CONSORCIO INTER – HATO 2024



Yopal, 29 de septiembre de 2025

OFICIO HT - 052

Ingeniero
LUIS RENE GRANADOS VARGAS
Líder supervisor e interventoría
Oficina Jurídica
prof3.juridica@enerca.com.co

Yopal, 2025/09/30 10:25:25
RAD: 20250109648
Empresa de energia de casanare S.A.E.S.P.
Enerca
correspondencia

Asunto: Entrega de informes semanal 33.

Ref.: Contrato de consultoría 377 de 2024 que tiene por objeto: INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y AREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO, CASANARE.

Cordial saludo,

Dando cumplimiento a nuestras actividades contractuales, muy respetuosamente realizamos la entrega de los informes semanales del contrato en referencia, de la siguiente manera:

N° INFORME SEMANAL	PERIODO	FOLIOS
33	Del 14/09/2025 al 20/09/2025	4

Es de aclarar que las semanas reportadas van de acuerdo al flujo de caja semanal.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

AUDENAR FLOREZ SANABRIA
R/L CONSORCIO INTER-HATO 2024
Contrato de consultoría No 377 de 2024

CONTRATO No.:	377 DE 2024	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y AREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO, CASANARE.		22	9	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR **CODIGO BPIN:** 2024005850123

INTERVENTORIA X **APOYO SUPERVISION**

Semana Número:	33	Del:	14/09/2025	Al:	20/09/2025	No:	33

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 7 Meses y 18 Días (Calendario)

Nombre del Contratista: CONSORCIO TERRAZAS
Nombre del Interventor: CONSORCIO INTER-HATO 2024
Nombre del Supervisor: LUIS RENE GRANADOS VARGAS - ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO
Nombre Apoyo a la Supervisión: VICTOR MANUEL BERNAL LOPEZ

CONTRATO DE OBRA

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y ÁREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO, CASANARE						
CONTRATO No	002 DE 2025	NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO TERRAZAS				
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0123 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y ÁREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO	RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0123	No. C.D.P.	6625	No R.P.	6625
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0123-SSF	RUBRO	2.3.2.01.01.001.03.14.47	No. C.D.P.	66	No R.P.	66
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 11.052.944.564,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) MESES				
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N/A	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	N/A				
FECHA DE INCIO	3 de febrero de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN	2 de diciembre de 2025	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A		

DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	VALOR DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSO
ANTICIPO	ACTA N° 01 DE INICIO	1	$ 4.421.177.825,60	40,00%
ACTA PARCIAL N°1	ACTA N° 02 PARCIAL N°1	2	$ 3.648.660.728,00	33,01%
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			$ 8.069.838.553,60	73,01%

PRORROGAS		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A

ADICIONES		
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

EJECUCIÓN

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
OBRA PROGRAMADA (%)	2,03%	89,45%	OBRA EJECUTADA (%)	0,78%	83,75%
VALOR DE LA OBRA PROGRAMADA	$ 224.559.546,89	$ 9.887.094.034,04	VALOR DE LA OBRA EJECUTADA	$ 86.291.468,00	$ 9.256.815.858,29

CONTRATO No.:	377 DE 2024	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y AREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO, CASANARE.		22	9	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

	PROYECTO SGR	CODIGO BPIN:	2024005850123
INTERVENTORIA	X	APOYO SUPERVISION	

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBJETO:	**INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y AREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO, CASANARE.**						
CONTRATO No	377 DE 2024	NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO INTER-HATO 2024				
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0123 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL DOMICILIARIO PARA LOS MUNICIPIOS DE OROCUE Y PAZ DE ARIPORO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE	RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0123	No. C.D.P.	3525	No R.P.	3525
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0123-SSF	RUBRO	2.3.2.02.02.008.47	No. C.D.P.	128	No R.P.	142
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.109.406.405,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	ONCE (11) MESES				
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N/A	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	N/A				
FECHA DE INCIO	3 de febrero de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN	2 de enero de 2026	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A		

DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	VALOR DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSO
ACTA PARCIAL N°1	ACTA N°2 PARCIAL N°1	2	$ 322.144.629	29,04%
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			$ 322.144.629	29,04%

PRORROGAS				SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A

ADICIONES		
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

CONTRATO No.:	377 DE 2024	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y AREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO, CASANARE.		22	9	2025


INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION


	PROYECTO SGR	CODIGO BPIN:	2024005850123
INTERVENTORIA	X	APOYO SUPERVISION	

RESUMEN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Se continúa con las excavaciones manuales en material común en las veredas San Nicolás, Sarrapio y Cedral y en el barrio El Bosque de hato corozal.
Se continua con las conexiones domiciliarias en la los barrios Senderos de manare y senderos de nuestra tierra de Paz de Ariporo; en los barrrios Esperanza, el Bosque y el aeropuerto de Hato Corozal.
Se continúa con la instalación de tubería de 1/2" en las veredas San Nicolas, La Manga, cedral y Sarrapio y en hato corozal en Villa Juliana, el bosque, la esperanza y el progreso y posterior relleno de las excavaciones.
Se continua con la excavacion en conglomerado en el barrio del bosque del municipio de Hato Corozal.
Cabe resaltar que las anteriores actividades son realizadas bajo el acompañamiento constante de la interventoría, desarrolladas bajo las normativas NTC 2505 instalaciones para suministro de gas destinadas a usos residenciales y comerciales, NTC 3728 gasoductos, líneas de transporte y redes de distribución de gas, ademas, de acuerdo al acto de gerencia No 219 del 12/09/2013 "manual de supervisión e interventoria de la empresa de energia de Casanare"

REGISTRO FOTOGRAFICO

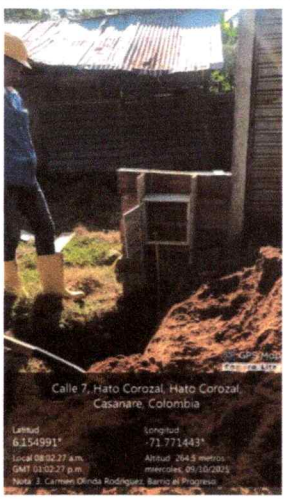

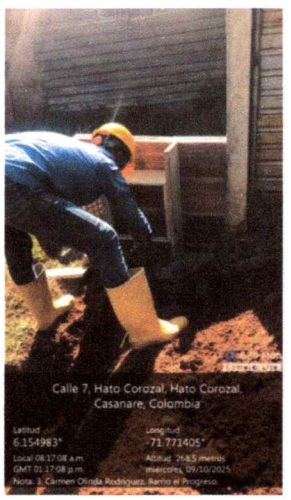

Descripción: Conexiones domiciliarias.



Descripción: Excavación manual en material común.

ACTIVIDADES PROYECTADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA

Se proyecta continuar excavaciones manuales en las veredas la Manga y Serrapio, continuar con la instalaciòn de tuberia de 1/2" en las veredas Las Tapias y serrapio y en el casco urbano del municipio de Hato Corozal; ademas, posterior relleno de las excavaciones. Continuar con la instalación de conexiones domiciliarias en el casco urbano de Paz de Ariporo y de Hato Corozal.


CONTRATO No.:	377 DE 2024	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y AREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO, CASANARE.		22	9	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

	PROYECTO SGR	CODIGO BPIN:	2024005850123
INTERVENTORIA	X	APOYO SUPERVISION	

OBSERVACIONES

A la fecha de corte del presente informe semanal, se tiene un atraso del 5,70%. Por lo cual se ha solicitado en comités y mediante oficio al contratista de obra presentar un plan de choque para mitigar dicho atraso.

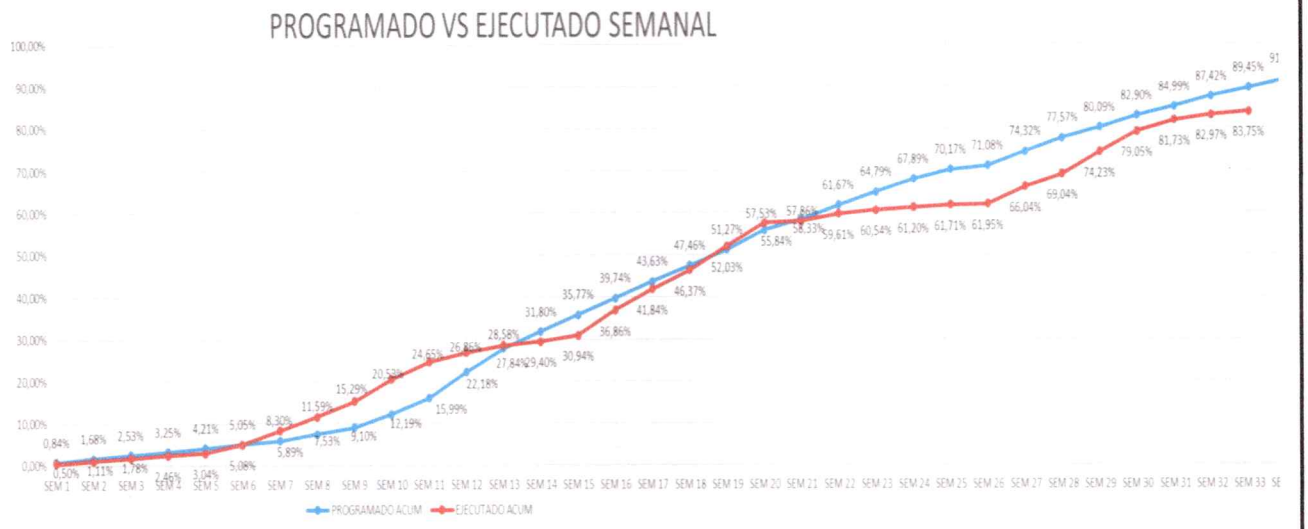

En constancia se firma.

Elaboró

CONSORCIO INTER-HATO 2024
R/L Audenar Florez Sanabria
INTERVENTOR

Revisó:

VICTOR MANUEL BERNAL LOPEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Recibió:

LUIS RENE GRANADOS VARGAS
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA

Enterado:

ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA
