ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

INTERVENTORÍA: ANTICA S.A.S BIC

CONTRATO No. SI-CMA-007-2024

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

CONTIENE: INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°6

PERÍODO DE EJECUCIÓN: 18 DE AGOSTO DE 2025 - 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

MONTERÍA - CÓRDOBA

Tabla de contenido.

1 INTRODUCCIÓN. 4
2 DECRIPCION DEL PROYECTO 5
2.1LOCALIZACIÓN. 5
2.2ESTADO INICIAL DEL SITIO DONDE SE EJECUTARÁN LAS OBRAS. 5
2.3CARACTERISTICAS TÉCNICAS Y ALCANCE DEL PROYECTO 11
3 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 22
3.1DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA. 22
ACTAS SUSCRITAS PARA EL CONTRATO DE OBRA 24
3.2 DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 25
3.3 INFORME DE AVANCE 28
3.4 CONTROL DIARIO DE EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA 30
3.5 CONTROL DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA 30
3.6 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA 31
3.7 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 32
3.8 INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO DEL CONTRATISTA 36
3.9INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL RESULTADO DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIOS .. 37
3.10 REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL CONTRATISTA DE OBRA POR PARTE DEL INTERVENTOR 37
4 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 38
4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 38
ACTAS SUSCRITAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 39
4.2 DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 40
4.3 CONTROL DIARIO DE EQUIPO DE INTERVENTORÍA 40
4.4 CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA 41
4.5 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 41
4.6 INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 42
4.7 REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL INTERVENTOR POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN 42
5 INFORMACIÓN DE GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL 43
6 INFORME DE GESTIÓN AL PLAN DE CALIDAD 43
7 CUADRO RESUMEN (AVANCE FISICO – FINANCIERO) 44
8 REGISTRO FOTOGRAFICO 47
9 INFORME EJECUTIVO DIRECCIÓN DE INTERVENTORÍA 47
10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 48

Imágenes.

Ilustración 1. Localización del proyecto 5
Ilustración 2. Cocina existente - Cereté 6
Ilustración 3. Área de comedor existente - Cereté 6
Ilustración 5. Área de comedor existente – San Pelayo 6
Ilustración 4. Cocina – San Pelayo 6
Ilustración 6. Cocina existente - CdO 7
Ilustración 7. Área de comedor existente - CdO 7
Ilustración 8. Cocina existente - Moñitos 7
Ilustración 9. Área de comedor existente - Moñitos 7
Ilustración 11. Área de comedor existente - Tierralta 8
Ilustración 10. Cocina existente - Tierralta 8
Ilustración 12. Cocina existente – Planeta Rica 8
Ilustración 13. Área de comedor – Planeta Rica 8
Ilustración 15. Área de comedor existente - SBDV 9
Ilustración 14. Cocina existente SBDV 9
Ilustración 17. Área de comedor existente - Canalete 9
Ilustración 16. Cocina existente - Canalete 9
Ilustración 19. Área de comedor existente - SADS 10
Ilustración 18. Cocina existente - SADS 10
Ilustración 21. Área de comedor – Los Córdobas 10
Ilustración 20. Cocina – Los Córdobas 10
Ilustración 22. Render comedor – vista 1. 12
Ilustración 23. Render comedor - vista 2. 12
Ilustración 24. Porcentaje (%) de avance físico semanal del proyecto 28
Ilustración 25. Relación de desembolsos al contratista 32
Ilustración 26. Gráfico de avance físico semanal 45
Ilustración 27. Gráfico de avance físico mensual 45
Ilustración 28. Avance financiero semanal 46
Ilustración 29. Avance financiero mensual 46

Tablas.

Tabla 1. Información general contrato de obra 22
Tabla 2. Seguimiento a garantías contractuales del contrato de obra 24
Tabla 3. Actas del contrato 24
Tabla 4. Avance programado vs Avance ejecutado 28
Tabla 5. Relación de Personal del Contratista de Obra 30
Tabla 6. Estado del tiempo. 33
Tabla 7. Información de contrato de Interventoría 38
Tabla 8. Seguimiento a garantías contractuales de interventoría 39
Tabla 9. Actas del Contrato de Interventoría 39
Tabla 10. Personal de interventoría 41

1 INTRODUCCIÓN.

El presente documento corresponde al SEXTO informe mensual de interventoría, en el que se relacionan las actividades desarrolladas en el sexto mes contractual comprendido entre el 18 de agosto de 2025 hasta el 17 de septiembre de 2025.

Este informe exhibe la Interventoría realizada al contrato de obra N° SI-LP-002-2024, cuyo objeto es *"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATICA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"*, el cual reviste una importancia fundamental para la administración departamental, al buscar impactar positivamente la calidad de vida de la población estudiantil.

La creación y optimización de estos espacios no solo proporcionarán áreas dignas y confortables para que los alumnos disfruten de sus alimentos bajo los más altos estándares de comodidad y ventilación, sino que también se conciben como lugares de esparcimiento y recreación. Se espera que estas pausas en la jornada académica, desarrolladas en estos comedores, contribuyan a renovar el entusiasmo y la motivación de los estudiantes, fortaleciendo así su proceso de aprendizaje y su interacción con la comunidad educativa.

El informe contiene las actividades desarrolladas por el Contratista CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002, representado legalmente por MARIA ISABEL QUINTERO GONZÁLEZ bajo el Contrato N° SI-LP-002-2024, el cual cuenta con un plazo de OCHO (8) meses y un valor total de CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($4.135.056.075,00).

Esta interventoría es realizada por ANTICA S.A.S BIC, representada legalmente por JUAN PABLO BANQUEZ GONZALEZ bajo el Contrato No. SI-CMA-007-2024 con un plazo de OCHO (8) meses y un valor total de TRECIENTOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($350.649.999,00).

El seguimiento y control de la ejecución de esta obra, detallado en el presente informe, se orienta a garantizar que los objetivos pactados se cumplan a cabalidad, entregando a la comunidad educativa espacios que fomenten su bienestar integral.

2 DECRIPCION DEL PROYECTO.

2.1 LOCALIZACIÓN.

El proyecto se encuentra localizado al noroccidente del país en la región Caribe Colombiana, Departamento de Córdoba. Específicamente en los municipios de Cereté (I.E. Marceliano Polo), San Pelayo (I.E. Santa Teresita sede general Santander), Ciénaga de Oro (I.E. Marco Fidel Suarez), Moñitos (I.E. San José de Moñitos sede principal), Tierralta (I.E. Junín), Planeta Rica (I.E. Plaza bonita), San Bernardo del Viento (I.E. El Castillo), Canalete (I.E. San José de Canalete), San Andrés de Sotavento (I.E. San Simón sede sagrado corazón de Jesús) y Los Córdobas (I.E. El Ébano).



Ilustración 1. Localización del proyecto.

2.2 ESTADO INICIAL DEL SITIO DONDE SE EJECUTARÁN LAS OBRAS.

De acuerdo a las solicitudes presentadas por parte de rectores y representantes de las diferentes instituciones educativas, se realizaron visitas técnicas a cada una de ellas, con el fin de verificar sus condiciones iniciales y establecer un diagnóstico preliminar, identificando las necesidades de cada Institución. En las cuales se encontró lo siguiente:

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCELIANO POLO

Las instalaciones existentes cuentan con un alto grado de deterioro y no cuentan con la capacidad necesaria para la atención de la población estudiantil de la institución educativa; por lo tanto, es necesario realizar la construcción de un nuevo comedor.



Ilustración 3. Área de comedor existente - Cereté

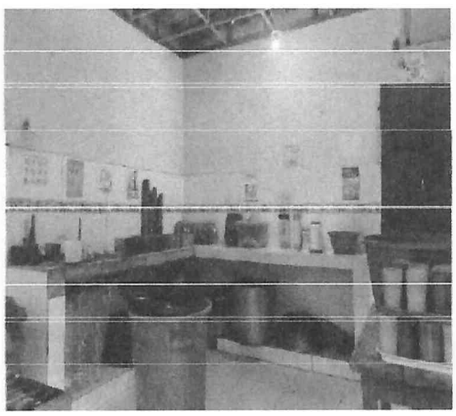


Ilustración 2. Cocina existente - Cereté

2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESITA SEDE GENERAL SANTANDER.

Las instalaciones existentes cuentan con un alto grado de deterioro y no cuentan con la capacidad necesaria para la atención de la población estudiantil de la institución educativa; por lo tanto, es necesario realizar la construcción de un nuevo comedor.



Ilustración 5. Área de comedor existente – San Pelayo



Ilustración 4. Cocina – San Pelayo

3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAZREZ.

Las instalaciones existentes cuentan con un alto grado de deterioro y no cuentan con la capacidad necesaria para la atención de la población estudiantil de la institución educativa; por lo tanto, es necesario realizar la construcción de un nuevo comedor.

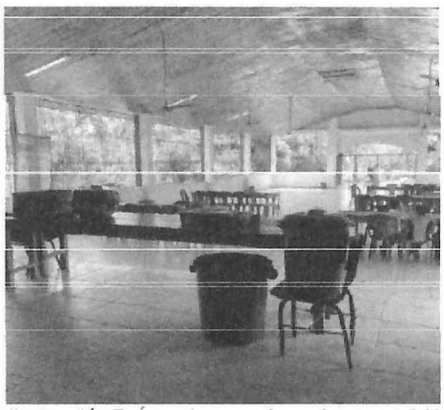


Ilustración 7. Área de comedor existente - CdO



Ilustración 6. Cocina existente - CdO

4. INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE MOÑITOS SEDE PRINCIPAL

Las instalaciones existentes cuentan con un alto grado de deterioro y no cuentan con la capacidad necesaria para la atención de la población estudiantil de la institución educativa; por lo tanto, es necesario realizar la construcción de un nuevo comedor.



Ilustración 9. Área de comedor existente - Moñitos




Ilustración 8. Cocina existente - Moñitos

5. INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUNIN

Las instalaciones existentes cuentan con un alto grado de deterioro y no cuentan con la capacidad necesaria para la atención de la población estudiantil de la institución educativa; por lo tanto, es necesario realizar la construcción de un nuevo comedor.



Ilustración 11. Área de comedor existente - Tierralta

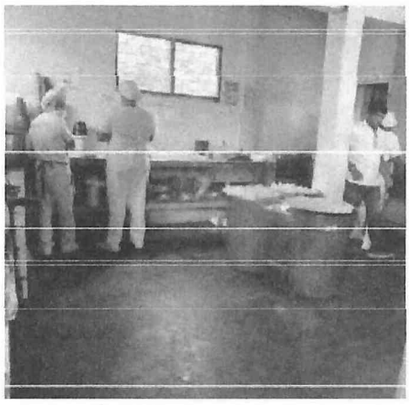


Ilustración 10. Cocina existente - Tierralta

6. INSTITUCIÓN EDUCATIVA PLAZA BONITA

Las instalaciones existentes cuentan con un alto grado de deterioro y no cuentan con la capacidad necesaria para la atención de la población estudiantil de la institución educativa; por lo tanto, es necesario realizar la construcción de un nuevo comedor.



Ilustración 13. Área de comedor - Planeta Rica

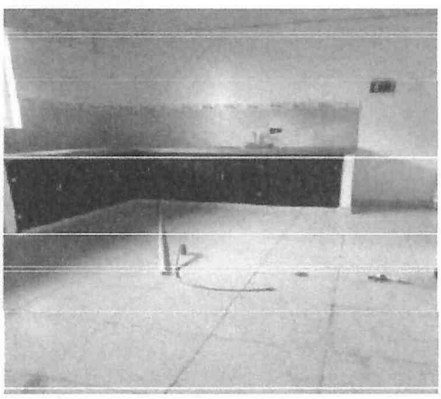


Ilustración 12. Cocina existente - Planeta Rica

7. INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CASTILLO

Las instalaciones existentes cuentan con un alto grado de deterioro y es necesario realizar trabajos de reparación de cubiertas, pinturas, resanes de muros, pisos y demás adecuaciones necesarias para la correcta operación de cocina y comedor, garantizando así la prestación de un servicio de calidad para toda la población estudiantil.



Ilustración 15. Área de comedor existente - SBDV

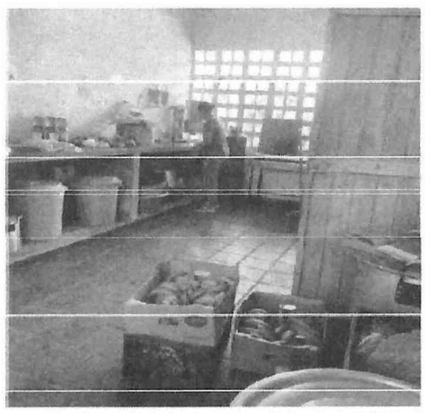


Ilustración 14. Cocina existente SBDV

8. INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE CANALETE.

Las instalaciones existentes cuentan con un alto grado de deterioro y es necesario realizar trabajos de reparación de cubiertas, pinturas, resanes de muros, pisos y demás adecuaciones necesarias para la correcta operación de cocina y comedor, garantizando así la prestación de un servicio de calidad para toda la población estudiantil.

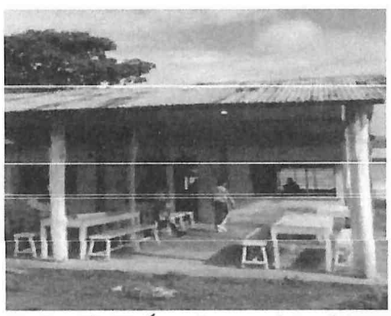


Ilustración 17. Área de comedor existente - Canalete

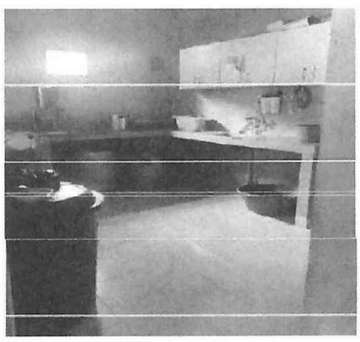


Ilustración 16. Cocina existente - Canalete

9. INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN SIMON SEDE SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Las instalaciones existentes cuentan con un alto grado de deterioro y es necesario realizar trabajos de reparación de cubiertas, pinturas, resanes de muros, pisos y demás adecuaciones necesarias para la correcta operación de cocina y comedor, garantizando así la prestación de un servicio de calidad para toda la población estudiantil.



Ilustración 19. Área de comedor existente - SADS



Ilustración 18. Cocina existente - SADS

10. INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ÉBANO

Las instalaciones existentes cuentan con un alto grado de deterioro y es necesario realizar trabajos de reparación de cubiertas, pinturas, resanes de muros, pisos y demás adecuaciones necesarias para la correcta operación de cocina y comedor, garantizando así la prestación de un servicio de calidad para toda la población estudiantil.



Ilustración 21. Área de comedor – Los Córdobas




Ilustración 20. Cocina – Los Córdobas

2.3 CARACTERISTICAS TÉCNICAS Y ALCANCE DEL PROYECTO

El presente proyecto consiste en la construcción y adecuación de diez (10) comedores institucionales en diferentes municipios del departamento de Córdoba, con el objetivo primordial de optimizar la infraestructura destinada a la alimentación escolar y, consecuentemente, mejorar el bienestar de la comunidad educativa. De estos diez comedores, se realizará la construcción de seis (6) comedores completamente nuevos en los municipios de Cereté, Ciénaga de Oro, San Pelayo, Moñitos, Planeta Rica y Tierralta.

Cada uno de estos comedores institucionales de nueva construcción representarán un espacio moderno y funcional, diseñado para cumplir con los más altos estándares de este tipo de infraestructura educativa, pues estos contarán con áreas especializadas como: Cuarto de Bombas, Depósito de Basuras, Zonas de Preparación de Alimentos (incluyendo cocina fría y cocina caliente), Zona de Lavado, Zona de Refrigeración, Zona de Selección y Recibo. Asimismo, dispondrá de espacios dedicados para la entrega y recibo de bandejas, depósitos específicos para el menaje de la cocina, y un baño exclusivo para el personal que labore en estas instalaciones.

Adicionalmente, se contará con un amplio y adecuado espacio destinado al comedor, donde los estudiantes podrán recibir sus alimentos en un ambiente con los más altos estándares de comodidad y ventilación, propiciando un disfrute pleno durante sus comidas. Es importante destacar que estos comedores nuevos serán completamente dotados con el mobiliario necesario, incluyendo sillas y mesas, así como también los electrodomésticos necesarios en beneficio población estudiantil. Por otra parte, el proyecto contempla la adecuación de cuatro (4) comedores existentes, ubicados en las diferentes instituciones educativas de los municipios de Canalete, San Bernardo del Viento, San Andrés de Sotavento y Los Córdobas.

En estas instituciones, las obras a ejecutar serán específicas y estarán adaptadas a las necesidades particulares que presente cada comedor, priorizando las intervenciones que garanticen que el espacio sea completamente funcional, seguro y estructuralmente estable para el beneficio de la comunidad educativa. Cabe resaltar que estos comedores también serán dotados de igual manera con sillas, mesas, electrodomésticos y el menaje correspondiente.

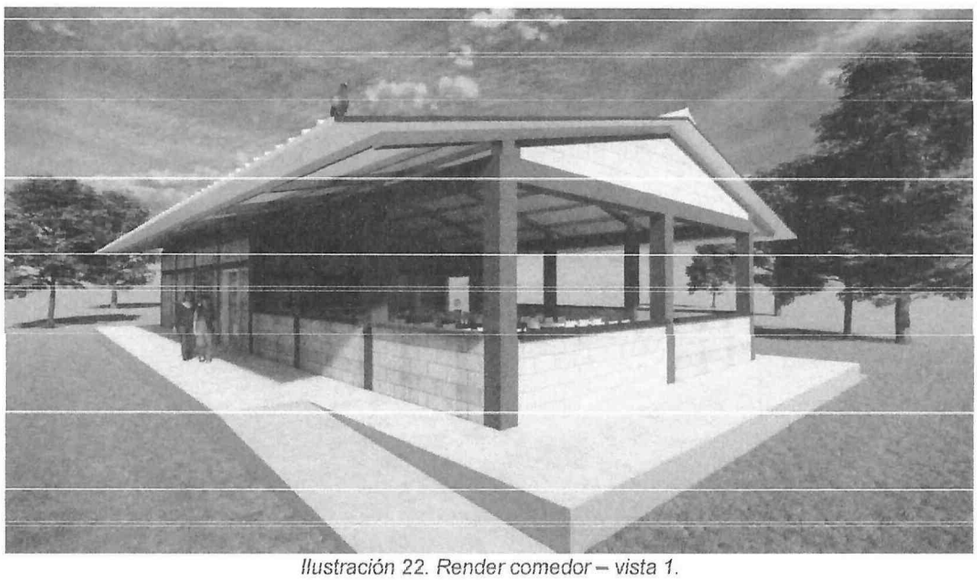


Ilustración 22. Render comedor – vista 1.

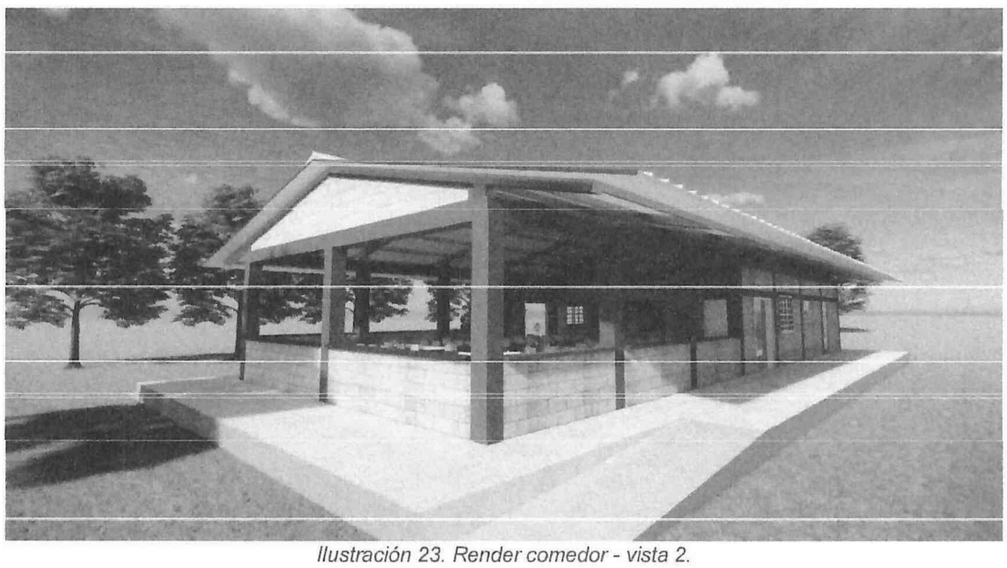


Ilustración 23. Render comedor - vista 2.

El proyecto consiste en la intervención de diez instituciones educativas, en diferentes municipios del Departamento de Córdoba, de la siguiente manera:

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCELIANO POLO
   Municipio: Cereté
   Las intervenciones a realizar en esta institución son: Construcción comedor escolar de 312 metros cuadrados.

2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESITA SEDE GENERAL SANTANDER
   Municipio: San Pelayo
   Las intervenciones a realizar en esta institución son: Construcción comedor escolar de 312 metros cuadrados.

3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ
   Municipio: Ciénaga de Oro
   Las intervenciones a realizar en esta institución son: Construcción comedor escolar de 312 metros cuadrados.

4. INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE MOÑITOS SEDE PRINCIPAL
   Municipio: Moñitos
   Las intervenciones a realizar en esta institución son: Construcción comedor escolar de 312 metros cuadrados.

5. INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUNÍN
   Municipio: Tierralta
   Las intervenciones a realizar en esta institución son: Construcción comedor escolar de 312 metros cuadrados.

6. INSTITUCIÓN EDUCATIVA PLAZA BONITA
   Municipio: Planeta Rica
   Las intervenciones a realizar en esta institución son: Construcción comedor escolar de 312 metros cuadrados.

7. INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CASTILLO
   Municipio: San Bernardo del Viento
   Las intervenciones a realizar en esta institución son: Adecuación Comedor escolar de 75,0 metros cuadrados (Cubiertas, Pinturas y resanes, resanes de muros, Pisos, otros).

8. INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE CANALETE
   Municipio: Canalete
   Las intervenciones a realizar en esta institución son: Adecuación Comedor escolar de 130,40 metros cuadrados (Cubiertas, Pinturas y resanes, resanes de muros, Pisos, otros).

9. INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN SIMÓN SEDE SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
   Municipio: San Andrés de Sotavento
   Las intervenciones a realizar en esta institución son: Adecuación Comedor escolar de 48,00 metros cuadrados (Cubiertas, Pinturas y resanes, resanes de muros, Pisos, otros).

10. INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ÉBANO

Municipio: Los Córdobas

Las intervenciones a realizar en esta institución son: Adecuación Comedor escolar de 80,96 m2 (Cubiertas, Pinturas y resanes, resanes de muros, Pisos, otros).

Las actividades y el alcance a ejecutar para este proyecto se relacionan a continuación:

					Formulario 1 - Propuesta económica		
					Código: 001		Versión: 1
GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA PRESUPUESTO OFICIAL							
MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA							
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CORREGIDO	VALOR TOTAL
1. ACTIVIDADES PRELIMINARES (I.E MARCELIANO POLO, CERETE - I.E SANTA TERESITA SEDE GNRAL SANTANDER, SAN PELAYO - I.E MARCO FIDEL SUAREZ; CIENAGA DE ORO - I.E SAN JOSE DE MOÑITOS - I.E PLAZA BONITA SEDE NUEVA EL EBANO, PLANETA RICA. - I.E JUNIN, TIERRALTA)							
	1,01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	M2	1.872,00	$ 4.287,00	$ 4.287,00	$ 8.025.264,00
	1,02	ADECUACIÓN Y NIVELACIÓN DE TERRENO	M2	1.872,00	$ 7.514,00	$ 7.514,00	$ 14.066.208,00
	1,03	S/I CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE, H=2.10 MTS PARA OBRAS	ML	444,00	$ 21.007,00	$ 21.007,00	$ 9.327.108,00
Subtotal							$ 31.418.580,00
2. EXCAVACIONES Y RELLENOS (I.E MARCELIANO POLO, CERETE - I.E SANTA TERESITA SEDE GNRAL SANTANDER, SAN PELAYO - I.E MARCO FIDEL SUAREZ; CIENAGA DE ORO - I.E SAN JOSE DE MOÑITOS - I.E PLAZA BONITA SEDE NUEVA EL EBANO, PLANETA RICA. - I.E JUNIN, TIERRALTA)							
	2,01	EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS DE 1.00 X 1.00 MTS	M3	171,00	$ 39.259,00	$ 39.259,00	$ 6.713.289,00
	2,02	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0.30 X 0.30 MTS	ML	409,00	$ 6.543,00	$ 6.543,00	$ 2.676.087,00
	2,03	REEMPLAZO O MEJORAMIENTO DEL TERRENO DEBAJO DE ZAPATAS EN PIEDRA RAJON - MATERIAL SELECCIONADO (80/20)	M3	57,00	$ 206.382,00	$ 206.382,00	$ 11.763.774,00
	2,04	RELLENO DEL AREA CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	730,20	$ 200.140,00	$ 200.140,00	$ 146.142.228,00
	2,05	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE 10 KM	M3	270,15	$ 22.830,00	$ 22.830,00	$ 6.167.525,00
Subtotal							$ 173.462.903,00
3. CIMENTACIÓN (I.E MARCELIANO POLO, CERETE - I.E SANTA TERESITA SEDE GNRAL SANTANDER, SAN PELAYO - I.E MARCO FIDEL SUAREZ; CIENAGA DE ORO - I.E SAN JOSE DE MOÑITOS - I.E PLAZA BONITA SEDE NUEVA EL EBANO, PLANETA RICA. - I.E JUNIN, TIERRALTA)							
	3,01	SOLADO EN CONCRETO E = 0.05 MTS DE 14 MPA (2000 PSI)	M3	5,70	$ 890.152,00	$ 890.152,00	$ 5.073.866,00
	3,02	ZAPATAS DE 1.00 X 1.00 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	M3	34,20	$ 1.020.946,00	$ 1.020.946,00	$ 34.916.353,00
	3,03	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	365,40	$ 124.557,00	$ 124.557,00	$ 45.513.128,00
	3,04	ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA CIMENTACIÓN	KG	7.173,00	$ 9.658,00	$ 9.658,00	$ 69.276.834,00
	3,05	SOBRECIMIENTO IMPERMEABILIZADO 3 HILADAS EN BLOQUE MACIZO DE CONCRETO DE 0.10M X 0.20M X 0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4	ML	596,40	$ 40.066,00	$ 40.066,00	$ 23.895.362,00
Subtotal							$ 178.675.543,00

4. ESTRUCTURAS (I.E MARCELIANO POLO, CERETE - I.E SANTA TERESITA SEDE GNRAL SANTANDER, SAN PELAYO - I.E MARCO FIDEL SUAREZ; CIENAGA DE ORO - I.E SAN JOSE DE MOÑITOS - I.E PLAZA BONITA SEDE NUEVA EL EBANO, PLANETA RICA. - I.E JUNIN, TIERRALTA)							
	4,01	COLUMNAS DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	438,00	$ 135.680,00	$ 135.680,00	$ 59.427.840,00
	4,02	VIGA SUPERIOR DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	318,00	$ 135.759,00	$ 135.759,00	$ 43.171.362,00
	4,03	ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA ESTRUCTURAS	KG	12.107,40	$ 9.658,00	$ 9.658,00	$ 116.933.269,00
	4,04	ALFAJIAS DE A=0.21 E=0.07 CON 2 Ø 3/8" Y Ø 1/4" @ 0.20 MTS EN CONCRETO DE 17.5Mpa (2500 PSI)	ML	131,00	$ 60.002,00	$ 60.002,00	$ 7.860.262,00
	4,05	RAMPA DE ACCESO EN CONCRETO DE 3000 PSI(PLANTILLA CON MALLA ELECTROSOLDADA E=0.08 Y VIGAS 0.15 MTS X 0.20 MTS) . REF 4 D 3/8" Y ESTRIBOS 1/4" @ 0.25 MTS	M2	108,00	$ 157.726,00	$ 157.726,00	$ 17.034.408,00
	4,06	MESON PARA ENTREGA DE ALIMENTOS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) E=0.08, CON REFUERZO 3/8" @ .15 EN AMBOS SENTIDOS CON ACABO EN GRANITO PULIDO	M2	9,60	$ 160.024,00	$ 160.024,00	$ 1.536.230,00
Subtotal							**$ 245.963.371,00**
5. MAMPOSTERIA Y REVOQUE (I.E MARCELIANO POLO, CERETE - I.E SANTA TERESITA SEDE GNRAL SANTANDER, SAN PELAYO - I.E MARCO FIDEL SUAREZ; CIENAGA DE ORO - I.E SAN JOSE DE MOÑITOS - I.E PLAZA BONITA SEDE NUEVA EL EBANO, PLANETA RICA. - I.E JUNIN, TIERRALTA)							
	5,01	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE SEMIESTRUCTURAL DE 0.12MTS X 0.20MTS X 0.40MTS CON PEGA DE MORTERO 1:4	M2	1.236,00	$ 99.267,00	$ 99.267,00	$ 122.694.012,00
	5,02	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 PARA MUROS EN MORTERO 1:4	M2	2.662,00	$ 56.791,00	$ 56.791,00	$ 151.177.642,00
	5,03	ESTUCO PLASTICO PARA MUROS	M2	2.362,00	$ 22.172,00	$ 22.172,00	$ 52.370.264,00
	5,04	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	2.362,00	$ 23.045,00	$ 23.045,00	$ 54.432.290,00
Subtotal							**$ 380.674.208,00**
6. ESTRUCTURA - CUBIERTA (I.E MARCELIANO POLO, CERETE - I.E SANTA TERESITA SEDE GNRAL SANTANDER, SAN PELAYO - I.E MARCO FIDEL SUAREZ; CIENAGA DE ORO - I.E SAN JOSE DE MOÑITOS - I.E PLAZA BONITA SEDE NUEVA EL EBANO, PLANETA RICA. - I.E JUNIN, TIERRALTA)							
	6,01	CUBIERTA TIPO SANDWICH 18 MM EN ACERO LAMINADO A500 GRADO C COLOR BLANCO CON AISLANTE EN POLIESTIRENO 18-20MM. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	M2	1.304,00	$ 281.430,00	$ 281.430,00	$ 366.984.720,00
	6,02	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CERCHAS CON PERFILES PHR C ENCAJONADOS SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, CON SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS	KG	7.925,30	$ 22.867,00	$ 22.867,00	$ 181.227.835,00
	6,03	S/I DE CORREAS CON PERFILES PHR C SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, CON SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS	KG	4.379,96	$ 18.468,00	$ 18.468,00	$ 80.889.101,00
Subtotal							**$ 629.101.656,00**
7. PISOS (I.E MARCELIANO POLO, CERETE - I.E SANTA TERESITA SEDE GNRAL SANTANDER, SAN PELAYO - I.E MARCO FIDEL SUAREZ; CIENAGA DE ORO - I.E SAN JOSE DE MOÑITOS - I.E PLAZA BONITA SEDE NUEVA EL EBANO, PLANETA RICA. - I.E JUNIN, TIERRALTA)							
	7,01	PLANTILLA EN CONCRETO 3000 PSI, E= 0.10MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	985,80	$ 127.857,00	$ 127.857,00	$ 126.041.431,00
	7,02	S/I DE PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 0.50X0.50 MTS COLOR BLANCA O BEIGE	M2	985,80	$ 163.779,00	$ 163.779,00	$ 161.453.338,00
	7,03	ENCHAPE CERÁMICA DE 0.30 X 0.60 MTS COLOR BLANCO BAÑOS Y ZONAS HUMEDAS	M2	266,40	$ 172.440,00	$ 172.440,00	$ 45.938.016,00
	7,04	GUARDAESCOBA EN CERAMICA H=0.10 MTS	ML	707,40	$ 35.593,00	$ 35.593,00	$ 25.178.488,00
Subtotal							**$ 358.611.273,00**
8. CARPINTERIA							

	8,01	S/I PUERTA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DE 1.00 X 2.2M INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	UN	42,00	$ 805.968,00	$ 805.968,00	$ 33.850.656,00
	8,02	S/I PUERTA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DE 0.80 X 2.2M INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	UN	12,00	$ 729.435,00	$ 729.435,00	$ 8.753.220,00
	8,03	S/I PUERTA EN ALUMINIO Y VIDRIO DOBLE HOJA, DE 1,50 X 2,20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MANIJAS DE 30 CMS EN AMBAS PUERTAS Y POR AMBOS LADOS.	UN	12,00	$ 1.717.152,00	$ 1.717.152,00	$ 20.605.824,00
	8,04	S/I CORTINA ENROLLABLE DE LAMAS DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO, PANEL CIEGO DE 0,6 MM ESPESOR, ACABADO EN COLOR GRIS, APERTURA MANUAL.	M2	21,60	$ 429.923,00	$ 429.923,00	$ 9.286.337,00
	8,05	S/I VENTANAS DE ALUMINIO CORREDIZA REF 744 Y VIDRIO DE 4mm	M2	42,72	$ 356.243,00	$ 356.243,00	$ 15.218.701,00
	8,06	S/I PROTECTOR DE VENTANAS EN VARILLA DE 1/2 CUADRADA INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE A DOS MANOS	M2	62,16	$ 175.448,00	$ 175.448,00	$ 10.905.848,00
Subtotal							**$ 98.620.586,00**
9. INSTALACIONES HIDROSANITARIOS(I.E MARCELIANO POLO, CERETE - I.E SANTA TERESITA SEDE GNRAL SANTANDER, SAN PELAYO - I.E MARCO FIDEL SUAREZ; CIENAGA DE ORO - I.E SAN JOSE DE MOÑITOS - I.E PLAZA BONITA SEDE NUEVA EL EBANO, PLANETA RICA. - I.E JUNIN, TIERRALTA)							
TUBERÍAS Y ACCESORIOS RED AGUA POTABLE							
	9,01	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL DE TUBERIA PRESION	ML	246,00	$ 2.798,00	$ 2.798,00	$ 688.308,00
	9,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 1/2" PVC RDE 9, PARA SOLDAR	ML	105,00	$ 12.259,00	$ 12.259,00	$ 1.287.195,00
	9,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 3/4" PVC, RDE 21, PARA SOLDAR	ML	54,00	$ 15.603,00	$ 15.603,00	$ 842.562,00
	9,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 1" PVC, RDE 21, PARA SOLDAR	ML	87,00	$ 14.626,00	$ 14.626,00	$ 1.272.462,00
	9,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO	UN	42,00	$ 33.494,00	$ 33.494,00	$ 1.406.748,00
	9,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE UNIÓN MACHO GALVANIZADO 1" L=50CM	UN	18,00	$ 116.469,00	$ 116.469,00	$ 2.096.442,00
	9,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE UNIÓN MACHO GALVANIZADO 1" L=15CM	UN	24,00	$ 33.322,00	$ 33.322,00	$ 799.728,00
	9,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION UNIVERSAL GALVANIZADA	UN	6,00	$ 57.277,00	$ 57.277,00	$ 343.662,00
	9,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO GALVANIZADO 1"	UN	6,00	$ 46.500,00	$ 46.500,00	$ 279.000,00
	9,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE GALVANIZADA 1"	UN	12,00	$ 27.150,00	$ 27.150,00	$ 325.800,00
	9,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN GALVANIZADO 1"	UN	6,00	$ 18.049,00	$ 18.049,00	$ 108.294,00
	9,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA CHECK VERTICAL BRONCE 1"	UN	12,00	$ 76.785,00	$ 76.785,00	$ 921.420,00
	9,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE CIERRE RÁPIDO METÁLICA 1"	UN	12,00	$ 76.785,00	$ 76.785,00	$ 921.420,00
	9,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE REGISTRO 1/2", INCLUYE TAPA REGISTRO 15X15CM	UN	42,00	$ 57.691,00	$ 57.691,00	$ 2.423.022,00
	9,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE REGISTRO 1", INCLUYE TAPA REGISTRO 15X15CM	UN	18,00	$ 59.062,00	$ 59.062,00	$ 1.063.116,00
	9,16	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL DE TUBERIA SANITARIA	ML	351,00	$ 2.798,00	$ 2.798,00	$ 982.098,00
	9,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 2" PVC, PARA SOLDAR	ML	108,00	$ 34.840,00	$ 34.840,00	$ 3.762.720,00
	9,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 3" PVC, PARA SOLDAR	ML	45,00	$ 46.441,00	$ 46.441,00	$ 2.089.845,00
	9,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 4" PVC, PARA SOLDAR	ML	114,00	$ 62.212,00	$ 62.212,00	$ 7.092.168,00
	9,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA VENTILACION 2" PVC, PARA SOLDAR	ML	72,00	$ 57.990,00	$ 57.990,00	$ 4.175.280,00
	9,21	PUNTO SANITARIO 2"	UN	84,00	$ 66.284,00	$ 66.284,00	$ 5.567.856,00
	9,22	PUNTO SANITARIO 4"	UN	6,00	$ 82.396,00	$ 82.396,00	$ 494.376,00

	9,23	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION 60X60X100 CM	UN	18,00	$ 618.920,00	$ 618.920,00	$ 11.140.560,00
EQUIPOS DE BOMBEO AGUA POTABLE Y TANQUE ELEVADO							
	9,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA 1/2HP (INCLUYE MANIFOLD DE SUCCIÓN)	UN	12,00	$ 1.416.032,00	$ 1.416.032,00	$ 16.992.384,00
	9,25	TANQUE ELEVADO DE 2000L PLÁSTICO	UN	6,00	$ 1.075.173,00	$ 1.075.173,00	$ 6.451.038,00
APARATOS SANITARIOS						$ -	$ -
	9,26	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TANQUE	UN	6,00	$ 616.099,00	$ 616.099,00	$ 3.696.594,00
	9,27	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS	UN	12,00	$ 683.223,00	$ 683.223,00	$ 8.198.676,00
	9,28	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS	UN	12,00	$ 1.019.878,00	$ 1.019.878,00	$ 12.238.536,00
	9,29	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE PISO PARA DESAGUE	UN	54,00	$ 104.607,00	$ 104.607,00	$ 5.648.778,00
	9,30	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADOS METÁLICOS	UN	12,00	$ 1.058.191,00	$ 1.058.191,00	$ 12.698.292,00
	9,31	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA DE GRASA EN CONCRETO DE 4000 PSI	UN	12,00	$ 616.694,00	$ 616.694,00	$ 7.400.328,00
TANQUE ELEVADO AGUA POTABLE							
	9,32	EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATA DE 2.00 X 2.00 MTS	M3	36,00	$ 39.259,00	$ 39.259,00	$ 1.413.324,00
	9,33	REEMPLAZO O MEJORAMIENTO DEL TERRENO DEBAJO DE ZAPATA EN PIEDRA RAJON - MATERIAL SELECCIONADO (80/20)	M3	12,00	$ 206.382,00	$ 206.382,00	$ 2.476.584,00
	9,34	RELLENO DEL AREA CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	13,82	$ 200.188,00	$ 200.188,00	$ 2.766.598,00
	9,35	SOLADO EN CONCRETO E = 0.05 MTS DE 14 MPA (2000 PSI)	M3	1,20	$ 890.152,00	$ 890.152,00	$ 1.068.182,00
	9,36	ZAPATA DE 2.00 X 2.00 X 0.35 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	M3	8,40	$ 1.020.946,00	$ 1.020.946,00	$ 8.575.946,00
	9,37	COLUMNA DE 0.40 X 0.40 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	28,98	$ 177.056,00	$ 177.056,00	$ 5.131.083,00
	9,38	PLACA EN CONCRETO DE 2.00 m X 2.00 m X 0.17 m DE 3000 PSI INCLUYE REF. VARILLA DE 3/8 @ 0.15MT PARA TANQUE ELEVADO	M2	24,00	$ 403.099,00	$ 403.099,00	$ 9.674.376,00
	9,39	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA PARA COLUMNA Y ZAPATA TANQUE	KG	1.615,80	$ 9.658,00	$ 9.658,00	$ 15.605.396,00
TANQUE AGUA POTABLE						$ -	$ -
	9,40	EXCAVACIÓN MANUAL PARA TANQUE	M3	151,20	$ 39.259,00	$ 39.259,00	$ 5.935.961,00
	9,41	REEMPLAZO O MEJORAMIENTO DEL TERRENO PARA SUPERFICIE DE APOYO DE TANQUE EN PIEDRA RAJON - MATERIAL SELECCIONADO (80/20)	M3	27,00	$ 206.382,00	$ 206.382,00	$ 5.572.314,00
	9,42	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE 10 KM	M3-KM	196,56	$ 22.831,00	$ 22.831,00	$ 4.487.661,00
	9,43	SOLADO EN CONCRETO E = 0.05 MTS DE 14 MPA (2000 PSI)	M3	1,20	$ 890.152,00	$ 890.152,00	$ 1.068.182,00
	9,44	CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) PARA FONDO TANQUE INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO.	M3	10,80	$ 1.195.256,00	$ 1.195.256,00	$ 12.908.765,00
	9,45	S/I CINTA PVC O-22	ML	117,60	$ 106.274,00	$ 106.274,00	$ 12.497.822,00
	9,46	CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) PARA TAPA Y MUROS DE TANQUE INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO	M3	43,20	$ 1.270.097,00	$ 1.270.097,00	$ 54.868.190,00
	9,47	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA PARA ESTRUCTURA TANQUE	KG	3.103,20	$ 9.658,00	$ 9.658,00	$ 29.970.706,00
TANQUE DE AGUAS RESIDUALES							
	9,48	EXCAVACIÓN MANUAL PARA TANQUE	M3	151,20	$ 39.259,00	$ 39.259,00	$ 5.935.961,00
	9,49	REEMPLAZO O MEJORAMIENTO DEL TERRENO DEBAJO DE ZAPATA EN PIEDRA RAJON - MATERIAL SELECCIONADO (80/20)	M3	27,00	$ 206.382,00	$ 206.382,00	$ 5.572.314,00
	9,50	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE 10 KM	M3-KM	196,56	$ 22.831,00	$ 22.831,00	$ 4.487.661,00

	9,51	SOLADO EN CONCRETO E = 0.05 MTS DE 14 MPA (2000 PSI)	M3	1,20	$ 765.656,00	$ 765.656,00	$ 918.787,00
	9,52	CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) PARA TAPA Y MUROS DE TANQUE INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO	M3	43,20	$ 905.605,00	$ 905.605,00	$ 39.122.136,00
	9,53	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA PARA ESTRUCTURA TANQUE	KG	3.103,20	$ 9.658,00	$ 9.658,00	$ 29.970.706,00
Subtotal							$ 383.437.363,00
10. INSTALACIONES ELECTRICAS (I.E MARCELIANO POLO, CERETE - I.E SANTA TERESITA SEDE GNRAL SANTANDER, SAN PELAYO - I.E MARCO FIDEL SUAREZ; CIENAGA DE ORO - I.E SAN JOSE DE MOÑITOS - I.E PLAZA BONITA SEDE NUEVA EL EBANO, PLANETA RICA. - I.E JUNIN, TIERRALTA)							
	10,01	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO (incluye interruptor, Tubería PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG)	UN	42,00	$ 251.975,00	$ 251.975,00	$ 10.582.950,00
	10,02	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE (incluye interruptor, Tubería PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG)	UN	18,00	$ 254.729,00	$ 254.729,00	$ 4.585.122,00
	10,03	SALIDA PARA VENTILADOR DE TECHO (incluye control, Tubería PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG,cable encauchetado 3x14AWG, Ventilador de Techo residencial)	UN	72,00	$ 1.246.819,00	$ 1.246.819,00	$ 89.770.968,00
	10,04	SALIDA PARA LUMINARIA EN TECHO Y EXTERIORES (incluye Tubería EMT, Tuberia PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG, cable encauchetado 3x14AWG, Panel LED 24W-Wallpack LED 30W)	UN	234,00	$ 624.202,00	$ 624.202,00	$ 146.063.268,00
	10,05	SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA Y AVISO SALIDA (incluye Tubería EMT, Tuberia PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG, cable encauchetado 3x14AWG, Luminaria LED EMERGENCIA, Aviso LED SALIDA)	UN	60,00	$ 945.986,00	$ 945.986,00	$ 56.759.160,00
	10,06	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA Y CFCI, (incluye TOMA DOBLE 15A - 125V, Tuberia PVC SCH40, Tubería EMT, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG) TD1-C-2-C4-C6-C8-10-12-14-16	UN	126,00	$ 203.416,00	$ 203.416,00	$ 25.630.416,00
	10,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO BIFÁSICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y PUERTA DE 20 CIRCUITOS. (incluye Protecciones, Tubería PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas)	UN	6,00	$ 1.282.734,00	$ 1.282.734,00	$ 7.696.404,00
	10,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA PUESTA A TIERRA (incluye Tubería PVC, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°8AWG)	UN	6,00	$ 1.914.256,00	$ 1.914.256,00	$ 11.485.536,00
	10,09	SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA EN Cu 2xN°8F + 1xN°8N (incluye Tuberia PVC, cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas)	ML	25,00	$ 147.633,00	$ 147.633,00	$ 3.690.825,00
	10,10	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS DE MEDIDA Y ADECUACIÓN DE PUNTO DE CONEXIÓN HASTA TABLERO DE PROTECCIONES (incluye Tuberia PVC, Tuberia IMC, cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas)	UN	6,00	$ 2.526.991,00	$ 2.526.991,00	$ 15.161.946,00
	10,11	SALIDA PARA TV (incluye TOMA TV, Tuberia PVC SCH40, Tubería EMT, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Coaxial RG-6)	UN	12,00	$ 202.067,00	$ 202.067,00	$ 2.424.804,00
	10,12	CERTIFICACION Retie Y Retilap Uso Final	UN	6,00	$ 2.873.894,00	$ 2.873.894,00	$ 17.243.364,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ENERGÍA SOLAR							
	10,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSUMOS ELÉCTRICOS (CABLE) RETIE TUBERÍAS PLÁSTICA Y METÁLICAS	UND	6,00	$ 3.599.955,00	$ 3.599.955,00	$ 21.599.730,00

	10,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INVERSOR OFFGRID 4000W	UND	6,00	$10.471.226,00	$ 10.471.226,00	$ 62.827.356,00
	10,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE METÁLICO CON INTERRUPTORES. INCLUYE ACCESORIOS	UND	6,00	$ 4.413.427,00	$ 4.413.427,00	$ 26.480.562,00
	10,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL MONOCRISTALINO DE 550W PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO	UND	48,00	$ 1.502.974,00	$ 1.502.974,00	$ 72.142.752,00
	10,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA INSTALACIÓN DE VEINTITRES (23) PANELES SOLARES. INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, ANCLAJE AL SUELO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS QUE PRESERVEN LA INTEGRIDAD DE LOS PANELES	UND	48,00	$ 1.104.924,00	$ 1.104.924,00	$ 53.036.352,00
	10,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE BATERÍAS (CADA UNIDAD DE 48V 100AH)	UND	18,00	$16.125.303,00	$ 16.125.303,00	$ 290.255.454,00
Subtotal							**$ 917.436.969,00**
11. MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL COMEDOR COCINA DE LA I.E SAN JOSE CANALETE							
ACTIVIDADES PRELIMINARES							
	11,01	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO	Und	1,00	$ 817.173,00	$ 817.173,00	$ 817.173,00
	11,02	ADECUACIÓN Y NIVELACIÓN DE TERRENO	M2	102,00	$ 7.514,00	$ 7.514,00	$ 766.428,00
	11,03	S/I CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE, H=2.10 MTS PARA OBRAS	ML	55,00	$ 21.007,00	$ 21.007,00	$ 1.155.385,00
EXCAVACIONES Y RELLENOS							
	11,04	EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS DE 1.00 X 1.00 MTS	M3	18,00	$ 39.259,00	$ 39.259,00	$ 706.662,00
	11,05	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0.30 X 0.30 MTS	ML	41,60	$ 6.543,00	$ 6.543,00	$ 272.189,00
	11,06	REEMPLAZO O MEJORAMIENTO DEL TERRENO DEBAJO DE ZAPATAS EN PIEDRA RAJON - MATERIAL SELECCIONADO (80/20)	M3	6,00	$ 206.382,00	$ 206.382,00	$ 1.238.292,00
	11,07	RELLENO DEL AREA CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	66,80	$ 200.140,00	$ 200.140,00	$ 13.369.352,00
	11,08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE 10 KM	M3	28,27	$ 22.827,00	$ 22.827,00	$ 645.319,00
CIMENTACIÓN							
	11,09	SOLADO EN CONCRETO E = 0.05 MTS DE 14 MPA (2000 PSI)	M3	0,60	$ 890.152,00	$ 890.152,00	$ 534.091,00
	11,10	ZAPATAS DE 1.00 X 1.00 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	M3	3,60	$ 1.020.946,00	$ 1.020.946,00	$ 3.675.406,00
	11,11	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	36,20	$ 124.557,00	$ 124.557,00	$ 4.508.963,00
	11,12	ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA CIMENTACIÓN	KG	856,20	$ 9.658,00	$ 9.658,00	$ 8.269.180,00
	11,13	SOBRECIMIENTO IMPERMEABILIZADO 3 HILADAS EN BLOQUE MACIZO DE CONCRETO DE 0.10M X 0.20M X 0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4	ML	40,00	$ 40.066,00	$ 40.066,00	$ 1.602.640,00
ESTRUCTURAS							
	11,14	COLUMNAS DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	40,00	$ 135.860,00	$ 135.860,00	$ 5.434.400,00
	11,15	VIGA SUPERIOR DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	21,60	$ 135.759,00	$ 135.759,00	$ 2.932.394,00
	11,16	ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA ESTRUCTURAS	KG	1.241,80	$ 9.658,00	$ 9.658,00	$ 11.993.304,00
	11,17	RAMPA DE ACCESO EN CONCRETO DE 3000 PSI(PLANTILLA CON MALLA ELECTROSOLDADA E=0.08 Y VIGAS 0.15 MTS X 0.20 MTS) . REF 4 D 3/8" Y ESTRIBOS 1/4" @ 0.25 MTS	M2	18,00	$ 157.726,00	$ 157.726,00	$ 2.839.068,00
ESTRUCTURA - CUBIERTA							
	11.18	CUBIERTA TIPO SANDWICH 18 MM EN ACERO LAMINADO A500 GRADO C COLOR BLANCO CON AISLANTE EN POLIESTIRENO 18-20MM. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN	M2	130.40	$ 281.430,00	$ 281.430,00	$ 36.698.472,00
	11,19	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CERCHAS CON PERFILES PHR C ENCAJONADOS SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, CON SOLDADURA	KG	825,55	$ 22.867,00	$ 22.867,00	$ 18.877.852,00

		DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS					
	11,20	S/I DE CORREAS CON PERFILES PHR C SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, CON SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS	KG	417,14	$ 18.468,00	$ 18.468,00	$ 7.703.742,00
PISOS							
	11,23	PLANTILLA EN CONCRETO 3000 PSI, E= 0.10MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	98,60	$ 127.857,00	$ 127.857,00	$ 12.606.700,00
	11,24	S/I DE PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 0.50X0.50 MTS COLOR BLANCA O BEIGE	M2	98,60	$ 163.779,00	$ 163.779,00	$ 16.148.609,00
	11,25	GUARDAESCOBA EN CERAMICA H=0.10 MTS	ML	12,00	$ 35.593,00	$ 35.593,00	$ 427.116,00
PINTURA COCINA EXISTENTE							
	11,26	REMOCION DE PINTURA EXISTENTE EN MAL ESTADO	M2	124,30	$ 5.611,00	$ 5.611,00	$ 697.447,00
	11,27	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	124,30	$ 21.227,00	$ 21.227,00	$ 2.638.516,00
Subtotal							$ 156.558.700,00
12. MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL COMEDOR COCINA DE LA I.E EL CASTILLO - MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO							
	12,01	DEMOLICIÓN DE MESON EN CONCRETO E= 0.10 MTS DE CONCRETO Y SOPORTE EN BLOQUE INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	Und	1,00	$ 196.292,00	$ 196.292,00	$ 196.292,00
	12,02	DEMOLICIÓN DE PISOS EN MAL ESTADO E=0,10 CM, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES	M2	75,00	$ 21.455,00	$ 21.455,00	$ 1.609.125,00
	12,03	REMOCION DE PINTURA EXISTENTE EN MAL ESTADO	M2	70,70	$ 5.611,00	$ 5.611,00	$ 396.698,00
	12,04	PLANTILLA EN CONCRETO 3000 PSI, E= 0.10MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	75,00	$ 127.857,00	$ 127.857,00	$ 9.589.275,00
	12,05	S/I DE PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 0.50X0.50 MTS COLOR BLANCA O BEIGE	M2	75,00	$ 163.779,00	$ 163.779,00	$ 12.283.425,00
	12,06	GUARDAESCOBA EN CERAMICA H=0.10 MTS	ML	48,38	$ 35.593,00	$ 35.593,00	$ 1.721.989,00
	12,07	MANTENIMIENTO DE CORREAS METALICAS INCLUYE, PULIDA CON LIJA, ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE	ML	41,60	$ 11.404,00	$ 11.404,00	$ 474.406,00
	12,08	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	70,70	$ 21.227,00	$ 21.227,00	$ 1.500.749,00
Subtotal							$ 27.771.959,00
13. MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL COMEDOR COCINA DE LA I.E SAN SIMÓN SEDE SAGRADO CORAZON DE JESÚS - MUNICIPIO SAN ANDRES DE SOTAVENTO							
	13,01	DEMOLICIÓN DE PISOS EN MAL ESTADO E=0,10 CM, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES	M2	48,00	$ 21.455,00	$ 21.455,00	$ 1.029.840,00
	13,02	DESMONTE CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO INCLUYE ENTRAMADO EN CERCHAS METALICAS	M2	48,00	$ 21.256,00	$ 21.256,00	$ 1.020.288,00
	13,03	S/I DE CORREAS CON PERFILES PHR C SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, CON SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS	KG	171,40	$ 18.469,00	$ 18.469,00	$ 3.165.587,00
	13,04	CUBIERTA TIPO SANDWICH 18 MM EN ACERO LAMINADO A500 GRADO C COLOR BLANCO CON AISLANTE EN POLIESTIRENO 18-20MM. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN	M2	48,00	$ 281.430,00	$ 281.430,00	$ 13.508.640,00
	13,05	PLANTILLA EN CONCRETO 3000 PSI, E= 0.10MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	48,00	$ 127.857,00	$ 127.857,00	$ 6.137.136,00
	13,06	S/I DE PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 0.50X0.50 MTS COLOR BLANCA O BEIGE	M2	48,00	$ 163.779,00	$ 163.779,00	$ 7.861.392,00
	13,07	GUARDAESCOBA EN CERAMICA H=0.10 MTS	ML	47,00	$ 35.593,00	$ 35.593,00	$ 1.672.871,00
	13,08	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	57,80	$ 21.227,00	$ 21.227,00	$ 1.226.921,00
Subtotal							$ 35.622.675,00
14. MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL COMEDOR COCINA DE LA I.E EL EBANO - MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS							
	14,01	REMOCION DE PINTURA EXISTENTE EN MAL ESTADO	M2	46,46	$ 5.611,00	$ 5.611,00	$ 260.687,00

	14,02	DEMOLICIÓN DE PISOS EN TABLON ROJO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES	M2	80,96	$ 21.455,00	$ 21.455,00	$ 1.736.997,00
	14,03	S/I DE PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 0.50X0.50 MTS COLOR BLANCA O BEIGE	M2	80,96	$ 163.779,00	$ 163.779,00	$ 13.259.548,00
	14,04	IMPERMEABILZANTE A DOS MANOS QUE ACTUE COMO REPARADOR EN MURO EN MAL ESTADO POR HUMEDAD INCLUYE REMOSION DE PINTURA, ESTUCO Y/O PAÑETE, MOHO Y HONGOS	M2	28,30	$ 31.021,00	$ 31.021,00	$ 877.894,00
	14,05	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	46,46	$ 21.455,00	$ 21.455,00	$ 996.799,00
	14,06	MANTENIMIENTO DE CORREAS METALICAS INCLUYE, PULIDA CON LIJA, ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE	ML	40,40	$ 11.404,00	$ 11.404,00	$ 460.722,00
	14,07	DESMONTE DE VENTILADORES EN MAL ESTADO	UND	4,00	$ 21.865,00	$ 21.865,00	$ 87.460,00
	14,08	SALIDA PARA VENTILADOR DE TECHO (incluye control, Tubería PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG,cable encauchetado 3x14AWG, Ventilador de Techo residencial)	UND	4,00	$ 1.246.819,00	$ 1.246.819,00	$ 4.987.276,00
Subtotal							**$ 22.667.383,00**
						SUBTOTAL OBRAS CIVILES	**$ 3.640.023.169,00**

DOTACIÓN DE MENAJE PARA COMEDOR - COCINA DE LAS DIFERENTES SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

15. SUMINISTRO PARA COCINAS Y COMEDORES (I.E MARCELIANO POLO, CERETE - I.E SANTA TERESITA SEDE GNRAL SANTANDER, SAN PELAYO - I.E MARCO FIDEL SUAREZ; CIENAGA DE ORO - I.E SAN JOSE DE MOÑITOS - I.E PLAZA BONITA SEDE NUEVA EL EBANO, PLANETA RICA. - I.E JUNIN, TIERRALTA - I.E EL EBANO, LOS CORDOBAS - I.E SAN SIMÓN SEDE SAGRADO CORAZON DE JESÚS, SAN ANDRES DE SOTAVENTO - I.E EL CASTILLO, SAN BERNARDO DEL VIENTO - DE LA I.E SAN JOSE CANALETE)							
	15,01	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA COCINAS	UND	10,00	$30.264.373,00	$ 30.264.373,00	$ 302.643.730,00
	15,02	SUMINISTRO DE DOTACION MENAJE COCINA Y COMEDORES	UND	10,00	$ 5.004.363,00	$ 5.004.363,00	$ 50.043.630,00
	15,03	SUMINISTRO DE MESAS Y SILLAS PARA COMEDORES	UND	10,00	$ 6.843.299,00	$ 6.843.299,00	$ 68.432.990,00
	15,04	SUMINISTRO DE CONTENEDORES DE BASURA	UND	10,00	$ 659.785,00	$ 659.785,00	$ 6.597.850,00
						SUBTOTAL SUMINISTROS	**$ 427.718.200,00**

SUBTOTAL PROYECTO		**$ 4.067.741.369,00**
TOTAL COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS		**$ 4.067.741.369,00**
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE GESTION INTEGRAL EN OBRA - PGIO		**$ 67.314.706,00**
VALOR TOTAL PROYECTO OBRA + SUMINISTRO		**$ 4.135.056.075,00**

VALOR TOTAL EN LETRAS:	**CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE**			
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCION**			**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACION**	**A=**		24%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**		1%
NOTA 4: El reconocimiento económico de los requerimientos ambientales exigidos por las autoridades ambientales, y/o sociales que son de obligatorio cumplimiento, serán reconocidos a cargo de reembolso de gastos (afectados por un % de administración).(Ajustar de acuerdo al proyecto)	**UTILIDAD**	**U=**		5%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**		30%

Tabla 1. Presupuesto oficial de Obra

3 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA.

NÚMERO DEL CONTRATO	SI-LP-002-2024
ENTIDAD CONTRATANTE	DEPARTAMETNO DE CÓRDOBA
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12 DE FEBRERO DE 2024
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002. NIT N°: 901.915.670-0 Rep. Legal MARIA ISABEL QUINTERO GONZÁLEZ. C.C. N°: 1.010.007.099
NIT	901915670-0
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ISABEL QUINTERO GONZALEZ
VALOR DEL CONTRATO	CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 4.135.056.075,00).
CDP:	4625 DE 11 DE FEBRERO DE 2025
INTERVENTORÍA	ANTICA S.A.S BIC
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	OCHO (8) MESES
FECHA DE INICIO	17 DE MARZO DE 2025
PLAZO FINAL	OCHO (8) MESES
FECHA TERMINACIÓN FINAL	17 DE NOVIEMBRE DE 2025

Tabla 2. Información general contrato de obra

ENTIDAD ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	NB-100369947
		ANEXO No.	0
FECHA DE EXPEDICIÓN PÓLIZA CONTRATO:	13 DE FEBRERO DE 2025	APROBACIÓN DE PÓLIZA	

AMPARO	VIGENCIA A FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/02/2025	12/04/2024	$ 413.513.491,50
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	12/02/2025	12/04/2024	$ 1.240.540.474,50
PRESTACIONES SOCIALES	12/02/2025	12/10/2028	$ 413.513.491,50
ESTABILIDAD DE LA OBRA	12/02/2025	12/10/2030	$ 398.655.004,10

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	12/02/2025	12/04/2026	$ 41.226.771,00

ENTIDAD ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	NB - 100095688
		ANEXO No.	0
FECHA DE EXPEDICIÓN PÓLIZA CONTRATO:	13 DE FEBRERO DE 2025	APROBACIÓN DE PÓLIZA	

AMPARO	VIGENCIA A FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
AMPARO BÁSICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	12/02/2025	12/10/2025	$ 569.400.000,00
CONTRATISTAS Y SUNCONTRATISTAS	12/02/2025	12/10/2025	$ 569.400.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	12/02/2025	12/10/2025	$ 569.400.000,00
PATRONAL	12/02/2025	12/10/2025	$ 569.400.000,00

ENTIDAD ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	NB-100369947
		ANEXO No.	3
FECHA DE EXPEDICIÓN PÓLIZA CONTRATO:	2 DE ABRIL DE 2025	APROBACIÓN DE PÓLIZA	

AMPARO	VIGENCIA A FECHA DE ACTA DE INICIO		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/03/2025	17/05/2026	$ 413.513.491,50
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	17/03/2025	17/05/2026	$ 1.240.540.474,50

PRESTACIONES SOCIALES	17/03/2025	17/11/2028	$ 413.513.491,50
ESTABILIDAD DE LA OBRA	17/03/2025	17/11/2030	$ 398.655.004,10
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	17/03/2025	17/05/2026	$ 41.226.771,00

ENTIDAD ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	NB-100095688
		ANEXO No.	3
FECHA DE EXPEDICIÓN PÓLIZA CONTRATO:	13 DE FEBRERO DE 2025	APROBACIÓN DE PÓLIZA	

AMPARO	VIGENCIA A FECHA DE ACTA DE INICIO		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
AMPARO BÁSICO	13/03/2025	17/11/2025	$ 569.400.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	13/03/2025	17/11/2025	$ 569.400.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	13/03/2025	17/11/2025	$ 569.400.000,00
PATRONAL	13/03/2025	17/11/2025	$ 569.400.000,00

Tabla 3. Seguimiento a garantías contractuales del contrato de obra

- CONTROL DE GARANTIAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA.
  VER ANEXO N°1

ACTAS SUSCRITAS PARA EL CONTRATO DE OBRA

TIPO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD	14 DE MARZO DE 2025
CONFORMACIÓN DE LA VEEDURÍA DEL PROYECTO:	14 DE MARZO DE 2025
ACTA DE INICIO	17 DE MARZO DE 2025

Tabla 4. Actas del contrato

- ACTAS DEL CONTRATO DE OBRA.
  VER ANEXO N°2

3.2 DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Para el mes del que trata el presente informe, se lograron realizar las siguientes actividades:

- LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO: 312.00 M2.
- ADECUACIÓN Y NIVELACIÓN DE TERRENO: 312.00 M2.
- S/I CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE, H=2.10 MTS PARA OBRAS: 74.00 ML.
- EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS DE 1.00 X 1.00 MTS: 28.50 M3.
- EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0.30 X 0.30 MTS: 103.1 ML.
- REEMPLAZO O MEJORAMIENTO DEL TERRENO DEBAJO DE ZAPATAS EN PIEDRA RAJON - MATERIAL SELECCIONADO (80/20) (EXCAVACIONES Y RELLENO): 9.50 M3.
- RELLENO DEL AREA CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO: 116.69 M3.
- CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE 10 KM (EXCAVACIONES Y RELLENO): 47.1 M3.
- SOLADO EN CONCRETO E = 0.05 MTS DE 14 MPA (2000 PSI) (CIMENTACION): 0.95 M3
- ZAPATAS DE 1.00 X 1.00 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI): 5.70 M3.
- VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI): 59.40 ML.
- ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA CIMENTACIÓN: 1033.49 KG.
- COLUMNAS DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI): 79.95 ML.
- VIGA SUPERIOR DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI): 35,00 ML.
- ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA ESTRUCTURAS: 2620.59 KG
- ALFAJIAS DE A=0.21 E=0.07 CON 2 Ø 3/8" Y Ø 1/4" @ 0.20 MTS EN CONCRETO DE 17.5Mpa (2500 PSI): 27.23 ML.
- LEVANTE DE MURO EN BLOQUE SEMIESTRUCTURAL DE 0.12MTS X 0.20MTS X 0.40MTS CON PEGA DE MORTERO 1:4: 222.51 M2.
- CUBIERTA TIPO SANDWICH 18 MM EN ACERO LAMINADO A500 GRADO C COLOR BLANCO CON AISLANTE EN POLIESTIRENO 18-20MM. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN: 321.60 M2.
- SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CERCHAS CON PERFILES PHR C ENCAJONADOS SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, CON SOLDADURA DE

6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS: 1324.96 KG.
- S/I DE CORREAS CON PERFILES PHR C SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, CON SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS: 810.19 K6.
- LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL DE TUBERIA PRESION: 82,00 ML.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 1/2" PVC RDE 9, PARA SOLDAR: 35.00 ML.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 3/4" PVC, RDE 21, PARA SOLDAR: 18.00 ML.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 1" PVC, RDE 21, PARA SOLDAR: 29.00 ML.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO: 14.00 UN.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE UNIÓN MACHO GALVANIZADO 1" L=50CM: 6,00 UN.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE UNIÓN MACHO GALVANIZADO 1" L=15CM: 8.00 UN.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION UNIVERSAL GALVANIZADA: 2.00 UN.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO GALVANIZADO 1": 2.00 UN.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE GALVANIZADA 1": 4.00 UN.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN GALVANIZADO 1": 2.00 UN.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA CHECK VERTICAL BRONCE 1": 4.00 UN.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE CIERRE RÁPIDO METÁLICA 1": 10.00 UN.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE REGISTRO 1/2", INCLUYE TAPA REGISTRO 15X15CM: 35.00 UN.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE REGISTRO 1", INCLUYE TAPA REGISTRO 15X15CM: 15.00 UN.
- LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL DE TUBERIA SANITARIA: 117.00 ML.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 2" PVC, PARA SOLDAR: 36.00 ML.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 3" PVC, PARA SOLDAR: 15.00 ML.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 4" PVC, PARA SOLDAR: 38.00 ML.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA VENTILACION 2" PVC, PARA SOLDAR: 24.00 ML.
- PUNTO SANITARIO 2": 28.00 UN.
- PUNTO SANITARIO 4": 2.00 UN.

- CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION 60X60X100 CM: 6.00 UN.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TANQUE: 3.00 UN.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS: 6.00 UN.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS: 6.00 UN.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE PISO PARA DESAGUE: 27.00 UN.
- EXCAVACIÓN MANUAL PARA TANQUE: 31.55 M3.
- REEMPLAZO O MEJORAMIENTO DEL TERRENO PARA SUPERFICIE DE APOYO DE TANQUE EN PIEDRA RAJON - MATERIAL SELECCIONADO (80/20) (TANQUE ELEVADO AGUA POTABLE): 5.78 M3.
- CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE 10 KM (TANQUE AGUA POTABLE): 41.02 M3-KM.
- CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) PARA FONDO TANQUE INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO: 2.31 M3.
- S/I CINTA PVC O-22: 19.60 ML.
- CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) PARA TAPA Y MUROS DE TANQUE INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO: 7.80 M3.
- ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA PARA ESTRUCTURA TANQUE: 612.33 KG.
- SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO (incluye interruptor, Tubería PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG): 8.00 UN.
- SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE (incluye interruptor, Tubería PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG): 2.00 UN.
- SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA Y CFCI, (incluye TOMA DOBLE 15A - 125V, Tubería PVC SCH40, Tubería EMT, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG) TD1-C-2-C4-C6-C8-10-12-14-16: 24.00 UN.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO BIFÁSICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y PUERTA DE 20 CIRCUITOS. (incluye Protecciones, Tubería PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas): 4.00 UN.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA PUESTA A TIERRA (incluye Tubería PVC, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°8AWG): 1.00 UN.
- SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA EN Cu 2xN°8F + 1xN°8N (incluye Tubería PVC, cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas): 4.17 ML
- SALIDA PARA TV (incluye TOMA TV, Tubería PVC SCH40, Tubería EMT, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Coaxial RG-6): 2.00 UN.
- S/I DE PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 0.50X0.50 MTS COLOR BLANCA O BEIGE: 98.60 M2.

3.3 INFORME DE AVANCE

3.3.1 AVANCE DE OBRA PROGRAMADA, EJECUTADA Y ACUMULADA DEL CONTRATO

Durante el periodo comprendido entre la semana N°23 y la semana N°26 del presente informe mensual, el seguimiento al avance de obra programado y ejecutado arrojó los siguientes resultados:

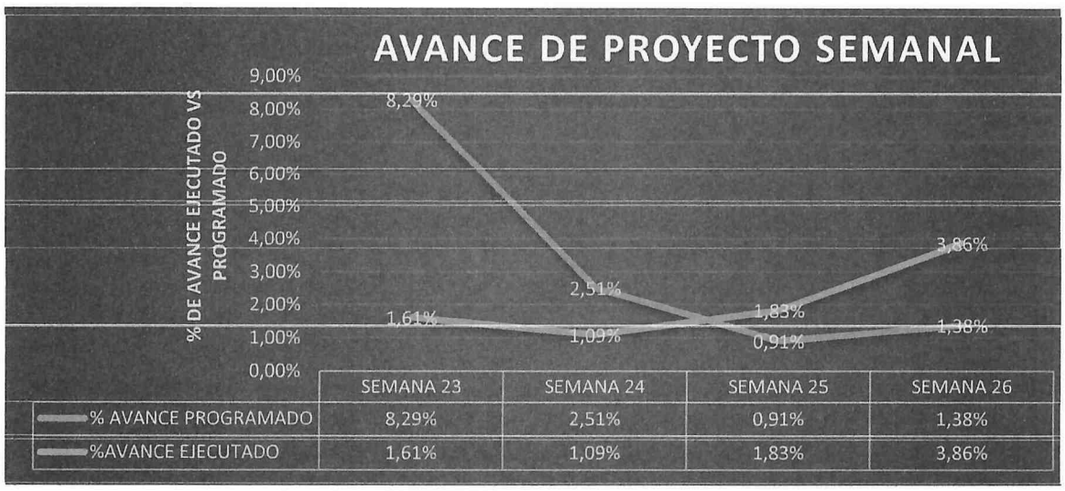


Ilustración 24. Porcentaje (%) de avance físico semanal del proyecto

AVANCE	SEMANA 23	SEMANA 24	SEMANA 25	SEMANA 26	ACUMULADO
AVANCE PROGRAMADO (%)	8,29%	2,51%	0,91%	1,38%	13,09%
AVANCE EJECUTADO (%)	1,61%	1.09%	1,83%	3,86%	8,39%

Tabla 5. Avance programado vs Avance ejecutado

De acuerdo con la tabla de avance anterior, para este sexto mes de ejecución, el proyecto registra un atraso del 4.7% respecto a la programación establecida.

A continuación, se presenta el avance de Obra acumulado por Institución Educativa en cada Municipio:

INTERVENTORÍA A COMEDORES ESCOLARES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA									
N°	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	MUNICIPIO	INTERVENCIÓN	AREA A INTERVENIR(M2)	% DE AVANCE EJECUTADO	VALOR DE AVANCE EJECUTADO			
1	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCELIANO POLO	CERETÉ	CONSTRUCCIÓN NUEVA	312,00	87,65%	$ 539.693.509,07			
2	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESITA SEDE GENERAL SANTANDER	SAN PELAYO		312,00	75,60%	$ 465.497.196,65			
3	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ	CIENAGA DE ORO		312,00	86,00%	$ 529.533.848,04			
4	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE MOÑITOS SEDE PRINCIPAL	MONITOS		312,00	52,00%	$ 320.183.256,95			
5	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUNÍN	TIERRALTA		312,00	20,00%	$ 123.147.406,52			
6	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PLAZA BONITA	PLANETA RICA		312,00	10,25%	$ 63.113.045,84			
7	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSÉ DE CANALETE	CANALETE	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN	102,00	81,53%	$ 167.994.772,10			
8	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CASTILLO	SAN BERNARDO DEL VIENTO		75,00	0,00%	$ -			
9	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN SIMÓN SEDE SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO		48,00	0,00%	$ -			
10	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ÉBANO	LOS CÓRDOBAS		81,00	7,00%	$ 5.051.947,15	% de Avance Total de la obra	Fecha de Corte	Informe Semanal N°
TOTAL AREA A INTERVENIR EN EL PROYECTO				2178,00	———	$ 2.214.214.982,32	58,95%	domingo, 14 de septiembre de 2025	26

Ilustración 25. Avance de Obra por Institución Educativa

3.3.2 INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Durante el periodo correspondiente al presente informe mensual, esta Interventoría elaboró y remitió a la Supervisión del Contrato y a la Secretaría de Infraestructura Departamental un total de cuatro (4) informes semanales. Estos documentos, enviados vía correo electrónico, detallaron el seguimiento de todas las actividades de construcción ejecutadas durante cada semana comprendida en el periodo.

En cada informe semanal se plasmó el avance físico de las obras, las novedades relevantes, el estado de cumplimiento del cronograma, el control de calidad, los aspectos de seguridad y salud en el trabajo, y cualquier otra información pertinente para el adecuado seguimiento del proyecto en cada uno de los frentes en intervención.

- INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA
  VER ANEXO N°3

3.3.3 ACTAS DE COMITÉS DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA

En el marco del seguimiento y control del programa de obra, se llevaron a cabo tres (3) comités técnicos de obra realizados en la oficina de esta interventoría. En estos espacios, conjunto con el contratista, se abordaron temas relevantes para el desarrollo del proyecto, incluyendo el seguimiento, control y calidad de la ejecución de las actividades en curso, la necesidad de un plan de acción que permita mitigar los atrasos presentados en obra y suministros de materiales en obra.

- COMITES Y VISITAS
  VER ANEXO N°4

3.4 CONTROL DIARIO DE EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA

Durante el periodo objeto del presente informe, se ha verificado de manera constante la presencia y operatividad de los equipos mínimos requeridos en el anexo técnico del contratista en los diferentes frentes de trabajo. Se constata que el contratista ha mantenido en obra los equipos esenciales para llevar a cabo todas las actividades pertinentes, tales como el vibrador de aguja para concreto, el compactador tipo rana, el mezclador de concreto y el equipo de oxicorte.

Es importante destacar que, dada la naturaleza del proyecto y su distribución en diez (10) instituciones educativas, estos equipos han mantenido una dinámica de rotación entre las ocho (8) diferentes sedes donde se desarrollan actividades actualmente. Para garantizar la continuidad y optimización de los trabajos sin generar retrasos por la disponibilidad de los equipos, los responsables de cada frente siguen la coordinación planeada inicialmente para la programación y utilización de los mismos, acordando horarios que permiten su uso oportuno cada vez que se requiere en las diferentes tareas constructivas.

- EQUIPOS DE CONTRATISTA DE OBRA
  VER ANEXO N°5

3.5 CONTROL DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

CARGO	NOMBRE	DEDICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ISABEL QUINTERO GONZÁLEZ	100%
DIRECTOR DE OBRA	KAMAL AUGUSTO BEJARANO FERNANDEZ	50%
RESIDENTE DE OBRA 1	ANDY MIGUEL AGÁMEZ GENEY	100%
RESIDENTE DE OBRA 2	RICARDO JAVIER CASTRO ESCOBAR	100%
RESIDENTE DE OBRA 3	JOSE CARLOS ALVAREZ ORTEGA	100%
INGENIERO ELÉCTRICO	HÉCTOR RAMÍREZ LIBREROS	50%
INGENIERO SANITARIO	SHARON MELISA CORRALES MARTINEZ	50%
SECRETARIO	JOHAN VERGARA	100%

Tabla 6. Relación de Personal del Contratista de Obra

Durante el periodo de este informe, se observó que los profesionales designados por el contratista para la ejecución del proyecto demostraron la dedicación requerida y atendieron de manera diligente las responsabilidades inherentes a sus respectivos cargos.

Por su parte, el personal de obra, mantuvo la conformación de las cuadrillas de trabajo en cada uno de los frentes activos, en concordancia con la planificación establecida para las diferentes actividades constructivas. Adicionalmente, se destaca la disposición del personal técnico y administrativo del contratista para atender las solicitudes de información y coordinación por parte de la Interventoría, lo cual ha facilitado el seguimiento y la resolución de aspectos técnicos y operativos del proyecto.

3.6 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

Contrato de Obra de N° SI-LP-002-2024 cuyo objeto es *MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.* Valor del contrato correspondiente a CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 4.135.056.075,00). El contrato cuenta con un anticipo del 30%.

FORMA DE PAGO:

- ANTICÍPO: Para este proyecto, a la entidad ha previsto entregar al contratista un anticipo del 30% sobre el valor total del contrato. Este porcentaje se determinó con el objetivo de generar un apalancamiento financiero al contratista, a fin de que las obras se ejecuten oportunamente y sin contratiempos. PARÁGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO: Para el manejo de los recursos entregado a título de anticipo, de conformidad con lo previsto en la Ley 1474 de 2011, el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable, con el fin de garantizar la aplicación de los recursos a la ejecución del contrato.

- El Departamento de Córdoba cancelará el valor del presente contrato de la siguiente manera: 1.- PAGOS PARCIALES, de hasta el 90% del valor del contrato, mediante actas parciales de ejecución, con un avance mínimo del 30% de ejecución la primera acta; no obstante, este requisito no será aplicable a los siguientes pagos parciales, pues éstos se realizarán conforme al porcentaje de ejecución respectivo. 2.- PAGO FINAL, equivalente al 10% del valor del contrato, que será pagado una vez se haya cumplido a cabalidad el objeto contractual.

A continuación, se relacionan los desembolsos que se le han realizado al contratista hasta la fecha de corte del presente informe:

VALOR DEL CONTRATO SI-LP-002-2024		$				4.135.056.075,00
AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA - COMEDORES INSTITUCIONALES DE CÓRDOBA						
DESEMBOLSOS				AMORTIZACIONES		
#	CONCEPTO	VALOR	% DE AVANCE	% DE AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	VALOR AMORTIZADO	VALOR DEL ACTA AMORTIZADA (NETO PAGADO)
1	ANTICIPO	$ 1.240.516.822,00	30,00%	N.A	$ -	$ 1.240.516.822,00
2	ACTA PARCIAL 1	$ 1.261.079.816,77	30,50%	30,00%	$ 378.323.945,03	$ 882.755.871,74
3	ACTA PARCIAL 2	$ 510.223.260,83	12,34%	30,00%	$ 153.066.978,25	$ 357.156.282,58
TOTALES		$ 1.771.303.077,60	42,84%		$ 531.390.923,28	$ 1.239.912.154,32

Ilustración 26. Relación de desembolsos al contratista

3.7 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

3.7.1 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO (CERETÉ - CIÉNAGA DE ORO - SAN PELAYO)

A continuación, se presenta tabla de estado del tiempo durante el periodo del presente informe:

ESTADO DEL TIEMPO (CERETÉ – CIÉNAGA DE ORO – SAN PELAYO)	
FECHA	DESCRIPCIÓN
18 DE AGOSTO DE 2025	MAÑANA SOLEADO/ TARDE SOLEADO
19 DE AGOSTO DE 2025	MAÑANA SOLEADO/ TARDE SOLEADO
20 DE AGOSTO DE 2025	MAÑANA LLUVIOSO / TARDE LLUVIOSO
21 DE AGOSTO DE 2025	MAÑANA SOLEADO/ TARDE SOLEADO
22 DE AGOSTO DE 2025	MAÑANA LLUVIOSO/ TARDE LLUVIOSO
23 DE AGOSTO DE 2025	MAÑANA SOLEADO/ TARDE SOLEADO
24 DE AGOSTO DE 2025	MAÑANA SOLEADO/ TARDE SOLEADO
25 DE AGOSTO DE 2025	MAÑANA LLUVIOSO/ TARDE LLUVIOSO
26 DE AGOSTO DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE LLUVIOSO
27 DE AGOSTO DE 2025	MAÑANA LLUVIOSO / TARDE LLUVIOSO
28 DE AGOSTO DE 2025	MAÑANA SOLEADO/ TARDE SOLEADO
29 DE AGOSTO DE 2025	MAÑANA LLUVIOSO / TARDE LLUVIOSO
30 DE AGOSTO DE 2025	MAÑANA SOLEADO/ TARDE SOLEADO
31 DE AGOSTO DE 2025	MAÑANA SOLEADO/ TARDE SOLEADO
01 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA LLUVIOSO / TARDE LLUVIOSO
02 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA SOLEADO/ TARDE SOLEADO
03 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA NUBLADO / TARDE SOLEADO
04 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA NUBLADO / TARDE LLUVIOSO
05 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA LLUVIOSO / TARDE LLUVIOSO
06 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO
07 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA SOLEADO/ TARDE NUBLADO
08 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA LLUVIOSO / TARDE SOLEADO
09 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO
10 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA NUBLADO / TARDE SOLEADO
11 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO
12 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA SOLEADO/ TARDE SOLEADO
13 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA SOLEADO/ TARDE SOLEADO
14 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA NUBLEADO/ TARDE SOLEADO

ESTADO DEL TIEMPO (CERETÉ – CIÉNAGA DE ORO – SAN PELAYO)	
FECHA	DESCRIPCIÓN
15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO
16 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA LLUVIOSO / TARDE SOLEADO
17 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA LLUVIOSO/ TARDE SOLEADO

Tabla 7. Estado del tiempo; Cereté, Ciénaga de Oro y San Pelayo

Durante el periodo cubierto por el presente informe, las condiciones meteorológicas presentaron variaciones que impactaron el normal desarrollo de las actividades constructivas. Se registraron un total de doce (12) días con precipitaciones pluviales en estos tres frentes del proyecto.

3.7.2 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO (MOÑITOS)

A continuación, se presenta tabla de estado del tiempo durante el periodo del presente informe:

ESTADO DEL TIEMPO (MOÑITOS)	
FECHA	DESCRIPCIÓN
18 DE AGOSTO DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO
19 DE AGOSTO DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO
20 DE AGOSTO DE 2025	MAÑANA LLUVIOSO / TARDE SOLEADO
21 DE AGOSTO DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO
22 DE AGOSTO DE 2025	MAÑANA LLUVIOSO / TARDE LLUVIOSO
23 DE AGOSTO DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO
24 DE AGOSTO DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO
25 DE AGOSTO DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO
26 DE AGOSTO DE 2025	MAÑANA LLUVIOSO / TARDE LLUVIOSO
27 DE AGOSTO DE 2025	MAÑANA LLUVIOSO / TARDE NUBLEADO
28 DE AGOSTO DE 2025	MAÑANA SOLEADO/ TARDE SOLEADO
29 DE AGOSTO DE 2025	MAÑANA LLUVIOSO / TARDE LLUVIOSO
30 DE AGOSTO DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO
31 DE AGOSTO DE 2025	MAÑANA LLUVIOSO / TARDE NUBLEADO
01 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA LLUVIOSO / TARDE LLUVIOSO
02 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO
03 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO
04 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO
05 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO
06 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO
07 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO
08 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO
09 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO
10 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO
11 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA LLUVIOSO / TARDE SOLEADO
12 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO
13 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE LLUVIOSO
14 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO
15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO

ESTADO DEL TIEMPO (MOÑITOS)	
FECHA	DESCRIPCIÓN
16 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO
17 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO

Tabla 8. Estado del tiempo Moñitos.

Durante el periodo cubierto por el presente informe, las condiciones meteorológicas presentaron variaciones que impactaron el normal desarrollo de las actividades constructivas. Se registraron un total de nueve (9) días con precipitaciones pluviales en este frente del proyecto.

3.7.3 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO (CANALETE – LOS CÓRDOBAS)

A continuación, se presenta tabla de estado del tiempo durante el periodo del presente informe:

ESTADO DEL TIEMPO (CANALETE – LOS CÓRDOBAS)	
FECHA	DESCRIPCIÓN
18 DE AGOSTO DE 2025	MAÑANA LLUVIOSO / TARDE SOLEADO
19 DE AGOSTO DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO
20 DE AGOSTO DE 2025	MAÑANA LLUVIOSO / TARDE NUBLADO
21 DE AGOSTO DE 2025	MAÑANA LLUVIOSO / TARDE SOLEADO
22 DE AGOSTO DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO
23 DE AGOSTO DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO
24 DE AGOSTO DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO
25 DE AGOSTO DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE LLUVIOSO
26 DE AGOSTO DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO
27 DE AGOSTO DE 2025	MAÑANA LLUVIOSO / TARDE LLUVIOSO
28 DE AGOSTO DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO
29 DE AGOSTO DE 2025	MAÑANA LLUVIOSO / TARDE LLUVIOSO
30 DE AGOSTO DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO
31 DE AGOSTO DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO
01 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA NUBLADO / TARDE LLUVIOSO
02 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO
03 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO
04 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO
05 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA LLUVIOSO / TARDE LLUVIOSO
06 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA LLUVIOSO / TARDE LLUVIOSO
07 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO
08 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO
09 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO
10 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO
11 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO
12 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO
13 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO
14 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA LLUVIOSO / TARDE SOLEADO

ESTADO DEL TIEMPO (CANALETE – LOS CÓRDOBAS)	
FECHA	DESCRIPCIÓN
15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO
16 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO
17 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO

Tabla 9. Estado del tiempo (Canalete)

Durante el periodo cubierto por el presente informe, las condiciones meteorológicas presentaron variaciones que impactaron el normal desarrollo de las actividades constructivas. Se registraron un total de diez (10) días con precipitaciones pluviales en este frente del proyecto.

3.7.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO (TIERRALTA – PLANETA RICA)

A continuación, se presenta tabla de estado del tiempo durante el periodo del presente informe:

ESTADO DEL TIEMPO (TIERRALTA – PLANETA RICA)	
FECHA	DESCRIPCIÓN
18 DE AGOSTO DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO
19 DE AGOSTO DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO
20 DE AGOSTO DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO
21 DE AGOSTO DE 2025	MAÑANA SOLEADO/ TARDE SOLEADO
22 DE AGOSTO DE 2025	MAÑANA LLUVIOSO / TARDE SOLEADO
23 DE AGOSTO DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO
24 DE AGOSTO DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO
25 DE AGOSTO DE 2025	MAÑANA LLUVIOSO / TARDE LLUVIOSO
26 DE AGOSTO DE 2025	MAÑANA SOLEADO/ TARDE SOLEADO
27 DE AGOSTO DE 2025	MAÑANA LLUVIOSO/ TARDELLUVIOSO
28 DE AGOSTO DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO
29 DE AGOSTO DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE LLUVIOSO
30 DE AGOSTO DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO
31 DE AGOSTO DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO
01 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA LLUVIOSO / TARDE SOLEADO
02 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA SOLEADO/ TARDE SOLEADO
03 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO
04 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA SOLEADO/ TARDE SOLEADO
05 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA LLUVIOSO / TARDE SOLEADO
06 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA SOLEADO/ TARDE SOLEADO
07 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA SOLEADO/ TARDE SOLEADO
08 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA SOLEADO/ TARDE SOLEADO
09 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO
10 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO
11 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE LLUVIOSO
12 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO
13 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA SOLEADO/ TARDE SOLEADO
14 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA LLUVIOSO / TARDE LLUVIOSO
15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO

ESTADO DEL TIEMPO (TIERRALTA – PLANETA RICA)	
FECHA	DESCRIPCIÓN
16 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO
17 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MAÑANA SOLEADO/ TARDE SOLEADO

Tabla 11. Estado del tiempo Tierralta.

Durante el periodo cubierto por el presente informe, las condiciones meteorológicas presentaron variaciones que impactaron el normal desarrollo de las actividades constructivas. Se registraron un total de ocho (8) días con precipitaciones pluviales en este frente del proyecto.

- REGISTRO IDEAM
  VER ANEXO N°6

3.8 INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO DEL CONTRATISTA

En relación con el anticipo estipulado para el presente Contrato de Obra, se informa que se tramitó una cuenta por valor de MIL DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($1.240.516.822,00), lo que corresponde al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato.

De este monto, el contratista recibió un desembolso final de $1.178.490.981,50, luego de la aplicación de una retención por contribución especial de obra pública correspondiente a un valor de $62.025.841,00, que equivale al 5% del valor del anticipo.

Del valor desembolsado, se ha verificado que el contratista destinó el 22.50% a la adquisición de materiales de construcción, el 25% al transporte de dichos materiales, el 45% a la subcontratación de obra, y el 7.50% restante como avance para el pago de mano de obra.

La Interventoría verificó la correcta inversión y el buen manejo de los recursos del anticipo en cumplimiento de las obligaciones contractuales.

- PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO
  VER ANEXO N°7

3.9 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL RESULTADO DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIOS

Durante el periodo correspondiente al presente informe mensual, se llevaron a cabo ensayos de resistencia a la compresión en probetas de concreto extraídas de los elementos estructurales fundidos en obra, específicamente de zapatas en los frentes que se aperturaron para este periodo, así como las columnas, alfajías y vigas de cimentación en cada una de las siete sedes que se encuentran en intervención.

El objetivo de estas pruebas es verificar el cumplimiento de la resistencia especificada en los diseños y garantizar la calidad estructural de las construcciones.

Los resultados detallados de estos ensayos, incluyendo las fechas de muestreo, los elementos evaluados, las resistencias obtenidas a diferentes edades (ej. 7, 14 y 28 días) y su comparación con los valores de diseño, se anexan en el presente informe.

El análisis de estos resultados es fundamental para esta Interventoría en su labor de control de calidad y para asegurar la durabilidad y seguridad de las edificaciones.

- ENSAYOS DE LABORATORIO
  VER ANEXO N°8

3.10 REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL CONTRATISTA DE OBRA POR PARTE DEL INTERVENTOR.

En cumplimiento de las labores de supervisión y control, se procedió a la revisión de los pagos de aportes a la seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF) correspondientes al personal del contratista de obra que labora en el proyecto durante el periodo evaluado.

La documentación soporte de estos pagos, proporcionada por el contratista, se adjunta al presente informe para su debida verificación y archivo.

- PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL OBRA
  VER ANEXO N°9

4 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

NÚMERO DEL CONTRATO	SI-CMA-007-2024
OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATICA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA""
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14 DE FEBRERO DE 2025
CONTRATISTA	ANTICA S.A.S BIC
NIT	901823241-9
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN PABLO BANQUEZ GONZALEZ C.C. N° 1.067.958.787 de Montería
CDP N°	4725 DE 11 DE FEBRERO DE 2025
VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($350.649.999,00).
PLAZO INICIAL	OCHO (8) MESES
FECHA DE INICIO	17 DE MARZO DE 2025
PLAZO FINAL	OCHO (8) MESES
FECHA TERMINACIÓN FINAL	17 DE NOVIEMBRE DE 2025
SUPERVISIÓN	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL - CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL

Tabla 10. Información de contrato de Interventoría

ENTIDAD ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	PÓLIZA No. CUMPLIMIENTO	CMT-100015007
		ANEXO N°	0
FECHA DE EXPEDICIÓN:	21 DE FEBRERO DE 2025	FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZA	

AMPARO	VIGENCIA A FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	14/02/2025	17/04/2024	$ 35.064.999,90
PRESTACIONES SOCIALES	14/02/2025	17/10/2028	$ 35.064.999,90
CALIDAD DEL SERVICIO	17/10/2025	17/04/2030	$ 35.064.999,90

ENTIDAD ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	PÓLIZA No. CUMPLIMIENTO	CMT-100015007
		ANEXO N°	2
FECHA DE EXPEDICIÓN:	28 DE MARZO DE 2025	FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZA	

AMPARO	VIGENCIA A FECHA DE FIRMA DEL ACTA DE INICIO		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	17/03/2025	21/05/2026	$ 35.064.999,90
PRESTACIONES SOCIALES	17/03/2025	21/11/2028	$ 35.064.999,90
CALIDAD DEL SERVICIO	21/11/2025	21/11/2030	$ 35.064.999,90

Tabla 11. Seguimiento a garantías contractuales de interventoría

- GARANTÍAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
  VER ANEXO N°10

ACTAS SUSCRITAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ACTA	FECHA SUSCRIPCIÓN
SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO Y CONFORMACIÓN DE LA VEEDURÍA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE CIENAGA DE ORO, SAN PELAYO Y CERETÉ	14 DE MARZO DE 2025
ACTA DE INICIO	17 DE MARZO DE 2025
SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO Y CONFORMACIÓN DE LA VEEDURÍA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE MOÑITOS	16 DE MAYO DE 2025
SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO Y CONFORMACIÓN DE LA VEEDURÍA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE CANALETE	19 DE MAYO DE 2025
SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO Y CONFORMACIÓN DE LA VEEDURÍA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE TIERRALTA	29 DE JULIO DE 2025
SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO Y CONFORMACIÓN DE LA VEEDURÍA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE PLANETA RICA	31 DE JULIO DE 2025
SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO Y CONFORMACIÓN DE LA VEEDURÍA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA EL ÉBANO, LOS CÓRDOBA	12 DE SEPTIEMBRE 2025

Tabla 12. Actas del Contrato de Interventoría

ACTAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
- VER ANEXO N°11

4.2 DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Durante el periodo comprendido en el presente informe, la labor de esta Interventoría se centró en el seguimiento integral de las actividades desarrolladas por el contratista de obra en el marco del Contrato N° SI-CMA-007-2024. Esta supervisión incluyó el control y verificación del avance de las actividades constructivas realizadas, tal como se detalla en el literal 3.2 "DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES" del presente documento, a través de visitas periódicas a los diferentes frentes de trabajo y la revisión de la documentación de soporte. Para el presente periodo se encuentra en ejecución 8 frentes de trabajo, estos se encuentran ubicados en las instituciones educativas de los municipios de: Ciénaga de Oro, Cereté, San Pelayo, Canalete, Moñitos, Tierralta, Los Córdobas y Planeta Rica.

De manera regular, se informó a la entidad contratante sobre el progreso de la obra mediante la elaboración y envío de informes semanales, los cuales incluyeron registros fotográficos que evidenciaron el estado de las actividades. Asimismo, se convocaron y realizaron los comités técnicos necesarios para abordar aspectos específicos del proyecto.

Esta Interventoría mantuvo una presencia activa en el proyecto, buscando identificar de manera oportuna cualquier novedad o situación que pudiera afectar el normal desarrollo del objeto contractual, para así informar de inmediato a la entidad contratante para su conocimiento y toma de decisiones.

Para este periodo en cuestión, se pudo verificar que no se presentó ninguna anomalía que pudiera afectar el desarrollo normal del proyecto. El objetivo primordial de estas acciones es garantizar un control total de la obra en todas sus etapas y asegurar el cumplimiento de los términos y condiciones del contrato para lograr el resultado esperado.

4.3 CONTROL DIARIO DE EQUIPO DE INTERVENTORÍA

Para el adecuado desempeño de las labores de supervisión e inspección en los diversos frentes de trabajo del proyecto, esta Interventoría dispuso de un vehículo tipo camioneta 4x4 de manera permanente.

Este recurso móvil resultó esencial para garantizar la presencia oportuna del equipo de interventoría en las diferentes sedes de las instituciones educativas en

ejecución, facilitando el seguimiento diario de las actividades, la verificación en sitio de la calidad de los trabajos y la atención eficiente a cualquier requerimiento o eventualidad que surgiera durante la ejecución de la obra.

El vehículo se mantuvo operativo y en condiciones óptimas para cumplir con las exigencias de desplazamiento inherentes a la naturaleza dispersa geográficamente del proyecto.

4.4 CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

CARGO	NOMBRE	DEDICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN PABLO BANQUEZ GONZALEZ	100%
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES	20%
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	NAYALIBE ELJACH MANJARREZ	100%
PROFESIONAL SG-SST	JOHAN SEBASTIAN BARRERA GONZÁLEZ	15%
ABOGADO	EDER LUIS MACHADO SOTO	5%
CONTADOR	ELI JOSÉ CUAVAS VEGA	6%
SECRETARIA DE OFICINA PRINCIPAL	OLINDA ESTHER MANAJARREZ MARTINEZ	50%
INSPECTOR SG-SST	ALVARO JAVIER GOMEZ RAMOS	85%

Tabla 13. Personal de interventoría.

4.5 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato de Interventoría de N° SI-CMA-007-2024 cuyo objeto es "*INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATICA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".* El valor del contrato corresponde a TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($350.649.999,00).

FORMA DE PAGO:

- El valor del contrato será cancelado mediante pagos parciales, en la misma proporción de la ejecución del contrato objeto de interventoría, para lo cual será requerido cuenta de cobro o factura informe parcial de ejecución, certificado de

cumplimiento expedido por el supervisor del contrato, la acreditación de los pagos que en materia de salarios y seguridad social deberá efectuar el contratista al personal que emplee en la ejecución del mismo y demás requeridos por la entidad para los trámites de las cuentas. PARÁGRAFO PRIMERO: Para el pago final será requerido cuenta de cobro o factura, informe final de interventoría, certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato, acta de liquidación, la acreditación de los pagos que en materia de salarios y seguridad social deberá efectuar el contratista al personal que emplee en la ejecución del mismo, la garantía otorgada debidamente actualizada y aprobada por la oficina asesora jurídica y demás requeridos por la entidad para los trámites de las cuentas.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los porcentajes de pagos mensuales no podrán ser superiores a los porcentajes de los avances físicos de la obra. PARÁGRAFO TERCERO. El valor total de este contrato incluye todos los costos y gastos en que tenga que incurrir EL CONTRATISTA, para el cumplimiento de su objeto, por lo cual no habrá lugar a reconocimiento adicional alguno, exceptuando la fuerza mayor y el caso fortuito.

A la fecha de presentación del presente informe, no se ha realizado ningún pago a esta interventoría

4.6 INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregará al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado

4.7 REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL INTERVENTOR POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN

En cumplimiento de los requerimientos contractuales y normativos, se adjunta al presente informe la documentación soporte de los pagos correspondientes a los aportes a la seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF, si aplica) del personal de la Interventoría asignado al seguimiento y control del Contrato respectivo durante el periodo evaluado.

- PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORÍA
  VER ANEXO N°12

5 INFORMACIÓN DE GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL

Durante el periodo del presente informe, la gestión socio-ambiental del proyecto se centró en el seguimiento del cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y Plan de Gestión Integral de Obra (PGIO). Se verificó la implementación de las medidas tomadas en materia ambiental con el objetivo de minimizar los impactos negativos.

El contratista demuestra compromiso con el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental del proyecto. Se ha constatado la correcta implementación de todas las medidas estipuladas, haciendo un uso eficiente de las prácticas ambientales para el desarrollo de la obra. Esto incluye un manejo adecuado de residuos sólidos, control de emisiones de polvo y ruido, y la protección de la naturaleza y vegetación presentes en algunos de los frentes en ejecución. Esta interventoría destaca que el contratista, no solo cumple con la normativa, sino que también fomenta una cultura de respeto por el entorno, lo que garantiza una ejecución sostenible y responsable.

En cuanto al componente social, se mantuvo comunicación con las comunidades de las diferentes instituciones educativas intervenidas a través de los canales establecidos, para informarlos acerca del avance de la obra, para que estos a su vez, desarrollen un sentido de pertenencia con el proyecto y cuiden el entorno en el cual se está desarrollando el mismo.

Es de anotar que no se reportaron incidentes ni accidentes durante este periodo y en general, se han tomado las medidas requeridas tal y como lo estipula la normativa vigente.

El seguimiento a estos aspectos continuará siendo prioritario para esta Interventoría, buscando garantizar un desarrollo del proyecto que minimice impactos ambientales negativos y fomente la participación de las comunidades beneficiarias de esta importante obra.

6 INFORME DE GESTIÓN AL PLAN DE CALIDAD

En el periodo cubierto por este informe, la prioridad de la Interventoría fue asegurar que la ejecución del proyecto cumpliera con los altos estándares de calidad definidos en el Plan de Gestión Integral de Obra y el Plan de Calidad. Para ello, se llevaron a cabo ensayos de laboratorio de los materiales y se realizó un monitoreo constante de los procedimientos constructivos a través de visitas técnicas.

Se prestó especial atención a actividades críticas, como la fundición de concreto en zapatas, vigas de cimentación, columnas y alfajías donde la supervisión fue constante para garantizar que cada elemento se ejecutara según los planos y especificaciones técnicas. De igual forma, se verificó minuciosamente el aplome de la mampostería, la correcta instalación de la perfilería metálica para la cubierta y la dosificación del mortero impermeabilizado para los pañetes.

Los resultados, plasmados en los reportes semanales, muestran un desempeño satisfactorio del contratista, que ha logrado cumplir con los requisitos de calidad.

Cabe resaltar que para este periodo se ha realizado y ejecutado un avance del 13.30% del total del PGIO, que corresponde a un valor de $8.951.741,63 lo que a su vez representa un avance del 0.215% del total del proyecto

La Interventoría mantendrá su compromiso de vigilancia para asegurar que todos los procesos y recursos empleados sigan las normas técnicas colombianas vigentes

- INFORME DE SEGUIMIENTO SST Y AL PGIO
  VER ANEXO N°13

7 CUADRO RESUMEN (AVANCE FISICO – FINANCIERO)

Durante el periodo del presente informe, el avance físico acumulado del proyecto se sitúa en un 53.55% de ejecución, en relación con la programación establecida que representa un 69.25%. Es decir, a la fecha, el proyecto presenta un atraso acumulado del 15.70%.

En cuanto al componente financiero, se ha tramitado una cuenta a título de anticipo por valor de $1.240.516.822,00, equivalente al 30% del valor del contrato, la cual ya ha sido desembolsada al contratista. También se tramitó un Acta Parcial N°1 de Obra por valor de $1.261.079.816,77, que contó con una amortización del 30%, es decir, por un valor correspondiente a $ 378.323.945,74 la cual, de igual manera ya ha sido desembolsada. De igual manera se tramitó una segunda acta parcial N°2 por un valor de $510.223.260,83

El avance financiero a la fecha, con respecto a los pagos parciales recibidos por parte del contratista, considerando el acta parcial N°1 y N°2, la cual se encuentra en trámite, corresponde a un 42.84% del valor del contrato.

A continuación, se presenta un cuadro detallado que representa el avance físico y financiero general de la ejecución de las actividades contractuales del proyecto,

permitiendo una visión integral del estado actual de la ejecución presupuestal y del progreso constructivo.

VALOR DEL CONTRATO SI-LP-002-2024			$			4.135.056.075,00
AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA - COMEDORES INSTITUCIONALES DE CÓRDOBA						
DESEMBOLSOS				AMORTIZACIONES		
#	CONCEPTO	VALOR	% DE AVANCE	% DE AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	VALOR AMORTIZADO	VALOR DEL ACTA AMORTIZADA (NETO PAGADO)
1	ANTICIPO	$ 1.240.516.822,00	30,00%	N.A	$ -	$ 1.240.516.822,00
2	ACTA PARCIAL 1	$ 1.261.079.816,77	30,50%	30,00%	$ 378.323.945,03	$ 882.755.871,74
3	ACTA PARCIAL 2	$ 510.223.260,83	12,34%	30,00%	$ 153.066.978,25	$ 357.156.282,58
	TOTALES	$ 1.771.303.077,60	42,84%		$ 531.390.923,28	$ 1.239.912.154,32

Ilustración 27. Avance Financiero y actas pagas del Contrato de Obra

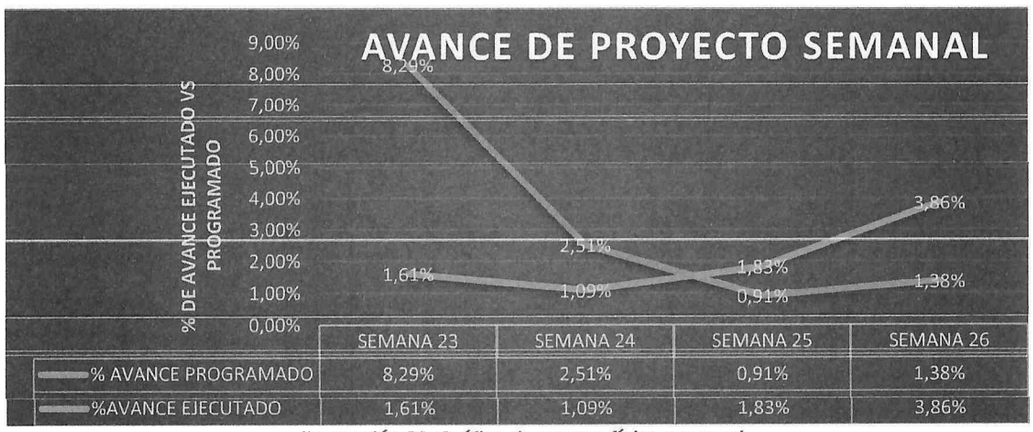


Ilustración 28. Gráfico de avance físico semanal

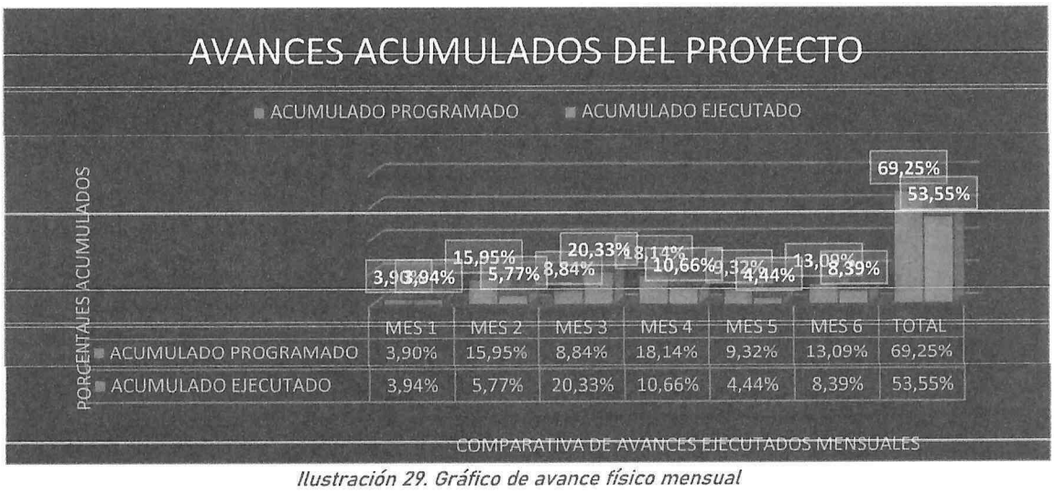


Ilustración 29. Gráfico de avance físico mensual

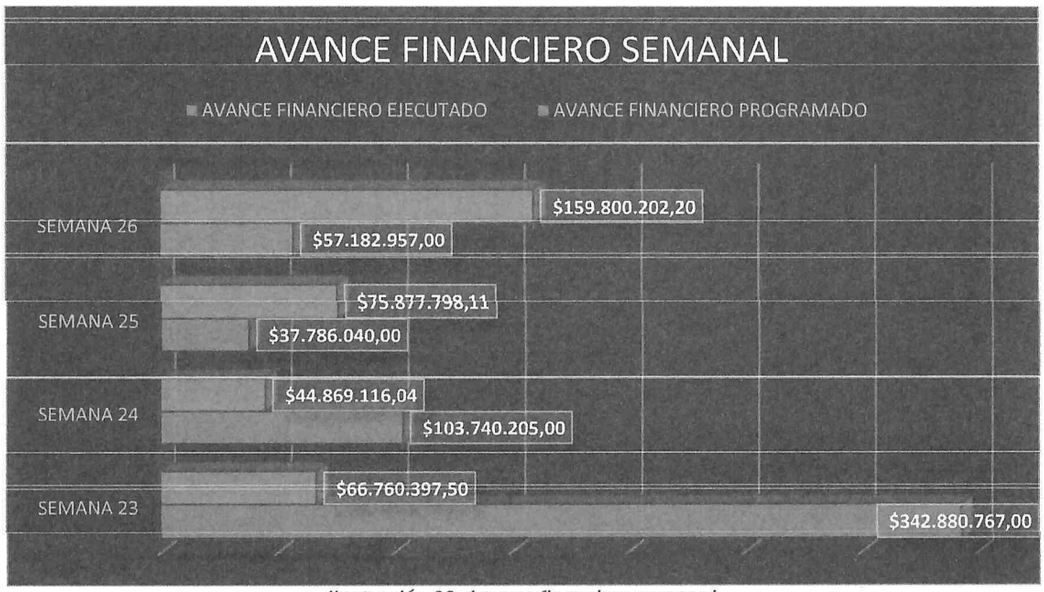


Ilustración 30. Avance financiero semanal

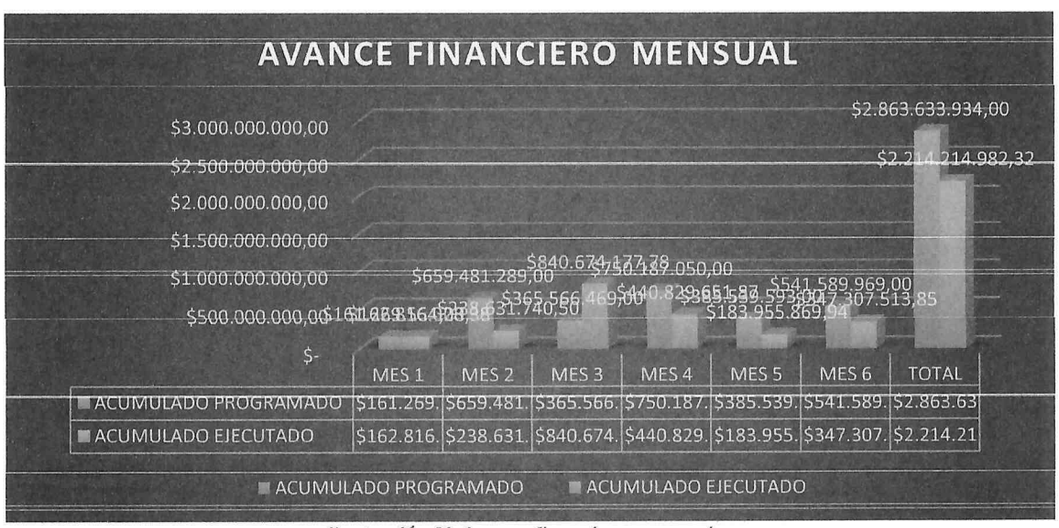


Ilustración 31. Avance financiero mensual

8 REGISTRO FOTOGRAFICO

Se adjunta al presente informe mensual un registro fotográfico que documenta el avance de las actividades constructivas desarrolladas durante el periodo respectivo en los diferentes frentes de trabajo del proyecto.

Las imágenes presentadas ilustran el estado de las actividades de los capítulos de Estructuras de concreto, Mampostería y Revoque, Estructura de Cubierta, Pisos, Instalaciones eléctricas e Hidrosanitarias y otras labores relevantes ejecutadas en las instituciones educativas intervenidas donde se realizan las adecuaciones y mejoramientos como lo es en Canalete.

Este material visual anexo al presente documento complementa la información detallada en los apartados anteriores del informe, permitiendo una mejor comprensión del progreso físico de la obra y evidenciando las condiciones de ejecución en sitio.

El registro fotográfico se organiza por institución educativa y actividad, facilitando la identificación y el seguimiento del avance en cada una de las localizaciones del proyecto.

- REGISTRO FOTOGRÁFICO
  VER ANEXO N°14

9 INFORME EJECUTIVO DIRECCIÓN DE INTERVENTORÍA

Durante el sexto mes de ejecución de la obra, la Dirección de Interventoría desplegó una gestión integral orientada al cumplimiento técnico del objeto contractual, certificando el avance y la correcta ejecución de las actividades iniciales conforme a los requerimientos técnicos pertinentes.

En esta etapa constructiva correspondiente a las ocho (8) sedes en intervención, se realizó la respectiva revisión, verificación, control y seguimiento a las actividades en ejecución con respecto a la estructura de la edificación – comedor.

Con el objetivo de mantener una comunicación fluida y un seguimiento proactivo del proyecto, se programaron y coordinaron con el contratista las reuniones y comités de seguimiento periódico, asegurando así un flujo constante de información con la Supervisión. Adicionalmente, se verificó la existencia y suficiencia de los planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones técnicas indispensables para el inicio y la correcta ejecución de las obras pactadas.

La Dirección de Interventoría ha establecido y mantiene un sistema de archivo organizado y actualizado de toda la documentación relevante del proyecto. Este archivo incluye la correspondencia oficial, la información preliminar, los informes técnicos detallados, las actas de los comités de obra, los planos constructivos y cualquier otro documento esencial para el control del desarrollo del proyecto.

Esta gestión documental garantiza la disponibilidad de la información necesaria para determinar las características completas de la obra ejecutada y facilita la toma de decisiones oportuna por parte de la entidad contratante.

10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el sexto mes de ejecución, comprendido entre el periodo 18 de agosto hasta el 17 de septiembre de 2025, el contratista se ha concentrado en el avance de la superestructura en las sedes intervenidas. El contratista ha enfocado sus esfuerzos en la instalación de la cubierta tipo sándwich, así como en la fundición de estructuras en concreto en las sedes recién aperturadas en el municipio de Tierralta. De igual manera se sigue realizando trabajos de mampostería y revoque e instalación de pisos.

Actualmente, las actividades se llevan a cabo en ocho frentes de obra: en las instituciones educativas de Cereté, Ciénaga de Oro, San Pelayo, Moñitos, Canalete, Los Córdobas, Tierralta y Planeta Rica. En las cinco primeras sedes mencionadas anteriormente, se han ejecutado trabajos que abarcan capítulos clave como Estructuras de concreto, Mampostería y revoque, Instalaciones hidráulicas y sanitarias, Estructura metálica, Cubierta, pisos. En la sede de Tierralta ya se han adelantado actividades preliminares, de excavaciones y rellenos, cimentación y mampostería y revoque. En cuanto a la sede de Planeta Rica, se han adelantado actividades preliminares, de Cimentación y estructuras en concreto.

A pesar de este progreso y la apertura de un nuevo frente, el proyecto registra un atraso del 15.70% con respecto a lo programado. El avance ejecutado del mes fue del 8.39% frente a un 13.09% programado, resultando en un avance acumulado ejecutado del 53.55% inferior al 69.25% de programación. Por ello, se le ha reiterado y se le exigió al contratista nuevamente la implementación de un plan de acción inmediata que permita recuperar el tiempo perdido y asegurar el cumplimiento de los plazos contractuales asegurando los objetivos, plazos y el éxito del proyecto.

En el aspecto financiero, el valor ejecutado y aún no facturado por el contratista asciende a $ 1.771.303.077,60, equivalente a un 42.84% del proyecto.

En cuanto a la gestión ambiental y social, el contratista ha demostrado un cumplimiento favorable con el PGIO y el PMA, destacándose por su eficiente manejo de residuos y la aplicación de buenas prácticas ambientales. Respecto a la calidad, los ensayos de resistencia del concreto para los elementos estructurales han sido positivos, cumpliendo con los estándares esperados.

Con el presente informe se deja constancia del cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002, en lo correspondiente a la parte técnica, financiera y jurídica.

Este informe, junto con sus anexos, sirve como constancia del cumplimiento de las obligaciones contractuales técnicas, jurídicas y financieras por parte del CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002.

Sin otro particular, se adjuntan la documentación descrita en los acápites del presente documento.

JUAN PABLO BANQUEZ GONZÁLEZ
Representante legal
ANTICA S.A.S BIC
Interventor

ANEXOS.

ANEXO N°1: GARANTIAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: jX1wgGPvgwTYYx1A4PnzSw==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100369947	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72305636	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	13/02/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	12/02/2025	24:00 Horas Del	12/10/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	No. DOC. IDENTIDAD	901.915.670-0
DIRECCIÓN	CRA 6A NO 64A 58	TELÉFONO	3135452977
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.935-6
DIRECCIÓN	CLL 27 NO. 3-28, PALACIO DE NAIN	TELÉFONO	7848940
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.935-6
DIRECCIÓN	CLL 27 NO. 3-28, PALACIO DE NAIN	TELÉFONO	7848940

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SI-LP-002-2024 , CUYO OBJETO ES ES MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

INTEGRANTES DEL CONSORCIO
VIBAR INGENIERIA SAS NIT. 901.566.942-0 PART.90%
HERSA CONSTRUCTORES SAS NIT. 900.475.731-9 PART:10%
CONFORMAN CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 12/02/2025	24:00 Horas Del 12/04/2026	413.513.491,50	1.200.888,50
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 12/02/2025	24:00 Horas Del 12/04/2026	1.240.540.474,50	3.602.665,49
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 12/02/2025	24:00 Horas Del 12/10/2028	413.513.491,50	3.789.596,24
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 12/10/2025	24:00 Horas Del 12/10/2030	398.655.004,10	4.985.918,06
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	00:00 Horas Del 12/02/2025	24:00 Horas Del 12/04/2026	41.226.771,00	119.727,06
		TOTAL ASEGURADO	$ 2.507.449.232,60	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
AD NACIONAL DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	13.698.795,35
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	13.698.795,35
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	2.604.253,12
TOTAL A PAGAR	$	16.310.848,47

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 13/02/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

María O.
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADO A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA - PASA - ACF

812

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100369947	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72305636	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	13/02/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	12/02/2025	24:00 Horas Del	12/10/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: Xez6JMHA5TyglzjA/nwu/Q==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100095688	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72305647	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	13/02/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	12/02/2025	24:00 Horas Del	12/10/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.915.670-0
DIRECCIÓN	CRA 6A NO 64A 58	**TELÉFONO**	3135452977
ASEGURADO	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.915.670-0
DIRECCIÓN	CRA 6A NO 64A 58	**TELÉFONO**	3135452977
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SI-LP-002-2024 , CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

INTEGRANTES DEL CONSORCIO
VIBAR INGENIERIA SAS NIT. 901.566.942-0 PART.90%
HERSA CONSTRUCTORES SAS NIT. 900.475.731-9 PART:10%
CONFORMAN CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	569.400.000,00	569.400.000,00	569.400.000,00	943.800,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	569.400.000,00	569.400.000,00	569.400.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	569.400.000,00	569.400.000,00	569.400.000,00	0,00
PATRONAL	569.400.000,00	569.400.000,00	569.400.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 569.400.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
AD NACIONAL DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	943.800,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	943.800,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	180.272,00
TOTAL A PAGAR	$	1.129.072,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 13/02/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

María O.
TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADA A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AFF

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R0000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100095688	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72305647	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	13/02/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	12/02/2025	24:00 Horas Del	12/10/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (DEPARTAMENTO DE CORDOBA COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS ITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO DE CORDOBA BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO DE CORDOBA COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

ADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

415

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: XlIZNhlP6GlD++aeVAX7bQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-86-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100095688	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	72344778	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	18/03/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	13/03/2025	24:00 Horas Del	10/11/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.915.670-0
DIRECCIÓN	CRA 6A NO 64A 58	**TELÉFONO**	3135452977
ASEGURADO	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.915.670-0
DIRECCIÓN	CRA 6A NO 64A 58	**TELÉFONO**	3135452977
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS, TENIENDO EN CUENTA EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE FECHA 13 DE MARZO DE 2025
DEMAS TERMINOS SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SI-LP-002-2024 , CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

INTEGRANTES DEL CONSORCIO
VIBAR INGENIERIA SAS NIT. 901.566.942-0 PART.90%
HERSA CONSTRUCTORES SAS NIT. 900.475.731-9 PART:10%

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	569.400.000,00	569.400.000,00	569.400.000,00	943.800,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	569.400.000,00	569.400.000,00	569.400.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	569.400.000,00	569.400.000,00	569.400.000,00	0,00
PATRONAL	569.400.000,00	569.400.000,00	569.400.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 569.400.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
AD NACIONAL DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 18/03/2025

PRIMA BRUTA	$	943.800,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	943.800,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	180.272,00
TOTAL A PAGAR	$	1.129.072,00

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

María O.
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADO A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - ASF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100095688	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	72344778	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	18/03/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	13/03/2025	24:00 Horas Del	10/11/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

CONFORMAN CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (DEPARTAMENTO DE CORDOBA COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS ITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO DE CORDOBA BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO DE CORDOBA COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

VINCULADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: KKrMhAIyU3Ba96u44ANtXw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100369947	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	72345192	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	18/03/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	13/03/2025	24:00 Horas Del	10/11/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.915.670-0
DIRECCIÓN	CRA 6A NO 64A 58	**TELÉFONO**	3135452977
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.103.935-6
DIRECCIÓN	PALACIO DE NAIN - CALLE 27 N 3 - 28	**TELÉFONO**	7848940
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.103.935-6
DIRECCIÓN	PALACIO DE NAIN - CALLE 27 N 3 - 28	**TELÉFONO**	7848940

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS, TENIENDO EN CUENTA EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE FECHA 13 DE MARZO DE 2025.

DEMAS TERMINOS SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SI-LP-002-2024 , CUYO OBJETO ES ES MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

INTEGRANTES DEL CONSORCIO
VIBAR INGENIERIA SAS NIT. 901.566.942-0 PART.90%

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 13/03/2025	24:00 Horas Del 11/05/2026	413.513.491,50	1.200.888,50
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 13/03/2025	24:00 Horas Del 11/05/2026	1.240.540.474,50	3.602.665,49
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 13/03/2025	24:00 Horas Del 10/11/2028	413.513.491,50	3.789.596,24
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 10/11/2025	24:00 Horas Del 10/11/2030	398.655.004,10	4.985.918,06
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	00:00 Horas Del 13/03/2025	24:00 Horas Del 11/05/2026	41.226.771,00	119.727,06
		TOTAL ASEGURADO	$ 2.507.449.232,60	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
AD NACIONAL DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	13.698.795,35
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	13.698.795,35
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	2.604.253,12
TOTAL A PAGAR	$	16.310.848,47

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 18/03/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

María O.
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
AFILIADO A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - ASF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100369947	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	72345192	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	18/03/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	13/03/2025	24:00 Horas Del	10/11/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

HERSA CONSTRUCTORES SAS NIT. 900.475.731-9 PART:10%
CONFORMAN CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

ADHERIDOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100369947** y endoso, **2** cuyo afianzado es: **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002** Asegurado o Beneficiario: **DEPARTAMENTO DE CORDOBA / DEPARTAMENTO DE CORDOBA** , expedida por la Compañía en **18/03/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **18** días del mes **MARZO** del año **2025.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: WKEYWkgzP7W/Ni+a8Y8xdQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100369947	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	72366393	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	02/04/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	13/03/2025	24:00 Horas Del	10/12/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.915.670-0
DIRECCIÓN	CRA 6A NO 64A 58	**TELÉFONO**	3135452977
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.103.935-6
DIRECCIÓN	PALACIO DE NAIN - CALLE 27 N 3 - 28	**TELÉFONO**	7848940
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.103.935-6
DIRECCIÓN	PALACIO DE NAIN - CALLE 27 N 3 - 28	**TELÉFONO**	7848940

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE AJUSTA LOS AMPAROS, TENIENDO EN CUENTA EL ACTA DE INICIO CORREGIDA ACTA DE INICIO DE FECHA 17 DE MARZO DE 2025
DEMAS TERMINOS SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SI-LP-002-2024 , CUYO OBJETO ES ES MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

INTEGRANTES DEL CONSORCIO
VIBAR INGENIERIA SAS NIT. 901.566.942-0 PART.90%
HERSA CONSTRUCTORES SAS NIT. 900.475.731-9 PART:10%

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 17/03/2025	24:00 Horas Del 17/05/2026	413.513.491,50	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 17/03/2025	24:00 Horas Del 17/05/2026	1.240.540.474,50	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 17/03/2025	24:00 Horas Del 17/11/2028	413.513.491,50	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 17/11/2025	24:00 Horas Del 17/11/2030	398.655.004,10	0,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	00:00 Horas Del 17/03/2025	24:00 Horas Del 17/05/2026	41.226.771,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 2.507.449.232,60	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
AD NACIONAL DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 02/04/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

María O.
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADO A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100369947	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	72366393	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	02/04/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	13/03/2025	24:00 Horas Del	10/12/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

CONFORMAN CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

ADHERIDOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100369947** y endoso, **3** cuyo afianzado es: **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002** Asegurado o Beneficiario: **DEPARTAMENTO DE CORDOBA / DEPARTAMENTO DE CORDOBA** , expedida por la Compañía en **02/04/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **02** días del mes **ABRIL** del año **2025**.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

463

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	72366393
Fecha de Facturación	02/04/2025
Fecha Límite de Pago	02/05/2025

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

Póliza No.	NB-100369947	
Periodo Facturado	13/03/2025	10/12/2030

Prima (incluye gastos de expedición)	00,00
IVA	00,00
VALOR TOTAL A PAGAR $	00,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 0
CRA 6A NO 64A 58	901915670
Intermediario	AD NACIONAL DE SEGUROS LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

ESPACIO PARA EL TIMBRE

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **02/05/2025** se aplicará la cláusula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit:900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra pagina web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	72366393
Fecha de Facturación	02/04/2025
Fecha Límite de Pago	02/05/2025

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

Póliza No.	NB-100369947	
Periodo Facturado	13/03/2025	10/12/2030

Prima (incluye gastos de expedición)	00,00
IVA	00,00
VALOR TOTAL A PAGAR $	00,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 0
CRA 6A NO 64A 58	901915670
Intermediario	AD NACIONAL DE SEGUROS LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)00000072366393(3900)000000000000(96)20250502

Bancos Corresponsales OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)2299007236639 3(3900)000000000000(96)20250502

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

821

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago · Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: gtr83treqg54L+2Srumigw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100095688	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	72366399	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	02/04/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	13/03/2025	24:00 Horas Del	17/11/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	No. DOC. IDENTIDAD	901.915.670-0
DIRECCIÓN	CRA 6A NO 64A 58	TELÉFONO	3135452977
ASEGURADO	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	No. DOC. IDENTIDAD	901.915.670-0
DIRECCIÓN	CRA 6A NO 64A 58	TELÉFONO	3135452977
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE AJUSTA LOS AMPAROS, TENIENDO EN CUENTA EL ACTA DE INICIO CORREGIDA ACTA DE INICIO DE FECHA 17 DE MARZO DE 2025
DEMAS TERMINOS SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SI-LP-002-2024 , CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

INTEGRANTES DEL CONSORCIO
VIBAR INGENIERIA SAS NIT. 901.566.942-0 PART.90%
HERSA CONSTRUCTORES SAS NIT. 900.475.731-9 PART:10%

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	569.400.000,00	569.400.000,00	569.400.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	569.400.000,00	569.400.000,00	569.400.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	569.400.000,00	569.400.000,00	569.400.000,00	0,00
PATRONAL	569.400.000,00	569.400.000,00	569.400.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 569.400.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
AD NACIONAL DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 02/04/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

María O.
TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADO A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - ASF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100095688	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	72366399	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	02/04/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	13/03/2025	24:00 Horas Del	17/11/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

CONFORMAN CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (DEPARTAMENTO DE CORDOBA COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS ITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO DE CORDOBA BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO DE CORDOBA COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

827

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	72366399

Fecha de Facturación	02/04/2025		Fecha Límite de Pago	02/05/2025
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			Prima (incluye gastos de expedición)	00,00
Póliza No.	NB-100095688		IVA	00,00
Periodo Facturado	13/03/2025	17/11/2025	VALOR TOTAL A PAGAR $	00,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 0
CRA 6A NO 64A 58	901915670
Intermediario	AD NACIONAL DE SEGUROS LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

ESPACIO PARA EL TIMBRE

1. No se aceptan pagos parciales
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciacion del pago
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **02/05/2025** se aplicará la clausula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA NIt 900531292-7**, al respaldo endóseio correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	72366399

Fecha de Facturación	02/04/2025		Fecha Límite de Pago	02/05/2025
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			Prima (incluye gastos de expedición)	00,00
Póliza No.	NB-100095688		IVA	00,00
Periodo Facturado	13/03/2025	17/11/2025	VALOR TOTAL A PAGAR $	00,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 0
CRA 6A NO 64A 58	901915670
Intermediario	AD NACIONAL DE SEGUROS LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)00000072366399(3900)000000000000(96)20250502

Bancos Corresponsales OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)229900723663999(3900)000000000000(96)20250502

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

825

826

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago · Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored
Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre

ANEXO N°2: ACTAS DEL CONTRATO DE OBRA.

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

ACTA DE INICIO

CONTRATO DE OBRA No.:	SI-LP-002-2024 de fecha 12 de febrero de 2025
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002 NIT: 901915670-0 R.L: María Isabel Quintero Gonzalez C.C No.: 1.010.007.099
INTERVENTORIA:	ANTICA S.A.S BIC NIT: 901823241-9 R.L: Juan Pablo Banquez Gonzalez C.C No.: 1.067.958.787
OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
VALOR DEL CONTRATO:	CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE **($4.135.056.075,00)**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO (08) MESES
FECHA DE INICIO:	DIECISIETE (17) DE MARZO DE 2025

En Montería, el día Diecisiete (17) de marzo de 2025 en las oficinas de la **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA** de la Gobernación de Córdoba se reunieron: el señor **JUAN PABLO BANQUEZ GONZALEZ** identificado con C.C. No. 1.067.958.787 de Montería, representante legal de **ANTICA S.A.S BIC** con Nit: 901823241-9, en su calidad de interventor del contrato, y la señora **MARÍA ISABEL QUINTERO GONZALEZ**, identificada con C.C No. 1.010.007.099 de Montería en calidad de represéntate legal de **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002** con Nit. 901915670-0 en su calidad de **CONTRATISTA**, con el fin de dar inicio a la ejecución del contrato en mención, las partes socializaron las obligaciones establecidas en el **CONTRATO DE OBRA No. SI-LP-002-2024** y manifestaron estar de acuerdo con la ejecución de las mismas a partir de la fecha.

ANTICA S.A.S BIC
Nit: 901823241-9
R.L: Juan Pablo Banquez González
C.C. No. 1.067.958.787
INTERVENTOR

María Q.

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002
NIT: 901915670-0
R.L: María Isabel Quintero González
C.C No.: 1.010.007.099
CONTRATISTA

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REVISADO POR:
Nombre: Abdul Zarur Lakah	Nombre: Oscar Pineda Mendoza	Nombre: GABRIELA RUIZ CARRASCAL
Cargo: Contratista SID	Cargo: Contratista SID	Cargo: Auxiliar Admin SID
Firma:	Firma:	Firma:

Scanned with CamScanner

631

Conformaciones de Veedurías

832

Rdo
Nasly Chaves Pinto
08/07/2025
04:10 pm.

Ciénaga de Oro, 8 de Julio de 2025.

Señores:
PERSONERIA MUNICIPAL
Ciénaga de Oro – Córdoba

ASUNTO: Solicitud de Reconocimiento e Inscripción de Veeduría Ciudadana.

Respetuoso Saludo:

La presente tiene como fin solicitarle el Reconocimiento e inscripción de la Veeduría Ciudadana Veeduria comedor escolar Marco Fidel Suarez en el registro público de Veedurías de acuerdo a la facultad otorgada por el ARTÍCULO 3 DE LA LEY 850 DE 2003 a las Personerías Municipales.

Teniendo en cuenta los principios rectores de *Democratización, Autonomía, Transparencia, Igualdad, Responsabilidad, Eficacia, Objetividad y Legalidad* establecidos en la ley por medio de la cual se reglamentan las Veedurías Ciudadanas Ley 850 de 2003.

Atentamente,

Cesar Mario Calderón Durán
C.C.No. 78709869

830

ANTICA ANTICA S.A.S. BIC CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. SI-CMA-007-2024	ACTA DE VISITA: ☐ N°___ COMITÉ TÉCNICO: ☐ N°___ ACTA DE SOCIALIZACIÓN: ☐ N°___
	ACTA DE VEEDURIA	
OBJETO: *INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"*		
ENTIDAD CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	

FECHA: 14 DE MARZO DE 2025

LUGAR DE LA REUNION: INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ – MUNCIPIO DE CIÉNAGA DE ORO.

TEMAS A TRATAR: CONFORMACIÓN DE VEEDURÍA DEL PROYECTO

DESARROLLO DEL COMITÉ:

Luego de realizar la respectiva socialización del proyecto con la comunidad, se abrió un espacio para que los interesados en conformar la veeduría expresaran su voluntad de pertenecer a ella. Los asistentes, conscientes de la responsabilidad y el compromiso que implica esta labor, manifestaron su deseo de participar activamente en el control social del proyecto.

Se procedió a la elección de los miembros de la veeduría, quienes se comprometen a velar por la correcta ejecución de la obra.

El objetivo de la presente acta es dejar constancia de la conformación de la Veeduría institucional que realizará este seguimiento y vigilancia al proyecto de Construcción del Comedor Escolar, específicamente en la institución educativa INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ en el municipio de Ciénaga de Oro, con el fin de garantizar la transparencia, eficiencia y calidad en la ejecución de esta.

ANTICA ANTICA S.A.S. BIC CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. SI-CMA-007-2024 ACTA DE VEEDURIA	ACTA DE VISITA: ☐ N°___ COMITÉ TÉCNICO: ☐ N°___ ACTA DE SOCIALIZACIÓN: ☐ N°___
OBJETO: *INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"*		
ENTIDAD CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	CONSORCIO

Se eligieron y quedaron formalmente constituidos los siguientes miembros de la Veeduría Ciudadana del Proyecto de la referencia en la Institución Educativa Marco Fidel Suarez:

- Benjamín Sáenz – C.C. 72.180.923 - Cel. 3178433088
- Karina Isabel Aria – C.C. 30.576.255 – Cel. 3006626074
- Cesar Calderón Doria – C.C. 78.709.862 – Cel. 3014086248
- Eduardo García – C.C. 7.383.154 – Cel. 3233443731
- Edinson Solano Mestra – C.C. 6.879.191 – Cel. 3126650353

Funciones y alcance de la veeduría:

Se recordaron las principales funciones de la veeduría, incluyendo:

- Vigilar la ejecución del contrato en sus componentes técnicos, financieros, administrativos y legales.
- Hacer seguimiento a la calidad de los materiales y la mano de obra.
- Verificar el cumplimiento de los cronogramas.
- Informar a la comunidad sobre los avances del proyecto.
- Alertar a las entidades competentes sobre posibles irregularidades o incumplimientos.
- Promover la participación ciudadana.

Se aclaró que la veeduría no tiene funciones de coadministración, cogestión o coejecución, sino de control social.

Los miembros de la Veeduría Ciudadana se comprometen a:

- Ejercer sus funciones con transparencia, objetividad e imparcialidad.
- Actuar en defensa del interés general y el bienestar de la comunidad.
- Mantener una comunicación constante con las entidades responsables del proyecto.

ANTICA S.A.S. BIC CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. SI-CMA-007-2024	ACTA DE VISITA: ☐ N°___ COMITÉ TÉCNICO: ☐ N°___ ACTA DE SOCIALIZACIÓN: ☐ N°___
	ACTA DE VEEDURIA	
OBJETO: *INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"*		
ENTIDAD CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	CONSORCIO

- Cumplir con lo establecido en la ley 850 de 2003 y demás normas aplicables.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la presente acta, la cual es firmada por todos los veedores.

Benjamin Sáenz
C.C. N° 72.180.923
Veedor

Karina Aria
Karina Isabel Aria
C.C. N° 30.576.255
Veedor

Cesar Calderón Doria
C.C. N° 78.709.862
Veedor

Eduardo García
C.C. N°. 7.383.154
Veedor

Edinson Solano
Edinson Solano Mestra
C.C. N° 6.879.191
Veedor

PERSONERÍA MUNICIPAL
CERETÉ - CÓRDOBA
Recibido 7-7-25
2:39 pm

Cereté, 7 de Julio de 2025.

Señores:
PERSONERIA MUNICIPAL
Cereté – Córdoba

ASUNTO: Solicitud de Reconocimiento e Inscripción de Veeduría Ciudadana.

Respetuoso Saludo:

La presente tiene como fin solicitarle el Reconocimiento e inscripción de la Veeduría Ciudadana Veeduría comedores Marcelliano Polo

en el registro público de Veedurías de acuerdo a la facultad otorgada por el ARTÍCULO 3 DE LA LEY 850 DE 2003 a las Personerías Municipales.

Teniendo en cuenta los principios rectores de *Democratización, Autonomía, Transparencia, Igualdad, Responsabilidad, Eficacia, Objetividad y Legalidad* establecidos en la ley por medio de la cual se reglamentan las Veedurías Ciudadanas Ley 850 de 2003.

Atentamente,

Edgar Otero Daniel

C.C.No. 78713722

Powered by CamScanner

ANTICA S.A.S. BIC CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. SI-CMA-007-2024	ACTA DE VISITA: ☐ N°___ COMITÉ TÉCNICO: ☐ N°___ ACTA DE SOCIALIZACIÓN: ☐ N°___
	ACTA DE VEEDURÍA	
OBJETO: *INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"*		
ENTIDAD CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	CONSORCIO

FECHA: 14 DE MARZO DE 2025

LUGAR DE LA REUNION: INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCELIANO POLO – MUNCIPIO DE CERETÉ

TEMAS A TRATAR: CONFORMACIÓN DE VEEDURÍA DEL PROYECTO

DESARROLLO DEL COMITÉ:

Luego de realizar la respectiva socialización del proyecto con la comunidad, se abrió un espacio para que los interesados en conformar la veeduría expresaran su voluntad de pertenecer a ella. Los asistentes, conscientes de la responsabilidad y el compromiso que implica esta labor, manifestaron su deseo de participar activamente en el control social del proyecto.

Se procedió a la elección de los miembros de la veeduría, quienes se comprometen a velar por la correcta ejecución de la obra.

El objetivo de la presente acta es dejar constancia de la conformación de la Veeduría institucional que realizará este seguimiento y vigilancia al proyecto de Construcción del Comedor Escolar, específicamente en la institución educativa INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCELIANO POLO en el municipio de Cereté, con el fin de garantizar la transparencia, eficiencia y calidad en la ejecución de esta.

Powered by CamScanner

ANTICA ANTICA S.A.S. BIC CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. SI-CMA-007-2024 ACTA DE VEEDURIA	ACTA DE VISITA: ☐ N°___ COMITÉ TÉCNICO: ☐ N°___ ACTA DE SOCIALIZACIÓN: ☐ N°___
OBJETO: *INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"*		
ENTIDAD CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	CONSORCIO

Se eligieron y quedaron formalmente constituidos los siguientes miembros de la Veeduría Ciudadana del Proyecto de la referencia en la Institución Educativa Marceliano Polo:

- Edgar Otero David – C.C. 78.713.722 – Cel. 3146138290
- Juan C. Galván – C.C. 78.699.102 – Cel. 3015878607
- Darlin P. Martínez Rodríguez – C.C.50.966.732 – Cel. 3127356674
- Anadelfa betin G. – C.C. 1.069.472.487 – Cel. 3246083745
- José Miguel Guerra M. – C.C. 78.030.940 – Cel. 3163058815
- Didier A. Padilla Padilla – C.C. 78.028.121 – Cel. 3147154026
- Fredy J. Lopez – C.C. 78.030.234 – Cel. 3103634657
- Fabian Luna Jaramillo – C.C. 1.014.669.269 – Cel. 3103409406
- Marian Yulieth Wilches Castro – Cel. 3009482787
- María Paula Guzmán Pérez – Cel. 3053552582
- Domingo Rosso – C.C. 78.109.061 – Cel. 3218462916

Funciones y alcance de la veeduría:

Se recordaron las principales funciones de la veeduría, incluyendo:

- Vigilar la ejecución del contrato en sus componentes técnicos, financieros, administrativos y legales.
- Hacer seguimiento a la calidad de los materiales y la mano de obra.
- Verificar el cumplimiento de los cronogramas.
- Informar a la comunidad sobre los avances del proyecto.
- Alertar a las entidades competentes sobre posibles irregularidades o incumplimientos.
- Promover la participación ciudadana.

Se aclaró que la veeduría no tiene funciones de coadministración, cogestión o coejecución, sino de control social.

Powered by CamScanner

ANTICA S.A.S. BIC CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. SI-CMA-007-2024	ACTA DE VISITA: ☐ N°___ COMITÉ TÉCNICO: ☐ N°___ ACTA DE SOCIALIZACIÓN: ☐ N°___
	ACTA DE VEEDURIA	
OBJETO: *INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"*		
ENTIDAD CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	CONSORCIO

Los miembros de la Veeduría Ciudadana se comprometen a:

- Ejercer sus funciones con transparencia, objetividad e imparcialidad.
- Actuar en defensa del interés general y el bienestar de la comunidad.
- Mantener una comunicación constante con las entidades responsables del proyecto.
- Cumplir con lo establecido en la ley 850 de 2003 y demás normas aplicables.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la presente acta, la cual es firmada por todos los veedores.

Edgar Otero David
C.C. N° 78.713.722
Veedor

Juan C. Galván
C.C. N° 78.699.102
Veedor

Darlin P. Martínez Rodríguez
C.C. N° .50.966.732
Veedor

Anadelfa betin G
C.C. N°. 1.069.472.487
Veedor

José Miguel Guerra M
C.C. N° 78.030.940
Veedor

Didier A. Padilla Padilla
C.C. N° 78.028.121
Veedor

Powered by CamScanner

ANTICA ANTICA S.A.S. BIC CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No SI-CMA-007-2024 ACTA DE VEEDURIA	ACTA DE INICIO ☐ N°___ COMITÉ TÉCNICO ☐ N°___ ACTA DE SOCIALIZACIÓN ☐ N°___
OBJETO: *INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"*		
ENTIDAD CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	

Fredy J. Lopez
C.C. N° 78.030.234
Veedor

Fabian Luna Jaramillo
C.C. N°. 1.014.669.269
Veedor

Marian Wilches
Marian Yulieth Wilches Castro
C.C. N°
Veedor

María Paula Guzmán Pérez.
María Paula Guzmán Pérez
C.C. N°.
Veedor

Domingo Russo
C.C. N° 78.109.061
Veedor

Powered by CamScanner

841

San Pelayo, 9 de Julio de 2025.

Señores:
PERSONERIA MUNICIPAL
San Pelayo – Córdoba

ASUNTO: Solicitud de Reconocimiento e Inscripción de Veeduría Ciudadana.

Respetuoso Saludo:

La presente tiene como fin solicitarle el Reconocimiento e inscripción de la Veeduría Ciudadana Veeduría comedores Santa Teresita sede general Santander en el registro público de Veedurías de acuerdo a la facultad otorgada por el ARTÍCULO 3 DE LA LEY 850 DE 2003 a las Personerías Municipales.

Teniendo en cuenta los principios rectores de *Democratización, Autonomía, Transparencia, Igualdad, Responsabilidad, Eficacia, Objetividad y Legalidad* establecidos en la ley por medio de la cual se reglamentan las Veedurías Ciudadanas Ley 850 de 2003.

PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN PELAYO
RECIBIDO EL 09 MES 07 AÑO 2025
HORA: 3:24 p.m.

Atentamente,

C.C. No. 1003944449

Powered by CamScanner

ANTICA ANTICA S.A.S. BIC CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. SI-CMA-007-2024	ACTA DE VISITA: ☐ N°___ COMITÉ TÉCNICO: ☐ N°___ ACTA DE SOCIALIZACIÓN: ☐ N°___
	ACTA DE VEEDURIA	
OBJETO: *INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"*		
ENTIDAD CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	CONSORCIO

FECHA: 14 DE MARZO DE 2025

LUGAR DE LA REUNION: INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESITA SEDE GENERAL SANTANDER– MUNCIPIO DE SAN PELAYO.

TEMAS A TRATAR: CONFORMACIÓN DE VEEDURÍA DEL PROYECTO

DESARROLLO DEL COMITÉ:

Luego de realizar la respectiva socialización del proyecto con la comunidad, se abrió un espacio para que los interesados en conformar la veeduría expresaran su voluntad de pertenecer a ella. Los asistentes, conscientes de la responsabilidad y el compromiso que implica esta labor, manifestaron su deseo de participar activamente en el control social del proyecto.

Se procedió a la elección de los miembros de la veeduría, quienes se comprometen a velar por la correcta ejecución de la obra.

El objetivo de la presente acta es dejar constancia de la conformación de la Veeduría institucional que realizará este seguimiento y vigilancia al proyecto de Construcción del Comedor Escolar, específicamente en la institución educativa INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESITA SEDE GENERAL SANTANDER en el municipio de San Pelayo, con el fin de garantizar la transparencia, eficiencia y calidad en la ejecución de esta.

1/3

Powered by CamScanner

ANTICA S.A.S. BIC CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. SI-CMA-007-2024	ACTA DE VISITA: ☐ N°___ COMITÉ TÉCNICO: ☐ N°___ ACTA DE SOCIALIZACIÓN: ☐ N°___
	ACTA DE VEEDURIA	
OBJETO: *INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"*		
ENTIDAD CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	CONSORCIO

Se eligieron y quedaron formalmente constituidos los siguientes miembros de la Veeduría Ciudadana del Proyecto de la referencia en la Institución Educativa Santa Teresita sede General Santander:

- Freís Ruiz Pérez – C.C. 78.710.033 – Cel. 3145546282
- Carmen García Hoyos – C.C. 50.760.223 – Cel. 3233621317
- Adeira Ávila G – C.C. 52.267.244 – Cel. 3007036576
- Carmen Pérez Campillo – C.C. 30.688.990 – Cel. 3017557856
- Remberto Pertuz Cavadía – C.C. 7.375.124 – Cel. 3012974969

Funciones y alcance de la veeduría:

Se recordaron las principales funciones de la veeduría, incluyendo:

- Vigilar la ejecución del contrato en sus componentes técnicos, financieros, administrativos y legales.
- Hacer seguimiento a la calidad de los materiales y la mano de obra.
- Verificar el cumplimiento de los cronogramas.
- Informar a la comunidad sobre los avances del proyecto.
- Alertar a las entidades competentes sobre posibles irregularidades o incumplimientos.
- Promover la participación ciudadana.

Se aclaró que la veeduría no tiene funciones de coadministración, cogestión o coejecución, sino de control social.

2/3

Los miembros de la Veeduría Ciudadana se comprometen a:

- Ejercer sus funciones con transparencia, objetividad e imparcialidad.
- Actuar en defensa del interés general y el bienestar de la comunidad.
- Mantener una comunicación constante con las entidades responsables del proyecto.

Powered by CamScanner

ANTICA S.A.S. BIC CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. SI-CMA-007-2024	ACTA DE VISITA: ☐ N°___ COMITÉ TÉCNICO: ☐ N°___ ACTA DE SOCIALIZACIÓN: ☐ N°___
	ACTA DE VEEDURIA	
OBJETO: *INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"*		
ENTIDAD CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	CONSORCIO

- Cumplir con lo establecido en la ley 850 de 2003 y demás normas aplicables.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la presente acta, la cual es firmada por todos los veedores.

Freis Ruiz Pérez
C.C. N° 78.710.033
Veedor

Adeira Ávila G
C.C. N° 52.267.244
Veedor

Carmen García Hoyos
C.C. N° 50.760.223
Veedor

Carmen Pérez Campillo
C.C. N°. 30.688.990
Veedor

Remberto Pertuz Cavadia
C.C. N° 7.375.124
Veedor

Powered by CamScanner

Moñitos, 09 de JULIO de 2025.

Señores:
PERSONERIA MUNICIPAL
Moñitos – Córdoba

ASUNTO: Solicitud de Reconocimiento e Inscripción de Veeduría Ciudadana

Respetuoso Saludo:

La presente tiene como fin solicitarle el Reconocimiento e inscripción de la Veeduría Ciudadana VEEDURIA COMEDOR ESCOLAR SAN JOSE DE MOÑITON en el registro público de Veedurías de acuerdo a la facultad otorgada por el ARTÍCULO 3 DE LA LEY 850 DE 2003 a las Personerías Municipales.

Teniendo en cuenta los principios rectores de *Democratización, Autonomía, Transparencia, Igualdad, Responsabilidad, Eficacia, Objetividad y Legalidad* establecidos en la ley por medio de la cual se reglamentan las Veedurías Ciudadanas Ley 850 de 2003.

Atentamente,

clodomiro Torres
C.C.No. 78757855

Recibido Lcda Luz Vasquero Mora
9-07-2025
2:58 p.m.

ANTICA ANTICA S.A.S. BIC CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	Contrato de interventoría No. SI-CMA-007-2024	ACTA DE VISITA: ☐ N°____ COMITÉ TÉCNICO: N°____
	ACTA DE SOCIALIZACIÓN	ACTA DE SOCIALIZACIÓN: N°____

Objeto: *INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"*		
ENTIDAD CONTRATANTE:	Departamento de córdoba	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	

FECHA: 16 DE MAYO DE 2025

LUGAR DE LA REUNION: INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE MOÑITOS SEDE PRINCIPAL – MUNCIPIO DE MOÑITOS

TEMAS A TRATAR: CONFORMACIÓN DE VEEDURÍA DEL PROYECTO

DESARROLLO DEL COMITÉ:

Luego de realizar la respectiva socialización del proyecto con la comunidad, se abrió un espacio para que los interesados en conformar la veeduría expresaran su voluntad de pertenecer a ella. Los asistentes, conscientes de la responsabilidad y el compromiso que implica esta labor, manifestaron su deseo de participar activamente en el control social del proyecto.

Se procedió a la elección de los miembros de la veeduría, quienes se comprometen a velar por la correcta ejecución de la obra.

El objetivo de la presente acta es dejar constancia de la conformación de la Veeduría institucional que realizará este seguimiento y vigilancia al proyecto de Construcción del Comedor Escolar, específicamente en la institución educativa INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE MOÑITOS SEDE PRINCIPAL en el municipio de Moñitos, con el fin de garantizar la transparencia, eficiencia y calidad en la ejecución de esta.

ANTICA ANTICA S.A.S. BIC CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	Contrato de interventoria No SI-CMA-007-2024	ACTA DE VISITA: ☐ N°____ COMITÉ TÉCNICO: N°____
	ACTA DE SOCIALIZACIÓN	ACTA DE SOCIALIZACIÓN: N°____

Objeto: *INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"*		
ENTIDAD CONTRATANTE:	Departamento de córdoba	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	

Se eligieron y quedaron formalmente constituidos los siguientes miembros de la Veeduría Ciudadana del Proyecto de la referencia en la Institución Educativa San José de Moñitos sede principal:

- Clodomiro Torres Berrocal – C.C. 78.7570.855 – Cel. 3212623043
- Jeidis Tapia Ortega – C.C. 26.147.679 – Cel. 3046310573
- Otto David Cogollo Martínez – C.C. 6.643.455 – Cel. 3005134024

Funciones y alcance de la veeduría:

Se recordaron las principales funciones de la veeduría, incluyendo:

- Vigilar la ejecución del contrato en sus componentes técnicos, financieros, administrativos y legales.
- Hacer seguimiento a la calidad de los materiales y la mano de obra.
- Verificar el cumplimiento de los cronogramas.
- Informar a la comunidad sobre los avances del proyecto.
- Alertar a las entidades competentes sobre posibles irregularidades o incumplimientos.
- Promover la participación ciudadana.

Se aclaró que la veeduría no tiene funciones de coadministracion, cogestion o coejecución, sino de control social.

Los miembros de la Veeduría Ciudadana se comprometen a:

- Ejercer sus funciones con transparencia, objetividad e imparcialidad.
- Actuar en defensa del interés general y el bienestar de la comunidad.
- Mantener una comunicación constante con las entidades responsables del proyecto.
- Cumplir con lo establecido en la ley 850 de 2003 y demás normas aplicables.

ANTICA ANTICA S A S. BIC CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	Contrato de interventoria No. SI-CMA 007-2024	ACTA DE VISITA: ☐ N°____ COMITÉ TÉCNICO: N°____
	ACTA DE SOCIALIZACIÓN	ACTA DE SOCIALIZACIÓN: N°____
Objeto: *INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"*		
ENTIDAD CONTRATANTE:	Departamento de córdoba	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la presente acta, la cual es firmada por todos los participantes.

Clodomiro Torres B

Clodomiro Torres Berrocal
C.C. N° 78.7570.855
Veedor

Jeidis Tapia Ortega

Jeidis Tapia Ortega
C.C. N° 26.147.679
Veedor

Otto David Cogollo Martínez
C.C. N° 6.843.455
Veedor

847

Rdo Rosa A. Doña Personería Sec 11/07/2025 11:52 am Acta Veeduría Nº 004 del 11 de Julio de 2025

Canalete, 11 de Julio de 2025.

Señores:
PERSONERIA MUNICIPAL
Canalete – Córdoba

ASUNTO: Solicitud de Reconocimiento e Inscripción de Veeduría Ciudadana.

Respetuoso Saludo:

La presente tiene como fin solicitarle el Reconocimiento e inscripción de la Veeduría Ciudadana Veeduría comedor escolar San José de Canalete en el registro público de Veedurías de acuerdo a la facultad otorgada por el ARTÍCULO 3 DE LA LEY 850 DE 2003 a las Personerías Municipales.

Teniendo en cuenta los principios rectores de *Democratización, Autonomía, Transparencia, Igualdad, Responsabilidad, Eficacia, Objetividad y Legalidad* establecidos en la ley por medio de la cual se reglamentan las Veedurías Ciudadanas Ley 850 de 2003.

Atentamente, Javier Ruelo Herrado

C.C.No. 1100385Y.

ANTICA S.A.S. BIC CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	ACTA DE SOCIALIZACIÓN	ACTA DE SOCIALIZACIÓN: N°_____
Objeto: *INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"*		
ENTIDAD CONTRATANTE:	Departamento de córdoba	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	

FECHA: 29 DE MAYO DE 2025

LUGAR DE LA REUNION: INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE CANALETE – MUNCIPIO DE CANALETE

TEMAS A TRATAR: CONFORMACIÓN DE VEEDURÍA DEL PROYECTO

DESARROLLO DEL COMITÉ:

Luego de realizar la respectiva socialización del proyecto con la comunidad, se abrió un espacio para que los interesados en conformar la veeduría expresaran su voluntad de pertenecer a ella. Los asistentes, conscientes de la responsabilidad y el compromiso que implica esta labor, manifestaron su deseo de participar activamente en el control social del proyecto.

Se procedió a la elección de los miembros de la veeduría, quienes se comprometen a velar por la correcta ejecución de la obra.

El objetivo de la presente acta es dejar constancia de la conformación de la Veeduría institucional que realizará este seguimiento y vigilancia al proyecto de Construcción del Comedor Escolar, específicamente en la institución educativa INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE CANALETE en el municipio de Canalete, con el fin de garantizar la transparencia, eficiencia y calidad en la ejecución de esta.

ANTICA S.A.S. BIC CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	Contrato de Interventoría No. S-CVA-007-2024 ACTA DE SOCIALIZACIÓN	ACTA DE VISITA: ☐ N°_____ COMITÉ ☐ CO: N°_____ ACTA DE SOCIALIZACIÓN: N°_____
Objeto: *INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"*		
ENTIDAD CONTRATANTE:	Departamento de córdoba	GOBERNACIÓN DE
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	

Se eligieron y quedaron formalmente constituidos los siguientes miembros de la Veeduría Ciudadana del Proyecto de la referencia en la Institución Educativa San José de Canalete:

- Wilson Murillo Ricardo – C.C. 6.681.824 – Cel. 3126656753
- Javier Eliecer Puello Mercado – C.C. 11.003.834 – Cel. 3215161942
- Eliana Ely Artuz – C.C. 35.011.116 – Cel. 3233685916

Funciones y alcance de la veeduría:

Se recordaron las principales funciones de la veeduría, incluyendo:

- Vigilar la ejecución del contrato en sus componentes técnicos, financieros, administrativos y legales.
- Hacer seguimiento a la calidad de los materiales y la mano de obra.
- Verificar el cumplimiento de los cronogramas.
- Informar a la comunidad sobre los avances del proyecto.
- Alertar a las entidades competentes sobre posibles irregularidades o incumplimientos.
- Promover la participación ciudadana.

Se aclaró que la veeduría no tiene funciones de coadministración, cogestión o coejecución, sino de control social.

Los miembros de la Veeduría Ciudadana se comprometen a:

- Ejercer sus funciones con transparencia, objetividad e imparcialidad.
- Actuar en defensa del interés general y el bienestar de la comunidad.
- Mantener una comunicación constante con las entidades responsables del proyecto.
- Cumplir con lo establecido en la ley 850 de 2003 y demás normas aplicables.

ANTICA S.A.S. B.I.C CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	Contrato de Interventoría No. S-CI-IA-007-2018-	ACTA DE LIQUIDACIÓN N°____ CONVENIO/CONTRATO: N°____
	ACTA DE SOCIALIZACIÓN	ACTA DE SOCIALIZACIÓN: N°____
Objeto: *INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"*		
ENTIDAD CONTRATANTE:	Departamento de córdoba	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la presente acta, la cual es firmada por todos los participantes.

Javier Eliecer Puello Mercado
C.C. N° 11.003.834
Veedor

Wilson Murillo Ricardo
C.C. N° 6.681.824
Veedor

Eliana Ely Artuz
C.C. N° 35.011.116
Veedor

ANTICA S.A.S. BIC Interventor	Contrato de interventoría No. SI-CMA-007-2024	ACTA DE VISITA: ☐ N°_____ COMITÉ TÉCNICO: ☐ N°_____
	ACTA DE SOCIALIZACIÓN	ACTA DE SOCIALIZACIÓN: ☐ N° 1
Objeto: *INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"*		
ENTIDAD CONTRATANTE:	Departamento de córdoba	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	CONSORCIO

FECHA: 29 DE JULIO DE 2025

LUGAR DE LA REUNION: INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUNÍN – MUNICIPIO DE TIERRALTA

TEMAS A TRATAR: SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO.

DESARROLLO DE LA SOCIALIZACIÓN:

El señor rector de la Institución Educativa le dió inicio a la socialización del proyecto con el siguiente orden del día:

Orden del Día:

1. Bienvenida a los presentes por parte del Rector de la Institución Educativa Junín.
2. Presentación del proyecto por parte del Contratista de Obra.
3. Intervención por parte de la Interventoría.
4. Espacio para dudas, preguntas e inquietudes de los participantes.
5. Conformación de la Veeduría del Proyecto.

El señor Rector de la Institución Educativa Junín, Luis Eduardo Hernandez, dio una cordial bienvenida a todos los asistentes, agradeciendo su presencia e interés en conocer los detalles del proyecto de construcción y mejoramiento de los comedores escolares en las diferentes sedes del Departamento de Córdoba, siendo la I.E Junín, una de las beneficiadas de este gran proyecto.

El Rector contextualizó a la audiencia sobre el estado actual de los espacios destinados para que los estudiantes reciban sus alimentos, destacando las limitaciones existentes. Subrayó la importancia de este proyecto, no solo como una mejora de infraestructura, sino como una iniciativa que contribuirá significativamente a una mejor calidad de vida para los estudiantes y a la creación de un espacio de recreación y esparcimiento adecuado para toda la institución.

Luego de la intervención del señor rector, el representante del contratista de obra, CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002, MARIA ISABEL QUINTERO GONZÁLEZ, tomó la palabra para

ANTICA S.A.S. BIC Interventor	Contrato de interventoría No. SI-CMA-007-2024	ACTA DE VISITA: ☐ N°_____ COMITÉ TÉCNICO: N°_____
	ACTA DE SOCIALIZACIÓN	ACTA DE SOCIALIZACIÓN: N° 1
Objeto: *INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"*		
ENTIDAD CONTRATANTE:	Departamento de córdoba	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	CONSORCIO

exponer detalladamente el proyecto mediante diapositivas para una mejor comprensión de los participantes. Su presentación incluyó:

- Generalidades del proyecto: El objetivo principal y el impacto esperado.
- Información contractual: El número del contrato, las partes involucradas, plazos de ejecución, valores de los contratos, etc.
- Alcance y descripción del proyecto: Qué se construirá y/o mejorará en la institución. Se explicaron las características de la nueva infraestructura, incluyendo aspectos de comodidad, ventilación, ahorro energético y los estándares de calidad esperados.
- Imágenes y gráficos: Se presentaron visualmente los diseños y la distribución de los espacios a intervenir en cocina y comedor, permitiendo a los asistentes una clara comprensión de la obra a ejecutar en la Institución Educativa Junín.

Seguidamente, el director de la interventoría, ANTICA S.A.S BIC, LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES intervino, expresando el firme compromiso de esta en asegurar el correcto desarrollo del proyecto. Se destacó la función de la Interventoría en realizar un seguimiento y control a todas las actividades ejecutadas por el contratista de obra, garantizando el cumplimiento de los diseños, especificaciones técnicas, normativas de calidad y de seguridad y salud en el trabajo (SST) con el fin de entregar una obra en los plazos pactados y estándares de calidad establecidos.
Así mismo, la interventoría se ofrece como un puente de comunicación entre la comunidad educativa y la Gobernación de Córdoba, para canalizar cualquier inquietud o novedad.

El Supervisor del Contrato por parte de la Gobernación de Córdoba, OSCAR PINEDA, se dirigió a los presentes, destacando la relevancia de este proyecto como un beneficio directo para la institución y toda su comunidad educativa. Enfatizó que es un éxito que esta iniciativa se esté materializando, gracias al compromiso de la administración departamental. Aseguró que, junto con la Interventoría, estará permanentemente al pendiente de que todas las actividades se ejecuten de acuerdo con lo establecido en el contrato y las especificaciones, garantizando la transparencia y la calidad de la obra.

En el mismo sentido, Se abrió un espacio para que los participantes pudieran expresar sus dudas, preguntas e inquietudes. Se abordaron diversos temas, como: los tiempos de ejecución, la afectación de las áreas durante la obra, la calidad de los materiales a utilizar, el suministro y la dotación a entregar, la participación de la comunidad en el proyecto, etc. Todas las preguntas fueron aclaradas por parte del Contratista y la Interventoría, resolviendo las inquietudes de los asistentes.

Como último punto del orden del día, se procedió a la conformación de la Veeduría Ciudadana del proyecto en la Institución Educativa Junín. Se explicó la importancia de esta figura como garante


ANTICA S.A.S. BIC Interventor	Contrato de interventoría No. SI-CMA-007-2024	ACTA DE VISITA: ☐ N°____ COMITÉ TÉCNICO: N°____
	ACTA DE SOCIALIZACIÓN	ACTA DE SOCIALIZACIÓN: N° 1
Objeto: *INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"*		
ENTIDAD CONTRATANTE:	Departamento de córdoba	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	CONSORCIO

de la transparencia y el control social de la obra. Los miembros de la veeduría fueron; Noemi Zapata Hernández, Lina Esmeralda García L, Nimia Elvira Muñoz Hernández, Aida Rosa Luna Luna, Lenys Pérez Pérez, quienes manifestaron su compromiso con el seguimiento del proyecto.

Conclusiones y Compromisos:

- La comunidad educativa de la Institución Junín fue debidamente informada sobre los alcances y beneficios del proyecto de construcción y mejoramiento del comedor escolar.
- El contratista se comprometió a ejecutar la obra bajo los estándares de calidad y en los plazos establecidos.
- La Interventoría reafirmó su rol de vigilancia y acompañamiento, sirviendo de enlace entre la comunidad y la entidad contratante.
- El Supervisor de la Gobernación reafirmó el compromiso institucional con el proyecto y su vigilancia.
- Se conformó la veeduría ciudadana para el control social del proyecto.

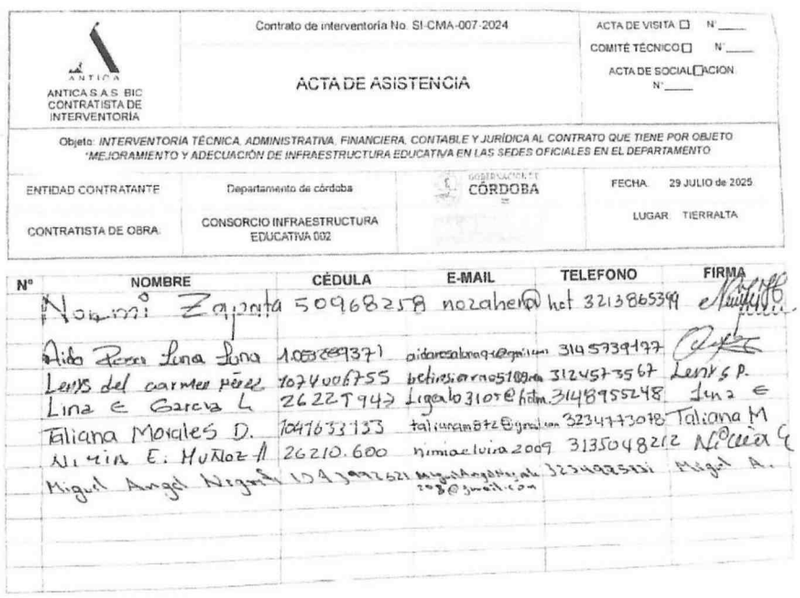Se levanta la presente acta para constancia de lo ocurrido.




ANTICA S.A.S. BIC CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	Contrato de interventoría No. SI-CMA-007-2024	ACTA DE VISITA ☐ N°____ COMITÉ TÉCNICO ☐ N°____ ACTA DE SOCIALIZACIÓN N°____
	ACTA DE ASISTENCIA	
Objeto: *INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO*		
ENTIDAD CONTRATANTE	Departamento de córdoba	FECHA: 29 JULIO de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	LUGAR: TIERRALTA

N°	NOMBRE	CÉDULA	E-MAIL	TELEFONO	FIRMA
	Noemi Zapata	50968258	nozaher@ hot	3213865399	
	Aida Rosa Luna Luna	1063269371	aidarosaluna@gmail.com	3145739197	
	Lenys del carmen Pérez	1074006755	lelivsiarna5108@	3124573567	Lenys P.
	Lina E Garcia L	26227942	ligalo3107@hotm	3148955248	Lina E
	Taliana Morales D.	1047633133	talianam87e@gmail.com	3234773048	Taliana M
	Nimia E. Muñoz H	26210.600	nimiaelvira2009	3135048212	
	Miguel Angel Negrete	1047992621	miguelangelnegrete 2018@gmail.com	3234995511	Miguel A.

ANTICA ANTICA S.A.S. BIC Interventor	Contrato de interventoría No. SI-CMA-007-2024	ACTA DE VISITA: ☐ N°_____ COMITÉ TÉCNICO: ☐ N°_____
	ACTA DE SOCIALIZACIÓN	ACTA DE SOCIALIZACIÓN: ☐ N° 1
Objeto: *INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"*		
ENTIDAD CONTRATANTE:	Departamento de córdoba	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	CONSORCIO

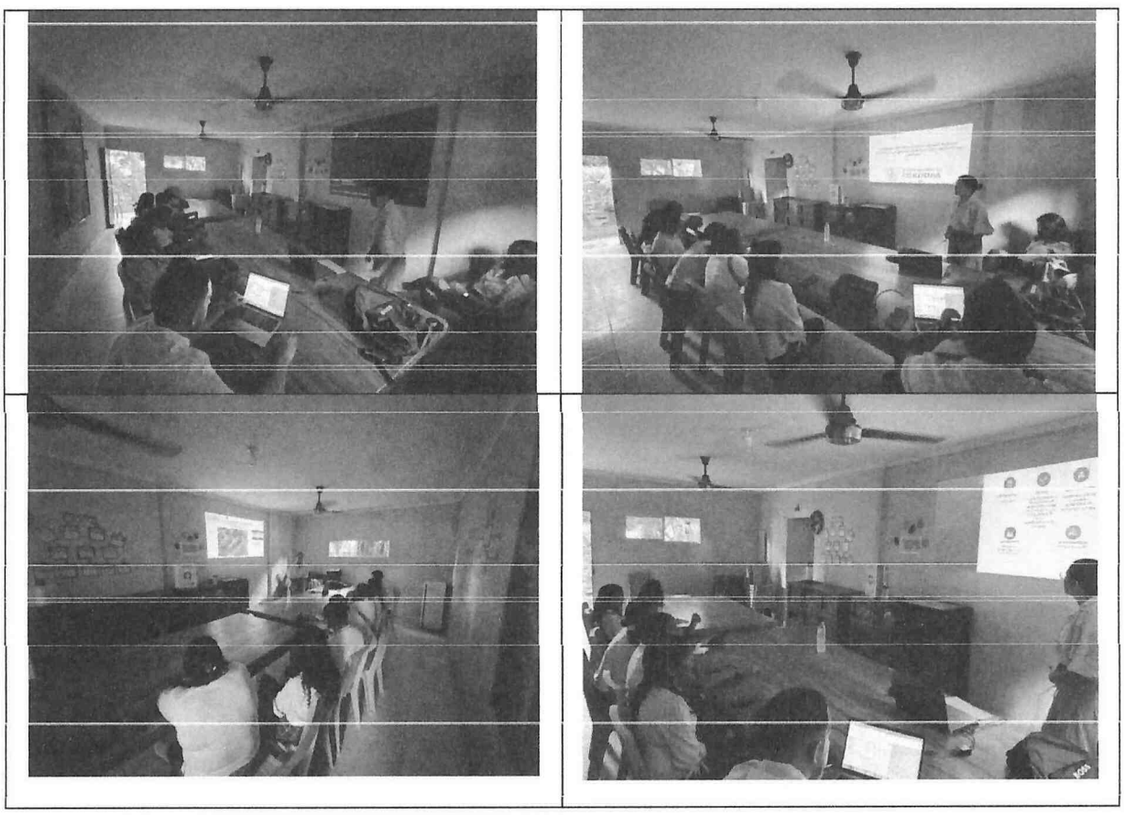REGISTRO FOTOGRÁFICO



ANTICA S.A.S. BIC Interventor	Contrato de interventoría No. SI-CMA-007-2024	ACTA DE VISITA: ☐ N°_____ COMITÉ TÉCNICO: N°_____
	ACTA DE SOCIALIZACIÓN	ACTA DE SOCIALIZACIÓN: N° 1
Objeto: *INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"*		
ENTIDAD CONTRATANTE:	Departamento de córdoba	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	CONSORCIO

FECHA: 31 DE JULIO DE 2025

LUGAR DE LA REUNION: INSTITUCIÓN EDUCATIVA PLAZA BONITA – MUNICIPIO DE PLANETA RICA

TEMAS A TRATAR: SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO.

DESARROLLO DE LA SOCIALIZACIÓN:

El señor rector de la Institución Educativa le dió inicio a la socialización del proyecto con el siguiente orden del día:

Orden del Día:

1. Bienvenida a los presentes por parte del Rector de la Institución Educativa Plaza Bonita.
2. Presentación del proyecto por parte del Contratista de Obra.
3. Intervención por parte de la Interventoría.
4. Espacio para dudas, preguntas e inquietudes de los participantes.
5. Conformación de la Veeduría del Proyecto.

El señor Rector de la Institución Educativa Plaza Bonita, Víctor Goenaga, dio una cordial bienvenida a todos los asistentes, agradeciendo su presencia e interés en conocer los detalles del proyecto de construcción y mejoramiento de los comedores escolares en las diferentes sedes del Departamento de Córdoba, siendo la I.E Plaza Bonita, una de las beneficiadas de este gran proyecto.

El Rector contextualizó a la audiencia sobre el estado actual de los espacios destinados para que los estudiantes reciban sus alimentos, destacando las limitaciones existentes. Subrayó la importancia de este proyecto, no solo como una mejora de infraestructura, sino como una iniciativa que contribuirá significativamente a una mejor calidad de vida para los estudiantes y a la creación de un espacio de recreación y esparcimiento adecuado para toda la institución.

Luego de la intervención del señor rector, el representante del contratista de obra, CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002, MARIA ISABEL QUINTERO GONZÁLEZ, tomó la palabra para

ANTICA S.A.S. BIC Interventor	Contrato de interventoría No. SI-CMA-007-2024	ACTA DE VISITA: ☐ N°_____ COMITÉ TÉCNICO: N°_____ ACTA DE SOCIALIZACIÓN: N° 1
	ACTA DE SOCIALIZACIÓN	
Objeto: *INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"*		
ENTIDAD CONTRATANTE:	Departamento de córdoba	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	CONSORCIO

exponer detalladamente el proyecto mediante diapositivas para una mejor comprensión de los participantes. Su presentación incluyó:

- Generalidades del proyecto: El objetivo principal y el impacto esperado.
- Información contractual: El número del contrato, las partes involucradas, plazos de ejecución, valores de los contratos, etc.
- Alcance y descripción del proyecto: Qué se construirá y/o mejorará en la institución. Se explicaron las características de la nueva infraestructura, incluyendo aspectos de comodidad, ventilación, ahorro energético y los estándares de calidad esperados.
- Imágenes y gráficos: Se presentaron visualmente los diseños y la distribución de los espacios a intervenir en cocina y comedor, permitiendo a los asistentes una clara comprensión de la obra a ejecutar en la Institución Educativa Plaza Bonita.

Seguidamente, el director de la interventoría, ANTICA S.A.S BIC, LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES intervino, expresando el firme compromiso de esta en asegurar el correcto desarrollo del proyecto. Se destacó la función de la Interventoría en realizar un seguimiento y control a todas las actividades ejecutadas por el contratista de obra, garantizando el cumplimiento de los diseños, especificaciones técnicas, normativas de calidad y de seguridad y salud en el trabajo (SST) con el fin de entregar una obra en los plazos pactados y estándares de calidad establecidos.
Así mismo, la interventoría se ofrece como un puente de comunicación entre la comunidad educativa y la Gobernación de Córdoba, para canalizar cualquier inquietud o novedad.

El Supervisor del Contrato por parte de la Gobernación de Córdoba, OSCAR PINEDA, se dirigió a los presentes, destacando la relevancia de este proyecto como un beneficio directo para la institución y toda su comunidad educativa. Enfatizó que es un éxito que esta iniciativa se esté materializando, gracias al compromiso de la administración departamental. Aseguró que, junto con la Interventoría, estará permanentemente al pendiente de que todas las actividades se ejecuten de acuerdo con lo establecido en el contrato y las especificaciones, garantizando la transparencia y la calidad de la obra.

En el mismo sentido, Se abrió un espacio para que los participantes pudieran expresar sus dudas, preguntas e inquietudes. Se abordaron diversos temas, como: los tiempos de ejecución, la afectación de las áreas durante la obra, la calidad de los materiales a utilizar, el suministro y la dotación a entregar, la participación de la comunidad en el proyecto, etc. Todas las preguntas fueron aclaradas por parte del Contratista y la Interventoría, resolviendo las inquietudes de los asistentes.

Como último punto del orden del día, se procedió a la conformación de la Veeduría Ciudadana del proyecto en la Institución Educativa Plaza Bonita. Se explicó la importancia de esta figura como


ANTICA S.A.S. BIC Interventor	Contrato de interventoría No. SI-CMA-007-2024	ACTA DE VISITA: ☐ N°____ COMITÉ TÉCNICO: ☐ N°____
	ACTA DE SOCIALIZACIÓN	ACTA DE SOCIALIZACIÓN: ☐ N° 1
Objeto: *INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"*		
ENTIDAD CONTRATANTE:	Departamento de córdoba	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	CONSORCIO

garante de la transparencia y el control social de la obra. Los miembros de la veeduría fueron; Caris Valeta Calle, Diana Moris Petro, Xenia Jiménez Ayala, Dairo José Yanis R, quienes manifestaron su compromiso con el seguimiento del proyecto.

Conclusiones y Compromisos:

- La comunidad educativa de la Institución Plaza Bonita fue debidamente informada sobre los alcances y beneficios del proyecto de construcción y mejoramiento del comedor escolar.
- El contratista se comprometió a ejecutar la obra bajo los estándares de calidad y en los plazos establecidos.
- La Interventoría reafirmó su rol de vigilancia y acompañamiento, sirviendo de enlace entre la comunidad y la entidad contratante.
- El Supervisor de la Gobernación reafirmó el compromiso institucional con el proyecto y su vigilancia.
- Se conformó la veeduría ciudadana para el control social del proyecto.

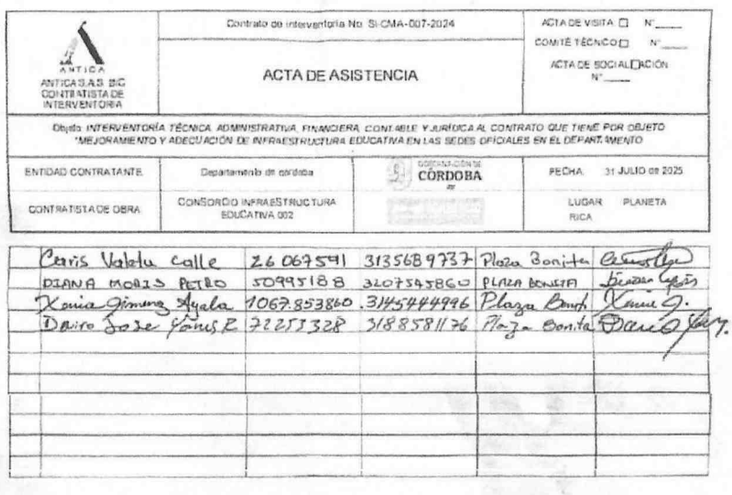Se levanta la presente acta para constancia de lo ocurrido.




ANTICA S.A.S. BIC CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	Contrato de interventoría No. SI-CMA-007-2024	ACTA DE VISITA ☐ N°____ COMITÉ TÉCNICO ☐ N°____ ACTA DE SOCIALIZACIÓN N°____
	ACTA DE ASISTENCIA	
Objeto: *INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO*		
ENTIDAD CONTRATANTE:	Departamento de córdoba — GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	FECHA: 31 JULIO de 2025
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	LUGAR: PLANETA RICA

Caris Valeta Calle	26 067591	3135689737	Plaza Bonita	
DIANA MORIS PETRO	50995188	3207543860	PLAZA BONITA	
Xenia Jimenez Ayala	1067853860	3145444996	Plaza Bonita	
Dairo Jose Yanis R	72251328	3188581176	Plaza Bonita	

ANTICA ANTICA S.A.S. BIC Interventor	Contrato de interventoría No. SI-CMA-007-2024	ACTA DE VISITA: ☐ N°_____ COMITÉ TÉCNICO: ☐ N°_____
	ACTA DE SOCIALIZACIÓN	ACTA DE SOCIALIZACIÓN: ☐ N° 1
Objeto: *INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"*		
ENTIDAD CONTRATANTE:	Departamento de córdoba	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	CONSORCIO

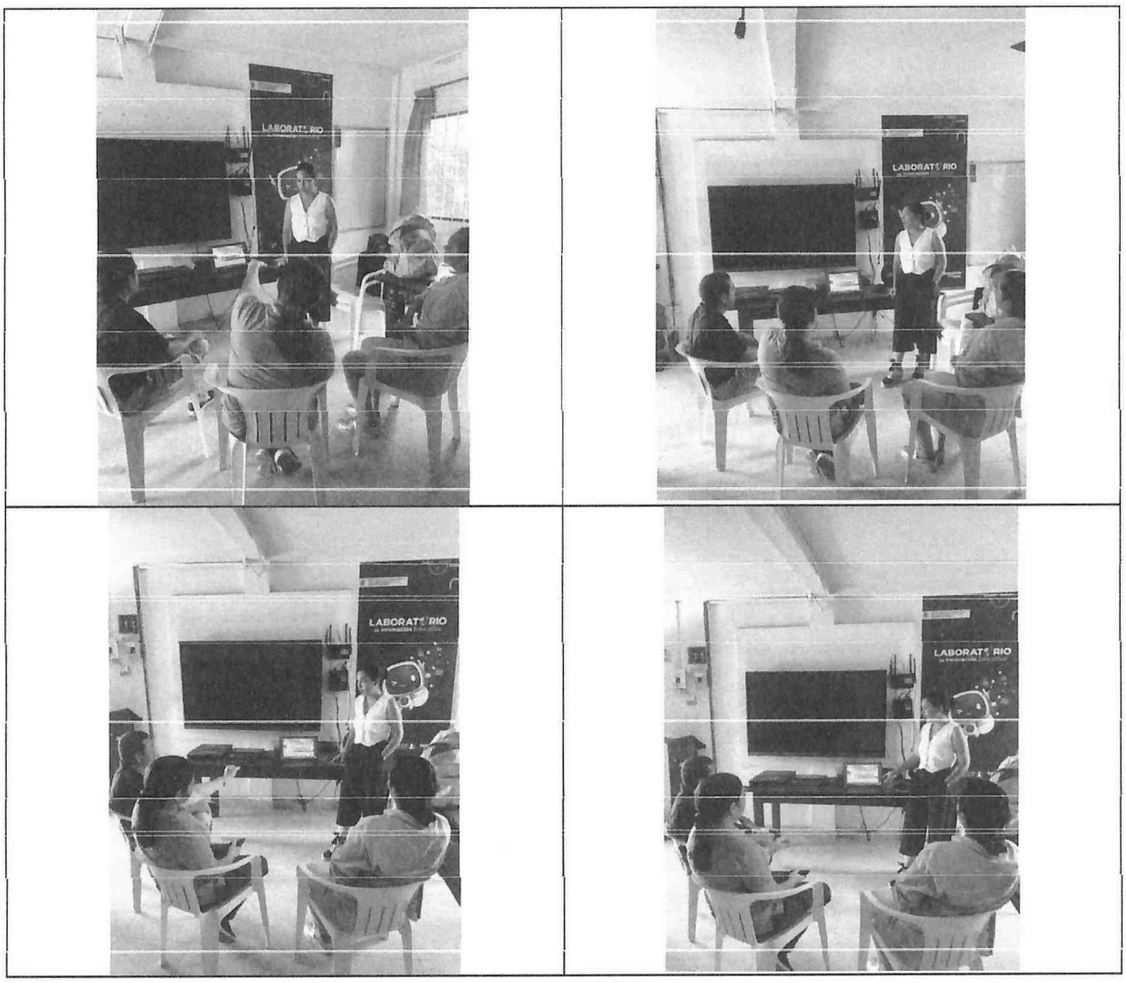REGISTRO FOTOGRÁFICO



ANTICA ANTICA S.A.S. BIC CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. SI-CMA-007-2024	ACTA DE VISITA: ☐ N°___ COMITÉ TÉCNICO: ☐ N°___
	ACTA DE SOCIALIZACIÓN	ACTA DE SOCIALIZACIÓN: ☒ N°___
OBJETO: *INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"*		
ENTIDAD CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	CONSORCIO

FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025

LUGAR DE LA REUNION: INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ÉBANO – MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS

TEMAS A TRATAR: SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO.

DESARROLLO DE LA SOCIALIZACIÓN:

El señor rector de la Institución Educativa El Ébano, dio inicio a la socialización del proyecto con el siguiente orden del día:

Orden del Día:

1. Bienvenida a los presentes por parte del Rector de la Institución Educativa El Ébano.
2. Presentación del proyecto por parte del Contratista de Obra.
3. Intervención por parte de la Interventoría.
4. Espacio para dudas, preguntas e inquietudes de los participantes.
5. Conformación de la Veeduría del Proyecto.

El señor Rector de la Institución Educativa El Ébano, José Jimenez , dio una cordial bienvenida a todos los asistentes, agradeciendo su presencia e interés en conocer los detalles del proyecto de construcción y mejoramiento de los comedores escolares en las diferentes sedes del Departamento de Córdoba, siendo la I.E El Ébano, una de las beneficiadas de este gran proyecto.

El Rector contextualizó a la audiencia sobre el estado actual de los espacios destinados para que los estudiantes reciban sus alimentos, destacando las limitaciones existentes. Subrayó la importancia de este proyecto, no solo como una mejora de infraestructura, sino como una iniciativa que contribuirá significativamente a una mejor calidad de vida para los estudiantes y a la creación de un espacio de recreación y esparcimiento adecuado para toda la institución.

ANTICA S.A.S. BIC CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. SI-CMA-007-2024	ACTA DE VISITA: ☐ N°___ COMITÉ TÉCNICO: ☐ N°___ ACTA DE SOCIALIZACIÓN: ☒ N°___
	ACTA DE SOCIALIZACIÓN	
OBJETO: *INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"*		
ENTIDAD CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	CONSORCIO

Luego de la intervención del señor rector, el representante del contratista de obra, CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002, MARIA ISABEL QUINTERO GONZÁLEZ, tomó la palabra para exponer detalladamente el proyecto mediante diapositivas para una mejor comprensión de los participantes. Su presentación incluyó:

* Generalidades del proyecto: El objetivo principal y el impacto esperado.

* Información contractual: El número del contrato, las partes involucradas, plazos de ejecución, valores de los contratos, etc.

* Alcance y descripción del proyecto: Qué se construirá y/o mejorará en la institución. Se explicaron las características de la nueva infraestructura, incluyendo aspectos de comodidad, ventilación, ahorro energético y los estándares de calidad esperados.

* Imágenes y gráficos: Se presentaron visualmente los diseños y la distribución de los espacios a intervenir en cocina y comedor, permitiendo a los asistentes una clara comprensión de la obra a ejecutar en la Institución Educativa El Ébano.

Seguidamente, el representante legal de la interventoría, ANTICA S.A.S BIC, JUAN PABLO BANQUEZ GONZALEZ intervino, expresando el firme compromiso de esta en asegurar el correcto desarrollo del proyecto. Se destacó la función de la Interventoría en realizar un seguimiento y control a todas las actividades ejecutadas por el contratista de obra, garantizando el cumplimiento de los diseños, especificaciones técnicas, normativas de calidad y de seguridad y salud en el trabajo (SST) con el fin de entregar una obra en los plazos pactados y estándares de calidad establecidos. Así mismo, la interventoría se ofrece como un puente de comunicación entre la comunidad educativa y la Gobernación de Córdoba, para canalizar cualquier inquietud o novedad.

El Supervisor del Contrato por parte de la Gobernación de Córdoba, OSCAR PINEDA, se dirigió a los presentes, destacando la relevancia de este proyecto

ANTICA S.A.S. BIC CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. SI-CMA-007-2024 **ACTA DE SOCIALIZACIÓN**	ACTA DE VISITA: ☐ N°___ COMITÉ TÉCNICO: ☐ N°___ ACTA DE SOCIALIZACIÓN: ☒ N°___
OBJETO: *INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"*		
ENTIDAD CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	CONSORCIO

como un beneficio directo para la institución y toda su comunidad educativa. Enfatizó que es un éxito que esta iniciativa se esté materializando, gracias al compromiso de la administración departamental. Aseguró que, junto con la Interventoría, estará permanentemente al pendiente de que todas las actividades se ejecuten de acuerdo con lo establecido en el contrato y las especificaciones, garantizando la transparencia y la calidad de la obra.

En el mismo sentido, Se abrió un espacio para que los participantes pudieran expresar sus dudas, preguntas e inquietudes. Se abordaron diversos temas, como: los tiempos de ejecución, la afectación de las áreas durante la obra, la calidad de los materiales a utilizar, el suministro y la dotación a entregar, la participación de la comunidad en el proyecto, etc. Todas las preguntas fueron aclaradas por parte del Contratista y la Interventoría, resolviendo las inquietudes de los asistentes. Como último punto del orden del día, se procedió a la conformación de la Veeduría Ciudadana del proyecto en la Institución Educativa El Ébano.

Se explicó la importancia de esta figura como garante de la transparencia y el control social de la obra. Los miembros de la veeduría fueron; José Jiménez, Adalberto González Medrano, Jorge Eliécer Martínez, Martha Liliana Berna Lozano y Pablo Barrios Estrella, quienes manifestaron su compromiso con el seguimiento del proyecto.

Conclusiones y Compromisos:

• La comunidad educativa de la Institución El Ébano fue debidamente informada sobre los alcances y beneficios del proyecto de construcción y mejoramiento del comedor escolar.

• El contratista se comprometió a ejecutar la obra bajo los estándares de calidad y en los plazos establecidos.

• La Interventoría reafirmó su rol de vigilancia y acompañamiento, sirviendo de enlace entre la comunidad y la entidad contratante.

ANTICA S.A.S. BIC CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. SI-CMA-007-2024	ACTA DE VISITA: ☐ N°___ COMITÉ TÉCNICO: ☐ N°___
	ACTA DE SOCIALIZACIÓN	ACTA DE SOCIALIZACIÓN: ☒ N°___
OBJETO: *INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"*		
ENTIDAD CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	CONSORCIO


• El Supervisor de la Gobernación reafirmó el compromiso institucional con el proyecto y su vigilancia.

• Se conformó la veeduría ciudadana para el control social del proyecto. Se levanta la presente acta para constancia de lo ocurrido.

Nombre	Cedula	Telefono	firma.
José G. Jiménez Tirado	15.701.024	3205173441	
Adalberto González Medrano	1063649879	3212001910	
Franklin Ladeus Hernandez	1063650231	3235748805	
Valentina González Medrano	1063650960	3226093703	
Pablo Bamol Estrella	6.887.746	3168128168	
Martha Berna Lotano	35005532	3145372174	
Jorge Eliecer Ordoñez Hoyos	15047360	3106846208	

ANTICA S.A.S. BIC CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. SI-CMA-007-2024	ACTA DE VISITA: ☐ N°___ COMITÉ TÉCNICO: ☐ N°___ ACTA DE SOCIALIZACIÓN: ☒ N°___
	ACTA DE SOCIALIZACIÓN	
OBJETO: *INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"*		
ENTIDAD CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002

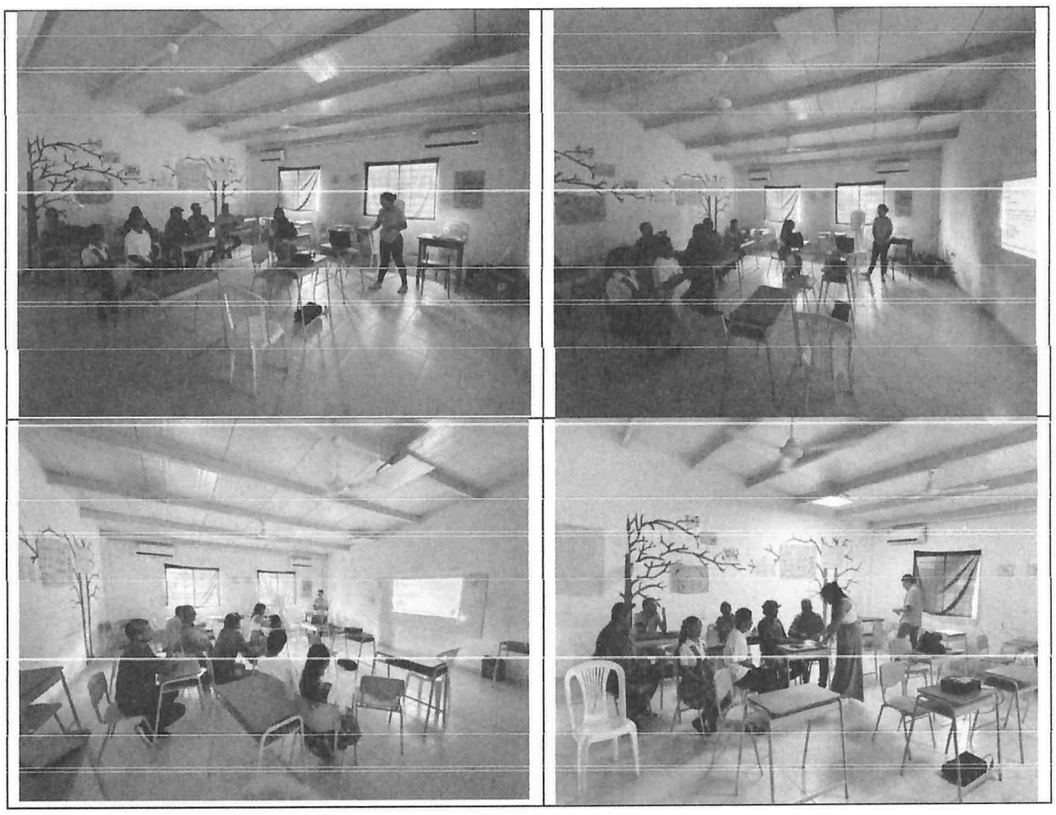REGISTRO FOTOGRÁFICO



ANEXO N°3: INFORMES SEMANALES DE LA INTERVENTORÍA

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002 — CONTRATO No: SI-LP-002-2024

INTERVENTORÍA: ANTICA S.A.S. BIC — CONTRATO No: SI-CMA-007-2024

Semana Número: 23 — Del: 18/08/2025 — Al: 24/08/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 161 Días

Supervisor: CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	8,29%	64,45%
Valor básico de la Obra programada:	$ 342.880.767,00	$ 2.664.924.732,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	1,61%	46,76%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 66.760.397,50	$ 1.933.667.865,97

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002
Contrato No.	SI-LP-002-2024
Valor Inicial:	$ 4.135.056.075,00
Valor Actualizado:	$ 4.135.056.075,00
Plazo Inicial:	8 MESES
Plazo Actualizado:	8 MESES
Fecha de iniciación:	17 de marzo de 2025
Fecha de Vencimiento:	17 de noviembre de 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

Interventor:	ANTICA S.A.S. BIC
Contrato No.	SI-CMA-007-2024
Valor Inicial:	$ 350.649.999,00
Valor Actualizado:	$ 350.649.999,00
Plazo Inicial:	8 MESES
Plazo Actualizado:	8 MESES
Fecha de iniciación:	17 de marzo de 2025
Fecha de Vencimiento:	17 de noviembre de 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	TOTAL
2,02	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0.30 X 0.30 MTS	ML	35,00	$ 6.543,00	$ 229.005,00
2,04	RELLENO DEL AREA CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	104,59	$ 200.140,00	$ 20.932.642,60
2,05	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE 10 KM	M3	10,05	$ 22.830,00	$ 229.441,50
4,01	COLUMNAS DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	41,00	$ 135.680,00	$ 5.562.880,00
4,02	VIGA SUPERIOR DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	17,50	$ 135.759,00	$ 2.375.782,50
4,03	ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA ESTRUCTURAS	KG	1057,80	$ 9.658,00	$ 10.216.232,40
9,01	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL DE TUBERIA PRESION	ML	82,00	$ 2.798,00	$ 229.436,00
9,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 1/2" PVC RDE 9, PARA SOLDAR	ML	35,00	$ 12.259,00	$ 429.065,00
9,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 3/4" PVC, RDE 21, PARA SOLDAR	ML	18,00	$ 15.603,00	$ 280.854,00
9,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 1" PVC, RDE 21, PARA SOLDAR	ML	29,00	$ 14.626,00	$ 424.154,00
9,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO	UND	14,00	$ 33.494,00	$ 468.916,00
9,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE UNIÓN MACHO GALVANIZADO 1" L=50CM	UND	6,00	$ 116.469,00	$ 698.814,00
9,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE UNIÓN MACHO GALVANIZADO 1" L=15CM	UND	8,00	$ 33.322,00	$ 266.576,00
9,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION UNIVERSAL GALVANIZADA	UND	2,00	$ 57.277,00	$ 114.554,00
9,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO GALVANIZADO 1"	UND	2,00	$ 46.500,00	$ 93.000,00
9,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE GALVANIZADA 1"	UND	4,00	$ 27.150,00	$ 108.600,00
9,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN GALVANIZADO 1"	UND	2,00	$ 18.049,00	$ 36.098,00
9,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA CHECK VERTICAL BRONCE 1"	UND	4,00	$ 76.785,00	$ 307.140,00
9,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE CIERRE RÁPIDO METÁLICA 1"	UND	10,00	$ 76.785,00	$ 767.850,00
9,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE REGISTRO 1/2" , INCLUYE TAPA REGISTRO 15X15CM	UND	35,00	$ 57.691,00	$ 2.019.185,00
9,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE REGISTRO 1", INCLUYE TAPA REGISTRO 15X15CM	UND	15,00	$ 59.062,00	$ 885.930,00
9,16	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL DE TUBERIA SANITARIA	ML	117,00	$ 2.798,00	$ 327.366,00
9,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 2" PVC, PARA SOLDAR	ML	36,00	$ 34.840,00	$ 1.254.240,00
9,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 3" PVC, PARA SOLDAR	ML	15,00	$ 46.441,00	$ 696.615,00
9,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 4" PVC, PARA SOLDAR	ML	38,00	$ 62.212,00	$ 2.364.056,00
9,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA VENTILACION 2" PVC, PARA SOLDAR	ML	24,00	$ 57.990,00	$ 1.391.760,00
9,21	PUNTO SANITARIO 2"	UND	28,00	$ 66.284,00	$ 1.855.952,00
9,22	PUNTO SANITARIO 4"	UND	2,00	$ 82.396,00	$ 164.792,00
9,23	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION 60X60X100 CM	UND	6,00	$ 618.920,00	$ 3.713.520,00
1,01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	M2	312,00	$ 4.287,00	$ 1.337.544,00
1,02	ADECUACIÓN Y NIVELACIÓN DE TERRENO	M2	312,00	$ 7.514,00	$ 2.344.368,00
1,03	S/I CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE, H=2.10 MTS PARA OBRAS	ML	74,00	$ 21.007,00	$ 1.554.518,00
2,01	EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS DE 1.00 X 1.00 MTS	M3	28,50	$ 39.259,00	$ 1.118.881,50
2,03	REEMPLAZO O MEJORAMIENTO DEL TERRENO DEBAJO DE ZAPATAS EN PIEDRA RAJON - MATERIAL SELECCIONADO (80/20)	M3	9,50	$ 206.382,00	$ 1.960.629,00
				COSTO TOTAL (INCLUYE AIU)	$ 66.760.397,50
				PORCENTAJE (%) EJECUTADO SEMANAL	1,61%
				PORCENTAJE (%) DE ATRASO O AVANCE SEMANAL	-6,68%

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

RELLENO DEL AREA CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	COLUMNAS DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)
ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA ESTRUCTURAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA 1/2HP (INCLUYE MANIFOLD DE SUCCIÓN)
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA DE GRASA EN CONCRETO DE 4000 PSI	CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) PARA FONDO TANQUE INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO.
ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA PARA ESTRUCTURA TANQUE	


ACTIVIDADES SISO, AMBIENTALES Y SOCIALES

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

AVANCE FINANCIERO DE OBRA		
RESUMEN DE ACTAS PAGADAS		% DE AVANCE
ANTICIPO	$ 1.240.516.822,50	0,00%
ACTA PARCIAL 1:	$ 1.261.079.816,77	30,50%
ACTA PARCIAL 2:	$ -	0,00%
ACTA PARCIAL 3:	$ -	0,00%
TOTAL ACUMULADO	$ 1.261.079.816,77	30,50%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA		
RESUMEN DE ACTAS PAGADAS		% DE AVANCE
ACTA PARCIAL 1:	$ -	0,00%
ACTA PARCIAL 2:	$ -	0,00%
ACTA PARCIAL 3:	$ -	0,00%
TOTAL ACUMULADO	$ -	0,00%

	%Programado	% Ejecutado
Acumulado anterior	56,16%	45,15%
Durante el periodo	8,29%	1,61%
Acumulado actual	64,45%	46,76%
Atraso o avance acumulado	-17,68%	

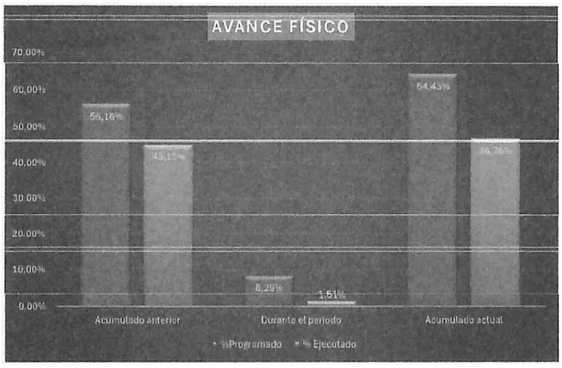

OBSERVACIONES

REPRESENTANTE LEGAL DE ANTICA S.A.S BIC

Firma

Nombre: JUAN PABLO BANQUEZ GONZALEZ

Matrícula No. : 081037-0586460 COR

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción: COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000PSI


FOTO 1.



Descripción: RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO

FOTO 2.

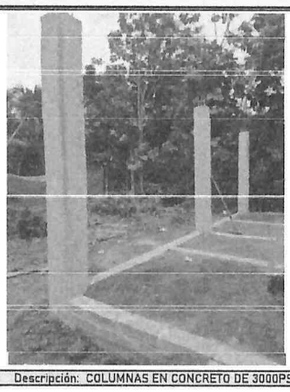INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA




Descripción: COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000PSI

FOTO 3.




Descripción: LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL DE TUBERIA PRESION

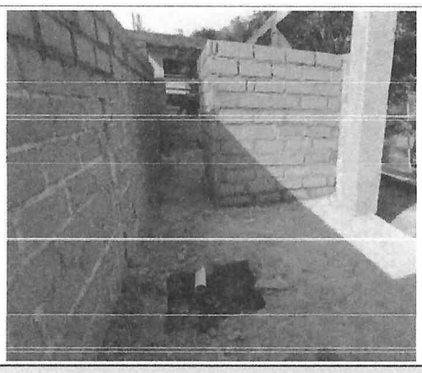FOTO 4.




Descripción: CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION 60X60X100 CM

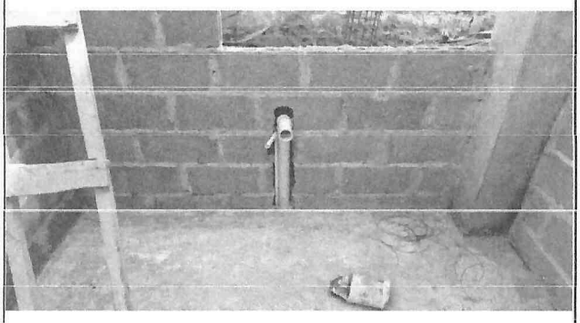FOTO 5.




Descripción: PUNTO SANITARIO 2"

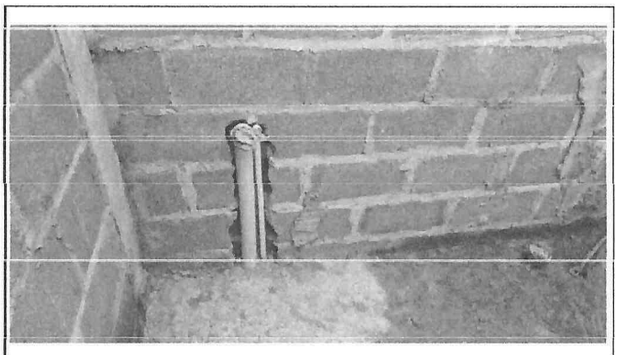FOTO 6.



Descripción: PUNTO SANITARIO Y PUNTO HIDRAULICO

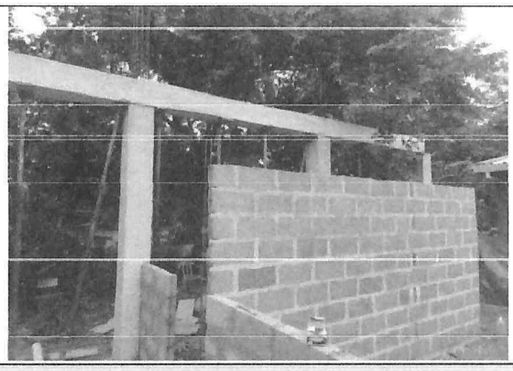FOTO 7.



Descripción: VIGA SUPERIOR


FOTO 8.

ANTIOQUIA

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA


GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

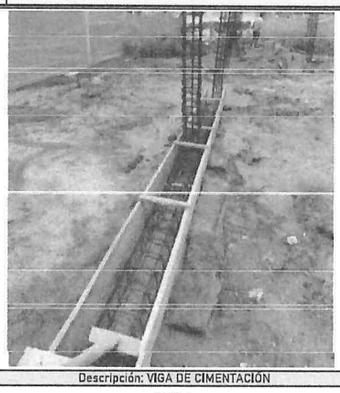CONSORCIO




Descripción: VIGA DE CIMENTACIÓN

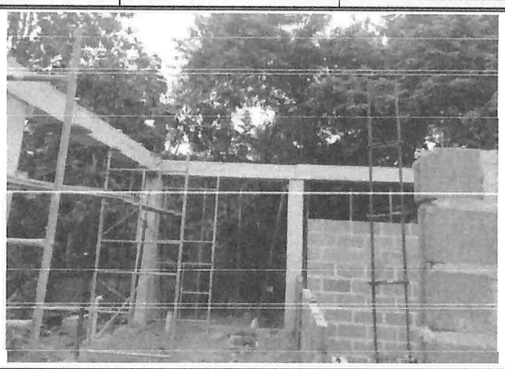FOTO 9.




Descripción: VIGA DE AMARRE SUPERIOR

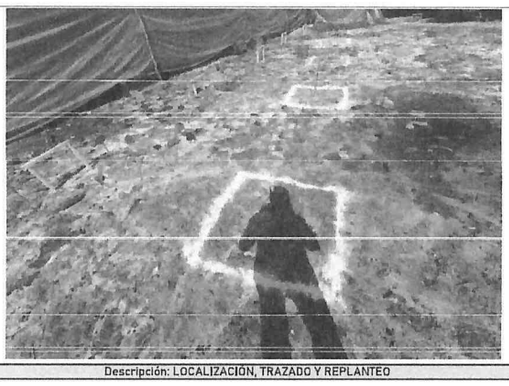FOTO 10.



Descripción: LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO

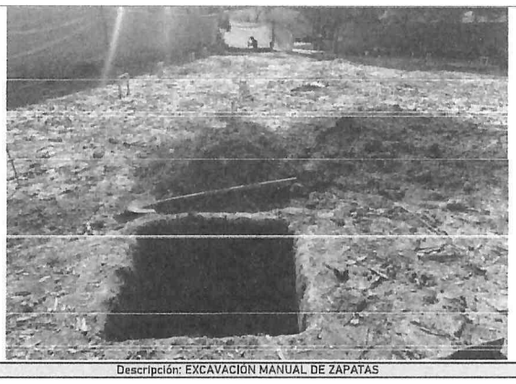FOTO 11.



Descripción: EXCAVACIÓN MANUAL DE ZAPATAS

FOTO 12.

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002 — CONTRATO No: SI-LP-002-2024

INTERVENTORÍA: ANTICA S.A.S. BIC — CONTRATO No: SI-CMA-007-2024

Semana Número: 24 — Del: 25/08/2025 — Al: 31/08/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 168 Días

Supervisor: CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	2,51%	58,66%	Obra Física Ejecutada (%)	1,09%	47,85%
Valor básico de la Obra programada:	$ 103.740.205,00	$ 2.425.784.170,00	Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 44.869.116,04	$ 1.978.536.982,01

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
Contratista:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	Interventor:	ANTICA S.A.S. BIC
Contrato No.	SI-LP-002-2024	Contrato No.	SI-CMA-007-2024
Valor Inicial:	$ 4.135.056.075,00	Valor Inicial:	$ 350.649.999,00
Valor Actualizado:	$ 4.135.056.075,00	Valor Actualizado:	$ 350.649.999,00
Plazo Inicial:	8 MESES	Plazo Inicial:	8 MESES
Plazo Actualizado:	8 MESES	Plazo Actualizado:	8 MESES
Fecha de Iniciación:	17 de marzo de 2025	Fecha de Iniciación:	17 de marzo de 2025
Fecha de Vencimiento:	17 de noviembre de 2025	Fecha de Vencimiento:	17 de noviembre de 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VALOR UNITARIO	TOTAL
2,02	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0.30 X 0.30 MTS	ML	68,10	$ 6.543,00	$ 445.578,30
2,05	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE 10 KM	M3	37,05	$ 22.830,00	$ 845.851,50
3,02	ZAPATAS DE 1.00 X 1.00 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	M3	5,70	$ 1.020.946,00	$ 5.819.392,20
3,03	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	59,40	$ 124.557,00	$ 7.398.685,80
3,04	ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA CIMENTACIÓN	KG	1033,49	$ 9.658,00	$ 9.981.446,42
4,01	COLUMNAS DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	38,95	$ 135.680,00	$ 5.284.736,00
4,03	ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA ESTRUCTURAS	KG	1562,79	$ 9.658,00	$ 15.093.425,82
				COSTO TOTAL (INCLUYE AIU)	$ 44.869.116,04
				PORCENTAJE (%) EJECUTADO SEMANAL	1,09%
				PORCENTAJE (%) DE ATRASO O AVANCE SEMANAL	-1,42%

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

COLUMNAS DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TANQUE
COLUMNA DE 0.40 X 0.40 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA PARA COLUMNA Y ZAPATA TANQUE
S/I CINTA PVC O-22	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA PARA ESTRUCTURA TANQUE


ACTIVIDADES SI50, AMBIENTALES Y SOCIALES

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

AVANCE FINANCIERO DE OBRA		
RESUMEN DE ACTAS PAGADAS		% DE AVANCE
ANTICIPO	$ 1.240.516.822,50	0,00%
ACTA PARCIAL 1:	$ 1.261.079.816,77	30,50%
ACTA PARCIAL 2:	$ -	0,00%
ACTA PARCIAL 3:	$ -	0,00%
TOTAL ACUMULADO	$ 1.261.079.816,77	30,50%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA		
RESUMEN DE ACTAS PAGADAS		% DE AVANCE
ACTA PARCIAL 1:	$ -	0,00%
ACTA PARCIAL 2:	$ -	0,00%
ACTA PARCIAL 3:	$ -	0,00%
TOTAL ACUMULADO	$ -	0,00%

	%Programado	% Ejecutado
Acumulado anterior	64,45%	46,76%
Durante el periodo	2,51%	1,09%
Acumulado actual	66,96%	47,85%
Atraso o avance acumulado	-19,11%	

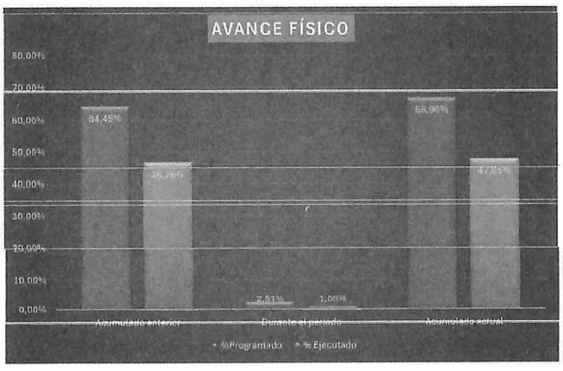

OBSERVACIONES

REPRESENTANTE LEGAL DE ANTICA S.A.S BIC

Firma

Nombre: JUAN PABLO BANQUEZ GONZALEZ

Matrícula No. : 081037-0586460 COR

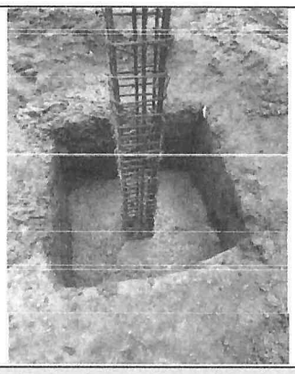
ANTIGA

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA


CONSORCIO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción: ZAPATA EN CONCRETO DE 3000PSI

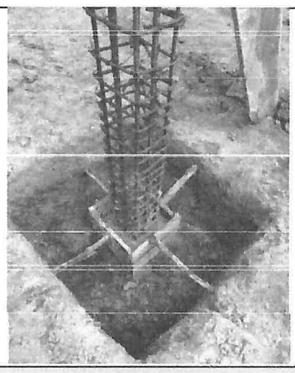FOTO 1.



Descripción: PEDESTAL EN CONCRETO - ACERO DE ESTRUCTURA

FOTO 2.




Descripción: ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAS

FOTO 3.




Descripción: ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAS

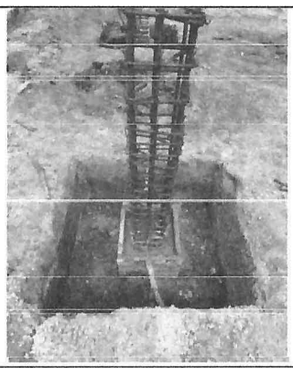FOTO 4.



Descripción: PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000PSI

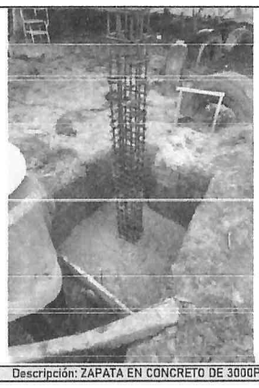FOTO 5.



Descripción: ZAPATA EN CONCRETO DE 3000PSI

FOTO 6.

673

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

ANTICA | GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002 — CONTRATO No: SI-LP-002-2024

INTERVENTORÍA: ANTICA S.A.S. BIC — CONTRATO No: SI-CMA-007-2024

Semana Número: 25 — Del: 1/09/2025 — Al: 7/09/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 175 Días

Supervisor: CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,91%	67,87%	Obra Física Ejecutada (%)	1,83%	49,68%
Valor básico de la Obra programada:	$ 37.786.040,00	$ 2.806.450.977,00	Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 75.877.798,11	$ 2.054.414.780,12

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
Contratista:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	Interventor:	ANTICA S.A.S. BIC
Contrato No.	SI-LP-002-2024	Contrato No.	SI-CMA-007-2024
Valor Inicial:	$ 4.135.056.075,00	Valor Inicial:	$ 350.649.999,00
Valor Actualizado:	$ 4.135.056.075,00	Valor Actualizado:	$ 350.649.999,00
Plazo Inicial:	8 MESES	Plazo Inicial:	8 MESES
Plazo Actualizado:	8 MESES	Plazo Actualizado:	8 MESES
Fecha de Iniciación:	17 de marzo de 2025	Fecha de Iniciación:	17 de marzo de 2025
Fecha de Vencimiento:	17 de noviembre de 2025	Fecha de Vencimiento:	17 de noviembre de 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	TOTAL
5,01	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE SEMIESTRUCTURAL DE 0.12MTS X 0.20MTS X 0.40MTS CON PEGA DE MORTERO 1:4	M2	222,51	$ 99.267,00	$ 22.087.900,17
3,01	SOLADO EN CONCRETO E = 0.05 MTS DE 14 MPA (2000 PSI)	M3	0,95	$ 890.152,00	$ 845.644,40
2,04	RELLENO DEL AREA CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	12,10	$ 200.140,00	$ 2.421.694,00
9,40	EXCAVACIÓN MANUAL PARA TANQUE	M3	31,55	$ 39.259,00	$ 1.238.621,45
9,41	REEMPLAZO O MEJORAMIENTO DEL TERRENO PARA SUPERFICIE DE APOYO DE TANQUE EN PIEDRA RAJON - MATERIAL SELECCIONADO (80/20)	M3	5,79	$ 206.382,00	$ 1.192.887,94
9,42	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE 10 KM	M3-KM	41,02	$ 22.831,00	$ 936.527,62
9,44	CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) PARA FONDO TANQUE INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO.	M3	2,31	$ 1.195.256,00	$ 2.761.041,36
9,45	S/I CINTA PVC O-22	ML	19,60	$ 106.274,00	$ 2.082.970,40
9,46	CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) PARA TAPA Y MUROS DE TANQUE INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO	M3	7,80	$ 1.270.097,00	$ 9.906.756,60
9,47	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA PARA ESTRUCTURA TANQUE	KG	612,33	$ 9.658,00	$ 5.913.883,14
10,01	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO (incluye interruptor, Tubería PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG)	UND	8,00	$ 251.975,00	$ 2.015.800,00
10,02	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE (incluye interruptor, Tubería PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG)	UND	2,00	$ 254.729,00	$ 509.458,00
10,06	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA Y CFCI, (incluye TOMA DOBLE 15A - 125V, Tuberia PVC SCH40, Tubería EMT, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG) TD1-C-2-C4-C6-C8-10-12-14-16	UND	24,00	$ 203.416,00	$ 4.881.984,00
10,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA PUESTA A TIERRA (incluye Tubería PVC, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°8AWG)	UND	1,00	$ 1.914.256,00	$ 1.914.256,00
10,09	SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA EN Cu 2xN°8F + 1xN°8N (incluye Tuberia PVC, cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas)	ML	4,17	$ 147.633,00	$ 615.629,61
10,11	SALIDA PARA TV (incluye TOMA TV, Tuberia PVC SCH40, Tubería EMT, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Coaxial RG-6)	UND	2,00	$ 202.067,00	$ 404.134,00
11,24	S/I DE PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 0.50X0.50 MTS COLOR BLANCA O BEIGE	M2	98,60	$ 163.779,00	$ 16.148.609,40
				COSTO TOTAL (INCLUYE AIU)	$ 75.877.798,11
				PORCENTAJE (%) EJECUTADO SEMANAL	1,83%
				PORCENTAJE (%) DE ATRASO O AVANCE SEMANAL	0,92%

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

COLUMNAS DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	VIGA SUPERIOR DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)
TANQUE ELEVADO DE 2000L PLÁSTICO	PLACA EN CONCRETO DE 2.00 m X 2.00 m X 0.17 m DE 3000 PSI INCLUYE REF. VARILLA DE 3/8 @ 0.15MT PARA TANQUE ELEVADO
CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) PARA TAPA Y MUROS DE TANQUE INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO	EXCAVACIÓN MANUAL PARA TANQUE

ACTIVIDADES SISO, AMBIENTALES Y SOCIALES

871

ANTICA

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA


CONSORCIO

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

AVANCE FINANCIERO DE OBRA			
RESUMEN DE ACTAS PAGADAS			% DE AVANCE
ANTICIPO	$	1.240.516.822,50	0,00%
ACTA PARCIAL 1:	$	1.261.079.816,77	30,50%
ACTA PARCIAL 2:	$	-	0,00%
ACTA PARCIAL 3:	$	-	0,00%
TOTAL ACUMULADO	$	1.261.079.816,77	30,50%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA			
RESUMEN DE ACTAS PAGADAS			% DE AVANCE
ACTA PARCIAL 1:	$	-	0,00%
ACTA PARCIAL 2:	$	-	0,00%
ACTA PARCIAL 3:	$	-	0,00%
TOTAL ACUMULADO	$	-	0,00%

	%Programado	% Ejecutado
Acumulado anterior	66,96%	47,85%
Durante el periodo	0,91%	1,83%
Acumulado actual	67,87%	49,68%
Atraso o avance acumulado	-18,19%	

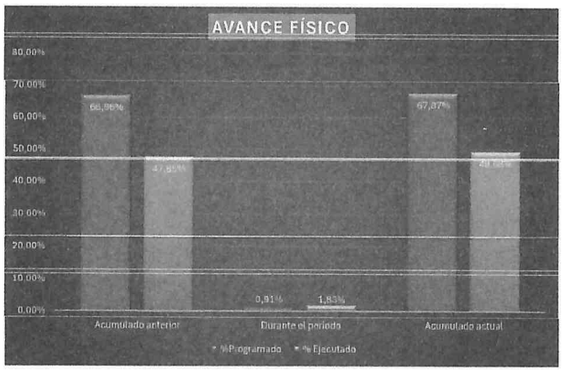

OBSERVACIONES

REPRESENTANTE LEGAL DE ANTICA S.A.S BIC

Firma

Nombre: JUAN PABLO BANQUEZ GONZALEZ

Matrícula No. : 081037-0586460 COR

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Descripción: CERÁMICA ANTIDESLIZANTE PARA PISOS

FOTO 1.




Descripción: ILUMINARIA

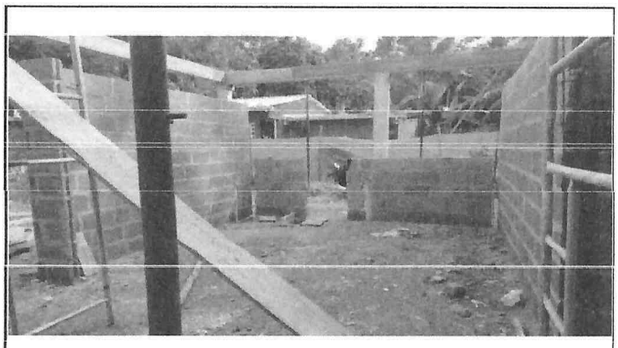FOTO 2.



Descripción: LEVANTE DE MURO EN BLOQUE

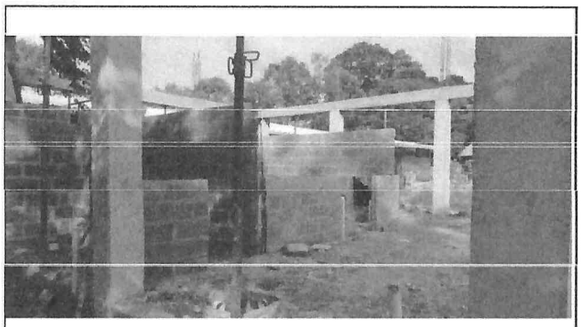
FOTO 3.



Descripción: LEVANTE DE MURO EN BLOQUE

FOTO 4.

ANTIGA | INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA | GOBERNACIÓN DE CORDOBA | CONSORCIO

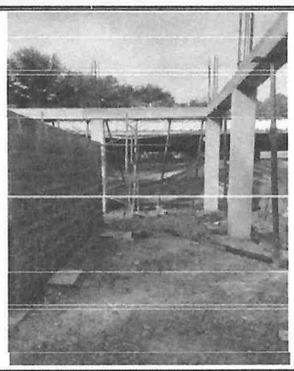


Descripción: VIGA SUPERIOR EN CONCRETO DE 3000PSI

FOTO 5.




Descripción: VIGA SUPERIOR EN CONCRETO DE 3000PSI

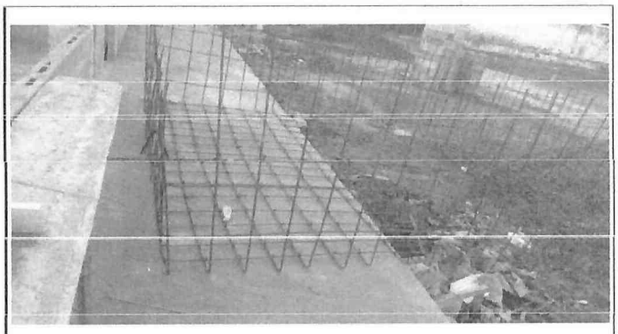FOTO 6.



Descripción: ACERO DE REFUERZO PARA TANQUE AGUA POTABLE

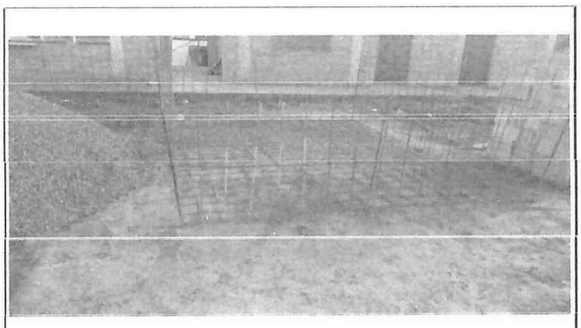FOTO 7.



Descripción: ACERO REFUERZO PARA TANQUE DE AGUA POTABLE

FOTO 8.

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002 — CONTRATO No: SI-LP-002-2024

INTERVENTORÍA: ANTICA S.A.S. BIC — CONTRATO No: SI-CMA-007-2024

Semana Número: 26 — Del: 8/09/2025 — Al: 14/09/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 182 Días

Supervisor: CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,38%	69,25%
Valor básico de la Obra programada:	$ 57.182.957,00	$ 2.863.633.934,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	3,86%	53,55%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 159.800.202,20	$ 2.214.214.982,32

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002
Contrato No.	SI-LP-002-2024
Valor Inicial:	$ 4.135.056.075,00
Valor Actualizado:	$ 4.135.056.075,00
Plazo Inicial:	8 MESES
Plazo Actualizado:	8 MESES
Fecha de iniciación.	17 de marzo de 2025
Fecha de Vencimiento:	17 de noviembre de 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

Interventor:	ANTICA S.A.S. BIC
Contrato No.	SI-CMA-007-2024
Valor Inicial:	$ 350.649.999,00
Valor Actualizado:	$ 350.649.999,00
Plazo Inicial:	8 MESES
Plazo Actualizado:	8 MESES
Fecha de iniciación.	17 de marzo de 2025
Fecha de Vencimiento:	17 de noviembre de 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	TOTAL
4,02	VIGA SUPERIOR DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	17,5	$ 135.759,00	$ 2.375.782,50
4,04	ALFAJIAS DE A=0.21 E=0.07 CON 2 Ø 3/8" Y Ø 1/4" @ 0.20 MTS EN CONCRETO DE 17.5Mpa (2500 PSI)	ML	27,23	$ 60.002,00	$ 1.633.854,46
6,01	CUBIERTA TIPO SANDWICH 18 MM EN ACERO LAMINADO A500 GRADO C COLOR BLANCO CON AISLANTE EN POLIESTIRENO 18-20MM. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	M2	321,60	$ 281.430,00	$ 90.507.888,00
6,02	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CERCHAS CON PERFILES PHR C ENCAJONADOS SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, CON SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS	KG	1324,96	$ 22.867,00	$ 30.297.860,32
6,03	S/I DE CORREAS CON PERFILES PHR C SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, CON SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS	KG	810,19	$ 18.468,00	$ 14.962.588,92
9,26	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TANQUE	UND	3,00	$ 616.099,00	$ 1.848.297,00
9,27	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS	UND	6,00	$ 683.223,00	$ 4.099.338,00
9,28	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS	UND	6,00	$ 1.019.878,00	$ 6.119.268,00
9,29	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE PISO PARA DESAGUE	UND	27,00	$ 104.607,00	$ 2.824.389,00
10,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO BIFÁSICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y PUERTA DE 20 CIRCUITOS. (incluye Protecciones, Tubería PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas)	UND	4,00	$ 1.282.734,00	$ 5.130.936,00
				COSTO TOTAL (INCLUYE AIU)	$ 159.800.202,20
				PORCENTAJE (%) EJECUTADO SEMANAL	3,86%
				PORCENTAJE (%) DE ATRASO O AVANCE SEMANAL	2,48%

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIGA SUPERIOR DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	PLACA EN CONCRETO DE 2.00 m X 2.00 m X 0.17 m DE 3000 PSI INCLUYE REF. VARILLA DE 3/8 @ 0.15MT PARA TANQUE ELEVADO
EXCAVACIÓN MANUAL PARA TANQUE	REEMPLAZO O MEJORAMIENTO DEL TERRENO DEBAJO DE ZAPATA EN PIEDRA RAJON - MATERIAL SELECCIONADO (80/20)
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE 10 KM	


ACTIVIDADES SISO, AMBIENTALES Y SOCIALES

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

AVANCE FINANCIERO DE OBRA		
RESUMEN DE ACTAS PAGADAS		% DE AVANCE
ANTICIPO	$ 1.240.516.822,50	0,00%
ACTA PARCIAL 1:	$ 1.241.079.816,77	30,50%
ACTA PARCIAL 2:	$ 510.223.260,83	12,34%
ACTA PARCIAL 3:	$ -	0,00%
TOTAL ACUMULADO	$ 1.771.303.077,60	42,84%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA		
RESUMEN DE ACTAS PAGADAS		% DE AVANCE
ACTA PARCIAL 1:	$ -	0,00%
ACTA PARCIAL 2:	$ -	0,00%
ACTA PARCIAL 3:	$ -	0,00%
TOTAL ACUMULADO	$ -	0,00%

	%Programado	% Ejecutado
Acumulado anterior	67,87%	49,68%
Durante el periodo	1,38%	3,86%
Acumulado actual	69,25%	53,55%
Atraso o avance acumulado	-15,71%	

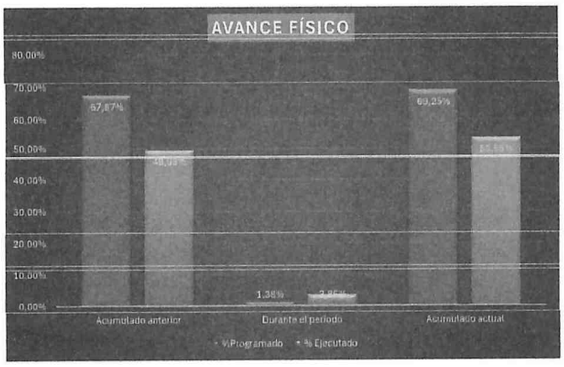


894

ANTICA	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA — CONSORCIO

OBSERVACIONES	REPRESENTANTE LEGAL DE ANTICA S.A.S BIC
	Firma Nombre: JUAN PABLO BANQUEZ GONZALEZ Matrícula No. : 081037-0586460 COR

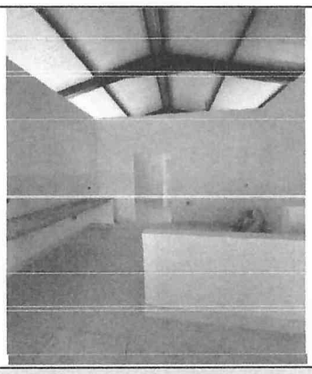REGISTRO FOTOGRÁFICO




Descripción: CERCHAS CON PERFILES PHR C ENCAJONADOS

FOTO 1.




Descripción: CUBIERTA TIPO SANDWICH 18 MM EN ACERO LAMINADO A500 GRADO C COLOR BLANCO

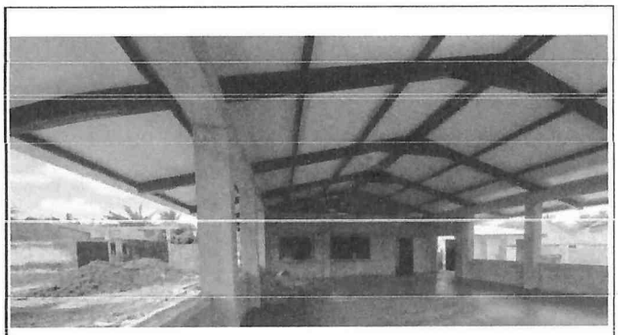FOTO 2.




Descripción: CUBIERTA TIPO SANDWICH 18 MM EN ACERO LAMINADO A500 GRADO C COLOR BLANCO

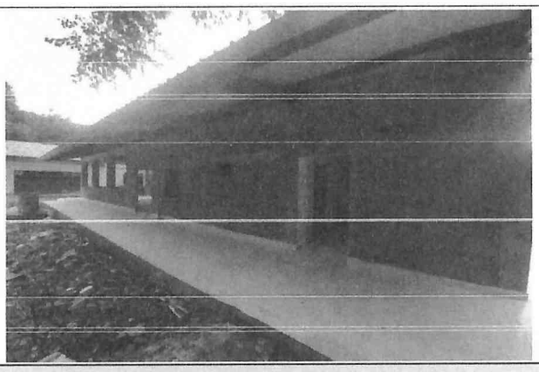FOTO 3.




Descripción: CUBIERTA TIPO SANDWICH 18 MM EN ACERO LAMINADO A500 GRADO C COLOR BLANCO

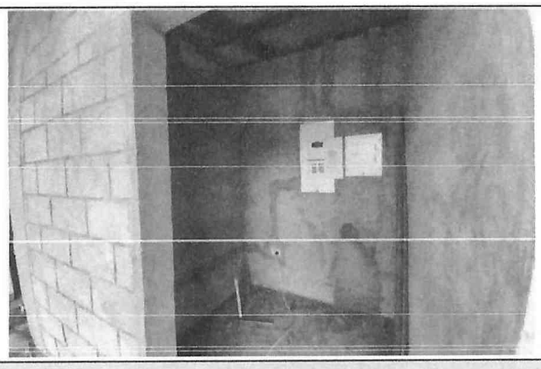FOTO 4.



Descripción: TABLERO BIFÁSICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y PUERTA DE 20 CIRCUITOS.

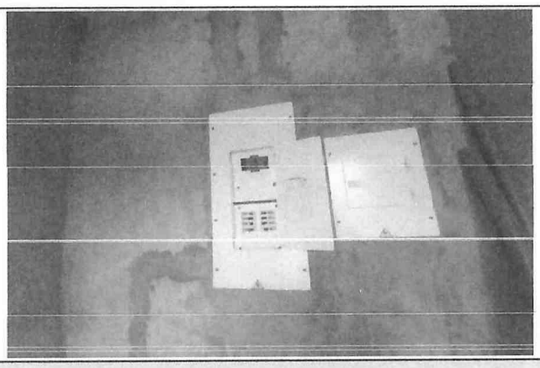FOTO 5.



Descripción: TABLERO BIFÁSICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y PUERTA DE 20 CIRCUITOS.

FOTO 6.

ANEXO N°4: COMITÉS DE SEGUIMIENTO

ANEXO N°5: EQUIPOS DE CONTRATISTA DE OBRA

887

Montería, 03 de marzo de 2025

Señores
GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA
Ciudad

Asunto: Certificación de disponibilidad de equipos

Cordial saludo,

Yo, ALONSO ALBERTO NEGRETE HERNANDEZ identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de prestador de servicios de alquiler y mantenimiento de equipos para construcción, certifico la disponibilidad inmediata de los equipos relacionados a continuación, los cuales serán destinados para ser alquilados a la firma CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002, con NIT 901.915.670-0, en la ejecución del contrato de obra No. SI-LP-002-2024 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

EQUIPO	CANTIDAD
VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA	2
PLACA VIBRATORIA (COMPACTADOR RANA)	2
MEZCLADORA DE CONCRETO 1.5 BULTOS	2
EQUIPO DE OXICORTE	1

Atentamente,

ALONSO ALBERTO NEGRETE HERNANDEZ
C.C 10.951.542
AN MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE EQUIPOS

878

841

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14986531879

(415)7707212489984(8020) 000001498653187 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 0 9 5 1 5 4 2	7	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	10951542	2 0 0 0 0 7 1 1

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Planeta Rica 5 5 5

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
NEGRETE	HERNANDEZ	ALONSO	ALBERTO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Montería 0 0 1

41. Dirección principal: CL 42 9A 20

42. Correo electrónico: alonsne@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 5 9 9 1 9 0 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
3 3 1 2	2 0 1 2 0 2 0 6	7 7 3 0	2 0 1 2 0 2 0 6				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9	5 2																								

49 - No responsable de IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros										Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código												57. Modo			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 02 - 28 / 16 : 58: 04

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre NEGRETE HERNANDEZ ALONSO ALBERTO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 28-02-2024 04:58:46PM

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

879

882

CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 28/02/2024 - 09:51:34
Recibo No. S000927958, Valor 3700

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2MZgkZtDmD

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=22 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 01 de abril de 2024.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Nombres y apellidos : ALONSO ALBERTO NEGRETE HERNANDEZ
Identificación : CC. - 10951542
Nit : 10951542-7
Domicilio: Montería, Córdoba

MATRÍCULA

Matrícula No: 198654
Fecha de matrícula: 21 de junio de 2022
Ultimo año renovado: 2024
Fecha de renovación: 28 de febrero de 2024
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CALLE 42NRO.9A -20 - Barrio los laureles
Municipio : Monteria, Còrdoba
Correo electrónico : alonsne@hotmail.com
Teléfono comercial 1 : 3135991903
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CALLE 42NRO.9A -20 - Barrio los laureles
Municipio : Montería, Córdoba
Correo electrónico de notificación : alonsne@hotmail.com
Teléfono para notificación 1 : No reportó.
Teléfono notificación 2 : No reportó.
Teléfono notificación 3 : No reporto.

La persona natural **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los articulos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: C3312
Actividad secundaria Código CIIU: N7730
Otras actividades Código CIIU: No reportó

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social -RUES- : Mantenimiento y reparacion especializado de maquinaria y equipo,alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.C.P.

INFORMACION FINANCIERA

880

Powered by CamScanner

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 28/02/2024 - 09:51:34
Recibo No. S000927958, Valor 3700

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2MZgkZtDmD

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=22 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 01 de abril de 2024.

El comerciante matriculado reportó la siguiente información financiera, la cual corresponde a la última información reportada en la matrícula mercantil, así:

Estado de la situación financiera:
Activo corriente: $15.000.000,00
Activo no corriente: $0,00
Activo total: $15.000.000,00
Pasivo corriente: $0,00
Pasivo no corriente: $0,00
Pasivo total: $0,00
Patrimonio neto: $15.000.000,00
Pasivo más patrimonio: $15.000.000,00

Estado de resultados:
Ingresos actividad ordinaria: $0,00
Otros ingresos: $0,00
Costo de ventas: $0,00
Gastos operacionales: $0,00
Otros gastos: $0,00
Gastos por impuestos: $0,00
Utilidad operacional: $0,00
Resultado del periodo: $0,00

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA NATURAL TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

881

Powered by CamScanner

CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 28/02/2024 - 09:51:34
Recibo No. S000927958, Valor 3700

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2MZgkZtDmD

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=22 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 01 de abril de 2024.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $0,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : C3312.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - REPORTE A ENTIDADES

INFORMACION COMPLEMENTARIA a. Que los datos del empresario y/o establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES. b. Se realizo la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT) Este certificado refleja la situación jurídica registral de la persona natural, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la persona natural, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

SANDRA SIERRA BUELVAS

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

Powered by CamScanner

ANEXO N°6: REGISTRO DEL IDEAM – ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

IDEAM

Reporte de información Hidrometeorológica de DHIME generado (02/10/2025 14:57)

Nombre estacion:	SALADO EL [13075020]	**Corriente:**		**Categoría de estación:**	Climática Ordinaria
Latitud:	8.9138888890	**Longitud:**	-75.58222222	**Elevación:**	40
Entidad:	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	**Area Operativa:**	Area Operativa 02 - Atlantico-Bolivar-Sucre	**Departamento:**	Cordoba
Municipio:	Ciénaga De Oro	**Fecha instalacion:**	15/10/1964 00:00	**Fecha suspensión:**	
Variable:	PRECIPITACION	**Frecuencia:**	Diaria	**Fecha consulta:**	18/08/2025 00:00-17/09/2025 00:00
Parametro:	Día pluviométrico (convencional)	**Unidad medida:**	mm		

Fecha	Valor:	Nivel de Aprobación
2025-08-18 00:00	0	Preliminar
2025-08-19 00:00	0	Preliminar
2025-08-20 00:00	31.6	Preliminar
2025-08-21 00:00	0	Preliminar
2025-08-22 00:00	21.4	Preliminar
2025-08-23 00:00	0	Preliminar
2025-08-24 00:00	0	Preliminar
2025-08-25 00:00	24.5	Preliminar
2025-08-26 00:00	3.3	Preliminar
2025-08-27 00:00	31.2	Preliminar
2025-08-28 00:00	0	Preliminar
2025-08-29 00:00	31	Preliminar
2025-08-30 00:00	0	Preliminar
2025-08-31 00:00	0	Preliminar
2025-09-01 00:00	68	Preliminar
2025-09-02 00:00	0	Preliminar
2025-09-03 00:00	0.5	Preliminar
2025-09-04 00:00	9.4	Preliminar
2025-09-05 00:00	44	Preliminar
2025-09-06 00:00	0	Preliminar
2025-09-07 00:00	0.5	Preliminar
2025-09-08 00:00	1.4	Preliminar
2025-09-09 00:00	0	Preliminar
2025-09-10 00:00	0.5	Preliminar
2025-09-11 00:00	0	Preliminar
2025-09-12 00:00	0	Preliminar
2025-09-13 00:00	0	Preliminar
2025-09-14 00:00	0.7	Preliminar
2025-09-15 00:00	0	Preliminar
2025-09-16 00:00	1.6	Preliminar
2025-09-17 00:00	1.6	Preliminar

IDEAM

Reporte de información Hidrometeorológica de DHIME generado (02/10/2025 11:05)

Nombre estacion:	CANALETE [12040020]	**Corriente:**		**Categoría de estación:**	Pluviométrica
Latitud:	8.7869444440	**Longitud:**	-76.23555556	**Elevación:**	40
Entidad:	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	**Area Operativa:**	Area Operativa 02 - Atlantico-Bolivar-Sucre	**Departamento:**	Cordoba
Municipio:	Canalete	**Fecha instalacion:**	15/01/1959 00:00	**Fecha suspensión:**	
Variable:	PRECIPITACION	**Fracuencia:**	Diaria	**Fecha consulta:**	18/08/2025 00:00-17/09/2025 00:00
Parametro:	Día pluviométrico (convencional)	**Unidad medida:**	mm		

Fecha	Valor:	Nivel de Aprobación
2025-08-18 00:00	3	Preliminar
2025-08-19 00:00	0	Preliminar
2025-08-20 00:00	9	Preliminar
2025-08-21 00:00	3	Preliminar
2025-08-22 00:00	0	Preliminar
2025-08-23 00:00	0	Preliminar
2025-08-24 00:00	0	Preliminar
2025-08-25 00:00	4	Preliminar
2025-08-26 00:00	0	Preliminar
2025-08-27 00:00	40	Preliminar
2025-08-28 00:00	0	Preliminar
2025-08-29 00:00	36	Preliminar
2025-08-30 00:00	0	Preliminar
2025-08-31 00:00	0	Preliminar
2025-09-01 00:00	15	Preliminar
2025-09-02 00:00	0	Preliminar
2025-09-03 00:00	0	Preliminar
2025-09-04 00:00	0	Preliminar
2025-09-05 00:00	62	Preliminar
2025-09-06 00:00	35	Preliminar
2025-09-07 00:00	0	Preliminar
2025-09-08 00:00	0	Preliminar
2025-09-09 00:00	0	Preliminar
2025-09-10 00:00	0	Preliminar
2025-09-11 00:00	0	Preliminar
2025-09-12 00:00	0	Preliminar
2025-09-13 00:00	0	Preliminar
2025-09-14 00:00	5	Preliminar
2025-09-15 00:00	0	Preliminar
2025-09-16 00:00	0	Preliminar
2025-09-17 00:00	0	Preliminar

IDEAM

Reporte de información Hidrometeorológica de DHIME generado (02/10/2025 15:33)

Nombre estacion:	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	**Corriente:**		**Categoría de estación:**	Climática Ordinaria
Latitud:	9.37	**Longitud:**	-75.95	**Elevación:**	22
Entidad:	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	**Area Operativa:**	Area Operativa 02 - Atlántico-Bolivar-Sucre	**Departamento:**	Cordoba
Municipio:	San Bernardo Del Viento	**Fecha instalacion:**	15/11/1964 00:00	**Fecha suspensión:**	
Variable:	PRECIPITACION	**Frecuencia:**	Diaria	**Fecha consulta:**	18/08/2025 00:00-17/09/2025 00:00
Parametro:	Día pluviométrico (convencional)	**Unidad medida:**	mm		

Fecha	Valor:	Nivel de Aprobación
2025-08-18 00:00	0	Preliminar
2025-08-19 00:00	0	Preliminar
2025-08-20 00:00	5	Preliminar
2025-08-21 00:00	0	Preliminar
2025-08-22 00:00	33	Preliminar
2025-08-23 00:00	0	Preliminar
2025-08-24 00:00	0	Preliminar
2025-08-25 00:00	0	Preliminar
2025-08-26 00:00	20	Preliminar
2025-08-27 00:00	8	Preliminar
2025-08-28 00:00	0	Preliminar
2025-08-29 00:00	20	Preliminar
2025-08-30 00:00	0	Preliminar
2025-08-31 00:00	7.2	Preliminar
2025-09-01 00:00	40	Preliminar
2025-09-02 00:00	0	Preliminar
2025-09-03 00:00	0	Preliminar
2025-09-04 00:00	0	Preliminar
2025-09-05 00:00	0	Preliminar
2025-09-06 00:00	0	Preliminar
2025-09-07 00:00	0	Preliminar
2025-09-08 00:00	0	Preliminar
2025-09-09 00:00	0	Preliminar
2025-09-10 00:00	0	Preliminar
2025-09-11 00:00	3	Preliminar
2025-09-12 00:00	0	Preliminar
2025-09-13 00:00	3.2	Preliminar
2025-09-14 00:00	0	Preliminar
2025-09-15 00:00	0	Preliminar
2025-09-16 00:00	0	Preliminar
2025-09-17 00:00	0	Preliminar

IDEAM

Reporte de información Hidrometeorológica de DHIME generado (02/10/2025 11:25)

Nombre estacion:	TIERRALTA [13030010]	**Corriente:**		**Categoría de estación:**	Pluviométrica
Latitud:	8.1866666670	**Longitud:**	-76.05305556	**Elevación:**	100
Entidad:	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	**Area Operativa:**	Area Operativa 02 - Atlantico-Bolivar-Sucre	**Departamento:**	Cordoba
Municipio:	Tierralta	**Fecha instalacion:**	15/02/1959 00:00	**Fecha suspensión:**	
Variable:	PRECIPITACION	**Frecuencia:**	Diaria	**Fecha consulta:**	18/08/2025 00:00-17/09/2025 00:00
Parametro:	Día pluviométrico (convencional)	**Unidad medida:**	mm		

Fecha	Valor:	Nivel de Aprobación
2025-08-18 00:00	0	Preliminar
2025-08-19 00:00	0	Preliminar
2025-08-20 00:00	0	Preliminar
2025-08-21 00:00	0	Preliminar
2025-08-22 00:00	3	Preliminar
2025-08-23 00:00	0	Preliminar
2025-08-24 00:00	0	Preliminar
2025-08-25 00:00	21	Preliminar
2025-08-26 00:00	0	Preliminar
2025-08-27 00:00	32	Preliminar
2025-08-28 00:00	0	Preliminar
2025-08-29 00:00	1	Preliminar
2025-08-30 00:00	0	Preliminar
2025-08-31 00:00	0	Preliminar
2025-09-01 00:00	4	Preliminar
2025-09-02 00:00	0	Preliminar
2025-09-03 00:00	0	Preliminar
2025-09-04 00:00	0	Preliminar
2025-09-05 00:00	1	Preliminar
2025-09-06 00:00	0	Preliminar
2025-09-07 00:00	0	Preliminar
2025-09-08 00:00	0	Preliminar
2025-09-09 00:00	0	Preliminar
2025-09-10 00:00	0	Preliminar
2025-09-11 00:00	1	Preliminar
2025-09-12 00:00	0	Preliminar
2025-09-13 00:00	0	Preliminar
2025-09-14 00:00	42	Preliminar
2025-09-15 00:00	0	Preliminar
2025-09-16 00:00	0	Preliminar
2025-09-17 00:00	0	Preliminar

ANEXO N°7: PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002

1. FECHA DE ELABORCIÓN	23	5	2025

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

DATOS GENERALES

CONTRATISTA

2. CONTRATO Nº	SI-LP-002-2024	3. FECHA DE CONTRATO	30	1	2025	4. VALOR DEL CONTRATO	$4.135.056.075,00

5. FECHA ACTA DE INICIO	13	3	2025	6. FECHA DE TERMINACIÓN	16	11	2025	7. PLAZO DE EJECUCIÓN	

8. CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002

9. OBJETO:	MANTEMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LAS SEDES OFICIALES DEL DEPARTAMNETO DE CORDOBA

10. VALOR ANTICIPO	$1.240.516.822,50	11. % PAGO ANTICIPADO	30%	VALOR TOTAL DESEEMBOLSO	$ 1.178.490.981,50

SUPERVISION

12. DESIGNACION DE INTERVENTORIA	EL ENTE CONTRATANTE ESTABLESE COMO INTERVENTORIA DEL CONTRATO A LA EMPRESA ANTICA S.A.S BIC

DESCRIPCIÓN DE INVERSIÓN ANTICIPO

VALOR CONTRATO DE OBRA	$	4.135.056.075,00
VALOR ANTICIPO 30%	$	1.240.516.822,50
VALOR DESEEMBOLSADO	$	1.178.490.981,50

ITEM	DESCRIPCIÓN CONCEPTO A INVERTIR	PORCENTAJES	VALOR TOTAL DESEEMBOLSO	PRIMER DESEEMBOLSO	SALDO DISPONIBLE	VALOR MODIFICADO
1	COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION	22,50%	$ 265.160.470,84	$ 161.774.581,14	$ 103.385.878,70	$ 117.341.697,86
2	TRANSPORTE DE MATERIALES	25,00%	$ 294.622.745,38	$ 216.688.000,00	$ 77.934.745,38	$ 31.416.163,50
3	SUBCONTRATO DE OBRA	45,00%	$ 530.320.941,68	$ 390.762.000,00	$ 139.558.941,68	$ 167.469.771,00
4	AVANCE PAGO MANO DE OBRA	7,50%	$ 88.386.823,60	$ 65.127.133,00	$ 23.259.690,60	$ 27.911.629,00
	TOTALES	100,0%	$ 1.178.490.981,50	$ 834.351.735,14	$ 344.139.256,36	$ 344.139.256,36

FIRMA

MARIA ISABEL QUINTERO GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002

FIRMA

JUAN PABLO BANQUEZ GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
ANTICA S.A.S BIC



FORMATO CERTIFICACIÓN

No. Del Fideicomiso

124462

Nombres y apellidos del Interventor

JUAN PABLO BANQUEZ GONZALEZ

Número de cédula del Interventor

CEDULA CIUDADANIA 1067958787

Número Contrato ó Descripción Negocio

124462

Objeto del Contrato

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Valor total de la Solicitud

$390.762.000,00

Correo electrónico del Interventor

anticasasbic@gmail.com


Celular del Interventor

3114301257

ISO 9001 icontec IQNet

Fiduciaria Bogotá © 2018 - Todos los derechos reservados

www.fidubogota.com



FORMATO CERTIFICACIÓN

No. Del Fideicomiso

124462

Nombres y apellidos del Interventor

JUAN PABLO BANQUEZ GONZALEZ

Número de cédula del Interventor

CEDULA CIUDADANIA 1067958787

Número Contrato ó Descripción Negocio

124462

Objeto del Contrato

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Valor total de la Solicitud

$156.000.000,00

Correo electrónico del Interventor

anticasasbic@gmail.com

Celular del Interventor

3114301257

Fiduciaria Bogotá © 2018 - Todos los derechos reservados
www.fidubogota.com



6 of 9

FORMATO CERTIFICACIÓN

No. Del Fideicomiso

124462

Nombres y apellidos del Interventor

JUAN PABLO BANQUEZ GONZALEZ

Número de cédula del Interventor

CEDULA CIUDADANIA 1067958787

Número Contrato ó Descripción Negocio

124462

Objeto del Contrato

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Valor total de la Solicitud

$65.127.133,00


Correo electrónico del Interventor

anticasasbic@gmail.com

Celular del Interventor

3114301257

Fiduciaria Bogotá © 2018 - Todos los derechos reservados
www.fidubogota.com



FORMATO CERTIFICACIÓN

No. Del Fideicomiso

124462

Nombres y apellidos del Interventor

JUAN PABLO BANQUEZ GONZALEZ

Número de cédula del Interventor

CEDULA CIUDADANIA 1067958787

Número Contrato ó Descripción Negocio

124462

Objeto del Contrato

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Valor total de la Solicitud

$101.006.355,10


Correo electrónico del Interventor

anticasasbic@gmail.com

Celular del Interventor

3114301257

Fiduciaria Bogotá © 2018 | Todos los derechos reservados
www.fidubogota.com



FORMATO CERTIFICACIÓN

No. Del Fideicomiso

124462

Nombres y apellidos del Interventor

JUAN PABLO BANQUEZ GONZALEZ

Número de cédula del Interventor

CEDULA CIUDADANIA 1067958787

Número Contrato ó Descripción Negocio

124462

Objeto del Contrato

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Valor total de la Solicitud

$222.462.592,14

Correo electrónico del Interventor

anticasasbic@gmail.com


Celular del Interventor

3114301257

ISO 9001 icontec IQNet

Fiduciaria Bogotá © 2018 - Todos los derechos reservados

www.fidubogota.com



FORMATO CERTIFICACIÓN

No. Del Fideicomiso

124462

Nombres y apellidos del Interventor

JUAN PABLO BANQUEZ GONZALEZ

Número de cédula del Interventor

CEDULA CIUDADANIA 1067958787

Número Contrato ó Descripción Negocio

124462

Objeto del Contrato

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Valor total de la Solicitud

$121.456.237,04


Correo electrónico del Interventor

anticasasbic@gmail.com

Celular del Interventor

3114301257

ISO 9001 icontec
IQNet
Fiduciaria Bogotá © 2018 - Todos los derechos reservados
www.fidubogota.com



FORMATO CERTIFICACIÓN

No. Del Fideicomiso

124462

Nombres y apellidos del Interventor

JUAN PABLO BANQUEZ GONZALEZ

Número de cédula del Interventor

CEDULA CIUDADANIA 1067958787

Número Contrato ó Descripción Negocio

124462

Objeto del Contrato

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Valor total de la Solicitud

$167.469.771,00

Correo electrónico del Interventor

anticasasbic@gmail.com

Celular del Interventor

3114301257

ANEXO N°8: RESULTADOS DEL ENSAYOS DE LABORATORIO

GEOTECNOLOGÍA SAS
ingeniería y control

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO
INV E-410-13

Codigo:	F-ED-RC-012
Versión:	1
Fecha:	24/09/19
Pagina:	1 de 1

PROYECTO : MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA

CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002

LOCALIZACIÓN : DEPARTAMENTO DE CORDOBA

MATERIAL: CONCRETO 3000 PSI

FECHA : 21 de septiembre de 2025

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
I.N.V. E-410-13

Muestra N°	Descripcion	Fecha de Elaboración	Fecha de Ensayo	Edad (Dias)	Altura (cm)	Diametro (cm)	Carga (KN)	RELACION L/D	PATRON DE FALLA	Resistencia (Kg/cm²) Edad (Dias)		
												28
022-1	INSTITUCION EDUCATIVA JUNIN COLUMNAS	18/08/2025	26/08/2025	8	30,3	15,3	285,2	1,98	TIPO-3	158,2		
022-2		18/08/2025	1/09/2025	14	30,3	15,3	311,8	1,98	TIPO-4		173,0	
022-3		18/08/2025	15/09/2025	28	30,3	15,3	387,6	1,98	TIPO-4			215,0
023-1	INSTITUCION EDUCATIVA JUNIN VIGA AEREA	25/08/2025	2/09/2025	8	30,3	15,3	291,9	1,98	TIPO-5	161,9		
023-2		25/08/2025	8/09/2025	14	30,3	15,3	307,5	1,98	TIPO-5		170,6	
023-3		25/08/2025	22/09/2025	28	30,3	15,3	388,1	1,98	TIPO-4			215,2
024-1	INSTITUCION EDUCATIVA PLAZA BONITA COLUMNAS	17/08/2025	25/08/2025	8	30,3	15,3	293,3	1,98	TIPO-4	162,6		
024-2		17/08/2025	31/08/2025	14	30,3	15,3	312,8	1,98	TIPO-5		173,5	
024-3		17/08/2025	14/09/2025	28	30,3	15,3	395,7	1,98	TIPO-4			219,5
025-1	INSTITUCION EDUCATIVA PLAZA BONITA VIGA AEREA	24/08/2025	1/09/2025	8	30,3	15,3	327,3	1,98	TIPO-5	181,5		
025-2		24/08/2025	7/09/2025	14	30,3	15,3	385,0	1,98	TIPO-5		213,5	
025-3		24/08/2025	21/09/2025	28	30,3	15,3	411,8	1,98	TIPO-4			228,4
									RESISTENCIA PROMEDIO (Kg/cm²)	160,0	171,8	215,1
									RESISTENCIA PROMEDIO (Mpa)	15,7	16,8	21,1
									RESISTENCIA PROMEDIO (Psi)	2276	2443	3059
									RESISTENCIA NOMINAL (Psi)	3000		
									PORCENTAJE DE RESISTENCIA	76	81	102

OBSERVACIONES :

Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuiciios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.



TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 TIPO 5 TIPO 6

REVISÓ	APROBÓ
GEOTECNOLOGO JEFE DE LABORATORIO	GERENTE
FREDY RODRIGUEZ RUBIO	KELLY ANDREA RODRIGUEZ S.
Fredy Rodriguez R. Geotecnologo Mat. Nº 19510-00111 CPSL	GEOTECNOLOGÍA GERENCIA TP 22202-354896 COR

GEOTECNOLOGÍA S.A.S
ingeniería y control

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO
INV E-410-13

Codigo:	F-ED-RC-012
Versión:	1
Fecha:	24/09/19
Pagina:	1 de 1

PROYECTO : MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA

CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002

LOCALIZACIÓN : DEPARTAMENTO DE CORDOBA


MATERIAL: CONCRETO 3000 PSI

FECHA : 26 de septiembre de 2025

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
I.N.V. E-410-13

Muestra N°	Descripcion	Fecha de Elaboración	Fecha de Ensayo	Edad (Dias)	Altura (cm)	Diametro (cm)	Carga (KN)	RELACION L/D	PATRON DE FALLA	Resistencia (Kg/cm²) Edad (Dias)		
												28
026-1	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE MOÑITOS PLANTILLA	20/08/2025	28/08/2025	8	30,3	15,3	323,3	1,98	TIPO-4	179,3		
026-2		20/08/2025	3/09/2025	14	30,3	15,3	379,6	1,98	TIPO-5		210,5	
026-3		20/08/2025	17/09/2025	28	30,3	15,3	435,6	1,98	TIPO-3			241,6
027-1	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE MOÑITOS VIGA DINTEL	29/08/2025	6/09/2025	8	30,3	15,3	349,7	1,98	TIPO-5	193,9		
027-2		29/08/2025	12/09/2025	14	30,3	15,3	386,1	1,98	TIPO-4		214,2	
027-3		29/08/2025	26/09/2025	28	30,3	15,3	429,6	1,98	TIPO-5			238,2
								-		-		
								-			-	
								-				-
								-		-		
								-			-	
								-				-
RESISTENCIA PROMEDIO (Kg/cm²)										**186,6**	**212,4**	**239,9**
RESISTENCIA PROMEDIO (Mpa)										**18,3**	**20,8**	**23,5**
RESISTENCIA PROMEDIO (Psi)										**2655**	**3020**	**3412**
RESISTENCIA NOMINAL (Psi)										**3000**		
PORCENTAJE DE RESISTENCIA										**88**	**101**	**114**

OBSERVACIONES :
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos.
El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.



REVISÓ	APROBÓ
GEOTECNOLOGO JEFE DE LABORATORIO	GERENTE
FREDY RODRIGUEZ RUBIO	KELLY ANDREA RODRIGUEZ S.
Fredy Rodriguez Rubio Geotecnologo Mat. N° 19510-00111 CPSC	GEOTECNOLOGIA GERENCIA TP 22202-354898 COR

GEOTECNOLOGÍA S.A.S ingeniería y control	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO INV E-410-13	Codigo:	F-ED-RC-012
		Versión:	1
		Fecha:	24/09/19
		Pagina:	1 de 1

PROYECTO : MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA

CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002

LOCALIZACIÓN : DEPARTAMENTO DE CORDOBA

MATERIAL: CONCRETO 3000 PSI

FECHA : 22 de octubre de 2025

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
I.N.V. E-410-13

Muestra N°	Descripcion	Fecha de Elaboración	Fecha de Ensayo	Edad (Dias)	Altura (cm)	Diametro (cm)	Carga (KN)	RELACION L/D	PATRON DE FALLA	Resistencia (Kg/cm²) Edad (Dias)		
												28
028-1	INSTITUCION EDUCATIVA JUNIN PLANTILLA	25/09/2025	3/10/2025	8	30,3	15,3	325,2	1,98	TIPO-3	180,4		
028-2		25/09/2025	9/10/2025	14	30,3	15,3	379,5	1,98	TIPO-3		210,5	
028-3		25/09/2025	23/10/2025	28	30,3	15,3	420,0	1,98	TIPO-3			232,9
029-1	INSTITUCION EDUCATIVA JUNIN VIGA DINTEL	23/09/2025	1/10/2025	8	30,3	15,3	325,2	1,98	TIPO-3	180,4		
029-2		23/09/2025	7/10/2025	14	30,3	15,3	378,6	1,98	TIPO-4		210,0	
029-3		23/09/2025	21/10/2025	28	30,3	15,3	419,0	1,98	TIPO-5			232,4
030-1	INSTITUCION EDUCATIVA PLAZA BONITA PLANTILLA	8/09/2025	16/09/2025	8	30,3	15,3	316,9	1,98	TIPO-5	175,8		
030-2		8/09/2025	22/09/2025	14	30,3	15,3	372,7	1,98	TIPO-5		206,7	
030-3		8/09/2025	6/10/2025	28	30,3	15,3	398,7	1,98	TIPO-4			221,1
031-1	INSTITUCION EDUCATIVA PLAZA BONITA VIGA DINTEL	24/09/2025	2/10/2025	8	30,3	15,3	313,1	1,98	TIPO-4	173,6		
031-2		24/09/2025	8/10/2025	14	30,3	15,3	367,5	1,98	TIPO-5		203,9	
031-3		24/09/2025	22/10/2025	28	30,3	15,3	421,8	1,98	TIPO-3			233,9
									RESISTENCIA PROMEDIO (Kg/cm²)	180,4	210,2	232,6
									RESISTENCIA PROMEDIO (Mpa)	17,7	20,6	22,8
									RESISTENCIA PROMEDIO (Psi)	2566	2990	3309
									RESISTENCIA NOMINAL (Psi)	3000		
									PORCENTAJE DE RESISTENCIA	86	100	110

OBSERVACIONES :
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos.
El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.



REVISÓ	APROBÓ
GEOTECNOLOGO JEFE DE LABORATORIO	GERENTE
FREDY RODRIGUEZ RUBIO	KELLY ANDREA RODRIGUEZ S.
Fredy Rodriguez Rubio Geotecnologo Mat. N° 19510-00111 CPSG	GEOTECNOLOGÍA S.A.S INGENIERIA T.P 22202-354878 COR

GEOTECNOLOGÍA S.A.S
ingeniería y control

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO
INV E-410-13

Codigo:	F-ED-RC-012
Versión:	1
Fecha:	24/09/19
Pagina:	1 de 1

PROYECTO : MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA

CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002

LOCALIZACIÓN : DEPARTAMENTO DE CORDOBA

MATERIAL: CONCRETO 3000 PSI

FECHA : 26 de octubre de 2025

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
I.N.V. E-410-13

Muestra N°	Descripcion	Fecha de Elaboración	Fecha de Ensayo	Edad (Dias)	Altura (cm)	Diametro (cm)	Carga (KN)	RELACION L/D	PATRON DE FALLA	Resistencia (Kg/cm²) Edad (Dias)		
												28
028-1	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE MOÑITOS MUROS TANQUE AGUA POTABLE	20/09/2025	28/09/2025	8	30,3	15,3	338,6	1,98	TIPO-5	187,8		
028-2		20/09/2025	4/10/2025	14	30,3	15,3	373,9	1,98	TIPO-4		207,3	
028-3		20/09/2025	18/10/2025	28	30,3	15,3	415,9	1,98	TIPO-5			230,7
029-1	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE MOÑITOS TRAMPA DE GRASA	26/09/2025	4/10/2025	8	30,3	15,3	314,9	1,98	TIPO-3	174,7		
029-2		26/09/2025	10/10/2025	14	30,3	15,3	387,5	1,98	TIPO-3		214,9	
029-3		26/09/2025	24/10/2025	28	30,3	15,3	516,6	1,98	TIPO-3			286,5
030-1	INSTITUCION EDUCATIVA EL EBANO	28/09/2025	6/10/2025	8	30,3	15,3	314,9	1,98	TIPO-3	174,7		
030-2		28/09/2025	12/10/2025	14	30,3	15,3	366,6	1,98	TIPO-4		203,3	
030-3		28/09/2025	26/10/2025	28				-				-
								-		-		
								-			-	
								-				-
RESISTENCIA PROMEDIO (Kg/cm²)										181,2	211,1	258,6
RESISTENCIA PROMEDIO (Mpa)										17,8	20,7	25,4
RESISTENCIA PROMEDIO (Psi)										2577	3003	3678
RESISTENCIA NOMINAL (Psi)										3000		
PORCENTAJE DE RESISTENCIA										86	100	123

OBSERVACIONES :
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos.
El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuiciios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.



TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 TIPO 5 TIPO 6

REVISÓ	APROBÓ
GEOTECNOLOGO JEFE DE LABORATORIO	GERENTE
FREDY RODRIGUEZ RUBIO	KELLY ANDREA RODRIGUEZ S.
Fredy Rodriguez Rubio Geotecnologo Mat. Nº 19510-00111 CPSC	GEOTECNOLOGÍA GERENCIA T.P 22202-354878 C.P.R.

ANEXO N°9: PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA DE OBRA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901915670	0	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 6 A 64 A58	MONTERIA-CORDOBA	7828082	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	9493200631	9493200631	E	2025/09/16	2025/10/16	BANCO DE BOGOTA	30	$10,824,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Reg	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerada SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1067940218	AGAMEZ ANDY																		230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF16	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
2	CC	1064735577	ALEAN MEVEN																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
3	CC	1233340397	ALVAREZ JOSE																		25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF16	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
4	CC	1064976924	ARGUELLO CESAR																		231001	30	$1,423,500	$227,800	CCFC55	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
5		78025167	AYALA JOSE																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
6		1020769957	BEJARANO KAMAL																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF16	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
7	CC	78748039	CASTRO RICARDO																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF16	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
8	CC	11171737	CONDE VICTOR																		231001	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
9	CC	1126245995	CONTRERAS EDINSON																		230301	30	$1,423,500	$227,800	CCFC55	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
10	CC	1067942893	CORRALES SHARON																		230201	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
11	CC	1043641929	CORTES MANUEL																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
12	CC	1003457959	FRANCO OSCAR																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
13	CC	1073828923	GALINDO CAMILO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
14	CC	1070815145	MELENDEZ JOSE																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
15	CC	1073825958	MENDOZA SAIBIS																		230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
16	CC	1064742487	PEREZ LUIS																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS009	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
17	CC	19191822	RAMIREZ HECTOR																			0	$0	$0	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$213,100
18	CC	11171037	RUIZ ARIEL																		230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
19	CC	1063721640	RUIZ HECTOR																		231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
20	CC	1068056210	RUIZ JOSE																		230201	30	$1,423,500	$227,800	CCFC55	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
21	CC	1063719164	RUIZ YERSON																		230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
22	CC	1073155444	TORRES HERIBERTO																		231001	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
23	CC	77237694	VERGARA JHOJAN																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
Total	**Afiliados(23)**																						$33,623,000	$5,380,480			$35,046,500	$1,403,000			$35,046,500	$1,403,000			$35,046,500	$2,439,700		$0	$0		$10,626,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901915670	0	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 6 A 64 A58	MONTERIA-CORDOBA	7828082	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	9493200631	9493200631	E	2025/09/16	2025/10/16	BANCO DE BOGOTA	30	$10,824,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				22	$5,380,400	$100,200	$0	$5,480,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$911,200	$17,000	$0	$928,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$775,600	$14,500	$0	$790,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$2,690,200	$50,000	$0	$2,740,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,003,400	$18,700	$0	$1,022,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$2,439,700	$45,400	$0	$2,485,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	23	$2,439,700	$45,400	$0	$2,485,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$1,403,000	$26,100	$0	$1,429,100
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	23	$1,403,000	$26,100	$0	$1,429,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				23	$1,403,000	$26,400	$0	$1,429,400
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	$171,000	$3,200	$0	$174,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$228,000	$4,300	$0	$232,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$57,000	$1,100	$0	$58,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	$285,000	$5,300	$0	$290,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$194,000	$3,700	$0	$197,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$114,000	$2,200	$0	$116,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$274,000	$5,100	$0	$279,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$80,000	$1,500	$0	$81,500
TOTAL				23	$10,626,100	$198,100	$0	$10,824,200

ANEXO N°10: GARANTIAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.02.21 15:49:40 -05:00

Código de Seguridad: BRoIlAAYH1+0M6+Sh+HE/0Q==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTA
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2N000000059-D001

No. PÓLIZA	CMT-100015007	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	489030718	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/02/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN MONTERIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/02/2025	24:00 Horas Del	17/10/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	ANTICA S.A.S BIC	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.823.241-9
DIRECCIÓN	CALLE 62 A N 11 A 50	**TELÉFONO**	3114301257
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.103.935-6
DIRECCIÓN	PALACIO DE NAIN - CALLE 27 N 3-28	**TELÉFONO**	7848940
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.103.935-6
DIRECCIÓN	PALACIO DE NAIN - CALLE 27 N 3-28	**TELÉFONO**	7848940

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.SI-CMA-007-2024 , CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 14/02/2025	24:00 Horas Del 17/04/2026	35.064.999,90	82.042,49
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 14/02/2025	24:00 Horas Del 17/10/2028	35.064.999,90	257.655,70
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 17/10/2025	24:00 Horas Del 17/10/2030	35.064.999,90	350.842,14
		TOTAL ASEGURADO	$ 105.194.999,70	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
LUZ ESTELA ESCUDERO KERGUELEN	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	690.540,33
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	690.540,33
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	132.684,66
TOTAL A PAGAR	$	831.024,99

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 21/02/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NUMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTA 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990. **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PACTO APP

seguros mundial

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CMT-100015007	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	489030718	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/02/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN MONTERIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/02/2025	24:00 Horas Del	17/10/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

ADHERIDOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA - PAGINA WEB

seguros mundial

RECIBO ELECTRONICO No. 100000199

NIT: 860.037.013-6 **CIUDAD Y FECHA:** MONTERIA 26/02/2025 5:01:01 p.m.

VALOR TOTAL: $831.024,99

RECIBO DE: ANTICA S.A.S BIC

NUMERO DE IDENTIFICACION: 901823241

POR CONCEPTO DE: PAGO ELECTRONICO DE PRIMAS

FORMA DE PAGO:

Medio De Pago	No. De Documento	No. Autorización	Entidad	Valor
P.S.E.	202501000020540	1294354819	BANCOLOMBIA	831.024,99

OBSERVACIONES: Ramo: CUMPLIMIENTO Póliza(s): 100015007 Certificado(s): 489030718;

FIRMA AUTORIZADA

CAJA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

DIRECCIÓN IP: 10.158.85.50 **CORREO:**

TES-08N-05/2019

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.03.18 09:55:48 -05:00

Código de Seguridad: tQSEmSj5dtvQ6YIIyU2y/w==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CMT-100015007	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	489031562	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	18/03/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN MONTERIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/02/2025	24:00 Horas Del	17/11/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	ANTICA S.A.S BIC	No. DOC. IDENTIDAD	901.823.241-9
DIRECCIÓN	CALLE 62 A N 11 A 50	TELÉFONO	3114301257
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.935-6
DIRECCIÓN	PALACIO DE NAIN - CALLE 27 N 3 - 28	TELÉFONO	7848940
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.935-6
DIRECCIÓN	PALACIO DE NAIN - CALLE 27 N 3 - 28	TELÉFONO	7848940

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE DE ACUERDO AL ACTA DE INICIO DE FECHA 13 DE MARZO DE 2025, SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS PERMANECN IGUAL.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.SI-CMA-007-2024 , CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 13/03/2025	24:00 Horas Del 17/05/2026	35.064.999,90	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 13/03/2025	24:00 Horas Del 17/11/2028	35.064.999,90	0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 17/11/2025	24:00 Horas Del 17/11/2030	35.064.999,90	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 105.194.999,70	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
LUZ ESTELA ESCUDERO KERGUELEN	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 18/03/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADO A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - A+F

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CMT-100015007	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	489031562	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	18/03/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN MONTERIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/02/2025	24:00 Horas Del	17/11/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

913

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CMT-100015007** y endoso, **1** cuyo afianzado es: **ANTICA S.A.S BIC** Asegurado o Beneficiario: **DEPARTAMENTO DE CORDOBA / DEPARTAMENTO DE CORDOBA** , expedida por la Compañía en **18/03/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN MONTERIA a los **18** días del mes **MARZO** del año **2025.**

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.03.28 09:45:02 -05:00

Código de Seguridad: a1rofTSM/aPjO8BUvkG1FQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CMT-100015007	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	489031928	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/03/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN MONTERIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/02/2025	24:00 Horas Del	22/11/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	ANTICA S.A.S BIC	No. DOC. IDENTIDAD	901.823.241-9
DIRECCIÓN	CALLE 62 A N 11 A 50	TELÉFONO	3114301257
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.935-6
DIRECCIÓN	PALACIO DE NAIN - CALLE 27 N 3 - 28	TELÉFONO	7848940
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.935-6
DIRECCIÓN	PALACIO DE NAIN - CALLE 27 N 3 - 28	TELÉFONO	7848940

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE DE ACUERDO AL ACTA DE INICIO DE FECHA 17 DE MARZO DE 2025, SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS PERMANECN IGUAL.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.SI-CMA-007-2024 , CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 17/03/2025	24:00 Horas Del 21/05/2026	35.064.999,90	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 17/03/2025	24:00 Horas Del 21/11/2028	35.064.999,90	0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 21/11/2025	24:00 Horas Del 21/11/2030	35.064.999,90	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 105.194.999,70	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
LUZ ESTELA ESCUDERO KERGUELEN	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/03/2025

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADO A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - A+F

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CMT-100015007	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	489031928	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/03/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN MONTERIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/02/2025	24:00 Horas Del	22/11/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF Asociación Panamericana de Fianzas Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CMT-100015007** y endoso, **2** cuyo afianzado es: **ANTICA S.A.S BIC** Asegurado o Beneficiario: **DEPARTAMENTO DE CORDOBA / DEPARTAMENTO DE CORDOBA** , expedida por la Compañía en **28/03/2025**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN MONTERIA a los **28** días del mes **MARZO** del año **2025**.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

ANEXO N°11: ACTAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

ACTA DE INICIO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	SI-CMA-007-2024 de fecha 14 de febrero de 2025
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA:	ANTICA S.A.S BIC NIT: 901823241-9 R.L: Juan Pablo Banquez Gonzalez C.C No.: 1.067.958.787
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"
VALOR DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($350.649.999,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO (08) MESES
FECHA DE INICIO:	DIECISIETE (17) DE MARZO DE 2025

En Montería, el día Diecisiete (17) de marzo de 2025 en las oficinas de la **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA** de la Gobernación de Córdoba se reunieron: la Doctora **CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL** identificada con C.C. No. 50.882.640, en su calidad de **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**, quien actúa como Supervisor(a) designado(a) del contrato de la referencia y el señor **JUAN PABLO BANQUEZ GONZALES** identificado con C.C. No. 1.067.958.787 de Montería, representante legal de **ANTICA S.A.S BIC** con Nit: 901823241-9, en su calidad de interventor del contrato, con el fin de dar inicio a la ejecución del contrato en mención, las partes socializaron las obligaciones establecidas en el **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. SI-CMA-007-2024** y manifestaron estar de acuerdo con la ejecución de las mismas a partir de la fecha.

CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL
C.C. No. 50.882.640
SUPERVISOR
Gobernación de Córdoba

ANTICA S.A.S BIC
Nit: 901823241-9
R.L: Juan Pablo Banquez González
C.C. No. 1.067.958.787
INTERVENTOR

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REVISADO POR:
Nombre: Juan Sebastián Arismendy	Nombre: Oscar Pineda Mendoza	Nombre: GABRIELA RUIZ CARRASCAL
Cargo: Contratista SID	Cargo: Contratista SID	Cargo: Auxiliar Admin SID
Firma	Firma	Firma

ANEXO N°12: PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORÍA

ANEXO N°13: INFORME DE SEGUIMIENTO SST Y AL PGIO

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

INTERVENTORÍA: ANTICA S.A.S BIC

CONTRATO No. SI-CMA-007-2024

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

CONTIENE: INFORME MENSUAL PGIO DE INTERVENTORÍA N°6

PERÍODO DE EJECUCIÓN: 18 DE AGOSTO DE 2025 - 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

MONTERÍA - CÓRDOBA

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 4
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 5
3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 6
4. AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE 7
5. MANEJO AMBIENTAL 8
5.1 ACTIVIDADES REALIZADAS 8
5.1.1 Capacitaciones 8
5.1.2 Jornadas de orden, aseo y limpieza 9
5.1.3 Puntos de disposición de desechos sólidos, manejo de escombros, material reutilizable, material de reciclaje, residuos sólidos convencionales (basura), material de cantera 9
5.1.4 Puntos de acopio de bolsas de cemento 10
5.1.5 Manejo de residuos líquidos, lodos, combustibles, aceites y sustancias químicas 12
5.1.6 Manejo y control de emisiones atmosféricas 12
5.1.7 Manejo y recuperación de la cobertura vegetal 12
5.1.8 Obras de concreto y materiales de construcción 12
6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 13
6.1 ACTIVIDADES BÁSICAS 13
6.1.1 Pagos al sistema de Seguridad Social 13
6.1.2 Capacitaciones 14
6.2 ACTIVIDADES DE MEDICINA PREVENTIVAS Y DEL TRABAJO 17
6.2.1 Índices de accidentalidad y ausentismo 17
6.2.2 Inspecciones 17
6.2.3 Exámenes ocupacionales de ingreso del personal 18
6.2.4 Matriz de peligros y riesgos, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, Reglamento Interno de Trabajo, Política de no consumo de alcohol y sustancias psicoactivas 18
6.3 ACTIVIDADES DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 18
6.3.1 Supervisión de actividades en Obra 18
6.3.2 Control y suministro de EPI's a los trabajadores 20

6.3.3 Reunión del COPASST 20

6.3.4 Señalización preventiva e informativa 20

6.3.5 Elementos y dispositivos para la atención de emergencias, rutas de evacuación y puntos de encuentro 20

Ilustración 1. Localización del proyecto 6
Ilustración 2. Capacitación ambiental. 8
Ilustración 3. Punto ecológico 9
Ilustración 4. Punto ecológico. 9
Ilustración 5. Punto ecológico. 10
Ilustración 6. Punto ecológico 10
Ilustración 7. Acopio para sustancias químicas 11
Ilustración 8. Acopio material CdO 11
Ilustración 9. Acopio material Pelayo 11
Ilustración 10. Pagos sistema de seguridad social. 13
Ilustración 11. Inducción SST 14
Ilustración 12. Notificación de riesgos 15
Ilustración 13. Uso adecuado de EPP 16
Ilustración 14. Botiquín de primeros auxilios-Institución Educativa Marceliano Polo. 17
Ilustración 15. Extintor- Institución Educativa Marceliano Polo. 17
Ilustración 16. Camilla de emergencia- Institución Educativa Santa teresa sede San Pelayo. 18
Ilustración 17. Actividades en obra 19
Ilustración 18. Entrega de EPP y Dotación 20
Ilustración 19. Elementos y dispositivos para la atención de emergencia. 21
Ilustración 20. Rutas de evacuación. 21

1. INTRODUCCIÓN

Las obras de infraestructura generan importantes impactos en el ambiente y la población que deben ser regulados a través del Sistema Integrado de Gestión, el cual está fundamentado en el cumplimiento de la legislación en materia ambiental y de salud y seguridad en el trabajo (Siso-Ambiental). Por un lado, la calidad de vida, salud física y mental del trabajador, el desarrollo de sus capacidades y desempeño, desarrollo personal y social, son promovidas a través del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo implementado durante todas las etapas constructivas del proyecto de obra. De otro lado, las prácticas de control, prevención, mitigación y/o compensación de los múltiples impactos ambientales generados por las actividades propias del proceso constructivo son objeto de trabajo del Plan de Manejo Ambiental (PMA), el cual es generado y ejecutado por el contratista de obra.

Este documento presenta el informe mensual de la gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo realizada durante el periodo comprendido entre el 18 de agosto hasta el 17 de septiembre de 2025 por parte de la Interventoría ANTICA S.A.S BIC en el proyecto: "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

✓ Objeto del Proyecto:	"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"
✓ Departamento:	Córdoba
✓ Municipios:	Cereté, San Pelayo, Ciénaga de oro, Moñitos, Tierralta, Planeta Rica, San Bernardo del Viento, Canalete, San Andrés de Sotavento, Los Córdobas
✓ Contratista:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002

3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

El proyecto se encuentra localizado al noroccidente del país en la región Caribe Colombiana, Departamento de Córdoba. Específicamente en los municipios de Cereté (I.E. Marceliano Polo), San Pelayo (I.E. Santa Teresita sede general Santander), Ciénaga de Oro (I.E. Marco Fidel Suarez), Moñitos (I.E. San José de Moñitos sede principal), Tierralta (I.E. Junín), Planeta Rica (I.E. Plaza bonita), San Bernardo del Viento (I.E. El Castillo), Canalete (I.E. San José de Canalete), San Andrés de Sotavento (I.E. San Simón sede sagrado corazón de Jesús) y Los Córdobas (I.E. El Ébano).



Ilustración 1. Localización del proyecto

4. AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

✓ Corporación autónoma:	Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS)
✓ Jurisdicción:	Todo el territorio del departamento de Córdoba
✓ Sede:	Montería
✓ Dirección:	Carrera 6 N° 61-25, Barrio Los Bongos
✓ Teléfonos:	(604) 789 06 05 – (604) 789 06 09

5. MANEJO AMBIENTAL

5.1 ACTIVIDADES REALIZADAS

A continuación, se da una descripción de las actividades de manejo ambiental realizadas durante el periodo 17 de agosto al 18 de septiembre de 2025 por parte del Consorcio Infraestructura Educativa 002 en el proyecto "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

5.1.1 Capacitaciones

Durante este periodo del proyecto el contratista realizó las siguientes capacitaciones ambientales:

- Medidas de Manejo Ambiental.

CONSORCIO

ACTA DE REUNIÓN Y/O CAPACITACIÓN

CÓDIGO: FOR-HSE-01	VERSIÓN: 01	FECHA: 01/08/2023

PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA"
FECHA	10-08-2025 — DURACIÓN: 30 min
CAPACITACIÓN (X) / CHARLA / ENTRENAMIENTO / REUNIÓN	TEMA: Medidas de autocuidado e identificación de peligros y riesgos durante la jornada laboral.
OBJETIVO	Capacitar al personal en la adopción de medidas de autocuidado y en la correcta identificación de peligros y riesgos, con el fin de prevenir accidentes y promover una cultura de autocuidado.
FACILITADOR	José Castillo S.

NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
Andy Agámez G.	1 067 940 218	Residente	Andy Agamez G
Hector Ramírez L	19 191 922	Eléctrico	
Ricardo Castro E	77 747 099	Residente	
José Álvarez O.	1233 340 397	Residente	
Sharon Corrales M.	1 067 948 893	Ambiental Gestalma	Sharon Corrales M.
Heriberto Torres P	1073 155 444	Maestro	HERIBERTO
Jhojan Vergara P.	92 237 694	Impulsor	Johan Vergara
Carmelo Cogollo D	1 043 818 229	Ayudante	Carmelo Cogollo
Olier Plaza L.	73. 22988	Ayudante	Olier Plaza
Never Alean A.	1 066 735 527	Oficial	Never Alean
Hernan de Jesús V.	6888826	Ayudante	HERNAN de Jesus
Manuel Mercado R.	1 574 798	Oficial	Manuel Mercado
Cesar Argüello G.	1 064 976 964	Ayudante	Cesar Argüello
José Ayala H.	92 025 167	Oficial	José Ayala
Oscar Franco R.	1 003 457 859	Ayudante	OSCAR FRANCO

Ilustración 2. Capacitación ambiental.

5.1.2 Jornadas de orden, aseo y limpieza

Durante recorridos e inspecciones de obra durante el periodo comprendido se observó condiciones de orden y aseo aceptables en los frentes de trabajo, el encargado SST llevó a cabo programa de mejoramiento de orden y aseo en todas las unidades de trabajo mejorando el criterio de orden y aseo a bueno; el material sobrante producto de las actividades realizadas es ubicado y señalizado en lugares específicos; las condiciones de orden, aseo y limpieza de los baños existentes en los frentes de obra son aceptables.

5.1.3 Puntos de disposición de desechos sólidos, manejo de escombros, material reutilizable, material de reciclaje, residuos sólidos convencionales (basura), material de cantera

En los frentes de trabajo se cuenta con puntos de disposición de desechos sólidos para mitigar el impacto ambiental generado por la dispersión de estos, se encuentran señalizados y socializados con el personal del proyecto, se realiza separación adecuada de desechos.

- CERETÉ:



Ilustración 3. Punto ecológico.

- CIÉNAGA DE ORO:

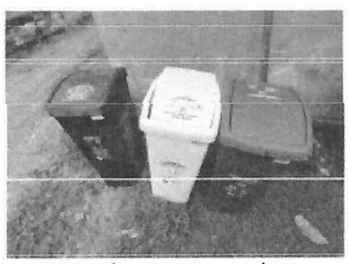


Ilustración 4. Punto ecológico.

- SAN PELAYO:

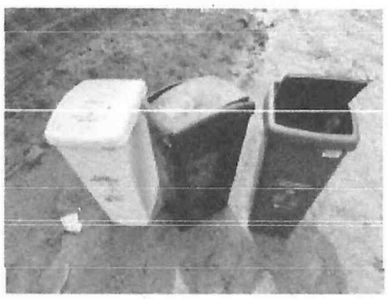


Ilustración 5. Punto ecológico.

- CANALETE:

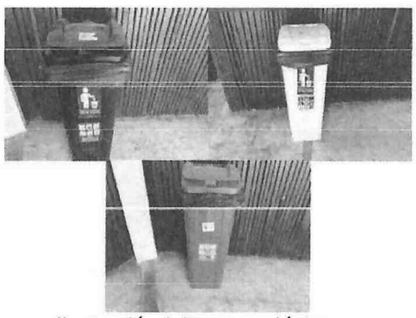


Ilustración 6. Punto ecológico.

En lo relacionado con escombros, el contratista entregará el material a lotes con necesidades de rellenos, previa autorización de las autoridades competentes, el material de cantera en los frentes de trabajo es cubierto con plástico con el fin de evitar la contaminación de este.

Los materiales de construcción, como la arena y la piedra china, se almacenan en áreas designadas para acopio, las cuales se señalan con cinta de seguridad para su uso posterior. Por su parte, el acero y otros insumos se guardan en la bodega correspondiente a cada obra.

5.1.4 Puntos de acopio de bolsas de cemento

Las bolsas vacías de cemento se consideran un residuo peligroso según la LER pues se cataloga como "Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas", el contratista cuenta con puntos de acopio de bolsas de cemento y demás sustancias químicas utilizadas en obra.

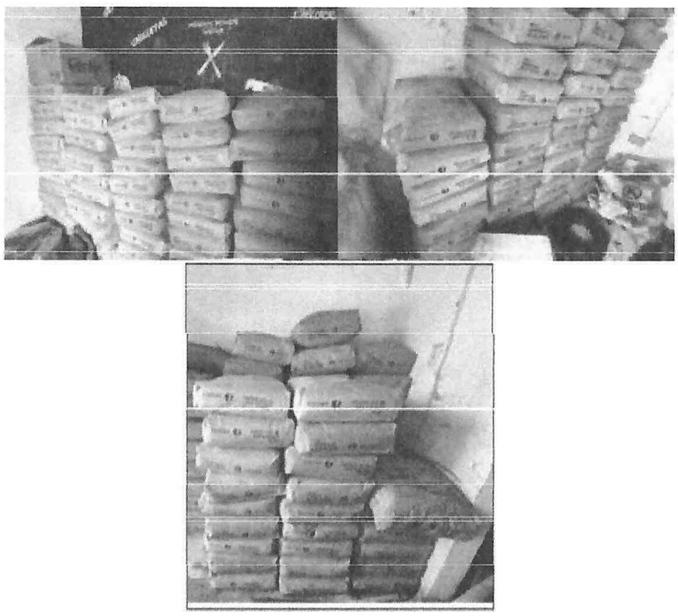


Ilustración 7. Acopio para sustancias químicas.



Ilustración 8. Acopio material CdO



Ilustración 9. Acopio material Pelayo

5.1.5 Manejo de residuos líquidos, lodos, combustibles, aceites y sustancias químicas

El contratista cuenta con las hojas de seguridad y tarjetas de emergencia de las sustancias químicas con las que se trabajan en los frentes de trabajo, los envases donde se conservan sustancias como la gasolina y demás se encuentran rotulados en los diferentes frentes de trabajo.

Los cambios de aceite y suministro de combustible a maquinaria y equipo se realizan de conformidad con los protocolos establecidos.

5.1.6 Manejo y control de emisiones atmosféricas

La maquinaria y vehículos con los que cuenta el contratista en obra cuentan con certificado tecno mecánicos y SOAT vigentes. De igual manera el contratista implementa los siguientes controles:

- Las volquetas que transportan material operan en horarios de 7:00:00 am – 5:00:00 pm.
- Los materiales que generan material particulado son cubiertos con plásticos para el transporte a obra.
- La velocidad de las volquetas no supera los 30 km/h.
- No se realizan quemas a cielo abierto.

5.1.7 Manejo y recuperación de la cobertura vegetal

Durante este periodo de trabajo no se generaron impactos negativos por motivos de la ejecución del proyecto. De igual forma, no se requirió la ejecución de acciones de rescate como tampoco relocalización de especies silvestres.

5.1.8 Obras de concreto y materiales de construcción

Se realiza el manejo de concretos de acuerdo a los protocolos ambientales y de seguridad.

6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

A continuación, se da una descripción de las actividades en seguridad y salud en el trabajo realizado durante el periodo 18 de agosto al 17 de septiembre de 2025 por parte del Consorcio Infraestructura Educativa 002 en el proyecto "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

6.1 ACTIVIDADES BÁSICAS

6.1.1 Pagos al sistema de Seguridad Social

Se hace recolección de la documentación que soporta los pagos de seguridad social efectuados por el Consorcio Infraestructura Educativa 002, se verifica que el personal que está en obra coincida con el personal que aparece en planilla, la última planilla de pago de seguridad social cancelada por el contratista tiene fecha de pago de 23 de junio de 2025.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901115670	3	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE 6 A 64 A56	MONTERIA-CORDOBA	7828082	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-04	2025-05	091446547	9406470929	E	2025/05/19	2025/05/23	BANCO DE OCCIDENTE	4	$6,197,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación	Nombres	PENSION Código	Días	IBC	Aporte	SALUD Código	Días	IBC	Aporte	CCF Código	Días	IBC	Aporte	RIESGOS Código	Días	IBC	Aporte	PARAFISCALES Días	IBC	Aporte
1	CC 1067940218	ADAMEZ CEVEY ANDY ARIEL	23030+	30	$2,300,000	$230,000	EPS005	30	$2,300,000	$80,500	CCF43	30	$2,300,000	$80,500	14-11	30	$2,300,000	$138,200	30	$0	$0
2	CC 1033340347	ALVAREZ ORTEGA JOSE CARLOS	23030+	30	$2,300,000	$230,000	EPS005	30	$2,300,000	$80,500	CCF43	30	$2,300,000	$80,500	14-11	30	$2,300,000	$138,200	30	$0	$0
3	CC 1020799927	BEJARANO HERNANDEZ DIANA MARGARITA	23030+	30	$2,300,000	$230,000	EPS037	30	$2,300,000	$80,500	CCF43	30	$2,300,000	$80,500	14-11	30	$2,300,000	$138,200	30	$0	$0
4	CC 78748096	CASTRO ESCOBAR RICARDO JAVIER	23030+	30	$2,300,000	$230,000	EPS042	30	$2,300,000	$80,500	CCF43	30	$2,300,000	$80,500	14-11	30	$2,300,000	$138,200	30	$0	$0
5	CC 1073213324	CORDILLO DIAZ CARMELO JAVIER	23030+	30	$1,423,500	$227,800	EPS042	30	$1,423,500	$57,000	CCF43	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$85,500	30	$0	$0
6	CC 1067941965	CURRALES MARTINEZ DAIRON MELISA	23030+	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF43	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$85,500	30	$0	$0
7	CC 1074813077	DIAZCLL QUINTANA WILSON JAVIER	23030+	15	$568,400	$91,200	EPS037	15	$568,400	$22,800	CCF43	15	$568,400	$22,800	14-11	15	$568,400	$34,150	15	$0	$0
8	CC 1073420983	SALINAS BARRERA CAMILO ANDRES	23030+	6	$284,700	$45,600	EPS042	6	$284,700	$11,400	CCF43	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$17,100	6	$0	$0
9	TC 1065595857	MARTINEZ DORIA CARMELO ANTONIO	23030+	6	$284,700	$45,600	EPS037	6	$284,700	$11,400	CCF43	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$17,100	6	$0	$0
10	CC 15002179	ARRAZOLA ARRAZOLA MARINO TITO	23030+	12	$568,400	$91,200	EPS037	12	$568,400	$22,800	CCF43	12	$568,400	$22,800	14-11	12	$568,400	$34,200	12	$0	$0
11	CC 78701026	MONTES SANCHEZ ALEX ERNESTO	23-14	6	$284,700	$45,600	EPS037	6	$284,700	$11,400	CCF43	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$17,100	6	$0	$0
12	CC 7182988	OLAYA CASARES ELIER JESUS	23030+	30	$1,423,500	$227,800	EPS042	30	$1,423,500	$57,000	CCF43	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$85,500	30	$0	$0
13	CC 1044941023	RAMIREZ JIMENEZ HECTOR	23-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF43	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$85,500	30	$0	$0
14	CC 1003823918	SERPA DE LA CRUZ IVAN MANUEL	23030+	30	$1,423,500	$227,800	EPS034	30	$1,423,500	$57,000	CCF43	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$85,500	30	$0	$0
15	CC 1003155844	TORRES TOLEDO ERNESTO ANTONIO	23030+	13	$1,423,500	$227,800	EPS037	13	$1,423,500	$57,000	CCF43	13	$1,423,500	$57,000	14-11	13	$1,423,500	$85,500	13	$0	$0
16	CC 7223784	VERGARA PORTILLO ENELDER	23030+	30	$1,423,500	$227,800	EPS042	30	$1,423,500	$57,000	CCF43	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$85,500	30	$0	$0
Total	Afiliados(16)				$19,957,400	$3,193,200			$19,957,400	$798,800			$19,957,400	$798,800			$19,957,400	$1,209,600		$0	$0


Ilustración 10. Pagos sistema de seguridad social.

6.1.2 Capacitaciones

Durante este periodo el contratista realizó capacitaciones con el propósito de fortalecer los conocimientos básicos de los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo y con esto reducir la probabilidad de ocurrencia de un incidente o accidente de trabajo; estas capacitaciones se verifican de acuerdo al cronograma de trabajo SISOMA suministrado por el contratista.

Las capacitaciones realizadas son las siguientes:

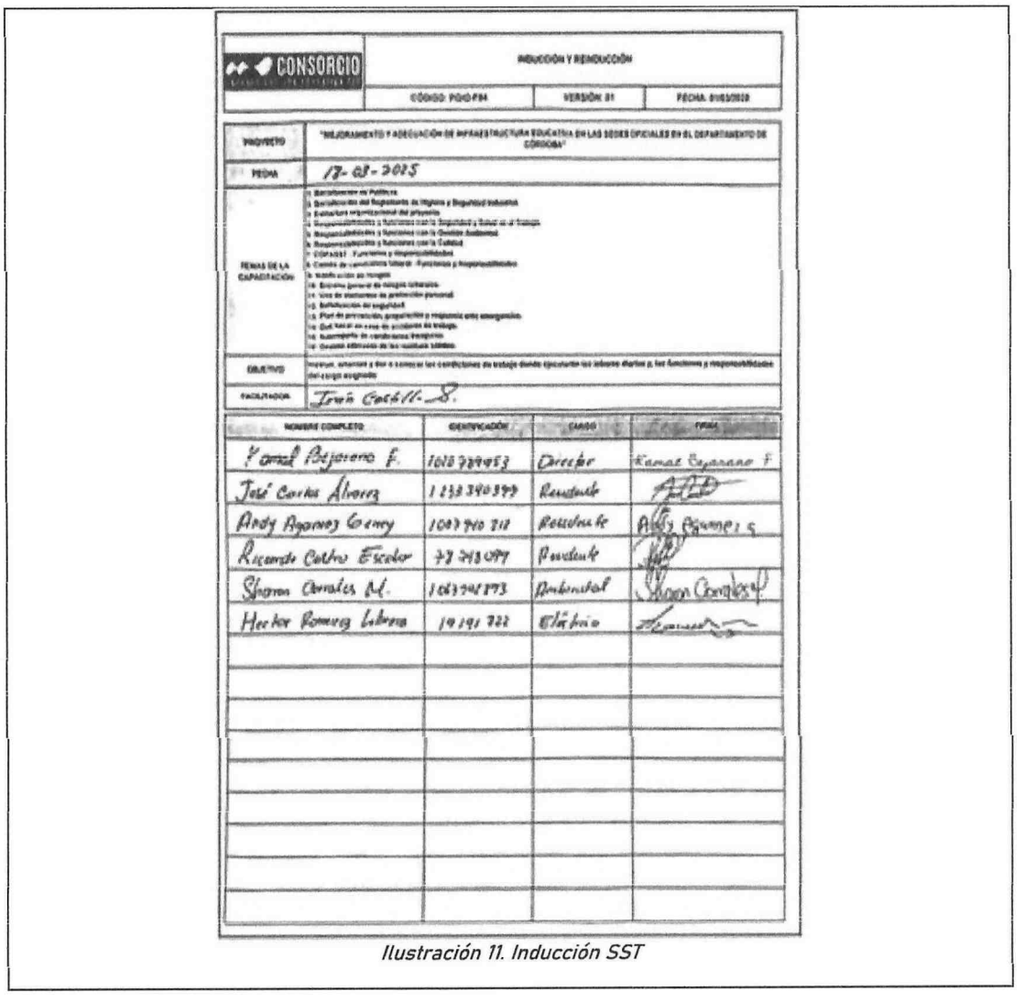- ✓ Inducción SST
- ✓ Notificación de riesgos.
- ✓ Uso adecuado de EPP.



CONSORCIO

INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

CÓDIGO: PGIO-F04	VERSIÓN: 01	FECHA: 01/03/2023

PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

FECHA: 17-03-2025


TEMAS DE LA CAPACITACIÓN:
a. Socialización de Política
b. Socialización del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
c. Estructura organizacional del proyecto
d. Responsabilidades y funciones con la Seguridad y Salud en el Trabajo
e. Responsabilidades y funciones con la Gestión Ambiental
f. Responsabilidades y funciones con la Calidad
g. COPASST - Funciones y responsabilidades
h. Comité de convivencia laboral - Funciones y responsabilidades
i. Identificación de riesgos
j. Sistema general de riesgos laborales
k. Uso de elementos de protección personal
l. Señalización de seguridad
m. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias
n. Qué hacer en caso de accidente de trabajo
o. Accidente de trabajo y enfermedad laboral
p. Gestión ambiental de las medidas sociales

OBJETIVO: Impartir, orientar y dar a conocer las condiciones de trabajo dentro ejecución en labores diarias y, las funciones y responsabilidades del cargo asignado

FACILITADOR: Irwin Castillo S.

NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
Yamil Pajaro F.	1083739453	Director	Yamil Pajaro F.
José Carlos Alvarez	1 038 390 399	Residente	
Andy Aguirre Gomez	1003 940 712	Residente	
Ricardo Castro Escobar	77 213 099	Residente	
Sharon Morales M.	1063 941 893	Ambiental	
Hector Romero Lobera	19 191 722	Eléctrico	

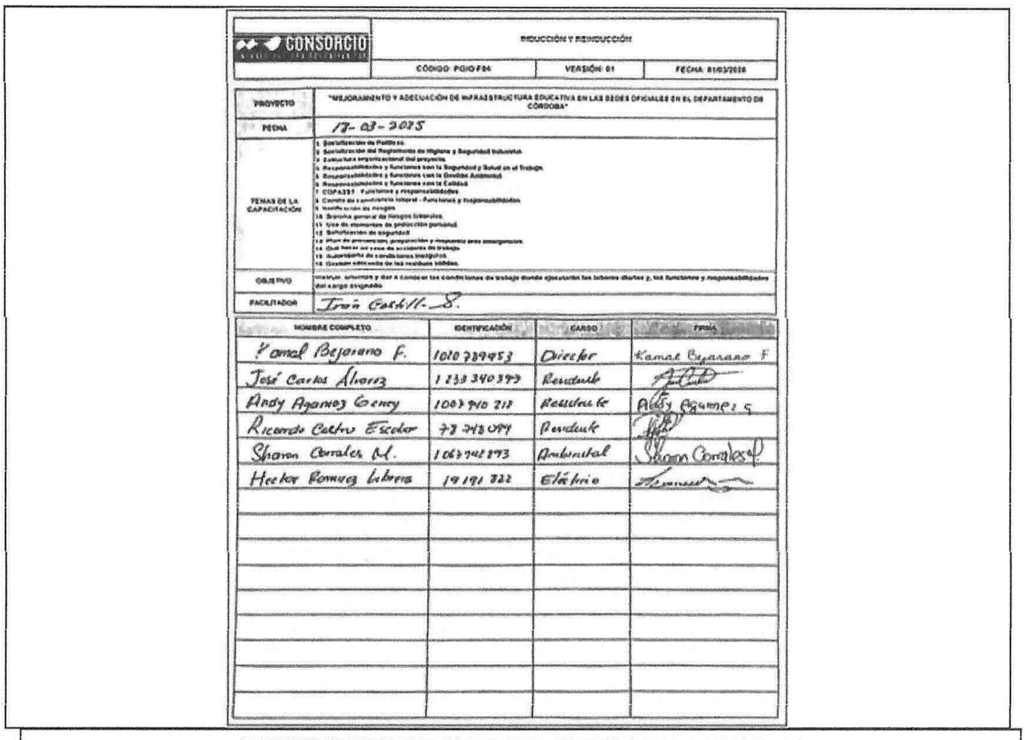Ilustración 11. Inducción SST




CONSORCIO

INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

CÓDIGO: PGIO-F04	VERSIÓN: 01	FECHA: 21/03/2025

PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"
FECHA	17-03-2025
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	1. Socialización de Política. 2. Socialización del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 3. Estructura organizacional del proyecto. 4. Responsabilidades y funciones con la Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Responsabilidades y funciones con la Gestión Ambiental. 6. Responsabilidades y funciones con la Calidad. 7. COPASST: Funciones y responsabilidades. 8. Comité de convivencia laboral - Funciones y responsabilidades. 9. Identificación de riesgos. 10. Matriz general de riesgos laborales. 11. Uso de elementos de protección personal. 12. Señalización de seguridad. 13. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 14. Qué hacer en caso de accidente de trabajo. 15. Autocuidado de condiciones inseguras. 16. Gestión adecuada de los residuos sólidos.
OBJETIVO	Instruir, orientar y dar a conocer las condiciones de trabajo donde ejecutarán las labores diarias y, las funciones y responsabilidades del cargo asignado.
FACILITADOR	Ivan Castillo S.

NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
Yamal Bejarano F.	1010 729953	Director	Kamar Bejarano F
José Carlos Álvarez	1 238 340 373	Residente	
Andy Agamez Cency	1083 940 213	Residente	Andy Agamez C
Ricardo Castro Escobar	77 243 089	Residente	
Sharon Corrales M.	1 067 942 893	Ambiental	Sharon Corrales M
Hector Romero Lobera	19 191 822	Eléctrico	

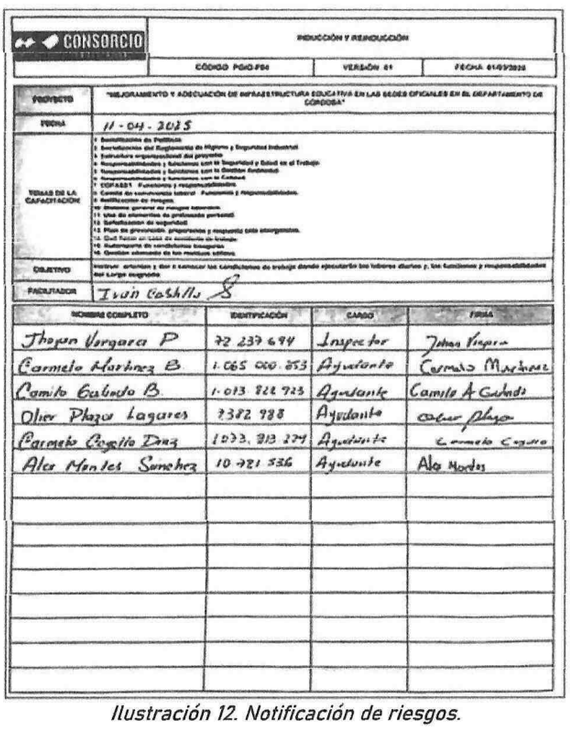

CONSORCIO


INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

CÓDIGO: PGIO-F04	VERSIÓN: 01	FECHA: 01/09/2025

PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"
FECHA	11-04-2025
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	1. Socialización de Política. 2. Socialización del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 3. Estructura organizacional del proyecto. 4. Responsabilidades y funciones con la Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Responsabilidades y funciones con la Gestión Ambiental. 6. Responsabilidades y funciones con la Calidad. 7. COPASST: Funciones y responsabilidades. 8. Comité de convivencia laboral - Funciones y responsabilidades. 9. Identificación de riesgos. 10. Matriz general de riesgos laborales. 11. Uso de elementos de protección personal. 12. Señalización de seguridad. 13. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 14. Qué hacer en caso de accidente de trabajo. 15. Autocuidado de condiciones inseguras. 16. Gestión adecuada de los residuos sólidos.
OBJETIVO	Instruir, orientar y dar a conocer las condiciones de trabajo donde ejecutarán las labores diarias y, las funciones y responsabilidades del cargo asignado.
FACILITADOR	Ivan Castillo S

NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
Jhojan Vergara P	72 237 694	Inspector	Jhojan Vergara
Carmelo Martinez B.	1.065 000 853	Ayudante	Carmelo Martinez
Camilo Eubardo B.	1.013 822 923	Ayudante	Camilo A Eubardo
Olver Plaza Lagares	7382 988	Ayudante	Olver plaza
Carmelo Cogollo Diaz	1033. 813 279	Ayudante	Carmelo Cogollo
Alex Montes Sanchez	10 721 536	Ayudante	Alex Montes

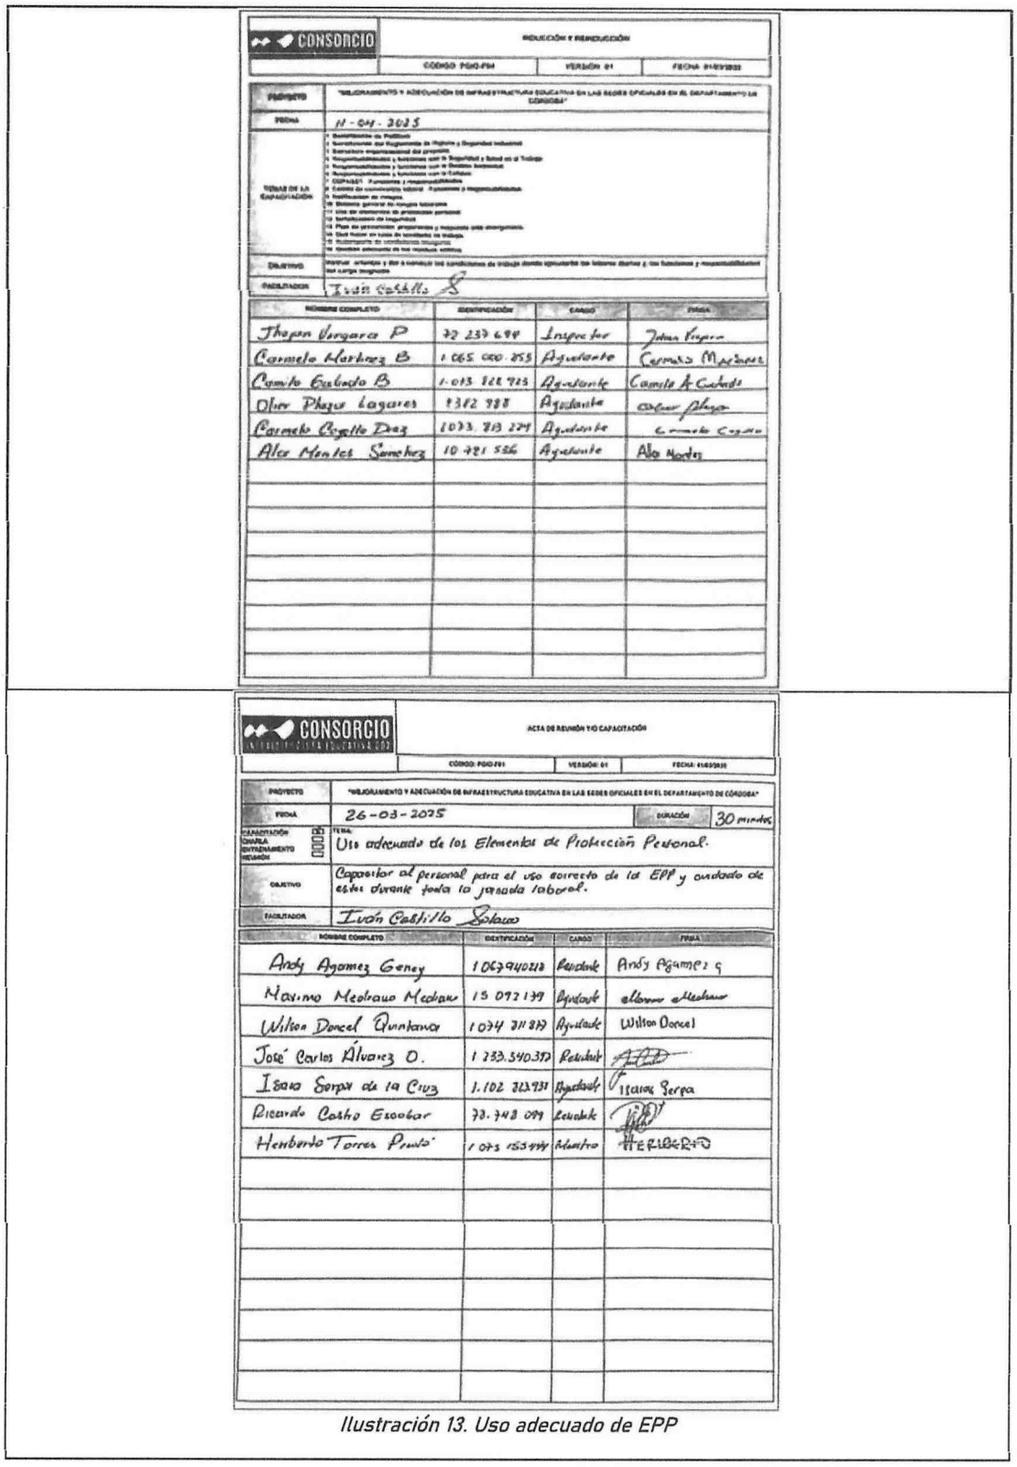Ilustración 12. Notificación de riesgos.



CONSORCIO — REDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

CÓDIGO: PGIO-F04 | VERSIÓN: 01 | FECHA: 01/07/2025

PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

FECHA: N - 04 - 2025

TEMAS DE LA CAPACITACIÓN:
1 Responsabilidades del Trabajador
2 Generalidades del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
3 Generalidades organizacional del proyecto
4 Responsabilidades y funciones con la Seguridad y Salud en el Trabajo
5 Responsabilidades y funciones con el Medio Ambiente
6 Responsabilidades y funciones con la Calidad
7 COPASST Funciones y responsabilidades
8 Comité de convivencia laboral Funciones y responsabilidades
9 Identificación de riesgos
10 Sistema general de riesgos laborales
11 Uso de elementos de protección personal
12 Señalización de seguridad
13 Plan de prevención preparación y respuesta ante emergencias
14 Qué hacer en caso de accidente de trabajo
15 Enfermedad de condiciones laborales
16 Conceptos básicos de las riesgos viales

OBJETIVO: Brindar orientación y dar a conocer las condiciones de trabajo dentro ejecución de labores diarias y las funciones y responsabilidades del cargo asignado

FACILITADOR: Iván Castillo S

NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
Jhoan Vergara P	77 237 694	Inspector	Jhoan Vergara
Carmelo Martinez B	1 065 000 855	Ayudante	Carmelo Martinez
Camilo Eubeto B	1 013 922 925	Ayudante	Camilo A Cubeto
Oliver Pheyre Lagares	1312 988	Ayudante	Oliver Pheyre
Carmelo Cogollo Diaz	1033. 813 224	Ayudante	Carmelo Cogollo
Alex Montes Sanchez	10 721 556	Ayudante	Alex Montes

CONSORCIO — ACTA DE REUNIÓN Y/O CAPACITACIÓN

CÓDIGO: PGIO-F01 | VERSIÓN: 01 | FECHA: 01/07/2025

PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

FECHA: 26-03-2025 | DURACIÓN: 30 minutos

CAPACITACIÓN (X) CHARLA ENTRENAMIENTO REUNIÓN — TEMA: Uso adecuado de los Elementos de Protección Personal.

OBJETIVO: Capacitar al personal para el uso correcto de la EPP y cuidado de estos durante toda la jornada laboral.

FACILITADOR: Iván Castillo Solano

NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
Andy Agamez Goney	1063940218	Ayudante	Andy Agamez G
Maximo Medrano Medrano	15 092 179	Ayudante	Medrano Medrano
Wilson Dorcel Quintana	1034 311 879	Ayudante	Wilson Dorcel
José Carlos Alvarez O.	1 232.540.370	Residente	
Isaias Borja de la Cruz	1.102 213 731	Ayudante	Isaias Borja
Ricardo Cotho Escobar	78.748 089	Residente	
Heriberto Torres Prieto	1 073 153 944	Alcantro	HERIBERTO

Ilustración 13. Uso adecuado de EPP

6.2 ACTIVIDADES DE MEDICINA PREVENTIVAS Y DEL TRABAJ

6.2.1 Índices de accidentalidad y ausentismo

Se realizó seguimiento continuo a las actividades en obra para minimizar los accidentes e incidentes de trabajo, durante la ejecución de las actividades en este periodo, no se presentaron accidentes de trabajo.

6.2.2 Inspecciones

Durante el periodo de trabajo el contratista realiza inspecciones preventivas en búsqueda de aumentar las condiciones de seguridad de los trabajadores, entre las inspecciones realizadas se encuentran:

- ✓ Inspección de herramientas.
- ✓ Inspecciones de botiquín.
- ✓ Inspecciones de extintores.
- ✓ Inspecciones de maquinaria y equipos.



Ilustración 14. Botiquín de primeros auxilios-Institución Educativa Marceliano Polo.



Ilustración 15. Extintor- Institución Educativa Marceliano Polo.

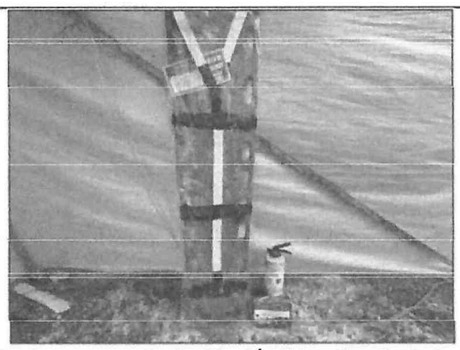


Ilustración 16. Camilla de emergencia- Institución Educativa Santa teresa sede San Pelayo.

6.2.3 Exámenes ocupacionales de ingreso del personal

El consorcio Infraestructura Educativa 002 muestra evidencia física de los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, el personal de obra de acuerdo a los resultados de los exámenes es apto para realizar las labores que el proyecto genera.

6.2.4 Matriz de peligros y riesgos, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, Reglamento Interno de Trabajo, Política de no consumo de alcohol y sustancias psicoactivas

El contratista tiene publicada en los frentes de trabajo la matriz de peligros y riesgos, se evidencia publicación del reglamento de higiene y seguridad industrial, reglamento interno de trabajo, política de no consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en los frentes de trabajo.

6.3 ACTIVIDADES DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

6.3.1 Supervisión de actividades en Obra

Se realiza supervisión en las actividades en donde se requieren suministro de los EPI reglamentarios para el adecuado desempeño de las actividades respectivas en los ejes necesarios para el control seguro de trabajo en todos los frentes y áreas respectivas del proyecto.

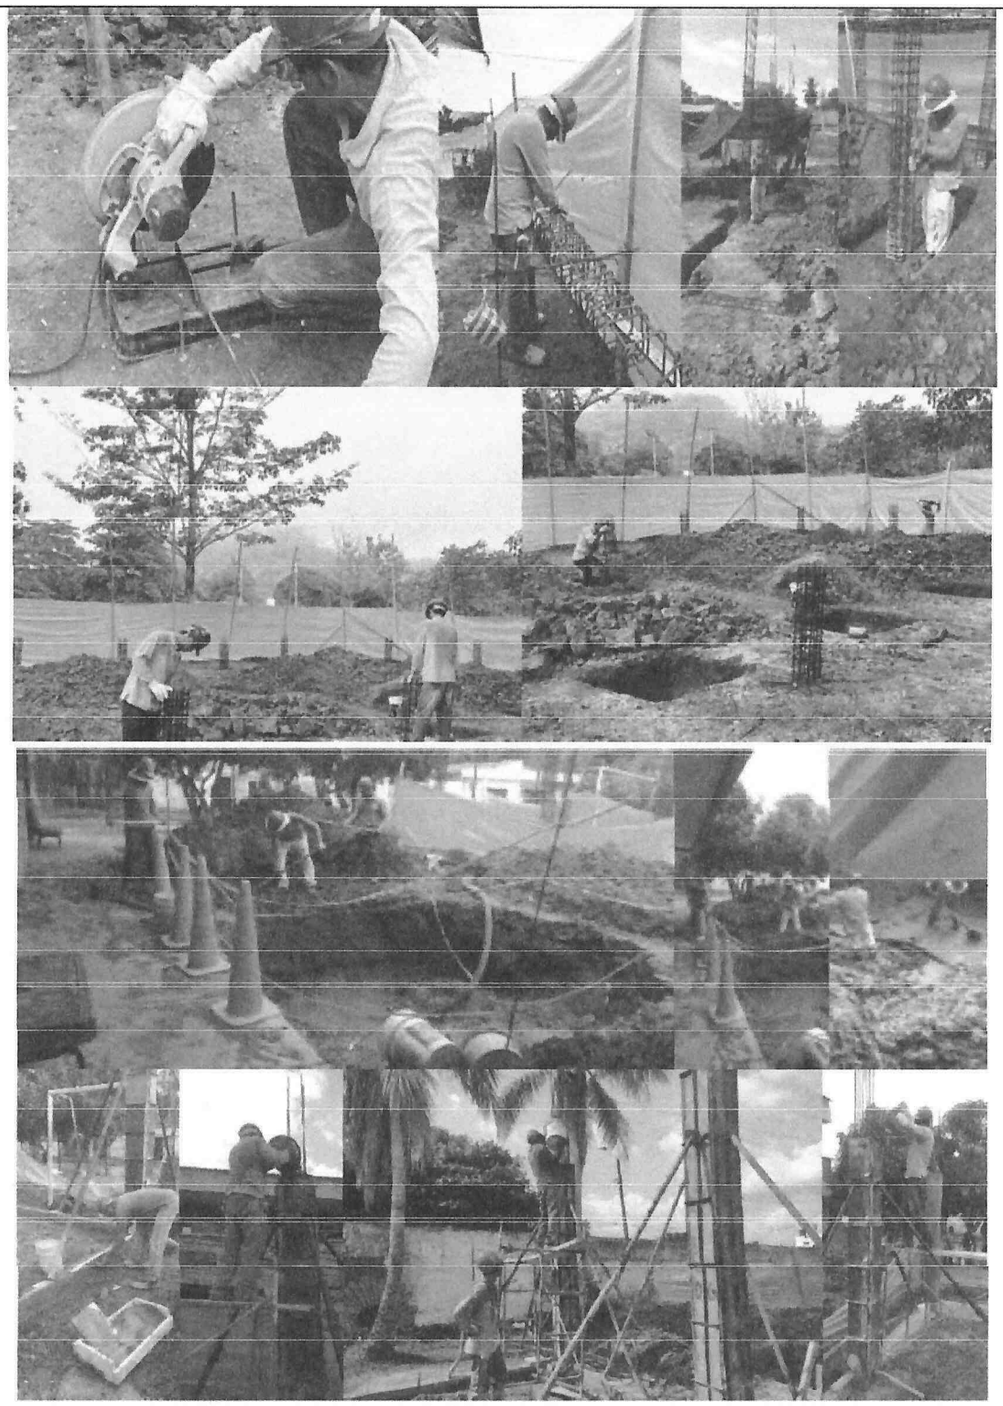


Ilustración 17. Actividades en obra.

6.3.2 Control y suministro de EPI's a los trabajadores

Se realiza control y entrega permanente de los elementos de protección personal (casco, tapa oídos tipo inserción, gafas, guantes, botas) a los trabajadores en el proyecto por parte del contratista con respecto a la naturaleza de la actividad realizada, los EPI en mal estado son recogidos y posteriormente reciclados. En inspecciones en campo se observaba que los trabajadores tienen buen uso de los elementos de protección personal.



Ilustración 18. Entrega de EPP y Dotación.

6.3.3 Reunión del COPASST

El encargado SST durante el periodo comprendido realizó la reunión correspondiente con los miembros del Copasst.

6.3.4 Señalización preventiva e informativa

El contratista mantiene señalización preventiva e informativa en los frentes de trabajo, identificando las posibles fuentes de accidentes e incidentes de trabajo, informando del uso obligatorio de EPI, la ruta de evacuación, los puntos de encuentro y los dispositivos para la atención de emergencias.

6.3.5 Elementos y dispositivos para la atención de emergencias, rutas de evacuación y puntos de encuentro

Se realizó inspección y verificación de los dispositivos y elementos para la atención de emergencias, tales como camilla rígida con inmovilizador de cuello, botiquín de primeros auxilios y extintores en los frentes de trabajo. Se evidencia señalización de ruta de emergencia y puntos de encuentros definidos.

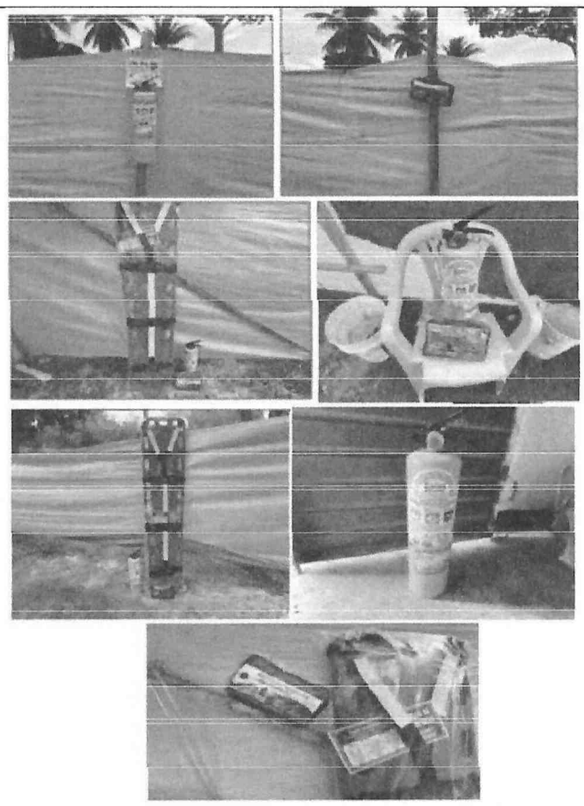


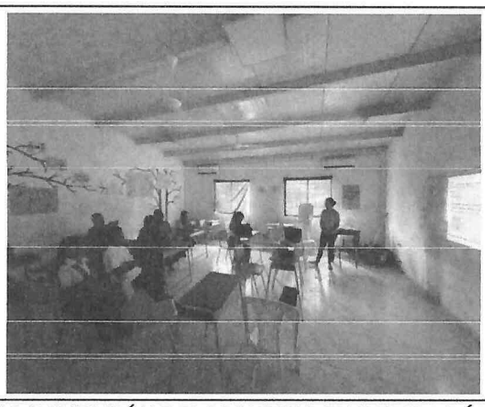
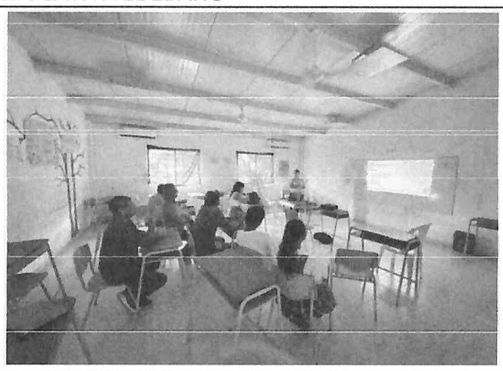
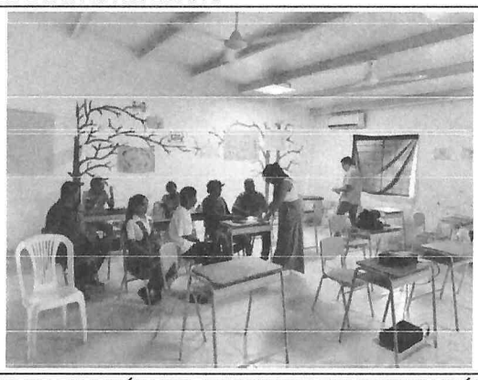
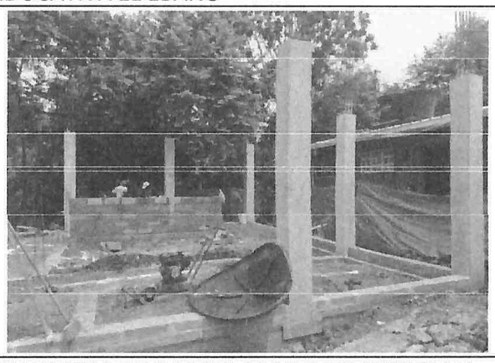
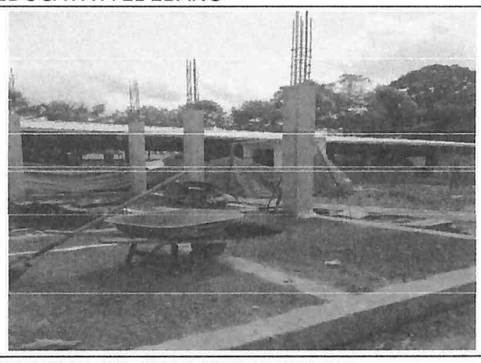
Ilustración 19. Elementos y dispositivos para la atención de emergencia.

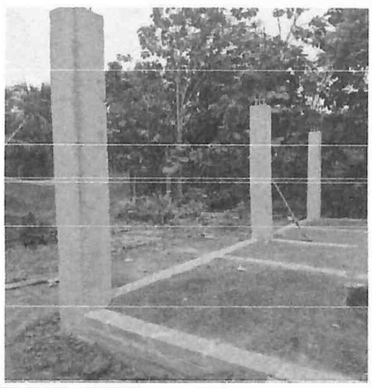
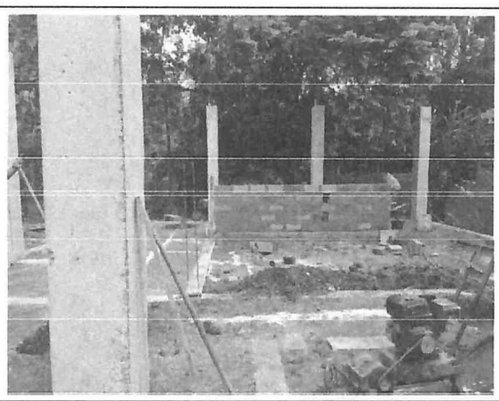
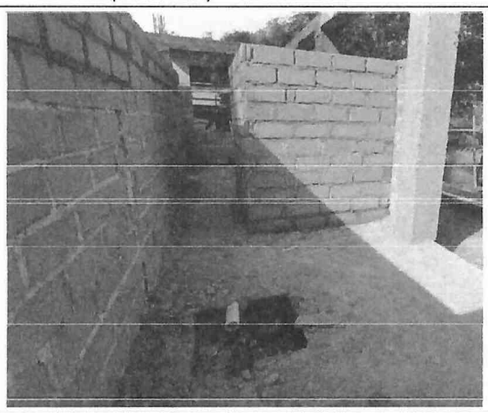
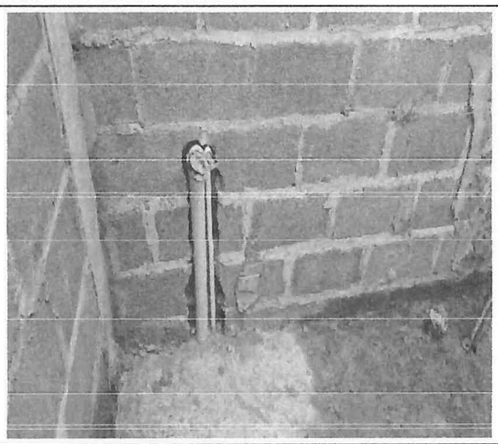
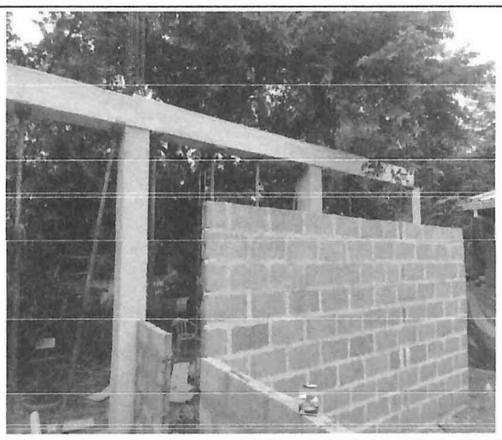








Ilustración 20. Rutas de evacuación.



ANEXO N°14: REGISTRO FOTOGRÁFICO







REGISTRO FOTOGRÁFICO





	
SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ÉBANO	SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ÉBANO
	
SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ÉBANO	SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ÉBANO
	
COLUMNAS DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) - TIERRALTA	RELLENO DEL AREA CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO - TIERRALTA





	
COLUMNAS DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) – TIERRALTA	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL DE TUBERIA PRESION - TIERRALTA
	
CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION 60X60X100 CM - TIERRALTA	PUNTO SANITARIO 2" - TIERRALTA
	
PUNTO SANITARIO Y PUNTO HIDRAULICO - TIERRALTA	VIGA SUPERIOR DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) - TIERRALTA

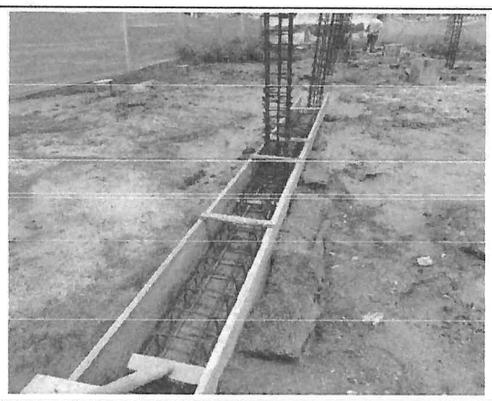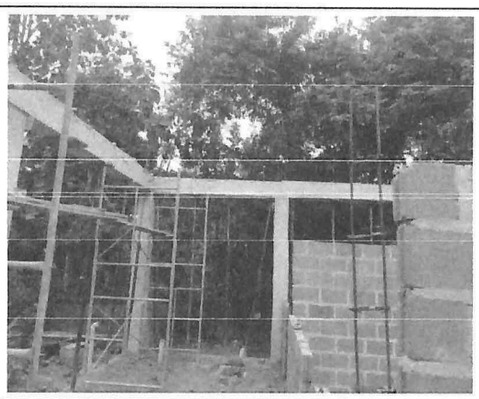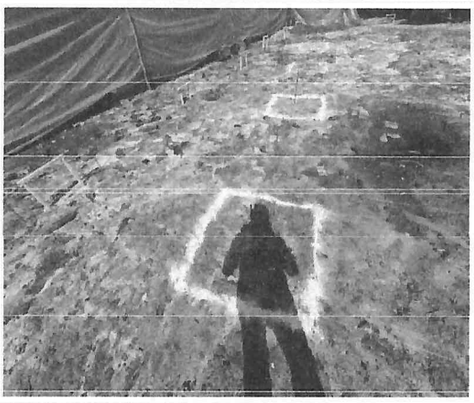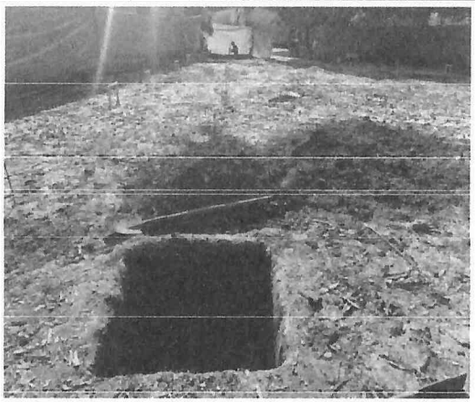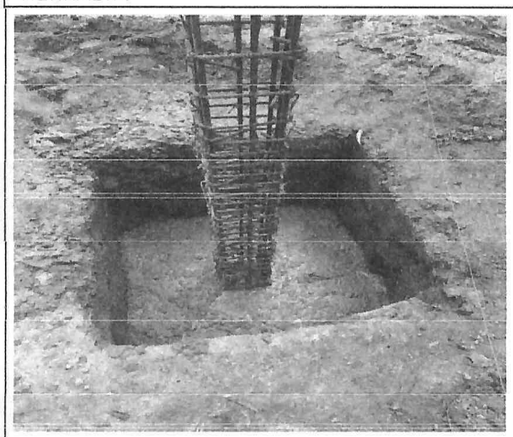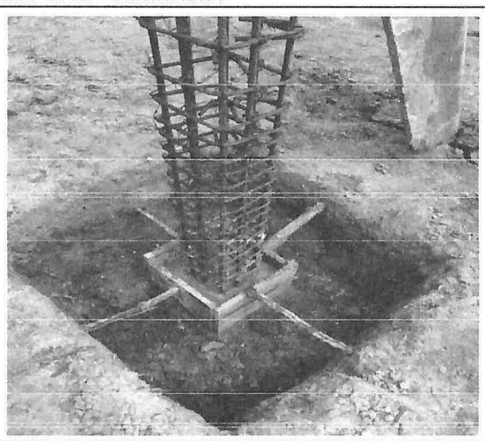	
VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) - TIERRALTA	VIGA SUPERIOR DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) - TIERRALTA
	
LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO - TIERRALTA	EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS DE 1.00 X 1.00 MTS - TIERRALTA
	
ZAPATAS DE 1.00 X 1.00 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) - TIERRALTA	PEDESTAL EN CONCRETO - ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA CIMENTACIÓN - TIERRALTA

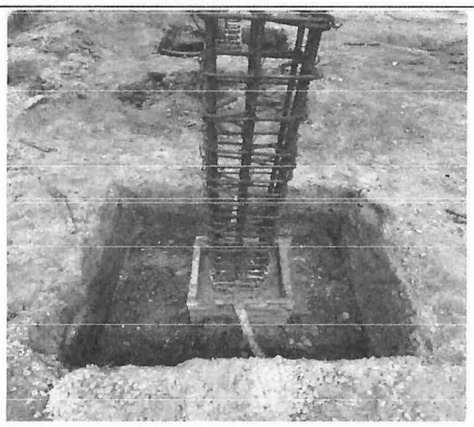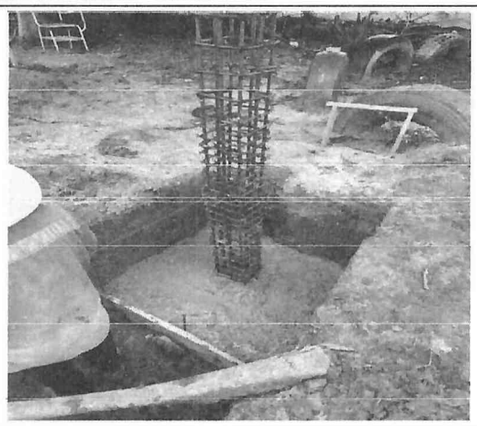	
ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA CIMENTACIÓN - TIERRALTA	ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA CIMENTACIÓN - TIERRALTA
	
PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000PSI - TIERRALTA	ZAPATAS DE 1.00 X 1.00 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) - TIERRALTA
	
S/I DE PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 0.50X0.50 MTS COLOR BLANCA O BEIGE - CANALETE	ILUMINARIA – CERETÉ

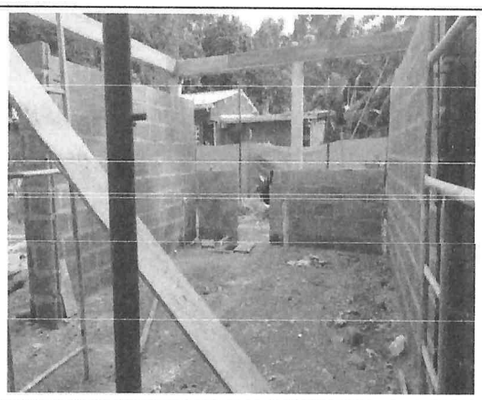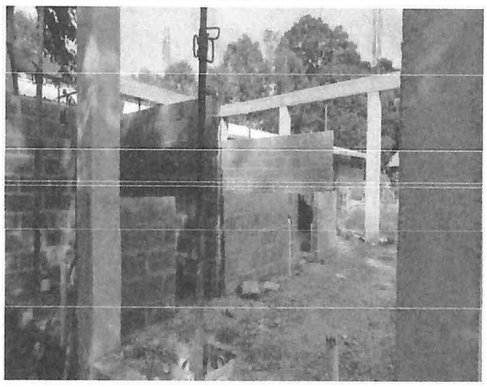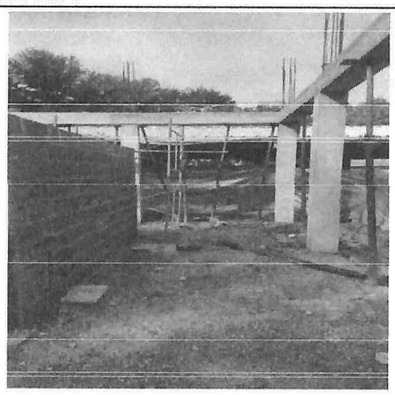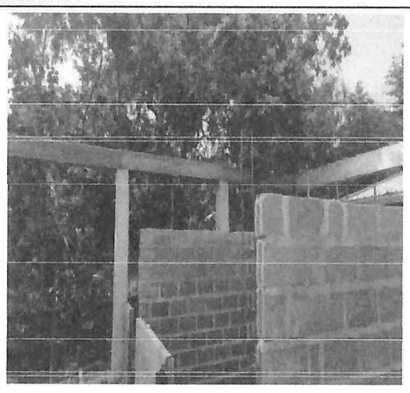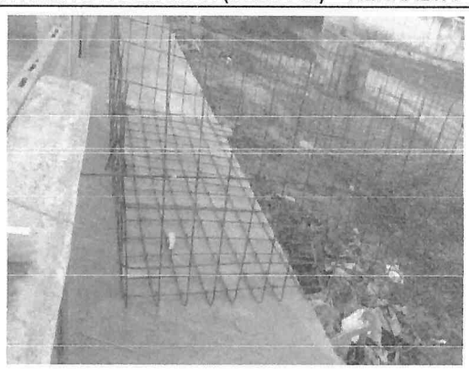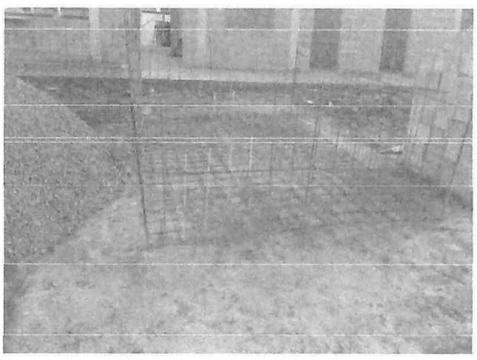	
LEVANTE DE MURO EN BLOQUE SEMIESTRUCTURAL DE 0.12MTS X 0.20MTS X 0.40MTS CON PEGA DE MORTERO 1:4 - TIERRALTA	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE SEMIESTRUCTURAL DE 0.12MTS X 0.20MTS X 0.40MTS CON PEGA DE MORTERO 1:4 - TIERRALTA
	
VIGA SUPERIOR DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) - TIERRALTA	VIGA SUPERIOR DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) - TIERRALTA
	
ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA PARA ESTRUCTURA TANQUE -MOÑITOS	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA PARA ESTRUCTURA TANQUE - MOÑITOS

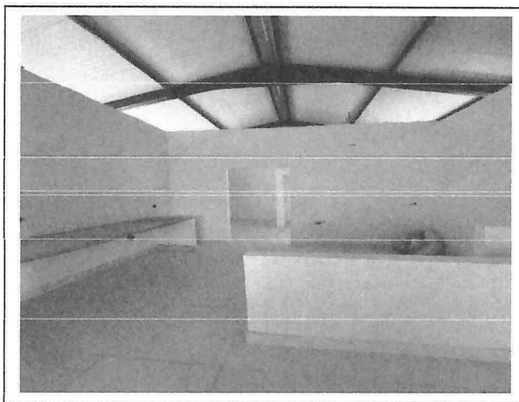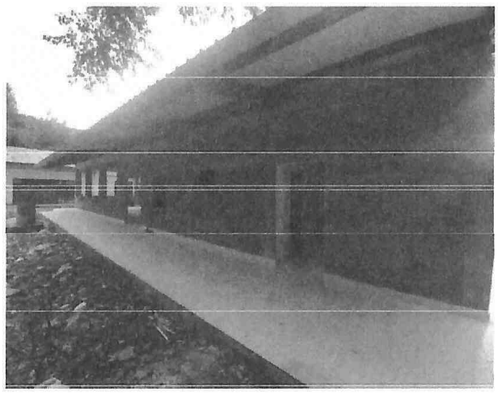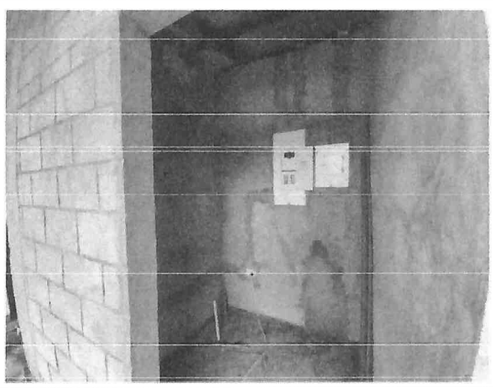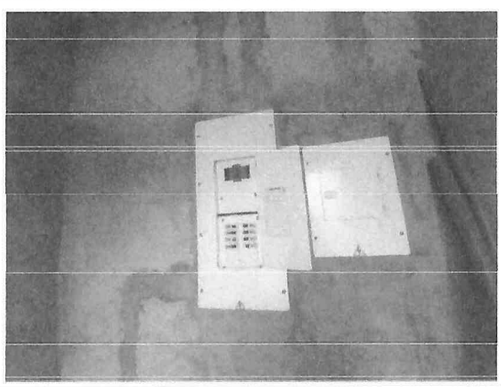	
ESTUCO PLASTICO PARA MUROS – CIENAGA DE ORO	GENERAL - MOÑITOS
	
PLANTILLA EN CONCRETO 3000 PSI, E= 0.10MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA - MOÑITOS	GENERAL – CIENAGA DE ORO
	

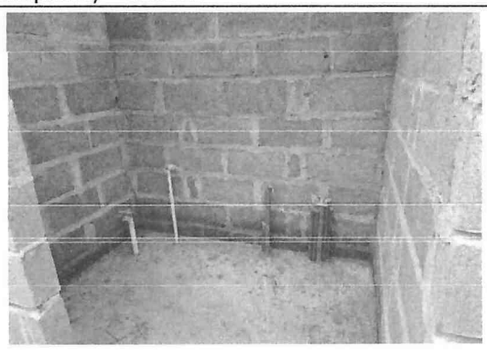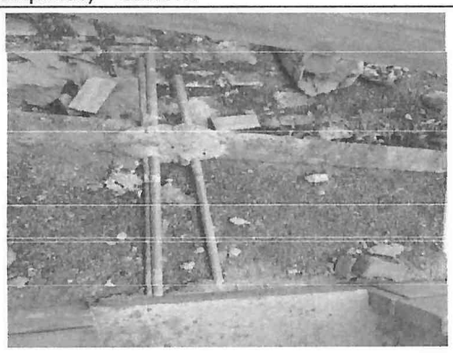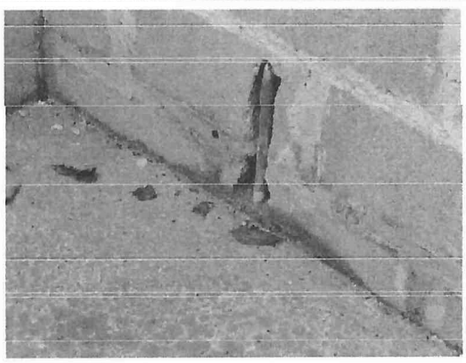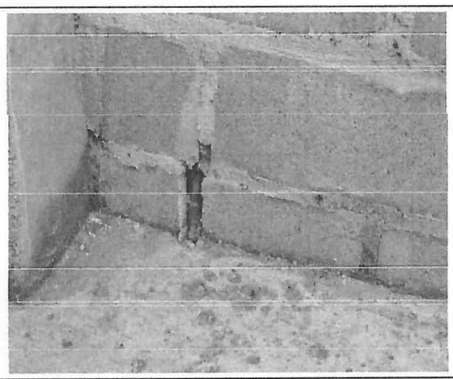SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO BIFÁSICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y PUERTA DE 20 CIRCUITOS. (incluye Protecciones, Tubería PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas) – CERETÉ	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO BIFÁSICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y PUERTA DE 20 CIRCUITOS. (incluye Protecciones, Tubería PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas) – CERETÉ
	
INSTALACIONES ELÉCTRICAS – TIERRALTA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS – TIERRALTA
	
INSTALACIONES ELÉCTRICAS – TIERRALTA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS – TIERRALTA
