EMAIL: consorcioinfraeducativo002@gmail.com
TELEFONO: +57 313 511 0185
DIRECCIÓN: Cra 6 No. 64A - 58

CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002

INFORME EJECUTIVO N°3

CONTRATO No: SI-LP-002-2024

OBJETO: "MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS SEDES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA"

CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

PERIODO: DEL 28 DE JULIO DE 2025 A 16 DE AGOSTO DE 2025

Dirección: Cra9 #6-36 Ofi202 **Teléfono:**3217764749 **E-Mail:** consorcioinfraeducativo022@gmail.com

Contenido

INTRODUCCIÓN 4
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 4
ALCANCE DEL PROYECTO Y ACTIVIDADES A REALIZAR 5
PLAZO DE EJECUCIÓN 10
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 10
ASPECTOS CONTRACTUALES 11
FORMA DE PAGO 11
CONTROL DE PÓLIZAS 12
INORMES SEMANALES Y ACTAS SUSCRITAS 14
INFORMES SEMANALES 14
ACTAS SUSCRITAS 15
INFORME DE AVANCE 15
FRENTES DE TRABAJO 15
ASISTENCIA DE PERSONAL PROFESIONAL 16
MAQUINARIA Y EQUIPOS 16
ACTIVIDADES DESARROLLADAS 16
PORCENTAJE DE AVANCE 17
PORCENTAJE DE AVANCE 18
SOPORTES DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 19
REGISTRO FOTOGRÁFICO 19
CONCLUCIONES 27
ANEXO 3. INFORMES SEMANALES 29
ANEXO 4. ACTAS SUSCRITAS 31
ANEXO 5. PLANILLAS 32
ANEXO 6. BITACORA 33
ANEXO 7. INFORME PGIO 34

Dirección: Cra9 #6-36 Ofi202 **Teléfono:**3217764749 **E-Mail:** consorcioinfraeducativo022@gmail.com

Fotografía 3. Pintura para muros 26

Fotografía 4.estuco para muros 26

Fotografía 5. Estuco para muros 26

Fotografía 6.Cerramiento provicional 27

Fotografía 7 Excavacion de zapatas 27

Fotografía 8 Pintura para muros 27

Fotografía 9 Levante de muros 27

Dirección: Cra9 #6-36 Ofi202 **Teléfono:**3217764749 **E-Mail:** consorcioinfraeducativo022@gmail.com

INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al informe del primer periodo mensual del contrato de Obra No. SI-LP-002-2024, comprendido del 17 DE ABRIL DE 2024 AL 16 DE MAYO DE 2025; cuyo objeto es "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS SEDES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA"

En el presente informe, se detallan los aspectos más relevantes del contrato de obra y se describen las actividades desarrolladas en el periodo, equivalentes al 30% de las actividades contratadas. El proyecto consiste en la intervención de 10 instituciones educativas en los diferentes municipios del departamento de Córdoba cuyo objeto es mantenimiento y adecuación que permitan el óptimo funcionamiento de las instalaciones, para brindar un servicio de calidad a la población estudiantil ;se contemplan actividades como excavaciones, rellenos ,concretos, impermeabilización, instalación de redes hidrosanitarias redes eléctricas, instalación de cubiertas, pintura enchapes; entre otras actividades.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra localizado al noroccidente del país en la región Caribe Colombiana, Departamento de Córdoba. Específicamente en los municipios de Cereté (I.E. Marceliano Polo), San Pelayo (I.E. Santa Teresita sede general Santander), Ciénaga de Oro (I.E. Marco Fidel Suarez), Moñitos (I.E. San José de Moñitos sede principal), Tierralta (I.E. Junín), Planeta Rica (I.E. Plaza bonita), San Bernardo del Viento (I.E. El Castillo), Canalete (I.E. San José de Canalete), San Andrés de Sotavento (I.E. San Simón sede sagrado corazón de Jesús) y Los Córdobas (I.E. El Ébano).



Ilustración 1. Localización General del Proyecto

Dirección: Cra9 #6-36 Ofi202 **Teléfono:**3217764749 **E-Mail:** consorcioinfraeducativo022@gmail.com

ALCANCE DEL PROYECTO Y ACTIVIDADES A REALIZAR

El proyecto tiene como objeto "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAEESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS SEDES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA". Y las actividades a ejecutar, de acuerdo al Balance de obra N°1 son las siguientes:

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA			
ITEM DE PAGO	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANTIDAD**
1,01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	M2	1.872,00
1,02	ADECUACIÓN Y NIVELACIÓN DE TERRENO	M2	1.872,00
1,03	S/I CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE, H=2.10 MTS PARA OBRAS	ML	444,00
	2. EXCAVACIONES Y RELLENOS		
2,01	EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS DE 1.00 X1.00 MTS	M3	171,00
2,02	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0.30 X0.30 MTS	ML	409,00
2,03	REEMPLAZO O MEJORAMIENTO DEL TERRENO DEBAJO DE ZAPATAS EN PIEDRA RAJON - MATERIAL SELECCIONADO (80/20)	M3	57,00
2,04	RELLENO DEL AREA CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	730,20
2,05	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE 10 KM	M3	270,15
	3. CIMENTACIÓN		
3,01	SOLADO EN CONCRETO E = 0.05 MTS DE 14 MPA (2000 PSI)	M3	5,70
3,02	ZAPATAS DE 1.00 X 1.00 X0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	M3	34,20
3,03	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0.30 X0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	365,40
3,04	ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA CIMENTACIÓN	KG	7.173,00
3,05	SOBRECIMIENTO IMPERMEABILIZADO 3 HILADAS EN BLOQUE MACIZO DE CONCRETO DE 0.10M X 0.20M X 0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4	ML	596,40
	4. ESTRUCTURAS		
4,01	COLUMNAS DE 0.30 X0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	438,00
4,02	VIGA SUPERIOR DE 0.30 X0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	318,00
4,03	ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA ESTRUCTURAS	KG	12.107,40
4,04	ALFAJIAS DE A=0.21 E=0.07 CON 2 Ø 3/8" Y Ø 1/4" @0.20 MTS EN CONCRETO DE 17.5Mpa (2500 PSI)	ML	131,00
4,05	RAMPA DE ACCESO EN CONCRETO DE 3000 PSI(PLANTILLA CON MALLA ELECTROSOLDADA E=0.08 Y VIGAS 0.15 MTS X 0.20 MTS) . REF 4 D 3/8" Y ESTRIBOS 1/4" @0.25 MTS	M2	108,00
4,06	MESON PARA ENTREGA DE ALIMENTOS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) E=0.08, CON REFUERZO 3/8" @.15 EN AMBOS SENTIDOS CON ACABO EN GRANITO PULIDO	M2	9,60
	5. MAMPOSTERIA Y REVOQUE		
5,01	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE SEMIESTRUCTURAL DE 0.12MTS X 0.20MTS X 0.40MTS CON PEGA DE MORTERO 1:4	M2	1.236,00
5,02	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 PARA MUROS EN MORTERO 1:4	M2	2.662,00
5,03	ESTUCO PLASTICO PARA MUROS	M2	2.362,00
5,04	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	2.362,00

Dirección: Cra9 #6-36 Ofi202 **Teléfono:**3217764749 **E-Mail:** consorcioinfraeducativo022@gmail.com

EMAIL: consorcioinfraeducativo002@gmail.com
TELEFONO: +57 313 511 0185
DIRECCIÓN: Cra 6 No. 64A - 58

CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002

6. ESTRUCTURA - CUBIERTA			
6,01	CUBIERTA TIPO SANDWICH 18 MM EN ACERO LAMINADO A500 GRADO C COLOR BLANCO CON AISLANTE EN POLIESTIRENO 18-20MM. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	M2	1.304,00
6,02	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CERCHAS CON PERFILES PHR C ENCAJONADOS SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, CON SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS	KG	7.925,30
6,03	S/I DE CORREAS CON PERFILES PHR C SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, CON SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS	KG	4.379,96
7. PISOS			
7,01	PLANTILLA EN CONCRETO 3000 PSI, E= 0.10MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	985,80
7,02	S/I DE PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 0.50X0.50 MTS COLOR BLANCA O BEIGE	M2	985,80
7,03	ENCHAPE CERÁMICA DE 0.30 X 0.60 MTS COLOR BLANCO BAÑOS Y ZONAS HUMEDAS	M2	266,40
7,04	GUARDAESCOBA EN CERAMICA H=0.10 MTS	ML	707,40
8. CARPINTERIA METALICA			
8,01	S/I PUERTA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DE 1.00 X 2.2M INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	UN	42,00
8,02	S/I PUERTA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DE 0.80 X 2.2M INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	UN	12,00
8,03	S/I PUERTA EN ALUMINIO Y VIDRIO DOBLE HOJA, DE 1,50 X 2,20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MANIJAS DE 30 CMS EN AMBAS PUERTAS Y POR AMBOS LADOS.	UN	12,00
8,04	S/I CORTINA ENROLLABLE DE LAMAS DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO, PANEL CIEGO DE 0,6 MM ESPESOR, ACABADO EN COLOR GRIS, APERTURA MANUAL.	M2	21,60
8,05	S/I VENTANAS DE ALUMINIO CORREDIZA REF 744 Y VIDRIO DE 4mm	M2	42,72
8,06	S/I PROTECTOR DE VENTANAS EN VARILLA DE 1/2 CUADRADA INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE A DOS MANOS	M2	62,16
9. INSTALACIONES HIDROSANITARIOS			
TUBERÍAS Y ACCESORIOS RED AGUA POTABLE			
9,01	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL DE TUBERIA PRESION	ML	246,00
9,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 1/2" PVC RDE 9, PARA SOLDAR	ML	105,00
9,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 3/4" PVC, RDE 21, PARA SOLDAR	ML	54,00
9,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 1" PVC, RDE 21, PARA SOLDAR	ML	87,00
9,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO	UN	42,00
9,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE UNIÓN MACHO GALVANIZADO 1" L=50CM	UN	18,00
9,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE UNIÓN MACHO GALVANIZADO 1" L=15CM	UN	24,00
9,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION UNIVERSAL GALVANIZADA	UN	6,00
9,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO GALVANIZADO 1"	UN	6,00
9,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE GALVANIZADA 1"	UN	12,00
9,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN GALVANIZADO 1"	UN	6,00
9,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA CHECK VERTICAL BRONCE 1"	UN	12,00
9,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE CIERRE RÁPIDO METÁLICA 1"	UN	12,00
9,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE REGISTRO 1/2", INCLUYE TAPA REGISTRO 15X15CM	UN	42,00
9,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE REGISTRO 1", INCLUYE TAPA REGISTRO 15X15CM	UN	18,00

Dirección: Cra9 #6-36 Ofi202 **Teléfono:**3217764749 **E-Mail:** consorcioinfraeducativo022@gmail.com

	TUBERÍAS Y ACCESORIOS RED SANITARIA		
9,16	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL DE TUBERIA SANITARIA	ML	351,00
9,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 2" PVC, PARA SOLDAR	ML	108,00
9,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 3" PVC, PARA SOLDAR	ML	45,00
9,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 4" PVC, PARA SOLDAR	ML	114,00
9,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA VENTILACION 2" PVC, PARA SOLDAR	ML	72,00
9,21	PUNTO SANITARIO 2"	UN	84,00
9,22	PUNTO SANITARIO 4"	UN	6,00
9,23	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION 60X60X100 CM	UN	18,00
	EQUIPOS DE BOMBEO AGUA POTABLE Y TANQUE ELEVADO		
9,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA 1/2HP (INCLUYE MANIFOLD DE SUCCIÓN)	UN	12,00
9,25	TANQUE ELEVADO DE 2000L PLÁSTICO	UN	6,00
	APARATOS SANITARIOS		
9,26	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TANQUE	UN	6,00
9,27	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS	UN	12,00
9,28	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS	UN	12,00
9,29	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE PISO PARA DESAGUE	UN	54,00
9,30	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADOS METÁLICOS	UN	12,00
9,31	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA DE GRASA EN CONCRETO DE 4000 PSI	UN	12,00
	TANQUE ELEVADO AGUA POTABLE		
9,32	EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATA DE 2.00 X 2.00 MTS	M3	36,00
9,33	REEMPLAZO O MEJORAMIENTO DEL TERRENO DEBAJO DE ZAPATA EN PIEDRA RAJON - MATERIAL SELECCIONADO (80/20)	M3	12,00
9,34	RELLENO DEL AREA CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	13,82
9,35	SOLADO EN CONCRETO E = 0.05 MTS DE 14 MPA (2000 PSI)	M3	1,20
9,36	ZAPATA DE 2.00 X 2.00 X 0.35 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	M3	8,40
9,37	COLUMNA DE 0.40 X 0.40 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	28,98
9,38	PLACA EN CONCRETO DE 2.00 m X 2.00 m X 0.17 m DE 3000 PSI INCLUYE REF. VARILLA DE 3/8 @ 0.15MT PARA TANQUE ELEVADO	M2	24,00
9,39	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA PARA COLUMNA Y ZAPATA TANQUE	KG	1.615,80
	TANQUE DE AGUA POTABLE		
9,40	EXCAVACIÓN MANUAL PARA TANQUE	M3	151,20
9,41	REEMPLAZO O MEJORAMIENTO DEL TERRENO PARA SUPERFICIE DE APOYO DE TANQUE EN PIEDRA RAJON - MATERIAL SELECCIONADO (80/20)	M3	27,00
9,42	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE 10 KM	M3-KM	196,56
9,43	SOLADO EN CONCRETO E = 0.05 MTS DE 14 MPA (2000 PSI)	M3	1,20
9,44	CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) PARA FONDO TANQUE INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO.	M3	10,80
9,45	S/I CINTA PVC O-22	ML	117,60
9,46	CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) PARA TAPA Y MUROS DE TANQUE INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO	M3	43,20
9,47	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA PARA ESTRUCTURA TANQUE	KG	3.103,20
	TANQUE DE AGUAS RESIDUALES		
9,48	EXCAVACIÓN MANUAL PARA TANQUE	M3	151,20
9,49	REEMPLAZO O MEJORAMIENTO DEL TERRENO DEBAJO DE ZAPATA EN PIEDRA RAJON - MATERIAL SELECCIONADO (80/20)	M3	27,00
9,50	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE 10 KM	M3-KM	196,56
9,51	SOLADO EN CONCRETO E = 0.05 MTS DE 14 MPA (2000 PSI)	M3	1,20
9,52	CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) PARA TAPA Y MUROS DE TANQUE INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO	M3	43,20
9,53	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA PARA ESTRUCTURA TANQUE	KG	3.103,20

Dirección: Cra9 #6-36 Ofi202 **Teléfono:**3217764749 **E-Mail:** consorcioinfraeducativo022@gmail.com

10. INSTALACIONES ELECTRICAS (I.E MARCELIANO POLO, CERETE - I.E SANTA TERESITA SEDE GNRAL SANTANDER, SAN PELAYO - I.E MARCO FIDEL SUAREZ; CIENAGA DE ORO - I.E SAN JOSE DE MOÑITOS - I.E PLAZA BONITA SEDE NUEVA EL EBANO, PLANETA RICA. - I.E JUNIN, TIERRALTA)			
10,01	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO (incluye interruptor, Tubería PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG)	UN	42,00
10,02	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE (incluye interruptor, Tubería PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG)	UN	18,00
10,03	SALIDA PARA VENTILADOR DE TECHO (incluye control, Tubería PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG,cable encauchetado 3x14AWG, Ventilador de Techo residencial)	UN	72,00
10,04	SALIDA PARA LUMINARIA EN TECHO Y EXTERIORES (incluye Tubería EMT, Tuberia PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG, cable encauchetado 3x14AWG, Panel LED 24W- Wallpack LED 30W)	UN	234,00
10,05	SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA Y AVISO SALIDA (incluye Tubería EMT, Tuberia PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG, cable encauchetado 3x14AWG, Luminaria LED EMERGENCIA, Aviso LED SALIDA)	UN	60,00
10,06	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA Y CFCI, (incluye TOMA DOBLE 15A - 125V, Tuberia PVC SCH40, Tubería EMT, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG) TD1-C-2-C4-C6-C8-10-12-14-16	UN	126,00
10,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO BIFÁSICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y PUERTA DE 20 CIRCUITOS. (incluye Protecciones, Tubería PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas)	UN	6,00
10,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA PUESTA A TIERRA (incluye Tubería PVC, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°8AWG)	UN	6,00
10,09	SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA EN Cu 2xN°8F + 1xN°8N (incluye Tuberia PVC, cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas)	ML	25,00
10,10	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS DE MEDIDA Y ADECUACIÓN DE PUNTO DE CONEXIÓN HASTA TABLERO DE PROTECCIONES (incluye Tuberia PVC, Tuberia IMC, cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas)	UN	6,00
10,11	SALIDA PARA TV (incluye TOMA TV, Tuberia PVC SCH40, Tubería EMT, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Coaxial RG-6)	UN	12,00
10,12	CERTIFICACION Retie Y Retilap Uso Final	UN	6,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ENERGÍA SOLAR		
10,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSUMOS ELÉCTRICOS (CABLE) RETIE TUBERÍAS PLÁSTICA Y METÁLICAS	UND	6,00
10,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INVERSOR OFF GRID 4000W	UND	6,00
10,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE METÁLICO CON INTERRUPTORES. INCLUYE ACCESORIOS	UND	6,00
10,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL MONOCRISTALINO DE 550W PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO	UND	48,00
10,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA INSTALACIÓN DE VEINTITRES (23) PANELES SOLARES. INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, ANCLAJE AL SUELO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS QUE PRESERVEN LA INTEGRIDAD DE LOS PANELES	UND	48,00
10,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE BATERÍAS (CADA UNIDAD DE 48V 100AH)	UND	18,00

Dirección: Cra9 #6-36 Ofi202 **Teléfono:**3217764749 **E-Mail:** consorcioinfraeducativo022@gmail.com

EMAIL: consorcioinfraeducativo002@gmail.com
TELEFONO: +57 313 511 0185
DIRECCIÓN: Cra 6 No. 64A - 58

CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002

11. MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN LA I.E SAN JOSE CANALETE			
ACTIVIDADES PRELIMINARES			
11,01	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO	Und	1,00
11,02	ADECUACIÓN Y NIVELACIÓN DE TERRENO	M2	102,00
11,03	S/I CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE, H=2.10 MTS PARA OBRAS	ML	55,00
EXCAVACIONES Y RELLENOS			
11,04	EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS DE 1.00 X 1.00 MTS	M3	18,00
11,05	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0.30 X 0.30 MTS	ML	41,60
11,06	REEMPLAZO O MEJORAMIENTO DEL TERRENO DEBAJO DE ZAPATAS EN PIEDRA RAJON - MATERIAL SELECCIONADO (80/20)	M3	6,00
11,07	RELLENO DEL AREA CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	66,80
11,08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE 10 KM	M3	28,27
CIMENTACIÓN			
11,09	SOLADO EN CONCRETO E = 0.05 MTS DE 14 MPA (2000 PSI)	M3	0,60
11,10	ZAPATAS DE 1.00 X 1.00 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	M3	3,60
11,11	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	36,20
11,12	ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA CIMENTACIÓN	KG	856,20
11,13	SOBRECIMIENTO IMPERMEABILIZADO 3 HILADAS EN BLOQUE MACIZO DE CONCRETO DE 0.10M X 0.20M X 0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4	ML	40,00
ESTRUCTURAS			
11,14	COLUMNAS DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	40,00
11,15	VIGA SUPERIOR DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	21,60
11,16	ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA ESTRUCTURAS	KG	1.241,80
11,17	RAMPA DE ACCESO EN CONCRETO DE 3000 PSI (PLANTILLA CON MALLA ELECTROSOLDADA E=0.08 Y VIGAS 0.15 MTS X 0.20 MTS) . REF 4 D 3/8" Y ESTRIBOS 1/4" @0.25 MTS	M2	18,00
ESTRUCTURA - CUBIERTA			
11,18	CUBIERTA TIPO SANDWICH 18 MM EN ACERO LAMINADO A500 GRADO C COLOR BLANCO CON AISLANTE EN POLIESTIRENO 18-20MM. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN	M2	130,40
11,19	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CERCHAS CON PERFILES PHR C ENCAJONADOS SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, CON SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS	KG	825,55
11,20	S/I DE CORREAS CON PERFILES PHR C SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, CON SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS	KG	417,14
PISOS			
11,23	PLANTILLA EN CONCRETO 3000 PSI, E= 0.10MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	98,60
11,24	S/I DE PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 0.50X0.50 MTS COLOR BLANCA O BEIGE	M2	98,60
11,25	GUARDAESCOBA EN CERAMICA H=0.10 MTS	ML	12,00
PINTURA COCINA EXISTENTE			
11,26	REMOCION DE PINTURA EXISTENTE EN MAL ESTADO	M2	124,30
11,27	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	124,30

Dirección: Cra9 #6-36 Ofi202 **Teléfono:**3217764749 **E-Mail:** consorcioinfraeducativo022@gmail.com

EMAIL: consorcioinfraeducativo002@gmail.com
TELEFONO: +57 313 511 0185
DIRECCIÓN: Cra 6 No. 64A - 58

12. MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN I.E EL CASTILLO - MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO			
12,01	DEMOLICIÓN DE MESON EN CONCRETO E= 0.10 MTS DE CONCRETO Y SOPORTE EN BLOQUE INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	Und	1,00
12,02	DEMOLICIÓN DE PISOS EN MAL ESTADO E=0,10 CM, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES	M2	75,00
12,03	REMOCION DE PINTURA EXISTENTE EN MAL ESTADO	M2	70,70
12,04	PLANTILLA EN CONCRETO 3000 PSI, E= 0.10MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	75,00
12,05	S/I DE PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 0.50X0.50 MTS COLOR BLANCA O BEIGE	M2	75,00
12,06	GUARDAESCOBA EN CERAMICA H=0.10 MTS	ML	48,38
12,07	MANTENIMIENTO DE CORREAS METALICAS INCLUYE, PULIDA CON LIJA, ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE	ML	41,60
12,08	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	70,70
13. MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN I.E SAN SIMÓN SEDE SAGRADO CORAZON DE JESÚS - MUNICIPIO SAN ANDRES DE SOTAVENTO			
13,01	DEMOLICIÓN DE PISOS EN MAL ESTADO E=0,10 CM, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES	M2	48,00
13,02	DESMONTE CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO INCLUYE ENTRAMADO EN CERCHAS METALICAS	M2	48,00
13,03	S/I DE CORREAS CON PERFILES PHR C SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, CON SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS	KG	171,40
13,04	CUBIERTA TIPO SANDWICH 18 MM EN ACERO LAMINADO A500 GRADO C COLOR BLANCO CON AISLANTE EN POLIESTIRENO 18-20MM. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN	M2	48,00
13,05	PLANTILLA EN CONCRETO 3000 PSI, E= 0.10MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	48,00
13,06	S/I DE PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 0.50X0.50 MTS COLOR BLANCA O BEIGE	M2	48,00
13,07	GUARDAESCOBA EN CERAMICA H=0.10 MTS	ML	47,00
13,08	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	57,80
14. MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN I.E EL EBANO - MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS			
14,01	REMOCION DE PINTURA EXISTENTE EN MAL ESTADO	M2	46,46
14,02	DEMOLICIÓN DE PISOS EN TABLON ROJO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES	M2	80,96
14,03	S/I DE PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 0.50X0.50 MTS COLOR BLANCA O BEIGE	M2	80,96
14,04	IMPERMEABILZANTE A DOS MANOS QUE ACTUE COMO REPARADOR EN MURO EN MAL ESTADO POR HUMEDAD INCLUYE REMOSION DE PINTURA, ESTUCO Y/O PAÑETE, MOHO Y HONGOS	M2	28,30
14,05	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	46,46
14,06	MANTENIMIENTO DE CORREAS METALICAS INCLUYE, PULIDA CON LIJA, ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE	ML	40,40
14,07	DESMONTE DE VENTILADORES EN MAL ESTADO	UND	4,00
14,08	SALIDA PARA VENTILADOR DE TECHO (incluye control, Tubería PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG,cable encauchetado 3x14AWG, Ventilador de Techo residencial)	UND	4,00

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución inicial del contrato, es de OCHO (08) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, la cual fue suscrita entre contratista y supervisión el día **17 de MARZO de 2025.**

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

El contratista presentó una programación de actividades, de acuerdo al plazo contractual del proyecto, de 08 meses, con fecha de finalización 17 de noviembre de 2025. Se anexa programación de obra y flujo financiero del contrato por semanas; para su seguimiento.

Dirección: Cra9 #6-36 Ofi202 **Teléfono:**3217764749 **E-Mail:** consorcioinfraeducativo022@gmail.com

EMAIL: consorcioinfraeducativo002@gmail.com
TELEFONO: +57 313 511 0185
DIRECCIÓN: Cra 6 No. 64A - 58

CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002

ASPECTOS CONTRACTUALES

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO DE OBRA No:	SI-LP-002-2024
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002 Nit: 901915670-0 R.L María Isabel Quintero González C.C 1.010.007.099
OBJETO:	"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS SEDES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA"
VALOR TOTAL:	CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA Y CINCO PESO M/CTE ($4.135.056.075)
CDP:	4625 11 de febrero de 2025
ACTA DE INICIO:	17 DE MARZO DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	UN (08) MESES
INTERVENTORIA	ANTICA SAS BIC

FORMA DE PAGO

El Departamento de Córdoba cancelara el valor del presente contrato de la siguiente manera: **1.- PAGOS PARCIALES**, de hasta el 90% del valor del contrato, mediante actas parciales de ejecución, con un avance mínimo del 30% de ejecución la primera acta; no obstante, este requisito no será aplicable a los siguientes pagos parciales, pues éstos se realizarán conforme al porcentaje de ejecución respectivo, certificado de cumplido a satisfacción expedido por el interventor del contrato, donde conste expresamente el porcentaje de ejecución, la acreditación del pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales del personal que emplee en la ejecución de la obra conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y demás a que haya lugar. **PARÀGRAFO PRIMERO:** Cada pago debe estar precedido de recibido a satisfacción expedido por el Interventor y/o supervisor de este, el cual debe incluir: memorias de cálculo, registro fotográfico, bitácora, resultados de laboratorio realizados (si se requirieron), informe de gestión social y planos. **2.- PAGO FINAL**, equivalente al 10% del valor del contrato, que será pagado una vez se haya cumplido a cabalidad el objeto contractual, para lo cual deberá entregarse informe final del interventor del contrato acompañado del certificado de cumplido a satisfacción, acta de liquidación, la acreditación del pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud, pensiones y

Dirección: Cra9 #6-36 Ofi202 **Teléfono:**3217764749 **E-Mail:** consorcioinfraeducativo022@gmail.com

riesgos profesionales del personal que emplee en la ejecución de la obra conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y demás a que haya lugar. **PARÁGRAFO PRIMERO. - EL CONTRATISTA** deberá presentar la afiliación a salud y pensión, en los términos de Ley, al interventor del contrato, del personal que haya empleado en la ejecución del objeto contractual. **PARÁGRAFO SEGUNDO. -** Para efectuar los pagos, se deberán adjuntar las actas parciales, debidamente firmadas por las partes y por el interventor. Los pagos se efectuarán previa presentación de la factura de venta que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario, en el caso de personas jurídicas y naturales obligados a facturar. En el caso de personas naturales inscritas en el régimen simplificado, el pago se efectuará previa presentación de la cuenta de cobro. Las facturas y/o cuentas de cobro deberán corresponder a las labores desarrolladas. Estas facturas y/o cuentas de cobro deberán ir acompañadas de todos los comprobantes y documentos de soporte necesarios para sustentar los avances de la consultoría durante el período de las actas. **PARÁGRAFO TERCERO**. Para efectos del último pago deberá presentarse el Acta de Liquidación del contrato. **PARÁGRAFO CUARTO. EL CONTRATISTA** deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. **El CONTRATISTA** deberá anexar con la factura el certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, de lo contrario no se tramitará la respectiva factura. **PARÁGRAFO QUINTO: El CONTRATISTA** deberá acreditar previo a cada pago que, respecto de sus obligaciones en materia laboral, frente al personal utilizado para la ejecución del contrato, se encuentra al día a la fecha de presentación de cada factura. **NOTA: EL DEPARTAMENTO** no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda.

CONTROL DE PÓLIZAS

A continuación, se presenta un resumen de las garantías del contrato de obra SI-LP -002-2024:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	
Aseguradora	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS
Póliza contractual	NB-100369947
Aprobación de Póliza	19 DE FEBRERO 2025

AMPARO	**VIGENCIA A FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO**	**VALOR ASEGURADO**

EMAIL: consorcioinfraeducativo002@gmail.com
TELEFONO: +57 313 511 0185
DIRECCIÓN: Cra 6 No. 64A - 58

CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002

	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/02/2025	12/04/2026	$ 413.513.491,50
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	12/02/2025	12/04/2026	$1.240.540.474,50
PRESTACIONES SOCIALES	12/02/2025	12/10/2028	$413.513.491,50
ESTABILIDAD DE LA OBRA	1210/2025	12/10/2030	$398.655.004,10
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	12/02/2025	12/04/2026	$41.226.771,00

AMPARO	VIGENCIA A FECHA DE ACTA DE INICIO		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/03/2025	17/05/2026	$413.513.491,50
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	17/03/2025	17/05/2026	$1.240.540.474,50
PRESTACIONES SOCIALES	17/03/2025	17/11/2028	$413.513.491,50
ESTABILIDAD DE LA OBRA	17/11/2025	17/11/2030	$398.655.004,10
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	17/03/2025	17/05/2026	$41.226.771,00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
Aseguradora	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS
Póliza contractual	NB-100095688
Aprobación de Póliza	19 DE FEBRERO 2025

Dirección: Cra9 #6-36 Ofi202 **Teléfono:**3217764749 **E-Mail:** consorcioinfraeducativo022@gmail.com

AMPARO	VIGENCIA A FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
AMPARO BÁSICO	12/02/2025	12/10/2025	$569.400.000,00
PATRONAL	12/02/2025	12/10/2025	$569.400.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	12/02/2025	12/10/2025	$569.400.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	12/02/2025	12/10/2025	$569.400.000,00
AMPARO	**VIGENCIA A FECHA DE ACTA DE INICIO**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
AMPARO BÁSICO	13/03/2025	17/11/2025	$569.400.000,00
PATRONAL	13/03/2025	17/11/2025	$569.400.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	13/03/2025	17/11/2025	$569.400.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	13/03/2025	17/11/2025	$569.400.000,00

Las garantías fueron revisas y aprobadas por el área jurídica de la Gobernación de Córdoba, inicialmente se realizó la aprobación con fecha 19/02/2025, donde se establece que las garantías cumplen con los requisitos exigidos por el contrato y por la ley; en lo que corresponde a las pólizas de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual.

El contratista realizó la actualización de las vigencias de las garantías contractuales, con la fecha del acta de inicio suscrita entre contratista y supervisión, y con las actas de suspensión, reinicio y prorroga las cuales fueron aprobadas con fecha 28/04/2025 por la entidad contratante.

INORMES SEMANALES Y ACTAS SUSCRITAS

INFORMES SEMANALES

Con una periodicidad semanal se elaboran informes con el resumen de las actividades desarrolladas durante la semana. Durante el periodo correspondiente al primes mes de ejecución de obra, se elaboraron 3 informes semanales; de los cuales se anexa copia.

DESCRIPCIÓN DEL INFORME	FECHA
Informe Semanal N°20	28/07/2025-03/08/2025
Informe Semanal N°21	04/08/2025-10/08/2025
Informe Semanal N°22	11/08/2025-17/082025

ACTAS SUSCRITAS

ACTA DE INICIO	17 DE MARZO DE 2025

INFORME DE AVANCE

FRENTES DE TRABAJO

INSTITUCION EDUCATIVA MARCELIANO POLO	MUNICIPIO DE CERETE
INSTITUCION EDUCATIVA MARCOS FIDEL SUAREZ	MUNICIPIO DE CIENEGA DE ORO
INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA SEDE GENERAL SANTANDER	MUNICIPIO DE SAN PELAYO
INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE MOÑITOS	MUNICIPIO DE MOÑITOS
INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE CANALETE	MUNICIPIO DE CANALETE

Dirección: Cra9 #6-36 Ofi202 **Teléfono:**3217764749 **E-Mail:** consorcioinfraeducativo022@gmail.com

ASISTENCIA DE PERSONAL PROFESIONAL

A continuación, se relaciona el personal profesional propuesto por el contratista CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002 para dar cumplimiento a equipo requerido por entidad contratante en el anexo técnico del contrato:

No	PROFESIONAL	DEDICACIÓN	NOMBRE
1	DIRECTOR DE OBRA	50%	KAMAL AUGUSTO BEJRANO FERNANDEZ
2	RESIDENTE DE OBRA 1	100%	ANDY MIGUEL AGAMEZ GENEY
3	RESIDENTE DE OBRA 2	100%	JOSE CARLOS ALVAREZ ORTEGA
4	RESIDENTE DE OBRA 3	100%	RICARDO JAVIER CASTRO ESCOBAR
5	INGENIERO ELECTRICO	50%	HECTOR RAMIREZ LIBREROS
6	INGENIERO AMBIENTAL	50%	SHARON MELISA CORRALES MARTINEZ
7	SECRETARIO	100%	JHOAN VERGARA

MAQUINARIA Y EQUIPOS

Durante el periodo correspondiente al presente informe, se destaca el uso de los siguientes equipos:

- Mezcladora de Concreto
- Placa Vibratoria (Compactador Rana)
- Vibrador de concreto
- Herramienta Menor
- Pulidora
- Taladro

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Las actividades desarrolladas en el periodo del presente informe, corresponden principalmente a:

-localizacion trazado y replanteo
-cerramiento provisional
-excavaciones
-Zapatas
-Levante de muros
-Meson para entrega de alimentos
-Estuco
-Pintura
-Acero de refuerzo

Dirección: Cra9 #6-36 Ofi202 **Teléfono:**3217764749 **E-Mail:** consorcioinfraeducativo022@gmail.com

EMAIL: consorcioinfraeducativo002@gmail.com
TELEFONO: +57 313 511 0185
DIRECCIÓN: Cra 6 No. 64A - 58

CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002

PORCENTAJE DE AVANCE

Durante el periodo correspondiente al presente informe; se ejecutaron las siguientes cantidades de obra; resultando en un avance de $124.439.488

1. ACTIVIDADES PRELIMINARES (I.E MARCELIANO POLO, CERETE - I.E SANTA TERESITA SEDE GNRAL SANTANDER, SAN PELAYO - I.E MARCO FIDEL SUAREZ; CIENAGA DE ORO - I.E SAN JOSE DE MOÑITOS - I.E PLAZA					
1,01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	M2	115,50	$ 4.287,00	$ 495.148,50
1,02	ADECUACIÓN Y NIVELACIÓN DE TERRENO	M2	115,50	$ 7.514,00	$ 867.867,00
1,03	S/I CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE, H=2.10 MTS PARA OBRAS	ML	43,00	$ 21.007,00	$ 903.301,00
2. EXCAVACIONES Y RELLENOS (I.E MARCELIANO POLO, CERETE - I.E SANTA TERESITA SEDE GNRAL SANTANDER, SAN PELAYO - I.E MARCO FIDEL SUAREZ; CIENAGA DE ORO - I.E SAN JOSE DE MOÑITOS - I.E PLAZA					
2,01	EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS DE 1.00 X1.00 MTS	M3	15,00	$ 39.259,00	$ 588.885,00
2,03	REEMPLAZO O MEJORAMIENTO DEL TERRENO DEBAJO DE ZAPATAS EN PIEDRA RAJON - MATERIAL SELECCIONADO (80/20)	M3	5,00	$ 206.382,00	$ 1.031.910,00
2,05	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE 10 KM	M3	19,50	$ 22.830,00	$ 445.185,00
3. CIMENTACIÓN (I.E MARCELIANO POLO, CERETE - I.E SANTA TERESITA SEDE GNRAL SANTANDER, SAN PELAYO - I.E MARCO FIDEL SUAREZ; CIENAGA DE ORO - I.E SAN JOSE DE MOÑITOS - I.E PLAZA BONITA SEDE					
3,01	SOLADO EN CONCRETO E = 0.05 MTS DE 14 MPA (2000 PSI)	M3	0,50	$ 890.152,00	$ 445.076,00
3,02	ZAPATAS DE 1.00 X 1.00 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	M3	3,00	$ 1.020.946,00	$ 3.062.838,00
3,03	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	30,80	$ 124.557,00	$ 3.836.355,60
3,04	ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA CIMENTACIÓN	KG	569,89	$ 9.658,00	$ 5.503.997,62
4. ESTRUCTURAS (I.E MARCELIANO POLO, CERETE - I.E SANTA TERESITA SEDE GNRAL SANTANDER, SAN PELAYO - I.E MARCO FIDEL SUAREZ; CIENAGA DE ORO - I.E SAN JOSE DE MOÑITOS - I.E PLAZA BONITA SEDE					
4,03	ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA ESTRUCTURAS	KG	176,09	$ 9.658,00	$ 1.700.677,22
4,04	ALFAJIAS DE A=0.21 E=0.07 CON 2 Ø 3/8" Y Ø 1/4" @0.20 MTS EN CONCRETO DE 17.5Mpa (2500 PSI)	ML	81,70	$ 60.002,00	$ 4.902.163,40
4,06	MESON PARA ENTREGA DE ALIMENTOS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) E=0.08, CON REFUERZO 3/8" @.15 EN AMBOS SENTIDOS CON ACABO EN GRANITO PULIDO	M2	5,61	$ 160.024,00	$ 897.734,64
5. MAMPOSTERIA Y REVOQUE (I.E MARCELIANO POLO, CERETE - I.E SANTA TERESITA SEDE GNRAL SANTANDER,					
5,01	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE SEMIESTRUCTURAL DE 0.12MTS X 0.20MTS X 0.40MTS CON PEGA DE MORTERO 1:4	M2	178,00	$ 99.267,00	$ 17.669.526,00
5,02	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 PARA MUROS EN MORTERO 1:4	M2	307,15	$ 56.791,00	$ 17.443.355,65
5,03	ESTUCO PLASTICO PARA MUROS	M2	1147,50	$ 22.172,00	$ 25.442.370,00
5,04	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	1147,50	$ 23.045,00	$ 26.444.137,50
9,25	TANQUE ELEVADO DE 2000L PLÁSTICO	UN	4,00	$ 1.075.173,00	$ 4.300.692,00
9,34	RELLENO DEL AREA CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	4,42	$ 200.188,00	$ 884.830,96
9,36	ZAPATA DE 2.00 X 2.00 X 0.35 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	M3	1,40	$ 1.020.946,00	$ 1.429.324,40
9,37	COLUMNA DE 0.40 X 0.40 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	14,49	$ 177.056,00	$ 2.565.541,44
9,38	PLACA EN CONCRETO DE 2.00 m X 2.00 m X 0.17 m DE 3000 PSI INCLUYE REF. VARILLA DE 3/8 @0.15MT PARA TANQUE ELEVADO	M2	4,00	$ 403.099,00	$ 1.612.396,00
9,39	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA PARA COLUMNA Y ZAPATA TANQUE	KG	203,58	$ 9.658,00	$ 1.966.175,64
				TOTAL	**$ 124.439.489**


Dirección: Cra9 #6-36 Ofi202 **Teléfono:**3217764749 **E-Mail:** consorcioinfraeducativo022@gmail.com

EMAIL: consorcioinfraeducativo002@gmail.com
TELEFONO: +57 313 511 0185
DIRECCIÓN: Cra 6 No. 64A - 58

CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002

PORCENTAJE DE AVANCE

A continuación, se presenta un resumen de los porcentajes de avance programados, de acuerdo con la programación presentada, la cual cuenta con la aprobación de la supervisión y con base en la cual se medirá el avance del proyecto mes a mes; la programación de obra fue elaborada con base a las cantidades de obra contratadas, en esta se puede evidenciar un avance del 3.01% durante este periodo, lo que a la fecha indica que el porcentaje ejecutado acumulado es del **45.15%**

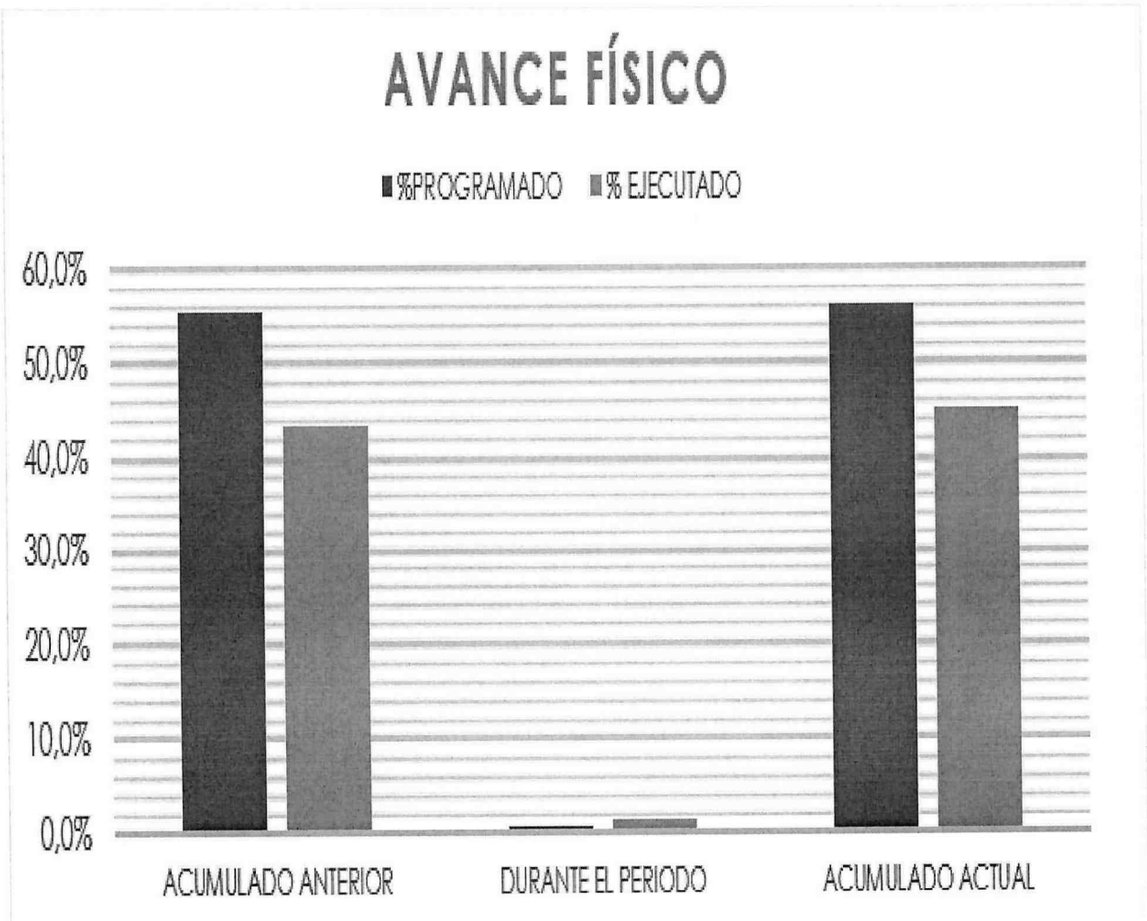

Dirección: Cra9 #6-36 Ofi202 **Teléfono:**3217764749 **E-Mail:** consorcioinfraeducativo022@gmail.com

En el presente periodo, el proyecto avanzo un 3.01% que equivale a $124.439.488 De acuerdo a las cantidades de obra ejecutadas


Teniendo en cuenta el avance presentado durante este periodo, en el cual se desarrolla la etapa de ejecución de obra, él proyecto cuenta con un avance acumulado del **45.15%**

SOPORTES DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Se anexa planilla de pago de seguridad social del consorcio y trabajadores independientes.


REGISTRO FOTOGRÁFICO

A continuación, se presenta un registro fotográfico de las actividades realizadas entre el 28 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DE 2025, en el desarrollo del contrato No. SI-LP-002-2024.

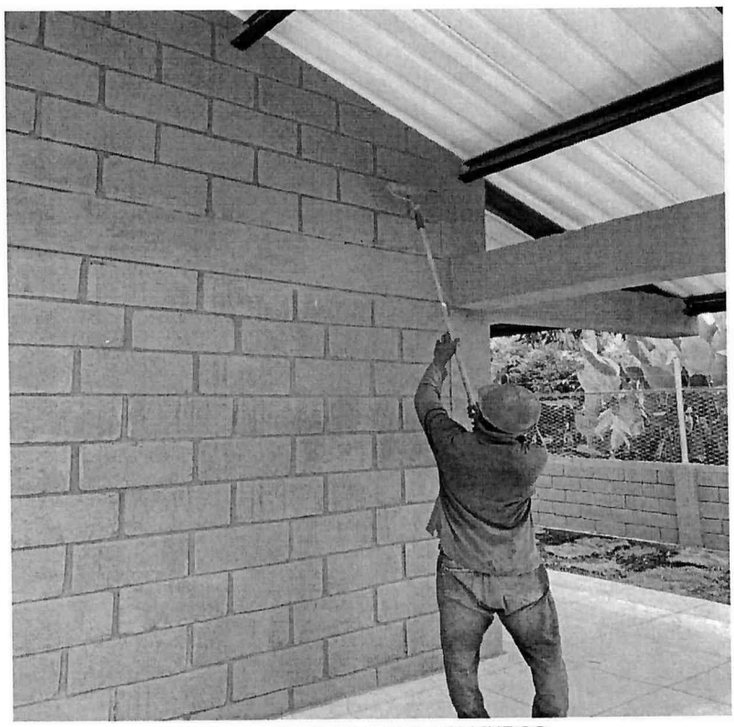


Fotografía 3. PINTURA DE MUROS

Dirección: Cra9 #6-36 Ofi202 **Teléfono:**3217764749 **E-Mail:** consorcioinfraeducativo022@gmail.com

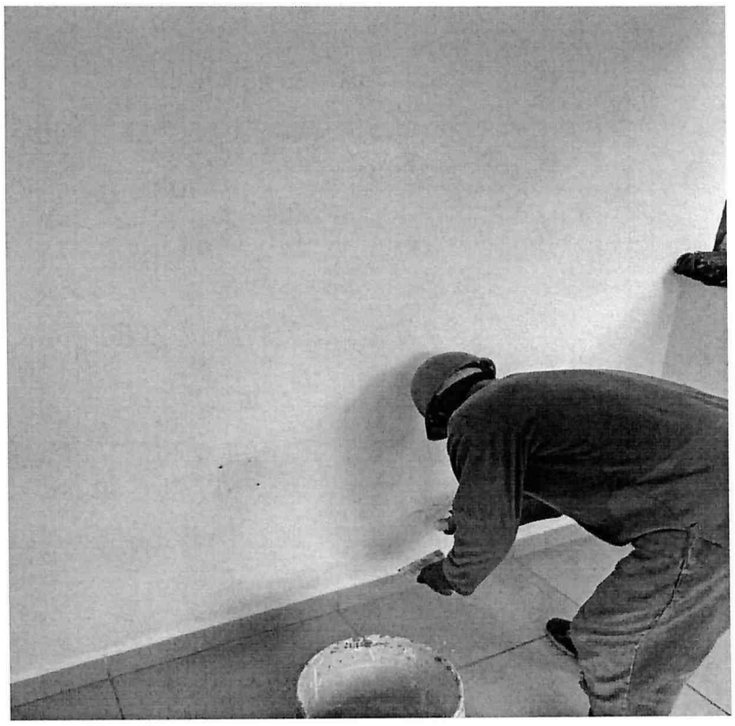

Fotografía 4. ESTUCO PARA MUROS

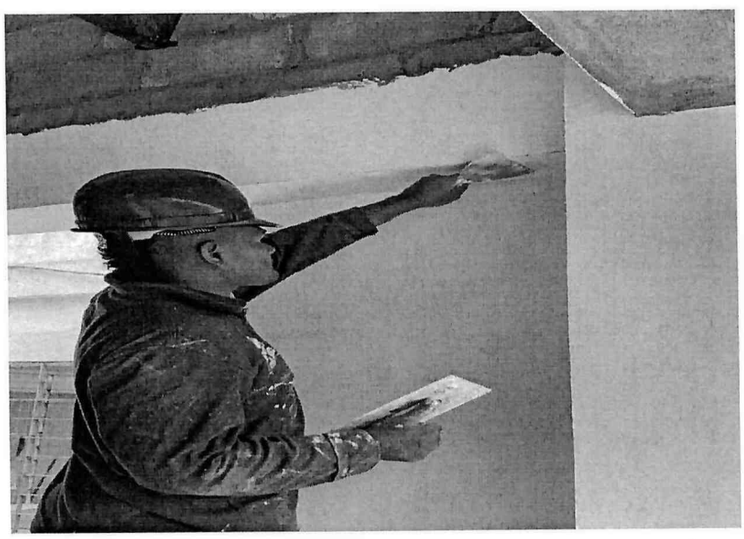

Dirección: Cra9 #6-36 Ofi202 **Teléfono:**3217764749 **E-Mail:** consorcioinfraeducativo022@gmail.com


EMAIL: consorcioinfraeducativo002@gmail.com
TELEFONO: +57 313 511 0185
DIRECCIÓN: Cra 6 No. 64A - 58

CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002



Fotografía 5. ACERO DE REFUERZO


Fotografía 6. CERRAMIENTO PROVICIONAL

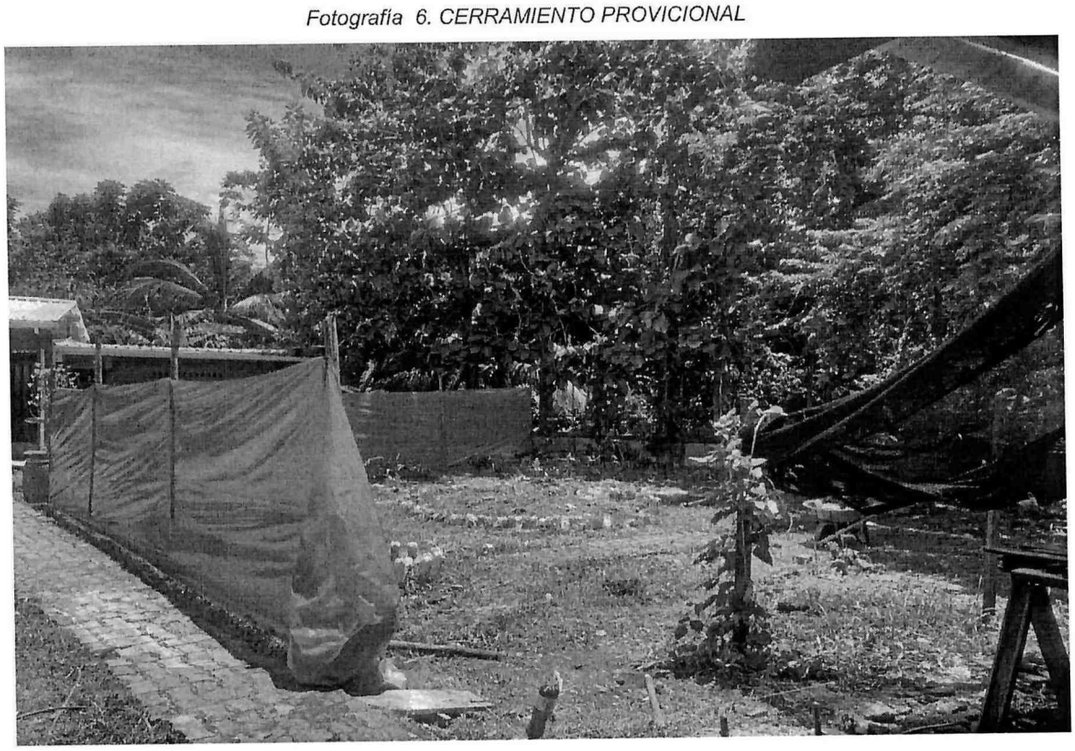

Dirección: Cra9 #6-36 Ofi202 **Teléfono:**3217764749 **E-Mail:** consorcioinfraeducativo022@gmail.com

Fotografía 7.EXCAVACION MANUAL PARA ZAPATAS



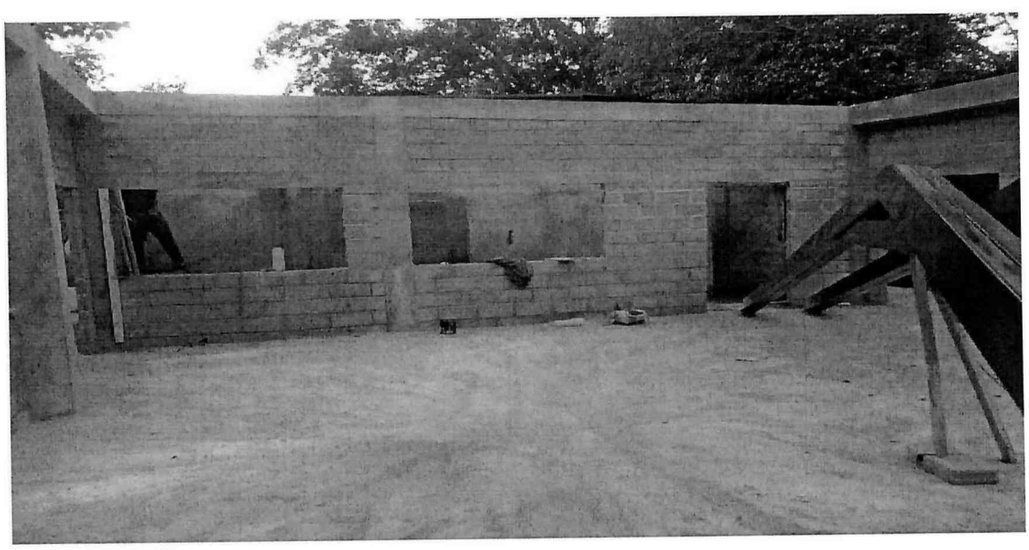

Fotografía 8.LEVANTE DE MUROS

Dirección: Cra9 #6-36 Ofi202 **Teléfono:**3217764749 **E-Mail:** consorcioinfraeducativo022@gmail.com

CONCLUCIONES

Dentro del periodo comprendido del 28 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DE 2025; correspondiente al presente informe podemos mencionar las siguientes conclusiones más relevantes:

- El contratista CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002, ha ejecutado actividades de instalación excavaciones,levante de muros ,excavaciones,pañete,rampas de acceso entre otras; alcanzando un porcentaje de avance acumulado de 45.15%

- Durante el presente periodo, el avance acumulado del proyecto es 56.16%, que comparado con el 45.15% programado acumulado ejecutado; se espera continuar aumentando este porcentaje de ejecución para el siguiente periodo.

- Las obras se vienen ejecutando de conformidad con los diseños suministrados por la entidad contratante; dando cumplimiento a las especificaciones técnicas de construcción y de acuerdo a los plazos establecidos.

- Se emplean los equipos necesarios y materiales de calidad para la ejecución de las obras.

- Con el presente informe se deja constancia del cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista consorcio infraestructura educativa 002, en lo correspondiente a la parte técnica, financiera y jurídica.

- Se incluye como anexo al presente informe, el reporte de las actividades y seguimiento al plan de seguridad y salud en el trabajo.

Maria Q.


MARIA ISABEL QUINTERO GONZALEZ
C.C. 1.010.007.099
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002
NIT 901.915.670-0

SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACION SEMANAL	
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA (COSTO DIRECTO)	4.135.056.075,00


	PERIODO DE EJECUCION			Semanal				Semana Acumulada				
Mes	Semana	PERIODO		Programado (P)	% P.S	Ejecutado (E)	% E.S	% Programado	% P	% Ejecutado	% E	% AVG. Avance
1	Semana 1	lun 17-mar-2025	dom 23-mar-2025	$ 20.099.075,00	0,486%	$ 15.709.290,00	0,380%	$ 20.099.075,00	0,486%	$ 15.709.290,00	0,380%	
	Semana 2	lun 24-mar-2025	dom 30-mar-2025	$ 57.747.504,00	1,397%	$ 37.162.883,72	0,899%	$ 77.846.579,00	1,883%	$ 52.872.173,72	1,279%	
	Semana 3	lun 31-mar-2025	dom 6-abr-2025	$ 26.705.425,00	0,646%	$ 68.272.083,38	1,651%	$ 104.552.004,00	2,528%	$ 121.144.257,10	2,930%	
	Semana 4	lun 7-abr-2025	dom 13-abr-2025	$ 56.717.560,00	1,372%	$ 41.671.560,59	1,008%	$ 161.269.564,00	3,900%	$ 162.815.817,69	3,937%	
2	Semana 5	lun 14-abr-2025	dom 20-abr-2025	$ 43.539.481,00	1,053%	$ 21.320.216,72	0,516%	$ 204.809.045,00	4,953%	$ 184.136.034,41	4,453%	
	Semana 6	lun 21-abr-2025	dom 27-abr-2025	$ 281.542.006,00	6,809%	$ 52.982.810,32	1,281%	$ 486.351.051,00	11,762%	$ 237.118.844,73	5,734%	
	Semana 7	lun 28-abr-2025	dom 4-may-2025	$ 200.539.670,00	4,850%	$ 47.007.846,96	1,137%	$ 686.890.721,00	16,611%	$ 284.126.691,69	6,871%	
	Semana 8	lun 5-may-2025	dom 11-may-2025	$ 52.161.034,00	1,261%	$ 52.253.467,96	1,264%	$ 739.051.755,00	17,873%	$ 336.380.159,65	8,135%	
	Semana 9	lun 12-may-2025	dom 18-may-2025	$ 81.699.098,00	1,976%	$ 65.067.398,54	1,574%	$ 820.750.853,00	19,849%	$ 401.447.558,19	9,708%	
3	Semana 10	lun 19-may-2025	dom 25-may-2025	$ 60.985.678,00	1,475%	$ 46.288.216,69	1,119%	$ 881.736.531,00	21,323%	$ 447.735.774,88	10,828%	
	Semana 11	lun 26-may-2025	dom 1-jun-2025	$ 49.975.236,00	1,209%	$ 49.056.520,84	1,186%	$ 931.711.767,00	22,532%	$ 496.792.295,72	12,014%	
	Semana 12	lun 2-jun-2025	dom 8-jun-2025	$ 162.732.843,00	3,935%	$ 154.799.936,40	3,744%	$ 1.094.444.610,00	26,467%	$ 651.592.232,12	15,758%	
	Semana 13	lun 9-jun-2025	dom 15-jun-2025	$ 91.872.712,00	2,222%	$ 590.516.569,66	14,281%	$ 1.186.317.322,00	28,689%	$ 1.242.108.801,78	30,038%	
4	Semana 14	lun 16-jun-2025	dom 22-jun-2025	$ 170.632.029,00	4,126%	$ 133.035.737,64	3,217%	$ 1.356.949.351,00	32,816%	$ 1.375.144.539,42	33,256%	
	Semana 15	lun 23-jun-2025	dom 29-jun-2025	$ 109.934.490,00	2,659%	$ 35.362.945,99	0,855%	$ 1.466.883.841,00	35,474%	$ 1.410.507.485,41	34,111%	
	Semana 16	lun 30-jun-2025	dom 6-jul-2025	$ 249.820.044,00	6,042%	$ 49.328.394,12	1,193%	$ 1.716.703.885,00	41,516%	$ 1.459.835.879,53	35,304%	
	Semana 17	lun 7-jul-2025	dom 13-jul-2025	$ 199.023.710,00	4,813%	$ 162.677.453,70	3,934%	$ 1.915.727.595,00	46,329%	$ 1.622.513.333,23	39,238%	
5	Semana 18	lun 14-jul-2025	dom 20-jul-2025	$ 20.776.777,00	0,502%	$ 60.425.120,42	1,461%	$ 1.936.504.372,00	46,831%	$ 1.682.938.453,65	40,699%	
	Semana 19	lun 21-jul-2025	dom 27-jul-2025	$ 43.033.201,00	1,041%	$ 59.516.381,37	1,439%	$ 1.979.537.573,00	47,872%	$ 1.742.454.835,02	42,139%	
	Semana 20	lun 28-jul-2025	dom 3-ago-2025	$ 266.078.042,00	6,435%	$ 49.371.048,13	1,194%	$ 2.245.615.615,00	54,307%	$ 1.791.825.883,15	43,333%	
	Semana 21	lun 4-ago-2025	dom 10-ago-2025	$ 47.173.002,00	1,141%	$ 11.216.828,60	0,271%	$ 2.292.788.617,00	55,448%	$ 1.803.042.711,75	43,604%	
6	Semana 22	lun 11-ago-2025	dom 17-ago-2025	$ 29.255.348,00	0,707%	$ 63.851.611,84	1,544%	$ 2.322.043.965,00	56,155%	$ 1.866.894.323,59	45,148%	
	Semana 23	lun 18-ago-2025	dom 24-ago-2025	$ 342.880.767,00	8,292%		0,000%	$ 2.664.924.732,00	64,447%	$ 1.866.894.323,59	45,148%	
	Semana 24	lun 25-ago-2025	dom 31-ago-2025	$ 103.740.205,00	2,509%		0,000%	$ 2.768.664.937,00	66,956%	$ 1.866.894.323,59	45,148%	
	Semana 25	lun 1-sep-2025	dom 7-sep-2025	$ 37.786.040,00	0,914%		0,000%	$ 2.806.450.977,00	67,870%	$ 1.866.894.323,59	45,148%	
	Semana 26	lun 8-sep-2025	dom 14-sep-2025	$ 57.182.957,00	1,383%		0,000%	$ 2.863.633.934,00	69,253%	$ 1.866.894.323,59	45,148%	
7	Semana 27	lun 15-sep-2025	dom 21-sep-2025	$ 21.648.689,00	0,524%		0,000%	$ 2.885.282.623,00	69,776%	$ 1.866.894.323,59	45,148%	
	Semana 28	lun 22-sep-2025	dom 28-sep-2025	$ 19.301.731,00	0,467%		0,000%	$ 2.904.584.354,00	70,243%	$ 1.866.894.323,59	45,148%	
	Semana 29	lun 29-sep-2025	dom 5-oct-2025	$ 124.938.434,00	3,021%		0,000%	$ 3.029.522.788,00	73,264%	$ 1.866.894.323,59	45,148%	
	Semana 30	lun 6-oct-2025	dom 12-oct-2025	$ 185.482.072,00	4,486%		0,000%	$ 3.215.004.860,00	77,750%	$ 1.866.894.323,59	45,148%	
	Semana 31	lun 13-oct-2025	dom 19-oct-2025	$ 114.132.100,00	2,760%		0,000%	$ 3.329.136.960,00	80,510%	$ 1.866.894.323,59	45,148%	
8	Semana 32	lun 20-oct-2025	dom 26-oct-2025	$ 75.763.733,00	1,832%		0,000%	$ 3.404.900.693,00	82,342%	$ 1.866.894.323,59	45,148%	
	Semana 33	lun 27-oct-2025	dom 2-nov-2025	$ 275.169.790,00	6,655%		0,000%	$ 3.680.070.483,00	88,997%	$ 1.866.894.323,59	45,148%	
	Semana 34	lun 3-nov-2025	dom 9-nov-2025	$ 42.102.771,00	1,018%		0,000%	$ 3.722.173.254,00	90,015%	$ 1.866.894.323,59	45,148%	
	Semana 35	lun 10-nov-2025	dom 16-nov-2025	$ 412.882.821,00	9,985%		0,000%	$ 4.135.056.075,00	100,000%	$ 496.792.295,72	45,148%	
				$ 4.135.056.075,00	100,00%	$ 1.866.894.323,59	45,15%			$ 1.866.894.323,59	45,15%	


RESUMEN EJECUCION MENSUAL

MES	P. Mensual		E. Mensual		P. Mensual		P. Mensual		Avg E (%)
Mes 1	161.269.564,000	3,90%		0,00%	161.269.564	3,90%	162.815.818	3,94%	0,00%
Mes 2	659.481.289,000	15,95%		0,00%	820.750.853	19,85%	401.447.558	9,71%	0,00%
Mes 3	365.566.469,000	8,84%		0,00%	1.186.317.322	28,69%	1.242.108.802	39,24%	
Mes 4	729.410.273,000	17,64%		0,00%	1.915.727.595	46,33%	1.622.513.333	39,24%	
Mes 5	377.061.022,000	9,12%		0,00%	2.292.788.617	55,45%	1.866.894.324	45,15%	
Mes 6	570.845.317,000	13,81%		0,00%	2.863.633.934	69,25%			
Mes 7	465.503.026,000	11,26%		0,00%	3.329.136.960	80,51%			
Mes 8	805.919.115,000	19,49%		0,00%	4.135.056.075	100,00%	496.792.296		0,00%
	4.135.056.075,000	100,00%	-	0,00%					

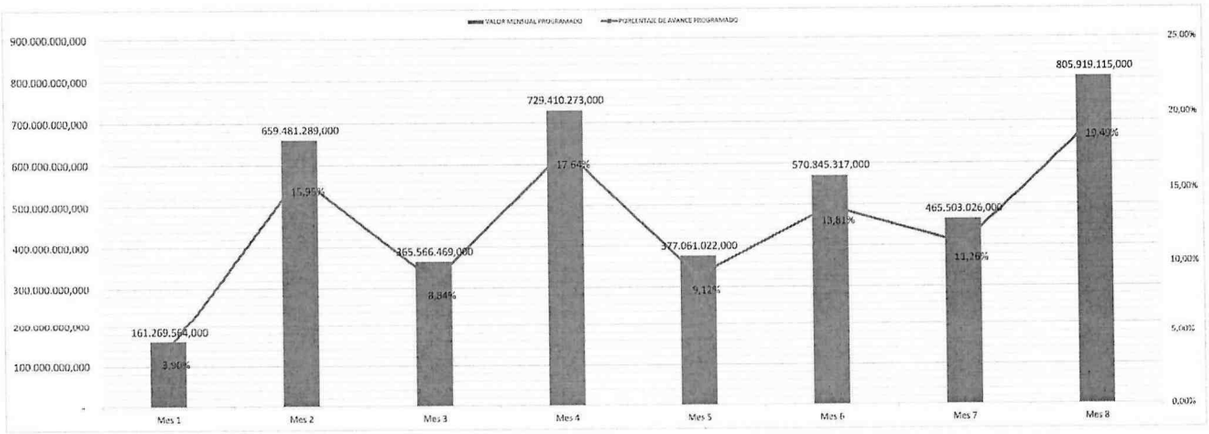

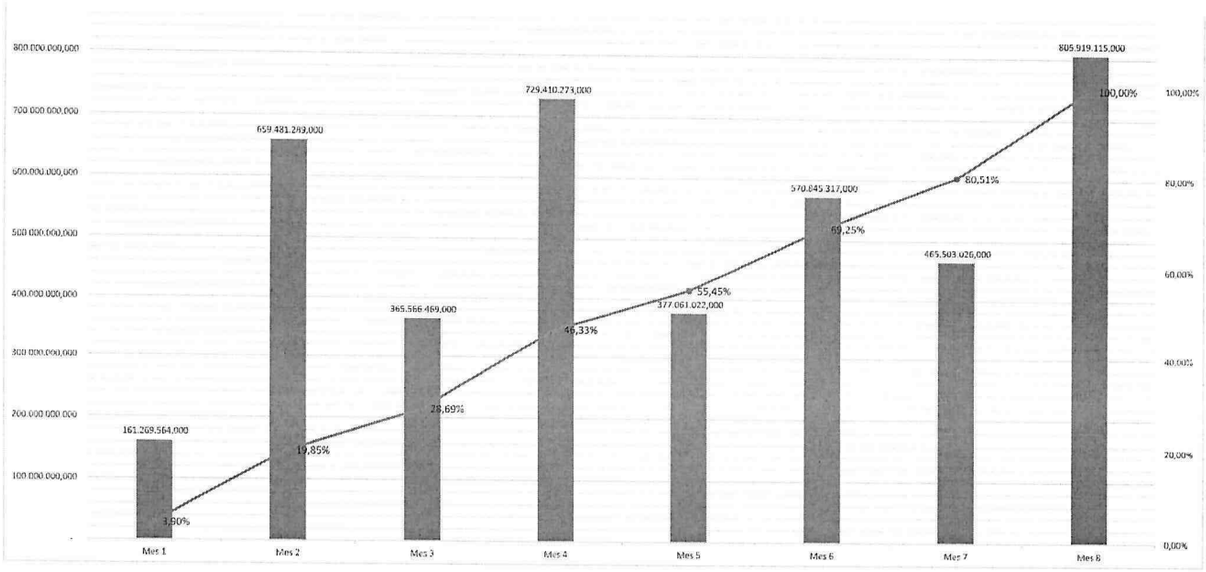


800.000.000,000
700.000.000,000
600.000.000,000
500.000.000,000
400.000.000,000
300.000.000,000
200.000.000,000
100.000.000,000
-
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
161.269.564,000
659.481.269,000
365.566.469,000
729.410.273,000
377.061.022,000
570.845.317,000
465.503.026,000
805.919.115,000
1,80%
19,85%
28,69%
46,33%
55,45%
69,25%
80,51%
100,00%
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8

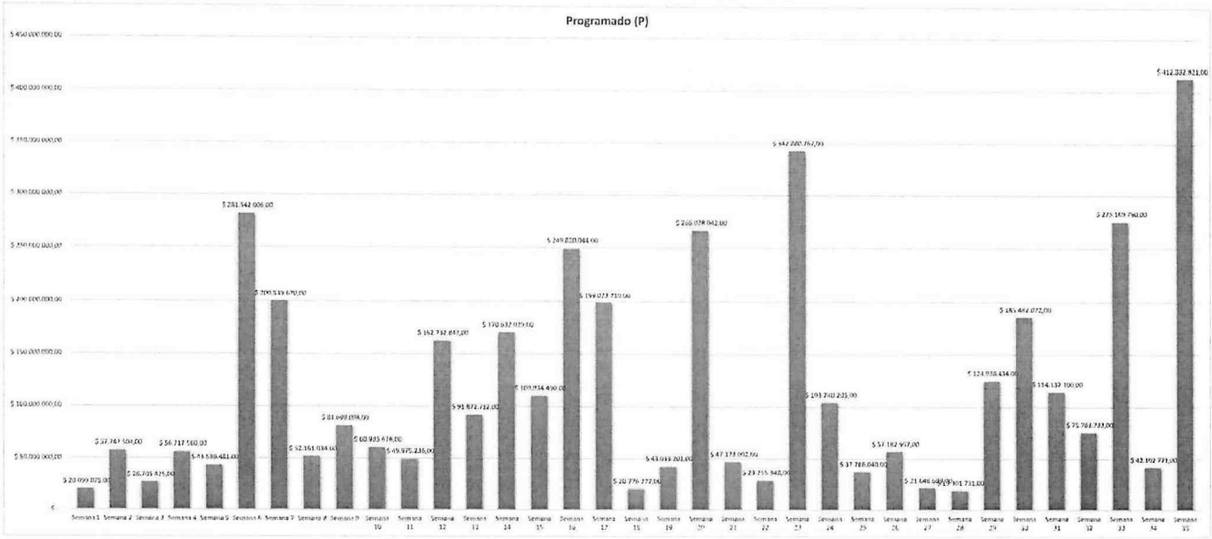
Programado (P)


AVANCE SEMANAL PROGRAMADO ACUMULADO (SPESOS)
$ 4.500.000.000,00
$ 4.000.000.000,00
$ 3.500.000.000,00
$ 3.000.000.000,00
$ 2.500.000.000,00
$ 2.000.000.000,00
$ 1.500.000.000,00
$ 1.000.000.000,00
$ 500.000.000,00
$ -
$ 4.135.056.075,00
$ 3.660.070.483,00
$ 3.404.900.693,00
$ 3.329.136.960,00
$ 3.215.004.360,00
$ 3.029.522.795,00
$ 2.768.
$ 2.664.924.737,00
$ 2.245.815.
$ 1.915.
$ 1.716.703.835,00
$ 1.466.883.441,00
$ 1.356.949.351,00
$ 1.186.317.325,00
$ 1.094.641.610,00
$ 931.711.767,00
$ 820.750.851,00
$ 779.051.755,00
$ 686.890.215,00
$ 486.351.051,00
$ 161.269.500,00
$ 77.418.404,00
$ 20.097.075,00
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Semana 6
Semana 7
Semana 8
Semana 9
Semana 10
Semana 11
Semana 12
Semana 13
Semana 14
Semana 15
Semana 16
Semana 17
Semana 18
Semana 19
Semana 20
Semana 21
Semana 22
Semana 23
Semana 24
Semana 25
Semana 26
Semana 27
Semana 28
Semana 29
Semana 30
Semana 31
Semana 32
Semana 33
Semana 34
Semana 35

EMAIL: consorcioinfraeducativo002@gmail.com
TELEFONO: +57 313 511 0185
DIRECCIÓN: Cra 6 No. 64A - 58

CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002

ANEXO 3. INFORMES SEMANALES

Dirección: Cra9 #6-36 Ofi202 **Teléfono:**3217764749 **E-Mail:** consorcioinfraeducativo022@gmail.com

732

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA OBRA Bien

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002 CONTRATO No: SI-LP-002-2024

INTERVENTORÍA: ANTICA S.A.S. BIC CONTRATO No: SI-CMA-007-2024

Semana Número: 21 Del: 4/08/2025 Al: 10/08/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 147 Días

Supervisor: CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,14%	#¡REF!
Valor básico de la Obra programada:	$ 47.173.002,00	#¡REF!

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,27%	43,60%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 11.216.828,60	$ 1.802.936.625,90

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002
Contrato No.	SI-LP-002-2024
Valor Inicial:	$ 4.135.056.075,00
Valor Actualizado:	$ 4.135.056.075,00
Plazo Inicial:	8 MESES
Plazo Actualizado:	8 MESES
Fecha de Iniciación:	17 de marzo de 2025
Fecha de Vencimiento:	17 de noviembre de 2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	ANTICA S.A.S. BIC
Contrato No.	SI-CMA-007-2024
Valor Inicial:	$ 350.649.999,00
Valor Actualizado:	$ 350.649.999,00
Plazo Inicial:	8 MESES
Plazo Actualizado:	8 MESES
Fecha de Iniciación:	17 de marzo de 2025
Fecha de Vencimiento:	17 de noviembre de 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	TOTAL
1,01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	M2	115,50	$ 4.287,00	$ 495.148,50
1,02	ADECUACIÓN Y NIVELACIÓN DE TERRENO	M2	115,50	$ 7.514,00	$ 867.867,00
1,03	S/I CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE, H=2.10 MTS PARA OBRAS	ML	43,00	$ 21.007,00	$ 903.301,00
2,01	EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS DE 1.00 X 1.00 MTS	M3	15,00	$ 39.259,00	$ 588.885,00
2,03	REEMPLAZO O MEJORAMIENTO DEL TERRENO DEBAJO DE ZAPATAS EN PIEDRA RAJON - MATERIAL SELECCIONADO (80/20)	M3	5,00	$ 206.382,00	$ 1.031.910,00
2,05	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE 10 KM	M3	19,50	$ 22.830,00	$ 445.185,00
3,01	SOLADO EN CONCRETO E = 0.05 MTS DE 14 MPA (2000 PSI)	M3	0,50	$ 890.152,00	$ 445.076,00
3,04	ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA CIMENTACIÓN	KG	221,45	$ 9.658,00	$ 2.138.764,10
9,25	TANQUE ELEVADO DE 2000L PLÁSTICO	UND	4,00	$ 1.075.173,00	$ 4.300.692,00
				COSTO TOTAL (INCLUYE AIU)	**$ 11.216.828,60**
				PORCENTAJE (%) EJECUTADO SEMANAL	**0,27%**
				PORCENTAJE (%) DE ATRASO O AVANCE SEMANAL	**-0,87%**

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	SOBRECIMIENTO IMPERMEABILIZADO 3 HILADAS EN BLOQUE MACIZO DE CONCRETO DE 0.10M X 0.20M X 0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4
LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL DE TUBERIA SANITARIA	EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATA DE 2.00 X 2.00 MTS
REEMPLAZO O MEJORAMIENTO DEL TERRENO DEBAJO DE ZAPATA EN PIEDRA RAJON - MATERIAL SELECCIONADO (80/20)	RELLENO DEL AREA CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO
EXCAVACIÓN MANUAL PARA TANQUE	REEMPLAZO O MEJORAMIENTO DEL TERRENO PARA SUPERFICIE DE APOYO DE TANQUE EN PIEDRA RAJON - MATERIAL SELECCIONADO (80/20)
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE 10 KM	

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

AVANCE FINANCIERO DE OBRA		
RESUMEN DE ACTAS PAGADAS		**% DE AVANCE**
ANTICIPO	$ 1.240.516.822,50	0,00%
ACTA PARCIAL 1:	$ 1.261.079.816,77	30,50%
ACTA PARCIAL 2:	$ -	0,00%
ACTA PARCIAL 3:	$ -	0,00%
TOTAL ACUMULADO	$ 1.261.079.816,77	30,50%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA		
RESUMEN DE ACTAS PAGADAS		**% DE AVANCE**
ACTA PARCIAL 1:	$ -	0,00%
ACTA PARCIAL 2:	$ -	0,00%
ACTA PARCIAL 3:	$ -	0,00%
TOTAL ACUMULADO	$ -	0,00%

	%Programado	% Ejecutado
Acumulado anterior	54,31%	43,33%
Durante el periodo	1,14%	0,27%
Acumulado actual	55,45%	43,60%
Atraso o avance acumulado	**-11,85%**	

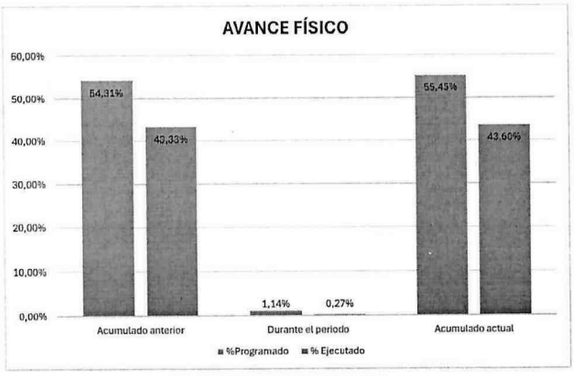

229

283

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA OBRA Bien

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUNIN - TIERRALTA



Descripción: LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO

FOTO 1.



Descripción: S/I CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE, H=2.10 MTS PARA OBRAS

FOTO 2.



Descripción: LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO

FOTO 3.



Descripción: EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS DE 1.00 X 1.00 MTS

FOTO 4.

234

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA OBRA Bien

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002 CONTRATO No: SI-LP-002-2024

INTERVENTORÍA: ANTICA S.A.S. BIC CONTRATO No: SI-CMA-007-2024

Semana Número: 22 Del: 11/08/2025 Al: 17/08/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 154 Días

Supervisor: CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,71%	#¡REF!
Valor básico de la Obra programada:	$ 29.255.348,00	#¡REF!
Obra Física Ejecutada (%)	1,54%	45,15%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 63.851.611,84	$ 1.866.788.237,74

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002
Contrato No.	SI-LP-002-2024
Valor Inicial:	$ 4.135.056.075,00
Valor Actualizado:	$ 4.135.056.075,00
Plazo Inicial:	8 MESES
Plazo Actualizado:	8 MESES
Fecha de Iniciación:	17 de marzo de 2025
Fecha de Vencimiento:	17 de noviembre de 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

Interventor:	ANTICA S.A.S. BIC
Contrato No.	SI-CMA-007-2024
Valor Inicial:	$ 350.649.999,00
Valor Actualizado:	$ 350.649.999,00
Plazo Inicial:	8 MESES
Plazo Actualizado:	8 MESES
Fecha de Iniciación:	17 de marzo de 2025
Fecha de Vencimiento:	17 de noviembre de 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	TOTAL
3,02	ZAPATAS DE 1.00 X 1.00 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	M3	3,00	$ 1.020.946,00	$ 3.062.838,00
3,03	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	30,80	$ 124.557,00	$ 3.836.355,60
3,04	ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA CIMENTACIÓN	KG	348,44	$ 9.658,00	$ 3.365.233,52
4,03	ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA ESTRUCTURAS	KG	176,09	$ 9.658,00	$ 1.700.677,22
5,03	ESTUCO PLASTICO PARA MUROS	M2	1147,50	$ 22.172,00	$ 25.442.370,00
5,04	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	1147,50	$ 23.045,00	$ 26.444.137,50
				COSTO TOTAL (INCLUYE AIU)	$ 63.851.611,84
				PORCENTAJE (%) EJECUTADO SEMANAL	1,54%
				PORCENTAJE (%) DE ATRASO O AVANCE SEMANAL	0,84%

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

RELLENO DEL AREA CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	SOBRECIMIENTO IMPERMEABILIZADO 3 HILADAS EN BLOQUE MACIZO DE CONCRETO DE 0.10M X 0.20M X 0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4
ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA ESTRUCTURAS	PLANTILLA EN CONCRETO 3000 PSI, E= 0.10MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA
LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL DE TUBERIA PRESION	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 1/2" PVC RDE 9, PARA SOLDAR
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 3/4" PVC, RDE 21, PARA SOLDAR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 1" PVC, RDE 21, PARA SOLDAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE UNIÓN MACHO GALVANIZADO 1" L=50CM
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE UNIÓN MACHO GALVANIZADO 1" L=15CM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION UNIVERSAL GALVANIZADA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO GALVANIZADO 1"	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE GALVANIZADA 1"
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN GALVANIZADO 1"	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA CHECK VERTICAL BRONCE 1"
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE CIERRE RÁPIDO METÁLICA 1"	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE REGISTRO 1/2" , INCLUYE TAPA REGISTRO 15X15CM
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE REGISTRO 1", INCLUYE TAPA REGISTRO 15X15CM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 2" PVC, PARA SOLDAR
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 3" PVC, PARA SOLDAR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 4" PVC, PARA SOLDAR
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA VENTILACION 2" PVC, PARA SOLDAR	PUNTO SANITARIO 2"
PUNTO SANITARIO 4"	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION 60X60X100 CM
SOLADO EN CONCRETO E = 0.05 MTS DE 14 MPA (2000 PSI)	ZAPATA DE 2,00 X 2,00 X 0,35 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)
SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO (incluye interruptor, Tubería PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG)	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE (incluye interruptor, Tubería PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG)
SALIDA PARA VENTILADOR DE TECHO (incluye control, Tubería PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG,cable encauchetado 3x14AWG, Ventilador de Techo residencial)	SALIDA PARA LUMINARIA EN TECHO Y EXTERIORES (incluye Tubería EMT, Tuberia PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG, cable encauchetado 3x14AWG, Panel LED 24W- Wallpack LED 30W)
SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA Y AVISO SALIDA (incluye Tubería EMT, Tuberia PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG, cable encauchetado 3x14AWG, Luminaria LED EMERGENCIA, Aviso LED SALIDA)	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA Y GFCI, (incluye TOMA DOBLE 15A - 125V, Tuberia PVC SCH40, Tubería EMT, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG) TD1-C-2-C4- C6-C8-10-12-14-16
SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO BIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y PUERTA DE 20 CIRCUITOS. (incluye Protecciones, Tubería PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA PUESTA A TIERRA (incluye Tubería PVC, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°8AWG)

235

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA


CÓRDOBA OBRA Bien

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

AVANCE FINANCIERO DE OBRA		
RESUMEN DE ACTAS PAGADAS		% DE AVANCE
ANTICIPO	$ 1.240.516.822,50	0,00%
ACTA PARCIAL 1:	$ 1.261.079.816,77	30,50%
ACTA PARCIAL 2:	$ -	0,00%
ACTA PARCIAL 3:	$ -	0,00%
TOTAL ACUMULADO	$ 1.261.079.816,77	30,50%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA		
RESUMEN DE ACTAS PAGADAS		% DE AVANCE
ACTA PARCIAL 1:	$ -	0,00%
ACTA PARCIAL 2:	$ -	0,00%
ACTA PARCIAL 3:	$ -	0,00%
TOTAL ACUMULADO	$ -	0,00%

	%Programado	% Ejecutado
Acumulado anterior	55,45%	43,60%
Durante el periodo	0,71%	1,54%
Acumulado actual	56,16%	45,15%
Atraso o avance acumulado	-11,01%	

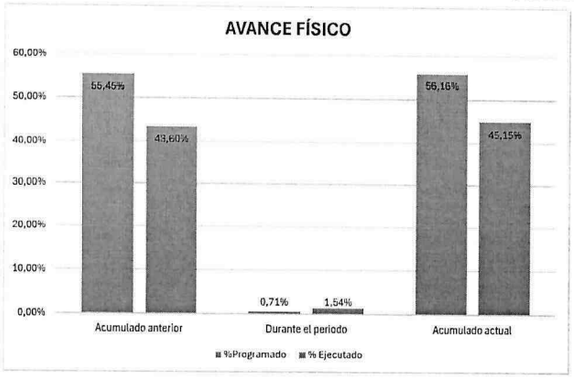


REGISTRO FOTOGRÁFICO


INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCOS FIDEL SUAREZ - CIENAGA DE ORO



Descripción: PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)

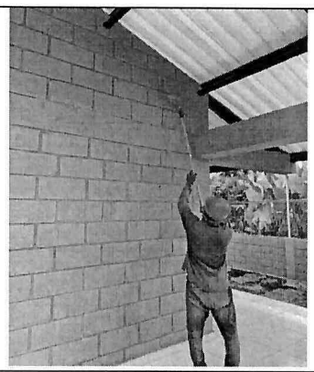

Descripción: PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)

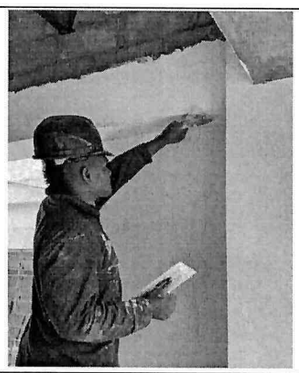

Descripción: ESTUCO PLASTICO PARA MUROS



Descripción: ESTUCO PLASTICO PARA MUROS

236

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA OBRA Bien

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUNIN - TIERRALTA



Descripción: ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA ESTRUCTURAS



Descripción: ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA ESTRUCTURAS

ANEXO 4. ACTAS SUSCRITAS

Dirección: Cra9 #6-36 Ofi202 **Teléfono:**3217764749 **E-Mail:** consorcioinfraeducativo022@gmail.com

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

ACTA DE INICIO

CONTRATO DE OBRA No.:	SI-LP-002-2024 de fecha 12 de febrero de 2025
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002 NIT: 901915670-0 R.L: María Isabel Quintero Gonzalez C.C No.: 1.010.007.099
INTERVENTORIA:	ANTICA S.A.S BIC NIT: 901823241-9 R.L: Juan Pablo Banquez Gonzalez C.C No.: 1.067.958.787
OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
VALOR DEL CONTRATO:	CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE **($4.135.056.075,00)**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO (08) MESES
FECHA DE INICIO:	DIECISIETE (17) DE MARZO DE 2025

En Montería, el día Diecisiete (17) de marzo de 2025 en las oficinas de la **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA** de la Gobernación de Córdoba se reunieron: el señor **JUAN PABLO BANQUEZ GONZALEZ** identificado con C.C. No. 1.067.958.787 de Montería, representante legal de **ANTICA S.A.S BIC** con Nit: 901823241-9, en su calidad de interventor del contrato, y la señora **MARÍA ISABEL QUINTERO GONZALEZ**, identificada con C.C No. 1.010.007.099 de Montería en calidad de represéntate legal de **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002** con Nit. 901915670-0 en su calidad de **CONTRATISTA**, con el fin de dar inicio a la ejecución del contrato en mención, las partes socializaron las obligaciones establecidas en el **CONTRATO DE OBRA No. SI-LP-002-2024** y manifestaron estar de acuerdo con la ejecución de las mismas a partir de la fecha.

ANTICA S.A.S BIC
Nit: 901823241-9
R.L: Juan Pablo Banquez González
C.C. No. 1.067.958.787
INTERVENTOR

Maria Q.

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002
NIT: 901915670-0
R.L: María Isabel Quintero González
C.C No.: 1.010.007.099
CONTRATISTA

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REVISADO POR:
Nombre: Abdul Zarur Lakah	Nombre: Oscar Pineda Mendoza	Nombre: GABRIELA RUIZ CARRASCAL
Cargo: Contratista SID	Cargo: Contratista SID	Cargo: Auxiliar Admin SID
Firma:	Firma:	Firma:

Gobernación de Córdoba. NIT. 800103935-6
Palacio de Naín. Calle 27 No. 3 - 28 Montería, Córdoba
PBX. + (57) 4 784 8940 - 01 8000 400 357
contactenos@cordoba.gov.co - gobernador@cordoba.gov.co
www.cordoba.gov.co

EMAIL: consorcioinfraeducativo002@gmail.com
TELEFONO: +57 313 511 0185
DIRECCIÓN: Cra 6 No. 64A - 58

CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002

ANEXO 5. PLANILLAS

Dirección: Cra9 #6-36 Ofi202 **Teléfono:**3217764749 **E-Mail:** consorcioinfraeducativo022@gmail.com

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901915670	0	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 6 A 64 A58	MONTERIA-CORDOBA	7828082	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	9490278848	9490278848	E	2025/08/20	2025/08/14	BANCO DE BOGOTA	0	$9,083,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1067940218	AGAMEZ ANDY																		230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF16	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
2	CC	1066735527	ALEAN NEVER																		230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
3	CC	1233340397	ALVAREZ JOSE																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF16	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
4	CC	1064976924	ARGUELLO CESAR																		231001	30	$1,423,500	$227,800	CCFC55	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
5	CC	78025167	AYALA JOSE																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
6	CC	1020789957	BEJARANO KAMAL																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF16	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
7	CC	78748099	CASTRO RICARDO																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF16	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
8	CC	11171737	CONDE VICTOR	X																	231001	9	$427,050	$68,400	ESSC24	9	$427,050	$17,100	CCF16	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$427,050	$29,800	9	$0	$0	Si	$132,400
9	CC	1126245995	CONTRERAS EDINSON																		230301	30	$1,423,500	$227,800	CCFC55	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
10	CC	1067942893	CORRALES SHARON																		230201	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
11	CC	1043641929	CORTES MANUEL	X																	25-14	9	$427,050	$68,400	ESSC24	9	$427,050	$17,100	CCF16	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$427,050	$29,800	9	$0	$0	Si	$132,400
12	CC	1003457959	FRANCO OSCAR																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
13	CC	1073828923	GALINDO CAMILO	X																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
14	CC	1070815145	MELENDEZ JOSE	X																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
15	CC	1073825958	MENDOZA SAIBIS																		230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
16	CC	1066732487	PEREZ LUIS	X																	230301	9	$427,050	$68,400	EPS002	9	$427,050	$17,100	CCF16	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$427,050	$29,800	9	$0	$0	Si	$132,400
17	CC	19191822	RAMIREZ HECTOR																			0	$0	$0	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$213,100
18	CC	11172007	RUIZ ARIEL	X																	230301	9	$427,050	$68,400	ESSC07	9	$427,050	$17,100	CCF16	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$427,050	$29,800	9	$0	$0	Si	$132,400
19	CC	1063721640	RUIZ HECTOR	X																	231001	9	$427,050	$68,400	EPS037	9	$427,050	$17,100	CCF16	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$427,050	$29,800	9	$0	$0	Si	$132,400
20	CC	1068656210	RUIZ JOSE																		230201	30	$1,423,500	$227,800	CCFC55	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
21	CC	1063719364	RUIZ YEISON																		230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
22	CC	1073155444	TORRES HERIBERTO																		231001	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
23	CC	72237694	VERGARA JHOJAN																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
Total	Afiliados(23)																						$28,640,750	$4,583,400			$30,064,250	$1,203,500			$30,064,250	$1,203,500			$30,064,250	$2,093,200		$0	$0		$9,083,600

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2025/10/17 07:35 AM

237

240

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901915670	0	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 6 A 64 A58	MONTERIA-CORDOBA	7828082	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	9490278848	9490278848	E	2025/08/20	2025/08/14	BANCO DE BOGOTA	0	$9,083,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				22	$4,583,400	$0	$0	$4,583,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$592,400	$0	$0	$592,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$296,200	$0	$0	$296,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$2,691,400	$0	$0	$2,691,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,003,400	$0	$0	$1,003,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$2,093,200	$0	$0	$2,093,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	23	$2,093,200	$0	$0	$2,093,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$1,203,500	$0	$0	$1,203,500
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	23	$1,203,500	$0	$0	$1,203,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				23	$1,203,500	$0	$0	$1,203,500
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	$171,000	$0	$0	$171,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$148,200	$0	$0	$148,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	$245,100	$0	$0	$245,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$154,100	$0	$0	$154,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$114,000	$0	$0	$114,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$234,100	$0	$0	$234,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$80,000	$0	$0	$80,000
TOTAL				23	$9,083,600	$0	$0	$9,083,600

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

EMAIL: consorcioinfraeducativo002@gmail.com
TELEFONO: +57 313 511 0185
DIRECCIÓN: Cra 6 No. 64A - 58

CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002

ANEXO 6. BITACORA

Dirección: Cra9 #6-36 Ofi202 **Teléfono:**3217764749 **E-Mail:** consorcioinfraeducativo022@gmail.com

Lunes 28 de Julio de 2025

Institución educativa: Marceliano Polo
Municipio de Cereté

Estado del clima: Soleado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Alfajías de A=0,21/E=0,07 en concreto de 17,5MPa (2500 PSI)
- Mesón para entrega de alimentos en concreto de 21 MPa (3000 PSI)
- Levante de muro en bloque semiestructural

Andy Romero.
Residente de obra

Mayelibe Egüez
Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Lunes 28 de Julio de 2025

Institución educativa: Santa Teresita sede General Santander
Municipio de San Pelayo

Estado del clima: Soleado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Alfajías de A=0,21, E=0,07 en concreto de 17,5 MPa (2500 PSI)
- Viga de amarre para entrega de alimentos en concreto de 21 MPa (3000 PSI)
- Levante de muro en bloque semiestructural

Residente de Obra

Residente de interventoría

Norma

Scanned with CamScanner

Lunes 28 de Julio de 2025

Institución educativa: San José de Moñitos sede Principal
Municipio de Moñitos

Estado del clima: Soleado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Alfajías de A=0,21, E=0,07 en concreto de 17,5 MPa (2500 PSI)
- Mesón para entrega de alimentos en concreto de 21 MPa (3000 PSI)
- Levante de muro en bloque semiestructural

Residente de obra

Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Lunes 28 de Julio de 2025

Institución educativa: San José de cunalete.
Municipio de cunalete.

Estado del clima:

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

-Alfajaas en concreto.
- Plantilla en concreto.
- remoción de puntos.

Jaiber Vargas.
Residente de obra

Resident de interventoria

Scanned with CamScanner

Martes 29 de Julio de 2025

Institución educativa: Marceliano Polo
Municipio de Ciereté

Estado del clima: Lluvioso

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Alteajías de A=0,21, E=0,07 en concreto de 17,5 MPa (2500 PSI)
- Mesón para entrega de alimentos en concreto de 21 MPa (3000 PSI)
- Levante en muro en bloque semiestructural

Andy Ospino
Residente de obra

Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Martes 29 de Julio de 2025

Institución educativa: Marco Fidel Suárez
Municipio de Ciénaga de Oro

Estado del clima: Lluvioso

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Alfajías de A=0,21, E=0,07 en concreto de 17,5 MPa (2500 PSI)
- Meson para entrega de alimentos en concreto de 21 MPa (3000 PSI
- Levante de muro en bloque semiestructural

Residente de obra

Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Martes 29 de Julio de 2025

Institución educativa: Santa Teresita sede General Santander
Municipio de San Pelayo

Estado del clima: lluvioso

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Alistajios de A=0,03 , E=0,07 en concreto de 17,5 MPa (2500 PSI)
- Meson para entrega de alimentos en concreto de 21 MPa (3000 PSI)
- Levante de muro en bloque semiestructural

Residente de obra

Residente de interventoria

Scanned with CamScanner

Martes 29 de Julio de 2025

250

Institución educativa: San José de Montes sede Principal
Municipio de Montes

Estado del clima: Soleado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de pantal
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Alfajías de A=0,21, E=0,07 en concreto de 17,5 MPa (2500 PSI)
- Mesón para entrega de alimentos en concreto de 21 MPa (3000 PSI)
- Levante de muro en bloque semiestructural

Nayulibe Eljach

Scanned with CamScanner

Martes 29 de Julio de 2025

Institución educativa: San José de Cuaque.
Municipio de Cuaque.

Estado del clima:

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Remoción de pintura
- estucado de muros.

Luisa Vergara.
Residente de obra

Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Sabado 30 de agosto de 2025

252

Institucion educativa: Pluza bonita
Municipio de Planeta Rica

Estado del clima: soleado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Acero de refuerzo fy = 4.2 MPa Estructural
- Columnas de 0,30 x 0,30 MTS en concreto de 21 MPa (3000 PSI)
- Viga de cimentación de 0,30 x 0,30 MTS en concreto de 21 MPa (3000 PSI)

Ricardo CE
Residente de obra

Jayuliber E. Ojeda
Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Jueves 31 de Julio de 2025

Institución educativa: San José de Moñitos sede principal
Municipio de Moñitos

Estado del clima: Soleado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Pañete impermeabilizado para muros en mortero 1:4
- Relleno del área con material seleccionado computado
- Zapata de 2.00 x 2.00 x 0,35 mts en concreto de 21 MPa

Yuri Cano E.
Residente de obra

Magalis Eljach
Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Jueves 31 de Julio de 2025

259

Institución educativa: San José de Canalete.
Municipio de Canalete.

Estado del clima: Soleado.

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Aseadas de Cubierta.

Residente de obra

Residente de interventoría

Norma

Scanned with CamScanner

Viernes 1 de agosto de 2025

Institución educativa: Marceliano Polo
Municipio de Cereté

Estado del Clima: Lluvioso

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Columna de 0,40 x 0,40 MTS en concreto de 21 MPa
- Placa en concreto de 2.00 m x 2.000 x 0,17 MTS de 3000 PSI
- Acero de refuerzo fy = 420 MPa para columna

Rudy Agamez
Residente de obra

Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Viernes 1 de agosto de 2025

Institución educativa: Marco Fidel Suarez
Municipio de Ciénaga de Oro

Estado del clima: lluvioso

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Columna de 0,40x0,40 MTS en concreto de 21 MPa
- Placas en concreto de 2.00 x 2.00 x 0,17 MTS de 3000 PSI
- Acero de refuerzo fy = 420 MPa para columnas

Residente de Obra

Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Viernes 1 de agosto de 2025

254

Institución educativa: Santa Teresita sede General Santander
Municipio de San Pelayo

Estado del Clima: Lluvioso

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibrador de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Columna de 0,40 x 0,40 Mts en concreto de 21 MPa
- Placa en concreto de 2.00 x 2.00 x 0,17 Mts de 3000 PSI
- Acero de refuerzo fy = 420 MPa para columna

Junior Vergara.
Residente de obra

Manuelita Eljach
Residente de interventoría

Norma

Scanned with CamScanner

Viernes 1 de agosto de 2025

Institución educativa: San José de Montes sede Principal
Municipio de Montes

Estado del clima: Soleado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Columnas de 0,40 x 0,40 MTS en concreto de 21 MPa
- Placa en concreto de 2,00 x 2,00 x 0,17 MTS de 3000 PSI
- Acero de refuerzo fy = 420 MPa para columnas

Residente de obra

Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Sábado 2 de agosto de 2025

254

Institución educativa: Marceliano Polo
Municipio de Ceretá

Estado del Clima: Soleado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Columna de 0.40 x 0.40 MTS en concreto de 21MPa
- Placa en concreto de 2.00 x 2.00 x 0,17 MTS de 3000 PSI
- Acero de refuerzo $f_y = 420$ MPa para la columna

Andy Agamez
Residente de obra

Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Sábado 2 de agosto de 2025

Institución educativa: Marco Fidel Suarez
Municipio de Ciénaga de Oro

Estado del clima: Soleado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Columnas de 0,40 x 0,40 MTS. en concreto de 21 MPa
- Placa en concreto de 2,00 x 2,00 x 0,17 MTS de 3000 PSI
- Acero de refuerzo fy = 4120 MPa para columnas

Residente de obra

Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Sábado 2 de agosto de 2025

Institución educativa: Santa Teresita Sede General Santander
Municipio de San Pelayo

Estado del clima: Soleado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Ranas compactadoras
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Columnas de 0,40 x 0,40 mts en concreto de 21 MPa
- Placa en concreto de 2.00 x 2.00 x 0,17 MTS de 3000 PSI
- Acero de refuerzo f_y = 420 MPa para columnas

Residente de obra

Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Sábado 2 de agosto 2025

Institución educativa: San José de Moñitos sede Principal
Municipio de Moñitos

Estado del clima: Lluvioso

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Columna de 0,40 x 0,40 MTS en Concreto de 21 MPa
- Placa en concreto de 2.00 x 2.00 x 0,17 MTS de 3000 PSI
- Acero de refuerzo fy = 420 MPa para columna

Julian Vergara
Residente de obra

Yaquelin Eljach
Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Lunes 4 de agosto de 2025

Institución educativa: Marcelrano Polo
Municipio de Caneté

Estado del clima: Nublado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Tanque elevado de 2000L Plástico
-

Residente de obra

Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Lunes 4 de agosto de 2025

Institución educativa: Marco Fidel Suarez
Municipio de Ciénaga de Oro

Estado del clima: Nublado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudanta

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Tanque elevado de 2000 L Plástico

Residente de obra

Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Lunes 4 de agosto de 2025

Institución educativa: Marco Fidel Suarez
Municipio de Ciénaga de Oro

Estado del clima: Nublado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudanta

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Tanque elevado de 2000 L Plástico

Residente de obra

Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Lunes 4 de agosto de 2025

Institución educativa: Santa Teresita sede General Santander
Municipio de San Pelayo

Estado del clima: Nublado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades efectuadas

- Tanque elevado de 2000 L Plástico

Residente de obra

Residente de interventoría

Norma
Scanned with CamScanner

Lunes 4 de agosto de 2025

267

Institución educativa ; San José de Moñitos sede principal
Municipio de Moñitos

Estado del clima : Nublado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Tanque elevado de 2000 L Plástico

Jhon Vergara.
Residente de obra

Yazulibet Eljach
Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Lunes 4 de agosto de 2023

Institución educativa i Junín
Municipio de Tierralta

Estado del clima: lluvioso

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Localización, trazado y replanteo
- Adecuación y nivelación de terreno
- S/I cerramiento provisional en tique color verde

Ricardo C E.
Residente de obra

Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Martes 5 de agosto de 2025

269

Institución educativa : Junín
Municipio de Tierralta

Estado del clima : Lluvioso

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Localización, trazado y replanteo
- Adecuación y nivelación de terreno
- S/I cerramiento provisional en fique color verde

Ricardo CE
Residente de obra

Yazulith Elvira
Residente de interventoría

Norma

Scanned with CamScanner

Miércoles 6 de agosto de 2025

210

Institución educativa: Junín
Municipio de Tierralta

Estado del clima: Soleado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Excavación manual para zapatas de 1.00 x 1.00 MTS
- Reemplazo o mejoramiento del terreno debajo de zapatas en piedra rajón
- Cargue y retiro de material sobrante

Ricardo GG.
Residente de obra

Yayalibe Edjadi
Residente de interventoría

Norma

Scanned with CamScanner

Jueves 7 de agosto de 2025

Institución educativa: Junin
Municipio de Tierralta

Estado del clima: lluvioso

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Excavación manual para zapata de 1.00 x 1.00 MTS
- Reemplazo o mejoramiento de terreno debajo de zapatas en piedra rajón
- Cargue y retiro de material sobrante

Ricardo BE.
Residente de obra

Mayelis Eljach
Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Viernes 8 de agosto de 2025

742

Institución educativa : Junín
Municipio de Tierralta

Estado del clima : lluvioso

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Solado en concreto e=0,05 MTS de 14 MPa (2000 PSI)
- Acero de refuerzo fy= 4,2 MPa cimentación

Ricardo G.
Residente de obra

Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Sábado 9 de agosto de 2025

Institución educativa : Junín
Municipio de Tierralta

Estado del clima : Soleado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Solado en concreto e = 0,05 mts de 14 MPa (2000 PSI)
- Acero de refuerzo fy = 4,2 MPa cimentación

Residente de obra

Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Lunes 11 de agosto de 2025

Institución educativa: Marceliano Polo
Municipio de Ceretè

Estado del clima: lluvioso

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Estuco Plástico para muros
- Pintura en vinilo tipo 1 para muros (A 3 manos)

Audy Agamez
Residente de obra

Nayelibe Eljach
Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Lunes 11 de agosto de 2025.

Institución educativa: Manco Fidel Suárez
Municipio de Ciénaga de Oro

Estado del clima: Lluvioso

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Estuco Plástico para muros
- Pintura en Vinilo tipo 1 para muros (A 3 manos)

Residente de obra

Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Lunes 11 de agosto de 2025

Institución educativa: Santa Teresita sede General Santander
Municipio de San Pelayo

Estado del clima: Lluvioso

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Estuco plástico para muros
- Pintura en vinilo tipo 1 para muros (A3 manos)

Residente de obra

Residente de interventoría

Lunes 11 de agosto de 2025

Institución educativa: Santa Josefa de moñitos sede principal
Municipio de Moñitos

Estado del clima: lluvioso

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Estuco plástico para muros
- Pintura en vinilo tipo 1 para muros (A 3 manos)

Residente de obra

Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

82

Jueves 17 de agosto de 2023

248

Institución educativa : Junín
Municipio de Tierralta

Estado del clima : lluvioso

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramental menor

Actividades ejecutadas

- Acero de refuerzo $f_y = 4{,}2$ MPa cimentación
- Zapatas de 1.00 x 1.00 x 0.30 MTS en concreto de 21 MPa (3000 PSI

Ricardo CE.
Residente de obra

Yuyolibe Egüez
Residente de interventoría

Norma

Scanned with CamScanner

Martes 12 de agosto de 2025

279

Institución educativa: Marceliano Polo
Municipio de Cereté

Estado del clima: Soleado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Estuco plástico para muros
- Pintura en vinilo tipo 1 para muros - (A3 muros)

Andy Tejeda
Residente de obra

Magalis Eljach
Residente de interventoría

Norma

Scanned with CamScanner

Martes 12 de agosto de 2025

Institución educativa: Marco Fidel Suarez
Municipio de Ciénaga de Oro

Estado del clima: Soleado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Estuco plástico para muros
- pintura en vinilo tipo 1 para muros (A 3 manos)

Residente de obra

Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Martes 12 de agosto de 2025

Institución educativa: Santa Teresita sede General Santander
Municipio de San Pelayo

281

Estado del clima: soleado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Ropa compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Estuco plástico para muro
- pintura en vinilo tipo 1 para muro (A 3 manos)

Residente de obra

Nayaliber Estrada
Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Martes, 12 de agosto de 2025

Institución educativa: San José de Moñitos sede principal
Municipio de Moñitos

Estado del clima: Soleado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Estuco plástico para muros
- pintura en vinilo tipo 1 para muros (A 3 manos)

Luchos Vergara.
Residente de obra

Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Martes 12 de agosto de 2025

283

Institución educativa : Jurin
Municipio de Tierralta

Estado del clima : Lluvioso

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Acero de refuerzo fy = 412 MPa cimentación
- Zapatas de 1.00 x 1.00 x 0.30 Mts en concreto de 21 MPa (3000 PSI)

Ricardo GE
Residente de obra

Nayalibe E Gioch
Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Miércoles 13 de agosto de 2025

281

Institución educativa : Marcoliano Polo
Municipio de Cereté

Estado del clima : Soleado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Estuco plástico para muros
- Pintura en vinilo tipo 1 para muros (A 3 manos)

Andy Agamez
Residente de obra

Yaqueline Eljach
Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Miércoles 13 de agosto de 2025

Institución educativa: Marco Fidel Suarez
Municipio de Ciénaga de oro

Estado del clima: Soleado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de pontal
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Estuco plastico para muros
- Pintura en vinilo tipo 1 para muros (A 3 manos)

Residente de obra

Residente de interventoria

Scanned with CamScanner

Miercoles 13 de agosto de 2025

Institución educativa : Santa Teresita sede General Santander
Municipio de San Pelayo

Estado del clima: Soleado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Ronca compactadora
- Vibro de punto
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Estuco plástico para muros
- Pintura en vinilo tipo 1 para muros (A 3 manos)

Residente de obra

Residente de interventoria

Scanned with CamScanner

Miércoles 13 de agosto de 2025

Institución educativa: San José de Moñitos sede principal (Municipio de Moñitos)

Estado del clima: Soleado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Estuco plástico para muros
- Pintura en vinilo tipo 1 para muros (A 3 manos)

Julian Vergara
Residente de obra

Yuyulibeth Eljach
Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Miércoles 13 de agosto de 2023

Institución educativa: Jonin
Municipio de Tierralta

Estado del clima: soleado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Acero de refuerzo $fy = 4,2$ MPa cimentación
- Zapata de 1.00 x 1.00 x 0.30 MTS en concreto de 21 MPa (3000 PSI)

Ricardo CE
Residente de obra

Yuyubeth Eljach
Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Jueves 14 de agosto de 2025

Institución educativa: Marceliano Polo
Municipio de Cereté

Estado del clima: Soleado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Estuco plástico para muros
- Pintura en vinilo tipo I para muros (A 3 manos)

Andy Ogamer
Residente de Obra

Yuyulila Eljach
Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Jueves 14 de agosto de 2025

Institución educativa: Marco Fidel Suarez
Municipio de Ciénaga de oro

Estado del clima: Soleado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- vibro de pantu
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Estuco plastico para muros
- Pintura en vinilo tipo I para muros (A 3 manos)

Residente de obra

Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Jueves 14 de agosto de 2025

Institución educativa : Santa Teresita sede General Santander
Municipio de San Pelayo

Estado del Clima : soleado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Estuco plástico para muros
- Pintura en vinilo tipo I para muros (A 3 manos)

Residente de Obra

Residente de interventoria

Scanned with CamScanner

Jueves 14 de agosto de 2025

Institución educativa: San José de moñitos sede principal
Municipio de Moñitos

Estado del clima: lluvioso

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Estuco plástico para muros
- Pintura en vinilo tipo 1 para muros (A 3 manos)

Author Vergara.
Residente de obra

Yajulibe Eljach
Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Jueves 14 de agosto de 2025

Institución educativa: Jurin
Municipio de Tierralta

Estado del Clima: Soleado

Personal de obra

- Residente de Obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

= Acero de refuerzo fy = 4,2 MPa Estructural
- Viga de cimentación de 0,30 x 0,30 MTS en concreto de 21 MPa (3000 PSI)

Ricardo CE.
Residente de obra

Mayerlis Eljach
Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Viernes 15 de agosto de 2025

Institución educativa: Marceliano Polo
Municipio de Cereté

Estado del clima: Lluvioso

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Roca compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Estuco plástico para muros
- Pintura en vinilo tipo 1 para muros (A 3 manos)

Andy Agamez
Residente de obra

Mayulides Ujiadi
Residente de interventoría

Norma

Scanned with CamScanner

Viernes 15 de agosto de 2025

Institución educativa: Marco Fidel Suarez
Municipio de Ciénaga de Oro

Estado del clima: lluvioso

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Estuco plástico para muros
- Pintura en vinilo tipo 1 para muros (A 3 manos)

Residente de obra

Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Viernes 15 de agosto de 2023

Institución educativa: Santa Teresita sede General Santander
Municipio de San Pelayo

Estado del Clima: lluvioso

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Estuco plástico para muros
- Pintura en vinilo tipo 1 para muros (A 3 manos)

Residente de obra

Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Viernes 15 de agosto de 2025

Institución educativa: San José de Muñitos sede principal
Municipio de Muñitos

Estado del clima: lluvioso

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Libra de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Estuco plástico para muros
- Pintura en vinilo tipo 1 para muros (A 3 manos)

Julian Vergara
Residente de obra

Yazmin Eljach
Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Viernes 18 de agosto de 2023

Institución educativa: Junin
Municipio de Tierralta

Estado del clima: lluvioso

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Acero de refuerzo $fy = 4,2$ MPa Estructural
- Viga de cimentación de 0,30 x 0,30 Mts en concreto de 21 MPa (3000 PSI)

Ricardo CE.
Residente de obra

Residente de interventoria

Scanned with CamScanner

Sábado 16 de agosto de 2025

209

Institución educativa : Marceliano Polo
Municipio de Ceretè

Estado del clima : lluvioso

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Estuco plástico para muros
- Pintura en vinilo tipo I para muros (A 3 manos)

Brady Agamez
Residente de obra

Magalis Espinoza
Residente de interventoria

Scanned with CamScanner

Sábado 16 de agosto de 2025

300

Institución educativa: Mario Fidel Suárez
Municipio de Ciénaga de Oro

Estado del clima: lluvioso

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Estuco plástico para muros
- pintura en vinilo tipo 1 para muros (A 3 manos)

Residente de obra

Nayolis Eljach
Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

301

Sábado 16 de agosto de 2025

Institución educativa: Santa Teresita sede General Santander
Municipio de ~~Cienaga~~ San Pelayo

Estado del clima: Lluvioso

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Estuco plástico para muros
- Pintura en vinilo tipo 1 para muros (A 3 manos)

Residente de obra

Residente de interventoria

Scanned with CamScanner

Sábado 16 de agosto de 2025

302

Institución educativa : San José de Muñitas sede Principal
Municipio de Muñito

Estado del clima : Soleado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Estuco plástico para muros.
- pintura en vinilo tipo 1 para muros (A 3 manos)

Julian Vergara.
Residente de obra

Nayelith Eljach
Residente de interventoria

Scanned with CamScanner

Sábado 16 de agosto de 2025

393

Institución educativa: Jonin
Municipio de Tierralta

Estado del clima: lluvioso

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividad ejecutada

- Acero de refuerzo fy = 412 MPa Estructural
- Viga de cimentación de 0,30 x 0,30 MTL en concreto de 21 MPa (3000 PSI)

Ricardo C E.
Residente de obra

Yaqueline Espinosa
Residente de interventoría

Norma
Scanned with CamScanner

331

ANEXO 7. INFORME PGIO

CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002

INFORME DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SI-LP-002-2024

PROYECTO

"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

Tabla de contenido

1. **INTRODUCCIÓN** 3
2. **OBJETIVOS** 4
2.1. OBJETIVO GENERAL 4
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 4
3. **ALCANCE DEL INFORME** 4
4. **JUSTIFICACIÓN** 5
5. **GENERALIDADES DEL PROYECTO** 5
5.1. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 5
5.1.1. LOCALIZACIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO 6
5.1.2. PLANTA DE PERSONAL 7
5.1.3. ORGANIGRAMA 7
5.2. ACTIVIDADES GENERALES CONSTRUCTIVAS PARA EL PROYECTO 8
6. **PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** 9
6.1. DESIGNACIÓN RESPONSABLE SG-SST 9
6.2. AFILIACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 9
6.3. PAGO APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 9
6.4. EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES 9
6.5. INDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 10
6.6. NOTIFICACIÓN DE EXPOSICIÓN A RIESGOS 10
6.7. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN 10
6.8. REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y/O INCIDENTES DE TRABAJO 11
6.9. INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO 12
6.10. AUSENTISMO 13
6.11. CAPACITACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 13
6.12. INSPECCIONES DE SEGURIDAD 14
6.13. PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 18
7. **PLAN DE MANEJO AMBIENTAL** 18
7.1. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL AL PERSONAL DE OBRA 18
7.2. MANEJO DE MATERIALES 19
7.3. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 19
7.3.1. ORDEN Y ASEO *19*
7.4. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES 19
7.4.1. UNIDADES SANITARIAS *21*
7.5. MANEJO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO 21
7.6. ESTABLECIMIENTO DE PUNTO DE HIDRATACIÓN 22
7.7. PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE 22
8. **CONCLUSIONES** 22
9. **ANEXOS** 23

1. INTRODUCCIÓN

El Plan de Gestión Integral de Obra (PGIO) constituye una herramienta fundamental para la planificación y ejecución eficiente de proyectos de construcción. El presente informe tiene como propósito presentar los resultados del diseño e implementación del PGIO presentado por el contratista **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002**, en el marco del proyecto cuyo objeto es **"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"**.

La implementación del PGIO en este contrato de obra tiene como objetivos principales: asegurar el cumplimiento de las metas del proyecto, mitigar los impactos ambientales, y garantizar la conformidad con la normativa legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, se busca cumplir con los estándares de calidad necesarios para la supervisión y control efectivo de las actividades programadas.

El presente Informe Mensual **No. 5** describe los resultados alcanzados, las actividades ejecutadas y los controles aplicados durante el periodo comprendido entre el **17 de julio y el 16 de agosto de 2025.**

En conclusión, este informe refleja un esfuerzo articulado orientado a lograr una gestión integral de la obra, cumplir con los objetivos establecidos y los más altos estándares de calidad y seguridad, y reducir al mínimo los impactos adversos sobre el ambiente.

308

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Ejecutar las actividades planificadas o programadas en el Plan de Gestión Integral de Obra, para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos negativos y promover los impactos positivos asociados a la ejecución del proyecto cuyo objeto es **"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"**.

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Propender que durante la ejecución del proyecto se ejecuten las actividades planeadas del SG-SST.
- Presentar la ejecución de los controles establecidos en la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, en el desarrollo de las diferentes actividades ejecutas en el cumplimiento del proyecto.
- Identificar y controlar los aspectos e impactos ambientales que se pueden generar en el desarrollo de las diferentes actividades dentro del proyecto.
- Capacitar al personal vinculado al proyecto en materia ambiental y seguridad de acuerdo con el avance de obra.

3. ALCANCE DEL INFORME

El presente informe, en el marco del Sistema Integral de Gestión, dentro de su alcance tiene en cuenta la legislación aplicable al proyecto, los requisitos técnicos como especificaciones generales y específicas, las normas técnicas aplicables, así como las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo. El informe contempla todas las actividades ejecutadas en las diferentes etapas del proyecto e incluye todos los procedimientos, instructivos, registros, metodologías y controles necesarios para el correcto desarrollo de este, así como las medidas de manejo, prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales que puedan generarse en las actividades de obra del proyecto.

4. JUSTIFICACIÓN

A partir de la suscripción del **CONTRATO DE OBRA No. SI-LP-002-2024** celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA** y el **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002**, se da inicio a la ejecución del proyecto cuyo objeto es **"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"** a través de la realización de las actividades programadas aplicables al proyecto, con el fin de proteger y garantizar el uso adecuado de los recursos que permitan minimizar los riesgos para la ocurrencia de accidentes de trabajo, impactos negativos al medio ambiente, y el incumplimiento de la programación de obra.

5. GENERALIDADES DEL PROYECTO

5.1. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Se describe a continuación la información general del **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002** asociada con el proyecto **"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".**

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002
NIT	901915670-0
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No:	SI-LP-002-2024
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"
INTERVENTOR:	ANTICA SAS BIC
PLAZO:	OCHO (8) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($4.135.134.915,00)

Tabla. Descripción contrato de obra

30

5.1.1. LOCALIZACIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO

El área de influencia del proyecto se ubica en diez diferentes municipios del departamento de Córdoba descritos a continuación:

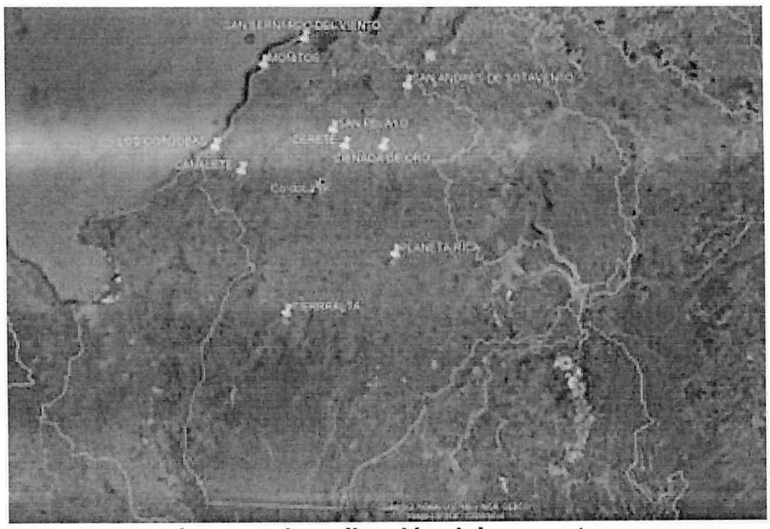


Imagen. Localización del proyecto

1. **INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCELIANO POLO - CERETÉ**
2. **INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESITA SEDE GENERAL SANTANDER - SAN PELAYO**
3. **INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ - CIÉNAGA DE ORO**
4. **INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE MOÑITOS SEDE PRINCIPAL - MOÑITOS**
5. **INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUNÍN - TIERRALTA**
6. **INSTITUCIÓN EDUCATIVA PLAZA BONITA - PLANETA RICA**
7. **INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CASTILLO - SAN BERNARDO DEL VIENTO**
8. **INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE CANALETE - CANALETE**
9. **INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN SIMÓN SEDE SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS - SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO**
10. **INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ÉBANO - LOS CÓRDOBAS**

B4


5.1.2. PLANTA DE PERSONAL

Planta de Personal que cumple con los pliegos:

CARGO	NOMBRE Y APELLIDO
DIRECTOR DE OBRA	BEJARANO FERNANDEZ KAMAL AUGUSTO
RESIDENTE DE OBRA I	AGAMEZ GENEY ANDY MIGUEL
RESIDENTE DE OBRA II	ALVAREZ ORTEGA JOSE CARLOS
RESIDENTE DE OBRA III	CASTRO ESCOBAR RICARDO JAVIER
INGENIERO ELÉCTRICO	RAMIREZ LIBREROS HECTOR
INGENIERO SANITARIO Y AMBEINTAL	CORRALES MARTINEZ SHARON MELISA

5.1.3. ORGANIGRAMA

La estructura organizacional del **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002** se presenta a continuación:

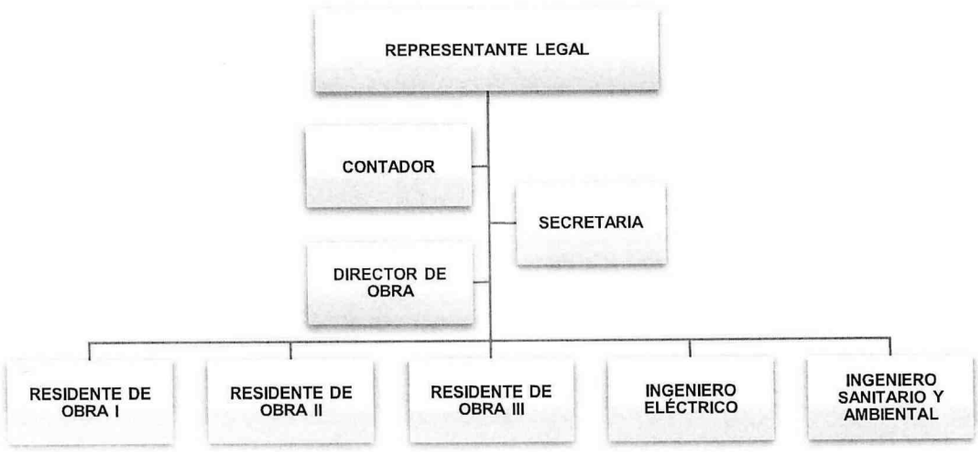

5.2. ACTIVIDADES GENERALES CONSTRUCTIVAS PARA EL PROYECTO

A continuación, se relacionan las actividades constructivas a ejecutar durante el desarrollo del proyecto:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	UBICACIÓN	INTERVENCIONES A REALIZAR
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCELIANO POLO	**CERETÉ**	CONSTRUCCIÓN COMEDOR ESCOLAR.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESITA SEDE GENERAL SANTANDER	**SAN PELAYO**	CONSTRUCCIÓN COMEDOR ESCOLAR.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ	**CIÉNAGA DE ORO**	CONSTRUCCIÓN COMEDOR ESCOLAR.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE MOÑITOS SEDE PRINCIPAL	**MOÑITOS**	CONSTRUCCIÓN COMEDOR ESCOLAR.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUNÍN	**TIERRALTA**	CONSTRUCCIÓN COMEDOR ESCOLAR.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PLAZA BONITA	**PLANETA RICA**	CONSTRUCCIÓN COMEDOR ESCOLAR.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CASTILLO	**SAN BERNARDO DEL VIENTO**	ADECUACIÓN COMEDOR ESCOLAR (CUBIERTAS, PINTURAS Y RESANES, RESANES DE MUROS, PISOS, OTROS.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE CANALETE	**CANALETE**	ADECUACIÓN COMEDOR ESCOLAR (CUBIERTAS, PINTURAS Y RESANES, RESANES DE MUROS, PISOS, OTROS.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN SIMÓN SEDE SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	**SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO**	ADECUACIÓN COMEDOR ESCOLAR (CUBIERTAS, PINTURAS Y RESANES, RESANES DE MUROS, PISOS, OTROS.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ÉBANO	**LOS CÓRDOBAS**	ADECUACIÓN COMEDOR ESCOLAR (CUBIERTAS, PINTURAS Y RESANES, RESANES DE MUROS, PISOS, OTROS.

SB

6. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se desarrollan las actividades del plan de gestión de seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta los riesgos, el plazo contractual, los recursos financieros, humanos y físicos.

A continuación, se detallan las actividades ejecutadas desde cada uno de los programas anexos al Plan SST.

6.1. DESIGNACIÓN RESPONSABLE SG-SST

Se realizó la designación del responsable de diseñar y ejecutar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST; dando cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019. **Anexo *ACTA DESIGNACIÓN RESPONSABLE SG-SST* presentado en PGIO.**

6.2. AFILIACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se realizó la afiliación de cada trabajador a ARL, EPS, fondo de pensiones (AFP), y caja de compensación.

ANEXO NO. 1 AFILIACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

6.3. PAGO APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se realiza el pago de seguridad social de acuerdo con la fecha límite correspondiente al mes de presentación del presente informe.

ANEXO NO. 2 PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

6.4. EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES

Se realizan los exámenes médicos ocupacionales de ingreso a todo trabajador cada vez que se presenta inicio de relación laboral.

ANEXO NO. 3 EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES

6.5. INDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se realiza proceso de inducción de Seguridad y Salud en el Trabajo a los trabajadores de obra al momento de ingresar, en el que se socializa el programa de SST y, se establecen los compromisos y responsabilidades de estos al momento de ejecutar las distintas tareas asignadas.

ANEXO NO. 4 INDUCCIÓN DE SST

6.6. NOTIFICACIÓN DE EXPOSICIÓN A RIESGOS

Se realiza notificación de los riesgos a los que se encuentran expuestos a cada uno de los trabajadores nuevos vinculados al proyecto.

ANEXO NO. 5 NOTIFICACIÓN DE EXPOSICIÓN A RIESGOS

6.7. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Se realiza la entrega y/o reposición de Elementos de Protección Personal (EPP) y dotación a todo el personal, el cual se supervisa y capacita sobre el uso adecuado de estos y la obligación de portarlos durante toda la jornada laboral.

La entrega de EPP y dotación se realiza al momento de ingresar un trabajador y en los casos que se requiera reposición de estos por daños o desgaste.

La entrega de EPP y dotación se realiza de acuerdo con la exposición identificada en la Matriz de EPP.

ANEXO NO. 6 ACTA ENTREGA DE EPP Y/O DOTACIÓN

315

Registro Fotográfico – Entrega EPP y/o Dotación



6.8. REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y/O INCIDENTES DE TRABAJO

Durante el periodo no se presentaron accidentes y/o incidentes de trabajo.

REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO POR PERIODO	
PERIODO	**No DE ACCIDENTES**
MAR-ABR	0
ABR-MAY	0
MAY-JUN	0
JUN-JUL	0
JUL-AGO	0
TOTAL	**0**


316

6.9. INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO

Se registran por periodo los indicadores de accidentalidad y ausentismo durante la etapa de ejecución del proyecto. La medición de estos se ilustra a continuación:


CONSORCIO	INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO											
NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	FÓRMULA	INTERPRETACIÓN	PERIODICIDAD	RESULTADOS								
					MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
Frecuencia de accidentalidad	Número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes.	$\frac{\text{Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes}}{\text{Número de trabajadores en el mes}} \times 100$	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se presentaron X accidentes de trabajo.	MENSUAL	0	0	0	0	0				
Severidad de accidentalidad	Número de días perdidos por accidentes de trabajo en el mes.	$\frac{\text{No. de días de incapacidad por Accidente de Trabajo en el mes + número de días cargados en el mes}}{\text{Número de trabajadores en el mes}} \times 100$	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron X días por accidente de trabajo.	MENSUAL	0	0	0	0	0				
Ausentismo por causa médica	Ausentismo es la no asistencia al trabajo, con incapacidad médica.	$\frac{\text{Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes}}{\text{Número de días programados en el mes}} \times 100$	En el mes se perdió X% de días programados de trabajo por incapacidad médica.	MENSUAL	0%	0%	0%	0%	0%				
Prevalencia de la enfermedad laboral	Número de casos de enfermedad laboral presentes en una población en un periodo de tiempo.	$\frac{\text{No. de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo Z}}{\text{Promedio de trabajadores en el periodo Z}} \times 100.000$	Por cada 100.000 trabajadores existen X casos de enfermedad laboral en el periodo Z.	ANUAL	0	0	0	0	0				
Incidencia de la enfermedad laboral	Número de casos nuevos de enfermedad laboral en una población determinada en un periodo de tiempo.	$\frac{\text{No. de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo Z}}{\text{Promedio de trabajadores en el periodo Z}} \times 100.000$	Por cada 100.000 trabajadores existen X casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo Z.	ANUAL	0	0	0	0	0				
Proporción de accidentes de trabajo mortales	Número de accidentes de trabajo mortales en el año	$\frac{\text{No. De Accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año}}{\text{Total de Accidentes del Trabajo que se presentaron en el año}} \times 100$	En el año, el X% de accidentes de trabajo fueron mortales.	ANUAL	0%	0%	0%	0%	0%				

GRÁFICOS DE RESULTADOS DE INDICADORES DE FRECUENCIA, SEVERIDAD Y AUSENTISMO POR PERIODO.

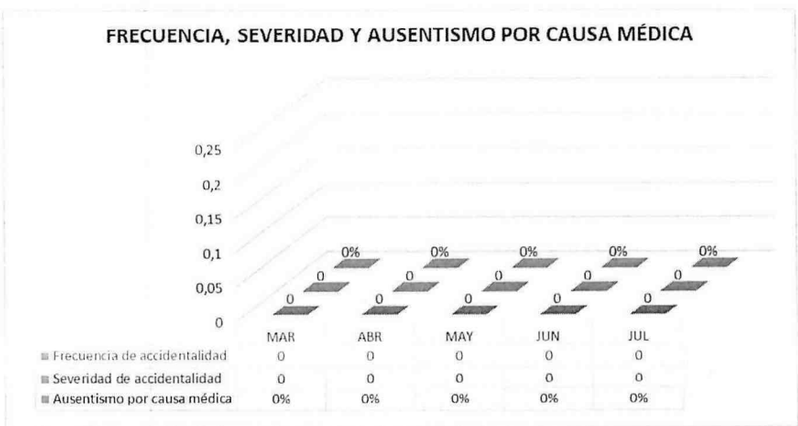

3p

GRÁFICOS DE RESULTADOS DE INDICADORES DE PREVALENCIA, INCIDENCIA Y PORPORCIÓN DE AT MORTALES.

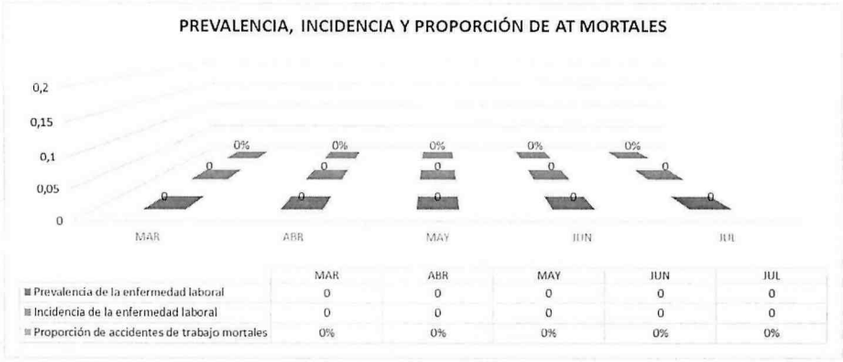

	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL
Prevalencia de la enfermedad laboral	0	0	0	0	0
Incidencia de la enfermedad laboral	0	0	0	0	0
Proporción de accidentes de trabajo mortales	0%	0%	0%	0%	0%

6.10. AUSENTISMO

Durante el periodo no se presentaron ausentismos del personal por enfermedad general o laboral, permisos, y/o sin justa causa.

6.11. CAPACITACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Durante el periodo se realizó capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo al personal vinculado al proyecto.

ANEXO NO. 7 CAPACITACIÓN SST

Registro fotográfico – Capacitación SST



314


6.12. INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Durante el periodo se realizaron inspecciones de seguridad relacionadas a continuación:


- Elementos de Protección Personal
- Orden y Aseo
- Camilla
- Extintor
- Botiquín
- Herramientas y Equipos

ANEXO NO. 8 INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Registro fotográfico – Inspecciones de Seguridad

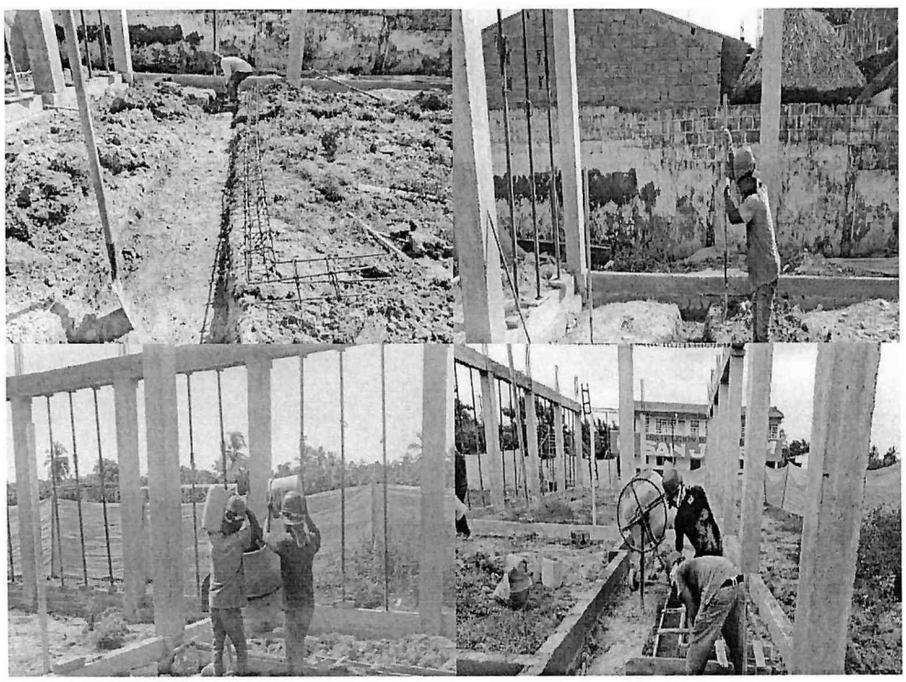

314

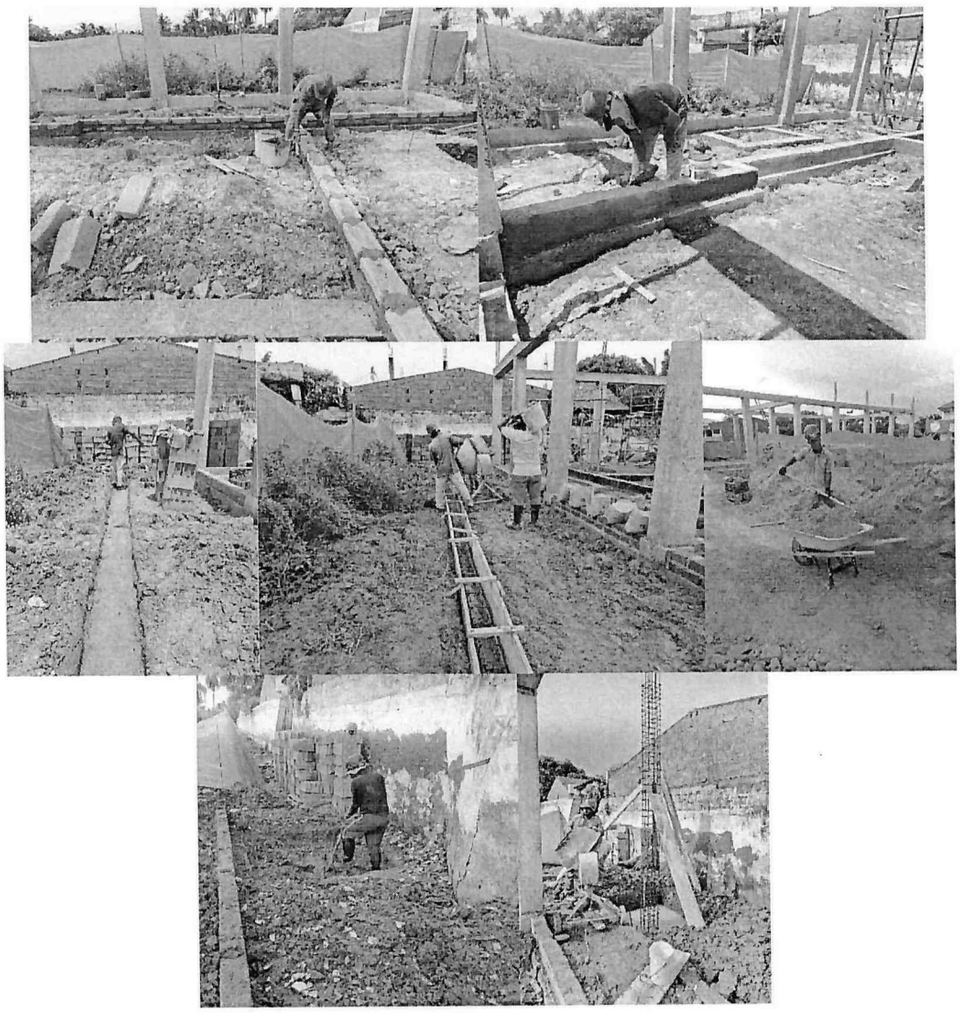

320



Se evidencia el cumplimiento por el buen estado de los elementos de emergencias. Los extintores multipropósito se encuentran con su mantenimiento al día; los botiquines cuentan con los elementos necesarios; y la camilla permanece instalada en un lugar visible con fácil acceso para su uso en caso de requerirse.

321

Registro fotográfico – Cerramiento Perimetral


CANALETE:



MOÑITOS:



SAN PELAYO:

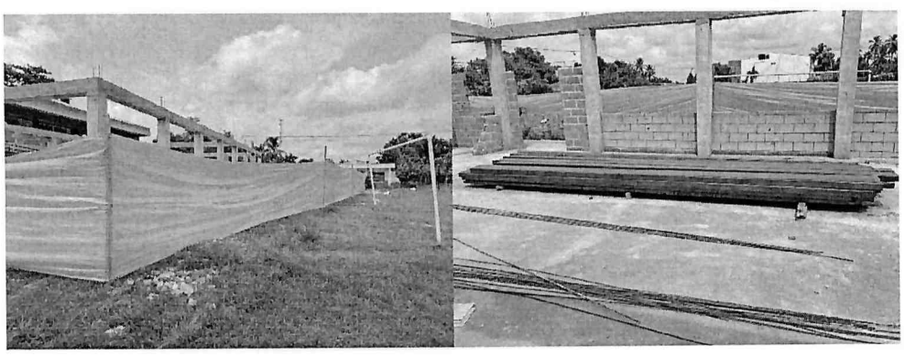

322

Se cuenta con lona verde instalada en todo el perímetro de las áreas de trabajo en los frentes activos, con el objetivo de delimitar la zona de intervención y restringir el acceso a personal no autorizado, garantizando así la seguridad durante la ejecución de las actividades.

6.13. PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Se realizó conformación de brigada de emergencia para la atención de posibles eventos que se puedan presentar durante la ejecución del proyecto. Con el objetivo de salvaguardar la integridad de los trabajadores, los bienes y recursos materiales, se dispone de un plan de emergencias, el cual establece la secuencia de las acciones a desarrollar para el control inicial de las emergencias que se puedan presentar durante la ejecución del proyecto. Así mismo se cuenta con recursos básicos para prestar primeros auxilios (Botiquín, extintor tipo ABC multipropósito para control de conatos de incendios, camilla para inmovilización y traslado de heridos); elementos indispensables para manejo de emergencia y primera atención básica a víctimas de un accidente. **Anexo. ACTA CONFORMACIÓN BRIGADA PRESENTADA EN INFORME No. 1.**

7. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

En el marco del Plan de Manejo Ambiental (PMA), se definen y relacionan las medidas de manejo ambiental a implementar para la prevención, mitigación, corrección y/o compensación de los impactos negativos generados por la intervención del proyecto. Estas medidas están organizadas por programas ambientales, permitiendo una gestión integral, específica y coherente con los objetivos de sostenibilidad del proyecto.

A continuación, se detallan las actividades ejecutadas desde cada uno de los programas anexos al Plan de Manejo Ambiental (PMA).

7.1. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL AL PERSONAL DE OBRA

Durante el periodo se realizó capacitación del Plan de Manejo Ambiental al personal vinculado al proyecto.

323

ANEXO NO. 9 CAPACITACIÓN AMBIENTAL

7.2. MANEJO DE MATERIALES

Los materiales de construcción como arena y piedra china se disponen en los sitios establecidos para acopio de material, los cuales se delimitan con cinta de seguridad para su posterior uso.

El acero y demás materiales se acopian en obra dentro de los cerramientos instalados.

7.3. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Se implementó el programa de manejo y disposición final de residuos sólidos generados en las diferentes actividades del proyecto acorde a lo definido en el Plan de Manejo Ambiental.

Durante el periodo se disponen los puntos ecológicos para la clasificación y almacenamiento temporal de residuos sólidos. Se realiza la disposición final en punto de acopio para que operador de servicios públicos domiciliarios haga la recolección y transporte.

7.3.1. ORDEN Y ASEO

Con el fin de mantener las condiciones óptimas de orden y aseo dentro de las áreas de intervención del proyecto, se realizó la designación de un trabajador por frente encargado de las labores de orden y aseo, asegurando que todas las zonas de trabajo permanezcan libres de residuos, adecuadamente organizadas, y de mantener el cerramiento en correcto estado.

7.4. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES

Se cuenta con campamento ubicado al frente del sitio de obra, en el cual se dispuso de espacios para bodega de almacenamiento de materiales.

El cemento en sacos se almacena sobre estibas de madera para aislar del suelo y son recubiertos con lona plástica para evitar la humedad.


319

Registro Fotográfico – Instalaciones de Campamentos de Obra

CERETÉ:



CIÉNAGA DE ORO:

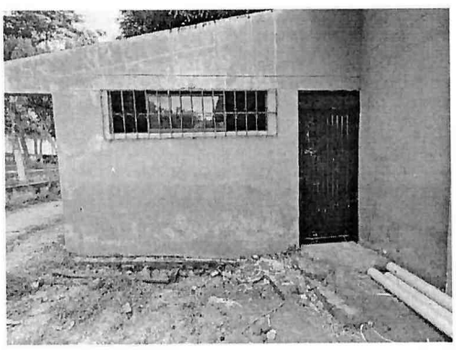


SAN PELAYO:



320

315

CANALETE:

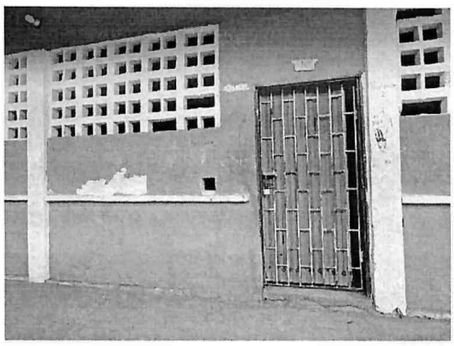

7.4.1. UNIDADES SANITARIAS

Se dispone de baños en el campamento de obra y en los diferentes frentes de obra se realizaron acuerdos con la comunidad aledaña, garantizando así, que el personal realice sus necesidades fisiológicas durante la jornada laboral.

7.5. MANEJO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO

Para controlar las emisiones atmosféricas, material particulado y demás que pueden generarse con el desarrollo de algunas actividades contenidas en el proyecto, se implementan los siguientes controles:


- Las volquetas que transportan material operan en horarios adecuados 7:00 a.m. – 5:00 p.m.
- Los materiales que generan material particulado son cubiertos con plásticos para el transporte a obra.
- La velocidad de las volquetas no supera los 30 km/h.
- No se realizan quemas a cielo abierto.

326

7.6. ESTABLECIMIENTO DE PUNTO DE HIDRATACIÓN

Durante el desarrollo de actividades y control del gasto energético del personal por la exposición a condiciones de temperaturas a cielo abierto y jornadas continuas de trabajo, se establecieron puntos de hidratación con la finalidad de mantener al personal hidratado dando cumplimiento de esta manera a lo dispuesto en la Resolución 2400 de 1979.

Registro Fotográfico – Punto de Hidratación

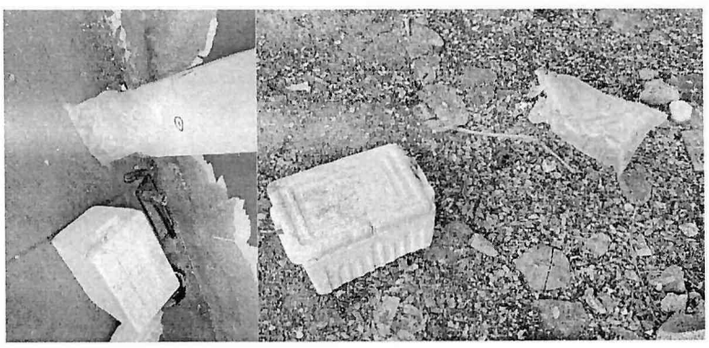

7.7. PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE

Para el periodo evaluado, no se requirió la ejecución de acciones de rescate ni relocalización de especies silvestres, ya que no se evidenciaron situaciones que lo ameritaran. No obstante, el personal técnico mantiene vigilancia permanente en los frentes de trabajo, conforme a los lineamientos del Plan de Manejo Ambiental (PMA), para actuar oportunamente en caso de que se identifiquen especies en riesgo o vulnerabilidad durante la ejecución del proyecto.

8. CONCLUSIONES

Del anterior informe presentado podemos concluir que:

- Se está cumpliendo con toda la normatividad legal vigente aplicable al proyecto en temas de seguridad y salud en el trabajo, y ambiental.

324

- Se desarrollan las actividades de los planes de seguridad y salud en trabajo, y gestión ambiental.
- Se garantiza la afiliación y pago de aportes de todos los trabajadores al Sistema de Seguridad Social en Colombia.
- Se están implementando todos los formatos estipulados en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) y los controles del plan de manejo ambiental.
- Se promueve entre los trabajadores buenas prácticas de gestión ambiental con el fin de que sean aplicadas durante las jornadas de trabajo.
- Se realiza entrega y reposición de EPP acorde con las actividades ejecutadas en el proyecto.
- Durante el periodo no se presentaron accidentes de trabajo.
- Se le da el cumplimiento al programa de inspecciones.
- Se desarrollan las actividades de los planes de seguridad y salud en trabajo, y gestión ambiental.

9. ANEXOS

Anexo No. 1 AFILIACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 9
Anexo No. 2 PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 9
Anexo No. 3 EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES 9
Anexo No. 4 INDUCCIÓN DE SST 10
Anexo No. 5 NOTIFICACIÓN DE EXPOSICIÓN A RIESGOS 10
Anexo No. 6 ACTA ENTREGA DE EPP Y/O DOTACIÓN 10
Anexo No. 7 CAPACITACIÓN SST 13
Anexo No. 8 INSPECCIONES DE SEGURIDAD 14
Anexo No. 9 CAPACITACIÓN AMBIENTAL 19

328

Anexo No. 1 AFILIACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

ARL | sura

329

Medellín, 21 de July de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL CORDOBA		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C11171737	CONDE MANJARREZ VICTOR	22/07/2025		H219226²	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 21/07/2025 10:54:31 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.141.123, 192.230.104.12, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

325

ARL | sura

330

Medellín, 21 de July de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL CORDOBA		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1043641929	CORTES RODRIGUEZ MANUEL DAVID	22/07/2025		15344371	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 21/07/2025 10:43:30 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.141.123, 192.230.104.12, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

326

ARL | sura

331

Medellín, 21 de July de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL CORDOBA		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1066732487	PEREZ ROMERO LUIS MIGUEL	22/07/2025		15417125	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 21/07/2025 10:17:46 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.141.123, 192.230.104.12, 172.16.42.57

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

327

ARL | sura

332

Medellín, 21 de July de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL CORDOBA		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C11172007	RUIZ ANAYA ARIEL	22/07/2025		M144L211	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 21/07/2025 10:56:42 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.141.123, 192.230.104.12, 172.16.42.57

328

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ARL | sura

333

Medellín, 21 de July de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL CORDOBA		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1063721640	RUIZ ANAYA HECTOR	22/07/2025		33³12153	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 21/07/2025 10:20:12 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.141.123, 192.230.104.12, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COOSALUD
En Pos de tu bienestar

337

CERTIFICADO DE RADICACIÓN DE AFILIACIÓN Y/O NOVEDAD

COOSALUD EPS SA certifica que el día 22/07/2025, se radicó solicitud de trámite de afiliación y/o novedad ante esta EPS, relacionando los siguientes datos en el formulario adjunto:

• **No. RADICADO:**	42542003
• **RÉGIMEN:**	Contributivo
• **TIPO DE TRÁMITE:**	Movilidad al régimen contributivo
• **FECHA DE INICIO DE RELACIÓN LABORAL:**	2025-07-22
• **TD AFILIADO:**	CC
• **NÚMERO DOCUMENTO AFILIADO:**	11171737
• **TD EMPLEADOR:**	NIT
• **NÚMERO DOCUMENTO EMPLEADOR:**	901915670
• **FONDO DE PENSIÓN:**	NO APLICA
• **IBC:**	$1.423.500,00
• **No. ADJUNTOS:**	2

OBSERVACIONES:

1. Hasta tanto entre en operación el Sistema de Afiliación Transaccional, la afiliación y reporte de las novedades se realizará en el formulario físico que adopte el Ministerio de Salud y Protección Social directamente a las EPS, y éstas las reportarán a la Base de Datos de Afiliados del Sistema conforme a la normativa vigente. Decreto 780/2016.
2. El trámite y gestión del caso radicado se realizará dentro de los 3 días hábiles posteriores a la fecha de expedición del presente documento. La respuesta será enviada al correo electrónico registrado en la plataforma de autogestión de empleadores.
3. Documento NO válido para prestación de servicios médicos y/o trámite de traslados entre EPS.

Cualquier inquietud con la información aquí contenida, puede comunicarse a través de las líneas 018000 515 611 ó #922.

La presente se expide a solicitud del interesado en Cartagena, a los 9 días del mes de Mayo de 2025.

Cordialmente,

CARLOS TORRES SALAZAR
Subdirector Nacional de Aseguramiento
COOSALUD EPS SA

COOSALUD
En Pos de tu bienestar

335

CERTIFICADO DE RADICACIÓN DE AFILIACIÓN Y/O NOVEDAD

COOSALUD EPS SA certifica que el día 22/07/2025, se radicó solicitud de trámite de afiliación y/o novedad ante esta EPS, relacionando los siguientes datos en el formulario adjunto:

• **No. RADICADO:**	42591045
• **RÉGIMEN:**	Contributivo
• **TIPO DE TRÁMITE:**	Movilidad al régimen contributivo
• **FECHA DE INICIO DE RELACIÓN LABORAL:**	2025-07-22
• **TD AFILIADO:**	CC
• **NÚMERO DOCUMENTO AFILIADO:**	11171737
• **TD EMPLEADOR:**	NIT
• **NÚMERO DOCUMENTO EMPLEADOR:**	901915670
• **FONDO DE PENSIÓN:**	NO APLICA
• **IBC:**	$1.423.500,00
• **No. ADJUNTOS:**	2

OBSERVACIONES:

1. Hasta tanto entre en operación el Sistema de Afiliación Transaccional, la afiliación y reporte de las novedades se realizará en el formulario físico que adopte el Ministerio de Salud y Protección Social directamente a las EPS, y éstas las reportarán a la Base de Datos de Afiliados del Sistema conforme a la normativa vigente. Decreto 780/2016.
2. El trámite y gestión del caso radicado se realizará dentro de los 3 días hábiles posteriores a la fecha de expedición del presente documento. La respuesta será enviada al correo electrónico registrado en la plataforma de autogestión de empleadores.
3. Documento NO válido para prestación de servicios médicos y/o trámite de traslados entre EPS.

Cualquier inquietud con la información aquí contenida, puede comunicarse a través de las líneas 018000 515 611 ó #922.

La presente se expide a solicitud del interesado en Cartagena, a los 24 días del mes de Julio de 2025.

Cordialmente,

CARLOS TORRES SALAZAR
Subdirector Nacional de Aseguramiento
COOSALUD EPS SA

mutualser
Atención sin tanta vuelta

336

CERTIFICA QUE

El (La) Señor(a) **ARIEL RUIZ ANAYA** identificado con **Cédula de ciudadanía** número **11172007** registra en nuestra Base de Datos en condición de: **COTIZANTE**.

Estado Afiliado:	**Activo**
IPS de atención:	**MEDISINU IPS SAS**
Categoría:	**A**
Fecha afiliación:	**22/07/2025**
Régimen:	**Contributivo**

La presente certificación se expide a solicitud del(de la) interesado(a) a **QUIEN INTERESE** , el 24 de julio del 2025. Esta es el Reflejo de la información registrada en nuestro sistema de información hoy.

Observaciones:

- NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS
- No válido para prestación de servicios que se realiza entre IPS y EPS
- Puede consultar más detalle en nuestra página web: www.mutualser.org
- Línea permanente 24 Horas 018000116882 o #603

Cordialmente,

LUIS BARRAZA
Director de Operaciones - Contributivo
infocontributivo@mutualser.com
MUTUAL SER EPS

COOSALUD
En Fos de tu bienestar

334

CERTIFICADO DE RADICACIÓN DE AFILIACIÓN Y/O NOVEDAD

COOSALUD EPS SA certifica que el día 22/07/2025, se radicó solicitud de trámite de afiliación y/o novedad ante esta EPS, relacionando los siguientes datos en el formulario adjunto:

• **No. RADICADO:**	42541223
• **RÉGIMEN:**	Contributivo
• **TIPO DE TRÁMITE:**	Movilidad al régimen contributivo
• **FECHA DE INICIO DE RELACIÓN LABORAL:**	2025-07-22
• **TD AFILIADO:**	CC
• **NÚMERO DOCUMENTO AFILIADO:**	1063721640
• **TD EMPLEADOR:**	NIT
• **NÚMERO DOCUMENTO EMPLEADOR:**	901915670
• **FONDO DE PENSIÓN:**	NO APLICA
• **IBC:**	$1.423.500,00
• **No. ADJUNTOS:**	2

OBSERVACIONES:

1. Hasta tanto entre en operación el Sistema de Afiliación Transaccional, la afiliación y reporte de las novedades se realizará en el formulario físico que adopte el Ministerio de Salud y Protección Social directamente a las EPS, y éstas las reportarán a la Base de Datos de Afiliados del Sistema conforme a la normativa vigente. Decreto 780/2016.
2. El trámite y gestión del caso radicado se realizará dentro de los 3 días hábiles posteriores a la fecha de expedición del presente documento. La respuesta será enviada al correo electrónico registrado en la plataforma de autogestión de empleadores.
3. Documento NO válido para prestación de servicios médicos y/o trámite de traslados entre EPS.

Cualquier inquietud con la información aquí contenida, puede comunicarse a través de las líneas 018000 515 611 ó #922.

La presente se expide a solicitud del interesado en Cartagena, a los 24 días del mes de Julio de 2025.

Cordialmente,

CARLOS TORRES SALAZAR
Subdirector Nacional de Aseguramiento
COOSALUD EPS SA

338

Colfondos
del grupo HABITAT

COLFONDOS ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS

NIT 800.149.496-2

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) VICTOR CONDE MANJARRES, identificado(a) con C.C 11.171.737, se encuentra afiliado(a) al Fondo Pensiones Obligatorias NIT 800.227.940-6.

Se expide la presente certificación a la fecha 22 de julio de 2025.

El presente certificado emitido contiene una firma digitalizada válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999.

Cualquier inquietud adicional no dude en escribirnos a través de nuestro portal transaccional www.colfondos.com.co opción PQR's, o comuníquese con nuestro Contact Center a través de las siguientes líneas Bogotá 601 748 48 88, Barranquilla 605 386 98 88, Bucaramanga 607 698 58 88, Cali 602 489 98 88, Cartagena 605 694 98 88, Medellín 604 604 28 88 y en el resto del país 01 800 05 10000.

Leonardo Cáceres García
Gerente Cuentas y Recaudo
Colfondos S.A Pensiones y Cesantías

339

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

MANUEL DAVID CORTES RODRIGUEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.043.641.929**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 22 de Julio del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

340

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

LUIS MIGUEL PEREZ ROMERO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.066.732.487**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 22 de Julio del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

341

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

ARIEL RUIZ ANAYA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **11.172.007**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 22 de Julio del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co *y actualice su Historia Laboral.*

342

Colfondos
del grupo HABITAT

COLFONDOS ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS

NIT 800.149.496-2

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) HECTOR RUIZ ANAYA, identificado(a) con C.C 1.063.721.640, se encuentra afiliado(a) al Fondo Pensiones Obligatorias NIT 800.227.940-6.

Se expide la presente certificación a la fecha 22 de julio de 2025.

El presente certificado emitido contiene una firma digitalizada válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999.

Cualquier inquietud adicional no dude en escribirnos a través de nuestro portal transaccional www.colfondos.com.co opción PQR's, o comuníquese con nuestro Contact Center a través de las siguientes líneas Bogotá 601 748 48 88, Barranquilla 605 386 98 88, Bucaramanga 607 698 58 88, Cali 602 489 98 88, Cartagena 605 694 98 88, Medellín 604 604 28 88 y en el resto del país 01 800 05 10000.

Leonardo Cáceres García
Gerente Cuentas y Recaudo
Colfondos S.A Pensiones y Cesantías

338

Anexo No. 2 PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Anexo No. 3 EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES

345

Salud Ocupacional

LUIS GABRIEL ALDANA OTERO

Mèdico especialista en salud ocupacional
Registro medico 8396
Licencia Salud Ocupacional: 01252 del 28/09/2020
celular: 3117367321

FECHA	C.C.
JULIO/21/2025	11,171,737

DATOS PERSONALES

NOMBRE COMPLETO	FECHA DE NACIMIENTO	T. SANGRE
VICTOR CONDE MANJARRES	MAR/09/1973	O +

CIUDAD	EPS	EDAD	MOVIL
MONTERIA	COOSALUD	52 AÑOS	3212526971

EMPRESA	ENFASIS	CARGO	MUNICIPIO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	OSTEOMOSCULAR	AYUDANTE	MONTERIA

DICTAMEN

APTO	SI	APLAZADO	

APTO PARA TRABAJO EN ALTURA		apto para trabajo en espacios confinados		Apto para trabajo en excavaciones	

PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE LE APLICAN

Fenomenos naturales	Biológico	Auditivo	Visual	Fisico
			Prevalente	Prevalente

Osteomuscular	Psicosocial	Biomecánico	Químico
Prevalente	Prevalente	Prevalente	

OBSERVACIONES AL CONCEPTO

PACIENTE SIN PATOLOGIA APERENTE QUE LO LIMITA PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES, PUEDE LABORAR SIN RETRICCIONES, SE LE DAN RECOMENDACIONES SIN DEFICIT CARDIOVASCULAR NI RESPIRATORIO. PACIENTE SIN LIMITACION FISICA PARA DESARROLLAR SUS FUNCIONES OSTEOMUSCULARES.

RECOMENDACIONES ESPECIFICAS

1. SEGUIR UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE. 2. DIETA SANA Y EJERCICIOS. 3. PAUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL. 4. USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 5. AUTOEXAMEN TESTICULAR.

EXAMENES PARACLINICOS REALIZADOS

Audiometría		Glicemia Basal		KOH, Coprológico, Frotis Faringeo	
Visiometria		Perfil Hepático		Rx Columna Dinámica	
Espirometría		Test de Fobias		RX Columna Lumbosacra	
Cuadro Hemático		Electrocardiograma		Psicometrico	
Perfil Lipídico		Rx Tórax		Parcial de Orina	

LEGALIDAD

Este documento hace parte de la historia clínica electrónica ocupacional y su contenido pleno es inmodificable. El trabajador manifiesta conocer el contenido registrado en el "Examen Médico de Ingreso"; el cual cumple con lo dispuesto en la Resolución 2346 de 2007. Se manifiesta informado de las medidas preventivas y correctivas en el cuidado de su salud. Autoriza al suscrito Médico para que custodie su Historia Clínica Ocupacional cumpliendo con el ordenamiento de la Resolución 1918 de 2009 y la Resolución 0839 de 2017. Su uso y copias solo pueden ser divulgadas en el momento y modo descritos por la Ley.

VICTOR CONDE
Firma del Paciente

Aldana O
Luis G. Aldana Otero
Medico Salud Ocupacional
L.S.O. 01252
Firma Médico Especialista en SO

341

Salud Ocupacional

LUIS GABRIEL ALDANA OTERO

Mèdico especialista en salud ocupacional
Registro medico 8396
Licencia Salud Ocupacional: 01252 del 28/09/2020
celular: 3117367321

FECHA	C.C.
JULIO/21/2025	1,043,641,929

DATOS PERSONALES

NOMBRE COMPLETO	FECHA DE NACIMIENTO	T. SANGRE
MANUEL DAVID CORTES RODRIGUEZ	NOV/05/2004	B +

CIUDAD	EPS	EDAD	MOVIL
MONTERIA	COOSALUD	21 AÑOS	3114780233

EMPRESA	ENFASIS	CARGO	MUNICIPIO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	OSTEOMOSCULAR	AYUDANTE	MONTERIA

DICTAMEN

APTO	SI	APLAZADO	

APTO PARA TRABAJO EN ALTURA		apto para trabajo en espacios confinados		Apto para trabajo en excavaciones	

PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE LE APLICAN

Fenomenos naturales	Biológico	Auditivo	Visual	Fisico
			Prevalente	Prevalente

Osteomuscular	Psicosocial	Biomecánico	Químico
Prevalente	Prevalente	Prevalente	

OBSERVACIONES AL CONCEPTO

PACIENTE SIN PATOLOGIA APERENTE QUE LO LIMITA PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES, PUEDE LABORAR SIN RETRICCIONES, SE LE DAN RECOMENDACIONES SIN DEFICIT CARDIOVASCULAR NI RESPIRATORIO. PACIENTE SIN LIMITACION FISICA PARA DESARROLLAR SUS FUNCIONES OSTEOMUSCULARES.

RECOMENDACIONES ESPECIFICAS

1. SEGUIR UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE. 2. DIETA SANA Y EJERCICIOS. 3. PAUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL. 4. USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 5. AUTOEXAMEN TESTICULAR.

EXAMENES PARACLINICOS REALIZADOS

Audiometría		Glicemia Basal		KOH, Coprológico, Frotis Faringeo	
Visiometria		Perfil Hepático		Rx Columna Dinámica	
Espirometría		Test de Fobias		RX Columna Lumbosacra	
Cuadro Hemático		Electrocardiograma		Psicometrico	
Perfil Lipídico		Rx Tórax		Parcial de Orina	

LEGALIDAD

Este documento hace parte de la historia clínica electrónica ocupacional y su contenido pleno es inmodificable. El trabajador manifiesta conocer el contenido registrado en el "Examen Médico de Ingreso"; el cual cumple con lo dispuesto en la Resolución 2346 de 2007. Se manifiesta informado de las medidas preventivas y correctivas en el cuidado de su salud. Autoriza al suscrito Médico para que custodie su Historia Clínica Ocupacional cumpliendo con el ordenamiento de la Resolución 1918 de 2009 y la Resolución 0839 de 2017. Su uso y copias solo pueden ser divulgadas en el momento y modo descritos por la Ley.

Manuel David
Firma del Paciente

Aldana O Luis G. Aldana Otero Medico Salud Ocupacional L.S.O. 01252
Firma Médico Especialista en SO

Salud Ocupacional

LUIS GABRIEL ALDANA OTERO

Mèdico especialista en salud ocupacional
Registro medico 8396
Licencia Salud Ocupacional: 01252 del 28/09/2020
celular: 3117367321

FECHA	C.C.
JULIO/21/2025	1,066,732,487

DATOS PERSONALES

NOMBRE COMPLETO	FECHA DE NACIMIENTO	T. SANGRE
LUIS MIGUEL PEREZ ROMERO	NOV/06/1989	O +

CIUDAD	EPS	EDAD	MOVIL
MONTERIA	SALUD TOTAL	35 AÑOS	3165571488

EMPRESA	ENFASIS	CARGO	MUNICIPIO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	OSTEOMOSCULAR	OFICIAL	MONTERIA

DICTAMEN

APTO	SI	APLAZADO	

APTO PARA TRABAJO EN ALTURA		apto para trabajo en espacios confinados		Apto para trabajo en excavaciones	

PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE LE APLICAN

Fenomenos naturales	Biológico	Auditivo	Visual	Fisico
			Prevalente	Prevalente

Osteomuscular	Psicosocial	Biomecánico	Químico
Prevalente	Prevalente	Prevalente	

OBSERVACIONES AL CONCEPTO

PACIENTE SIN PATOLOGIA APERENTE QUE LO LIMITA PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES, PUEDE LABORAR SIN RETRICCIONES, SE LE DAN RECOMENDACIONES SIN DEFICIT CARDIOVASCULAR NI RESPIRATORIO. PACIENTE SIN LIMITACION FISICA PARA DESARROLLAR SUS FUNCIONES OSTEOMUSCULARES.

RECOMENDACIONES ESPECIFICAS

1. SEGUIR UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE. 2. DIETA SANA Y EJERCICIOS. 3. PAUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL. 4. USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 5. AUTOEXAMEN TESTICULAR.

EXAMENES PARACLINICOS REALIZADOS

Audiometría		Glicemia Basal		KOH, Coprológico, Frotis Faringeo	
Visiometria		Perfil Hepático		Rx Columna Dinámica	
Espirometría		Test de Fobias		RX Columna Lumbosacra	
Cuadro Hemático		Electrocardiograma		Psicometrico	
Perfil Lipídico		Rx Tórax		Parcial de Orina	

LEGALIDAD

Este documento hace parte de la historia clínica electrónica ocupacional y su contenido pleno es inmodificable. El trabajador manifiesta conocer el contenido registrado en el "Examen Médico de Ingreso"; el cual cumple con lo dispuesto en la Resolución 2346 de 2007. Se manifiesta informado de las medidas preventivas y correctivas en el cuidado de su salud. Autoriza al suscrito Médico para que custodie su Historia Clínica Ocupacional cumpliendo con el ordenamiento de la Resolución 1918 de 2009 y la Resolución 0839 de 2017. Su uso y copias solo pueden ser divulgadas en el momento y modo descritos por la Ley.

Luis Perez
Firma del Paciente

Aldana O Luis G. Aldana Otero Medico Salud Ocupacional L.S.O. 01252
Firma Médico Especialista en SO

346

Salud Ocupacional

LUIS GABRIEL ALDANA OTERO

Mèdico especialista en salud ocupacional
Registro medico 8396
Licencia Salud Ocupacional: 01252 del 28/09/2020
celular: 3117367321

FECHA	C.C.
JULIO/21/2025	11,172,007

DATOS PERSONALES

NOMBRE COMPLETO	FECHA DE NACIMIENTO	T. SANGRE
ARIEL RUIZ ANAYA	MAY/26/1976	O +

CIUDAD	EPS	EDAD	MOVIL
MONTERIA	MUTUAL SER	49 AÑOS	3004397568

EMPRESA	ENFASIS	CARGO	MUNICIPIO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	OSTEOMOSCULAR	MAESTRO	MONTERIA

DICTAMEN

APTO	SI	APLAZADO	

APTO PARA TRABAJO EN ALTURA		apto para trabajo en espacios confinados		Apto para trabajo en excavaciones	

PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE LE APLICAN

Fenomenos naturales	Biológico	Auditivo	Visual	Fisico
			Prevalente	Prevalente

Osteomuscular	Psicosocial	Biomecánico	Químico
Prevalente	Prevalente	Prevalente	

OBSERVACIONES AL CONCEPTO

PACIENTE SIN PATOLOGIA APERENTE QUE LO LIMITA PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES, PUEDE LABORAR SIN RETRICCIONES, SE LE DAN RECOMENDACIONES SIN DEFICIT CARDIOVASCULAR NI RESPIRATORIO. PACIENTE SIN LIMITACION FISICA PARA DESARROLLAR SUS FUNCIONES OSTEOMUSCULARES.

RECOMENDACIONES ESPECIFICAS

1. SEGUIR UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE. 2. DIETA SANA Y EJERCICIOS. 3. PAUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL. 4. USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 5. AUTOEXAMEN TESTICULAR.

EXAMENES PARACLINICOS REALIZADOS

Audiometría		Glicemia Basal		KOH, Coprológico, Frotis Faringeo	
Visiometria		Perfil Hepático		Rx Columna Dinámica	
Espirometría		Test de Fobias		RX Columna Lumbosacra	
Cuadro Hemático		Electrocardiograma		Psicometrico	
Perfil Lipídico		Rx Tórax		Parcial de Orina	

LEGALIDAD

Este documento hace parte de la historia clínica electrónica ocupacional y su contenido pleno es inmodificable. El trabajador manifiesta conocer el contenido registrado en el "Examen Médico de Ingreso"; el cual cumple con lo dispuesto en la Resolución 2346 de 2007. Se manifiesta informado de las medidas preventivas y correctivas en el cuidado de su salud. Autoriza al suscrito Médico para que custodie su Historia Clínica Ocupacional cumpliendo con el ordenamiento de la Resolución 1918 de 2009 y la Resolución 0839 de 2017. Su uso y copias solo pueden ser divulgadas en el momento y modo descritos por la Ley.

Ariel Ruiz Anaya
Firma del Paciente

Aldana O
Luis G. Aldana Otero
Medico Salud Ocupacional
L.S.O. 01252
Firma Médico Especialista en SO

344

Salud Ocupacional

LUIS GABRIEL ALDANA OTERO

Mèdico especialista en salud ocupacional
Registro medico 8396
Licencia Salud Ocupacional: 01252 del 28/09/2020
celular: 3117367321

FECHA	C.C.
JULIO/21/2025	1,063,721,640

DATOS PERSONALES

NOMBRE COMPLETO	FECHA DE NACIMIENTO	T. SANGRE
HECTOR RUIZ ANAYA	JUN/01/1989	A +

CIUDAD	EPS	EDAD	MOVIL
MONTERIA	COOSALUD	36 AÑOS	3203367108

EMPRESA	ENFASIS	CARGO	MUNICIPIO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	OSTEOMOSCULAR	OFICIAL	MONTERIA

DICTAMEN

APTO	SI	APLAZADO	

APTO PARA TRABAJO EN ALTURA		apto para trabajo en espacios confinados		Apto para trabajo en excavaciones	

PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE LE APLICAN

Fenomenos naturales	Biológico	Auditivo	Visual	Fisico
			Prevalente	Prevalente

Osteomuscular	Psicosocial	Biomecánico	Químico
Prevalente	Prevalente	Prevalente	

OBSERVACIONES AL CONCEPTO

PACIENTE SIN PATOLOGIA APERENTE QUE LO LIMITA PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES, PUEDE LABORAR SIN RETRICCIONES, SE LE DAN RECOMENDACIONES SIN DEFICIT CARDIOVASCULAR NI RESPIRATORIO. PACIENTE SIN LIMITACION FISICA PARA DESARROLLAR SUS FUNCIONES OSTEOMUSCULARES.

RECOMENDACIONES ESPECIFICAS

1. SEGUIR UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE. 2. DIETA SANA Y EJERCICIOS. 3. PAUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL. 4. USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 5. AUTOEXAMEN TESTICULAR.

EXAMENES PARACLINICOS REALIZADOS

Audiometría		Glicemia Basal		KOH, Coprológico, Frotis Faringeo	
Visiometria		Perfil Hepático		Rx Columna Dinámica	
Espirometría		Test de Fobias		RX Columna Lumbosacra	
Cuadro Hemático		Electrocardiograma		Psicometrico	
Perfil Lipídico		Rx Tórax		Parcial de Orina	

LEGALIDAD

Este documento hace parte de la historia clínica electrónica ocupacional y su contenido pleno es inmodificable. El trabajador manifiesta conocer el contenido registrado en el "Examen Médico de Ingreso"; el cual cumple con lo dispuesto en la Resolución 2346 de 2007. Se manifiesta informado de las medidas preventivas y correctivas en el cuidado de su salud. Autoriza al suscrito Médico para que custodie su Historia Clínica Ocupacional cumpliendo con el ordenamiento de la Resolución 1918 de 2009 y la Resolución 0839 de 2017. Su uso y copias solo pueden ser divulgadas en el momento y modo descritos por la Ley.

Hector Ruiz A

Firma del Paciente

Aldana O Luis G. Aldana Otero Medico Salud Ocupacional L.S.O. 01252

Firma Médico Especialista en SO

Anexo No. 4 INDUCCIÓN DE SST

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 4GB	INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN		
	CÓDIGO: PGIO-F04	VERSIÓN: 01	FECHA: 01/03/2025

PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"
FECHA	22-07-2025
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	1. Socialización de Políticas. 2. Socialización del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 3. Estructura organizacional del proyecto. 4. Responsabilidades y funciones con la Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Responsabilidades y funciones con la Gestión Ambiental. 6. Responsabilidades y funciones con la Calidad. 7. COPASST - Funciones y responsabilidades. 8. Comité de convivencia laboral - Funciones y responsabilidades. 9. Notificación de riesgos. 10. Sistema general de riesgos laborales. 11. Uso de elementos de protección personal. 12. Señalización de seguridad. 13. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 14. Qué hacer en caso de accidente de trabajo. 15. Autoreporte de condiciones inseguras. 16. Gestión adecuada de los residuos sólidos.
OBJETIVO	Instruir, orientas y dar a conocer las condiciones de trabajo donde ejecutarán las labores diarias y, las funciones y responsabilidades del cargo asignado.
FACILITADOR	Iván Castillo S.

NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
Luis Miguel Perez R.	1066732487	Oficial	Luis Miguel PR.
Hector Ruiz Anaya.	1063721640	Oficial	Hector Ruiz Anaya.
Manuel David Costes.	1043641929	Oficial	Manuel David C
Victor Conde Mayarez.	11171737	Ayudante	Victor Mayarez S.
Anel Ruiz Anaya.	11172007	Maestro.	Ariel Ruiz.

Anexo No. 5 NOTIFICACIÓN DE EXPOSICIÓN A RIESGOS

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA - PGIO			
	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	Código: PGIO-F12	**Versión:** 01	**Fecha:** 01-03-2025	**Página:** 1 de 2

PROYECTO	**"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"**
CARGOS	Ayudante y oficial.
ACTIVIDADES	Ejecución de actividades diarias, mezclado, armado, cargue y descargue material.
FECHA DE NOTIFICACIÓN	22-07-2025

RIESGO		EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES
DESCRIPCIÓN	**CLASIFICACIÓN**		
Virus	BIOLÓGICO	Enfermedad COVID-19, Infección Respiratoria Aguda (IRA) Enfermedad pulmonar crónica, neumonía o muerte	Tapabocas Vacunación Capacitaciones en prevención del contagio y medidas de bioseguridad
Bacterias	BIOLÓGICO	Enfermedades infecciosas, hongos, virus	Charlas de autocuidado ATS Procedimientos de seguridad
Picaduras Mordeduras	BIOLÓGICO	Fiebre, enfermedades producidas por picaduras, lesiones menores en la piel	Fumigación de áreas, poda de malezas y vegetación no deseable
Sobresfuerzos	BIOMECÁNICO	Lesiones osteomusculares, dolores en el cuerpo	Pausas activas Charlas de autocuidado Programa de prevención osteomuscular ATS
Posturas prolongadas y mantenidas	BIOMECÁNICO	Lumbalgia, Problemas osteomusculares, Cansancio.	Pausas activas Charlas de autocuidado Programa de prevención osteomuscular ATS
Movimientos repetitivos	BIOMECÁNICO	Lesiones osteomusculares, Cansancio	Pausas activas Charlas de autocuidado Programa de prevención osteomuscular ATS
Locativo Superficies de trabajo	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Golpes y/o contusiones Caídas a mismo y distinto nivel	Elementos de Protección Personal Instalación de señalización preventiva Nivelación de superficies
Locativo Condiciones de orden y aseo	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Golpes, heridas, tropezones, resbalones, Caídas a un mismo nivel	Elementos de Protección Personal Instalación de señalización preventiva Jornadas de orden y aseo
Contacto eléctrico	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Lesiones por energización (Alta y baja tensión)	Elementos de Protección Personal Señalización preventiva Inspección y mantenimiento de conexiones eléctricas
Público Robos, Atracos, Asaltos.	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Heridas, golpes, contusiones.	Capacitaciones sobre autocuidado Limitación de áreas Vigilancia
Accidentes de tránsito	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Politraumatismos leves o severos	Seguridad Vial y Manejo Defensivo Mantenimiento de vehículos y maquinaria
Mecánico Manejo inadecuado de herramientas manuales	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Golpes, heridas	Elementos de Protección Personal Inspección de herramientas Guardas de seguridad
Sismos, tormentas, vendavales, inundaciones	FENOMENOS NATURALES	Heridas, lesiones, atrapamientos	Entrenamiento al personal, participación en simulacros. Brigadas conformadas y entrenadas, Extintores, camillas, botiquín dotado, instalaciones señalizadas
Iluminación Luz solar directa y luz deficiente	FÍSICO	Cansancio visual, pérdida parcial de la visión, fatiga, disminución de la destreza manual, mareos, desmayos, agravamiento de trastornos cardiovasculares.	Dotación correcta Mediciones Ambientales Hidratación constante
Vibración	FÍSICO	Trastornos articulares, daños vasculares, alteración del sistema nervioso central, perdida de la capacidad auditiva, dolor de espalda.	Exámenes periódicos Mantenimiento de Maquinaria, equipos y herramientas Elementos de Protección Personal
Ruido	FÍSICO	Cefaleas, Agresividad, Bajo rendimiento, Insomnio, Baja percepción del riesgo, Alteraciones auditivas, Disminución de la concentración	Elementos de Protección Personal Inspecciones de seguridad Mantenimiento de Maquinaria, equipos y herramientas
Contacto con Líquidos ACPM, Aceites, grasas y gases de soldadura autógena	QUÍMICO	Irritación de la piel, irritación en los ojos, quemaduras	Elementos de Protección Personal Inspecciones de seguridad Mantenimiento de Maquinaria, equipos y herramientas
Presencia de gases, vapores, humos.	QUÍMICO	Quemadura, neumoconiosis, bisinosis, neumonitis, asma profesional, EPOC, cáncer y muerte.	Elementos de Protección Personal Inspecciones de seguridad Mantenimiento de Maquinaria, equipos y herramientas
Contacto o salpicadura de sustancia química	QUÍMICO	Irritación (piel, ojos, vías respiratorias), intoxicación leve o severa	Elementos de Protección Personal Inspecciones de seguridad Rotulación de sustancias químicas
Condiciones de la tarea Monotonía del trabajo, carga mental	PSICOSOCIAL	Estrés laboral, fatiga, agotamiento, Cansancio físico, Disconfort	Capacitación Comité de convivencia laboral
¿OTRO?, ¿CUAL?			
¿OTRO?, ¿CUAL?			

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA - PGIO			
	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	Código: PGIO-F12	**Versión:** 01	**Fecha:** 01-03-2025	**Página:** 2 de 2

DECLARO QUE HE SIDO NOTIFICADO DE TODOS LOS RIESGOS Y PELIGROS A LOS CUALES PUEDO ESTAR EXPUESTO DURANTA LA JORNADA LABORAL, Y ME COMPROMETO A CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y OTRAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR EL CONSORCIO PARA PREVENIR LA OCURRENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES, DE CONFORMIDAD FIRMO A CONTINUACIÓN EL PRESENTE DOCUMENTO.

NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
Luis Miguel Pérez R	1066731487	Oficial.	Luis Miguel P R.
Hector Ruiz Anaya.	1063721640	Oficial	Hector Ruiz Anaya.
Manuel David Cortes.	1043641929	Oficial.	Manuel Dari C
Victor Conde Nayarez	117 1737	Ayudante.	Victor Nayarez C.
Ariel Ruiz Anaya.	111 72007	Maestro.	ARIEL RUIZ

RESPONSABLE NOTIFICACIÓN	
COORDINADOR SST	

Anexo No. 6 ACTA ENTREGA DE EPP Y/O DOTACIÓN

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002

ACTA ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CÓDIGO: PGIO-F16	VERSIÓN: 01	FECHA: 01/03/2025

PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"
COORDINADOR SST	

NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACIÓN	LISTA DE VERIFICACIÓN								FECHA	FIRMA
		CASCO	BOTAS	GUANTES	GAFAS	PROTECCIÓN AUDITIVA	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	CAMISA	PANTALÓN		
Never Manuel Aleas Anas.	1066735527			X	X					19-06-25	
Cesar Antonio Arguello G.	1064976924			X	X					19-06-25	Never Aleas Anas.
Jose Antonio Ayala Herrera.	78025167			X						24-06-25	Cesar Arguello G.
Oscar David Trenco.	1003457959			X						24-06-25	Oscar.
Jose Gregorio Diaz Meza.	1068656210			X						24-06-25	Jose Gregorio Diaz
SAMUEL F MENDOZA H.	1073825958			X	X					03-07-25	Samuel F Mendoza.
Jose Eduardo Melendez Ramos.	1070815145			X						03-07-25	Jose Eduardo Melendez.
Camilo Andres Galindo Barrera	1073828923			X	X					11-07-25	Camilo Andres Galindo
Edinson Manuel Cantillo M	1126245995			X						11-07-25	Edinson Manuel Cantillo
Luis Miguel Pérez Romero.	1066732487	X	X	X	X			X	X	22-07-25	Luis Miguel Pérez Romero
Hector Anaya Ruiz	1063721640	X	X	X	X			X	X	22-07-25	Hector Ariel Ruiz
Manuel David Cortes R.	1043641929	X	X	X	X			X	X	22-07-25	Manuel David Cortes R.
Victor Conde Manjarrez.	111717737	X	X	X	X			X	X	22-07-25	victor conde Manjarrez.
Ariel Anaya Ruiz	1117717007	X	X	X	X			X	X	22-07-25	Ariel Anaya Ruiz

ME COMPROMETO A
UTILIZAR ADECUADAMENTE DURANTE LA JORNADA LABORAL, LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECIBIDOS Y MANTENERLOS EN BUEN ESTADO Y CONDICIÓN.
Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de estos y dotación recibida.

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	ACTA ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL		
	CÓDIGO: PGIO-F16	VERSIÓN: 01	FECHA: 01/03/2025

PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"
COORDINADOR SST	

NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACIÓN	LISTA DE VERIFICACIÓN								FECHA	FIRMA
		CASCO	BOTAS	GUANTES	GAFAS	PROTECCIÓN AUDITIVA	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	CAMISA	PANTALÓN		
Henberto Torres P.	1073155444			X	X					25-07-25	HENBERTO
José Ruiz Mezar	1068656210	X		X						25-07-25	Jose Ruiz
Oscar Franco R.	1003457959			X	X					25-07-25	Yeison Ruiz
Yeison Ruiz M.	1063719364			X						25-07-25	Oscar Franco
Never Alean P.	1066735527	X		X	X					31-07-25	Never Alean
Camilo Galindo B.	1073828923	X		X	X					31-07-25	Camilo Galindo
Saibis Mendoza H.	1073825958			X	X					31-07-25	Saibis Mendoza
Cesar Arguello G.	1064976924			X	X					04-08-25	Cesar Arguello
Edinson Contreras M.	1126245995			X	X					04-08-25	Edinson C
Jose Ayala H.	78025167			X	X					04-08-25	Jose Ayala
Jhojan Vergara P.	72237694			X	X					04-08-25	Johan Vergara
José Ruiz M.	1068656210			X	X					04-08-25	Jose Ruiz
Luis Perez Romero	1066732427			X						13-08-25	Luis Perez
Victor Conde M.	1171737			X						13-08-25	Victor Conde
Jose Melendez R.	1070815145			X						13-08-25	José Melendez

ME COMPROMETO A
UTILIZAR ADECUADAMENTE DURANTE LA JORNADA LABORAL LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECIBIDOS Y MANTENERLOS EN BUEN ESTADO Y CONDICIÓN
Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de estos y dotación recibida.

386

Anexo No. 7 CAPACITACIÓN SST

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	ACTA DE REUNIÓN Y/O CAPACITACIÓN		
	CÓDIGO: PGIO-F01	VERSIÓN: 01	FECHA: 01/03/2025

PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"		
FECHA	23-07-2025	DURACIÓN	30 min
CAPACITACIÓN ☒ CHARLA ☐ ENTRENAMIENTO ☐ REUNIÓN ☐	TEMA: Higiene postural		
OBJETIVO	Promover en los trabajadores el mantener posturas corporales adecuadas durante las actividades diarias		
FACILITADOR	Juan Castillo S.		

NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
Cesar Arguello G.	1064976924	Ayudante	Cesar Arguello
José Ayala H.	78025167	Operario	Jose Ayala
Heriberto Torres P.	1073155444	Maestro	Heriberto
Oscar Franco R.	1003457959	Ayudante	Oscar Franco
Yelson Ruiz M.	1063719364	Ayudante	Yelson Ruiz
José Ruiz Meza	1068656210	Ayudante	Jose Ruiz
Saibis Mendoza H.	1073225958	Ayudante	Saibis Mendoza
Edinson Contreras M.	1126215775	Ayudante	Edinson C.
Camilo Galindo B.	1073828923	Ayudante	Camilo A Galindo
Jhojan Vergara P.	72237691	Inspector	Johan Vergara

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL		
	CÓDIGO: PGIO-F06	VERSIÓN: 01	FECHA: 01/03/2025

PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"
FECHA	23-07-2025
COORDINADOR SST	
UBICACIÓN	Frentes de Obra — SEÑALIZACIÓN SI X NO__

NOMBRE COMPLETO	LISTA DE VERIFICACIÓN														OBSERVACIONES
	CASCO		BOTAS		GUANTES		GAFAS		PROTECCIÓN AUDITIVA		PROTECCIÓN RESPIRATORIA		DOTACIÓN (CAMISA PANTALÓN)		
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Jhojan Vergara P.	X		X				X						X		
Heriberto Torres P.	X		X		X		X						X		
Never Alean A.	X		X		X		X						X		
José Ayala H.	X		X		X		X						X		
Oscar Franco R.	X		X		X		X						X		
Jose Ruiz M.	X		X		X		X						X		
Yelson Ruiz M.	X		X		X		X						X		
Saibis Mendoza H.	X		X		X		X						X		
Edinson Contreras M.	X		X		X		X						X		
Camilo Galindo	X		X		X		X						X		
Luis Perez Romero	X		X		X		X						X		
José Meléndez R.	X		X		X		X						X		

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	INSPECCIÓN A CAMILLA DE EMERGENCIA		
	CÓDIGO: PGIO-F21	VERSIÓN: 01	FECHA: 01/03/2025

PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"
FECHA	23-07-2025
COORDINADOR SST	

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: B: BUENO R: REGULAR M: MALO

No	UBICACIÓN	ESTADO DE LA CAMILLA								OBSERVACIONES
		VISIBILIDAD	ACCESO	OBSTRUCCIÓN	SEÑALIZACIÓN	SOPORTE	CORREAS	INMOVILIZADOR	ESTADO GENERAL	
1	Ciénaga de oro	B	B		B	B	B	B	B	
2	Cereté	B	B		B	B	B	B	B	
3	San Pelayo	B	B		B	B	B	B	B	
4	Canalete	B	B		B	B	B	B	B	
5	Moñitos	B	B		B	B	B	B	B	
6										
7										

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2025	INSPECCIÓN A EXTINTORES		
	CÓDIGO: PGIO-F07	VERSIÓN: 01	FECHA: 01/03/2025

PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"
FECHA	23-07-2025
COORDINADOR SST	

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: B: BUENO R: REGULAR M: MALO

No	TIPO DE EXTINTOR	UBICACIÓN	CAPACIDAD	FECHA DE PROXIMA RECARGA	ESTADO DEL EXTINTOR											OBSERVACIONES
					Manometro	Pasador de seguridad	Sello de seguridad	Manguera	Boquilla	Manija	Cilindro	Pintura	Señalización	Acceso	Visibilidad	
1	Multipropósito	Ciénaga de oro	10Lb	04-26	B	B	B		B	B	B	B	B	B	B	
2	Multipropósito	Cereté	10 Lb	04-26	B	B	B		B	B	B	B	B	B	B	
3	Multipropósito	San Pelayo	10 Lb	04-26	B	B	B		B	B	B	B	B	B	B	
4	Multipropósito	Canalete	10 lb	04-26	B	B	B		B	B	B	B	B	B	B	
5	Multipropósito	Montitos	10Lb	04-26	B	B	B		B	B	B	B	B	B	B	
6																
7																
8																
9																
10																

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CÓRDOBA 2025	INSPECCIÓN A BOTIQUÍN		
	CÓDIGO: PGIO-F05	VERSIÓN: 01	FECHA: 01/03/2025

PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"		
FECHA	23-07-2025		
COORDINADOR SST			
UBICACIÓN	Ciénaga de Oro	SEÑALIZACIÓN SI X NO__	

No	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO	CUMPLE		OBSERVACIONES
				SI	NO	
1	SOLUCIÓN SALINA 250 CC Ó 500 CC	UNIDAD	03-26	✓		
2	ALCOHOL ANTISÉPTICO	UNIDAD	08-26	✓		
3	BAJALENGUAS	PAQUETE X 20		✓		
4	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 4"	UNIDAD		✓		
5	GASAS LIMPIAS	PAQUETE X 20		✓		
6	GUANTES DE LÁTEX	CAJA		✓		
7	YODOPOVIDONA	UNIDAD		✓		
8	TERMÓMETRO	UNIDAD		✓		
9	VENDA ELÁSTICA 2X5 YARDAS	UNIDAD		✓		
10	VENDA ELÁSTICA 3X5 YARDAS	UNIDAD		✓		
11	VENDA ELÁSTICA 5X5 YARDAS	UNIDAD		✓		
12	VENDA DE ALGODÓN	UNIDAD		✓		
13	ALGODÓN	PAQUETE X 25g		✓		
14	CURAS	10 UNIDADES		✓		
15	TIJERAS	UNIDAD		✓		

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CÓRDOBA	INSPECCIÓN A BOTIQUÍN		
	CÓDIGO: PGIO-F05	VERSIÓN: 01	FECHA: 01/03/2025

PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"		
FECHA	23-07-2025		
COORDINADOR SST			
UBICACIÓN	Cereté	SEÑALIZACIÓN SI X NO__	

No	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO	CUMPLE		OBSERVACIONES
				SI	NO	
1	SOLUCIÓN SALINA 250 CC Ó 500 CC	UNIDAD	03-26	✓		
2	ALCOHOL ANTISÉPTICO	UNIDAD	06-26	✓		
3	BAJALENGUAS	PAQUETE X 20		✓		
4	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 4"	UNIDAD		✓		
5	GASAS LIMPIAS	PAQUETE X 20		✓		
6	GUANTES DE LÁTEX	CAJA		✓		
7	YODOPOVIDONA	UNIDAD		✓		
8	TERMÓMETRO	UNIDAD		✓		
9	VENDA ELÁSTICA 2X5 YARDAS	UNIDAD		✓		
10	VENDA ELÁSTICA 3X5 YARDAS	UNIDAD		✓		
11	VENDA ELÁSTICA 5X5 YARDAS	UNIDAD		✓		
12	VENDA DE ALGODÓN	UNIDAD		✓		
13	ALGODÓN	PAQUETE X 25g		✓		
14	CURAS	10 UNIDADES		✓		
15	TIJERAS	UNIDAD		✓		

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	INSPECCIÓN A BOTIQUÍN		
	CÓDIGO: PGIO-F05	VERSIÓN: 01	FECHA: 01/03/2025

PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"		
FECHA	23-07-2025		
COORDINADOR SST			
UBICACIÓN	San pelayo	SEÑALIZACIÓN SI X NO__	

No	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO	CUMPLE		OBSERVACIONES
				SI	NO	
1	SOLUCIÓN SALINA 250 CC Ó 500 CC	UNIDAD	03-26	✓		
2	ALCOHOL ANTISÉPTICO	UNIDAD	06-26	✓		
3	BAJALENGUAS	PAQUETE X 20		✓		
4	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 4"	UNIDAD		✓		
5	GASAS LIMPIAS	PAQUETE X 20		✓		
6	GUANTES DE LÁTEX	CAJA		✓		
7	YODOPOVIDONA	UNIDAD		✓		
8	TERMÓMETRO	UNIDAD		✓		
9	VENDA ELÁSTICA 2X5 YARDAS	UNIDAD		✓		
10	VENDA ELÁSTICA 3X5 YARDAS	UNIDAD		✓		
11	VENDA ELÁSTICA 5X5 YARDAS	UNIDAD		✓		
12	VENDA DE ALGODÓN	UNIDAD		✓		
13	ALGODÓN	PAQUETE X 25g		✓		
14	CURAS	10 UNIDADES		✓		
15	TIJERAS	UNIDAD		✓		

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 0124	INSPECCIÓN A BOTIQUÍN		
	CÓDIGO: PGIO-F05	VERSIÓN: 01	FECHA: 01/03/2025

PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"		
FECHA	23-07-2025		
COORDINADOR SST			
UBICACIÓN	Canalete	SEÑALIZACIÓN SI X NO__	

No	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO	CUMPLE		OBSERVACIONES
				SI	NO	
1	SOLUCIÓN SALINA 250 CC Ó 500 CC	UNIDAD	03-26	✓		
2	ALCOHOL ANTISÉPTICO	UNIDAD	06-26	✓		
3	BAJALENGUAS	PAQUETE X 20		✓		
4	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 4"	UNIDAD		✓		
5	GASAS LIMPIAS	PAQUETE X 20		✓		
6	GUANTES DE LÁTEX	CAJA		✓		
7	YODOPOVIDONA	UNIDAD		✓		
8	TERMÓMETRO	UNIDAD		✓		
9	VENDA ELÁSTICA 2X5 YARDAS	UNIDAD		✓		
10	VENDA ELÁSTICA 3X5 YARDAS	UNIDAD		✓		
11	VENDA ELÁSTICA 5X5 YARDAS	UNIDAD		✓		
12	VENDA DE ALGODÓN	UNIDAD		✓		
13	ALGODÓN	PAQUETE X 25g		✓		
14	CURAS	10 UNIDADES		✓		
15	TIJERAS	UNIDAD		✓		

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2027	INSPECCIÓN A BOTIQUÍN		
	CÓDIGO: PGIO-F05	VERSIÓN: 01	FECHA: 01/03/2025

PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"		
FECHA	23-07-2025		
COORDINADOR SST			
UBICACIÓN	Montitos	SEÑALIZACIÓN SI X NO__	

No	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO	CUMPLE		OBSERVACIONES
				SI	NO	
1	SOLUCIÓN SALINA 250 CC Ó 500 CC	UNIDAD	03-26	✓		
2	ALCOHOL ANTISÉPTICO	UNIDAD	06-26	✓		
3	BAJALENGUAS	PAQUETE X 20		✓		
4	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 4"	UNIDAD		✓		
5	GASAS LIMPIAS	PAQUETE X 20		✓		
6	GUANTES DE LÁTEX	CAJA		✓		
7	YODOPOVIDONA	UNIDAD		✓		
8	TERMÓMETRO	UNIDAD		✓		
9	VENDA ELÁSTICA 2X5 YARDAS	UNIDAD		✓		
10	VENDA ELÁSTICA 3X5 YARDAS	UNIDAD		✓		
11	VENDA ELÁSTICA 5X5 YARDAS	UNIDAD		✓		
12	VENDA DE ALGODÓN	UNIDAD		✓		
13	ALGODÓN	PAQUETE X 25g		✓		
14	CURAS	10 UNIDADES		✓		
15	TIJERAS	UNIDAD		✓		

364

Anexo No. 9 CAPACITACIÓN AMBIENTAL

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	ACTA DE REUNIÓN Y/O CAPACITACIÓN		
	CÓDIGO: PGIO-F01	VERSIÓN: 01	FECHA: 01/03/2025

PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"		
FECHA	30/07/2025	DURACIÓN	30 minutos
CAPACITACIÓN [X] CHARLA [ ] ENTRENAMIENTO [ ] REUNIÓN [ ]	TEMA: Impactos ambientales		
OBJETIVO	Identificar, evaluar, controlar los impactos ambientales.		
FACILITADOR	Sharon Corrales M		

NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
Heriberto Torres	1,073,155,444	Maestro	HERIBERTO
Jojan Vergara	72,237,694	Residente	Johan Vergara
Yeison Ruiz	1,063,779,364	Ayud.	Yeison Ruiz
José Ayala	78,025,167	Oficial	Jose Ayala
Jose Ruiz	1,068,656,210	Ayud.	Jose Ruiz
Cesar Arguello	1,064,976,924	Ayud.	Solbis Mendoza
Solbis Mendoza	1,073,825,950	Ayud.	Cesar Arguello
Oscar Franco	1,003,457,959	Ayud.	Oscar Franco
Edinson Contreras	1,126,245,995	Oficial	Edinson C.
