ANEXOS

Anexo 1
Actas de Reunion

ACTA DE COMITÉ

CONTRATO No.: ACTA No.: 4.

FRENTE: LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C., Nov 27/18

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
Luis M. Prado Pardo	Directa Obra	SAT AMBIENTAL	
Jennifer Correa Garcia	Residente Obra	SAT AMBIENTAL	
Alejandra Morín Rivera	Residente Interventoria	Interventoria	

TEMAS A TRATAR

1. Tramite Gas Natural
2. Informe Mensual
3. Plan de Contingencias
4. Balance
5. PITT
6. Excavacion de escombros
7. Avance.

ACTA DE COMITÉ

CONTRATO No.: ACTA No.: 4.

FRENTE: LUGAR Y FECHA: Bogota D.C Marzo. 27/18.

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS EN EL COMITÉ ANTERIOR

DESARROLLO DE TEMAS Y DECISIONES:

1. Tramite Gas Natural
   El proceso se este llevando a cabo el tramite de acuerdo al poder otorgado por la SED. Se estima que el tramite. dure de 45 - 6 dias. Para el Frente Agustin Fernandez se realizó la consulto, sobre la conexión en la esquina de la cra 6, encontrando que en este punto se puede hacer la conexion para la acometida del servicio.
2. Informe Mensual.
   Tiene un avance para la revision, se entrega en el desarrollo del comite para la primera revision.
3. Plan de Contingencia.
   Se realizó revision del plan de contingencia observando que falta el ajuste del mismo sobre la programación
4. Balance
   - Bomba hidro flow. — Se solicita concepto de especialista hidraulico.
   - APUs. Se facilita el formato de la SED para la entrega de los APU. estos deben estar acompañados de las respectivas cotizaciones. para la evaluacion de cada actividad.
   - Se entregara al final del dia de hoy el balance consolidado.
5. PMT.
   Se presenta complicacion con el frente Don Bosco por estar dentro de un parque y el formulario debe ir firmado por un encargado de IDRD.

ACTA DE COMITÉ

CONTRATO No.: ACTA No.: 4

FRENTE: LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C Marzo. 27/18.

Ambiental.

- Se solicita presentar cronograma de evacuación de escombros, de cada sitio, socializado con el colegio. y estar atentos a las observaciones de parte de los Rectores.

Tecnico.

Muro don Bosco.: Se solicita presentar concepto estructural referente a. la segregacion de material. presentado.

Avance Programado 24.81% ≠ 17.69%

Ejecutado 12.12 %

ACTA DE COMITÉ

CONTRATO No.:

ACTA No.:

FRENTE:

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C.,

COMPROMISOS PACTADOS Y RESPONSABLES

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO
1. Tramite Gas Natural - informe semanal.	Contratista	2 Abril / 18
2. Informe Mensual.	Contratista	27 Marzo / 18.
3. Plan de contingencia - Ajuste Programación	Contratista	28 marzo / 18.

PROXIMA REUNION

LUGAR:

FECHA: **HORA:**

ACTA DE COMITÉ

CONTRATO No.: CO1.PCCNTR.260352 **ACTA No.:** 5

FRENTE: COL AGUSTIN FERNANDEZ - COL DON BOSCO IV **LUGAR Y FECHA:** Bogotá D.C., 4 de abril de 2018

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
Elsa Torres	Rep Legal	Interventoria	
Luis Mazatazo	Director de obra	SATAMEXICO	
Alejandro Mann Riveros	Residente Interventoria	Interventoria	
Adriana Leiva	DCCEE	SED	
Nelson Rincon P.	R-Ext. F.C.	EAT AMEXICO	

TEMAS A TRATAR

ACTA DE COMITÉ

CONTRATO No.: CO1.PCCNTR.260352 **ACTA No.:** 5

FRENTE: COL AGUSTIN FERNANDEZ - COL DON BOSCO II **LUGAR Y FECHA:** Bogotá D.C 4 de abril de 2018

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS EN EL COMITÉ ANTERIOR

DESARROLLO DE TEMAS Y DECISIONES:

Administrativo.

1 Informe. tramite Gas Natural.
Contratista entrega informe de avance de tramite de Gas.

2. Informe mensual
Entregada version 01, se presentaron observaciones que estan siendo subsanadas.
De acuerdo al memorando entregado por la oficina de contratos de la SED los documentos del contrato deben ser subidos al SECOP 3 dias despues de su proderación.
La SED entrega el memorando de la oficina de contratos.

3. Polizas
El contratista riesgo polizas para no se evidencia en SECOP los documentos, por lo cual se solicita enviar a la entidad polizas actualizadas y el pantallazo del documento cargado.

4. La entidad solicita a Interventoria entrega de No Previstos. el
El contratista no ha presentado los Item No Previstos.

5. PMT don Bosco. Continua pendiente firma. de funcionario IDED. para formato de SDM.

ACTA DE COMITÉ

CONTRATO No.: CO1.PCCNTR.260352 **ACTA No.:** 5

FRENTE: COL AGUSTIN FERNANDEZ - COL DON BOSCO II **LUGAR Y FECHA:** Bogotá D.C 4 de abril de 2018

6. Corte: Se encuentra en revisión de memorias de cantidades del acta parcial 5.

TECNICA.

DON BOSCO:

- El contratista entrega concepto de E. Estructural sobre segregación de concreto. Se solicita a la Interventoria hacer revisión de este concepto.
- Se solicita mejorar el acopio de materiales y tomar precauciones por la temporada de invierno.
- Instalacion tubería sanitaria vs. instalacion trampa de grasas. No se aprueba por parte de interventoria la excavacion e instalacion de la tubería. Se solicita al contratista acatar las observaciones de la interventoria y la supervisión.
- Se funde placa de contrapiso de e=0.25m el dia de hoy.

AGOSTIN FERNANDEZ.

- Se solicita mejorar medidas de protección a materiales.
- Se solicita presentar plan de trabajo para mitigar atrasos por lluvias.
- Implementar canpeo.

ACTA DE COMITÉ

CONTRATO No.: CO1.PCCNTR.260352 **ACTA No.:** 5

FRENTE: COL AGUSTIN FERNANDEZ - COL DON BOSCO IV **LUGAR Y FECHA:** Bogotá D.C., 4 de abril de 2018

COMPROMISOS PACTADOS Y RESPONSABLES

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO
Entrega Balance + APUs	Contratista	06 Abril/18
Entrega Inf. Mensual Corregido	Contratista	05 Abril/18

PROXIMA REUNION

LUGAR:

FECHA: **HORA:**

Dirección Construcción

4300
I-2018-19514
27-03-2018

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C

MEMORANDO

PARA: **SUBSECRETARIOS, DIRECTORES, JEFES DE OFICINA Y SUPERVISORES DE CONTRATOS**

DE: **DIRECTORA DE CONTRATACIÓN**

ASUNTO: Instructivo operativo de trámites durante la ejecución contractual en la plataforma SECOPII

La implementación del SECOPII en los procesos de contratación de la Secretaria, que se ha desarrollado de manera progresiva, en las diferentes modalidades de selección y a partir de enero 2018, con toda la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, antes de la entrada en vigencia de las restricciones establecidas en la Ley 996 de 2005, ha requerido el ajuste de los procedimientos internos a la configuración del Sistema, en garantía del cumplimiento de la misión institucional y los principios de la contratación pública.

En atención a lo anterior, a continuación, se presentan las siguientes instrucciones que deben tenerse en cuenta por los supervisores y ordenadores del gasto, para los trámites que sean necesarios adelantar durante la ejecución de la contratación electrónica a través de la plataforma SECOPII:

1. Publicación y archivo de la ejecución contractual: en virtud de la configuración del sistema SECOPII, que establece la configuración de roles y perfiles en materia contractual, los supervisores deben cargar y publicar la información de la ejecución de los contratos, **dentro de los tres días hábiles siguientes a su producción**, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014[1] y el decreto 1082 de 2015[2], en documentos de la ejecución contractual Módulo 7:

Rocio Ruiz
Abril 2/2018
10:21

---

[1] Artículo 11. Información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento del sujeto obligado. Todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente información mínima obligatoria de manera proactiva:
(...)
g) Sus procedimientos, lineamientos, políticas en materia de adquisiciones y compras, así como todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones;

[2] Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. Los documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el SECOP.

ACTA DE COMITÉ

CONTRATO No.: CO1.PCCNTR.260352 **ACTA No.:** 6

FRENTE: COL AGUSTIN FERNANDEZ - COL DON BOSCO IV **LUGAR Y FECHA:** Bogotá D.C., 10 de abril de 2018

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
Alejandro Maria Rivera	Resid. Interventoria	Interventoria	
Adriana Velandia B	Apoyo Supervision	S.E.D. DCEE	
Inés M. Pedroza	Director Obra	Estamento Fs	

TEMAS A TRATAR

ACTA DE COMITÉ

CONTRATO No.: CO1.PCCNTR.260352 **ACTA No.:** 6

FRENTE: COL AGUSTIN FERNANDEZ - COL DON BOSCO II **LUGAR Y FECHA:** Bogotá D.C 10 de abril de 2018

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS EN EL COMITÉ ANTERIOR

1. Entrega Informe Mensual OS fue entregado el 06-Abril/18.



DESARROLLO DE TEMAS Y DECISIONES:

1. Balance.
- Se han presentado opciones de mejora del talón de gres y cabezales existentes x lo cual se presenta la opcion de utilizar para instalar sobre el piso existente. Se solicita evaluar de manera comparativa el uso de este material y la construccion de la placa.
- Respecto a la cubierta para el Col Agustin Fernandez, se solicita revisar la distancia minima entre correas la cual es recomendable en 0.60m
- Se solicita la revision de las cantidades del acero de refuerzo quede pendiente como ultima opcion
- Revisar de la conduccion de ALL del contenedor

2 POLIZAS

En la pag SECOP aun no permite cargar las polizas actualizadas se solicita al Contratista enviar correo electronico al supervisor, interventoria y solicitar asistencia tecnica al call center del SECOP. De continuar la falla radicar oficio anexando polizas a of. de contratos explicando que sucede al hacer cargue (incl. reg. grafico) con copia a Dir Construcciones

3 PMT.

La SED realizara la gestion con IDRD para la firma del formato

ACTA DE COMITÉ

CONTRATO No.: CO1.PCCNTR.260352 **ACTA No.:** 6

FRENTE: COL AGUSTIN FERNANDEZ - COL DON BOSCO II **LUGAR Y FECHA:** Bogotá D.C 10 de abril de 2018

4. Hoja de Vida Residente: Se solicita entrega de hoja de vida del cambio solicitado hoy

5 Baterías: se verifica con baterías encontrando que se pusieron el día AMBIENTAL Y SEGURIDAD

1. Cerramiento: Se debe revisar diario el estado del cerramiento y corregir las laminas y polisombras instaladas.

2 Aseo: Mejorar aseo en entrada

3 RCD: En ambos sitios se hace acopio en lunes y recolección los sábados

1. Bodega Campamento Don Bosco: se solicita hacer entrega en optimas condiciones y verificar entrega de pintura. (Aseado y con reposición de elementos dañados)

TECNICO

1. Se recibe ensayo concreto placa 7 días para

2. Se realiza el procedimiento de mejora del muro de contención de acuerdo a concepto estructural

3 Se instala tanque de trampa de grasas y se corrigen los niveles de instalación de tuberías sanitarias.

4. Recebo Agustín Fernandez:
Se instalo la trampa de grasas, y las tuberías de conducción de Aguas Negras.
Se solicita celeridad en la instalación de recebo y programar fundida de placa.

5. Avance Programado 38.39% ≠ 6.99%
Ejecutado 31.40%

6. Se recuerda que los Actas parciales deben entregarse el día 1 de cada mes, a la fecha no se han recibido actas radicadas.
PAC para el 16 de Abril/18

ACTA DE COMITÉ

CONTRATO No.: CO1.PCCNTR.260352 **ACTA No.:** 6

FRENTE: COL AGUSTIN FERNANDEZ - COL DON BOSCO IV **LUGAR Y FECHA:** Bogotá D.C., 10 de abril de 2018

COMPROMISOS PACTADOS Y RESPONSABLES

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO
Entregar Balance comparando demolición placa vs. recubrimiento Contratista + Apoz		Abril 12/18

PROXIMA REUNION

LUGAR:

FECHA: **HORA:**

ACTA DE COMITÉ

CONTRATO No.: CO1.PCCNTR.260352 - AmenoFis ACTA No.: 7

FRENTE: Don Bosco IV - AGUSTIN FERNANDEZ LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C., 20-04-18

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
Elsa Torres A.	Dirección Obra DCCEE	Interventoría Fd. Amenofis DCCEE	
Jhon M. Osorio F. Asesora Vial.			

TEMAS A TRATAR

Frente: Colegio Don Bosco.

1. Entrega de Paz y Salvos del personal que se retiró, el cual debe estar en el Informe
2. Entrega del informe (Resumen Técnico, financiero, ambiental, administrativo, copias Bitácora, oficios, registro fotográfico, etc.) Todo en tamaño Carta, se debe radicar antes del Acta, incluyendo el informe de Especialista. Solo en medio físico, planillas de Pago.
3. Informe Ambiental, cargue de RED. El informe debe estar ya actualizado con cargue de manejo del Escombro.
4. Radicación Cuentas: Se solicita radicar a más tardar las actas al 30 de Abril.
5. Inicio obras de intervención Comunal: Esta pendiente fecha. dada por la interventoría de acuerdo a contenedor
6. Visita de Gas.: pendiente firma del formulario.
7. Tapa de la caja del vle. que se estaba utilizando como bodega.

ACTA DE COMITÉ

CONTRATO No.: ACTA No.:

FRENTE: LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C

Frente Agustin fernandez.

- Armada de la placa: Se espera despachado el acero el dia de hoy y se aspira a dejar fundida el sabado 21.
- Se inicia la construcción de los 2 nichos
- Se debe pasar el APU de Bombeo
- El contratista espera que entregará el calculo estructural de la estructura de Cubierta el dia 20-04-18. (Esquema)
  La JEB hace lectura del Pliego en lo que tiene que ver con la obligacion de entregar el diseño de esta estructura.

ACTA DE COMITÉ

CONTRATO No.:

ACTA No.:

FRENTE:

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C.,

COMPROMISOS PACTADOS Y RESPONSABLES

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO
· Entrega de Paz y Salvo personal retirado	Contratista	23-04-18
· Entrega de Informe	Contratista	23-04-18
· Entrega de Actas en Mesa Seguim. de Obra	contratista	24-04-18
· Entrega Diseño. Estructural de Cubierta (Esquema)	Contratista.	20-04-18
· Inicio obras del tercero de cocinas (continuidad)	SED	Pendiente confirmar en la intervención.

PROXIMA REUNION

LUGAR:

FECHA: HORA:

ACTA DE COMITÉ

CONTRATO No.:

ACTA No.:

FRENTE:

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C.,

COMPROMISOS PACTADOS Y RESPONSABLES

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO
· Informe Mensual (Según requerimientos)	Contratista.	antes de radicar cuenta
· Visita especialistas hidráulicos y Eléctricos	SED - Contratista - Interv.	23-04-18.
· Informe Ambiental - Cargue RCD	Contratista.	en el Mensual
· Entrega APUS aprobados	SED.	
· Balance final (Ajustado por diseño Hidr y concepto de Especialista)	Contratista - Interv	25-04-18.
· Entrega de APUS no previstos pendientes.	Contratista	24-04-18

PROXIMA REUNION

LUGAR: SED

FECHA:

HORA:

Anexo 2
Bitacora
De Obra

Bitacora Colegio Agustin Fernandez


19 MARZO DE 2018 — (1 Festivo)

el Personal de obra y administrativo no presenta actividad en obra en este frente.

20 DE MARZO DE 2018

Se continua con labores de excavacion de tierra, sobre area de intervencion, se recibe visita By Pass de interventoria con el fin de revisar avance de actividades se continua con empresque y tasiego de material restante de la excavacion y Y. Demoliciones

Se trabaja con una cuadrilla de 1 maestro / 1 oficial & 2 ayodantes




21 DE MARZO DE 2018

Inician labores de suministro e instalacion de recebo compactado para zona a intervenir, incluyendo compactacion con maquina y la aplicacion se desarolla manualmente


Ingresa acero para Placa de contrapiso y vigas de amarre, se realiza tasiego del mismo

Frente de trabajo: cuadrilla = 1 oficial y tres ayodantes + maestro. y Supervisor del contratista



22 DE MARZO DE 2018


Se continua con labores de amarrado y armado de acero, segun especificaciones de Planimetria estructural, se finaliza tramo de 12 mts de viga de amarre, y se continua con proceso de aplicacion y compactacion de recebo




Scanned by CamScanner


23 Marzo de 2018

- Se recibe visita Pin Punte de supervisor de la secretaria (Ing. Adriana Velandia) Interventoria (Ing Alejandra Maria) Director de obra de contratista (Arq Luis Parada) Residente contratista (Arq. Jennifer Correa) para hacer revisión de Pantos entregar en Placa y niveles.



Y se revisa diseño de cubierta



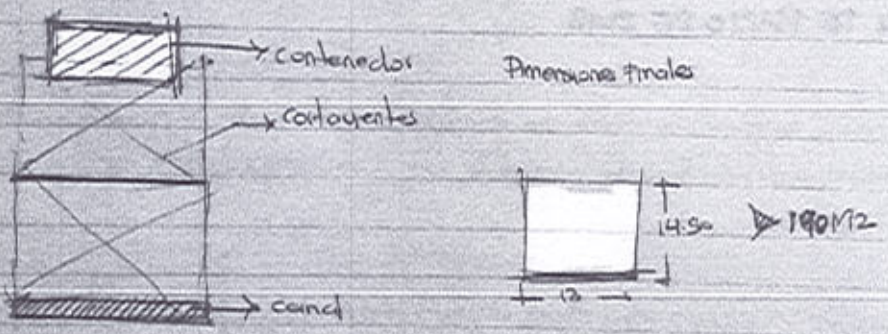

Se define Fundición de Placa de 0.10 mts sobre adoquín reconformado en obra con labores de excavación sobre trampa de grasas.

Rodolfo

24 Marzo 2018

Se continuan las labores de Demolición de adoquin, el concreto de fibra sobre Plataforma de juegos, segun lo determinado en la visita del 23 Marzo de 2018, se hace replanteo de acometidas sanitarias, segun forma de pendientes y distancias en tuberia convencional entre buzones de grasas y Placa de contenedor — Jornada laboral con Presencia de Ing.


25 Marzo de 2018

→ DOMINGO

el personal administrativo y de obra no laboro en dicha fecha de trabajo

26 Marzo 2018

Por recomendaciones de la interventoria IVC Alcaldia se comienza con drenaje sobre el acceso empedrado debido a las fuertes precipitaciones que se vienen presentando en la capital de la republica (lluvias de Bastante intensidad) esto a retrasado las actividades programadas pues esto demora

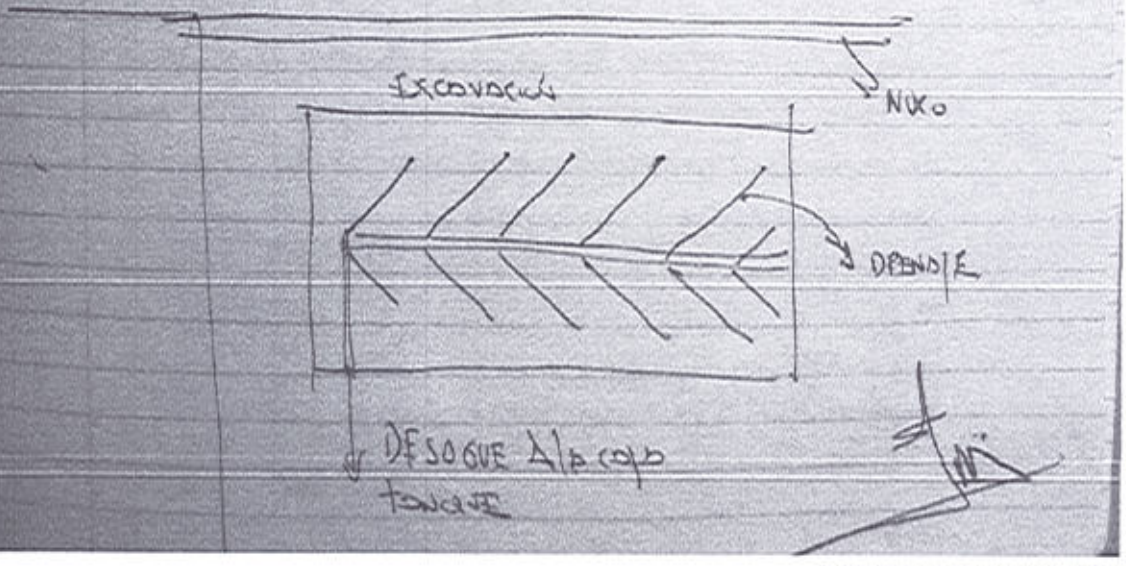

Scanned by CamScanner

Marzo 27/2018

Se viene presentando lluvias durante todo el dia se compro un plastico de alto rendimiento que sirve para cubrir la excavacion y proteger el acceso compartamo, de todas maneras las lluvias inundaron la excavacion hecha

La bomba de pozo no funciono pero las precipitaciones son muy altas las lluvias retrasaron actividades programadas perdiendo tiempo y no la productividad establecida

Marzo 28/2018

El dia Miercoles 28 de marzo se continuan las labores constructivas referentes a demolicion, instalacion de tuberia sanitaria, losa de muros de tanque de trampa de grasas rotoplas de 2000 Litros que fue solicitado por la supervision del contrato y se encuentra dentro de items contractuales, se informan caracteristicas de instalacion de dicho elemento a la interventoria

— teniendo en cuenta las dificiles condiciones climaticas se continua con las obras de mitigacion que restablecen el drenaje de aguas lluvias detectadas dentro de la zona de trabajo de contratista y que pueden afectar la consistencia del recebe compactado.


Ing. Obra

Abril 2/ 2018

Se UNCEN MADERAMIENTOS EN EL RECEBO COMPACTADO NUEVAMENTE para filtrar el agua lluvia la cual está drenando hacia la caja del contenedor septico


Se sacan NIVELES para poder instalar el tanque septico para poder dejarlo en funcionamiento

La cubierta está funcionando y ayuda a conservar el RECEBO ya instalado

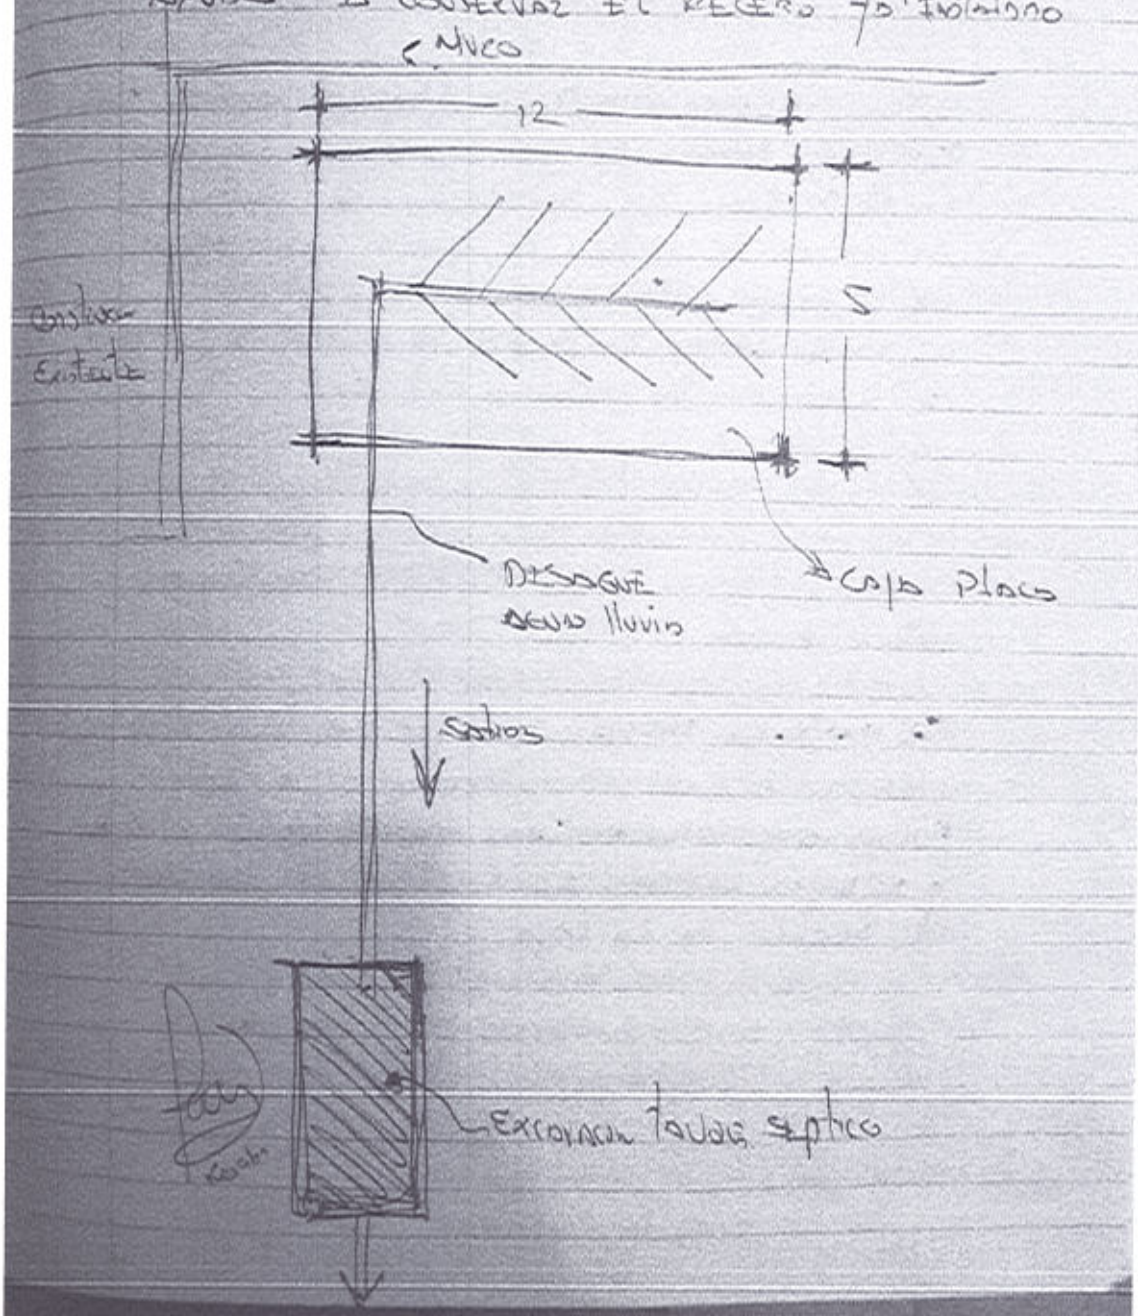


Scanned by CamScanner

Las lluvias siguen retrasando la programación establecida x la empresa




ABRIL 3 DE 2018

Las condiciones atmosféricas (lluvias torrenciales) siguen generando retrasos de actividades programadas en el colegio de igual forma se desarrollan actividades de retiro de asfalto contaminado que el hasta utilizado en la calle donde se va a fundir la placa de contrapiso se replanteo la conexion del gas



ABRIL 04 DE 2018

Se continuan labores con un maestro y 3 oficiales los cuales se ven interrumpidos x las lluvias que siguen monitoreando durante todo el dia y no dejan avanzar. se continua con la sacada del recebo de la calle



Scanned by CamScanner

ABRIL 05 DE 2018

Se finalizan Labores de excavacion en caja de trampa de grasas con una profundidad Final de 1.80 mts segun toma de niveles en terreno y en Puntos sanitarios de llegada de trampa de grasas.

Las condiciones climaticas, no son las mejores en horas de la tarde, se Presentan Fuertes lluvias en horas de la tarde de 1:00 Pm a 6:00 PM, Por lo tanto continua retraso de la Programacion



ABRIL 06 DE 2018

Se realiza comité de obra, con Presencia de interventoria contratista y supervisor con el fin de revisar el estado de la obra posterior a los eventos causados Por las altas precipitaciones y Volumen de agua lluvia de los ultimos dias, ya que las condiciones climaticas no mejoran y los drenajes hechos al recebo no son suficientes, se determina el cambio total del mismo, Por lo tanto continua la excavacion del material y la Colocacion de los asadoos.

Se evalua el diseño de cubierta entregado Por el contratista, y Por Parte de la interventoria y la Supervision se solicita concepto de eficiencia estructural del diseño arquitectonico

- Se desarrolla replanteo Por Parte del tecnico de gas de la red de suministro desde el nicho medido fue se ubicara en la cra 7ª. dicho recorrido se aprueba Por la supervisora del contrato



las condiciones climaticas son Perjudiciales en horas de la tarde continuan las Fuertes lluvias

Scanned by CamScanner

ABRIL 07 DE 2018

Visita del contratista a la obra — teniendo en cuenta las condiciones climaticas del dia con presencia de nebosidad sin lluvias se continua con labores de demolicion de placa de concreto sobre zona de acometida sanitaria entre trampa de grasas y caja de aguas negras existente,

Se continua con excavacion de recebo deteriorado por las fuertes lluvias

ABRIL 08 DE 2019

Domingo —
como parte del plan de contingencia por retraso en la obra, con motivo de alteraciones climaticas, se autoriza por parte del contratista dia laboral en jornada de 7:00 am a 1:00 pm con cuadrilla de 1 maestro y 3 oficiales para adecuacion de rejata de acometida de aguas negras.

Ya que dicho tramo de demoliciones se encuentra fuera del cerramiento en el cual se ejecutan las labores, el dia domingo sin presencia de la comunidad educativa.

Scanned by CamScanner

Abril 09/18.


Se realiza visita al Col Agustin Fernandez verificando las actividades de pases de tubería sanitaria a la caja de Aguas Negras existente. Se solicita al contratista mantener las medidas preventivas por las lluvias para proteger los materiales en obra y las excavaciones actualmente abiertas. Se acuerda realizar en la trampa de grasas (caja) lleno con material triturado y realizar el esquema de instalación de la tapa. Se verifican niveles dentro de la excavación de la placa para instalar nuevamente el material granular.

Residente Interventoría.

Contratista

Abril 10/18

Se comienza el día con una cuadrilla de un maestro y 3 ayudas para continuar con actividades de preparación de cimentación para las estructuras de la cubierta propuesta por el contratista concilidas con la interventoría y la supervisión del contrato. De igual forma se entrega caseta para cubrir la zona de trabajo de 8:00 a.m. hasta tanto que impere en Bogotá

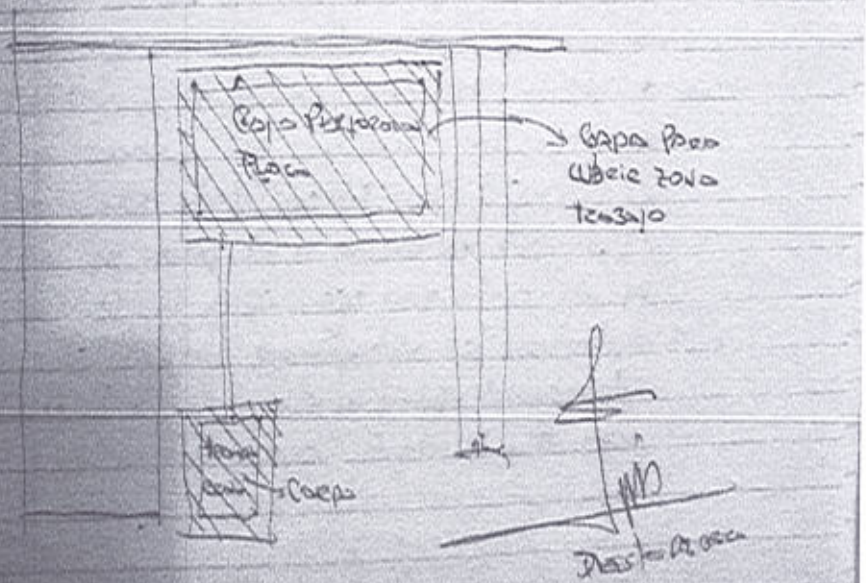

Scanned by CamScanner

11 ABRIL DE 2018

SE REALIZAN MAMPOSTERIAS ALREDEDOR DE LOS COJOS PARA EVITAR FILTRACIÓN DE AGUAS LLUVIAS DENTRO DE LOS COJOS DONDE SE VA A FUNDIR LAS PLACAS DE CIMENTACIÓN Y LOS PEDESTALES DE CIMENTACIÓN DE ACUERDO A LOS PLANOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA YA QUE NO EL CONTRATISTA NO CUENTA CON PLANOS DEFINITIVOS ENTREGADOS X PARTE SED. SE DEJA CONSTANCIA QUE EL CONTRATISTA ESTA COLABORANDO CON EL DISEÑO DE LAS CUBIERTAS YA QUE EL ALCANCE DEL CONTRATO ES DE OBRA NO DE DISEÑO Y ESTUDIOS CONTINUA EL MAL TIEMPO EN EL SECTOR

Director proyecto

12 ABRIL DE 2018

SE HACE VISITA POR PARTE DIRECTOR DE OBRA ENVIADO DE LA SEDE SE EVIDENCIA QUE NO SE HA PODIDO AVANZAR EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEBIDO AL MAL TIEMPO QUE IMPERA EN LA CIUDAD. LAS DIFERENTES EXCAVACIONES FUERON AUTORIZADAS X INTERVENTORÍA Y DIRECCIÓN DE ACUERDO A LOS PLANOS PRESENTADOS X PARTE DEL CONTRATISTA SE HACE CONSULTA AL INGENIERO ESTRUCTURAL DEL CONTRATISTA EL CUAL RECOMIENDA SOLICITAR EL ESTUDIO DE SUELOS DEL LUGAR Y SOLICITAR EL DISEÑO DE LAS CUBIERTAS PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE ACUERDO A LOS PLANOS DE LA ENTIDAD O DE LA CONTRATISTA YA QUE LA ENTIDAD Y LA INTERVENTORÍA SOLICITA EL ESTUDIO DE SUELOS Y EL CALCULO ESTRUCTURAL PARA QUE CUMPLA CON LA NORMA DE SISMO-RESISTENCIA DE LAS CUBIERTAS

Director proyecto

Scanned by CamScanner

Abril 13/18

Se evidencian medidas de protección en las excavaciones abiertas implementando uso de cerpeo y una hilada en ladrillo tolete instalada perimetralmente en las excavaciones para impedir el libre desagues lluvias Se evidencian excavaciones para dados de la cubierta, excavaciones no autorizados por la interventoria ya que no se tienen planos definitivos de esta estructura avalados por la SED. Se evidencia retiro total de recebo contaminado y sobre excavado del area de implantacion de la placa de cocina nivel.

Residente
Interventoria

Abril 14/18

SE trabajo en dejar seco la caja de la placa ya que se encuentra saturado por la cantidad de H_2O que se a precipitado durante todo la semana. SE continua con la sacada del recebo que estaba instalado y que se contamino x la cantidad de H_2O
Se dejara bombas en la caja de la trampa de Grasas para evitar volcamiento de los recebos de la caja por las precipitaciones que se han presentado durante toda la semana lo cual a retrasado otras actividades programadas

Abril 14/18

Se mueve pero para generar un plan de contingencia por el clima no muy favorable se suspende actividades para retomarlas nuevamente el lunes

16 de Abril de 2018

Se realizo visita x parte de la SED, observando obras en la ejecucion de obra en los actividades de armado de placa. Se solicita para el viernes el plan de choque x parte del contratista, q' evidencie la entrega de las obras en los tiempos establecidos, dado que nos encontramos a 37 dias de la fecha finalizacion de las obras. Así mismo se debe entregar el balance real de la obra avalado y revisado x interventoria.

SED - DCEE

17 Abril 2018

SE COMIENZAN ACTIVIDADES CON UNA CUADRILLA DE UN MAESTRO Y 4 OFICIALES

SE RETIRA RECEBO CONTAMINADO HASTA TERRENO Y EXTENDERLO PARA PODER TRANSPORTARLO HASTA LA VOLQUETA. DE IGUAL FORMA SE RETIRA LOS SOBRANTES DE PUNTOS DE LA ACTIVIDAD DE PODA MAL DESOL.

HASTA UN NIVEL DE RECEBO B 400


Dirección de obra

18 Abril 2018

SE COMIENZA ACTIVIDADES CON LA LOCALIZACION Y REPLANTEO DE LA PLACA DE ACUERDO A LOS COTAS PLANTEADAS X LA TOPOGRAFIA. SE EMPIEZA CON LA EXTENSION DEL RECEBO B400 Y DE IGUAL FORMA SE COMPACTA CON CAPAS DE 10 cm DE ESPESOR PARA HACER 3 CAPAS DE 10 cm P... HASTA EL ESPESOR DE LA PLACA DE .25 cm DE ESPESOR, SE CONTINUA CON LA SOBRA DEL RECEBO ANTERIORMENTE, SE REPLANTEA

Scanned by CamScanner


NUEVAMENTE SOBRE EL RELLENO COMPACTADO SOBRE LA ESQUINA DE LA PLACA DE ANCLAJE AL PARAMENTO DEL EDIFICIO Y NO DEL MURO PARA CONTENDER LA LINEA DE LA CUADRILLA, SE COMIENZA CON CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO QUE SEPARA LA CANCHA DE LA PLACA.

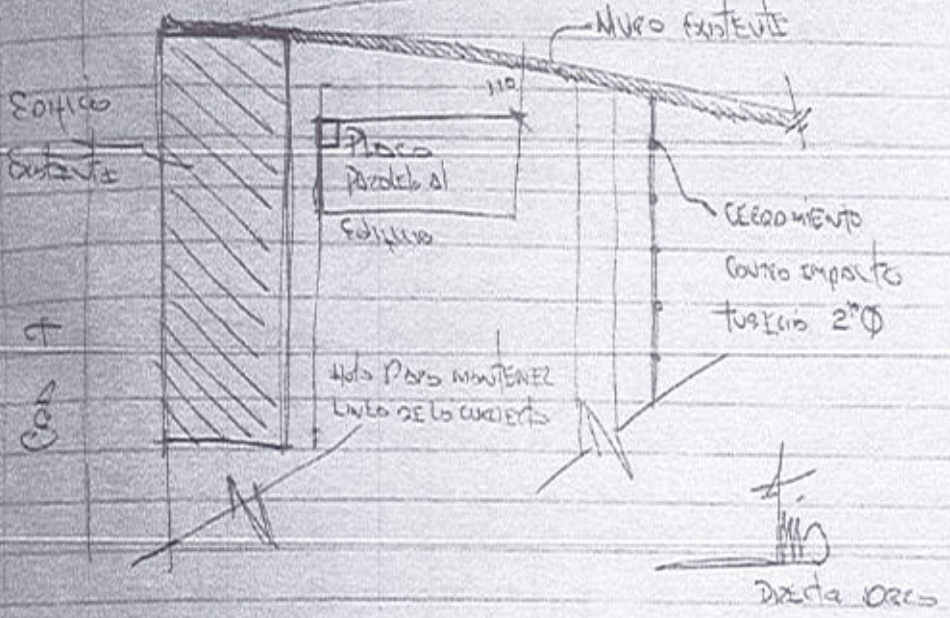


19 Abril 2018

SE COMIENZAN ACTIVIDADES CON UNA CUADRILLA DE DOS MAESTROS Y 6 AYUDAS PARA GENERAR UN PLAN DE CHOQUE EN LAS ACTIVIDADES DE ARMADO DE HIERROS Y COMPACTADO DE RELLENO B-400 DE ESTA FECHA COMIENZAN EL DESCAPOTADO EN LA PERFORACIÓN Y DEL FLUJO DE CAJA DE ANCLAJE Y ACTIVIDADES QUE NO SE ENCUENTREN DENTRO DEL CONTRATO EN MENCIÓN. SE CONTINUA CON EL CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO EL CUAL SE ESTAN UTILIZANDO TUBERIA DE 2"Ø PERO DEBE CONTINUARSE AL MISMO QUE SE ENCUENTRA INSTALADO Y GENERANDO UN REMATE EN EL CERRAMIENTO DE ESTE TRASLAPANDO UNA ALTURA DE 3 MTS QUE ES LO QUE TIENE EL CERRAMIENTO EXISTENTE CON MALLA ESTABONADA. SE HACE LA INSTALACION

DE la tubería de 3" ϕ Eléctrico de PVC DE acuerdo a los planos recolectados x ARES se debe instalado el punto sanitario de ϕ 4" los cuales cumplen con los diseños dados por ARES y de esta forma tener Licencias estas actividades para poder fundir el próximo 21 Abril de 2018 en compañía de la INTERVENTORÍA, se alargo en jornada de trabajo hasta las 7 PM. para dar cumplimiento



Dentro de los compromisos o tareas establecidos en el plan de choque se dejo la parrilla inferior de 1/2 N° 4 Empradizada totalmente igual forma se Establece dejar todos los Elementos Verticales del Reforzamiento contra impacto y/o instalados lo cual se cumplio a cabalidad, se Hace Aseo General a la OBRA

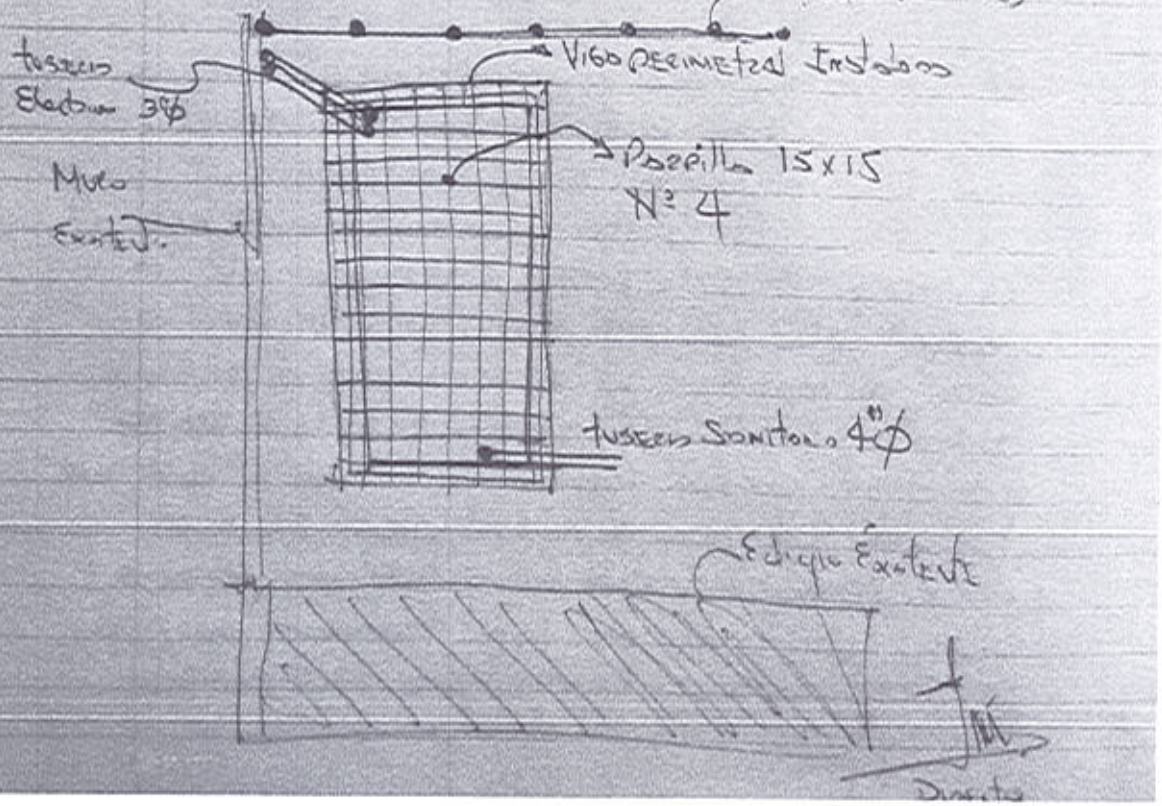

Scanned by CamScanner

20 Abril / 2018

EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ARMADO DE HIERROS DE LA SEGUNDA PARRILLA DE 5/8 C/U 15 X 15 SE COMENZARON ACTIVIDADES 6:30 AM. PERO PODER DAR CUMPLIMIENTO A LA ACTIVIDAD PROPUESTA SE CUENTA CON DOS MAESTROS Y 6 OFICIALES SE REPLANTEA NUEVAMENTE LOS PUNTOS DE SALIDA DE TUBERIA DE AGUA NEGRA DE 4"Ø Y LA SALIDA DE LA TUBERIA ELECTRICA DE 3"Ø Y SE DA COMIENZO A LA ARMADA DE LA PARRILLA DE IGUAL FORMA EL CONTRATISTA DE LA MALLA SANDA TRAPECIO CONTINUO EN LA UNION DE LOS ELEMENTOS VERTICALES Y SE EJECUTA EN SITIO PARA DAR CUMPLIMIENTO EL SUBCONTRATISTA DE GAS NATURAL EMPIEZA ACTIVIDADES DE UBICACION DE CAJAS 45X45X25 EN LOS PUNTOS DEL EDIFICIO Y EN NICHO DE MEDIDORES A LOS PLANOS SUMINISTRADOS POR ARES

SE PLANTEA ACTIVIDADES HASTA LAS 7 PM. PARA PODER CUMPLIR CON LA META DE PODER FUNDIR CONCRETO PARA LAS 9 AM DEL SABADO

SE CULMINO ACTIVIDADES DE ARMADO A LAS 5 1/4 LISTO PARA PODER FUNDIR.

Se realizo revision de acero de refuerzo para vigas de amarre para placa y acero de refuerzo para placa. Cumple con las dimensiones del esquema de vigas y los refuerzos y flejes estan acorde al despiece. En cuanto a la placa se cumple con las dimensiones y los refuerzos cumplen con el despiece.

Se solicita al contratista prever lluvias durante la fundida manteniendo en sitio los carpas


Se realiza recorrido para determinar la instalacion de la red de gas. partiendo del punto norte del cerramiento y el lindero. atravesando el cuarto y llegando al sitio.

Ing. [illegible]
Interventoria

Scanned by CamScanner


21 ABRIL 2018

Dando cumplimiento al plan de contingencia se llego a las 6 AM pero comenzar labores con 2 maestros y 6 ayudantes la bomba eyectora de concreto llego a las 6:30 AM. se instalo la tuberia para el bombeo llego la primera mixer 6:35 AM. y se comenzo a descargar a las 7:40 AM se dejo la muestra para los cilindros de pruebas de igual forma se hace pruebas slom: asentamiento dando 5" ø la cual cumple c se extiende el concreto llenando primero las vigas y luego la placa, la segunda mixer llego 650 AM y comenzo a descargar a las 8:27 AM. terminando actividades de fundida de placa 10 AM. se utiliza el concreto restante para fundir en placa de 10. Espesor por donde va la tuberia sanitario, se hacen dados en la compuerta de acceso para mejoramiento del acceso una placa de 10 con malla de electrosoldada de igual forma se estan realizando actividades de chequeamiento contra impacto - pinturas se hace acometida del Gas instalando la tuberia de 1" ø cobre cal. L se hacen regatos puntos del sobre para incrustar la tuberia y protegida con un conduit PVC se hacen soldaduras en la zona verde para tuberia de gas

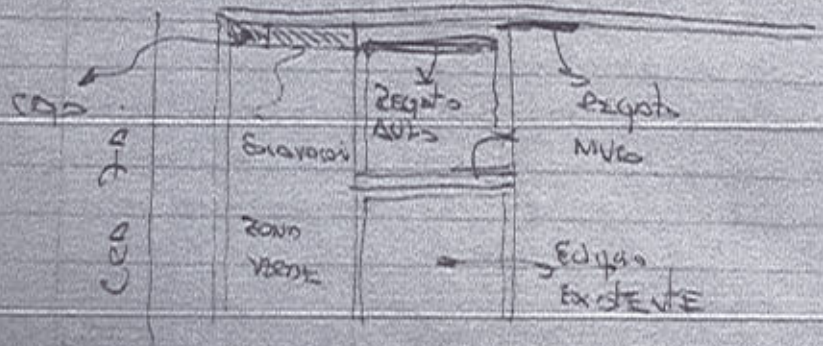

Scanned by CamScanner

Ya finalizando actividades se comienza hacer aseo general de las obras terminando actividades a las 4:30 pm
tambien se da primera mano de pintura a la malla contra impacto.



Se solicita la entrega de la estructura de cubierta (planos despiece y recomendaciones) para la verificacion de la propuesta frente al cumplimiento de la norma y revision de los elementos propuestos

Ing. Residente
Interventoria

Scanned by CamScanner

Bitacora
Colegio
Don Bosco
IV

18

MARZO 21 DE 2019

Se continua con labores de excavacion sobre trampa de grasas, remocion de material, se continua con armado de acero sobre zapata de muro de contencion, se recibe visita de supervision y acompañamiento por parte del ingeniero de obra encargado por el contratista, se continua con [redacted] demolicion de concreto hallado en trampa de grasas y sobre la viga.

en obra se laboran con una cuadrilla conformada por Maestro, 4 dos ayudantes y un oficial ayudante [redacted] de armado de acero.

Residente


MARZO 28 DE 2019

-Por recomendacion de supervisor de contrato de la secretaria de obras se recibe visita de parte del contratista [redacted] para replanteo y ubicacion de coordenadas correspondientes a la zona de contención, sin embargo ellos mediante circular indican que requieren para la ejecucion de dichas labores que se encuentren armado el acero de la placa para dejar embebidas. Las acometidas, dentro de la programacion del contratista dicha actividad no ha sido liberada por lo tanto se programara una nueva visita por parte de [redacted] en cuanto el acero de la placa se encuentre armada.


- se recibe visita por parte de la interventoria directa de obra, y residente de obra en donde se realizan actividades de armado y amarre de acero en zapata de muro, acometidas electricas sobre placa, remocion de residuos de excavacion desde el area de trabajo, instalacion de tuberia de PVC electrico para gas - [redacted] salida en Unidades de muro de contención.

Scanned by CamScanner

El dia de hoy se hace la finalizacion de la liberacion del lado corto del muro de contencion. Se realize la revision de la placa y se solicita al contratista realizar las observaciones referentes a la distribucion de los aceros de la parrilla inferior y cumplir con la especificacion del plano.



- Se accede a concepto del ingeniero hidraulico del contratista para analisis de ubicacion de una nueva caja de inspeccion en el trayecto de la acometida hacia la trampa de grasas, determinando que al conservar la pendiente del 1% se puede permitir el uso de semicodo

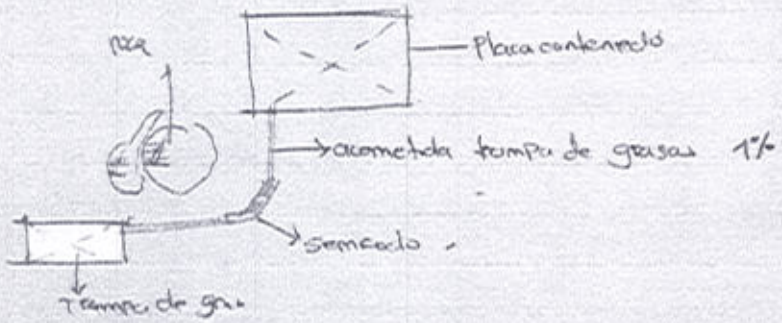


- Se deja constancia de que el dia 21 de marzo se dejaron 5 varillas de 5/8 con longitud de 2mts y no se encuentran en obra al dia siguiente al comienzo labores

Scanned by CamScanner

Marzo 23/2018

Se realizan actividades de armada de vigas de placa de contrapiso, se plomea y se nivela el encofrado del muro de contención de igual forma se acaba de armar los hierros de la zapata y el muro de contención que fueron abrid de mayor cantidad autorizada por la interventoria 6.30 x 1.30. Zapata y muro 1.10 x 6.30 E.

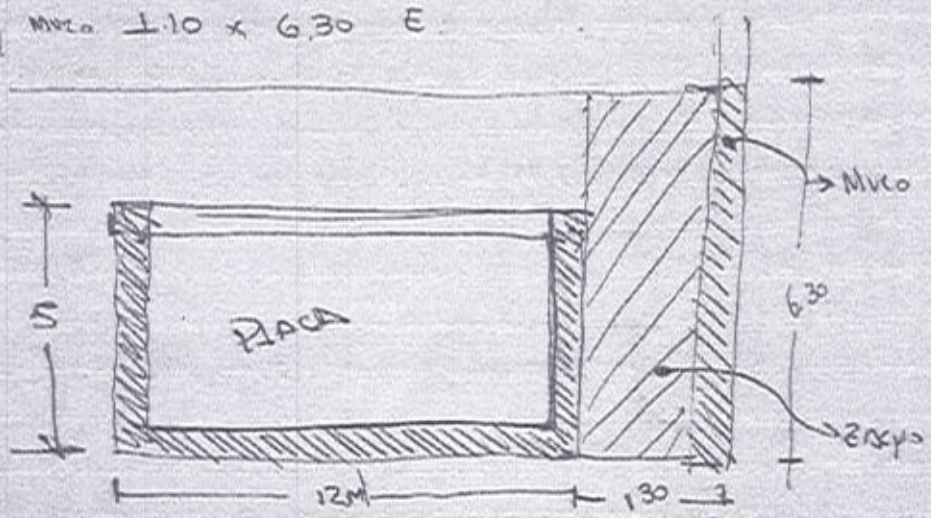


Vigas que ya se encuentran armadas faltan ya estan listas para fundir
se programa concreto para el dia 23/3/18 de acuerdo al compromiso y a la logistica de la Empresa.
El Inspector de interventoria hace observaciones sobre los hierros los cuales fueron acatados por el contratista aumentando unos hierros que no estaban contemplados ya que de esta parte del muro no hay diseño y se tomo los mismos parametros estableciendo en el diseño del muro y recomendaciones del Ingeniero Estructural


Scanned by CamScanner

MARZO 24 / 2018

COMENZAMOS ACTIVIDADES COMO TODOS LOS DIAS 7 AM
EL DIA ESTA LLUVIOSO.. TENEMOS PROGRAMADO
CONCRETO DE 3000 PSI A LAS 10 AM Y 11 AM
DE LA CONCRETERA TRIUNFO CONCRETO SE REVISA
EL ENCOFRADO Y SE DAN LOS ULTIMOS REQUERIDOS
LA LOGISTICA ESTA LISTA SE COLOCAN PUNTALES
EN EL MURO PARA REFORZARLO X SUGERENCIA DE LA
INTERVENTORIA (INSPECTOR)
SE INSTALAN ABRAZADERAS EN EL MURO DE
CONTENCION QUE VA CONTRA LA RAMPA
EL INSPECTOR DE INTERVENTORIA ORDENA
COLOCAR UN AISLAMIENTO EN EL MURO DE CONTENCION
SE PROCEDE A INSTALARLO POR PARTE DEL CONTRATISTA
RECOMIENDA LA INTERVENTORIA QUE SEA EN ICOPOR
DE 1 CM.
SE PROCEDE A SECARLO SOBRE EL LA ZAPATA
EL AGUA LLUVIA QUE SE ENCUENTRA PARA
MANTENER EL AREA SECA

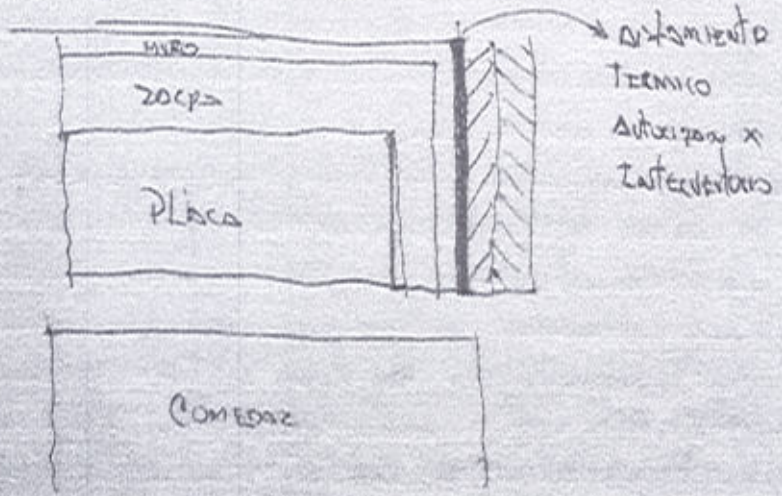

LISTADO DE ALAMBRE ADICIONAL PARA ZOCALO QUE
NO ESTAN CONTEMPLADOS DENTRO DEL DISEÑO Y LOS
AUTORIZO INTERVENTORIA (INSPECTOR)
FUERON 24 PUNTALES 9/8 LONGITUD DE 1.44m
LA MENCIONADA APARECE 8 DE ESTOS PUNTALES
CANTIDAD QUE SE UNIO PARA COMPLETAR LA LONGITUD
DE LOS MUROS



INSPECTOR DE INTERVENTORIA

Scanned by CamScanner

Se limpia el fierro de las zapatas antes de fundir

Por parte de interventoria se hace el respectivo chequeo del acero para el muro de contención dando el aval para su fundida. Se recomienda un buen vibrado y curado

Marzo 26/18

Se reconoce el muro de contención, evidenciando que la cara a la vista se encuentra hormigueado, por lo cual se solicita presentar alternativas para mejorar el acabado. Debido a las lluvias del fin de semana se repelentan los niveles y el estado del recebo instalado, solicitando la renivelacion del mismo y recompactado. Adicionalmente se solicita demoler el concreto sobrante del muro que fue instalado en la viga de fondo que a la fecha no ha sido liberada.

Residente interventoria.

Marzo 27/18

Se recuerda al contratista que en vista que se esta armando y amarrando el acero de la placa sin haber demolido el concreto sobrante que depositaron en una de las vigas; la interventoria no aprobara la fundida de la placa hasta tanto no se ejecute dicha actividad, teniendo en cuenta que no se deja distancia entre la viga y la casa, y ademas esta viga no habia sido liberada por parte de interventoria

Ingeniero de interventoria


Marzo 28/2018

Visita de avance de obra del contratista, se realiza punto a la entrada de obra el estado del armado del acero, se encuentra laborando una cuadrilla conformada por 1 maestro, 4 oficial y 2 ayudantes.

Se recibe tanque rotoplast 2000 Lts segun especificaciones dadas por siguiendo del contrato. Para tramite de garantia

T = 12°C — vientos fuertes llovizna, sobre placa fundida labores

DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES HECHAS POR EL INSPECTOR DE OBRA DE LA INTERVENTORIA SE PROCEDIO A DEMOLER EL CONCRETO QUE SE HABIA INSTALADO EN LA VIGA DE LA PLACA DE ESTA FORMA DEJANDO LIBRE LOS HIERROS DE LA VIGA PARA PODER FUNDIR UN CONCRETO HOMOGENEO - DE IGUAL FORMA SE HACE LA DILATACION CON POLIPROPILENO DE 2 cm. EN UN AREA DE TRENTA Y CUATRO (34 ML) METROS LINEALES LOS CUALES SE PIDE A LA INTERVENTORIA SEA CONTEMPLADO ESTA ACTIVIDAD

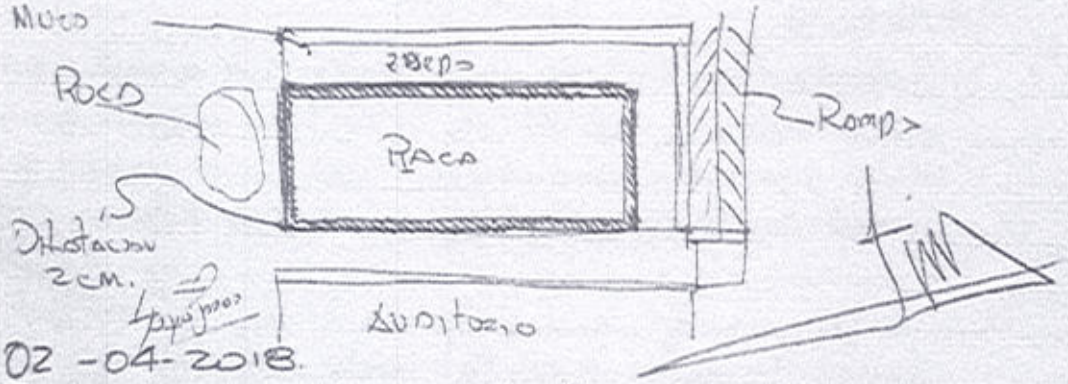

02-04-2018.

Se hace recorrido x parte de la SED, observando y solicitando a la interventoria, se informe como se hara en el proceso constructivo para la conexion de la tuberia a los tanques para la atrompagrosa, si la tubona instalada se encuentra a 28cm.

Se solicita de manera inmediata, retirar el agua q' se encuentra apozada en la excavacion del tanque, dado q' el material se encuentra saturado. Se solicita a la interventoria y contratista se informe cual sera el plan de contingencia a implementar en el frente de obra, dado el atraso q' se presenta en las actividades placa (armado, resane y fundida). Se solicita verificar la calidad, humedad y proceso de fundida para la placa, dado los apozamientos presentados.

De acuerdo a lo observado hecho por parte de la supervisión se da
fe de los mismos estan de acuerdo a lo solicitado y exigido del formulario
Compromiso por la EMPRESA y RECOMENDADO x USTEDES DE 26001 Ferro
NUESTRING. Hidrosanitario y Técnicos verificaron que se cumplieron con las
especificaciones técnicas del proponente. El Apuntalamiento de Redes
Hubo se procedió y retiros del sitio se tomaron las medidas
pertinentes (cubrir cortes el sitio de trabajo). y con respecto
al acto que se anuncia se le informe a los interventores
que la empresa Esta cumpliendo con los procedimientos establecidos y
Delo activos de la placa y Nico son efectivos que se estaban
Dentro de la cotidianidad practicas del sitio x interventoria JEO

03-04-18

La interventoria solicita al contratista que se cumplan con las pruebas de calidad de los materiales,
ya que a la fecha se a solicitado dos veces que sean fallados los cilindros de muestra del
concreto correspondiente al mes de contratacion los cuales ya tienen una edad de 10 días.
Se recuerda que estos procedimientos se deben hacer a los 7, 14 y 28 días.

Impuesto de interventoria

Yo se recibio Los pesos de la cotización se hacen llegar a la
subinterventoria el día 3 de Abril del año en curso

04-04-18

La interventoria da liberacion de acero para placa en donde todo se encuentra de acuerdo
a los planos y por tanto se da el aval para su fundida, recomendamos buen vibrado.
Hubo acompañamiento por parte de la interventoria en la fundida de la placa

Impuesto de interventoria

Se realizo el procedimiento de fundida de placa durante todo
el día culminado con exito

05-04-18

La interventoria solicita al contratista señalizar espacios donde se puedan presentar posibles accidentes, como por ejemplo, la excavacion para el tanque atrapa grasas, asi
mismo no dejar a un lado el aseo y limpieza de la obra

Impuesto de interventoria

Scanned by CamScanner

se procede a demarcar los sitios de peligro y a diferenciados por parte del contratista con cinta de peligro y cercar los sitios críticos 06-04-18

1. En vista de que el contratista esta haciendo un cambio en la tubuerea ubicación del tanque séptico, la interventoria no autoriza cambios en esta actividad por lo cual solicita que se detenga dicha actividad. Se sugiere realizar un sistema como por ejemplo tablestacado para evitar que el talud falle.

2. La interventoria solicita los resultados de las pruebas de concreto que el laboratorio se llevo el 03-04-18. Recordando al contratista que se deben seguir ejecutando esta actividad ya que aplica a la calidad de los materiales.

Interventoria


La empresa acoge la recomendación del Inspector de tablestacado pero evitar que el cajón se desestabilice y procede a realizar estas actividades,
El cambio de sitio del tanque de grasas es autorizado x el objeto de obra para un mejor funcionamiento del sistema y por las especificaciones técnicas del fabricante de igual forma se consultaron al Ing. Hidraulico de la empresa para soportar el cambio y para aprovechar las pendientes establecidas de acuerdo a la entrada y salida del tanque séptico también se justifico por la parte de la piedra o roca del sector que no permitio excavar para llegar a la cota profunda del tanque de grasas y se procede a instalar

07-04-18

El comienzo actividades con una charla de 1 Hora- 20 Operarios y 4 Ayudantes donde se programa la actividad de instalación del tanque séptico, tomamos niveles de acuerdo al punto de salida de la placa tomamos como nivel

Scanned by CamScanner

±0.00 DE MAS y con una pendiente del uno (1) % para llegar al nivel de entrada del pozo septico 124 Altura y boca de entrada .90 mts nivel de salida .85 m/s Revisados estos niveles se procede a instalar el pozo septico

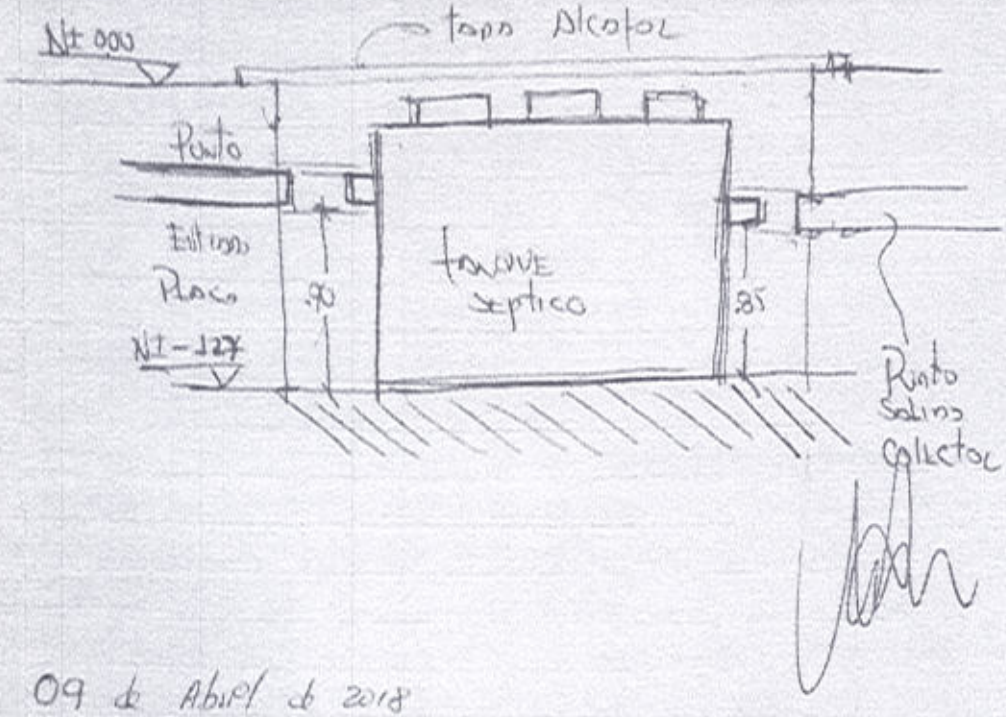

09 de Abril de 2018


Se realiza visita x parte del asesor de la secretaria hidraulico. De igual forma el asesor hidraulico de la firma Aranofis. Se realiza prueba hidraulica dando 30 PSI suficiente para llenar tanques elevados y se encuentran encima del tanque, se debe colocar el bypass de cuarenta (paso directo) y conexion de la bajante de aguas lluvias del tanque y debe llegar a la nueva caja lluvias.

Julio B
SDO-DCCEE

Scanned by CamScanner

10 de Abril de 2018

Comenzamos actividades con la visita del directo de obra arquitecto Luis Maria Parada Fonseca, el cual dio unas observaciones constructivas para la obra, y se da inicio al dia laboral con el siguiente personal 1 Maestro, 1 Oficial, 2 ayudantes Se da inicio a la terminacion de la canal de aguas lluvias, se da construccion al nicho, se inicio construccion de Muro para contencion de tuberia ~~electrica~~ Hidraulico de 1" Pulgadas. Se suspenden las actividades del dia por motivo de lluvias torrenciales.

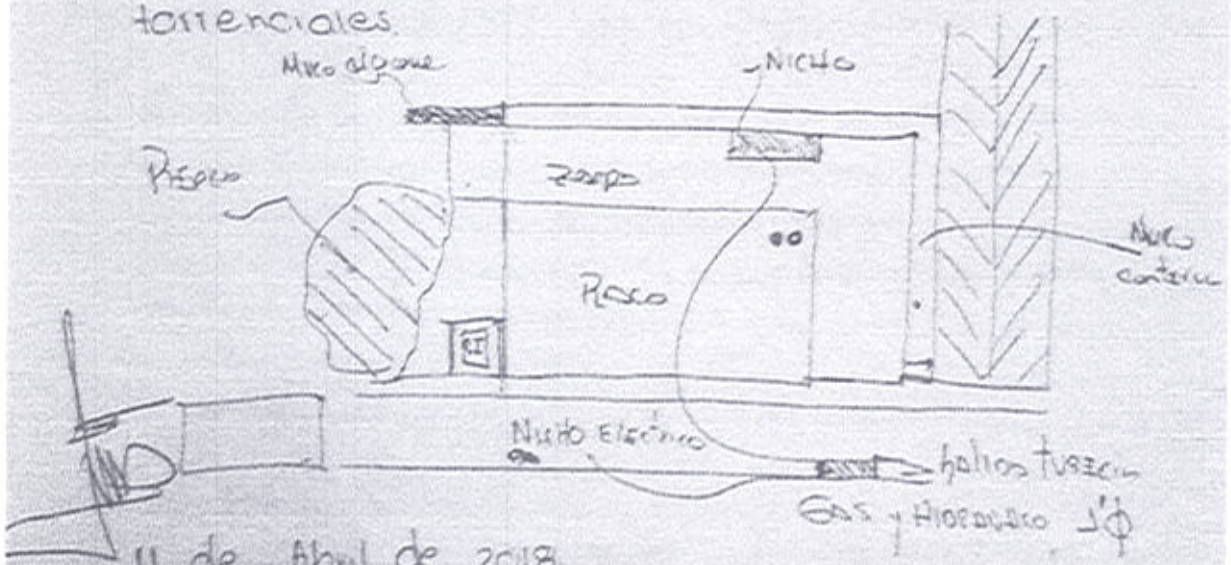

11 de Abril de 2018

Siendo las 8:30 AM, se da inicio a las actividades con la visita del director de obra arquitecto Luis Maria Parada Fonseca, se continua con la construccion del nicho se funden las placas y se da terminacion al nicho, se suspenden las actividades por lluvias torrenciales.

12 de Abril de 2018

Iniciamos actividades bajo la visita del director de Obra Arquitecto Luis Parada, se realiza afinamiento del suelo para instalar tuberia de 4 Pulgadas, se da inicio al aseo

Scanned by CamScanner

de la obra, nuevamente se suspenden actividades por lluvias.

13 de Abril de 2018.
Comenzamos actividades con visita del Director de obra Arquitecto Luis Parada, se realizo aseo general y se termino de pegar el adoquin. En las diferentes otros que hubo necesidad de levantar para la colocacion de la tubería sanitaria de conexion a la trampa de grasas y otro a la tubería de gas.
SE TERMINAN ACTIVIDADES X. LLUVIAS EN EL SECTOR QUEDO POR REALIZAR LO TAPA DE LA TRAMPA DE GRASAS Y LOCALIZACIÓN DE CIRCULACIÓN CON EL CONTENEDOR

14 de Abril de 2018

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE ASEO GENERAL COLOCACION DE CAJA PARA MEDIDOR DE GAS solicitado X LA SED PARA DEJAR SEPARADO LO QUE CORRESPONDE A OBRA CIVIL APERTURA CAJA Y RESANES DE INSTALACIÓN DE TUBERIA DE POLIPROPILENO - SE DEJA CONTADOR PARA CONSUMO ACTUAL Y OTRO CONTADOR PARA EL CONTENEDOR QUE SE VA INSTALAR, SE RECOGE TODO LO QUE ESTABA EN EL PATIO QUE SE HABÍA TOMADO COMO CAMPAMENTO

Scanned by CamScanner

16 de Abril de 2018.
Se solicita al contratista las obras de acometida (obra civil) para la conexión del gas y el tramite ante la entidad respectiva

Se recibio resultados de concreto de 7 y 14 dias para la placa de e=0.25m para la cimentacion del contenedor que instalara el contratista AEO. El resultado es 7 dias 2617 PSI
SE LEVANTA ACTA PARA ENTREGAR LA PLACA A LA FIRMA AEO LA CUAL ESTA FIRMADA X INTERVENTORIA Y SEO Y CONTRATISTA
17 Abril DE 2018

SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE ASEO GENERAL EN EL COMPONENTE Y ZONAS VERDES LO QUE CORRESPONDE A PAISAJISMO Y EXTENCION DE TALLOS NEGROS. PERO NIVELAR LOS ZONAS INTERVENIDAS EN LAS ≠ EXCAVACIONES

18 Abril DE 2018

SE HACEN ACTIVIDADES DE ASEO GENERAL

19 Abril DE 20
POR RECOMENDACION DE LA SUPERVICION DE LA INTERVENTORIA SE HACE LA INSTALACION DE LA CAJA DE MEDICION DE GAS Natural Y QUEDANDO LISTO YA LA ACOMETIDA Y EL REGULADOR DE CASA DE 1'' PULGADAS QUEDA PENDIENTE INSTALACION DEL MEDIDOR YA SOLICITADO A GAS Natural Y LOS RESPECTIVOS TRAMITES PARA LA INSTALACION POR PARTE DE GAS Natural

Scanned by CamScanner

30

21 Abril 2018

SE HACE visita por parte oficina DE OBRAS para verificar que no falte NADA por EJECUTAR por parte DE los suministrantes, los cuales DETALLAN todo lo que faltan

23 Abril 2018

SE DA ORDEN DE PINTAR EL WC. QUE SE utilizo como COMPARTIMIENTO y DE COLOCAR los RELOJES QUE HACEN falta EN LA CAJA DE INSPECCION QUE SE ENCUENTRA EN EL WC la cual se RECIBIO Rota SEGUN REGISTRO FOTOGRAFICO

27 Abril/18

La Supervision de la SED solicita al contratista la presentacion del concepto (en balcon - documento escrito) de la estructura que se va a instalar para la cubierta en policarbonato, asi mismo se solicita la entrega de la ficha tecnica del policarbonato a instalar.

Se debe corregir la tapa de aguas lluvias (caja trasladada) que presenta inspexion. Se debe corregir el filo superior del muro que se encuentra mal desplomado en la esquina del muro de contencion se debe mejorar la recoleccion de aguas ya que presenta apozamiento

Se solicita revisar la presion del agua de la cocina ya presenta del punto hidraulico, toda vez que se abre la llave y pierde presion

Scanned by CamScanner

la cocina. Se solicita que el tanque utilizado como campamento debe ser entregado en optimas condiciones, se debe colocar la rejilla del sifon y reparar la tapa de la caja de inspección.
Se solicita hacer entrega de fichas y certificaciones del cableado instalado para la acometida electrica y tuberia EMT.

Residente Interventoria

28 Abril 2018

De acuerdo a las observaciones presentadas por la IVC adriana velandia sugerencias de la secretaria de educación, se solicita concepto al ingeniero estructural para que de concepto tecnico sobre la estructura que se coloco en el colegio don bosco, se corrigio la tapa de la caja de aguas lluvias transformadas para evitar el tropezon, se corrigieron los filos del nicho se volvio a pañetar el muro que no continuidad al muro de contencion, se hizo limpieza a la tuberia que recolecta las aguas lluvias del muro de contencion para evitar taponamientos se van hacer las pruebas con respecto a las pozos del frente de la cocina, el barro que fue utilizado como campamento se lo funde nuevamente la tapa a la caja de inspecion y se cambio el sifon y la rejilla, se solicita al proveedor la certificacion del cableado empleado x la empresa, se corrigieron todas las observaciones presentadas por la SED y la interventoria, Gracias.

Scanned by CamScanner

Anexo 3

PMT

Colegio Agustin Fernandez

Anexo 3

PMT

Colegio Agustin Fernandez

COI No. 16
ABRIL 19 DE 2018
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCION 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCION DE CONTROL Y VIGILANCIA

No.	DIRECCION DE LA OBRA		CONTRATISTA	FECHA		HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	No. CONTRATO	OBSERVACIONES	AUTORIZADO	LOCALIDAD	ING. RESPONSABLE	No RADICADO SDM
	INICIO	FIN		INICIO	FIN								
17276	CL 69 No 47 46		EDIFICIO SAN NICOLAS I	20-abr-18	21-jun-18	06:00-18:00	06:00-18:00	PRIVADO	LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI No 1 COI 06-18 - NUMERAL 6423 PMT PARA LA ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS DE OBRA COSTADO NORTE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE CARGA FUERA DEL PREDIO	SI	TEUSAQUILLO	JHON J. FLOREZ B	107851-2018
17277	AK 7 No 155 20		EMPRESA ASOCIATIVA DEL TRABAJO AMENOFIS	20-abr-18	17-may-18	07:00-11:00 14:00-17:00	07:00-11:00 14:00-17:00	PRIVADO	LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS PESADOS EN COSTADO ORIENTAL IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO	SI	USAQUEN	DANIELO CRUZ R	107620-2018
17278	CL 22 No 3 28		EMPRESA TRESESENTA S A S	-	-	-	-	PRIVADO	LA SDM NO AUTORIZA RETROALIMENTACION No 2 AL PMT AUTORIZADO EN EL COI 3-18 - NUMERAL 8045 PARA CIERRE DEL CARRIL NORTE PARA CARQUE Y DESCARQUE DE MATERIALES Y ESCOMBROS TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 17ABR-18 LA RETROALIMENTACION INDICA CAMBIO DE CONTRATISTA PERO EL FORMATO TAMBIEN PRESENTA CAMBIOS EN EL HORARIO AUTORIZADO INICIALMENTE REVISAR Y CORREGIR SE DEBEN PRESENTAR LAS OBSERVACIONES REFERENTES A LA MODELACION QUE SE ENVIARON POR CORREO ELECTRONICO	NO	SANTA FE	DIEGO F DIAZ B	97096-2018
17279	KR 49 No 106 58		EQUANIME LOGICA URBANA	-	-	-	-	PRIVADO	LA SDM NO AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 06-18 PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS COSTADO ORIENTAL TENIENDO EN CUENTA QUE NO ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 17ABR-18 PRESENTAR REGISTRO FOTOGRAFICO RECIENTE CON FECHA DE LA IMPLEMENTACION DEL PMT TAL COMO LO ESTABLECE EL CONCEPTO TECNICO No 16 Y COPIA DE LICENCIA DE CONSTRUCCION VIGENTE	NO	SUBA	DIEGO A. TORO C	107824-2018
17280	KR 49 No 106 58		EQUANIME LOGICA URBANA	-	-	-	-	PRIVADO	LA SDM NO AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 06-18 PMT PARA DE CARRIL COSTADO ORIENTAL PARA ESTACIONAMIENTO TEMPORAL PARA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL TENIENDO EN CUENTA QUE NO ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 17ABR-18 PRESENTAR REGISTRO FOTOGRAFICO RECIENTE CON FECHA DE LA IMPLEMENTACION DEL PMT TAL COMO LO ESTABLECE EL CONCEPTO TECNICO No 16 Y COPIA DE LICENCIA DE CONSTRUCCION VIGENTE	NO	SUBA	DIEGO A. TORO C	107824-2018
17281	KR 18 No 82 29		FERNANDO VERA	-	-	-	-	PRIVADO	LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL Y CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE DESCENSO DE TANQUES DOCUMENTO NO PRESENTA FORMATO COI DILIGENCIADO FLAYOS DE SEÑALIZACION CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA EN OFICINAS DE LA SDM SEDE PALOQUEMAO (KR 28A No 17A - 20 - LUNES A VIERNES DE 8:30 A 12:30 DE LA MAÑANA PISO 3)	NO	CHAPINERO	FERNEL E BONZA R	112671-2018

NORMATIVIDAD
El plan de manejo de tránsito (PMT) debe cumplir con lo establecido en el manual de señalización vial vigente

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) le recuerda que la calidad de contratista no lo exime en ningún caso del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital principalmente la reglamentación que rige la utilización del espacio público la circulación de vehículos dentro del perímetro urbano el manejo de residuos y seguridad para peatones por la ejecución de obras civiles

A. ESPACIO PUBLICO
Según Ley 769 de 2002 "Código Nacional de Tránsito Terrestre". Artículos 65 69 75 76 121 122 123 124 129 132 134 135 139 140

B. RESTRICCIÓN PARA CIRCULACIÓN DE VEHICULOS
Decreto 034 del 05 de febrero 2009 "Por el cual se establecen restricciones para el tránsito de vehículos de carga en el área urbana del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones"
Decreto 575 del 17 de diciembre de 2013 "Por medio del cual se dictan disposiciones para el mejor ordenamiento del tránsito de vehículos automotores de servicio particular por las vías públicas en el Distrito Capital y se derogan los Decretos Distritales 271 y 330 de 2012"
Decreto 520 de noviembre 13 2013 "Por el cual se establecen restricciones y condiciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el área urbana del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones"
Decreto 630 del 31 de diciembre de 2013 "Por medio del cual se modifica el Decreto 520 de 2013 que establece restricciones y condiciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el área urbana del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones"

NOTA
1. En el lugar de desarrollo de las actividades deberá permanecer copia del plano del PMT aprobado y de la autorización emitida por la SDM para la verificación por parte de las autoridades competentes en cumplimiento y la implementación del PMT
2. No se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra
3. El contratista y la interventoría son responsables solidariamente de la correcta implementación del PMT
4. En horario nocturno y/o cuando las condiciones atmosféricas lo ameritan se debe garantizar la instalación de señalización luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Concepto Técnico 17 de la SDM
5. Para excavaciones con profundidad superior a 3 5m deberán aislarse y/o cerrarse mediante muretes plásticos o metálicos
6. En caso de congestión vehicular y/o por solicitud expresa de la Policía de Tránsito deberá levantarse el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones óptimas de tránsito y seguridad vial
7. La señalización a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de señalización vial vigente
8. La longitud de transición a implementar para cierres de carril deberá cumplir las especificaciones técnicas estipuladas en el Concepto Técnico 18 de la SDM

Ing. Nicolás Adolfo Cortés Huertas
Director de Control y Vigilancia

Anexo 4

Ensayos de Laboratorio Concretos Colegio Don Bosco IV

n No. 4
de Rev.: 31-10-2016
E-023

LABORATORIO SANCHEZ FISCHER B. S.A.S.
ESTUDIO DE SUELOS - CONCRETOS Y PAVIMENTOS
CORTE Y PERFORACION EN CONCRETO

Determinación de la Resistencia a la Compresión de Probetas Cilíndricas NTC 673: 2010-02-17

de Informe:	5 de abril de 2018	Obra:	Colegio Distrital Don Bosco IV			No. de Hoja	2 de 2
nsable:	Arq. Luis Parada Fonseca.	Dirección:	Calle 91 Sur N° 4 Este 22 sur			Informe No.:	C-01
esa:	EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO AMENOFIS	Codigo de Obra:	1374	Remision N°	15732	Fecha de Remision	3 de abril de 2018

stra	Concreto Elaborado		Localización	Asent.	f'c-Diseño	Fecha	Fecha	Edad	Carga Max.	Resistencia			% de	Dimensiones mm			Masa	Densidad	Tipo
	P	O		(pulg)	kgf/cm²	Fundida	Ensayo	Días	kN	MPa	kgf/cm²	PSI	f'c	Longitud	Diámetro	Área	kg	kg/m³	Falla
\	X		Muro de Contención		210	24/03/18	03/04/18	10	381,2	21,01	214	3047	102	304	152	18145,9	12,602	2,284	5
\	X				210	24/03/18	03/04/18	10	377,9	20,29	207	2943	99	304	154	18626,5	12,251	2,164	5

Esquema de los modelos de fractura típicos.

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5 Tipo 6



Recomendaciones: _____

e Prensa:	CONTROLS	Balanza Digital:	LEXUS	Observaciones:	
:	PILOT 4 Indicación Digital	Modelo:			
ad Calibrada	1000 kN / 100 kN	Capacidad:	20kg		
rtificado:		No. de Certificado:			

Rene Guarnizo Q.
Coordinador Dpto Tecnico.

Ing. William Freddy Sierra Gil
Director Tecnico.

laboratoriosanchezfischer@hotmail.com / gestiontecnica.sfb@gmail.com
Km 2 Vía Chía - Cota Vereda Cerca de Piedra (Entrada Kalamary) CHÍA – CUNDINAMARCA
Tel: 8856523 – 3633845 - 3176574824

LABORATORIO SÁNCHEZ FISCHER B. S.A.S.
ESTUDIO DE SUELOS - CONCRETOS Y PAVIMENTOS
CORTE Y PERFORACIÓN EN CONCRETO

Determinación de la Resistencia a la Compresión de Probetas Cilíndricas NTC 673: 2010-02-17

Fecha de Informe:	13 de abril de 2018	**Obra:**	Colegio Districtal Don Bosco IV			**No. de Hoja**	2 de 2
Responsable:	Arq Luis Parada Fonseca.	**Dirección:**	Calle 91 Sur N° 4 Este 22 sur			**Informe No.:**	C-01
Empresa:	EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO AMENOFIS	**Codigo de Obra:**	1374	**Remision N°**	15732	**Fecha de Remision**	3 de abril de 2018

Muestra	Concreto Elaborado		Localización	Asent.	F'c-Diseño	Fecha	Fecha	Edad	Carga Max.	Resistencia			% de	Dimensiones mm			Masa	Densidad	Tipo
No.	P	O		(pulg)	kgf/cm²	Fundida	Ensayo	Dias	kN	MPa	kgf/cm²	PSI	f'c	Longitud	Diámetro	Área	kg	kgf/m³	Falla
1A	x		Muro de Contención		210	24/03/18	03/04/18	10	381,2	21,01	214	3047	102	304	152	18145,9	12,602	2,284	5
1A	x				210	24/03/18	03/04/18	10	377,9	20,29	207	2943	99	304	154	18626,5	12,251	2,164	5
1B					210	24/03/18	07/04/18	14	405,2	22,33	228	3239	108	300	152	18145,9	12,308	2,261	1
1B					210	24/03/18	07/04/18	14	424,1	23,07	235	3346	112	301	153	18385,4	12,324	2,227	5
1C					210	24/03/18	21/04/18	28											
1C					210	24/03/18	21/04/18	28											

Esquema de los modelos de fractura tipicos.

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5 Tipo 6



Recomendaciones. _____

Maquina o Prensa:	CONTROLS	Balanza Digital:	LEXUS	**Observaciones:**	
Modelo:	PILOT 4 Indicación Digital	Modelo:			
Capacidad Calibrada:	1000 kN / 100 kN	Capacidad:	20kg		
No. de Certificado:		No. de Certificado:			

Rene Guarnizo Q.
Coordinador Dpto Tecnico.

Ing. Wilmar Freddy Sierra Gil
Director Técnico.

LABORATORIO SÁNCHEZ FISCHER B. S.A.S.

ESTUDIO DE SUELOS - CONCRETOS Y PAVIMENTOS
CORTE Y PERFORACIÓN EN CONCRETO

Determinación de la Resistencia a la Compresión de Probetas Cilíndricas NTC 673: 2010-02-17

Fecha de Informe:	13 de abril de 2018	**Obra:**	Colegio Districtal Don Bosco IV			**No. de Hoja**	2 de 2
Responsable:	Arq Luis Parada Fonseca.	**Dirección:**	Calle 91 Sur N° 4 Este 22 sur			**Informe No.:**	C-02
Empresa:	EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO AMENOFIS	**Codigo de Obra:**	1374	**Remision N°**	15933	**Fecha de Remision**	7 de abril de 2018

Muestra	Concreto Elaborado		Localización	Asent.	f'c-Diseño	Fecha	Fecha	Edad	Carga Max.	Resistencia			% de	Dimensiones mm			Masa	Densidad	Tipo
No.	P	O		(pulg)	kgf/cm²	Fundida	Ensayo	Días	kN	MPa	kgf/cm²	PSI	f'c	Longitud	Diámetro	Área	kg	kgf/m³	Falla
2A	x		Contrapisos		210	03/04/18	10/04/18	7	331,7	18,04	184	2617	88	306	153	18385,4	12,487	2,220	3
2B	x				210	03/04/18	17/04/18	14											
2C					210	03/04/18	01/05/18	28											
3A			Lado Rampa		210	03/04/18	10/04/18	7	369,9	20,39	208	2956	99	302	152	18145,9	12,556	2,291	5
3B					210	03/04/18	17/04/18	14											
3C					210	03/04/18	01/05/18	28											

Esquema de los modelos de fractura tipicos.

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5 Tipo 6



Recomendaciones. _____

Maquina o Prensa:	CONTROLS	Balanza Digital:	LEXUS	**Observaciones:**	
Modelo:	PILOT 4 Indicación Digital	Modelo:			
Capacidad Calibrada:	1500 kN / 150 kN	Capacidad:	2Kg		
No. de Certificado:		No. de Certificado:			

Rene Guarnizo Q.
Coordinador Dpto Tecnico.

Ing. Wilmar Freddy Sierra Gil
Director Técnico.

Anexo 5
Planillas de Pago de Seguridad Social

compensar miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830230664-4	Empresa Asociativa de Trabajo Arandis		carrera 42 88 81 NUEVA	4565329	salarandis@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B – Ninos de 200 o			BOGOTA, D.C.	BOGOTA, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA							
PERIODO COTIZACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
SALUD		DIFERENTE A SALUD					
MES	AÑO	MES	AÑO				
4	2018	3	2018	E	13/04/2018	26553089	$3.905.800

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y nombres	Colilla	Bonifica	Extranjero	Cotiza en otro país	Cotizante exterior	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Incapacidad	Cód. AFP	IBC AFP	Cot. adicional	Voluntaria Afiliado	Voluntaria Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	ISC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1223176318	PARADA SERNA LUIS DAVID	1	0			X																	230301	781.242	12.500	0	0	0	0	EPS010	781.242	87.100	14-01	781.242	1	4.150	CCF24	781.242	31.300	781.242	15.756	23.634	0	0
2	CC	1144099691	MARTINEZ CASTELLANOS SERGIO DANIEL	1	0			X	X																230301	390.621	42.500	0	0	0	0	EPS074	390.621	43.500	14-01	390.621	1	2.100	CCF24	390.621	15.700	390.621	360	11.835	0	0
3	CC	1014017570	BORJA VILLAQUIRA JUAN SEBASTIAN	1	0			X																	230301	781.242	12.500	0	0	0	0	EPS010	781.242	87.100	14-01	781.242	1	4.150	CCF24	781.242	31.300	781.242	15.756	23.634	0	0
4	CC	1090371741	ROLON ERAZO JOSE FERNANDO	1	0			X	X																230301	130.207	20.900	0	0	0	0	EPS041	130.207	18.900	14-01	130.207	1	650	CCF24	130.207	4.900	130.207	2.756	4.866	0	0
5	CC	1069010234	CORREA GARCIA JENNIFER	1	0			X																	230301	900.000	14.400	0	0	0	0	EPS037	900.000	112.500	14-01	900.000	1	4.650	CCF24	900.000	36.000	900.000	18.000	27.000	0	0
6	CC	51164229	[illegible]	1	0			X																	230301	781.242	12.500	0	0	0	0	EPS010	781.242	87.100	14-01	781.242	1	4.150	CCF24	781.242	31.300	781.242	15.756	23.634	0	0
7	CC	79260771	VALENCIA CUARTAS CARLOS ARTURO	1	0			X	X																230301	390.621	42.500	0	0	0	0	EPS074	390.621	43.500	14-01	390.621	1	2.100	CCF24	390.621	15.700	390.621	360	11.835	0	0
8	CC	79180408	PARADA FONSECA LUIS MARIA	1	0			X																	230301	3.450.000	55.000	0	0	1.300	17.500	EPS018	3.450.000	431.300	14-01	3.450.000	1	16.150	CCF24	3.450.000	138.000	3.450.000	83.000	103.500	0	0
9	CC	79360943	RAMIREZ MESA MARIO CESAR	1	0			X	X																230114	781.242	12.500	0	0	0	0	EPS010	781.242	87.100	14-01	781.242	1	4.150	CCF24	781.242	31.300	781.242	15.756	23.634	0	0
10	CC	79439968	GARCIA VARGAS SERGIO PABLO	1	0			X	X																230301	390.621	42.500	0	0	0	0	EPS034	390.621	43.500	14-01	390.621	1	2.100	CCF24	390.621	15.700	390.621	360	11.835	0	0
11	CC	79726070	BORJA FREDDY ANDREY	1	0			X																	230301	781.242	12.500	0	0	0	0	EPS044	781.242	87.100	14-01	781.242	1	4.150	CCF24	781.242	31.300	781.242	15.756	23.634	0	0
12	CC	80214242	CONTRERAS VILLAMIL JUAN CARLOS	1	0			X																	230301	781.242	12.500	0	0	0	0	EPS010	781.242	87.100	14-01	781.242	1	4.150	CCF24	781.242	31.300	781.242	15.756	23.634	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830230564-4	Empresa Asociativa de Trabajo Amanoti		carrera 42 88 83 N JEVA	4065329	salamanoti@gmail.com	
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B – menos de 200 c			BOGOTA, D. C.	BOGOTA, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA							
PERIODO COTIZACION				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
SALUD		DIFERENCIA SALUD					
MES	AÑO	MES	AÑO				
4	2018	3	2018	E	13/04/2018	26653089	$3.905.800

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	519.800	0		0		0	0	0	0	519.800	6
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	112.500	0		0		0	0	0	0	112.500	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	16.300	0		0		0	0	0	0	16.300	1
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	97.700	0		0		0	0	0	0	97.700	1
EPSC34	Ráscalo SGP Capital Salud	900298372-3	146.700	0		0		0	0	0	0	146.700	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
23-201	Protección (Ruta + Protección)	800227339-0	500.900	0	0	0	0	1	0		500.900	4
23-301	Porvenir	800224808-8	1.029.400	0	0	17.300	17.300	1	0		1.064.000	7
25-14	Colpensiones	900336004-7	125.900	0	0	0	0	1	0		125.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	54.400				54.400	0	0	54.400			544	54.400	12

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	386.000	0	0	386.000	12

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
193.500	0	0	193.500	12
ICBF				
289.900	0	0	289.900	12
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IDE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.293.000	1.293.000
Pensión	3	1.539.000	1.539.000
Riesgos Laborales	1	54.400	54.400
CCF	1	386.000	386.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	289.900	289.900
MEN	0	0	0
SENA	1	193.500	193.500
TOTALES	12	3.905.800	3.905.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Señor(a): LILIANA ORTIZ BASTO
No. Identificación: CC 60396627
Dirección: CALLE 166 NO. 9-45 TORRE 3 APTO 1312
Teléfono: 2707102 **Fax:**
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla 8326499175

CITE ESTE NUMERO PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Respetado señor(a)

Con atento saludo, informamos que Compensar Operador de Información procesó el siguiente pago realizado por medio de:

compensar | miplanilla.com

Nombre	LILIANA ORTIZ BASTO
Tipo y Número de Identificación	CC 60396627
Número Planilla	8326499175
Fecha de Pago	4/06/2018
Número de Autorización de Pago	26499175
Canal	1002
Valor Corrección	50

Número de Días	1
Periodo Cotización Salud	Abril 2018
Periodo Cotización Pensión	Abril 2018
Periodo Cotización Caja	Abril 2018
Número de Administradoras	2
Total Pagado	$475.800
Total Interes Mora	$1.600

CODIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NUMERO DE AFILIADOS
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	$268.500	1
EPS005	Sanitas EPS	$210.000	1

TIPO DOC	CC
NO. DOCUMENTO	60396627
APELLIDOS Y NOMBRES	ORTIZ BASTO LILIANA

COD EPS	COD AFP	UPC	SALARIO	INGRESO	DIAS INCAPACIDAD	DIAS LICENCIA	COTIZACION	COTIZACION INCAPACIDAD	COTIZACION LICENCIA	VALOR INCAPACIDAD
EPS005	230201	0	1.674.000	1.674.000	0	0	289.300	267.900	0	0

TIPO DOC	
NO. DOCUMENTO	
APELLIDOS Y NOMBRES	

COD EPS	COD AFP	UPC	SALARIO	INGRESO	DIAS INCAPACIDAD	DIAS LICENCIA	COTIZACION	COTIZACION INCAPACIDAD	COTIZACION LICENCIA	VALOR INCAPACIDAD

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
N	900599008-6	CREAR Proyectos y Soluciones de Ingeniería S.A.S	cra 15 97-48 of 230	8057320	cnlaingeniera@creasp.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	D = Ley 1429			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA							
PERIODO COTIZACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
SALUD		DIFERENTE A SALUD					
MES	AÑO	MES	AÑO				
4	2018	3	2018	E	04/04/2018	29698365	$832.100

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Suspilado	Pensionado	Extranjero sin obligación de cotizar pensión	Colombiano en el exterior	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP		Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1014161489	RIOS ALFONSO BRIAN ANDRES	1	0			0																	23/06/1	1.230.300	132.000	0	0	0	0	EPS017	1.230.300	46.200	14.7	1.230.300	1	8.946	CCF24	1.230.300	49.200	0	0	0	0	0
2	CC	79971442	Garcia Leon Wilson Giovanni	1	0			0																	23/06/1	2.310.560	124.800	0	0	0	0	EPS009	2.310.560	82.300	14.7	2.310.560	5	142.798	CCF24	2.310.560	92.300	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900599905-6	CREAR Proyectos y Soluciones de Ingeniera S.A.S		cra 15 97-46 of. 206	8067320	creaingeniera@crearp.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	D - Ley 1429			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		53

DATOS DE LA PLANILLA							
PERIODO COTIZACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
SALUD		DIFERENTE A SALUD					
MES	AÑO	MES	AÑO				
4	2018	3	2018	E	04/04/2018	25658365	$830.100

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	82.000	0		0		0	1	100	0	82.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	48.000	0		0		0	1	100	0	48.100	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
23301	Porvenir	830224806-8	520.000	0	0	0	0	1	500	0	520.500	2

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolívar S.A.	860002503-2	148.000				148.500	1	200	149.200			1.490	149.200	2

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	130.000	1	200	130.200	2

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	130.000	130.200
Pensión	1	520.000	520.500
Riesgos Laborales	1	148.000	149.200
CCF	1	130.000	130.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	928.000	930.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
52	830080044	Empresa Asociativa de trabajo Amarecfa		carrera 42 80 95 MAEVA	4061325	asistenteafo@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	E – menos de 200 c			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA							
PERIODO COTIZACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
SALUD		DIFERENTE A SALUD					
MES	AÑO	MES	AÑO				
4	2018	3	2018	E	13/04/2018	26583088	53.930.830

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	918.000	0		0		0	0	0	0	918.000	6
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	112.500	0		0		0	0	0	0	112.500	1
EPS041	MUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	16.330	0		0		0	0	0	0	16.330	1
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	900156264-2	97.700	0		0		0	0	0	0	97.700	1
EPSC34	Asociación EGP Capital Salud	900298372-9	146.700	0		0		0	0	0	0	146.700	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (PAS + Proteccion)	8002187309-0	508.000	0	0	0	0	0	0		508.000	4
230301	Porvenir	8002249368-8	1.020.400	0	0	17.500	17.500	0	0		1.064.000	7
25-14	Colpensiones	900336004-7	125.000	0	0	0	0	0	0		125.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-5	54.400				54.400	3	0	54.400			544	54.900	12

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	386.000	0	0	386.000	12

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
193.500	0	0	193.500	12
ICBF				
289.900	0	0	289.900	12
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LRA, ERP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	1.233.000	1.233.000
Pensión	3	1.689.000	1.689.000
Riesgos Laborales	1	54.400	54.400
CCF	1	386.000	386.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	289.900	289.900
MEN	0	0	0
SENA	1	193.500	193.500
TOTALES	12	3.905.800	3.905.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830080064-4	Empresa Asociativa de trabajo Atlantida		carrera 42 BB 65 NUEVA	4068329	adiazmolfs@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B - Horas de 200 c			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA							
PERIODO COTIZACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
SALUD		DIFERENTE A SALUD					
MES	AÑO	MES	AÑO				
4	2018	3	2018	E	13/04/2018	26883089	$3.805.800

DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | |

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXCLUIDO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830050644	Empresa Asociativa de trabajo Amarilla		carrera 42 80 65 NUEVA	4568329	[illegible]	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B - menos de 200 c			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA							
PERIODO COTIZACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (CLAVE SI/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
SALUD		DIFERENTE A SALUD					
MES	AÑO	MES	AÑO				
5	2018	4	2018	E		27220997	$3.445.700

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	87.700	0		0		0	0	0	0	87.700	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	826.700	0		0		0	0	0	0	826.700	5
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	87.700	0		0		0	0	0	0	87.700	1
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	6.800	0		0		0	0	0	0	6.800	1
EPSC34	Famisanar SAS Cap Sal Salud	900298372-3	104.300	0		0		0	0	0	0	104.300	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (BA3 + Protección)	830229730-6	208.800	0	0	0	0	0	0		208.800	4
230101	Porvenir	830224866-9	835.400	0	0	17.300	17.300	0	0		970.000	5
25-14	Colpensiones	800153061-7	256.000	0	0	0	0	0	0		256.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
1423	Positiva Seguros	860011153-6	47.700				47.700	0	0	47.700			477	47.700	11

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	344.600	3	0	344.600	11

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
172.800	0	0	172.800	11
ICBF				
258.800	0	0	258.800	11
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICBF, LMA, ESP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.135.000	1.135.000
Pensión	3	1.488.800	1.488.800
Riesgos Laborales	1	47.700	47.700
CCF	1	344.600	344.600
ESAP	0	0	0
ICBF	1	258.800	258.800
MEN	0	0	0
SENA	1	172.800	172.800
TOTALES	12	3.445.700	3.445.700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830036064-4	Empresa Asociativa de trabajo Arenalfa		carrera 42 68 85 NUEVA	4068329	asiamenofs@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ONDA	S - menos de 200 t			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA							
PERIODO COTIZACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DD/MM/AAAA)	NÚMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
SALUD		DIFERENTE A SALUD					
MES	AÑO	MES	AÑO				
5	2015	4	2015	E		27223997	$3.445.700

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Actividad	Trabajo	Pensión	Salud	Riesgos	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VIP				Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario a Afiliada	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización Fijo/Var UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1019075016	PARADA BERMUDEZ JOSE DAVID	1	0		X																				23001	791.242	125.908	0	0	0	0	EPS016	791.242	87.750	14-23	791.242	1	4.134	CCF24	791.242	21.300	791.242	15.706	23.561	0	0
2	CC	1014189034	MARTINEZ CASTIBLANCO SERGIO DANIEL	1	0		X	X																			23001	52.263	8.400	0	0	0	0	EPS034	62.263	6.600	14-23	52.853	1	300	CCF24	62.263	3.100	52.853	1.319	1.979	0	0
3	CC	1033714178	BORJA VILLAQUIRA JUAN SEBASTIAN	1	0		X	X																			30001	52.263	8.400	0	0	0	0	EPS018	62.263	6.600	14-23	52.853	1	300	CCF24	57.263	3.100	52.853	1.319	1.979	0	0
4	CC	1088281844	OCAMPO GARCIA JENNIFER	1	0		X																				23001	791.242	125.908	0	0	0	0	EPS037	791.242	87.750	14-23	791.242	1	4.134	CCF24	791.242	21.300	791.242	15.706	23.561	0	0
5	CC	5745628	Ramiro garcia martinez	1	0		X																				23001	791.242	125.908	0	0	0	0	EPS018	791.242	87.750	14-23	791.242	1	4.134	CCF24	791.242	21.300	791.242	15.706	23.561	0	0
6	CC	1082397	VALENCIA GARCIA CARLOS ARTURO	1	0		X																				23001	791.242	125.908	0	0	0	0	EPS034	791.242	87.750	14-23	791.242	1	4.134	CCF24	791.242	21.300	791.242	15.706	23.561	0	0
7	CC	79780436	PARADA FONSECA LUIS ALFONSO	1	0		X																				23001	3.450.800	574.800	0	0	17.251	17.251	EPS018	3.450.800	431.350	14-23	3.450.800	1	18.134	CCF24	3.450.800	138.300	3.450.800	69.016	103.524	0	0
8	CC	79980913	RAMIREZ MESA JULIO CESAR	1	0		X																				23-14	791.242	125.908	0	0	0	0	EPS018	791.242	87.750	14-23	791.242	1	4.134	CCF24	547.800	21.300	547.800	11.000	16.500	0	0
9	CC	79780918	GARCIA VARGAS PEDRO PABLO	1	0		X																				23-14	791.242	125.908	0	0	0	0	EPS018	791.242	87.750	14-23	791.242	1	4.134	CCF24	791.242	21.300	791.242	15.706	23.559	0	0
10	CC	79780345	BORJA FREDDY ANDREY	1	0		X	X																			23001	52.263	8.400	0	0	0	0	EPS034	62.263	6.600	14-23	52.853	1	300	CCF24	57.263	3.100	52.853	1.319	1.979	0	0
11	CC	1014 4332	CONTRERAS VILLAVICENCIO JUAN CARLOS	1	0		X																				23001	791.242	125.908	0	0	0	0	EPS018	791.242	87.750	14-23	791.242	1	4.134	CCF24	547.800	21.300	547.800	11.000	16.500	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PAGO ABRIL 2018
SALUD TOTAL

DOCUMENTO ATENDIDO EN
11/Abr/2018 16:00 3800 04 0123 5224149

Fecha creación reporte: 2018-03-11

Número Planilla: 10124977[illegible]

Referencia pago (PIN): 8889178410

DOCUMENTO SOPORTE

COLSUBSIDIO
SANTA ISABEL

NOMBRE : PLANILLA SIMPLE RECAUDO
NIT : 900.097.333-9
CODIGO : 20596
FORMULA : 8889178410

Código	Descripción	Cant	Valor
693927	RECAUDO PLA	1	97800
			97800

DOCUMENTO
1804110004356051
CONSECUTIVO: 00
ABR 11, 18 16:00

11/Abr/2018 16:00 3800 04 0123 5224149
(COPIA CLIENTE)

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOFIA PARADA FONSECA
Documento	CC51668440
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	BOGOTA
Representante Legal	PARADA FONSECA SOFIA

IMPORTANTE Señor aportante si usted realiza el pago de su aporte [illegible] aportante está de acuerdo con la informa[illegible]

Total Afiliados 1

[illegible] puede revisar su liquidación antes del pago, SIMPLE S.A. da por entendido que el [illegible] administradoras serán responsabilidad del aportante.

II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | |

Simple

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2018-02-07, 12:25:27 PM Tipo Planilla: E PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: enero de 2018 Periodo Servicio: enero de 2018

PAGO MARZO 2018
ATRASADO

COLSUBSIDIO
SANTA ISABEL

GUARDADA 15/01/2018

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOFIA PARADA FONSECA		
Documento	CC51668440	Dirección	DG 3A 41C 09
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3702692
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA	Departamento	BOGOTA D.C
Representante Legal	PARADA FONSECA SOFIA	Identificación	CC51668440

IMPORTANTE: Señor aportante si usted realiza el pago de su aporte después de las 4:00 PM este se hará efectivo al día hábil siguiente; recuerde revisar su liquido
aportante está de acuerdo con la información suministrada, en consecuencia cualquier inconsistencia con las administradoras serán re

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades	Pensiones			Salud			Riesgos			
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante		Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Ad
CC 51668440	PARADA FONSECA SOFIA	03	00			$ 0	$ 0	SANITAS	$ 737.717	$ 88.526		$ 0	$ 0	

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes	Aportes	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación
$ 0	$ 737.717	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.526	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

IV. INFORMACION

Día hábil de pago sin mora
7

Periodo de cotización salud											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Cafam-Colsubsidio-Mercadroguerías Cafam-Colsubsidio-

8888748994000000000991231

Grupo Éxito-Finamérica-Confandi Grupo Éxito-Finamérica-

(415)7709998485884(8020)8874899400(3900)0000000(96)20991231

DOCUMENTO SOPORTE

NOMBRE	PLANILLA SIMPLE RECAUDO
NIT	900 097 333-9
CODIGO	20596
FORMULA	8874899400

Código	Descripción	Cant	Valor
693927	RECAUDO PLA	1	97700
			97700

DOCUMENTO

1803070003351961

CONSECUTIVO: 001

MAR 07, 18 15:00

07/Mar/2018 15:00 3800 03 0197 2073992

(COPIA CLIENTE)

DOCUMENTO ATENDIDO EN
07/MAR/2018 15:00 3800 03 0197 2073992

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2948 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 655 30 03 - Pereira: 313 93 00 - Barranquilla: 351 88 50 - Resto del País: 018000 978 971 -
¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúreso que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado por SIMPLE

DOCUMENTO ATENDIDO EN
07/MAR/2018 15:00 3800 03 0196 2073992

Señor(a): LILIANA ORTIZ BASTO
No. Identificación: CC 60396627
Dirección: CALLE 166 NO. 9-45 TORRE 3 APTO 1312
Teléfono: 2707102 **Fax:**
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla 8318171692

CITE ESTE NUMERO PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Respetado señor(a)

Con atento saludo, informamos que Compensar Operador de Información procesó el siguiente pago realizado por medio de:

compensar miplanilla.com

	LILIANA ORTIZ BASTO
	CC 60396627
	8318171692
	3/3/2017
	18171692
	1052
	$0

	1
	Marzo 2017
	Marzo 2017
	Marzo 2017
	2
	$427.500
	$0

CODIGO CONCEPTO NOMINA	NOMBRE	VALOR PAGADO	CANTIDAD
230201	Proteccion (INC + Proyectiva)	$240.000	1
EPS005	Sanitas EPS	$187.500	1

TIPO DOC.:	CC
NO. DOCUMENTO:	60396627
APELLIDOS Y NOMBRES	ORTIZ BASTO LILIANA

EPS005	230201	0	1.500.000	1.500.000	0	0	147.500	360.000	0	0

TIPO DOC.:	
NO. DOCUMENTO:	
APELLIDOS Y NOMBRES	

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2018-04-06, 11:43:30 AM Tipo Planilla I Número Planilla 1011977229

Periodo Cotización 201803 Periodo Servicio 201503

Cliente:

PAGADA 2018-03-19 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JHON EDWIN SERRATO VALENCIA				
Documento	CC 3135316	Dirección	CRA 82A # 43-36 SUR GRAN BRITALIA		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3125711442		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	BOGOTA	Departamento	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	SERRATO VALENCIA JHON EDWIN	Identificación	CC 3135316		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 3135316		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59	00					SERRATO VALENCIA JHON EDWIN	25307000 - 25		CUNDINAMARCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades			Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
			Código AFP	Código Tipo AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tipo EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
X			23001		16 %	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	EPS017		12.5 %	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	14-01	1	0.522 %	$ 1.000.000	$ 5.300	CCF24	2 %	$ 1.000.000	$ 20.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	POSITIVA DE SEGUROS	COMPENSAR CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 5.300	$ 20.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 313.300

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA identificado(a) con NI 860517302 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para NESTOR FABIO GARCIA AGUDELO identificado(a) con CC 10136804

| | | |

Señor(es):	CONSORCIO H&H
Nit:	NI 901114272
Dirección:	CARRERA 55 No 44 A 06
Teléfono:	3000805 **Fax:** 2212559
Ciudad:	BOGOTA, D.C.

Respetado(s) señor(es)

Con atento saludo, informamos que Compensar Operador de Información procesó el siguiente pago realizado por medio de:

compensar | miplanilla.com


	CONSORCIO H&H
	901114272
	632695#300
	3/12/2018
	26058300
	1052
	50

	6
	Marzo 2018
	Febrero 2018
	Febrero 2018
	6
	$3,140,600
	50

CODIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NUMERO DE APORTANTES
1414	Seguros de Vida Colpatria S.A.	$707,400	6
230201	Proteccion (INC + Proteccion)	$699,000	7
230201	Porvenir	$628,000	4
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fluv	$609,600	6
CCFC55	EPS-S Cafesalud	$31,300	1
EPS005	Sanitas EPS	$240,000	2
EPS008	Compensar EPS	$104,000	2
EPS017	Famisanar EPS Calam. Colectivo	$31,100	1

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

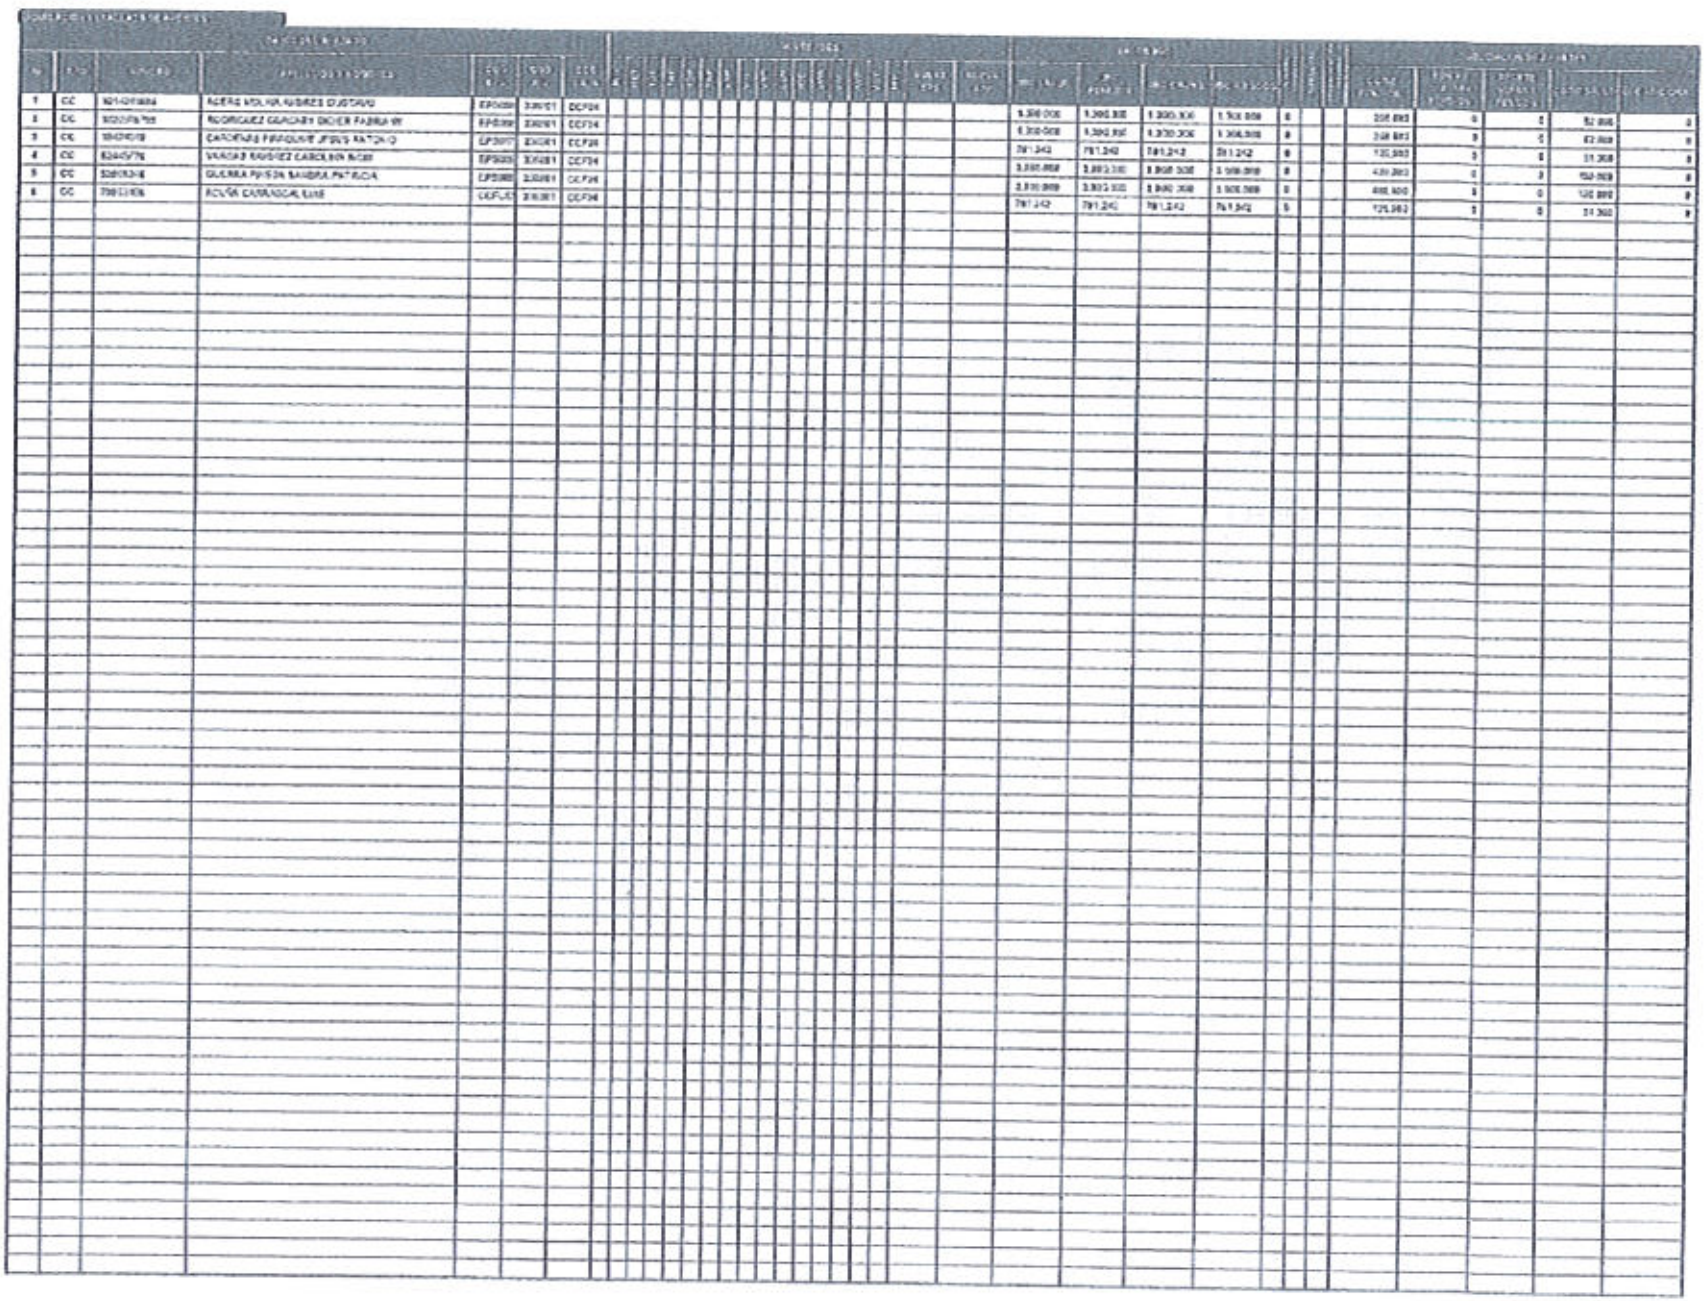

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Anexo 6
Registro Fotografico





































Anexo 7
Recibos de Material RCD

OBRA COLEGIO DON BOSCO USME
VALES

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S

Reconformacion Morfológica las Manas
NIT 900.459.311-1
Dir: Kr 17 N 142 - 25 Tel: 7023048/6040
Res. 1480 de 2014 de la ANLA
ORIGINAL

Remisión N: RM-519291
Fecha: 03 de April de 2018 10:30:42
Cajero: Felipe
Placa: AEB221 PIN volqueta: 8332
CLIENTE: EFECTIVO-5 Recibo No. 0

CONCEPTO

Viaje: Sencillo- Excavación, Tierras, Arcillas, Recebos
TOTAL: $32.000

Imprimir

SAN ANTONIO

DISPOSICION FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCION 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9230
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427-2015

VALE POR UN VIAJE

Nº 246446

Registro N° 064374

FECHA: _____ CONTRATO IDU: _____

EMPRESA GENERADORA _____

OBRA/FRENTE _____ PIN _____

PLACAS VEHICULO _____ PIN _____

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro	☐	Sencillo	☐
Excavacion	☐	Doble Troque	☐
Capa Vegetal	☐	Tracto Camion	☐
T. Negra	☐		
Lodo	☐		

CERTIFICACION

VALE POR UN VIA

ES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
O DE 2015 DE ANLA
TIEMBRE DE 2017 DE ANLA

427-2015

Nº 246446

CONTRATO IDU: _____

PIN _____

PIN _____

TIPO DE VEHICULO

Sencillo ☐
Doble Troque ☐
Tracto Camion ☐

CLIENTE
