Informe Mensual No. 8
CONTRATO 552-2024 COP (120683)
Periodo: del 1 al 30 de septiembre de 2025



OBJETO DEL CONTRATO:

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

CONSORCIO TEUSAVIAL

CONTRATISTA:

Consorcio Teusavial

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO | BOGOTÁ

CONTRATO DE OBRA No. 552-2024 COP (120683)

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

Informe de Gestión Social No. 8

REVISIÓN Y APROBACIÓN


Número de revisión: 1		**Versión No. 1**
Elaborado por: CONSORCIO TEUSAVIAL		
Responsable por elaboración Residente social	Nombre	T.S Ángela María Quiroga G.
	Firma	
Aprobado por: CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG		
Responsable por Aprobación Residente Social de Interventoría	Nombre	T.S. Luz Escobar Ospina
	Firma	
Octubre de 2025		

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 6
2. JUSTIFICACIÓN 7
3. INFORMACIÓN DEL PROYECTO. 8
4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 10
5. ALCANCE DEL PROYECTO 11
6. RECURSOS HUMANOS Y SOPORTE LOGÍSTICO - ÁREA SOCIAL 12
7. GESTIÓN SOCIAL 12
7.1 Objetivo General. 12
7.2 Objetivos Específicos. 12
8. PROGRAMAS DEL PLAN DE GESTION SOCIAL 13
9. PROGRAMA DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD. 13
9.1 Afiches informativos 14
9.2 Reuniones de inicio 14
9.3. Reuniones de finalización 15
9.4. Reuniones Extraordinarias 15
9.5. Socializaciones 15
10. PROGRAMA DE DIVULGACIÓN DEL PROYECTO. 16
10.1. Objetivo General 16
10.2. Puntos satélites de información 16
10.3. Volante informativo de inicio de obra 18
10.4. Volante de convocatoria a reuniones de inicio de obra 18
10.5. Volante recomendaciones para adecuación de canales y bajantes de aguas lluvias . 19
10.6. Volante notificación inicio actas de vecindad 19
10.7. Volante Oferta laboral 19
10.8. Volante de información ciudadana 19
10.9. Piezas de Información del Plan de Manejo de Tráfico - PMT. 20
10.10. Volante otras informaciones 20
10.11. Volante notificación cierre actas de vecindad 20
10.12. Volante de convocatoria a reuniones de finalización de obra 22
11. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA – ACTAS DE VECINDAD 22
11.1. Levantamiento de Actas de Vecindad iniciales. 22
11.2. Actas de compromiso. 22
11.3. Levantamiento de actas para acceso a rampas 22

11.4. Registro fílmico y fotográfico de vías de desvió. 23
11.5. Actas de Vecindad de cierre 23
12. PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. 24
12.1. Punto PAC fijo 24
12.2. Punto PAC VIRTUAL 25
12.3. Punto PAC Móvil 25
12.5 PQRSD 26
12.6. Participación Ciudadana Reuniones Comité Ciudadano 30
13. PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD 30
13.1. Objetivo General 30
14. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A LOS EMPLEADOS DEL PROYECTO. 31
14.1 Objetivo General 31
14.2 Capacitación mensual 31
15. PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA NO FORMADA 32
15.1 Objetivo General 32
15.2 Generación total de empleo 32
5.3. Vinculación de Mano de Obra No formada periodo No. 8. 35
16. PROGRAMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A DOTACIONES 39
16.1 Objetivo General. 39
16.2 Seguimientos por periodo 39
17 PROGRAMA DE GESTION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 39
17.1 Informes Semanales 40
17.2 Informe Mensual 40
17.3 Informe Final 40
18 METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COSTOS. 41
18.1 Comités de Gestión Social 41

Listado de Tablas

Tabla 1 Información del proyecto 8
Tabla 2 Información del Contratista 8
Tabla 3 Información de la Interventoría 9
Tabla 4 CIV´S del proyecto 11
Tabla 5 Personal mínimo requerido área social 12
Tabla 6 Consolidado realización reuniones de inicio 15
Tabla 7 Consolidado actas de socializaciones realizadas en el periodo 16
Tabla 8 PSI vigentes en el periodo 17

Tabla 9 Indicador PSI actualizados 18
Tabla 10 Indicador PSI desinstalados 18
Tabla 11 consolidado convocatoria reuniones de inicio 18
Tabla 12 Indicador distribución de volantes de convocatoria a reunión inicio 19
Tabla 13 Consolidado notificación cierre de actas de vecindad en el periodo 20
Tabla 14 Indicador distribución de volantes cierre de actas de vecindad primera visita en el periodo 21
Tabla 15 Consolidado de distribución de volante notificación segunda visita de cierre actas de vecindad 21
Tabla 16 Indicador distribución de volantes cierre de actas de vecindad segunda visita en el periodo 21
Tabla 17 Consolidado de distribución de volante notificación tercera visita de cierre de actas de vecindad 21
Tabla 18 Indicador distribución de volantes cierre de actas de vecindad tercera visita en el periodo 22
Tabla 19 Consolidado cierres de actas de vecindad 23
Tabla 20 Tabla de atención PUNTO PAC 25
Tabla 21 Indicador Punto PAC Móvil 26
Tabla 22 Consolidado PQRSD 26
Tabla 23 Consolidado entrega de plegables de sostenibilidad de la vía en el periodo 31
Tabla 24 Indicador distribución de plegables de sostenibilidad de la vía en el periodo 31
Tabla 25 Realización de capacitación mensual 32
Tabla 26 Indicador realización de capacitación mensual 32
Tabla 27 Personal contratado en el periodo No. 7 33
Tabla 28 Porcentajes MONF – Mujeres en el periodo 36
Tabla 29 Personal MONF en el periodo 36
Tabla 30 Indicador vinculación MONC 37
Tabla 31 listado de las mujeres vinculadas en cumplimiento al decreto 332 de 2021 38
Tabla 32 Indicador generación de empleo de mujeres en el periodo 38
Tabla 33 Indicador control y seguimiento de dotaciones 39

Lista de Anexos

Anexo 1 Acta de reunión de inicio Quinta Paredes, listado de asistencia y registro fotográfico. .. 14
Anexo 2 Actas de socialización PMT barrio San Luis tramo 1 y Chapinero Occidental tramo 1, registro fotográfico. 16
Anexo 3 PSIS vigentes en el periodo 17
Anexo 4 Formato control entrega de piezas de divulgación invitación a reunión de inicio, volante y registro fotográfico tramo Quinta Paredes. 18
Anexo 5 Formato control entrega de piezas de divulgación, volante cierre de actas de vecindad primera visita y registro fotográfico barrios Galerías y Alfonso López. 20

Anexo 6 Formato control entrega de piezas de divulgación, volante cierre de actas de vecindad segunda visita y registro fotográfico barrio Alfonso López. 21
Anexo 7 Formato control entrega de piezas de divulgación, volante cierre de actas de vecindad tercera visita y registro fotográfico Alfonso López. 22
Anexo 8 PQRSD No. 6. 26
Anexo 9 Formato control entrega de piezas de divulgación, plegable de sostenibilidad de la vía y registro fotográfico barrios Galerías, Nicolás de Federmán y Alfonso López. 31
Anexo 10 Registro de asistencia y fotográfico de capacitación No. 8 32

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como objetivo presentar los resultados y avances de la Gestión Social del contrato No. 552-2024 COP (120683) el cual hace parte integral de los componentes requeridos en el marco de ejecución, cuyo objeto es **"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES",** celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo y la firma Consorcio Teusavial.

Con base a lo anterior, el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, busca elevar las condiciones de bienestar de la ciudadanía, a través del cumplimiento de los objetivos, estrategias y políticas que deben desarrollar los contratistas en el marco del Plan de Desarrollo Local. Lo anterior con el fin de minimizar el impacto social generado por las obras de la construcción de vías en los diferentes barrios de la localidad de Teusaquillo, ejecutadas por la firma Consorcio Teusavial.

Dentro de los fines y objetivos del presente informe, se plantea describir las acciones realizadas desde la parte social del contratista en la etapa preliminar del contrato No. 552-2024 COP (120683), cabe señalar que este informe entregará un resumen de la gestión realizada en el **periodo No. 8, del 1 al 30 de septiembre de 2025**, a partir de los siguientes programas:

- Programa de divulgación e información a la comunidad.
- Programa de atención al ciudadano
- Programa de sostenibilidad.
- Programa de capacitación empleados del proyecto
- Programa de control y seguimiento a dotaciones.
- Programa de contratación de mano de obra no calificada.
- Programa de gestión de aseguramiento de la calidad.

2. JUSTIFICACIÓN

Con ocasión de la ejecución del contrato No. 552-2024 COP (120683), cuyo objeto **"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"** y teniendo en cuenta que el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, es una entidad de carácter público, la cual es responsable de la contratación de múltiples obras de infraestructura junto con el espacio público, es importante ejecutar obras que den alcance y respuesta a las necesidades de las comunidades.

Por lo anterior la ejecución de obras en los diferentes segmentos viales de la localidad de Teusaquillo, se convierte en acciones de carácter misional que cumple el FDLT, mediante la intervención de obras de infraestructura vial y del espacio público que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la localidad.

Por lo tanto, se plantean estrategias y actividades que mitiguen los impactos generados debido a la ejecución de las obras a través de la implementación del Plan de Gestión Social y sus respectivos programas.

3. INFORMACIÓN DEL PROYECTO.

Tabla 1 Información del proyecto

Entidad contratante: Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo	
Contrato No.	552-2024 COP (120683)
Objeto del contrato	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
Localización del proyecto	Teusaquillo
Plazo de ejecución	8 meses
Fecha de inicio	22 de enero de 2025
Fecha de terminación	21 de septiembre de 2025
Valor Adición	$2.673.333.000
Valor Total	$8.130.760.612
Prórroga No.1	Cuatro (4) Meses a partir del 22 de septiembre de 2025 al 21 de enero de 2026.
Plazo total	12 meses
Fecha de Finalización	21 de enero de 2026

Fuente: acta de inicio Contrato No. 552-2024 COP (120683)

Tabla 2 Información del Contratista

Contratista	
Contratista	Consorcio Teusavial
Director de obra	Ing. Juan Felipe Delgado.
Residente técnico	Ing. Andrés Echandía
Residente junior	Ing. Marcela Arévalo
Residente SST	Ing. Camilo Durán

Residente Ambiental	Ing. Camilo Durán
Residente Social	T.S Angela María Quiroga G.

Fuente: Archivos del contratista Contrato No. 552-2024 COP (120683)

Tabla 3 Información de la Interventoría


Interventoría	
Contratista	Consorcio Interteusaquillo JG
Director de obra	Ing. Jorge Gómez Falla
Residente técnico	Ing. Johan Mojica Sierra
Residente SST	Ing. Yesica Quíneme Fusca
Residente Ambiental	Ing. Yesica Quíneme Fusca
Residente Social	T.S. Luz Escobar Ospina

Fuente: residente social de interventoría

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

EL contrato se ejecuta en la localidad 13 de Teusaquillo, esta localidad está compuesta por seis UPL, las cuales son:

- ✓ UPL 100 Galerías
- ✓ UPL 101 Teusaquillo
- ✓ UPL 104 Parque Simón Bolívar – CAN
- ✓ UPL 106 La Esmeralda
- ✓ UPL 107 Quinta Paredes
- ✓ UPL 109 Ciudad Salitre Oriental

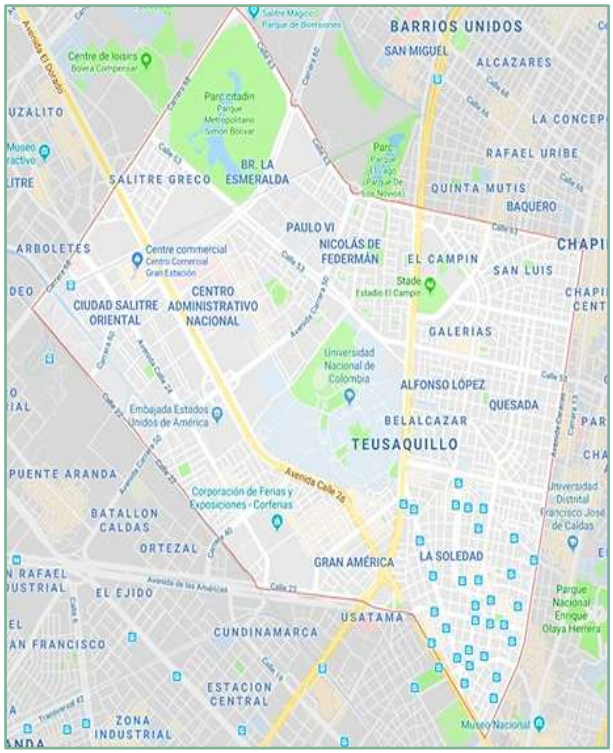

Fuente: Anexo técnico CCE-EICP-IDI-01
Imagen 1 Mapa de la localidad de Teusaquillo

El contrato No. 552-2024 COP (120683), realizará intervención vial en las UPL, Galerías, Teusaquillo, La Esmeralda y Quinta Paredes, de acuerdo con el listado de vías contempladas en el anexo técnico del contrato en referencia, lo cual representa un factor positivo para la ciudadanía puesto que habrá cobertura en un número significativo de UPL, de la localidad. A continuación, se relacionan los CIV´S a intervenir.

Tabla 4 CIV´S del proyecto

No	CIV o Código	No. UPL	Barrio	Eje Vial
1	13002387	101 Teusaquillo	Teusaquillo	Carrera 24 entre SE y Avenida Calle 34
2	13000593	100 Galerías	San Luis	Carrera 18 entre Calles 58B y 59
3	13000686	100 Galerías	San Luis	Carrera 18 entre Calles 58 y 58A
4	13000794	100 Galerías	San Luis	Carrera 16 entre Calles 57 y 58
5	13001165	100 Galerías	Alfonso López	Carrera 27 entre Calles 50 y 51
6	13002083	101 Teusaquillo	La Magdalena	Calle 38 entre Carreras 17A y 17
7	13000284	106 La Esmeralda	Nicolás de Federmán	Carrera 47 entre Calles 58A y 59
8	13000343	106 La Esmeralda	Nicolás de Federmán	Carrera 47 entre Calles 58 y 58A
9	13000476	106 La Esmeralda	Nicolás de Federmán	Carrera 36A entre Calles 57A y 57B
10	13000846	100 Galerías	Campin	Transversal 28 entre Carrera 28 y Diagonal 61B
11	13000875	100 Galerías	Galerías	Calle 53B entre Carrera 27 y Transversal 27A
12	13000864	106 La Esmeralda	Nicolás de Federmán	Calle 53A entre Carreras 35 y 36
13	13000336	100 Galerías	San Luis	Diagonal 61B entre Carreras 19A y 20
14	13000826	100 Galerías	Chapinero Occidental	Avenida Calle 57 entre Avenida Carrera 14 y Carrera 14A
15	13000814	100 Galerías	Chapinero Occidental	Carrera 14A entre Avenida Calle 57 y Calle 58

Fuente: Anexo técnico Contrato 552-2024 COP (120683)

5. ALCANCE DEL PROYECTO

En el presente documento se da respuesta al lineamiento técnico y social del contrato COP-552-2024 COP (120683), donde se garantiza por parte del contratista el cumplimiento del Plan de Gestión Social, a través del desarrollo de los programas aquí planteados.

Cabe resaltar que todos los procesos que surjan deben contar con la aprobación de la Interventoría y por su parte el contratista brindará una atención permanente y oportuna a los requerimientos realizados por la comunidad.

6. RECURSOS HUMANOS Y SOPORTE LOGÍSTICO - ÁREA SOCIAL

El equipo humano de la gestión social está integrado por profesionales idóneos los cuales trabajarán de manera interdisciplinaria con los profesionales del área técnica: director, residente, residente ambiental, residente de seguridad y salud en el trabajo en pro de favorecer la ejecución de las obras de manera eficaz y oportuna. El Consorcio Teusavial, cuenta con el siguiente personal a fin de cubrir todas las obligaciones contenidas en el Plan de Gestión Social del Contrato:

Tabla 5 Personal mínimo requerido área social

Cargo	Nombres y apellidos	Dedicación
Residente Social	T.S Ángela María Quiroga G	100 %

Fuente: elaboración propia

7. GESTIÓN SOCIAL

Para el **octavo periodo**, la firma contratista Consorcio Teusavial, por medio de la residente social, diseñó y realizó la distribución de diferentes piezas informativas, también se realizó socialización de Plan de Manejo de Tránsito de vías por la entidad contratante, barrios San Luis y Chapinero Occidental.

7.1 Objetivo General.

Describir las acciones y actividades adelantas por el área de Gestión Social, de acuerdo a cada uno de los programas que hacen parte de este componente; garantizando a la comunidad del área de influencia directa del proyecto una información clara, veraz y oportuna que les permitan participar y apropiarse por las obras ejecutadas

7.2 Objetivos Específicos.

- Fomentar canales de comunicación que permitan al contratista brindar información clara, veraz y oportuna, a las comunidades del área de influencia del proyecto.

- Generar escenarios de participación comunitaria que faciliten la interacción entre la ciudadanía, el contratista y el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo.
- Brindar por medio de estrategias, una atención al ciudadano oportuna y eficaz, dando alcance a sus solicitudes, inquietudes, sugerencias quejas y/o reclamos que surjan con la ejecución de las obras.
- Mitigar los impactos sociales causados por la ejecución de las obras contempladas dentro del proyecto.

8. PROGRAMAS DEL PLAN DE GESTION SOCIAL

A continuación, se describe las actividades que adelantó el contratista desde el componente social en el **octavo periodo**, en pro de dar cumplimiento a las obligaciones de gestión social, las cuales están encaminadas a garantizar que los usuarios beneficiarios de los diferentes frentes de obra o CIV del proyecto y/u otros actores representantes organizaciones sociales, socioeconómicas y ambientales, se mantengan informados sobre las obras:

- Recorridos por los frentes de obra.
- Elaboración de metodología y cronograma de actividades del Plan de Gestión Social.
- Asistencia a los comités de seguimiento.
- Realización de trabajo interdisciplinario con los profesionales de las otras áreas que hacen parte del proyecto (Técnica, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo SST), para garantizar el cumplimiento de los criterios del proyecto de manera integral.
- Implementación de los formatos, informes semanales, mensual, entre otros.

9. PROGRAMA DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD.

El área social del contratista en el **periodo No. 8,** mantuvo el objetivo de fortalecer los procesos de comunicación con la comunidad y sus representantes, de manera que se genere una relación de confianza y participación constante, entre los diversos actores involucrados directa o indirectamente en la obra.

9.1 Afiches informativos

El contratista **en el periodo No. 8**, realizó la publicación de afiches informativos, los cuales tienen por objeto divulgar las actividades a realizar, dichos afiches fueron instalados en los PSI, y funcionan como estrategia informativa hacia la comunidad. Estos afiches se instalaron en los PSI vigentes en el periodo.

9.2 Reuniones de inicio

El área social del contratista, para el **periodo No. 8,** realizó una (1) reunión de inicio de obra, para el tramo No. 1 del barrio Quinta Paredes, se contó con amplia asistencia y participación de la comunidad. En este espacio de reunión se dio a conocer aspectos de relevancia de la intervención vial. Se informó a la comunidad los aspectos técnicos, sociales, SST y ambientes que contemplan las diferentes intervenciones; así como la inversión realizada por el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, tiempo de ejecución general del contrato y tiempo por tramo, se realizaron recomendaciones que contribuyen a que las obras se ejecuten dentro de un ambiente de confianza y satisfacción para la comunidad. La reunión contó con el acompañamiento y el aval de la interventoría y la supervisión del contrato. Dentro de los aspectos de mayor relevancia tratados fueron:

- ✓ Presentación de los profesionales del FDLT, Interventoría y Constructor.
- ✓ Localización del proyecto
- ✓ Antecedentes del proyecto
- ✓ Lineamientos básicos de seguridad.
- ✓ Plan de manejo ambiental y plan de gestión social.
- ✓ Tiempo de ejecución.
- ✓ Localización de los segmentos viales a intervenir.
- ✓ Informe sobre el punto PAC, puntos satélites de información y demás actividades de gestión social.
- ✓ Accesos vehiculares a predios.
- ✓ Procedimiento para el levantamiento de actas de vecindad.
- ✓ Respuesta a inquietudes de la comunidad.

Se dio atención a la comunidad, se despejaron sus inquietudes y dudas frente a la intervención vial, la información suministrada a la comunidad estuvo a cargo de la supervisión del contrato, la interventoría y el contratista.

Anexo 1 Acta de reunión de inicio Quinta Paredes, listado de asistencia y registro fotográfico.

A continuación, se presenta tabla de consolidado de la reunión de inicio de obra realizada en este periodo.

Tabla 6 Consolidado realización reuniones de inicio

Periodo No. 8					
Fecha	**CIV**	**Barrio/tramo**	**No. De acta de reunión**	**No. De asistentes comunidad**	**No. De asistentes interventoría/contratista otros**
18/09/2025	13001365	Quinta Paredes	1	30	12

9.3. Reuniones de finalización

Una vez se culminen los trabajos técnicos de cada tramo, el área social del contratista realizará las reuniones de finalización, se hace salvedad que aún no hay finalización de actividades técnicas en los tramos vigentes, por tanto, no aplica para este periodo.

9.4. Reuniones Extraordinarias

Para este periodo, no se recibieron solicitudes por parte de la comunidad o la interventoría, tampoco surgieron situaciones que ameritaran la realización de reuniones extraordinarias. Por lo tanto, no se reporta ejecución de reuniones de este tipo para este mes.

9.5. Socializaciones

El área de Gestión Social del Consorcio Teusavial, para el periodo No. 8 por requerimiento de la Secretaría Distrital de Movilidad, realizó el levantamiento de actas de socialización de PMT, para los siguientes tramos de la siguiente manera:

<u>Para cierre total de calzada</u>

- Tramo 1 barrio San Luis CIV 13000336

Desde el área social del contratista se realizó visita predio a predio, se informó a la comunidad de zona de influencia directa las implicaciones del cierre total de calzada y espacio público, se recibió respuesta favorable de la comunidad, quienes firmaron las actas de socialización a conformidad. Se dio atención a la comunidad, se despejaron sus inquietudes y dudas frente a la intervención vial.

Para cierre total de espacio público

- Tramo 1 barrio Chapinero Occidental CIV 13000826

Desde el área social del contratista se realizó visita predio a predio, se informó a la comunidad de zona de influencia directa las implicaciones del cierre total del espacio público, se recibió respuesta favorable de la comunidad, quienes firmaron las actas de socialización a conformidad. Se dio atención a la comunidad, se despejaron sus inquietudes y dudas frente a la intervención vial.

A continuación, se presenta tabla de consolidado de socializaciones realizadas en este periodo.

Anexo 2 Actas de socialización PMT barrio San Luis tramo 1 y Chapinero Occidental tramo 1, registro fotográfico.

Tabla 7 Consolidado actas de socializaciones realizadas en el periodo

Periodo No. 8			
Fecha	**CIV**	**Barrio/tramo**	**Institución**
10/09/2025	13000336	San Luis Tramo 1	Jardín Moderno San Gabriel
			Comunidad en general del área a intervenir
19/09/2025	13000826	Chapinero Occidental Tramo 1	Grupo Educativo Fundesuperior
			Colegio Manuela Beltrán
			Colegio Principado de Mónaco

10. PROGRAMA DE DIVULGACIÓN DEL PROYECTO.

10.1. Objetivo General

Mantener informada a la comunidad durante la ejecución del proyecto, por medio de piezas de divulgación, que contengan información de las diferentes actividades y acontecimientos específicos que se puedan presentar y que impacten a la comunidad.

10.2. Puntos satélites de información

Los puntos satélites de información son equipamientos urbanos o puntos de encuentro ciudadano, para este proyecto tendrán como función difundir por medio de piezas de divulgación la información de este contrato la comunidad de la localidad de Teusaquillo.

Para el **periodo No. 8,** se realizó la actualización de (8) PSI, ubicados en los barrios Nicolas de Federmán tramo 1, Alfonso López, Galerías, San Luis tramos 1 y 2, Chapinero Occidental y Quinta Paredes, se publicaron piezas informativas de acuerdo a la dinámica de la obra. Igualmente, se realizó la desinstalación de (1) PSI por terminación de obra en el barrio Ortezal.

Anexo 3 PSIS vigentes en el periodo

Tabla 8 PSI vigentes en el periodo

Periodo No. 8						
Fechas	**CIV**	**Barrio/tramo**	**Dirección**	**Instalación**	**Mantenimiento/ actualización**	**Desinstalación**
17/09/2025	13000284	Nicolás de Federmán tramo 1	Caseta parque de la carrera 47 con calle 58 y 59	0	1	0
26/09/2025	13001165	Alfonso López	Carrera 27 # 50-77	0	1	0
25/09/2025	13000875	Galerías	Calle 53B # 27-31	0	1	0
17/09/2025	13000336	San Luis	Carrera 19A # 61-67/65	0	1	0
17/09/2025	13000826	Chapinero Occidental	Carrera 14A # 57-28	0	1	0
03/09/2025	13001326	Ortezal	Calle 22Bis # 48-28	0	0	1
17/09/2025	13001489 13001461	Palermo	Transversal 16 Bis No. 45D-79	0	1	0
15/09/2025	13000744	San Luis	Carrera 20 No. 57-55	0	1	0
16/09/2025	13001365	Quinta Paredes	AC 26 No. 44 A-29	0	1	0
Total				0	8	1

Tabla 9 Indicador PSI actualizados

Ítem	Formula	Meta	% de cumplimiento
PSI	8 PSI actualizados / 8 PSI con necesidad de actualización * 100	Actualizar los PSI	100%

Tabla 10 Indicador PSI desinstalados

Ítem	Formula	Meta	% de cumplimiento
PSI	1 PSI desinstalado / 1 PSI con terminación de obra * 100	Desinstalar los PSI abiertos	100%

10.3. Volante informativo de inicio de obra

Para el **periodo No. 8**, no se distribuyeron volantes de inicio de obra, ya que por la dinámica del contrato no se dio la necesidad de implementarlas. Estas se aplicarán en el momento que sea necesario en concordancia a la dinámica del proyecto.

10.4. Volante de convocatoria a reuniones de inicio de obra

Para el **periodo No. 8,** desde el área social del Consorcio Teusavial, se realizó la distribución de volantes de invitación a reunión de inicio de obra, para el barrio Quinta Paredes, se realizó visita predio a predio en la zona de influencia directa de la vía a intervenir, invitando a propietarios y residentes a participar en la reunión de socialización para el inicio de las obras en el sector, se aplicó la metodología aprobada para tal fin, se contó con el aval de la interventoría.

Anexo 4 Formato control entrega de piezas de divulgación invitación a reunión de inicio, volante y registro fotográfico tramo Quinta Paredes.

Tabla 11 consolidado convocatoria reuniones de inicio

Periodo No. 8					
Tipo de volante	**CIV**	**Barrio**	**Tramo**	**Fecha**	**# volantes distribuidos**
Convocatoria reunión de inicio	13001365	Quinta Paredes	1	16/09/2025	50
Total					50

Tabla 12 Indicador distribución de volantes de convocatoria a reunión inicio

Programa	Formula	Meta	% de cumplimiento
Divulgación	50 volantes de convocatoria a reunión de inicio distribuidos _____ 50 volantes de convocatoria a reunión de inicio requeridos * 100	Distribuir un volante por pedio en zona de influencia directa de cada tramo a intervenir	100%

10.5. Volante recomendaciones para adecuación de canales y bajantes de aguas lluvias

El contratista implementará esta pieza una vez se inicie la etapa de obra, en los predios que requieran su utilización, para acordar con la comunidad la correcta instalación de canales y bajantes de aguas lluvias, sin embargo, para **el periodo No. 8,** no aplica, dado que no se identificaron situaciones que dieran lugar a su implementación.

10.6. Volante notificación inicio actas de vecindad

Para el **periodo No. 8**, el área social no realizó la distribución de volantes inicio actas de vecindad, dado que, por programación técnica de obra, no se contempló apertura de nuevos tramos, por lo tanto este ítem no aplica para el presente periodo.

10.7. Volante Oferta laboral

Para el **periodo No. 8**, no se realizó publicación de volante de oferta laboral, sin embargo, en las reuniones de inicio de obra realizadas en los periodos anteriores se realizó la divulgación de oferta laboral para mano de obra no formada, se indicó a la comunidad el correo para el envío de las hojas de vida de las personas que estuvieran interesadas en las vacantes para cargos de BOAL y ayudantes de obra.

10.8. Volante de información ciudadana

Estas piezas se implementarán en caso de presentarse alguna contingencia, se adelantarán según la programación de actividades técnicas específicamente cuando haya necesidad de brindar:

- Información sobre corte se servicios públicos.
- Cuando se presente intervención de tráfico vehicular.

- Cuando se presenten circunstancias de intervención particular.

Para el **periodo No. 8,** no se implementó esta pieza ya que no se generaron situaciones que diera lugar a su utilización, no aplica para este informe.

10.9. Piezas de Información del Plan de Manejo de Tráfico - PMT.

Para el presente periodo no se generó la necesidad de implementar este tipo de piezas informativas, por lo cual este ítem no aplica para este periodo.

10.10. Volante otras informaciones

Para el presente periodo no se generó la necesidad de implementar este tipo de piezas informativas, por lo cual este ítem no aplica para este periodo.

10.11. Volante notificación cierre actas de vecindad

Para el presente periodo, el área social del Consorcio Teusavial, continúo con el proceso de cierre de actas de vecindad, por lo tanto, se realizó la distribución de volantes cierre de actas de vecindad de primera, segunda y tercera visita; a los tramos que están en proceso de remates por el área técnica. La actividad se realizó en el barrio Galerías y Alfonso López CIV´S 13000875 y 13001165, respectivamente.

Los volantes en su debido momento, fueron presentados a la interventoría, contaron con su aprobación para impresión y distribución, se aplicó la metodología aprobada.

A continuación, se presentan tablas de consolidados de distribución de volantes de primera, segunda y tercera visita durante el periodo.

Tabla 13 Consolidado notificación cierre de actas de vecindad en el periodo

Periodo No. 8					
Tipo de volante	**CIV**	**Barrio**	**Tramo**	**Fecha**	**# volantes distribuidos**
Notificación cierre de actas de vecindad primera visita	1300875	Galerías	1	25/09/2025	4
	13001165	Alfonso López	1	26/09/2025	31
Total					35

Anexo 5 Formato control entrega de piezas de divulgación, volante cierre de actas de vecindad primera visita y registro fotográfico barrios Galerías y Alfonso López.

Tabla 14 Indicador distribución de volantes cierre de actas de vecindad primera visita en el periodo

Programa	Formula	Meta	% de cumplimiento
Divulgación	35 volantes de cierre de actas de vecindad primera visita distribuidos _____ 35 volantes de cierre de actas de vecindad de primera visita requeridos * 100	Distribuir un volante por predio en zona de influencia directa de cada tramo intervenido	100%

Tabla 15 Consolidado de distribución de volante notificación segunda visita de cierre actas de vecindad

Periodo No. 8					
Tipo de volante	**CIV**	**Barrio**	**Tramo**	**Fecha**	**# volantes distribuidos**
Notificación cierre actas de vecindad segunda visita	13001165	Alfonso López	1	27/09/2025	8
Total					8

Anexo 6 Formato control entrega de piezas de divulgación, volante cierre de actas de vecindad segunda visita y registro fotográfico barrio Alfonso López.

Tabla 16 Indicador distribución de volantes cierre de actas de vecindad segunda visita en el periodo

Programa	Formula	Meta	% de cumplimiento
Divulgación	8 volantes de segunda visita de cierre actas de vecindad distribuidos _____ 8 volantes de segunda visita de cierre actas de vecindad requeridos * 100	Distribuir un volante de segunda visita de cierre actas de vecindad, en predios donde no se reciba atención en primera visita	100%

Tabla 17 Consolidado de distribución de volante notificación tercera visita de cierre de actas de vecindad

Periodo No. 8					
Tipo de volante	**CIV**	**Barrio**	**Tramo**	**Fecha**	**# volantes distribuidos**
Notificación cierre de actas de vecindad tercera vista	13001165	Alfonso López	1	29/09/2025	6
Total					6

Anexo 7 Formato control entrega de piezas de divulgación, volante cierre de actas de vecindad tercera visita y registro fotográfico Alfonso López.

Tabla 18 Indicador distribución de volantes cierre de actas de vecindad tercera visita en el periodo

Programa	Formula	Meta	% de cumplimiento
Divulgación	6 volantes de cierre de actas de vecindad tercera visita distribuidos / 6 volantes de cierre de actas de vecindad tercera visita requeridos * 100	Distribuir un volante de tercera visita de cierre de actas de vecindad, en predios donde no se reciba atención en segunda visita	100%

10.12. Volante de convocatoria a reuniones de finalización de obra

Para el presente periodo no se generó la necesidad de implementar este tipo de piezas informativas, por lo cual este ítem no aplica para este periodo.

11. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA – ACTAS DE VECINDAD

11.1. Levantamiento de Actas de Vecindad iniciales.

Desde el componente social del contratista Consorcio Teusavial, para el **periodo No. 8,** no se realizó levantamiento actas de vecindad. Se informa que el día 25 de septiembre del presente año, se radicó ante la interventoría las actas de vecindad realizadas en el periodo anterior, tramos de Palermo CIV´S 13001489 – 13001461, San Luis tramo 2 CIV 13000744 y Quinta Paredes CIV 13001365.

11.2. Actas de compromiso.

Para el presente periodo no surgieron situaciones que ameritaran el levantamiento de actas de compromiso, dado que el contrato se encuentra en etapa preliminar, por tal motivo no hay reporte referente a este tema, no aplica para este informe.

11.3. Levantamiento de actas para acceso a rampas

Para el **periodo No. 8,** desde el componente social del contratista Consorcio Teusavial, no se reporta levantamiento de actas para acceso a rampas

11.4. Registro fílmico y fotográfico de vías de desvió.

Para el **periodo No. 8**, desde el componente social del contratista Consorcio Teusavial, no se reporta la realización de registro fílmico y fotográfico de vías aledañas y/o de posibles desvíos de PMT.

11.5. Actas de Vecindad de cierre

Para el presente periodo, el área social del Consorcio Teusavial, continúa con el proceso de cierre de actas de vecindad, procedimiento que consiste en la realización de una o tres visitas predio a predio en los tramos donde se concluyeron actividades técnicas, se valida con los encargados, responsables y/o propietarios de las viviendas, si a causa de la obra se generaron afectaciones en las mismas.

En caso de recibir manifestaciones de daños, se procede a verificar contra registro inicial de acta de vecindad y de evidenciar afectaciones nuevas, en caso de comprobar algún tipo de afectación se realiza respectivos acuerdos económicos y/o reparaciones para subsanar las afectaciones. Se levanta y se cierra PQR, y así mismo se da cierre correspondiente en paz y salvo, que estará anexo al formato de acta de vecindad.

Para este periodo, se realizó cierre de actas de vecindad en el barrio Galerías y Alfonso López, CIV´S 13000875 y 13001165, las cuales se radicarán a la interventoría en el próximo periodo. A continuación, se presenta tabla de consolidado de cierre de actas de vecindad:

Tabla 19 Consolidado cierres de actas de vecindad

Periodo No. 8						
Barrio	**Tramo**	**CIV**	Total, actas de predios cerradas con firma del propietario y/o encargado	Total, cierre de actas con tres vistas verificadas con firma interventoría	Total, actas pendientes para cierre	Observaciones
Galerías	1	13000875	4	0	0	Se cierran actas a satisfacción de la comunidad
Alfonso López	1	13001165	21	5	2	2 actas pendientes de cierre, se reportarán en el próximo periodo

11.6. Divulgación actas de vecindad a la comunidad

Durante el presente periodo, no se realizó la entrega de copia de acta de vecindad a la comunidad

12. PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

El contratista en cumplimiento de sus obligaciones dará atención oportuna a la comunidad a través del trato digno y respetuoso que propenderá por la rápida solución de las diferentes consultas y requerimientos que se presenten; en virtud de ello contará con la instalación de un Punto PAC Fijo, virtual y móvil.

12.1. Punto PAC fijo

Desde el área social del contratista, se da cumplimiento a la metodología dispuesta para atención a la comunidad en caso de presentarse alguna petición, reclamo, queja, sugerencia, y/o denuncia, por tal motivo se instaló el Punto PAC fijo el cual cuenta con atención presencial, en la calle 39 A # 29 -21 piso 3.



Foto 1 Punto PAC

El equipamiento del Punto PAC, será dotado con los siguientes elementos y/o recursos:

- ✓ Espacio de recepción
- ✓ Escritorio y silla para la persona encargada de la atención del Punto PAC.
- ✓ Computador e impresora
- ✓ Sillas para la atención a la población.
- ✓ Material impreso: formato de sistema de atención PQRSD.

- ✓ Medios de comunicación: Línea telefónica para hacer la recepción de las llamadas realizadas por la población y cuenta de correo electrónico.
- ✓ Horario de atención al público.

12.2. Punto PAC VIRTUAL

La contratista continua con la disposición de la atención del Punto PAC Virtual, como mecanismo que no implique desplazamientos de la comunidad hasta el Punto físico, se realizó instalación de la línea de atención No. 3019072050, la cual está dispuesta para la atención a la comunidad y el correo electrónico: teusavialsocial@gmail.com.

Esta información ha sido plasmada en cada pieza informativa que se ha entregado a la comunidad y en el punto satélite de información. Para el presente informe por medio del correo electrónico no se recibieron PQRSD.

12.3. Punto PAC Móvil

Durante este periodo el contratista a través del área social realizó recorridos de reconocimiento de los tramos de obra, con el ánimo de tener un acercamiento directo con la comunidad, escuchar sus consultas y manifestaciones y así mismo tramitar su respuesta en lo posible de manera inmediata.

Para este periodo se presentó una (1) PQRSD, la cual será referenciada y se dará respectiva trazabilidad en el apartado PQRSD, al finalizar el programa atención al ciudadano. Se hace claridad que en la vigencia de este periodo el contratista Consorcio Teusavial continua con la disposición de canales de atención, los cuales se describen en la siguiente tabla.

Tabla 20 Tabla de atención PUNTO PAC

Horario de Atención Virtual		Contacto	Responsable
Días	**Horario**		
Lunes a viernes	8 am a 4:30 pm 	 Correo electrónico: teusavialsocial@gmail.com Teléfono Móvil: 3019072050	Profesional Social T.S Ángela María Quiroga G.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 21 Indicador Punto PAC Móvil

Ítems/programa	Formula	Meta	% de cumplimiento
Punto PAC Móvil	1 punto PAC móvil implementado / 1 punto PAC móvil programado * 100	Instalación de un Punto PAC móvil	100%

Fuente: elaboración propia.

12.5 PQRSD

Durante el **periodo No. 8,** se recibió una (1) PQRSD, correspondiente al consecutivo No. 6, dicha PQRSD corresponde a particularidades surgidas por los procesos constructivos en los tramos de obra. A continuación, se muestra consolidado y trazabilidad de las PQRSD generadas hasta la fecha de este informe.

Anexo 8 PQRSD No. 6.

Para el presente informe por medio del correo electrónico no se recibieron PQRSD.

Tabla 22 Consolidado PQRSD

# de PQRSD	Fecha apertura	Fecha de cierre	Solicitud	Peticionario	Dirección /teléfono	Trazabilidad	Estado/ informe #
1	25/03/2025	7/04/2025	Copia acta de reunión de inicio tramo 1 Nicolás de Federmán	Jesika Aullon Guerrero Edificio Monterosso P-H Administración	Carrera 47 # 58 - 40 Edificio Monterosso	7/04/2025 Se emite correo electrónico con acta de reunión solicitada. En esta misma fecha se recibe notificación de la peticionaria, sobre el recibido de la información solicitada. Teniendo en cuenta la respuesta dada se genera cierre de la PARSD No. 1, a satisfacción de las partes.	Cerrado en informe No. 3
2	29/04/2025	19/05/2025	Garantizar el paso para silla de ruedas costado occidental, tramo de la carrera 27 entre	Yessica Olaya Sánchez Tel. 3178376564	Carreras 27 3 entre calles 50 y 51	29/04/2025 Por medio del correo electrónico de atención a la comunidad, se recibe petición de una residente del tramo Alfonso López, quien solicita que por el andén del costado	Cerrado en informe No. 4

# de PQRSD	Fecha apertura	Fecha de cierre	Solicitud	Peticionario	Dirección /teléfono	Trazabilidad	Estado/ informe #
2			calles 50 y 51, Alfonso López			occidental se garantice el paso de una silla de ruedas o persona con movilidad reducida. Se dará trámite en el periodo No. 4. 13/05/2025 Se realiza recorrido con el área técnica del contratista, donde se verifican los niveles del espacio público del costado occidental. Igualmente, se realiza adecuación de sobresalto en la junta de los andenes, quedando el andén en condiciones óptimas para la movilidad de silla de ruedas. 19/05/2025 Se envía respuesta formal a la señora Peticionaria, a través de correo electrónico. 23/05/2025 Se realiza visita al predio y se recibe firma física de la trazabilidad y cierre de la presente PQRSD.	
3	08/05/2025	08/05/2025	Inconformidad referente al poco personal trabajando en el tramo y la maquinaria quieta	Julia Moreno Tel. 6012219996	Calle 53A No. 35-10	Se informa a la Peticionaria que las actividades que se están adelantando son de tipo manual: excavación, adecuación de cárcamos y la instalación de tubería hacia los pozos. Igualmente, se le informa que las condiciones climáticas hacen que en ciertos lapsos de tiempo sea necesario suspender actividades, sin embargo, la ejecución se encuentra en los tiempos estipulados. La Peticionaria recibe la información suministrada y cierra el PQRSD a satisfacción.	Cerrado en informe No. 4

# de PQRSD	Fecha apertura	Fecha de cierre	Solicitud	Peticionario	Dirección /teléfono	Trazabilidad	Estado/ informe #
4	11/06/2025	11/06/2025	Información sobre la intervención que se está llevando a cabo en la carrera 47 entre calles 58A y 59, tiempo de duración, pago de parqueaderos	Blanca Mojica Álvaro Suarez Tel. 3142328909	Carrera 47 No. 58A-67	Se informa a los Peticionarios que la intervención del tramo carrera 47 entre calles 58A es de tres meses aproximadamente, tiempo en el cual no se permite el ingreso a los garajes y el costo de los mismos es asumido por el propietario, arrendatario y/o encargado del predio.	Cerrado en informe No. 5
5	02/07/2025	02/07/2025	Durante proceso de cierre de actas de vecindad, el propietario manifiesta fisura mínima en muro de alcoba del costado sur.	John Alexander Blandon Tel. 3107713366	Carrera 47 No. 58-40 Apartamento 208	En visita realizada al predio con el acompañamiento del área técnica del contratista, se evidencia que el daño mencionado por el propietario, muestra levantamiento de pintura generada por humedad, que no son ocasionadas por los equipos y maquinaría utilizada; sin embargo y ante la negativa de firma del paz y salvo, el Consorcio Teusavial, realiza la reparación de la fisura mínima, aclarando que la intervención realizada en la vía no sobrepasa los 65 cm, siendo poco viable la afectación de alguna propiedad vecina. El propietario firma a satisfacción el cierre del acta de vecindad.	Cerrado en informe No. 6

# de PQRSD	Fecha apertura	Fecha de cierre	Solicitud	Peticionario	Dirección /teléfono	Trazabilidad	Estado/ informe #
6	01/09/2025	03/09/2025	El día 01 de septiembre de 2025, la firma Contratista Consorcio Teusavial, recibe solicitud de PQRSD, a través de la firma Interventora Consorcio Interteusaquillo JG, la cual fue remitida por la supervisión en la fecha mencionada, donde el señor Benjamín Espitia Nieto, residente del predio ubicado en la Calle 55Bis No.15A-13, el día 28 de agosto manifiesta queja formal a la Alcaldía de Teusaquillo refiriendo inconformidad por obras de adecuación de la vía Carrera 15 entre calles 54A y 55Bis, barrio Chapinero Occidental.	Benjamín Espitia Nieto	Calle 55Bis No. 15A-13 3133069678	El día 03 septiembre de 2025, El Consorcio Teusavial envía respuesta al comunicado CIT_FDLT_577_2024_142, con consecutivo TEUSAVIAL-552-116, dando cumplimiento a la solicitud y cerrando de esta manera la presente PQRSD.	Cerrado en informe No. 8

12.6. Participación Ciudadana Reuniones Comité Ciudadano

La firma Contratista, a través de la residente social estableció en reunión de inicio del tramo 1 barrio Nicolás de Federmán, un comité de participación ciudadana, conformado por personas de la comunidad ubicada en el área de influencia directa del proyecto. Se aclara que el tramo finaliza en el mes de octubre, por lo cual se programará la reunión de finalización.

Para el presente periodo, el área social del Consorcio Teusavial y en reunión de inicio del tramo del barrio Quinta Paredes, realizó la conformación del segundo comité de participación ciudadana, donde se postularon 4 personas de la comunidad; los cuales, se reunirán cada dos meses, para informar a los participantes el avance de la obra y los cambios generados durante la intervención. Igualmente, los representantes del Contratista y la Interventoría identificarán las problemáticas manifestadas por los asistentes y ofrecerá alternativas y soluciones.

Durante el presente período, no se llevó a cabo ninguna reunión de Comité de Participación Ciudadana.

13. PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD

13.1. Objetivo General

Brindará información por medio de plegables de sostenibilidad sobre la responsabilidad ciudadana en el buen uso y mantenimiento de las obras construidas, en pro de que las mismas se mantengan en el tiempo.

13.2. Plegables de Sostenibilidad

En el presente periodo se dio inicio a la socialización del plegable de sostenibilidad de la vía, en los barrios Galerías, Nicolás de Federmán tramo 2 y 3 y Alfonso López CIV´S 13000875, 13000864, 13000476 y 13001165, se realizó acercamiento predio a predio donde se contactaron a los propietarios y/o encargados de los mismos, indicando recomendaciones a tener en cuenta para que las obras ejecutadas se conserven en buen estado.

Los plegables en su debido momento, fueron presentados a la interventoría, contaron con su aprobación para impresión y distribución, se aplicó la metodología aprobada.

A continuación, se presenta tabla de consolidado de distribución de plegables de sostenibilidad de la vía durante el periodo.

Tabla 23 Consolidado entrega de plegables de sostenibilidad de la vía en el periodo

Periodo No. 8					
Tipo de volante	**CIV**	**Barrio**	**Tramo**	**Fecha**	**# volantes distribuidos**
Plegable de sostenibilidad de la vía	1300875	Galerías	1	25/09/2025	8
	13000864	Nicolás de Federmán	2	25/09/2025	42
	13000476		3	29/09/2025	4
	13001165	Alfonso López	1	26/09/2025	39
Total					93

Anexo 9 Formato control entrega de piezas de divulgación, plegable de sostenibilidad de la vía y registro fotográfico barrios Galerías, Nicolás de Federmán y Alfonso López.

Tabla 24 Indicador distribución de plegables de sostenibilidad de la vía en el periodo

Programa	Formula	Meta	% de cumplimiento
Sostenibilidad	93 plegables de sostenibilidad de la vía distribuidos _____ 93 plegables de sostenibilidad de la vía requeridos * 100	Distribuir un plegable por predio en zona de influencia directa de cada tramo intervenido	100%

14. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A LOS EMPLEADOS DEL PROYECTO.

14.1 Objetivo General

Realizar acciones encaminadas a la formación del personal que hace parte del contrato, articuladas con las áreas SST y ambiental, a través de una capacitación mensual sobre temas que contribuyan al mejoramiento de la convivencia y desarrollo personal, laboral y social de los trabajadores adscritos al proyecto, además de enfatizar sobre el trato a la ciudadanía.

14.2 Capacitación mensual

Para el **periodo No. 8**, desde el área social y SST, se implementó la capacitación No. 8, la cual se desarrolló en el tramo de obra de Nicolás de Federmán, Quinta Paredes y San

Luis, el tema abordado fue salud mental, se contó con la participación activa del personal vigente.

Anexo 10 Registro de asistencia y fotográfico de capacitación No. 8

Tabla 25 Realización de capacitación mensual

Periodo No. 8		
Fecha	**Tema**	**No. De asistentes**
24/09/2025	Salud Mental	20

Tabla 26 Indicador realización de capacitación mensual

Ítems/programa	Formula	Meta	% de cumplimiento
Programa de capacitación a los empleados del proyecto.	20 trabajadores asistentes a la capacitación Mensual No. 8 / 20 trabajadores convocados a la capacitación * 100	Realización de una capacitación mensual.	100%

Fuente: elaboración propia.

15. PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA NO FORMADA

15.1 Objetivo General

Vincular mínimo al 30% de personal MONF[1], de la localidad de Teusaquillo, en concordancia al anexo técnico del contrato.

15.2 Generación total de empleo

Para el **periodo No. 8,** el Consorcio Teusavial continua con la plantilla de personal profesional requerida, se cumple con la vinculación de mano de obra femenina, también se continua con contratación de mano de obra no formada, de la localidad de Teusaquillo. A continuación, se presenta tabla.

[1] Mano de obra no formada

Tabla 27 Personal contratado en el periodo No. 8

NÚMERO	EMPRESA (CONTRATISTA/ SUBCONTRATISTA)	DATOS DEL TRABAJADOR				
		TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	LOCALIDAD DE RESIDENCIA N°	CARGO
NUEVO						
1	PAVIOBRAS SAS	LABORAL	ALVARO RIOS BARRIOS	11433021	TEUSAQUILLO	OPERADOR
2	VG EQUIPOS Y MAQUINARIA SAS	LABORAL	VICENTE GUIZA PINZON	80127447	CIUDAD BOLIVAR	OPERADOR
ANTIGUO						
1	JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA	OPS	JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA	79947081	USAQUÉN	DIRECTOR DE OBRA
2	JUAN RICARDO TRONCOSO RIVERA	OPS	JUAN RICARDO TRONCOSO RIVERA	80026555	PUENTE ARANDA	ESP. GEOTECNIA Y PAVIMENTOS
3	LISANDRO NUÑEZ GALEANO	OPS	LISANDRO NUÑEZ GALEANO	5471618	USAQUÉN	ESPECIALISTA HIDRAULICO
4	CONSORCIO TEUSAVIAL	LABORAL	SANDRA ISABEL PERILLA FONSECA	52104995	BOSA	AUXILIAR SOCIAL
5	CONSORCIO TEUSAVIAL	LABORAL	YOHANA MARCELA AREVALO MOLINA	1032380392	FONTIBÓN	INGENIERA CIVIL DE OBRAS Y TÉCNICA
6	CONSORCIO TEUSAVIAL	LABORAL	HENRY CAMILO DURAN MARQUEZ	80903575	MARTIRES	RESIDENTE AMBIENTAL
7	CONSORCIO TEUSAVIAL	LABORAL	ANDRES FELIPE ECHANDIA ROLDAN	79785617	USAQUÉN	RESIDENTE DE OBRA
8	CONSORCIO TEUSAVIAL	LABORAL	ANGELA MARIA QUIROGA GALVIS	52753727	PUENTE ARANDA	RESIDENTE SOCIAL
9	CONSORCIO TEUSAVIAL	LABORAL	TATIANA ANDREA VALDELEÓN MANRIQUE	1014240890	ENGATIVA	RESIDENTE SST
10	CONSORCIO TEUSAVIAL	LABORAL	DANIEL FELIPE SANCHEZ MOLINA	1023928966	TUNJUELITO	TOPOGRÁFO
11	CONSORCIO TEUSAVIAL	LABORAL	ISABEL CRISTINA AGUDELO	1193074894	ENGATIVA	INSPECTORA SST AMBIENTAL
12	CONSORCIO TEUSAVIAL	LABORAL	DAVID SEBASTIAN MARTINEZ ARENAS	1022421350	KENNEDY	INSPECTOR DE OBRA
13	CONSORCIO TEUSAVIAL	LABORAL	REINALDO SALAS GONZALEZ	1240640	CIUDAD BOLIVAR	AYUDANTE DE OBRA
14	CONSORCIO TEUSAVIAL	LABORAL	ALEXIS FEREIRA SALAS	1775189	CIUDAD BOLIVAR	AYUDANTE DE OBRA
15	CONSORCIO TEUSAVIAL	LABORAL	GLORIA ESPERANZA CAMPOS	52026157	CIUDAD BOLIVAR	AUXILIAR SOCIAL
16	CONSORCIO TEUSAVIAL	LABORAL	RAFAEL GUTIERREZ	79122807	ENGATIVA	CONDUCTOR

17	EP INGENIEROS CIVILES SAS	LABORAL	EDWIN MALAMBO	123349149	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA
18	EP INGENIEROS CIVILES SAS	LABORAL	NESTOR ALBERTO REYES	4226971	CIUDAD BOLIVAR	OFICIAL DE OBRA
19	EP INGENIEROS CIVILES SAS	LABORAL	GIOVANNI GUIZA	1024524592	CIUDAD BOLIVAR	OPERADOR DE MINICARGADOR
20	CONSORCIO TEUSAVIAL	LABORAL	SANDRA LILIANA VACA	52971427	CIUDAD BOLIVAR	AUXILIAR TOPOGRAFIA
21	CONSORCIO TEUSAVIAL	LABORAL	JHON FREDY HERNANDEZ	74189712	CIUDAD BOLIVAR	AUXILIAR TOPOGRAFIA
22	CONSORCIO TEUSAVIAL	LABORAL	JULIÁN FERNANDO TRUJILLO DURÁN	1010200330	CIUDAD BOLIVAR	INSPECTOR SST-AMB
23	EP INGENIEROS CIVILES SAS	LABORAL	MIGUEL ANGEL ROA PEÑA	1023923191	CIUDAD BOLIVAR	OFICIAL DE OBRA
24	CONSORCIO TEUSAVIAL	LABORAL	JONATHAN CASTAÑO PIEDRAHITA	1012360118	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA
25	CONSORCIO TEUSAVIAL	LABORAL	LENIS CALDERON BOCANEGRA	79955833	BOSA	AYUDANTE DE OBRA
26	EP INGENIEROS CIVILES SAS	LABORAL	EULOGIO RAMIREZ	6004326	CIUDAD BOLIVAR	AYUDANTE DE OBRA
27	EP INGENIEROS CIVILES SAS	LABORAL	ANDRES GUSTAVO ROA	1023892019	CIUDAD BOLIVAR	OFICIAL DE OBRA
28	EP INGENIEROS CIVILES SAS	LABORAL	JHON FREDY JIMENEZ	1074808680	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA
29	EP INGENIEROS CIVILES SAS	LABORAL	RUBEN DARIO PINILLA ROMERO	80006819	MARTIRES	AYUDANTE DE OBRA
30	EP INGENIEROS CIVILES SAS	LABORAL	JACKSON RODRIGUEZ RIVAS	18420022	MARTIRES	AYUDANTE DE OBRA
31	CONSORCIO TEUSAVIAL	LABORAL	WILMER PEROZO	993685	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA
32	CASTRO VARGAS INGENIEROS SAS	LABORAL	CARLOS ARTURO CADENA	1032383432	CIUDAD BOLIVAR	OPERADOR
33	DISTRICOMERCIO YLSAS	LABORAL	HUMBERTO VARGAS	80265284	CIUDAD BOLIVAR	OPERADOR
34	CONSORCIO TEUSAVIAL	LABORAL	EDGAR ALFONSO CASTRO BARRAGAN	79896322	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA
35	CONSORCIO TEUSAVIAL	LABORAL	OSCAR ENRIQUE DE LIMA	1118843305	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA
36	CONSORCIO TEUSAVIAL	LABORAL	KEVIN ANDRES ALZATE ROMERO	1105464056	CIUDAD BOLIVAR	AYUDANTE DE OBRA
37	EP INGENIEROS CIVILES SAS	LABORAL	OSCAR JAVIER GARZON MARTINEZ	107367696	CIUDAD BOLIVAR	AYUDANTE DE OBRA
38	EP INGENIEROS CIVILES SAS	LABORAL	RONAL SALCEDO	5300663	CIUDAD BOLIVAR	AYUDANTE DE OBRA
39	EP INGENIEROS CIVILES SAS	LABORAL	LUIS ALBERTO RIVERA CASTRO	4052960	CIUDAD BOLIVAR	AYUDANTE DE OBRA
40	MAQUINARIA MEDINA R Y C SAS	LABORAL	JOSE ANDRES NIETO ROA	1031132699	CIUDAD BOLIVAR	OPERADOR
41	EP INGENIEROS CIVILES SAS	LABORAL	JOSE MIGUEL VARGAS ROA	79878620	CIUDAD BOLIVAR	AYUDANTE DE OBRA

42	CONSORCIO TEUSAVIAL	LABORAL	EDGAR DAVID GONZALEZ GOMEZ	1010178521	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA
43	EP INGENIEROS CIVILES SAS	LABORAL	ANDRES FELIPE VILLEGAS MEDINA	1024592489	CIUDAD BOLIVAR	OPERADOR
44	CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES	LABORAL	JHON FREDY QUINTERO	1022924380	CIUDAD BOLIVAR	OPERADOR
45	CONSORCIO TEUSAVIAL	LABORAL	HASSAY VANESA QUIROGA AGUILAR	1011080611	BOSA	INSPECTORA SSTAMB
46	EP INGENIEROS CIVILES SAS	LABORAL	JHONATHAN ALEXANDER CADENA JARA	1032418471	CIUDAD BOLIVAR	AYUDANTE DE OBRA
47	EP INGENIEROS CIVILES SAS	LABORAL	JOSE RICARDO MANZANILLA	5382962	CIUDAD BOLIVAR	OFICIAL DE OBRA
48	CONSORCIO CAPITAL	LABORAL	LEIVER ESTIVEN RODRIGUEZ MORALES	1000000755	TEUSAQUILLO	CADENERO I
49	CONSORCIO TEUSAVIAL	LABORAL	NIKOLAY CASTELLANOS CABALLERO	1001186516	TEUSAQUILLO	CADENERO I
RETIRO						
1	PAVIOBRAS SAS	LABORAL	JOSE ALBERTO GUZMAN PERDOMO	93471010	TEUSAQUILLO	OPERADOR FRESADORA
2	EP INGENIEROS CIVILES SAS	LABORAL	DANIEL ADRIAN SANCHEZ	1006903859	CIUDAD BOLIVAR	AYUDANTE DE OBRA
3	EP INGENIEROS CIVILES SAS	LABORAL	CARLOS ANDRES SERNA GALLEGO	1032455022	CIUDAD BOLIVAR	OFICIAL DE OBRA
4	VG EQUIPOS Y MAQUINARIA SAS	LABORAL	JONATHAN ROZO MARTINEZ	1031137524	CIUDAD BOLIVAR	OPERADOR RETROEXCAVADORA
5	EP INGENIEROS CIVILES SAS	LABORAL	JHON FREDY RAMIREZ	80254210	CIUDAD BOLIVAR	MAESTRO OBRA CIVIL
6	CONSORCIO TEUSAVIAL	LABORAL	HUMBERTO DAVID CHIRINOS GRIMAN	7094719	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA
7	CONSORCIO TEUSAVIAL	LABORAL	YDALIS DEXIRE TORREALBA	5900718	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA
8	CONSORCIO TEUSAVIAL	LABORAL	JOHAN SEBASTIAN RAMIREZ SANCHEZ	1033698531	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA

5.3. Vinculación de Mano de Obra No formada periodo No. 8.

Para el presente periodo se mantienen vinculadas (23) personas, con perfil mano de obra no formada, de las cuales (10) pertenecen a la localidad de Teusaquillo, las demás pertenecen a la localidad Ciudad Bolívar y otras localidades, desde el área de gestión humana del Consorcio Teusavial, se generó la vinculación de perfiles para actividades de auxiliares de tráfico y brigadistas de orden, aseo y limpieza con asignación de cargos de

ayudantes de obra, desde el subcontratista de obra se realizaron vinculaciones para ayudantes de obra, para actividades operativas en los diferentes frentes del proyecto.

A continuación, se presenta tabla que permite verificar cuantitativamente los porcentajes alcanzados del ítem para vinculación laboral MONF y mujeres.

Tabla 28 Porcentajes MONF – Mujeres en el periodo

Periodo No. 8							
Total, MONF	**Total, MONF localidad Teusaquillo**	**Total, MONF otras localidades**	**Porcentaje cumplimiento MONF**	**Total, personal contratado (MONF, y Mujeres MONF)**	**Total, mujeres vinculadas al proyecto**	**Total, personal vinculado al proyecto**	**Porcentaje total vinculación (mujeres)**
23	10	13	43.4%	57	9	57	15.7%

Tabla 29 Personal MONF en el periodo

#	EMPRESA (CONTRATISTA/ SUBCONTRATISTA)	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	LOCALIDAD DE RESIDENCIA N°	CARGO
1	EP INGENIEROS CIVILES SAS	JHONATHAN ALEXANDER CADENA JARA	1032418471	CIUDAD BOLIVAR	AYUDANTE DE OBRA
2	EP INGENIEROS CIVILES SAS	DANIEL ADRIAN SANCHEZ	1006903859	CIUDAD BOLIVAR	AYUDANTE DE OBRA
3	CONSORCIO TEUSAVIAL	REINALDO SALAS GONZALEZ	1240640	CIUDAD BOLIVAR	AYUDANTE DE OBRA
4	CONSORCIO TEUSAVIAL	ALEXIS FEREIRA SALAS	1775189	CIUDAD BOLIVAR	AYUDANTE DE OBRA
5	EP INGENIEROS CIVILES SAS	EDWIN MALAMBO	123349149	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA
6	CONSORCIO TEUSAVIAL	JONATHAN CASTAÑO PIEDRAHITA	1012360118	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA
7	CONSORCIO TEUSAVIAL	YDALIS DEXIRE TORREALBA	5900718	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA
8	CONSORCIO TEUSAVIAL	LENIS CALDERON BOCANEGRA	79955833	BOSA	AYUDANTE DE OBRA

9	EP INGENIEROS CIVILES SAS	EULOGIO RAMIREZ	6004326	CIUDAD BOLIVAR	AYUDANTE DE OBRA
10	EP INGENIEROS CIVILES SAS	JHON FREDY JIMENEZ	1074808680	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA
11	EP INGENIEROS CIVILES SAS	RUBEN DARIO PINILLA ROMERO	80006819	MARTIRES	AYUDANTE DE OBRA
12	EP INGENIEROS CIVILES SAS	JACKSON RODRIGUEZ RIVAS	18420022	MARTIRES	AYUDANTE DE OBRA
13	CONSORCIO TEUSAVIAL	WILMER PEROZO	993685	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA
14	CONSORCIO TEUSAVIAL	EDGAR ALFONSO CASTRO BARRAGAN	79896322	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA
15	CONSORCIO TEUSAVIAL	OSCAR ENRIQUE DE LIMA	1118843305	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA
16	CONSORCIO TEUSAVIAL	JOHAN SEBASTIAN RAMIREZ SANCHEZ	1033698531	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA
17	CONSORCIO TEUSAVIAL	KEVIN ANDRES ALZATE ROMERO	1105464056	CIUDAD BOLIVAR	AYUDANTE DE OBRA
18	CONSORCIO TEUSAVIAL	HUMBERTO DAVID CHIRINOS GRIMAN	7094719	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA
19	EP INGENIEROS CIVILES SAS	OSCAR JAVIER GARZON MARTINEZ	107367696	CIUDAD BOLIVAR	AYUDANTE DE OBRA
20	EP INGENIEROS CIVILES SAS	RONAL SALCEDO	5300663	CIUDAD BOLIVAR	AYUDANTE DE OBRA
21	EP INGENIEROS CIVILES SAS	LUIS ALBERTO RIVERA CASTRO	4052960	CIUDAD BOLIVAR	AYUDANTE DE OBRA
22	EP INGENIEROS CIVILES SAS	JOSE MIGUEL VARGAS ROA	79878620	CIUDAD BOLIVAR	AYUDANTE DE OBRA
23	CONSORCIO TEUSAVIAL	EDGAR DAVID GONZALEZ GOMEZ	1010178521	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA

Tabla 30 Indicador vinculación MONC

Programa	Formula	Meta	Cumplimiento
Contratación MONF	10 trabajadores MONF de localidad de Teusaquillo / 23 de trabajadores MONF * 100	30% mano de obra local y/o de localidades de estratos 1 y 2	43.4%

Es importante mencionar que, el contratista Consorcio Teusavial en el marco del contrato No. 552 – 2024 (120683), y en cumplimiento del acuerdo 332 de 2021 del Concejo de Bogotá, cuyo objetivo principal cerrar la brecha de pobreza y disminuir la informalidad económica e inclusión de mujeres en la contratación de obra pública, desde la etapa preliminar del contrato, realizó la vinculación de mano de obra femenina con un alcance del 20%, las cuales se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 31 listado de las mujeres vinculadas en cumplimiento al decreto 332 de 2021.

#	Contratista/ Subcontratista	Nombres Y Apellidos	Cédula	Localidad	Cargo
1	Consorcio Teusavial	Sandra Isabel Perilla Fonseca	52104995	Bosa	Auxiliar Social
2	Consorcio Teusavial	Yohana Marcela Arévalo Molina	1032380392	Fontibón	Ingeniera Civil De Obras Y Técnica
3	Consorcio Teusavial	Angela maría Quiroga Galvis	52753727	Puente Aranda	Residente Social
4	Consorcio Teusavial	Tatiana Valdeleón	1014240890	Engativá	Residente SST
5	Consorcio Teusavial	Isabel Cristina Agudelo	1193074894	Engativá	Inspectora SST-Ambiental
6	Consorcio Teusavial	Gloria Esperanza Campos	52026157	Bosa	Aux. Social
7	Consorcio Teusavial	Ydalis Dexire Torrealba	5900718	Teusaquillo	Ayudante de obra - Boal
8	Consorcio Teusavial	Sandra Liliana Vaca	52971427	Ciudad Bolívar	Aux. Topografía
9	CONSORCIO TEUSAVIAL	HASSAY VANESA QUIROGA AGUILAR	1011080611	Bosa	Inspectora SSTAMB

Tabla 32 Indicador generación de empleo de mujeres en el periodo

Programa	Formula	Meta	Cumplimiento
Contratación mujeres	9 mujeres vinculadas al proyecto / 57 personas total vinculadas al proyecto * 100	Mantener mínimo el 13.4% mano de obra femenina en el desarrollo del contrato	15.7%

16. PROGRAMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A DOTACIONES

16.1 Objetivo General.

Velar porque todos los empleados del proyecto utilicen adecuadamente los elementos de protección personal acorde a las actividades que cada uno realiza, cumpliendo con lo establecido en el Manual de Identidad Visual del Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo.

16.2 Seguimientos por periodo

Para el **periodo No. 8**, desde el área social del Consorcio Teusavial, se efectúo el seguimiento a dotaciones, para personal administrativo y operativo del contrato, quienes portan la dotación acorde a la imagen corporativa privada del contratista y en concordancia a criterios del área SST.



Foto 2 Uso dotación personal administrativo y operativo

Tabla 33 Indicador control y seguimiento de dotaciones

Programa	Formula	Meta	Cumplimiento
Control y seguimiento de dotaciones	57 trabajadores portando la dotación requerida _____ 57 trabajadores contratados en el periodo * 100	Que todo el personal administrativo y operativo contratado, porten la dotación requerida en cada periodo	100%

17 PROGRAMA DE GESTION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

17.1 Informes Semanales

Semanalmente la residente social del Consorcio Teusavial, ha remitido vía correo electrónico a la Interventoría, el informe semanal de actividades de gestión social, se han atendido las observaciones y sugerencias de la interventoría, de acuerdo a la etapa preliminar a la fecha.

17.2 Informe Mensual

Este es un mecanismo que permite verificar el cumplimiento de los programas del plan de gestión social planteados para el proyecto. En concordancia se presenta **el informe No. 8**, a corte 30 de septiembre de 2025**,** en este informe se describen las actividades que se realizaron durante el periodo. Posteriormente la interventora social realizará revisión, verificación, concepto y aprobación, para remitir a la alcaldía Local de Teusaquillo (FDLT).

17.3 Informe Final

Al finalizar el contrato se presentará un informe final a la firma interventoría, donde se plasme el consolidado de la implementación del Plan de Gestión Social en obra, dicho informe recogerá información cuantitativa y cualitativa de cada una de las actividades realizadas por tramo o sector intervenido. Como se proyecta realizar consolidado por tramo se dejará organizado el historial de anexos que den soporte de las actividades ejecutadas; los cuales fueron mencionados en los informes mensuales, pero que en el final también se registraran.

Las actas de vecindad harán parte de los anexos por cada segmento vial, estás llevaran un consolidado donde se registre el nombre del propietario, dirección teléfono y numero de acta, así mismo contarán con su respectivo soporte de acta de cierre que verifique si se generó alguna afectación y firma a satisfacción según sea el caso. El informe se entregará según los criterios de radicación del FDLT. El informe final contendrá los siguientes requisitos:

- ✓ Identificación, información del proyecto.
- ✓ Introducción.
- ✓ Componentes del Plan de Gestión Social con los programas y actividades desarrolladas por el contratista, incluirá consolidados e indicadores de cumplimiento.
- ✓ Análisis del cumplimiento del programa.
- ✓ Conclusiones y recomendaciones y anexos.

18 METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COSTOS.

18.1 Comités de Gestión Social

El seguimiento del desempeño social del contratista ha sido verificado semanalmente por la interventoría, de acuerdo a las actividades de gestión en campo, seguimiento telefónico y por vía correo electrónico. Adicionalmente se ha realizado seguimiento y verificación del trabajo por medio de comités sociales e integrales, validados y efectuados por la interventoría a través de la lista de chequeo. Esta información reposa en actas de seguimiento de la interventoría.

Anexos

Anexo 1
Acta de reunión de inicio Quinta Paredes, listado de asistencia y registro fotográfico

FORMATO ACTA DE REUNIÓN Y/O SOCIALIZACIÓN DE INICIO DE OBRA CON COMUNIDAD BARRIO QUINTA PAREDES TRAMO 1 CIV 13001365			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Teusaquillo
CÓDIGO FO-SC-14	**PROCESO** GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**VERSIÓN** 2.0	

Contrato No.: 552-2024 COP (120683)	**HORA INICIO:** 7:45 a. m.	**Hoja** _1___ de ___3__
FECHA: 18 de septiembre de 2025	**HORA DE FINALIZACIÓN:** 8:30 am	**Acta N°** 7

OBJETO DEL CONTRATO:

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo
2. Intervención del área de técnica del contratista.
3. Intervención de la comunidad
4. Compromisos
5. Cierre

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. **Saludo**: Siendo las 7:45 a.m del día 18 de septiembre de 2025, se inicia la reunión de socialización de inicio de obra, el ingeniero Carlos Durán, Ingeniero Juan Camilo Amaya y la Trabajadora Social Diana Silva de parte de la Supervisión de la Alcaldia Local, saluda a la comunidad y se presenta ante los asistentes e indica que el Contratista Consorcio Teusavial realizará la intervención del segmento vial, CIV 13001365 en el marco del contrato de obra No. No. FDLT-552-2024 COP (120683), del mismo modo agradece la participación de la reunión de socialización.

2. **Intervención del área técnica del contratista**, toma la palabra la ingeniera Marcela Arevalo, quien saluda a la comunidad y refiere que el objetivo de esta reunión es explicarle a la comunidad que desde el año pasado (2024), se realizó un proceso de licitación pública para la contratación de la intervención de la malla vial de algunos segmentos de la localidad, para lo cual fue incluido el CIV 13001365 del barrio Quinta Paredes, ubicado en la carrera 44A entre calles 24D y 25.

Manifiesta la necesidad del mejoramiento a la subrasante, por las evidentes de fisuar y hundimientos que se presentan actualmente en la vía. Igualmente, el refuerzo que requiere la estrctura por la perdica de capacida portante que presenta evidente en las deformaciones, con el fin de mejorar la calidad de vida de los residentes del área a intervenir. Expone a la comunidad las actividades a ejecutar: se hará excavación mecánica y manual, se realizará la instalación de geotextil tejido, conformación de subbase granular con agregado reciclado,instalación de geocelda rellena con agregado reciclado, posteriormete se procedería a la instalación de base granular mejorada con cemento y aditivo,instalación de concreto asfaltico base de MD-25 y concreto asfaltico MD-19 como rodadura.

Indica a la comunidad que las obras iniciarán el día 23 de septiembre del presente año, por un lapso de 3 meses aproximadamente, tiempo en el cual los accesos vehículares quedaran suspendidos. Las zonas de andenes quedan de libre circulación.

3. **Preguntas de los asistentes:**

Pregunta: Señor Miguel Atuesta, residente del Edificio Corporación El Dorado, manifiesta la intervencion se realiza a partir del 25 de septiembre hasta el 25 de diciembre, que en el contrato de ejecución no se encuentra contemplado la instalación de reductores de velocidad que actualmente estan instalados en la vía. Pregunta, ¿quien va a dejar la vía en el estado en que se encontraba?, ya que por el paso de vehículos pesados y con demasiada velocidad presentan un peligro para los residentes de la zona. Pregunta, ¿la vía no se puede ejecutar por carriles?

Respuesta: el ingeniero Carlos Durán, líder de infraestructura FDLT indica que las intervenciones que realizan los contratistas de la Alcaldía, dejan la señalización que establece la Secretaría de Movilidad; en este caso, para una malla vial intermedia. Igualmente informa, que la demarcación de la vía se realiza después de un tiempo, donde por el paso de los vehículos la carpeta asfaltica presenta un curado y alisado que permite el agarre de la pintura. En cuanto al paso de vehiculos pesados y a gran velocidad que generan peligro a los transeuntes, la Alcaldia Local realiza mesas de trabajo con la comunidad y una vez terminadas las intervenciones, y de forma conjunta se harán las solicitudes a que hubiere lugar ante la Secretaría de Movilidad. Se recomienda que como comunidad soliciten a Movilidad, dispositivos y medidas para el no ingreso de vehículos pesados y que sean ellos como entidad responsable, quien ponga unos limitantes para el no paso de este tipo de vehículos en el sector y que dispongan de otras rutas, incluyendo el tema de velocidad.

FORMATO ACTA DE REUNIÓN Y/O SOCIALIZACIÓN DE INICIO DE OBRA CON COMUNIDAD BARRIO QUINTA PAREDES TRAMO 1 CIV 13001365			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Teusaquillo
CÓDIGO FO-SC-14	**PROCESO** GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**VERSIÓN** 2.0	
Contrato No.: 552-2024 COP (120683)	**HORA INICIO:** 7:45 a. m.		**Hoja** _2___ de ___3__
FECHA: 18 de septiembre de 2025	**HORA DE FINALIZACIÓN:** 8:30 am		**Acta N°** 7

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

Respuesta: Toma la palabra la ingeniera Marcela Arevalo por parte del contratista, quien manifiesta a los presentes que una vez se inicia el trámite de PMT en los tramos a intervenir, se solicita a la Secretaría de Movilidad, los diseños de la demarcación de las vías. Manifiesta que la comunidad debe solicitar a la Secretaría de Movilidad, la instalación de estoperoles, badén, reductores de velocidad que promuevan un comportamiento más prudente de los conductores en áreas críticas, como zonas escolares, cruces peatonales y áreas residenciales. El Consorcio Teusavial no es responsable de este tipo de actividad y no se encuentra estipulado en el objeto del contrato.

Toma la palabra el señor Miguel Atuesta y solicita en nombre de la comunidad que la vía quede en las mismas condiciones de señalización que actualmente presenta; donde el ingeniero Carlos Duran, manifiesta que la vía quedará con la señalización que se encuentre autorizada y en el diseño que envie movilidad.

Pregunta: Señora Clara Inés González, Administradora Edificio Corporación El Dorado, ¿cómo va a quedar el cerramiento y si se van a intervenir los andenes?, ¿hasta qué punto de los andenes se va a colocar el cerramiento?. Con respecto al tema de los garajes, solicita que la obra se haga en el menor tiempo posible, debido a que el Edificio cuenta con 70 parqueaderos, que se de mayor tiempo para el retiro de los vehiculos porque en la zona es dificil encontrar parqueaderos.

Respuesta: La residente social del contratista, manifiesta que se va a instalar un cerramiento perimetral con polisombra en la parte inferior y en polimalla en la parte superior, que es mas traslúcida para mayor observación y mitigar impactos de inseguridad, creando un ambiente seguro y controlado, protegiendo el interior de los efectos del exterior y al público de los peligros de la obra. Igualmente manifiesta, que la obra va a contar con vigilancia para los elementos propios del contratista y quienes no pueden hacerse responsables de la seguridad de los transeuntes y residentes de la zona.

En cuanto al tiempo del intervención, se indica que el periodo expuesto es el mayor; sin embargo, esperamos poder entregar las obras en un tiempo menor. Se solicita el retiro de los vehículos de los parqueaderos a partir del día 23 de septiembre, debido a que el contratista cuenta con un permiso de la Secretaria de Movilidad con fechas establecidas para la ejecución de las obras y no queremos incurrir en incumplimientos que nos puedan acarrear sanciones.

El ingeniero Carlos Durán manifiesta que esta vía como la de carrera 43, ya cuentan con el Plan de Manejo de Transito y se debe cumplir con las fechas establecidas dentro de este permiso. La vía carrera 44A cuenta con un cronograma de ejecución establecido dentro de los tiempos de ejecución del Contrato, indica a la comunidad que en otras vias en las cuales se ha ejecutado la misma intervención y gracias a que el clima ha favorecido, se han terminado segmentos en menos de dos meses.

Pregunta: Señora Cecilia Ayala, Administradora Edificio Villa Venetto, pregunta ¿se va a incluir o adecuar algunas cajas o cableado?. Igualmente, solicita que no abandonen la obra y que se cuente con el personal autorizado para resolver la inquietudes en el momento de la intervención. En cuanto a los reductores de velocidad, manifiesta que asumia que los contratistas eran los responsables de esta actividad.

Respuesta: el ingeniero Carlos Durán, líder de infraestructura FDLT indica que en la vía nose va a realizar intervención en redes de alcantarillado, por lo tanto, no se realizará instalación de tubería, ni adeucuación de cajas, ni domiciliarias. Informa que la Empresa de Acueducto de Bogotá emitió un reporte del estado del alcantarillado, donde manifiesta que no requiere cambio y que cuenta con las especificaciones técnicas autorizadas.

En cuanto a los reductores de velocidad, el ingeniero indica que pueden pasar el requerimiento a la Alcaldía, que la Entidad trasladará la inquietud a la Secretaría de Movilidad.

Toma la palabra la ingeniera Marcela Arevalo, quien reitera que la fecha de inicio es el miércoles 24 de septiembre, con un horario de trabajo de lunes a viernes de 7:00 am a 4:00 pm y los días sábados de 7:00 am a 12:00 m; se informa que el horario se ajusta dependiendo de alguna actividad técnica adicional, que requiera trabajar fuera de los tiempos indicados.

Pregunta: Señora Zeida Bohorquez, Edificio Villa Venetto, solicita que la intervención de la vía se haga en el menor tiempo posible, debido a que el edificio cuenta con un número considerable de vehiculos los cuales se ven perjudicados y a la vez beneficiados por la intervención, manfiiesta que tiempo atrás se realizaron unas obras sobre la vía, donde el contratista demoró dos años en la intervención, manifiesta que la zona no cuenta con parqueaderos cercanos. Se solicita que los horarios de trabajo sean más flexibles y puedan trabajar más tiempo (7 por 24) y terminar más rápido la vía.

FORMATO ACTA DE REUNIÓN Y/O SOCIALIZACIÓN DE INICIO DE OBRA CON COMUNIDAD BARRIO QUINTA PAREDES TRAMO 1 CIV 13001365			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Teusaquillo
CÓDIGO FO-SC-14	**PROCESO** GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**VERSIÓN** 2.0	
Contrato No.: 552-2024 COP (120683)	**HORA INICIO:** 7:45 a. m.		**Hoja** _3___ de ___3__
FECHA: 18 de septiembre de 2025	**HORA DE FINALIZACIÓN:** 8:30 am		**Acta N°** 7

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

Respuesta: El ingeniero Carlos Durán, manifiesta que en este contrato se realizó una intervención en una vía del barrio Galerías, donde se ejecutó en menos de dos meses, aclara que algunas vías no cuentan con un plano de redes, en donde pueden aparacer tuberías o cableado, donde toca hacer intervenciones adicionales que obviamente generan que los tiempos se extiendan.

En cuanto al trabajo 7 por 24, manifiesta que puede ocasionar incomodidades a la comunidad, ya que la maquinaria genera ruido que no permitiría que la comunidad descanse; además, por el tipo de intervención que se va a llevar a cabo en la vía, no vale la pena generar ese malestar a los residentes de la zona; se busca que la vía sea intervenida, como se les ha manifestado en el menor tiempo posible.

Pregunta: Señora Cecilia Ayala, Administradora Edificio Villa Venetto, pregunta ¿ya se tienen los planos de redes del sector?

Respuesta: El ingeniero Carlos Durán, manifiesta que la Alcaldía Local junto con el contratista y la interventoría, en la etapa inicial de diagnóstico realiza recorrido en los segmentos viales priorizados, donde se solicita a cada entidad de servicios públicos la información referente a la ubicación de las redes, pero en algunas ocasiones y al momento de excavar se encuentran redes que las entidades desconocian y se espera que no suceda en este tramo.

Pregunta: Señora Cecilia Ayala, Administradora Edificio Villa Venetto, pregunta ¿qué posibilidad hay que los administradores puedan participar en los comités ciudadanos, con el fin de tener información clara sobre el avance de la obra, las actividades a realizar y de esta manera mantener informada a la comunidad en general?

Respuesta: El ingeniero Carlos Durán, indica que regularmente se realiza el comité de obra y comité de participación ciudadano, donde la parte social de contratista realiza la convocatoria y se brinda la información de avance de obra, actividades a realizar y aclaración de dudas de la comunidad. Manifiesta que se mantienen los canales de atención disponibles para cualquier tipo de inconveniente que se pueda generar en la ejecución de la obra.

La residente social del contratista Consorcio Teusavial, abre el espacio para conformar el comité ciudadano, para lo cual explica que se realizará una reunión mensual. A continuación se relaciona en la presente acta, los nombres de las personas vinculadas al comité ciudadano:
Clara Inés González, Administradora Edificio Corporación El Dorado, Cr 44A No. 24D-18, Celular 311 443 7054.
Cristina Muñoz, miembro de la Asociación del Edificio Corporación El Dorado, Cr 44A No. 24D-18, Celular 300 201 7509.
Cecilia Ayala Ayala, Administradora Edificio Villa Venetto, Cr 44A No. 24D-37, Celular 300 555 7781.
Jaime Pinzón, Administrador Edificiio Calle 24D No. 43A-94, Celular 313 831 3811.

4. Compromisos, se describen al finalizar el acta.

5. Una vez atendidas las inquietudes se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Realizar trabajos de obra de lunes a sabado en horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.	Contratista	Desde el 24 de septiembre de 2025 hasta terminación de la obra
Iniciar obra	Contratista	24 de septiembre de 2025
Utilizar canales de atención a la comunidad	Comunidad	En el desarrollo de la obra

FIRMAS

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Se adjunta listado de asistencia.		

	ELABORÓ	RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	T.S. Ángela M. Quiroga	T.S. Ángela M. Quiroga	T.S. Luz Escobar Ospina
CARGO	Residente Social	Residente Social	Residente Interventoría
FIRMA	Angela M. Quiroga G.	Angela M. Quiroga G.	Luz Escobar

ANEXOS:	SI	X	NO		TIPO DE ANEXO: Reg. Fotográfico	CANTIDAD: 1

FORMATO		
FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-228	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FECHA	SEPTIEMBRE 18 DE 2025	TEMA	SOCIALIZACIÓN INICIO DE OBRA
LUGAR	CARRERA 44A ENTRE CALLES 24D Y 25	BARRIO	QUINTA PAREDES
UPZ	QUITA PAREDES	LOCALIDAD	TEUSAQUILLO

No	DOCUMENTO		NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	SEXO	ORIENTACIÓN SEXUAL	GRUPO ÉTNICO	TIPO DE DISCAPACIDAD	TELÉFONO FIJO O CELULAR	DIRECCIÓN	BARRIO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
	C.C T.I C.E	NÚMERO												
1	CC	80096367	Luis Fernando García Ríos	43	COMUNIDAD					3017652940	AC 26 #14C1A-24	QUINTA PAREDES	luisfercho30@hotmail.com	
2	CC	1018419704	Carlos Eduardo Gomez	36	Comunidad					3132150913	Cra 44A-24-22	QUINTA PAREDES	Carbs.edu.ee@gmail.com	
3	CC	25025750	Laura Pinilla	40	Comunidad					3163018456	Calle 26 #44A-29		laurapinilla@gmail.com	
4	CC	21047303	CLARA J. GONZALEZ		Comunidad					3114437054	Cra 44A 24D-18		edificio.el.diredo.ph.j.c.g@gmail.com	
5	CC	39527731	Mª Cristina Muñoz A.	63	Comunidad					3002017509	Kr. 44A #24D-18	Apto 502	frissmarz@gmail.com	
6	CC	52179946	Claudia Micán H	43	Comunidad					3043893531	Cra 44A #24D-18	Apto 203	mican_s1@hotmail.com	claudia micán
7	CC	79'024'774	Javier Valencia	61	Comunidad					3102625030	Av. Dbo # 44A-29	604	javiervalencia2@hotmail.com	
8	CC	41570248	Cecilia Ayala	72	Comunidad					3103317392	AV. clle 26 #44A 29 QUINTA P.		edificiovilla.ventto@hotmail.com	
9	CC	17160.749	JAIME H. RODRIGUEZ T	78	Comunidad					3125790994	KR. 44A 24D 18 APTO 13	Q. PAREDES	J. RODRIGUEZTELLEZ@YAHOO.COM	
10	CC	20612937	María Gloria de Rod.	76	Comunidad					3123626765	AV. Calle 26 #44A 29	Q. Paredes	Vila Vanto	
11	CC	41485491	Olga Mery Bogotá Moreno	75	Comunidad					3004891533	Av Calle 26 #44A-29	Q. Paredes	Vila Venello	
12	CC	10294 31555	Marlon Enrique Godoy	38	Comunidad					3125375291	Kr 44A # 24D 18	Q Paredes	Kikegodoy.com	
13	CC	77168340	SADITH JASPERRO G.	50	Comunidad					3102995152	Kra 44D #24D18.	Q Paredes	Sjasmin@gmail.com	
14	CC	79650542	Alvaro Bolivar	53	Comunidad					3207726964	Cra 44A # 24 D 18	Q. Paredes	maobolivar2@hotmail.com	
15	CC	41616403	Teresa algate	60	Comunidad					3124429828	Kra 44 #24D 18			

Sexo. M: Mujer / H: Hombre
Orientación Sexual. Hm: Homosexual / Ht: Heterosexual / Bi: Bisexual / T: Transexual/ I: Intersexual
Grupo Étnico. N: Ninguno / R: Raizales / A: Afrodescendientes / I: Indígenas / P: Palenqueros(as)/G: Rrom
Tipo Discapacidad. F: Física / V: Visual / A: Auditiva / C: Cognitiva / MU: Múltiple / N: Ninguna

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO		
FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-228	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA	SEPTIEMBRE 18 DE 2025	TEMA	SOCIALIZACIÓN INICIO DE OBRA

LUGAR	CARRERA 44A ENTRE CALLES 24D Y 25	BARRIO	QUINTA PAREDES	UPZ	QUITA PAREDES	LOCALIDAD	TEUSAQUILLO

No.	DOCUMENTO C.C T.I C.E	DOCUMENTO NÚMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	SEXO	ORIENTACIÓN SEXUAL	GRUPO ÉTNICO	TIPO DE DISCAPACIDAD	TELÉFONO FIJO O CELULAR	DIRECCIÓN	BARRIO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	CC	1010179960	JUAN CARLOS RIVERA	36	COMUNIDAD	M				3178157061	CRHHA# 24D-18	QUINTA PAREDES	jrivera@sdp.gov.co	
2	CC	19060404	TULIO PIÑEROS	72	Comunidad	M				3042050582	CRA 44A #24D-32	QUINTA PAREDES	TULIOPIN2008@hotmail.com	
3	CC	79.103.067	Marco Manrique	67	Comunidad	M				3208314661	Cr 44A N: 24D 18		mpmanz2@yahoo.es	
4	CC	1032399624	Diana Silva	—	Alcaldía Local	F				3014012437	Quinta paredes	—	—	
5	CC	79498674	Jeeny Pomen	—	Interventoria	M				3007885225	Quinta Paredes	—	—	
6	CC	80903375	Camilo Duran		Consorcio Teusaquil					3123726884	—			
7	CC	1019240890	Tatiana Valdeleón	—	Consorcio Teusaquil	M				3207367585	—	—	3stcambvial@gmail.com	
8	CC	1022421359	Sebastian Martinez		Consorcio teusaquil					3204249883	—	—	—	
9	CC	1028459077	Juan Camilo Amaya P.	—	Alcaldía	M				3225236085	FDLT	—	—	
10	CC	79754310	Carlos Duran		Alcaldía Local					3148214273	FDLT.	—	—	
11	CC	52889627	Luz Escobar	—	Interventoría	F				3207239771	Soledad.	Soledad.	luz.interteusaquillo@gmail.com	
12	CC	79733532	Alvaro Salas M		Alcaldía Local					—	—	—	—	
13	CC	19.417708	Hno Pinzon f.		Comunidad	M				3228107493	cll 72#44A10	Sta P.	naubpinzaf@yahoo.es	
14	CC	1032380392	Marcela Arevalo		Cteusavial	F				3105838694	Cra 39A 29121	Soledad	Consorcioteusavial	
15	CC	52004995	Sandra J. Perilla		C. teusavial					3132258654	cll 39A - 29-21	Soledad	teusavialsocial@gmail.com	

Sexo. M: Mujer / **H:** Hombre
Orientación Sexual. Hm: Homosexual / **Ht:** Heterosexual / **Bi:** Bisexual / **T:** Transexual/ **I:** Intersexual
Grupo Étnico. N: Ninguno / **R:** Raizales / **A:** Afrodescendientes / **I:** Indígenas / **P:** Palenqueros(as)/**G:** Rrom
Tipo Discapacidad. F: Física / **V:** Visual / **A:** Auditiva / **C:** Cognitiva / **MU:** Múltiple / **N:** Ninguna

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO		
FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-228	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FECHA	SEPTIEMBRE 18 DE 2025	TEMA	SOCIALIZACIÓN INICIO DE OBRA

LUGAR	CARRERA 44A ENTRE CALLES 24D Y 25	BARRIO	QUINTA PAREDES	UPZ	QUITA PAREDES	LOCALIDAD	TEUSAQUILLO

No.	DOCUMENTO C.C T.I C.E	DOCUMENTO NÚMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	SEXO	ORIENTACIÓN SEXUAL	GRUPO ÉTNICO	TIPO DE DISCAPACIDAD	TELÉFONO FIJO O CELULAR	DIRECCIÓN	BARRIO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	CC	1222S494	JORGE MARTINEZ	71	COMUNIDAD					3001587327	CRA 44A # 24D-18	QUINTA PAREDES	jorgemtyag@Hotmail.com	
2	CC	1052381777	Ana Reyes	38	Comunidad					3223644704	cra 44A #24d 18	QUINTA PAREDES	anareyes717@gmail.com	
3	CC	24098118	Alicia Barón O.	71	Comunidad					3212401927	Cra 44A N°24d-18	" "	aybaron54@hotmail.com	
4	CC	79533904	Ernesto Lugo	53	Comunidad					3186222661	Cra 44A # 22-49	" "		
5	CC	17118908	Gilberto Castillo	72	Comunidad					3002907823	K44A 24D18	" "		
6	CC	79585855	YESID ACOSTA	55	Comunidad					3112225024	CR 44A 24D18	" "		
7	CC	41375932	Marina Martinez	78	Comunidad					3002768	CRA 44A-24D18	"		
8	CC	1013612303	Daniel Buitrago	35	Comunidad					3539236 40	AC 26 # 49a-29.	"	dabuitragoca@gmail.com	
9	CC	35486824	Nancy Bogotá	60	Comunidad					3012351120	Av Calle 26 # 44 A 29	"		
10	CC	52855751	Ingrid Lopez Ruiz	44	Comunidad					3102799238	Call 26 # 44A-29	"	ingrid.lopez1280@gmail.com	
11	CC	79373372	Alfonso Abusta	55	Comunidad					3208466457	Cr. 44A 24D 18	"	registro2609@live.com	
12	CC	52753728	Angela Quiroga	43	Consorcio Teusaquillo					3144283886	Punto PAE.	-11-	teusaquillosocial@gmail.com	
13	CC													
14	CC													
15	CC													

Sexo. M: Mujer / **H:** Hombre
Orientación Sexual. Hm: Homosexual / **Ht:** Heterosexual / **Bi:** Bisexual / **T:** Transexual/ **I:** Intersexual
Grupo Étnico. N: Ninguno / **R:** Raizales / **A:** Afrodescendientes / **I:** Indígenas / **P:** Palenqueros(as)/**G:** Rrom
Tipo Discapacidad. F: Física / **V:** Visual / **A:** Auditiva / **C:** Cognitiva / **MU:** Múltiple / **N:** Ninguna

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

CONSORCIO TEUSAVIAL	**Contrato No. 552-2024** **COP (120683)**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO | BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	18 de septiembre de 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4









Observacion: Reunión de inicio barrio Quinta Paredes.
CIV 13001365

Anexo 2
Actas de socialización PMT barrio San Luis tramo 1 y Chapinero Occidental tramo 1, registro fotográfico

FECHA:	2025/09/10 **HORA:** 11:00am **LUGAR:** Jardín Moderno San Gabriel
CONTRATO No.	**FDLT - 552 - 2024**
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES.
CONTRATISTA:	**CONSORCIO TEUSAVIAL**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG**
TEMA:	Socialización de PMT para cierre total y/o parcial de andén y/o calzada para ejecutar las obras de ejecutar a precios unitarios y a monto agotable, las obras y actividades necesarias para la conservación de la malla vial, ciclo infraestructura, espacio público, y puentes peatonales y/o vehiculares pertenecientes a la malla vial local e intermedia de la localidad de Teusaquillo, en la ciudad de Bogotá D.C. de conformidad con los estudios previos, anexo técnico y apéndices.
PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN:	AUXILIAR SOCIAL SANDRA I. PERILLA F.

Se realiza socialización del proyecto se realizará **Cierre total de calzada costado sur para realizar actividades de la conservación de la malla vial de la localidad de Teusaquillo y posicionamiento del vehículo de obra al interior del cerramiento.** contemplado en el Contrato No. **FDLT - 552 - 2024** el cual será ejecutado por el (la) contratista **CONSORCIO TEUSAVIAL** y supervisado por la interventoría **CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG**. Se especifica a los miembros de la comunidad que se realizará afectación **cierre total** en **calzada**, para lo cual se plantea como alternativa de mitigación el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) descrito a continuación:

Manejo y desvíos de modos no motorizados (peatones y ciclistas)

No aplica, debido a que la intervención se realizará únicamente sobre calzada.

- **Accesos a predios:** No aplica.
- **Paso en intersecciones:** No aplica.
- **Bici-carril, ciclorruta y/o ciclovía dominical:** No aplica.

Se implementará un cerramiento con polisombra y/o polimalla, se ubicarán señales Informativas a 50m, Preventivas, Reglamentarias, para dar aviso oportuno a los conductores y peatones de la proximidad de la obra, además se contará con la ayuda de personal abanderado el cual coordinará la actividad descrita anteriormente. (Ver plano anexo).

Finalizado el horario de trabajo, se mantendrá el cerramiento las 24 horas, la señalización y cada uno de los manejos propuestos, hasta la culminación de las actividades. Posteriormente, la zona afectada se dejará en igual o mejores condiciones de lo encontrado.

Manejo y desvíos de transporte público

No aplica, debido a que en la zona no transita transporte público.

- **Paraderos SITP:** No aplica.
- **Desvíos:** No aplica.

Manejo y desvíos de tránsito particular

Los cierres propuestos se plantean realizar en el horario de 24 horas, donde se realizará el cierre total en calzada costado sur desviando el flujo vehicular particular que transite de occidente a oriente, adicional teniendo en cuenta la geometría de estos tramos se ubicarán señales para avisar el desvió propuesto.


- **Accesos a predios:** No aplica.
- **Desvíos:** No aplica.

  Desvío al occidente (--->): Para todos los vehículos que deseen transitar por la DG 61B al oriente, deberán continuar por la KR 20 al norte, girando por la AC 63 al oriente, llegando al corredor de la KR 19A al sur, y continuado su recorrido.

Se implementará un cerramiento con polisombra y/o polimalla, se ubicarán señales Informativas a 100m y 50m, Preventivas, Reglamentarias, para dar aviso oportuno a los conductores y peatones de la proximidad de la obra, además se contará con la ayuda de personal abanderado el cual coordinará la actividad descrita anteriormente. (Ver plano anexo).

Finalizado el horario de trabajo, se mantendrá el cerramiento las 24 horas, la señalización y cada uno de los manejos propuestos, hasta la culminación de las actividades.

Esquema PMT

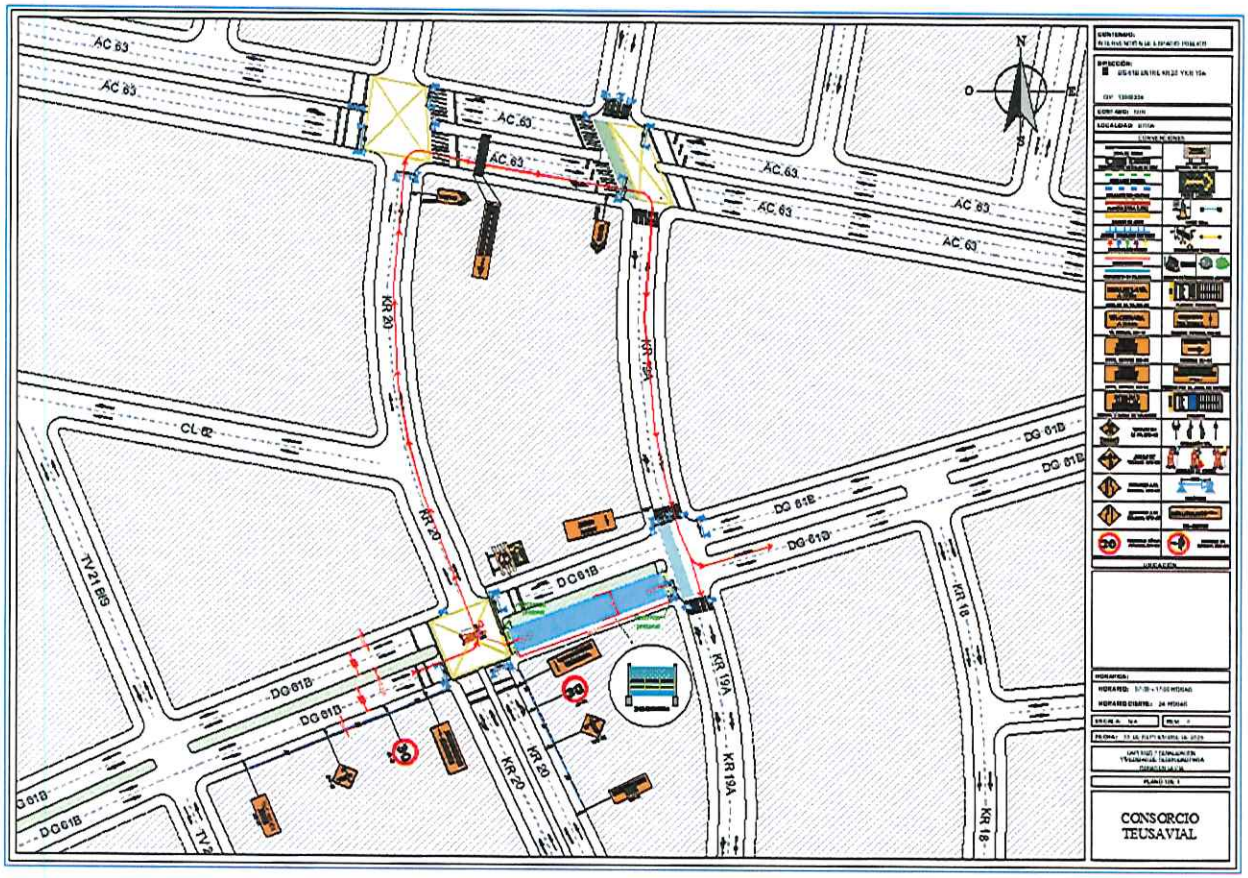

Las actividades se realizarán de acuerdo con el avance de cada intervención en un tiempo máximo de ciento veinte (120) días. La obra dará inicio el día 26 de septiembre de 2025 y se tiene previsto su finalización el día 24 de enero de 2026.

El horario de trabajo y cierre establecido es:

Horario de trabajo: 07:00 – 17:00
Horario de cierre: 24 Horas

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	
	Acta de Socialización del PMT	
	CÓDIGO: PM02-PR01-F14	Versión 1.0

La presente socialización se realiza a los abajo firmantes:

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Ligia Mora	52'438.699	cr 20 Bg 61B- 06	310 805 3805	ppo-sam @hotmail com	
2	Coordinadora					
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	
	Acta de Socialización del PMT	
	CÓDIGO: PM02-PR01-F14	Versión 1.0

FECHA:	AAAA/MM/DD 2025/09/10	**HORA:** 11:40 am	**LUGAR:** General. DG 61B ENTRE KR 20 Y KR 19A
CONTRATO No.	**FDLT - 552 - 2024**		
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES.		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO TEUSAVIAL**		
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG**		
TEMA:	Socialización de PMT para cierre total y/o parcial de andén y/o calzada para ejecutar las obras de ejecutar a precios unitarios y a monto agotable, las obras y actividades necesarias para la conservación de la malla vial, ciclo infraestructura, espacio público, y puentes peatonales y/o vehiculares pertenecientes a la malla vial local e intermedia de la localidad de Teusaquillo, en la ciudad de Bogotá D.C. de conformidad con los estudios previos, anexo técnico y apéndices.		
PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN:	AUXILIAR SOCIAL SANDRA I. PERILLA F.		

Se realiza socialización del proyecto se realizará **Cierre total de calzada costado sur para realizar actividades de la conservación de la malla vial de la localidad de Teusaquillo y posicionamiento del vehículo de obra al interior del cerramiento.** contemplado en el Contrato No. **FDLT - 552 - 2024** el cual será ejecutado por el (la) contratista **CONSORCIO TEUSAVIAL** y supervisado por la interventoría **CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG.** Se especifica a los miembros de la comunidad que se realizará afectación **cierre total** en **calzada**, para lo cual se plantea como alternativa de mitigación el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) descrito a continuación:

Manejo y desvíos de modos no motorizados (peatones y ciclistas)

No aplica, debido a que la intervención se realizará únicamente sobre calzada.

- **Accesos a predios:** No aplica.
- **Paso en intersecciones:** No aplica.
- **Bici-carril, ciclorruta y/o ciclovía dominical:** No aplica.

Se implementará un cerramiento con polisombra y/o polimalla, se ubicarán señales Informativas a 50m, Preventivas, Reglamentarias, para dar aviso oportuno a los conductores y peatones de la proximidad de la obra, además se contará con la ayuda de personal abanderado el cual coordinará la actividad descrita anteriormente. (Ver plano anexo).

Finalizado el horario de trabajo, se mantendrá el cerramiento las 24 horas, la señalización y cada uno de los manejos propuestos, hasta la culminación de las actividades. Posteriormente, la zona afectada se dejará en igual o mejores condiciones de lo encontrado.

Manejo y desvíos de transporte público

No aplica, debido a que en la zona no transita transporte público.

- **Paraderos SITP:** No aplica.
- **Desvíos:** No aplica.

Manejo y desvíos de tránsito particular

Los cierres propuestos se plantean realizar en el horario de 24 horas, donde se realizará el cierre total en calzada costado sur desviando el flujo vehicular particular que transite de occidente a oriente, adicional teniendo en cuenta la geometría de estos tramos se ubicarán señales para avisar el desvió propuesto.


- **Accesos a predios:** No aplica.
- **Desvíos:** No aplica.

  Desvío al occidente (--->): Para todos los vehículos que deseen transitar por la DG 61B al oriente, deberán continuar por la KR 20 al norte, girando por la AC 63 al oriente, llegando al corredor de la KR 19A al sur, y continuado su recorrido.

Se implementará un cerramiento con polisombra y/o polimalla, se ubicarán señales Informativas a 100m y 50m, Preventivas, Reglamentarias, para dar aviso oportuno a los conductores y peatones de la proximidad de la obra, además se contará con la ayuda de personal abanderado el cual coordinará la actividad descrita anteriormente. (Ver plano anexo).

Finalizado el horario de trabajo, se mantendrá el cerramiento las 24 horas, la señalización y cada uno de los manejos propuestos, hasta la culminación de las actividades.

Esquema PMT

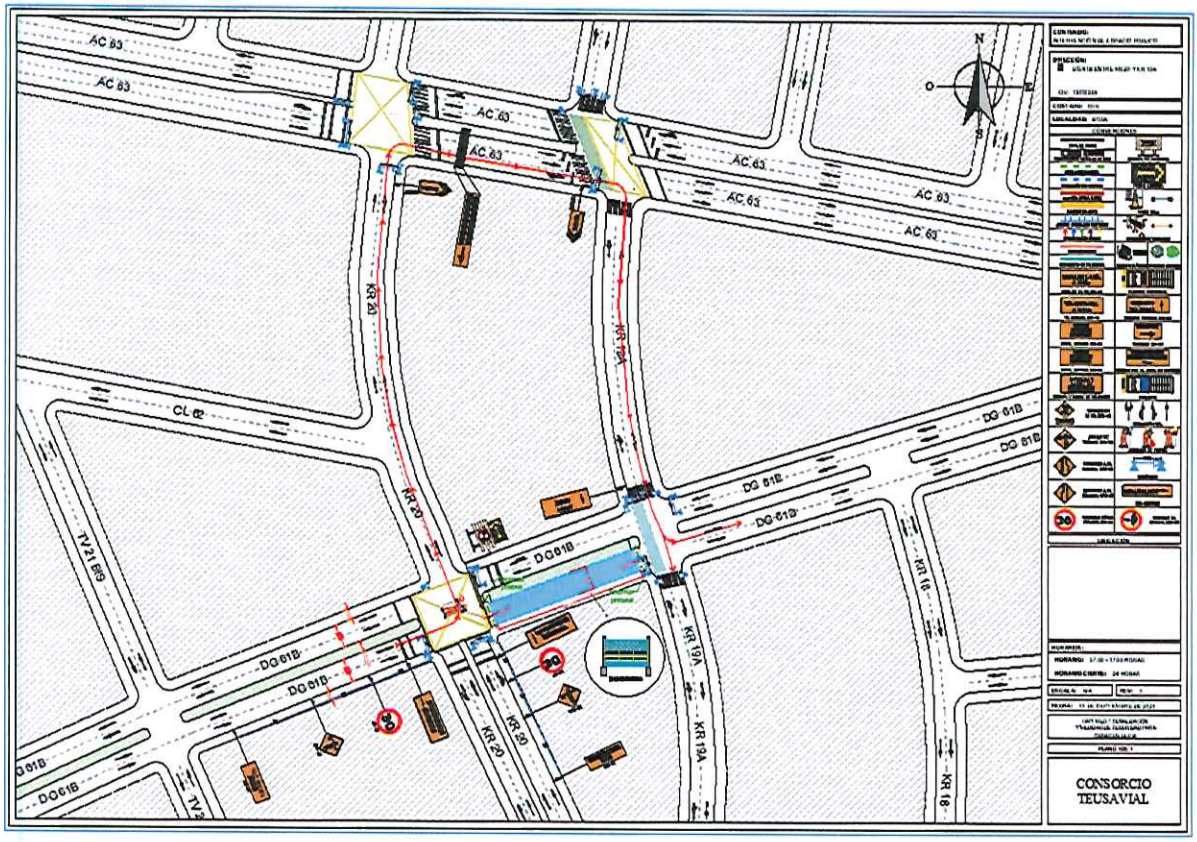

Las actividades se realizarán de acuerdo con el avance de cada intervención en un tiempo máximo de ciento veinte (120) días. La obra dará inicio el día 26 de septiembre de 2025 y se tiene previsto su finalización el día 24 de enero de 2026.

El horario de trabajo y cierre establecido es:

Horario de trabajo: 07:00 – 17:00
Horario de cierre: 24 Horas

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	
	Acta de Socialización del PMT	
	CÓDIGO: PM02-PR01-F14	Versión 1.0

La presente socialización se realiza a los abajo firmantes:

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Cecilia Cárdenas propietaria	41739361	Cr 19A No. 61-67/65	3124757494	—11—	
2	Daniel Mora Propietario	1032456755	Dg 61B No 19A-13	3138387913	moragdaniel@gmail.com	
3	Andrea Vargas propietaria	52.409.516	Dg 61B No. 19A-27	3145840594	apvargasleon@yahoo.com	Andrea Vargas.
4	Jairo Gallo arrendatario	72.219401	Cr 20 No 61-44	3103046249	jairogallo75@yahoo.	
5	Dolly Rojas propietaria	46672724	Dg 61B No. No. 19A-26	3106432375	dolly-rojas@hotmail.com	Dolly Rojas
6	Herceder Cabezas Familiar	—11—	Dg 61B No 19A. 22	3002633487	—11—	Herceder C.
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						

CONSORCIO TEUSAVIAL	**Contrato No. 552-2024** **COP (120683)**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO | BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	10 de septiembre de 2025

FOTOGRAFÍAS 1 AL 4









Observacion: Socialización PMT
CIV 13000336 barrio San Luis tramo 1

FECHA:	HORA:	LUGAR:	- AC 57 ENTRE AK 14 Y KR 14A - KR 14A a 9m AL NORTE de la AC 57 - Grupo Educativo Fundesuperior
	2025/09/19	12:45pm	

CONTRATO No.	FDLT-552-2024
OBJETO DEL CONTRATO:	Ejecutar a precios unitarios y a monto agotable, las obras y actividades necesarias para la conservación de la malla vial, cicloinfraestructura, espacio público, y puentes peatonales y/o vehiculares pertenecientes a la malla vial local e intermedia de la localidad de Teusaquillo, en la ciudad de Bogotá D.C. de conformidad con los estudios previos, anexo técnico y apéndices.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
INTERVENTORÍA:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO
TEMA:	Socialización de PMT para Cierre total de andén costado norte para realizar actividades de la conservación del espacio público de la localidad de Teusaquillo y cierre parcial de calzada costado norte para implementar sendero peatonal. Cierre parcial de calzada costado oriente para realizar posicionamiento de vehículo de obra.
PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN:	Auxilio Social Sandra F. Perilla

Se realiza socialización del proyecto **Ejecutar a precios unitarios y a monto agotable, las obras y actividades necesarias para la conservación de la malla vial, cicloinfraestructura, espacio público, y puentes peatonales y/o vehiculares pertenecientes a la malla vial local e intermedia de la localidad de Teusaquillo, en la ciudad de Bogotá D.C. de conformidad con los estudios previos, anexo técnico y apéndices.** contemplado en el Contrato No. **FDLT-552-2024** el cual será ejecutado por el (la) contratista ***NOMBRE DE CONTRATISTA*** y supervisado por la interventoría **CONSORCIO TEUSAVIAL**. Se especifica a los miembros de la comunidad que se realizará afectación **parcial** en **calzada** y **total** en **andén**, para lo cual se plantea como alternativa de mitigación el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) descrito a continuación:

Manejo y desvíos de modos no motorizados (peatones y ciclistas)

I. AC 57 ENTRE AK 14 Y KR 14A

PLANO 1 DE 2 (INTERVENCIÓN EN HORARIO DIURNO): Debido a que la intervención se realizara sobre la totalidad del ancho de la zona peatonal del andén costado norte de la AC 57, se propone realizar un traslado de peatón a calzada implementando un sendero peatonal delimitado a través de delineadores tubulares y maletines plásticos garantizando un ancho promedio de 1.2m mínimo en todo momento para el paso de peatones por la zona.

Las actividades se realizarán de acuerdo con el avance dè cada intervención en un tiempo máximo de ciento veinte (120) días. La obra dará inicio el día 03 de octubre de 2025 y se tiene previsto su finalización el día 31 de enero de 2026.

El horario de trabajo y cierre establecido es:

I. **AC 57 ENTRE AK 14 Y KR 14A**

Horario de trabajo: 07:00 – 17:00 HORAS y Horario de cierre: 24 HORAS.

II. **KR 14A a 9m AL NORTE de la AC 57**

Horario de trabajo: 07:00 – 17:00 HORAS y Horario de cierre: 07:00 – 17:00 HORAS.

La presente socialización se realiza a los abajo firmantes:

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Cesar Sánchez Hector	79.347.132	Cr 14A bis 52-43	312 358 9063	grupofundesuperior@gmail.com	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	
	Acta de Socialización del PMT	
	CÓDIGO: PM02-PR01-F14	Versión 1.0

FECHA: 2025/09/19	HORA: 12:00pm	LUGAR:	- AC 57 ENTRE AK 14 Y KR 14A - KR 14A a 9m AL NORTE de la AC 57 - Colegio Manuela Beltrán
CONTRATO No.	FDLT-552-2024		
OBJETO DEL CONTRATO:	Ejecutar a precios unitarios y a monto agotable, las obras y actividades necesarias para la conservación de la malla vial, cicloinfraestructura, espacio público, y puentes peatonales y/o vehiculares pertenecientes a la malla vial local e intermedia de la localidad de Teusaquillo, en la ciudad de Bogotá D.C. de conformidad con los estudios previos, anexo técnico y apéndices.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL		
INTERVENTORÍA:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO		
TEMA:	Socialización de PMT para Cierre total de andén costado norte para realizar actividades de la conservación del espacio público de la localidad de Teusaquillo y cierre parcial de calzada costado norte para implementar sendero peatonal. Cierre parcial de calzada costado oriente para realizar posicionamiento de vehículo de obra.		
PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN:	Auxiliar Social Sandra I. Perilla		

Se realiza socialización del proyecto **Ejecutar a precios unitarios y a monto agotable, las obras y actividades necesarias para la conservación de la malla vial, cicloinfraestructura, espacio público, y puentes peatonales y/o vehiculares pertenecientes a la malla vial local e intermedia de la localidad de Teusaquillo, en la ciudad de Bogotá D.C. de conformidad con los estudios previos, anexo técnico y apéndices.** contemplado en el Contrato No. **FDLT-552-2024** el cual será ejecutado por el (la) contratista ***NOMBRE DE CONTRATISTA*** y supervisado por la interventoria **CONSORCIO TEUSAVIAL**. Se especifica a los miembros de la comunidad que se realizará afectación **parcial** en **calzada** y **total** en **andén**, para lo cual se plantea como alternativa de mitigación el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) descrito a continuación:

Manejo y desvíos de modos no motorizados (peatones y ciclistas)

I. **AC 57 ENTRE AK 14 Y KR 14A**

PLANO 1 DE 2 (INTERVENCIÓN EN HORARIO DIURNO): Debido a que la intervención se realizara sobre la totalidad del ancho de la zona peatonal del andén costado norte de la AC 57, se propone realizar un traslado de peatón a calzada implementando un sendero peatonal delimitado a través de delineadores tubulares y maletines plásticos garantizando un ancho promedio de 1.2m mínimo en todo momento para el paso de peatones por la zona.

Las actividades se realizarán de acuerdo con el avance de cada intervención en un tiempo máximo de ciento veinte (120) días. La obra dará inicio el día 03 de octubre de 2025 y se tiene previsto su finalización el día 31 de enero de 2026.

El horario de trabajo y cierre establecido es:

I. **AC 57 ENTRE AK 14 Y KR 14A**

Horario de trabajo: 07:00 – 17:00 HORAS y Horario de cierre: 24 HORAS.

II. **KR 14A a 9m AL NORTE de la AC 57**

Horario de trabajo: 07:00 – 17:00 HORAS y Horario de cierre: 07:00 – 17:00 HORAS.

La presente socialización se realiza a los abajo firmantes:

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Rosa Ibel Vargas D.D. Rectora	4666143	cr 14A No. 57-28	305 947 2267	ledmanuela beltran3 @educacion bogota.edu. co	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	
	Acta de Socialización del PMT	
	CÓDIGO: PM02-PR01-F14	Versión 1.0

FECHA:	**HORA:** 2025/09/19 12:30pm	**LUGAR:**	- AC 57 ENTRE AK 14 Y KR 14A - KR 14A a 9m AL NORTE de la AC 57 - Colegio Principado de Mónaco
CONTRATO No.	**FDLT-552-2024**		
OBJETO DEL CONTRATO:	Ejecutar a precios unitarios y a monto agotable, las obras y actividades necesarias para la conservación de la malla vial, cicloinfraestructura, espacio público, y puentes peatonales y/o vehiculares pertenecientes a la malla vial local e intermedia de la localidad de Teusaquillo, en la ciudad de Bogotá D.C. de conformidad con los estudios previos, anexo técnico y apéndices.		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO TEUSAVIAL**		
INTERVENTORÍA:	**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO**		
TEMA:	Socialización de PMT para Cierre total de andén costado norte para realizar actividades de la conservación del espacio público de la localidad de Teusaquillo y cierre parcial de calzada costado norte para implementar sendero peatonal. Cierre parcial de calzada costado oriente para realizar posicionamiento de vehículo de obra.		
PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN:	Auxiliar Social Sandra I. Perilla		

Se realiza socialización del proyecto **Ejecutar a precios unitarios y a monto agotable, las obras y actividades necesarias para la conservación de la malla vial, cicloinfraestructura, espacio público, y puentes peatonales y/o vehiculares pertenecientes a la malla vial local e intermedia de la localidad de Teusaquillo, en la ciudad de Bogotá D.C. de conformidad con los estudios previos, anexo técnico y apéndices.** contemplado en el Contrato No. **FDLT-552-2024** el cual será ejecutado por el (la) contratista ***NOMBRE DE CONTRATISTA*** y supervisado por la interventoría **CONSORCIO TEUSAVIAL**. Se especifica a los miembros de la comunidad que se realizará afectación **parcial** en **calzada** y **total** en **andén**, para lo cual se plantea como alternativa de mitigación el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) descrito a continuación:

Manejo y desvíos de modos no motorizados (peatones y ciclistas)

I. AC 57 ENTRE AK 14 Y KR 14A

PLANO 1 DE 2 (INTERVENCIÓN EN HORARIO DIURNO): Debido a que la intervención se realizara sobre la totalidad del ancho de la zona peatonal del andén costado norte de la AC 57, se propone realizar un traslado de peatón a calzada implementando un sendero peatonal delimitado a través de delineadores tubulares y maletines plásticos garantizando un ancho promedio de 1.2m mínimo en todo momento para el paso de peatones por la zona.

- **Accesos a predios:** No aplica, debido a que sobre el costado de intervención no se evidenciaron predios que puedan ser afectados.
- **Paso en intersecciones:** Se garantizará el paso sobre intersecciones utilizado usualmente por los peatones de la zona, sobre el costado oriente de la KR 14A se implementará un sendero en calzada con el fin de garantizar el acceso de peatones al sendero peatonal ubicado sobre el costado norte de la AC 57.
- **Bici-carril, ciclorruta y/o ciclovía dominical:** No aplica.

Se implementará un cerramiento con polisombra y/o polimalla, se ubicarán señales Informativas a 100m y 50m, Preventivas, Reglamentarias, para dar aviso oportuno a los conductores y peatones de la proximidad de la obra, además se contará con la ayuda de personal abanderado el cual coordinará la actividad descrita anteriormente. (Ver plano anexo).

Finalizado el horario de trabajo, se mantendrá el cerramiento las 24 horas, la señalización y cada uno de los manejos propuestos, hasta la culminación de las actividades. Posteriormente, la zona afectada se dejará en igual o mejores condiciones de lo encontrado.

PLANO 2 DE 2 (INTERVENCIÓN EN HORARIO NOCTURNO): Debido a que el CONCESIONARIO METRO LINEA 1 SAS va a contar con la implementación de un contraflujo sobre la calzada norte de la AC 57 ENTRE KR 13 Y KR 14A, al momento de finalizado el horario de trabajo se retirará el sendero peatonal sobre calzada, dejando el andén debidamente recebado, compactado y con la implementación de plafones rígidos antideslizantes con el fin de garantizar el paso de peatones por la zona en todo momento.

- **Accesos a predios:** No aplica, debido a que sobre el costado de intervención no se evidenciaron predios que puedan ser afectados.
- **Paso en intersecciones:** No se verán afectadas en este horario.
- **Bici-carril, ciclorruta y/o ciclovía dominical:** No aplica.

Las señales implementadas por el contratista CONSORCIO TEUSAVIAL se cubrirán con plástico negro con el fin de no generar desinformación en la zona, de igual manera retirando todo manejo que se haya implementado sobre la calzada costado norte de la AC 57.

II. KR 14A a 9m AL NORTE de la AC 57

PLANO 1 DE 2 (INTERVENCIÓN EN HORARIO DIURNO): No aplica, debido a que los cierres se realizarán únicamente sobre la calzada.

- **Accesos a predios:** No aplica.
- **Paso en intersecciones:** Se garantizará el paso sobre intersecciones utilizado usualmente por los peatones de la zona.
- **Bici-carril, ciclorruta y/o ciclovía dominical:** No aplica.

Se implementará un cerramiento con cintas y delineadores tubulares, se ubicarán señales Informativas a 100m y 50m, Preventivas, Reglamentarias, para dar aviso oportuno a los conductores y peatones de la proximidad de la obra, además se contará con la ayuda de personal abanderado el cual coordinará la actividad descrita anteriormente. (Ver plano anexo).

Se aclara que la ubicación de la zona de cargue y descargue se realizará en un lapso inferior a 1 hora dentro los

horarios previstos para la misma.

PLANO 2 DE 2 (INTERVENCIÓN EN HORARIO NOCTURNO): No aplica, debido a que en horario nocturno no se realizará implementación de este cierre.

- **Accesos a predios:** No aplica.
- **Paso en intersecciones:** Se garantizará el paso sobre intersecciones utilizado usualmente por los peatones de la zona.
- **Bici-carril, ciclorruta y/o ciclovía dominical:** No aplica.

Se implementará un cerramiento con cintas y delineadores tubulares, se ubicarán señales Informativas a 100m y 50m, Preventivas, Reglamentarias, para dar aviso oportuno a los conductores y peatones de la proximidad de la obra, además se contará con la ayuda de personal abanderado el cual coordinará la actividad descrita anteriormente. (Ver plano anexo).

Se aclara que la ubicación de la zona de cargue y descargue se realizará en un lapso inferior a 1 hora dentro los horarios previstos para la misma.

Manejo y desvíos de transporte público

I. AC 57 ENTRE AK 14 Y KR 14A

PLANO 1 DE 2 (INTERVENCIÓN EN HORARIO DIURNO): Debido a que la intervención se realizara sobre la totalidad del ancho de la zona peatonal del andén costado norte de la AC 57, se propone realizar un traslado de peatón a calzada implementando un sendero peatonal delimitado a través de delineadores tubulares y maletines plásticos garantizando un ancho promedio de 5.2m mínimo en todo momento para el paso de vehículos por la zona.

- **Paraderos SITP:** No aplica.
- **Desvíos:** No aplica.

Se implementará un cerramiento con polisombra y/o polimalla, se ubicarán señales Informativas a 100m y 50m, Preventivas, Reglamentarias, para dar aviso oportuno a los conductores y peatones de la proximidad de la obra, además se contará con la ayuda de personal abanderado el cual coordinará la actividad descrita anteriormente. (Ver plano anexo).

Finalizado el horario de trabajo, se mantendrá el cerramiento las 24 horas, la señalización y cada uno de los manejos propuestos, hasta la culminación de las actividades. Posteriormente, la zona afectada se dejará en igual o mejores condiciones de lo encontrado.

PLANO 2 DE 2 (INTERVENCIÓN EN HORARIO NOCTURNO): Debido a que el CONCESIONARIO METRO LINEA 1 SAS va a contar con la implementación de un contraflujo sobre la calzada norte de la AC 57 ENTRE KR 13 Y KR 14A, al momento de finalizado el horario de trabajo se retirará el sendero peatonal sobre calzada, dejando el andén debidamente recebado, compactado y con la implementación de plafones rígidos antideslizantes con el fin de garantizar que la calzada se encuentre libre para el flujo de vehículos en ambos sentidos de circulación vial.

- **Paraderos SITP:** No aplica.
- **Desvíos:** No aplica.

Las señales implementadas por el contratista CONSORCIO TEUSAVIAL se cubrirán con plástico negro con el fin de no generar desinformación en la zona, de igual manera retirando todo manejo que se haya implementado sobre la calzada costado norte de la AC 57.

II. **KR 14A a 9m AL NORTE de la AC 57**

PLANO 1 DE 2 (INTERVENCIÓN EN HORARIO DIURNO) Y PLANO 2 DE 2 (INTERVENCIÓN EN HORARIO NOCTURNO): No aplica, debido a que sobre el corredor no circulan rutas de transporte público.

- **Paraderos SITP:** No aplica.
- **Desvíos:** No aplica.

Manejo y desvíos de tránsito particular

I. **AC 57 ENTRE AK 14 Y KR 14A**

PLANO 1 DE 2 (INTERVENCIÓN EN HORARIO DIURNO) Y PLANO 2 DE 2 (INTERVENCIÓN EN HORARIO NOCTURNO): Se implementará el mismo manejo descrito al interior del numeral 4.3.6.3.

- **Accesos a predios:** No aplica.
- **Desvíos:** No aplica.

II. **KR 14A a 9m AL NORTE de la AC 57**

PLANO 1 DE 2 (INTERVENCIÓN EN HORARIO DIURNO): Teniendo en cuenta que el cierre se realizará en calzada costado oriente de la KR 14A delimitado a través delineadores tubulares al momento de requerir el cierre sobre la zona se garantizará un ancho promedio mínimo de 4.0m para el tránsito de vehículos por la zona.

- **Accesos a predios:** Se garantizará en todo momento el acceso al "Colegio Manuela Beltrán", teniendo en cuenta que la transición para el sendero peatonal y vehículo de obra se realizará por segmentos con el fin de no realizar un cierre total de los accesos presentados sobre este costado.
- **Desvíos:** No aplica.


Se implementará un cerramiento con cintas y delineadores tubulares, se ubicarán señales Informativas a 100m y 50m, Preventivas, Reglamentarias, para dar aviso oportuno a los conductores y peatones de la proximidad de la obra, además se contará con la ayuda de personal abanderado el cual coordinará la actividad descrita anteriormente. (Ver plano anexo).


Se aclara que la ubicación de la zona de cargue y descargue se realizará en un lapso inferior a 1 hora dentro los horarios previstos para la misma.

PLANO 2 DE 2 (INTERVENCIÓN EN HORARIO NOCTURNO): No aplica, debido a que en horario nocturno no se realizará implementación de este cierre.

- **Accesos a predios:** No aplica debido a que no se tendrá el cerramiento implementado.
- **Desvíos:** No aplica.

Esquema PMT

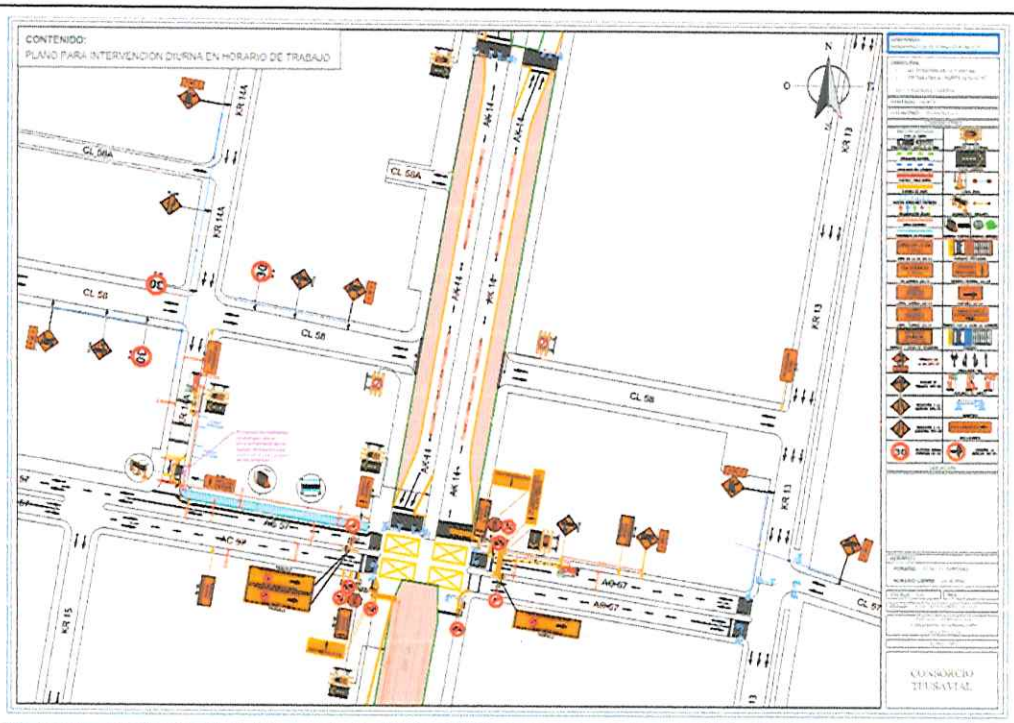
CONTENIDO:
PLANO PARA INTERVENCION DIURNA EN HORARIO DE TRABAJO
CL 58A
CL 58
CL 57
KR 14A
KR 15
CONSORCIO TUSAVIAL

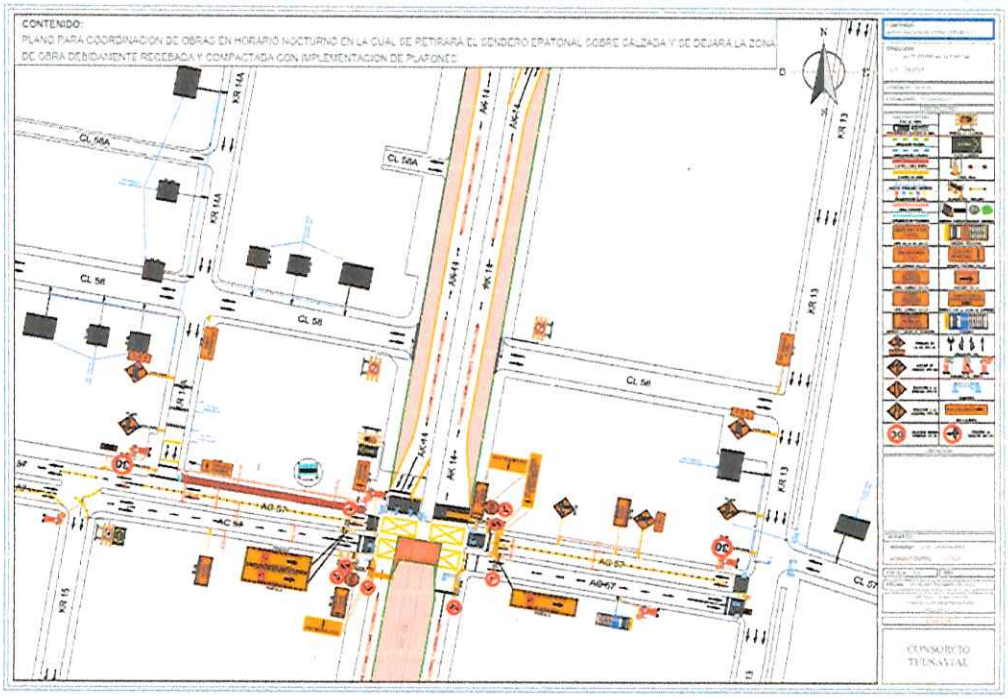
CONTENIDO:
PLANO PARA COORDINACION DE OBRAS EN HORARIO NOCTURNO EN LA CUAL SE RETIRARA EL SENDERO PEATONAL SOBRE CALZADA Y SE DEJARA LA ZONA DE OBRA DEBIDAMENTE REGLEADA Y COMPACTADA CON IMPLEMENTACION DE PLAFONES
CL 58A
CL 58
CL 57
KR 14A
KR 15
CONSORCIO TUSAVIAL

Las actividades se realizarán de acuerdo con el avance de cada intervención en un tiempo máximo de ciento veinte (120) días. La obra dará inicio el día 03 de octubre de 2025 y se tiene previsto su finalización el día 31 de enero de 2026.

El horario de trabajo y cierre establecido es:

I. **AC 57 ENTRE AK 14 Y KR 14A**

Horario de trabajo: 07:00 – 17:00 HORAS y Horario de cierre: 24 HORAS.

II. **KR 14A a 9m AL NORTE de la AC 57**

Horario de trabajo: 07:00 – 17:00 HORAS y Horario de cierre: 07:00 – 17:00 HORAS.

La presente socialización se realiza a los abajo firmantes:

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Monica Palacios Directora	52214464	Cr 14A bis. 57-29	3105800 200	directora general bogota@ sdm.gov.co	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

CONSORCIO TEUSAVIAL	**Contrato No. 552-2024** **COP (120683)**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO BOGOTÁ


REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	19 de septiembre de 2025

FOTOGRAFÍAS 1 AL 3





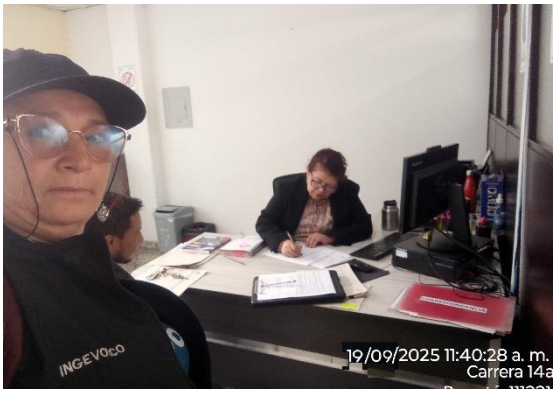

Observacion: Actualización PMT Barrio Chapinero Occidental Tramo 1
CIV 13000826

Anexo 3
PSIS vigentes en el periodo

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local de Teusaquillo

FECHA		
17	09	2025

CONTRATO N° 552-2024 COP (120683)

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: COMUNIDAD
DIRECCIÓN: CASETA CARRERA 47 CON CALLE 58
TELÉFONO: 312 476 7226
PERSONA CONTACTO: SIGIFREDO ANZOLA
TRAMO: CARRERA 47 ENTRE CALLES 58 Y 59

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☒	1
VOLANTE	☒	2
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD

INSTALACION ☒ ACTUALIZACION ☐
CIERRE ☐

5. OBSERVACIONES

Se actualiza punto satélite de información con volante de canales de atención y afiche, se verifica en buenas condiciones y se mantiene informada a la comunidad de los avances de la obra.

CIV 13000284
Barrio: Nicolás de Federmán Tramo 1

6. FIRMAS

Sigifredo Anzola
Nombres y apellidos
Propietario /o quien autoriza el punto satélite

Angela Ma Quiroga
T.S. Angela María Quiroga G
Residente Social del Contratista o Consultor

Luz Escobar
T.S. Luz Escobar Ospina
Residente Social Interventoría

Original: Interventoría
1ra Copia Propietario
2da Copia Contratista

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local de Fontibón

FECHA		
26	09	2025

CONTRATO N° 552-2024 COP (120683)

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: NEGOCIO
DIRECCIÓN: CARRERA 27 No. 50-77
TELÉFONO: 3204956793
PERSONA CONTACTO: AMIR VERGEL
TRAMO: CIV 13001165 TRAMO 1

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☑	1
VOLANTE	☑	2
PLEGABLE	☑	1
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD

INSTALACION ☐
CIERRE ☐
ACTUALIZACION ☑

5. OBSERVACIONES

Se actualiza Punto Satélite de Información con volante de cierre de actas de vecindad, plegable de sostenibilidad de la vía, Canales de Atención y Afiche, con el fin de mantener informada a la comunidad las actividades realizadas y de avance de la obra.

CIV 13001165
Barrio: Alfonso López

6. FIRMAS

Amir Vergel
Nombres y apellidos
Propietario /o quien autoriza el punto satélite

Angela Quiroga
T.S. Angela María Quiroga G
Residente Social del Contratista o Consultor

Luz Escobar
T.S. Luz Escobar Ospina
Residente Social Interventoría

Original: Interventoría
1ra Copia Propietario
2da Copia Contratista

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
Alcaldía Local de Fontibón

FECHA		
25	09	2025

CONTRATO N° 552-2024 COP (120683)

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: NEGOCIO
DIRECCIÓN: CALLE 53B No. 27-31
TELÉFONO: 3102744509
PERSONA CONTACTO: FRANCISCO BETANCOUR
TRAMO: CIV 13000875 TRAMO 1

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☑	1
VOLANTE	☑	2
PLEGABLE	☑	1
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD

INSTALACION ☐ ACTUALIZACION ☑
CIERRE ☐

5. OBSERVACIONES

Se actualiza Punto Satélite de Información con volante de cierre de actas de vecindad, plegable de sostenibilidad de la vía, Canales de Atención y Afiche, con el fin de mantener informada a la comunidad las actividades realizadas y de avance de la obra.

CIV 13000875
Barrio: Galerias

6. FIRMAS

Nombres y apellidos
Propietario /o quien autoriza el punto satélite

T.S. Angela María Quiroga G
Residente Social del Contratista o Consultor

T.S. Luz Escobar Ospina
Residente Social Interventoría

Original: Interventoría
1ra Copia Propietario
2da Copia Contratista

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local de Fontibón

FECHA		
26	09	**2025**

CONTRATO N° 552-2024 COP (120683)

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: NEGOCIO
DIRECCIÓN: CARRERA 27 No. 50-77
TELÉFONO: 3204956793
PERSONA CONTACTO: AMIR VERGEL
TRAMO: CIV 13001165 TRAMO 1

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☑	1
VOLANTE	☑	2
PLEGABLE	☑	1
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD

INSTALACION ☐ ACTUALIZACION ☑
CIERRE ☐

5. OBSERVACIONES

Se actualiza Punto Satélite de Información con volante de cierre de actas de vecindad, plegable de sostenibilidad de la vía, Canales de Atención y Afiche, con el fin de mantener informada a la comunidad las actividades realizadas y de avance de la obra.

CIV 13001165
Barrio: Alfonso López

6. FIRMAS

Amir Vergel
Nombres y apellidos
Propietario /o quien autoriza el punto satélite

Angela Quiroga
T.S. Angela María Quiroga G
Residente Social del Contratista o Consultor

Luz Escobar
T.S. Luz Escobar Ospina
Residente Social Interventoria

Original: Interventoría
1ra Copia Propietario
2da Copia Contratista


FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local de Teusaquillo

FECHA		
25	09	2025

CONTRATO N° 552-2024 COP (120683)

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO

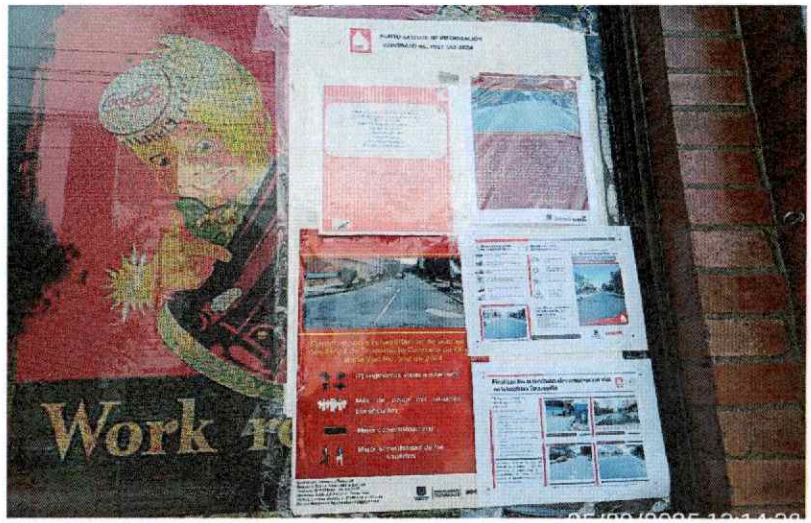

2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: NEGOCIO
DIRECCIÓN: CALLE 53B No. 27-31
TELÉFONO: 3102744509
PERSONA CONTACTO: FRANCISCO BETANCOUR
TRAMO: CIV 13000875 TRAMO 1

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☑	1
VOLANTE	☑	2
PLEGABLE	☑	1
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD

INSTALACION ☐ ACTUALIZACION ☑
CIERRE ☐

5. OBSERVACIONES

Se actualiza Punto Satélite de Información con volante de cierre de actas de vecindad, plegable de sostenibilidad de la vía, Canales de Atención y Afiche, con el fin de mantener informada a la comunidad las actividades realizadas y de avance de la obra.

CIV 13000875
Barrio: Galerias

6. FIRMAS

Nombres y apellidos	T.S. Angela María Quiroga G	T.S. Luz Escobar Ospina
Propietario /o quien autoriza el punto satélite	Residente Social del Contratista o Consultor	Residente Social Interventoría

Original: Interventoría
1ra Copia Propietario
2da Copia Contratista

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local de Teusaquillo

FECHA		
17	09	2025

CONTRATO N° 552-2024 COP (120683)

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: COMUNIDAD
DIRECCIÓN: CARRERA 19A NO. 61-67 65
TELÉFONO: 3124787494
PERSONA CONTACTO: CECILIA CARDENAS
TRAMO: CIV 13000336 TRAMO 1

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☑	1
VOLANTE	☑	1
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD

INSTALACION ☐ ACTUALIZACION ☑
CIERRE ☐

5. OBSERVACIONES

Se actualiza Punto Satélite de Información evidenciando que se encuentra en buenas condiciones, con el fin de mantener informada a la comunidad de las actividades realizadas y de avance de la obra.

CIV 13000336
Barrio: San Luis

6. FIRMAS

Cecilia Cárdenas
Nombres y apellidos
Propietario /o quien autoriza el punto satélite

Angela Ma Quiroga G
T.S. Angela María Quiroga G
Residente Social del Contratista o Consultor

Luz Escobar
T.S. Luz Escobar Ospina
Residente Social Interventoría

Original: Interventoría
1ra Copia Propietario
2da Copia Contratista

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local de Fontibón

FECHA		
17	09	2025

CONTRATO N° 552-2024 COP (120683)

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSTITUCION EDUCATIVA
DIRECCIÓN: CARRERA 14A No. 57-28
TELÉFONO: 3057542960
PERSONA CONTACTO: JUAN CAMILO QUINTERO
TRAMO: CIV 13000826 TRAMO 2

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☑	1
VOLANTE	☑	1
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD

INSTALACION ☐ ACTUALIZACION ☑
CIERRE ☐

5. OBSERVACIONES

Se instala Punto Satélite de Información con volante de canales de atención y afiche, con el fin de mantener informada a la comunidad de las actividades realizadas y de avance de la obra.

CIV 13000826
Barrio: Chapinero Occidental Tramo 2

6. FIRMAS

Nombres y apellidos
Propietario /o quien autoriza el punto satélite

T.S. Angela Maria Quiroga G
Residente Social del Contratista o Consultor

T.S. Luz Escobar Ospina
Residente Social Interventoría

Original: Interventoría
1ra Copia Propietario
2da Copia Contratista

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FECHA		
03	09	**2025**

CONTRATO N° 552-2024 COP (120683)

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Droguería Farmacenter
DIRECCIÓN: cll 22 b15 No. 48-28
TELÉFONO: 3057955527
PERSONA CONTACTO: Plino Prendo
TRAMO: CIV 13001326 TRAMO 1

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☐	
VOLANTE	☐	
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD

INSTALACION ☐ ACTUALIZACION ☐
CIERRE ☑

5. OBSERVACIONES

Se desinstala PSI por terminación de obra.

CIV 13001326
Barrio: Ortezal Tramo 1

6. FIRMAS

Nombres y apellidos
Propietario /o quien autoriza el punto satélite

T.S. Angela María Quiroga G
Residente Social del Contratista o Consultor

T.S. Luz Escobar Ospina
Residente Social Interventoría

Original: Interventoría
1ra Copia Propietario
2da Copia Contratista

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
Alcaldía Local de Teusaquillo

FECHA		
17	09	2025

CONTRATO N° 552-2024 COP (120683)

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: PARQUEADERO DI 45
DIRECCIÓN: TRANSVERSAL 16 BIS No. 45D-79
TELÉFONO: 3145725996
PERSONA CONTACTO: MISAEL QUIROGA
TRAMO: CIV´S 13001489 -13001461

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☑	1
VOLANTE	☑	2
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD

INSTALACION ☐ ACTUALIZACION ☑
CIERRE ☐

5. OBSERVACIONES

Se actualiza Punto Satélite de Información con volante de canales de atenciónyy afiche, con el fin de mantener informada a la comunidad de las actividades a realizar y de avance de la obra.

CIV´S 13001489 -13001461
Barrio: Palermo

6. FIRMAS

Nombres y apellidos
Propietario /o quien autoriza el punto satélite

T.S. Angela María Quiroga G
Residente Social del Contratista o Consultor

T.S. Luz Escobar Ospina
Residente Social Interventoría

Original: Interventoría
1ra Copia Propietario
2da Copia Contratista

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local de Teusaquillo

FECHA		
15	09	2025

CONTRATO N° 552-2024 COP (120683)

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: PARQUEADERO RB
DIRECCIÓN: CARRERA 20 No. 57-55
TELÉFONO: 3150599989
PERSONA CONTACTO: JOSE MANUEL BELTRAN
TRAMO: CIV 13000744 TRAMO 2

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☒	1
VOLANTE	☒	2
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD

INSTALACION ☐ ACTUALIZACION ☒
CIERRE ☐

5. OBSERVACIONES

Se actualiza Punto Satélite de Información con volante de canales de atenciónу afiche, con el fin de mantener informada a la comunidad de las actividades a realizar y de avance de la obra.

CIV 13000744
Barrio: San Luis Tramo 2

6. FIRMAS

Nombres y apellidos
Propietario /o quien autoriza el punto satélite

T.S. Angela María Quiroga G
Residente Social del Contratista o Consultor

T.S. Luz Escobar Ospina
Residente Social Interventoría

Original: Interventoría
1ra Copia Propietario
2da Copia Contratista

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local de Teusaquillo

FECHA		
16	09	2025

CONTRATO N° 552-2024 COP (120683)

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: EDIFICIO VILLA VENETTO PH
DIRECCIÓN: AC 26 No. 44A-29
TELÉFONO: 6014793351
PERSONA CONTACTO: ANA CECILIA AYALA
TRAMO: CIV 13001365 TRAMO 1

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☑	1
VOLANTE	☑	2
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD

INSTALACION ☐ ACTUALIZACION ☑
CIERRE ☐

5. OBSERVACIONES

Se actualiza Punto Satélite de Información con volante de canales de atención, volante de convocatoria reunión de inicio y afiche, con el fin de mantener informada a la comunidad de las actividades a realizar y de avance de la obra.

CIV 13001365
Barrio: Quinta Paredes Tramo 1

6. FIRMAS

Nombres y apellidos
Propietario /o quien autoriza el punto satélite

T.S. Angela María Quiroga G
Residente Social del Contratista o Consultor

T.S. Luz Escobar Ospina
Residente Social Interventoría

Original: Interventoría
1ra Copia Propietario
2da Copia Contratista

Anexo 4
Formato control entrega de piezas de divulgación invitación a reunión de inicio, volante y registro fotográfico tramo Quinta Paredes

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO Alcaldía Local de Teusaquillo

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

TIPO DE PIEZA: PIEZA INFORMATIVA DE CONVOCATORIA REUNIÓN DE INICIO

CONTRATO N°: 552-2024 COP (120683) RESPONSABLE: T.S. Angela María Quiroga Galvis FECHA 16/09/2025

LOCALIDAD: TEUSAQUILLO BARRIO: QUINTA PAREDES CIV : 13001365

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Michael González	Cll 24D Bis. 43A - 96	3156769344	QUINTA PAREDES	Michael González	1	—11—
2	—11—	Cll 24D Bis. 43A - 94	—11—	QUINTA PAREDES	Atiende por el tío	4	En buzón
3	Carlos Puerto	Cr 44D Bis. 24D. 18	3025139558	QUINTA PAREDES		15	—11—
4	Oscar Lobo	Cr 44A Bis. 24D-18	3143355896	QUINTA PAREDES		1	—11—
5	Ana Arias	Cr 44A Bis. 24D. 32	3142352134	QUINTA PAREDES	Ana Arias	1	—11—
6	Flor Falero	Cll 24D Bis. 44A-10	3012690103	QUINTA PAREDES	Flor María Falero	1	—11—
7	Daniel Lesmes	Cr 44A Bis. 24D-21	3224116828	QUINTA PAREDES		4	—11—
8	Ivonne Barbosa	AC 26 Bis. 44A-29	3102160314	QUINTA PAREDES	Ivonne B.	1	—11—
9	Cecilia Ayala Ayala	AC 26 Bis. 44A-29	3005557761	Quinta Pared		20.	—11—
10	—11—	Cr 44A Bis. 24D-27	—11—	Quinta Pared	—11—	2	—11— Bajo puerta
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
				TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS		50	

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	T.S. Angela María Quiroga Galvis	T.S. Luz Escobar Ospina
FIRMA	Angela Mª Quiroga.	Luz Escobar



SOCIALIZACIÓN INICIO DE OBRA
CONTRATO DE OBRA N.º FDLT-552-2024

Se informa a la comunidad que el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, realizará la intervención del tramo vial que comprende el (CIV 13001365, eje vial, ubicado en la carrera 44 A entre calles 24D y 25), del Barrio Quinta Paredes a través del contrato 552 de 2024 que tiene como objeto "*EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES*", por tal motivo se realizará la reunión de inicio de obra el día 18 de septiembre de 2025 a las 7:30 a.m., en donde se dará a conocer las generalidades del contrato.

Fecha inicio: 18-09-2025

Lugar de reunión: via a intervenir Carrera 44A con calle 25.

Información y Contacto:
ANGELA MARÍA QUIROGA GALVIS
Teléfono: 3019072050
Correo:
teusavialsocial@gmail.com
Profesional social
Consorcio Teusavial

ALCALDÍA MAYOR | ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO | BOGOTÁ

CONSORCIO TEUSAVIAL	**Contrato No. 552-2024** **COP (120683)**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	16 de septiembre de 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4









Observacion: Socialización volante convocatoria reunión de inicio barrio Quinta Paredes.
CIV 13001365

Anexo 5
Formato control entrega de piezas de divulgación, volante cierre de actas de vecindad primera visita y registro fotográfico barrios Galerías y Alfonso López

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Teusaquillo


TIPO DE PIEZA: VOLANTE No. 30 CIERRE DE ACTAS DE VECINDAD

CONTRATO N°: 552-2024 COP (120683) **RESPONSABLE: T.S. Angela María Quiroga Galvis** **FECHA** 25/09/2025

LOCALIDAD: TEUSAQUILLO **BARRIO: GALERIAS** **CIV : 13000875**

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Fredy Cespedes	Cll 53B No. 27-07	3016705530	GALERIAS		1	-11-
2	Esther Pallares	Cll 53B No. 27-23	3101540	GALERIAS		1	-11-
3	Francisco Betancourt	Cll 53B No 27 - 31	3102744509	GALERIAS		1	-11-
4	Karen Rojas	Cll 53B No 27A-07	3224168872	GALERIAS		1	-11-
5				GALERIAS			
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
					TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS	4	

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	T.S. Angela María Quiroga Galvis	T.S. Luz Escobar Ospina
FIRMA	Angela Mª Quiroga	Luz Escobar

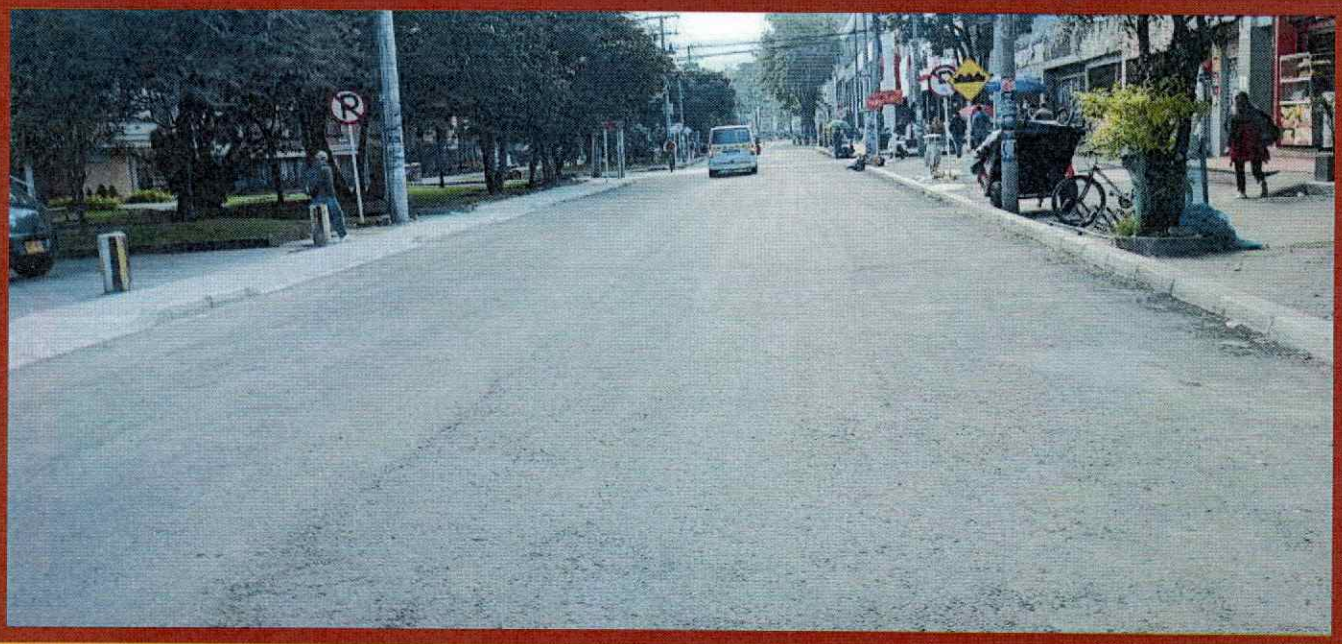

CIERRE DE ACTAS DE VECINDAD

CONTRATO DE OBRA Nº: FDLT-552-2024

Se informa a la comunidad del Barrio Galerías que el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo realizó la intervención del tramo vial identificado con el CIV 13000875 (calle 53B entre carreras 27 y 27A), dentro del alcance del contrato de obra FDLT 552 2024 COP (120683) que tiene como objeto: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES", Por tal motivo el día 24 de septiembre de 2025, se realizará el cierre de actas de vecindad en el horario de 8:00 am a 2:00 pm. Si desea coordinar el horario de la visita, por favor comunicarse con la profesional social de contratista

Fecha: 24-09-2025

Lugar: Área intervenida, Calle 53B entre carreras 27 y 27A.

Información y Contacto:
ANGELA MARÍA QUIROGA GALVIS
Teléfono: 301 907 2050
Correo:
teusavialsocial@gmail.com
Profesional social
Consorcio Teusavial


ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO | BOGOTÁ

CONSORCIO TEUSAVIAL	**Contrato No. 552-2024** **COP (120683)**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	25 de septiembre de 2025

FOTOGRAFÍAS 1 AL 4

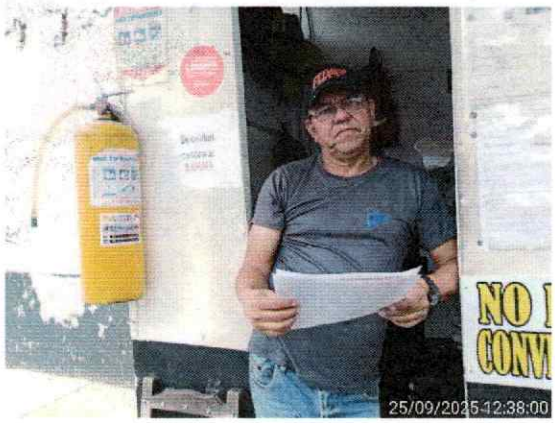







Observacion: Entrega volante de cierre de actas de vecindad barrio Galerías
CIV 13000875

FORMATO		
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO Alcaldía Local de Teusaquillo

TIPO DE PIEZA: VOLANTE No. 32 CIERRE DE ACTAS DE VECINDAD

CONTRATO N°: 552-2024 COP (120683) **RESPONSABLE: T.S. Angela María Quiroga Galvis** **FECHA** 26/09/2025

LOCALIDAD: TEUSAQUILLO **BARRIO: ALFONSO LÓPEZ** **CIV : 13001165**

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Amin Verjel	Cr 27 No 50-77	3204956793	ALFONSO LÓPEZ	Amin Verjel	1	—11—
2	Gloria P. Castillo	Calle 51#2707	3214575078	ALFONSO LÓPEZ	Gloria Castillo	1	—11—
3	Juan David Rodriguez	Cr 27 No. 50-67	3213342952	ALFONSO LÓPEZ		1	—11—
4	Daniela Alagura	Cr 27 No 50-61	3167586221	ALFONSO LÓPEZ		1	—11—
5	Juan Felipe Pineda	Cr 27 No 50-57/59	3132002017	ALFONSO LÓPEZ		2	—11—
6	Angela Escobar	Cr 27 No 50-43	3059257267	ALFONSO LÓPEZ		1	—11—
7	—11—	Cr 27 No 50-37	—11—	ALFONSO LÓPEZ	—11—	2	Bajo puerta
8	—11—	Cr 27 No 50-27	—11—	ALFONSO LÓPEZ	—11—	1	Bajo puerta
9	Juan Camilo Gutierrez	Cr 27 No 50-19 Local 301	3132600312	ALFONSO LÓPEZ	Juan Gutierrez	9	—11—
10	Ricardo Estepa	Cr 27 No 50-19-201	3222240744	ALFONSO LÓPEZ		1	—11—
11	Juan Camilo Gutierrez	Cr 27 No 50-17	3132600312	ALFONSO LÓPEZ	Juan Gutierrez	3	—11—
12	—11—	Cr 27 No 50-07	—11—	ALFONSO LÓPEZ	—11—	3	Bajo puerta
13	Cristian Juez	Cr 27 No 50-09	—11—	ALFONSO LÓPEZ		1	—11—
14	Anadid Concino D	Cr 27 No 50-22	3228954210	ALFONSO LÓPEZ		1	—11—
15	Salomon Delgado	Cr 27 No 50-30/36	3106454208	ALFONSO LÓPEZ		1	
16	Salomon Delgado	Cr 27 No 50-42 302	3106454208	ALFONSO LÓPEZ		1	—11—
17	Salomon Delgado	Cr 27 No 50-42 201	3106454208	ALFONSO LÓPEZ		1	—11—
18	Salomon Delgado	Cr 27 No 50-42 202	3106454208	ALFONSO LÓPEZ		1	—11—
19	Salomon Delgado	Cr 27 No 50-42 Bd.	3106454208	ALFONSO LÓPEZ		1	—11—
20	Rodrigo Poleder	Cr 27 No 50-52	3136669982	ALFONSO LÓPEZ		1	—11—
				TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS		27	

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	T.S. Angela María Quiroga Galvis	T.S. Luz Escobar Ospina
FIRMA	Angela Mª Quiroga	Luz Escobar

FORMATO			
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Teusaquillo
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0	

TIPO DE PIEZA: VOLANTE No. 32 CIERRE DE ACTAS DE VECINDAD

CONTRATO N°: 552-2024 COP (120683) **RESPONSABLE: T.S. Angela María Quiroga Galvis** **FECHA** 26/09/2025

LOCALIDAD: TEUSAQUILLO **BARRIO: ALFONSO LÓPEZ** **CIV : 13001165**

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Olbeni Betancourt	Cr 27 No 50-58	3116468457	ALFONSO LÓPEZ		1	— 11 —
2	Louis Nino	Cr 27 No. 50-68	3153099173	ALFONSO LÓPEZ		1	— 11 —
3	— 11 —	Cr 27 No. 50-79	— 11 —	ALFONSO LÓPEZ	Boyacá N.	1	— 11 —
4	Martha Gonzalez	Cr 27 No 50-84	— 11 —	ALFONSO LÓPEZ	Niega Firmar	1	Manifiesta Satisfacción por la obra
5				ALFONSO LÓPEZ			
6				ALFONSO LÓPEZ			
7				ALFONSO LÓPEZ			
8				ALFONSO LÓPEZ			
9				ALFONSO LÓPEZ			
10				ALFONSO LÓPEZ			
11				ALFONSO LÓPEZ			
12				ALFONSO LÓPEZ			
13				ALFONSO LÓPEZ			
14				ALFONSO LÓPEZ			
15				ALFONSO LÓPEZ			
16				ALFONSO LÓPEZ			
17				ALFONSO LÓPEZ			
18				ALFONSO LÓPEZ			
19				ALFONSO LÓPEZ			
20				ALFONSO LÓPEZ			
				TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS		4	

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	T.S. Angela María Quiroga Galvis	T.S. Luz Escobar Ospina
FIRMA	Angela Mª Quiroga	Luz Escobar



CIERRE DE ACTAS DE VECINDAD

CONTRATO DE OBRA Nº: FDLT-552-2024

Se informa a la comunidad del Barrio Alfonso López que el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo realizó la intervención del tramo vial identificado con el CIV 13001165 (carrera 27 entre calles 50 y 51), dentro del alcance del contrato de obra FDLT 552 2024 COP (120683) que tiene como objeto: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES", Por tal motivo a partir del día 26 de septiembre de 2025, se realizará el cierre de actas de vecindad en el horario de 8:00 am a 2:00 pm. Si desea coordinar el horario de la visita, por favor comunicarse con la profesional social de contratista

Fecha: 26-09-2025

Lugar: Área intervenida, Carrera 27 entre calles 50 y 51.

Información y Contacto:
ANGELA MARÍA QUIROGA GALVIS
Teléfono: 301 907 2050
Correo:
teusavialsocial@gmail.com
Profesional social
Consorcio Teusavial

ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO | BOGOTÁ

CONSORCIO TEUSAVIAL	**Contrato No. 552-2024** **COP (120683)**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO BOGOTÁ


REGISTRO FOTOGRAFICO


NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	26 de septiembre de 2025

FOTOGRAFÍAS 1 AL 4





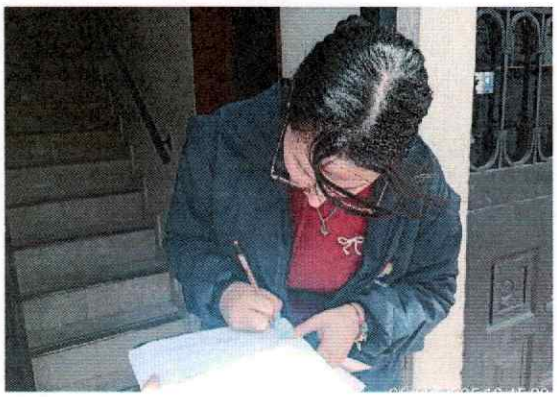

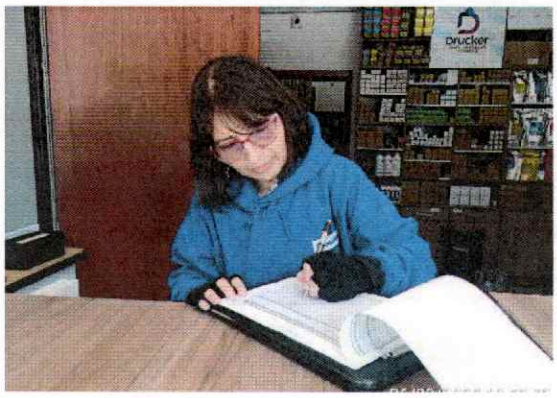

Observacion: Entrega volante de cierre de actas de vecindad barrio Alfonso López
CIV 13001165

Anexo 6
Formato control entrega de piezas de divulgación, volante cierre de actas de vecindad segunda visita y registro fotográfico barrio Alfonso López

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

TIPO DE PIEZA: VOLANTE No. 32 CIERRE DE ACTAS DE VECINDAD SEGUNDA VISITA

CONTRATO N°: 552-2024 COP (120683) **RESPONSABLE: T.S. Angela María Quiroga Galvis** **FECHA** 27/09/2025

LOCALIDAD: TEUSAQUILLO **BARRIO: ALFONSO LÓPEZ** **CIV : 13001165**

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	—11—	Cra 27 Bis 50-07	—11—	ALFONSO LÓPEZ	—11—	3	Bajo puerta
2	—11—	Cr 27 Bis 50-27	—11—	ALFONSO LÓPEZ	—11—	1	Bajo puerta
3	—11—	cr 27 Bis 50-37	—11—	ALFONSO LÓPEZ	—11—	2	Bajo puerta
4	Salomon Delgado	Cr 27 Bis 50-112	3106454208	ALFONSO LÓPEZ		2	—11—
5				ALFONSO LÓPEZ			
6				ALFONSO LÓPEZ			
7				ALFONSO LÓPEZ			
8				ALFONSO LÓPEZ			
9				ALFONSO LÓPEZ			
10				ALFONSO LÓPEZ			
11				ALFONSO LÓPEZ			
12				ALFONSO LÓPEZ			
13				ALFONSO LÓPEZ			
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
				TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS		8	

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	T.S. Angela María Quiroga Galvis	T.S. Luz Escobar Ospina
FIRMA	Angela Ma Quiroga	Luz Escobar



CIERRE DE ACTAS DE VECINDAD

CONTRATO DE OBRA Nº: FDLT-552-2024

Se informa a la comunidad del Barrio Alfonso López que el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo realizó la intervención del tramo vial identificado con el CIV 13001165 (carrera 27 entre calles 50 y 51), dentro del alcance del contrato de obra FDLT 552 2024 COP (120683) que tiene como objeto: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES", Por tal motivo a partir del día 26 de septiembre de 2025, se realizará el cierre de actas de vecindad en el horario de 8:00 am a 2:00 pm. Si desea coordinar el horario de la visita, por favor comunicarse con la profesional social de contratista

Fecha: 26-09-2025

Lugar: Área intervenida, Carrera 27 entre calles 50 y 51.

Información y Contacto:
ANGELA MARÍA QUIROGA GALVIS
Teléfono: 301 907 2050
Correo:
teusavialsocial@gmail.com
Profesional social
Consorcio Teusavial

Visita No. 2
Fecha: Septiembre 29/25
Entre las 8:30 am y 10:00 am

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO
BOGOTÁ

CONSORCIO TEUSAVIAL	**Contrato No. 552-2024** **COP (120683)**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO BOGOTÁ


REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	27 de septiembre de 2025

FOTOGRAFÍAS 1 AL 4





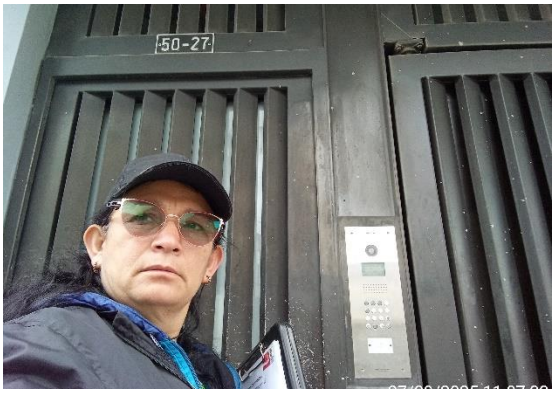



Observacion: Entrega volante de cierre de actas de vecindad segunda visita barrio Alfonso López
CIV 13001165

Anexo 7
Formato control entrega de piezas de divulgación, volante cierre de actas de vecindad tercera visita y registro fotográfico barrio Alfonso López

FORMATO CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0	

TIPO DE PIEZA: VOLANTE No. 32 CIERRE DE ACTAS DE VECINDAD TERCERA VISITA

CONTRATO N°: 552-2024 COP (120683) **RESPONSABLE: T.S. Angela María Quiroga Galvis** **FECHA** 29/09/2025

LOCALIDAD: **TEUSAQUILLO** **BARRIO: ALFONSO LÓPEZ** **CIV : 13001165**

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	— 11 —	Cr 27 Bis 50-07	— 11 —	ALFONSO LÓPEZ	— 11 —	3	Bajo puerta
2	— 11 —	Cr 27 Bis 50-42	— 11 —	ALFONSO LÓPEZ	— 11 —	2	En buzón
3	— 11 —	Cr 27 Bis 50-39 p2	— 11 —	ALFONSO LÓPEZ	— 11 —	1	En buzón
4				ALFONSO LÓPEZ			
5				ALFONSO LÓPEZ			
6				ALFONSO LÓPEZ			
7				ALFONSO LÓPEZ			
8				ALFONSO LÓPEZ			
9				ALFONSO LÓPEZ			
10				ALFONSO LÓPEZ			
11				ALFONSO LÓPEZ			
12				ALFONSO LÓPEZ			
13				ALFONSO LÓPEZ			
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
				TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS		6	


	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	T.S. Angela María Quiroga Galvis	T.S. Luz Escobar Ospina
FIRMA	Angela Mª Quiroga	Luz Escobar


CONSORCIO TEUSAVIAL	**Contrato No. 552-2024** **COP (120683)**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO BOGOTÁ


REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	29 de septiembre de 2025

FOTOGRAFÍAS 1 AL 3

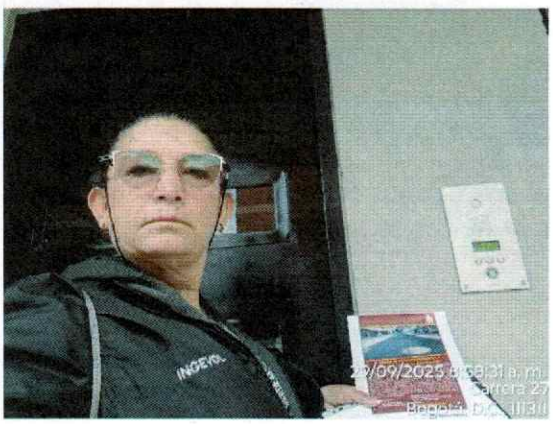

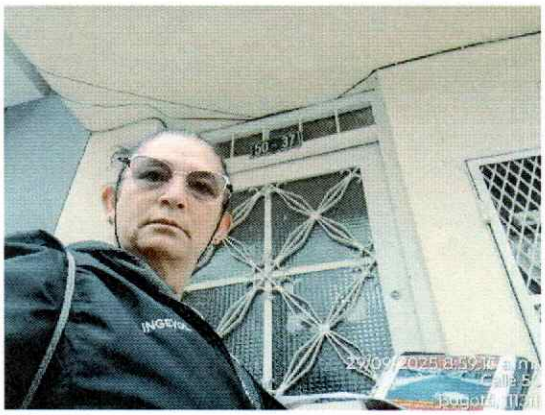

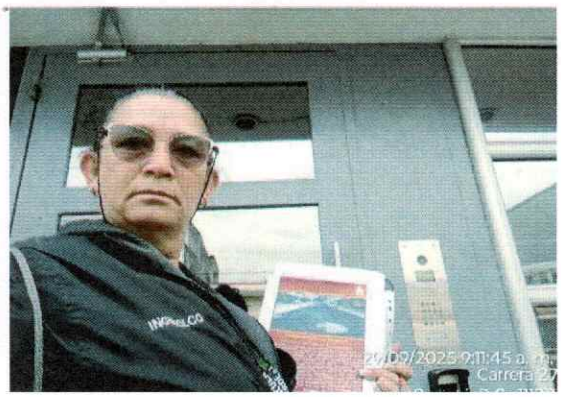

Observacion: Entrega volante de cierre de actas de vecindad tercera visita barrio Alfonso López
CIV 13001165



CIERRE DE ACTAS DE VECINDAD

CONTRATO DE OBRA Nº: FDLT-552-2024

Se informa a la comunidad del Barrio Alfonso López que el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo realizó la intervención del tramo vial identificado con el CIV 13001165 (carrera 27 entre calles 50 y 51), dentro del alcance del contrato de obra FDLT 552 2024 COP (120683) que tiene como objeto: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES", Por tal motivo a partir del día 26 de septiembre de 2025, se realizará el cierre de actas de vecindad en el horario de 8:00 am a 2:00 pm. Si desea coordinar el horario de la visita, por favor comunicarse con la profesional social de contratista

Fecha: 26-09-2025

Lugar: Área intervenida, Carrera 27 entre calles 50 y 51.

Información y Contacto:
ANGELA MARÍA QUIROGA GALVIS
Teléfono: 301 907 2050
Correo:
teusavialsocial@gmail.com
Profesional social
Consorcio Teusavial

Visita No. 3
Fecha: 30 sep 12025
Entre las 8:30 am y 10:00 am

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO | BOGOTÁ

Anexo 8
PQRSD No. 6

FORMATO ACTA DE COMPROMISO SOCIAL			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Teusaquillo
CÓDIGO FO-SC-22	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 2	

FECHA			SEGUIMIENTO No	CONTRATO CIN INTERVENTORÍA N°: 577 de 2024	CONTRATO 552-2024 COP (120683)	INICIO SEGUIMIENTO CIERRE
DD	MM	AA				
1	9	2025				

OBJETO DEL CONTRATO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

DESCRIPCIÓN:
El día 01 de septiembre de 2025, la firma Contratista Consorcio Teusavial, recibe solicitud de PQRSD, a traves de la firma Interventora Consorcio Interteusaquillo JG, la cual fue remitida por la supervisión en la fecha mencionada, donde el señor Benjamín Espitia Nieto, residente del predio ubicado en la Calle 55Bis No.15A-13, el día 28 de agosto manifiesta queja formal a la Alcaldía de Teusaquillo refiriendo inconformidad por obras de adecuación de la vía Carrera 15 entre calles 54A y 55Bis, barrio Chapinero Occidental.


PQRS No: 6	FECHA RADICACIÓN PQRS: 01 de septiembre de 2025	SEGUIMIENTO A PQRS	SEGUIMIENTO A ACTA
	FECHA CIERRE PQRS:	6	6
	FECHA CIERRE COMPROMISO: No aplica		

PARTICIPANTES

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	EN CALIDAD DE:	FIRMA
T.S. Ángela María Quiroga Galvis	52.753.727	C.C.	OTROS (ESPECIFIQUE)	

OTRO:

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPLEMENTO A LA ACTIVIDAD (En Caso de requerirse)

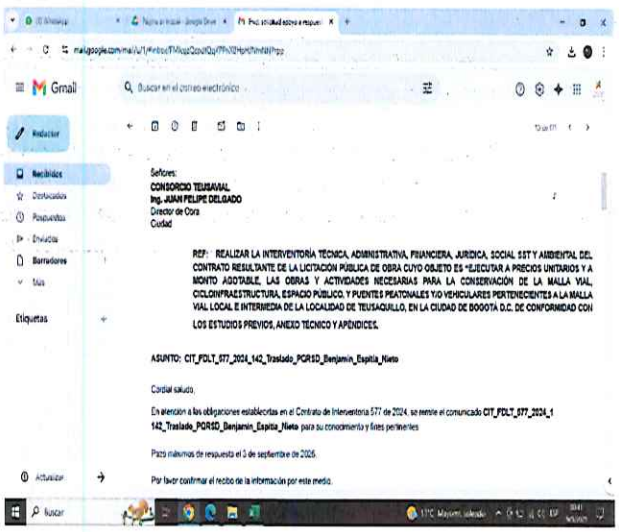

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del propietario y/o Ciudadano:
Benjamín Espitia Nieto

Dirección del inmueble y/o lugar de la PQRS:
Calle 55 Bis No. 15A-13

Correo electrónico:
benjaminespitian@hotmail.com

Teléfono fijo/ movil:
3133069678

Correo electrónico:

Nombre del propietario y/o Ciudadano :

Nombre del propietario y/o Ciudadano :

Nombre del propietario y/o Ciudadano :

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Seguimiento No. 1 Septiembre 01 de 2025, se recibe PQRSD, del señor Benjamín Espitia Nieto, residente del predio ubicado en la Calle 55Bis No.15A-13, donde manifiesta su inconformidad con la reparación realizada en la vía Carrera 15 entre calles 54A y 55Bis, se remite al área técnica para su respectiva respuesta.

Seguimiento No. 2 Septiembre 03 de 2025, El Consorcio Teusavial envía respuesta al comunicado CIT_FDLT_577_2024_142, con consecutivo TEUSAVIAL-552-116, dando cumplimiento a la solicitud y cerrando de está manera la presente PQRSD.

La información técnica emitida en la respuesta fue socializada con la interventoría y la supervisión en comité técnico, quedando el tema abordado y cerrado por los mismos.

FORMATO ACTA DE COMPROMISO SOCIAL			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Teusaquillo
CÓDIGO FO-SC-22	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 2	

COMPROMISOS ADQUIRIDOS			
COMPROMISO	**RESPONSABLE**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**	**FECHA PRÓXIMO SEGUIMIENTO AL COMPROMISO**
NINGUNO			

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 03 días del mes de septiembre de 2025.

ELABORÓ:

Nombre Ing. Andrés Echandía

Firma

Residente Técnico – Contratista

REVISÓ:

Nombre

Firma

Residente Técnico – Interventoría

ACOMPAÑÓ:

Nombre Luz Escobar Ospina

Firma

Residente Social – Interventoría

Nombre Angela María Quiroga G.

Firma

Residente Social – Contratista

N/A.

Nombre

C.C. N/A.

Firma

Propietario y/o Ciudadano(a)

IMPORTANTE: SI LA PRESENTE ACTA SE GENERÓ COMO COMPROMISO PARA CIERRE DE UNA PQRS, ESTA SE DEBE ANEXAR A LA RESPUESTA QUE SE VA A DAR AL PETICIONARIO

Bogotá, 3 de septiembre de 2025

TEUSAVIAL-552-116

Señores
CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG
Ing. JORGE GOMEZ FALLA
Director de Interventoría
Bogotá D.C

Ref: CONTRATO DE OBRA No. COP-552-2024 (120683)

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES

Asunto: Aclaración a Derecho de Petición –CIV's 13000985 y 13002468 – Calidad de Obras Ejecutadas

Respetados señores:

En atención a los derechos de petición referenciados y relacionados con la calidad de las obras ejecutadas en los segmentos viales mencionados, nos permitimos presentar las siguientes aclaraciones:

Las intervenciones realizadas en dichos segmentos viales fueron programadas en el marco de acciones de movilidad, cuyo alcance corresponde exclusivamente a la remoción y reposición de la carpeta asfáltica, sin contemplar trabajos estructurales en la vía. En este tipo de intervenciones, la garantía se limita a los materiales empleados para la reposición del pavimento asfáltico.

En particular, las actividades se desarrollaron bajo un Plan de Manejo de Tráfico (PMT) de emergencia, el cual otorgaba un margen de intervención no mayor a 24 horas. La ejecución de los trabajos se completó en aproximadamente 18 horas. Durante la remoción de la carpeta asfáltica

Actualmente, y desde que se evidencio esta situación nos encontramos gestionando un nuevo Plan de Manejo de Tráfico con una duración mayor que nos permita retornar al sitio y ejecutar una intervención de la estructura más profunda que permita mejorar de forma definitiva las condiciones de la vía y garantizar su estabilidad y durabilidad, este permiso de movilidad se ha venido gestionando desde hace varios meses y no ha sido posible la autorización por parte de secretaria de movilidad debido a que el segmento cuenta con restricciones a causa de la construcción y utilización como desvió de las obras del metro, el pmt solicitado tiene número de radicado 202561202195732 con fecha inicial de radicación del 10 de julio y respuesta de observaciones realizadas por la secretaria de movilidad con fechas del 13 de agosto y nueva radicación, con el mismo número del 20 de agosto; así las cosas estamos a la espera la determinación de la secretaria de movilidad de aprobación de este permiso, para dar inicio a las obras de recuperación de la estructura de estos segmentos viales.

Adjunto a este comunicado la última observación por parte de Secretaria Distrital de Movilidad para el Plan de Manejo de Tráfico, el cual se está atendiendo respectivamente con una nueva propuesta que nos permita la obtención del permiso para intervenir la vía.

Sin otro particular, quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente,

JUAN FELIPE DELGADO
Director de obra
CONSORCIO TEUSAVIAL

CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG
901.902.462-9

CIT_FDLT_577_2024_142

Bogotá, Septiembre 1 de 2025

Señores:
CONSORCIO TEUSAVIAL
Ing. JUAN FELIPE DELGADO
Director de Obra
Calle 39 A #29-21
Ciudad

REF: **REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL SST Y AMBIENTAL DEL CONTRATO RESULTANTE DE LA LICITACION PUBLICA DE OBRA CUYO OBJETO ES "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE *BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO* Y APÉNDICES.**

ASUNTO: **TRASLADO REQUERIMIENTO CIUDADANO BENJAMÍN ESPITÍA NIETO**

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales como interventoría del CONTRATO DE OBRA 552 de2024 damos traslado a la solicitud remitida por la supervisión el 1 de septiembre de 2025, mediante correo electrónico, del ciudadano BENJAMÍN ESPITÍA NIETO, quien reside en la Calle 55 BIS No.15 A- 13, con correo electrónico benjaminespitian@hotmail.com y número de celular 3133069678, para su atención y cierre, en un plazo máximo de atención del 3 de septiembre de 2025.

Por lo anterior, y considerando que las peticiones y compromisos formulados obedecen a su entera competencia en su condición de representante legal del Contrato de Obra No.552 de 2024, y siendo el responsable del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato en mención, requerimos remitir la trazabilidad con las acciones que apliquen para el cierre de la PQRSD y enviar la respuesta de fondo que será remitida a la Alcaldía Local de Teusaquillo.

Gracias por su atención. Cualquier duda y/o inquietud comuníquese con nosotros.

Atentamente,

CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

JORGE GÓMEZ FALLA
Representante Legal

Se anexa: PDF CON OCHO (8) FOLIOS.

Elaboro: LAEO
Revisó: JGF
Aprobó: JGF

FUNDO DE DESARROLLO LOCAL
TEUSAQUILLO
FECHA: 28 AGO 2025
RECIBIDO:

BOGOTA, 22-08-2025

CC

SEÑORES: ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO

20256310067832

ASUNTO:
QUEJA FORMAL AL CONTRATISTA DE LA ALCALDÍA Y LA FALTA DE VERACIDAD A LOS MISMOS Y FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA EN PRO DEL BUEN USO DE LOS RECURSOS DEL PUEBLO.
(MENCIONE LOS HECHOS)

EN DIA PASADO (13-06-25) LEVANTE UNA QUEJA CON USTEDES POR LA REPARACION DE UNA VIA EN EL BARRIO, CON EL #RADICADO N° 2025-631-004534-2. LA CUAL ALPARECER FUE ATENDIDA Y ME ENVIARON UN COMUNICADO DE EL PASO A SEGUIR CON EL CONTRATISTA Y EL ARREGLO DE LA VIA, POR LO CUAL AGRADEZCO SU ATENCION Y PRONTA RESPUESTA, YA QUE EL DIA 03-07-2025 EN HORAS DE LA NOCHE REGRESO UNA CUADRILLA DE OBRAS Y REPARE EL MAL TRABAJO REALIZADO.

(SIGUE AL RESPALDO)

(MENCIONE PUNTUALMENTE LAS PRETENCIONES DE SU PETICION)

- REPARACION CORRESPONDIENTE DE LA VIA.
- SANCION AL CONTRATISTA POR SU MAL TRABAJO.
- SANCION A FUNCIONARIO INTERVENTOR DE OBRA.
- SOLICITAR A LA ALCALDIA UN MEJOR CONTROL SOBRE LOS PROYECTOS QUE TIENEN EN DESARROLLO EN BIEN DE LA COMUNIDAD.

CORREO DE NOTIFICACION BENJAMINESPITIAN@HOTMAIL.COM

DATOS DEL PETICIONARIO (SI DESEA PROPORCIONARLOS)

NOMBRE COMPLETO BENJAMIN ESPITIA DIETO.


TELEFONO 3133069678

DIRECCION DE CORRESPONDENCIA CALLE 55 BIS #15A-13

12/08/2025

4 de Julio 2025

4 de agosto 2025

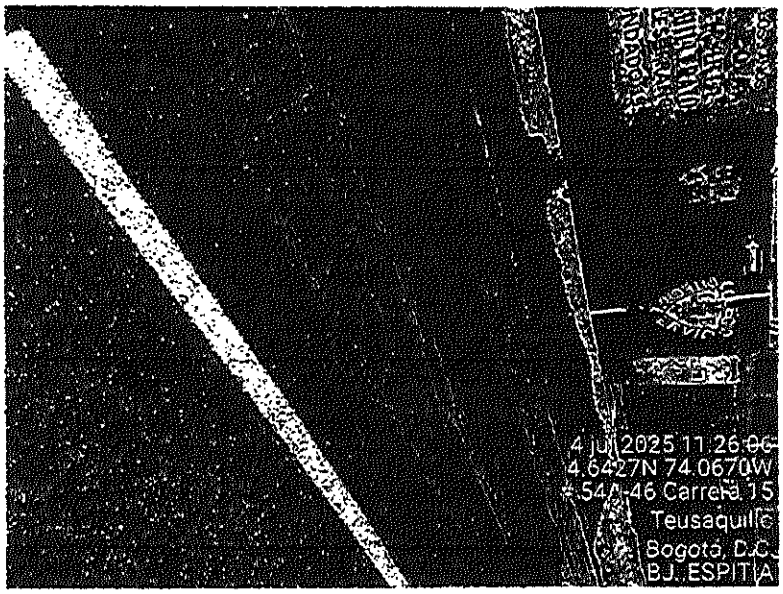

4 Julio 2025



4 Agosto 2025

Anexo 9
Formato control entrega de piezas de divulgación, plegable de sostenibilidad de la vía y registro fotográfico barrios Galerías, Nicolás de Federmán y Alfonso López

FORMATO		
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Teusaquillo

TIPO DE PIEZA: VOLANTE No. 31 PLEGABLE SOSTENIBILIDAD DE LA VÍA

CONTRATO N°: 552-2024 COP (120683) **RESPONSABLE: T.S. Angela María Quiroga Galvis** **FECHA** 25/09/2025

LOCALIDAD: TEUSAQUILLO **BARRIO: GALERIAS** **CIV : 13000875**

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Fredy Céspedes	cll 53B No. 27-07	3016705530	GALERIAS		1	—11—
2	Sthev Pallares	cll 53B No. 27.23	210 1540	GALERIAS		1	—11—
3	Francisco Betancur	cll 53B No. 27.37	3102744509	GALERIAS		1	—11—
4	Karen Rojas	cll 53B No. 27A.02	3224186872	GALERIAS	Karen rojas.	1	—11—
5	—11—	cll 53B No. 27.36	—11—	GALERIAS	—11—	1	En buzón
6	Concepción Poveda	cll 53B No 27-24		GALERIAS	Concepcion P	1	—11—
7	Gladys Niño	cll 53B No. 27.10	2375379	GALERIAS	Gladys Niño	1	—11
8	Jose Manana	cll 53B- 27-36	3212477971	GALERIAS	Jose Mana	1	——
9				GALERIAS			
10				GALERIAS			
11				GALERIAS			
12				GALERIAS			
13				GALERIAS			
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
				TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS		8	

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	T.S. Angela María Quiroga Galvis	T.S. Luz Escobar Ospina
FIRMA	Angela Mª Quiroga	Luz Escobar

Recomendaciones de sostenibilidad:



Evitar lavar, hacer mantenimiento o parquear vehículos en las vías.



Recoger y depositar la basura en las canecas dispuestas y horarios establecidos.



Evitar pintar, rayar o quemar materiales sobre las vías.



Utilizar adecuadamente los pasos peatonales. Evita alterar la estructura de la vía.



Evitar el derrame de combustible y agentes químicos.



Retirar o adecuar los desagües que puedan dañar la vía

Estado actual - Calle 53B entre carreras 27 y 27A



Beneficios de la conservación vial:



Más seguridad vial



Menos tiempo de desplazamiento



Más conectividad



Más de 500 mil personas beneficiadas

Más información sobre el Contrato COP No. 552-2024 (120683)

Dirección: Calle 39A No. 29-21 Piso 3
Horario: lunes a viernes: 7:00 a.m. a 1:00 pm.
Teléfono: 601 5317157
Línea celular: 3019072050
Correo: teusavialsocial@gmail.com
Contratista: Consorcio Teusavial
Interventoría: Consorcio Interteusaquillo JG

Finalizan las actividades de

Conservación Vial


En el tramo de la calle 53B entre carreras 27 y 27A CIV 13000875 barrio Galerías Localidad de Teusaquillo



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Alcaldía Local de Teusaquillo

BOGOTÁ

Finalizan las actividades de conservación vial en la localidad Teusaquillo



Finalizan las obras de conservación de la malla vial

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

- Excavación mecánica.
- Mejoramiento de subrasante y manejo de grietas, hundimiento y/o abultamiento de estructura por raíces arbóreas
- Instalación de geotextil tejido
- Conformación de subbase granular con agregado reciclado
- Instalación de geo celda rellena con agregado reciclado.
- Instalación de Base granular mejorada con cemento y aditivo.
- Capa de base concreto asfaltico MD-25.
- Capa de concreto asfaltico MD-19.

Las intervenciones en la malla vial, **mejoran la movilidad** vehicular, permitiendo la **conectividad y la accesibilidad**, así como **menores tiempos de desplazamiento** para los residentes de la zona.



Excavación mecánica



Instalación de carpeta asfáltica

Estado inicial



Estado actual




NOTA: Se instalará señalización teniendo en cuenta los lineamientos del contrato.

CONSORCIO TEUSAVIAL	**Contrato No. 552-2024** **COP (120683)**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO BOGOTÁ


REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	25 de septiembre de 2025

FOTOGRAFÍAS 1 AL 4

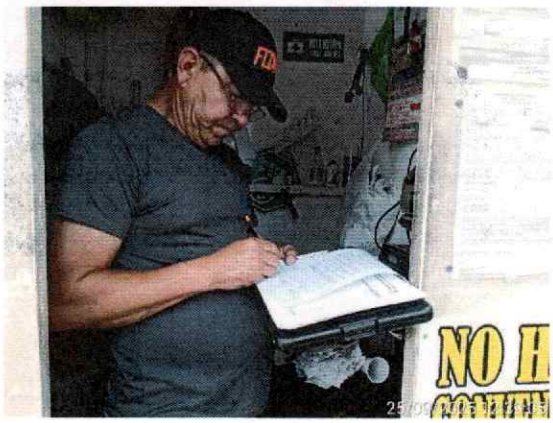



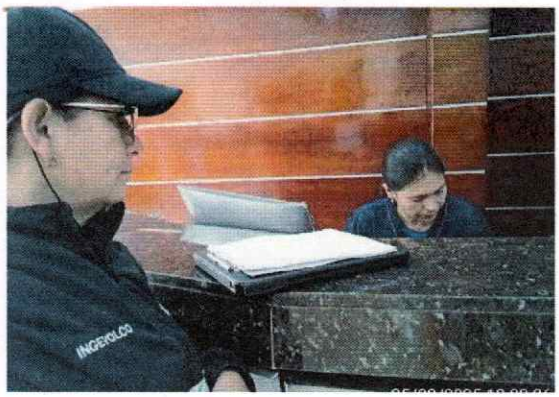



Observacion: Entrega plegable de sostenibilidad de la vía barrio Galerías
CIV 13000875

FORMATO		
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Teusaquillo

TIPO DE PIEZA: VOLANTE No. 29 PLEGABLE DE SOSTENIBILIDAD DE LA VÍA

CONTRATO N°: 552-2024 COP (120683) **RESPONSABLE: T.S. Angela Maria Quiroga Galvis** **FECHA** 25/09/2025

LOCALIDAD: TEUSAQUILLO **BARRIO: NICOLAS DE FEDERMAN** **CIV : 13000864 TRAMO 2**

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Julio	cll 53A No. 35-10/24		NICOLAS DE FEDERMAN		1	—11—
2	Germán	cll 53A No. 35-38		NICOLAS DE FEDERMAN		1	—11—
3	Jhon Caicedo	cll 53A No. 35-48	3105712715	NICOLAS DE FEDERMAN		3	—11—
4	—11—	cll 53 A No. 35-66	—11—	NICOLAS DE FEDERMAN	—11—	1	En buzón
5	—11—	Cr 36 No. 53-65	—11—	NICOLAS DE FEDERMAN	—11—	1	Bajo puerta
6	—11—	cr 36 No 53-55	—11—	NICOLAS DE FEDERMAN	—11—	1	En buzón
7	—11—	cll 53A No. 35-83	—11—	NICOLAS DE FEDERMAN	—11—	1	Bajo puerta
8	Andres Ortiz	cll 53A No 35-51	3152771443	NICOLAS DE FEDERMAN	Andres ortiz	20	—11—
9	—11—	cll 53A No. 35-25	—11—	NICOLAS DE FEDERMAN	—11—	1	Bajo puerta
10	José Portilla	cll 53A No. 35-23	3118730820	NICOLAS DE FEDERMAN		1	—11—
11	—11—	Cr 35 No. 53-53	—11—	NICOLAS DE FEDERMAN	—11—	1	—11
12	Jonny Molina	cr 35 No. 53-78	3014932928	NICOLAS DE FEDERMAN		10	—11
13				NICOLAS DE FEDERMAN			
14				NICOLAS DE FEDERMAN			
15				NICOLAS DE FEDERMAN			
16				NICOLAS DE FEDERMAN			
17				NICOLAS DE FEDERMAN			
18				NICOLAS DE FEDERMAN			
19							
20							
				TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS		42	

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	T.S. Angela Maria Quiroga Galvis	T.S. Luz Escobar Ospina
FIRMA	Angela Mª Quiroga	Luz Escobar

Recomendaciones de sostenibilidad:



Evitar lavar, hacer mantenimiento o parquear vehículos en las vías.



Recoger y depositar la basura en las canecas dispuestas y horarios establecidos.



Evitar pintar, rayar o quemar materiales sobre las vías.



Utilizar adecuadamente los pasos peatonales. Evita alterar la estructura de la vía.



Evitar el derrame de combustible y agentes químicos.



Retirar o adecuar los desagües que puedan dañar la vía

Estado actual - Calle 53A entre carreras 35 y 35



Beneficios de la conservación vial:



Más seguridad vial



Menos tiempo de desplazamiento



Más conectividad



Más de 500 mil personas beneficiadas

Más información sobre el Contrato COP No. 552-2024 (120683)

Dirección: Calle 39A No. 29-21 Piso 3
Horario: lunes a viernes: 7:00 a.m. a 1:00 pm.
Teléfono: 601 5317157
Línea celular: 3019072050
Correo: teusavialsocial@gmail.com
Contratista: Consorcio Teusavial
Interventoría: Consorcio Interteusaquillo JG

Finalizan las actividades de

Conservación Vial

En el tramo de la calle 53A entre carreras 35 y 36 CIV 13000864 barrio Nicolas de Federmán Localidad de Teusaquillo



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Alcaldía Local de Teusaquillo

BOGOTÁ

Finalizan las actividades de conservación vial en la localidad Teusaquillo



Finalizan las obras de conservación de la malla vial

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

- Se realizo excavación mecánica y manual
- Renovación de tubería residual
- Construcción de cárcamos
- Instalación de geotextil
- Instalación de geocelda
- Relleno SBG reciclada
- Instalación de sumideros
- Nivelación, instalación y compactación de material granular estabilizado con cemento y aditivo.
- Capa de asfalto MD-25 y MD-19

Las intervenciones en la malla vial, **mejoran la movilidad** vehicular, permitiendo la **conectividad y la accesibilidad**, así como **menores tiempos de desplazamiento** para los residentes de la zona.



Excavación mecánica



Instalación de tubería

Estado inicial



Estado actual




NOTA: Se instalará señalización teniendo en cuenta los lineamientos del contrato.

CONSORCIO TEUSAVIAL	**Contrato No. 552-2024** **COP (120683)**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	25 de septiembre de 2025

FOTOGRAFÍAS 1 AL 4

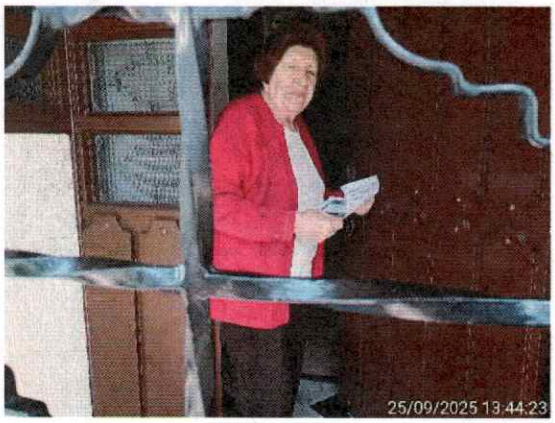







Observacion: Entrega plegable de sostenibilidad de la vía barrio Nicolás de Federmán Tramo 2
CIV 13000864

FORMATO			
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Teusaquillo
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0	

TIPO DE PIEZA: VOLANTE No. 33 PLEGABLE DE SOSTENIBILIDAD DE LA VÍA

CONTRATO N°: 552-2024 COP (120683) **RESPONSABLE:** T.S. Angela Maria Quiroga Galvis **FECHA** 26/09/2025

LOCALIDAD: TEUSAQUILLO **BARRIO:** ALFONSO LÓPEZ **CIV :** 13001165

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Amin Vargas	Cr 27 Bis 50-77	3204951793	ALFONSO LÓPEZ	Amin Vargas	1	— " —
2	Gloria P. Castillo	Cll 51 B. 27 - 07	3145750776	ALFONSO LÓPEZ	Gloria P. Castillo	1	— " —
3	Juan David Rodriguez	Cr 27 Bis 50 - 67	3213342952	ALFONSO LÓPEZ		1	— " —
4	Daniela Alzate	Cr 27 B. 50-61	3167586221	ALFONSO LÓPEZ		1	— " —
5	Juan Felipe Pineda	Cr 27 B. 50-57/59	3132002947	ALFONSO LÓPEZ		5	— " —
6	Angela Escobar	Cr 27 Bis 50-43	3059257262	ALFONSO LÓPEZ		1	— " —
7	— " —	Cr 27 B. 50-37 101	— " —	ALFONSO LÓPEZ	— " —	1	Bajo puerta
8	— " —	Cr 27 Bis 50-37 201	— " —	ALFONSO LÓPEZ	— " —	1	Bajo puerta
9	— " —	Cr 27 Bis 50-27	— " —	ALFONSO LÓPEZ	— " —	1	Bajo puerta
10	Juan Camilo Gutierrez	Cr 27 Bis 50-19 Local 301	3132600312	ALFONSO LÓPEZ	Juan Gutierrez	2	— " —
11	Ricardo Estepa	Cr 27 Bis 5019 201	3223224074	ALFONSO LÓPEZ		1	— " —
12	— " —	Cr 27 Bis 50-07	— " —	ALFONSO LÓPEZ	— " —	3	Bajo puerta
13	Cristian Juez	Cr 27 Bis 50-08	— " —	ALFONSO LÓPEZ		1	— " —
14	Arnaldo Carmona Diaz	Cr 27 Bis 50-22	3228954210	ALFONSO LÓPEZ	Arnaldo Carmona	1	— " —
15	Salomon Delgado	Cr 27 Bis 50-30/36	3106454208	ALFONSO LÓPEZ		1	— " —
16	Salomon Delgado	Cr 27 Bis 50-42 302	3106454208	ALFONSO LÓPEZ		1	— " —
17	Salomon Delgado	Cr 27 Bis 50-42-201	3106454208	ALFONSO LÓPEZ		1	— " —
18	Salomon Delgado	Cr 27 Bis 50-42202	3106454208	ALFONSO LÓPEZ		1	— " —
19	Salomon Delgado	Cr 27 Bis 50-42 Adm.	3106454208	ALFONSO LÓPEZ		5	— " —
20	Rodrigo Paredes	Cr 27 Bis 50-52	3136669932	ALFONSO LÓPEZ		5	— " —
				TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS		35	

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	T.S. Angela María Quiroga Galvis	T.S. Luz Escobar Ospina
FIRMA	Angela Mª Quiroga	Luz Escobar

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Teusaquillo

TIPO DE PIEZA: VOLANTE No. 33 PLEGABLE DE SOSTENIBILIDAD DE LA VÍA

CONTRATO N°: 552-2024 COP (120683) **RESPONSABLE: T.S. Angela Maria Quiroga Galvis** **FECHA** 26/09/2025

LOCALIDAD: TEUSAQUILLO **BARRIO: ALFONSO LÓPEZ** **CIV : 13001165**

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Albeni Betancourt	Cr 27 No. 50-58	3116468157	ALFONSO LÓPEZ		1	— " —
2	Laura Niño	Cr 27 D. 50-68	3153099123	ALFONSO LÓPEZ		1	— " —
3	— " —	Cr 27 No. 50-78	— " —	ALFONSO LÓPEZ	— " —	1	Bajo puerta
4	Martha Gonzalez	Cr 27 No. 50-84	— " —	ALFONSO LÓPEZ	— " —	1	Niega Firmar Esta con Felme Con la dueña
5				ALFONSO LÓPEZ			
6				ALFONSO LÓPEZ			
7				ALFONSO LÓPEZ			
8				ALFONSO LÓPEZ			
9				ALFONSO LÓPEZ			
10				ALFONSO LÓPEZ			
11				ALFONSO LÓPEZ			
12				ALFONSO LÓPEZ			
13				ALFONSO LÓPEZ			
14				ALFONSO LÓPEZ			
15				ALFONSO LÓPEZ			
16				ALFONSO LÓPEZ			
17				ALFONSO LÓPEZ			
18				ALFONSO LÓPEZ			
19				ALFONSO LÓPEZ			
20				ALFONSO LÓPEZ			
				TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS		4	

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	T.S. Angela María Quiroga Galvis	T.S. Luz Escobar Ospina
FIRMA	Angela M. Quiroga	Luz Escobar

Recomendaciones de sostenibilidad:



Evitar lavar, hacer mantenimiento o parquear vehículos en las vías.



Recoger y depositar la basura en las canecas dispuestas y horarios establecidos.



Evitar pintar, rayar o quemar materiales sobre las vías.



Utilizar adecuadamente los pasos peatonales. Evita alterar la estructura de la vía.



Evitar el derrame de combustible y agentes químicos.



Retirar o adecuar los desagües que puedan dañar la vía

Estado actual – Carrera 27 entre calles 50 y 51



Beneficios de la conservación vial:



Más seguridad vial



Menos tiempo de desplazamiento



Más conectividad



Más de 500 mil personas beneficiadas

Más información sobre el Contrato COP No. 552-2024 (120683)

Dirección: Calle 39A No. 29-21 Piso 3
Horario: lunes a viernes: 7:00 a.m. a 1:00 pm.
Teléfono: 601 5317157
Línea celular: 3019072050
Correo: teusavialsocial@gmail.com
Contratista: Consorcio Teusavial
Interventoría: Consorcio Interteusaquillo JG

Finalizan las actividades de

Conservación Vial

En el tramo de la carrera 27 entre calles 50 y 51 CIV 13001165 barrio Alfonso López Localidad de Teusaquillo



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Alcaldía Local de Teusaquillo

BOGOTÁ

Finalizan las actividades de conservación vial en la localidad Teusaquillo



Finalizan las obras de conservación de la malla vial

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

- Se realizo excavación mecánica y manual
- Renovación de tubería residual
- Construcción de cárcamos
- Instalación de geotextil
- Instalación de geocelda
- Relleno SBG reciclada
- Instalación de sumideros
- Nivelación, instalación y compactación de material granular estabilizado con cemento y aditivo.
- Capa de asfalto MD-25 y MD-19

Las intervenciones en la malla vial, **mejoran la movilidad** vehicular, permitiendo la **conectividad y la accesibilidad**, así como **menores tiempos de desplazamiento** para los residentes de la zona.



Construcción de cárcamo



Instalación de sardinel

Estado inicial



Estado actual




NOTA: Se instalará señalización teniendo en cuenta los lineamientos del contrato.

CONSORCIO TEUSAVIAL	**Contrato No. 552-2024** **COP (120683)**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO BOGOTÁ


REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	26 de septiembre de 2025

FOTOGRAFÍAS 1 AL 4

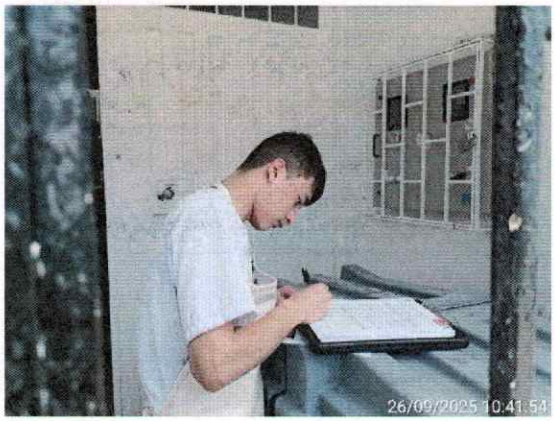



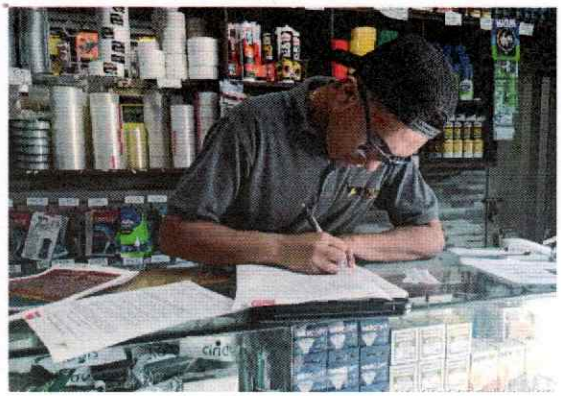



Observacion: Entrega plegable de sostenibilidad de la vía barrio Alfonso López
CIV 13001165

FORMATO			
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Teusaquillo
FO-SC-19	DE LA	3.0	

TIPO DE PIEZA: PLEGABLE DE SOSTENIBILIDAD DE LA VIA NICOLAS DE FEDERMAN TRAMO 3

CONTRATO N°: 552-2024 COP (120683) **RESPONSABLE: T.S. Angela Maria Quiroga Galvis** **FECHA** 29/09/25

LOCALIDAD: **TEUSAQUILLO** **BARRIO: NICOLAS DE FEDERMAN** **CIV : 13000476**

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Marco Tulio Querubin	Cr 36A No. 57A-22	3157493253	NICOLAS DE FEDERMAN		2	— " —
2	Héctor Herrera	Cr 36A No 57A-08	3203446463	NICOLAS DE FEDERMAN	Hector Herrera	1	— " —
3	Marco Tulio Querubin	Cr 36A No 57A-14	3157493253	NICOLAS DE FEDERMAN		1	— " —
4				NICOLAS DE FEDERMAN			
5				NICOLAS DE FEDERMAN			
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
					TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS	4	

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	T.S. Angela Maria Quiroga Galvis	T.S. Luz Escobar Ospina
FIRMA	Angela Ma Quiroga	Luz Escobar

Recomendaciones de sostenibilidad:



Evitar lavar, hacer mantenimiento o parquear vehículos en las vías.



Recoger y depositar la basura en las canecas dispuestas y horarios establecidos.



Evitar pintar, rayar o quemar materiales sobre las vías.



Utilizar adecuadamente los pasos peatonales. Evita alterar la estructura de la vía.



Evitar el derrame de combustible y agentes químicos.



Retirar o adecuar los desagües que puedan dañar la vía

Estado actual – Carrera 36A entre calles 57A y 57B



Beneficios de la conservación vial:

- Más seguridad vial
- Menos tiempo de desplazamiento
- Más conectividad
- Más de 500 mil personas beneficiadas


Más información sobre el Contrato COP No. 552-2024 (120683)

Dirección: Calle 39A No. 29-21 Piso 3
Horario: lunes a viernes: 7:00 a.m. a 1:00 pm.
Teléfono: 601 5317157
Línea celular: 3019072050
Correo: teusavialsocial@gmail.com
Contratista: Consorcio Teusavial
Interventoría: Consorcio Interteusaquillo JG

Finalizan las actividades de

Conservación Vial

En el tramo de la carrera 36A entre calles 57A y 57B CIV 13000476 barrio Nicolás de Federmán Localidad de Teusaquillo

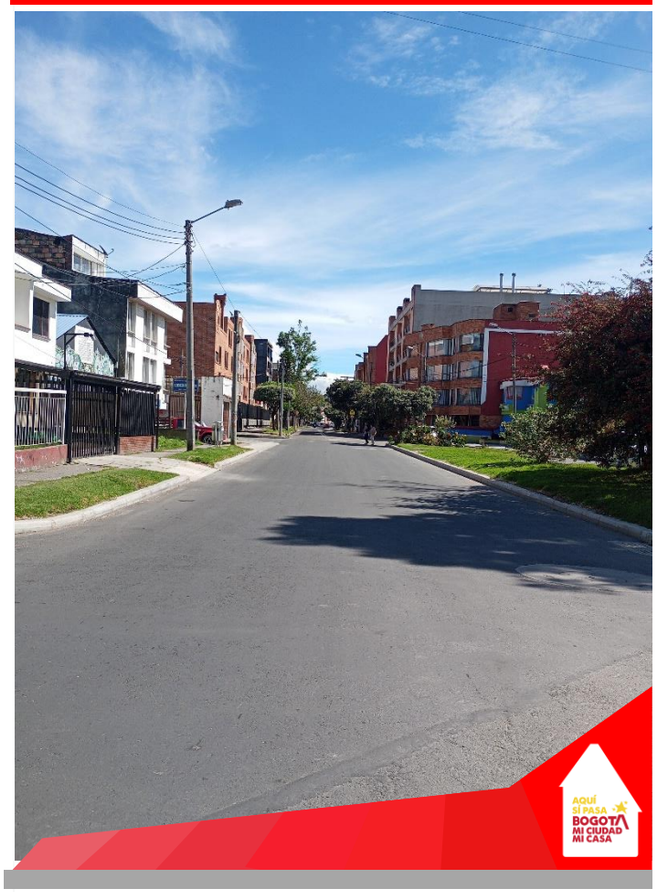

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Alcaldía Local de Teusaquillo

BOGOTÁ

Finalizan las actividades de conservación vial en la localidad Teusaquillo



Finalizan las obras de conservación de la malla vial

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

- Se realizo excavación mecánica y manual
- Renovación de tubería residual
- Construcción de cárcamos
- Instalación de geotextil
- Instalación de geocelda
- Relleno SBG reciclada
- Instalación de sumideros
- Nivelación, instalación y compactación de material granular estabilizado con cemento y aditivo.
- Capa de asfalto MD-25 y MD-19

Las intervenciones en la malla vial, **mejoran la movilidad** vehicular, permitiendo la **conectividad y la accesibilidad**, así como **menores tiempos de desplazamiento** para los residentes de la zona.



Instalación de tubería



Instalación de sardinel

Estado inicial



Estado actual



NOTA: Se instalará señalización teniendo en cuenta los lineamientos del contrato.

CONSORCIO TEUSAVIAL	**Contrato No. 552-2024** **COP (120683)**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	29 de septiembre de 2025

FOTOGRAFÍAS 1 AL 3







Observacion: Entrega de plegable de sostenibilidad de la vía barrio Nicolás de Federmán CIV 13000476 Tramo 3

Anexo 10
Registro de asistencia y fotográfico de capacitación No. 8

FORMATO		
FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-228	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FECHA	SEPTIEMBRE 24 DE 2025	TEMA	CAPACITACIÓN No. 8 TRABAJADORES DE OBRA TEMA: Salud Mental.

LUGAR	FRENTES DE OBRA	BARRIO	QUINTA PAREDES, NICOLAS DE FEDERMAN Y SAN LUIS	UPZ	QUITA PAREDES, LA ESMERALDA Y GALERIAS	LOCALIDAD	TEUSAQUILLO

No.	DOCUMENTO C.C T.I C.E	NÚMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	SEXO	ORIENTACIÓN SEXUAL	GRUPO ÉTNICO	TIPO DE DISCAPACIDAD	TELÉFONO FIJO O CELULAR	DIRECCIÓN	BARRIO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	CC	1100[illegible]	Kevin Andres Ayala	19	Tevisavial					3249499774	Cra 30 #27			
2	CC	993685	Wilmer Perez	51	TECSAVIAL					3102414525	75C SUR 75 F 22			WJP
3	CC	1240640	Reinaldo Salas	33	Tevavial	M				3026069883	Transversal 73G # 69-12	Perdomo Alto	Salas21@gmail.com	
4	CC	1011080611	Hassay Vanesa Quiroga	21	Tevsavial	F				310339561				Hassay Quiro
5	CC	1000000755	Jeiver Esteban Rodriguez	24	Tevsavial	M.				3026010166				
6	CC	4052960	Luis Alberto Rivera	63	T.	M				3224091014				
7	CC	80 006810	Ruben D	48	T.	M								Ruben.
8	CC	5	Ronal Salcedo	37	EPT	M				5300663				
9	CC	80120823	Jackson Rivas	44	Tevsavial	M				3112913315		Perdiso		Rivas
10	CC	79316469	Oscar Garzon	79	EPI	M				3213896578		Bosa		
11	CC	79878620	Jose miguel	46	EPI	M				3117783201		Altos de la Florida		Jose miguel
12	CC	1124865472	Brenda Castillo	27	Tevsavial	F				3226181444				Brenda
13	CC	7012360	Jonathan Castaño P.	36	Tevsavial	M				3148462201		Bosa		
14	CC	79955833	Jesus cobleros	40	Tevsavial	M				3158395634		Bosa		
15	CC	1010200330	Lilian Trujillo	33	Tevsavial	M				—	—	Soacha		Lilian Trujillo

Sexo. M: Mujer / **H:** Hombre
Orientación Sexual. Hm: Homosexual / **Ht:** Heterosexual / **Bi:** Bisexual / **T:** Transexual/ **I:** Intersexual
Grupo Étnico. N: Ninguno / **R:** Raizales / **A:** Afrodescendientes / **I:** Indígenas / **P:** Palenqueros(as)/**G:** Rrom
Tipo Discapacidad. F: Física / **V:** Visual / **A:** Auditiva / **C:** Cognitiva / **MU:** Múltiple / **N:** Ninguna

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO		
FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-228	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FECHA	SEPTIEMBRE 24 DE 2025	TEMA	CAPACITACIÓN No. 8 TRABAJADORES DE OBRA TEMA:

LUGAR	FRENTES DE OBRA	BARRIO	QUINTA PAREDES, NICOLAS DE FEDERMAN Y SAN LUIS	UPZ	QUITA PAREDES, LA ESMERALDA Y GALERIAS	LOCALIDAD	TEUSAQUILLO

No	DOCUMENTO		NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	SEXO	ORIENTACIÓN SEXUAL	GRUPO ÉTNICO	TIPO DE DISCAPACIDAD	TELÉFONO FIJO O CELULAR	DIRECCIÓN	BARRIO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
	C.C T.I C.E	NÚMERO												
1	CC	1118843305	Oscar de Lima	43	Teusaul	M.				3044523234	Tran 12 # 76 16 sur	Ducales	Delimacontreras@gmail.com	
2	CC	79896322	Edgar Castro B	47	Teusaul.	M				3228271045		Molinos	biattnatpaty@gamail.com.	Edgar Castro B.
3	CC	52104995	Sondra I. Perilla		Consorcio Teusaul	M	Hl	N	U	3132256659	cll 39A n. 29-27	La Soledad	teusaul.social@gmail.com	
4	CC	1022429350	Sebastián Martinez	H	Teusaul	H				3204249886	Tv 74 17A-35	Villa Alsacia	— —	
5	CC	79122509	RAFAEL GUTIERREZ	M	TEUSAUL					3106258446	K 102 86A 46	BOLIVIA		
6	CC													
7	CC													
8	CC													
9	CC													
10	CC													
11	CC													
12	CC													
13	CC													
14	CC													
15	CC													

Sexo. M: Mujer / **H:** Hombre
Orientación Sexual. Hm: Homosexual / **Ht:** Heterosexual / **Bi:** Bisexual / **T:** Transexual/ **I:** Intersexual
Grupo Étnico. N: Ninguno / **R:** Raizales / **A:** Afrodescendientes / **I:** Indígenas / **P:** Palenqueros(as)/**G:** Rrom
Tipo Discapacidad. F: Física / **V:** Visual / **A:** Auditiva / **C:** Cognitiva / **MU:** Múltiple / **N:** Ninguna

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

CONSORCIO TEUSAVIAL	**Contrato No. 552-2024** **COP (120683)**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	24 de septiembre de 2025

FOTOGRAFÍAS 1 AL 4









Observacion: Capacitación trabajadores de obra No. 8 Salud Mental
Frentes de obra
