Bogotá D.C.

Fecha de ejecución: agosto 21 de 2025

Dirección: KR 92 70-15 SUR
Unidad Operativa: JI OJO DE PERDIZ
Asunto: Informe Asistencia técnica Planta Eléctrica

Contrato No. 9048 - 2024

Secretaria Integración Social

Objeto contrato: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS Y TRANSFERENCIAS DE PROPIEDAD DE LA SDIS Y AQUELLOS POR LOS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE."

El día 21 de agosto de 2025 se procedió a realizar asistencia técnica para revisión de planta eléctrica STAMFORD de 32 KVA, la cual se encuentra ubicada en JARDIN INFANTIL OJO DE PERDIZ

Duante la asistencia se realizó lo siguiente:


Revisión electromecánica
Se detecta fuga de aceite por el tapavalvula, se procede a realizar limpieza y posterior ajuste de tapa.
Se realiza revision general
Revisión de fluidos (Aceite, refrigerante y ACPM)
Se comprueba estado de batería midiendo el amperaje y tensión,
Se da breve inducción al personal de la operación del equipo.
Se requiere visita técnica con proveedor eléctrico, ya que en el momento de presentarse una falla de la red publica, el equipo solo suple la iluminación del pasillo.

REGISTRO FOTOGRAFICO

Planta eléctrica revisión general





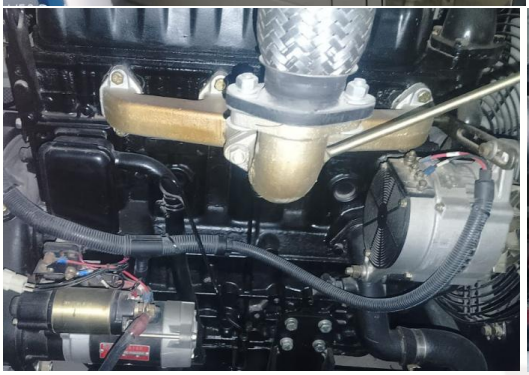



Revisión baterías





Estado aceite



Filtros





Limpieza planta eléctrica



Transferencia





SE ANEXA CUADRO COSTOS

ITEM BOLSA DE REPUESTOS	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	Numero de Orden de Servicio	Observaciones
Mantenimiento preventivo planta electrica :/32 KVA/:OJO DE PERDIZ/KR 92 70 15 SUR/BOSA							
2	PLANTA ELECTRICA Y TRANSFERENCIA DE 31-60 KVA-VISITA DE INSPECCION PLANTA ELECTRICA Y TRANSFERENCIA (Motores Diesel y tranferencia electrica) Revisión y diagnóstico del estado real de la planta electrica y su transferencia. Pruebas de funcionamiento, verificación de los parámetros eléctricos, mecánicos y fungibles. Nivelación de fluidos (aceite, refrigerante, combustible)	UNIDAD	1	$ 180,000.00	$ 180,000.00	151-2025	se realizo revision electromecanica, se evidencia fuga de aceite por tapavalvula, se realiza ajuste de tapa valvula, pruebas de operación y funcionamiento, se deja equipo operando sin novedad.
				Subtotal	$ 180,000.00		
