CONSORCIO INTER DA

NIT: 901.863.475 - 6

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS "INVIAS"

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3780 de 2024

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 8


INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2025

EDICION 1

SANTIAGO DE CALI, ENERO DE 2025

CONTROL DE REVISIONES Y CAMBIOS

VERSION No.	FECHA	PAGINAS	DESCRIPCION DEL CAMBIO	COPIA CONTROLADA	
				SI	NO
1	ENERO DE 2025		Versión inicial	X	
Elaborado por:  **Director de Interventoría:** Ing. PABLO ORDOÑEZ BOLAÑOS			Revisado por:  **Director de Interventoría:** Ing. PABLO ORDOÑEZ BOLAÑOS		

CONTROL DE DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS

COPIA No.	EMITIDA	FECHA DE DISTRIBUCION
1	INVIAS	30 de enero de 2025
2	ARCHIVO	30 de enero de 2025

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio solidarios de Obra No. 2408-2024 , 2257-2024, 2288-2024 , 2434-2024, 2407-2024, 2482-2024, 2507-2024, 2549-2024, 2530-2024 , 2563-2024, 2568-2024 OAC , 3008-2024, 3108-2024, 3144-2024, 3159-2024, 3179-2024, 3420-2024, 3403-2024, 3418-2024, 3459-2024, 3544-2024, 2550-2024, 3579-2024, 3608-2024, 3931-2024, 3938-2024, 3991-2024, 4014-2024 Y 4112-2024. **Contratista:** OAC´S

Contrato de Interventoría No. 3780 de 2024 **Interventoría:** CONSORCIO INTER DA

Objeto Convenio solidario:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL, DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME MENSUAL No. 4 **MES O PERIODO:** ENERO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	3
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	4
1	**INTRODUCCIÓN**		5
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		6
2.1	Localización		6
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		6
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		7
2.4	Características técnicas del proyecto		7
3	**INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO**		8
3.1	Información general del contrato		8
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		9
3.3	Seguimiento Items no previstos		9
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		9
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO**		10
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	10
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	10
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	10
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	11
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	11
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	11
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	12
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	12
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		12
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo		
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones		
	• Actas de Comité de Obra		
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		13
5.1	Información general del contrato		13
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		14
5.3	Informes especialistas y profesionales		14
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		17
5.5	Informe matriz de riesgos.		17
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N/A
5.7	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		N/A
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		18
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	18
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	18
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	18
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	18
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	18
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		18
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N/A
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	18
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	18
7	**Conclusiones y recomendaciones**		19
8	**Anexos**		20
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		N/A
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		40
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N/A
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		43

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: CARLOS HERNAN LODOÑO ESTRADA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 4843 de fecha 15/10/2024

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE **PERIODO MES:** ENERO

CONVENIO DE OBRA No.: 2408-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE BARRANCAS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 20/11/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 216.404.793,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 216.404.793,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3780 2024 **INTERVENTOR:** INTER DA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS HERNAN LONDOÑO ESTRADA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	m	170
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	m	149,67	88,04%
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			216.404.793,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	N/A		
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	N/A		
ESTUDIOS Y DISEÑOS	N/A		
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	N/A		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			216.404.793,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	154.348.710,84	36.205.253,16	190.553.964,00	190.553.964,00
AJUSTES	N/A			
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	N/A			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	N/A			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	N/A			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	N/A			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	N/A			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	N/A			
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	N/A			
VALOR EJECUTADO	154.348.710,84	36.205.253,16	190.553.964,00	190.553.964,00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 194.994.090,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 190.553.964,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 88,05%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 6
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 6
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **23**

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Indicar la localización y actividad.




Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

N/A

Firma
Nombre
Director de Interventoria
Matricula Profesional No.5220254323NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a las actividades realizadas por el Convenio de Solidario No. 2408 DE 2024, entre el 01 al 31 de enero del 2025, registradas por INTER DA, actuando en condición de Interventor mediante el Contrato OFERTA No.3780 de 2024 suscrito con el INVIAS cuyo objeto es realizar la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 8.

Alcance contrato de interventoría convenios solidarios: 2408-2024 OAC CORREGIMEINTO BARRANCAS, 2257-2024 OAC VERDA LA GAVIOTA, 2288-2024 OAC VEREDA LA ELVIRA, 2434-2024 OAC CORREGIMIENTO LA CASTILLA, 2407-2024 OAC VEREDA CULEBRAS, 2482-2024 OAC VEREDA LIMONES, 2507-2024 OAC CORREGIMIENTO EL RECREO, 2549-2024 OAC VEREDA LA PAILA, 2530-2024 OAC LOMITAS, 2563-2024 OAC BUENOS AIRES, 2568-2024 OAC LA FERIA, 3008-2024 OAC LAURELES, 3108-2024 OAC MARACAIBO, 3144-2024 OAC PLAYA RICA, 3159-2024 OAC PRADERA, 3179-2024 OAC LOS ALPES, 3420-2024 OAC MADRE VIEJA, 3403-2024 OAC LAS BRISAS, 3418-2024 OAC MORRO AZUL, 3459-2024 OAC VILLA RODAS, 3544-2024 OAC RAIZAL, 2550-2024 OAC PORTUGAL DE PIEDRAS, 3579-2024 OAC BUENOS AIRES BOMBAY, 3608-2024 OAC CORDOBA, 3931-2024 OAC CALAMAR, 3938-2024 OAC ARBOLEDAS, 3991-2024 OAC EL PORVENIR, 4014-2024 OAC EL CARMEN Y 4112-2024 RESGUARDO INDIGENA TRIUNFO CRISTAL PAEZ del departamento del Valle.

Los cuales tiene por objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

El SUPERVISOR GENERAL designado por el INVIAS para el control del Contrato de Interventoría, es el Ing. Carlos Hernán Londoño Estrada.

En este informe la Interventoría hace una descripción al INVIAS de las actividades realizadas, de tal manera que le brinde a la entidad contratante una visión general del desarrollo de los convenios citados, en lo referente a sus características principales, localización general del proyecto, aspectos técnicos como son sus antecedentes e intervención de la vía, su estado y trabajos ejecutados, aspectos financieros, ambientales, legales, de cumplimiento, y además el seguimiento de los componentes mencionados.


2. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El proyecto contempla realizar el MEJORAMIENTO VIAL, mediante la construcción de pavimento en Placa Huella en el Marco del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.

El proyecto tiene como alcance realizar el mejoramiento de la vía en una longitud de placa huella:170.00 m, ancho placa huella:4.40 m, longitud de la huella: 3.00 m, longitud de la viga riostra: 4.40 m, alto de la viga riostra: 0.25 m, ancho viga riostra: 0.20 m, ancho cuneta con bordillo: 0.63 m, ancho cuneta placa: 0.48 m, ancho bordillo: 0.15 m .

2.1 LOCALIZACION

La localización del proyecto se encuentra en el corregimiento de Barrancas del municipio de Palmira como se puede observar en la siguiente imagen:

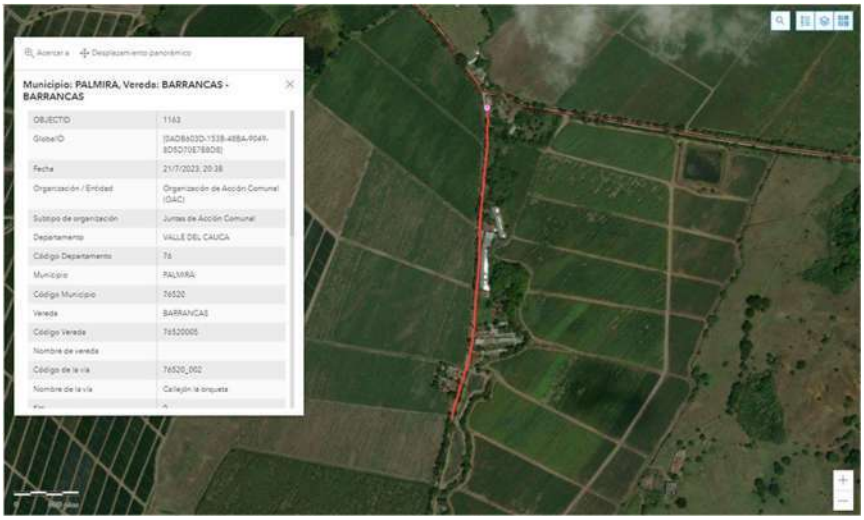

Fuente: https: Arcgis - FiledMapsLocalización vía a Intervenir – Arcgis - FiledMaps

2.2 MUNICIPIOS DE LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

El proyecto que se desarrolla se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Palmira del departamento de Valle del Cauca en el corregimiento de Barrancas, en el corredor vial denominado Callejón La Orqueta el tramo de vía visitado tiene una longitud de 600 metros, de los cuales el convenio considera la adecuación de 170 metros lineales con sistema de placa huella. El punto de inicio de referencia PR 0+380 en casa de la señora Alicia Arias y el punto final de referencia es PR0+560 en predios de la Familia Paredes, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Valle del Instituto Nacional de Vías. El alcance de proyecto consiste en realizar la ejecución de obras de baja complejidad en los sectores priorizados mediante la aplicación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, ejecutando actividades de mejoramiento tales como la construcción de placa huella. El Organismo de Acción

Comunal deberá gestionar y tramitar los aspectos sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a la normatividad vigente.

Entre los beneficios que otorga este desarrollo del proyecto está la optimización en la explotación de los productos **AGRICOLA, PISCICOLA, PORCICOLA y TURISTICA**, que permite a la comunidad nuevas opciones laborales.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

La vía se encuentra actualmente destapada, por lo que presentaba grandes deterioros debido al tránsito vehicular y acumulación de aguas lluvias, por la ausencia de obras para el manejo de escorrentías que deterioran de forma acelerada la estructura y funcionalidad de la vía, considerando que, en época de lluvias, este tramo de vía funciona como un canal que escurre las aguas que se acumulan, debido a la ubicación topográfica de la zona a intervenir. Este factor afecta significativamente el tránsito de vehículos y transeúntes cuando el clima lluvioso no favorece los desplazamientos, lo cual genera mayores costos de operación en el trasporte de productos agrícolas que se comercializan en el sector, incomodidad y mayores tiempos en la movilidad de conductores y usuarios de la comunidad. De igual manera, en épocas de verano, la generación de polvo complica las condiciones de salud de los residentes del tramo a intervenir.


	
Fotografía 1. Estado inicial del proyecto	**Fotografía 2. Estado inicial del proyecto**

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

De acuerdo con el presupuesto estimado de referencia las intervenciones proyectadas son las siguientes:

El proyecto tenía como alcance inicial realizar el mejoramiento de la vía en una longitud de placa huella:170.00 m, ancho placa huella:4.40 m, longitud de la huella: 3.00 m, longitud de la viga riostra: 4.40 m, alto de la viga riostra: 0.25 m, ancho viga riostra: 0.20 m, ancho cuneta con bordillo: 0.63 m, ancho cuneta placa: 0.48 m, ancho bordillo: 0.15 m.

No obstante, lo anterior, dadas las condiciones de la vía existente, las dimensiones de la sección transversal se adaptan a las posibilidades geométricas existentes.

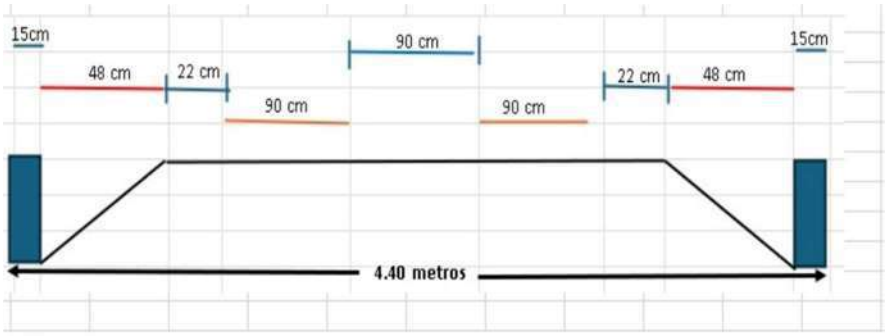

3. INFORMACION DEL CONVENIO SOLIDARIO

3.1 INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Tipo de Contrato:	Convenio Solidario
Convenio Solidario No.:	N° 2408 DE 2024
Contratista:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE BARRANCAS, D E L MUNICIPIO DE PALMIRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
Fecha iniciación contractual:	Agosto 24 de 2024
Valor Total del Contrato:	$ 216.404.793,00
Plazo de ejecución inicial:	130 días
Fecha de terminación Inicial:	Hasta 31 de diciembre 2024
Porcentaje de Ejecución:	95%
Interventor del Proyecto:	INTER DA
Supervisor INVIAS	Ing. Carlos Hernán Londoño Estrada

Gráfico 1. Presupuesto estimado

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA — CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL — INVIAS

PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE BARRANCAS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DEPARTAMENTO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD DEL CORREDOR (Km)	DIRECCIÓN TERRITORIAL	FECHA ELABORACIÓN
VALLE DEL CAUCA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE BARRANCAS	0,60	VALLE DEL CAUCA	11/05/2024

ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO

No	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO						
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	600.1.1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5,51	$ 82.531,00	$ 454.746,00
2	320.3	Subbase Granular Clase C	M3	143,06	$ 145.766,00	$ 20.853.284,00
3	630.1.4.1	Concreto reforzado resistencia 21 MPa (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	99,42	$ 917.084,00	$ 91.176.491,00
4	630.1.7	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	43,80	$ 418.743,00	$ 18.340.943,00
5	640.1	Acero de refuerzo de Fy = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4.608,55	$ 7.389,00	$ 34.052.576,00
					SUB-TOTAL	$ 164.878.040,00
					SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	$ 164.878.040,00
					PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.946.341,00
					GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 45.580.412,00
					VALOR ESTIMADO CONVENIO	$ 215.404.793,00

3.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

Se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- El día 07 de enero se realiza la toma de densidades de la subbase instalada sobre diferentes abscisas, obteniendo los siguientes resultados:
    1. (k0+380) =102.3 % Compactación
    2. (k0+410) = 99.9 % Compactación
    3. (k0+440) =102.3% Compactación
    4. (k0+480) =104.4% Compactación
    5. (k0+520) =101.3% Compactación

  Nombre del Laboratorio que realizo los ensayos: LABCON SAS

- Se continua con actividades de corte y figurado de aceros de refuerzo para placa huella.

- El día 8 de enero se recibieron en obra, la (07)m3 grava, arena (07)m3, cemento(150uni) y roca (07)m3 de canto rodado, para la fabricación de concreto de 3000 PSI y concreto ciclópeo.

- 13 de enero se da inicio de los primeros 25 metros lineales con sistema de placa huella. El punto de inicio de referencia PR0+560- hasta PR0+535

- El 15 de enero, se recibió la visita en obra del supervisor del contrato, el Ing. Carlos Hernán Londoño Estrada. Durante la inspección, se constató una impresión favorable en cuanto al personal, los materiales y el estado de la obra, los cuales se encontraban en óptimas condiciones y funcionando con normalidad. Asimismo, se llevaron a cabo apreciaciones y coordinaciones relacionadas con la posible desactivación de los convenios prevista para marzo de 2025.

- Se procede con la verificación de los certificados de calidad de los materiales (agregados / insumos) correspondientes. Ver anexos

- El contratista entrega la afiliación del personal que va a trabajar (08 ayudantes y una femenina) como concreteros en la vía BARRANCAS. Se le entregan sus elementos de protección personal (EPP)

- Se instalan elementos de información de la valla del proyecto de barrancas sobre la contrición y mejoramiento de la vía de vereda de Barrancas sobre el tramo de la vía a intervenir.

- El contratista ejecuta 124 metros lineales de placa huella para el cierre del mes de enero 2025, fuera de los bordillos. Y se instalan 26.06 metros de formaletas listos para fundir.

3.3 SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS

En el período objeto del presente informe no se presentaron Ítems no previstos por el contratista de obra.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE INTERVENTORIA

En el desarrollo del contrato de obra No 2804 de 2024, es responsabilidad de la Interventoría revisar y aprobar el “Cronograma” del proyecto con el cual se efectúa el seguimiento a las actividades que se programan durante las fases y/o etapas del contrato.

En el periodo comprendido de 01 de enero hasta el 30 de enero 2024 se evidencia en el avance de la obra de un 73%, este avance es debido a que se contaba con gran porcentaje de suministros de los insumos en obra, se evidencio una mejora en los tiempos de ejecución para el inicio de las formaletas y para el fundido de la placa huella y sus elementos.

La JAC adelanta la gestión administrativa tendiente para el pago oportuno de los proveedores, de acuerdo al plan de inversión, el cronograma de obra y la curva de inversión.

Acciones para seguir por parte de la Interventoría.

- Seguimiento a la programación: avance de obra y avance financiero.
- Seguimiento al control de calidad (Ensayos de laboratorio).
- Atención y respuesta a comunicaciones recibidas.
- Prevenir posibles errores del Contratista en los métodos constructivos.
- Control a los perfiles de construcción y Medición de cantidades de obra.
- Se realiza el reporte de 5 informes semanales correspondientes al mes de enero (9,10,11 y 12) a la entidad contratante de acuerdos con y los términos establecidos al contrato de interventoría No. 3780 de 2024.

4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

4.1 INFORME SEMANAL

El formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 correspondiente al INFORME SEMANAL, se diligencio durante el presente periodo. Anexo 1.

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO SOLIDARIO

El Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 correspondiente a MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO SOLIDARIO, de acuerdo a la secuencia de actividades constructivas se presenta el formato correspondiente para el presente periodo. Anexo 2.

4.3 PERSONAL, CONTROL Y APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

El Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 correspondiente al PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL OBRA, se presenta el formato correspondiente al periodo de enero. Anexo 3.

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO SOLIDARIO

RELACION DE GASTO	VALOR EJECUTADO
Pago de Gastos de Representacion 20 nov al 20 dic de 2024	$ 400,000
Honorarios profesionales del 16 al 30 de diciembre	$ 1,400,000
Honorarios profesionales del 25 al 30 noviembre	$ 1,750,000
Suministro y trasnporte de agua y maquinaria pesada	$ 2,079,000
laboratorio densidades de terrero y transporte de equipos.	$ 303,450
Alquiler de vibro por 9 horas y transporte	1,493,760
Pago de Retencion en la fuente diciembre 2024 y seguridad s	$ 1,030,000.00
Concepto: Compra de 14 mt de piedra y 7mt de arena	$ 1,260,000.00
Honorarios profesionales del 1 al 15 de enero del 2025	$ 1,400,000
Honorarios profesionales del 1 al 15 de enero del 2025	$ 1,750,000
Gastos bancarios	$ 195,539
Concepto: Compra de 28 mt de piedra y 7mt de arena	$ 2,100,000
Concepto: 80 metros lineales de placa huella	$ 24,000,000
Gastos bancarios	
Pago de Gastos de Representacion 26 diciembre al 25 enero d	$ 400,000
Concepto: Compra de 21 mt de arena	$ 1,260,000
Honorarios profesionales del 16 al 30 de enero del 2025	$ 1,400,000
Honorarios profesionales del 16 al 30 de enero del 2025	$ 1,750,000
laboratorio densidades de terrero y transporte de equipos.	$ 741,251
Concepto: 80 metros lineales de placa huella	$ 20,000,000

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

El Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 correspondiente al ESTADO GENERAL DEL TIEMPO, se diligencio durante el presente periodo. Anexo 4.

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

El Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 correspondiente al RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO, se presenta el formato correspondiente al periodo de enero Anexo 5.

El día 17 de enero se toman las muestras del concreto para los ensayos de resistencias de la fundición de la placa huella a 21 MPa y 14 MPa de respectivamente de los siguientes tramos k0+534- hasta k0+560, obteniendo los siguientes resultados:

02 cilindros = A una edad (7) días con un madures de desarrollo 86.5 %, y para el 2do cilindro de 82.1%. pendiente la entrega de los resultados a 14 y 28 días.

- Cilindro 1A: k0+534- hasta k0+560= 18.2 MPa
- Cilindro 1B: k0+534- hasta k0+560= 17.2 MPa

	LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS	Código: EL-FR-004
		Versión: 02
	INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRECTO (NTC-673/2010)	Fecha Actualización: feb 2023
		Página 1 de 2

Informe No: 0060 Fecha de informe: 22/01/2025 Código cliente: 225

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Días)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxima (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de falla
1A	FUNDICIÓN PLACA HUELLA K0+534 Y K0+560	2025/1/15	2025/1/22	4"	7	3963	2,406	147,2	185,2	2633	18,2	21	86,5	3
1B	FUNDICIÓN PLACA HUELLA K0+534 Y K0+560	2025/1/15	2025/1/22	4"	7	3929	2,385	139,7	175,7	2499	17,2	21	82,1	3

4.7 SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONVENIO SOLIDARIO.

Se diligencia el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 correspondiente al SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DE OBRA Anexo 6.

4.8 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD.


El Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14 correspondiente al SEGUIMIENTO PLAN DE CALIDAD DE OBRA, No Aplica para el convenio solidario.

4.9 SEGUIMIENTO PROGRAMACION E INVERSIONES DE OBRA.

Corresponde a la gráfica para evidenciar la curva de inversión VS lo proyectado en la ejecución de la obra correspondiente a la construcción del mejoramiento de la vía terciara del sector paso la Orqueta en el corregimiento de Barrancas del Municipio de Palmira.

			COSTO PROGRAMADO ACUMULADO	% ACUMULADO	COSTO SEMANAL PROGRAMADO	% SEMANAL	COSTO EJECUTADO ACUMULADO	% ACUMULADO EJECUTADO	COSTO SEMANAL EJECUTADO	% SEMANAL EJECUTADO
0	S0	8/11/2024	$0,00	0,00%	$0,00	0,00%				
1	S1	15/11/2024	$0,00	0,00%	$0,00	0,00%				
2	S2	22/11/2024	$0,00	0,00%	$0,00	0,00%				
3	S3	29/11/2024	$0,00	0,00%	$0,00	0,00%				
4	S4	6/12/2024	$0,00	0,00%	$0,00	0,00%				
5	S5	13/12/2024	$1.318.000,00	0,61%	$1.318.000,00	0,61%	$1.318.000,00	0,61%	$1.318.000,00	0,61%
6	S6	20/12/2024	$15.097.238,90	6,98%	$13.779.238,90	6,37%	$65.051.568,00	30,06%	$63.733.568,00	29,45%
7	S7	27/12/2024	$42.858.200,32	19,80%	$27.760.961,42	12,83%	$65.051.568,00	30,06%	$0,00	0,00%
8	S8	3/01/2025	$56.839.922,83	26,27%	$13.981.722,52	6,46%	$65.051.568,00	30,06%	$0,00	0,00%
9	S9	10/01/2025	$73.878.451,41	34,14%	$17.038.528,58	7,87%	$72.831.964,00	33,66%	$7.780.396,00	3,60%
10	S10	17/01/2025	$90.916.997,00	42,01%	$17.038.545,58	7,87%	$76.553.964,00	35,38%	$3.722.000,00	1,72%
11	S11	24/01/2025	$163.916.997,00	75,75%	$73.000.000,00	33,73%	$156.553.964,00	72,34%	$80.000.000,00	36,97%
12	S12	31/01/2025	$194.994.090,00	90,11%	$31.077.093,00	14,36%	$190.553.964,00	88,05%	$34.000.000,00	15,71%

Cuadro de Inversión

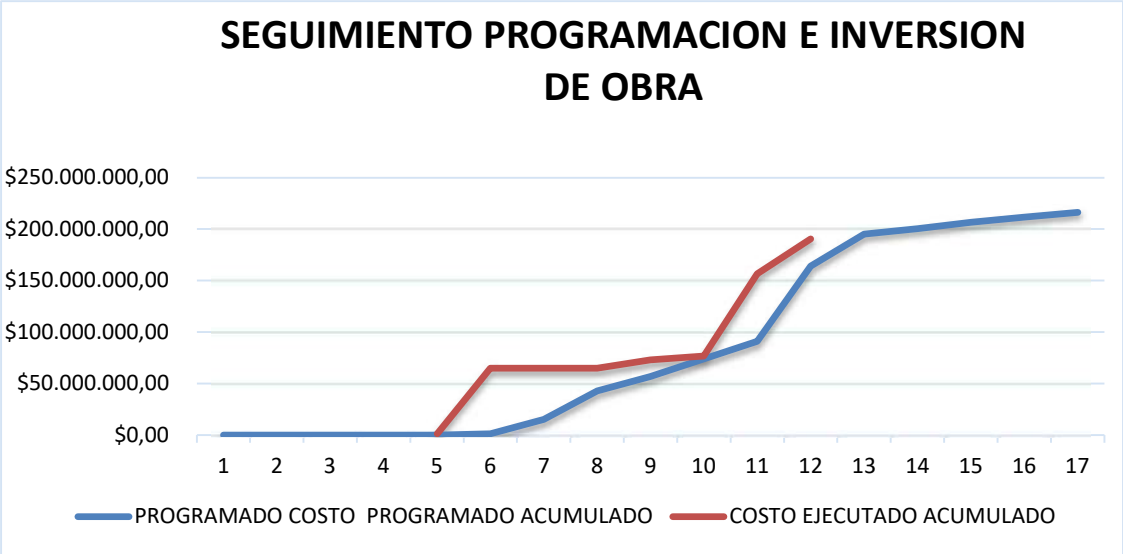

5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3780 de 2024

5.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Corresponde al Contrato Oferta No. 3780 de 2024, ejercer la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 8".

Alcance contrato de interventoría convenios solidarios: 2408-2024 OAC CORREGIMEINTO BARRANCAS, 2257-2024 OAC VERDA LA GAVIOTA, 2288-2024 OAC VEREDA LA ELVIRA, 2434-2024 OAC CORREGIMIENTO LA CASTILLA, 2407-2024 OAC VEREDA CULEBRAS, 2482-2024 OAC VEREDA LIMONES, 2507-2024 OAC CORREGIMIENTO EL RECREO, 2549-2024 OAC VEREDA LA PAILA, 2530-2024 OAC LOMITAS, 2563-2024 OAC BUENOS AIRES, 2568-2024 OAC LA FERIA, 3008-2024 OAC LAURELES, 3108-2024 OAC MARACAIBO, 3144-2024 OAC PLAYA RICA, 3159-2024 OAC PRADERA, 3179-2024 OAC LOS ALPES, 3420-2024 OAC MADRE VIEJA, 3403-2024 OAC LAS BRISAS, 3418-2024 OAC MORRO AZUL, 3459-2024 OAC VILLA RODAS, 3544-2024 OAC RAIZAL, 2550-2024 OAC PORTUGAL DE PIEDRAS, 3579-2024 OAC BUENOS AIRES BOMBAY, 3608-2024 OAC CORDOBA, 3931-2024 OAC CALAMAR, 3938-2024 OAC ARBOLEDAS, 3991-2024 OAC EL PORVENIR, 4014-2024 OAC EL CARMEN, 4112-2024 y RESGUARDO INDIGENA TRIUNFO CRISTAL PAEZ del departamento del Valle.

En el siguiente cuadro se relacionan las vías que inicia la intervención, debido a que cuentan con los recursos económicos destinados para ejecutar el objeto del convenio solidario y a su vez la interventoría podrá realizar vigilancia, control y verificación por parte de la Interventoría, en el marco de ejecución de los Convenios Interadministrativos que se suscribieron con las juntas de acción en el departamento de Valle.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VÍA	OBRA PROYECTADA
VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	VEREDA BARRANCAS	PLACA HUELLA LONGITUD 170 M

Tabla 1. Relación de vías a intervenir
Fuente: INTER DA

Contractualmente se tiene lo siguiente:

Tipo de Contrato:	Contrato de Interventoría
Contrato No.:	No.3780 de 2024
Contratista:	CONSORCIO INTER DA
Fecha iniciación contractual:	30/10/2024
Valor Total del Contrato:	$ 1.146.992.897
Plazo de ejecución:	62 días
Fecha de vencimiento Inicial:	31/12/2024

5.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

- Informe mensual de noviembre.
- Elaboración de los informes semanales.
- Seguimiento a los Planes de Desembolsos.
- Seguimiento a la contratación para la ejecución de las obras.

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

5.3.1 ACTIVIDADES ÁREA SOCIAL

SECTOR: CORREGIMIENTO DE BARRANCAS – MUNICIPIO DE PALMIRA
Convenio 2408-2024.

- **Informe Componente Social**

ACTIVIDADES ÁREA SOCIAL
ENERO DE 2025

PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Dirección Territorial Valle – Vigencia 2024
Contrato interventoría 3780 – 2024

5.3.1.1 PROTOCOLO PARA EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO

Se cuenta con un buzón de sugerencias el cual se encuentra instalado en la Casa de Habitación del Señor Marco Tulio Cespedes, este permanece en constante monitoreo por parte del Comité de Participación Comunitaria, quienes realizan revisión mensual del mismo los días martes de cada semana, realizando el correspondiente reporte a la Profesional Social de Interventoría Sandra Liliana Pianda Mejía. Cabe anotar que durante el mes de enero de 2025 no se encontraron ningún tipo de solicitudes en el buzón.

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de enero de 2025, no se presentan solicitudes por parte de la comunidad beneficiaria del proyecto o de la comunidad en general. El Comité de Participación Ciudadana tiene contacto permanente con la comunidad de igual forma han divulgado de forma reiterada tanto el correo de atención al ciudadano socialvalleinterda@gmail.com como el número telefónico de atención a la comunidad 3005704421. El día 29 de enero del año en curso se lleva a cabo reunión con el Comité de Participación en el acta se deja constancia de que a la fecha no se presentan inconformidades por parte de los residentes del sector o la comunidad en general.

5.3.1.2 PROTOCOLO DE SOCIALIZACION A LA COMUNIDAD


Durante el periodo no se llevan a cabo actividades correspondientes a este Ítem, se encuentra a la espera de orden de inicio por parte de la entidad contratante INVIAS.

5.3.1.3 PROTOCOLO DE PARTICIPACION COMUNITARIA

El día 29 de enero de 2025 se lleva a cabo reunión con el Comité de Participación en la cual se realiza seguimiento al buzón de sugerencias evidenciando que durante el periodo no se han presentado inconformidades por parte de la comunidad, de igual forma el buzón se continuara revisando los días martes de cada mes por parte del Comité y se realiza el correspondiente reporte a la Profesional Social de Interventoría, así mismo se realiza la correspondiente anotación el acta de la reunión (Anexo 1)

5.3.1.4 PROTOCOLO DE MANO DE OBRA LOCAL

	OBRA
EMPLEOS DIRECTOS GENERDOS	13
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	3
EMPLEOS DE LA ZONA DE INFLUENCIA	0
MANO DE OBRA FEMENINA	1
TOTAL, EMPLEOS GENERADOS	17

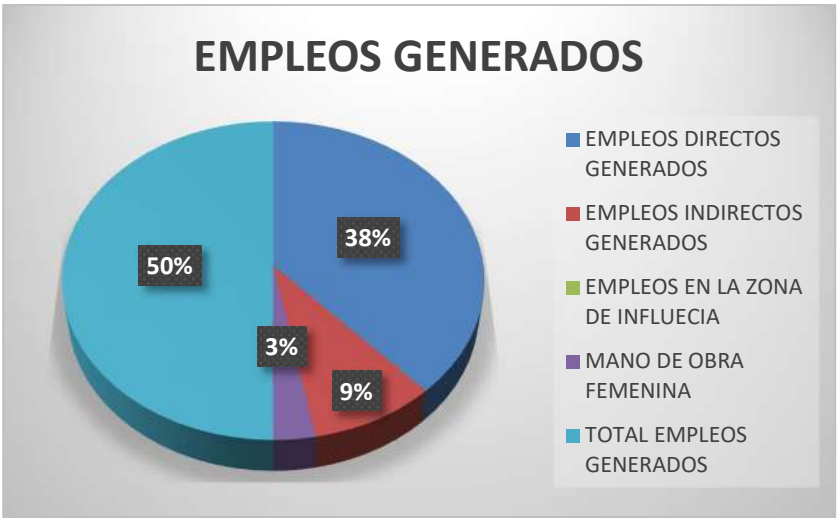

La mano de obra local se vinculará a medida de acuerdo con el avance y el requerimiento para el desarrollo de la obra, para el mes de enero se vinculó personal de mano de obra femenina a fin de dar cumplimiento a los lineamientos de la entidad en relación a la inclusión.

5.3.1.5 PROGRAMA GESTION SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA

Durante el periodo correspondiente al presente informe se realiza levantamiento de actas de vecindad en los tramos correspondientes a los convenios 4112-2024 Resguardo Triunfo Cristal Páez Municipio de la Florida y 3420 – 2024 Vereda Madre Vieja Municipio de Candelaria.

5.3.1.6 OBRAS CON PARTICIPACION COMUNITARIA

Con respecto a la Obra de Participación Comunitaria correspondiente al Convenio 2408 - 2024 suscrito con la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Barrancas, se radico la documentación en la página asignada para este fin atencionalciudadano@invias.gov.co mediante comunicado MVV-INVIAS-2024-006 con fecha 12 de Diciembre de 2024 se recibe comunicación de la confirmación con el radicado número 2024-12-13 11:51:19, posterior a ello se reciben observaciones respecto de la documentación y con respecto a la Obra con Participación Comunitaria se requirió el cambio de las cotizaciones requeridas haciendo referencia a que estas no eran legibles. Se realiza la solicitud a la JAC y se brinda la correspondiente orientación con respecto a las cotizaciones, esto con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos para aprobación de la misma, a la fecha se encuentra pendiente la entrega de las cotizaciones por parte de la JAC. El día 03 de enero de 2025 mediante comunicado MVV-INVIAS-2024-013 se radica nuevamente para revisión de la Subdirección de Sostenibilidad la documentación correspondiente al Convenio 2408 – 2024 Corregimiento de Barrancas incluidas como lo indica el PGS la propuesta de la OPC con el cambio de las cotizaciones como había sido solicitado con antelación, se radica en esta fecha por cuanto fue en este momento cuando el Ingeniero Residente del Convenio por parte de la JAC hace entrega de las cotizaciones, se recibe como respuesta al radicado por parte de INVIAS el radicado 2025E-VUVRAZ-000782 emitido por INVIAS como evidencia de la entrega de los documentos. Teniendo en cuenta que se encuentra pendiente la emisión del documento de no objeción por parte de la Dirección de Sostenibilidad para dar inicio al desarrollo de la OPC de Barrancas se radica un comunicado MVV-INVIAS-2024-016 solicitando información al respecto, el día 28 de enero de 2025, como evidencia se

recibe el radicado por parte de INVIAS 2025E-VUVRAZ-010464. Se encuentra pendiente de respuesta.

5.3.1.7 CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA

Se dio finalizada con a la realización de las fichas de caracterización socioeconómica de los veintiocho (28) Convenios Solidarios, con las cuales se buscaba recolectar información de fuentes primarias, para identificar el contexto poblacional, económico y dinámicas comunitarias con el propósito de reconocer las necesidades y potencialidades del territorio. Posterior a la finalización de la actividad con cada uno de los proyectos se realizará el ingreso de la información al link de la entidad INVIAS.

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC: No aplica

5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS:

No aplica.

5.6 INFORMACION OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA

No aplica.

5.7 SEGUIMIENTO ESTADO DEL TRÁMITE CERTIFICACIÓN DE COMPATIBILIDAD DE LOS PLANOS CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (SIG) DE LA ENTIDAD.

No aplica.

6 REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO INTERVENTORIA

Se realizan visitas de campo para conocer los pormenores de la obra y tener el contacto directo con los lideres de la comunicad y se elabora el informe de la gestión social realizada en este periodo.

6.3 EQUIPO Y VEHICULOS CONTRATO INTERVENTORIA.

No se diligencia en el presente periodo, debido a que no se tiene defino en inventario vehicular disponible.

6.4 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Se diligencia el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL INT. El cual hace parte de la información documentada correspondiente al acta de Interventoría #2. Anexo 3.

6.5 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO INTERVENTORIA

Se diligencia el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. Anexo 4

6.6 SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

Se diligencia el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEG GARANTIAS INTERVENTORÍA. Anexo 5.

6.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15 SEGUIMIENTO PLAN CALIDAD INTERVENTORIA.

No aplica.

6.8 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO

No aplica.

6.9 PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACION AL PLAN DE CARGAS APROBADO

Se diligencia el Formato MEPI-MN1-IN-9-FR-2. Para el presente periodo, el documento aún está en proceso de modificación por parte del interventor.

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- En el periodo de enero, se integra la contratación de una mujer como parte del equipo y mano de obra de la placa huella haciendo referencia a de dar cumplimiento a los lineamientos de la entidad en relación a la inclusión.

- Desde de ámbito técnico, se e realizan pruebas de densidades el extendido y compactación de la subbase del tramo a intervenir. (K0+ 380, K0+ 560)

- Se continua con la revisión del corte y figurado del acero y los castillos de las vigas riostras y que estas mediciones cumplan con las especificaciones de la cartilla de obras menores de INVIAS.

- Se solicitaron las pruebas y los ensayos de laboratorios para la prueba de calidad del concreto y el análisis de las respectivas resistencias para la huella 21 MPa y 14 MPa.

- Desde el ámbito social, se realizó el seguimiento a la contratación del personal de la mano de obra no calificada para la ejecución de las obras.

- Se dio finalizada con a la realización de las fichas de caracterización socioeconómica de los veintiocho (28) Convenios Solidarios, con las cuales se buscaba recolectar información de fuentes primarias, para identificar el contexto poblacional, económico y dinámicas comunitarias con el propósito de reconocer las necesidades y potencialidades del territorio

- Con respecto a la Obra de Participación Comunitaria correspondiente al Convenio 2408 - 2024 suscrito con la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Barrancas, se radico la documentación en la página asignada para este fin atencionalciudadano@invias.gov

- Por último, el contratista ejecuta un avance 124 metros lineales de placa huella. El avance evidencia un porcentaje de avance del 73% físico en relación sobre los 170 metros objetivos.

8 ANEXOS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 9/01/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE BARRANCAS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALLE — SEMANA No.: 9 del 3-ene-25 al 9-ene-25 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS HERNAN LONDOÑO ESTRADA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: YIRA COPETE

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE BARRANCAS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de170,00 m de placa huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Longitud placa huella:170,00 m, Ancho placa huella:5,00 m, longitud de la huella: 3,0 m, longitud de la viga riostra: 5,00 m, alto de la viga riostra: 0.25 m, ancho viga riostra: 0.25 m, ancho cuneta con bordillo: 0.70 m, ancho cuneta placa: 0.55 m, ancho bordillo: 0.15 m. Espesor de placa huella 0,15 m. sobre ancho de 0,70 m

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE BARRANCAS			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER DA		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	DAIMCO S.A.S., BERAKAH INGENIERÍA S.A.S.		
CONTRATO No.	2408 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 216.404.793,00	CONTRATO No.	3780 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.146.992.897,00
FECHA DE INICIO:	08/30/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30/10/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 216.404.793,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 1.146.992.897,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215.404.793			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 72.831.964			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 142.572.829			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.146.992.897			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 31.356.132			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.115.636.765			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 216.404.793,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 73.878.451,00	34,14%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 72.831.964,00	33,66%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 1.046.487,00	0,48%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	N/A	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 73.878.451,00	34,14%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 72.831.964,00	33,66%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 1.046.487,00	0,48%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 73.878.451,00	34,14%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 72.831.964,00	33,66%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se realiza actividad de riego y compactacion de sub-base

ANTICIPOS	
Otorgado $	NA
Amortizado $	NA
Saldo $	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 31.356.132,00	2,73%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 31.356.132,00	2,73%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.083.000,00	0,70%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.583.000,00	1,10%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: dic-24
VALOR FACTURA: $ 35.105.000,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 40% — Avance o Atraso Físico %: -7%
Meta Física Ejecutada %: 33%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	K0+390; K0+560	N/A	N/A	Total	%
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5,51			Prog	5,51			5,51	100,00%
					Ejec	0			0	
Subbase Granular Clase C	M3	184			Prog	184			184	100,00%
	M3				Ejec	184			0	100,00%
* Concreto reforzado resistencia 21 MPa (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	99,42			Prog					
					Ejec					
* Concreto reforzado resistencia 14 MPa (Clase F) - 60% Concreto - 40% Piedra para placa huella	M3	43,8			Prog					
					Ejec					
* Acero de refuerzo de Fy = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4608,6			Prog	2258,214			4608,6	49,00%
					Ejec	1843,44			4608,6	40,00%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: K0+390; K0+560 — TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A
TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Cantera Bermejal. Municipio de Yumbo	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Titulo minero 18449.Cantera Bermejal. Municipio de Yumbo. Jorge Anibal Peña Rico, Titular licencia ambiental resolucion 0100 No. 0710-0618 de noviembre 10 de 2009

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO		N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO		N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A	x
EMISIONES:	SI	NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A	x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	1
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO: CASA 144

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizaron, pruebas de densidades en el tramo a intervenir.
Se realiza corte y figurado de aceros de refuerzo para placa huella.
Se recibieron en obra, la grava, arena, cemento y roca de canto rodado, para la fabricación de concreto de 3000 PSI y concreto ciclopedo.
Se entregaron EPP a personal que realiza actividades en obra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se instalarán elementos de señalización en el tramo de la vía a intervenir.
Se iniciará con el proceso de armado de formaleta, para vaciado de concreto de placa huella, se proyecta fundir 30 ml diarios de vía.
Se realizarán las excavaciones, para las vigas de la vía.
Se enviará a laboratorio muestras de arena, para hacer generar un informe de la misma, muestra.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



K0+390



K0+450



K0+560

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Se realizará la verificación de la entrega de los elementos de protección personal EPP a los miembros de la obra.
Se realizará la verificación del corte figurado del acero cumplan con las dimensiones y las especificaciones técnicas contempladas de la cartilla de obra menores INVIAS.
Se verificará que el tramo de la vía este debidamente señalizada con el aviso del cierre total / parcial de la vía, evitando así contratiempos y accidentes en obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: PABLO ORDOÑEZ BOLAÑOS
Matrícula Profesional No.: 5220254323 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 16/01/2025 (Día / Mes / Año)

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE BARRANCAS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALLE | SEMANA No.: 10 del 10-ene-25 al 16-ene-25 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS HERNAN LONDOÑO ESTRADA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: YIRA COPETE

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE BARRANCAS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de170,00 m de placa huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Longitud placa huella:170,00 m, Ancho placa huella:5,00 m, longitud de la huella: 3,0 m, longitud de la viga riostra: 5,00 m, alto de la viga riostra: 0.25 m, ancho viga riostra: 0.25 m, ancho cuneta con bordillo: 0.70 m, ancho cuneta placa: 0.55 m, ancho bordillo: 0.15 m. Espesor de placa huella 0,15 m. sobre ancho de 0,70 m

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE BARRANCAS		INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER DA	
INTEGRANTES:			INTEGRANTES:	DAIMCO S.A.S., BERAKAH INGENIERÍA S.A.S.	
CONTRATO No.	2408 de 2024	VALOR INICIAL: $ 216.404.793,00	CONTRATO No.	3780 DE 2024	VALOR INICIAL: $ 1.146.992.897,00
FECHA DE INICIO:	08/30/2024	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	30/10/2024	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO: $ 216.404.793,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO: $ 1.146.992.897,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO: $ -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215.404.793			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 76.553.964			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 138.850.829			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.146.992.897			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 5.134.132			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.141.858.765			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 216.404.793,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 90.916.997,00	42,01%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 76.553.964,00	35,38%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 14.363.033,00	6,64%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	N/A	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 90.916.997,00	42,01%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 76.553.964,00	35,38%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 14.363.033,00	6,64%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 90.916.997,00	42,01%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 76.553.964,00	35,38%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se realiza actividad de riego y compactacion de sub-base

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 5.134.132,00	0,45%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 5.134.132,00	0,45%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.083.000,00	0,70%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.583.000,00	1,10%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: dic-24
VALOR FACTURA: $ 35.105.000,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	NA
Amortizado $	NA
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 52%
Meta Física Ejecutada %: 51%
Avance o Atraso Físico %: -1%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	K0+390; K0+560	N/A	N/A	Total	%
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5,51			Prog	5,51			5,51	100,00%
					Ejec	0			0	
Subbase Granular Clase C	M3	184			Prog	184			184	100,00%
	M3				Ejec	184			0	100,00%
* Concreto reforzado resistencia 21 MPa (Clase D) -	M3	99,42			Prog	51,6			51,60	51,90%
					Ejec	50,5			50,50	50,79%
* Concreto reforzado resistencia 14 MPa (Clase F) - 60% Concreto - 40% Piedra para placa huella	M3	43,8			Prog	22,6			22,60	51,60%
					Ejec	20,8			20,80	47,49%
* Acero de refuerzo de Fy = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4608,6			Prog	2903,418			4608,6	63,00%
					Ejec	4147,74			4608,6	90,00%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: K0+390; K0+560
TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A
TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Concretadora	1	1
vibradores	1	1
Total		2

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Cantera Bermejal. Municipio de Yumbo	PERMISO MINERO:	SI	x	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Titulo minero 18449.Cantera Bermejal. Municipio de Yumbo. Jorge Anibal Peña Rico, Titular licencia ambiental resolucion 0100 No. 0710-0618 de noviembre 10 de 2009

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	x
EMISIONES:	SI		NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	17	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	13	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	1
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 23

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: CASA 144

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se recibieron en obra, la grava, arena, cemento y roca de canto rodado, para la fabricación de concreto de 3000 PSI y concreto ciclopedo.
Se entregaron EPP a personal que realiza actividades en obra.
Se realizaron fundiciones de 39 ml de placa huella, al momento de este informe se tiene desde la abs k0+560 hasta la abs k0+521

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se instalarán elementos de señalización en el tramo de la vía a intervenir.
Se iniciará con el proceso de armado de formaleta, para vaciado de concreto de placa huella, se proyecta fundir 26 ml cada cuatro días de vía.
Se realizarán las excavaciones, para las vigas de la vía.
Se enviará a laboratorio muestras de concreto, para validar la resistencia del concreto.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



87,6
16/01/2025

TRAMO FUNDIDO
TRAMO EN FORMALETA
TRAMO EN SUBBASE

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



K0+390



K0+450



K0+560

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Se realizará la verificación de la entrega de los elementos de protección personal EPP a los miembros de la obra.
Se verificará que el tramo de la vía este debidamente señalizada con el aviso del cierre total / parcial de la vía, evitando así contratiempos y accidentes en obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: PABLO ORDOÑEZ SOLAÑOS
Matrícula Profesional No.: 5220254323 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	1

FECHA: 16/01/2025 (Día / Mes / Año)

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE BARRANCAS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALLE — SEMANA No.: 11 del 17-ene-25 al 22-ene-25 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS HERNAN LONDOÑO ESTRADA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: YIRA COPETE

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE BARRANCAS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de170,00 m de placa huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Longitud placa huella:170,00 m, Ancho placa huella:4,40 m, longitud de la huella: 3,0 m, longitud de la viga riostra: 4,40 m, alto de la viga riostra: 0.25 m, ancho viga riostra: 0.25 m, ancho cuneta con bordillo: 0.63 m, ancho cuneta placa: 0.48 m, ancho bordillo: 0.15 m. Espesor de placa huella 0,15 m. sobre ancho de 0,70 m

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE BARRANCAS		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	2408 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 216.404.793,00
FECHA DE INICIO:	08/30/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 216.404.793,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER DA		
INTEGRANTES:	DAIMCO S.A.S., BERAKAH INGENIERÍA S.A.S.		
CONTRATO No.	3780 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.146.992.897,00
FECHA DE INICIO:	30/10/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 1.146.992.897,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/03/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215.404.793			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 76.553.964			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 138.850.829			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.146.992.897			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 35.105.080			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.080.683.784			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 216.404.793,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 163.916.997,00	75,75%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 156.553.964,00	72,34%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 7.363.033,00	3,40%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	N/A	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 163.916.997,00	75,75%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 156.553.964,00	72,34%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 7.363.033,00	3,40%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 73.000.000,00	33,73%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 80.000.000,00	36,97%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se realiza actividad de riego y compactacion de sub-base

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 66.258.212,00	5,78%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 66.258.212,00	5,78%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.083.000,00	0,70%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.983.000,00	1,13%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: diciembre
VALOR FACTURA: $ 35.105.080,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	NA
Amortizado $	NA
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 52% — Avance o Atraso Físico % -1%
Meta Física Ejecutada % 51%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	K0+390; K0+560	N/A	N/A	Total	%
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5,51			Prog	5,51			5,51	100,00%
					Ejec	0			0	
Subbase Granular Clase C	M3	184			Prog	184			184	100,00%
	M3				Ejec	184			184	100,00%
* Concreto reforzado resistencia 21 MPa (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	99,42			Prog	75			75	75,44%
					Ejec	73,5			73,5	73,93%
* Concreto reforzado resistencia 14 MPa (Clase F) - Concreto 60% Piedra 40% para placa huella	M3	43,8			Prog	33			33	75,34%
					Ejec	32			32	73,06%
* Acero de refuerzo de Fy = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4608,6			Prog	4608,6			4608,6	100,00%
					Ejec	4608,6			4608,6	100,00%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: K0+390; K0+560
TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A
TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Concretadora	1	1
vibradores	1	1
Total		2

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN: Marteriales Ferreteria en Palmira	PERMISO MINERO:	SI	x	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Titulo minero 18449.Cantera Bermejal. Municipio de Yumbo. Jorge Anibal Peña Rico, Titular licencia ambiental resolucion 0100 No. 0710-0618 de noviembre 10 de 2009

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	x
EMISIONES:	SI		NO	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	17	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	13	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	1
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 23

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: CASA 144

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizo la verificación de las pruebas de densidades a la sub base instalada con un requerimiento minino de compactación del 97%.
Se realiza la verificación del proceso constructivo de la placa huela k0+560 - k0+463, corte figurado, castillos, formaletas, vigas riostras y dosificación del concreto de acuerdo a especificaciones Se recibieron en obra, la grava, arena, cemento y roca de canto rodado, para la fabricación de concreto de 3000 PSI y concreto ciclopedo. e realizaron fundiciones de 103 ml de placa huella, al momento de este informe se tiene desde la abs k0+560 hasta la abs k0+463

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizará la verificación de los certificados de calidad de los materiales (agregados / insumos) correspondientes.
Se iniciará con el proceso de armado de formaleta, para vaciado de concreto de placa huella, se proyecta fundir 26 ml cada cuatro días de vía.
Se realizarán las excavaciones, para las vigas de la vía.
Se enviará a laboratorio muestras de concreto, para validar la resistencia del concreto.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



TRAMO FUNDIDO
TRAMO EN FORMALETA
TRAMO EN SUBBASE

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



K0+390



K0+450



K0+560

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Seguimiento a la programación: avance de obra y avance financiero.
Se realizará acompañamiento y verificación al ejecutor en el proceso constructivo de formaleta, castillos y fundidas de la placa huella de acuerdo a especificaciones.
Se solicitará pruebas de ensayos de laboratorios para el análisis de las respectivas resistencias del concreto, para la huella 21 MPa Y 14 MPa para el ciclopedo.
Se verificará que los insumos cumplan con su correspondiente control calidad.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: PABLO ORDOÑEZ BOLAÑOS

Matrícula Profesional No.: 5220254323 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MIN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	1

FECHA: 29/01/2025 (Día / Mes / Año)

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE BARRANCAS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALLE | SEMANA No.: 12 del 23-ene-25 al 29-ene-25 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS HERNAN LONDOÑO ESTRADA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: YIRA COPETE

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE BARRANCAS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción de170,00 m de placa huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Longitud placa huella:170,00 m, Ancho placa huella:5,00 m, longitud de la huella: 3,0 m, longitud de la viga riostra: 5,00 m, alto de la viga riostra: 0.25 m, ancho viga riostra: 0.25 m, ancho cuneta con bordillo: 0.70 m, ancho cuneta placa: 0.55 m, ancho bordillo: 0.15 m. Espesor de placa huella 0,15 m. sobre ancho de 0,70 m

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE BARRANCAS		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	2408 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 216.404.793,00
FECHA DE INICIO:	08/30/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 216.404.793,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER DA		
INTEGRANTES:	DAIMCO S.A.S., BERAKAH INGENIERÍA S.A.S.		
CONTRATO No.	3780 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.146.992.897,00
FECHA DE INICIO:	30/10/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 1.146.992.897,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215.404.793			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 76.553.964			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 138.850.829			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.146.992.897			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 35.105.080			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.080.683.784			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 216.404.793,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 194.994.090,00	90,11%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 190.553.964,00	88,05%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 4.440.126,00	2,05%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	N/A	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 194.994.090,00	90,11%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 190.553.964,00	88,05%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 4.440.126,00	2,05%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 31.077.093,00	14,36%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 34.000.000,00	15,71%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se realiza la activida de construcción de placa huella en 24 ml

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 66.258.212,00	5,78%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 66.258.212,00	5,78%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.083.000,00	0,70%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.983.000,00	1,13%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: diciembre
VALOR FACTURA: $ 35.105.080,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	NA
Amortizado $	NA
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 73% | Avance o Atraso Físico %: -1%
Meta Física Ejecutada %: 73%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	K0+390; K0+560	N/A	N/A	Total	%
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5,51			Prog	5,51			5,51	100,00%
					Ejec	0			0	
Subbase Granular Clase C	M3	184			Prog	184			184	100,00%
	M3				Ejec	184			184	100,00%
* Concreto reforzado resistencia 21 MPa (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	99,42			Prog	91			91	91,53%
					Ejec	89			89	89,52%
* Concreto reforzado resistencia 14 MPa (Clase F) - Concreto 60% Piedra 40% para placa huella	M3	43,8			Prog	39			39	89,04%
					Ejec	38			38	86,76%
* Acero de refuerzo de Fy = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4608,6			Prog	4608,6			4608,6	100,00%
					Ejec	4608,6			4608,6	100,00%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Concretadora	1	1
vibradores	1	1
Total		2

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: K0+380; K0+560
TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A
TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN: Cantera Bermejal. Municipio de Yumbo para la Subabse	PERMISO MINERO:	SI x NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI x NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO

OBSERVACIONES: Titulo minero 18449.Cantera Bermejal. Municipio de Yumbo. Jorge Anibal Peña Rico, Titular licencia ambiental resolucion 0100 No. 0710-0618 de noviembre 10 de 2009. Resultados d elaboratorio de pruebas de calidad del concreto

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	x
EMISIONES:	SI		NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	17	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	13	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	1
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 23

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: CASA 144

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizo la verificación de las pruebas de densidades a la sub base instalada con un requerimiento minino de compactación del 97% cumpliendo con el requerimiento minimo.
Se realiza la verificación del proceso constructivo de la placa huela k0+560 - k0+406, corte figurado, castillos, formaletas, vigas riostras y dosificación del concreto de acuerdo a especificaciones Se recibieron en obra, la grava, arena, cemento y roca de canto rodado, para la fabricación de concreto de 3000 PSI y concreto ciclopedo. e realizaron fundiciones de 154 ml de placa huella, al momento de este informe se tiene desde la abs k0+560 hasta la abs k0+406

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizará la verificación de los certificados de calidad de los materiales (agregados / insumos) correspondientes.
Se iniciará con el proceso de armado de formaleta, para vaciado de concreto de placa huella, se proyecta fundir 26 ml cada cuatro días de vía.
Se realizarán las excavaciones, para las vigas de la vía.
Se enviará a laboratorio muestras de concreto, para validar la resistencia del concreto.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



TRAMO FUNDIDO
TRAMO EN FORMALETA
TRAMO EN SUBBASE

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



K0+390



K0+450



K0+560

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Seguimiento a la programación: avance de obra y avance financiero.
Se realizará acompañamiento y verificación al ejecutor en el proceso constructivo de formaleta, castillos y fundidas de la placa huella de acuerdo a especificaciones de la cartilla de obras menores.
Se solicitará pruebas de ensayos de laboratorios para el análisis de calidad del concreto y las resistencias del concreto ciclopeo (14 MPa) y para la placa huella (21 MPa) respectivamente.
Se verificará que los insumos cumplan con su correspondiente control calidad.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: PABLO ORDOÑEZ BOLAÑOS
Matrícula Profesional No.: 5220254323 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31-ene (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: ene-25 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE BARRANCAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 2408 DE 2024 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE BARRANCAS

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 3780 de 2024 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO INTERDA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CONCRETADORA	4 TIEMPOS, TIPO	100 KG	VEREDA BARRANCAS	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VIBRADOR DE CONCRETO	JCB-VIBROMAX	VMT260	VEREDA BARRANCAS	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CORTA METAL	DEWALT	-	VEREDA BARRANCAS	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
TOTAL ACTIVO				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	3	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	N/A	N/A
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	N/A	N/A

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: LOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN EN TODO EL PERIODO EN FUNCIONAMIENTO Y NO PRESENTA FALLA ALGUNA

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: CARLOS BARACALDO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 17202-245386 CLD

Firma

Nombre: Pablo Ordoñez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202 - 54323 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 de enero 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALLE

CONTRATO DE OBRA No: 2408 de 2024

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE BARRANCAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: diembre 2024

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE BARRANCAS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3780 de 2024

INTERVENTOR: INTERDA

NOMBRE ARL: SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	Carlos Alberto Baracaldo		Ingeniero Residente	$ 3.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Junta de accion comunal		sura	V	Sanitas	9480207919	$ 113.800	Colpensiones	9480207919	$ 145.600	$ 45.500			
2	Yorlady Medina	1113671161	Contadora	$ 2.800.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Junta de accion comunal		sura	I	Sanitas	478392698	$ 162.500	Porvenir	478392698	$ 208.000				
3	Luis Eduardo quitero Henao	1116373139	Ayudante	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Junta de accion comunal		sura	V	SOS	9480207919	$ 10.900	Proteccion	9480207919	$ 13.900	$ 4.500			
4	Clemente zalazar pareja	16512380	Ayudante	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Junta de accion comunal		sura	V	SOS	9480207919	$ 10.900	Proteccion	9480207919	$ 13.900	$ 4.500			
5	Wilmer caldon	10293869	Ayudante	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Junta de accion comunal		sura	V	Nueva Eps	9480207919	$ 10.900	Porvenir	9480207919	$ 13.900	$ 4.500			
6	Jhon Frey soto Burbano	11	Ayudante	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Junta de accion comunal		sura	V	Nueva Eps	9480207919	$ 10.900	Porvenir	9480207919	$ 13.900	$ 4.500			
7	Luis Eduardo quitero Henao	1116373139	Ayudante	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Junta de accion comunal		sura	V	Nueva Eps	9480207919	$ 10.900	Porvenir	9480207919	$ 13.900	$ 4.500			
8	Clemente zalazar pareja	16512380	Ayudante	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Junta de accion comunal		sura	V	Nueva Eps	9480207919	$ 10.900	Porvenir	9480207919	$ 13.900	$ 4.500			
9	Jhon fredy soto burbano	1113666555	Ayudante	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Junta de accion comunal		sura	V	Nueva Eps	9480207919	$ 10.900	Porvenir	9480207919	$ 13.900	$ 4.500			
10	Jhon esteban bermudes	1006342792	Ayudante	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Junta de accion comunal		sura	V	Nueva Eps	9480207919	$ 10.900	Porvenir	9480207919	$ 13.900	$ 4.500			
11	Kevin alberto balanta	10066308818	Ayudante	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Junta de accion comunal		sura	V	Nueva Eps	9480207919	$ 10.900	Porvenir	9480207919	$ 13.900	$ 4.500			
12	Jhon Edwar Obando	1113978909	Ayudante	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Junta de accion comunal		sura	V	Nueva Eps	9480207919	$ 10.900	Porvenir	9480207919	$ 13.900	$ 4.500			
13	Lucia sosa salgado	1116913008	Ayudante	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Junta de accion comunal		sura	V	Nueva Eps	9480207919	$ 10.900	Porvenir	9480207919	$ 13.900	$ 4.500			
14	Luis hidalgo Veliz																		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma _____

Julian Martinez
1.113.659.500

Nombre: Julian Martinez
Representante Legal OAC de Barrancas
Cedula No. 1,113,659,500

Firma _____

Pablo Ordoñez

Nombre: Pablo Ordoñez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202 - 54323 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31-ene-25 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE

CONTRATO DE OBRA No: 2408 de 2024 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE BARRANCAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ene-25 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE BARRANCAS DEL MUNICIPIO DE DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3780 de 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTER DA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	22	24	21	24	20	20	24	24	731
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**	0	**2**	0	0	0	**4**	0	0	0	0	**4**	0	0	2	0	**3**	0	0	1	0	0	21
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	15
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre: CARLOS BARACALDO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 17202-245386 CLD

Firma

Nombre: Pablo Ordoñez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202 - 54323 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 30/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE

CONTRATO DE OBRA No.: 2408 de 2024 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE BARRANCAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01/30/2025 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3780 DE 2024 **INTERVENTOR:** INTERDA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1A	01/15/2025	Ensayo a comprension	(NTC-673/2010)	Vereda Barrancas	1	21MPa	18,2	SI	7 dias de edad
1B	01/15/2025	Ensayo a comprension	(NTC-673/2010)	Vereda Barrancas	1	21MPa	17,2	SI	7 dias de edad
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

Teniendo en cuenta que de el rangoa superar es de 21 Mpa a lso 28 dias que alcancza su resistecia maxima, los resultados muestran una resitencia a comprension de 18.2 a 7 dias de edad. Es un rango acptable para pa edad que presenta es decir es al tercera parte de la edad que debe desarrrollar .Quedan pendientes los restados a 28 dias de edad.

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.

2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio

Firma

Nombre: CARLOS BARACALDO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 17202-245386 CLD

Firma

Nombre: Pablo Ordoñez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202 - 54323 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO GARANTÌAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Valle

CONTRATO DE OBRA No. 2408-2024 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE BARRANCAS

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE BARRANCAS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 20/11/2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/03/2025
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: 216.404.793

VALOR ACUMULADO: 216.404.793
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N/A

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3780- 2024 **INTERVENTOR:** CONCSORCIO INTERDA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 75.741.679,00	16	7	2024	31/12/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		N/A	Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños		N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra		N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100334306

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100334306 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: N/A
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 75.741.679,00	16	7	2024	31/12/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		N/A	Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños		N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra		N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100334306

Certificado de modificación o anexo No.: N/A
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260,000000	16	7	2024	31	12	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100334306 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No. N/A
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Pablo Ordoñez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 5220254323 NRN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALLE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3780 DE 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER DA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ene-25

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 8

CONTRATO DE OBRA No.: 2408 - 2024

CONTRATISTA: CONVENIOS INVIAS-OAC- PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - CONSORCIO BARRANCAS

NOMBRE ARL: AXXA COLPATRIA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMPENSAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	oct-24																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indica Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	Pablo Ordoñez Bolaños	12.981.089	Director de Interventoria	$ 6.900.000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CONSORCIO INTER DA	$ 6.900.000	$ 480.240	V	SANITAS	9481697569	$ 862.500	COLPENSIONES	9481697569	$ 1.104.000	$ 276.000	$ -	$ -	
2	SANDRA LILIANA PIANDA MEJIA	59.821.382	Profesional Social	$ 3.800.000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CONSORCIO INTER DA	$ 3.800.000	$ 264.480	V	SANITAS	9481697569	$ 475.000	COLPENSIONES	9481697569	$ 608.000	$ 152.000	$ -	$ -	
3	WILFREDO SEGUNDO ACUÑA	7.604.194	Ing. Auxiliar	$ 3.000.000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CONSORCIO INTER DA	$ 3.000.000	$ 208.800	V	SURA	9481697569	$ 375.000	COLPENSIONES	9481697569	$ 480.000	$ 120.000	$ -	$ -	
4	JULIO CESAR CABRERA GUERRERO	98.396.987	Ing, Residente	$ 5.100.000							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CONSORCIO INTER DA	$ 4.080.000	$ 283.968	V	SURA	9481697569	$ 510.000	COLFONDOS	9481697569	$ 652.800	$ 163.200	$ -	$ -	
5																																				$ -	V			$ -		0	$ -	$ -	$ -	$ -	
6																																				$ -	V			$ -		0	$ -	$ -	$ -	$ -	
7																																				$ -	V			$ -		0	$ -	$ -	$ -	$ -	
8																																				$ -	V			$ -		0	$ -	$ -	$ -	$ -	
9																																				$ -	V			$ -		0	$ -	$ -	$ -	$ -	
10																																				$ -	V			$ -		0	$ -	$ -	$ -	$ -	
11																																												$ -		
12																																												$ -		
13																																												$ -		
14																																												$ -		
15																																												$ -		
16																																												$ -		
17																																												$ -		
18																																												$ -		
19																																												$ -		
20																																												$ -		
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 18.800.000																																								

El Interventor adjunta la certificación de fecha 1/11/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con una X a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JOSE VICENTE BOCANEGRA GARCÍA
Representante Legal o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 13202-45616 BLV

Firma
SUPERVISOR DEL CONTRATO
Nombre: CARLOS HERNÁN LONDOÑO ESTRADA
Matrícula Profesional No.: 76202-21967 VLL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901863475	6	CONSORCIO INTER DA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 43B N85 76	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3393035	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1266166239	9481697569	E	2025/02/18	2025/02/14	BANCOLOMBIA	0	$7,340,650

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: 910009 (1 Afiliados)																							$5,500,001	$667,500			$5,500,001	$7,400			$5,500,001	$7,400			$5,500,001		$12,800		$0	$0		$695,100
Centro de Trabajo: 910009 (1 Afiliados)																							$5,500,001	$667,500			$5,500,001	$7,400			$5,500,001	$7,400			$5,500,001		$12,800		$0	$0		$695,100
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)																							$5,500,001	$667,500			$5,500,001	$7,400			$5,500,001	$7,400			$5,500,001		$12,800		$0	$0		$695,100
1	CC	9092134	JIMENEZ MARTINEZ WILLIAM																		25-14	1	$183,334	$29,400	EPS037	1	$183,334	$7,400	CCF09	1	$183,334	$7,400	14-4	1	$183,334	6.960%	$12,800	1	$0	$0	Si	$57,000
2	CC	9092134	JIMENEZ MARTINEZ WILLIAM										X								25-14	29	$5,316,667	$638,100	EPS037	29	$5,316,667	$0	CCF09	29	$5,316,667	$0	14-4	29	$5,316,667	0.000%	$0	29	$0	$0	Si	$638,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: 910010 (4 Afiliados)																							$17,780,000	$2,844,800			$17,780,000	$2,222,500			$17,780,000	$711,200			$17,780,000		$1,237,488		$0	$0		$7,015,988
Centro de Trabajo: 910010 (4 Afiliados)																							$ 17,780,000	$2,844,800			$ 17,780,000	$2,222,500			$ 17,780,000	$711,200			$ 17,780,000		$1,237,488		$0	$0		$7,015,988
Ciudad: CALI Depto: VALLE (4 Afiliados)																							$17,780,000	$2,844,800			$17,780,000	$2,222,500			$17,780,000	$711,200			$17,780,000		$1,237,488		$0	$0		$7,015,988
3	CC	7604194	ACUÑA VALLE WILFRIDO SEGUNDO																		25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$375,000	CCF57	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	Si	$1,183,800
4	CC	98396987	CABRERA GUERRERO JULIO CESAR	X																	23100 1	24	$4,080,000	$652,800	EPS010	24	$4,080,000	$510,000	CCF57	24	$4,080,000	$163,200	14-4	24	$4,080,000	6.960%	$283,968	24	$0	$0	Si	$1,609,968
5	CC	12981089	ORDOÑEZ BOLAÑOS PABLO																		25-14	30	$6,900,000	$1,104,000	EPS005	30	$6,900,000	$862,500	CCF57	30	$6,900,000	$276,000	14-4	30	$6,900,000	6.960%	$480,240	30	$0	$0	Si	$2,722,740
6	CC	59821382	PIANDA MEJIA SANDRA LILIANA																		25-14	30	$3,800,000	$608,000	EPS005	30	$3,800,000	$475,000	CCF57	30	$3,800,000	$152,000	14-4	30	3,800,000	6.960%	$264,480	30	$0	$0	Si	$1,499,480
Total			**Afiliados(5)**																				$23,096,667	$3,482,900			$23,096,667	$2,229,900			$23,096,667	$718.600			$23,096,667		$1,250,288		$0	$0		$7,654,088

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901863475	6	CONSORCIO INTER DA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 43B N85 76	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3393035	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1266166239	9481697569	E	2025/02/18	2025/02/14	BANCOLOMBIA	0	$7,340,650

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$3,482,900	$0	$0	$3,482,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$652,800	$0	$0	$652,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$2,830,100	$0	$0	$2,830,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$1,237,488	$0	$0	$1,237,488
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	5	$1,237,488	$0	$0	$1,237,488
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$718,600	$0	$0	$718,600
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	1	$7,400	$0	$0	$7,400
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	4	$711,200	$0	$0	$711,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$2,229,900	$0	$0	$2,229,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$510,000	$0	$0	$510,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$382,400	$0	$0	$382,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$1,337,500	$0	$0	$1,337,500
TOTAL				5	$7,654,088	$0	$0	$7,654,088

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: ENE - 25 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3780 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTER DA

MES INFORME MENSUAL: ene-25 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 8

CONTRATO DE OBRA No: LOTE 8 **CONTRATISTA:** CONVENIOS INVIAS-OAC- PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 8

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	valor utilizado	saldo anterior
2024	957024	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCIÓN DE VÍAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCIARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERÓDROMOS	10	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 1.146.992.897	$ 66.309.132,4	$ 1.080.683.764,60

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.146.992.897**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	**oct-24**	$ -	$ -	$ -	**0**	**0**	**0**	133524 DE 2024	$ 1.146.992.897,00	$ 1.146.992.897,00		
2	**nov-24**	$ 26.221.960	$ 4.982.172,40	$ 31.204.132,40		**$ 31.204.132,40**	**0**		$ 1.115.788.764,60	$ 1.115.788.764,60		
3	**dic-24**	$ 29.500.000	$ 5.605.000,00	$ 35.105.000,00		**$ 35.105.000,00**	**0**		$ 1.080.683.764,60	$ 1.080.683.764,60		
4	**ene-25**	$ 48.425.171,01	$ 9.200.782,00	$ 57.625.953,01		**$ 57.625.953,01**			$ 1.023.057.811,59	$ 1.023.057.811,59		
TOTALES		**$ 104.147.131**,01	**$ 19.787.954**,40	**$ 123.935.085**,41	**$ -**	**$ 123.935.085**,41	**$ -**	**$ -**	**$ 1.023.057.81**1,59	**$ 1.023.057.81**1,59		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 104.147.131,01	$ 19.787.954,40	$ 123.935.085,41
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
*			
VALOR TOTAL	$ 104.147.131,01	$ 19.787.954,40	$ 123.935.085,41

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: JOSE VICENTE BOCANEGRA GARCÍA
Representante Legal o su Apoderado
Matrícula No.: 13202-45616 BLV

Firma
Nombre: CARLOS HERNÁN LONDOÑO ESTRADA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 76202-21967 VLL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	26/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION DE VIAS REGIONALES — VALLE — **No.** ____
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3780 - 2024
PLAZO INICIAL: 31/12/2024 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 6 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 8

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 30/10/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER DA
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.146.992.896,63 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS HERNAN LONDOÑO ESTRADA
RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar día/mes/año)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.146.992.896,63

CONVENIO No. LOTE 8
CONTRATISTA: MUNICIPIOS VALLE DEL CAUCA - LOTE 8

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				2024						2025						TOTAL	
							OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO			
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		Director de Interventoria	$ 6.900.000,00		4,00	$ 27.600.000,00	0,00	$ -	0,80	$ 5.520.000,00	1,00	$ 6.900.000,00	1,00	$ 6.900.000,00	0,60	$ 6.900.000,00	0,80	$ 6.900.000,00	4,000	$ 33.120.000,00
		Ingeniero Residente de Interventoria	$ 5.100.000,00		4,00	$ 20.400.000,00	0,00	$ -	0,53	$ 2.703.000,00		$ -	1,00	$ 5.100.000,00	1,00	$ 5.100.000,00	1,00	$ 5.100.000,00	3,530	$ 18.003.000,00
		Ingeniero Auxiliar de Interventoria y alistamiento	$ 3.000.000,00		8,00	$ 24.000.000,00	0,00	$ -		$ -	0,60	$ 1.800.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	2,00	$ 6.000.000,00	2,00	$ 6.000.000,00	5,600	$ 16.800.000,00
		Profesional Financiero	$ 3.800.000,00		4,00	$ 15.200.000,00	0,00	$ -		$ -		$ -	0,70	$ 2.660.000,00	1,00	$ 3.800.000,00	1,00	$ 3.800.000,00	2,700	$ 10.260.000,00
		Profesional Ambiental	$ 3.800.000,00		6,00	$ 22.800.000,00	0,00	$ -		$ -		$ -	0,70	$ 2.660.000,00	1,00	$ 3.800.000,00	1,00	$ 3.800.000,00	2,700	$ 10.260.000,00
		Profesional Social	$ 3.800.000,00		3,50	$ 13.300.000,00	0,00	$ -	0,76	$ 2.888.000,00	1,00	$ 3.800.000,00	1,00	$ 3.800.000,00	1,00	$ 3.800.000,00	1,00	$ 3.800.000,00	4,760	$ 18.088.000,00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (confirman esta bolsa los especialistas de amarillo)				$ 29.106.667,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,000	$ -
		PERSONAL TÉCNICO																		
		Inspector SST	$ 2.300.000,00		7,00	$ 16.100.000,00	0,00	$ -		$ -		$ -	1,00	$ 2.300.000,00	2,00	$ 4.600.000,00	2,00	$ 4.600.000,00	5,000	$ 11.500.000,00
		Inspector	$ 2.000.000,00		63,00	$ 126.000.000,00	0,00	$ -		$ -		$ -	13,00	$ 26.000.000,00	25,00	$ 50.000.000,00	25,00	$ 50.000.000,00	63,000	$ 126.000.000,00
		Apoyo Social	$ 2.300.000,00		7,00	$ 16.100.000,00	0,00	$ -		$ -		$ -	2,00	$ 4.600.000,00	2,00	$ 4.600.000,00	2,00	$ 4.600.000,00	6,000	$ 13.800.000,00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO																		
		Tecnico Administrativo	$ 1.400.000,00		4,00	$ 5.600.000,00	0,00	$ -		$ -		$ -	1,00	$ 1.400.000,00	1,00	$ 1.400.000,00	1,00	$ 1.400.000,00	3,000	$ 4.200.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 316.206.667	$ -		$ 11.111.000,00		$ 12.500.000,00		$ 58.420.000,00		$ 90.000.000,00		$ 90.000.000,00		$ 262.031.000	
FACTOR MULTIPLICADOR						2,36	2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36	
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 746.247.734	$ 26.221.960,0		$ 26.221.960,0		$ 29.500.000,0		$ 137.871.200,0		$ 212.400.000,0		$ 212.400.000,0		$ 618.393.160	

GRUPO 2 COSTO VARIABLE

No. de Orden	Cantidad	CARGO / COSTO VARIABLE	Unidad	% PAGO SOBRE COSTOS VARIABLES (A1)	VALOR TOTAL PAGO POR COSTOS VARIABLES (A2)	2024												TOTAL	
						MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6			
							VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS VARIABLES: El pago de costos variables, se realizara en concordancia con los avances físicos de obra establecidos en el informe mensual, previa aprobación del Supervisor de contrato de Interventoria.	SEGÚN AVANCE DE OBRA	100,00	$ 186.561.934														
		Avance de obra No (...) N		100,00	$ 186.561.934		$ -		$ 800.000,00	0	$ 11.500.000		$ 18.500.000		$ 55.800.000		$ 37.200.000	0,66	$ 123.800.000,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOSVARIABLE = SUMATORIA DE (B) + (B)			$ 186.561.934	$ -		$ 800.000		$ 11.500.000		$ 18.500.000		$ 55.800.000		$ 37.200.000		$ 123.800.000	
		SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) + (C)			$ 932.809.668	$ -		$ 27.021.960		$ 41.000.000		$ 156.371.200		$ 268.200.000		$ 249.600.000		$ 742.193.160	
		VEEDURIA TÉCNICA CIUDADANA (Gastos reembolsables) = (D)			$ 1.200.000					$ -		$ 300.000		$ 600.000		$ 300.000		$ 1.200.000	
		PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (E)			$ 29.849.909					$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
		PSUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) + (E) = (F)			$ 963.859.577	$ -		$ 27.021.960		$ 41.000.000		$ 156.671.200		$ 268.800.000		$ 249.900.000		$ 743.393.160	
		IVA = 19% * (F) = (G)			$ 183.133.320	$ -		$ 5.134.172		$ 7.790.000		$ 29.767.528		$ 51.072.000		$ 47.481.000		$ 141.244.700	
		COSTO TOTAL = (F) + (G)			$ 1.146.992.897,00	$ -		$ 32.156.132		$ 48.790.000		$ 186.438.728		$ 319.872.000		$ 297.381.000		$ 884.637.860	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS	

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
Se presenta el plan de cargas inicial el contrato de interventoria teniendo en como base la condiciones iniciales según la propuesta economica aprobada (dedicaciones recursos establecidos en la propuesta).

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoria.

4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.

5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma
Nombre: **JOSE VICENTE BOCANEGRA**
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 13202-45616BLV

Firma:
Nombre: CARLOS HERNAN LONDOÑO ESTRADA
Supervisor de Contrato de Interventoria
Matrícula Profesional No.: 7602-21967VLL
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

8.2 REGISTRO FOTOGRAFICO














13/01/2025 14:58:13
#Vereda Barrancas


15/01/2025 16:49:19
Vía Sin Nombre
Palmira
Valle del Cauca
#Vereda Barrancas


16/01/2025 17:00:18
Palmira 763538
Colombia
#Vereda Barrancas


16/01/2025 11:50:59
Barrancas, Palmira 763538
Colombia
#Vereda Barrancas




18/01/2025 11:33:50
Palmira 763538
Colombia
#Vereda Barrancas


24/01/2025 15:14:51
Palmira 763538
Colombia
#Vereda Barrancas



24/01/2025 17:37:41
Palmira 763538
Colombia
#Vereda Barrancas


25/01/2025 10:28:43
Palmira 763538
Colombia
#Vereda Barrancas


25/01/2025 10:31:47
#Vereda Barrancas


28/01/2025 14:08:25
#Vereda Barrancas


29/01/2025 10:20:21
#Vereda Barrancas

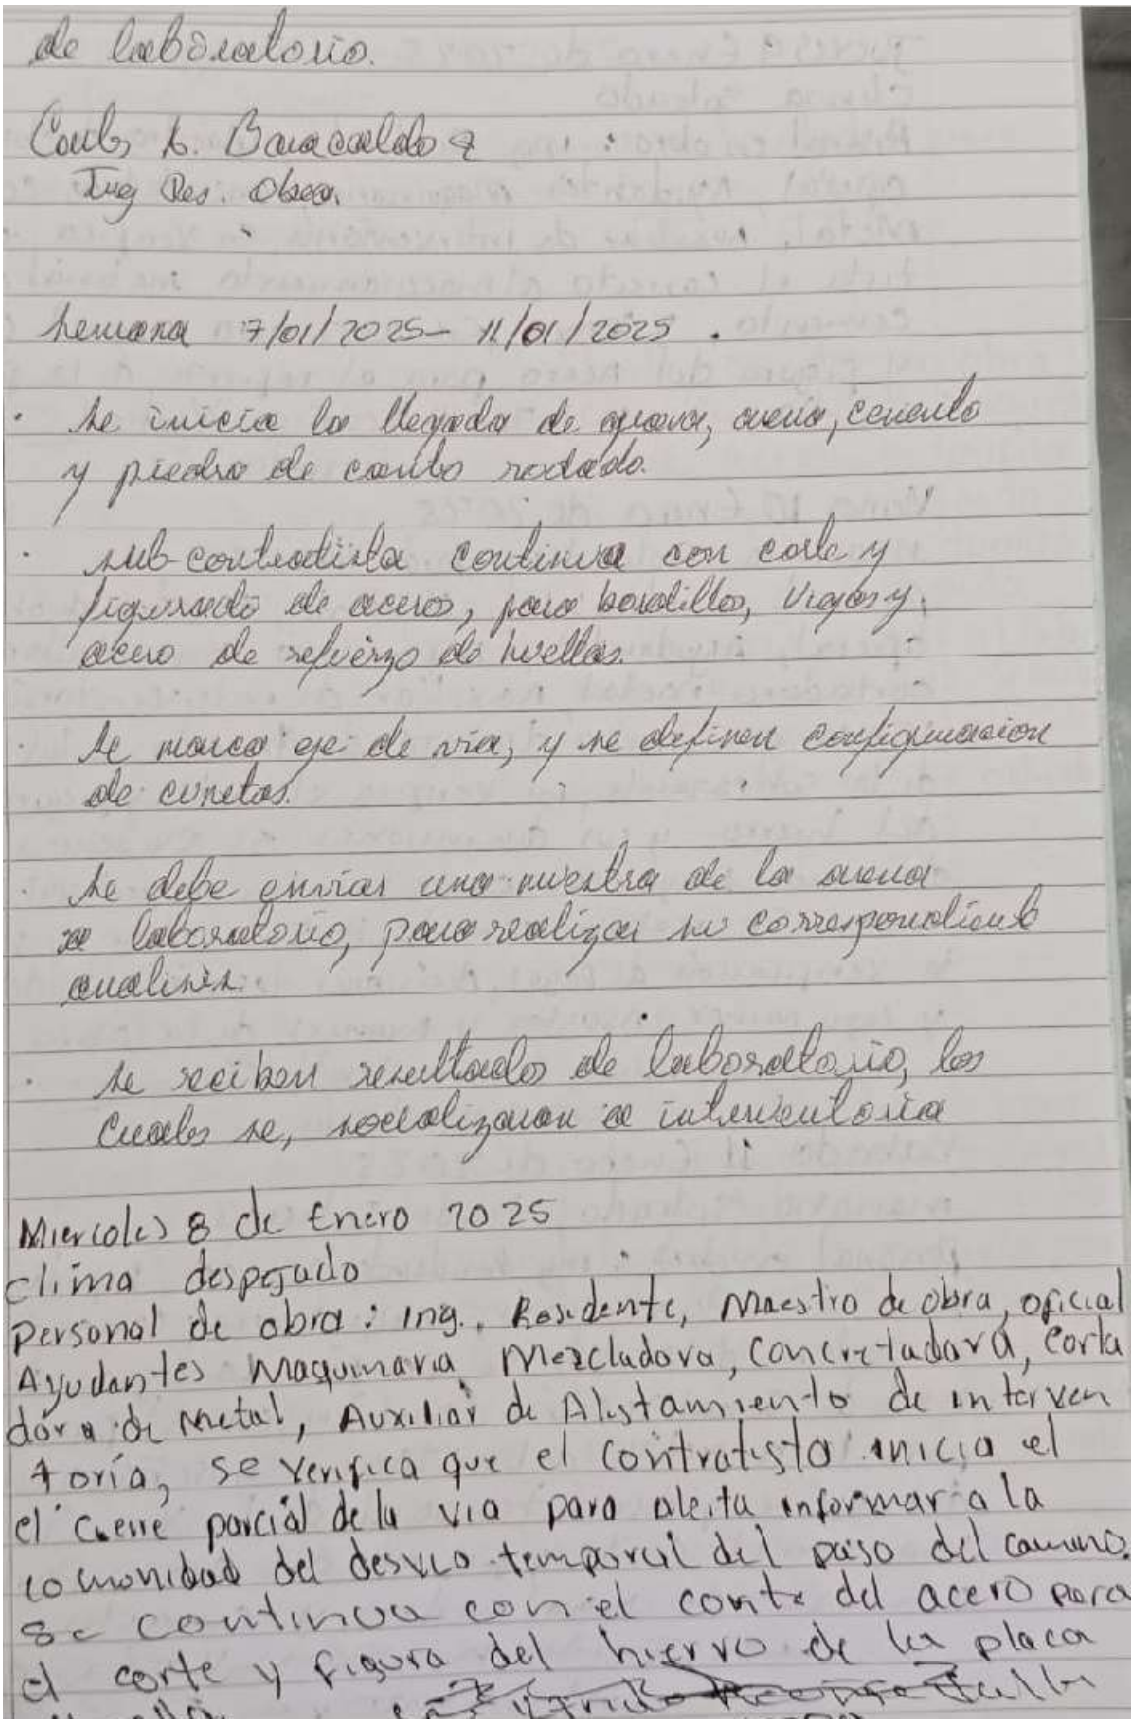

de laboratorio.

Cuadr. Barcelona 2
Ing Res. Obra.

Semana 7/01/2025 - 11/01/2025.


- Se inicia la llegada de grava, arena, cemento y piedra de canto rodado.
- Subcontratista continua con corte y figurado de acero, para bordillo, viga y acero de refuerzo de huellas.
- Se marca eje de vía, y se definen configuración de cunetas.
- Se debe enviar una muestra de la arena a laboratorio, para realizar su correspondiente análisis.
- Se reciben resultados de laboratorio, los cuales se, socializaron en interventoría

Miercoles 8 de Enero 2025
clima despejado
Personal de obra: Ing. Residente, Maestro de obra, oficial Ayudantes Maquinaria Mezcladora, Concretadora, Cortadora de metal, Auxiliar de Alistamiento de interventoría, se verifica que el contratista inicia el cierre parcial de la via para alerta informar a la comunidad del desvio temporal del paso del camino. se continua con el corte del acero para el corte y figura del hierro de la placa

Jueves 9 Enero de 2025
clima soleado
Personal en obra: Ing. Residente, Maestro de obra oficial, Ayudantes Maquinaria, concretadora, cortadora Metal, Auxiliar de interventoría, se verifica el control tista el correcto almacenamiento material del cemento, y GRAVA, se continua con el corte y figura del Acero para el refuerzo de la placa huella. WILFRIDO ACOÑA
Interventoria

Viernes 10 Enero de 2025
mañana Soleado, tarde lluviosa
Personal en obra: Ing. Residente, Maestro de obra oficial, Ayudantes, Maquinario concretadora cortadora metal, Auxiliar de interventoría, se virica que inicio trabajo de trazado de los eje de la subrazante, se verifica el corte y figurado del hierro y sus dimensiones. se evidencia una dimension Mayor se ejecotan los respectivas correcciones. Se realiza comite # 5 de obra y se realiza la verificación de pagos, decisiones tecnicas, Bodegaje y caja menor, Ajustes y Avances de la obra
Wilfrido Acoña
Interventoria

Sabado 11 Enero de 2025
manana soleado, tarde soleada:
Personal en obra: ing Residente, Maestro, Ayudantes Auxiliar interventoria, Maquinaria; concretadora cortadora de metal, se verifica La llegada del Material de Senalizacción (malletin, conos) formaletas para lo respectivo delimitacion y señalizacion del cierre y desvio temporal de la via. Se continua con el corte y figurado del Acero para el armazon de viga riostras y cuneta
Wilfrido Acoña
interventoria

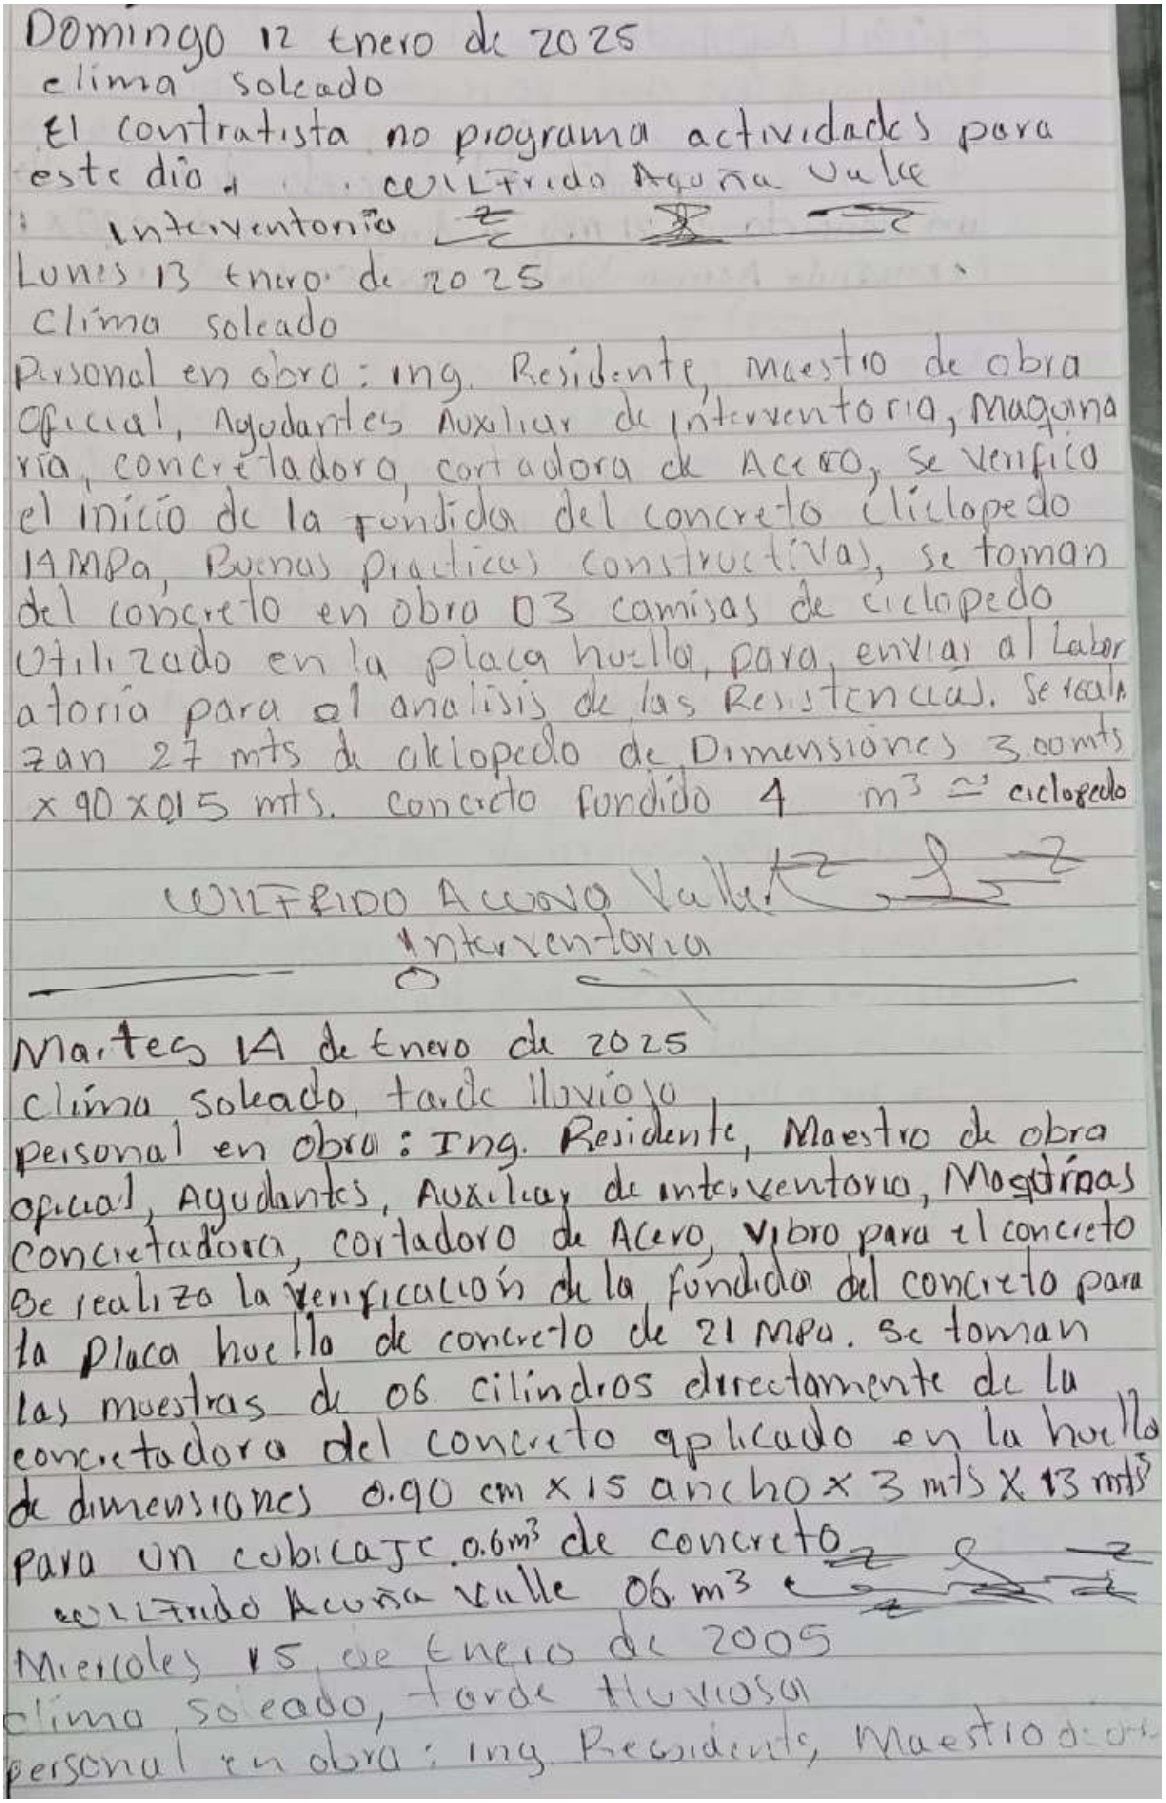

Domingo 12 enero de 2025
clima soleado
El contratista no programa actividades para este dia.
WILFRIDO Acuña Valle
Interventoria

Lunes 13 enero de 2025
Clima soleado
Personal en obra: Ing. Residente, Maestro de obra Oficial, Ayudantes Auxiliar de interventoria, Maquinaria, concretadora, cortadora de Acero, se verifico el inicio de la fundida del concreto Ciclopeo 14MPa, Buenas practicas constructivas, se toman del concreto en obra 03 camisas de ciclopeo Utilizado en la placa huella, para enviar al Laboratoria para el analisis de las Resistencias. Se realizan 27 mts de ciclopeo de Dimensiones 3.00mts x 90 x 015 mts. concreto fundido 4 m^3 = ciclopeado

WILFRIDO Acuña Valle
Interventoria

Martes 14 de enero de 2025
clima soleado, tarde lluviosa
personal en obra: Ing. Residente, Maestro de obra oficial, Ayudantes, Auxiliar de interventoria, Maquinas concretadora, cortadora de Acero, Vibro para el concreto Se realizo la verificación de la fundida del concreto para la Placa huella de concreto de 21 MPa. Se toman las muestras de 06 cilindros directamente de la concretadora del concreto aplicado en la huella de dimensiones 0.90 cm x 15 ancho x 3 mts x 13 mts para un cubicaje 0.6m^3 de concreto
WILFRIDO Acuña Valle 06 m^3

Miercoles 15 de enero de 2005
clima soleado, tarde lluviosa
personal en obra: Ing Residente, Maestro de ob

Oficial, Ayudantes, Auxiliar de interventoria, Maquinaria en obra, concretadora, vibrador de concreto corta metal, se continua con el corte de la obra consistente en Fondida del concreto de la huella con un concreto de 21 MPa de dimenciones de 0.90 x 0.15 x 3mts
Wilfrido Acuña Valle Interventoria

VIERNES 17 Enero de 2025
Clima mañana Soleado, tarde lluviosa - No se interrumpe
Personal en obra: Ing. Residente Maestro, ayudantes, 1Inv. interventoria, Maquinaria; concretadora, cortadora de metal vibro para el concreto se continua con el trazado y corte de la jornada de Formaleteo y Fundicion de La placa huella se realiza un avance 26.06 mts diario de avance fisico cada 4 dias de trabajo
Interventoria Wilfrido Acuña Valle

Sabado 18 Enero de 2025
clima: mañana soleado, tarde lluviosa
Personal en obra: Ing. Residente, Maestro, ayudantes, 1Inv. Auxiliar de interventoria Maquinaria; concretadora cortadora de metal vibro para el concreto, se verifica el avance y la instalacion de las formaletas para culminar su Fundición el dia Lunes El el avance FISICO es de 560 mts Lineales de Placa huella Señidas alas especificaciones de la cartilla tipo INVIAS
Wilfrido Acuña Valle
Interventoria

Domingo 19 Enero de 2025
Clima Soleado
El contratista no programa actividades para este dia.
Wilfrido S. Acuña Va
Interventoria

Lunes 20 de Enero de 2025
Clima: mañana soleado, tarde soleado
Personal en obra: Ing. Residente, Maestro, ayudantes Aux. interventoria, Magoinaria; concretadora, cortadora de Metal, vibro para el concreto, se verifica la fundida del concreto ciclopedo y el concreto de la huella 21 mpa de una manera monolitico donde quedan confinadas vigas riostas, huella, bermas. con un avance de 26.06 diario, se presenta la entrada de 3 personas ayudante de obra se verifica la afiliacion de ARL y se autoriza su ingreso al mismo
Interventoria Leonel Fredo Acuña U.

Martes 21 de Enero de 2025
Clima: Mañana soleda, tarde lluvioso
Personal en obra: Ing. Residente, Maestro, ayudantes Axiliar Interventoria Maquinaria; concretadora, cortadora de Metal, Vibro para el concreto, se continuo con verificacion de la fundida de la placa Huella con un avance Fisico Lineal de 58.13 mts. se presenta Lluvias de tormenta y Rayos a los 4:45 se suspende Las actividades por precaucion del personal en obra.
Interventoria Leonel Fredo Acuña U.

Miercoles 22 Enero de 2025
Clima: Mañana soleado, tarde soleada
Personal en obra: Ing. Residente, Maestro Ayudantes Aux. interventoria, Maquinaria; concretadora, cortadora de Metal, Vibra para el concreto, se verifica proceso constructivo de la formaleta, Fundido, castillo, Ensayos dando las especificaciones tecnicas del a cartilla de construccion tipo INVIAS para Placas Huellas. se evidencia un avance Fisico de 7.25 mts de placa Huella
Aux. interventoria

Jueves 23 de Enero de 2025
clima: soleada Tarde soleado
Personal en obra: ing. Residente, Maestro, Ayudantes interventoria, Maquinarias, Concretadora, Vibro de concreto, corta Metal, se realiza la revision de cantidades de Material de suministro en obra (Arena, Grava, Cemento, Hier. Se continua con la fondidas y formaleteo para el concreto 21 y 14 Mpa se realiza un avance de 07.25 mts diarios. Winfrido Acuña Valle
Interventoria

Viernes 24 de Enero de 2025
Clima: Mañana soleada Tarde Soleado
Personal en obra: ing. Residente, Maestro, Ayudantes interventoria Maquinaria, Concretadora, Vibro para el concreto, Cortadora de Metal, Se inspeciona los EPP en el personal que entegra la obra evidenciando su correcto uso de los mismos. Se verifica la fondida del concreto 21 Mpa y concreto Ciclopeo evidenciado una pondido tipo Monolitico donde queda confinado Vigas Riostros, Huellas, bermas, se evidencia un avance de 87 mts Lineales de placa huellas. y se recibe Material de grava 3/4 con un cubicaje de 8.83 Kg/m
Interventoria Winfrido Acuña Valle.

Sabado 25 de Enero de 2025
clima: Mañana Soleada Tarde Soleada
Personal en obra: ing. Residente, Maestro, Ayudantes, interventoria, Maquinarias; Concretadora, Vibra para el concreto, cortadora de Metal, Se continua con el formaleteo de la placa huella se proyecta para la Proxima semana 115 mts lineales. Se realiza el abono del pago de la nomina de los trabajadores, se evidencia una inconformidad por parte de los trabajadores con respecto a su pago Se espero en la reunión del comité se toque

el tema y se normalice o subsane la inconformidad, a la ~~otra resultados~~.
Interventoria Wilfrido Acuña Valle

Domingo 26. de Enero de 2025
clima: Mañana Soleado: Tarde un poco lluviosa
El contratista No plagrama actividades para este dia. interventono. Wilfrido Acuña Valle

Lunes 27 de Enero de 2025
clima: Mañana soleada Tarde: soleado
Personal en obra: Ing. Residente, maestro, Ayudantes, interventoria, Maquinaria, concretadora, Vibro para el concreto, Se continua con la formada con el trazado del corte de fundida de concreto de la huella y el concreto ciclopeo para un avance diario de 0.725 mts y con un total de 110 mts. de Fundidas
Wilfrido Acuña Valle
interventono.

MARTES 28 de Enero de 2025
Clima: Mañana Soleada Tarde: soleada
Personal en obio: Ing. Residente, maste, Ayudantes. interventoria, Maquinana, concretadora, Vibro para el concreto, Se continua con la formada con el ritmo de trabajo de fanletas del ciclopeo, central y laterales una vez seco se procede con el formaleteo y fundida de la huella con un concreto de 21 MPa. Se realiza la siguiente observación como buenas practicas constructivas que se deben Aplicar en obra. El concreto de las huellas debe ser de 3.000 psi = 21 MPa No debe contener piedras y el espesor debe ser de 15cm de concreto puro y limpio con tan solo Grava se dan instrucciones de retirar todo el % de piedra de canto rodado sobre las huella y se indica la piedra para el concreto ciclopeo de 14MPa del Huella Wilfrido Acuña Valle

Miercoles 29 Enero de 2025
Mañana soleada Tarde Soleada
Personal en obra: ing. Residente, Maestro, Ayudantes
Interventoría Maquinaria: concretadora, Vibro de concreto
El dia de Enero de 2025 se hizo la observacion
por parte de la Direccion de la interventoria por asunto
de temas de calidad, dando las siguientes instrucciones
de no incluir piedras en las formaletas donde se va
Fundir las Huellas convirtiendo un vaciada de concreto
21 MPa → 3000 PSi en concreto ciclopeo.
Interventoria (illegible)

Jueves 30 Enero de 2025
Mañana Soleada tarde soleada
Personal en obra: ing. Residente, Maestro, Ayudante
Auxiliar de interventoria, Maquinaria concretadora, Vibro
para el concreto, se supervisa la Fundicion de placa
huella donde se Verifica que queden confinadas Vigas
riostras, Huellas, Bermas y ciclopedo. para el dia de hoy
se evidencia un avance de obra de cada 4 dias de
26.06 mts Lineales y para un total del de hoy de
129 metros lineales de placa huella. desde K0+436, K0+561
Interventoria (illegible)

31 de Enero de 2025 viernes
Mañana soleada tarde soleada
Personal en obra: ing. Residente, Maestro Ayudante Inter,
Ventoría, Maquinaria, Concretadora, Vibra para el concreto
se supervisa las formaletas para el fundido del concreto
con un avance de 142 mts. se realiza un arqueo
de los Materiales evidenciando que se tiene en existencia
339 Un. Cemento, 02 Viajes de Grava (14m3) y suficiente
Piedra de canto rodado para terminar el tramo objetivo
170 mts Lineales
Interventoria (illegible)
