PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No 3

CONSORCIO MABRIL 90 2023

CABA INTERVENTORÍA SAS

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	10 VARIOS	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	1 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO
ITEM	10,1 Suministro e instalacion de espejo de 5 mm con bisel de 2 cm en contorno, incluye retiro de espejos rotos o en mal estado, limpieza del area de instalacion, material de pega y todos los elementos y materiales necesarios para su ejecución y uso.			**UNIDAD**	M2

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

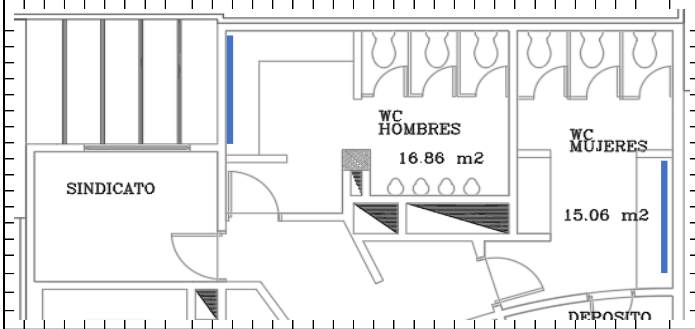



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	ESPEJO BAÑO PISO 2 HOMBRE		2,25	1,05	1,00	2,36	2,36
	ESPEJO BAÑO PISO 2 MUJER		2,55	1,05		2,68	2,68
						SUBTOTAL	**5,04**
						TOTAL	**5,04**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de obra Jaime Moreno Castiblanco

Por la Interventoría:

Residente de interventoria Carlos Márquez

Por la Obra:

Directora de obra Diana Parra

Por la Interventoría:

Directora de interventoria Diana Ramirez

PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No 3


CONSORCIO MABRIL 90 2023

CABA INTERVENTORÍA SAS

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	10 VARIOS	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	1 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO
ITEM	10,2	Suministro e instalación de división de baño en vidrio templado de 8 mm con herrajes de acero inoxidable (cuerpo fijo y puerta batiente) H=2,00 m, incluye elementos de fijación en acero inoxidable, bisagras de acero inoxidable, remate de sellado a muro y a piso (burbuja de caucho), topes, manijas y demás elementos y materiales necesarios para su ejecución y uso.		**UNIDAD**	M2

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

BANO ANTROPOLOGIA PISO 2

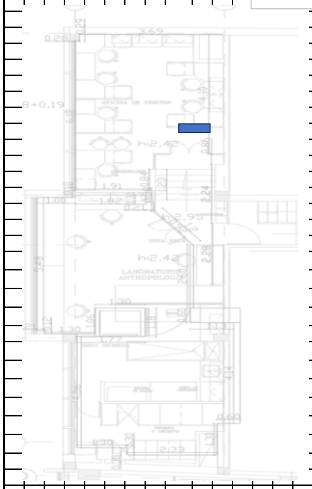



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	BANO ANTROPOLOGIA		1,08	2,00			2,16
						SUBTOTAL	**2,16**
						TOTAL	**2,16**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de obra Jaime Moreno Castiblanco

Por la Interventoría:

Residente de interventoria Carlos Márquez

Por la Obra:

Directora de obra Diana Parra

Por la Interventoría:

Directora de interventoria Diana Ramirez

PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No 3

CONSORCIO MABRIL 90 2023

CABA INTERVENTORÍA SAS

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	10 VARIOS	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	1 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2025
ITEM	10,3	Suministro e instalación de división en vidrio templado 10 mm altura piso a techo (2,40 m) soportada en postes de acero inoxidable 2.5" anclados con brida y chazos expansivos a piso y muros. Incluye soporte de vidrios en acero inoxidable, puerta de hoja sencilla en vidrio templado 10 mm (2 Und) soportada sobre poste en acero inoxidable 2.5 "con bisagra evolvente, manija de 40-20en acero inoxidable de 1", con porta cerradura y cerradura de palanca Yale o Schlage.			**UNIDAD**	M2

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

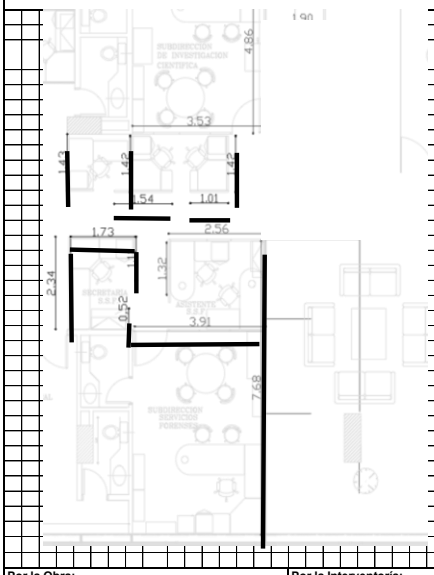

#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
PISO 6							
	DIVISION PISO TECHO	3,91		2,78			10,8698
		7,68		2,78			21,3504
	DIVISIÓN MEDIA ALTURA	2,34		1,32			3,0888
		1,73		1,32			2,2836
		1,11		1,32			1,4652
		0,52		1,32			0,6864
				1,32			0
		1,43		1,32			1,8876
		1,42		1,32			1,8744
		1,54		1,32			2,0328
		1,01		1,32			1,3332
		1,42		1,32			1,8744
						SUBTOTAL ACTA PARCIAL 3	**48,75**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de obra Jaime Moreno Castiblanco

Por la Interventoría:

Residente de interventoria Carlos Márquez

Por la Obra:

Directora de obra Diana Parra

Por la Interventoría:

Directora de interventoria Diana Ramirez

PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No 3

CONSORCIO MABRIL 90 2023

CABA INTERVENTORÍA SAS

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	10 VARIOS	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	1 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO
ITEM	10,4 Suministro e instalación de cinta antideslizante foto-luminiscente para pasos de escalera, incluye retiro de cinta existente, limpieza de la superficie, instalación homologando características del material existente.			**UNIDAD**	M2

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

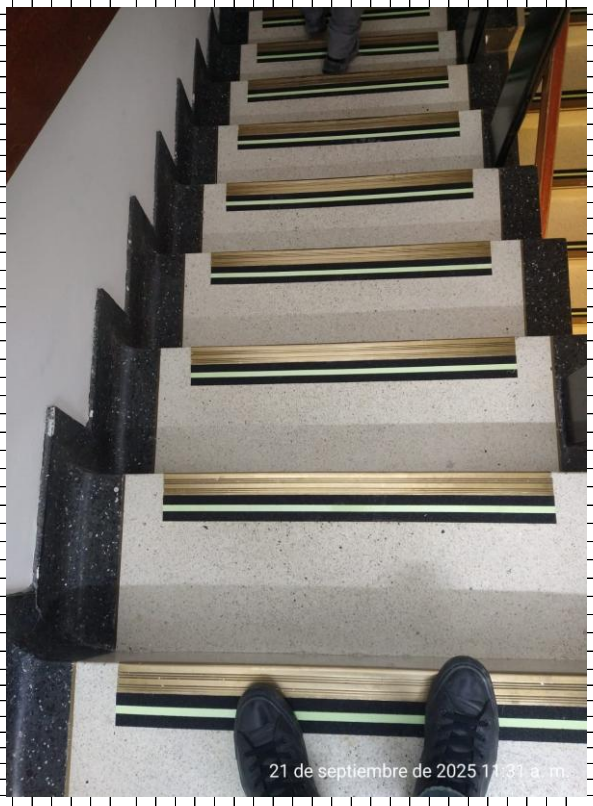

#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	8 al 7		1,00		22,00		22,00
	7 al 6		1,00		22,00		22,00
	6 al 5		1,00		20,00		20,00
	5 al 4		1,00		20,00		20,00
	4 al 3		1,00		20,00		20,00
	3 al 2		1,00		20,00		20,00
	2 al 1		1,00		22,00		22,00
	1 al -1		0,75		18,00		13,50
	Sotano 1 al Sotano 2		0,75		18,00		13,50
						SUBTOTAL	**173,00**
						TOTAL	**173,00**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de obra Jaime Moreno Castiblanco

Por la Interventoría:

Residente de interventoria Carlos Márquez

Por la Obra:

Directora de obra Diana Parra

Por la Interventoría:

Directora de interventoria Diana Ramirez

PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No 3


CONSORCIO MABRIL 90 2023

CABA INTERVENTORÍA SAS


OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	10 VARIOS	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	1 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO
ITEM	10,5 Suministro e instalación de cerradura tipo pomo madera (alcoba Dorada Bell Wood) para cuarto de aseo con dos llaves, incluye todos los elementos necesarios para la ejecución del ítem.			**UNIDAD**	UN

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

PISO 6



PISO 4





#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	BAÑOS PISO 6				2,00		2,00
	ESCALERA PISO 4				1,00		1,00
						SUBTOTAL	**3,00**
						TOTAL	**3,00**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de obra Jaime Moreno Castiblanco

Por la Interventoría:

Residente de interventoria Carlos Márquez

Por la Obra:

Directora de obra Diana Parra

Por la Interventoría:

Directora de interventoria Diana Ramirez

PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No 3

CONSORCIO MABRIL 90 2023

CABA INTERVENTORÍA SAS

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	10 VARIOS	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	1 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO
ITEM	10,6 Suministro, instalación y certificación de punto de anclaje de dos pernos, en acero inoxidable, de alta tenacidad, resistente a la corrosión y demás afectaciones del medio ambiente, con resistencia mínima a la tensión de 25 KN anclajes de sistemas contra caída para trabajo seguro) con cumplimiento de normas ANSI/			**UNIDAD**	UN

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

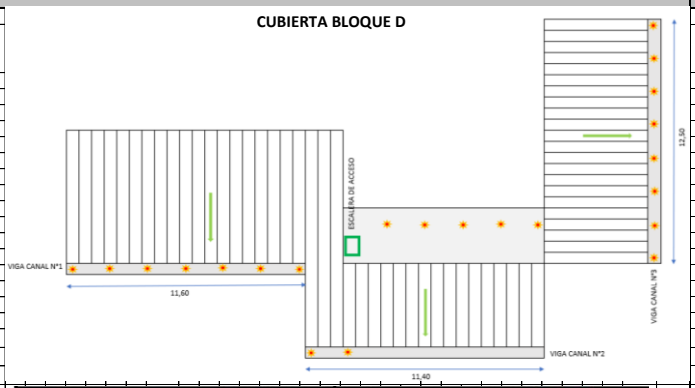



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	ANCLAJES CUBIERTA BLOQUE D				22,00		22,00
						SUBTOTAL	**22,00**
						TOTAL	**22,00**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de obra Jaime Moreno Castiblanco

Por la Interventoría:

Residente de interventoria Carlos Márquez

Por la Obra:

Directora de obra Diana Parra

Por la Interventoría:

Directora de interventoria Diana Ramirez

PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No 3

CONSORCIO MABRIL 90 2023

CABA INTERVENTORÍA SAS

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	10 VARIOS	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	1 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO
ITEM	10,16 Suministro e instalación de jaboneras en acero inoxidable (dispensador de jabón líquido acero inoxidable 1000, Ml De 20x13 cm), incluye elementos de sujeción (chazos, tonillos etc.) y todos los elementos y materiales necesarios para su instalación y uso.			**UNIDAD**	UN

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

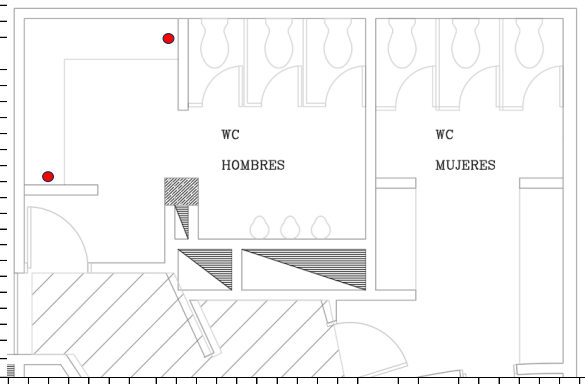



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m^2)	TOTAL
	PISO 3						
	BAÑO HOMBRES				2,00		2,00
						SUBTOTAL	**2,00**
						TOTAL	**2,00**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de obra Jaime Moreno Castiblanco

Por la Interventoría:

Residente de interventoria Carlos Márquez

Por la Obra:

Directora de obra Diana Parra

Por la Interventoría:

Directora de interventoria Diana Ramirez

PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No 3

CONSORCIO MABRIL 90 2023

CABA INTERVENTORÍA SAS

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	10 VARIOS	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	1 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO
ITEM	10,17	Suministro e instalación de tapa registro de 20×20 cm de empotrar, en acero inoxidable satinado· Dimensión interna: 20 x 20 cm · Tapa 20 / Marco 23, · Acabado: Acero inoxidable satinado, Incluye mortero 1:3, Sika Flex, chazos, tornillos y demás elementos y materiales necesarios para la ejecución de la actividad		**UNIDAD**	UND

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

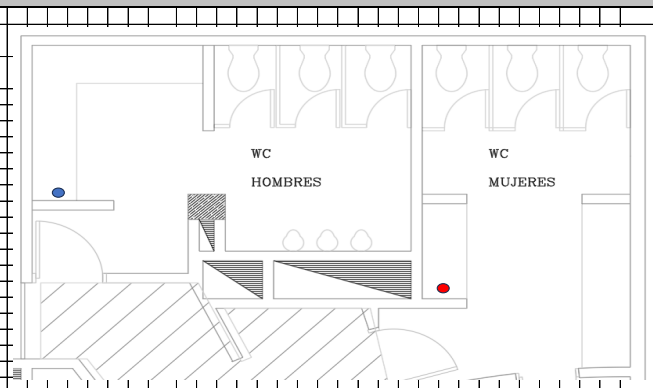



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	BAÑO HOMBRES PISO 3				1,00		1,00
	BAÑO MUJERES PISO 3				1,00		1,00
							-
							-
							-
							-
							-
						SUBTOTAL	2,00
						TOTAL	2,00

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de obra Jaime Moreno Castiblanco

Por la Interventoría:

Residente de interventoria Carlos Márquez

Por la Obra:

Directora de obra Diana Parra

Por la Interventoría:

Directora de interventoria Diana Ramirez

PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No 3

CONSORCIO MABRIL 90 2023

CABA INTERVENTORÍA SAS

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**					
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024	
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024	
CAPITULO	10 VARIOS	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	1 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO	
ITEM	10,18	Suministro e instalación de secador de manos industrial con sensor automático, en acero inoxidable satín, de uso institucional (h 24*23*27 cm), 110 voltios, incluye elementos de sujeción a muro (chazos, tornillos etc.) y demás elementos y materiales necesarios para su ejecución y uso.		**UNIDAD**	UN	

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

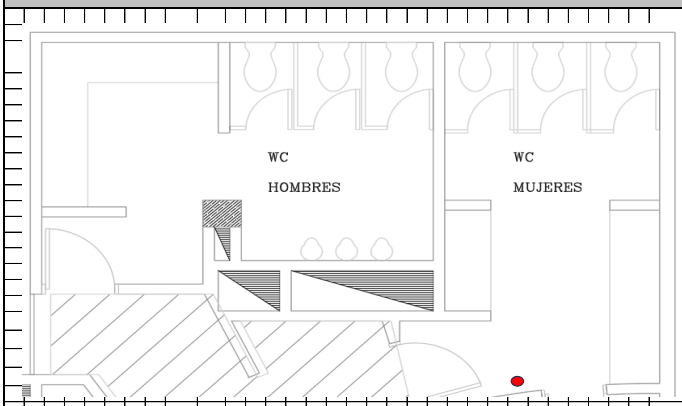



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
●	BAÑO MUJERES PISO 3				1,00		1,00
						SUBTOTAL	**1,00**
						TOTAL	**1,00**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de obra Jaime Moreno Castiblanco

Por la Interventoria:

Residente de interventoria Carlos Márquez

Por la Obra:

Directora de obra Diana Parra

Por la Interventoria:

Directora de interventoria Diana Ramirez
