PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No 3

CONSORCIO MABRIL 90 2023


CABA INTERVENTORÍA SAS

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	4 BASES Y PISOS	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	1 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO
ITEM	4,7 Reparación de guarda escoba en granito pulido, (pasos de escalera), (+/- 50 cm) incluye demolición en sitios afectados, limpieza de la superficie, elementos y materiales necesarios para su ejecución y uso, cargue y retiro de escombraos a botadero autorizado, se deben homologar las características (forma, color tamaño y textura) del elemento existente.			**UNIDAD**	UN

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

PISO 1 AL 2



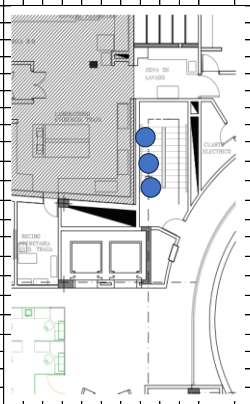

#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	ESCALERA PISO 2 A 1				3,00		3,00
						SUBTOTAL	**3,00**
						TOTAL	**3,00**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de obra Jaime Moreno Castiblanco

Por la Interventoría:

Residente de interventoria Carlos Márquez

Por la Obra:

Directora de obra Diana Parra

Por la Interventoría:

Directora de interventoria Diana Ramirez

PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No 3

CONSORCIO MABRIL 90 2023

CABA INTERVENTORÍA SAS

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	4 BASES Y PISOS	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	1 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO
ITEM	4.9 Reparación corredor exterior en adoquín de ladrillo, incluye retiro del adoquín, relleno con recebo B 200, apisonado y afirmado del material, pendientado, conformación de rampa, instalación del adoquín con reposición de piezas rotas (aprox 30 %), emboquillado y demás elementos y materiales necesarios para su ejecución y uso conservando características existentes.			**UNIDAD**	M2

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	ZONA EXTERIOR BLOQUE D	3,61	22,85				82,502
	AREA TRIANGULO	3,61	3,60			2,00	6,50
	DESCUENTO CAJAS				9,00		9,00
						SUBTOTAL	**80,00**
						TOTAL	**80,00**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de obra Jaime Moreno Castiblanco

Por la Interventoría:

Residente de interventoria Carlos Márquez

Por la Obra:

Directora de obra Diana Parra

Por la Interventoría:

Directora de interventoria Diana Ramirez

PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No 3

CONSORCIO MABRIL 90 2023

CABA INTERVENTORÍA SAS

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	4 BASES Y PISOS	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	1 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO
ITEM	4,12 Suministro de piso falso en acero de alta resistencia de 64 celdas (Módulos de 60.9 x 60.9 cm, acabado superior en laminado de alta presión mi carta Ref. QUARZITE SNOW 3007 ó QUARZITE 3044 MT, acabado inferior en pintura electrostática, niveladores y estructura sismo resistente, stringers en acero zincados o con recubrimiento en pintura electrostática gris, Resistencia 1800 Kg/m2, Altura del piso terminado 0.24 m, Incluye rampa de acceso, cargue y retiro de escombros y sobrantes a botadero autorizado, aseo del área intervenida y todos los materiales y elementos necesarios para su ejecución y uso.			**UNIDAD**	M2

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

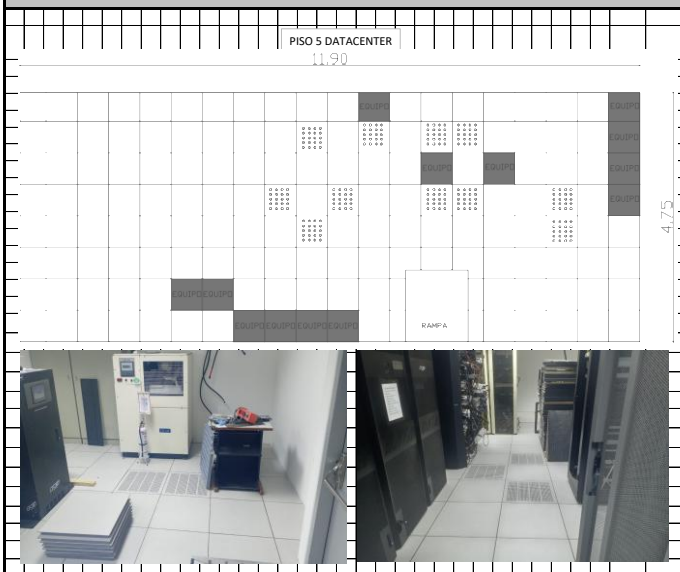

#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
		4,65	11,90				55,34
	DESCUENTO EQUIPOS				20,00	0,36	7,20
						SUBTOTAL	48,14
						TOTAL	48,14

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de obra Jaime Moreno Castiblanco

Por la Interventoría:

Residente de interventoria Carlos Márquez

Por la Obra:

Directora de obra Diana Parra

Por la Interventoría:

Directora de interventoria Diana Ramirez
