PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No 3


CONSORCIO MABRIL 90 2023

CABA INTERVENTORÍA SAS


OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	8 ELEMENTOS METALICOS Y ACERO DE REFUERZO	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	1 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO
ITEM	8,5 Suministro e instalación protectores de ventanas compuesto por marco en aluminio proyectante con pisa vidrio recto a 45° (tipo pesado) y lámina expandido calibre 16, huecos de 30 mm, pintura electrostática color a definir para la malla, empaquetadura en todo el contorno, incluye tres (3) anclajes por cada borde (4 bordes), tornillería, chazos y demás elementos y materiales necesarios para su ejecución y uso.			**UNIDAD**	M2

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

FACHADA BLOQUE A CALLE 13



FACHADA BLOQUE A CRA 7

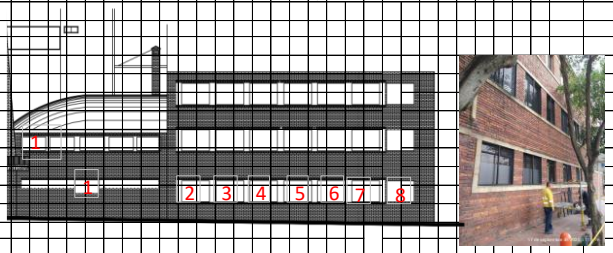

#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	FACHADA BLOQUE A CALLE 13						
	PISO 1						
	V1	1,78		1,25			2,23
	V2	1,78		1,25			2,23
	V3	1,82		1,25			2,28
	V4	1,82		1,25			2,28
	V5	1,82		1,25			2,28
	V6	1,82		1,25			2,28
	V7	1,82		1,25			2,28
	PISO 2						-
	V1	2,06		1,64			3,38
	V2	2,06		1,64			3,38
	V3	2,06		1,64			3,38
	V4	2,06		1,64			3,38
	V5	2,06		1,64			3,38
	V6	1,82		1,64			2,98
	V7	1,82		1,64			2,98
	V8	1,82		1,64			2,98
	V9	1,82		1,64			2,98
	FACHADA BLOQUE A CRA 7						-
	PISO 1						-
	V1	1,540		1,25			1,93
	V2	1,260		1,37			1,73
	V3	1,260		1,36			1,71
	V4	1,260		1,01			1,27
	V5	1,250		1,37			1,71
	V6	1,250		1,37			1,71
	V7	1,250		1,02			1,28
	V8	1,250		1,01			1,26
	PISO 2						-
	V1	0,994		1,00			0,99
						SUBTOTAL	**58,25**
						TOTAL	**58,25**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de obra Jaime Moreno Castiblanco

Por la Interventoría:

Residente de interventoria Carlos Márquez

Por la Obra:

Directora de obra Diana Parra

Por la Interventoría:


Directora de interventoria Diana Ramirez

PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No 3

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	8 ELEMENTOS METALICOS Y ACERO DE REFUERZO	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	1 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO
ITEM	8,6 Mantenimiento de puerta de cuarto de aseo de morgue, incluye asegurado del marco a la mampostería, suministro e instalación de tapa luz en lamina metálica, resanes de pañete y estuco en baño de puerta, ajuste de pasadores y todos los elementos, aseo y limpieza del área intervenida y materiales necesarios para su ejecución.			**UNIDAD**	M2

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

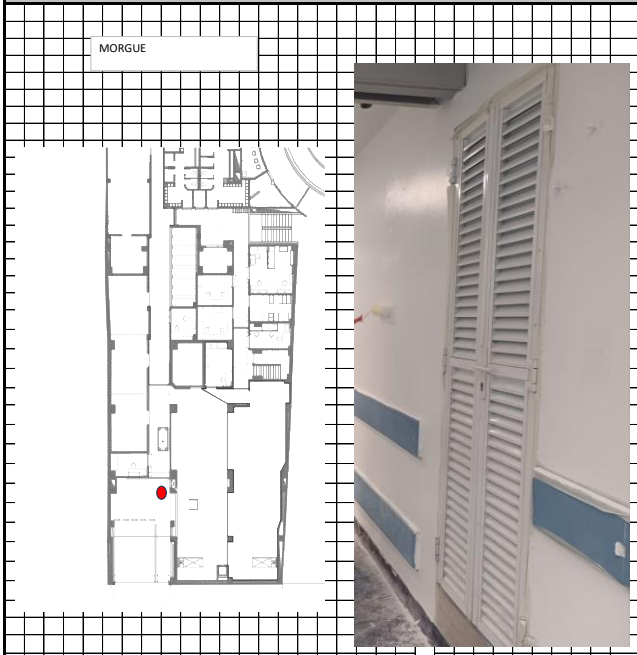

#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	MORGUE	0,80		2,00		1,60	1,60
						SUBTOTAL	**1,60**
						TOTAL	**1,60**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de obra Jaime Moreno Castiblanco

Por la Interventoría:

Residente de interventoria Carlos Márquez

Por la Obra:

Directora de obra Diana Parra

Por la Interventoría:

Directora de interventoria Diana Ramirez

PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No 3

CONSORCIO MABRIL 90 2023

CABA INTERVENTORÍA SAS

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	8 ELEMENTOS METALICOS Y ACERO DE REFUERZO	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	1 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO
ITEM	8,17 Suministro e instalación de barra de seguridad abatible fabricada en acero inoxidable 304 Industrial, incluye bridas, escudos, chazos en cero inoxidable y todos los elementos y materiales necesarios para su ejecución y uso.			**UNIDAD**	UN

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO





#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	BAÑO PISO 6 mujeres				1,00		1,00
	BAÑO PISO2 hombres				1,00		1,00
						SUBTOTAL	**2,00**
						TOTAL	**2,00**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de obra Jaime Moreno Castiblanco

Por la Interventoría:

Residente de interventoria Carlos Márquez

Por la Obra:

Directora de obra Diana Parra

Por la Interventoría:

Directora de interventoria Diana Ramirez

PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No 3

CONSORCIO MABRIL 90 2023

CABA INTERVENTORÍA SAS

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	8 ELEMENTOS METALICOS Y ACERO DE REFUERZO	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	1 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO
ITEM	8,18 Suministro e instalación de barra de seguridad fija de 60 cm, fabricada en acero inoxidable 304 Industrial, incluye bridas, escudos, chazos en cero inoxidable y todos los elementos y materiales necesarios para su ejecución y uso.			**UNIDAD**	UN

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO





#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	BAÑO PISO 6				2,00		2,00
						SUBTOTAL	**2,00**
						TOTAL	**2,00**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de obra Jaime Moreno Castiblanco

Por la Interventoría:

Residente de interventoria Carlos Márquez

Por la Obra:

Directora de obra Diana Parra

Por la Interventoría:

Directora de interventoria Diana Ramirez
