

Prog. Infraestructura Palacio De Justicia act (1)

Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
1			**PROGRAMACION BAJO TABLAZO**	**101 días**	**mié 17/09/25**	**jue 18/12/25**		
2			Fecha Inicio De Obra	0 días	mié 17/09/25	mié 17/09/25		FC+31 días;63C
3		**1**	**PRELIMINARES**	**86,38 días**	**mié 17/09/25**	**jue 4/12/25**		
4		1,01	Trazado y replanteo	15 días	mié 17/09/25	mar 30/09/25	2	as;6FC+1 día;8(
5		1,02	Realizacion de tala de arboles, compensacion y reforestacion	1 día	mar 23/09/25	mié 24/09/25	4CC+7 días	67
6		1,03	Demolicion de muro perimetral	2 días	mié 1/10/25	vie 3/10/25	4FC+1 día	7CC+1 día
7		1,04	Retiro a disposicion final de material de demolicion	69,38 días	jue 2/10/25	jue 4/12/25	6CC+1 día	10CC
8		1,05	Suministro e instalacion de cerramiento en tela verde y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion	10 días	mar 23/09/25	jue 2/10/25	4CC+7 días	67
9		**2**	**MOVIMIENTO DE SUELO**	**74,63 días**	**mar 7/10/25**	**lun 15/12/25**		
10		2,01	Excavación manual en material común (incluye cargue y retiro)	69,5 días	mar 7/10/25	mié 10/12/25	7CC	11CC
11		2,02	Excavación manual en material común (incluye cargue y retiro) < 0,50 mts	69,5 días	mar 7/10/25	mié 10/12/25	10CC	17CC+1 día;24CC
12		2,03	Suministro e instalacion de relleno con material seleccionado suelto	8 días	dom 7/12/25	lun 15/12/25	20FC+3 días	67
13		**3**	**IDENTIFICACION INSTITUCIONAL**	**4,25 días**	**mar 4/11/25**	**vie 7/11/25**		
14		3,01	Suministro e instalación de logo institucional en letras de acero inoxidable brillante con corte láser color a elección h: 20 cm y escudo en acero inoxidable en contraste satinado d: 80 cm	4,25 días	mar 4/11/25	vie 7/11/25	2	67
15		**4**	**CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL**	**26,38 días**	**sáb 15/11/25**	**mar 9/12/25**		
16		4,01	Suministro, corte, figurado e instalación de acero de refuerzo 60.000 psi	20 días	sáb 15/11/25	mar 2/12/25	17CC	18CC
17		4,02	Suministro y colocación de solado en concreto pobre de 17,5 MPa (2500 PSI) hecho en obra	20 días	sáb 15/11/25	mar 2/12/25	11CC+1 día	16CC
18		4,03	Suministro y colocación de concreto de 24 MPa (3,500 psi)	20 días	sáb 15/11/25	mar 2/12/25	16CC	19CC+1 día
19		4,04	Suministro y colocación de concreto de 21 mpa para columnas y vigas (3,000 psi)	21 días	dom 16/11/25	jue 4/12/25	18CC+1 día	20CC
20		4,05	Sobrecimeinto en bloque estructural e=0,15mts	21 días	dom 16/11/25	jue 4/12/25	19CC	1CC;12FC+3 día
21		4,06	Suministro e instalacion de levante de muro en bloque e = 0,15 mts	21 días	dom 16/11/25	jue 4/12/25	20CC	22CC+5 días
22		4,07	Suministro e instalacion de pañete para muros	20,38 días	jue 20/11/25	mar 9/12/25	21CC+5 días	43
23		**5**	**TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA**	**21 días**	**vie 17/10/25**	**mié 5/11/25**		
24		4,01	Suministro, corte, figurado e instalación de acero de refuerzo 60.000 psi	15 días	vie 17/10/25	jue 30/10/25	11CC	25CC+5 días
25		4,03	Suministro y colocación de concreto de 24 mpa (3,500 psi)	15 días	mar 21/10/25	mié 5/11/25	24CC+5 días	26CC
26		5,01	Suministro y colocación de concreto de 28 mpa (4,000 psi)	15 días	mar 21/10/25	mié 5/11/25	25CC	;29CC+10 días;

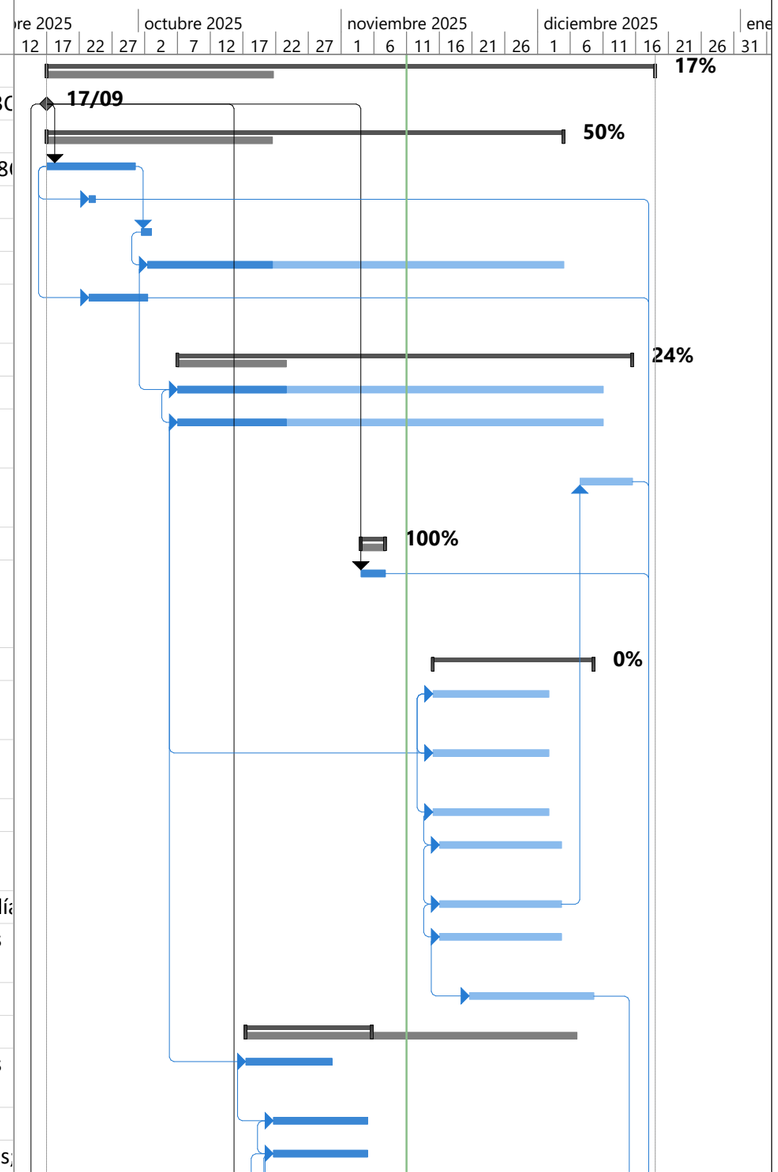


Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Tareas críticas
División crítica
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
27		4,04	Suministro y colocación de concreto de 21 mpa para columnas y vigas (3,000 psi)	14 días	mié 22/10/25	mié 5/11/25	26CC+1 día	28CC;47CC+6 días
28		5,02	Suministro e instalación de tapa en concreto de 21mpa (3000 psi) con bordes en ángulo de 2"x2" y reforzado con varillas de 3/8" de medidas 0,6mx0,6m, incluye ganchos de apertura.	14 días	mié 22/10/25	mié 5/11/25	27CC	67
29		5,03	Pañete impermeabilizado dosificación 1:4	5 días	jue 30/10/25	mié 5/11/25	26CC+10 días	30
30		5,04	Caseta para electrobomba de 0,6H x 0,6L x 0,6B dimensiones internas (incluye placa en concreto 3000 psi e = 8 cm y protector metalico y sistema de seguridad cadena y candado)	3 días	mié 5/11/25	vie 7/11/25	29	31
31		5,05	Suministro e instalación de electrobomba de 1 Caballo	1 día	dom 7/12/25	mar 9/12/25	30	32CC
32		5,06	suministro e isntalacion de tubería pvc de 1/2" (incluye accesorios)	1 día	dom 7/12/25	mar 9/12/25	31CC	33CC
33		5,07	suministro e instalacion de tuberia pvc de 3/4" (inc. accesorios)	1 día	dom 7/12/25	mar 9/12/25	32CC	35CC
34		5,08	Suministro e instalación de sika waterbar/cinta pvc o-22 sellar e impermeabilizar juntas en tanques	16 días	lun 20/10/25	mié 5/11/25	26CC-1 día	67
35		5,09	Suministro e instalación de interruptor flotador eléctrico	1 día	dom 7/12/25	mar 9/12/25	33CC	67
36		**6**	**CARPINTERIA METALICA**	**68,88 días**	**mié 15/10/25**	**mié 17/12/25**		
37		6,01	Suministro e instalación de protectores para ventanas en acero inoxidable en tubería de 1" y ½".	17 días	mié 15/10/25	jue 30/10/25	2FC+31 días	38CC
38		6,02	Suministro e instalacion de vinilo esmerilado para puertas y ventanas	17 días	mié 15/10/25	jue 30/10/25	37CC	39CC
39		6,03	Suministro e instalación de cortina tipo panel japonés con corredera horizontal, incluye accesorios de instalación y herrajes. hmax: 1.50 mts aproximadamente	10,13 días	lun 8/12/25	mié 17/12/25	38CC	40CC
40		6,04	Suministro e instalación de rejas para patio en tubería de 1 pulgada en acero inoxidable REF. 304	17 días	mié 15/10/25	jue 30/10/25	39CC	41CC
41		6,05	Suministro e instalacion de puerta de acceso en vidrio templado 2,30x2,20 incluye bisagra y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye desmonte de puerta existente y disposicion final.	17 días	mié 15/10/25	jue 30/10/25	40CC	67
42		**7**	**CERRAMIENTO ELECTRICO**	**4,25 días**	**lun 15/12/25**	**jue 18/12/25**		
43		7,01	Suministro e instalación de kit solar para cerca eléctrica	4,25 días	lun 15/12/25	jue 18/12/25	22	44CC
44		7,02	Suministro e instalación de postes para cerca eléctrica. Incluye anclado de postes y aisladores para el cable	4,25 días	lun 15/12/25	jue 18/12/25	43CC	45CC;67
45		7,03	Cable para cercado eléctrico de 4 líneas	4,25 días	lun 15/12/25	jue 18/12/25	44CC	67
46		**8**	**SISTEMA ELÉCTRICO REGULADO**	**45,88 días**	**vie 7/11/25**	**jue 18/12/25**		
47		8,01	Suministro e instalación de tablero bypass de 40 A, con luz indicadora de la posición (Red o UPS).	35,75 días	vie 7/11/25	mar 9/12/25	27CC+6 días	48CC

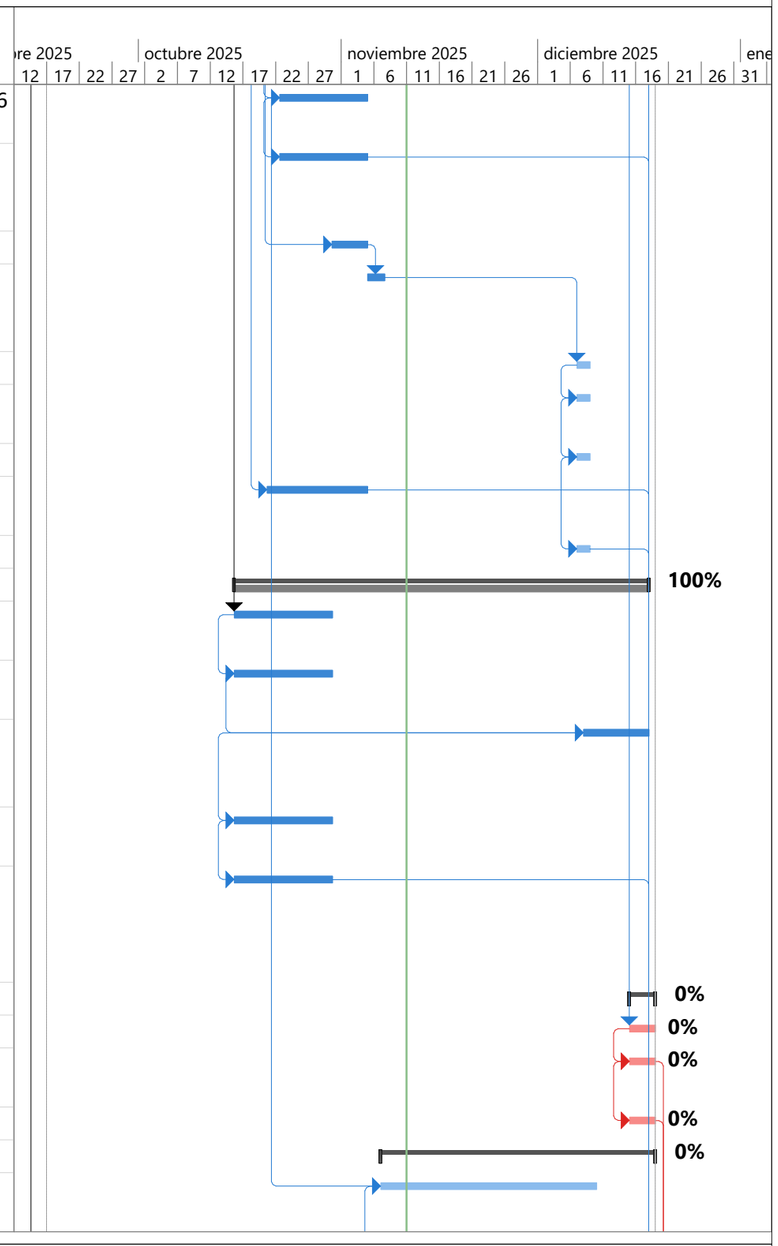

Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Tareas críticas
División crítica
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
48		8,02	Suministro e instalación de breaker enchufable de 2 x 40 A	35,75 días	vie 7/11/25	mar 9/12/25	47CC	49CC
49		8,03	Suministro e instalación de breaker enchufable de 1 x 15 A	35,75 días	vie 7/11/25	mar 9/12/25	48CC	50CC
50		8,04	Suministro e instalación de coraza liquid tight de 1" para conectar la entrada y salida de la UPS, conexionado del tablero regulado. Debe incluir acoples para conexión y correcta instalación.	45,88 días	vie 7/11/25	jue 18/12/25	49CC	51CC
51		8,05	Suministro e Instalación de ducto para salida 220 V desde el tablero hasta caja de conexión. Incluye regata, resane y acabado con pintura tipo 1 desde el tablero hasta el cuarto técnico.	35,75 días	vie 7/11/25	mar 9/12/25	50CC	52CC
52		8,06	Suministro e instalación de cable de cobre calibre #8 AWG THWN-2	35,75 días	vie 7/11/25	mar 9/12/25	51CC	53CC
53		8,07	Suministro e instalación de borna para ponchar de cobre calibre #8 AWG THWN-2	35,75 días	vie 7/11/25	mar 9/12/25	52CC	54CC
54		8,08	Suministro e instalación de caja de paso y conexiones	35,75 días	vie 7/11/25	mar 9/12/25	53CC	55CC
55		8,09	Instalación de tablero de 8 circuitos para el sistema regulado	35,75 días	vie 7/11/25	mar 9/12/25	54CC	56CC
56		8,1	Suministro e instalación de salida eléctrica para tomacorriente doble regulado a 120 V, hasta 3 m. Incluye tomacorriente, conectores y demás elementos necesarios para su correcta instalación en canaleta metálica de 10 cm.	35,75 días	vie 7/11/25	mar 9/12/25	55CC	57CC
57		8,11	Suministro e instalación de alimentador en cable 3* # 12 AWG	35,75 días	vie 7/11/25	mar 9/12/25	56CC	58CC
58		8,12	Suministro e instalación de tubo PVC SCH 40 de 1/2" para alimentador en cable 3* # 12 AWG	35,75 días	vie 7/11/25	mar 9/12/25	57CC	59CC
59		8,13	Suministro e instalación de tubo PVC de 1/2" incrustado para alimentador en cable 3* # 12 AWG. Incluye regata, resane y acabado con pintura tipo 1	35,75 días	vie 7/11/25	mar 9/12/25	58CC	60CC
60		8,14	Suministro e instalación de salida para toma de electrobomba de 1 hp. Incluye tablero con protección termica y contol para los niveles	35,75 días	vie 7/11/25	mar 9/12/25	59CC	61CC
61		8,15	Suministro e instalación de puente para equipotencialización a la puesta a tierra en cable calibre # 8 AWG en el tablero principal	35,75 días	vie 7/11/25	mar 9/12/25	60CC	67
62			**COSTOS INDIRECTOS**	**99,88 días**	**mié 17/09/25**	**mié 17/12/25**		
63			Administración	99,88 días	mié 17/09/25	mié 17/12/25	2CC	64CC
64			Imprevistos	99,88 días	mié 17/09/25	mié 17/12/25	63CC	65CC
65			Utilidad	99,88 días	mié 17/09/25	mié 17/12/25	64CC	66CC
66			IVA Sobre La Utilidad	99,88 días	mié 17/09/25	mié 17/12/25	65CC	67
67			Fin De La Obra	0 días	jue 18/12/25	jue 18/12/25	41;34;35;28;14;	

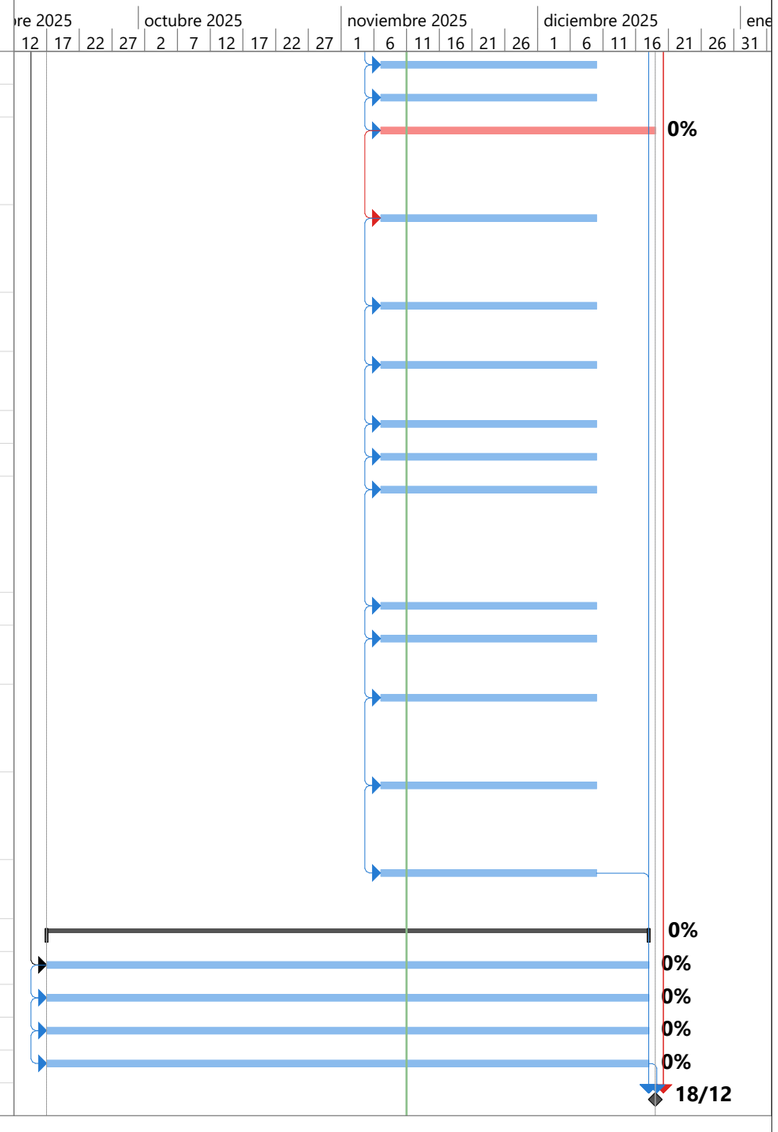

Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Tareas críticas
División crítica
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite
