	FORMATO PARA PAGO	Código: FO-GJ-014
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	Versión: 2
		Página: 1 de 1

Elaboró: Abogado Especializado	Revisó: Jefe Oficina Asesora Jurídica	Aprobó: Comité MECI – CALIDAD Alcalde

CIUDAD:	FUSAGASUGA	FECHA	02	07	2024	ACTA PARCIAL	03			
CONTRATO	2023-0667	PERIODO A CANCELAR	26	02	2024	AL	07	06	2024	

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 DE 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
VALOR CONTRATO:	OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($8.370.631.493,49) MCTE
VALOR ADICIÓN No. 01:	TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS. ($ 3.996.989.087,91) M/TCE
VALOR FINAL CONTRATO:	DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS ($ 12.367.620.581,19) M/TCE
VALOR A CANCELAR EN LA PRESENTA ACTA	VALOR DEL SERVICIO $ 1.359.060.024,61 VALOR TOTAL ACTA $ 1.359.060.024,61
CONTRATISTA	CONSORCIO DEPORTIVO 2023 NIT: 901771549-7 R.L LUIS GABRIEL FARFÁN VELÁSQUEZ. C.C 79.584.718 DE BOGOTÁ D.C.
INTERVENTOR	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS NIT. 830.028.126-2 R.L CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ C.C. 19.275.138 DE BOGOTA D.C.
SUPERVISOR	ING. RAUL ARANGUREN MARTINEZ SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA

ANEXO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION

X	ACTA No. 6 DE PAGO PARCIAL No.3
X	INFORME DE SUPERVISION
X	INFORME INTERVENTORIA
X	INFORME DE CONTRATISTA
X	FACTURA
X	PAGO DE SALUD Y PENSION
X	RUT
X	CERTIFICACION DE PARAFISCALES
X	CDP
X	RP
X	CLAUSULADO MODIFICATORIO No. 1
X	CLAUSULADO ADICION No. 1 Y MODIFICATORIO No. 2
X	ACTA No.7 PARCIAL No.02
X	CLAUSULADO PRORROGA No.1
X	CLAUSULADO ACLARATORIO No. 1 Y PROROGA No. 1
X	EGRESO PAGO No.2
X	CERTIFICACION BANCARIA

FIRMA	ALCALDIA DE FUSAGASUGA
FUNCIONARIO QUIEN TRAMITA LA CUENTA	9 JUL 2024
Nombre:	

	FORMATO DE ACTAS	Espacio exclusivo para el rótulo de radicación
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	R4D1C4D0_1 R4D1C4D0_2 R4D1C4D0_3 R4D1C4D0_4 R4D1C4D0_5
Código: FO-GJ-011	**Elaboró:** Dirección de Contratación	
Versión: 3	**Revisó:** Oficina de Desarrollo Institucional	
Página 1 de 14	**Aprobó:** Comité técnico de calidad	

ACTA No. 09

CIUDAD	FUSAGASUGÁ	FECHA PRESENTE ACTA			02	07	2024	
	INICIO			SUSPENSIÓN				
	REINICIO			PRORROGA				
	ADICIÓN			MODIFICACIÓN				
	ENTREGA Y RECIBO			LIQUIDACIÓN				
X	**PAGO PARCIAL No.03**			¿OTRA CUAL?				
	FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL							
Contrato No.	Contrato de obra 2023-0667	**Fecha de Suscripción del Contrato**			16	06	2023	
Objeto	"EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 DE 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".							
Plazo de Ejecución	Nueve (9) meses a partir de la fecha de inicio	**Fecha Acta de Inicio**	06	09	2023	**Fecha de Terminación**	05	06	2024
ACTA No. 01: INICIO	**Fecha Acta de Inicio**		06	09	2023	**Fecha de Terminación**	05	06	2024
ACTA No. 02: FIJACION DE ITEMS NO PREVISTOS Y PACTACION DE PRECIOS No.1	**Fecha del acta**					22	12	2023	
ACTA No. 03: MODIFICACIÓN No. 01 MAYORES Y MENORES CANTIDADES.	**Fecha del acta**					22	12	2023	
ACTA No. 04: PAGO PARCIAL No. 01	**Fecha del acta**	26	12	2023		**Valor Pagado:**	**$ 3.806.993.304,93**	
ACTA No. 05: FIJACION DE ITEMNS NO PREVISTOS Y PACTACION DE PRECIOS No.2	**Fecha del acta**					29	12	2023	
ACTA No. 06: MODIFICACION No 02 MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS Y ADICION No. 01	**Fecha del acta**	29	12	2023		**Valor de la Adición:**	**$ 3.996.989.087,91**	
ACTA No.07: PAGO PARCIAL No.2	**Fecha del acta**	05	04	2024		**Valor Pagado:**	**$ 1.434.707.500,05**	

VALOR DEL CONTRATO:	**OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($8.370.631.493,49) MCTE**
VALOR ADICIÓN No. 01:	**TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS. ($ 3.996.989.087,91) M/TCE**
VALOR FINAL CONTRATO:	**DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS ($ 12.367.620.581,19) M/TCE**
CONTRATISTA	**CONSORCIO DEPORTIVO 2023 NIT: 901771549-7 R.L LUIS GABRIEL FARFÁN VELÁSQUEZ. C.C 79.584.718 DE BOGOTÁ D.C.**
INTERVENTOR	**R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS NIT. 830.028.126-2 R.L CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ C.C. 19.275.138 DE BOGOTA D.C.**
SUPERVISOR	**ING. RAUL ARANGUREN MARTINEZ SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA**

INGRESO AL ALMACÉN	No Aplica	**X**	Aplica		Número		Fecha ingreso		

En el Municipio de Fusagasugá, a los DOS (02) días del mes de JULIO del año 2024, se reunieron en la Secretaria De Infraestructura del municipio de Fusagasugá Cundinamarca, el **ING. RAUL ARANGUREN MARTÍNEZ** en calidad de **SUPERVISOR**; el señor **LUIS GABRIEL FARFÁN VELÁSQUEZ** con cedula de ciudadanía No. 79.584.718 de Bogotá D.C, representante legal **CONSORCIO DEPORTIVO 2023 NIT: 901771549-7** en calidad de **CONTRATISTA**, y el señor **CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ** con cedula de ciudadanía No. 19.275.138 de Bogotá D.C, representante legal **R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS NIT. 830.028.126-2** en calidad de **INTERVENTOR;** con el fin de suscribir la presente **ACTA No. 09 PAGO PARCIAL No. 03** al **Contrato de Obra pública No. 2023-0667** teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

CANTIDADES EJECUTADAS A PAGAR ACTA No. 03

	CONTRATO OBRA PUBLICA No.2023-0667			CONDICIONES CONTRACTUALES	CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.2		ACTA PARCIAL No. 3	
ITEM	**ITEM ICCU**	**DESCRIPCION**	**UND**	**VALOR UNITARIO**	**CANT**	**VR. PARCIAL DIRECTO**	**CANT**	**VR. Parcial Directo**
1		**PRELIMINARES**						
1.10		**PRELIMINARES**						
1.1.01		**DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M**	**M2**	**$1.527,00**	**33.836,28**	**$ 51.667.999,56**	**7.373,53**	**$ 11.259.380,31**
1.1.02		TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	$1.300,00	5.891,40	$ 7.658.820,00	-	$ -
		SUBTOTAL				**$ 59.326.819,56**		**$ 11.259.380,31**
2		**MOVIMIENTO DE TIERRAS**						
		EXCAVACIONES VARIAS A						

		COMPACTADO MECÁNICAMENTE							
		SUBTOTAL				$ 491.656.324,28		$ -
3		ESTRUCTURAS							
3,1		CIRCULACIÓN Y PERMANENCIA							
3.1.1		PISOS							
3.1.1.01		RELLENO TIPO 4 "SUBBASEB-200"	M3	$87.728,00	0,00	$ -	-	$ -
3.1.1.02		**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)**	**M2**	**$9.549,00**	**7.990,70**	**$ 76.303.194,30**	**7.268,02**	**$ 69.402.322,98**
3.1.1.03		SUBBASE GRANULAR	M3	$170.944,00	3.542,94	$ 605.644.335,36	-	$ -
3.1.1.04		ANDÉN CONCRETO 3000PSI EN SITIO E=0.1M	M2	$62.959,00	1.667,17	$ 104.963.356,03	-	$ -
3.1.1.05		CONCRETO 3000 PSI	M3	$439.638,00	309,77	$ 136.186.663,26	-	$ -
3.1.1.06		RELLENO GRAVILLA DE RÍO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	$98.043,00	0,00	$ -	-	$ -
3.1.1.07		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1700 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	$6.427,00	0,00	$ -	-	$ -
3.1.1.08		RELLENO TIPO 7 "ARENADE PEÑA"	M3	$107.689,00	0,00	$ -	-	$ -
3.1.1.09		**GRAMA SINTÉTICA PARACAMPOS DEPORTIVOS**	**M2**	**$127.347,00**	**7.362,24**	**$ 937.559.177,28**	**1.466,13**	**$ 186.707.257,11**
3.1.1.10		**RIEGO DE IMPRIMACIÓN**	**M2**	**$4.534,00**	**9.724,24**	**$ 44.089.704,16**	**7.267,92**	**$ 32.952.749,28**
3.1.1.11		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	$877.156,00	0,00	$ -	-	$ -
3.1.1.12		RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2	$2.199,00	0,00	$ -	-	$ -
3.1.1.13		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	$903.931,00	0,00	$ -	-	$ -
3.1.1.14		**BORDILLO PREFABRICADO A-80**	**ML**	**$70.885,00**	**3.222,76**	**$ 228.445.342,60**	**283,15**	**$ 20.071.087,75**
3.1.1.15		SISTEMA BICAPA O SÁNDWICH CON ESTRUCTURA GRANULADA, ANTIDESLIZANTE E IMPERMEABLE FUNDIDA EN SITIO CON PROTECCIÓN UV Y RESISTENTE A LOS CLAVOS, CUMPLE CON NORMAS DIN EN 14877 YDIN 18035-6. ESPESOR 13 MM, CONSISTE DE IMPRIMACIÓN CON VIASOL EP-P210, 1 CAPAELASTICA DE 10 A 12 MM DE SBR 1 A 4 MM, CAPA DE TAPAPOROS Y UNA CAPA DE 3 A 5MM VERTIDA Y ESTRUCTURADA DE EPDM1 A 4 MM DE COLOR	M2	$413.168,00	2.361,75	$ 975.799.524,00	-	$ -

3.1.1.16		RECUBRIMIENTO SINTÉTICO COLOR PAVE (Incluye suministros, equipos, mano de obra para su correcta instalación)	M2	$112.661,00	2.361,75	$ 266.077.116,75	-	$ -
		SUBTOTAL				$ 3.375.068.413,74		$ 309.133.417,12
3,2		MOBILIARIO						
3.2.01		**ARCOS DE FÚTBOL 11 X 2JUEGOS (Incluye mallas impermeabilizadas) (Incluye suministros, equipos y mano de obra para su correcta instalación)**	JG	$9.031.568,00	1,00	$ 9.031.568,00	1,0	$ 9.031.568,00
3.2.02		EQUIPO PARA PISTA DE ATLETISMO (Incluye suministros 4 obstáculos y17 tacos de salida)	UN	$90.598.364,00	1,00	$ 90.598.364,00	-	$ -
3.2.03		FOSO DE ARENA PARASALTO LARGO Y SALTOTRIPLE (Incluye cantonera final y arena de sílice al99%)	UN	$21.064.211,00	2,00	$ 42.128.422,00	-	$ -
		SUBTOTAL				$ 141.758.354,00		$ 9.031.568,00
4		PAISAJISMO						
4,01		EMPRADIZACIÓN CON BIOMANTO NATURAL	M2	$28.594,00		$ -	-	$ -
		SUBTOTAL				$ -		$ -
5		EDIFICACIONES						
5,1		RED SUMINISTRO DE AGUA FRÍA						
5.1.01		RED SUMINISTRO PVC 2"	ML	$34.577,00	0,00	$ -	-	$ -
5.1.02		RED SUMINISTRO PVC 11/2"	ML	$24.424,00	13,00	$ 317.512,00	-	$ -
5.1.03		TUBERIA PVC P 1 1/4" RDE 21 (Incluye accesorios suministros e instalación)	ML	$17.111,00	9,00	$ 153.999,00	-	$ -
5.1.04		RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	$15.280,00	31,00	$ 473.680,00	-	$ -
5.1.05		RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	$9.213,00	129,00	$ 1.188.477,00	-	$ -
5.1.06		RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	$11.472,00	36,00	$ 412.992,00	-	$ -
5.1.07		REGISTRO DE 1 1/4" (Incluye accesorios, suministros e instalación)	UN	$213.835,00	2,00	$ 427.670,00	-	$ -
5.1.08		REGISTRO 1 1/2"	UN	$191.086,00	1,00	$ 191.086,00	-	$ -
5.1.09		REGISTRO 3/4"	UN	$79.783,00	2,00	$ 159.566,00	-	$ -
5.1.10		REGISTRO 1/2"	UN	$63.092,00	2,00	$ 126.184,00	-	$ -
5.1.11		LLAVE MANGUERA	UN	$38.255,00	0,00	$ -	-	$ -
		SUBTOTAL				$ 3.451.166,00		$ -
6		PUNTOS HIDRÁULICOS DEAGUA FRÍA						
6,01		PUNTO AF REGADERA (Incluye suministros e instalaciones)	UN	$177.836,00	0,00	$ -	-	$ -
6,02		PUNTO AF LLAVE MANGUERA (Incluye suministros e instalaciones)	UN	$34.443,00	15,00	$ 516.645,00	-	$ -
		PUNTO AF DISPENSADOR						

7		RED SANITARIA							
7,01		EXCAVACIÓN MANUAL ENMATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	M3	$48.721,00	19,00	$ 925.699,00	-	$ -
7,02		RELLENO TIPO 7 "ARENADE PEÑA"	M3	$107.689,00	6,38	$ 687.055,82	-	$ -
7,03		RELLENO TIPO 2 "RECEBO"	M3	$79.419,00	15,30	$ 1.215.110,70	-	$ -
7,04		RELLENO CON MATERIALDE EXCAVACIÓN	M3	$20.799,00	7,65	$ 159.112,35	-	$ -
7,05		TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	$29.468,00	38,80	$ 1.143.358,40	-	$ -
7,06		TUBERÍA DRENAJE PVC 160	ML	$46.906,00	37,00	$ 1.735.522,00	-	$ -
7,07		RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	$27.347,00	13,00	$ 355.511,00	-	$ -
7,08		RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	$37.652,00	29,40	$ 1.106.968,80	-	$ -
7,09		RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	$56.742,00	0,00	$ -	-	$ -
7,10		SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN	$74.391,00	5,00	$ 371.955,00	-	$ -
7,11		SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UN	$79.451,00	11,00	$ 873.961,00	-	$ -
7,12		CAJA DE INSPECCIÓN DE60X60	UN	$274.171,00	6,00	$ 1.645.026,00	-	$ -
7,13		REVENTILACIÓN 2"	ML	$19.248,00	27,00	$ 519.696,00	-	$ -
7,14		SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN	$74.391,00	12,00	$ 892.692,00	-	$ -
7,15		SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UN	$97.502,00	10,00	$ 975.020,00	-	$ -
		SUBTOTAL				**$ 12.606.688,07**		**$ -**
8		RED PLUVIAL							
8,01		EXCAVACIÓN MANUAL ENMATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DESOBRANTES A UNADISTANCIA MENOR DE 5KM)	M3	$48.721,00	107,57	$ 5.240.917,97	-	$ -
8,02		RELLENO TIPO 7 "ARENADE PEÑA"	M3	$107.689,00	44,82	$ 4.826.620,98	-	$ -
8,03		RELLENO TIPO 2 "RECEBO"	M3	$79.419,00	64,54	$ 5.125.702,26	-	$ -
8,04		RELLENO CON MATERIALDE EXCAVACIÓN	M3	$20.799,00	32,27	$ 671.183,73	-	$ -
8,05		RELLENO TIPO 1"GRAVILLA"	M3	$84.906,00	43,03	$ 3.653.505,18	-	$ -
8,06		RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	$51.069,00	55,50	$ 2.834.329,50	-	$ -
8,07		RED SANITARIA PVC-S 6"	ML	$93.407,00	0,00	$ -	-	$ -
8,08		SALIDA AGUAS LLUVIAS ACANAL DE 4" (Incluye codo90, suministros e instalación)	UN	$61.452,00	0,00	$ -	-	$ -
8,09		SALIDA AGUAS LLUVIAS ACANAL DE 6" (Incluye codo90, suministros e instalación)	UN	$166.780,00	0,00	$ -	-	$ -
		TUBERIA PVC						

8,13		TUBERIA PVCLCANTARILLADO 14"_355MM (Incluye suministros e instalación)	ML	$152.314,00	0,00	$ -	-	$ -
8,14		TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	$29.468,00	0,00	$ -	-	$ -
8,15		TUBERÍA DRENAJE PVC 200	ML	$61.267,00	0,00	$ -	-	$ -
8,16		SUMINISTRO EINSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	$7.569,00	0,00	$ -	-	$ -
8,17		CAJA DE INSPECCIÓN DE40X40	UN	$241.560,00	0,00	$ -	-	$ -
8,18		CAJA DE INSPECCIÓN DE80X80	UN	$395.145,00	0,00	$ -	-	$ -
8,19		**CAJA DE INSPECCIÓN DE100X100**	**UN**	**$485.070,00**	**10,00**	**$ 4.850.700,00**	**3,0**	**$ 1.455.210,00**
8,20		CANAL ACO SPORT DEDRENAJE EN POLICONCRETO _LW125H200B125 + REJILLA (Incluye suministros, excavación, rellenos, mano de obra para su instalación)	M	$708.435,00	0,00	$ -	-	$ -
8,21		SUMIDERO LW125K +REJILLA LW125 L =0,50(Incluye suministros e instalación)	UN	$1.116.611,00	0,00	$ -	-	$ -
8,22		CANAL ACO ENPOLICONCRETO_N150_H 31 + REJILLA(Incluye suministros, excavación, rellenos, mano de obra para su instalación)	ML	$542.697,00	0,00	$ -	-	$ -
8,23		CONCRETO 4000 PSI	M3	$456.485,00	3,30	$ 1.506.400,50	-	$ -
8,24		ACERO FIGURADO 60000PSI	KG	$7.588,00	100,89	$ 765.553,32	-	$ -
		SUBTOTAL				**$ 48.915.774,32**		**$ 9.918.647,48**
9		**RED GENERAL DE SUMINISTRO**						
9,1		**ACOMETIDA MEDIDOR YLLENADO DE TANQUE**						
9.1.01		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	M3	$48.721,00	6,49	$ 316.199,29	-	$ -
9.1.02		RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	$20.799,00	3,24	$ 67.388,76	-	$ -
9.1.03		RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	$107.689,00	2,70	$ 290.760,30	-	$ -
9.1.04		RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	$11.472,00	16,80	$ 192.729,60	-	$ -
9.1.05		RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	$9.213,00	9,26	$ 85.312,38	-	$ -
9.1.06		ACOMETIDA DE 1/2" (Incluye suministros e instalación de accesorios y medidor)	UN	$211.416,00	0,00	$ -	-	$ -
9.1.07		FLOTADOR MECANICO DE1/2" (Incluye suministro e instalación)	UN	$99.516,00	2,00	$ 199.032,00	-	$ -

9.2.01		EXCAVACIÓN MANUAL ENMATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	M3	$48.721,00	28,00	$ 1.364.188,00	-	$ -
9.2.02		RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	$84.621,00	19,60	$ 1.658.571,60	-	$ -
9.2.03		RELLENO TIPO 4 "SUBBASEB-200"	M3	$78.956,00	2,80	$ 221.076,80	-	$ -
9.2.04		SUBBASE GRANULAR	M3	$170.944,00	16,80	$ 2.871.859,20	-	$ -
9.2.05		PLACA EN CONCRETO DE 24 MPa, e=0.15 m (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y VIBRADO.NO INCLUYE ACERO)	M2	$147.052,00	56,00	$ 8.234.912,00	-	$ -
9.2.06		REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	$9.522,00	74,48	$ 709.198,56	-	$ -
9.2.07		CORTE PARA JUNTA DEDILATACIÓN EN PISO DECONCRETO AL 1/3 DEL ESPESOR DE LA PLACA (INCLUYE EQUIPOS Y MANO DE OBRA PARA EJECUCIÓN)	ML	$1.798,00	113,00	$ 203.174,00	-	$ -
9.2.08		SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO YSELLANTE)	ML	$7.699,00	113,00	$ 869.987,00	-	$ -
9.2.09		TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 15000 LTRS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIONES)	UN	$25.260.058,00	2,00	$ 50.520.116,00	-	$ -
9.2.10		CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	M2	$112.772,00	60,00	$ 6.766.320,00	-	$ -
9.2.11		VÁLVULA MARIPOSA 3"	UN	$659.205,00	3,00	$ 1.977.615,00	-	$ -
9.2.12		RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	$11.472,00	10,00	$ 114.720,00	-	$ -
9.2.13		RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	$15.280,00	17,00	$ 259.760,00	-	$ -
9.2.14		REGISTRO 3/4"	UN	$79.783,00	2,00	$ 159.566,00	-	$ -
9.2.15		UNIÓN UNIVERSAL PVC3"(Incluye suministro e instalación)	UN	$56.069,00	2,00	$ 112.138,00	-	$ -
9.2.16		VÁLVULA CHEQUE DE 3" (Incluye suministro e instalación)	UN	$296.695,00	0,00	$ -	-	$ -
9.2.17		VÁLVULA DE BOLA METÁLICA 1" (Suministro e instalación)	UN	$40.835,00	1,00	$ 40.835,00	-	$ -
9.2.18		UNIÓN UNIVERSAL PVC1"(Incluye suministro e instalación)	UN	$18.396,00	2,00	$ 36.792,00	-	$ -
9.2.19		UNIÓN UNIVERSAL PVC3/4"(Incluye suministro e	UN	$15.387,00	1,00	$ 15.387,00		$

10		**RED SUMINISTRO DE AGUA FRÍA**						
10,01		TUBERIA PVC P 3" RDE 21 (Incluye accesorios suministros e instalación)	ML	$57.401,00	119,40	$ 6.853.679,40	-	$ -
10,02		RED SUMINISTRO PVC 21/2"	ML	$53.613,00	176,87	$ 9.482.531,31	-	$ -
10,03		RED SUMINISTRO PVC 2"	ML	$34.577,00	0,00	$ -	-	$ -
10,04		RED SUMINISTRO PVC 11/2"	ML	$24.424,00	82,58	$ 2.016.933,92	-	$ -
10,05		TUBERIA PVC P 1 1/4" RDE 21 (Incluye accesorios suministros e instalación)	ML	$17.111,00	0,00	$ -	-	$ -
10,06		RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	$15.280,00	286,90	$ 4.383.832,00	-	$ -
10,07		RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	$9.213,00	0,00	$ -	-	$ -
10,08		RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	$11.472,00	0,00	$ -	-	$ -
10,09		REGISTRO 1/2"	UN	$63.092,00	12,00	$ 757.104,00	-	$ -
10,10		LLAVE MANGUERA	UN	$38.255,00	12,00	$ 459.060,00	-	$ -
		SUBTOTAL				**$ 23.953.140,63**		**$ -**
11		**PUNTOS HIDRAÚLICOS DEAGUA FRIA h max 2,50m**						
11,01		PUNTO AF LLAVE MANGUERA (incluye suministros e instalaciones)	UN	$34.443,00	0,00	$ -	-	$ -
11,02		PUNTO AF LAVADO DEPIES (Incluye suministros e instalaciones)	UN	$36.794,00	1,00	$ 36.794,00	-	$ -
11,03		PUNTO AF DISPENSADOR DE AGUA (Incluye suministros e instalaciones)	UN	$34.443,00	0,00	$ -	-	$ -
		SUBTOTAL				**$ 36.794,00**		**$ -**
12		**REDES ELÉCTRICAS**						
12,1		**RED DE ENERGIA**						
12.1.01		4 DUCTOS D=3" PVC-TDP(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS) NORMA CS209.	ML	$73.759,00	50,00	$ 3.687.950,00	-	$ -
12.1.02		4 DUCTOS D=4" PVC-TDP(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS) NORMA CS209.	ML	$88.688,00	130,10	$ 11.538.308,80	-	$ -
12.1.03		6 DUCTOS D=6" PVC-TDP(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS). NORMA CS212.	ML	$293.179,00	29,00	$ 8.502.191,00	-	$ -
12.1.04		CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274(ZVERDE. INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPA). MEDIDAS EXTERNAS: 0.90 X 0.90M. MEDIDAS INTERNAS: 0.60X 0.60M. ALTURA: 0.93M.	UN	$521.297,00	64,00	$ 33.363.008,00	-	$ -
		CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA						

			MEDIDAS INTERNAS: 1.19 X 0.69M. ALTURA: 1.37M.						
12.1.06			CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276 (ZVERDE.INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPAS). MEDIDAS EXTERNAS: 1.79 X 1.49M. MEDIDAS INTERNAS: 1.49 X 1.19M. ALTURA: 1.22M.	UN	$1.255.733,00	6,00	$ 7.534.398,00	-	$ -
12.1.07			TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	$431.487,00	0,00	$ -	-	$ -
12.1.08			MALLA DE PUESTA ATIERRA PARA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN SUBTERRÁNEO RED DISTRIBUCIÓN O ALUMBRADO PUBLICO, RESISTIVIDAD DE TERRENODE 42.42 O-M. (INCLUYESISTEM INSTALACIÓN).A DE PUESTA A TIERRA, POZOS CAPACITIVOS, TRATAMIENTO DE SUELOTIPO HIDROSOLTA, CABLE 2/0 CU DESNUDO, CONECTORES CERTIFICADOS.) (INCLUYE SUMINISTRO E	UN	$3.944.905,00	0,00	$ -	-	$ -
12.1.09			SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA AP Y EMPALME DE DERIVACIÓN RESINA (Incluye suministros e instalación)	UN	$2.476.732,00	0,00	$ -	-	$ -
12.1.10			CABLE ELÉCTRICO 2X8 AWG PARA ACOMETIDATIPO ST CU 600V 75°C. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	ML	$14.917,00	225,84	$ 3.368.855,28	-	$ -
12.1.11			RED SUBTERRANEA 1x2+1x2 ALUMINIO 600V THW AWG (Incluye suministro e instalación).	ML	$40.331,00	225,84	$ 9.108.353,04	-	$ -
12.1.12			RED SUBTERRANEA 3x185mm2 ALUMINIO XLPE 15kV (Incluye suministro e instalación).	ML	$181.609,00	60,00	$ 10.896.540,00	-	$ -
12.1.13			SUBESTACIÓN SEMISUMERGIBLE DE 150 KVA 13200/208-120V, CAJA DE MANIOBRA ENTRADA Y SALIDA DE 3VÍAS 600A 15 KV (Incluye suministro, transporte, accesorios e instalación). Norma CODENSA CTS 534.	UN	$30.188.596,00	0,00	$ -	-	$ -
			SUBTOTAL				$ 93.307.132,12		$ -
12,2			RED DE ALÚMBRADO PÚBLICO						
12.2.01			2 DUCTOS D=3" PVC-TDP(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS)	ML	$36.680,00	1.101,51	$ 40.403.386,80	-	$ -

		BASE SEGÚN NORMA AP802)						
12.2.04		POSTE METALICO AP, H=12M (INC. SUMINISTRO, IZAJE, APLOMADO E INSTALACIÓN. INC. BRAZOSENCILLO Y BASE SEGÚN NORMA AP802)	UN	$3.534.657,00	0,00	$ -	-	$ -
12.2.05		POSTE METALICO H=24M.INCLUYE CANASTILLA Y BRAZO SENCILLO. (INC. SUMINISTRO, IZAJE, APLOMADO E INSTALACIÓN. INC. BRAZOSENCILLO Y BASE EN CONCRETO Y BASE GRANULAR B-600)	UN	$11.757.090,00	4,00	$ 47.028.360,00	-	$ -
12.2.06		LUMINARIA REF.: OMEGA I MP 48 LED. 4000K. T07.28W 3.541 LM. 120/277V. 50.000 HORAS.	UN	$536.121,00	0,00	$ -	-	$ -
12.2.07		LUMINARIA REF.: OMEGAMP II 128 LED . NW. 4000K.T02. 70W 9.668 Lúmenes. 120/277V. 100.000 HORAS. IP66. SPD 10KV-10KA. MARCA ROY ALPHA. Con Base para Fotocelda y Fotocelda y brazo de 0,5 mx 11/2". GARANTIA: 5AÑOS.	UN	$1.022.312,00	0,00	$ -	-	$ -
12.2.08		REFLECTOR TAYRONA LEDI I92 LED. P04 5000K.103W 14.344 Lúmenes. IRC 80 120/277V. 50.000HORAS. IP66. MARCA ROY ALPHA. Garantía: 5 AÑOS.	UN	$1.090.877,00	0,00	$ -	-	$ -
12.2.09		REFLECTOR TAYRONA LEDII 320 LED. P04 170W 24.297 Lúmenes. 120/277V. SPD 10KV- 10KA. CTRL 0-10V 50.000 Horas. 5000K. IRC 80 MARCA: ROY ALPHA. GARANTIA: 5 AÑOS	UN	$1.253.134,00	0,00	$ -	-	$ -
12.2.10		Proyector H bay de 960W124.000 Lúmenes IP664000K Y/O 6.500K DRIVER MULTIVOLTAJE 120- 277V.CTRL 0-10V VIDAUTIL PROMEDIO: 100.000 HORAS. GARANTIA: 7 AÑOS. A 15°	UN	$10.070.942,00	8,00	$ 80.567.536,00	-	$ -
12.2.11		Proyector H bay de 960W124.000 Lúmenes IP664000K Y/O 6500K DRIVERMULTIVOLTAJE 120-277V. VIDA UTIL PROMEDIO :100.000 HORAS. CTRL O- 1OV. GARANTIA : 7 AÑOS.A 30°	UN	$10.077.467,00	52,00	$ 524.028.284,00	-	$ -
12.2.12		LUMINARIA HERMETICA DE ALTO RENDIMIENTO121 CMS IP65 40W 4.969 Lúmenes . 120/277V. 100.000 HORAS. Garantias: 7 años. MARCA. ROY ALPHA.	UN	$275.468,00	0,00	$ -	-	$ -

		SUBTOTAL				$ 692.027.566,80		$ -
	I)	A. COSTO TOTAL PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES OBRA				5.020.252.816,01		339.343.012,91
		ADMINISTRACION	26,00%			$ 1.305.265.732,16		88.229.183,00
		IMPREVISTOS	2%			$ 100.405.056,32		6.786.860,00
		UTILIDAD	5%			$ 251.012.640,80		16.967.151,00
		B. COSTO TOTAL PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES OBRA CON A.I.U				$ 6.676.936.245,29		451.326.206,91
		VALOR TOTAL DEL PROYECTO (A+B)				$ 6.676.936.245,29		451.326.206,91
		ITEMS NO PREVISTOS MODIFICATORIO No.1						
NP-01	ICCU VIAS 2.10 600,1	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	M3	$77.321,00	10.191,22	$ 787.995.321,62	-	$ -
NP-02	ICCU VIAS 450,1 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	$1.090.541,00	118,08	$ 128.771.081,28	-	$ -
NP-03		Shockpad Refosport 16 mm	M2	$108.500,00	7.362,24	$ 798.803.040,00	1.466,13	$ 159.075.105,00
NP-04	IDRD 11460	CarcamoT-2 2500 psi+Rejilla Peat.Conc.Ref. (canal) seccion de 35x40x100	ML	$269.269,36	640,00	$ 172.332.390,40	616,00	$ 165.869.925,76
NP-05	ICCU 4,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2100 (ESTABILIZACIÓN,FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	$11.764,00	7.362,24	$ 86.609.391,36	-	$ -
NP-06	ICCU 4.59	FILTRO LATERAL DE VIA ALVEOLAR IMPERMEABLE	ML	$107.220,00	354,00	$ 37.955.880,00	42,60	$ 4.567.572,00
NP-07	IDRD 11646	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	ml	$27.272,67	945,84	$ 25.795.582,19	344,07	$ 9.383.707,57
NP-08	IDRD 16766	CerramMallaEslaCal10 h=2.5+Malla Nylonh=2.5	ml	$971.171,87	353,81	$ 343.610.319,32	353,81	$ 343.610.319,32
NP-09	IDRD COD 16678	PISO CAUCHO RECICLADO 6CM (EPDM 1CM +SBR 5CM SUM+INST) COD IRD 16678	M2	$693.139,00	407,17	$ 282.225.406,63	-	$ -
NP-10	COTIZACIONES	RECUBRIMIENTO SINTETICO SPORT MASTER PARA CAMPOS MULTIPLES	M2	$125.716,46	1.883,41	$ 236.775.637,93	-	$ -
NP-11	ICCU 5,5.1.	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	M2	$95.790,00	2.150,42	$ 205.988.731,80	-	$ -
NP-12	IDRD CIO 106048	Juegocuerdaspoliedro 5-12añosCap:40niñosH=4.5m	UND	$227.305.370,00	1,00	$ 227.305.370,00	-	$ -
NP-13	IDRD CIO 106849	JUEGO COLUMPIO MULTIPLE 9 U(2+añosCap:9 niñosH=2.6	UND	$95.628.847,00	1,00	$ 95.628.847,00	-	$ -
NP-14	IDRD CIO 100575	Juego gran escala circuito 3a5 años cap: 61 niños	UND	$596.957.187,00	1,00	$ 596.957.187,00	-	$ -
NP-15	IDRD CIO 101275	Juego Muelle Paneles laterales Animal2+años Cap4	UND	$21.125.320,00	1,00	$ 21.125.320,00	-	$ -
NP-16	IDRD CIO 106003	Juego muro escalar trepar deslizar:2-8AñosCap:5niñ	UND	$57.917.342,99	1,00	$ 57.917.342,99	-	$ -

NP-20	ICCU 5.5.15	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	$129.013,00	0,00	$ -	-	$ -
	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				$ 4.278.710.026,52		682.506.629,65
		ADMINISTRACION		26%		$ 1.112.464.606,90		177.451.724,00
		IMPREVISTOS		2%		$ 85.574.200,53		13.650.133,00
		UTILIDAD		5%		$ 213.935.501,33		34.125.331,00
		B. COSTO TOTAL PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES OBRA CON A.I.U				$ 5.690.684.335,28		907.733.817,65
		VALOR TOTAL DEL PROYECTO (A+B)				**$ 5.690.684.335,28**		**907.733.817,65**
		TOTALES DEL CONTRATO						
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				$ 9.298.962.843,00		$ 1.021.849.642,56
		ADMINISTRACION		26%		$ 2.417.730.339,18		$ 265.680.907,07
		IMPREVISTOS		2%		$ 185.979.256,86		$ 20.436.992,85
		UTILIDAD		5%		$ 464.948.142,15		$ 51.092.482,13
		B. COSTO TOTAL PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES OBRA CON A.I. U				**$ 12.367.620.581,19**		**$ 1.359.060.024,61**
		VALOR TOTAL DEL PROYECTO (A+B)				$ 12.367.620.581,19		$ 1.359.060.024,61
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO				$ 12.367.620.581,19		$ 1.359.060.024,61
		VALOR APROBADO DEL CONTRATO				**$ 12.367.620.581,19**		**$ 1.359.060.024,61**

- **PERIODO ACTA PARCIAL No.3: ENTRE EL 26 DE FEBRERO DE 2024 AL 07 DE JUNIO DE 2024**
- **AVANCE ACTA PARCIAL No.3: 11.00%**
- **AVANCE ACUMULADO: 53.37%**

NOTA-1: El valor a cancelar en la presente acta es de **mil trescientos cincuenta y nueve millones sesenta mil veinticuatro pesos m/cte ($ 1.359.060.024,61)**

NOTA-2: El valor establecido en la presente acta se encuentra acorde con lo estipulado en la CLÁUSULA SEXTA (VALOR DEL CONTRATO) la cual establece (...) *El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.*

NOTA-3: El valor establecido en la presente acta se encuentra acorde con lo estipulado en la CLÁUSULA DECIMA PRIMERA (FORMA Y REQUISITOS DE PAGO) la cual establece (...) *El valor del contrato será cancelado al contratista de la siguiente manera: El valor del contrato será cancelado al contratista de la siguiente manera: La Entidad cancelará al Contratista mediante pagos parciales de acuerdo a las cantidades de obra ejecutadas dentro del término de ejecución del contrato aprobadas por la Interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato*

NOTA-4: Las cantidades de obra y memorias de cálculo del acta parcial de obra No.3 son de acuerdo al informe descrito en el oficio R-2024-16189 ID: 398305 DE 18-06-2024, y OFICIO R-2024-16187 ID: 398294 fechado el 18-06-2024 por parte de la interventoría,

ESTADO JURÍDICO

DESCRIPCIÓN	HUBO	NO HUBO	OBSERVACIONES
MODIFICATORIO	X		
SUSPENSIONES		X	
REINICIO		X	
PRORROGAS	X		
MULTAS		X	
DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO		X	
ADICIONES	X		
CADUCIDAD		X	

ESTADO FINANCIERO

RELACION DE ACTAS:

DOCUMENTO	VALOR ACTA ANTERIOR	VALOR ACTA	SALDO
ACTA No.1: INICIO			$ 8.370.631.493,49
ACTA No. 02: FIJACION DE ITEMS NO PREVISTOS Y PACTACION DE PRECIOS No.1			$ 8.370.631.493,49
ACTA No. 03: MODIFICACIÓN No. 01 MAYORES Y MENORES CANTIDADES			$ 8.370.631.493,49
ACTA No. 04: PAGO PARCIAL No. 01: ENTRE EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		$ 3.806.993.304,93	$ 4.563.638.188,56
ACTA No. 05: FIJACION DE ITEMNS NO PREVISTOS Y PACTACION DE PRECIOS No.2			$ 4.563.638.188,56
ACTA No. 06: MODIFICACION No 02 MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS Y ADICION No. 01	$ 3.806.993.304,93	$ 3.996.989.087,91	$ 8.560.627.276,26
ACTA No.07: PAGO PARCIAL No.2: ENTRE EL 16 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 25 DE FEBRERO DE 2024	$ 3.806.993.304,93	$ 1.434.707.500,05	$ 7.125.919.776,21
ACTA No.08: PRORROGA No.01			$ 7.125.919.776,21
ACTA No.09: PAGO PARCIAL No.3: ENTRE EL 26 DE FEBRERO DE 2024 AL 07 DE JUNIO DE 2024	$ 1.434.707.500,05	$ 1.359.060.024,61	$ 5.766.859.751,60

RESUMEN DE ACTAS:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 8.370.631.493,49**
VALOR ADICION No.1:	**$ 3.996.989.087,91**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$ 12.367.620.581,19**
VALOR ACTA PARCIAL No.1	**$ 3.806.993.304,93**
VALOR ACTA PARCIAL No.2	**$ 1.434.707.500,05**
VALOR ACTA PARCIAL No.3 – PRESENTE ACTA	**$ 1.359.060.024,61**
VALOR EJECUTADO	**$ 6.600.760.829,59**
SALDO PENDIENTE	**$ 5.766.859.751,60**

No siendo otro el objeto de la presente se firma en Fusagasugá, a los DOS (02) días del mes de JULIO del año dos mil veinticuatro (2024).

FIRMAS

CONTRATISTA	INTERVENTORIA	SUPERVISOR
CONSORCIO DEPORTIVO 2023 **NIT. 901771549-7** R.L. LUIS GABRIEL FARFÁN VELÁSQUEZ. **C.C 79.584.718 DE BOGOTÁ D.C.**	**R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS** **NIT. 830.028.126-2** **R.L.** CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ **C.C. 19.275.138 DE BOGOTA D.C.**	**ING. RAUL ARANGUREN MARTINEZ** Secretario de Infraestructura
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:

GESTIÓN DOCUMENTAL:
Original: Dirección de Contratación
Nombre del archivo sistematizado:
Proyectó: Ing. José Melco Jiménez Cruz – Profesional Universitario - Secretaria De Infraestructura
Revisó: Ing. Raúl Aranguren Martínez – Secretario De Infraestructura

CIUDAD:	FUSAGASUGA	**FECHA INFORME**	**02**	**07**	**2024**	**INFORME**			**03**	
CONTRATO	2023-0667	**FECHA SUSCRIPCION CONTRATO**				**16**	**06**		**2023**	
OBJETO DEL CONTRATO	**"EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 DE 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".**									
PLAZO INICIAL	Nueve (9) meses a partir de la fecha de inicio	**FECHA INICIO**	**06**	**09**	**2023**	**FECHA DE TERMINACION**	**05**	**06**	**2024**	
PRORROGA No.1	Cuatro (04) meses	**FECHA INICIO**	**05**	**06**	**2024**	**FECHA DE TERMINACION**	**05**	**10**	**2024**	
VALOR DEL CONTRATO	**OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($8.370.631.493,49) MCTE**									
VALOR ADICION No. 01	**TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS. ($ 3.996.989.087,91) M/TCE**									
VALOR FINAL	**DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS ($ 12.367.620.581,19) M/TCE**									
CONTRATISTA	**CONSORCIO DEPORTIVO 2023 NIT: 901771549-7 ING. LUIS GABRIEL FARFÁN VELÁSQUEZ. C.C 79.584.718 DE BOGOTÁ D.C.**									
INTERVENTORIA	**R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS NIT. 830.028.126-2 R.L CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ C.C. 19.275.138 DE BOGOTA D.C.**									
SUPERVISOR	**RAUL ARANGUREN MARTINEZ – Secretario de Infraestructura**									

En el Municipio de Fusagasugá, a los DOS (02) días del mes de JULIO del año 2024, se reunieron en la Secretaria De Infraestructura del municipio de Fusagasugá, el **ING. RAUL ARANGUREN MARTINEZ** en calidad de **SUPERVISOR** y el **ING. JOSE MELCO JIMENEZ CRUZ** en calidad de apoyo a la supervision, con el fin se suscribir el presente **INFORME No. 03** de acuerdo a las siguientes cantidades ejecutadas y de *conformidad con lo establecido en el contrato y las actividades desplegadas para garantizar su correcta ejecución, certifican e informan:*
De acuerdo a lo establecido en la parte contractual, la Administración Municipal a través de la Secretaría de Infraestructura recibió, reviso, verifico y avalo los siguientes productos:

CANTIDADES EJECUTADAS A PAGAR ACTA No. 03

CONTRATO OBRA PUBLICA No.2023-0667				CONDICIONES CONTRACTUALES	CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.2		ACTA PARCIAL No. 3	
ITEM	**ITEM ICCU**	**DESCRIPCION**	**UND**	**VALOR UNITARIO**	**CANT**	**VR. PARCIAL DIRECTO**	**CANT**	**VR. Parcial Directo**
1		**PRELIMINARES**						
1.10		**PRELIMINARES**						
1.1.01		**DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M**	**M2**	**$1.527,00**	**33.836,28**	**$ 51.667.999,56**	**7.373,53**	**$ 11.259.380,31**
1.1.02		TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	$1.300,00	5.891,40	$ 7.658.820,00	-	$ -

		SUBTOTAL				$ 491.656.324,28		$ -
3		ESTRUCTURAS						
3,1		CIRCULACIÓN Y PERMANENCIA						
3.1.1		PISOS						
3.1.1.01		RELLENO TIPO 4 "SUBBASEB-200"	M3	$87.728,00	0,00	$ -	-	$ -
3.1.1.02		**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)**	**M2**	**$9.549,00**	**7.990,70**	$ 76.303.194,30	7.268,02	$ 69.402.322,98
3.1.1.03		SUBBASE GRANULAR	M3	$170.944,00	3.542,94	$ 605.644.335,36	-	$ -
3.1.1.04		ANDÉN CONCRETO 3000PSI EN SITIO E=0.1M	M2	$62.959,00	1.667,17	$ 104.963.356,03	-	$ -
3.1.1.05		CONCRETO 3000 PSI	M3	$439.638,00	309,77	$ 136.186.663,26	-	$ -
3.1.1.06		RELLENO GRAVILLA DE RÍO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	$98.043,00	0,00	$ -	-	$ -
3.1.1.07		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1700 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	$6.427,00	0,00	$ -	-	$ -
3.1.1.08		RELLENO TIPO 7 "ARENADE PEÑA"	M3	$107.689,00	0,00	$ -	-	$ -
3.1.1.09		**GRAMA SINTÉTICA PARACAMPOS DEPORTIVOS**	**M2**	**$127.347,00**	**7.362,24**	$ 937.559.177,28	1.466,13	$ 186.707.257,11
3.1.1.10		**RIEGO DE IMPRIMACIÓN**	**M2**	**$4.534,00**	**9.724,24**	$ 44.089.704,16	7.267,92	$ 32.952.749,28
3.1.1.11		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	$877.156,00	0,00	$ -	-	$ -
3.1.1.12		RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2	$2.199,00	0,00	$ -	-	$ -
3.1.1.13		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	$903.931,00	0,00	$ -	-	$ -
3.1.1.14		**BORDILLO PREFABRICADO A-80**	**ML**	**$70.885,00**	**3.222,76**	$ 228.445.342,60	283,15	$ 20.071.087,75
3.1.1.15		SISTEMA BICAPA O SÁNDWICH CON ESTRUCTURA GRANULADA, ANTIDESLIZANTE E IMPERMEABLE FUNDIDA EN SITIO CON PROTECCIÓN UV Y RESISTENTE A LOS CLAVOS, CUMPLE CON NORMAS DIN EN 14877 YDIN 18035-6. ESPESOR 13 MM, CONSISTE DE IMPRIMACIÓN CON VIASOL EP-P210, 1 CAPAELASTICA DE 10 A 12 MM DE SBR 1 A 4 MM, CAPA DE TAPAPOROS Y UNA CAPA DE 3 A 5MM VERTIDA Y ESTRUCTURADA DE EPDM1 A 4 MM DE COLOR ROJO.INCLUYE RECUBRIMIENTO EN PISTA Y CARRILES DE SALTO TRIPLE PARA PISTA ATLÉTICA CERTIFICADA. (Incluye suministros e instalación)	M2	$413.168,00	2.361,75	$ 975.799.524,00	-	$ -
		RECUBRIMIENTO SINTÉTICO COLOR PAVE (Incluye						

3.2.02			EQUIPO PARA PISTA DE ATLETISMO (Incluye suministros 4 obstáculos y17 tacos de salida)	UN	$90.598.364,00	1,00	$ 90.598.364,00	-	$ -
3.2.03			FOSO DE ARENA PARASALTO LARGO Y SALTOTRIPLE (Incluye cantonera final y arena de sílice al99%)	UN	$21.064.211,00	2,00	$ 42.128.422,00	-	$ -
			SUBTOTAL				$ 141.758.354,00		**$ 9.031.568,00**
4			**PAISAJISMO**						
4,01			EMPRADIZACIÓN CON BIOMANTO NATURAL	M2	$28.594,00		$ -	-	$ -
			SUBTOTAL				$ -		$ -
5			**EDIFICACIONES**						
5,1			**RED SUMINISTRO DE AGUA FRÍA**						
5.1.01			RED SUMINISTRO PVC 2"	ML	$34.577,00	0,00	$ -	-	$ -
5.1.02			RED SUMINISTRO PVC 11/2"	ML	$24.424,00	13,00	$ 317.512,00	-	$ -
5.1.03			TUBERIA PVC P 1 1/4" RDE 21 (Incluye accesorios suministros e instalación)	ML	$17.111,00	9,00	$ 153.999,00	-	$ -
5.1.04			RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	$15.280,00	31,00	$ 473.680,00	-	$ -
5.1.05			RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	$9.213,00	129,00	$ 1.188.477,00	-	$ -
5.1.06			RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	$11.472,00	36,00	$ 412.992,00	-	$ -
5.1.07			REGISTRO DE 1 1/4" (Incluye accesorios, suministros e instalación)	UN	$213.835,00	2,00	$ 427.670,00	-	$ -
5.1.08			REGISTRO 1 1/2"	UN	$191.086,00	1,00	$ 191.086,00	-	$ -
5.1.09			REGISTRO 3/4"	UN	$79.783,00	2,00	$ 159.566,00	-	$ -
5.1.10			REGISTRO 1/2"	UN	$63.092,00	2,00	$ 126.184,00	-	$ -
5.1.11			LLAVE MANGUERA	UN	$38.255,00	0,00	$ -	-	$ -
			SUBTOTAL				**$ 3.451.166,00**		$ -
6			**PUNTOS HIDRÁULICOS DEAGUA FRÍA**						
6,01			PUNTO AF REGADERA (Incluye suministros e instalaciones)	UN	$177.836,00	0,00	$ -	-	$ -
6,02			PUNTO AF LLAVE MANGUERA (Incluye suministros e instalaciones)	UN	$34.443,00	15,00	$ 516.645,00	-	$ -
6,03			PUNTO AF DISPENSADOR DE AGUA (Incluye suministros e instalaciones)	UN	$34.443,00	6,00	$ 206.658,00	-	$ -
6,04			REGISTRO 1/2"	UN	$70.101,00	0,00	$ -	-	$ -
			SUBTOTAL				**$ 723.303,00**		$ -
7			**RED SANITARIA**						
7,01			EXCAVACIÓN MANUAL ENMATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	M3	$48.721,00	19,00	$ 925.699,00	-	$ -
7,02			RELLENO TIPO 7 "ARENADE PEÑA"	M3	$107.689,00	6,38	$ 687.055,82	-	$ -
7,03			RELLENO TIPO 2 "RECEBO"	M3	$79.419,00	15,30	$ 1.215.110,70	-	$ -

7,09		RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	$56.742,00	0,00	$ -	-	$ -
7,10		SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN	$74.391,00	5,00	$ 371.955,00	-	$ -
7,11		SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UN	$79.451,00	11,00	$ 873.961,00	-	$ -
7,12		CAJA DE INSPECCIÓN DE60X60	UN	$274.171,00	6,00	$ 1.645.026,00	-	$ -
7,13		REVENTILACIÓN 2"	ML	$19.248,00	27,00	$ 519.696,00	-	$ -
7,14		SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN	$74.391,00	12,00	$ 892.692,00	-	$ -
7,15		SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UN	$97.502,00	10,00	$ 975.020,00	-	$ -
		SUBTOTAL				**$ 12.606.688,07**		**$ -**
8		**RED PLUVIAL**						
8,01		EXCAVACIÓN MANUAL ENMATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DESOBRANTES A UNADISTANCIA MENOR DE 5KM)	M3	$48.721,00	107,57	$ 5.240.917,97	-	$ -
8,02		RELLENO TIPO 7 "ARENADE PEÑA"	M3	$107.689,00	44,82	$ 4.826.620,98	-	$ -
8,03		RELLENO TIPO 2 "RECEBO"	M3	$79.419,00	64,54	$ 5.125.702,26	-	$ -
8,04		RELLENO CON MATERIALDE EXCAVACIÓN	M3	$20.799,00	32,27	$ 671.183,73	-	$ -
8,05		RELLENO TIPO 1"GRAVILLA"	M3	$84.906,00	43,03	$ 3.653.505,18	-	$ -
8,06		RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	$51.069,00	55,50	$ 2.834.329,50	-	$ -
8,07		RED SANITARIA PVC-S 6"	ML	$93.407,00	0,00	$ -	-	$ -
8,08		SALIDA AGUAS LLUVIAS ACANAL DE 4" (Incluye codo90, suministros e instalación)	UN	$61.452,00	0,00	$ -	-	$ -
8,09		SALIDA AGUAS LLUVIAS ACANAL DE 6" (Incluye codo90, suministros e instalación)	UN	$166.780,00	0,00	$ -	-	$ -
8,10		**TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 6"_160MM (Incluye suministros e instalación)**	**ML**	**$40.132,00**	**349,59**	**$ 14.029.745,88**	**210,89**	**$ 8.463.437,48**
8,11		TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"	ML	$72.433,00	23,40	$ 1.694.932,20	-	$ -
8,12		TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12"	ML	$104.270,00	35,64	$ 3.716.182,80	-	$ -
8,13		TUBERIA PVCLCANTARILLADO 14"_355MM (Incluye suministros e instalación)	ML	$152.314,00	0,00	$ -	-	$ -
8,14		TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	$29.468,00	0,00	$ -	-	$ -
8,15		TUBERÍA DRENAJE PVC 200	ML	$61.267,00	0,00	$ -	-	$ -
8,16		SUMINISTRO EINSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	$7.569,00	0,00	$ -	-	$ -
8,17		CAJA DE INSPECCIÓN DE40X40	UN	$241.560,00	0,00	$ -	-	$ -
8,18		CAJA DE INSPECCIÓN DE80X80	UN	$395.145,00	0,00	$ -	-	$ -
8,19		**CAJA DE INSPECCIÓN DE100X100**	**UN**	**$485.070,00**	**10,00**	**$ 4.850.700,00**	**3,0**	**$ 1.455.210,00**
		CANAL ACO SPORT DEDRENAJE EN						

8,22			CANAL ACO ENPOLICONCRETO_N150_H31 + REJILLA(Incluye suministros, excavación, rellenos, mano de obra para su instalación)	ML	$542.697,00	0,00	$ -	-	$ -
8,23			CONCRETO 4000 PSI	M3	$456.485,00	3,30	$ 1.506.400,50	-	$ -
8,24			ACERO FIGURADO 60000PSI	KG	$7.588,00	100,89	$ 765.553,32	-	$ -
			SUBTOTAL				**$ 48.915.774,32**		**$ 9.918.647,48**
9			**RED GENERAL DE SUMINISTRO**						
9,1			**ACOMETIDA MEDIDOR YLLENADO DE TANQUE**						
9.1.01			EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	M3	$48.721,00	6,49	$ 316.199,29	-	$ -
9.1.02			RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	$20.799,00	3,24	$ 67.388,76	-	$ -
9.1.03			RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	$107.689,00	2,70	$ 290.760,30	-	$ -
9.1.04			RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	$11.472,00	16,80	$ 192.729,60	-	$ -
9.1.05			RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	$9.213,00	9,26	$ 85.312,38	-	$ -
9.1.06			ACOMETIDA DE 1/2" (Incluye suministros e instalación de accesorios y medidor)	UN	$211.416,00	0,00	$ -	-	$ -
9.1.07			FLOTADOR MECANICO DE1/2" (Incluye suministro e instalación)	UN	$99.516,00	2,00	$ 199.032,00	-	$ -
9.1.08			CAJA CONTADOR DE AGUA	UN	$80.601,00	1,00	$ 80.601,00	-	$ -
			SUBTOTAL				**$ 1.232.023,33**		**$ -**
9,2			**TANQUE**						
9.2.01			EXCAVACIÓN MANUAL ENMATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	M3	$48.721,00	28,00	$ 1.364.188,00	-	$ -
9.2.02			RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	$84.621,00	19,60	$ 1.658.571,60	-	$ -
9.2.03			RELLENO TIPO 4 "SUBBASEB-200"	M3	$78.956,00	2,80	$ 221.076,80	-	$ -
9.2.04			SUBBASE GRANULAR	M3	$170.944,00	16,80	$ 2.871.859,20	-	$ -
9.2.05			PLACA EN CONCRETO DE 24 MPa, e=0.15 m (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y VIBRADO.NO INCLUYE ACERO)	M2	$147.052,00	56,00	$ 8.234.912,00	-	$ -
9.2.06			REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	$9.522,00	74,48	$ 709.198,56	-	$ -
9.2.07			CORTE PARA JUNTA DEDILATACIÓN EN PISO DECONCRETO AL 1/3 DEL ESPESOR DE LA PLACA (INCLUYE EQUIPOS Y MANO DE OBRA PARA EJECUCIÓN)	ML	$1.798,00	113,00	$ 203.174,00	-	$ -
9.2.08			SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	$7.699,00	113,00	$ 869.987,00	-	$ -

9.2.11		VÁLVULA MARIPOSA 3"	UN	$659.205,00	3,00	$ 1.977.615,00	-	$ -
9.2.12		RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	$11.472,00	10,00	$ 114.720,00	-	$ -
9.2.13		RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	$15.280,00	17,00	$ 259.760,00	-	$ -
9.2.14		REGISTRO 3/4"	UN	$79.783,00	2,00	$ 159.566,00	-	$ -
9.2.15		UNIÓN UNIVERSAL PVC3"(Incluye suministro e instalación)	UN	$56.069,00	2,00	$ 112.138,00	-	$ -
9.2.16		VÁLVULA CHEQUE DE 3" (Incluye suministro e instalación)	UN	$296.695,00	0,00	$ -	-	$ -
9.2.17		VÁLVULA DE BOLA METÁLICA 1" (Suministro e instalación)	UN	$40.835,00	1,00	$ 40.835,00	-	$ -
9.2.18		UNIÓN UNIVERSAL PVC1"(Incluye suministro e instalación)	UN	$18.396,00	2,00	$ 36.792,00	-	$ -
9.2.19		UNIÓN UNIVERSAL PVC3/4"(Incluye suministro e instalación)	UN	$15.387,00	1,00	$ 15.387,00	-	$ -
9.2.20		VÁLVULA CHEQUE DE 3/4" (Incluye suministro e instalación)	UN	$53.100,00	1,00	$ 53.100,00	-	$ -
		SUBTOTAL				**$ 76.189.316,16**		**$ -**
10		**RED SUMINISTRO DE AGUA FRÍA**						
10,01		TUBERIA PVC P 3" RDE 21 (Incluye accesorios suministros e instalación)	ML	$57.401,00	119,40	$ 6.853.679,40	-	$ -
10,02		RED SUMINISTRO PVC 21/2"	ML	$53.613,00	176,87	$ 9.482.531,31	-	$ -
10,03		RED SUMINISTRO PVC 2"	ML	$34.577,00	0,00	$ -	-	$ -
10,04		RED SUMINISTRO PVC 11/2"	ML	$24.424,00	82,58	$ 2.016.933,92	-	$ -
10,05		TUBERIA PVC P 1 1/4" RDE 21 (Incluye accesorios suministros e instalación)	ML	$17.111,00	0,00	$ -	-	$ -
10,06		RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	$15.280,00	286,90	$ 4.383.832,00	-	$ -
10,07		RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	$9.213,00	0,00	$ -	-	$ -
10,08		RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	$11.472,00	0,00	$ -	-	$ -
10,09		REGISTRO 1/2"	UN	$63.092,00	12,00	$ 757.104,00	-	$ -
10,10		LLAVE MANGUERA	UN	$38.255,00	12,00	$ 459.060,00	-	$ -
		SUBTOTAL				**$ 23.953.140,63**		**$ -**
11		**PUNTOS HIDRAÚLICOS DEAGUA FRIA h max 2,50m**						
11,01		PUNTO AF LLAVE MANGUERA (incluye suministros e instalaciones)	UN	$34.443,00	0,00	$ -	-	$ -
11,02		PUNTO AF LAVADO DEPIES (Incluye suministros e instalaciones)	UN	$36.794,00	1,00	$ 36.794,00	-	$ -
11,03		PUNTO AF DISPENSADOR DE AGUA (Incluye suministros e instalaciones)	UN	$34.443,00	0,00	$ -	-	$ -
		SUBTOTAL				**$ 36.794,00**		**$ -**
12		**REDES ELÉCTRICAS**						
12,1		**RED DE ENERGIA**						

12.1.03			6 DUCTOS D=6" PVC-TDP(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS). NORMA CS212.	ML	$293.179,00	29,00	$ 8.502.191,00	-	$ -
12.1.04			CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274(ZVERDE. INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPA). MEDIDAS EXTERNAS: 0.90 X 0.90M. MEDIDAS INTERNAS: 0.60X 0.60M. ALTURA: 0.93M.	UN	$521.297,00	64,00	$ 33.363.008,00	-	$ -
12.1.05			CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 275 (ZVERDE.INCLUYE BASE, MUROS,PAÑETE, MARCO Y TAPA). MEDIDAS EXTERNAS: 1.49 X 0.99M. MEDIDAS INTERNAS: 1.19 X 0.69M. ALTURA: 1.37M.	UN	$884.588,00	6,00	$ 5.307.528,00	-	$ -
12.1.06			CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276 (ZVERDE.INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPAS). MEDIDAS EXTERNAS: 1.79 X 1.49M. MEDIDAS INTERNAS: 1.49 X 1.19M. ALTURA: 1.22M.	UN	$1.255.733,00	6,00	$ 7.534.398,00	-	$ -
12.1.07			TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	$431.487,00	0,00	$ -	-	$ -
12.1.08			MALLA DE PUESTA ATIERRA PARA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN SUBTERRÁNEO RED DISTRIBUCIÓN O ALUMBRADO PUBLICO, RESISTIVIDAD DE TERRENODE 42.42 O-M. (INCLUYESISTEM INSTALACIÓN).A DE PUESTA A TIERRA, POZOS CAPACITIVOS, TRATAMIENTO DE SUELOTIPO HIDROSOLTA, CABLE 2/0 CU DESNUDO, CONECTORES CERTIFICADOS.) (INCLUYE SUMINISTRO E	UN	$3.944.905,00	0,00	$ -	-	$ -
12.1.09			SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA AP Y EMPALME DE DERIVACIÓN RESINA (Incluye suministros e instalación)	UN	$2.476.732,00	0,00	$ -	-	$ -
12.1.10			CABLE ELÉCTRICO 2X8 AWG PARA ACOMETIDATIPO ST CU 600V 75°C. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	ML	$14.917,00	225,84	$ 3.368.855,28	-	$ -
12.1.11			RED SUBTERRANEA 1x2+1x2 ALUMINIO 600V THW AWG (Incluye suministro e instalación).	ML	$40.331,00	225,84	$ 9.108.353,04	-	$ -
12.1.12			RED SUBTERRANEA 3x185mm2 ALUMINIO XLPE 15kV (Incluye suministro e instalación).	ML	$181.609,00	60,00	$ 10.896.540,00	-	$ -
			SUBESTACIÓN SEMISUMERGIBLE DE 150 KVA 13200/208-120V CA IA						

12.2.01		2 DUCTOS D=3" PVC-TDP(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS) NORMA CS207.	ML	$36.680,00	1.101,51	$ 40.403.386,80	-	$ -
12.2.02		POSTE METÁLICO 6M	UN	$1.330.923,00	0,00	$ -	-	$ -
12.2.03		POSTE METALICO AP, H=8M (INC. SUMINISTRO, IZAJE, APLOMADO E INSTALACIÓN. INC. BRAZOSENCILLO Y BASE SEGÚN NORMA AP802)	UN	$2.841.380,00	0,00	$ -	-	$ -
12.2.04		POSTE METALICO AP, H=12M (INC. SUMINISTRO, IZAJE, APLOMADO E INSTALACIÓN. INC. BRAZOSENCILLO Y BASE SEGÚN NORMA AP802)	UN	$3.534.657,00	0,00	$ -	-	$ -
12.2.05		POSTE METALICO H=24M.INCLUYE: CANASTILLA Y BRAZO SENCILLO. (INC. SUMINISTRO, IZAJE, APLOMADO E INSTALACIÓN. INC. BRAZOSENCILLO Y BASE EN CONCRETO Y BASE GRANULAR B-600)	UN	$11.757.090,00	4,00	$ 47.028.360,00	-	$ -
12.2.06		LUMINARIA REF.: OMEGA I MP 48 LED. 4000K. T07.28W 3.541 LM. 120/277V. 50.000 HORAS.	UN	$536.121,00	0,00	$ -	-	$ -
12.2.07		LUMINARIA REF.: OMEGAMP II 128 LED . NW. 4000K.T02. 70W 9.668 Lúmenes. 120/277V. 100.000 HORAS. IP66. SPD 10KV-10KA. MARCA ROY ALPHA. Con Base para Fotocelda y Fotocelda y brazo de 0,5 mx 11/2". GARANTIA: 5AÑOS.	UN	$1.022.312,00	0,00	$ -	-	$ -
12.2.08		REFLECTOR TAYRONA LEDI I92 LED. P04 5000K.103W 14.344 Lúmenes. IRC 80 120/277V. 50.000HORAS. IP66. MARCA ROY ALPHA. Garantía: 5 AÑOS.	UN	$1.090.877,00	0,00	$ -	-	$ -
12.2.09		REFLECTOR TAYRONA LEDII 320 LED. P04 170W 24.297 Lúmenes. 120/277V. SPD 10KV- 10KA. CTRL 0-10V 50.000 Horas. 5000K. IRC 80 MARCA: ROY ALPHA. GARANTIA: 5 AÑOS	UN	$1.253.134,00	0,00	$ -	-	$ -
12.2.10		Proyector H bay de 960W124.000 Lúmenes IP664000K Y/O 6.500K DRIVER MULTIVOLTAJE 120-277V.CTRL 0-10V VIDAUTIL PROMEDIO: 100.000 HORAS. GARANTIA: 7 AÑOS. A 15°	UN	$10.070.942,00	8,00	$ 80.567.536,00	-	$ -
12.2.11		Proyector H bay de 960W124.000 Lúmenes IP664000K Y/O 6500K DRIVERMULTIVOLTAJE 120-277V. VIDA UTIL PROMEDIO :100.000 HORAS. CTRL O-10V. GARANTIA : 7 AÑOS.A 30°	UN	$10.077.467,00	52,00	$ 524.028.284,00	-	$ -
12.2.12		LUMINARIA HERMETICA DE ALTO RENDIMIENTO121 CMS IP65 40W 4.969 Lúmenes .	UN	$375.468,00	0,00	$		$

		SUBTOTAL				**$ 692.027.566,80**		**$ -**
	I)	**A. COSTO TOTAL PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES OBRA**				5.020.252.816,01		339.343.012,91
		ADMINISTRACION	26,00%			$ 1.305.265.732,16		88.229.183,00
		IMPREVISTOS	2%			$ 100.405.056,32		6.786.860,00
		UTILIDAD	5%			$ 251.012.640,80		16.967.151,00
		B. COSTO TOTAL PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES OBRA CON A.I.U				**$ 6.676.936.245,29**		**451.326.206,91**
		VALOR TOTAL DEL PROYECTO (A+B)				**$ 6.676.936.245,29**		**451.326.206,91**
		ITEMS NO PREVISTOS MODIFICATORIO No.1						
NP-01	ICCU VIAS 2.10 600,1	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	M3	$77.321,00	10.191,22	$ 787.995.321,62	-	$ -
NP-02	ICCU VIAS 450,1 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	$1.090.541,00	118,08	$ 128.771.081,28	-	$ -
NP-03		**Shockpad Refosport 16 mm**	**M2**	**$108.500,00**	**7.362,24**	**$ 798.803.040,00**	**1.466,13**	**$ 159.075.105,00**
NP-04	**IDRD 11460**	**CarcamoT-2 2500 psi+Rejilla Peat.Conc.Ref. (canal) seccion de 35x40x100**	**ML**	**$269.269,36**	**640,00**	**$ 172.332.390,40**	**616,00**	**$ 165.869.925,76**
NP-05	ICCU 4,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2100 (ESTABILIZACIÓN,FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	$11.764,00	7.362,24	$ 86.609.391,36	-	$ -
NP-06	**ICCU 4.59**	**FILTRO LATERAL DE VIA ALVEOLAR IMPERMEABLE**	**ML**	**$107.220,00**	**354,00**	**$ 37.955.880,00**	**42,60**	**$ 4.567.572,00**
NP-07	**IDRD 11646**	**Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) ****	**ml**	**$27.272,67**	**945,84**	**$ 25.795.582,19**	**344,07**	**$ 9.383.707,57**
NP-08	**IDRD 16766**	**CerramMallaEslaCal10 h=2.5+Malla Nylonh=2.5**	**ml**	**$971.171,87**	**353,81**	**$ 343.610.319,32**	**353,81**	**$ 343.610.319,32**
NP-09	IDRD COD 16678	PISO CAUCHO RECICLADO 6CM (EPDM 1CM +SBR 5CM SUM+INST) COD IRD 16678	M2	$693.139,00	407,17	$ 282.225.406,63	-	$ -
NP-10	COTIZACIONES	RECUBRIMIENTO SINTETICO SPORT MASTER PARA CAMPOS MULTIPLES	M2	$125.716,46	1.883,41	$ 236.775.637,93	-	$ -
NP-11	ICCU 5,5.1.	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	M2	$95.790,00	2.150,42	$ 205.988.731,80	-	$ -
NP-12	IDRD CIO 106048	Juegocuerdaspoliedro 5-12añosCap:40niñosH=4.5m	UND	$227.305.370,00	1,00	$ 227.305.370,00	-	$ -
NP-13	IDRD CIO 106849	JUEGO COLUMPIO MULTIPLE 9 U(2+añosCap:9 niñosH=2.6	UND	$95.628.847,00	1,00	$ 95.628.847,00	-	$ -
NP-14	IDRD CIO 100575	Juego gran escala circuito 3a5 años cap: 61 niños	UND	$596.957.187,00	1,00	$ 596.957.187,00	-	$ -
NP-15	IDRD CIO 101275	Juego Muelle Paneles laterales Animal2+años Cap4	UND	$21.125.320,00	1,00	$ 21.125.320,00	-	$ -
NP-16	IDRD CIO 106003	Juego muro escalar trepar deslizar:2-8AñosCap:5niñ	UND	$57.917.342,99	1,00	$ 57.917.342,99	-	$ -
NP-17	IDRD CIO 109157	Juego Arenero multifuncion 2+años Cap28 niños P.N	UND	$167.723.533,00	1,00	$ 167.723.533,00	-	$ -
NP-18	IDRD CIO 105668	Mesa- ping pong en fibra de vidrio de 2.74m x1.74m	UND	$3.153.500,00	1,00	$ 3.153.500,00	-	$ -
	IDRD CIO	MESA DE AJEDREZ CON DOS	UND			$		$

	UTILIDAD	5%	$ 213.935.501,33		34.125.331,00
	B. COSTO TOTAL PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES OBRA CON A.I.U		$ 5.690.684.335,28		907.733.817,65
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO (A+B)		$ 5.690.684.335,28		907.733.817,65
	TOTALES DEL CONTRATO				
	TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)		$ 9.298.962.843,00		$ 1.021.849.642,56
	ADMINISTRACION	26%	$ 2.417.730.339,18		$ 265.680.907,07
	IMPREVISTOS	2%	$ 185.979.256,86		$ 20.436.992,85
	UTILIDAD	5%	$ 464.948.142,15		$ 51.092.482,13
	B. COSTO TOTAL PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES OBRA CON A.I. U		$ 12.367.620.581,19		$ 1.359.060.024,61
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO (A+B)		$ 12.367.620.581,19		$ 1.359.060.024,61
	VALORES TOTALES DEL CONTRATO		$ 12.367.620.581,19		$ 1.359.060.024,61
	VALOR APROBADO DEL CONTRATO		$ 12.367.620.581,19		$ 1.359.060.024,61

- **PERIODO ACTA PARCIAL No.3: ENTRE EL 26 DE FEBRERO DE 2024 AL 07 DE JUNIO DE 2024**
- **AVANCE ACTA PARCIAL No.3: 11.00%**
- **AVANCE ACUMULADO: 53.37%**

RESUMEN DE ESTADO EJECUCION CONTRATO:

No.	CAPITULOS	INICIAL	MODIFICATORIO No.1	ACTA PARCIAL No.1	ACTA PARCIAL No.2	ACTA PARCIAL No.3	AVANCE	ACUMULADO	AVANCE	POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES	$ 34.322.289,00	$ 59.326.819,56	$ 32.785.967,81	$ 12.377.541,33	$ 11.259.380,31	19%	$ 56.422.889,45	95%	$ 2.903.930,11
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS	$ 209.944.405,32	$ 491.656.324,28	$ 209.934.076,70	$ 222.362.160,87	$ -	0%	$ 432.296.237,57	88%	$ 59.360.086,71
3	ESTRUCTURAS	$ 3.836.734.425,31	$ 3.375.068.413,74	$ 1.364.771.703,38	$ 530.597.975,63	$ 309.133.417,12	9%	$ 2.204.503.096,13	65%	$ 1.170.565.317,61
4	MOBILIARIO	$ 141.758.354,00	$ 141.758.354,00	$ -	$ -	$ 9.031.568,00	6%	$ 9.031.568,00	6%	$ 132.726.786,00
5	PAISAJISMO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -
6	EDIFICACIONES	$ 3.945.295,00	$ 3.451.166,00	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ 3.451.166,00
7	PUNTOS HIDRÁULICOS DEAGUA FRÍA	$ 723.303,00	$ 723.303,00	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ 723.303,00
8	RED SANITARIA	$ 12.535.602,00	$ 12.606.688,07	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ 12.606.688,07
9	RED PLUVIAL	$ 556.387.771,82	$ 48.915.774,32	$ -	$ 11.222.771,20	$ 9.918.647,48	20%	$ 21.141.418,68	43%	$ 27.774.355,64
10	RED GENERAL DE SUMINISTRO	$ 18.355.895,00	$ 1.232.023,33	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ 1.232.023,33
11	TANQUE	$ 81.452.360,39	$ 76.189.316,16	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ 76.189.316,16
12	RED SUMINISTRO DE AGUA FRÍA	$ 35.987.994,00	$ 23.953.140,63	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ 23.953.140,63

COSTO DIRECTO	$ 6.293.707.889,84	$ 9.298.962.843,00	$ 2.862.400.981,15	$ 1.078.727.443,65	$ 1.021.849.642,560	11,00%	$ 4.962.978.067,36	53,37%	$ 4.335.984.775,17
AIU 33%	$ 2.076.923.603,65	$ 3.068.657.738,19	$ 944.592.323,78	$ 355.980.056,40	$ 338.210.382,05		$ 1.637.782.762,23		$ 1.430.874.975,81
COSTO INDIRECTO	$ 2.076.923.603,65	$ 3.068.657.738,19	$ 944.592.323,78	$ 355.980.056,40	$ 338.210.382,05		$ 1.637.782.762,23		$ 1.430.874.975,81
COSTO TOTAL	$ 8.370.631.493,49	$ 12.367.620.581,19	$ 3.806.993.304,93	$ 1.434.707.500,05	$ 1.360.060.024,61		$ 6.600.760.829,59		$ 5.766.859.750,98



NOTA-1: El valor a cancelar en la presente acta es de mil trescientos cincuenta y nueve millones sesenta mil veinticuatro pesos m/cte ($ 1.359.060.024,61) con sesenta y uno centavos.



NOTA-2: El valor establecido en la presente acta se encuentra acorde con lo estipulado en la CLÁUSULA SEXTA (VALOR DEL CONTRATO) la cual establece (...) El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.


NOTA-3: El valor establecido en la presente acta se encuentra acorde con lo estipulado en la CLÁUSULA DECIMA PRIMERA (FORMA Y REQUISITOS DE PAGO) la cual establece (...) El valor del contrato será cancelado al contratista de la siguiente manera: El valor del contrato será cancelado al contratista de la siguiente manera: La Entidad cancelará al Contratista mediante pagos parciales de acuerdo a las cantidades de obra ejecutadas dentro del término de ejecución del contrato aprobadas por la Interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato



NOTA-4: Las cantidades de obra y memorias de cálculo del acta parcial de obra No.3 son de acuerdo al informe descrito en el oficio R-2024-16189 ID: 398305 DE 18-06-2024, y OFICIO R-2024-16187 ID: 398294 fechado el 18-06-2024 por parte de la interventoría, R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS NIT. 830.028.126-2, con representación legal del señor CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ identificado con C.C No. 19.275.138 DE BOGOTA D.C.:


REGISTRO FOTOGRAFICO:

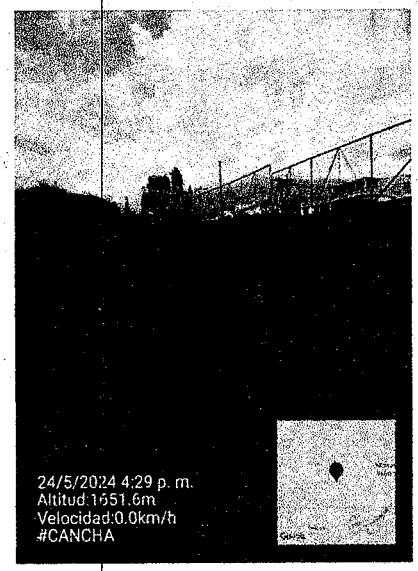
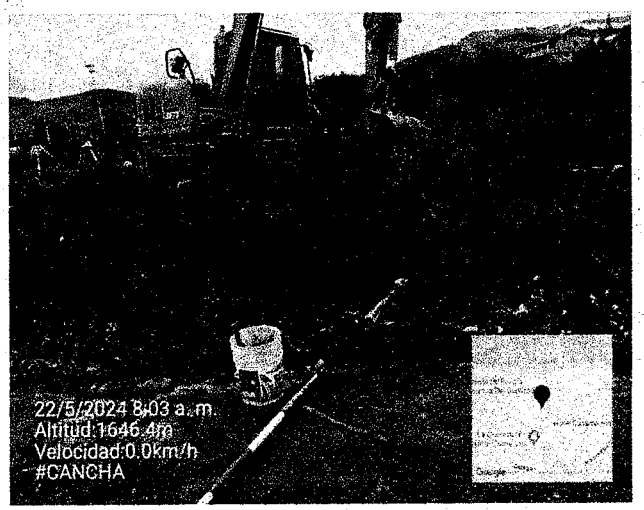
FOTOGRAFIA No.1	FOTOGRAFIA No.2
	

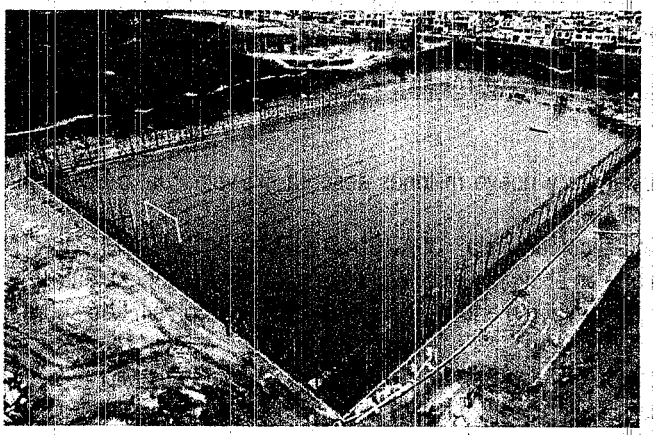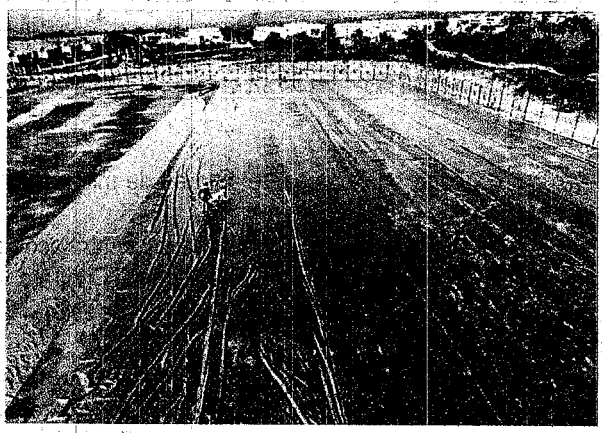FOTOGRAFIA No.3	FOTOGRAFIA No.4
	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	



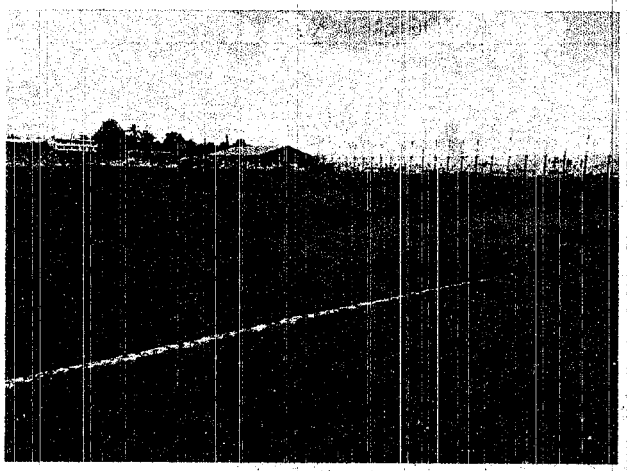
FOTOGRAFIA No.5	FOTOGRAFIA No.6
	
GRAMA SINTÉTICA PARA CAMPOS DEPORTIVOS	

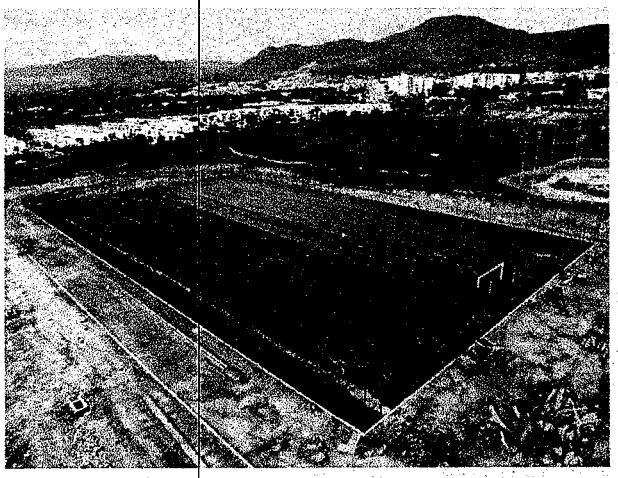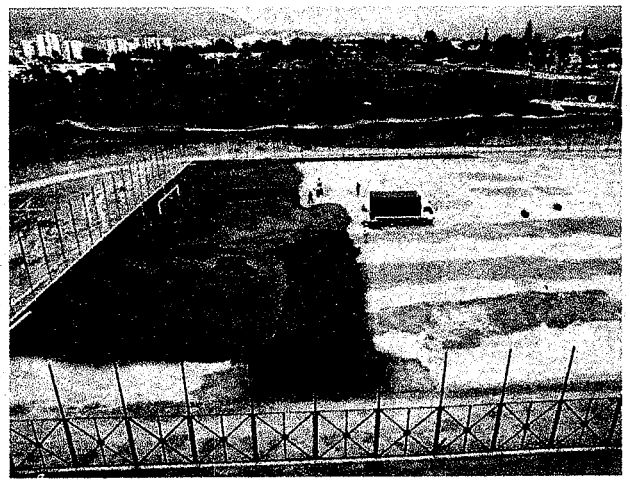FOTOGRAFIA No.7	FOTOGRAFIA No.8
	
RIEGO DE IMPRIMACIÓN	

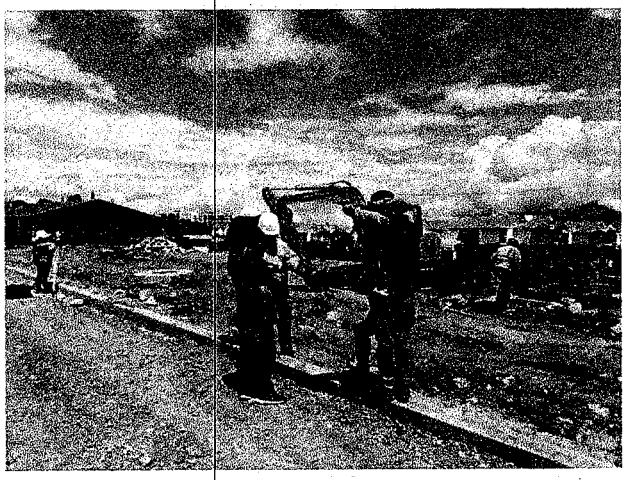FOTOGRAFIA No.9	FOTOGRAFIA No.10
	
BORDILLO PREFABRICADO A-80	

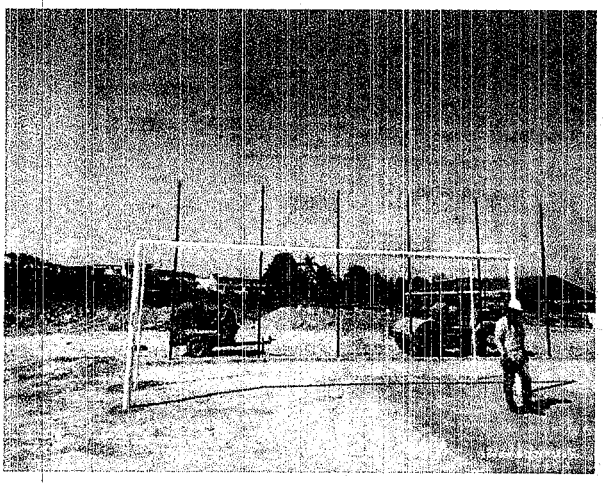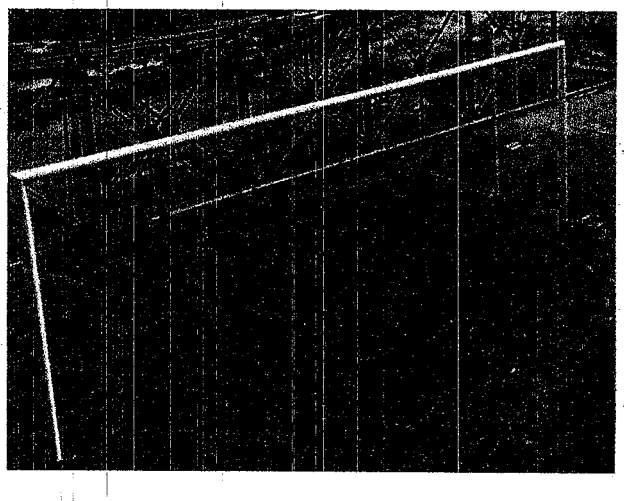
FOTOGRAFIA No.11	FOTOGRAFIA No.12
	


ARCOS DE FÚTBOL 11 X 2JUEGOS (Incluye mallas impermeabilizadas) (Incluye suministros, equipos y mano de obra para su correcta instalación)

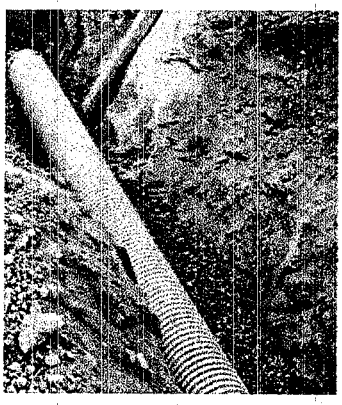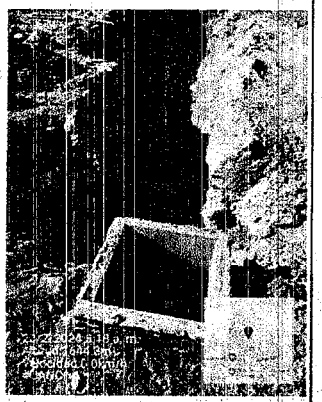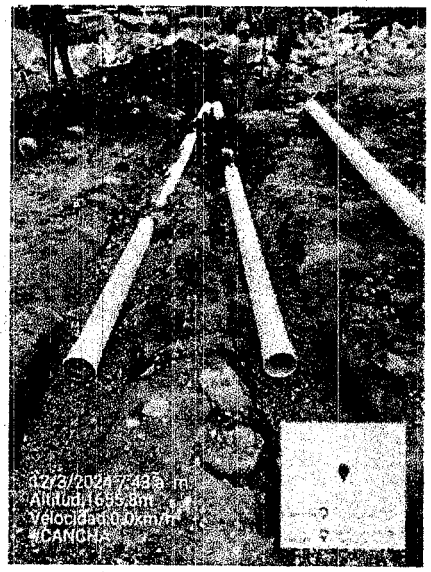FOTOGRAFIA No.13	FOTOGRAFIA No.14
 	



TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 6" _160MM (Incluye suministros e instalación)

FOTOGRAFIA No.15	FOTOGRAFIA No.16
	
CAJA DE INSPECCIÓN DE100X100	

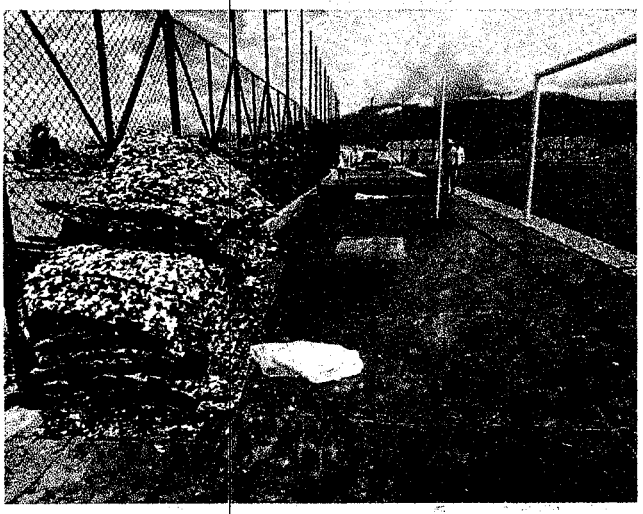
FOTOGRAFIA No.17	FOTOGRAFIA No.18
	
Shockpad Refosport 16 mm	


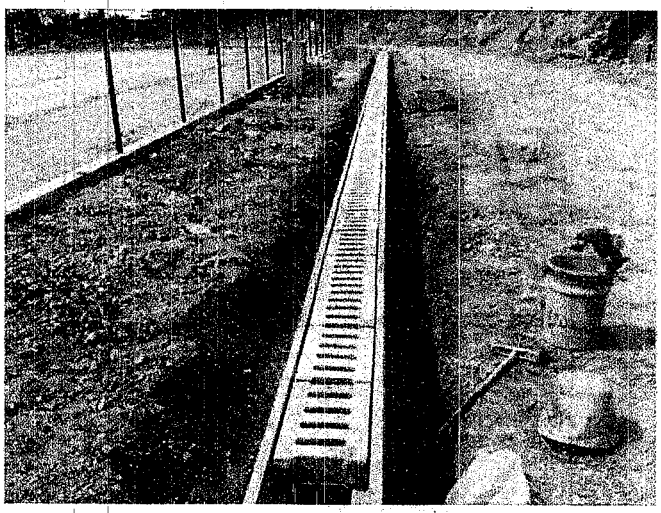
FOTOGRAFIA No.19	FOTOGRAFIA No.20
	

CarcamoT-2 2500 psi+Rejilla Peat.Conc.Ref. (canal) seccion de 35x40x100

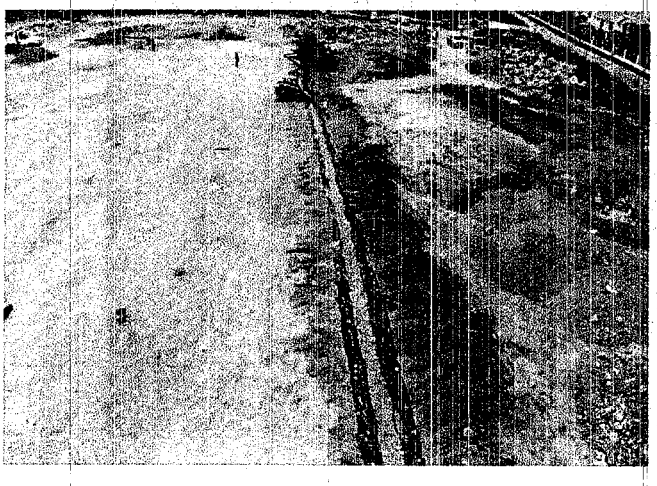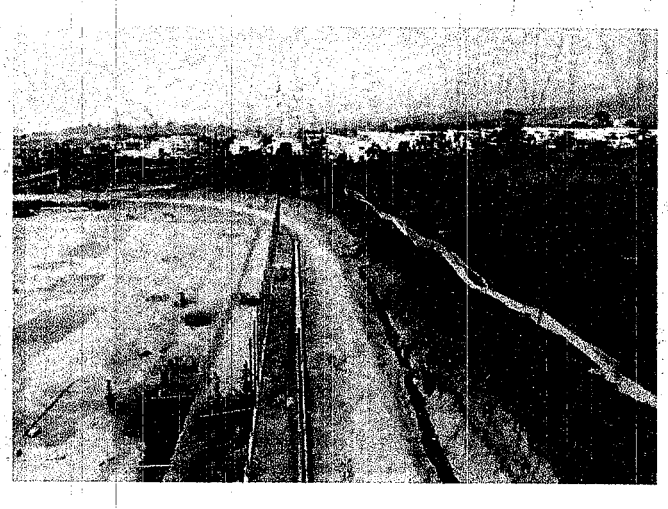FOTOGRAFIA No.21	FOTOGRAFIA No.22
	

FILTRO LATERAL DE VIA ALVEOLAR IMPERMEABLE

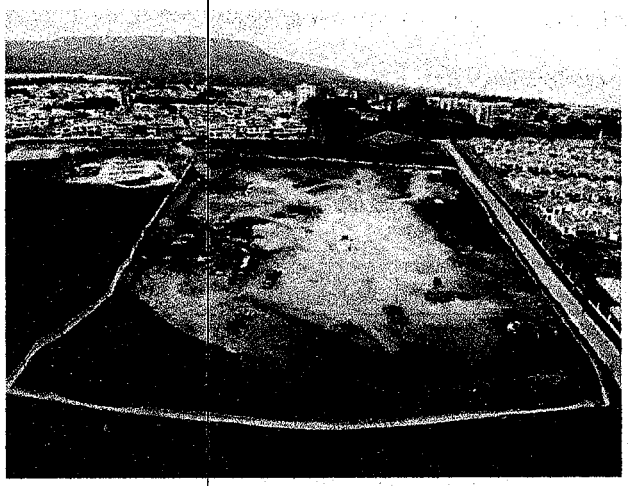FOTOGRAFIA No.23	FOTOGRAFIA No.24
	
Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	

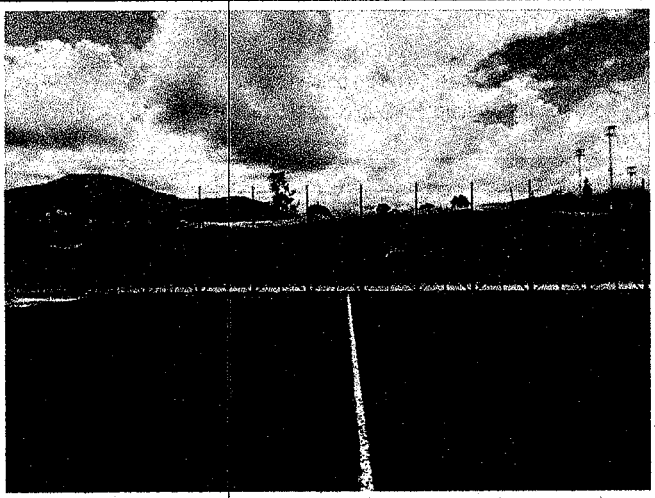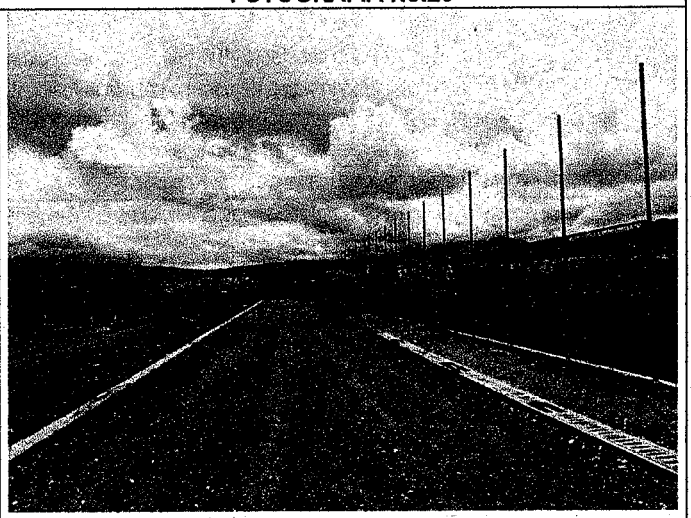FOTOGRAFIA No.25	FOTOGRAFIA No.26
	
CerramMallaEslaCal10 h=2.5+Malla Nylonh=2.5	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. Además de los(as) establecidos(as) en los artículos 4º y 5º de la Ley

No.	OBLIGACIONES GENERALES	% DE EJECUCIÓN
1	Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior 100% de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%) de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos el último año, *contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de* modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato. Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal requerido para la ejecución del contrato	100%
2	Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la Ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 1. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad. 2. Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad. 3. El Contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto elaborado conforme con las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los 15 hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 4. Conocer el diseño entregado por la Entidad, analizarlo exhaustivamente y ejecutar la obra conforme al mismo. A tales efectos, el Contratista declara que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la Entidad 5. Incorporar como mínimo el cien por ciento (100 %), de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.	100%
3	Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada residente en el municipio de Fusagasugá en un porcentaje no inferior al 30% de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso el 5% de la mano de obra no calificada residente en el municipio de Fusagasugá serán mujeres.	100%
4	Cumplirá la constitución política y las leyes de la Republica	100%
5	Ejecutará el objeto del presente contrato en las condiciones establecidas en los estudios previos, la propuesta presentada y el contrato celebrado	100%
6	Rendirá y elaborará los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato	100%
7	Cumplirá con las metas del Contrato.	100%
8	Programará las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto contratado.	100%
9	Acatará las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le imparta por parte del supervisor del contrato	100%
10	Obrará con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y en trabamientos	100%
11	No accederá a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.	100%
12	Mantendrá la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato	100%
13	Mantendrá vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo, si a ello hubiere lugar	100%
14	Diligenciará el formato único de hoja de vida que tratan las leyes 190 de 1995 y 443 de 1998 y las resoluciones 580 de 1999 y 535 del 2003 del Departamento Administrativo de la Función Pública, cuando haya lugar	100%
15	Responderá por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios	100%
16	Se afiliará en los sistemas de pensión, salud y riesgos laborales, si a ello hubiera lugar. Tener afiliado al personal a cargo al Sistema General de Seguridad Social	100%
17	Mantendrá actualizado su domicilio durante toda la vigencia del contrato y cuatro meses más y presentarse en la alcaldía municipal en el momento en que sea requerido.	100%

20	*Ejecutará la obra tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con el personal necesario, con todos los equipos, maquinaria,* herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de las obras.	100%
21	Realizará por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demás pruebas que se soliciten para verificar la calidad de los materiales y demás elementos que se instalen en la obra.	100%
22	Suministrará y mantendrá durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal profesional ofrecido. En caso de justa causa comprobada una vez iniciada la obra, y si EL CONTRATISTA requiera cambiar alguno de los profesionales propuestos, deberá demostrar el motivo y el reemplazo deberá tener un perfil igual o superior que el exigido en el pliego de condiciones. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de EL MUNICIPIO, previo visto bueno del Interventor. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con EL MUNICIPIO	100%
23	Presentará al Interventor informes mensuales de avance de obra	100%
24	Elaborará y presentará juntamente con el Interventor, actas parciales y final de obra.	100%
25	Responderá por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas	100%
26	Responderá por el pago de los impuestos que cause la legalización del contrato.	100%
27	Mantendrá al frente de las obras un Ingeniero Civil y/o un Arquitecto, matriculado y aceptado por EL MUNICIPIO, quien será el director de la obra y representante del CONTRATISTA para decidir con el Interventor sobre los aspectos relacionados con la ejecución de la obra	100%
28	Ejecutará las obras de acuerdo con el programa general aprobado por la Interventoría	100%
29	Reparará los espacios en los lugares de obra concernientes al presente contrato, cuando se deterioren como consecuencia de la ejecución de las obras	100%
30	Retirará los materiales sobrantes y los depositará en un sitio debidamente legalizado y que cuente con los respectivos permisos y entregar la obra en perfecto estado de limpieza	100%
31	Responderá por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato	100%
32	Garantizará las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal de la obra, b) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto y c) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes.	100%
33	Responderá por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del contrato	100%
34	El CONTRATISTA, subcontratistas y proveedores se obligarán a practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omisión	100%
35	EL CONTRATISTA deberá instalar una valla informativa en el sitio de la obra, de acuerdo con la información que le será suministrada por la Alcaldía Municipal, sin costo adicional para el MUNICIPIO.	100%
36	Entregará la obra en las condiciones establecidas en el presente proceso y en la propuesta presentada por el contratista de conformidad con las condiciones técnicas requeridas	100%
37	EL CONTRATISTA deberá cumplir con las normas relacionadas con sismo resistencia y construcción, uso de tierra, ordenamiento territorial (POT y EOT), espacio público y medio ambiente, dentro de las cuales se encuentran, entre otras, el Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Decreto 2041 de 2014, Norma NTC 4595 y demás disposiciones reglamentarias en materia de Licencia Ambiental, Planes de Manejo, Diseño, Licencias urbanísticas y demás permisos y autorizaciones que se requieran	100%
38	El Contratista deberá garantizar que el personal que emplee en la ejecución de la obra debe tener sus elementos de protección personal (chalecos, cascos, botas, tapa bocas), tanto en estos elementos como en las vallas informativas y demás elementos distintivos.	100%
39	El contratista debe cumplir con las normas del Sistema General de Riesgos Laborales, en especial, las siguientes: a) Procurar el cuidado integral de su salud. b) Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo. c) Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. d) Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por los contratantes, los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigías Ocupacionales o la Administradora de Riesgos Laborales. e) Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). f) Informar oportunamente a los contratantes toda novedad derivada del contrato. g) Las demás disposiciones que en la materia reglamente el decreto 1072 de 2015, el Ministerio de Salud y el Ministerio de trabajo	100%

CLAUSULA DECIMA TERCERA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

	establecido en el pliego de condiciones: programa de trabajo, programa de inversión, planes de calidad de la obra, metodología para la ejecución de las actividades del contrato, Plan Integral de Obra PGIO.	
3	Presentará en medio magnético e impreso durante la ejecución del contrato, la información soporte del avance físico de las obras, informe de avance técnico administrativo y financiero, actas de obra, cuentas de cobro o facturas, registro fotográfico y demás actos que se requiera.	100%
4	Deberá contar con una bitácora de obra en donde el contratista y el interventor dejan constancias de lo realizado en la ejecución diaria de la obra, así como las observaciones y recomendaciones	100%
5	Contratar la permanencia en los frentes//fases de obra, del director de obra, el residente de obra e ingenieros y personal operativo requerido en cada uno de ellos	100%
6	Afiliará a los terceros que emplee para la ejecución del contrato a una entidad promotora de salud, de manera tal que se garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en especial de accidentes de trabajo (Decreto 1295 de 1994), y a aplicar en forma estricta los controles y obligaciones que le competen, de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002 y el decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes o complementarias, en materia de aportes a seguridad social, y pago de parafiscales, vigentes a la fecha de presentación de la propuesta y durante la vigencia del contrato.	100%
7	El Contratista se obligará a tomar las medidas necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio y los transeúntes, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país. Deberá organizar y dirigir el programa y comité de seguridad industrial del proyecto, de acuerdo con las normas legales vigentes	100%
8	Durante y a la terminación del proyecto el Contratista deberá retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza.	100%
9	Estudiará cuidadosamente todos los factores que puedan influir en la ejecución de los trabajos.	100%
10	Responderá al interventor y/o supervisor todas las observaciones técnicas y administrativas en cuanto a calidad, presupuesto, programación, seguridad industrial y manejo ambiental del proyecto, y en especial de manejo de personal	100%
11	Rehará a sus expensas cualquier obra que resultare mal ejecutada a juicio del Interventor.	100%
12	Responderá por haber ocultado al contratar inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones o por haber suministrado información falsa	100%
13	Cumplirá con las especificaciones técnicas requeridas para la adecuada ejecución de las obras	
14	Cumplirá con la totalidad de los alcances descritos en el pliego y sus anexos	100%
15	Informará oportunamente al Municipio sobre eventualidad que pueda surgir y que implique retraso en el desarrollo del contrato	100%
16	Programará oportunamente las actividades que debe desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato	100%
17	Rendirá y elaborará los informes que solicite el Municipio, conforme al objeto del contrato	100%
18	Acatará las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le impartan el Interventor y/o supervisor del contrato	100%
19	Mantendrá la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato	100%
20	Velará y garantizará la buena calidad del objeto contratado, mediante la ejecución de ensayos de laboratorio a los materiales que emplee en la construcción, con las frecuencias determinadas en las especificaciones y a suministrar esta información al Interventor. Se compromete igualmente a suministrar las muestras de los materiales que solicite el interventor para la ejecución de ensayos de control.	100%
21	Ejecutar la obra objeto de este proceso conforme a la programación avalada por la interventoría.	100%
22	Que, de acuerdo a lo establecido en la ley 99 de 1993 y los decretos reglamentarios1220 de 2015 y 500 de 2006, el proyecto no requiere la licencia ambiental, sin embargo, el ejecutor y/o contratista debe cumplir con lo establecido en la guía de manejo ambiental de proyectos	100%
23	Implementar las medidas establecidas en el factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado en el evento que hayan sido ofrecidas en la propuesta	100%
24	El municipio se obliga a contratar y ejecutar las obras de conformidad con los ítems, actividades y valores dispuestos en el anexo 1 de este convenio. Los valores de cada uno de los ítems y actividades incluidos en el anexo 1 del presente convenio, son los máximos a sufragar por el ICCU y por el municipio y, por ende, no serán sujetos a incrementos ni reajuste por cambio de vigencia fiscal.	100%
25	Entregar, con el acta de recibo final de la obra, registro fotográfico que evidencie el estado del proyecto objeto del convenio, antes durante y después de la ejecución de las obras.	100%
26	Cumplir las normas técnicas aplicables relacionadas con el objeto código NRS- 10, norma NTC 4595, norma colegio-10, ley 361 de 1997 sobre discapacidad y la ley 12 de 1987 sobre accesibilidad en Colombia, Legislación y reglamentación sobre manejo ambiental y recursos hídricos, legislación de seguridad industrial y de salud ocupacional, normas NFPA- NEC y código nacional de incendios, ley 400 de 1997, código eléctrico nacional, norma ICONTEC 2050, reglamento técnico del sector de agua potable y saneamientobásico, RAS-2000, ley 915 de 2004, ley 388 de 1997 sobre ordenamiento territorial, resolución 1096 del 17 de noviembre del 2000, emanada de LA UNIDAD de desarrollo económico de Colombia- ministerio de comercio industria y turismo)	100%

ESTADO FINANCIERO GENERAL

DESCRIPCION	No.	FECHA	VALOR RP
REGISTRO PRESUPUESTAL	REX-2024000094	1/01/2024	$ 3.066.921.282,76
DISPONIBILIDAD RESERVA APROPIACION	2024000094	3/01/2024	$ 3.066.921.282,76
REGISTRO PRESUPUESTAL	REX-2024000096	1/01/2024	$ 930.067.805,15
DISPONIBILIDAD RESERVA APROPIACION	2024000096	3/01/2024	$ 930.067.805,15
REGISTRO PRESUPUESTAL	REX-2024000048	1/01/2024	$ 4.563.638.188,56
DISPONIBILIDAD RESERVA APROPIACION	2024000048	3/01/2024	$ 4.563.638.188,56
TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL			**$ 8.560.627.276,47**

DESCRIPCION	No.	RUBRO / FUENTE No.	VALOR	TOTAL
REGISTRO PRESUPUESTAL	REX-2024000094	3.2.3.4002020.2.3.2.02.02.005.972.1.2.1.0.00	$ 682.791.539,05	**$ 682.791.539,05**
		3.2.3.4002020.2.3.2.02.02.005.972.1.2.4.3.03	$ 141.900.328,29	**$ 141.900.328,29**
		3.2.3.4002020.2.3.2.02.02.005.972.1.3.1.1.05	$ 120.096.721,00	**$ 120.096.721,00**
		3.2.3.4002020.2.3.2.02.02.005.972.1.3.1.1.11	$ 1.027.867.039,88	**$ 1.027.867.039,88**
		3.2.3.4002020.2.3.2.02.02.005.972.1.3.3.1.00	$ 794.265.656,54	**$ 794.265.656,54**
		3.2.3.4002020.2.3.2.02.02.005.972.1.3.3.8.03	$ 299.999.998,00	**$ 299.999.998,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL	REX-2024000096	3.2.3.4002020.2.3.2.02.02.005.972.1.3.1.1.08	$ 930.067.805,15	**$ 930.067.805,15**
REGISTRO PRESUPUESTAL	REX-2024000048	3.2.3.4002020.2.3.2.02.02.005.972.1.3.1.1.08	$ 3.720.281.844,17	**$ 3.720.281.844,17**
		3.2.3.4002020.2.3.2.02.02.005.972.1.3.1.1.08	$ 843.356.344,39	**$ 843.356.344,39**
SUBTOTAL				**$ 8.560.627.276,47**

AFECTACION PRESUPUESTAL

DISPONIBILID RESERVA PRESUPUESTAL - REGISTRO PRESUPUESTAL	RUBROS	NOMBRE	FUENTE DEL RECURSO	VALOR RP	VALOR ACTA PARCIAL No.2	VALOR A PAGAR DEL RUBRO: ACTA PARCIAL No.3	SALDO SIN EJECUTAR
2024000094	3.2.3.4002020.2.3.2.02.02.005.972.1.2.1.0.00	ESPACIO PUBLICO ADECUADO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$ 682.791.539,05	$ 682.791.539,05		$ 0,00
	3.2.3.4002020.2.3.2.02.02.005.972.1.2.4.3.03	ESPACIO PUBLICO ADECUADO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO,	SGP-PROPOSITO GENERAL LIBRE	$ 141.900.328,29	$ 141.900.328,29		$ 0,00

		DESARROLLO URBANO					
	3.2.3.4002020.2.3.2.02.02.005.972.1.3.1.1.11	ESPACIO PUBLICO ADECUADO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	$ 1.027.867.039,88	$ 489.918.911,71	**$ 537.948.128,17**	$ 0,00
	3.2.3.4002020.2.3.2.02.02.005.972.1.3.3.1.00	ESPACIO PUBLICO ADECUADO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	$ 794.265.656,54		**$ 794.265.656,54**	$ 0,00
	3.2.3.4002020.2.3.2.02.02.005.972.1.3.3.8.03	ESPACIO PUBLICO ADECUADO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	SGP-PROPOSITO GENERAL LIBRE DESTINACION	$ 299.999.998,00		**$ 26.846.239,90**	$ 273.153.758,10
SUBTOTAL				**$ 3.066.921.282,76**	**$ 1.434.707.500,05**	**$ 1.359.060.024,61**	**$ 273.153.758,10**

DISPONIBILID RESERVA PRESUPUESTAL - REGISTRO PRESUPUESTAL	RUBROS	NOMBRE	FUENTE DEL RECURSO	VALOR RP	VALOR ACTA PARCIAL No.2	VALOR A PAGAR DEL RUBRO: ACTA PARCIAL No.3	SALDO SIN EJECUTAR
2024000096 REX-2024000096	3.2.3.4002020.2.3.2.02.02.005.972.1.3.1.1.08	ESPACIO PUBLICO ADECUADO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-CONVENIOS NAL Y/O DPTO.	$ 930.067.805,15			$ 930.067.805,15
SUBTOTAL				**$ 930.067.805,15**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 930.067.805,15**

DISPONIBILID RESERVA PRESUPUESTAL - REGISTRO PRESUPUESTAL	RUBROS	NOMBRE	FUENTE DEL RECURSO	VALOR RP	VALOR ACTA PARCIAL No.2	VALOR A PAGAR DEL RUBRO: ACTA PARCIAL No.3	SALDO SIN EJECUTAR
2024000048	3.2.3.4002020.2.3.2.02.02.005.972.1.3.1.1.08	ESPACIO PUBLICO ADECUADO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-CONVENIOS NAL Y/O DPTO.	$ 3.720.281.844,17			**$ 3.720.281.844,17**

RESUMEN AFECTACION PRESUPUESTAL

DESCRIPCION	No.	RUBRO / FUENTE No.	VALOR	TOTAL	VALOR ACTA PARCIAL No.2	VALOR A PAGAR DEL RUBRO: ACTA PARCIAL No.3	SALDO SIN EJECUTAR
REGISTRO PRESUPUESTAL	REX-2024000094	3.2.3.4002020.2.3.2.02.02.005.972.1.2.1.0.00	$ 682.791.539,05	**$ 682.791.539,05**	$ 682.791.539,05	$ 0,00	$ 0,00
		3.2.3.4002020.2.3.2.02.02.005.972.1.2.4.3.03	$ 141.900.328,29	**$ 141.900.328,29**	$ 141.900.328,29	$ 0,00	$ 0,00
		3.2.3.4002020.2.3.2.02.02.005.972.1.3.1.1.05	$ 120.096.721,00	**$ 120.096.721,00**	$ 120.096.721,00	$ 0,00	$ 0,00
		3.2.3.4002020.2.3.2.02.02.005.972.1.3.1.1.11	$ 1.027.867.039,88	**$ 1.027.867.039,88**	$ 489.918.911,71	$ 537.948.128,17	$ 0,00
		3.2.3.4002020.2.3.2.02.02.005.972.1.3.3.1.00	$ 794.265.656,54	**$ 794.265.656,54**	$ 0,00	$ 794.265.656,54	$ 0,00
		3.2.3.4002020.2.3.2.02.02.005.972.1.3.3.8.03	$ 299.999.998,00	**$ 299.999.998,00**	$ 0,00	$ 26.846.239,90	$ 273.153.758,10
REGISTRO PRESUPUESTAL	REX-2024000096	3.2.3.4002020.2.3.2.02.02.005.972.1.3.1.1.08	$ 930.067.805,15	**$ 930.067.805,15**	$ 0,00	$ 0,00	$ 930.067.805,15
REGISTRO PRESUPUESTAL	REX-2024000048	3.2.3.4002020.2.3.2.02.02.005.972.1.3.1.1.08	$ 3.720.281.844,17	**$ 3.720.281.844,17**	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.720.281.844,17
		3.2.3.4002020.2.3.2.02.02.005.972.1.3.1.1.08	$ 843.356.344,39	**$ 843.356.344,39**	$ 0,00	$ 0,00	$ 843.356.344,39
SUBTOTAL				**$ 8.560.627.276,47**	**$ 489.918.911,71**	**$ 1.359.060.024,61**	***$ 5.766.859.751,81***

ESTADO FINANCIERO CONTRATO OBRA

ITEM	DESCRIPCION	VALOR	
1	VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA	$	8.370.631.493,49
2	VALOR ADICION No.1	$	3.996.989.087,91
3	VALOR ACTUAL CONTRATO	$	12.367.620.581,19
4	VALOR PAGO PARCIAL No.1	$	3.806.993.304,93
5	VALOR PAGO PARCIAL No.2	$	1.434.707.500,05
6	**VALOR CORTE PARCIAL PRESENTA ACTA PARCIAL No.3**	$	**1.359.060.024,61**
7	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$	1.359.060.024,61
8	SALDO A FAVOR CONTRATISTA	$	5.766.859.751,60
9	SALDO A FAVOR MUNICIPIO	$	-

RESUMEN DE ACTAS PARCIALES:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 8.370.631.493,49**
VALOR ADICION No.1:	**$ 3.996.989.087,91**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$ 12.367.620.581,19**
VALOR ACTA PARCIAL No.1	**$ 3.806.993.304,93**
VALOR ACTA PARCIAL No.2	**$ 1.434.707.500,05**
VALOR ACTA PARCIAL No.3 – PRESENTE ACTA	**$ 1.359.060.024,61**
VALOR EJECUTADO	**$ 6.600.760.829,59**
SALDO PENDIENTE	**$ 5.766.859.751,60**

PAGO A REALIZAR EN LA PRESENTE ACTA:

Los supervisores del contrato dejan constancia de la verificación del cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social (salud y pensiones) y parafiscales.

FIRMAS

APOYO A LA SUPERVISION

ING. JOSE MELCO JIMENEZ CRUZ
Profesional Universitario - Secretaria de Infraestructura
Firma:

SUPERVISOR

ING. RAUL ARANGUREN MARTINEZ
Secretario de Infraestructura
Firma:

GESTIÓN DOCUMENTAL:
Original: Dirección de Contratación
Proyectó: Ing. José Melco Jiménez Cruz – Profesional Universitario - Secretaria de infraestructura
Revisó: Ing. Raúl Aranguren Martínez – Secretario de Infraestructura

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2023- 0780

OBJETO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.



INFORME ACTA PARCIAL No. 3

PERIODO: 26 DE FEBRERO DE 2024 AL 07 DE JUNIO DE 2024.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0667-2023

OBJETO:

EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 de 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA, PISTA ATLETICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

CONTRATO DE CONSULTORIA No.2023- 0780

OBJETO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

INFORME ACTA PARCIAL No. 3

PERIODO: 26 DE FEBRERO AL 07 DE JUNIO DE 2024.

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN....4
1. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO....5
2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO....6
3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS....6
4. VERIFICACIÓN DE POLIZAS....7
5. VERIFICACIÓN DE PERSONAL....10
6. INFORMACIÓN TÉCNICA....11
6.1 ACTIVIDADES Y CANTIDADES EJECUTADAS....11
8.1 SEGUIMIENTO AL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL CTO DE OBRA....25
8.2 ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA....26
8.3 SUSCRIPCIÓN DE ACTAS....26
7. CONCLUSIONES....26
ANEXOS....27

INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a las actividades realizadas por R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S, en el periodo comprendido entre el 26 de febrero de 2024 al 07 de junio de 2024, dando cumplimiento al contrato de consultoría No. 2023-0780 que tiene por objeto: **INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA,** celebrado entre la Alcaldía de Fusagasugá y por R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.

1. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO


El municipio de Fusagasugá tiene un porcentaje bajo de infraestructura deportiva y recreativa para poder cubrir la demanda de población que necesita este tipo de espacios públicos, adicionalmente, los existentes están en mal estado o no se encuentran dotados, en este sentido, la administración municipal conjuntamente con la comunidad de la Comuna Suroccidental identificó que la necesidad más constante y sobre la cual hay un mayor interés para llevar a cabo acciones, es el mejoramiento de calidad de vida y salud del pueblo de los Fusagasugueños y así lograr que se generen condiciones para que el municipio tenga mejores escenarios e infraestructura recreo deportiva para el desarrollo de actividades físicas. Así, el proyecto denominado "EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 DE 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA." permite dar respuesta a esta situación problemática.


Por lo anterior, el alcance que comprende el contrato de obra pública No. 2023-0667 se enmarca en la construcción de cancha sintética, pista atlética y urbanismo en el parque de las generaciones del municipio de Fusagasugá departamento de Cundinamarca, con un plazo contractual de ejecución de nueve (9) meses, cabe resaltar que se realizó modificación en las cantidades del presupuesto inicial, presentándose mayores y menores cantidades, como también la inclusión de nuevos ítems y adición No.1 , para la correcta ejecución y funcionamiento de las obras a realizar .

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto está localizado en el predio Santa Cesárea del Barrio Villa Patricia en la Comuna Suroccidental del Municipio de Fusagasugá, en el denominado Parque de las Generaciones.





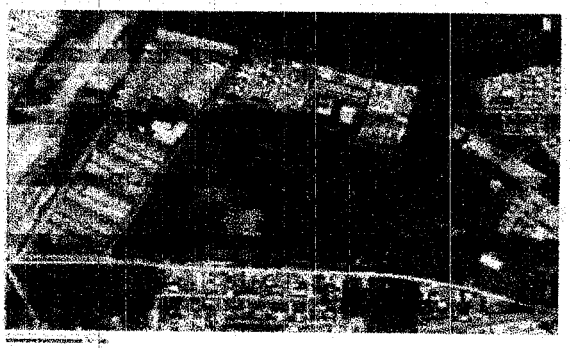

3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

FICHA INFORMATIVA CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA No.	**2023 - 0667**		
OBJETO	EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 de 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA, PISTA ATLETICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGADEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.		
CONTRATISTA	CONSORCIO DEPORTIVO 2023		
VALOR INICIAL	$8.370.631.493,49	**PLAZO INICIAL**	Nueve (9) meses
VALOR ADICION N°1	$3,996,989,087.91	**PRORROGA No. 1**	Cuatro (04) meses
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$12.367.620.581,19	**PRORROGA No. 2**	N.A
INICIO	06 septiembre 2023	**TERMINACION**	05 octubre 2024

FICHA INFORMATIVA CONTRATO DE INTERVENTORIA			
OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.		
CONTRATISTA	RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S		
VALOR INICIAL	$ 699.220.238,20	**PLAZO INICIAL**	Nueve (9) meses
VALOR ADICION N°1	$ 233.032.975,62	**PRORROGA No. 1**	Cuatro (04) meses
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 932.253.213,84	**PRORROGA No. 2**	N.A
INICIO	06 septiembre 2023	**TERMINACION**	05 octubre 2024

4. VERIFICACIÓN DE POLIZAS

A continuación, se presenta la verificación de pólizas que amparan los contratos según corresponde: (Anexo No. 1 Pólizas).

CONSORCIO DEPORTIVO 2023

TIPO PÓLIZA	CUMPLIMIENTO		
DESCRIPCIÓN	Suscripción del contrato		
Póliza No.	AB003039		
Aseguradora	EQUIDAD SEGUROS		
Amparos	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma asegurada
Cumplimiento	16/06/2023	15/07/2024	$1.674.126.298,60
Pago de salarios, y prestaciones	16/06/2023	15/03/2027	$1.255.594.723,95
Estabilidad y calidad de la obra	15/03/2023	15/03/2029	$2.511.189.447,90

TIPO PÓLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
DESCRIPCIÓN	Suscripción del contrato
Póliza No.	AB-003040
Aseguradora	EQUIDAD SEGUROS

Responsabilidad cruzada contratistas	16/06/2023	15/03/2024	$580.000.000,00

TIPO PÓLIZA	CUMPLIMIENTO		
Descripción	Cesión del contrato		
Póliza No.	17-44-101212847		
Aseguradora	Seguros del estado		
Amparos	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma asegurada
Cumplimiento	13/11/2023	5/10/2024	$1.674.126.298,70
Pago de salarios, y prestaciones	13/11/2023	5/06/2027	$1.255.594.724,02
Estabilidad y calidad de la obra	5/06/2023	5/06/2029	$2.511.189.448,05

TIPO PÓLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		
DESCRIPCIÓN	Suscripción del contrato		
Póliza No.	17-40-101028519		
Aseguradora	Seguros del estado S.A		
Amparos	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma asegurada
Predios, Labores y operaciones	13/11/2023	5/06/2024	$580.000.000,00

TIPO PÓLIZA	CUMPLIMIENTO		
Descripción	Prorroga No. 1		
Póliza No.	17-44-101212847		
Aseguradora	EQUIDAD SEGUROS		
Amparos	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma asegurada
Cumplimiento	13/11/2023	5/06/2025	$2.473.524.116,40
Pago de salarios, y prestaciones	13/11/2023	5/02/2028	$1.855.143.087,30
Estabilidad y calidad de la obra	5/06/2024	5/06/2029	$3.710.286.174,60

TIPO PÓLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S

TIPO PÓLIZA	CUMPLIMIENTO		
Descripción	Suscripción del contrato		
Póliza No.	101419349		
Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO		
Amparos	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma asegurada
Cumplimiento del contrato	27/07/2023	21/10/2024	$69.922.023,82
Pagos de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	27/07/2023	21/04/2027	$69.922.023,82
Calidad del servicio	21/04/2024	21/04/2029	$69.922.023,82

TIPO PÓLIZA	CUMPLIMIENTO		
Descripción	Acta de inicio		
Póliza No.	101419349		
Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO		
Amparos	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma asegurada
Cumplimiento del contrato	06/09/2023	07/12/2024	$69.922.023,82
Pagos de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	06/09/2023	07/06/2027	$69.922.023,82
Calidad del servicio	07/06/2024	07/06/2029	$69.922.023,82

TIPO PÓLIZA	CUMPLIMIENTO		
Descripción	Adición del contrato		
Póliza No.	101419349		
Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO		
Amparos	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma asegurada
Cumplimiento del contrato	06/09/2023	07/12/2024	$ 93.225.321,38

TIPO PÓLIZA	CUMPLIMIENTO		
Descripción	Prorroga No.1		
Póliza No.	101419349		
Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO		
Amparos	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma asegurada
Cumplimiento del contrato	06/09/2023	07/05/2025	$ 93.225.321,38
Pagos de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	06/09/2023	07/11/2027	$ 93.225.321,38
Calidad del servicio	07/06/2024	07/06/2029	$ 93.225.321,38

5. VERIFICACIÓN DE PERSONAL

El personal profesional requerido para el cumplimiento de los contratos de obra e interventoría son los siguientes:

No	CARGO	CANTIDAD
1	DIRECTOR DE OBRA	1
2	RESIDENTE DE OBRA	1
3	RESIDENTE SST	1
4	RESIDENTE SOCIAL	1
5	MAESTRO DE OBRA	1

No	CARGO	CANTIDAD
1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1
2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
3	ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO	1
4	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	1
5	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	1

No	CARGO	CANTIDAD
10	ESPECIALISTA EN ELÉCTRICO	1
11	PROFESIONAL EN PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN	1
12	RESIDENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1
13	ESPECIALISTA AMBIENTAL	1
14	RESIDENTE SOCIAL	1

6. INFORMACIÓN TÉCNICA


- Se realizó la solicitud de modificación al contrato haciendo la inclusión de actividades No previstas en el presupuesto inicial.


6.1 ACTIVIDADES Y CANTIDADES EJECUTADAS

Durante el periodo del presente informe se realizaron actividades administrativas como la recepción de documentación, revisión de diseños y balance general de obra, adicionalmente se realizaron las siguientes actividades de obra:

CAPITULO 1: PRELIMINARES

Ítem 1.1.01: DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M

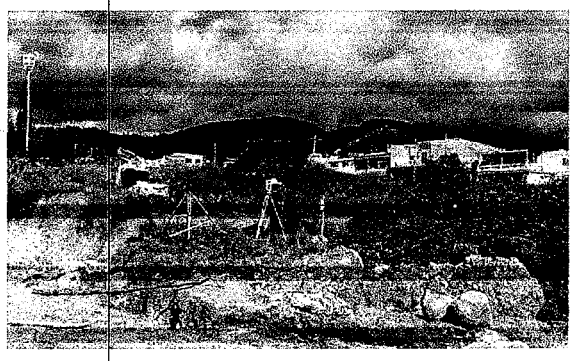

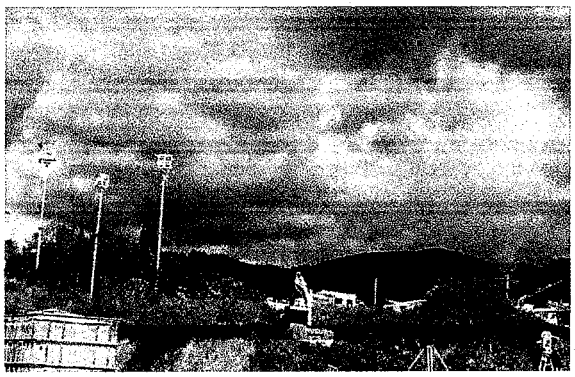






CAPITULO 2: MOVIMIENTO DE TIERRAS


SUBCAPÏTULO 3: ESTRUCTURAS


SUBCAPÍTULO 3.1: CIRCULACIÓN Y PERMANENCIA


3.1.1: PISOS

Ítem 3.1.1.09 GRAMA SINTÉTICA PARA CAMPOS DE PORTIVOS

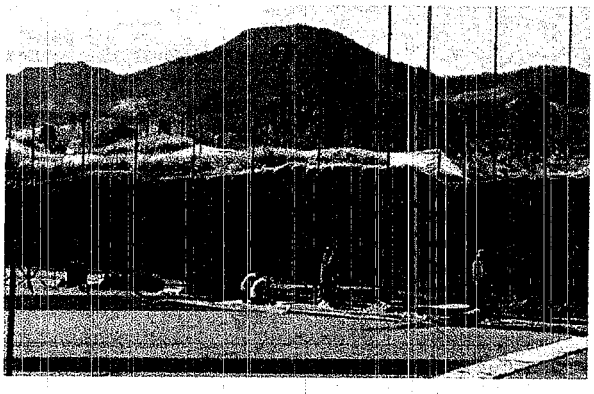

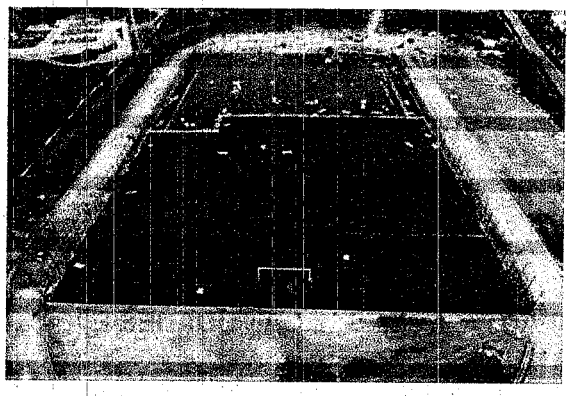

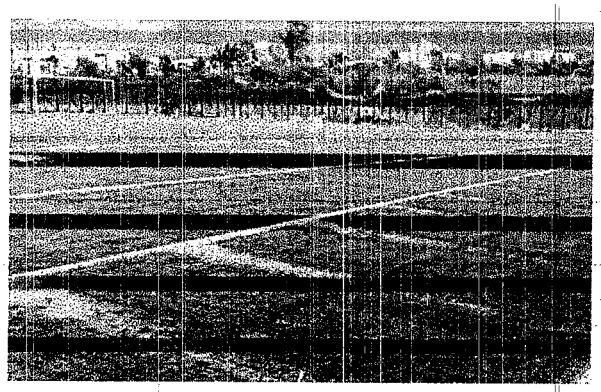


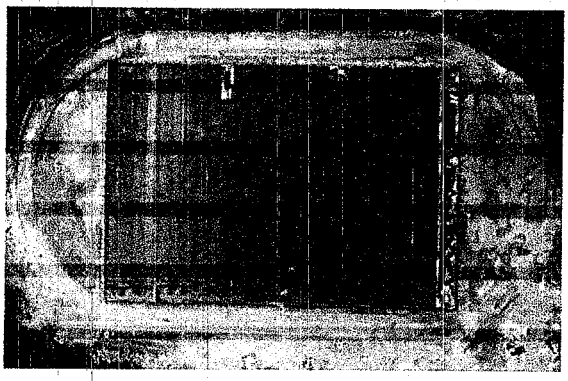



Se instala grama sintética en el área interna de la cancha.

Ítem 3.1.1.12 RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CCR-1





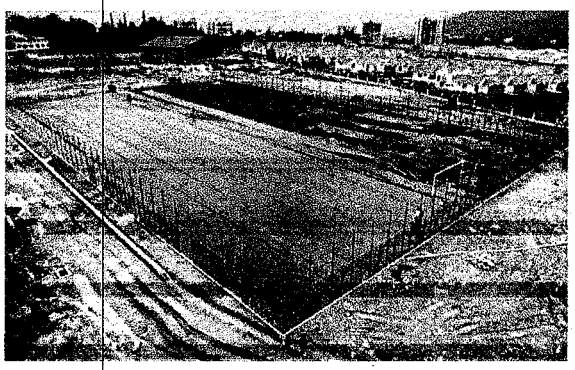

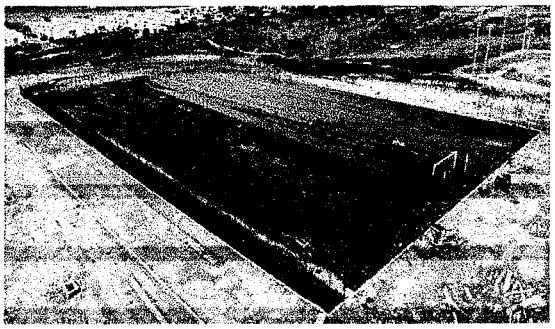

Se emulsión asfáltica sobre la rasante dela sub base granular en el área de la cancha de futbol.

ÍTEM 3.1.1.14: BORDILLO PREFABRICADO A-80











SUBCAPÍTULO 3.2: MOBILIARIO

ÍTEM 3.2.01: ARCOS DE FÚTBOL 11 X 2JUEGOS (Incluye mallas impermeabilizadas) (Incluye suministros, equipos y mano de obra para su correcta instalación)

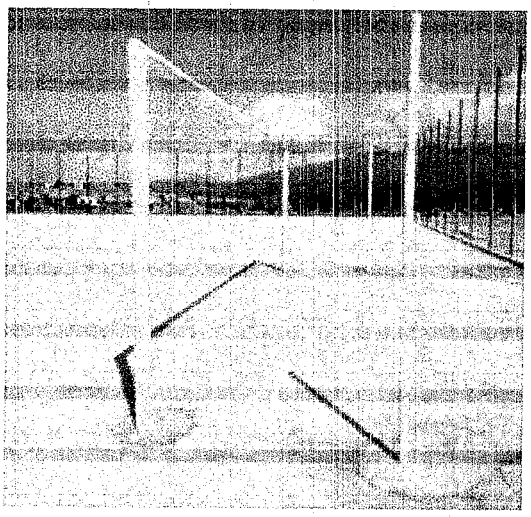

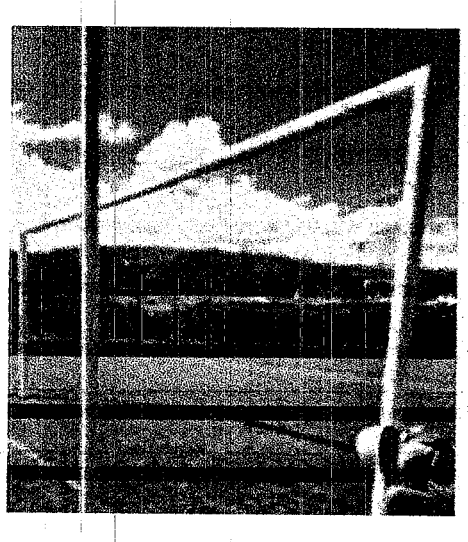

Instalación de arcos como mobiliario de la cancha de futbol, la cual esta empotrada en el piso, la malla se entregara a la entidad para su resguardo y cuidado.

CAPITULO 8: RED PLUVIAL

ÍTEM 8.10: TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 6"_160MM (Incluye suministros e instalación).











Se realiza instalación de tubería de 6" para descoles de los filtros y cárcamos construidos para el manejo de aguas de escorrentía.

ÍTEM 8.19: CAJA DE INSPECCIÓN DE100X100

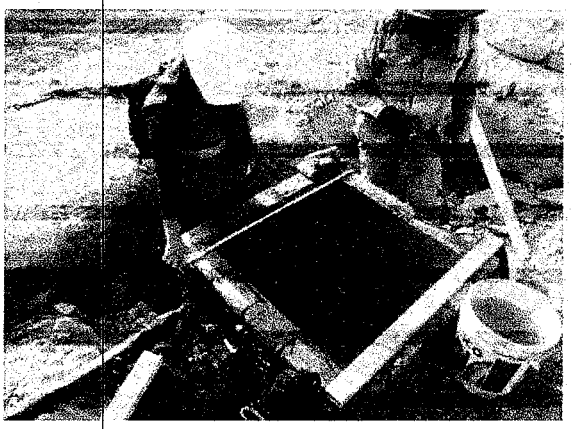


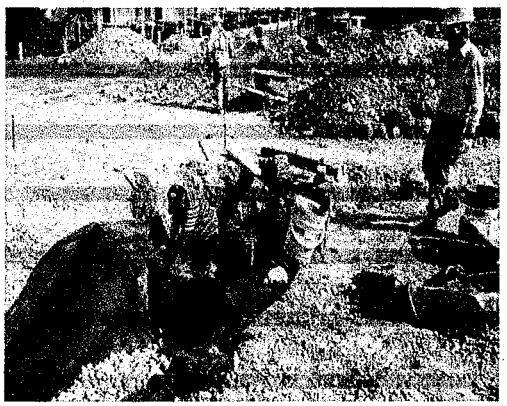


Construcción de caja de inspección de 1x1 m para el descoles de filtros y cajas de paso de la red de agua pluvial.

ÍTEMS NO PREVISTOS

Ítem NP-03: Shockpad Refosport 16 mm

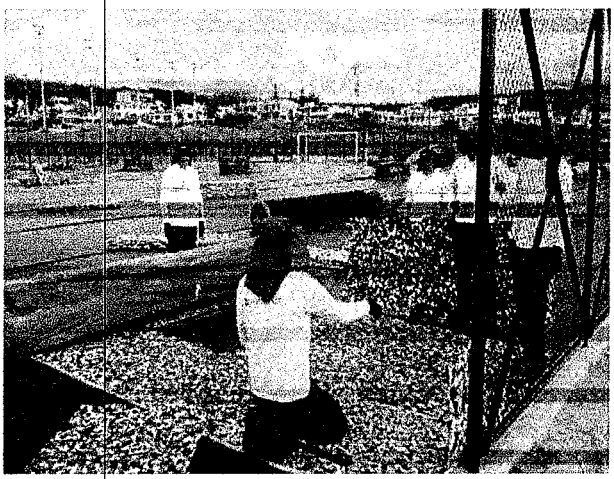

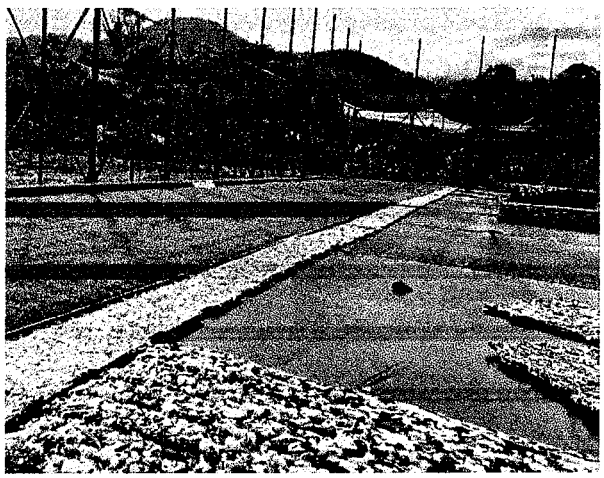

Se observa instalacion de shocpad refosport 16 mm en el area de la cancha de futbol.


ÍTEM NP-04: CARCAMOT-2 2500 psi+REJILLA PEAT.CONCE.REF. (CANAL) SECCION DE 35*40X100





Se observa instalación de cárcamo prefabricado.


ÍTEM NP-06: FILTRO LATERAL DE VIA ALVEOLAR IMPERMEABLE

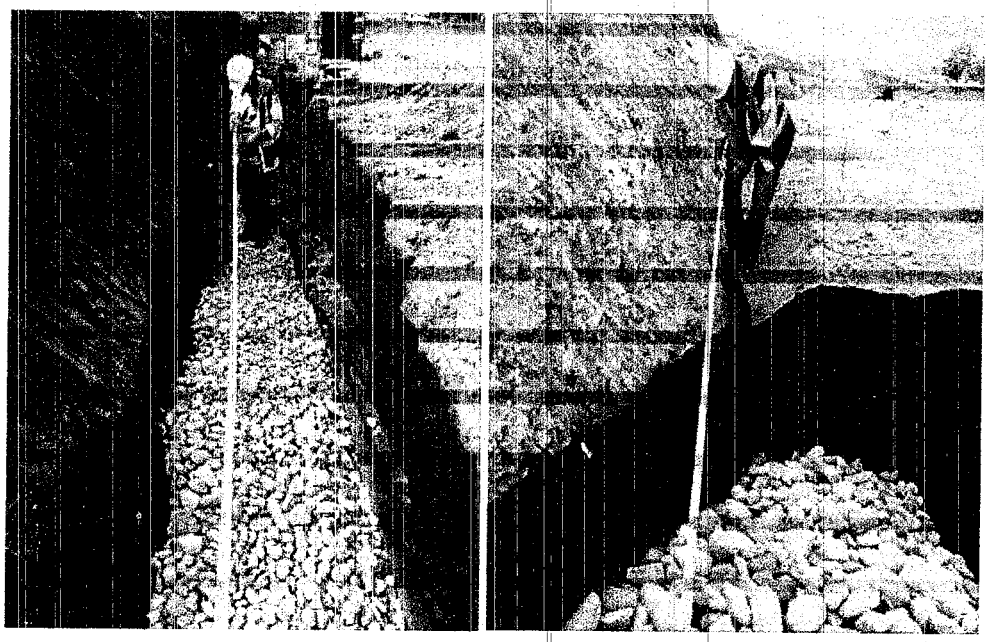

Se observa construcción de filtro en la pata del talud del costado oriental de la cancha con el fin de ayudar a conducir las escorrentías superficiales y garantizar la estabilidad de la obra.


ÍTEM NP-07: Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **




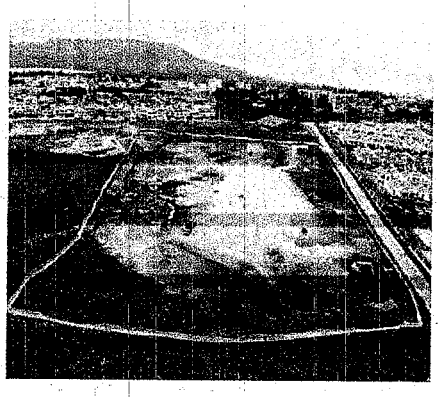


Se realiza instalación de cerramiento en lona

ÍTEM NP-08: CerramMallaEslaCal10 h=2.5+Malla Nylonh=2.5

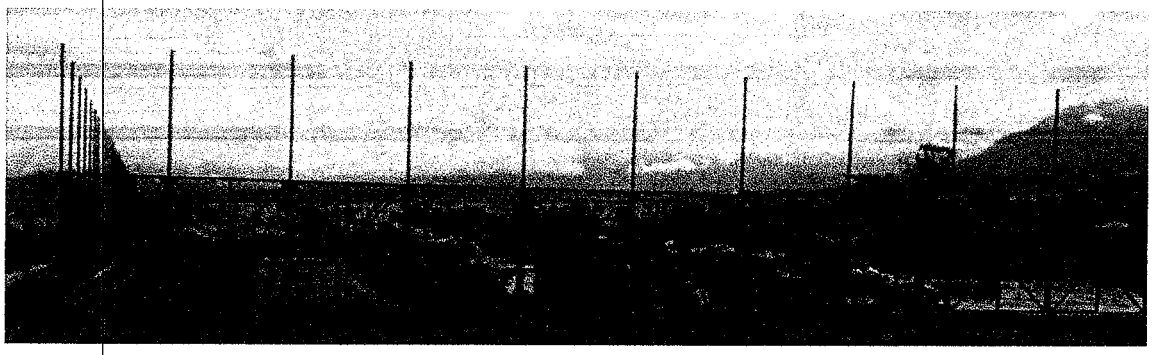

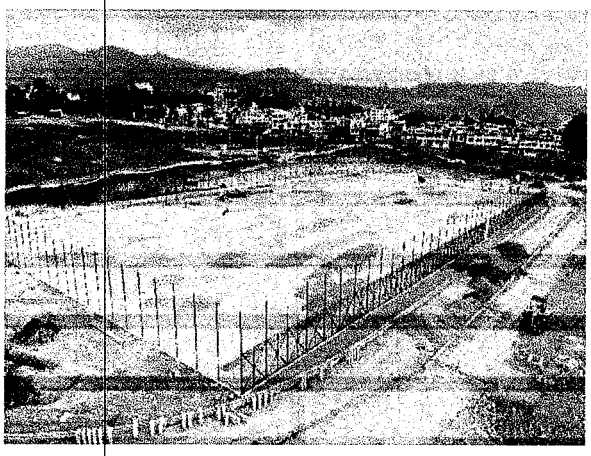

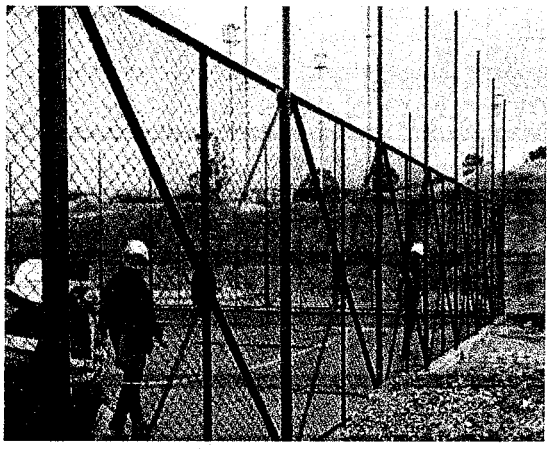

Se realiza la instalación del cerramiento delimitando el área del la cancha de futbol con el fin de controlar el acceso.

Las cantidades de obras ejecutadas para el periodo de la presente Acta son:

				ACTA No. 3	
ITEM	**ITEM ICCU**	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**Vr Parcial Directo**
1		**PRELIMINARES**			
1.10		**PRELIMINARES**			
1.1.01		DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M	M2	7,373.53	$ 11,259,380.31
1.1.02		TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	-	$ -
					$ 11,259,380.31
2		**MOVIMIENTO DE TIERRAS**			

3.1.1		**PISOS**			$ -
3.1.1.01		RELLENO TIPO 4 "SUBBASEB-200"	M3	-	$ -
3.1.1.02		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	7,268.02	$ 69,402,322.98
3.1.1.03		SUBBASE GRANULAR	M3	-	$ -
3.1.1.04		ANDÉN CONCRETO 3000PSI EN SITIO E=0.1M	M2	-	$ -
3.1.1.05		CONCRETO 3000 PSI	M3	-	$ -
3.1.1.06		RELLENO GRAVILLA DE RÍO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	-	$ -
3.1.1.07		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1700 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	-	$ -
3.1.1.08		RELLENO TIPO 7 "ARENADE PEÑA"	M3	-	$ -
3.1.1.09		GRAMA SINTÉTICA PARACAMPOS DEPORTIVOS	M2	1,466.13	$ 186,707,257.11
3.1.1.10		RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	7,267.92	$ 32,952,749.28
3.1.1.11		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	-	$ -
3.1.1.12		RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2	-	$ -
3.1.1.13		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	-	$ -
3.1.1.14		BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	283.15	$ 20,071,087.75
3.1.1.15		SISTEMA BICAPA O SÁNDWICH CON ESTRUCTURA GRANULADA, ANTIDESLIZANTE E IMPERMEABLE FUNDIDA EN SITIO CON PROTECCIÓN UV Y RESISTENTE A LOS CLAVOS, CUMPLE CON NORMAS DIN EN 14877 YDIN 18035-6. ESPESOR 13 MM, CONSISTE DE IMPRIMACIÓN CON VIASOL EP-P210, 1 CAPAELASTICA DE 10 A 12 MM DE SBR 1 A 4 MM, CAPA DE TAPAPOROS Y UNA CAPA DE 3 A 5MM VERTIDA Y ESTRUCTURADA DE EPDM1 A 4 MM DE COLOR ROJO.INCLUYE RECUBRIMIENTO EN PISTA Y CARRILES DE SALTO TRIPLE PARA PISTA ATLÉTICA CERTIFICADA. (Incluye suministros e instalación)	M2	-	$ -
3.1.1.16		RECUBRIMIENTO SINTÉTICO COLOR PAVE (Incluye suministros, equipos, mano de obra para su correcta instalación)	M2	-	$ -
					$ 309,133,417.12
3.2		**MOBILIARIO**			
3.2.01		ARCOS DE FÚTBOL 11 X 2JUEGOS (Incluye mallas impermeabilizadas) (Incluye suministros, equipos y mano de obra para su correcta instalación)	JG	1.00	$ 9,031,568.00
3.2.02		EQUIPO PARA PISTA DE ATLETISMO (Incluye suministros 4 obstáculos y17 tacos de salida)	UN	-	$ -
3.2.03		FOSO DE ARENA PARASALTO LARGO Y SALTOTRIPLE (Incluye cantonera final y arena de sílice al99%)	UN	-	$ -
				-	

5.1.02		RED SUMINISTRO PVC 11/2"	ML	-	$ -
5.1.03		TUBERIA PVC P 1 1/4" RDE 21 (Incluye accesorios suministros e instalación)	ML	-	$ -
5.1.04		RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	-	$ -
5.1.05		RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	-	$ -
5.1.06		RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	-	$ -
5.1.07		REGISTRO DE 1 1/4" (Incluye accesorios, suministros e instalación)	UN	-	$ -
5.1.08		REGISTRO 1 1/2"	UN	-	$ -
5.1.09		REGISTRO 3/4"	UN	-	$ -
5.1.10		REGISTRO 1/2"	UN	-	$ -
5.1.11		LLAVE MANGUERA	UN	-	$ -
					$ -
6		**PUNTOS HIDRÁULICOS DEAGUA FRÍA**			
6.01		PUNTO AF REGADERA (Incluye suministros e instalaciones)	UN	-	$ -
6.02		PUNTO AF LLAVE MANGUERA (Incluye suministros e instalaciones)	UN	-	$ -
6.03		PUNTO AF DISPENSADOR DE AGUA (Incluye suministros e instalaciones)	UN	-	$ -
6.04		REGISTRO 1/2"	UN	-	$ -
					$ -
7		**RED SANITARIA**			
7.01		EXCAVACIÓN MANUAL ENMATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	M3	-	$ -
7.02		RELLENO TIPO 7 "ARENADE PEÑA"	M3	-	$ -
7.03		RELLENO TIPO 2 "RECEBO"	M3	-	$ -
7.04		RELLENO CON MATERIALDE EXCAVACIÓN	M3	-	$ -
7.05		TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	-	$ -
7.06		TUBERÍA DRENAJE PVC 160	ML	-	$ -
7.07		RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	-	$ -
7.08		RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	-	$ -
7.09		RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	-	$ -
7.10		SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN	-	$ -
7.11		SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UN	-	$ -
7.12		CAJA DE INSPECCIÓN DE60X60	UN	-	$ -
7.13		REVENTILACIÓN 2"	ML	-	$ -
7.14		SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN	-	$

					-
8.04		RELLENO CON MATERIALDE EXCAVACIÓN	M3	-	$ -
8.05		RELLENO TIPO 1"GRAVILLA"	M3	-	$ -
8.06		RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	-	$ -
8.07		RED SANITARIA PVC-S 6"	ML	-	$ -
8.08		SALIDA AGUAS LLUVIAS ACANAL DE 4" (Incluye codo90, suministros e instalación)	UN	-	$ -
8.09		SALIDA AGUAS LLUVIAS ACANAL DE 6" (Incluye codo90, suministros e instalación)	UN	-	$ -
8.10		TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 6"_160MM (Incluye suministros e instalación)	ML	210.89	$ 8,463,437.48
8.11		TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"	ML	-	$ -
8.12		TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12"	ML	-	$ -
8.13		TUBERIA PVCLCANTARILLADO 14"_355MM (Incluye suministros e instalación)	ML	-	$ -
8.14		TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	-	$ -
8.15		TUBERÍA DRENAJE PVC 200	ML	-	$ -
8.16		SUMINISTRO EINSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	-	$ -
8.17		CAJA DE INSPECCIÓN DE40X40	UN	-	$ -
8.18		CAJA DE INSPECCIÓN DE80X80	UN	-	$ -
8.19		CAJA DE INSPECCIÓN DE100X100	UN	3.00	$ 1,455,210.00
8.20		CANAL ACO SPORT DEDRENAJE EN POLICONCRETO _LW125H200B125 + REJILLA (Incluye suministros, excavación, rellenos, mano de obra para su instalación)	M	-	$ -
8.21		SUMIDERO LW125K +REJILLA LW125 L =0,50(Incluye suministros e instalación)	UN	-	$ -
8.22		CANAL ACO ENPOLICONCRETO_N150_H31 + REJILLA(Incluye suministros, excavación, rellenos, mano de obra para su instalación)	ML	-	$ -
8.23		CONCRETO 4000 PSI	M3	-	$ -
8.24		ACERO FIGURADO 60000PSI	KG	-	$ -
					$ 9,918,647.48

9		**RED GENERAL DE SUMINISTRO**			
9.1		**ACOMETIDA MEDIDOR YLLENADO DE TANQUE**		-	$ -
9.1.01		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	M3	-	$ -
9.1.02		RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	-	$ -
9.1.03		RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	-	$ -
9.1.04		RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	-	$ -
9.1.05		RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	-	$ -
		ACOMETIDA DE 1/2" (Incluye suministros			$

9.2.02		RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	-	$ -
9.2.03		RELLENO TIPO 4 "SUBBASEB-200"	M3	-	$ -
9.2.04		SUBBASE GRANULAR	M3	-	$ -
9.2.05		PLACA EN CONCRETO DE 24 MPa, e=0.15 m (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y VIBRADO.NO INCLUYE ACERO)	M2	-	$ -
9.2.06		REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	-	$ -
9.2.07		CORTE PARA JUNTA DEDILATACIÓN EN PISO DECONCRETO AL 1/3 DEL ESPESOR DE LA PLACA (INCLUYE EQUIPOS Y MANO DE OBRA PARA EJECUCIÓN)	ML	-	$ -
9.2.08		SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO YSELLANTE)	ML	-	$ -
9.2.09		TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 15000 LTRS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIONES)	UN	-	$ -
9.2.10		CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	M2	-	$ -
9.2.11		VÁLVULA MARIPOSA 3"	UN	-	$ -
9.2.12		RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	-	$ -
9.2.13		RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	-	$ -
9.2.14		REGISTRO 3/4"	UN	-	$ -
9.2.15		UNIÓN UNIVERSAL PVC3"(Incluye suministro e instalación)	UN	-	$ -
9.2.16		VÁLVULA CHEQUE DE 3" (Incluye suministro e instalación)	UN	-	$ -
9.2.17		VÁLVULA DE BOLA METÁLICA 1" (Suministro e instalación)	UN	-	$ -
9.2.18		UNIÓN UNIVERSAL PVC1"(Incluye suministro e instalación)	UN	-	$ -
9.2.19		UNIÓN UNIVERSAL PVC3/4"(Incluye suministro e instalación)	UN	-	$ -
9.2.20		VÁLVULA CHEQUE DE 3/4" (Incluye suministro e instalación)	UN	-	$ -
					$ -

10		**RED SUMINISTRO DE AGUA FRÍA**			
10.01		TUBERIA PVC P 3" RDE 21 (Incluye accesorios suministros e instalación)	ML	-	$ -
10.02		RED SUMINISTRO PVC 21/2"	ML	-	$ -
10.03		RED SUMINISTRO PVC 2"	ML	-	$ -
10.04		RED SUMINISTRO PVC 11/2"	ML	-	$ -
10.05		TUBERIA PVC P 1 1/4" RDE 21 (Incluye accesorios suministros e instalación)	ML	-	$ -
10.06		RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	-	$ -
10.07		RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	-	$ -

11.02		PUNTO AF LAVADO DEPIES (Incluye suministros e instalaciones)	UN	-	$ -
11.03		PUNTO AF DISPENSADOR DE AGUA (Incluye suministros e instalaciones)	UN	-	$ -
					$ -

12		**REDES ELÉCTRICAS**			
12.1		**RED DE ENERGIA**		-	$ -
12.1.01		4 DUCTOS D=3" PVC-TDP(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS) NORMA CS209.	ML	-	$ -
12.1.02		4 DUCTOS D=4" PVC-TDP(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS) NORMA CS209.	ML	-	$ -
12.1.03		6 DUCTOS D=6" PVC-TDP(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS). NORMA CS212.	ML	-	$ -
12.1.04		CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274(ZVERDE. INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPA). MEDIDAS EXTERNAS: 0.90 X 0.90M. MEDIDAS INTERNAS: 0.60X 0.60M. ALTURA: 0.93M.	UN	-	$ -
12.1.05		CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 275 (ZVERDE.INCLUYE BASE, MUROS,PAÑETE, MARCO Y TAPA). MEDIDAS EXTERNAS: 1.49 X 0.99M. MEDIDAS INTERNAS: 1.19 X 0.69M. ALTURA: 1.37M.	UN	-	$ -
12.1.06		CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276 (ZVERDE.INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPAS). MEDIDAS EXTERNAS: 1.79 X 1.49M. MEDIDAS INTERNAS: 1.49 X 1.19M. ALTURA: 1.22M.	UN	-	$ -
12.1.07		TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	-	$ -
12.1.08		MALLA DE PUESTA ATIERRA PARA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN SUBTERRÁNEO RED DISTRIBUCIÓN O ALUMBRADO PUBLICO, RESISTIVIDAD DE TERRENODE 42.42 O-M. (INCLUYESISTEM INSTALACIÓN).A DE PUESTA A TIERRA, POZOS CAPACITIVOS, TRATAMIENTO DE SUELOTIPO HIDROSOLTA, CABLE 2/0 CU DESNUDO, CONECTORES CERTIFICADOS.) (INCLUYE SUMINISTRO E	UN	-	$ -
12.1.09		SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA AP Y EMPALME DE DERIVACIÓN RESINA (Incluye suministros e instalación)	UN	-	$ -
12.1.10		CABLE ELÉCTRICO 2X8 AWG PARA ACOMETIDATIPO ST CU 600V 75°C. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	ML	-	$ -
12.1.11		RED SUBTERRANEA 1x2+1x2 ALUMINIO 600V THW AWG (Incluye suministro e instalación).	ML	-	$ -
12.1.12		RED SUBTERRANEA 3x185mm2 ALUMINIO XLPE 15kV (Incluye suministro e instalación).	ML	-	$ -
12.1.13		SUBESTACIÓN SEMISUMERGIBLE DE 150 KVA 13200/208-120V, CAJA DE MANIOBRA ENTRADA Y SALIDA DE 3VÍAS 600A 15 KV (Incluye suministro, transporte, accesorios e instalación). Norma CODENSA CTS 534.	UN	-	$ -

12.2.03		POSTE METALICO AP, H=8M (INC. SUMINISTRO, IZAJE, APLOMADO E INSTALACIÓN. INC. BRAZOSENCILLO Y BASE SEGÚN NORMA AP802)	UN	-	$ -
12.2.04		POSTE METALICO AP, H=12M (INC. SUMINISTRO, IZAJE, APLOMADO E INSTALACIÓN. INC. BRAZOSENCILLO Y BASE SEGÚN NORMA AP802)	UN	-	$ -
12.2.05		POSTE METALICO H=24M.INCLUYE CANASTILLA Y BRAZO SENCILLO. (INC. SUMINISTRO, IZAJE, APLOMADO E INSTALACIÓN. INC. BRAZOSENCILLO Y BASE EN CONCRETO Y BASE GRANULAR B-600)	UN	-	$ -
12.2.06		LUMINARIA REF.: OMEGA I MP 48 LED. 4000K. T07.28W 3.541 LM. 120/277V. 50.000 HORAS.	UN	-	$ -
12.2.07		LUMINARIA REF.: OMEGAMP II 128 LED . NW. 4000K.T02. 70W 9.668 Lúmenes. 120/277V. 100.000 HORAS. IP66. SPD 10KV-10KA. MARCA ROY ALPHA. Con Base para Fotocelda y Fotocelda y brazo de 0,5 mx 11/2". GARANTIA: 5AÑOS.	UN	-	$ -
12.2.08		REFLECTOR TAYRONA LEDI I92 LED. P04 5000K.103W 14.344 Lúmenes. IRC 80 120/277V. 50.000HORAS. IP66. MARCA ROY ALPHA. Garantía: 5 AÑOS.	UN	-	$ -
12.2.09		REFLECTOR TAYRONA LEDII 320 LED. P04 170W 24.297 Lúmenes. 120/277V. SPD 10KV-10KA. CTRL 0-10V 50.000 Horas. 5000K. IRC 80 MARCA: ROY ALPHA. GARANTIA: 5 AÑOS	UN	-	$ -
12.2.10		Proyector H bay de 960W124.000 Lúmenes IP664000K Y/O 6.500K DRIVER MULTIVOLTAJE 120- 277V.CTRL 0-10V VIDAUTIL PROMEDIO: 100.000 HORAS. GARANTIA: 7 AÑOS. A 15°	UN	-	$ -
12.2.11		Proyector H bay de 960W124.000 Lúmenes IP664000K Y/O 6500K DRIVERMULTIVOLTAJE 120-277V. VIDA UTIL PROMEDIO :100.000 HORAS. CTRL O- 10V. GARANTIA : 7 AÑOS.A 30°	UN	-	$ -
12.2.12		LUMINARIA HERMETICA DE ALTO RENDIMIENTO121 CMS IP65 40W 4.969 Lúmenes . 120/277V. 100.000 HORAS. Garantías: 7 años. MARCA. ROY ALPHA.	UN	-	$ -
12.2.13		LUMINARIA LED HERMETICA 40W 100-277V	UN	-	$ -
12.2.14		SALIDA TOMA DOBLE PVCCOMPLETA	UN	-	$ -
12.2.15		SALIDA TRIFÁSICA PVCCOMPLETA	UN	-	$ -
					$ -

I)	**A. COSTO TOTAL PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES OBRA**	339,343,012.91
	0	88,229,183.00
	IMPREVISTOS	6,786,860.00
	UTILIDAD	16,967,151.00
	B. COSTO TOTAL PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES OBRA CON A.I.U	**451,326,206.91**
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO (A+B)	**451,326,206.91**

		ITEMS NO PREVISTOS				

NP-06	ICCU 4.59	FILTRO LATERAL DE VIA ALVEOLAR IMPERMEABLE	ML	42.60	$ 4,567,572.00
NP-07	IDRD 11646	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	ml	344.07	$ 9,383,707.57
NP-08	IDRD 16766	CerramMallaEslaCal10 h=2.5+Malla Nylonh=2.5	ml	353.81	$ 343,610,319.32
NP-09	IDRD COD 16678	PISO CAUCHO RECICLADO 6CM (EPDM 1CM +SBR 5CM SUM+INST) COD IRD 16678	M2	-	$ -
NP-10	COTIZACIONES	RECUBRIMIENTO SINTETICO SPORT MASTER PARA CAMPOS MULTIPLES	M2	-	$ -
NP-11	ICCU 5,5.1.	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	M2	-	$ -
NP-12	IDRD CIO 106048	Juegocuerdaspoliedro 5-12añosCap:40niñosH=4.5m	UND	-	$ -
NP-13	IDRD CIO 106849	JUEGO COLUMPIO MULTIPLE 9 U(2+añosCap:9 niñosH=2.6	UND	-	$ -
NP-14	IDRD CIO 100575	Juego gran escala circuito 3a5 años cap: 61 niños	UND	-	$ -
NP-15	IDRD CIO 101275	Juego Muelle Paneles laterales Animal2+años Cap4	UND	-	$ -
NP-16	IDRD CIO 106003	Juego muro escalar trepar deslizar:2-8AñosCap:5niñ	UND	-	$ -
NP-17	IDRD CIO 109157	Juego Arenero multifuncion 2+años Cap28 niños P.N	UND	-	$ -
NP-18	IDRD CIO 105668	Mesa- ping pong en fibra de vidrio de 2.74m x1.74m	UND	-	$ -
NP-19	IDRD CIO 105669	MESA DE AJEDREZ CON DOS SILLAS EN FIBRA DE VIDRIO	UND	-	$ -
NP-20	ICCU 5.5.15	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	-	$ -

II)	**SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1**	682,506,629.65
	ADMINISTRACION	177,451,724.00
	IMPREVISTOS	13,650,133.00
	UTILIDAD	34,125,331.00
	B. COSTO TOTAL PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES OBRA CON A.I.U	**907,733,817.65**
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO (A+B)	**907,733,817.65**

TOTALES DEL CONTRATO

TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)	$ 1,021,849,642.56
ADMINISTRACION	$ 265,680,907.07
IMPREVISTOS	$ 20,436,992.85
UTILIDAD	$ 51,092,482.13
B. COSTO TOTAL PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES OBRA CON A.I.U	**$ 1,359,060,024.61**
VALOR TOTAL DEL PROYECTO (A+B)	**$ 1,359,060,024.61**
VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)	**$ 1,359,060,024.61**


8.1 SEGUIMIENTO AL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL CTO DE OBRA


A continuación se presenta el avance físico y financiero del contrato de obra No. 2023-0667, teniendo en cuenta la programación presentada por el contratista de obra, aprobada y entregada a la entidad.

MES	PERIODO	PORCENTUAL		FINANCIERO	
		PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	PROGRAMADO	EJECUTADO
1	Del 6/09/2023 al 5/10/2023	0.57	0.1	$ 70,708,517.51	$ 8,370,631.44
2	Del 6/102023 al 5/11/2023	1.63	4.0	$ 201,100,884.70	$ 334,825,257.58
3	Del 6/11/2023 al 5/12/2023	3.73	7.0	$ 461,699,453.40	$ 585,944,200.76
4	Del 6/12/2023 al 5/01/2024	7.09	16.0	$ 877,293,035.60	$ 1,978,819,292.99
5	Del 6/01/2024 al 5/02/2024	11.02	32.0	$ 1,362,374,550.20	$ 3,957,638,586.05
6	Del 6/02/2024 al 5/03/2024	13.76	44.0	$ 1,701,929,577.30	$ 5,441,753,055.82
7	Del 6/03/2024 al 5/04/2024	17.2	47.0	$ 2,127,682,977.50	$ 5,812,781,673.26
8	Del 6/04/2024 al 05/05/2024	22.16	55.0	$ 2,740,575,498.30	$ 6,802,191,319.77
9	Del 6/05/2024 al 05/06/2024	26.64	64.0	$ 3,294,957,093.90	$ 7,915,277,171.96

De acuerdo con lo anterior, el porcentaje actual de avance de obra e interventoría ejecutado para la presente acta parcial N° 3, es del 53.37% frente al 26.64% programado, presentando un avance del 26.73%, para el presente periodo teniendo en cuenta el valor actualizado del contrato según adición No. 1, cabe resaltar que estos porcentajes son acumulados, y que el valor del Acta Parcial No. 3 de obra e interventoría corresponde a $6.600.760.829,35 y $ 102,466,820.68; respectivamente.

El desembolso financiero incluyendo la presente acta corresponde a un 53.37%, y el avance de ejecución de la obra se encuentra en el 64%.

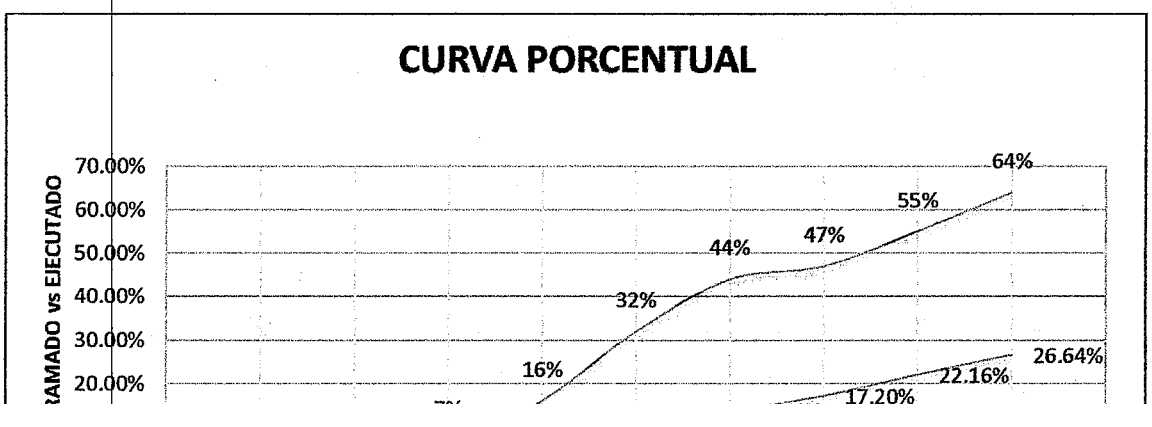

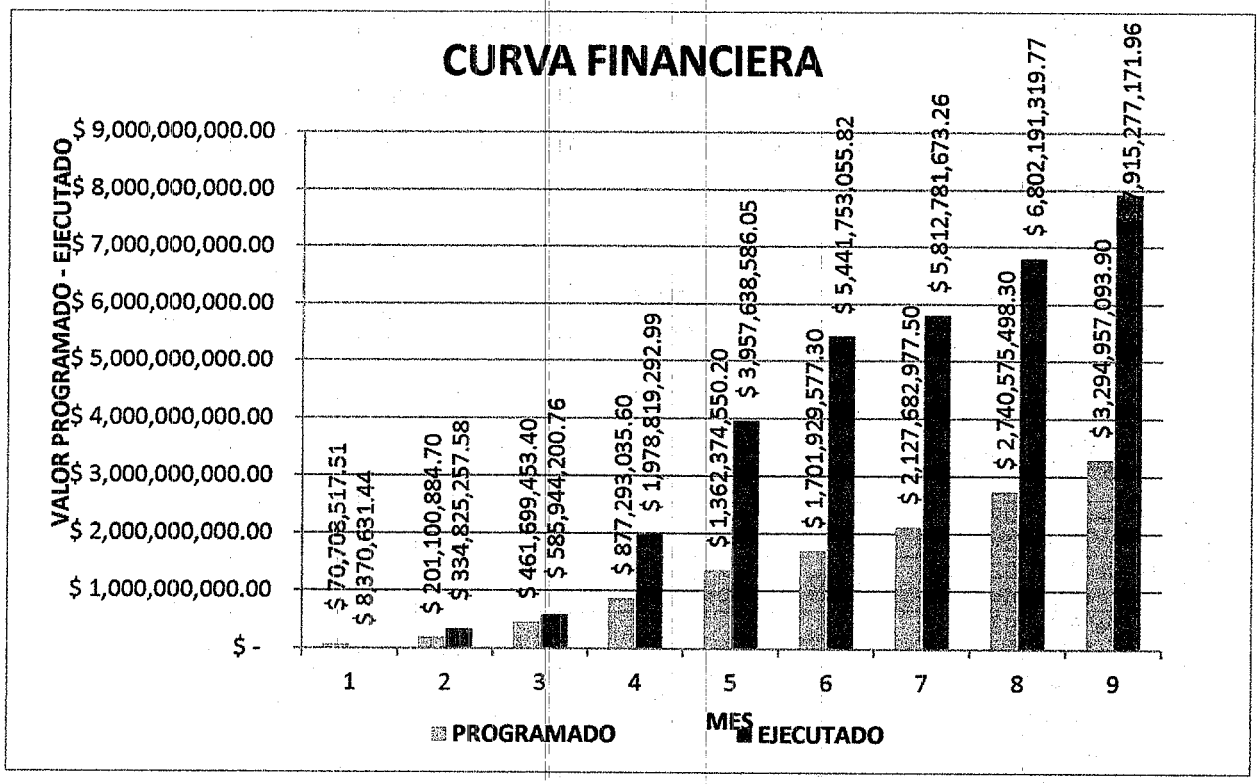

8.2 ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

Se llevan a cabo todas las actividades técnicas, jurídicas, administrativas, financieras y socioambientales, de acuerdo a las obligaciones estipuladas dentro del contrato y todas las requeridas para el correcto cumplimiento del mismo, velando, revisando y supervisando que las actividades realizadas por el contratista de obra se realicen bajo el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de calidad, así como el control al desarrollo de actividades se da mediante la verificación al cumplimiento de la programación y el flujo de inversión entregado por parte del contratista.

8.3 SUSCRIPCIÓN DE ACTAS

Durante el periodo del presente informe se suscribieron las actas de reunión presentadas en el Anexo No. 2 Actas.

7. CONCLUSIONES

- Se realizó la solicitud de ampliación al contrato de obra e interventoría por un plazo de 4 meses, actualizando la fecha de terminación al 05 de octubre de 2024.
- El porcentaje actual de avance de obra ejecutado es del 53.37% frente al 26.64%

instalación de arcos de futbol 11, instalación de tubería PVC alcantarillado 6" para descoles de cárcamos y filtros, cajas de inspección de 1.00x1.00 m, instalación de Shockpad Refosport 16 mm, construcción de cárcamo +rejilla, cerramiento en lona y construcción de cerramiento en malla eslabonada de la cancha de futbol.

ANEXOS

Anexo No. 1 Pólizas

Anexo No. 2 Actas de comité

Anexo No.3 Control de Correspondencia

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Anexo No. 1 Pólizas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101419349	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	06	2024	06	09	2023	00:00	07	07	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	R Y M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	NIT: 830.028.126-2

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
CR 38 A NRO. 25 - 58		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		2697927

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	ALCALDIA DE FUSAGASUGA	NIT: 890.680.008-4

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO
CL 6 NRO. 6 - 24		FUSAGASUGA, CUNDINAMARCA		8818181

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUCIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA EN VIRTUD DEL CONTRATO No.2023-0780 CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO LA CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA, PISTA ATLETICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/09/2023	07/05/2025	$93,225,321.38	$93,225,321.38
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/09/2023	07/11/2027	$93,225,321.38	$93,225,321.38
CALIDAD DEL SERVICIO	07/06/2024	07/06/2029	$93,225,321.38	$93,225,321.38

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS CONTRACTUALES 4 MESES DE ACUERDO AL ACTA No. 5 DE PRORROGA DE FECHA 28 DE MAYO DE 2024.

DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****232,935.00	$ *******8,000.00	$ ******45,777.00	$ **********286,713.00	$ ******279,675,964.14	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MYS CONSULTORES EN SEGUROS LTDA	235583	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

INTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101419349	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	06	2024	06	09	2023	00:00	07	07	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	R Y M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	NIT: 830.028.126-2

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
CR 38 A NRO. 25 - 58		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		2697927

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	ALCALDIA DE FUSAGASUGA	NIT: 890.680.008-4

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO
CL 6 NRO. 6 - 24		FUSAGASUGA, CUNDINAMARCA		8818181

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

PSE

VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Super INTER

SuperMAX

Bancolombia

éxito

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****232,935.00	$ *******8,000.00	$ ******45,777.00	$ **********286,713.00	$ ******279,675,964.14	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MYS CONSULTORES EN SEGUROS LTDA	235583	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

REFERENCIA PAGO:

INTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101419349	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	06	2024	06	09	2023	00:00	07	07	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
R Y M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS			NIT: 830.028.126-2
DIRECCIÓN: CR 38 A NRO. 25 - 58	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	2697927

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
ALCALDIA DE FUSAGASUGA			NIT: 890.680.008-4
DIRECCIÓN: CL 6 NRO. 6 - 24	**CIUDAD:** FUSAGASUGA, CUNDINAMARCA	**TELÉFONO:**	8818181

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Anexo No. 2 Actas de comité

Anexo No.3 Control de Correspondencia

FECHA:	Hora Inicio:	Hora Finalización:	LUGAR:
6/03/24	9:00 AM	10:00AM	Parque de las Generaciones
NOMBRE	Seguimiento al cto de Obra No. 2023-0667		
DEPENDENCIA	Secretaria de Infraestructura.		

ORDEN DEL DÍA (Temas Programados)

-Seguimiento al cto de Obra No. 2023-0667.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA (Temas Tratados)

- Se realiza comité de Obra estando presente Apoyo a la supervisión, cto de obra e interventoría, donde se trataron los siguientes temas:

  * El avance de obra es del 45% frente al 25% programado con un adelanto del 20%.

  * Se adelantan actividades tales como:
    - Instalación de cerramiento
    - Conformación de la estructura de la concha y la pista.
    - Mejoramiento de la subrasante con piedra rajón.
    - Instalación de tubería eléctrica
    - Construcción de cajas de inspección eléctricas
    - Construcción de filtro para drenaje de aguas lluvias del talud.

  * El cto de obra presentará Acta Parcial N. 2 para revisión de la interventoría y respectivo trámite.

Proceso Direccionamiento Estratégico
ACTA DE REUNIÓN

R4D1C4D0_1 R4D1C4D0_2 R4D1C4D0_3 R4D1C4D0_4 R4D1C4D0_5

CONCLUSIONES:

El avance de Obra ejecutado es del 45%. frente a un programado del 25%. presentando un adelanto del 20%.

COMPROMISOS:

OBSERVACIONES:

Responsables de la Reunión

Firma:	Firma:
Nombre: LUIS GRACIAN	Nombre: Leiman Godoy
Cargo: R.L.	Cargo:
Dependencia: CONTRATISTA	Dependencia: PROF. Sofia.

Firma: Mª Camila Espam T.
Nombre: Camila Espam
Dependencia: RM Construcciones e Int. SAS

Proceso Direccionamiento Estratégico
ACTA DE REUNIÓN

R4D1C4D0_1 R4D1C4D0_2 R4D1C4D0_3 R4D1C4D0_4 R4D1C4D0_5

FECHA:	Hora Inicio:	Hora Finalización:	LUGAR:
13/03/24	8:00 AM	9:00 AM	Parque de las Generaciones.
NOMBRE	Seguimiento al cto de Obra 2023-0667.		
DEPENDENCIA	Secretaría de Infraestructura - Alcaldía de Fusagasugá		

ORDEN DEL DÍA (Temas Programados)

Seguimiento al cto de Obra 2023-0667.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA (Temas Tratados)

-Se realizó comité técnico de obra, estando presente Apoyo a la supervisión, cto de obra, e interventoría, en donde se trataron los siguientes temas:

* Se realizó recorrido de obra, revisión y verificación de actividades ejecutadas.
* El avance ejecutado de obra es de 46% frente a un 27% programado, con un adelanto del 19%.
* Se adelantaron las siguientes actividades:
  - Instalación de bordillos perimetrales de la pista atlética.
  - Conformación de estructura para la pista.
  - Instalación de cemamiento en la cancha sintética.
  - Construcción de cajas eléctricas y pluviales.
* Se entregó Acta Parcial N-2 del cto a interventoría para su respectivo trámite.

Proceso Direccionamiento Estratégico
ACTA DE REUNIÓN

R4D1C4D0_1
R4D1C4D0_2
R4D1C4D0_3
R4D1C4D0_4
R4D1C4D0_5

CONCLUSIONES:

- El avance ejecutado de obra es del 46%. frente un 27%. programado, con un adelanto del 14%..

COMPROMISOS:

- Radicar Acta Parcial N.2 de Obra por parte de la interventoría a la Alcaldía.

OBSERVACIONES:

Responsables de la Reunión

Firma:
Nombre: LUIS G. FARFAN
Cargo: R.L.
Dependencia:

Firma:
Nombre: Iguan Yopasa B
Cargo: PICF.
Dependencia: Infraestructura

Hª Camila Espitia T.
Apoyo técnico Interventoría
R4M Construcciones e Int. SAS

Proceso Direccionamiento Estratégico
ACTA DE REUNIÓN

R4D1C400_1
R4D1C400_2
R4D1C400_3
R4D1C400_4
R4D1C400_5

FECHA: 20/03/24	Hora Inicio: 3:00PM	Hora Finalización:	LUGAR: Parque de las Generaciones
NOMBRE	Seguimiento al cto de Obra 2023-0667		
DEPENDENCIA	Secretaria de Infraestructura.		

ORDEN DEL DÍA (Temas Programados)

- Seguimiento al cto de Obra 2023-0667.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA (Temas Tratados)

- Se realiza comité técnico estando presente Apoyo a la supervisión, cto de obra e interventoría en donde se trataron los siguiente temas:

1. Avance de Obra: El cto se encuentra con un avance del 46% ejecutado, frente a un programado del 27%.
2. Descole de Aguas Pluviales: Teniendo en cuenta que se realizó reunión con la CAR en la cual se consultó el proceso para realizar el descole; la entidad manifiesta que este trámite de ocupación del cauce tiene un periodo de aprobación superior al plazo de ejecución del cto. Por lo tanto cto, interventoría y supervisión evaluaran las posibles alternativas para la entrega o disposición final de estas aguas, se deberá presentar el respectivo balance por parte del cto.
3. El cto realizará solicitud de inclusión de items no previstos.
4. Se solicito nuevamente a la supervisión el plano de las redes de Alcantarillado de la zona.

Proceso Direccionamiento Estratégico
ACTA DE REUNIÓN

R4D1C400_1 R4D1C400_2 R4D1C400_3 R4D1C400_4 R4D1C400_5

CONCLUSIONES:

- El cto presenta un avance del 47%.

COMPROMISOS:

- Balance de Obra

OBSERVACIONES:

Responsables de la Reunión

Firma:	**Firma:**
Nombre: Lemuel Hoyos	**Nombre:** Hugo Nobles
Cargo: Ingeniero	**Cargo:** Residente Obra
Dependencia: Profesional. I	**Dependencia:** Contratista de Obra

Camila España
Apoyo Técnico Interventoría
R4M Construcciones e Inv. SA.S

Alex Pencros.

Dario Delgado.
Apoyo Técnico Contratista.
Concreto Deportivo 2023.

FECHA:	Hora Inicio:	Hora Finalización:	LUGAR:
25-04-24	9:00 AM	10:00 AM	Obra
NOMBRE	Seguimiento al cto de Obra N. 2023-0667		
DEPENDENCIA	Sec. de Infraestructura - Alcaldía de Fusagasugá		

ORDEN DEL DÍA (Temas Programados)

- Seguimiento al cto de Obra N. 2023-0667.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA (Temas Tratados)

-Se realiza comité de seguimiento al cto de obra N. 2023-0667 estando presente el cto de obra y la interventoría, en donde se trataron los siguientes temas:

* La obra presenta un avance de ejecución del 50%. frente a un avance programado del 36%.

* Se llevan a cabo las siguientes actividades:
  - Suministro e intalación de cárcamo prefabricado perimetral para recolección de aguas lluvias de la pista Atlética.
  - Verificación de niveles con equipo de topografía.
  - Instalación de tubería pluvial de 12" para recolección de aguas lluvias.
  - Se avanzó en instalación de cerramiento en malla eslabonada para concha.
  - Se dio inicio a la instalación de geotextil para la concha sintética.
  - Se realizó imprimación asfáltica del área de la concha.

* Se manifiesta por parte de la interventoría que se envió oficio R&M-CTO-0780-047-2023, en donde se manifiesta al cto que de acuerdo a la programación se debe dar inicio a la actividad de instalación de mezcla densa en caliente de la pista atletica, razón por la cual debe aumentar los rendimientos

* Mediante Oficio CP-030-0667-2023, el cto realizó solicitud de aclaración sobre licencia de construcción de estructura en container, bajo radicado 2-2024-11380 Id: 386486, información necesaria para el modificatorio N. 3.

Proceso Direccionamiento Estratégico
ACTA DE REUNIÓN

R4D1C4D0_1
R4D1C4D0_2
R4D1C4D0_3
R4D1C4D0_4
R4D1C4D0_5

CONCLUSIONES:

-La obra presenta un avance de ejecucion del 50%. frente un avance programado del 36%.

COMPROMISOS:

OBSERVACIONES:

Responsables de la Reunión

Firma: Mg Camila Español	**Firma:**
Nombre: Camila Español	**Nombre:** Hugo Mateo
Cargo: Interventoría	**Cargo:** Residente Obra
Dependencia: Q401 Construcciones e Inv. SAS	**Dependencia:** CONSORCIO DEPORTIVO 2023

FECHA:	Hora Inicio:	Hora Finalización:	LUGAR:
2-05-24	9:00 AM	10:00 AM	Obra
NOMBRE	Seguimiento al cto de Obra N. 2023-0667		
DEPENDENCIA	Sec. de Infraestructura - Alcaldía de Tuluá, Valle.		


ORDEN DEL DÍA (Temas Programados)

- Seguimiento al cto de Obra N. 2023-0667.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA (Temas Tratados)

- Se realiza comité de seguimiento al cto de Obra N. 2023-0667 estando presente el cto de Obra y la interventoría, en donde se trataron los siguientes temas:

* El avance de obra ejecutado corresponde al 55% frente a un programado del 53%.
* Se llevaron a cabo las siguientes actividades:
  - Actividad topográfica, replanteo para la conformación de la estructura de la pista atlética.
  - Se realizó instalación de geotextil en la cancha sintética.
  - Se avanzó en excavación e instalación de tubería de 12" para recolección de aguas lluvias.
* Nuevamente el cto manifiesta que a causa de las fuertes lluvias se presentan atrasos y bajos rendimientos en la ejecución de las actividades.
* Se avanza por parte del cto en la proyección del Modificatorio N. 3, de acuerdo a los requerimientos realizados por la supervisión, teniendo en cuenta lo siguiente:
  - Inclusión de Actividades No previstas
  - Mayores y menores cantidades
  - Necesidad de garantizar instalación de gradenas para la comodidad de los asistentes a los futuros eventos.

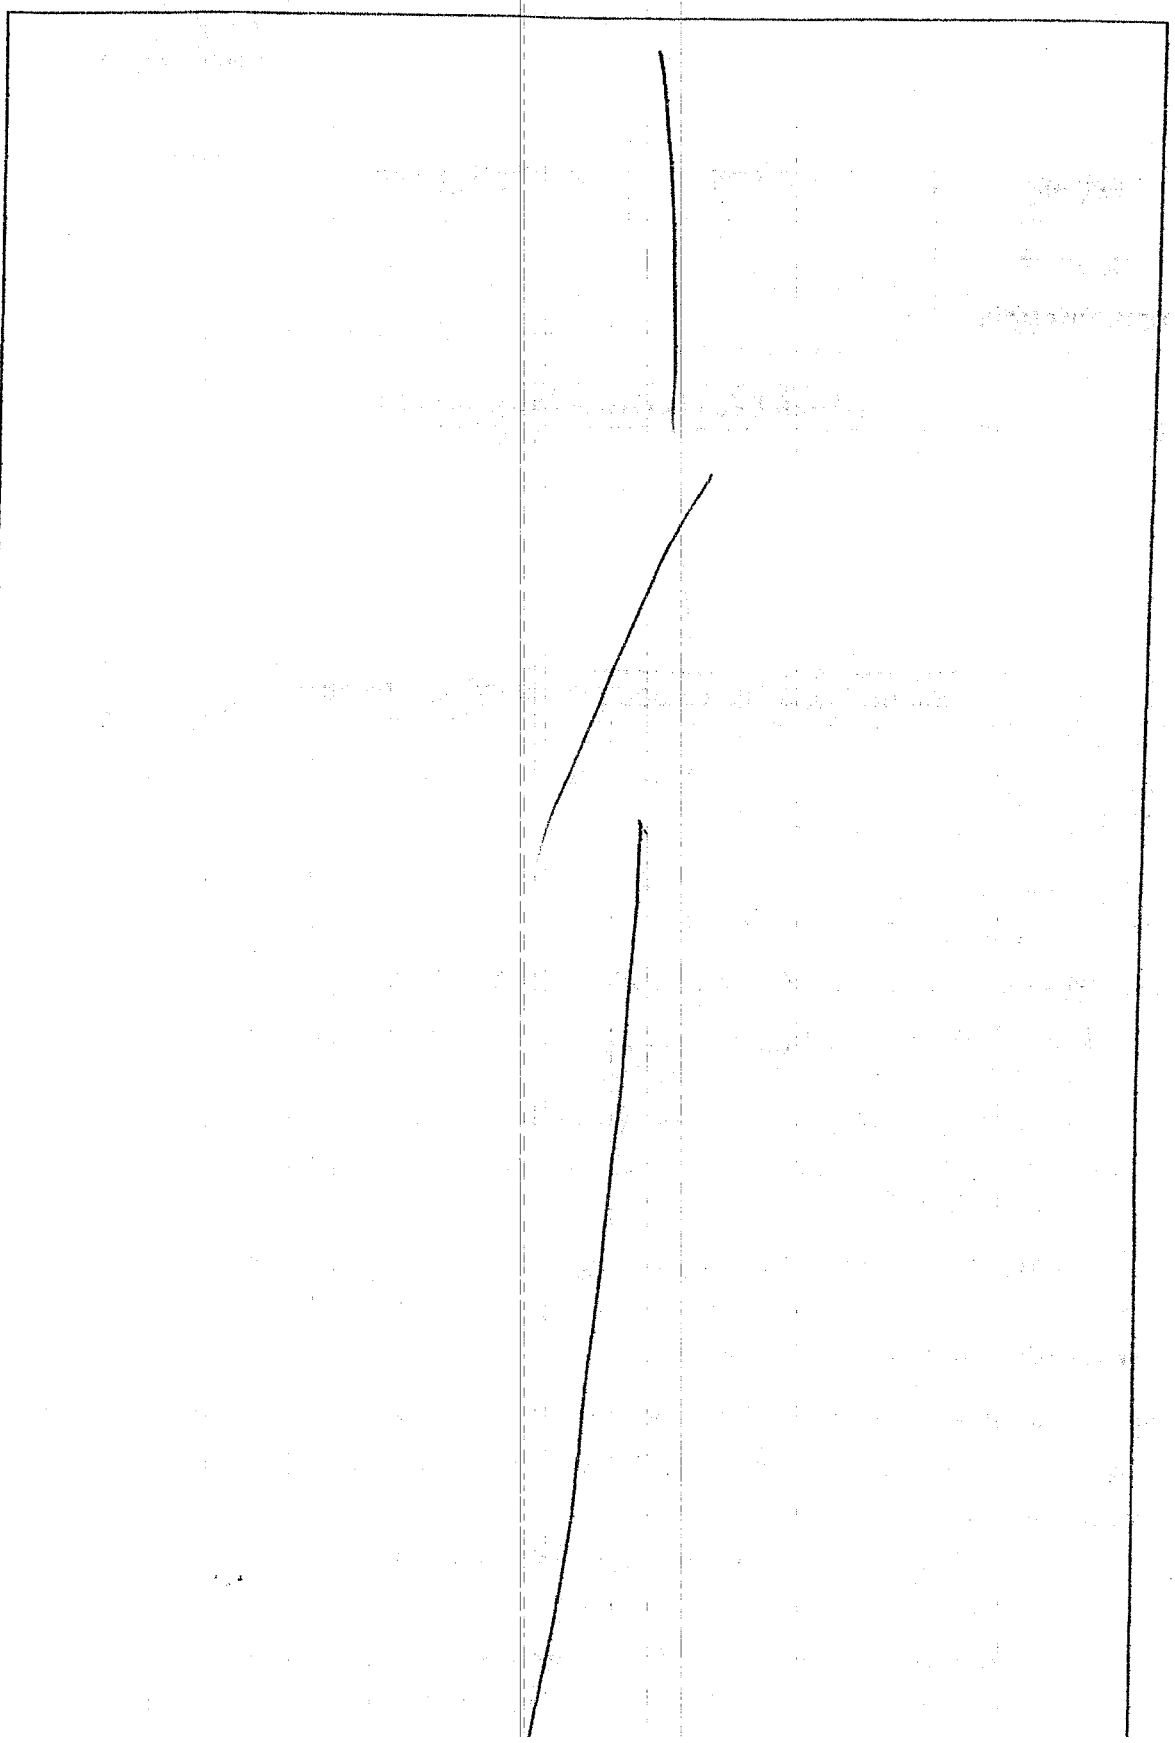

R4D1C4D0_1
R4D1C4D0_2
R4D1C4D0_3
R4D1C4D0_4
R4D1C4D0_5

CONCLUSIONES:

- El avance de obra ejecutado corresponde al 55%. frente a un programado del 53%.

COMPROMISOS:

- Avance en la Proyección de Mod. N. 3.

OBSERVACIONES:

Responsables de la Reunión

Firma: Mª Camila España T.	**Firma:**
Nombre: Camila España.	**Nombre:** Hugo Muñoz
Cargo: Interventoría.	**Cargo:** Residente Obra
Dependencia: R&M Construcciones e Int. S.A.S	**Dependencia:** CONSORCIO DEPORTIVO 2023

Anexo No.3 Control de Correspondencia enviada

CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
NIT: 830028126-2

Fusagasugá, 29 de febrero de 2024.

R&M-CTO-0780-041-2023

Señores:
CONSORCIO DEPORTIVO 2023
R. L. LUIS GABRIEL FARFAN
Fusagasugá – Cundinamarca.

REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORIA No.2023- 0780 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

ASUNTO: **AVAL DE LA RESPUESTA EMITIDA POR EL CONSORCIO DEPORTIVO 2023 A LA PQRS DEL CIUDADANO MARCO ANTONIO VARGAS.**

Respetado Ingeniero:

Por medio de la presente y en cumplimiento con las obligaciones contractuales del contrató en mención, esta interventoría revisa la respuesta a la PQRS radicada por el señor **MARCO ANTONIO VARGAS**, se realizo la revisión del concepto y contenido de la respuesta que emite el consorcio Deportivo 2023 por lo cual se avala, no se presenta ninguna objeción, por lo tanto se aprueba para proceder a enviar la respuesta al ciudadano por medio de correspondencia certificada.

Agradezco de antemano la atención prestada y cualquier aclaración con gusto será atendida

Cordialmente,

MARGARITA GÓMEZ GÓMEZ
RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
Representante Legal

Aprobó M.G.G.
Elaboro: K.J.G
C.C.// Archivo

Fusagasugá, 01 de marzo de 2024.

R&M-CTO-0780-042-2023

Señores:
CONSORCIO DEPORTIVO 2023
R. L. GERMAN ANDRES DUARTE ROA
Fusagasugá – Cundinamarca.

REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORIA No.2023- 0780 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

ASUNTO: **APROBACIÓN INFORME SOCIAL N° 5 CONTRATO DE OBRA 0667-2023**

Respetados Ingenieros:

Por medio de la presente y en cumplimiento a las obligaciones contractuales, nos permitimos informar que, una vez revisado el Informe de Gestión Social N° 5; encontramos que se cumple con los lineamientos impartidos por la presente Interventoría, por lo tanto se APRUEBA el documento. Se solicita presentar el Documento en físico.

Cordialmente.

MARGARITA GÓMEZ GÓMEZ
RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
Representante Legal

Aprobó M.G.G.
Elaboro: K.J.G.
C.C.// Archivo

Fusagasugá, 04 de Marzo de 2024.

R&M-CTO-0780-043-2023

Señores:
CONSORCIO DEPORTIVO 2023
R. L. LUIS GABRIEL FARFAN
Fusagasugá – Cundinamarca.

REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORIA No.2023- 0780 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

ASUNTO: APROBACIÓN INFORME SST N° 5 CONTRATO DE OBRA 0667-2023

Respetados Ingenieros:

Por medio de la presente y en cumplimiento a las obligaciones contractuales, nos permitimos informar que, una vez revisado el Informe de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo SST N° 5; encontramos que se cumple con los lineamientos impartidos por la presente Interventoría, por lo tanto se APRUEBA el documento. Se solicita presentar el Documento en físico.

Cordialmente.

MARGARITA GÓMEZ GÓMEZ
RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
Representante Legal

Aprobó M.G.G.
Elaboro: J.E.S.
C.C.// Archivo

Fusagasugá, 12 de Marzo de 2024.

R&M-CTO-0780-044-2023

Señores:
CONSORCIO DEPORTIVO 2023
R. L. LUIS GABRIEL FARFAN
Fusagasugá – Cundinamarca.

REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORIA No.2023- 0780 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

ASUNTO: **APROBACIÓN INFORME AMBIENTAL N° 5 CONTRATO DE OBRA 0667-2023**

Respetados Ingenieros:

Por medio de la presente y en cumplimiento a las obligaciones contractuales, nos permitimos informar que, una vez revisado el Informe Ambiental N° 5; encontramos que se cumple con los lineamientos impartidos por la presente Interventoría, por lo tanto se APRUEBA el documento. Se solicita presentar el Documento en físico.

Cordialmente.

MARGARITA GÓMEZ GÓMEZ
RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
Representante Legal

Aprobó M.G.G.
Elaboro: J.E.S.
C.C.// Archivo

Fusagasugá, 15 de Marzo de 2024.

R&M-CTO-0780-045-2023

Señores:
Alcaldía de Fusagasugá
Secretario De Infraestructura
ING. Oscar Fabián Espinel Manrique
Fusagasugá – Cundinamarca.

REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORIA No.2023- 0780 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

ASUNTO: ENTREGA ACTA PARCIAL No. 2- CONTRATO DE CONSULTORIA No.2023-0780.

Respetados señores:

Por medio de la presente nos permitimos realizar entrega del ACTA PARCIAL No. 2 de interventoría, para su revisión, aprobación y trámite.

Se anexan los siguientes soportes:

- Factura
- Autorización de facturación
- RUT actualizado a la fecha
- CDP
- RP
- Certificación bancaria
- Sabana de Acta Parcial No. 2
- Certificación de parafiscales y planillas
- Copia de Actas generados en el periodo
- Informe técnico Acta Parcial No. 2

15/03/2024

Sin otro particular, agradezco la atención prestada.

Cordialmente

MARGARITA GOMEZ GOMEZ
Representante Legal (S)
Aprobó: C.E.G.G
Elaboró: M.G.G
C.C.// Archivo
Folios: 44
Se entregan tres (3) copias.

CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
NIT: 830028126-2

Fusagasugá, 15 de Marzo de 2024.

R&M-CTO-0780-046-2023

Señores:
Alcaldía de Fusagasugá
Secretario De Infraestructura
ING. Oscar Fabián Espinel Manrique
Fusagasugá – Cundinamarca.

REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORIA No.2023- 0780 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

ASUNTO: ENTREGA ACTA PARCIAL No. 2- CONTRATO DE OBRA No. 2023-0667.

Respetados señores:

Por medio de la presente nos permitimos realizar entrega del ACTA PARCIAL No. 2 de interventoría, para su revisión, aprobación y trámite.

Se anexan los siguientes soportes:

- Factura en borrador
- Autorización de facturación
- CDP
- RP
- Certificación bancaria
- Sabana de cobro y memorias de cantidades
- Certificación de parafiscales y FIC
- Copia de Actas generados en el periodo
- Informe técnico de ejecución de obra

15/03/2024

Sin otro particular, agradezco la atención prestada.

Cordialmente

MARGARITA GOMEZ GOMEZ
Representante Legal (S)
Aprobó: C.E.G.G
Elaboró: M.G.G
C.C.// Archivo
Folios: 157
Se entregan tres (3) copias.

CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
NIT: 830028126-2

Fusagasugá, 07 de mayo de 2024.

R&M-CTO-0780-046-2023

Señores:
CONSORCIO DEPORTIVO 2023
R. L. LUIS GABRIEL FARFAN
Fusagasugá – Cundinamarca.

REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORIA No.2023- 0780 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

ASUNTO: **APROBACIÓN INFORME SOCIAL N° 7 CONTRATO DE OBRA 0667-2023**

Respetados Ingenieros:

Por medio de la presente y en cumplimiento a las obligaciones contractuales, nos permitimos informar que, una vez revisado el Informe de Gestión Social N° 7; encontramos que se cumple con los lineamientos impartidos por la presente Interventoría, por lo tanto se APRUEBA el documento. Se solicita presentar el Documento en físico.

Cordialmente.

MARGARITA GÓMEZ GÓMEZ
RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
Representante Legal

Aprobó M.G.G.
Elaboro: K.J.G.
C.C.// Archivo

CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
NIT: 830028126-2

Fusagasugá, 22 de abril de 2024.

R&M-CTO-0780-047-2023

Señores:
CONSORCIO DEPORTIVO 2023
R.L Luis Gabriel Farfán
Fusagasugá – Cundinamarca.

REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORIA No.2023- 0780 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

ASUNTO: AVISO ACTIVIDADES PREVISTAS PARA LA PRÓXIMA SEMANA.

Respetado ingeniero:

Por medio de la presente me permito informar que teniendo en cuenta la programación de obra, se tiene previsto para la semana 35 dar inicio a la actividad de instalación de mezcla densa en caliente para la pista atlética, por lo que, según las actividades realizadas en obra, se evidencia que no se podrá llevar a cabo su cumplimiento, debido a que no se ha culminado la instalación de bordillos y cárcamos perimetrales, así como también la conformación de la estructura de la misma.

Por lo anterior, se solicita aumentar los rendimientos en cuanto a la construcción de la pista atlética conforme a la programación con el fin de no presentar atrasos en la ejecución de las actividades. Cabe resaltar que a la fecha nos encontramos en la semana No. 33 de 39, lo cual corresponde al 84% del plazo de ejecución contractual.

Sin otro particular, agradezco la atención prestada.

Cordialmente

MARGARITA GOMEZ GOMEZ
Representante Legal (S)
Aprobó: C.E.G.G
Elaboró: M.G.G
C.C.// Archivo
Folios: ( )

CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
NIT: 830028126-2

Fusagasugá, 09 de mayo de 2024.

R&M-CTO-0780-048-2023

Señores:
Alcaldía de Fusagasugá
Secretario De Infraestructura
ING. RAÚL ARANGUREN
Fusagasugá – Cundinamarca.

REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORIA No.2023- 0780 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

ASUNTO: Remisión oficio CP-031-0667-2023 - Solicitud de Estudio fotométrico y estructura base de la iluminación de cancha y pista atlética.

Respetados señores:

Por medio de la presente y teniendo en cuenta los comités de obra realizados, así como también las observaciones que se realizaron al inicio del contrato por el contratista de obra y la interventoría a los diseños entregados por parte de la entidad contratante en todos sus componentes, incluyendo la parte eléctrica, y de los cuales no se recibieron respuesta, nos permitimos solicitar a ustedes el estudio fotométrico y estructura base de la iluminación de cancha sintética y la pista atlética, de acuerdo a los requerimientos realizados por el contratista de obra, mediante oficio **CP-031-0667-2023.**

Lo anterior, teniendo en cuenta que se está proyectando realizar solicitud de modificación al contrato y se requiere de dicha información para su correcta elaboración.

Sin otro particular, agradezco la atención prestada y pronta respuesta.

Cordialmente

MARGARITA GOMEZ GOMEZ
Representante Legal (S)
Aprobó: C.E.G.G
Elaboró: M.G.G
C.C.// Archivo
Folios: (1)

Fusagasugá, 14 de Mayo de 2024.

R&M-CTO-0780-049-2023

Señores:
CONSORCIO DEPORTIVO 2023
R. L. LUIS GABRIEL FARFAN
Fusagasugá – Cundinamarca.

REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORIA No.2023- 0780 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

ASUNTO: **APROBACIÓN INFORME AMBIENTAL N° 6 CONTRATO DE OBRA 0667-2023**

Respetados Ingenieros:

Por medio de la presente y en cumplimiento a las obligaciones contractuales, nos permitimos informar que, una vez revisado el Informe Ambiental N° 6; encontramos que se cumple con los lineamientos impartidos por la presente Interventoría, por lo tanto se APRUEBA el documento. Se solicita presentar el Documento en físico.

Cordialmente.

MARGARITA GÓMEZ GÓMEZ
RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
Representante Legal

Aprobó M.G.G.
Elaboro: J.E.S.

Fusagasugá, 17 de mayo de 2024.

R&M-CTO-0780-050-2023

Señores:
Alcaldía de Fusagasugá
Secretario De Infraestructura
ING. RAÚL ARANGUREN
Fusagasugá – Cundinamarca.

REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORIA No.2023- 0780 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

ASUNTO: Solicitud de prorroga No. 1 al contrato de obra No. 2023-0667 y al contrato de consultoría No. 2023-0780.

Respetado ingeniero:

De acuerdo con la solicitud realizada por el contratista de obra mediante oficio No. CP-033-0667-2023 – Solicitud de prorroga No. 1, nos permitimos manifestar lo siguiente:

- Que teniendo en cuenta el Modificatorio No.2 que corresponde a la Adición No. 1, se actualizo el alcance de obra reportando mayores y menores cantidades, así como también la necesidad de la construcción de obras complementarias y la inclusión de actividades no previstas para la correcta ejecución del contrato.

- Adicionalmente, de acuerdo a los requerimientos realizados por la supervisión en el presente año, se ha evidenciado la necesidad de realizar nuevas obras complementarias para el correcto funcionamiento de las obras a ejecutar como lo son la construcción de camerinos y graderías.

- Que, de acuerdo a lo anterior, se encuentra en proyección la solicitud de realizar la *modificación No. 3 al contrato de obra según los requerimientos de la entidad* contratante mediante la cual se tienen en cuenta la inclusión de actividades no previstas y mayores y menores cantidades.

- Que, por otra parte para el periodo comprendido desde el 27 de enero al 15 de mayo del presente año, se han presentado lluvias antes, durante y después de la ejecución *de las actividades previstas para ejecutar en obra, las cuales de acuerdo al registro* realizado de las h/día, se evidenciaron 20 días en los cuales se presentaron lluvias antes de la jornada laboral, representando un retraso en 60 horas en total, además de lo anterior se presentan lluvias durante 92 horas laborares, para un total de 152 horas equivalentes a 19 días laborales.(Ver oficio CP-033-0667-2023).

- Que, teniendo en cuenta la solicitud de prorroga [illegible]

Así las cosas, partiendo de las razones anteriormente expuestas se hace necesario prorrogar el contrato de obra por un termino de cuatro (4) meses y por ende con el fin de realizar acompañamiento, seguimiento y control a las actividades ejecutadas por el contratista, se requiere de igual manera prorrogar el contrato de consultoría por el mismo tiempo.

De acuerdo con lo manifestado, se remite la presente solicitud para su conocimiento, aprobación y trámite pertinente.

Sin otro particular, agradezco la atención prestada y pronta respuesta.

Se adjunta oficio CP-033-0667-2023.

Cordialmente

MARGARITA GOMEZ GOMEZ
Representante Legal (S)
Aprobó: C.E.G.G
Elaboró: M.G.G
C.C.// Archivo
Folios: (12)
.

CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
NIT: 830028126-2

Fusagasugá, 20 de mayo de 2024.

R&M-CTO-0780-051-2023

Señores:
Alcaldía de Fusagasugá
Secretario De Infraestructura
ING. RAÚL ARANGUREN
Fusagasugá – Cundinamarca.

REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORIA No.2023- 0780 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

ASUNTO: Remisión de oficio CP-034-0667-2023 - Reiteración solicitud de aclaración sobre licencia de construcción de estructura en container, estudio fotométrico y estructura base de la iluminación de cancha y pista atlética.

Respetado ingeniero:

Por medio de la presente nos permitimos remitir oficio CP-034-0667-2023 enviado por el contratista, mediante el cual solicita la siguiente información:

- Solicitud de aclaración sobre licencia de construcción de estructura en container.
- Estudio fotométrico y estructura base de la iluminación de cancha y pista atlética.

Cabe resaltar que lo anteriormente expuesto fue remitido a la entidad contratante mediante oficios CP-030-0667-2023, CP-031-0667-2023 y R&M-CTO-0780-048-2023; se reitera que la información solicitada es de carácter prioritario ya que se requiere para la elaboración del modificatorio No. 3 que se encuentra en proyección.

Sin otro particular, agradezco la atención prestada y celeridad en el asunto.

Se adjunta oficio CP-034-0667-2023, R&M-CTO-0780-048-2023, CP-031-0667-2023 y CP-030-0667-2023.

Cordialmente

MARGARITA GOMEZ GOMEZ
Representante Legal (S)
Aprobó: C.E.G.G
Elaboró: M.G.G
C.C.// Archivo
Folios: (4)

Anexo No.3 Control de Correspondencia recibida

CONSORCIO
DEPORTIVO 2023

CONSORCIO DEPORTIVO 2023
NIT: 901.771.549

Fusagasugá, 26 de febrero de 2024 **CP-028-0667-2023**

Ciudadano
Marco Antonio Vargas
Quintas del pedregal
Calle 23 # 42B-98 CASA C15
Fusagasugá - Cundinamarca

REFERENCIA: EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 DE 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

ASUNTO: Respuesta a afectación predio.

Cordial saludo

Teniendo en cuenta su comunicación telefónica en donde manifestó posibles afectaciones en su predio a causa de la obra el cual esta ubicado en la dirección calle 23 # 42B-98 casa C15 nos permitimos referir:


1. Se realizo visita junto con el área técnica y social tanto de la interventoría como del contratista el día 2 de febrero de 2024 cuyas fotografías se relacionan a continuación:


Registro fotográfico 2 de febrero de 2024.







2. Una vez realizada la visita el componente técnico refiere; Las fisuras que nombra el propietario y por las cuales se realiza la verificación obedecen a juntas constructivas ya que muestran una tendencia a hacer rectas, lo cual indica que no es una falla estructural, sino que es una dilatación que esta presente desde el momento de la construcción del inmueble, lo cual se puede apreciar en las siguientes imágenes




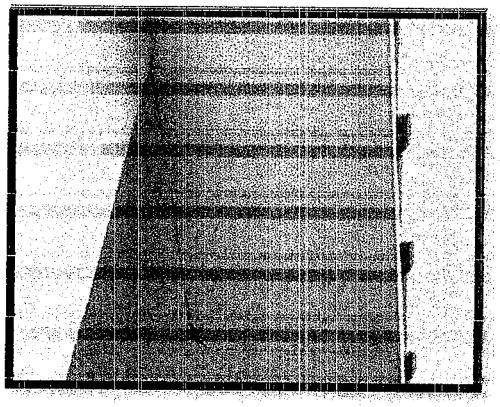

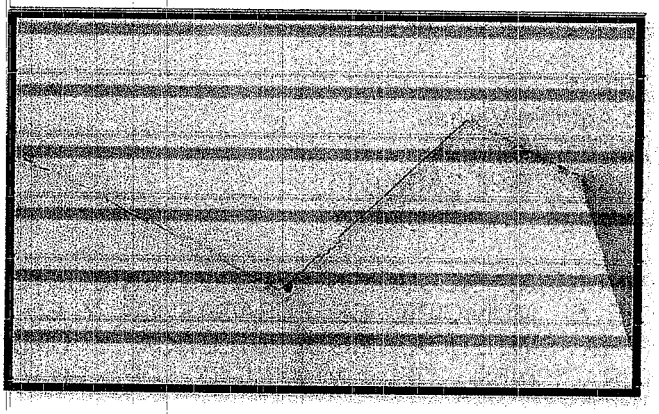


3. En los techos de la vivienda se logra evidenciar, que existen láminas de superboard o sistemas de la misa índole, de igual forma en una de las habitaciones se logra evidenciar que las fisuras ya se han tratado y se observa pintura.

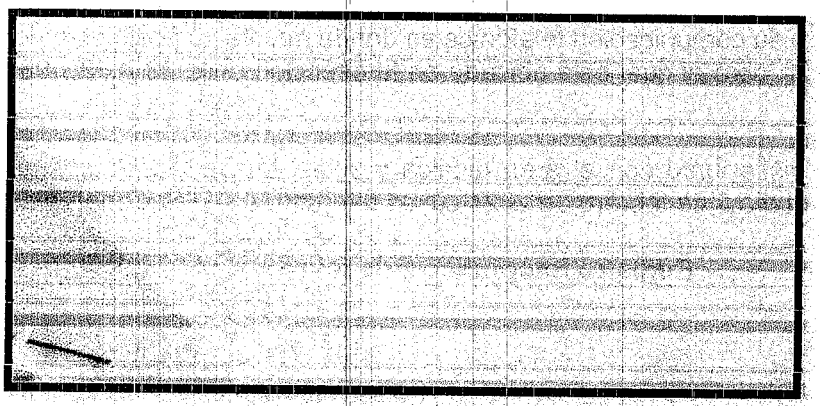

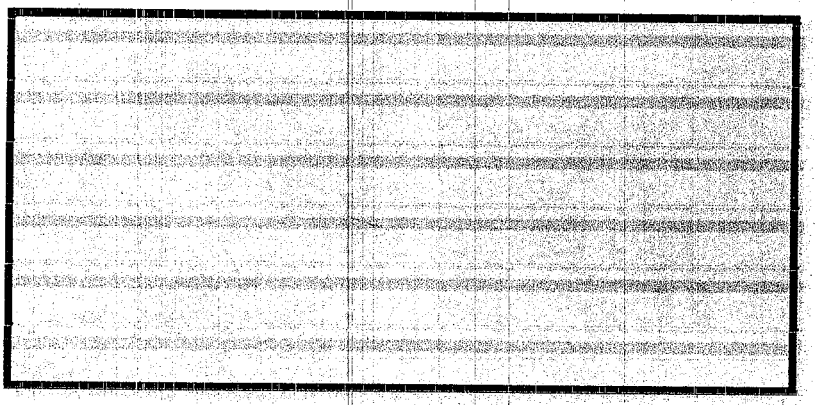


De igual forma se observa en las viviendas colindantes presentan problemas del mismo ámbito, evidenciando que los problemas reportados por el propietario de la vivienda corresponden a juntas constructivas, que se hacen visibles con el paso del tiempo o por movimientos sísmicos, cabe recordar que en los últimos meses se han presentado fuertes sismos en el territorio nacional y de los cuales los presentados el 19 de enero y 21 de enero se han sentido con gran magnitud en Fusagasugá.

Anexo 1. Sismos Sentidos Intensidad Escala.

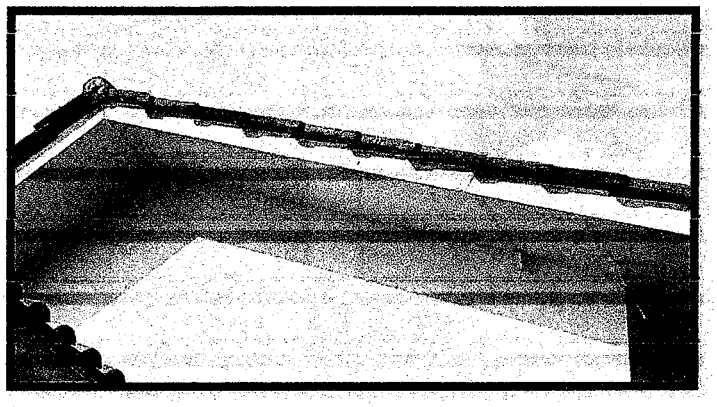




Así mismo nos permitimos aclarar que la obra no afecta directamente la zona cercana a los predios colindantes de hecho no hay registro sobre afectaciones al muro que actúa de cerramiento del conjunto, estructura que se encuentra más cercano a las obras en ejecución, teniendo en cuenta que las obras adelantadas a la fecha se realizan a una distancia de mas de 70 metros al punto más cercano de la vivienda.

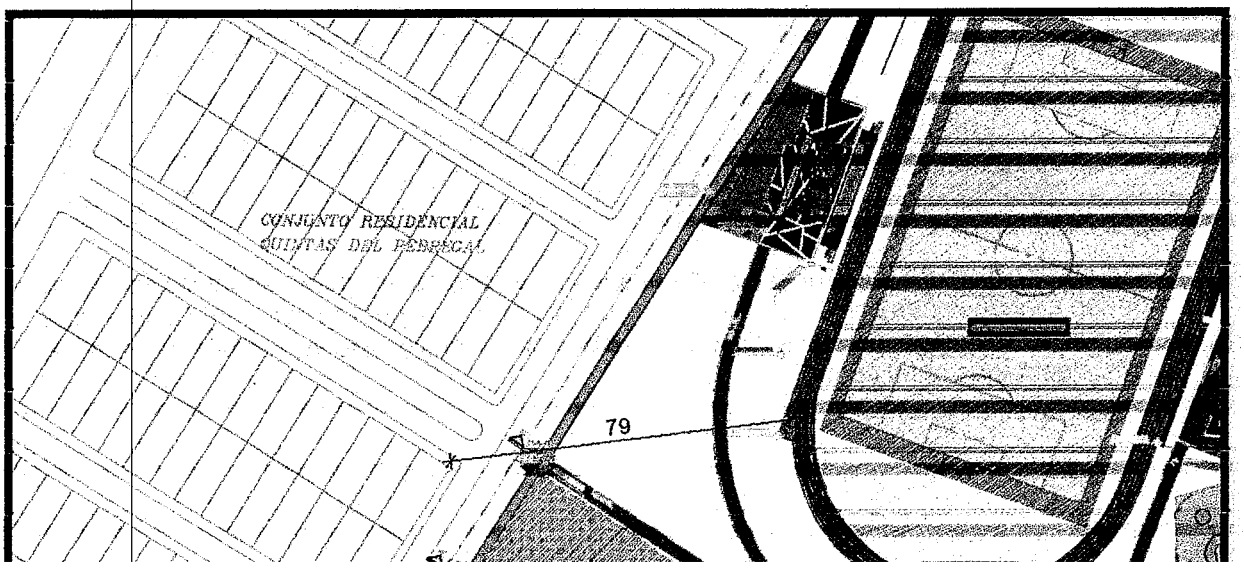

A continuación, se anexa registro fotográfico del muro, donde actualmente no presentan daños que en este caso es el más cercano a la obra.




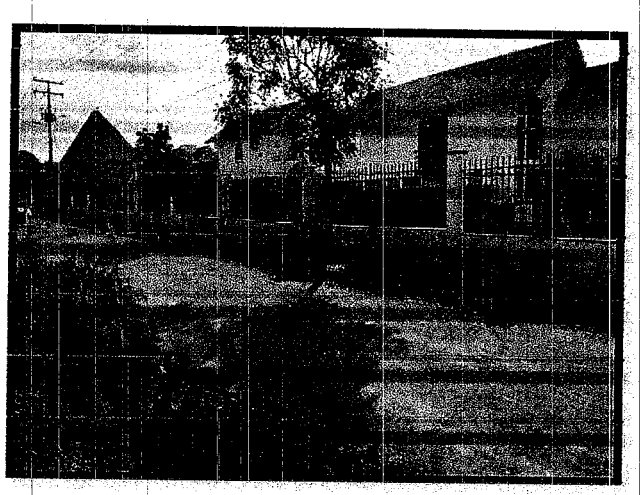

4. Nos permitimos adjuntar registro fotográfico fechado donde se evidencia que el contratista realizo levantamiento de actas de vecindad del muro del conjunto por prevención ya que como se ha manifestado anteriormente la obra se encuentra a una distancia considerable de los predios y/o conjuntos perimetrales.

Así mismo nos permitimos anexar el formato de acta de vecindad del 13 de septiembre de 2023.

Anexo 2. Formato acta de vecindad.

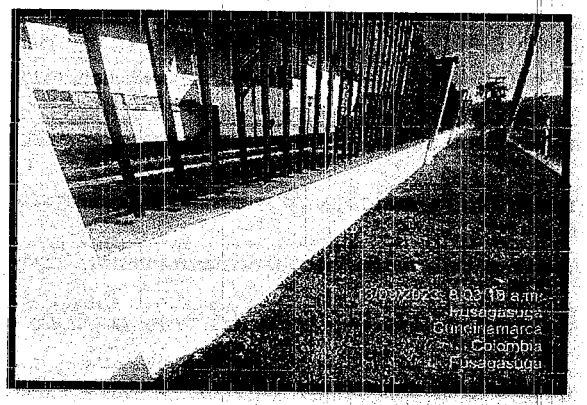



Por lo anterior expuesto se determina que las patologías encontradas en la estructura verificada corresponden a dilataciones constructivas propias de la forma en la cual se construyó el inmueble y que se han evidenciado por el paso del tiempo, por lo tanto, esto no es atribuible a las actividades ejecutadas en el contrato en mención.

Cordialmente,

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO

Sismos sentidos
Intensidad Escala (EMS -98)


Sismos reportados como sentidos del municipio FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA al 27/02/2024 12:34:26

Fecha	Latitud	Longitud	Magnitud	Departamento	Municipio	Centro poblado	Intensidad maxima	Intensidad sitio	Area epicentral	Id sismo
21/02/2024 - 11:05 PM	6.79	-73.23	4.70	CUNDINAMARCA	FUSAGASUGÁ	FUSAGASUGÁ	5	2	Zapatoca - Santander, Colombia	SGC2024drtxjc
21/01/2024 - 12:19 PM	6.80	-73.14	5.00	CUNDINAMARCA	FUSAGASUGÁ	FUSAGASUGÁ	5	4	Los Santos - Santander, Colombia	SGC2024bmazsf
19/01/2024 - 06:26 AM	4.78	-76.04	5.60	CUNDINAMARCA	FUSAGASUGÁ	FUSAGASUGÁ	6	4	Ansermanuevo - Valle del Gauca, Colombia	SGC2024bhxvaw
08/11/2023 - 04:40 AM	6.77	-73.17	4.70	CUNDINAMARCA	FUSAGASUGÁ	FUSAGASUGÁ	3	3	Los Santos - Santander, Colombia	SGC2023vzqbww
01/11/2023 - 03:44 AM	6.79	-73.18	2.90	CUNDINAMARCA	FUSAGASUGÁ	FUSAGASUGÁ	4	3	Los Santos - Santander, Colombia	SGC2023vmsdte

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CODIGO FO-SC-06	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSION 1	

FECHA			OBJETO DEL CONTRATO: EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 DE 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.	ACTA N° 3
13	9	2023		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO

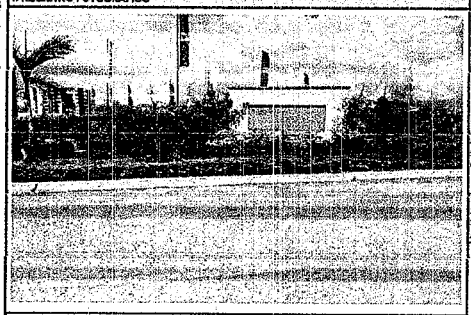

2. DATOS GENERALES

Nombre del Propietario: ACTA DE VECINDAD VILLAS DEL PEDREGAL
Teléfono: 3105784594
Dirección: Calle 23N # 42E-88
Long. del frente (mts): Estrato: 5

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		Se realiza acta de vecindad el 13 de septiembre de 2023.
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. TICS		X	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional	
2. Comercial	X	5. Baldío	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural	
4. Institucional	X	8. Mixto	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI X NO
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI NO X

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

El 13 de septiembre de 2023, se realiza acta de vecindad del muro del conjunto villas del pedregal, teniendo en cuenta muro colindante sobre la vía de la carrera 42B


Se evidencia la existencia de cerramiento en muro y reja del conjunto aledaño a la vía costado izquierdo. Muros: En mampostería y columnas en concreto y reja metalica pintada con desgaste


Sumideros: Se evidencia material de arrastre junto al sardinel del costado izquierdo y sobre las rejillas de los sumideros existentes donde se aprecia hojas, raices y varios elementos que estan taponando le entrada del desague

Nota: El registro fotografico y descripción se realizo el 13 de septiembre de 2023, antes de la intervención de la cancha, de manera preventiva.


FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CODIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-SC-06	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1	

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, en interior de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.









Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente período de reporte, en Bogotá D.C., a los _____13_____días del mes de_____09_____ de _____2023_____

ELABORÓ:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Residente Técnico - Contratista

REVISO:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Residente Técnico - Interventoría

ACOMPAÑÓ:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Residente Social-Interventoría

(Firma) _____
(Nombre) _____
Residente Social - Contratista

(Firma) _____
(Nombre) _____
Propietario

CONSORCIO DEPORTIVO 2023
NIT: 901.771.549

Fusagasugá, 23 de abril de 2024 **CP-030-0667-2023**

Señores:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Atn. Ing. Raul Aranguren Martínez
Secretario de Despacho
Supervisor de contrato
Fusagasugá - Cundinamarca

REFERENCIA: EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 DE 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

ASUNTO: Solicitud de aclaración sobre licencia de construcción de estructura en container

Cordial saludo

Teniendo en cuenta que actualmente se avanza la elaboración de un modificatorio de mayores y menores cantidades, necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, nos encontramos avanzando sobre la solicitud de cotización de Camerinos y gradería en container, sin embargo, se hace necesario solicitar aclaración sobre la necesidad de tener licencia de construcción para este tipo de estructuras, teniendo en cuenta el predio de intervención y el objeto del contrato en ejecución.

Agradezco su atención y pronta respuesta.

Cordialmente,

CONSORCIO DEPORTIVO 2023
R/L LUIS FARFAN VELASQUEZ
NIT: 901.771.549
consorciodeportivo667@gmail.com

ALCALDIA DE FUSAGASUGA

Al Contestar cite Radicado: **R-2024-11380** Id: **386486**

Folios: 1 Fecha: 2024-04-24 08:45:54 Anexos: 0
Copias:
Remitente: CONSORCIO DEPORTIVO 2023
Destinatario: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
AUTORIZO a la Alcaldía de Fusagasugá, para utilizar los medios electrónicos como mecanismo de comunicación de conformidad de los previstos en los artículos 53,56 y 57 numeral primero de la ley 1437 de 2011.
SI__NO__Firma_____

CONSORCIO
DEPORTIVO 2023

CONSORCIO DEPORTIVO 2023
NIT: 901.771.549

Fusagasugá, 09 de mayo de 2024 **CP-031-0667-2023**

Señores
R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
Atn. R.L. MARGARITA GOMEZ GOMEZ
Fusagasugá – Cundinamarca.

REFERENCIA: Contrato de obra No. 2023-0667 cuyo objeto es "EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 DE 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".

ASUNTO: Solicitud de Estudio fotométrico y estructura base de la iluminación de cancha y pista atlética.

Cordial saludo

De acuerdo a las solicitudes realizadas en los comités de obra, donde se solicita incluir en el modificatorio el circuito de iluminación de la cancha de futbol y pista, me permito informar que, dentro de los diseños entregados por la entidad, no se encuentran aquellos refrentes al estudio fotométrico, memorias y descripciones de lámparas o proyectores a instalar en dicha iluminación.

Con el fin de dar el alcance solicitado al modificatorio en proyección, nos permitimos solicitar copia de estudio fotométrico que incluya memorias, descripción de lámparas o proyectores a suministrar, además de los estudios de la estructura base de soporte para los postes de 24 metros de altura correspondientes a la iluminación de la cancha de futbol y pista atlética.

Agradezco su atención y pronta respuesta.

Cordialmente,

CONSORCIO DEPORTIVO 2023
R/L LUIS FARFAN VELASQUEZ
NIT: 901.771.549
consorciodeportivo667@gmail.com

CONSORCIO
DEPORTIVO 2023

CONSORCIO DEPORTIVO 2023
NIT: 901.771.549

Fusagasugá, 16 de mayo de 2024 **CP-033-0667-2023**

Señores
R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
Atn. R.L. MARGARITA GOMEZ GOMEZ
Fusagasugá – Cundinamarca.

REFERENCIA: Contrato de obra No. 2023-0667 cuyo objeto es "EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 DE 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".

ASUNTO: Solicitud de Prorroga 01.

Cordial saludo

Durante la ejecución de las obras adicionales incorporadas al presupuesto del contrato de obra en mención, se han evidenciado la necesidad de solicitar tiempo de prórroga para su correcta ejecución.

Si bien es cierto, durante el modificatorio No. 02 Adición 01, se estableció que dichas obras complementarias, se ejecutarían en el transcurso del plazo contractual vigente, dichas actividades han sido retrasadas por los tiempos de lluvias del presente año, trayendo consigo, disminución en rendimientos en movimiento de tierras, instalación de cárcamos, y cerramiento de cancha, y en algunos casos la suspensión total de actividades, como se puede observar en el análisis de lluvias y afectaciones que se adjunta.

Por otro lado, durante los comités realizados en conjunto con interventoría, supervisión y contratista en el año 2024, han denotado la necesidad de garantizar los camerinos para hombres y mujeres al igual que el espacio necesario para la comodidad de los asistentes a los eventos (graderías), como que ciertamente se realizaran en dichas instalaciones una vez culminadas las obras en ejecución.

Esta situación evidencio la necesidad de realizar un modificatorio 3, en el cual se contemplarán ítems no previstos y cantidades mayores y menores que garanticen suplir las necesidades evidenciadas por el contratante, y que a la fecha se encuentra en fase de proyección para la aprobación de la entidad.

De acuerdo a las situaciones detalladas anteriormente, el área administrativa del CONSORCIO DEPORTIVO 2023, Solicita la aprobación de un prorroga de 4 meses al contrato en mención; con el fin de dar alance a las necesidades evidenciadas en los comités técnicos y garantizar la ejecución de las obras contratadas al igual que aquellas que se encuentran en proyección mediante el modificatorio No. 3.

De acuerdo a la anterior solicitud adjunto reporte de lluvias y afectaciones y cronograma actualizado

Agradezco su atención y pronta respuesta.

Cordialmente,

CONSORCIO DEPORTIVO 2023
NIT: 901.771.549

Los registra de lluvias durante la noche anterior a la jornada laboral ocasionan afectaciones de 3 horas por día, durante las cuales se hace manejo de aguas y se permite airear los materiales húmedos y luego continuar con las actividades a ejecutar, por otra parte, las lluvias que se presentan en horas laborales obligan a la suspensión de actividades durante.

Para el periodo en reporte se presentan 20 días en los cuales se presentaron lluvias antes de la jornada laboral, representando un retraso en 60 horas en total, además de lo anterior se presentan lluvias durante 92 horas laborares, para un total de 152 horas equivalentes a 19 días laborales.

RELACION ESTADO DEL CLIMA ENERO NOCHE			
DIA	DURACION (H)	OBSERVACIONES	AFECTACION (H)
27/01/2024	2 h	Se presentan lluvias la noche anterior lo cual afecta las actividades de movimiento de tierras por la saturación de los materiales	3
29/01/2024	3 h	Se presentan lluvias la noche anterior lo cual afecta las actividades de movimiento de tierras por la saturación de los materiales	3
30/01/2024	2 h	Se presentan lluvias la noche anterior lo cual afecta las actividades de movimiento de tierras por la saturación de los materiales	3
RELACION ESTADO DEL CLIMA FEBRERO HORAS NO LABORALES			
DIA	DURACION (H)	OBSERVACIONES	AFECTACION (H)
5/02/2024	2 h	Se presentan lluvias la noche anterior lo cual afecta las actividades de movimiento de tierras por la saturación de los materiales	3
10/02/2024	3 h	Se presentan lluvias la noche anterior lo cual afecta las actividades de movimiento de tierras por la saturación de los materiales	3
28/02/2024	2 h	Se presentan lluvias la noche anterior lo cual afecta las actividades de movimiento de tierras por la saturación de los materiales	3
RELACION ESTADO DEL CLIMA FEBRERO HORAS LABORALES			
DIA	HORA LABORAL	OBSERVACIONES	AFECTACION (H)
6/02/2024	07:00-19:00	Se presentan lluvias moderadas impidiendo la ejecución normal de actividades	5
8/02/2024	14:00-19:00	Se presentan lluvias moderadas impidiendo la ejecución normal de actividades	5
10/02/2024	07:00-19:00	Se presentan lluvias moderadas impidiendo la ejecución normal de actividades	12
22/02/2024	15:00-19:00	Se presenta lluvias moderas impidiendo la ejecución normal de actividades	4
RELACION ESTADO DEL CLIMA MARZO HORAS NO LABORALES			
DIA	DURACION (H)	OBSERVACIONES	AFECTACION (H)
4/03/2024	3 h	Se presentan lluvias la noche anterior lo cual afecta las actividades de movimiento de tierras por la saturación de los materiales	3
RELACION ESTADO DEL CLIMA MARZO HORAS LABORALES			
DIA	HORA LABORAL	OBSERVACIONES	AFECTACION (H)
8/03/2024	11:00-12:00	Se presentan lluvias moderadas impidiendo la ejecución normal de actividades	1
18/03/2024	17:00-18:00 18:00-19:00	Se presenta lluvias fuertes impidiendo la ejecución normal de actividades	2
19/03/2024	14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00	Se presenta lluvias fuertes impidiendo la ejecución normal de actividades	5
20/03/2024	17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00	Se presenta lluvias fuertes impidiendo la ejecución normal de actividades	3
23/03/2024	15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00	Se presenta lluvias fuertes impidiendo la ejecución normal de actividades	4

CONSORCIO
DEPORTIVO 2023

CONSORCIO DEPORTIVO 2023
NIT: 901.771.549

RELACION ESTADO DEL CLIMA ABRIL HORAS NO LABORALES			
DIA	DURACION (H)	OBSERVACIONES	AFECTACION (H)
1/04/2024	4 h	Se presentan lluvias la noche anterior lo cual afecta las actividades de movimiento de tierras por la saturación de los materiales	3
2/04/2024	3 h	Se presentan lluvias la noche anterior lo cual afecta las actividades de movimiento de tierras por la saturación de los materiales	3
3/04/2024	2 h	Se presentan lluvias la noche anterior lo cual afecta las actividades de movimiento de tierras por la saturación de los materiales	3
4/04/2024	4 h	Se presentan lluvias la noche anterior lo cual afecta las actividades de movimiento de tierras por la saturación de los materiales	3
6/04/2024	5 h	Se presentan lluvias la noche anterior lo cual afecta las actividades de movimiento de tierras por la saturación de los materiales	3
18/04/204	3 h	Se presentan lluvias la noche anterior lo cual afecta las actividades de movimiento de tierras por la saturación de los materiales	3
20/04/2024	3 h	Se presentan lluvias la noche anterior lo cual afecta las actividades de movimiento de tierras por la saturación de los materiales	3
22/04/2024	4 h	Se presentan lluvias la noche anterior lo cual afecta las actividades de movimiento de tierras por la saturación de los materiales	3
23/04/2024	3 h	Se presentan lluvias la noche anterior lo cual afecta las actividades de movimiento de tierras por la saturación de los materiales	3
26/04/2024	4 h	Se presentan lluvias la noche anterior lo cual afecta las actividades de movimiento de tierras por la saturación de los materiales	3

RELACION ESTADO DEL CLIMA ABRIL HORAS LABORALES			
DIA	HORA LABORAL	OBSERVACIONES	AFECTACION (H)
6/04/2024	07:00-08:00	Se presentan lluvias fuertes impidiendo la ejecución normal de actividades	1
17/04/2024	16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00	Se presentan lluvias moderadas impidiendo la ejecución normal de actividades	3
19/04/2024	12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00	Se presenta lluvias moderadas impidiendo la ejecución normal de actividades	7
20/04/2024	12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00	Se presenta lluvias fuertes impidiendo la ejecución normal de actividades	7
22/04/2024	08:00-09:00 09:00-10:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00	Se presenta lluvias moderadas impidiendo la ejecución normal de actividades	7
	11:00-12:00 12:00-13:00	Se presenta lluvias fuertes impidiendo la ejecución normal de actividades	
23/04/2024	11:00-12:00	Se presentan lluvias moderadas impidiendo la ejecución normal de actividades	1
26/04/2024	12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 16:00-17:00	Se presenta lluvias fuertes impidiendo la ejecución normal de actividades	4

RELACION ESTADO DEL CLIMA MAYO HORAS NO LABORALES			
DIA	DURACION (H)	OBSERVACIONES	AFECTACION
6/05/2024	3 h	Se presentan lluvias la noche anterior lo cual afecta las actividades de movimiento de tierras por la saturación de los materiales	3
13/05/2024	3 h	Se presentan lluvias la noche anterior lo cual afecta las actividades de movimiento de tierras por la saturación de los materiales	3
14/05/2024	3 h	Se presentan lluvias la noche anterior lo cual afecta las actividades de	

REGISTRO DE CLIMA SEGÚN HORARIO LABORAL

Objeto EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 DE 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA


Contratista CONSORCIO DEPORTIVO 2023

Ciudad FUSAGASUGA

FECHA DESDE: 29 de abril **FECHA HAS TA :** 2 de junio **Informe No.** 09 - mayo

Informe No.9 - mayo Semana 36


Fecha / Hora	Lunes 13	Martes 14	Miércoles 15	Jueves 16	Viernes 17	Sábado 18
7:00 a. m.		S	S	S		
8:00 a. m.		S	S	S		
9:00 a. m.		S	S			
10:00 a. m.		S	S			
11:00 a. m.		S	M			
12:00 p. m.		S	M			
1:00 p. m.		S	M			
2:00 p. m.		S	S			
3:00 p. m.		S	S			
4:00 p. m.		S	S			
5:00 p. m.		S	S			
6:00 p. m.		S	S			
Noche (f) hr		3				
S	0	12	9	2	0	0
N	0	0	0	0	0	0
M	0	0	3	0	0	0
F	0	0	0	0	0	0
M+F	0	0	3	0	0	0

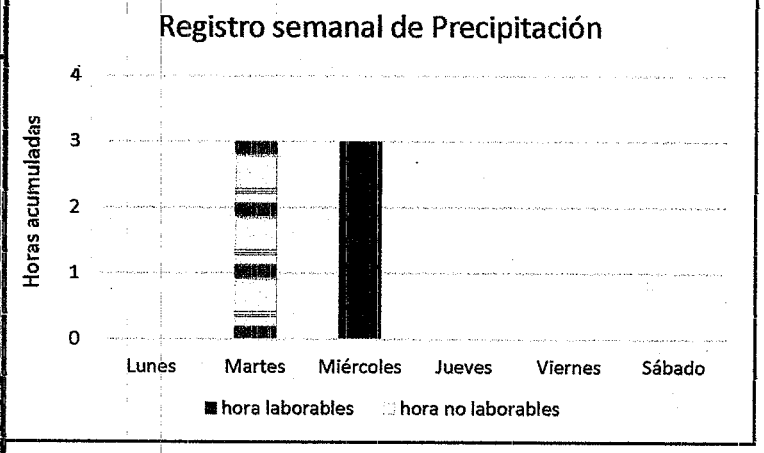

hora no laborables
Seco
Nublado
Lluvias Moderadas
Lluvias Fuertes
hora laborables

Informe No.9 - mayo Semana 37

Fecha / Hora	Lunes 20	Martes 21	Miércoles 22	Jueves 23	Viernes 24	Sábado 25
7:00 a. m.						
8:00 a. m.						
9:00 a. m.						
10:00 a. m.						
11:00 a. m.						
12:00 p. m.						
1:00 p. m.						
2:00 p. m.						
3:00 p. m.						
4:00 p. m.						
5:00 p. m.						
6:00 p. m.						
Noche (f) hr						
S	0	0	0	0	0	0
N	0	0	0	0	0	0

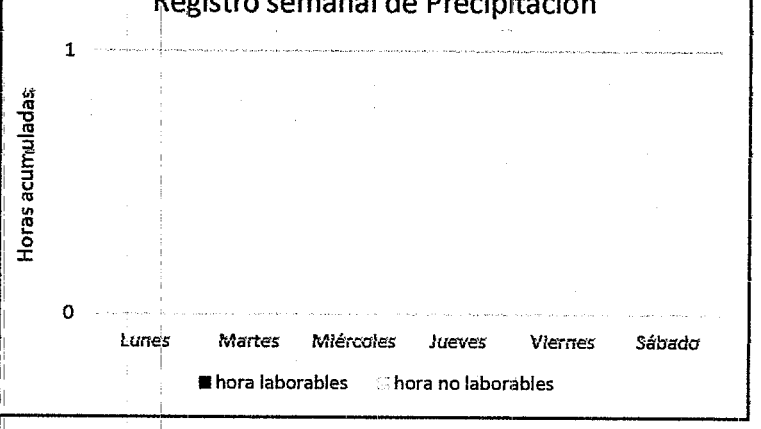

hora no laborables
Seco
Nublado

REGISTRO DE CLIMA SEGÚN HORARIO LABORAL

Objeto EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 DE 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA


Contratista CONSORCIO DEPORTIVO 2023

Ciudad FUSAGASUGA

FECHA DESDE: 29 de abril **FECHA HAS TA :** 2 de junio **Informe No.** 09 - mayo

Informe No.9 - mayo Semana 38

Fecha / Hora	Lunes 27	Martes 28	Miércoles 29	Jueves 30	Viernes 31	Sábado 1
7:00 a. m.						
8:00 a. m.						
9:00 a. m.						
10:00 a. m.						
11:00 a. m.						
12:00 p. m.						
1:00 p. m.						
2:00 p. m.						
3:00 p. m.						
4:00 p. m.						
5:00 p. m.						
6:00 p. m.						
Noche (f) hr						
S	0	0	0	0	0	0
N	0	0	0	0	0	0
M	0	0	0	0	0	0
F	0	0	0	0	0	0
M+F	0	0	0	0	0	0

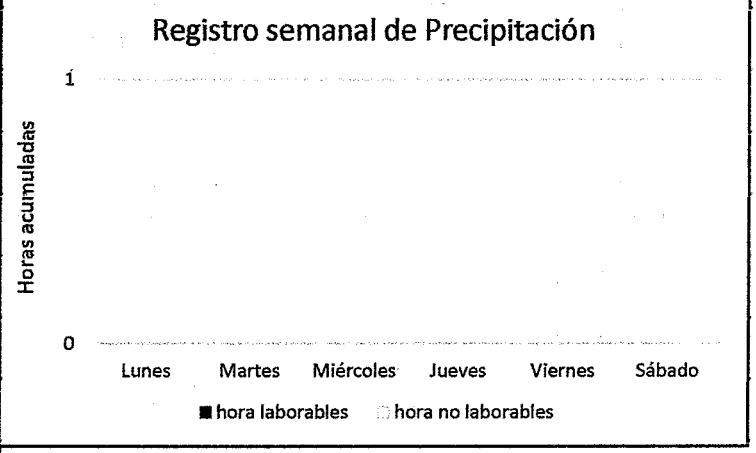

hora no laborables

Seco

Nublado

Lluvias Moderadas

Lluvias Fuertes

hora laborables

CONSORCIO
DEPORTIVO 2023

CONSORCIO DEPORTIVO 2023
NIT: 901.771.549

Fusagasugá, 20 de mayo de 2024 **CP-034-0667-2023**

Señores
R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
Atn. R.L. MARGARITA GOMEZ GOMEZ
Fusagasugá – Cundinamarca.

REFERENCIA: EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 DE 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

ASUNTO: Reiteración solicitud de aclaración sobre licencia de construcción de estructura en container, estudio fotométrico y estructura base de la iluminación de cancha y pista atlética.

Cordial saludo

Teniendo en cuenta que a la fecha no se ha recibido respuesta por parte de supervisión sobre las solicitudes realizadas bajo los consecutivos **CP-030-0667-2023 y CP-031-0667-2023** los cuales fueron radicados los días 24 de abril y 07 de mayo respectivamente

Me permito reiterar dichas solicitudes, siendo estas respuestas necesarias para la elaboración del modificatorio de mayores y menores cantidades en proyección, para la cual se solicitó, por una parte, incluir la cotización de Camerinos y gradería en container, y por otra el circuito de iluminación de la cancha de futbol y pista.

Es preciso establecer si es necesaria una licencia de construcción para la construcción de este tipo de estructuras en conteiner, al igual que es primordial la entrega de copia de estudio fotométrico que incluya memorias, descripción de lámparas o proyectores a suministrar, además de los estudios de la estructura base de soporte para los postes de 24 metros de altura correspondientes a la iluminación de la cancha de futbol y pista atlética-

Como es de notar, la documentación solicitada es de gran importancia para establecer el alcance del modificatorio en proyección, por tal motivo se enfatiza en la entrega oportuna de los mismos.

Agradezco su atención y pronta colaboración.

Cordialmente,

CONSORCIO DEPORTIVO 2023
R/L LUIS FARFAN VELASQUEZ
NIT: 901.771.549

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101419349	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	06	2024	06	09	2023	00:00	07	07	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
R Y M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	NIT: 830.028.126-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 38 A NRO. 25 - 58	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2697927

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
ALCALDIA DE FUSAGASUGA	NIT: 890.680.008-4

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 6 NRO. 6 - 24	FUSAGASUGA, CUNDINAMARCA	8818181

ADICIONAL:

PGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****232,935.00	$ *******8,000.00	$ ******45,777.00	$ **********286,713.00	$ ******279,675,964.14	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MYS CONSULTORES EN SEGUROS LTDA	235583	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-817963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 11005135682914 (3900) 000000286713 (96) 20240905

REFERENCIA PAGO: 11005135682291-4

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101419349	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	06	2024	06	09	2023	00:00	07	07	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	R Y M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS		NIT: 830.028.126-2
DIRECCIÓN: CR 38 A NRO. 25 - 58	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	2697927

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	ALCALDIA DE FUSAGASUGA		NIT: 890.680.008-4
DIRECCIÓN: CL 6 NRO. 6 - 24	**CIUDAD:** FUSAGASUGA, CUNDINAMARCA	**TELÉFONO:**	8818181

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101419349

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
NIT: 830028126-2

Fusagasugá, 17 de junio de 2024.

R&M-CTO-0780-059-2023

Señores:
Alcaldía de Fusagasugá
Secretario De Infraestructura
ING. Oscar Fabián Espinel Manrique
Fusagasugá – Cundinamarca.

REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORIA No.2023- 0780 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

ASUNTO: ENTREGA ACTA PARCIAL No. 3- CONTRATO DE OBRA No. 2023-0667.

Respetados señores:

Por medio de la presente nos permitimos realizar entrega del ACTA PARCIAL No. 3 de obra, para su revisión, aprobación y trámite.

Se anexan los siguientes soportes:

- Factura en borrador
- Autorización de facturación
- CDP
- RP
- Certificación bancaria
- Sabana de cobro y memorias de cantidades
- Certificación de parafiscales y FIC
- Copia de Actas generados en el periodo
- Informe técnico de ejecución de obra

ALCALDIA DE FUSAGASUGA

Al Contestar Cite Radicado: **R-2024-16189** Id: **398305**

Folios: 141 Fecha: 2024-06-18 09:18:17 Anexos: 0
Copias:
Remitente: CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS
Destinatario: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
AUTORIZO a la Alcaldia de Fusagasugá, para utilizar los medios electrónicos como mecanismo de comunicación de conformidad de los previsto en los artículos 53,56 y 57 numeral primero de la ley 1437 de 201...
SI__NO__Firma_____

Sin otro particular, agradezco la atención prestada.

Cordialmente

MARGARITA GOMEZ GOMEZ
Representante Legal (S)
Aprobó: C.E.G.G
Elaboró: M.G.G
C.C.// Archivo
Folios: 141
Se entregan tres (3) copias.

CONSORCIO
DEPORTIVO 2023

CONSORCIO DEPORTIVO 2023
NIT: 901.771.549

Fusagasugá, 17 de junio de 2024 **CP-037-0667-2023**

Señores
R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
Atn. R.L. MARGARITA GOMEZ GOMEZ
Fusagasugá – Cundinamarca.

REFERENCIA: EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 DE 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

ASUNTO: Documentos acta de pago parcial No 3

Cordial saludo

Por medio de la presente me permito remitir acta de pago parcial No. 3 correspondiente al periodo de 26 de febrero del 2023 al 07 de junio de 2024, de acuerdo a las actividades ejecutadas en el contrato en mención.

Con el fin de dar cumplimiento al proceso se revisión y aprobación, me permito adjuntar la siguiente documentación.

- Factura en borrador (se generar la factura final luego de la verificación y aprobación)
- Autorización de facturación
- RUT actualizado a la fecha
- CDP y RP
- Certificación Bancaria
- Sabana de Cobro y Memorias de cantidades
- Certificación de parafiscales y FIC
- Copia de Actas generadas en el periodo
- Informe Técnico de Ejecución de Obra

Agradezco su colaboración para continuar con el trámite respectivo y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

CONSORCIO DEPORTIVO 2023
R/L LUIS FARFAN VELASQUEZ
NIT: 901.771.549
consorciodeportivo667@gmail.com

| | | |

8.18		CAJA DE INSPECCIÓN DE80X80	UN		$395'145,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1
8.19		CAJA DE INSPECCIÓN DE100X100	UN	6,00	$485'070,00	$ 2'910'420,00	10,00	$ 4'850'700,00	10,00	$ 4'850'700,00		$ -	4,00	$ 1'940'280,00	3,00	$ 1'455'210,00	7,00	$ 3'395'490,00	
8.20		CANAL ACO SPORT DEDRENAJE EN POLICONCRETO _LW125H200B125 + REJILLA (incluye suministros, excavación, rellenos, mano de obra para su instalación)	M	635,00	$708'435,00	$ 449'856'225,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1
8.21		SUMIDERO LW125K +REJILLA LW125 L =0,50(incluye suministros e instalación)	UN	10,00	$1'116'811,00	$ 11'166'110,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1
8.22		CANAL ACO ENPOLICONCRETO_N150_H31 + REJILLA(incluye suministros, excavación, rellenos, mano de obra para su instalación)	ML		$542'697,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1
8.23		CONCRETO 4000 PSI	M3	3,30	$456'485,00	$ 1'506'400,50	3,30	$ 1'506'400,50	3,30	$ 1'506'400,50		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
8.24		ACERO FIGURADO 60000PSI	KG	100,89	$7'588,00	$ 765'553,32	100,89	$ 765'553,32	100,89	$ 765'553,32		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
						$ 558'387'771,82		$ 76'872'893,44		$ 48'915'774,32		$ -		$ 11'222'771,20		$ 9'918'847,48	-	$ 21'141'418,68	
9		RED GENERAL DE SUMINISTRO																	
9.1		ACOMETIDA MEDIDOR YLLENADO DE TANQUE				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	1
9.1.01		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	M3	182,00	$48'721,00	$ 8'867'222,00	6,49	$ 316'199,29	6,49	$ 316'199,29		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
9.1.02		RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	146,00	$20'799,00	$ 3'036'654,00	3,24	$ 67'388,76	3,24	$ 67'388,76		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
9.1.03		RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	36,00	$107'689,00	$ 3'876'804,00	2,70	$ 290'760,30	2,70	$ 290'760,30		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
9.1.04		RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	23,00	$11'472,00	$ 263'856,00	16,80	$ 192'729,60	16,80	$ 192'729,60		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
9.1.05		RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	14,00	$9'213,00	$ 128'982,00	9,26	$ 85'312,38	9,26	$ 85'312,38		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
9.1.06		ACOMETIDA DE 1/2" (incluye suministros e instalación de accesorios y medidor)	UN	9,00	$211'416,00	$ 1'902'744,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1
9.1.07		FLOTADOR MECANICO DE1/2" (incluye suministro e instalación)	UN	2,00	$99'516,00	$ 199'032,00	2,00	$ 199'032,00	2,00	$ 199'032,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
9.1.08		CAJA CONTADOR DE AGUA	UN	1,00	$80'601,00	$ 80'601,00	1,00	$ 80'601,00	1,00	$ 80'601,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
						$ 18'355'895,00		$ 1'232'023,33		$ 1'232'023,33		$ -		$ -		$ -	-	$ -	
9.2		TANQUE																	
9.2.01		EXCAVACIÓN MANUAL ENMATERIAL COMÚN H=0,0-2,0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	M3	47,60	$48'721,00	$ 2'319'119,60	28,00	$ 1'364'188,00	28,00	$ 1'364'188,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
9.2.02		RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	19,60	$84'621,00	$ 1'658'571,60	19,60	$ 1'658'571,60	19,60	$ 1'658'571,60		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
9.2.03		RELLENO TIPO 4 "SUBBASEB-200"	M3	2,80	$78'956,00	$ 221'076,80	2,80	$ 221'076,80	2,80	$ 221'076,80		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
9.2.04		SUBBASE GRANULAR	M3	16,80	$170'944,00	$ 2'871'859,20	16,80	$ 2'871'859,20	16,80	$ 2'871'859,20		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
9.2.05		PLACA EN CONCRETO DE 24 MPa, e=0,15 m (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y VIBRADO,NO INCLUYE ACERO)	M2	56,00	$147'052,00	$ 8'234'912,00	56,00	$ 8'234'912,00	56,00	$ 8'234'912,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
9.2.06		REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	369,60	$9'522,00	$ 3'519'331,20	74,48	$ 709'198,56	74,48	$ 709'198,56		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
9.2.07		CORTE PARA JUNTA DEDILATACIÓN EN PISO DECONCRETO AL 1/3 DEL ESPESOR DE LA PLACA (INCLUYE EQUIPOS Y MANO DE OBRA PARA EJECUCIÓN)	ML	166,67	$1'798,00	$ 335'632,66	113,00	$ 203'174,00	113,00	$ 203'174,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
9.2.08		SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO YSELLANTE)	ML	166,67	$7'899,00	$ 1'437'172,33	113,00	$ 889'987,00	113,00	$ 889'987,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
9.2.09		TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 15000 LTRS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIONES)	UN	2,00	$25'260'058,00	$ 50'520'116,00	2,00	$ 50'520'116,00	2,00	$ 50'520'116,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
9.2.10		CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C, 10 INC, ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	M2	60,00	$112'772,00	$ 6'766'320,00	60,00	$ 6'766'320,00	60,00	$ 6'766'320,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
9.2.11		VÁLVULA MARIPOSA 3"	UN	3,00	$659'205,00	$ 1'977'615,00	3,00	$ 1'977'615,00	3,00	$ 1'977'615,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
9.2.12		RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	10,00	$11'472,00	$ 114'720,00	10,00	$ 114'720,00	10,00	$ 114'720,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
9.2.13		RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	17,00	$15'280,00	$ 259'760,00	17,00	$ 259'760,00	17,00	$ 259'760,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
9.2.14		REGISTRO 3/4"	UN	1,00	$79'783,00	$ 79'783,00	2,00	$ 159'566,00	2,00	$ 159'566,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
9.2.15		UNIÓN UNIVERSAL PVC3"(incluye suministro e instalación)	UN	8,00	$56'069,00	$ 448'552,00	2,00	$ 112'138,00	2,00	$ 112'138,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
9.2.16		VÁLVULA CHEQUE DE 3" (incluye suministro e instalación)	UN	1,00	$298'695,00	$ 298'695,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
9.2.17		VÁLVULA DE BOLA METÁLICA 1" (Suministro e instalación)	UN	7,00	$40'835,00	$ 285'845,00	1,00	$ 40'835,00	1,00	$ 40'835,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
9.2.18		UNIÓN UNIVERSAL PVC1"(incluye suministro e instalación)	UN	2,00	$18'396,00	$ 36'792,00	2,00	$ 36'792,00	2,00	$ 36'792,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
9.2.19		UNIÓN UNIVERSAL PVC3/4"(incluye suministro e instalación)	UN	1,00	$15'387,00	$ 15'387,00	1,00	$ 15'387,00	1,00	$ 15'387,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
9.2.20		VÁLVULA CHEQUE DE 3/4" (incluye suministro e instalación)	UN	1,00	$53'100,00	$ 53'100,00	1,00	$ 53'100,00	1,00	$ 53'100,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
						$ 81'452'360,39		$ 76'189'316,16		$ 76'189'316,16		$ -		$ -		$ -	-	$ -	
10		RED SUMINISTRO DE AGUA FRÍA																	
10,01		TUBERIA PVC P 3" RDE 21 (incluye accesorios suministros e instalación)	ML	119,00	$57'401,00	$ 6'830'719,00	119,40	$ 6'853'679,40	119,40	$ 6'853'679,40		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
10,02		RED SUMINISTRO PVC 21/2"	ML	324,00	$53'613,00	$ 17'370'612,00	176,87	$ 9'482'531,31	176,87	$ 9'482'531,31		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
10,03		RED SUMINISTRO PVC 2"	ML	13,00	$34'577,00	$ 449'501,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
10,04		RED SUMINISTRO PVC 11/2"	ML	88,00	$24'424,00	$ 2'149'312,00	82,58	$ 2'016'933,92	82,58	$ 2'016'933,92		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
10,05		TUBERIA PVC P 1 1/4" RDE 21 (incluye accesorios suministros e instalación)	ML	24,00	$17'111,00	$ 410'664,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
10,06		RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	337,00	$15'280,00	$ 5'148'360,00	286,90	$ 4'383'832,00	286,90	$ 4'383'832,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
10,07		RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	191,00	$9'213,00	$ 1'759'683,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
10,08		RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	15,00	$11'472,00	$ 172'080,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
10,09		REGISTRO 1/2"	UN	19,00	$83'092,00	$ 1'198'748,00	12,00	$ 757'104,00	12,00	$ 757'104,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
10,10		LLAVE MANGUERA	UN	13,00	$38'255,00	$ 497'315,00	12,00	$ 459'060,00	12,00	$ 459'060,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
						$ 35'987'994,00		$ 23'953'140,63		$ 23'953'140,63		$ -		$ -		$ -	-	$ -	
11		PUNTOS HIDRAÚLICOS DEAGUA FRÍA h max 2,50m																	
11,01		PUNTO AF LLAVE MANGUERA (incluye suministros e instalaciones)	UN	13,00	$34'443,00	$ 447'759,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	

AVADO DEPIES (Incluye suministros e	UN	1,00	$36'794,00	$	36'794,00	1,00	$	36'794,00	1,00	$	36'794,00		$	-		$	-	-	$	-	-	$	-	0,00%	1,00	$	36'794,00
IPENSADOR DE AGUA (Incluye suministros e	UN	5,00	$34'443,00	$	172'215,00	0,00	$	-	0,00	$	-		$	-		$	-	-	$	-	-	$	-	100,00%	-	$	-
				$	656'768,00		$	36'794,00		$	36'794,00		$	-		$	-		$	-	-	$	-		-	$	36'794,00
REDES ELÉCTRICAS																											
A				$	-		$	-		$	-		$	-		$	-	-	$	-	-	$	-	100,00%	-	$	-
=3" PVC-TDP(INCLUYE SUMINISTRO E O INCLUYE RELLENOS) NORMA CS209.	ML	50,00	$73'759,00	$	3'687'950,00	45,00	$	3'319'155,00	50,00	$	3'687'950,00		$	-	50,00	$	3'687'950,00	-	$	-	50,00	$	3'687'950,00	100,00%	-	$	-
=4" PVC-TDP(INCLUYE SUMINISTRO E O INCLUYE RELLENOS) NORMA CS209.	ML	50,00	$88'988,00	$	4'434'400,00	130,10	$	11'538'308,80	130,10	$	11'538'308,80		$	-	-	$	-	-	$	-	-	$	-	0,00%	130,10	$	11'538'308,80
=6" PVC-TDP(INCLUYE SUMINISTRO E O INCLUYE RELLENOS). NORMA CS212.	ML	45,00	$293'179,00	$	13'193'055,00	29,00	$	8'502'191,00	29,00	$	8'502'191,00		$	-	-	$	-	-	$	-	-	$	-	0,00%	29,00	$	8'502'191,00
ECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NSA CS 274(ZVERDE, INCLUYE BASE, TE, MARCO Y TAPA). MEDIDAS X 0,90M. MEDIDAS INTERNAS: 0,60X 0,60M.	UN	86,00	$521'297,00	$	44'831'542,00	14,00	$	7'298'158,00	64,00	$	33'363'008,00		$	-	-	$	-	-	$	-	-	$	-	0,00%	64,00	$	33'363'008,00
ECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NSA CS 275 (ZVERDE,INCLUYE BASE, , MARCO Y TAPA). MEDIDAS EXTERNAS: M. MEDIDAS INTERNAS: 1,19 X 0,69M.	UN	6,00	$884'588,00	$	5'307'528,00	6,00	$	5'307'528,00	6,00	$	5'307'528,00		$	-	-	$	-	-	$	-	-	$	-	0,00%	6,00	$	5'307'528,00
PECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN SA CS 278 (ZVERDE,INCLUYE BASE, MUROS, O Y TAPAS). MEDIDAS EXTERNAS: 1,79 X IDAS INTERNAS: 1,49 X 1,19M. ALTURA:	UN	6,00	$1'255'733,00	$	7'534'398,00	6,00	$	7'534'398,00	6,00	$	7'534'398,00		$	-	-	$	-	-	$	-	-	$	-	0,00%	6,00	$	7'534'398,00
CIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE	UN	2,00	$431'487,00	$	862'974,00	2,00	$	862'974,00	0,00	$	-		$	-	-	$	-	-	$	-	-	$	-	100,00%	-	$	-
UESTA ATIERRA PARA CENTRO DE ON SUBTERRÁNEO RED DISTRIBUCION O UBLICO, RESISTIVIDAD DE TERRENODE (INCLUYESISTEM INSTALACIÓN),A DE IERRA, POZOS CAPACITIVOS, DE SUELOTIPO HIDROSOLTA, CABLE 2/0 UDO, CONECTORES CERTIFICADOS.) ISTRO E	UN	1,00	$3'944'905,00	$	3'944'905,00	1,00	$	3'944'905,00	0,00	$	-		$	-	-	$	-	-	$	-	-	$	-	100,00%	-	$	-
PUESTA A TIERRA PARA AP Y DERIVACIÓN RESINA (Incluye lación)	UN	84,00	$2'476'732,00	$	208'045'488,00	8,00	$	19'813'856,00	0,00	$	-		$	-	-	$	-	-	$	-	-	$	-	100,00%	-	$	-
RICO 2X8 AWG PARA ACOMETIDATIPO 'C. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	ML	775,00	$14'917,00	$	11'560'675,00	775,00	$	11'560'675,00	225,84	$	3'368'855,28		$	-	-	$	-	-	$	-	-	$	-	0,00%	225,84	$	3'368'855,28
NEA 1x2+1x2 ALUMINIO 600V THW AWG e instalación).	ML	1'850,00	$40'331,00	$	74'612'350,00	250,00	$	10'082'750,00	225,84	$	9'108'353,04		$	-	-	$	-	-	$	-	-	$	-	0,00%	225,84	$	9'108'353,04
STERRANEA 3x185mm2 ALUMINIO XLPE suministro e instalación).	ML	60,00	$181'609,00	$	10'896'540,00	60,00	$	10'896'540,00	60,00	$	10'896'540,00		$	-	-	$	-	-	$	-	-	$	-	0,00%	60,00	$	10'896'540,00
SEMISUMERGIBLE DE 150 KVA CAJA DE MANIOBRA ENTRADA Y SVÍAS 600A 15 KV (Incluye suministro, orios e instalación), Norma CODENSA CTS	UN	1,00	$30'188'596,00	$	30'188'596,00	1,00	$	30'188'596,00	0,00	$	-		$	-	-	$	-	-	$	-	-	$	-	100,00%	-	$	-
				$	419'100'401,00		$	130'850'034,80		$	93'307'132,12		$	-		$	3'687'950,00		$	-	-	$	3'687'950,00		-	$	89'619'182,12
DE ALUMBRADO PÚBLICO																											
=3" PVC-TDP(INCLUYE SUMINISTRO E NO INCLUYE RELLENOS)	ML	1'547,00	$36'980,00	$	56'743'960,00	250,00	$	9'170'000,00	1'101,51	$	40'403'386,80		$	-		$	-	-	$	-	-	$	-	0,00%	1'101,51	$	40'403'386,80
O 6M	UN	53,00	$1'330'923,00	$	70'538'919,00	5,00	$	6'654'615,00	0,00	$	-		$	-		$	-	-	$	-	-	$	-	100,00%	-	$	-
CO AP, H=8M (INC. SUMINISTRO, IZAJE, STALACIÓN, INC. BRAZOSENCILLO Y BASE AP802)	UN	23,00	$2'841'380,00	$	65'351'740,00	9,00	$	25'572'420,00	0,00	$	-		$	-		$	-	-	$	-	-	$	-	100,00%	-	$	-
ICO AP, H=12M (INC. SUMINISTRO, IZAJE, E INSTALACIÓN. INC. BRAZOSENCILLO Y ORMA AP802)	UN	4,00	$3'534'657,00	$	14'138'628,00	0,00	$	-	0,00	$	-		$	-		$	-	-	$	-	-	$	-	100,00%	-	$	-
CO H=24M.INCLUYE CANASTILLA Y LO. (INC. SUMINISTRO, IZAJE, APLOMADO I. INC. BRAZOSENCILLO Y BASE EN SE GRANULAR B-600)	UN	3,00	$11'757'090,00	$	35'271'270,00	4,00	$	47'028'360,00	4,00	$	47'028'360,00		$	-		$	-	-	$	-	-	$	-	0,00%	4,00	$	47'028'360,00
: OMEGA I MP 48 LED, 4000K, 1 LM, 120/277V, 50.000 HORAS,	UN	57,00	$536'121,00	$	30'558'897,00	5,00	$	2'680'605,00	0,00	$	-		$	-		$	-	-	$	-	-	$	-	100,00%	-	$	-
: OMEGAMP II 128 LED . NW. 4000K,T02, nas. 120/277V. 100.000 HORAS. IP65. SPD CA ROY ALPHA. Con Base para Fotocelda y de 0,5 mx 11/2". GARANTIA: 5AÑOS.	UN	24,00	$1'022'312,00	$	24'535'488,00	9,00	$	9'200'808,00	0,00	$	-		$	-		$	-	-	$	-	-	$	-	100,00%	-	$	-
RONA LEDI 92 LED. P04 5000K,103W . IRC 80 120/277V. 50,000HORAS. IP66. HA. Garantia: 5 AÑOS.	UN	5,00	$1'090'877,00	$	5'454'385,00	0,00	$	-	0,00	$	-		$	-		$	-	-	$	-	-	$	-	100,00%	-	$	-
RONA LEDII 320 LED. P04 170W 24.297 V. SPD 10KV- 10KA. CTRL 0-10V 50.000 IRC 80 MARCA: ROY ALPHA. GARANTIA:	UN	18,00	$1'253'134,00	$	22'556'412,00	0,00	$	-	0,00	$	-		$	-		$	-	-	$	-	-	$	-	100,00%	-	$	-
le 960W124.000 Lúmenes IP664000K Y/O MULTIVOLTAJE 120- 277V.CTRL 0- PROMEDIO: 100.000 HORAS. GARANTIA:	UN	8,00	$10'070'942,00	$	80'567'536,00	8,00	$	80'567'536,00	8,00	$	80'567'536,00		$	-		$	-	-	$	-	-	$	-	0,00%	8,00	$	80'567'536,00
le 960W124.000 Lúmenes IP664000K Y/O MULTIVOLTAJE 120-277V. VIDA UTIL .000 HORAS. CTRL 0- 10V. GARANTIA : 7	UN	51,00	$10'077'467,00	$	513'950'817,00	8,00	$	80'619'736,00	52,00	$	524'028'284,00		$	-		$	-	-	$	-	-	$	-	0,00%	52,00	$	524'028'284,00
METICA DE ALTO RENDIMIENTO121 CMS Lúmenes , 120/277V. 100.000 HORAS. MARCA. ROY ALPHA.	UN	8,00	$275'468,00	$	2'203'744,00	0,00	$	-	0,00	$	-		$	-		$	-	-	$	-	-	$	-	100,00%	-	$	-
ERMETICA 40W 100-277V	UN	56,00	$275'468,00	$	15'426'208,00	0,00	$	-	0,00	$	-		$	-		$	-	-	$	-	-	$	-	100,00%	-	$	-

LE PVCCOMPLETA	UN	36,00	$58'370,00	$	2'101'320,00	0,00	$	-	0,00	$	-		$	-		$	-	-	$	-	-	$	-	100,00%	-	$	-
A PVCCOMPLETA	UN	18,00	$133'539,00	$	2'403'702,00	0,00	$	-	0,00	$	-		$	-		$	-	-	$	-	-	$	-	100,00%	-	$	-
				$	941'803'026,00		$	261'494'080,00		$	692'027'566,80		$	-		$	-		$	-		$	-		-	$	692'027'566,80

OS UNITARIOS ACTIVIDADES OBRA			CDCTO>>	6'293'707'889,84			3'910'851'390,94			5'020'252'816,01		1'607'491'747,9		780'246'399,0		339'343'012,91		2'727'083'159,83			2'293'169'656,18
			26,00%	1'636'364'051,36		$	1'016'821'361,84		$	1'305'265'732,18		417'947'854,5		202'864'583,8		88'229'183,00		709'041'822,00			596'224'111,00
			2%	125'874'157,80		$	78'217'027,82		$	100'405'056,32		32'149'635,0		15'604'968,0		6'786'660,00		54'541'863,00			45'863'393,00
			5%	314'685'394,49		$	195'542'569,55		$	251'012'640,80		80'374'587,4		39'012'420,0		16'967'151,00		136'354'158,00			114'658'483,00
OS UNITARIOS ACTIVIDADES OBRA CON A.I.U				8'370'631'493,49		$	5'201'432'349,95		$	6'678'938'245,29		2'137'964'024,7		1'037'730'370,7		451'326'206,91		3'627'020'802,83			3'049'915'643,18
YECTO (A+B)				8'370'631'493,49		$	5'201'432'349,95		$	6'678'938'245,29		2'137'964'025		1'037'730'371		451'326'206,91		3'627'020'802,83			3'049'915'643,18

OS																							
ARIAS EN ROCA SECO (INCLUYE RETIRO UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	M3		$77'321,00		10'325,30	$	798'362'521,30	10'191,22	$	787'995'321,62	9'256,95	$	715'911'272,95	931,14	$	71'996'675,84	-	$	-	10'190,09	$	787'907'948,89	99,99%	1,13	$	87'372,73
EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE ICO)	M3		$1'090'541,00		118,08	$	128'771'081,28	118,08	$	128'771'081,28		$	-	-	$	-	-	$	-	-	$	-	0,00%	118,08	$	128'771'081,28
16 mm	M2		$108'500,00		7'362,24	$	798'803'040,00	7'362,24	$	798'803'040,00	4'417,34	$	479'281'390,00	1'472,45	$	159'760'825,00	1'468,13	$	159'075'105,00	7'355,92	$	798'117'320,00	99,91%	6,32	$	685'720,00
el+Rejilla Peat.Conc.Ref. (canal) seccion de	ML		$269'269,36		640,00	$	172'332'390,40	640,00	$	172'332'390,40		$	-	-			616,00	$	165'869'925,76	616,00	$	165'869'925,76	96,25%	24,00	$	6'462'484,64
INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2100 FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2		$111'764,00		7'362,24	$	86'609'391,36	7'362,24	$	86'609'391,36	3'681,12	$	43'304'695,68	3'681,12	$	43'304'695,68	-	$	-	-	$	7'362,24	$	86'609'391,36	100,00%	-	$	-
IE VIA ALVEOLAR IMPERMEABLE	ML		$107'220,00		354,00	$	37'955'880,00	354,00	$	37'955'880,00		$	-	216,40	$	23'416'848,00	42,60	$	4'587'572,00	261,00	$	27'964'420,00	73,73%	93,00	$	9'971'460,00
2,20 mts(Exc) **	ml		$27'272,67		601,77	$	16'411'874,63	945,84	$	25'795'582,19	601,77	$	16'411'874,63		$	-	344,07	$	9'383'707,57	945,84	$	25'795'582,19	100,00%	-	$	-
10 h=2,5+Malla Nylonh=2,5	ml		$971'171,87		353,81	$	343'610'319,32	353,81	$	343'610'319,32					$	-	353,81	$	343'610'319,32	353,81	$	343'610'319,32	100,00%	-	$	-
ECICLADO 5CM (EPDM 1CM +SBR 5CM ID 16678	M2		$693'139,00					407,17	$	282'225'406,83					$	-	-	$	-	-	$	-	0,00%	407,17	$	282'225'406,83
SINTETICO SPORT MASTER PARA ES	M2		$125'718,46					1'883,41	$	236'775'637,93					$	-	-	$	-	-	$	-	0,00%	1'883,41	$	236'775'637,93
LLA 20X10X6CM	M2		$957'90,00					2'150,42	$	205'988'731,80					$	-	-	$	-	-	$	-	0,00%	2'150,42	$	205'988'731,80
o 5-12añosCap:40niñosH=4,5m	UND		$227'305'370,00					1,00	$	227'305'370,00					$	-	-	$	-	-	$	-	0,00%	1,00	$	227'305'370,00
MULTIPLE 9 U(2+añosCap:9 niñosH=2,6	UND		$95'628'847,00					1,00	$	95'628'847,00					$	-	-	$	-	-	$	-	0,00%	1,00	$	95'628'847,00
rculto 3a5 años cap: 61 niños	UND		$596'957'187,00					1,00	$	596'957'187,00					$	-	-	$	-	-	$	-	0,00%	1,00	$	596'957'187,00
s letereles Animal2+años Cap4	UND		$21'125'320,00					1,00	$	21'125'320,00					$	-	-	$	-	-	$	-	0,00%	1,00	$	21'125'320,00
trepar deslizar:2-8AñosCap:5niñ	UND		$57'917'342,99					1,00	$	57'917'342,99					$	-	-	$	-	-	$	-	0,00%	1,00	$	57'917'342,99
funcion 2+años Cap28 niños P.N	UND		$167'723'533,00					1,00	$	167'723'533,00					$	-	-	$	-	-	$	-	0,00%	1,00	$	167'723'533,00
fibra de vidrio de 2.74m x1.74m	UND		$3'153'500,00					1,00	$	3'153'500,00					$	-	-	$	-	-	$	-	0,00%	1,00	$	3'153'500,00
CON DOS SILLAS EN FIBRA DE VIDRIO	UND		$1'018'072,00					2,00	$	2'036'144,00					$	-	-	$	-	-	$	-	0,00%	2,00	$	2'036'144,00
RICADO A-10	ML		$129'013,00					0,00	$	-					$	-	-	$	-	-	$	-	100,00%	-	$	-

CTO NO PREVISTO PARQUE 1																							
			CDCTO>>	-		$	2'382'656'498,29		$	4'278'710'026,52		1'254'908'233		298'479'045		682'508'629,85		2'235'894'908			2'042'615'119
			26,00%	-		$	619'542'689,56		$	1'112'464'606,90		326'276'400,7		77'604'551,6		177'451'724,00		581'332'676,0			531'131'931,0
			2%	-		$	47'857'129,97		$	85'574'200,53		25'098'184,7		5'969'580,9		13'650'133,00		44'717'898,0			40'856'302,0
			5%	-		$	119'142'824,91		$	213'935'501,33		62'745'461,7		14'923'952,2		34'125'331,00		111'794'745,0			102'140'756,0
OS UNITARIOS ACTIVIDADES OBRA CON A.I.U				-		$	3'169'199'142,73		$	5'690'884'335,28		1'669'029'280,2		396'977'129,3		907'733'817,85		2'973'740'226,5			2'716'944'108,0
YECTO (A+B)				-		$	3'169'199'142,73		$	5'690'884'335,28		1'669'029'280		396'977'129		907'733'817,85		2'973'740'227			2'716'944'108

NTRATO																							
LECTO DEL CONTRATO (I+II)			CDCTO>>	6'293'707'889,84		$	6'293'707'889,23		$	9'295'962'843,00		2'862'400'981,15		$	1'078'727'443,65		$	1'021'849'842,56		$	4'962'978'067,35			$ 4'335'984'775,18
			26,00%	1'636'364'051,19		$	1'636'364'051,19		$	2'417'730'339,18		744'224'255,10		$	280'469'135,35		$	265'680'907,07		$	1'290'374'298,00			$ 1'127'356'042,00
			2%	125'874'157,80		$	125'874'157,78		$	185'979'256,88		57'248'019,62		$	21'574'546,87		$	20'436'992,85		$	99'259'561,00			$ 86'719'696,00
			5%	314'685'394,49		$	314'685'394,46		$	464'948'142,15		143'120'049,06		$	53'936'372,18		$	51'092'482,13		$	248'148'903,00			$ 216'799'239,00
OS UNITARIOS ACTIVIDADES OBRA CON A.I.U				8'370'631'493,49		$	8'370'631'492,66		$	12'367'620'581,19		3'806'993'304,93		$	1'434'707'500,05		$	1'359'060'024,61		$	6'600'780'829,35			$ 5'768'859'752,18
YECTO (A+B)				8'370'631'493,49		$	8'370'631'492,66		$	12'367'620'581,19		3'806'993'304,93		$	1'434'707'500,05		$	1'359'060'024,61		$	6'600'780'829,35			$ 5'768'859'752,18
ES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				8'370'631'493,49		$	8'370'631'492,66		$	12'367'620'581,19		3'806'993'304,93		$	1'434'707'500,05		$	1'359'060'024,61		$	6'600'780'829,35			$ 5'768'859'752,18
L CONTRATO				8'370'631'493,49		$	8'370'631'492,66		$	12'367'620'581,19		3'806'993'304,93		$	1'434'707'500,05		$	1'359'060'024,61		$	6'600'780'829,35	53,37%		
ANTICIPO (%)		0,00%		0		$	-		$	-		-			-								
AGAR EN CADA ACTA				0		$	-		$	-		$ 3'806'993'304,93		$	1'434'707'500,050		$	1'359'060'024,61		$	-			$ -
												PAGADO			PAGADO			POR PAGAR					

DE LA ENTIDAD 0

V° B° INTERVENTORIA

NYM CONSTRUCCIONES INTEGRALES S.A.S. - NEL MARGARITA GÓMEZ GÓMEZ

No Contrato de Interventoría REPRESENTANTE LEGAL

V° B° CONTRATISTA

CONSORCIO IMPORTADO 2023 - NEL LUIS DANIEL TANGARIFE VELASQUEZ

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
DEPORTIVO 2023


MEMORIAS DE CALCULO

NIT No.901.771.549-7			Página _1_ de _1_	Fecha de Elaboracion :

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 de 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA, PISTA ATLETICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGADEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"				
INTERVENTOR	RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	NIT O C.C.	830.028.126-2	CONTRATO No.	2023-0780
CONTRATISTA	CONSORCIO DEPORTIVO 2023	NIT O C.C.	901.771.549-7	CONTRATO No.	2023-0667

NOMBRE DEL PARQUE:	PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGADEPARTAMENTO	COD:	LOCALIDAD:

ITEM	1.1.01	DECRIPCION	DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M	UNIDAD	M2	UBICACIÓN			

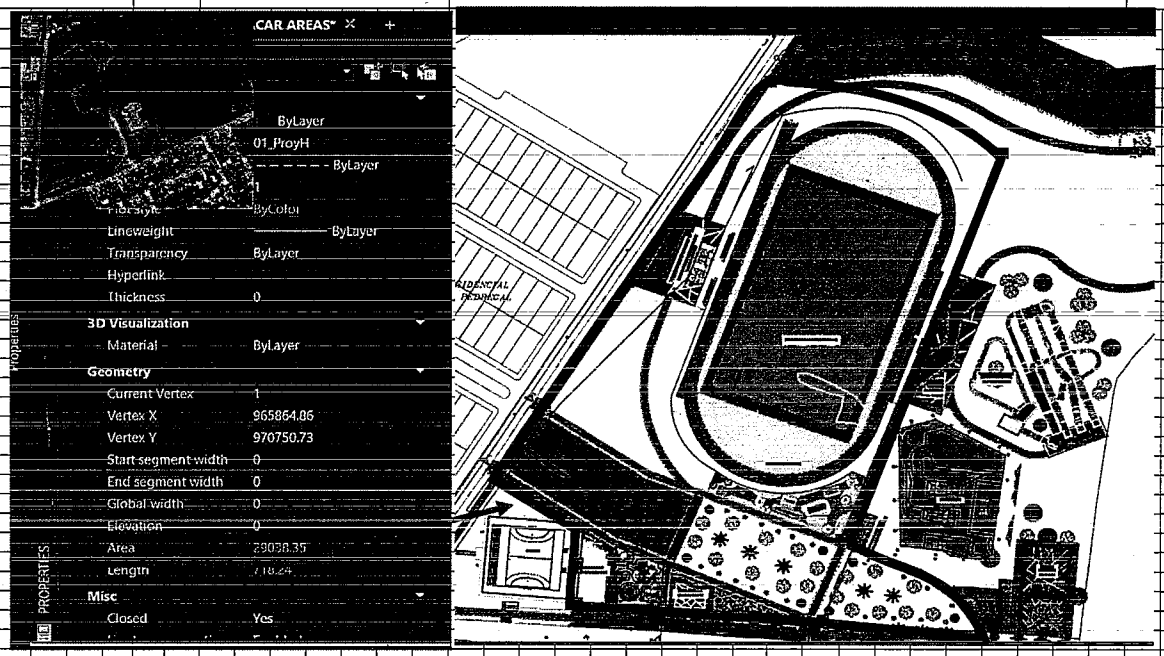

Localización	Ancho			No Elem.	Medida Total
	AREA	Alto	Longitud		
	29'038.35				29'038.35

VER PLANO DESCRIPTIVO ANEXO

Subtotal	29'038.35
PAGO ACTAS ANTERIORES	21'664.82
TOTAL PRESENTE ACTA	7'373.53

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Vo.BO.

RESIDENTE DE OBRA

Vo.BO.

MEMORIAS DE CALCULO


			Página _1_ de _1_	Fecha de Elaboracion :


EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 de 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA, PISTA ATLETICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGADEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

'M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	NIT O C.C.	830.028.126-2	CONTRATO No.	2023-0780
)NSORCIO DEPORTIVO 2023	NIT O C.C.	901.771.549-7	CONTRATO No.	2023-0667

PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGADEPARTAMENTO	COD:	LOCALIDAD:

DECRIPCION	DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M	UNIDAD	M2	UBICACIÓN			
		Localización	Ancho			No Elem.	Medida Total
			AREA	Alto	Longitud		

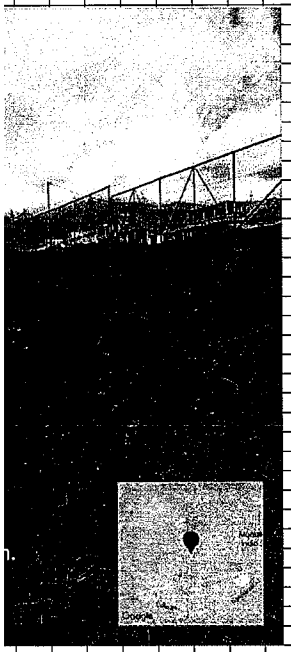

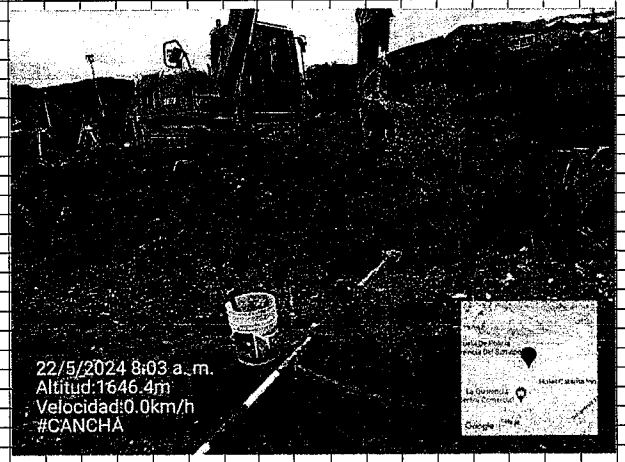

Subtotal	
PAGO ACTAS ANTERIORES	
TOTAL PRESENTE ACTA	

)
ENTORIA

RESIDENTE DE OBRA

Vo.BO.

CONSORCIO
DEPORTIVO 2023


MEMORIAS DE CALCULO

NIT No.901.771.549-7			Página _1_ de _1_	Fecha de Elaboracion :

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 de 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA, PISTA ATLETICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGADEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"				
INTERVENTOR	RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	NIT O C.C.	830.028.126-2	CONTRATO No.	2023-0780
CONTRATISTA	CONSORCIO DEPORTIVO 2023	NIT O C.C.	901.771.549-7	CONTRATO No.	2023-0667

NOMBRE DEL PARQUE:	PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGADEPARTAMENTO	COD:	LOCALIDAD:

ITEM	3.1.1.02	DECRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	

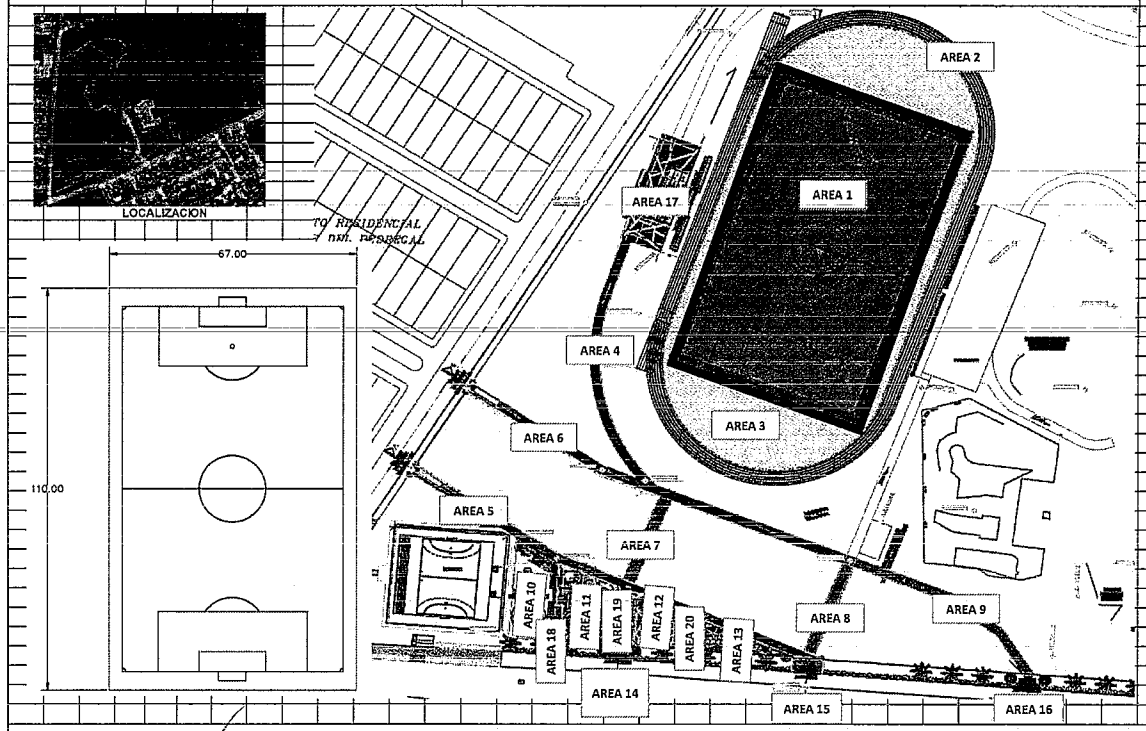

Localización	Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
AREA CANCHA					-
AREA 1	67.000		110.000	1.00	7'370.00
DESCUENTOS					
Area libre en filtros	0.40		110.00	-2.00	- 88.00
Potr ejecutar	67.00		0.2086	-1.00	- 13.98
				Subtotal	7'268.02
				PAGO ACTAS ANTERIORES	
				TOTAL PRESENTE ACTA	7'268.02

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Vo.BO.

RESIDENTE DE OBRA

Vo.BO.

MEMORIAS DE CALCULO


	Página _1_ de _1_	Fecha de Elaboracion :	

EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 de 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA, PISTA ATLETICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGADEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

YM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	NIT O C.C.	830.028.126-2	CONTRATO No.	2023-0780
ONSORCIO DEPORTIVO 2023	NIT O C.C.	901.771.549-7	CONTRATO No.	2023-0667

PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGADEPARTAMENTO	COD:	LOCALIDAD:

DECRIPCION GRAMA SINTÉTICA PARACAMPOS DEPORTIVOS — **UNIDAD** M2 — **UBICACIÓN**

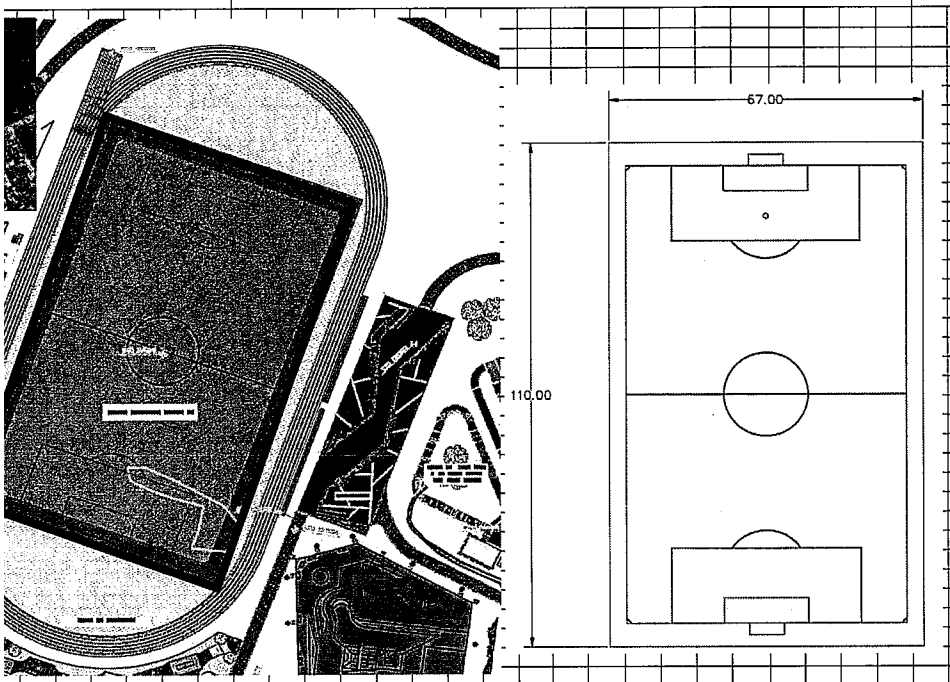

Localización	Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
AREA CANCHA	67.000		110.000	1.00	7'370.00
DESCUENTOS					
Por ejecutar	67.00		0.2101	-1.00	- 14.08
				Subtotal	7'355.92
				PAGO ACTAS ANTERIORES	5'889.79
				TOTAL PRESENTE ACTA	1'466.13

ENTORIA

RESIDENTE DE OBRA

Vo.BO.

CONSORCIO DEPORTIVO 2023

MEMORIAS DE CALCULO


NIT No.901.771.549-7			Página _1_ de _1_	Fecha de Elaboracion :

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 de 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA, PISTA ATLETICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGADEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"				
INTERVENTOR	RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	NIT O C.C.	830.028.126-2	CONTRATO No.	2023-0780
CONTRATISTA	CONSORCIO DEPORTIVO 2023	NIT O C.C.	901.771.549-7	CONTRATO No.	2023-0667

NOMBRE DEL PARQUE:	PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGADEPARTAMENTO	COD:	LOCALIDAD:

ITEM	3.1.1.02	DECRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	



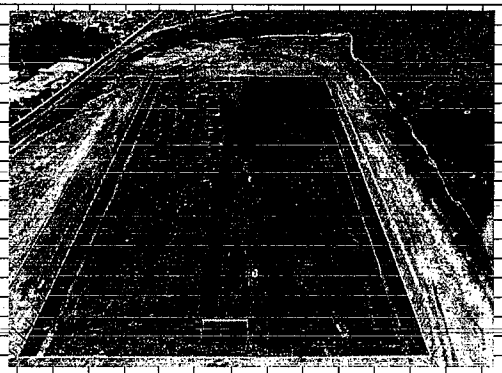



Localización	Ancho			No Elem.	Medida Total
	AREA	Alto	Longitud		
					-
					-
				Subtotal	
				PAGO ACTAS ANTERIORES	
				TOTAL PRESENTE ACTA	

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Vo.BO.

RESIDENTE DE OBRA

Vo.BO.

MEMORIAS DE CALCULO

		Página _1_ de _1_	Fecha de Elaboracion :

EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 de 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA, PISTA ATLETICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGADEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

'M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	NIT O C.C.	830.028.126-2	CONTRATO No.	2023-0780
)NSORCIO DEPORTIVO 2023	NIT O C.C.	901.771.549-7	CONTRATO No.	2023-0667

PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGADEPARTAMENTO	COD:	LOCALIDAD:

DECRIPCION	GRAMA SINTÉTICA PARACAMPOS DEPORTIVOS	UNIDAD	M2	UBICACIÓN				
		Localización	Ancho			No Elem.	Medida Total
			Ancho	Alto	Longitud		
							-
							-

CONSORCIO
DEPORTIVO 2023


MEMORIAS DE CALCULO


NIT No.901.771.549-7		Página _1_ de _1_	Fecha de Elaboracion :

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 de 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA, PISTA ATLETICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGADEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"				
INTERVENTOR	RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	NIT O C.C.	830.028.126-2	CONTRATO No.	2023-0780
CONTRATISTA	CONSORCIO DEPORTIVO 2023	NIT O C.C.	901.771.549-7	CONTRATO No.	2023-0667

NOMBRE DEL PARQUE:	PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGADEPARTAMENTO	COD:	LOCALIDAD:

ITEM	3.1.1.10	DECRIPCION	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	UNIDAD	M2

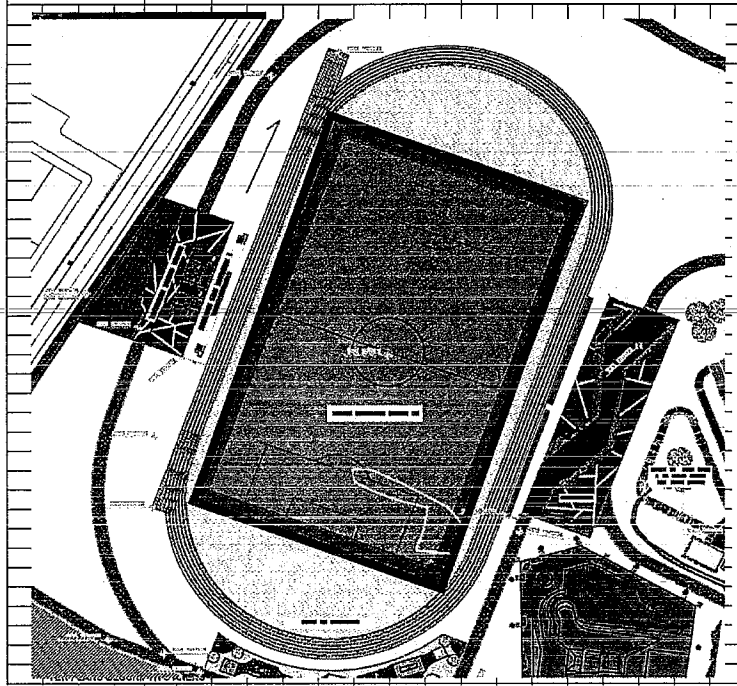

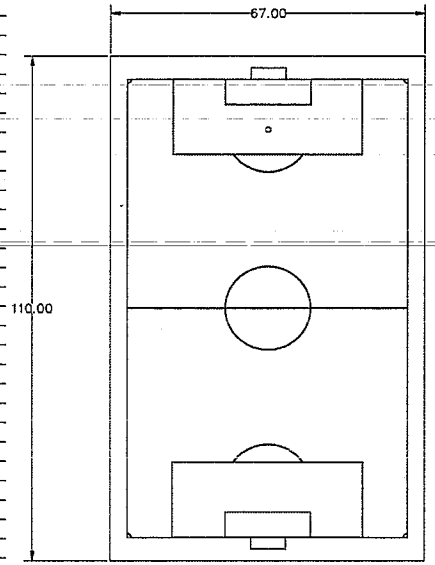

UBICACIÓN

Localización	Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
AREA CANCHA					-
AREA 1	67.000		110.000	1.00	7'370.00
DESCUENTOS					
Area libre en filtros	0.40		110.00	-2.00	- 88.00
Potr ejecutar	67.00		0.2101	-1.00	- 14.08
				Subtotal	7'267.92
				PAGO ACTAS ANTERIORES	
				TOTAL PRESENTE ACTA	7'267.92

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Vo.BO.

RESIDENTE DE OBRA

Vo.BO.

MEMORIAS DE CALCULO

			Página _1_ de _1_	Fecha de Elaboracion :

EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 de 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA, PISTA ATLETICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGADEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

'M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	NIT O C.C.	830.028.126-2	CONTRATO No.	2023-0780
)NSORCIO DEPORTIVO 2023	NIT O C.C.	901.771.549-7	CONTRATO No.	2023-0667

PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGADEPARTAMENTO	COD:	LOCALIDAD:

DECRIPCION	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	UNIDAD	M2	UBICACIÓN			
		Localización	Ancho			No Elem.	Medida Total
			AREA	Alto	Longitud		

CONSORCIO DEPORTIVO 2023

MEMORIAS DE CALCULO


NIT No.901.771.549-7 | Página _1_ de _1_ | Fecha de Elaboracion :

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 de 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA, PISTA ATLETICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGADEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

INTERVENTOR	RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	NIT O C.C.	830.028.126-2	CONTRATO No.	2023-0780
CONTRATISTA	CONSORCIO DEPORTIVO 2023	NIT O C.C.	901.771.549-7	CONTRATO No.	2023-0667

NOMBRE DEL PARQUE:	PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGADEPARTAMENTO	COD:	LOCALIDAD:

ITEM	3.1.1.14	DECRIPCION	BORDILLO PREFABRICADO A-80	UNIDAD	ML	UBICACIÓN			
				Localización	Ancho AREA	Ancho Alto	Ancho Longitud	No Elem.	Medida Total
				PERIMETRO CANCHA					
				AREA 1			110.290	1.00	110.29
							110.270	1.00	110.27
							66.900	1.00	66.90
							66.990	1.00	66.99
				PERIMETRO PISTA ATLETICA					
				AREA 2					-
				Externo			240.10	1.00	240.10

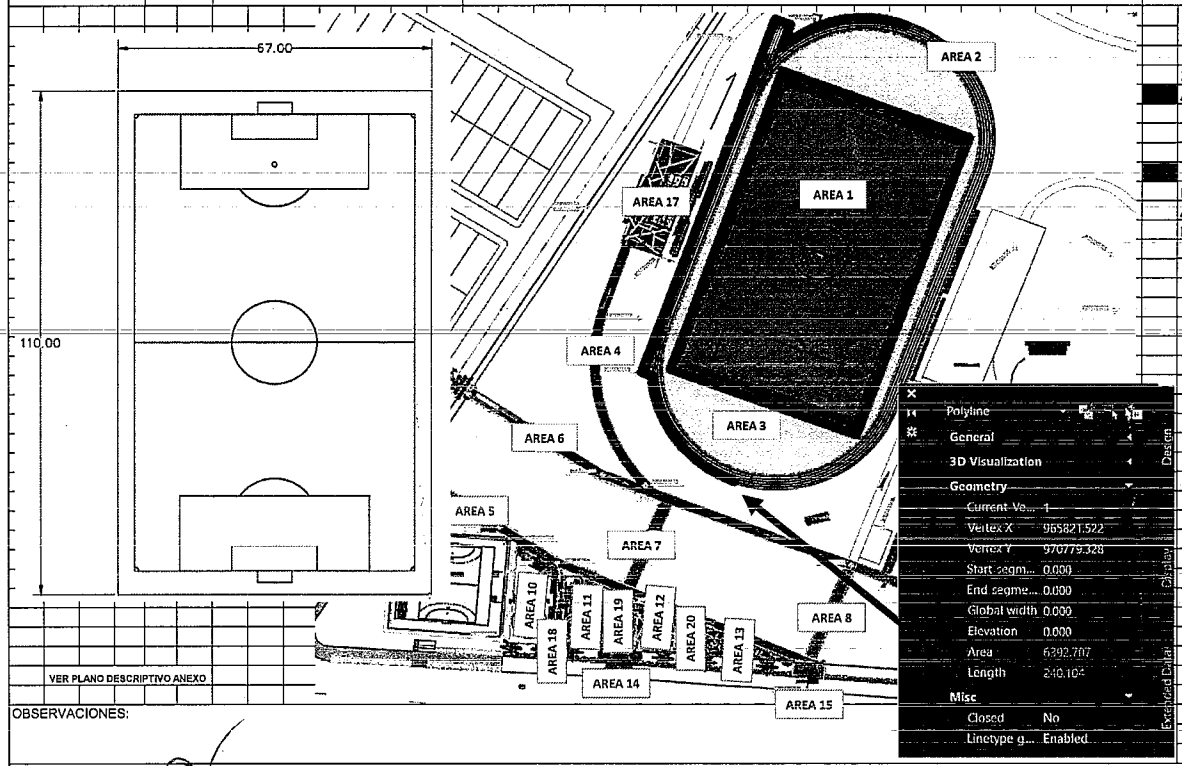

VER PLANO DESCRIPTIVO ANEXO

	Subtotal	594.55
	PAGO ACTAS ANTERIORES	311.40
	TOTAL PRESENTE ACTA	283.15

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Vo.BO.

RESIDENTE DE OBRA

Vo.BO.

MEMORIAS DE CALCULO


		Página _1_ de _1_	Fecha de Elaboracion :

EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 de 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA, PISTA ATLETICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGADEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

YM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	NIT O C.C.	830.028.126-2	CONTRATO No.	2023-0780
ONSORCIO DEPORTIVO 2023	NIT O C.C.	901.771.549-7	CONTRATO No.	2023-0667

PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGADEPARTAMENTO	COD:	LOCALIDAD:

DECRIPCION	BORDILLO PREFABRICADO A-80	UNIDAD	ML	UBICACIÓN			
		Localización	Ancho			No Elem.	Medida Total
			AREA	Alto	Longitud		
							-
							-

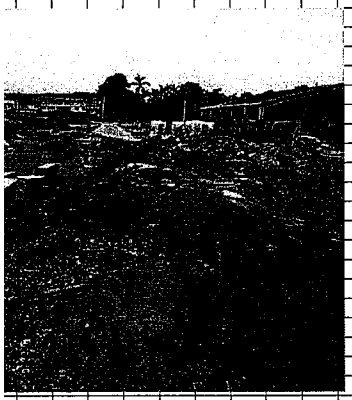



Subtotal	
PAGO ACTAS ANTERIORES	
TOTAL PRESENTE ACTA	

ENTORIA

RESIDENTE DE OBRA

Vo.BO.

CONSORCIO DEPORTIVO 2023


MEMORIAS DE CALCULO

NIT No.901.771.549-7			Página _1_ de _1_	Fecha de Elaboracion :


OBJETO DEL CONTRATO	EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 de 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA, PISTA ATLETICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGADEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"				
INTERVENTOR	RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	NIT O C.C.	830.028.126-2	CONTRATO No.	2023-0780
CONTRATISTA	CONSORCIO DEPORTIVO 2023	NIT O C.C.	901.771.549-7	CONTRATO No.	2023-0667

NOMBRE DEL PARQUE:	PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGADEPARTAMENTO	COD:	LOCALIDAD:

ITEM	3.2.01	DECRIPCION	UNIDAD	JG	UBICACIÓN				
		ARCOS DE FÚTBOL 11 X 2JUEGOS (Incluye mallas impermeabilizadas) (Incluye suministros, equipos y mano de obra para su correcta instalación)	Localización		Ancho			No Elem.	Medida Total
					AREA	Alto	Longitud		
			CANCHA						
								1.00	1.00



LOCALIZACION

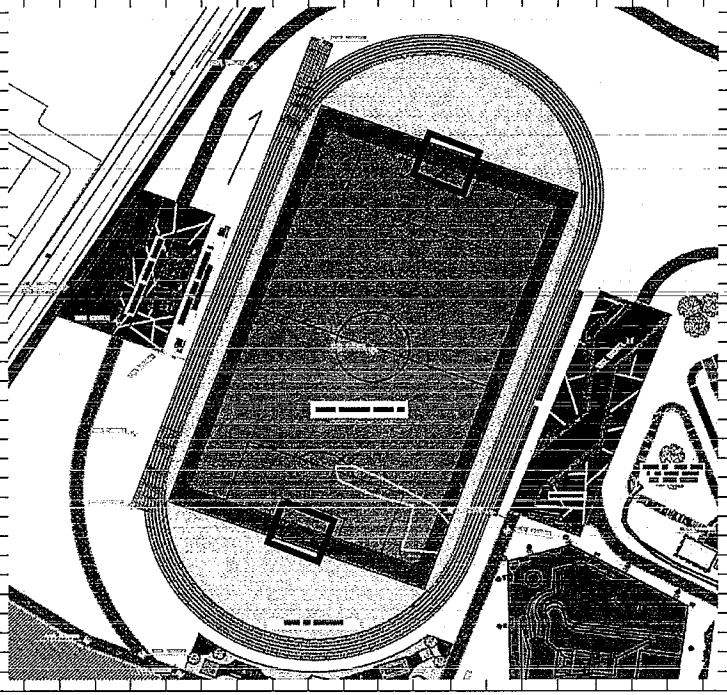

VER PLANO DESCRIPTIVO ANEXO

Subtotal	1.00
PAGO ACTAS ANTERIORES	
TOTAL PRESENTE ACTA	1.00

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Vo.BO.

RESIDENTE DE OBRA

Vo.BO.

MEMORIAS DE CALCULO


		Página _1_ de _1_	Fecha de Elaboracion :	


EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 de 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA, PISTA ATLETICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGADEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	NIT O C.C.	830.028.126-2	CONTRATO No.	2023-0780
NSORCIO DEPORTIVO 2023	NIT O C.C.	901.771.549-7	CONTRATO No.	2023-0667

PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGADEPARTAMENTO	COD:	LOCALIDAD:

DECRIPCION	UNIDAD	JG	UBICACIÓN				
ARCOS DE FÚTBOL 11 X 2JUEGOS (incluye mallas impermeabilizadas) (incluye suministros, equipos y mano de obra para su correcta instalación)	Localización	AREA	Ancho Alto	Ancho Longitud	No Elem.	Medida Total

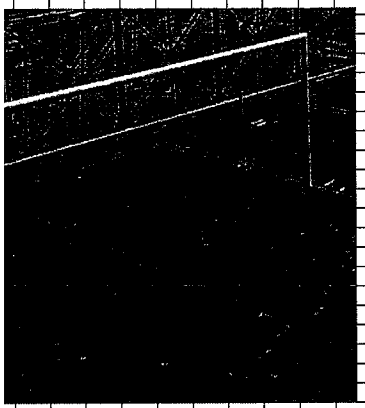

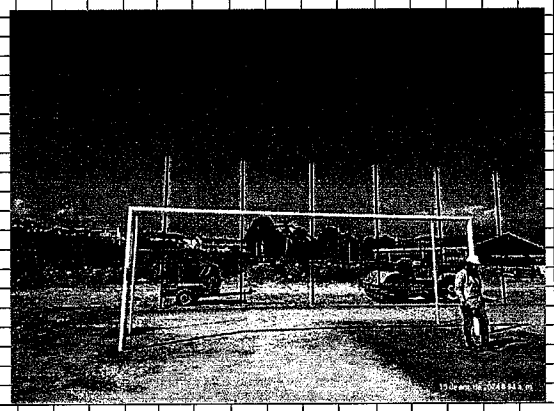

Subtotal	
PAGO ACTAS ANTERIORES	
TOTAL PRESENTE ACTA	

ENTORIA

RESIDENTE DE OBRA

Vo.BO.

CONSORCIO DEPORTIVO 2023

MEMORIAS DE CALCULO


NIT No.901.771.549-7			Página _1_ de _1_	Fecha de Elaboracion :

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 de 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA, PISTA ATLETICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGADEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

INTERVENTOR	RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	NIT O C.C.	830.028.126-2	CONTRATO No.	2023-0780
CONTRATISTA	CONSORCIO DEPORTIVO 2023	NIT O C.C.	901.771.549-7	CONTRATO No.	2023-0667

NOMBRE DEL PARQUE:	PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGADEPARTAMENTO	COD:	LOCALIDAD:

ITEM	8.10	DECRIPCION	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 6"_160MM (Incluye suministros e instalación)	UNIDAD	ML	UBICACIÓN	

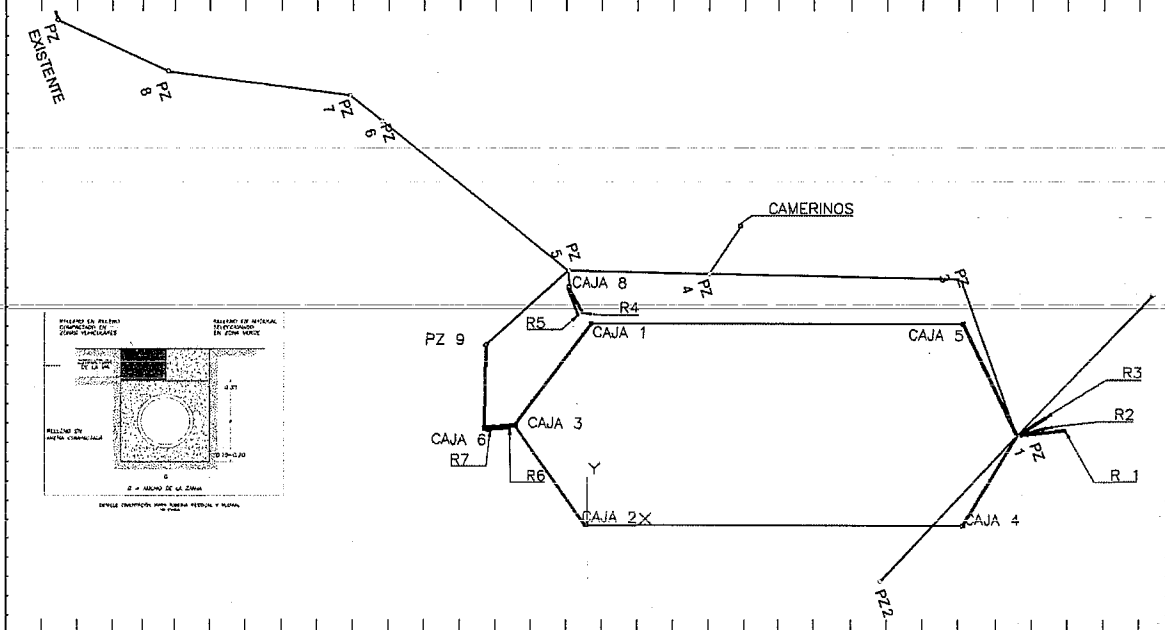

VER PLANO DESCRIPTIVO ANEXO

Localización	Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
POZO 1 PROYECTADO - REJILLA 1			13.50		13.50
POZO 1 PROYECTADO - REJILLA 2			7.86		7.86
POZO 1 PROYECTADO - REJILLA 3			9.08		9.08
CAJA 4 - POZO 1 PROYECTADO			29.90		29.90
CAJA 5 - POZO 1 PROYECTADO			35.90		35.90
CAJA 3 - CAJA 2			35.55		35.55
CAJA1 - CAJA 3			37.00		37.00
CAJA 3 - CAJA 6			8.54		8.54
CAJA6 - POZO 9 PROYECTADO			17.21		17.21
CAJA 6 - REJILLA 6					-
CAJA 6 - REJILLA 7					-
CAJA 8 - REJILLA 4			8.15		8.15
CAJA 8 - REJILLA 5			8.20		8.20
			Subtotal		210.89
			PAGO ACTAS ANTERIORES		
			TOTAL PRESENTE ACTA		210.89

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Vo.BO.

RESIDENTE DE OBRA

Vo.BO.

MEMORIAS DE CALCULO


		Página _1_ de _1_	Fecha de Elaboracion :


EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 de 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA, PISTA ATLETICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGADEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

'M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	NIT O C.C.	830.028.126-2	CONTRATO No.	2023-0780
)NSORCIO DEPORTIVO 2023	NIT O C.C.	901.771.549-7	CONTRATO No.	2023-0667

PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGADEPARTAMENTO	COD:	LOCALIDAD:

DECRIPCION	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 6"_160MM (Incluye suministros e Instalación)	UNIDAD	ML	UBICACIÓN			
		Localización	Ancho			No Elem.	Medida Total
			Ancho	Alto	Longitud		
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-

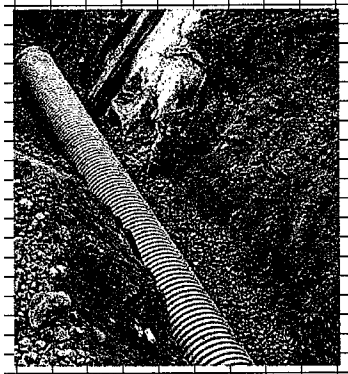

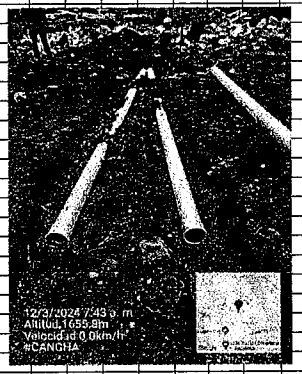



Subtotal	
PAGO ACTAS ANTERIORES	
TOTAL PRESENTE ACTA	

)
ENTORIA

RESIDENTE DE OBRA

Vo.BO.

CONSORCIO DEPORTIVO 2023


MEMORIAS DE CALCULO

NIT No.901.771.549-7			Página _1_ de _1_	Fecha de Elaboracion :

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 de 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA, PISTA ATLETICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGADEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"				
INTERVENTOR	RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	NIT O C.C.	830.028.126-2	CONTRATO No.	2023-0780
CONTRATISTA	CONSORCIO DEPORTIVO 2023	NIT O C.C.	901.771.549-7	CONTRATO No.	2023-0667

NOMBRE DEL PARQUE:	PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGADEPARTAMENTO	COD:	LOCALIDAD:

ITEM	8.19	DECRIPCION	CAJA DE INSPECCIÓN DE100X100	UNIDAD	UN	UBICACIÓN

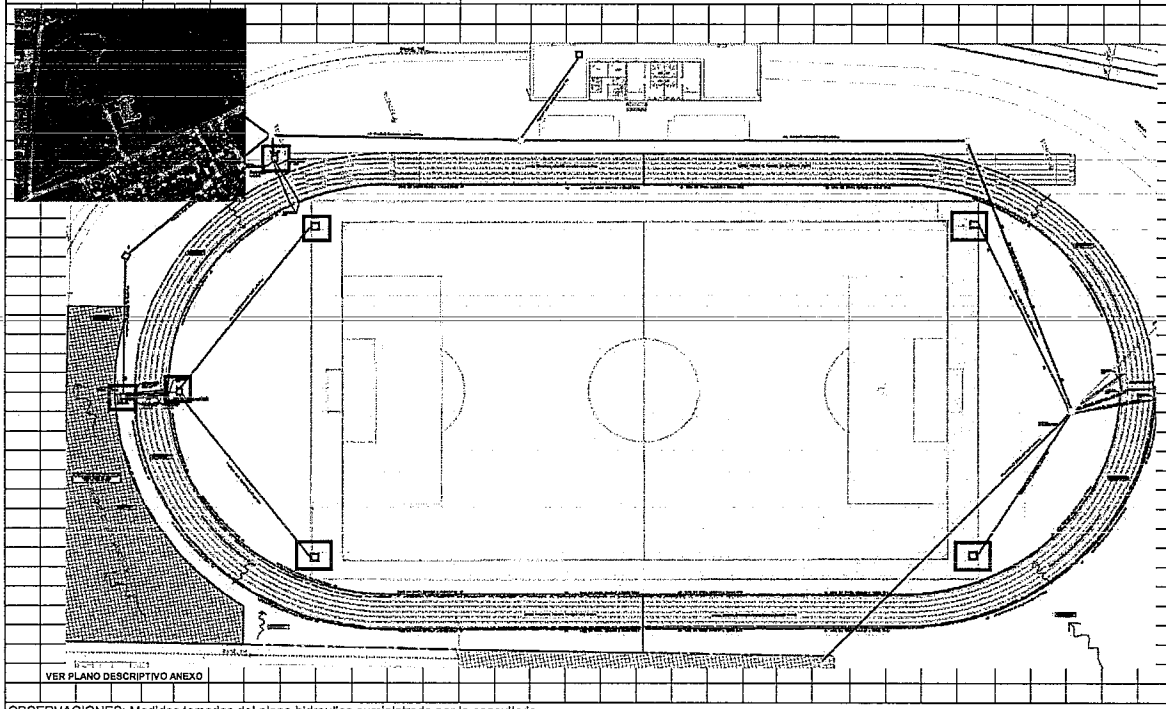

Localización	Ancho	Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
DESCOLES DE FILTROS Y CARCAMOS					7.00	7.00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-

Subtotal	7.00
PAGO ACTAS ANTERIORES	4.00
TOTAL PRESENTE ACTA	3.00

OBSERVACIONES: Medidas tomadas del plano hidraulico suministrado por la consultoria

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Vo.BO.

RESIDENTE DE OBRA

Vo.BO.

MEMORIAS DE CALCULO

			Página _1_ de _1_	Fecha de Elaboracion :


EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 de 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA, PISTA ATLETICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGADEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

'M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	NIT O C.C.	830.028.126-2	CONTRATO No.	2023-0780
)NSORCIO DEPORTIVO 2023	NIT O C.C.	901.771.549-7	CONTRATO No.	2023-0667

PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGADEPARTAMENTO	COD:	LOCALIDAD:

DECRIPCION	CAJA DE INSPECCIÓN DE100X100	UNIDAD	UN	UBICACIÓN				
		Localización	Ancho				No Elem.	Medida Total
			Ancho	Alto	Longitud			
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-



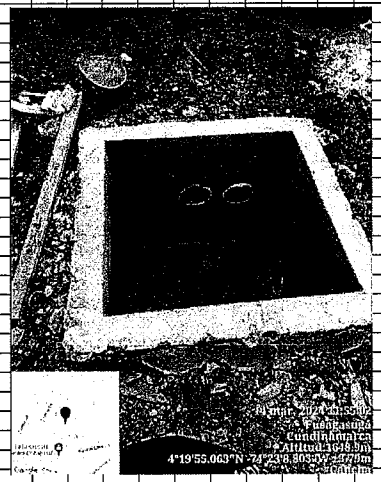



del plano hidraulico suministrado por la consultoria

Subtotal	
PAGO ACTAS ANTERIORES	
TOTAL PRESENTE ACTA	

ENTORIA

RESIDENTE DE OBRA

Vo.BO.

CONSORCIO DEPORTIVO 2023


MEMORIAS DE CALCULO


NIT No.901.771.549-7			Página _1_ de _1_	Fecha de Elaboracion :

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 de 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA, PISTA ATLETICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGADEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"				
INTERVENTOR	RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	NIT O C.C.	830.028.126-2	CONTRATO No.	2023-0780
CONTRATISTA	CONSORCIO DEPORTIVO 2023	NIT O C.C.	901.771.549-7	CONTRATO No.	2023-0667

NOMBRE DEL PARQUE:	PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGADEPARTAMENTO	COD:	LOCALIDAD:

ITEM	NP-03	DECRIPCION	Shockpad Refosport 16 mm	UNIDAD	M2	UBICACIÓN			

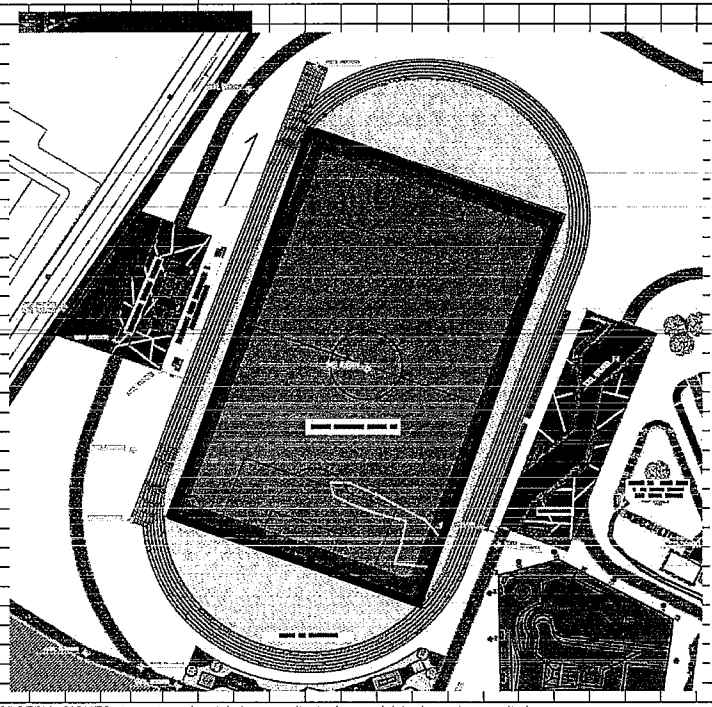

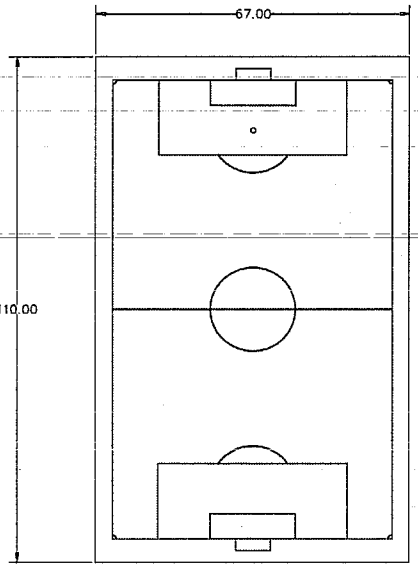

Localización	Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
AREA CANCHA					
	67.000		110.000	1.00	7'370.00
					-
DESCUENTOS					
Por ejecutar	67.00		0.2101	-1.00	- 14.08

OBSERVACIONES: Areas tomadas del plano arquitectonico suministrado por la consultoria

Subtotal	7'355.92
PAGO ACTAS ANTERIORES	5'889.79
TOTAL PRESENTE ACTA	1'466.13

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Vo.BO.

RESIDENTE DE OBRA

Vo.BO.

MEMORIAS DE CALCULO


			Página _1_ de _1_	Fecha de Elaboracion :

EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 de 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA, PISTA ATLETICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGADEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

'M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	NIT O C.C.	830.028.126-2	CONTRATO No.	2023-0780
)NSORCIO DEPORTIVO 2023	NIT O C.C.	901.771.549-7	CONTRATO No.	2023-0667

PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGADEPARTAMENTO	COD:	LOCALIDAD:

DECRIPCION	Shockpad Refosport 16 mm	UNIDAD	M2	UBICACIÓN			
		Localización	Ancho			No Elem.	Medida Total
			Ancho	Alto	Longitud		

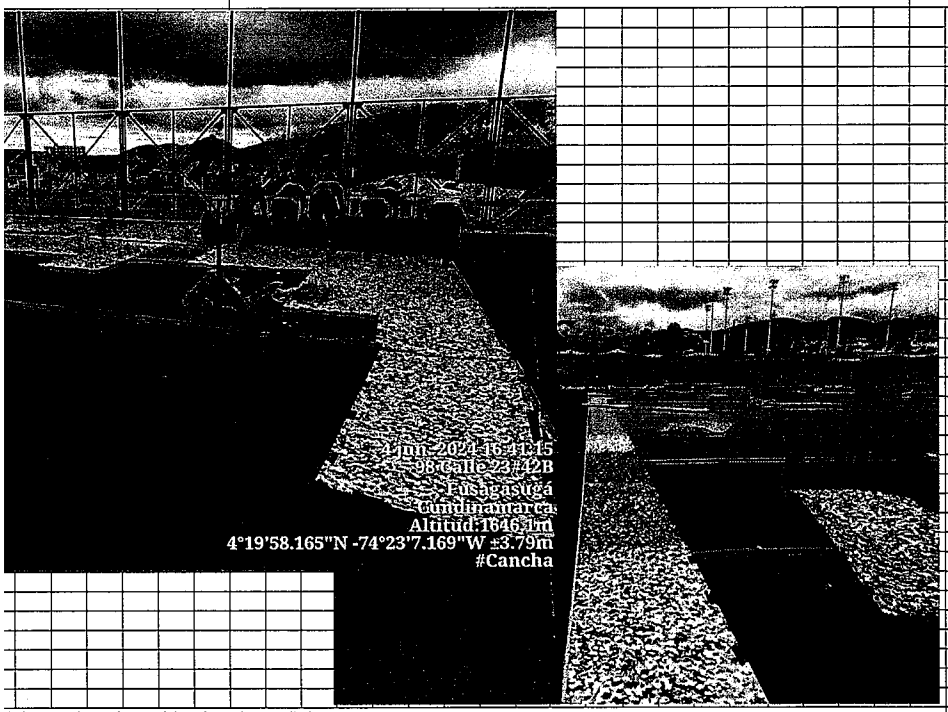

el plano arquitectonico suministrado por la consultoria

Subtotal	
PAGO ACTAS ANTERIORES	
TOTAL PRESENTE ACTA	

ENTORIA

RESIDENTE DE OBRA

Vo.BO.

CONSORCIO DEPORTIVO 2023


MEMORIAS DE CALCULO

NIT No.901.771.549-7		Página _1_ de _1_	Fecha de Elaboracion :

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 de 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA, PISTA ATLETICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGADEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"				
INTERVENTOR	RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	NIT O C.C.	830.028.126-2	CONTRATO No.	2023-0780
CONTRATISTA	CONSORCIO DEPORTIVO 2023	NIT O C.C.	901.771.549-7	CONTRATO No.	2023-0667

NOMBRE DEL PARQUE:	PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGADEPARTAMENTO	COD:	LOCALIDAD:

ITEM	NP-04	DECRIPCION	CarcamoT-2 2500 psi+Rejilla Peat.Conc.Ref. (canal) seccion de 35x40x100	UNIDAD	ML	UBICACIÓN		

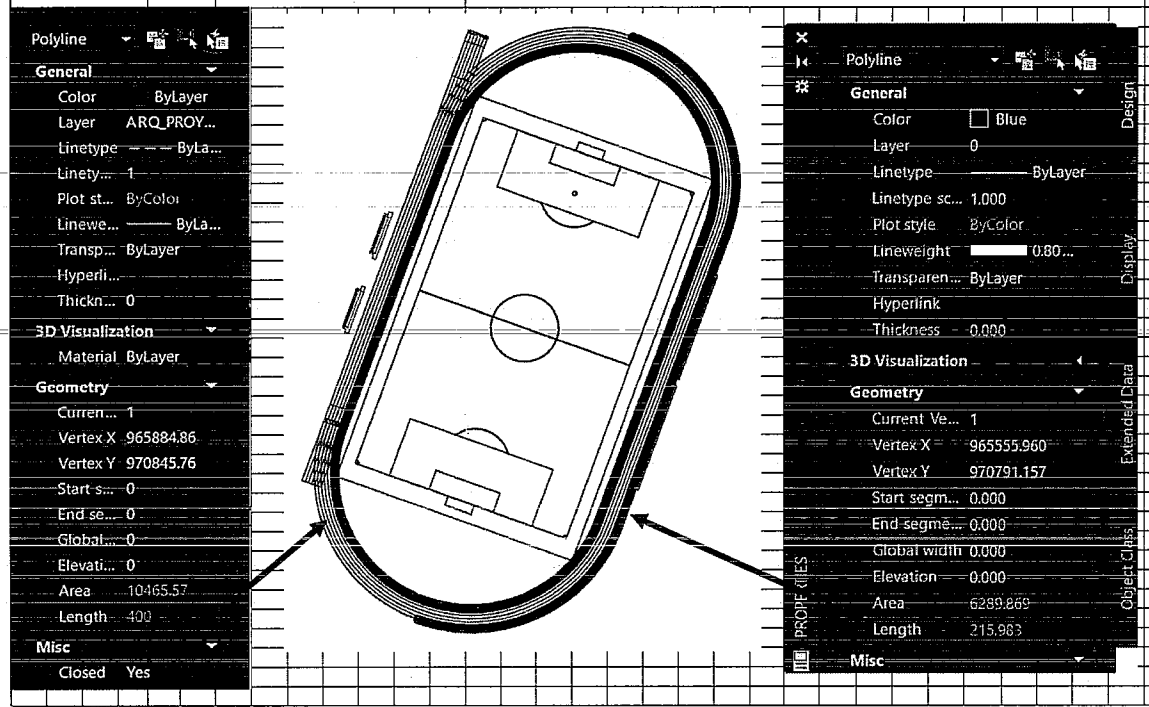

Localización	Ancho AREA	Ancho Alto	Ancho Longitud	No Elem.	Medida Total
PISTA ATLETICA					
Interno			400.00		400.00
Externo			216.00		216.00
					-
					-

OBSERVACIONES: Areas tomadas del plano arquitectonico suministrado por la consultoria

Subtotal	616.00
PAGO ACTAS ANTERIORES	
TOTAL PRESENTE ACTA	616.00

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Vo.BO.

RESIDENTE DE OBRA

Vo.BO.

MEMORIAS DE CALCULO



		Página _1_ de _1_	Fecha de Elaboracion :



EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 de 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA, PISTA ATLETICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGADEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

'M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	NIT O C.C.	830.028.126-2	CONTRATO No.	2023-0780
)NSORCIO DEPORTIVO 2023	NIT O C.C.	901.771.549-7	CONTRATO No.	2023-0667

PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGADEPARTAMENTO	COD:	LOCALIDAD:

DECRIPCION	CarcamoT-2 2500 psi+Rejilla Peat.Conc.Ref. (canal) seccion de 35x40x100	UNIDAD	ML	UBICACIÓN				
		Localización	Ancho			No Elem.	Medida Total
			AREA	Alto	Longitud		
							-
							-
							-
							-

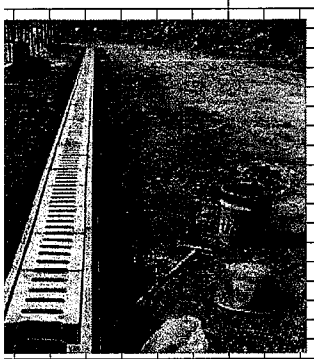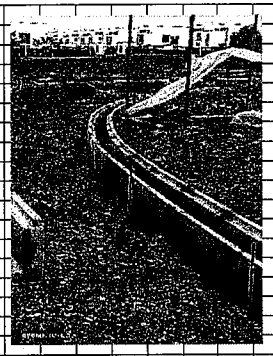
Subtotal	
PAGO ACTAS ANTERIORES	
TOTAL PRESENTE ACTA	

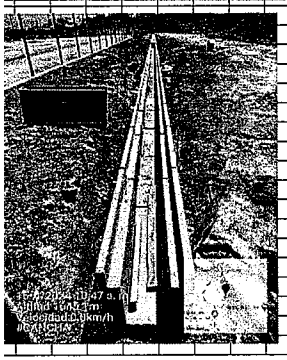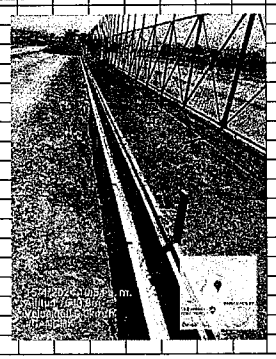ENTORIA

RESIDENTE DE OBRA

Vo.BO.

CONSORCIO DEPORTIVO 2023


MEMORIAS DE CALCULO

NIT No.901.771.549-7			Página _1_ de _1_	Fecha de Elaboracion :


OBJETO DEL CONTRATO	EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 de 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA, PISTA ATLETICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGADEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"				
INTERVENTOR	RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	NIT O C.C.	830.028.126-2	CONTRATO No.	2023-0780
CONTRATISTA	CONSORCIO DEPORTIVO 2023	NIT O C.C.	901.771.549-7	CONTRATO No.	2023-0667

NOMBRE DEL PARQUE:	PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGADEPARTAMENTO	COD:	LOCALIDAD:

ITEM	NP-06	DECRIPCION	FILTRO LATERAL DE VIA ALVEOLAR IMPERMEABLE	UNIDAD	ML	UBICACIÓN		



LOCALIZACION

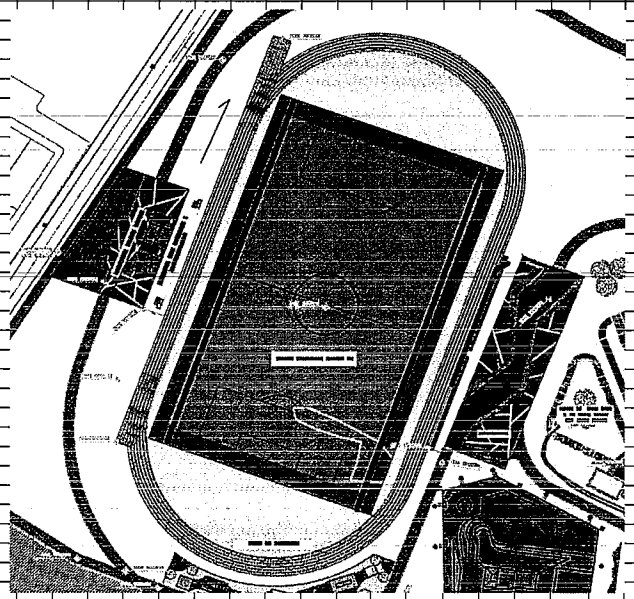

VER PLANO DESCRIPTIVO ANEXO

Localización	Ancho AREA	Ancho Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
CANCHA					
laterales			110.00	2.00	220.00
COSTADO ORIENTAL DE LA PISTA					
taud			41.00	1.00	41.00

OBSERVACIONES: Areas tomadas del plano arquitectonico suministrado por la consultoria

Subtotal	261.00
PAGO ACTAS ANTERIORES	218.40
TOTAL PRESENTE ACTA	42.60

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Vo.BO.

RESIDENTE DE OBRA

Vo.BO.

MEMORIAS DE CALCULO

		Página _1_ de _1_	Fecha de Elaboracion :


EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 de 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA, PISTA ATLETICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGADEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"


'M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	NIT O C.C.	830.028.126-2	CONTRATO No.	2023-0780
)NSORCIO DEPORTIVO 2023	NIT O C.C.	901.771.549-7	CONTRATO No.	2023-0667

PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGADEPARTAMENTO	COD:	LOCALIDAD:

DECRIPCION	FILTRO LATERAL DE VIA ALVEOLAR IMPERMEABLE	UNIDAD	ML	UBICACIÓN			
		Localización	Ancho			No Elem.	Medida Total
			AREA	Alto	Longitud		
							-
							-



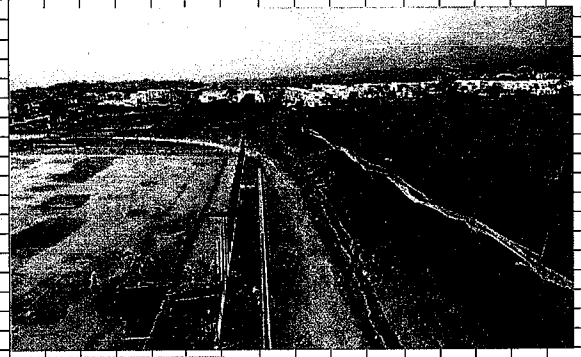

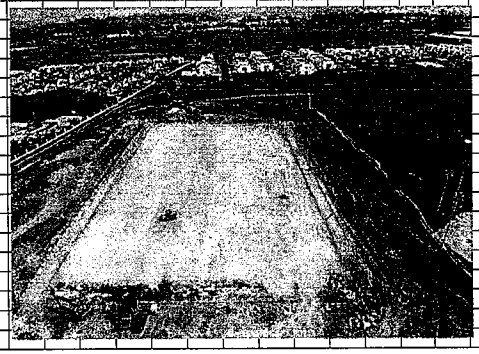

Subtotal	
PAGO ACTAS ANTERIORES	
TOTAL PRESENTE ACTA	

ENTORIA

RESIDENTE DE OBRA

Vo.BO.

CONSORCIO DEPORTIVO 2023


MEMORIAS DE CALCULO

NIT No.901.771.549-7			Página _1_ de _1_	Fecha de Elaboracion :

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 de 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA, PISTA ATLETICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGADEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"				
INTERVENTOR	RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	NIT O C.C.	830.028.126-2	CONTRATO No.	2023-0780
CONTRATISTA	CONSORCIO DEPORTIVO 2023	NIT O C.C.	901.771.549-7	CONTRATO No.	2023-0667

NOMBRE DEL PARQUE:	PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGADEPARTAMENTO	COD:	LOCALIDAD:

ITEM	NP-07	DECRIPCION	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	UNIDAD	ml	UBICACIÓN			

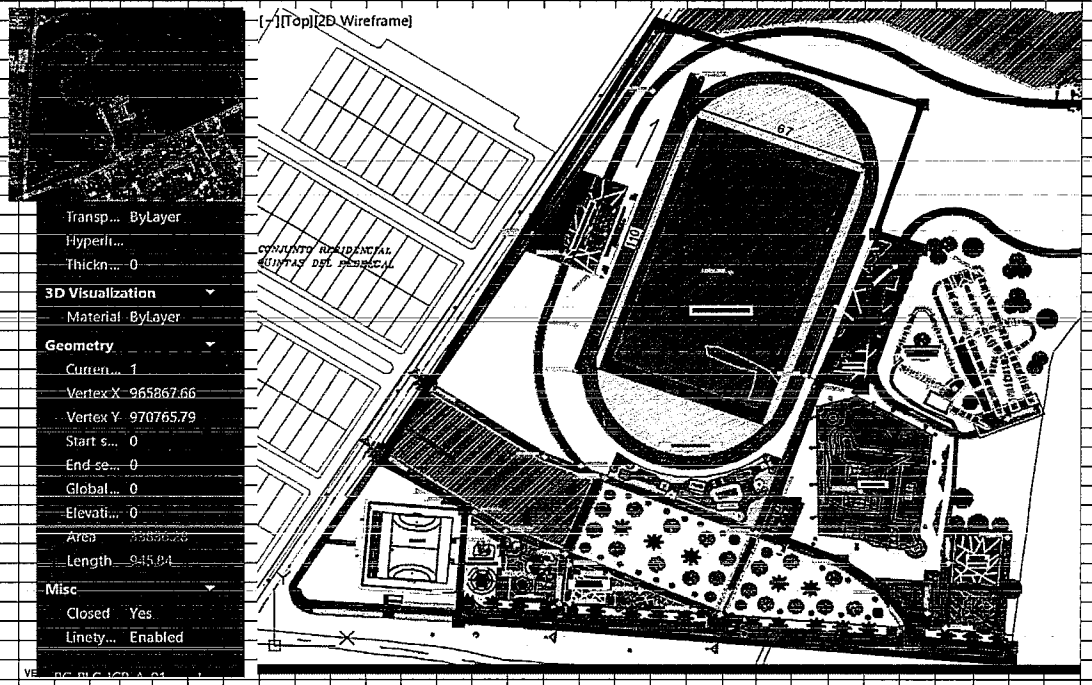

Localización	Ancho			No Elem.	Medida Total
	ancho	Alto	Longitud		
LONGITUD TOTAL			945.84		945.84

OBSERVACIONES: Areas tomadas del plano arquitectonico suministrado por la consultoria

Subtotal	945.84
PAGO ACTAS ANTERIORES	601.77
TOTAL PRESENTE ACTA	344.07

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Vo.BO.

RESIDENTE DE OBRA

Vo.BO.

MEMORIAS DE CALCULO

			Página _1_ de _1_	Fecha de Elaboracion :


EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 de 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA, PISTA ATLETICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGADEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"


'M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	NIT O C.C.	830.028.126-2	CONTRATO No.	2023-0780
ONSORCIO DEPORTIVO 2023	NIT O C.C.	901.771.549-7	CONTRATO No.	2023-0667

PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGADEPARTAMENTO	COD:	LOCALIDAD:

DECRIPCION	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	UNIDAD	ml	UBICACIÓN				
		Localización	Ancho			No Elem.	Medida Total
			ancho	Alto	Longitud		
							-



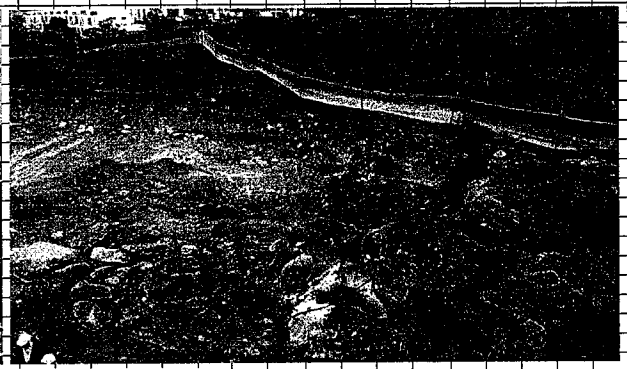

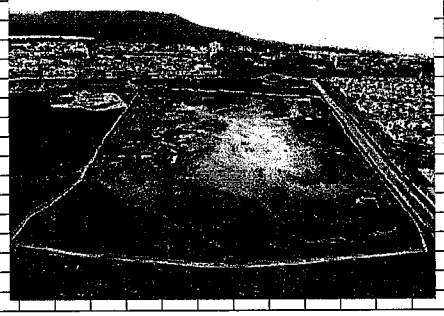

Subtotal	
PAGO ACTAS ANTERIORES	
TOTAL PRESENTE ACTA	

ENTORIA

RESIDENTE DE OBRA

Vo.BO.

CONSORCIO DEPORTIVO 2023

MEMORIAS DE CALCULO


NIT No.901.771.549-7 | Página _1_ de _1_ | Fecha de Elaboracion :

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 de 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA, PISTA ATLETICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGADEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

INTERVENTOR	RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	NIT O C.C.	830.028.126-2	CONTRATO No.	2023-0780
CONTRATISTA	CONSORCIO DEPORTIVO 2023	NIT O C.C.	901.771.549-7	CONTRATO No.	2023-0667

NOMBRE DEL PARQUE:	PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGADEPARTAMENTO	COD:	LOCALIDAD:

ITEM	NP-08	DECRIPCION	CerramMallaEslaCal10 h=2.5+Malla Nylonh=2.5	UNIDAD	ml	UBICACIÓN			
				Localización	Ancho area	Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
				Largo entre ejes			110.200	1.00	110.20
							110.200	1.00	110.20
				Ancho entre ejes			67.20	1.00	67.20
							67.20	1.00	67.20
				DESCUENTOS					
				Porejecutar			0.99	-1.00	- 0.99

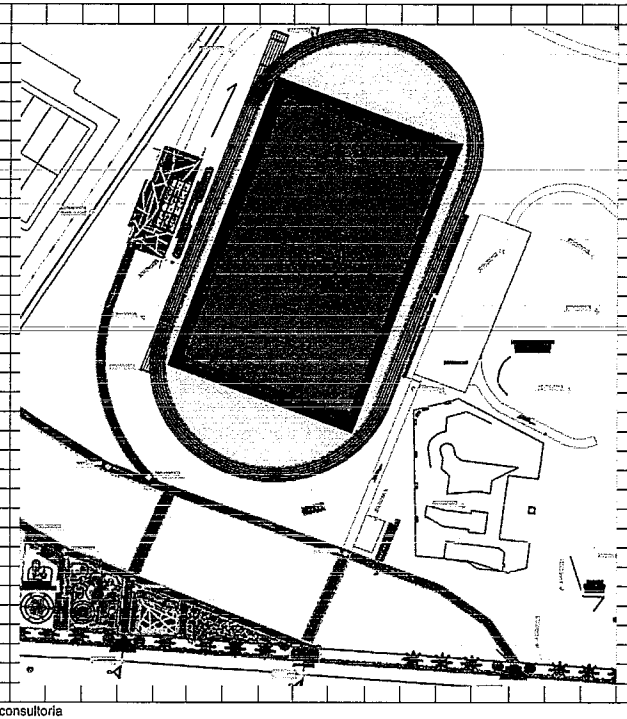

VER PLANO DESCRIPTIVO ANEXO

OBSERVACIONES: Areas tomadas del plano arquitectonico suministrado por la consultoria

Subtotal	353.81
PAGO ACTAS ANTERIORES	
TOTAL PRESENTE ACTA	353.81

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Vo.BO.

RESIDENTE DE OBRA

Vo.BO.

MEMORIAS DE CALCULO




			Página _1_ de _1_	Fecha de Elaboracion :

EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 de 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA, PISTA ATLETICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGADEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

'M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	NIT O C.C.	830.028.126-2	CONTRATO No.	2023-0780
)NSORCIO DEPORTIVO 2023	NIT O C.C.	901.771.549-7	CONTRATO No.	2023-0667

PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGADEPARTAMENTO	COD:	LOCALIDAD:

DECRIPCION	CerramMallaEslaCal10 h=2.5+Malla Nylonh=2.5	UNIDAD	ml	UBICACIÓN				
		Localización	Ancho				No Elem.	Medida Total
			area	Alto	Longitud			
								-
								-

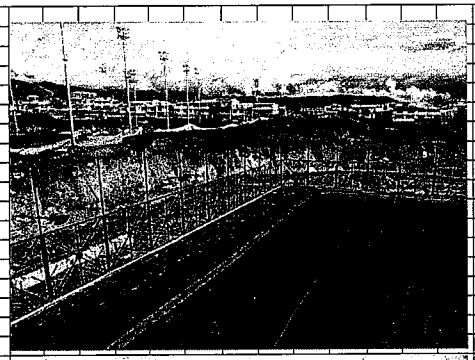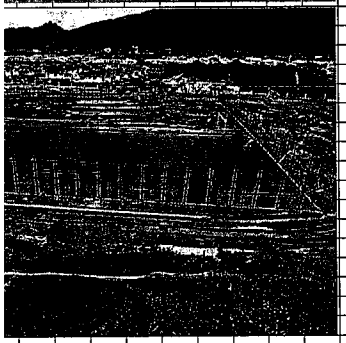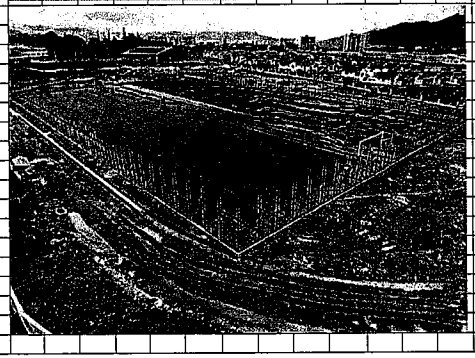el plano arquitectonico suministrado por la consultoria

Subtotal	
PAGO ACTAS ANTERIORES	
TOTAL PRESENTE ACTA	

ENTORIA

RESIDENTE DE OBRA

Vo.BO.

CONSORCIO
DEPORTIVO 2023

INFORME CORTE DE OBRA No. 3

CONSORCIO DEPORTIVO 2023
NIT: 901.771.549-7



OBJETO DEL CONTRATO:

"EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 DE 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA,"

INFORME TÉCNICO DE OBRA

ACTA DE COBRO No. 03
Periodo 26 de febrero de 2024
al 07 de junio de 2024

INFORME CORTE DE OBRA No. 3

CONSORCIO DEPORTIVO 2023
NIT: 901.771.549-7

CONTENIDO

		pág.
1.	INTRODUCCIÓN	4
2.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	4
3.	PLAZO DE EJECUCIÓN	5
3.1	ACTIVIDADES GENERALES A EJECUTAR	5
3.2	ANTECEDENTES DEL PROYECTO	6
4.	OBJETIVOS DEL PROYECTO	6
4.1	ACTIVIDADES GENERALES A EJECUTAR	6
4.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	6
5.	LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	7
6.	PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA 2023-0667	8
7.	RELACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	9
8.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	10
8.1	ACTIVIDADES TÉCNICAS	10
1.1.	ENSAYOS REALIZADOS	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
9.	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	18
9.1	INSTALACIONES Y EQUIPOS	18
10.	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
11.	SALDOS PENDIENTES Y ACTAS COBRADAS	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
12.	INCONVENIENTES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	24
12.1	ESTADO DEL CLIMA	25
12.2	MODIFICATORIO	28
13.	CONCLUSIONES	30
14.	ANEXOS	32

INFORME CORTE DE OBRA No. 3

CONSORCIO DEPORTIVO 2023
NIT: 901.771.549-7

Anexo A. ENSAYOS Y CERTIFICACIONES
Anexo B. CORRESPONDENCIA
Anexo C. BITÁCORA

LISTA DE TABLAS

pág.

Tabla 1. Información del Contrato de Obra 4
Tabla 2. Información Pólizas de Cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual Presentadas a la entidad con la firma del contrato. 8
Tabla 3. Información Pólizas de Cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual Presentadas a la entidad con la firma de la cesión del contrato. 9
Tabla 4. Información Pólizas de Cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual Presentadas a la entidad por la adición No 1. 9
Tabla 5. Relación del Personal Técnico y Administrativo 10

LISTA DE ILUSTRACIONES

pág.

Ilustración 1: Localización Municipio de Fusagasugá - Cundinamarca 7
Ilustración 2: Localización Predio Obra 8
Ilustración 3. Costos directos por capitulo **¡Error! Marcador no definido.**

CONSORCIO
DEPORTIVO 2023

INFORME CORTE DE OBRA No. 3

CONSORCIO DEPORTIVO 2023

NIT: 901.771.549-7

CONSORCIO DEPORTIVO 2023

INFORME CORTE DE OBRA No. 3

CONSORCIO DEPORTIVO 2023
NIT: 901.771.549-7

1. INTRODUCCIÓN

LA ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ –, Adjudica el Contrato de obra No. 2023-0667 cuyo objeto es: **"EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 de 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GNERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".**

El presente documento constituye el Informe de cuenta de cobro No. 3, en el cual se detallan las actividades ejecutadas del contrato en mención durante el periodo del Periodo 26 de febrero de 2024 al 07 de junio de 2024, por parte del CONSORCIO DEPORTIVO; el informe describe las actividades técnicas desarrolladas.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Según las obligaciones contractuales del **Contrato de Obra No. 2023-0667**, se prevé realizar la construcción de cancha sintética, pista atlética y urbanismo en el parque de las generaciones del municipio de Fusagasugá departamento de Cundinamarca. Los datos referentes al contrato se pueden observar en la Tabla 1.

Tabla 1. Información del Contrato de Obra

CONTRATO No.:	**2023-0667**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	3 de noviembre de 2023
OBJETO:	EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 de 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA, PISTA ATLETICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA-DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
VALOR INICIAL:	OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 49/100 CTVS. ($ 8'370'631'493.49).
CONTRATISTA:	CONSORCIO DEPORTIVO 2023 NIT: 900.226. 247-8 LUIS GABRIEL FARFAN VELASQUEZ, C.C No. 79.584.718 DE BOGOTÁ D.C
INTERVENTOR DEL CONTRATO:	RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S NIT: 830.028.126-2 CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ C.C No. 19.275.138 DE BOGOTÁ D.C

INFORME CORTE DE OBRA No. 3

CONSORCIO DEPORTIVO 2023
NIT: 901.771.549-7

SUPERVISOR:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	9 MESES
ACTA No. 01 - ACTA DE INICIO:	6 de septiembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO:	5 de junio de 2024
ACTA No. 02 - PACTACION DE PRECIOS:	22 de diciembre de 2023
ACTA No. 03 - MODIFICATORIO No. 1 :	22 de diciembre de 2023
ACTA No. 04 - PAGO PARCIAL No. 1 :	26 de diciembre de 2023
VALOR DE PAGO PARCIAL No. 1 :	TRES MIL OCHOCIENTOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS CON 93/100 CTVS. ($ 3'806'993'304.93).
ACTA No. 05 - FIJACION DE ITEMS NO PREVISTOS Y PACTACION DE PRECIOS:	29 de diciembre de 2023
ACTA No. 06 - ADICION No. 1 MODIFICATORIO No. 2:	29 de diciembre de 2023
VALOR DE LA ADICIÓN No.1	TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y SIETE PESOS CON 70/100 CTVS. ($ 3'996'989'087.70).
VALOR DEL CONTRATO ACTUALIZADO	DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 19/100 CTVS. ($ 12'367'620'581.19).
ACTA No. 07 - PAGO PARCIAL No. 2:	5 de abril de 2024
VALOR DE PAGO PARCIAL No. 2:	UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON 05/100 CTVS. ($ 1'434'707'500.05).
ACTA No. 08 - PRORROGA No. 1:	28 de mayo de 2024
PLAZO PRORROGA No. 1:	4 MESES
PLAZO CONTRACTUAL SEGÚN PRORROGA No. 1:	13 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No. 1:	5 de octubre de 2024

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del contrato de cancha sintética, pista atlética y urbanismo en el parque de las generaciones será de nueve (13) MESES contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio firmada el 06 de septiembre de 2023.

3.1 ACTIVIDADES GENERALES A EJECUTAR

Las actividades generales para ejecutar constan de: la construcción de cancha sintética, pista atlética y urbanismo en el parque de las generaciones del municipio de Fusagasugá departamento de Cundinamarca.

3.2 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Los estudios preliminares, diseños arquitectónicos, estructurales realizados para la cancha sintética, pista atlética y urbanismo en el parque de las generaciones fueron desarrollados por Consultoría CIVIDEPORTES mediante el contrato No. 084 - 2021 para la actualización y complementación de los estudios y diseños.

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

4.1 ACTIVIDADES GENERALES EJECUTADAS

Ejecución del convenio interadministrativo no. 831 de 2022 entre el municipio de Fusagasugá y el ICCU para la construcción de cancha sintética, pista atlética y urbanismo en el parque de las generaciones del municipio de Fusagasugá departamento de Cundinamarca

En la misma línea de desarrollo, se quiere dar cumplimiento a dicho objetivo mediante el desarrollo enfocado de la construcción de cancha sintética, pista atlética y urbanismo en el parque de las generaciones del municipio de Fusagasugá departamento de Cundinamarca.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Aumentar los escenarios para la práctica del deporte, la recreación y la actividad física del Municipio.

2. Prestar un mejor servicio a la comunidad como alternativa de solución para espacios de integración.

3. Herramienta en la generación de hábitos saludables y en la contribución al desarrollo de sectores como la educación, salud, inclusión social e incluso paz.

4. Incentivar la convivencia ciudadana y encuentro intergeneracional en el municipio, cumpliendo así mismo con la metas y objetivos planteados para la gestión del presente año.

5. La Constitución Política prevé en el artículo 2° que son fines del Estado: "servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la

Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación". La Constitución Política prevé en el artículo 2º que son fines del Estado: "servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación". Que el artículo 311 de la Constitución Política de Colombia, indica que el Municipio es la entidad fundamental de la división político administrativa del Estado, al que le corresponde prestar los servicios públicos determinados por la ley, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asigne la Constitución y la ley. Asimismo, en su ARTÍCULO 52. Modificado por el art. 1, Acto Legislativo No. 02 de 2000, establece que El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte y la recreación forman parte de la educación y constituyen gasto público socia.

5. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Ubicado en el predio Santa Cesárea del Barrio Villa Patricia en la Comuna Suroccidental del Municipio de Fusagasugá. La comuna suroccidental comprende los siguientes barrios: Llano Largo, La Pampa, La Venta, Cooviprof, Maíz Amarillo, Ciudad Eben-ezer, Gran Colombia, Caminos de Llano Largo, Llano Verde, Villa Celeste, Urb. Las Brisas, Leidy Di, Urb. Pedregal de San Luis, Urb. Parques de Occidente Etapas I y II, Urb. El Oasis, Urb. La Primavera, Llano Grande, Conj. Res. Asoveinte, Urb. San Diego La Venta, Conj. Res. Balcones de San José, Villas de La Pampa, Conj. Res. Villa Rosita, La Venta, Urb. Los Girasoles, Ciudad Jardín, Urb. Cádiz, Urb. Nueva Campiña, Urb. Ciudadela Comfenalco, San Francisco, Urb. Cambulos y Conj. Cerrado San Martín de Los Olivos

Localización exacta de la obra: 4°19´53´´N - 74°23´05´´ W

Ilustración 1: Localización Municipio de Fusagasugá - Cundinamarca

CONSORCIO DEPORTIVO 2023

INFORME CORTE DE OBRA No. 3

CONSORCIO DEPORTIVO 2023

NIT: 901.771.549-7


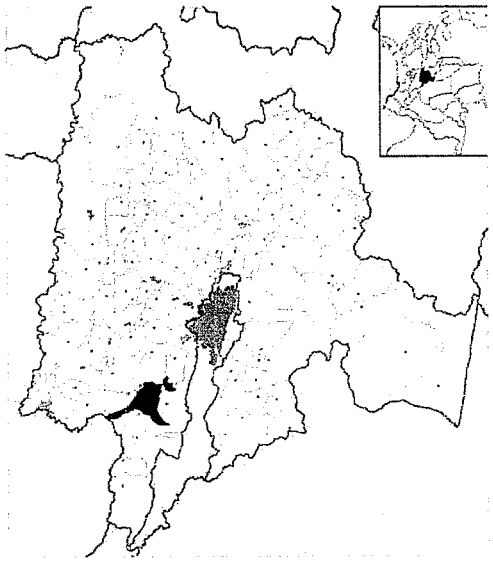


Ilustración 2: Localización Predio Obra

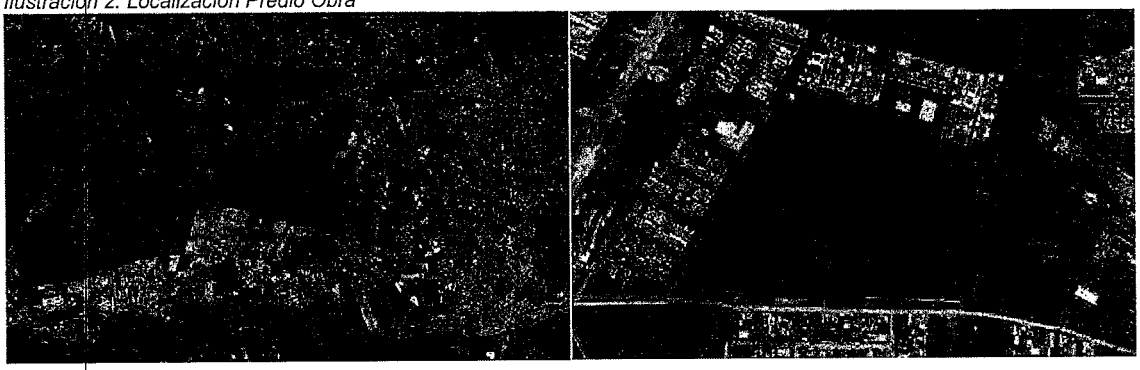

6. PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA 2023-0667

A continuación, se relaciona la información de las pólizas presentadas a la entidad contratante:

Tabla 2. Pólizas de Acta de inicio.

TIPO PÓLIZA	CUMPLIMIENTO		
Póliza No.	AB003039		
Aseguradora	EQUIDAD SEGUROS		
Amparos	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma asegurada
Cumplimiento	16/06/2023	15/07/2024	$1.674.126.298,60
Pago de salarios, y prestaciones	16/06/2023	15/03/2027	$1.255.594.723,95
Estabilidad y calidad de la obra	15/03/2023	15/03/2029	$2.511.189.447,90

TIPO PÓLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
Póliza No.	AB-003040

Aseguradora	EQUIDAD SEGUROS		
Amparos	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma asegurada
Predios, Labores y operaciones	16/06/2023	15/03/2024	$580.000.000,00
Contratistas y Subcontratistas	16/06/2023	15/03/2024	$580.000.000,00
Responsabilidad Civil Patronal	16/06/2023	15/03/2024	$580.000.000,00
Vehículos Propios y no Propios	16/06/2023	15/03/2024	$580.000.000,00
Responsabilidad cruzada contratistas	16/06/2023	15/03/2024	$580.000.000,00

Tabla 3. Pólizas Cesión del contrato.

VALOR DEL CONTRATO		$ 8'370'631'493.49		
FECHA DE TERMINACIÓN		5 de junio de 2024		
ACTA DE INICIO		POLIZA: 17-44-101212847	ANEXO 0	SEGUROS DEL ESTADO
AMPAROS		VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	20%	$ 1'674'126'298.70	13/11/2023	5/10/2024
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	15%	$ 1'255'594'724.02	13/11/2023	5/06/2027
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	30%	$ 2'511'189'448.05	13/11/2023	5/06/2029
ACTA DE INICIO		POLIZA: 17-40-101028519	ANEXO 0	SEGUROS DEL ESTADO
AMPAROS		VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
RESPONSABILIDAD CIVIL	500 SMLMV	$ 650'000'000	13/11/2023	5/06/2024

Tabla 4. Pólizas - Adición No 1.

VALOR DEL CONTRATO		$ 12'367'620'581.19		
FECHA DE TERMINACIÓN		5 de junio de 2024		
ADICION No. 1 MODIFICATORIO No. 2		POLIZA: 17-44-101212847	ANEXO 1	SEGUROS DEL ESTADO
AMPAROS		VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	20%	$ 2'473'524'116.40	13/11/2023	5/10/2024
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	15%	$ 1'855'143'087.30	13/11/2023	5/06/2027
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	30%	$ 3'710'286'174.60	13/11/2023	5/06/2029
ADICION No. 1 MODIFICATORIO No. 2		POLIZA: 17-40-101028519	ANEXO 1	SEGUROS DEL ESTADO
AMPAROS		VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
RESPONSABILIDAD CIVIL	500 SMLMV	$ 650'000'000	13/11/2023	5/06/2024

Tabla 5. Pólizas - Adición No 1.

VALOR DEL CONTRATO		$ 12'367'620'581.19		
FECHA DE TERMINACIÓN		5 de octubre de 2024		
PRORROGA No. 1		POLIZA: 17-44-101212847	ANEXO 3	SEGUROS DEL ESTADO
AMPAROS		VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	20%	$ 2'473'524'116.40	13/11/2023	5/06/2025
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	15%	$ 1'855'143'087.30	13/11/2023	5/02/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	30%	$ 3'710'286'174.60	13/11/2023	5/06/2029
PRORROGA No. 1		POLIZA: 17-40-101028519	ANEXO 3	SEGUROS DEL ESTADO
AMPAROS		VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
RESPONSABILIDAD CIVIL	500 SMLMV	$ 650'000'000	13/11/2023	5/02/2025

7. RELACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

En la Tabla 6 se encuentra suministrada la información pertinente al personal técnico y administrativo del proyecto:

Tabla 6. Relación del Personal Técnico y Administrativo

No	CARGO	CANTIDAD
1	DIRECTOR DE OBRA	1
2	RESIDENTE DE OBRA	1
3	RESIDENTE SST	1
4	RESIDENTE SOCIAL	1
5	MAESTRO DE OBRA	1

El personal mencionado anteriormente, fue avalado por la interventoría y aprobado la supervisión, se aclara que dicho personal está totalmente capacitado y es suficiente para la ejecución de las actividades del plan de trabajo vigente.

8. ACTIVIDADES EJECUTADAS

El desarrollo del proyecto en el periodo del 06 de abril al 05 de mayo de 2024, está compuesto por actividades de tipo administrativo y técnicas; las actividades administrativas corresponden a: recepción de información mediante correspondencia enviada y recibida de manera digital. Y las actividades técnicas a: toda actividad contratada y necesaria de obra para poder realizar a satisfacción el proyecto en mención.

8.1 ACTIVIDADES TÉCNICAS

A continuación, se describe las actividades que se ejecutaron durante el periodo de 26 de febrero de 2024 al 07 de junio de 2024 correspondientes al objeto del contrato 2023-0667.

CAPITULO 1: PRELIMINARES

SUBCAPÍTULO 1.10 PRELIMINARES

Ítem 3.1.1.12 DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M


Se presenta avance en las áreas de senderos, retirando la capa vegetal para luego continuar con las excavaciones necesarias para la instalación de la estructura de estos elementos.

CONSORCIO DEPORTIVO 2023

INFORME CORTE DE OBRA No. 3

CONSORCIO DEPORTIVO 2023

NIT: 901.771.549-7





Ítem: 1.1.01
Cantidad ejecutada: 7'373.53 m^2
Valor ejecutado a costo directo: $11'259'380.31 mcte

CAPITULO 2: MOVIMIENTO DE TIERRAS


SUBCAPÏTULO 3: ESTRUCTURAS

SUBCAPÍTULO 3.1: CIRCULACIÓN Y PERMANENCIA

3.1.1: PISOS

Ítem 3.1.1.09 GRAMA SINTÉTICA PARACAMPOS DEPORTIVOS

Como superficie final de la cancha de futbol se instala la grama sintética.

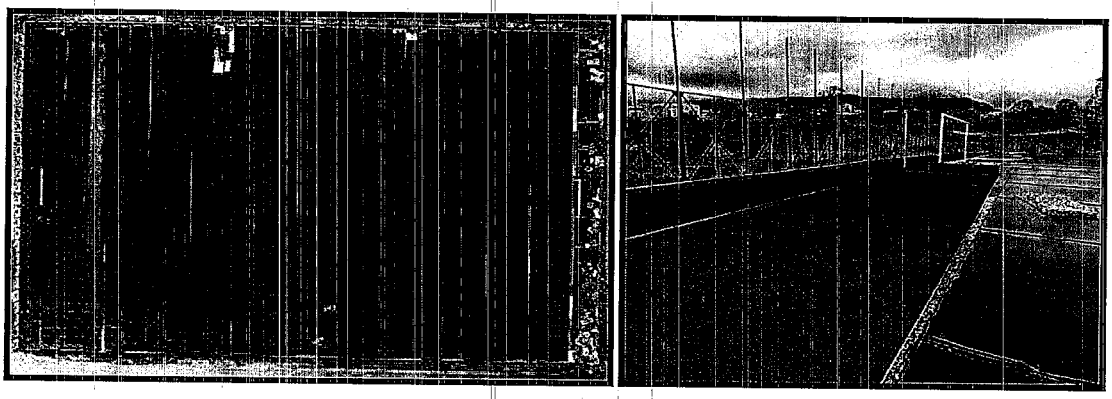




Ítem: 3.1.1.02
Cantidad ejecutada: 7'268.02 m^2
Valor ejecutado a costo directo: $69'402'322.98 mcte

Ítem 3.1.1.12 RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CCR-1

INFORME CORTE DE OBRA No. 3

CONSORCIO DEPORTIVO 2023
NIT: 901.771.549-7


Se realiza la impermeabilización de la subbase mediante riego con emulsión asfáltica, el avance de esta actividad se presenta en el área de la cancha de futbol.

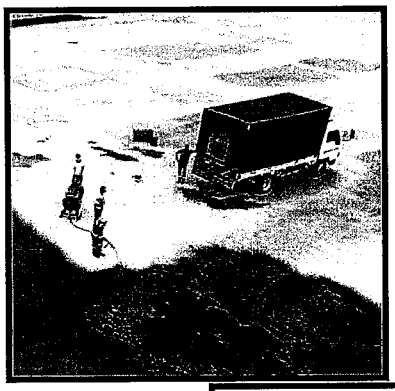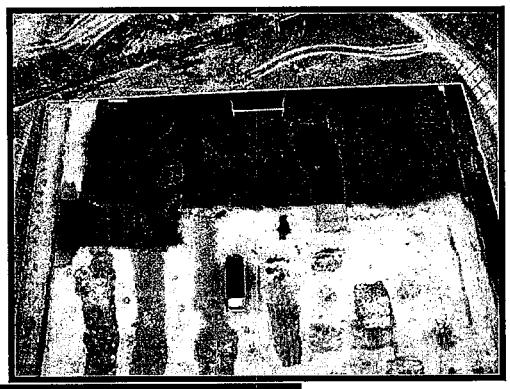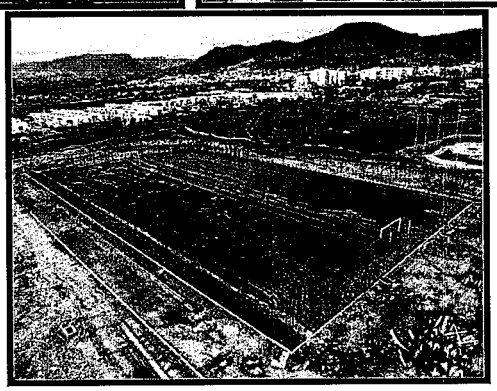Ítem: 3.1.1.10
Cantidad ejecutada: 7'267.92 m^2
Valor ejecutado a costo directo: $32'952'749.28 mcte

ÍTEM 3.1.1.14: BORDILLO PREFABRICADO A-80

Se instala como estructura de confinamiento de la cancha de futbol y pista atlética, garantizando la estabilidad de la estructura construida.

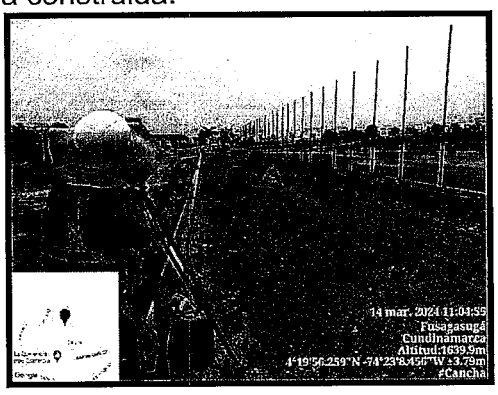



Ítem: 3.1.1.14
Cantidad ejecutada: 283.15 ml
Valor ejecutado a costo directo: $20'071'087.75 mcte

SUBCAPÍTULO 3.2: MOBILIARIO

ÍTEM 3.2.01: ARCOS DE FÚTBOL 11 X 2JUEGOS (Incluye mallas impermeabilizadas) (Incluye suministros, equipos y mano de obra para su correcta instalación)

Instalación de arcos como mobiliario de la cancha de futbol, la cual esta empotrada en el piso.

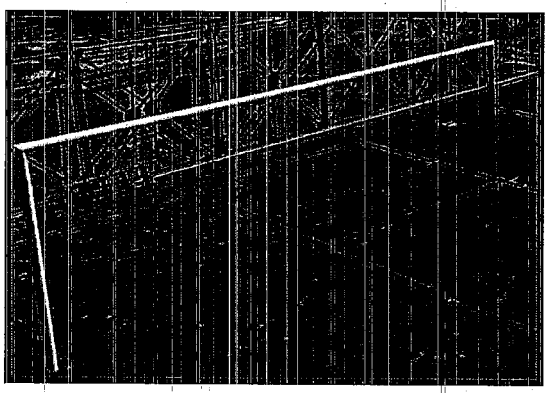



Ítem: 3.2.01
Cantidad ejecutada: 1 und
Valor ejecutado a costo directo: $9'031'568.00 mcte

CAPITULO 8: RED PLUVIAL


ÍTEM 8.10: TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 6"_160MM (Incluye suministros e instalación)

Conexión desde los descoles de los filtros y cárcamos construidos para el manejo de aguas de escorrentía.

CONSORCIO
DEPORTIVO 2023

INFORME CORTE DE OBRA No. 3


CONSORCIO DEPORTIVO 2023
NIT: 901.771.549-7

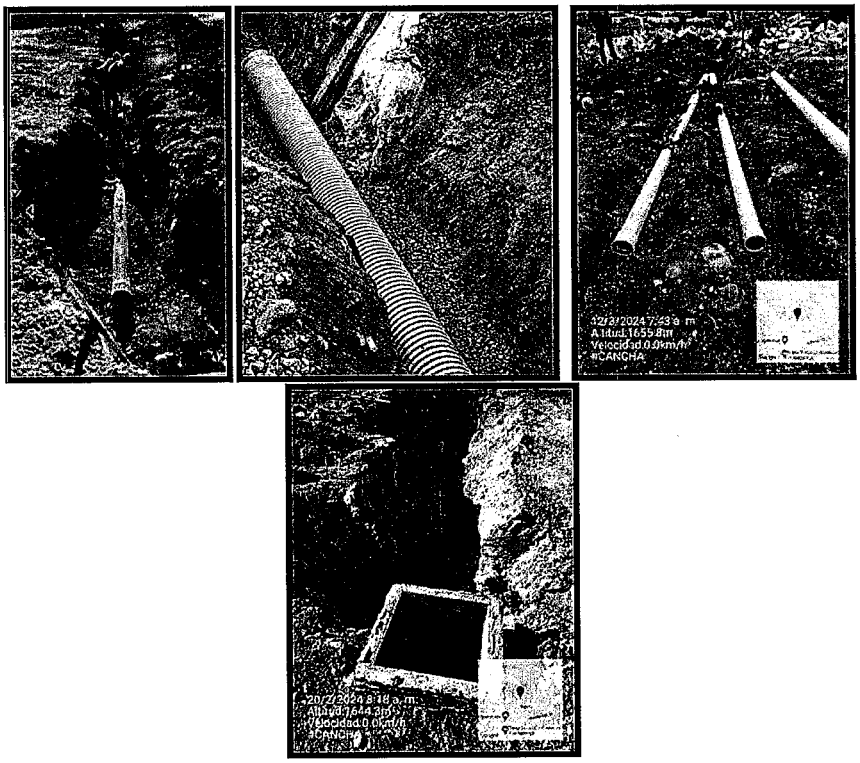

Ítem: 8.10
Cantidad ejecutada: 210.89 ml
Valor ejecutado a costo directo: $8'463'437.48 mcte

ÍTEM 8.19: CAJA DE INSPECCIÓN DE100X100

Descoles de filtros y cajas de paso de la red de agua pluvial.

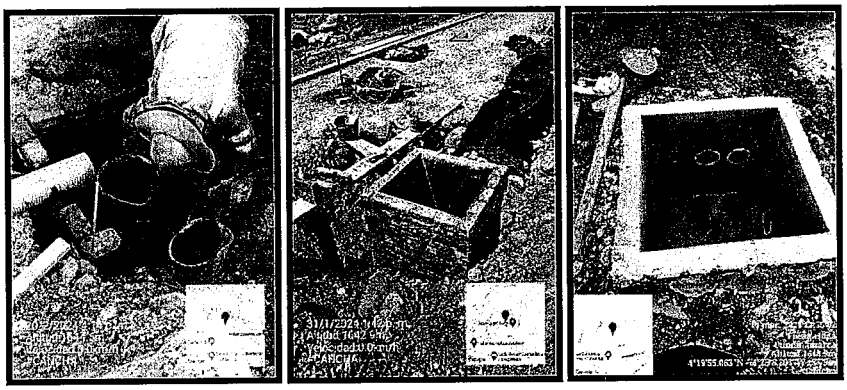



Ítem: 8.19
Cantidad ejecutada: 3 und
Valor ejecutado a costo directo: $1'455'210.00 mcte

ÍTEMS NO PREVISTOS

Ítem NP-03: Shockpad Refosport 16 mm

Una vez nivelada e impermeabilizada la subbase, se procede a instalar el geotextis sobre el cual se extiende el Shockpad, que sirve como material frintante que recolecta las aguas lluvias y trasnporta mediante su ranurado hasta los filtros perimetrales.

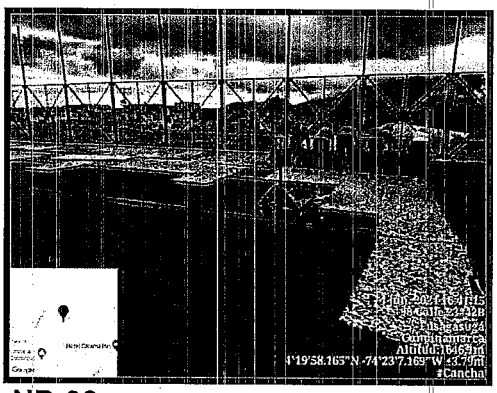


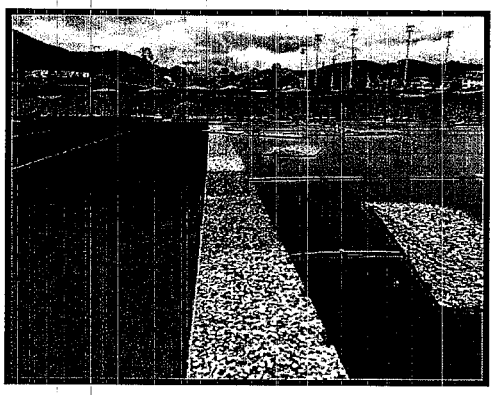


Ítem: NP-03
Cantidad ejecutada: 1'466.13 m^2
Valor ejecutado a costo directo: $1'455'210.00 mcte

ÍTEM NP-04: CARCAMOT-2 2500 psi+REJILLA PEAT.CONCE.REF. (CANAL) SECCION DE 35*40X100

Estructuras construidas en la periferia de la pista atlética con el fin de recoger las aguas de escorrentía, evitando daños a las obras ejecutadas.

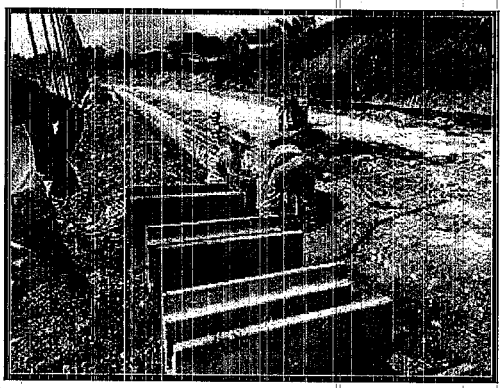

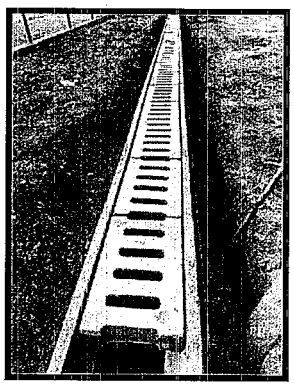


Ítem: NP-04
Cantidad ejecutada: 616.00 ml
Valor ejecutado a costo directo: $165'869'925.76 mcte

INFORME CORTE DE OBRA No. 3

CONSORCIO DEPORTIVO 2023
NIT: 901.771.549-7

ÍTEM NP-06: FILTRO LATERAL DE VIA ALVEOLAR IMPERMEABLE


Con el fin de controlar las aguas subterráneas y de capilaridad, se realiza la construcción de filtro en el la pata del talud con el fin de ayudar a conducir dichos caudales fuera de las estructuras y garantizando su estabilidad.

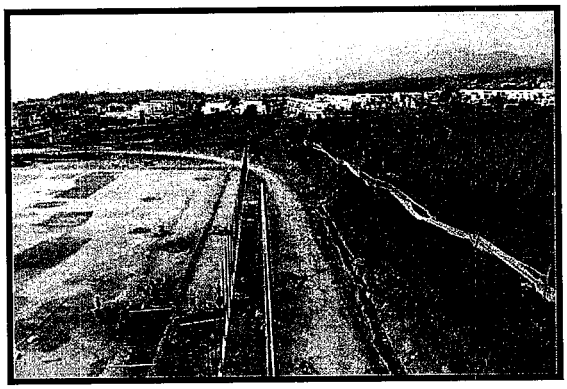

Ítem: NP-06
Cantidad ejecutada: 42.60 ml
Valor ejecutado a costo directo: $4'567'572.00 mcte

ÍTEM NP-07: Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **

Instalación de cerramiento en el perímetro del área a intervenir con el fin de evitar el ingreso de personal ajeno a la obra.

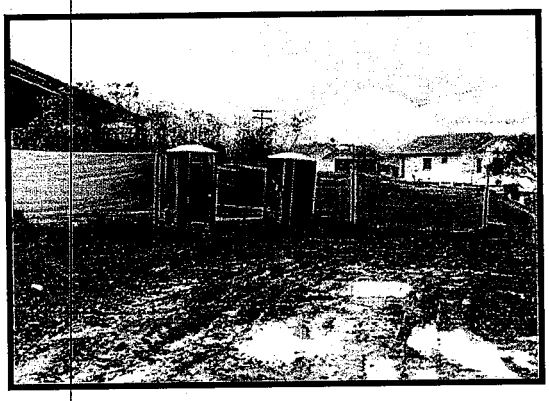




CONSORCIO
DEPORTIVO 2023

INFORME CORTE DE OBRA No. 3


CONSORCIO DEPORTIVO 2023
NIT: 901.771.549-7

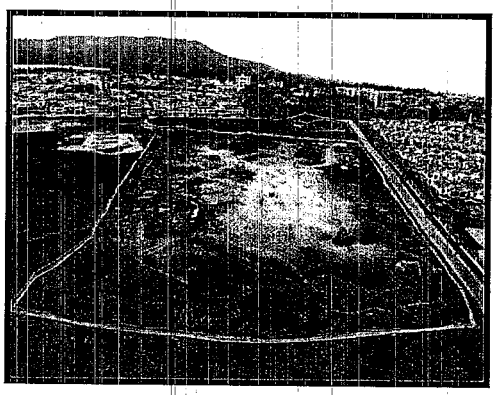

Ítem: NP-07
Cantidad ejecutada: 344.07 ml
Valor ejecutado a costo directo: $9'383'707.57 mcte

ÍTEM NP-08: CerramMallaEslaCal10 h=2.5+Malla Nylonh=2.5

Se realiza la instalación del cerramiento delimitando el área del la cancha de futbol con el fin de controlar el acceso.

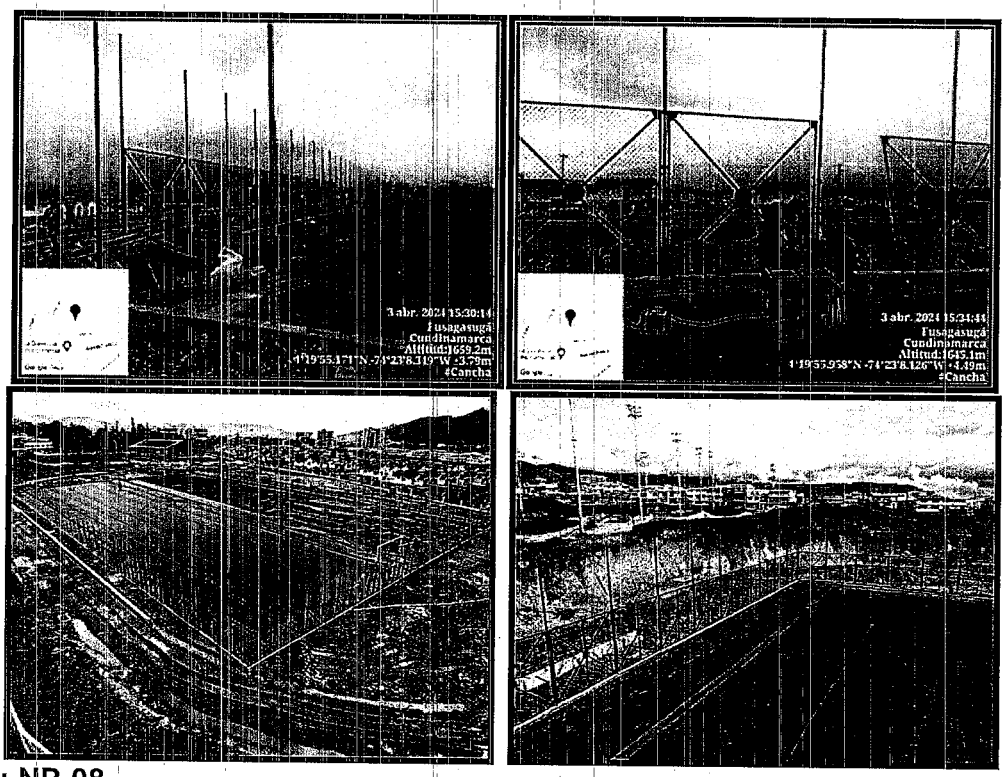

Ítem: NP-08
Cantidad ejecutada: 353.81 ml
Valor ejecutado a costo directo: $343'610'319.32 mcte

9. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

Durante el periodo de tiempo descrito en el presente informe el Plan de Manejo de Tránsito se encuentra aprobado y puesto en marcha.




9.1 INSTALACIONES Y EQUIPOS

Las instalaciones implementadas que se generan a partir de las necesidades del proyecto se encuentran localizadas dentro del predio a intervenir como se observa en la Figura 1:

Figura 1. Localización de Instalaciones

INFORME CORTE DE OBRA No. 3

CONSORCIO DEPORTIVO 2023
NIT: 901.771.549-7

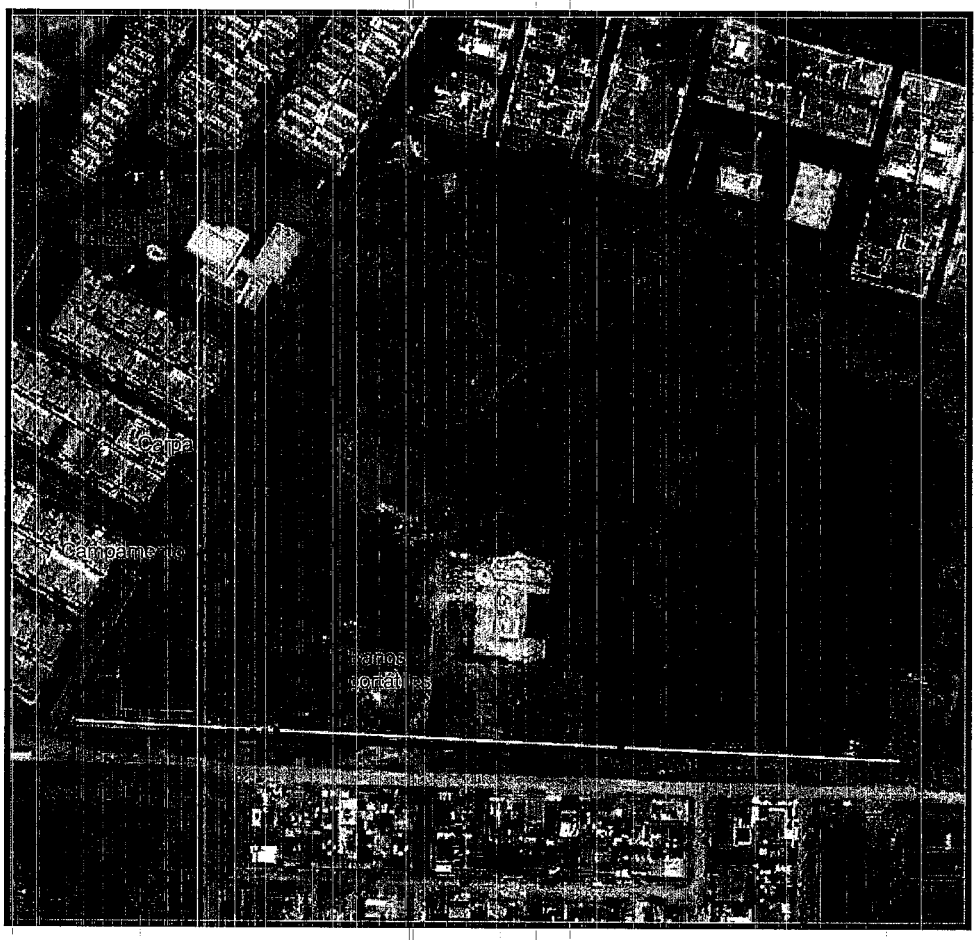

A continuación, se presentan las imágenes de las instalaciones relacionadas en la Figura 1:


- Campamento: Utilizado para almacenamiento de materiales dentro de la obra.

Figura 2. Campamento, baños portátiles, carpa



- Espacio para la atención e información de obra.

Figura 3. Espacio atención

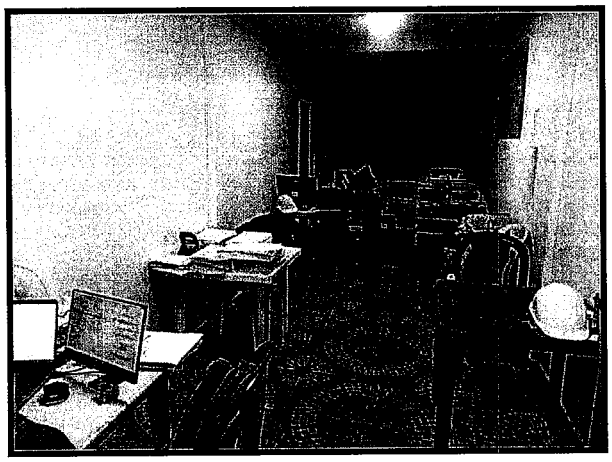

Equipo Ofimático

Para el desarrollo de las actividades propias del contrato durante el periodo activo del 06 abril 2023 al 05 mayo 2024 CONSORCIO DEPORTIVO 2023 conto con equipos adecuados y actualizados tales como computadores, impresoras, fotocopiadoras, y equipos de comunicación, también con los vehículos necesarios para el desplazamiento del personal operativo y administrativo del contrato.

10. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

En este apartado se analiza factores preponderantes del contrato sobre inversiones de los recursos, identificando los principales montos ejecutados, porcentajes de desarrollo de las actividades, otros factores adjuntos que determinan el estado actual del proyecto y permiten tomar decisiones de fondo sobre la forma que se deben desarrollar las actividades y la identificación de algunas situaciones particulares que generan atrasos o adelantos en el plan propuesto inicialmente.

Por lo anterior se hace necesario realizar un análisis inicial del contrato, desde el punto de vista presupuestal, que permita conocer cómo se contempla realizar las diferentes inversiones de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto y sentar un punto de partida con base en los cronogramas.

Cabe aclarar que durante la ejecución del contrato se ha realizado el modificatorio 1 donde se realiza un balance de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos sin afectar el valor del proyecto, y un modificatorio 2 donde se realiza la inclusión de ítems no previstos y la adición 1 por un valor de TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y SIETE PESOS CON 70/100 CTVS. ($ 3'996'989'087.70) lo cual actualiza el valor del contrato a DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 19/100 CTVS. ($ 12'367'620'581.19) distribuyendo los costos de la siguiente forma:

Tabla 8. Porcentaje por capítulos

Capitulo	Descripción	Valor Total	Porcentaje
1	PRELIMINARES	$ 59'326'819.56	0.64%
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS	$ 491'656'324.28	5.29%
3	ESTRUCTURAS	$ 3'375'068'413.74	36.30%
4	MOBILIARIO	$ 141'758'354.00	1.52%
5	PAISAJISMO	$ -	0.00%
6	EDIFICACIONES	$ 3'451'166.00	0.04%
7	PUNTOS HIDRÁULICOS DEAGUA FRÍA	$ 723'303.00	0.01%
8	RED SANITARIA	$ 12'606'688.07	0.14%
9	RED PLUVIAL	$ 48'915'774.32	0.53%
10	RED GENERAL DE SUMINISTRO	$ 1'232'023.33	0.01%
11	TANQUE	$ 76'189'316.16	0.82%
12	RED SUMINISTRO DE AGUA FRÍA	$ 23'953'140.63	0.26%
13	PUNTOS HIDRAÚLICOS DEAGUA FRIA h max 2,50	$ 36'794.00	0.00%
14	REDES ELÉCTRICAS	$ 93'307'132.12	1.00%
15	RED DE ALÚMBRADO PÚBLICO	$ 692'027'566.80	7.44%
16	ITEMS NO PREVISTOS	$ 2'381'873'006.17	25.61%
17	ITEMS NO PREVISTOS MOD No. 02	$ 1'896'837'020.35	20.40%

Ilustración 3. Costos directos por capitulo

INFORME CORTE DE OBRA No. 3

CONSORCIO DEPORTIVO 2023
NIT: 901.771.549-7

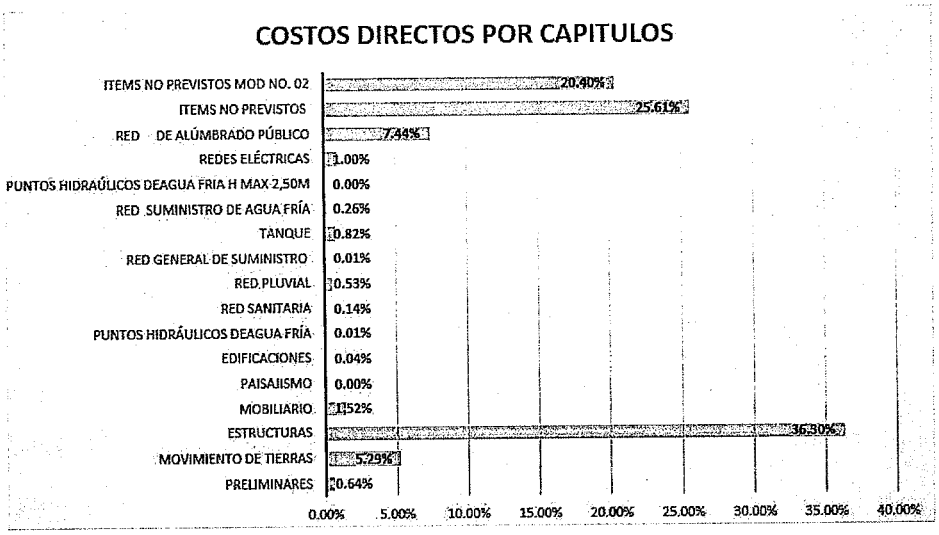


Tabla 9. Distribución de costos

Capitulo	Descripción		Valor Total
1	PRELIMINARES	$	59'326'819.56
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS	$	491'656'324.28
3	ESTRUCTURAS	$	3'375'068'413.74
4	MOBILIARIO	$	141'758'354.00
5	PAISAJISMO	$	-
6	EDIFICACIONES	$	3'451'166.00
7	PUNTOS HIDRÁULICOS DEAGUA FRÍA	$	723'303.00
8	RED SANITARIA	$	12'606'688.07
9	RED PLUVIAL	$	48'915'774.32
10	RED GENERAL DE SUMINISTRO	$	1'232'023.33
11	TANQUE	$	76'189'316.16
12	RED SUMINISTRO DE AGUA FRÍA	$	23'953'140.63
13	PUNTOS HIDRAÚLICOS DEAGUA FRIA h max 2,50	$	36'794.00
14	REDES ELÉCTRICAS	$	93'307'132.12
15	RED DE ALÚMBRADO PÚBLICO	$	692'027'566.80
16	ITEMS NO PREVISTOS	$	2'381'873'006.17
17	ITEMS NO PREVISTOS MOD No. 02	$	1'896'837'020.35
	TOTAL COSTOS DIRECTOS	$	9'298'962'842.53
ADMINISTRACIÓN		26.00% $	2'417'730'339.06
IMPREVISTOS		2.00% $	185'979'256.85
UTILIDAD		5.00% $	464'948'142.13
	COSTO TOTAL OBRA	$	12'367'620'580.57

Los costos de administración guardan relación directa con la forma en que se amortizan, ya que estos costos son una función de los costos directos de obra lo que implica que se pagarán en función de la cantidad de obra ejecutada y no de la duración del contrato.

11. SALDOS PENDIENTES Y ACTAS COBRADAS

El valor total cobrado en actas es de TRES MIL OCHOCIENTOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS CON 93/100 CTVS. ($ 3'806'993'304.93) cobrado mediante acta parcial 1, mas CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON 05/100 CTVS. ($ 1'434'707'500.05) cobrado mediante acta parcial 2.

El avance financiero acumulado asciende a CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS CON 98/100 CTVS. ($ 5.241.700.804,98), correspondiente al 42,38% de acuerdo con las condiciones contractuales actualizadas, más el valor de la presente acta.

Tabla 9. Distribución de costos

ACTAS	CONCEPTO	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PARCIAL	VALOR PARCIAL
ACTA 1	ACTA PARCIAL 01	30,78%	30,78%	$ 3.806.993.304,93
ACTA 2	ACTA PARCIAL 02	42,38%	11,60%	$ 1.434.707.500,05
TOTAL		42,38%	42,38%	$ 5.241.700.804,98

12. COSTOS EJECUTADOS EN EL PERIODO

En este apartado se evidencia las cantidades y valores a cobrar en la presente acta de cobro.

	ITEM	ITEM ICCU	DESCRIPCIONES	UND	VALOR UNITARIO	ACTA PARCIAL No. 3 CANTIDAD	ACTA PARCIAL No. 3 VALOR PARCIAL
	1.0		**PRELIMINARES**				
	1.10	.	PRELIMINARES				
1	1.1.01	.	DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M	M2	$1'527.00	7'373.53	$11'259'380.31
	SUBTOTAL						**$11'259'380.31**
	3.0		**ESTRUCTURAS**				
	3.1	.	**CIRCULACIÓN Y PERMANENCIA**				
	3.1.1	.	**PISOS**				
7	3.1.1.02	.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	$9'549.00	7'268.02	$69'402'322.98
14	3.1.1.09	.	GRAMA SINTÉTICA PARACAMPOS DEPORTIVOS	M2	$127'347.00	1'466.13	$186'707'257.11
15	3.1.1.10	.	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	$4'534.00	7'267.92	$32'952'749.28

19	3.1.1.14	.	BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	$70'885.00	283.15	$20'071'087.75
	SUBTOTAL						**$309'133'417.12**
	3.2		**MOBILIARIO**				
22	3.2.01	.	ARCOS DE FÚTBOL 11 X 2JUEGOS (Incluye mallas impermeabilizadas) (Incluye suministros, equipos y mano de obra para su correcta instalación)	JG	$9'031'568.00	1.00	$9'031'568.00
	SUBTOTAL					-	**$9'031'568.00**
	8.0		**RED PLUVIAL**				
65	8.10	.	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 6"_160MM (Incluye suministros e instalación)	ML	$40'132.00	210.89	$8'463'437.48
74	8.19	.	CAJA DE INSPECCIÓN DE100X100	UN	$485'070.00	3.00	$1'455'210.00
	SUBTOTAL						**$9'918'647.48**
			ITEMS NO PREVISTOS				
NP-03	NP-03		Shockpad Refosport 16 mm	M2	$108'500.00	1'466.13	$159'075'105.00
NP-04	NP-04	IDRD 11460	CarcamoT-2 2500 psi+Rejilla Peat.Conc.Ref. (canal) seccion de 35x40x100	ML	$269'269.36	616.00	$165'869'925.76
NP-06	NP-06	ICCU 4.59	FILTRO LATERAL DE VIA ALVEOLAR IMPERMEABLE	ML	$107'220.00	42.60	$4'567'572.00
NP-07	NP-07	IDRD 11646	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	ml	$27'272.67	344.07	$9'383'707.57
NP-08	NP-08	IDRD 16766	CerramMallaEslaCal10 h=2.5+Malla Nylonh=2.5	ml	$971'171.87	353.81	$343'610'319.32
	SUBTOTAL						**$682'506'629.65**

SUBTOTAL OBRAS		**$1'021'849'642.56**
ADMINISTRACIÓN	26.00%	$265'680'907.07
IMPREVISTOS	2.00%	$20'436'992.85
UTILIDADES	5.00%	$51'092'482.13
SUBTOTAL AIU		**$337'210'382.05**
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS		**$1'359'060'024.61**

El valor por cobrar para el acta de pago No. 3 es de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA MIL VEINTICUATRO PESOS CON 61/100 CTVS. ($ 1'359'060'024.61).

13. INCONVENIENTES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Acontecimientos:

Observaciones presentadas a los planos de diseño suministrados por la entidad contratante, las cuales se listan a continuación:

1. El informe topográfico realizado por nuestra firma dista demasiado de lo propuesto en el contrato inicial, hay grandes diferencias en cuanto a las cantidades de excavación y rellenos, estas diferencias generan incrementos sustanciales afectando el presupuesto contractual.

2. En el informe eléctrico realizado por nuestro especialista, evidencia diferencias esenciales en los planos, afectándose así las cantidades contractuales, y de igual forma no es claro lo propuesto por la consultoría.

13.1 ESTADO DEL CLIMA

Con respecto al estado de precipitación en el municipio de Fusagasugá en el periodo del 26 de febrero de 2024 al 07 de junio de 2024, se presentan **lluvias en horas No laborales** antes de iniciar jornada laboral durante 14 días que retrasaron las actividades de movimiento de tierras durante un total de 42 horas debido a la necesidad de manejar los materiales a una humedad optima y evitar posibles fallos, adicional se presentaron **78 Horas de lluvia durante horas laborales** en donde se vio necesario suspender actividades.

De acuerdo con lo anterior la ejecución de actividades se vio afectada durante un acumulado de 15 días laborales en los cuales no se mantuvieron los rendimientos generando un posible atraso en el cronograma que podría ser perceptible finalizando el plazo de ejecución.

RELACION ESTADO DEL CLIMA			
DIA	HORA LABORAL	DURACIÓN (H)	OBSERVACIONES
01/04/2024		4 h	Se presentan fuertes lluvias durante la noche anterior
02/04/2024		3 h	Se presentan fuertes lluvias durante la noche anterior
03/04/2024		2 h	Se presentan fuertes lluvias durante la noche anterior
04/04/2024		4 h	Se presentan fuertes lluvias durante la noche anterior
06/04/2024		5 h	Se presentan fuertes lluvias durante la noche anterior
18/04/2024		3 h	Se presentan fuertes lluvias durante la noche anterior
20/04/2024		3 h	Se presentan fuertes lluvias durante la noche anterior

22/04/2024	4 h	Se presentan fuertes lluvias durante la noche anterior
23/04/2024	3 h	Se presentan fuertes lluvias durante la noche anterior
26/04/2024	4 h	Se presentan fuertes lluvias durante la noche anterior
06/05/2024	3 h	Se presentan fuertes lluvias durante la noche anterior
14/05/2024	3 h	Se presentan fuertes lluvias durante la noche anterior
28/05/2024	3 h	Se presentan fuertes lluvias durante la noche anterior

Las lluvias que se presentan durante la noche anterior a la jornada de trabajo causan retrasos en la ejecución de actividades por alrededor de 3 horas al inicio de la jornada laboral, teniendo en cuenta que no se puedan realizar trabajos.

RELACION ESTADO DEL CLIMA			
DIA	HORA LABORAL	DURACIÓN (H)	OBSERVACIONES
08/03/2024	11:00-12:00	1 h	Se presentan lluvias moderadas impidiendo la ejecución normal de actividades
18/03/2024	17:00-18:00	1 h	Se presentan lluvias fuertes impidiendo la ejecución normal de actividades
19/03/2024	14:00-18:00	4 h	Se presentan lluvias fuertes impidiendo la ejecución normal de actividades
20/03/2024	16:00-18:00	2 h	Se presentan lluvias fuertes impidiendo la ejecución normal de actividades
22/03/2024	15:00-18:00	3 h	Se presentan lluvias fuertes impidiendo la ejecución normal de actividades
03/04/2024	13:00-14:00 14:00-15:00	2 h	Se presentan lluvias fuertes impidiendo la ejecución normal de actividades

INFORME CORTE DE OBRA No. 3

CONSORCIO DEPORTIVO 2023
NIT: 901.771.549-7

04/04/2024	08:00-09:00 09:00-10:00	6 h	Se presentan lluvias fuertes impidiendo la ejecución normal de actividades
	07:00-08:00 10:00-11:00 14:00-15:00 16:00-17:00		Se presentan lluvias moderadas impidiendo la ejecución normal de actividades
06/04/2024	07:00-08:00	1 h	Se presentan lluvias fuertes impidiendo la ejecución normal de actividades
17/04/2024	16:00-18:00	2 h	Se presentan lluvias moderadas impidiendo la ejecución normal de actividades
19/04/2024	12:00-18:00	6 h	Se presenta lluvias moderadas impidiendo la ejecución normal de actividades
20/04/2024	12:00-18:00	6 h	Se presenta lluvias fuertes impidiendo la ejecución normal de actividades
22/04/2024	08:00-10:00 14:00-17:00	7 h	Se presenta lluvias moderadas impidiendo la ejecución normal de actividades
	11:00-13:00		Se presenta lluvias fuertes impidiendo la ejecución normal de actividades
23/04/2024	11:00-12:00	1 h	Se presentan lluvias moderadas impidiendo la ejecución normal de actividades
26/04/2024	12:00-15:00	4 h	Se presenta lluvias fuertes impidiendo la ejecución normal de actividades
	16:00-17:00		Se presentan lluvias moderadas impidiendo la ejecución normal de actividades
29/04/2024	07:00-09:00	3 h	Se presenta lluvias fuertes impidiendo la ejecución normal de actividades
	09:00-10:00		Se presentan lluvias moderadas impidiendo la ejecución normal de actividades

02/05/2024	12:00-13:00 13:00-14:00	3 h	Se presenta lluvias fuertes impidiendo la ejecución normal de actividades
	14:00-15:00		Se presentan lluvias moderadas impidiendo la ejecución normal de actividades
09/05/2024	07:00-17:00	11 h	Se presentan lluvias moderadas impidiendo la ejecución normal de actividades
10/05/2024	12:00-15:00	4 h	Se presentan lluvias moderadas impidiendo la ejecución normal de actividades
15/05/2024	11:00-13:00	3 h	Se presentan lluvias moderadas impidiendo la ejecución normal de actividades
16/05/2024	12:00-15:00	4 h	Se presentan lluvias moderadas impidiendo la ejecución normal de actividades
30/05/2024	12:00-14:00	2 h	Se presentan lluvias moderadas impidiendo la ejecución normal de actividades
07/06/2024	12:00-13:00	1 h	Se presentan lluvias moderadas impidiendo la ejecución normal de actividades

13.2 MODIFICATORIO

Modificatorio 01 Cómo puede evidenciarse en la tabla anexa, las mayores, menores cantidades y las actividades No previstas, se vio la necesidad de solicitar un modificatorio sin afectar el valor inicial de las condiciones contractuales:

CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1	$ 8,370,631,493.49

Modificatorio 02 con inclusión de ítems no previstos y adición en valor por lo tanto el valor contractual es actualizado de la siguiente forma:

CONDICIONES CONTRACTUALES	$ 8,370,631,493.49
ADICIÓN No. 01 AL CONTRATO	$ 3,996,989,087.70
CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2	$ 12,367,620,581.19

CONSORCIO
DEPORTIVO 2023

INFORME CORTE DE OBRA No. 3

CONSORCIO DEPORTIVO 2023
NIT: 901.771.549-7

Prorroga No. 01 con un plazo de 4 meses necesarios para la culminación de las actividades contractuales vigentes, por lo cual el plazo actualizado del contrato es de 13 MESES contados a partir de la firma del acta de inicio, estableciendo como fecha de finalización el 05 de octubre de 2024.

14. CONCLUSIONES

- A la fecha se cuenta con el personal idóneo capacitado para la realización de los diferentes Planes exigidos y procesos constructivos, del mismo modo se cuenta con los materiales y equipos necesarios para el desarrollo de las actividades.

- Durante la ejecución del contrato se ha realizado un modificatorio 1 correspondiente un balance de mayores y menores cantidades, y un modificatorio 2, en el cual se realiza inclusión de ítems no previstos y adición 1 al contrato.

- El valor actualizado del contrato mediante adición 1 es de DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 19/100 CTVS. ($ 12'367'620'581.19).

- El desembolso financiero incluyendo la presente acta corresponde a un 53.37%, y el avance de ejecución de la obra se encuentra en 64%

- Durante las excavaciones y conformación de subrasante se encontraron fallos en donde se realiza excavación y mejoramiento con piedra rajón compactado sobre el cual se remata con un sello.

- Las fuertes lluvias han retrasado las actividades de excavaciones y extensión de material, los días posteriores a las lluvias puesto que se dificulta el movimiento de la maquinaria.

- La ejecución de actividades se vio afectada por lluvias durante un acumulado 15 días laborares en los cuales no se mantuvieron los rendimientos generando un posible atraso en el cronograma que podría ser perceptible finalizando el plazo de ejecución.

CONSORCIO
DEPORTIVO 2023

INFORME CORTE DE OBRA No. 3

CONSORCIO DEPORTIVO 2023

NIT: 901.771.549-7

15. ANEXOS

ANEXO A. ENSAYOS Y CERTIFICACIONES

SPORTGRASS
Bogotá-Panamá-Santo Domingo- Miami

Technical Data


PRODUCT SPECIFICATION			
Product Name	MS PRO	***Application***	Soccer
Model	FX-MS PRO 5011	***Roll Width***	2.0m/4m
Color	Light Green	***Roll Length***	As required;
Accreditations and Testing	SGS, 25000cycles Lisport XL, UV 5000H		
YARN CHARACTERISTICS			
Yarn 1		**Yarn 2**	
Structure	Monofilament	***Structure***	N/A
Composition (ISO 11357)	PE	***Composition***	N/A
Dtex (ASTM D1907)	12000D	***Dtex (ASTM D1577)***	N/A
Tape Thickness (ASTM D3218)	370μm	***Tape thickness (ASTM D3218)***	N/A
Tape Width:	1.2mm	***Tape Width***	N/A
UV Effects (EN ISO 20105)	Grey Scale 4-5,no visual change	***Yarn Breaking Strength (ASTM D2256)***	≥110 N
Pill Burn Test (ASTM D2859)	Pass	***Yarn Melt Point (ASTM D789)***	100°C
CARPET CHARACTERISTICS			
TURF			
Pile Height (ISO 2549)	45mm±1mm	***Gauge (ASTM D418-93)***	5/8 inch
Number of Strands per Tuft	6	***Stitches per 10cm***	13.±1
Stitches per m2 (ISO 1763)	8190±100	***Total Yarn Weight (ISO 2549)***	1059g/sqm±10%
BACKING			
Primary Backing	***PP+Leno***		
Weight (ASTM D5848)	200g/sqm		
Secondary Backing	Black SBR Latex		
Weight (ASTM D5848)	1100g/sqm±10%		
Total Carpet Weight (ASTM D5848)		2359g/sqm±10%	
Carpet			
Carpet Tuft Withdrawal (EN 13744 & ISO 4919)	**≥ 40N (FIFA Standard)**	*Water Permeability of Carpet (EN 12616)*	≥ 2000 mm/hr
INFILL REQUIREMENTS			
SAND			
Particle Size Range	0.5-1.0mm	***Particle shape***	***B2***
Bulk Density	1465mg/m3	***Application rate***	***5kg/m2***
RUBBER			
Particle Size Range	2-3mm	***Particle shape***	***A2***

APETEK SRL
Corso Italia, 19 24040 Osio Sopra (Bg)
Tel. +39 (0)35 494220 1 - Fax +39 (0) 35 4997158
info@apetek.net - www.apetek.net

Rev. 2/2020

REFO SPORT 16 C S*

Drilled and grooved - Horizontal and vertical drainage
Perforado y ranurado - Drenaje horizontal y vertical
Forato e scanalato - Drenaggio orizzontale e verticale

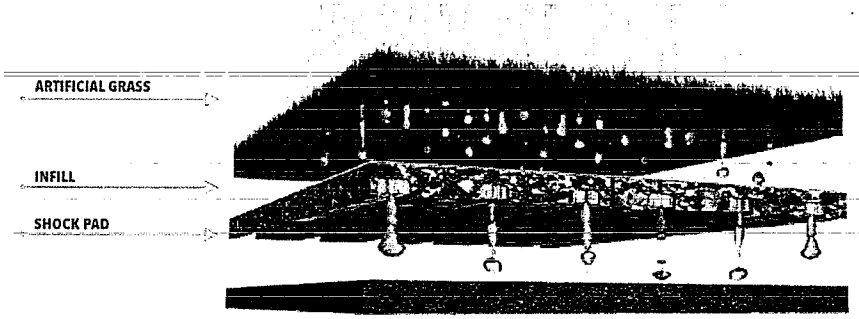

- High performance
- High permeability
- High hydraulic capacity
- Excellent consolidation to reduce micro plastics
- Tested according to:
  - EN 71-3;
  - DIN ISO 25-7 : 2004;
  - Phthalates Content;
  - PAH Content

TECHNICAL SPECIFICATION/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/SPECIFICAZIONI TECNICHE/SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


REFO SPORT 16 C S, meets, in specific field contructions, the specifications of the international sports associations
lockey, football, MUGA and soccer (FIFA requirements) etc. / cumple, en construcciones de campo específicas, con las especificaciones de las asociaciones
acionales de deportes como Hockey, football, MUGA and soccer (FIFA requirements) etc. / è conforme, in specifiche costruzioni di campo, alle specifiche delle
ioni sportive internazionali come hockey, calcio, MUGA e calcio (requisiti FIFA) ecc. / est conforme, dans certains domaines spécifiques de la construction, aux spécifications d'associations sportives internationales de hockey, football américain, MUGA et football (exigences de la FIFA), etc.

CHARACTERISTICS/CARACTERÍSTICAS/CARATTERISTICHE/CARACTÉRISTIQUES			
ıl /Fisicas / Fisiche / Physiques			
ess at kPa load/Espesor	16	mm	EN 1969:2000
re a carico kPa/Épaisseur à la charge kPa			
er unit area/Peso por unidad de area	1,48	Kg/m²	EN 430:1994
per unità di superficie/Masse par unité de surface			
Strength of Shockpad/Resistencia a la tracción **nza alla trazione dello shock pad/Résistance à la traction du Shockpad**	0.173	Mpa	EN 12230:2003

e definition of channels / C Es la definición de canales / C È la definizione di canali / C est la définition des canaux

definition of Special measures (mm 2250 x 900) / S Es la definición de medidas especiales (mm 2250 x 900)

efinizione di misure speciali (mm 2250 x 900) / S la définition des mesures spéciales (mm 2250 x 900)

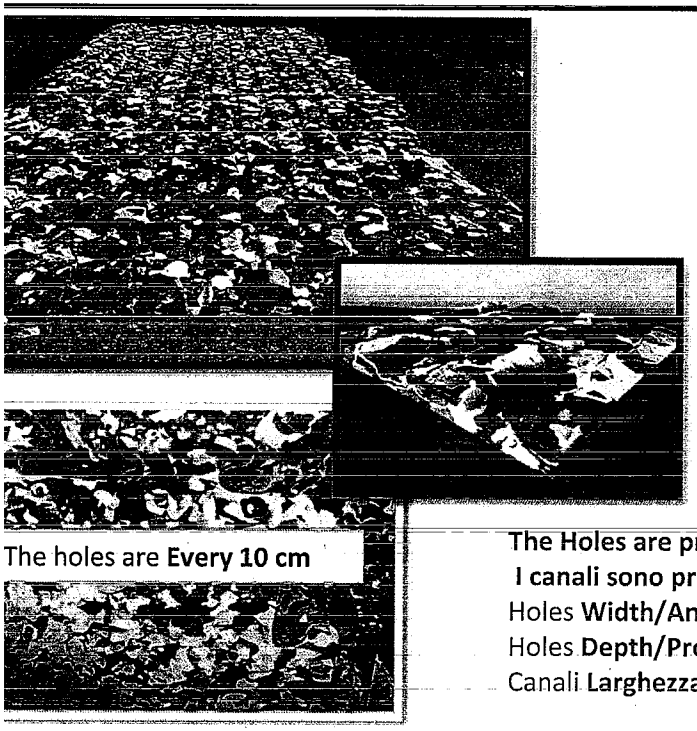

The holes are **Every 10 cm**

REFO SPORT 16 C S is supplied in plates/se suministra en planchas
è fornito in lastre/est fourni en plaque

Measures each plate/Medida de la plancha: **mt 0,90 x 2,25 (puzzle form)**
Misura lastra/Mesures de chaque plaque: **mt 0,90 x 2,25 (puzzle form)**
Sqm each plate/Área dela plancha: **2,025 sqm**
Mq di ogni lastra/Mètre carré de chaque plaque: **2.025 mq**



The Holes are present on each plate/Los canales están presentes en cada plato
I canali sono presenti in ogni lastra/Les trous sont présents sur chaque plaque
Holes **Width/Ancho: 20 mm**
Holes **Depth/Profundidad: 10 mm**
Canali **Larghezza/Largeur** des trous**: 20 mm**

TEST FOLLOWING FIFA HANDBOOK 2015

nance/Propiedades/Prestazioni/Performance*

ation/Deformación e/Déformation		9.00		mm	AAA FIFA Handbook of Test Methods 05a
bsorption/Absorción de impacto mento degli impatti/Absorption des chocs ı channels/Entre canales/Tra i canali/Entre les canaux		55		%	AAA FIFA Handbook of Test Methods 04a
Restitution/Restitución energía :ione di energia/Restitution d'énergie		42		%	AAA FIFA Handbook of Test Methods 13
ıce to break/Resistencia a la rotura i rottura/Résistance à la rupture		140N		± 1N	
ıce to compression/Resistencia a la compresión ıza alla compressione/Résistance à la compression	**± 1N**	Without permanent deformation/ Sin deformación permanente Nessuna deformazione permanente/Sans déformation permanente			
ional stability/Estabilidad dimensional à dimensionale/Stabilité dimensionnelle		0.25 & 0.04		%	

ge/Drenaje/Drenaggio/Drainage

ion Rate (vertical)/Tasa de infiltración (vertical) i infiltrazione (verticale)/Taux d'infiltration (vertical)		> 3000 mm		mm/h	EN 12616:2013
ıtal drainage/Drenaje horizontal gio orizzontale/Drainage horizontal	Slope (%) Flow l/s*m	0.5 0.457	1.0 0.466	1.5 0.495	EN ISO 12958:2010

DURABILITY/DURABILIDAD/DURABILITA'/DURABILITÉ

RT 16 C S consists of thermal bonded (closed-celled) cross-linked Polyethene foam (from non-contaminated industrial waste)
dicted durability (according ISO/TR 13434) for a minimum of 100 yars but the normal warranty is tied to the use of the turf.
microbiological resistance (according EN 12225) - resistance to: weathering (according EN 12224) - oxidation (according EN 13438) - acids & bases (according EN

RT 16 C S consiste en espuma de Polietileno reticulada, unida térmicamente (célula cerrada) y obtenida de restos industriales no
ados con una durabilidad preestablecida (según ISO/TR 13434) de 100 años mínimo aunque la garantía está sujeta al uso del césped.
la resistencia microbiológica (según EN12225) -resistencia al desgaste (según EN12224)-oxidación (según EN13438) -ácidos&bases (seg. EN14030)
RT 16 C S consite in un legame termico (cellule chiuse) di polietile espanso reticolato (da uno scarto industriale non contaminato)
urata prevista (secondo ISO/TR 13434) per un minimo di 100 anni,la normale garanzia è legata all'utilizzo del manto erboso.
una resistenza microbiologica(secondo EN 12225) - resistenza alle perturbazioni(secondo EN 12224) - all'ossidazione (secondo EN 14030)
RT 16 C S est constitué de mousse de polyéthylène réticulée thermiquement (à cellules fermées) (provenant de déchets industriels non contaminés) avec une
prévue (selon ISO / TR 13434) pour un minimum de 100 ans, mais la garantie normale est liée à l'utilisation de le gazon.
résistance microbiologique (selon EN 12225) - résistance aux intempéries (selon EN 12224) - oxydation (selon EN 13438)

rmance characteristics of REFO SPORT 16 C S are hardly effected by simulated (mechanical) wear.
stability after 65,000 Lisport cycli (when combined with a non-infill artificial grass)

ıciones del REFO SPORT 16 C S apenas se ven afectadas por el desgaste mecánico simulado.
la estabilidad después de 65.000 ciclos Lisport (combinado con hierba artificial sin relleno)

:ioni cartteristiche di REFO SPORT 16 C S sono difficilmente simulabili (meccanicamente).
lla stabilità dopo 65.000 cicli Polisport (quando combinato con un erba sintetica vuota).

éristiques de performance de REFO SPORT 16 C S sont à peine affectés par l'usure simulée (mécanique).
asée après 65.000 cycles Lisport (en combination avec un gazon synthétique non chargé)

ensional) characteristics of **REFO SPORT 16 C S** are hardly effected by simulated aging.
stability after hot water and hot air (according EN 13744 a nd EN 13817)

terísticas dimensionales de **REFO SPORT 16 C S** apenas se ven afectadas por el envejecimiento simulado
n la estabilidad después de agua caliente y aire caliente según EN13744 y EN 13817)

eristiche (dimensionali) di **REFO SPORT 16 C S** sono difficilmente colpite da invecchiamento simulato.
illa stabilità dopo acqua calda e aria calda (secondo EN 13744 a nd EN 13817).

éristiques (dimensionnelles) de **REFO SPORT 16 C S** ne sont guère affectées par le vieillissement simulé

fication is based on (independent) Laboratory measurements and the overall knowledge of APETEK SRL (at the time of revision).
l information (e.g. additional characteristics, specif laboratory reports or statistical analysis) is available upon request.
RL reserves itself the right to change this specification and/or product (without notice)

ecificaciones se basan en los resultados obtenidos en un Laboratorio independiente y en el conocimiento general de APETEK SRL (en el momento de la revisión).
ón adicional (ej. características adicionales, reports específicos del Laboratorio o análisis estadísticos) están disponibles bajo petición expresa.
RL se reserva el derecho de modificar esta especificación sin notificación previa.

ecificazionisono sono fatte in un (indipendente) laboratorio misurazioni, e dalla complessiva conoscenza di APETEK SRL (al momento della revisone).
azioni addizinali (e.g. caratteristiche addizionali, report specifici del laboratorio o analisi statistiche) sono disponibili su richiesta.
riserva il diritto di cambiare queste specificazioni e/o il prodotto (senza avviso).

cification est basée sur des mesures de laboratoire (indépendantes) et sur la connaissance globale d'APETEK SRL (au moment de la révision).
mations supplémentaires (par exemple, des caractéristiques supplémentaires, des rapports de laboratoire ou des analyses statistiques) sont disponibles sur demande.
RL se réserve le droit de modifier cette spécification et / ou le produit (sans préavis)

GUARANTEE/GARANTIA/GARANZIE/GUARANTIE

All APETEK Products are guaranteed for 25 years in normal condition (except specific products out of our official range)

Los productos de APETEK tienen 25 años de garantía en las condiciones normales de uso (excepto productos específicos fuera de la gama oficial)

Tutti i prodotti APETEK sono assicurati per 25 anni in normali condizioni (eccetto quei prodotti specifici esterni alla nostra gamma ufficiale).

Tous les produits APETEK sont garantis 25 ans en condition normale (sauf produits spécifiques hors de notre gamme officielle)

CELTA S.A.S
NIT. 800.164.590-1

TUBOS Y ACCESORIOS
CELTA
SU ALIADO

CERTIFICADOS
ISO 9001:2008 No. 035-1
ISO 14001:2004 No. AA053-1
OHSAS 18001:2007 No. OS010-1

CERTIFICADO DE CALIDAD

Señores: NURUEÑA SAS **Fecha: 08.02.2024**
Producto: TB DUCTO TDP 3X6M CSA **Nro: 540-24**
Lote de Fabricación: 3230505065
Norma de referencia: NTC 3363 DUCTO CORRUGADO TELEFONICOS Y ELECTRICOS TDP CON INTERIOR LISO

CARACTERISTICAS DE CALIDAD	UM	REQUISITO MINIMO	REQUISITO MAXIMO	RESULTADOS
DIMENSIONES				
Diámetro Exterior Promedio	mm	88.62	89.18	89.01
Ovalamiento Diametro	mm		1.60	0.15
Espesor de Pared -P	mm	0.40	2.00	0.96
Diámetro Interior Promedio	mm	75.00	80.00	78.40
Espesor de Valle	mm	0.60		1.31
Espesor de Pared Interno -P	mm	0.40	2.00	1.02
ENSAYOS FÍSICO - MECÁNICOS				
Aplastamiento transversal		No debe presentar grietas ni roturas		CUMPLE
Calidad de Extrusión		No debe presentar descascaramiento		CUMPLE
Calidad de adherencia		No debe evidenciar separación de paredes		CUMPLE
ENSAYOS FRECUENCIA TIPO (ANUAL)				
Inflamabilidad		Los tubos deben ser autoextinguibles		CUMPLE
INSPECCIÓN VISUAL				
Homogeneidad de Superficie		HOMOGENEA		CUMPLE
Grietas, Poros, Inclusiones		AUSENCIA		CUMPLE
Color		HOMOGENEO		CUMPLE

R. Noriega.

Ricardo Noriega
Coordinador de Laboratorio

CELTA S.A.S
NIT. 800.164.590-1

TUBOS Y ACCESORIOS
CELTA
SU ALIADO

CERTIFICADOS
ISO 9001:2008 No. 035-1
ISO 14001:2004 No. AA053-1
OHSAS 18001:2007 No. OS010-1

CERTIFICADO DE CALIDAD

Señores: NURUEÑA SAS
Producto: TB ALC DURAFORT 160MM(6) 6M CSA
Lote de Fabricación: 3231130075
Norma de referencia: NTC 3722-3 TUBOS Y ACCESORIOS DE PARED ESTRUCTURAL PARA SISTEMAS DE DRENAJE SUBTERRÁNEO Y ALCANTARILLADO. ESPECIFICACIONES PARA PVC RÍGIDO

Fecha: 08.02.2024
Nro: 541-24

CARACTERISTICAS DE CALIDAD	UM	REQUISITO MINIMO	REQUISITO MAXIMO	RESULTADOS
DIMENSIONES				
Diámetro Exterior Promedio	mm	159.10	160.50	159.84
Diámetro Interior Promedio	mm	135.00	147.05	146.52
Espesor de Pared Interno -P	mm	1.00	6.00	1.73
ENSAYOS FÍSICO - MECÁNICOS				
Flexibilidad del anillo		Min:30% (carga creciente) y sin grietas.		CUMPLE
HERMETICIDAD DE LA UNIÓN				
Presión Hidrost. Angular (0.3 bar)		Soporta(0.3bar) sin presentar filtración		CUMPLE
Presión Hidrost. Int.Sin Deflex(0.05bar)		Soporta(0.05bar)sin presentar filtración		CUMPLE
Presión Hidrost. Int.Sin Deflex (0.5bar)		Soporta(0.5bar)sin presentar filtración		CUMPLE
Presión (-) con deflexión (0.3 bar)		Soporta(0.3bar) sin presentar filtración		CUMPLE
Presión Hidrost. Int.Con Defl (0.05 bar)		Soporta(0.05bar)sin presentar filtración		CUMPLE
Presión Hidrost. Int.Con Deflex (0.5bar)		Soporta(0.5bar)sin presentar filtración		CUMPLE
INSPECCIÓN VISUAL				
Homogeneidad de Superficie		HOMOGENEA		CUMPLE
Grietas, Poros, Inclusiones		AUSENCIA		CUMPLE
Color		HOMOGENEO		CUMPLE

R. Noriega.
Ricardo Noriega
Coordinador de Laboratorio

CELTA S.A.S
NIT. 800.164.590-1

TUBOS Y ACCESORIOS
CELTA
SU ALIADO

CERTIFICADOS
ISO 9001:2008 No. 035-1
ISO 14001:2004 No. AA053-1
OHSAS 18001:2007 No. OS010-1

CERTIFICADO DE CALIDAD

Señores: NURUEÑA SAS **Fecha: 08.02.2024**
Producto: TB ALC DURAFORT 315MM(12) 6M CSA **Nro: 542-24**
Lote de Fabricación: 3240103035
Norma de referencia: NTC 3722-3 TUBOS Y ACCESORIOS DE PARED ESTRUCTURAL PARA SISTEMAS DE DRENAJE SUBTERRÁNEO Y ALCANTARILLADO. ESPECIFICACIONES PARA PVC RÍGIDO

CARACTERISTICAS DE CALIDAD	UM	REQUISITO MINIMO	REQUISITO MAXIMO	RESULTADOS
DIMENSIONES				
Diámetro Exterior Promedio	mm	313.20	316.00	315.07
Diámetro Interior Promedio	mm	270.00	291.60	285.05
Espesor de Pared Interno -P	mm	1.60	7.00	2.52
ENSAYOS FÍSICO - MECÁNICOS				
Flexibilidad del anillo		Min:30% (carga creciente) y sin grietas.		CUMPLE
HERMETICIDAD DE LA UNIÓN				
Presión Hidrost. Angular (0.3 bar)		Soporta(0.3bar) sin presentar filtración		CUMPLE
Presión Hidrost. Int.Sin Deflex(0.05bar)		Soporta(0.05bar)sin presentar filtración		CUMPLE
Presión Hidrost. Int.Sin Deflex (0.5bar)		Soporta(0.5bar)sin presentar filtración		CUMPLE
Presión (-) con deflexión (0.3 bar)		Soporta(0.3bar) sin presentar filtración		CUMPLE
Presión Hidrost. Int.Con Defl (0.05 bar)		Soporta(0.05bar)sin presentar filtración		CUMPLE
Presión Hidrost. Int.Con Deflex (0.5bar)		Soporta(0.5bar)sin presentar filtración		CUMPLE
INSPECCIÓN VISUAL				
Homogeneidad de Superficie		HOMOGENEA		CUMPLE
Grietas, Poros, Inclusiones		AUSENCIA		CUMPLE
Color		HOMOGENEO		CUMPLE

R. Noriega.
Ricardo Noriega
Coordinador de Laboratorio

MATRIX
Los Expertos en Geosintéticos

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD N°. Cert 042018

FECHA DE EXPEDICIÓN	CODIGO / CLIENTE	
12/12/2023	901447769	ARK INGENIERIA SAS

GEOMATRIX S.A.S
Calle 15 N 72 72
COLOMBIA
Tel:4249999
Email:servicioalcliente@geomatrix.com.co

Especificación para el producto

Referencia Nombre	Referencia Número	No. Orden	Uso	Factura No.
FIBERTEX F-20G 4m	PV55003	PC-14983	GT150	NAC013141

Nombre Prueba	U. Medida	Norma	Datos
RESISTENCIA ULTIMA A TENSIÓN - METODO TIRA ANCHA	kN/m	ASTM D4595	7,0
RESISTENCIA A LA TENSIÒN METODO GRAB.	N	ASTM D4632	450
ELONGACIÒN A LA ROTURA.	%		50
RESISTENCIA AL PUNZONAMIENTO	N	ASTM D4833	260
RESISTENCIA AL RASGADO TRAPEZOIDAL	N	ASTM D4533	215
RESISTENCIA AL PUNZONAMIENTO ESTATICO CBR	N	ASTM D6241	1200
RESISTENCIA A UV (% Retenciòn a 500 Horas)	%	ASTM D4355	70
TAMAÑO DE ABERTURA APARENTE	mm	ASTM D4751	0,18
PERMEABILIDAD	cm/s		0,17
PERMITIVIDAD	s^{-1}	ASTM D4491	2,40
TASA DE FLUJO	$l/min/m^2$		7700

PIEZAS...# 000700178 - 000700179.

Observaciones:

GEOMATRIX S.A.S.
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
GEOMATRIX S.A.S.

QGA-QGA-F-001 / V03
30/Dic/2022

Aprobado por: Omar Torres, DIRECTOR TÉCNICO

Revisado por: Elver Andres Ortega, JEFE DE CALIDAD

Los presentes resultados han sido obtenidos a partir de análisis estadísticos de mediciones realizadas en nuestro propio laboratorio de control de calidad de materiales, acreditado por el "Geosynthetic Accreditation Institute – Laboratory Program – GAI-LAP", garantizando así la competencia e independencia para llevar a cabo las pruebas emitidas en el presente certificado.

La operación de GEOMATRIX se basa en un Sistema de Gestión de Calidad para el diseño, desarrollo, producción, comercialización y soporte técnico de materiales geosintéticos, certificado bajo la norma ISO 9001: 2015.

QUALITY ASSURANCE GSI GAI - LAP ISO 17025
Accreditation # GAI-LAP-75-13

ISO 9001:2015
Alcance de Certificación
DISEÑO, DESARROLLO, PRODUCCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE MATERIALES GEOSINTÉTICOS

MATRIX
Los Expertos en Geosintéticos

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD N°. Cert 042019

FECHA DE EXPEDICIÓN	CODIGO / CLIENTE
12/12/2023	901447769 ARK INGENIERIA SAS

GEOMATRIX S.A.S
Calle 15 N 72 72
COLOMBIA
Tel:4249999
Email:servicioalcliente@geomatrix.com.co

Especificación para el producto

Referencia Nombre	Referencia Número	No. Orden	Uso	Factura No.
PROPYWEAVE T2100	PV52002	PC14064	GT150	NAC013141

Nombre Prueba	U. Medida	Norma	Datos
RESISTENCIA ULTIMA A TENSIÓN - METODO TIRA ANCHA	kN/m	ASTM D4595	35,7
ELONGACIÓN A TENSIÓN ÚLTIMA	%		18,3
CARGA A LA ROTURA - METODO GRAB	N	ASTM D4632	1251
ELONGACIÓN APARTE A LA ROTURA	%		18,3
RESISTENCIA AL RASGADO TRAPEZOIDAL	N	ASTM D4533	664
RESISTENCIA AL PUNZONAMIENTO ESTATICO CBR	N	ASTM D6241	4568
RESISTENCIA A UV (% Retención a 500 Horas)	%	ASTM D4355	>70
TAMAÑO DE ABERTURA APARENTE	mm	ASTM D4751	0,291
PERMITIVIDAD	s^{-1}	ASTM D4491	0,141
TASA DE FLUJO	$l/min/m^2$		413

PIEZAS...# 000692594 - 000692595 - 000692596 - 000692598 - 000692599 - 000692600 - 000692772 - 000692773 - 000692774 - 000692775 - 000692776 - 000692777 - 000692778 - 000692779 - 000692780 - 000692781 - 000692782 - 000692783 - 000692784 - 000692785.

Observaciones:

GEOMATRIX S.A.S.
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
GEOMATRIX S.A.S.

QGA-QGA-F-001 / V03
30/Dic/2022

Aprobado por: Omar Torres, DIRECTOR TÉCNICO

Revisado por: Elver Andres Ortega, JEFE DE CALIDAD

Los presentes resultados han sido obtenidos a partir de análisis estadísticos de mediciones realizadas en nuestro propio laboratorio de control de calidad de materiales, acreditado por el "Geosynthetic Accreditation Institute – Laboratory Program – GAI-LAP", garantizando así la competencia e independencia para llevar a cabo las pruebas emitidas en el presente certificado.

La operación de GEOMATRIX se basa en un Sistema de Gestión de Calidad para el diseño, desarrollo, producción, comercialización y soporte técnico de materiales geosintéticos, certificado bajo la norma ISO 9001:2015.

QUALITY ASSURANCE GSI GAI-LAP
Accreditation # GAI-LAP-75-13

ISO 9001:2015
Alcance de Certificación
DISEÑO, DESARROLLO, PRODUCCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE MATERIALES GEOSINTÉTICOS

icontec

Sello de Calidad

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

TUBOS DUCTOS ELÉCTRICOS Y TELEFÓNICOS TDP

Fabricado por **CELTA S.A.S.:** Carrera 24 No. 30 - 500, Soledad, Atlántico, Colombia; **Planta Maquila:** Autopista sur No. 71 - 75, Bogotá D.C., Colombia

Manufactured by **CELTA S.A.S.:** Carrera 24 No. 30 - 500, Soledad, Atlántico, Colombia; **Planta Maquila:** Autopista sur No. 71 - 75, Bogotá D.C., Colombia

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 3363 (2019)

Plásticos. Tubos y curvas de poli(cloruro de vinilo) (PVC) rígido corrugados con interior liso para alojar y proteger conductores subterráneos eléctricos y telefónicos

Plastics. Rigid and corrugated poly(vynil chloride) (PVC) pipes and elbows, having smooth inner wall, for enclose and protect underground electrical and telephone wires.

SECTOR ICS 23.040.20

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the " R-PS-019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSC-0002-9
Certificate

Fecha de Aprobación: Approval Date:	1998-07-22	**Fecha Última Modificación:** Last Modification Date:	
Fecha de Renovación: Renewal Date:	2023-09-01	**Fecha de Vencimiento:** Expiration Date:	2029-08-31

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

ONAC

ANAB

Sello de Calidad

icontec internacional

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

TUBERÍA DURAFORT ALCANTARILLADO

Comercializado por **CELTA S.A.S.**, en la **Carrera 24 No. 30 - 500, Soledad, Atlántico, Colombia**
Trader by **CELTA S.A.S.**, in the **Carrera 24 No. 30 - 500, Soledad, Atlántico, Colombia**

Fabricado por **Planta Maquila**, en la **Autopista sur No. 71 - 75, Bogotá D.C., Colombia**
Manufactured by **Planta Maquila**, in the **Autopista sur No. 71 - 75, Bogotá D.C., Colombia**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 5055 (2016)

Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) (PVC) perfilados para uso en alcantarillado por gravedad, controlados por el diámetro interno

Poly(vinyl chloride) (PVC) profile gravity sewer pipe and fittings based on controlled inside diameter

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity product is subject to the company´s and product´s permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certified

Certificado CSC - CER395916
Certificate

Fecha de Aprobación: Approval Date:	2015-06-17	**Fecha Última Modificación:** Last Modification Date:	
Fecha de Renovación: Renewal Date:	2018-04-20	**Fecha de Vencimiento:** Expiration Date:	2024-04-19

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:



Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

TUBOS DE POLI (CLORURO DE VINILO) RÍGIDO (PVC RÍGIDO) PARA ALOJAR Y PROTEGER CONDUCTORES ELÉCTRICOS Y CABLEADO TELEFÓNICO

Comercializado por **TUBOSA S.A.S.**, en la **Calle 14B No. 20E - 80, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia**

Trader by **TUBOSA S.A.S.**, in the **Calle 14B No. 20E - 80, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia**

Fabricado por **TUBOSA S.A.S.:** Calle 14B No. 20E - 80, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia; **TUBRICA C.A.:** Zona industrial 2, Parcelación 31 con calle A-2, Barquisimeto, Edo, Lara, Venezuela

Manufactured by **TUBOSA S.A.S.:** Calle 14B No. 20E - 80, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia; **TUBRICA C.A.:** Zona industrial 2, Parcelación 31 con calle A-2, Barquisimeto, Edo, Lara, Venezuela

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 979 (2006)

Plásticos. Tubos y curvas de poli (cloruro de vinilo) rigido (PVC rígido) para alojar y proteger conductores eléctricos y cableado telefónico

Plastics. Unplasticized poly (vynil chloride) (PVC-U) pipes and bends for conduits housing and protecting

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity product is subject to the company´s and product´s permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certified

Certificado CSC - CER173648
Certificate

Fecha de Aprobación: 2012-02-22
Approval Date:

Fecha Última Modificación:
Last Modification Date:

Fecha de Renovación: 2018-03-02
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2024-02-21
Expiration Date:

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo
CEO

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:


FORMATO FICHA TÉCNICA

Fecha de Emisión: (4/0/2024)

Nombre de la Empresa
CONSORCIO DEPORTIVO 2023
NIT 901.771.549

Estimados Señores:

Comunicamos a ustedes mediante esta ficha información técnica y resultados correspondientes a elementos prefabricados Suministrados con referencia **CARCAMO +REJILLA AC-45 45*40*100**, cumpliendo con la normatividad de calidad y resistencia correspondiente al NTC, Confirmados con los ensayos realizados por la empresa **G&S LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS S.A.S** así;

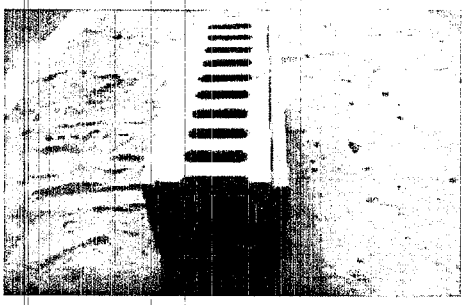ELEMENTO	CÁRCAMO 45
IMAGEN	
Referencia	C-45
Dimensiones (cm)	35*40*100
Peso (Kg)	152
Fabricación	CITY PLAY S.A.
Clase concreto	3000
Laboratorio	**G&S LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS S.A.S**
SUMINISTRO A LA FECHA	163

Cordialmente,

JUAN CARLOS GÓMEZ
CC: 74.081.153
CEL 3102570959 REPRESENTANTE LEGAL

CITY PLAY PARQUES INFANTILES S.A.S

G&S LABORATORIO	LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS S.A.S.	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA INVE. -410	VERSION :01 8 de julio de 2013

OBRA: PARQUES GENERACIONES
SECTOR: CANCHA SINTETICA
CONTRATIST: CONSORCIO DEPORTIVO

FECHA DE INFORME: 13 de febrero de 2024
FECHA DE INFORME FINAL: 13 de febrero de 2024

INTERVENTOR:

Cilindro No.	Fecha de toma	Fecha de Rotura	Edad Días	Resistencia (MPa)	diametro (mm)	longitud (mm)	area (mm)	carga (kN)	Resistencia (kg/cm2)	Resistencia (MPa)	Resistencia (P.S.I.)	tipo fall	% avance	
1	16-ene-24	23-ene-24	7	21,0	104	202	8495	140	168	16,5	2401	3	78%	CARCAMOS REJILLAS SUMIDERO
2	16-ene-24	23-ene-24	7	21,0	104	203	8495	138	166	16,2	2366	3	77%	CARCAMOS REJILLAS SUMIDERO
3	16-ene-24	13-feb-24	28	21,0	103	201	8332	198	242	23,8	3462	3	113%	CARCAMOS REJILLAS SUMIDERO
4	16-ene-24	13-feb-24	28	21,0	101	201	8012	181	231	22,6	3295	3	108%	CARCAMOS REJILLAS SUMIDERO
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														
34														
35														
36														
37														
38														
39														
40														
41														
42														
43														
44														
45														
46														
47														
48														
49														
50														
51														
52														
53														
54														
55														
56														

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN SOLAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO.

ENSAYO : R.M.L.	DIGITO	REVISO:	APROBO: E.G.P.
FECHA: 13-Feb-24	FECHA: 13-Feb-24	FECHA: 13-Feb-24	FECHA: 13-Feb-24


G&S LABORATORIO	LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS S.A.S.	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA INVE. -410	VERSION :01 8 de julio de 2013

OBRA: PARQUES GENERACIONES
SECTOR: CANCHA SINTETICA
CONTRATANTE: CONSORCIO DEPORTIVO
INTERVENTOR:

FECHA DE INFORME: 13 de febrero de 2024

Cilindro No.	Fecha de toma	Fecha de Rotura	Edad Dias	Resistencia (MPa)	diametro (mm)	longuitud (mm)	area (mm)	carga (kN)	Resistencia (kg/cm2)	Resistencia (MPa)	Resistencia (P.S.I.)	tipo falla	% avance	Localizacion de las Muestras
1	16-ene-24	23-ene-24	7	21,0	104	202	8495	140	168	16,5	2401	3	78%	CARCAMOS REJILLAS SUMIDERO
2	16-ene-24	23-ene-24	7	21,0	104	203	8495	138	166	16,2	2366	3	77%	CARCAMOS REJILLAS SUMIDERO
3	16-ene-24	13-feb-24	28	21,0	103	201	8332	198	242	23,8	3462	3	113%	CARCAMOS REJILLAS SUMIDERO
4	16-ene-24	13-feb-24	28	21,0	101	201	8012	181	231	22,6	3295	3	108%	CARCAMOS REJILLAS SUMIDERO
5														
6														
7														

ESQUEMA DE TIPOS DE FALLA



OBSERVACIONES:

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN SOLAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO.

ENSAYO R.M.L.	DIGITO:M.N.R.T.	APROBO: E.G.P.	ARCHIVO
FECHA: 13-Feb-24	FECHA: 13-Feb-24	FECHA 13-Feb-24	FECHA 13-Feb-24

CALLE 23A No. 96G-23 TELEFONO 4134906 CEL 311-2602862 3192588979 gysslaboratorios@gmail.com BOGOTA D.C.

CITY PLAY S.A.S

FORMATO FICHA TÉCNICA

Fecha de Emisión: (18/05/2024

Nombre de la Empresa

CONSORCIO DEPORTIVO 2023
NIT 901.771.549

Estimados Señores:

Comunicamos a ustedes mediante esta ficha información técnica y resultados correspondientes a elementos fabricados Suministrados con referencia **CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA H:2.50**, cumpliendo con la normatividad de calidad correspondiente, Confirmados con los certificados realizados desde las marcas del material y ensayos realizados por la empresa así;

UNID	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
M2	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA H:2.50	885
UN	TUBERÍA DE 2 PULG A/N CAL 2.5 MM	142

Se suministró al CONSORCIO DEPORTIVO 2023 con el contrato de obra No. 0667-2023 los siguientes elementos:

ELEMENTO SUMINISTRADO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL
POSTES METÁLICOS	47 UN	47 UN	48 UN	142
MALLA ESLABONADA	47 UN	47 UN	48 UN	142

Cordialmente,

JUAN CARLOS GOMEZ
CC:74.081.153
CEL 3102570959 REPRESENTANTE LEGAL

CITY PLAY

GERDAU
DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S/A
Carretera Central del Norte Km 27. Tuta. Colombia.
C.P - 150408 Tel/Fax: 7426350

NIT: 10002131377440

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PEDIDO DEL CLIENTE	ESPECIFICACIÓN	PESO (Kg)
PERFILES ACEROS JM SAS	9007496145/40	OC05032024	10877429/000040	NTC 1985 - 1020	2.000

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	COMPOSICION QUIMICA (%) Ensayo según método ASTM E415											
				C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	
106000508	ANG NTC 1985 1 1/2"x1/8" 6m	1726105001	GR 50	0,21	0,77	0,009	0,015	0,19	0,22	0,07	0,11	0,02	0,003	0,003	
	Rangos de referencia según norma														

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	PROPIEDADES MECÁNICAS Ensayo según método NTC3353						CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS				
				R. Fluencia	R. Tracción	Alargamiento				Lado	Espesor	Dif. A		
106000508	ANG NTC 1955 1 1/2"x1/8" 6m	1726105001	NA	365	518	22,0				37,90 mm	3,11 mm	0,13		
	Rangos de referencia según norma			min 345,0 MPa	min 450,0 MPa	min 18,00%				36,91 - 38,29 mm	2,92 - 3,43 mm			

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

TUTA, 11.03.2024

PAOLA KATHERIN MATEUS

Powered by CamScanner

CERTIFICADO

N° REGISTRO
F-950490

N.I.T: 900474622
Cliente: PERFILES & ACEROS JM SAS

ESPECIFICACIONES DE BOBINA MADRE

# Lote	% Mnx100	% Px1000	% Sx1000	% Cx100
CO-0009936431	94.00	23.00	2.00	9.00

TIPO B (SS GR45) - TUB EST RED GR B - OTROS

UND TUBO EST RED 2,50 X 2" (60) X 6000 MM NTC 4526 GR B

# Lote	Fecha Fabricación	Aplastamiento	Diámetro Externo (mm)	Longitud (mm)
CO-B172894	24/1/2024	Cumple	60.02	6006.00

Elongación (%)	Punto de fluencia (MPa)	Resistencia ultima (MPa)
21.28	416.11	467.64

# Lote	Fecha Fabricación	Aplastamiento	Diámetro Externo (mm)	Longitud (mm)
CO-B172896	24/1/2024	Cumple	60.02	6006.00

Elongación (%)	Punto de fluencia (MPa)	Resistencia ultima (MPa)
21.28	416.11	467.64

# Lote	Fecha Fabricación	Aplastamiento	Diámetro Externo (mm)	Longitud (mm)
CO-B172897	24/1/2024	Cumple	60.02	6006.00

Elongación (%)	Punto de fluencia (MPa)	Resistencia ultima (MPa)
21.28	416.11	467.64

OBSERVACIONES

*Los datos del presente certificado de calidad, han sido revisados por el área de calidad.
**Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
***No se debe reproducir información parcial del certificado de calidad, excepto, si se hace en su totalidad, con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

CONCRETAN

Prefabricados en Concreto

Mobiliario Andenes – Tubos en Concreto – Casas Prefabricadas
Pavimentación en Concreto

Fusagasugá, Marzo 04 de 2023

SEÑORES
CONSORCIO DEPORTIVO 2.023
La Ciudad

Con gusto remitimos a Usted la correspondiente información técnica y resultado correspondiente a los elementos prefabricados elaborados para su compañía de referencia **SARDINEL A10** y **BORDILLO A80**, cumpliendo la normatividad de calidad y resistencia correspondiente NTC, de acuerdo a los ensayos realizados con nuestra compañía de aseguramiento de calidad Geocretos, de la siguiente manera:

ELEMENTO	BORDILLO A80
Imagen	
Referencia	A80
Dimensiones (cm)	35 x 80 x 20
Peso (Kg)	99
Fabricación	Sistema Vibrocompactado
Refuerzo	N.A
Clase Concreto	Tipo C; Norma ACI 1001 – F'c = 3.500psi
Acabado	Superficie Superior Lisa
Perfil	Ortogonal
Laboratorio	GEOCRETO
Conformidad	Inv 413 – 07 Cilindro Testigo
SUMINISTRO A LA FECHA	600

CONCRETAN

CONCRETAN

Prefabricados en Concreto

Mobiliario Andenes – Tubos en Concreto – Casas Prefabricadas

Pavimentación en Concreto

GEOCRETOS
LABORATORIO DE INGENIERÍA CIVIL

INV 413-07


CONTRATISTA: CONCRETAN PREFABRICADOS EN CONCRETO — FECHA INF.: JULIO 6 DE 2020
PROYECTO: PLANTA AV PALMAS No 13-60 — LAB.: J.P.C. — REVISÓ: M.A.S.
LOCALIZACION: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA CUNDINAMARCA

ESCLERÓMETRO

TOMA DE MUESTRA No 1

DATOS PICO			
31	31	34	33
34	33	33	33
34	34	33	31

FORMA DE TOMA	
Angulo de toma	(90°)
Inclinado	
Paralelo	
Perpendicular	X



ESQUEMA LOCALIZACIÓN

TESTIGO C1 — ELEMENTO

PLANTA — LOCALIZACIÓN ESPÉCIMEN

PRIMERAS L			
31	31	31	
%	31	X	(90°)

SEGUNDAS L			
34	34	34	34
%	34	X	(90°)

TERCERAS L			
33	33	33	33
33			
%	33	X	(90°)

1L	160	
2L	200	
3L	190	
Σ	550	3655
Kg/cm²	185,83	PSI

PROMEDIO IMPACTOS 32,8

OBSERVACIONES

LAB. ALBERTO CEBALLOS — EJECUTO
ING RICARDO LARROTA — REVISO
GEOCRETOS LABORATORIO — APROBO

Estamos seguros de seguir satisfaciendo sus requerimientos, garantizando de la nuestra: **calidad y cumplimiento**.

Atentamente,

CONCRETAN

Ing. Edwin L. Contreras O.
GERENTE

ANEXO B. CORRESPONDENCIA

CONSORCIO
DEPORTIVO 2023

CONSORCIO DEPORTIVO 2023
NIT: 901.771.549

Fusagasugá, 12 de marzo de 2024 **CP-028-0667-2023**

Señores
R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
Atn. R.L. MARGARITA GOMEZ GOMEZ
Fusagasugá – Cundinamarca.

REFERENCIA: EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 DE 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

ASUNTO: Documentos acta de pago parcial No 2

Cordial saludo

Por medio de la presente me permito remitir acta de pago parcial No. 2 correspondiente al periodo de 26 de diciembre del 2023 al 25 de febrero de 2024, de acuerdo a las actividades ejecutadas en el contrato en mención.

Con el fin de dar cumplimiento al proceso se revisión y aprobación, me permito adjuntar la siguiente documentación.

- Factura en borrador (se generar la factura final luego de la verificación y aprobación)
- Autorización de facturación
- RUT actualizado a la fecha
- CDP
- RP
- Certificación Bancaria
- Sabana de Cobro y Memorias de cantidades
- Certificación de parafiscales y FIC
- Copia de Actas generadas en el periodo
- Informe Técnico de Ejecución de Obra

Agradezco su colaboración para continuar con el trámite respectivo y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

LUIS FARFAN VELASQUEZ

CONSORCIO DEPORTIVO 2023
NIT: 901.771.549

Fusagasugá, 23 de abril de 2024 **CP-030-0667-2023**

Señores:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Atn. Ing. Raul Aranguren Martínez
Secretario de Despacho
Supervisor de contrato
Fusagasugá - Cundinamarca

REFERENCIA: EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 DE 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

ASUNTO: Solicitud de aclaración sobre licencia de construcción de estructura en container

Cordial saludo

Teniendo en cuenta que actualmente se avanza la elaboración de un modificatorio de mayores y menores cantidades, necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, nos encontramos avanzando sobre la solicitud de cotización de Camerinos y gradería en container, sin embargo, se hace necesario solicitar aclaración sobre la necesidad de tener licencia de construcción para este tipo de estructuras, teniendo en cuenta el predio de intervención y el objeto del contrato en ejecución.

Agradezco su atención y pronta respuesta.

Cordialmente,

CONSORCIO DEPORTIVO 2023
R/L LUIS FARFAN VELASQUEZ
NIT: 901.771.549
consorciodeportivo667@gmail.com

ALCALDIA DE FUSAGASUGA

Al Contestar cite Radicado: **R-2024-11380** Id: **386486**

Folios: 1 Fecha: 2024-04-24 08:45:54 Anexos: 0
Copias:
Remitente: CONSORCIO DEPORTIVO 2023
Destinatario: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
AUTORIZO a la Alcaldia de Fusagasugá, para utilizar los medios electrónicos como mecanismo de comunicación de conformidad de los previstos en los articulos 53,56 y 57 numeral primero de la ley 1437 de 2011.
SI__NO__Firma_____

C.C. Archivo Interventoría

CONSORCIO
DEPORTIVO 2023

CONSORCIO DEPORTIVO 2023
NIT: 901.771.549

Fusagasugá, 23 de abril de 2024 **CP-030-0667-2023**

Señores:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Atn. Ing. Raul Aranguren Martínez
Secretario de Despacho
Supervisor de contrato
Fusagasugá - Cundinamarca

REFERENCIA: EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 DE 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

ASUNTO: Solicitud de aclaración sobre licencia de construcción de estructura en container

Cordial saludo

Teniendo en cuenta que actualmente se avanza la elaboración de un modificatorio de mayores y menores cantidades, necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, nos encontramos avanzando sobre la solicitud de cotización de Camerinos y gradería en container, sin embargo, se hace necesario solicitar aclaración sobre la necesidad de tener licencia de construcción para este tipo de estructuras, teniendo en cuenta el predio de intervención y el objeto del contrato en ejecución.

Agradezco su atención y pronta respuesta.

Cordialmente,



CONSORCIO DEPORTIVO 2023
R/L LUIS FARFAN VELASQUEZ
NIT: 901.771.549
consorciodeportivo667@gmail.com

CONSORCIO
DEPORTIVO 2023

CONSORCIO DEPORTIVO 2023
NIT: 901.771.549

Fusagasugá, 09 de mayo de 2024 **CP-031-0667-2023**

Señores
R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
Atn. R.L. MARGARITA GOMEZ GOMEZ
Fusagasugá – Cundinamarca.

REFERENCIA: Contrato de obra No. 2023-0667 cuyo objeto es "EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 DE 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".

ASUNTO: Solicitud de Estudio fotométrico y estructura base de la iluminación de cancha y pista atlética.

Cordial saludo

De acuerdo a las solicitudes realizadas en los comités de obra, donde se solicita incluir en el modificatorio el circuito de iluminación de la cancha de futbol y pista, me permito informar que, dentro de los diseños entregados por la entidad, no se encuentran aquellos refrentes al estudio fotométrico, memorias y descripciones de lámparas o proyectores a instalar en dicha iluminación.

Con el fin de dar el alcance solicitado al modificatorio en proyección, nos permitimos solicitar copia de estudio fotométrico que incluya memorias, descripción de lámparas o proyectores a suministrar, además de los estudios de la estructura base de soporte para los postes de 24 metros de altura correspondientes a la iluminación de la cancha de futbol y pista atlética.

Agradezco su atención y pronta respuesta.

Cordialmente,

CONSORCIO DEPORTIVO 2023
R/L LUIS FARFAN VELASQUEZ
NIT: 901.771.549
consorciodeportivo667@gmail.com

CONSORCIO DEPORTIVO 2023

CONSORCIO DEPORTIVO 2023
NIT: 901.771.549

Fusagasugá, 16 de mayo de 2024 **CP-032-0667-2023**

Señores
R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
Atn. R.L. MARGARITA GOMEZ GOMEZ
Fusagasugá – Cundinamarca.

REFERENCIA: Contrato de obra No. 2023-0667 cuyo objeto es "EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 DE 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".

ASUNTO: Informes de avance 05 y 06.

Respetados señores:

Por medio de la presente se hace entrega de los informes de avance mensual números 5 y 6 correspondientes a los meses enero y febrero, respectivamente, en los cuales se incluyen los siguientes componentes:

- Informe técnico
- Informe SST
- Informe Ambiental
- Informe social

Cordialmente,

CONSORCIO DEPORTIVO 2023
R/L LUIS FARFAN VELASQUEZ
NIT: 901.771.549
consorciodeportivo667@gmail.com

CONSORCIO
DEPORTIVO 2023

CONSORCIO DEPORTIVO 2023
NIT: 901.771.549

Fusagasugá, 16 de mayo de 2024 **CP-033-0667-2023**

Señores
R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
Atn. R.L. MARGARITA GOMEZ GOMEZ
Fusagasugá – Cundinamarca.

REFERENCIA: Contrato de obra No. 2023-0667 cuyo objeto es "EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 DE 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".

ASUNTO: Solicitud de Prorroga 01.

Cordial saludo

Durante la ejecución de las obras adicionales incorporadas al presupuesto del contrato de obra en mención, se han evidenciado la necesidad de solicitar tiempo de prórroga para su correcta ejecución.

Si bien es cierto, durante el modificatorio No. 02 Adición 01, se estableció que dichas obras complementarias, se ejecutarían en el transcurso del plazo contractual vigente, dichas actividades han sido retrasadas por los tiempos de lluvias del presente año, trayendo consigo, disminución en rendimientos en movimiento de tierras, instalación de cárcamos, y cerramiento de cancha, y en algunos casos la suspensión total de actividades, como se puede observar en el reporte del IDEAM y el análisis de lluvias y afectaciones que se adjunta.

Por otro lado, durante los comités realizados en conjunto con interventoría, supervisión y contratista en el año 2024, han denotado la necesidad de garantizar los camerinos para hombres y mujeres al igual que el espacio necesario para la comodidad de los asistentes a los eventos (graderías), como ciertamente se realizaran en dichas instalaciones una vez culminadas las obras en ejecución.

Esta situación evidencio la necesidad de realizar un modificatorio 3, en el cual se contemplarán ítems no previstos y cantidades mayores y menores que garanticen suplir las necesidades evidenciadas por el contratante, y que a la fecha se encuentra en fase de proyección para la aprobación de la entidad.

De acuerdo a las situaciones detalladas anteriormente, el área administrativa del CONSORCIO DEPORTIVO 2023, Solicita la aprobación de un prorroga de 4 meses al contrato en mención; con el fin de dar alcance a las necesidades evidenciadas en los comités técnicos y garantizar la ejecución de las obras contratadas al igual que aquellas que se encuentran en proyección mediante el modificatorio No. 3.

De acuerdo a la anterior solicitud adjunto reporte de lluvias y afectaciones y cronograma actualizado

Agradezco su atención y pronta respuesta.

Cordialmente,

CONSORCIO DEPORTIVO 2023

CONSORCIO
DEPORTIVO 2023

CONSORCIO DEPORTIVO 2023
NIT: 901.771.549

Fusagasugá, 20 de mayo de 2024 **CP-034-0667-2023**

Señores
R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
Atn. R.L. MARGARITA GOMEZ GOMEZ
Fusagasugá – Cundinamarca.

REFERENCIA: EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 DE 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

ASUNTO: Reiteración solicitud de aclaración sobre licencia de construcción de estructura en container, estudio fotométrico y estructura base de la iluminación de cancha y pista atlética.

Cordial saludo

Teniendo en cuenta que a la fecha no se ha recibido respuesta por parte de supervisión sobre las solicitudes realizadas bajo los consecutivos **CP-030-0667-2023 y CP-031-0667-2023** los cuales fueron radicados los días 24 de abril y 07 de mayo respectivamente

Me permito reiterar dichas solicitudes, siendo estas respuestas necesarias para la elaboración del modificatorio de mayores y menores cantidades en proyección, para la cual se solicitó, por una parte, incluir la cotización de Camerinos y gradería en container, y por otra el circuito de iluminación de la cancha de futbol y pista.

Es preciso establecer si es necesaria una licencia de construcción para la construcción de este tipo de estructuras en conteiner, al igual que es primordial la entrega de copia de estudio fotométrico que incluya memorias, descripción de lámparas o proyectores a suministrar, además de los estudios de la estructura base de soporte para los postes de 24 metros de altura correspondientes a la iluminación de la cancha de futbol y pista atlética-

Como es de notar, la documentación solicitada es de gran importancia para establecer el alcance del modificatorio en proyección, por tal motivo se enfatiza en la entrega oportuna de los mismos.

Agradezco su atención y pronta colaboración.

Cordialmente,

CONSORCIO DEPORTIVO 2023
R/L LUIS FARFAN VELASQUEZ
NIT: 901.771.549
consorciodeportivo667@gmail.com

ANEXO C.
BITÁCORA

2 Boals — 1 Demoledor
4 Operadores — 3 Oficiales
8 Auxiliares — 1 Topografo

Actividades: Excavación y perfilado de taludes
Relleno de material del sitio
Conformación y compactación de subrasante de pista
Excavación para instalación de cerramiento en concha

Observaciones: Se realiza localización y replanteo para el chequeo y verificación por parte de la interventoría.

Contratista — Interventoría

Fecha 26 de febrero de 2024

Clima: Soleado

Equipo y maquinaria: Vibrocompactador, minicargador, retroexcavadora, volqueta sencilla, equipo topográfico completo

Personal: 5 Administrativos
2 Boals — 1 Demoledor
4 Operadores — 3 Oficiales
8 Auxiliares — 1 Topografo

Actividades: Excavación para instalación de cerramiento en concha
Relleno y conformación con material del sitio en zona de camerinos.
Excavación y perfilado de taludes
Toma de densidades dentro de la concha, por parte de Interventoría
Instalación de bordillos al exterior de la pista

Observaciones: Se realizó toma de densidades por parte de la inter-

Fecha 27 de febrero de 2024

Estado del Clima : Soleado

Equipo y maquinaria : Vibrocompactador, minicargador, retroexcavadora volqueta sencilla, equipo topografico completo

Personal 5 Administrativos

2 Oficiales | 1 Demoledor

4 Operadores | 3 Oficiales

8 Auxiliares | 1 Topografo

Actividades : Se realiza correcciones puntuales en la nivelacion de la concha

Conformación y compactación de subrasante de pista

Instalación de bordillos externos en la pista

Excavación para instalacion de cerramiento en concha

Relleno y conformacion con material de sitio en zona de camerino

Observaciones : Se realiza verificación de niveles y anchos de la pista atlética dando cumplimiento a lo estipulado en los diseños.

Contratista _____ Interventoria _____

Fecha 28 de febrero de 2024

Estado del Clima : Soleado

Equipo y maquinaria : Vibrocompactador, minicargador, retroexcavadora volqueta sencilla, equipo topografico completo

Personal 5 Administrativos

2 Oficiales | 1 Demoledor

Instalación de bordillos externos en la pista
Excavación para instalación de cerramiento en cancha
Relleno y conformación con materiales de sitio en zona de cameinos.

Observaciones:

Contratista [signature] Interventoría [signature]

Fecha 29 de febrero de 2024

Estado del Clima Soleado

Equipo y maquinaria: Vibrocompactador, minicargador, retrocxcavadora volqueta sencilla, equipo topografico completo

Personal: 5 Administrativos
2 Oficiales 1 Demedor
4 Operadores 3 Oficiales
8 Auxiliares 1 Topografo

Actividades: Se realizan correcciones puntuales en la nivelación de la cancha
Instalación de Geotextil en zona de pista
Extensión y compactacion de subbase en zona de pista
Instalacion de bordillo externo en pista
Relleno y conformacion con material de sitio en zona de cameinos
Toma de densidades en zona de cancha por parte de Interventoria

Fecha 01 de marco de 2024

Estado del Clima: Seco

Equipo y maquinaria: Vibrocompactador, minicargador, retroexcavadora volqueta sencilla, equipo topografico completo

Personal 5 Administrativos
2 Oficiales 1 Demoledor
4 Operadores 3 Oficiales
8 Auxiliares 1 Topografo

Actividades: Excavacion y perfilada de taludes
Se realiza correcciones puntuales en la nivelacion de la concha
Nivelacion y conformacion de la subrasante de la pista
Relleno y compormacion con material de sitio en zona de cameinos
Excavacion para instalacion de cerramiento de concha

Observaciones: Los resultados de las densidades realizadas por parte de la interventoria, evidencian que el material de subbase de la concha cuenta con su optima compactacion.

Contratista: [signature] Interventoria [signature]

Fecha 02 de marco de 2024

Estado del Clima: Seco

Equipo y maquinaria: Trompo

Personal 5 Administrativos
1 Oficial 1 Auxiliar

Actividades: Instalacion de cerramiento de concha

Fecha 03 de marzo de 2024

Estado del Clima : Soleado

Equipo y maquinaria : Trompo

Personal 2 Administrativos

1 Oficial 2 Auxiliares

Actividades : Instalacion de cerramiento en concha

Observaciones : Se realiza verificación de medidas de los componentes del cerramiento, como lo son los tubos galvanizados.

Contratista [signature] Interventoria [signature]

Fecha 04 de marzo de 2024

Estado del Clima Nublado

Se registran fuertes lluvias la noche anterior

Equipo y maquinaria : Vibrocompactador, minicargador, retroexcavadora volqueta sencilla, equipo topografico completo

Personal 5 Administrativos

2 Oficiales 1 Demoledor

4 Operadores 3 Oficiales

8 Auxiliares 1 Topografo

Actividades Excavación para tubería eléctrica zona de comerinos.

Instalación de tubería eléctrica zona de comerinos.

Instalación de cerramiento en concha

Demolición de roca.

Observaciones : Se verifican longitudes y diámetros de tubería eléctrica.

05 de marzo de 2024

Estado del Clima: Soleado

Equipo y maquinaria: Vibrocompactador, minicargador, retroexcavadora volqueta sencilla, equipo topografico completo

Personal: 5 Administrativos
2 Oficiales — 1 Demoledor
4 Operadores — 3 Oficiales
8 Auxiliares — 1 Topografo

Actividades: Construcción de cajas electricas zona de cantinas
Replanteo de pilas costado este cercano al talud
Demolición de roca y excavación
Excavación en material común
Relleno con material de sitio

Observaciones: Se recomienda el correcto uso de los EPP's, realizar jornadas de orden y aseo.

Contratista — Interventoria

06 de marzo de 2024

Estado del Clima: Soleado

Equipo y maquinaria: Vibrocompactador, minicargador, retroexcavadora volqueta sencilla, equipo topografico completo

Personal: 5 Administrativos
2 Oficiales — 1 Demoledor
4 Operadores — 3 Oficiales

Instalación de bordillos en pista

Observaciones: Se recomienda al cto en lo posible tratar de no dañar los bordillos con el paso de la maquinaria, ya que no se recibiran por parte de la interventoría los que esten dañados.

Contratista _____ Interventoría

Fecha 07 de marzo de 2024

Estado del Clima: Soleado

Equipo y maquinaria: Vibrocompactador, minicargador, retroexcavadora volqueta sencilla, equipo topografico completo

Personal: 5 Administrativos
2 Oficiales 1 Demoledor
4 Operadores 3 Oficiales
8 Ayudantes 1 Topografo

Actividades: Excavación para instalación de tubería electrica costado este.
Excavación para cajas electricas costado este
Construcción de filtro; incluye excavacion, instalacion de geotextil, tubería drenante y material filtrante

Observaciones: Se realiza verificación de construcción de filtro para drenaje de aguas superficiales de la zona alta del tullal.

Contratista _____ Interventoría

Fecha 08 de marzo de 2024

4 Operadores
8 Auxiliares
3 Oficiales
+ Topografo

Actividades: Ingresa material de cerramiento y carcamo
Instalación de bastillos en pista
Nivelación y conformación de subrasante de la pista
Excavación para instalación de tubería eléctrica
Se reemplaza tubería de 12 pulgadas que fue afectada durante excavación

Observaciones: Se recomienda revisar las secciones de los cárcamos que ingresaron, teniendo en cuenta que se evidenció que algunas presentaban fisuras y daños en las esquinas.

Contratista _____ Interventoría _____

Fecha 10 de marzo de 2024

Clima Seco

Personal 5 Administrativos
4 Auxiliares + Ofical

Actividades: Instalacion de cerramiento
Ingreso de material de carcamo

Observaciones: Se realiza verificación de secciones de cárcamos suministrados evidenciandose algunos con fracturas fisuras y se solicita su respectivo cambio.

Contratista _____ Interventoría: _____

Fecha 11 de marzo de 2024

Clima Seco

Equipo y maquinaria: Vibrocompactador, minicargador, retroexcavadora volqueta sencilla carro tan

Actividades: Excavación para descoles de cercamos
Construcción de cajas eléctricas
Filtro perimetral en talud
Retiro de pollo para construcción de caja eléctrica

Observaciones: Se realiza verificación de niveles y medidas conjuntamente cta de obra e interventoría.

Contratista _____ Interventoría _____

Fecha 12 de marzo de 2024

Clima: Seco

Equipo y maquinaria: Vibrocompactadora, mini cargador, retroexcavadora volqueta sencilla, equipo topográfico completo

Personal: 5 Administrativos
2 Boals 1 Demoledor
4 Operadores 3 Oficiales
8 Auxiliares 1 Topógrafo

Actividades: Excavación para instalación de cercamo
Instalación de tubería en descoles de filtro
Construcción de cajas eléctricas

Observaciones: Se realiza verificación de estructura para instalación de tubería, se realizan observaciones respecto al atraque y se toman las medidas correctivas.

Contratista _____ Interventoría _____

Fecha 13 de marzo de 2024

Personal 5 Administrativos
2 Soldadores 1 Demoledor
4 Operadores 3 Oficiales
8 Ayudantes 1 Topografo

Actividades: Excavación para instalación de cárcamo
Instalación de tubería de descoles de pilas
Construcción de cajas electricas
Instalación de poste para cerramiento de cancha de fútbol

Observaciones: Se realiza verificación de separación de tubos galvanizados para cerramiento cada 2,50 m a eje, verificandose su cumplimiento.

Contratista Interventoria

Fecha 14 de marzo de 2024

Clima: Nublado en la mañana Soleado en la tarde

Equipo y maquinaria: Vibrocompactador, minicargador, retroexcavadora volqueta sencilla, equipo topografico completo

Personal 5 Administrativos
2 Soldadores 1 Demoledor
4 Operadores 3 Oficiales
8 Ayudantes 1 Topografo

Actividades: Instalación de postes para cerramiento de cancha
Replanteo excavación de cárcamos
Instalación de bordillo en pasta
Instalación de cárcamos
Nivelación de sobrecimiento de postes

Fecha 15 de marzo de 2024

Clima: Seco

Equipo y maquinaria: Vibrocompactador, motoniveladora, retroexcavadora, volqueta sencilla, equipo topográfico completo

Personal
- 5 Administrativos
- 2 Oficiales
- 1 Operadores
- 3 Ayudantes
- 8 Auxiliares
- 1 Topógrafo

Actividades: Excavación para instalación de cárcamo
Instalación de postes de cerramiento de cancha
Nivelación subrasante pista

Observaciones: Se realiza verificación de medidas, longitudes, anchos para conformación de la pista atlética, así como también la verificación de niveles.

Contratista

Interventoría

Fecha 16 de marzo de 2024

Clima seco

Equipo y maquinaria: Retroexcavadora, plantas eléctricas

Personal
- 3 Administrativo
- 1 Operador
- 1 Oficial
- 6 Auxiliares
- 1 Topógrafo

Actividades: Excavación para instalación de cárcamo
Instalación de postes de cerramiento de cancha

Observaciones: Se realizan nuevamente observaciones respecto al estado de algunas secciones de los cárcamos.

Fecha 18 de marzo de 2024

Clima seco Lluvias fuertes despues de las 5:00 pm

Personal 5 Administrativos
2 Cabos 1 Demoledor
4 Operadores 3 Oficiales
8 Auxiliares 1 Topografo

Equipo y maquinaria: Vibrocompactador, minicargador, retroexcavadora volqueta sencilla, equipo topografico completo.

Actividades: Nivelación de subrasante de pista
Instalación de cárcamo
Topografía y replanteo en zona de juegos
Paredes cajas eléctricas

Observaciones: Se realizan observaciones respecto a la nivelación de algunas secciones del cárcamo, se toman las respectivas medidas correctivas en campo.

Contratista Interventoria

Fecha 19 de marzo de 2024

Clima Nublado Lluvias fuertes despues de las 2 pm

Equipo y maquinaria: Vibrocompactador, minicargador, retroexcavadora volqueta sencilla, equipo topografico completo

Personal 5 Administrativos
2 Cabos 1 Demoledor
9 Operadores 3 Oficiales
8 Auxiliares 1 Topografo

Actividades Nivelación de subrasante de pista

Fecha 20 de marco de 2024

Clima Nublado Lluvias puedas despues de las 1 pm

Equipo y maquinaria Vibrocompactador, minicargador, retroexcavadora
Volqueta sencilla, equipo topografico completo

Personal 5 Administrativos
2 Oficiales 1 Demoledor
1 Operadores 3 Ayudantes
8 Auxiliares 1 Topografo

Actividades: Instalación de cárcamo
Nivelación de subrasante pista

Observaciones: Se realizan observaciones respecto a la nivelación de algunas secciones de cárcamo, se toman las respectivas acciones correctivas.

Contratista: Interventoría

Fecha 21 de marco de 2024

Clima nublado

Equipo y maquinaria Vibrocompactador, minicargador, retroexcavadora
Volqueta sencilla, equipo topografico completo

Personal 5 Administrativos
2 Oficiales 1 Demoledor
1 Operadores 3 Ayudantes
8 Auxiliares 1 Topografo

Actividades: Instalación de cárcamo
Nivelación de subrasante pista

Observaciones: Se realiza acompañamiento por parte de la interventoría en todas las actividades realizadas por el cto.

Fecha 22 de marzo de 2024

Clima Nublado

Equipo y maquinaria Vibrocompactador, minicargador, retroexcavadora
Volqueta sencilla, equipo topografico completo

Personal: 5 Administrativos
2 Oficiales 1 Demoledor
4 Operadores 3 Oficiales
8 Auxiliares 1 Topografo

Actividades: Instalación del cárcamo
Nivelación de subrasante de pista
Peñetes de cajas electrica
Excavación para instalación de cárcamo

Observaciones: Se recomienda realizar la delimitación de las áreas de acopio de materiales.

Contratista [signature] Interventoria [signature]

Fecha 01 de Abril de 2024

Clima nublado
Se presentan fuertes lluvias la noche anterior
Equipo y maquinaria: Vibrocompactador, minicargador, retroexcavadora
volqueta sencilla, equipo topografico completo

Personal: 5 Administrativos
2 Oficiales 1 Demoledor
4 Operadores 3 Oficiales
8 Auxiliares 1 Topografo

Actividades: Instalación de cárcamo

Fecha 02 de Abril de 2024

Clima nublado
Se presentan fuertes lluvias la noche anterior
Equipo y maquinaria: Vibrocompactador, minicargador, retroexcavadora
volqueta sencilla, equipo topografico completo
Personal 5 Administrativos
2 Boal
4 Operadores
8 Auxiliares
1 Demoledor
3 Oficiales
1 Topografo
Actividades: Instalación de cárcamo
Instalacion de cerramiento de cancha
Excavación para cárcamos
Observaciones: Se realizan observaciones respecto a la pintura de los
fijos galvanizados para el cerramiento, ya que se evidencia que no es
de manera continua.

Contratista Interventoria

Fecha 03 de Abril de 2024

Clima Fuertes lluvias de 1 a 3 pm / nublado
Equipo y maquinaria: Vibrocompactador, minicargador, retroexcavadora
volqueta sencilla, equipo topografico completo
Personal 5 Administrativos
2 Boal
4 Operadores
8 Auxiliares
1 Demoledor
3 Oficiales
1 Topografo
Actividades: Instalación de cárcamo
Instalación de cerramiento en curva

Fecha 04 de Abril de 2024

Clima: Fuertes lluvias de 7-11 y 14-17

Personal
- 5 Administradores
- 2 Maestro de Obra
- 1 Operador
- 4 Operadores
- 3 Oficiales
- 8 Auxiliares
- 1 Topógrafo

Actividades: Instalación de cárcamo
Se suspende actividades por fuertes lluvias
Actividades de manejo de aguas de escorrentía

Observaciones: Teniendo en cuenta las fuertes lluvias, se presentan atrasos en las actividades que se deben desarrollar.

Contratista [signature] Interventoría [signature]

Fecha 05 de Abril de 2024

Clima: nublado

Personal
- 5 Administradores
- 2 Maestro de Obra
- 1 Operador
- 4 Operadores
- 3 Oficiales
- 8 Auxiliares
- 1 Topógrafo

Actividades: Instalación de cárcamo
Nivelación zona verde
Nivelación subrasante pista
Actividades de manejo de aguas de escorrentía

Observaciones: Se recomienda al ICT aumentar los rendimientos en la conformación de la pista atlética.

Contratista [signature] Interventoría [signature]

retroexcavadora, volqueta sencilla, equipo topografico completo

Personal 5 Administrativos
2 Oficial 1 Demoledor
4 Operadores 3 Oficiales
8 Auxiliares 1 Topografo

Actividades: Instalación de cordoro
Nivelación de subrasante de pista
Instalación de cárcamo

Observaciones: Se realizan observaciones respecto al estado de algunas secciones de cárcamos instaladas.

Contratista [signature] Interventoria [signature]

Fecha 09 de abril de 2024

Clima seco

Equipo y maquinaria Vibrocompactador, minicargador, retroexcavadora volqueta sencilla, equipo topografico

Personal: 5 Administrativos
2 Oficial 1 Demoledor
4 Operadores 3 Oficiales
8 Auxiliares 1 Topografo

Actividades: Instalación de cárcamo
Nivelación de subrasante de pista
Excavación de tubería de alcantarillado

Observaciones: Se realiza verificación de niveles para instalación de tubería y verificación de estructura para la instalación de la misma.

Contratista [signature] Interventoria [signature]

Personal 5 Administrativos
2 Boal 1 Demoledor
4 Operador 3 Oficiales
8 Auxiliares 1 Topografo

Actividades: Instalación de cárcamo
Nivelación de subrasante de pista
Excavación de tubería de Alcantarillado
Nivelación de tubería de Alcantarillado

Observaciones: Se realizan observaciones respecto a la nivelación de los cárcamos y de toman las respectivas acciones correctivas.

Contratista [signature] Interventoría [signature]

Fecha 11 de abril de 2024

Clima seco
Equipo y maquinaria: Vibrocompactador, minicargador, retroexcavadora volqueta sencilla, equipo topografico completo
Personal: 5 Administrativos
2 Boal 1 Demoledor
4 Operadores 3 Oficiales
8 Auxiliares 1 Topografo
Actividades: Instalación de cárcamo
Excavación de tubería de Alcantarillado
Instalación de tubería de Alcantarillado
Observaciones: Se recomienda al ctsi aumentar los rendimientos para la conformación de la pista atlética.

Contratista [signature] Interventoría [signature]

volqueta sencilla, equipo topografico completo

Personal: 5 Administrativos
2 Oficial — 1 Demoledor
4 Operadores — 3 Oficiales
8 Auxiliares — 1 Topografo

Actividades: Instalación de cárcamo
Excavación de tubería de Alcantarillado
Instalación de tubería de Alcantarillado

Observaciones: Se solicita al cto realizar el retiro de algunas seraciones de cárcamo teniendo en cuenta que no estan en óptimas condiciones.

Contratista _____ Interventoria _____

Fecha 13 de abril de 2024

Clima seco

Equipo y maquinaria: Vibrocompactador, minicargador, retroexcavadora volqueta sencilla

Personal: 5 Administrativos
2 Oficial — 1 Demoledor
4 Operadores — 3 Oficiales
8 Auxiliares — 1 Topografo

Actividades: Instalación de cerramiento de concha
Instalación de arcos de concha de futbol

Observaciones: Se solicita al cto aumentar los rendimientos respecto a la instalacion de cerramiento y construcción de la pista.

Contratista _____ Interventoria _____

Personal
5 Administrativos
4 Operadores — 1 Demoledor
2 Boal — 3 Oficiales
8 Auxiliares — 1 Topografo

Actividades: Corrección de desniveles en la base de cancha con suelo cemento instalado de forma manual.

Observaciones: Teniendo en cuenta que de acuerdo a la verificación de niveles de la cancha, se presentan algunos puntos con desniveles, se toman las respectivas medidas correctivas.

Contratista [signature] Interventoría [signature]

Fecha 16 de abril de 2024

Clima seco

Equipo y maquinaria: Vibrocompactador, minicargador, retroexcavadora volqueta semilla, equipo topografico completo

Personal:
5 Administrativos
4 Operadores — 1 Demoledor
2 Boal — 3 Oficiales
8 Auxiliares — 1 Topografo

Actividades: Instalación de suelo cemento en el area de cancha para nivelación manual de base.

Observaciones: Se realiza acompañamiento por parte de la interventoría en todas las actividades realizadas.

Contratista [signature] Interventoría [signature]

retroexcavadora, volqueta sencilla, equipo topografico completo

Personal: 5 Administrativos
2 Boal — 1 Demoledor
4 Operadores — 3 Oficiales
8 Auxiliares — 1 Topografo

Actividades: Instalación de suelo cemento en el area de la concha para nivelación manual de base.

Observaciones: De acuerdo a la verificación de niveles de la cancha, se realiza nivelación manual en puntos especificos.

Contratista [signature] Interventoria [signature]

Fecha 18 de abril de 2024

Clima: seco / Se presentan pocas lluvias la noche anterior

Equipo y maquinaria: Vibrocompactador, minicargador, retroexcavadora, volqueta sencilla, equipo topografico completo.

Personal 5 Administrativos
2 Boal — 1 Demoledor
4 Operadores — 3 Oficiales
8 Auxiliares — 1 Topografo

Actividades: Instalacion de riega de imprimacion en el area de la concha.
Excavación para tuberia de Alcantarillado.
Instalación de tuberia de Alcantarillado

Observaciones: Se avanza en la conformación de la estructura definida para la concha, llegando a la actividad de imprimación, se recomienda realizar la instalacion del geotextil.

Contratista [signature] Interventoria [signature]

volqueta sencilla, equipo topografico

Actividades: Riego de imprimación en el area de la cancha.

Excavación para tubería de alcantarillado

Instalacion de tubería de alcantarillado

Se suspenden actividades por lluvias a partir de las 12:00

Observaciones: Se recomienda una vez se termine la imprimación realizar la instalación del geotextil en la cancha.

Contratista [signature] Interventoria [signature]

Fecha 20 de abril de 2024

Clima seco / lluvias despues de las 12:00

se presentaron fuertes lluvias la noche anterior

Equipo y maquinaria: Vibrocompactador, mezclador, retroexcavadora, volqueta sencilla, equipo topografico

Personal: 5 Administrativos

2 Soldadores

4 Operadores

3 Oficiales

8 Auxiliares

1 Topografo

Actividades: Instalacion de cerramiento en cancha

Pintura de cerramiento de cancha

Se suspenden actividades despues de las 12:00

Observaciones: Se solicita mejorar el acabado de pintura de cerramiento de la cancha.

Contratista [signature] Interventoria [signature]

1 Oficial 2 Auxiliares

Actividades: Instalacion de cerramiento en concha
Pintura de cerramiento en concha

Observaciones: Se solicita aumentar los rendimientos en la instalación del cerramiento y la construcción de la pista.

Contratista [signature] Interventoria [signature]

Fecha 22 de abril de 2024

Clima nublado / lluvias moderadas de 8 a 10 / lluvias fuertes - de 11 a 16
Se presentan fuertes lluvias la noche anterior

Equipo y maquinaria: Vibrocompactador, minicargador, retroexcavadora, volqueta sencilla, equipo topografico completo

Personal 5 Administrativos
2 Boal 1 Demoledor
4 Operadores 3 Oficiales
8 Auxiliares 1 Topografo

Actividades Se suspenden actividades despues de las 11

Observaciones: Teniendo en cuenta el cronograma de obra, se solicita al ctr aumentar los rendimientos para la conformación de la pista, ya que se deberia estar dando inicio a la actividad a la instalación de mezcla densa en caliente para la pista.

Contratista [signature] Interventoria [signature]

Fecha 23 de abril de 2024

Clima seco / lluvias moderada de 11 a 12
Se presentan fuertes lluvias la noche anterior

8 Auxiliares 1 Topografo

Actividades: Instalación de geotextil en area de la concha
Excavación para tubería de alcantarillado
Instalación de tubería de alcantarillado

Observaciones: Se solicita al contratista mayor celeridad en las actividades de instalación de concreto, cerramiento y pintura asfáltica.

Contratista Interventoria

Fecha 24 de abril de 2024

Clima seco

Equipo y maquinaria: Vibrocompactador, minicargador, retroexcavadora
Volqueta sencilla, equipo topografico completo

Personal
5 Administrativa
2 Maestro 1 Demolador
4 Operadores 3 Oficiales
8 Auxiliares 1 Topografo

Actividades: Instalación de geotextil en el area de la concha
Excavación para tubería de Alcantarillado
Instalación de tubería de Alcantarillado

Observaciones: Se recomienda realizar jornada de orden y aseo

Contratista Interventoria

Fecha 25 de abril de 2024

1 Operadores 3 Oficiales
8 Auxiliares 1 Topografo

Actividades: Instalación de geotextil en el área de la cancha
Excavación de tubería de alcantarillado
Instalación de tubería de alcantarillado

Observaciones: Se solicita aumentar el rendimiento de las actividades previstas.

Contratista Inventaria

Fecha 26 de abril de 2024

Clima seco / lluvias fuertes desde 12:00 a 17:00

Equipo y materiales: Vibrocompactador, minicargador, retroexcavadora, volqueta sencilla, equipo de topografía

Personal 5 Administrativos
2 Maestro 1 Demolador
1 Operadores 3 Oficiales
8 Auxiliares 1 Topografo

Actividades Instalación de geotextil en el area de la cancha
Excavacion de tubería de alcantarillado
Instalacion de tubería de alcantarillado
Se suspenden actividades despues de las 12 por fuertes lluvias

—— o ——

Contratista Interventoria

Personal: 5 Administrativos
2 Boal — 1 Demoledor
4 Operadores — 3 Oficiales
8 Auxiliares — 1 Topografo

Actividades: Instalación de cerramiento de cancha
Pintura en cerramiento de cancha

Observaciones: Se recomienda mejorar los acabados de pintura del cerramiento.

Contratista (4 de 5) — Interventoría

Fecha 29 de abril de 2024

Clima Lluvias fuertes de 7:00 a 10:00 / seco
Equipo y maquinaria: Vibrocompactador, minicargador, retroexcavadora, volqueta sencilla, equipo topografico
Personal 5 Administrativos
2 Boal — 1 Demoledor
4 Operadores — 3 Oficiales
8 Auxiliares — 1 Topografo
Actividades: Excavación para tubería de alcantarillado
Instalación de tubería de alcantarillado
Se realizan obras de manejo de aguas con
Bongeo y canalización para manejo de aguas
que probienen de zonas aledañas al proyecto.
Observaciones: Se hace necesario realizar canales naturales para la conducción de las aguas lluvias.

Contratista (4 de 5) — Interventoría

volqueta sencilla, equipo topografico completo

Personal
- 3 Administrativos
- 2 Boal
- 1 Demoledor
- 4 Operadores
- 3 Oficiales
- 8 Auxiliares
- 1 Topografo

Actividades: Excavación para tubería de Alcantarillado
Instalación de tubería de Alcantarillado
Instalación de cerramiento de concha.
Pintura en cerramiento de concha

Observaciones: Se solicita al cto realizar y aumentar los rendimientos para la instalación de cerramiento y confirmación de la pista.

Contratista _____ Interventoría

Fecha 02 de mayo de 2024

Clima seco / lluvias puntos 12 a 14 / nublado

Equipo y maquinaria: Vibrocompactador, minicargador, retroexcavadora volqueta sencilla, equipo topografico completo

Actividad: Excavación para tubería de Alcantarillado
Instalación de tubería de Alcantarillado

Observaciones: Se realiza verificación de niveles y la correcta instalación del atraque para la tubería.

Contratista _____ Interventoría

Fecha 03 de mayo de 2024

Clima nublado seco

8 Auxiliares 1 Topografo

Actividades: Excavación para tubería de Alcantarillado
Instalacion de tubería de Alcantarillad
Pintura de cerramiento de concha
Refuerzo de soldadura de cerramiento de concha.

Observaciones: Se realiza acompañamiento en todas las actividades realizadas por parte de la interventoría al chu de obra.

Contratista _____ Interventoria

Fecha 04 de mayo de 2024

Clima seco

Equipo y maquinaria: Vibrocompactador, minicargador, retroexcavadora volqueta sencilla, equipo topografico

Personal 5 Administrativos
2 Soldador 1 Demoledor
9 Operadores 3 Oficiales
8 Auxiliares 1 Topografo

Actividades: Instalación de cerramiento en concha
Pintura en cerramiento en concha
Refuerzo de soldadura en cerramiento de concha

Observaciones: Se recomienda mejorar los acabados de la pintura del cerramiento.

Contratista _____ Interventoria

volqueta sencilla, equipo topografico

Actividades: Excavación para tubería de Alcantarillado
Instalación de tubería de Alcantarillado

Observaciones: Se solicita al cto aumentar los rendimientos en las actividades de acuerdo al cronograma de obra.

Contratista [signature] Interventoría

Fecha 07 de mayo de 2024

Clima seco

Equipo y maquinaria Vibrocompactador, minicargador, retroexcavadora, volqueta sencilla, equipo topografico

Personal 5 Administrativos
2 Maestro de obra 1 Demoledor
4 Operarios 3 Oficiales
2 Auxiliares 1 Topografo

Actividades: Excavación para tubería de Alcantarillado
Instalacion para tubería de Alcantarillado
Instalacion de cerramiento

Observaciones: Se solicita al cto dar cumplimiento a la actividad de instalación de cárcamo.

Contratista [signature] Interventoría

Fecha 08 de mayo de 2024

Clima seco

Equipo y maquinaria Vibrocompactador, minicargador, retroexcavadora

Actividades Excavación para tubería de Alcantarillado
Instalación de tubería de Alcantarillado
Instalación de cerramiento de concha

Observaciones: Se realizan verificación de medidas y niveles conjuntamente, obra e interventoría.

Contratista [signature] Interventoría [signature]

Fecha 09 de mayo de 2024

Clima Lluvias moderadas todo el día
Equipo y maquinaria Vibrocompactador, minicargador, retroexcavadora, equipo topográfico
Personal 5 Administrativos
2 Maal 1 Demoledor
4 Operarios 3 Oficiales
8 Auxiliares 1 Topografo
Actividades: Se suspenden obras por lluvias

Contratista [signature] Interventoría [signature]

Fecha 10 de mayo de 2024

Clima seco / lluvias a partir de las 12
Equipo y maquinaria Vibro compactador, minicargador retroexcavadora, volqueta sencilla, equipo topográfico

Instalación de tubería de Alcantarillado
Se suspenden obras después de las 12 por lluvias

Contratista [signature] Interventoría [signature]

Fecha 14 de mayo de 2024

Clima seco ; se presentan fuertes lluvias la noche anterior

Equipo y maquinaria Vibrocompactador, minicargador, retroexcavadora volqueta sencilla, equipo topográfico

Personal 5 Administrativos
2 Local 1 Demoledor
4 Operarios 3 Oficiales
8 Auxiliares 1 Topógrafo

Actividades Instalación de campamento
Excavación para instalación de tubería
Instalación de tubería de alcantarillado

Observaciones: Se recomienda realizar la delimitación de las áreas de acopio de materiales.

Contratista [signature] Interventoría [signature]

Fecha 15 de mayo de 2024

8 Auxiliares 1 Topografo

Actividades Instalación de cerramiento
Pintura de cerramiento
Excavación para tubería de Alcantarillado
Instalación de tubería de Alcantarillado
Instalación de cárcamo

Observaciones: Se realiza verificación de medidas y avance de obra.

Contratista [signature] Interventoría [signature]

Fecha 16 de mayo de 2024

Clima seco

Equipo y maquinaria: Vibrocompactadora, minicargadora, retroexcavadora, equipo topografico

Personal 5 Administrativos
2 Oficial 1 Demoledor
3 Operadores 3 Ayudantes
8 Auxiliares 1 Topografo

Actividades: Instalación de cerramiento en concreto
Excavación para instalación de cárcamo
Excavación para tubería Alcantarillado
Instalación de cárcamo
Instalación de tubería Alcantarillado

Observaciones: Se realizan observaciones respecto a un punto de soldadura del cerramiento que se encuentra suelto, para que se tomen las respectivas medidas.

[signature]

Equipo y maquinaria : Vibrocompactador, minicargador, retroexcavadora, equipo topografico

Personal 5 Administrativos
2 Boal 1 Demoledor
4 Operadores 3 Oficiales
8 Auxiliares 1 Topografo

Actividades Excavación para tubería de Alcantarillado
Instalación de tubería de Alcantarillado
Instalación de cárcamo

Observaciones: Se realiza acompañamiento por parte de la interventoría a todas las actividades realizadas.

Contratista Interventoría

Fecha 18 de mayo de 2024

Clima seco

Equipo y maquinaria: Vibrocompactador, minicargador, retroexcavadora, equipo topografico

Personal 5 Administrativos
2 Boal 1 Demoledor
4 Operadores 3 Oficiales
8 Auxiliares 1 Topografo

Actividades Instalación de cerramiento de canchas
Pintura de cerramiento en cancha

Observaciones: Se recomienda aumentar los rendimientos de las actividades previstas.

Contratista Interventoría

retroexcavadora, equipo topografico completo

Personal 5 Administrativos
2 Oficiales, 1 Demoledor
4 Operadores, 3 Oficiales
8 Auxiliares, 1 Topografo

Actividades Instalacion de cercamo
Excavacion para tubería de Alcantarillado
Instalacion de tubería de Alcantarillado

Observaciones: Se realiza observacion al contratista de obra de revisar la alineación de los cercamos prefabricados.

Contratista [signature] Interventoria [signature]

Fecha 21 de mayo de 2021

Clima Seco

Equipo y maquinaria: Vibrocompactador, minicargador, retroexcavadora equipo topografico completo

Personal 5 Administrativos
2 Oficial, 1 Demoledor
1 Operadores, 3 Oficiales
8 Auxiliares, 1 Topografo

Actividades: Instalacion de cercamo
- Excavacion para tubería de Alcantarillado
Instalacion de tubería de Alcantarillado

Observación: Se recomienda al contratista controlar la nivelación de la tubería cada 6 m. y llevar control de todo lo niveleos

Contratista [signature] Interventoria [signature]

retroexcavadora, equipo topografico completo

Personal
- 5 Administrativos
- 2 Maestro
- 4 Operadores
- 8 Auxiliares
- 1 Demoledor
- 3 Oficiales
- 1 Topografo

Actividades
- Instalacion de campamento
- Excavacion para tuberia de Alcantarillado
- Instalacion de tuberia de Alcantarillado
- Descapote de senderos y maqueles
- Replanteo de senderos

Observaciones: Se solicita al contratista realizar atraque de la tuberia instalada

Contratista _____ Interventoria _____

Fecha 23 de mayo de 2024

Clima: Seco

Equipo y maquinaria: Vibrocompactador, minicargador, retroexcavadora, equipo topografico completo

Personal
- 5 Administrativos
- 4 Operadores
- 2 Maestro
- 8 Auxiliares
- 1 Demoledor
- 3 Oficiales
- 1 Topografo

Actividades
- Instalacion de campamento
- Excavacion para tuberia de Alcantarillado
- Instalacion de tuberia de Alcantarillado
- Descapote de senderos
- Replanteo de senderos

Fecha 24 de mayo de 2024

Clima seco

Equipo y maquinaria: Vibrocompactador, minicargador, retroexcavadora
equipo topografico completo

Personal
5 Administrativos
4 Operadores
2 Boal
8 Auxiliares
1 Demoledor
3 Oficiales
1 Topografo

Actividades: Instalacion de cercama
Excavacion para estructura de senderos
Nivelacion de subrasante de pista
Instalacion de subbase de pista
Instalacion de cercamiento de cancha

Observaciones: se verifican espesores de la subbase instalados en la pista de atletismo

Contratista

Interventoria

Fecha 27 de mayo de 2024

Clima seco

Equipo y maquinaria: Vibrocompactador, minicargador,
retroexcavadora, equipo topografico completo

Personal
3 Administrativos
2 Boal
4 Operadores
8 Auxiliares
1 Demoledor
3 Oficiales
1 Topografo

Actividades: Excavacion para estructura de senderos

Evitar empozamiento y realizar la instalación del geotextil y shopack

Contratista [signature] Interventoria [signature]

Fecha 28 de mayo de 2024

Clima seco / se presentan lluvias la noche anterior
Equipo y maquinaria: Vibrocompactador, minicargador
retro excavadora, equipo topografico completo
Personal 5 Administrativos
2 Oficial 1 Demoledor
4 Operadores 3 Ayudantes
8 Auxiliares 1 Topografo
Actividades Instalación de cercamas
Instalacion de shopack en concha
Excavacion para estructura de senderos
Observaciones: Se solicita al cto remplazar los cercamas que no se encuentran uniformes, para su correcta alineación

Contratista [signature] Interventoria [signature]

Fecha 29 de mayo de 2024

Clima seco
Equipo y maquinaria: Vibrocompactador, minicargador
retroexcavadora, equipo topografico
Personal: 5 Administrativos
2 Oficial 1 Demoledor
4 Operarios 3 Ayudantes

Observaciones: Se solicita realizar el respectivo ataque en la tubería instalada.

Contratista [signature] Interventoría [signature]

Fecha 30 de mayo de 2024

Clima seco / lluvias moderadas de 12 a 14

Equipo y maquinaria: Vibrocompactador, minicargador, retroexcavadora equipo topográfico completo

Personal 5 Administrativos
2 Boal 1 Demoledor
4 Operadores 3 Oficiales
8 Auxiliares 1 Topógrafo

Actividades: Instalación de cerramiento en concha
Instalación de concreto
Excavación para tubería de Alcantarillado
Instalación de tubería de Alcantarillado

Observaciones: Se recomienda al etu instalar correctamente los cordones de soldadura en la fijación de los modulos

Contratista [signature] Interventoría [signature]

Fecha 31 de mayo de 2024

Clima seco

Equipo y maquinaria: Vibrocompactador, minicargador retroexcavadora, equipo topográfico completo

Personal 5 Administrativos

Instalacion de tuberia de Alcantarillado

Observaciones: Se realiza acompañamiento a todas las actividades de obra realizadas por el cta.

Contratista [signature] Interventoria [signature]

Fecha 4 de Junio de 2024

Clima seco

Equipo y maquinaria: Vibrocompactador, minicargador retroexcavadora, equipo topografico

Personal: 5 Administrativos
2 Oficial — 1 Dumpero
2 Operarios — 3 Oficiales
6 Ayudantes — 1 Topografo

Actividades: Instalacion de Shopack
Instalacion de groma
Instalacion de tuberia de alcantarillado
Nivelacion de subrasante de pata
Excavación para cercamos

Observaciones: La interventoria realiza seguimiento a las actividades de instalación de shopack y gruma

Contratista [signature] Interventoria [signature]

Fecha: 5 junio de 2024

Equipo y maquinaria: Vibrocompactador, minicargador

Actividades: Instalacion de shopack
Instalacion de grama
Instalacion de tuberia de alcantarillado

Observaciones: se continua realizando seguimiento a las actividades de instalación de shopack y grama

Contratista [signature] Interventoria [signature]

Fecha 6 de junio de 2024

Clima seco

Equipo y maquinaria: Vibrocompactador, minicargador retroexcavadora, equipo topografico completo

Actividades: Instalacion de Shopack
Instalación de grama
Instalacion de tuberia de alcantarillado

Observaciones: se recomienda al contratista verificar las dimensiones de la cancha para la futura aplicación de la pintura

Contratista [signature] Interventoria [signature]

Fecha 7 de junio de 2024

Clima seco / lluvias de 12 a 13

Equipo y maquinaria: Vibrocompactador, minicargador retroexcavadora, equipo topografico

Actividades : Instalacion de Shopact
Instalacion de grama
Instalacion de tuberia de Alcantarillado

Observación: Se recomienda al contratista controlar la nivelación de la tubería segun pendientes diseñadas

Contratista [signature] Interventoria [signature]

Fecha 11 de junio de 2024

Clima seco / lluvias moderadas de 9 - 14
Equipo y maquinaria : Vibrocompactadora, minicargador retroexcavadora equipo topografico
Personal 5 Administrativos
2 Maestro 1 Residente
2 Operario 3 Oficiales
8 Auxiliares 1 Topografo
Actividades : Instalacion de grama
Excavacion de cajas electricas en zona de cameinos
Construccion de cajas electricas
Replanteo de diseños en zona de cameinos ; Se suspende actividades por lluvias

Contratista [signature] Interventoria [signature]

REGISTRO DE CLIMA SEGÚN HORARIO LABORAL

Objeto EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 DE 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA


Contratista CONSORCIO DEPORTIVO 2023

Ciudad FUSAGASUGA

FECHA DESDE: 29 de enero **FECHA HAS TA :** 2 de marzo **Informe No.** 06 - febrero de 2024

Informe No.6 - febrero de 2024 Semana 21


Fecha / Hora	Lunes 29	Martes 30	Miércoles 31	Jueves 1	Viernes 2	Sábado 3
7:00 a. m.	S	S	S	S	S	S
8:00 a. m.	S	S	S	S	S	S
9:00 a. m.	S	S	S	S	S	S
10:00 a. m.	S	S	S	S	S	S
11:00 a. m.	S	S	S	S	S	S
12:00 p. m.	S	S	S	S	S	S
1:00 p. m.	S	S	S	S	S	S
2:00 p. m.	S	S	S	S	S	S
3:00 p. m.	S	S	S	S	S	S
4:00 p. m.	S	S	S	S	S	S
5:00 p. m.	S	S	S	S	S	S
6:00 p. m.						
Noche (f) hr						
S	11	11	11	11	11	11
N	0	0	0	0	0	0
M	0	0	0	0	0	0
F	0	0	0	0	0	0
M+F	0	0	0	0	0	0

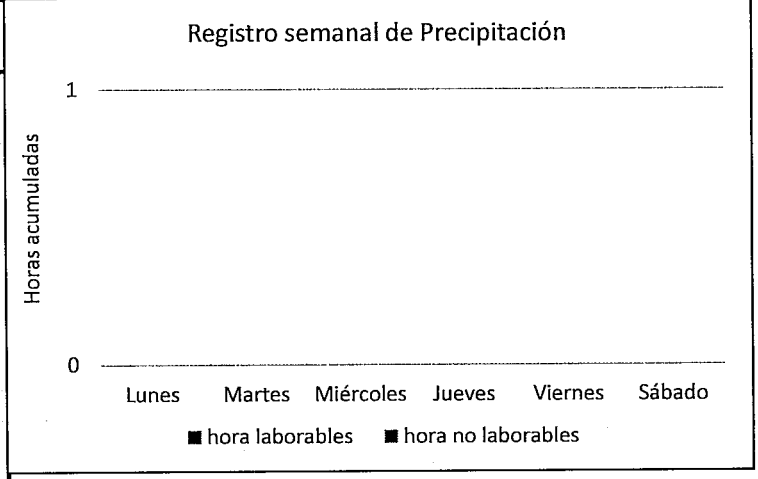

hora no laborables
Seco
Nublado
Lluvias Moderadas
Lluvias Fuertes
hora laborables

Informe No.6 - febrero de 2024 Semana 22

Fecha / Hora	Lunes 5	Martes 6	Miércoles 7	Jueves 8	Viernes 9	Sábado 10
7:00 a. m.	M	M	N	N	S	M
8:00 a. m.	M	M	N	N	S	M
9:00 a. m.	M	S	N	N	S	M
10:00 a. m.	M	S	N	N	S	M
11:00 a. m.	M	S	N	N	S	M
12:00 p. m.	M	S	N	N	S	M
1:00 p. m.	M	S	N	N	S	M
2:00 p. m.	M	S	N	M	S	M
3:00 p. m.	M	S	N	M	S	M
4:00 p. m.	M	M	N	M	S	M
5:00 p. m.	M	M	N	M	S	M
6:00 p. m.						
Noche (f) hr	2					3
S	0	7	0	0	11	0
N	0	0	11	7	0	0
M	11	4	0	4	0	11
F	0	0	0	0	0	0
M+F	11	4	0	4	0	11

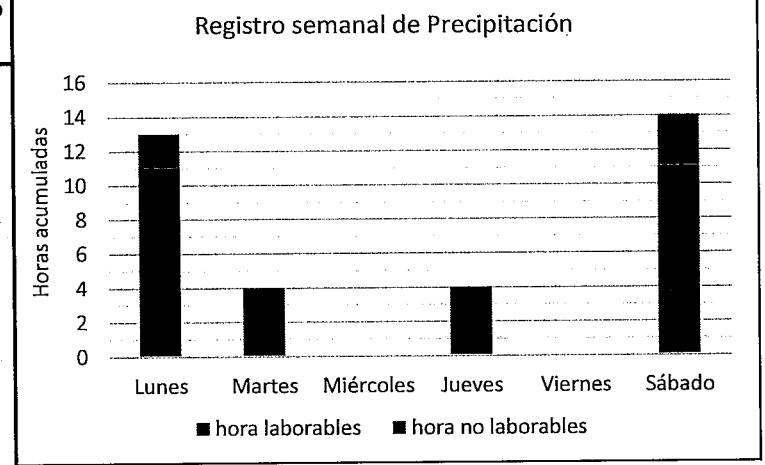

hora no laborables
Seco
Nublado
Lluvias Moderadas
Lluvias Fuertes
hora laborables

REGISTRO DE CLIMA SEGÚN HORARIO LABORAL

Objeto EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 DE 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA


Contratista CONSORCIO DEPORTIVO 2023

Ciudad FUSAGASUGA

FECHA DESDE: 29 de enero **FECHA HAS TA :** 2 de marzo **Informe No.** 06 - febrero de 2024

Informe No.6 - febrero de 2024 Semana 23


Fecha / Hora	Lunes 12	Martes 13	Miércoles 14	Jueves 15	Viernes 16	Sábado 17
7:00 a. m.	S	S	S	S	S	S
8:00 a. m.	S	S	S	S	S	S
9:00 a. m.	S	S	S	S	S	S
10:00 a. m.	S	S	S	S	S	S
11:00 a. m.	S	S	S	S	S	S
12:00 p. m.	S	S	S	S	S	S
1:00 p. m.	S	S	S	S	S	S
2:00 p. m.	S	S	S	S	S	S
3:00 p. m.	S	S	S	S	S	S
4:00 p. m.	S	S	S	S	S	S
5:00 p. m.	S	S	S	S	S	S
6:00 p. m.						
Noche (f) hr						
S	11	11	11	11	11	11
N	0	0	0	0	0	0
M	0	0	0	0	0	0
F	0	0	0	0	0	0
M+F	0	0	0	0	0	0

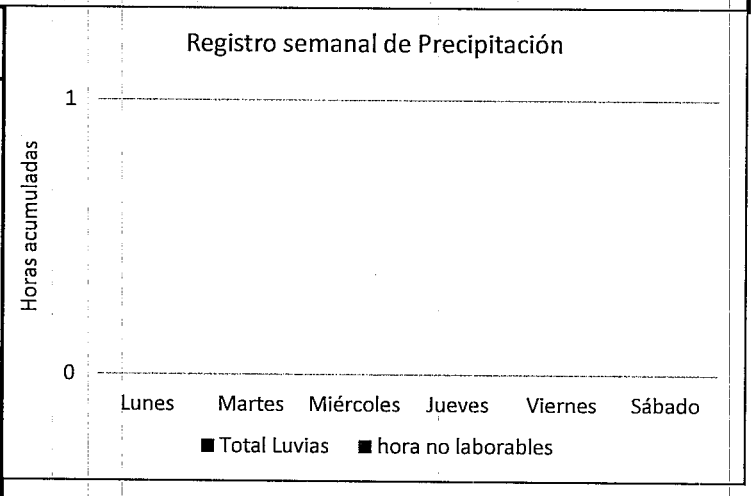

hora no laborables
Seco
Nublado
Lluvias Moderadas
hora laborables
Total Luvias

Informe No.6 - febrero de 2024 Semana 24

Fecha / Hora	Lunes 19	Martes 20	Miércoles 21	Jueves 22	Viernes 23	Sábado 24
7:00 a. m.	S	S	S	S	N	S
8:00 a. m.	S	S	S	S	N	S
9:00 a. m.	S	S	S	S	N	S
10:00 a. m.	S	S	S	S	N	S
11:00 a. m.	S	S	S	S	N	S
12:00 p. m.	S	S	S	S	N	S
1:00 p. m.	S	S	S	S	N	S
2:00 p. m.	S	S	S	S	N	S
3:00 p. m.	S	S	S	F	N	S
4:00 p. m.	S	S	S	F	N	S
5:00 p. m.	S	S	S	F	N	S
6:00 p. m.						
Noche (f) hr						
S	11	11	11	8	0	11
N	0	0	0	0	11	0
M	0	0	0	0	0	0
F	0	0	0	3	0	0
L+F	0	0	0	3	0	0

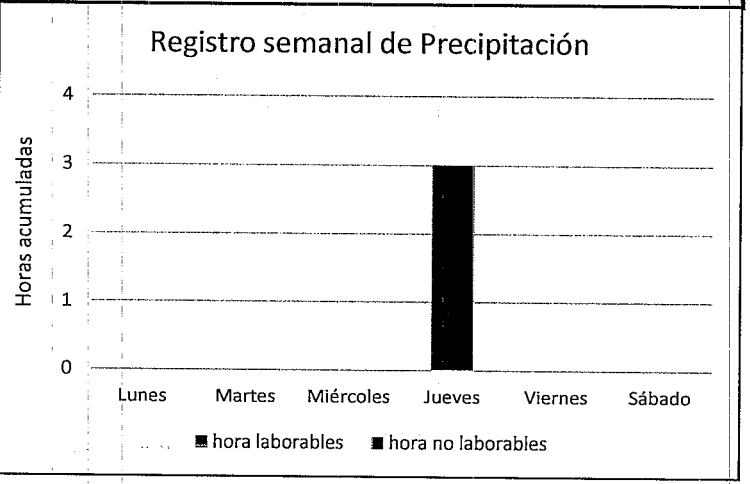

hora no laborables
Seco
Nublado
Lluvias Moderadas
Lluvias Fuertes
hora laborables

REGISTRO DE CLIMA SEGÚN HORARIO LABORAL

Objeto EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 DE 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA


Contratista CONSORCIO DEPORTIVO 2023

Ciudad FUSAGASUGA

FECHA DESDE: 29 de enero **FECHA HAS TA :** 2 de marzo **Informe No.** 06 - febrero de 2024

Informe No.6 - febrero de 2024 Semana 25


Fecha / Hora	Lunes 26	Martes 27	Miércoles 28	Jueves 29	Viernes 1	Sábado 2
7:00 a. m.	S	S	N	N	S	S
8:00 a. m.	S	S	N	N	S	S
9:00 a. m.	S	S	N	S	S	S
10:00 a. m.	S	S	N	S	S	S
11:00 a. m.	S	S	N	S	S	S
12:00 p. m.	S	S	S	S	S	S
1:00 p. m.	S	S	S	S	S	S
2:00 p. m.	S	S	S	S	S	S
3:00 p. m.	S	S	S	S	S	S
4:00 p. m.	S	S	S	S	S	S
5:00 p. m.	S	S	S	S	S	S
6:00 p. m.						
Noche (f) hr			2			
S	11	11	6	9	11	11
N	0	0	5	2	0	0
M	0	0	0	0	0	0
F	0	0	0	0	0	0
M+F	0	0	0	0	0	0

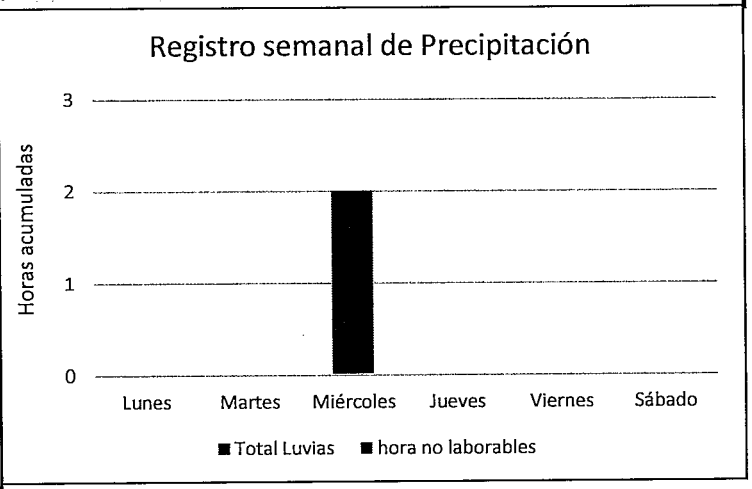

hora no laborables
Seco
Nublado
Lluvias Moderadas
hora laborables
Total Luvias

Informe No.6 - febrero de 2024 Semana 26

Fecha / Hora	Lunes 4	Martes 5	Miércoles 6	Jueves 7	Viernes 8	Sábado 9
7:00 a. m.	N	N				
8:00 a. m.	N	S				
9:00 a. m.	N	S				
10:00 a. m.	N	S				
11:00 a. m.	N	S				
12:00 p. m.	N	S				
1:00 p. m.	S	S				
2:00 p. m.	S	S				
3:00 p. m.	S	S				
4:00 p. m.	S	S				
5:00 p. m.	S	S				
6:00 p. m.						
Noche (f) hr						
S	5	10	0	0	0	0
N	6	1	0	0	0	0
M	0	0	0	0	0	0
F	0	0	0	0	0	0
M+F	0	0	0	0	0	0

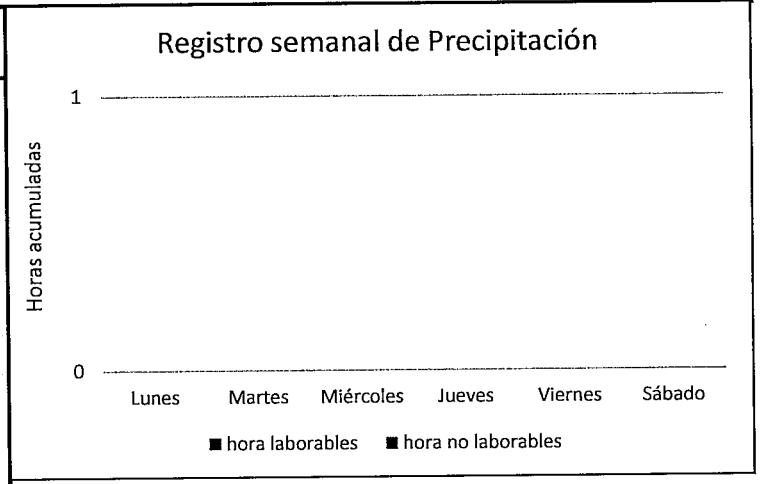

hora no laborables
Seco
Nublado
Lluvias Moderadas
Lluvias Fuertes
hora laborables

REGISTRO DE CLIMA SEGÚN HORARIO LABORAL

Objeto EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 DE 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA


Contratista CONSORCIO DEPORTIVO 2023

Ciudad FUSAGASUGA

FECHA DESDE: 4 de marzo **FECHA HAS TA :** 8 de abril **Informe No.** 08 - ABRIL

Informe No.8 - ABRIL Semana 26 26


Fecha / Hora	Lunes 4	Martes 5	Miércoles 6	Jueves 7	Viernes 8	Sábado 9
7:00 a. m.			S	S	S	N
8:00 a. m.			S	S	S	N
9:00 a. m.			S	S	S	N
10:00 a. m.			S	S	S	N
11:00 a. m.			S	S	M	N
12:00 p. m.			S	S	S	N
1:00 p. m.			S	S	S	N
2:00 p. m.			S	S	S	N
3:00 p. m.			S	S	S	N
4:00 p. m.			S	S	S	N
5:00 p. m.			S	S	S	N
6:00 p. m.						
Noche (f) hr						
S	0	0	11	11	10	0
N	0	0	0	0	0	11
M	0	0	0	0	1	0
F	0	0	0	0	0	0
M+F	0	0	0	0	1	0

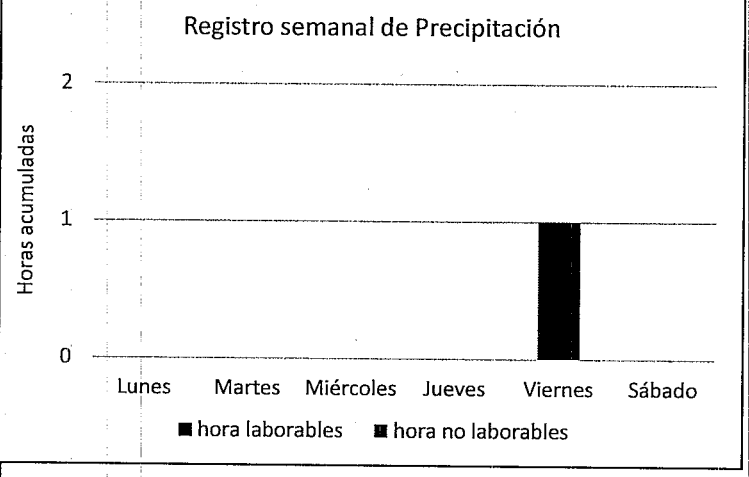

hora no laborables
Seco
Nublado
Lluvias Moderadas
Lluvias Fuertes
hora laborables

Informe No.8 - ABRIL Semana 27 27

Fecha / Hora	Lunes 11	Martes 12	Miércoles 13	Jueves 14	Viernes 15	Sábado 16
7:00 a. m.	S	S	S	N	S	S
8:00 a. m.	S	S	S	N	S	S
9:00 a. m.	S	S	S	N	S	S
10:00 a. m.	S	S	S	N	S	S
11:00 a. m.	S	S	S	S	S	S
12:00 p. m.	S	S	S	S	S	S
1:00 p. m.	S	S	S	S	S	S
2:00 p. m.	S	S	S	S	S	S
3:00 p. m.	S	S	S	S	S	S
4:00 p. m.	S	S	S	S	S	S
5:00 p. m.	S	S	S	S	S	S
6:00 p. m.						
Noche (f) hr						
S	11	11	11	7	11	11
N	0	0	0	4	0	0
M	0	0	0	0	0	0
F	0	0	0	0	0	0
M+F	0	0	0	0	0	0

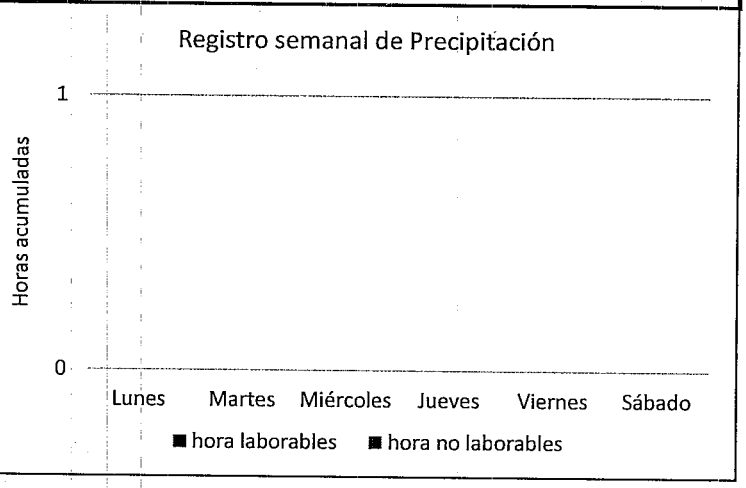

hora no laborables
Seco
Nublado
Lluvias Moderadas
Lluvias Fuertes
hora laborables

REGISTRO DE CLIMA SEGÚN HORARIO LABORAL

Objeto EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 DE 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA


Contratista CONSORCIO DEPORTIVO 2023

Ciudad FUSAGASUGA

FECHA DESDE: 4 de marzo **FECHA HAS TA :** 8 de abril **Informe No.** 08 - enero

Informe No.8 - ABRIL Semana 28 28


Fecha / Hora	Lunes 18	Martes 19	Miércoles 20	Jueves 21	Viernes 22	Sábado 23
7:00 a. m.	S	N	N	N	N	N
8:00 a. m.	S	N	N	N	N	N
9:00 a. m.	S	N	N	N	N	N
10:00 a. m.	S	N	N	N	N	N
11:00 a. m.	S	N	N	N	N	N
12:00 p. m.	S	N	N	N	N	N
1:00 p. m.	S	N	N	N	N	N
2:00 p. m.	S	F	N	N	N	N
3:00 p. m.	S	F	N	N	N	F
4:00 p. m.	S	F	F	N	N	F
5:00 p. m.	F	F	F	N	N	F
6:00 p. m.						
Noche (f) hr						
S	10	0	0	0	0	0
N	0	7	9	11	11	8
M	0	0	0	0	0	0
F	1	4	2	0	0	3
M+F	1	4	2	0	0	3

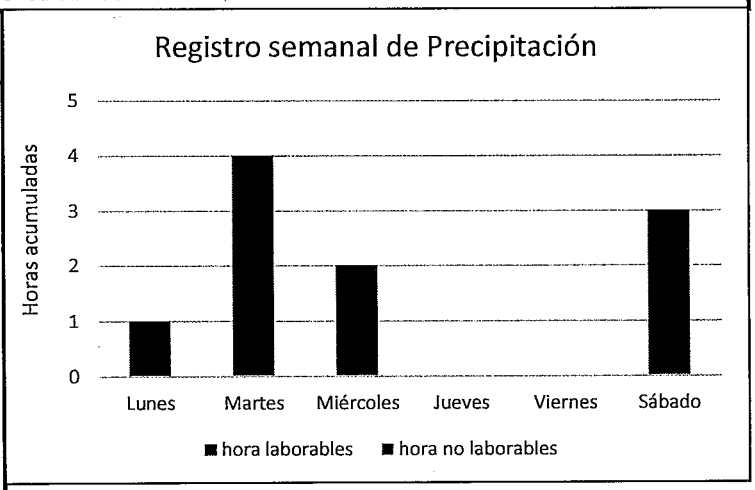

hora no laborables
Seco
Nublado
Lluvias Moderadas
Lluvias Fuertes
hora laborables

Informe No.8 - ABRIL Semana 29 29

Fecha / Hora	Lunes 25	Martes 26	Miércoles 27	Jueves 28	Viernes 29	Sábado 30
7:00 a. m.						
8:00 a. m.						
9:00 a. m.						
10:00 a. m.						
11:00 a. m.						
12:00 p. m.						
1:00 p. m.						
2:00 p. m.						
3:00 p. m.						
4:00 p. m.						
5:00 p. m.						
6:00 p. m.						
Noche (f) hr						
S	0	0	0	0	0	0
N	0	0	0	0	0	0
M	0	0	0	0	0	0
F	0	0	0	0	0	0
L+F	0	0	0	0	0	0

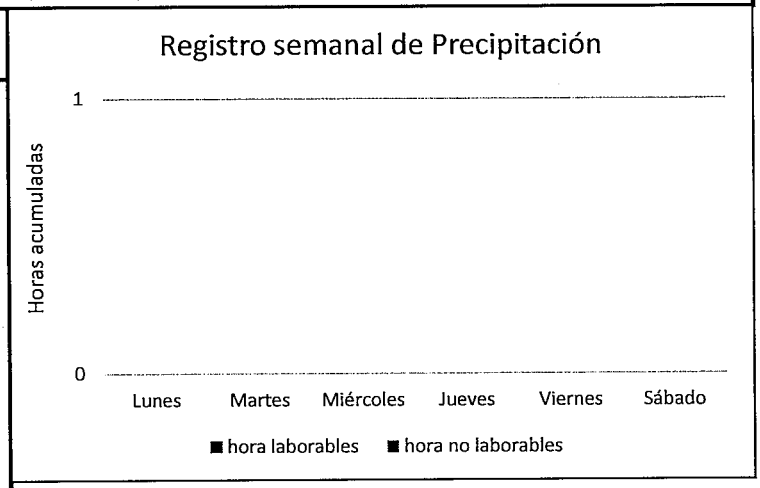

hora no laborables
Seco
Nublado
Lluvias Moderadas
Lluvias Fuertes
hora laborables

REGISTRO DE CLIMA SEGÚN HORARIO LABORAL

Objeto EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 DE 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Contratista CONSORCIO DEPORTIVO 2023


Ciudad FUSAGASUGA

FECHA DESDE: 4 de marzo **FECHA HAS TA :** 8 de abril **Informe No.** 08 - enero

Informe No.8 - ABRIL Semana 30 30

Fecha / Hora	Lunes 1	Martes 2	Miércoles 3	Jueves 4	Viernes 5	Sábado 6
7:00 a. m.	N	N	N	M	N	
8:00 a. m.	N	N	N	F	N	
9:00 a. m.	N	N	N	F	N	
10:00 a. m.	N	N	N	M	N	
11:00 a. m.	N	N	N	N	N	
12:00 p. m.	N	N	N	N	N	
1:00 p. m.	N	N	F	N	N	
2:00 p. m.	N	N	F	M	S	
3:00 p. m.	N	N	N	N	N	
4:00 p. m.	N	N	N	M	S	
5:00 p. m.	N	N	N	N	S	
6:00 p. m.						
Noche (f) hr	4	3	2	4		
S	0	0	0	0	3	0
N	11	11	9	5	8	0
M	0	0	0	4	0	0
F	0	0	2	2	0	0
M+F	0	0	2	6	0	0


hora no laborables
Seco
Nublado
Lluvias Moderadas
Lluvias Fuertes
hora laborables

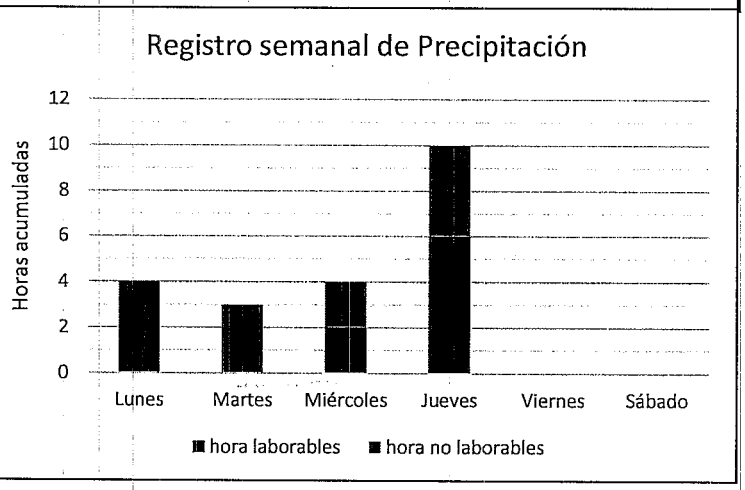

Informe No.8 - ABRIL Semana 31 31

Fecha / Hora	Lunes 8	Martes 9	Miércoles 10	Jueves 11	Viernes 12	Sábado 13
7:00 a. m.						
8:00 a. m.						
9:00 a. m.						
10:00 a. m.						
11:00 a. m.						
12:00 p. m.						
1:00 p. m.						
2:00 p. m.						
3:00 p. m.						
4:00 p. m.						
5:00 p. m.						
6:00 p. m.						
Noche (f) hr						
S	0	0	0	0	0	0
N	0	0	0	0	0	0
M	0	0	0	0	0	0
F	0	0	0	0	0	0
M+F	0	0	0	0	0	0

hora no laborables
Seco
Nublado
Lluvias Moderadas
Lluvias Fuertes
hora laborables

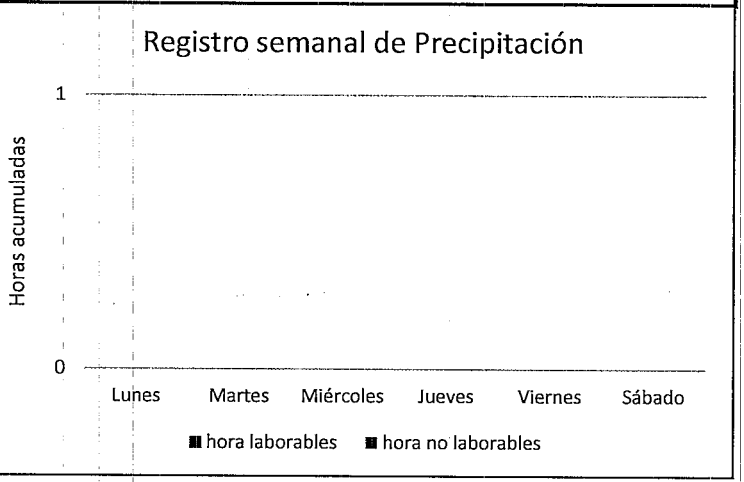

REGISTRO DE CLIMA SEGÚN HORARIO LABORAL

Objeto EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 DE 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Contratista CONSORCIO DEPORTIVO 2023


Ciudad FUSAGASUGA

FECHA DESDE: 1 de abril **FECHA HAS TA :** 5 de mayo **Informe No.** 08 - ABRIL

Informe No.8 - ABRIL Semana 30

30

Fecha / Hora	Lunes 1	Martes 2	Miércoles 3	Jueves 4	Viernes 5	Sábado 6
7:00 a. m.						F
8:00 a. m.						N
9:00 a. m.						N
10:00 a. m.						N
11:00 a. m.						N
12:00 p. m.						N
1:00 p. m.						N
2:00 p. m.						N
3:00 p. m.						N
4:00 p. m.						N
5:00 p. m.						N
6:00 p. m.						
Noche (f) hr						5
S	0	0	0	0	0	0
N	0	0	0	0	0	10
M	0	0	0	0	0	0
F	0	0	0	0	0	1
M+F	0	0	0	0	0	1

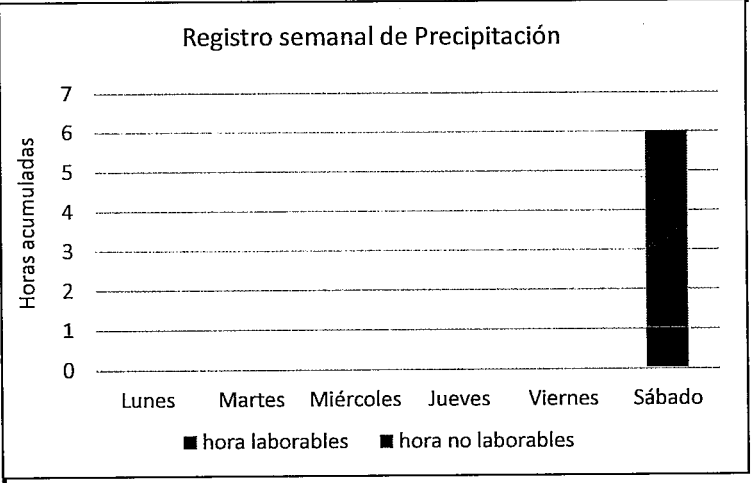


hora no laborables
Seco
Nublado
Lluvias Moderadas
Lluvias Fuertes
hora laborables

Informe No.8 - ABRIL Semana 31

31

Fecha / Hora	Lunes 8	Martes 9	Miércoles 10	Jueves 11	Viernes 12	Sábado 13
7:00 a. m.	N	S	S	S	S	S
8:00 a. m.	N	S	S	S	S	S
9:00 a. m.	S	S	S	S	S	S
10:00 a. m.	S	S	S	S	S	S
11:00 a. m.	S	S	S	S	S	S
12:00 p. m.	S	S	S	S	S	S
1:00 p. m.	S	S	S	S	S	S
2:00 p. m.	S	S	S	S	S	S
3:00 p. m.	S	S	S	S	S	S
4:00 p. m.	S	S	S	S	S	S
5:00 p. m.	S	S	S	S	S	S
6:00 p. m.						
Noche (f) hr						
S	9	11	11	11	11	11
N	2	0	0	0	0	0
M	0	0	0	0	0	0
F	0	0	0	0	0	0
M+F	0	0	0	0	0	0

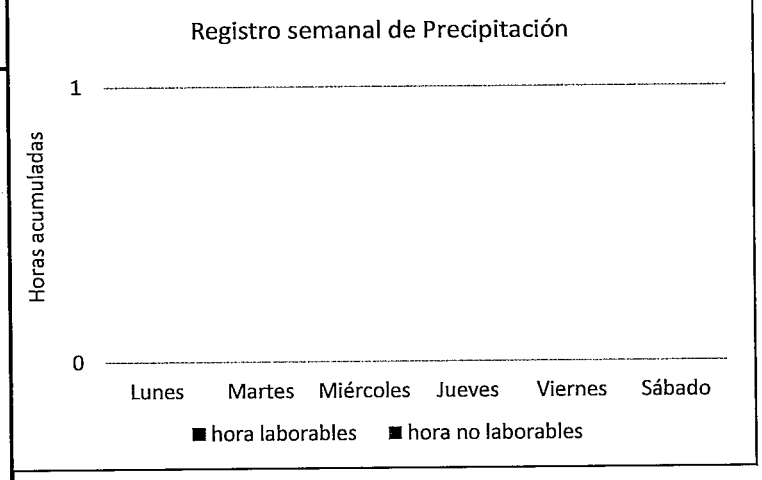

hora no laborables
Seco
Nublado
Lluvias Moderadas
Lluvias Fuertes
hora laborables

REGISTRO DE CLIMA SEGÚN HORARIO LABORAL

Objeto EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 DE 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA


Contratista CONSORCIO DEPORTIVO 2023

Ciudad FUSAGASUGA

FECHA DESDE: 1 de abril **FECHA HAS TA :** 5 de mayo **Informe No.** 08 - enero

Informe No.8 - ABRIL Semana 32 32


Fecha / Hora	Lunes 15	Martes 16	Miércoles 17	Jueves 18	Viernes 19	Sábado 20
7:00 a. m.	S	S	S	S	S	S
8:00 a. m.	S	S	S	S	S	S
9:00 a. m.	S	S	S	S	S	S
10:00 a. m.	S	S	S	S	S	S
11:00 a. m.	S	S	S	S	S	S
12:00 p. m.	S	S	S	S	M	M
1:00 p. m.	S	S	S	S	M	M
2:00 p. m.	S	S	S	S	M	M
3:00 p. m.	S	S	S	S	M	M
4:00 p. m.	S	S	M	S	M	M
5:00 p. m.	S	S	M	S	M	M
6:00 p. m.						
Noche (f) hr				3		3
S	11	11	9	11	5	5
N	0	0	0	0	0	0
M	0	0	2	0	6	6
F	0	0	0	0	0	0
M+F	0	0	2	0	6	6

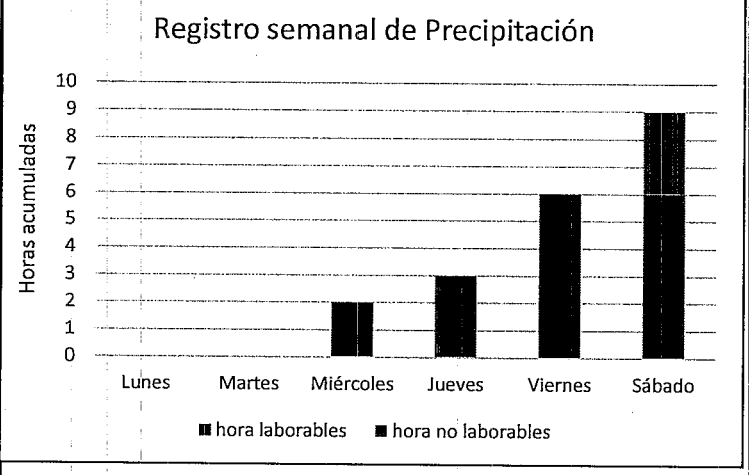

hora no laborables
Seco
Nublado
Lluvias Moderadas
Lluvias Fuertes
hora laborables

Informe No.8 - ABRIL Semana 33 33

Fecha / Hora	Lunes 22	Martes 23	Miércoles 24	Jueves 25	Viernes 26	Sábado 27
7:00 a. m.	N	N	N	N	S	N
8:00 a. m.	M	N	N	F	S	S
9:00 a. m.	M	N	S	N	S	S
10:00 a. m.	S	S	S	S	S	S
11:00 a. m.	F	M	S	S	S	S
12:00 p. m.	F	S	S	S	F	S
1:00 p. m.	N	S	S	S	F	S
2:00 p. m.	M	S	S	S	F	S
3:00 p. m.	M	S	S	S	N	S
4:00 p. m.	M	S	S	S	M	S
5:00 p. m.	S	S	S	S	S	S
6:00 p. m.						
Noche (f) hr	4	3			4	
S	2	7	9	8	6	10
N	2	3	2	2	1	1
M	5	1	0	0	1	0
F	2	0	0	1	3	0
L+F	7	1	0	1	4	0

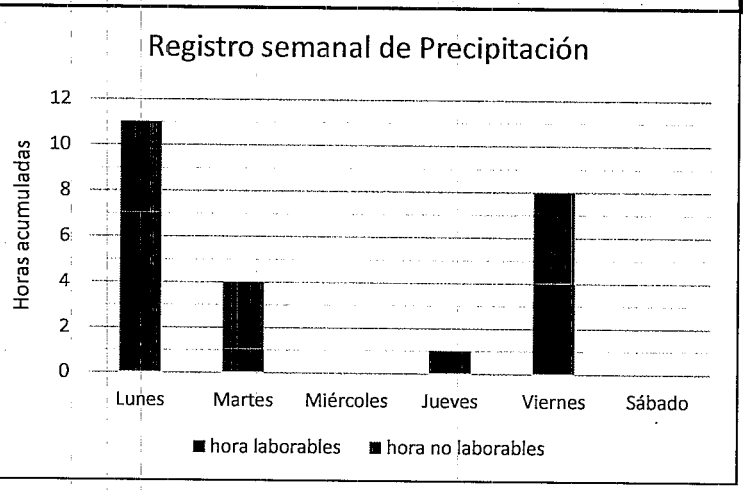

hora no laborables
Seco
Nublado
Lluvias Moderadas
Lluvias Fuertes
hora laborables

REGISTRO DE CLIMA SEGÚN HORARIO LABORAL

Objeto EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 DE 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA


Contratista CONSORCIO DEPORTIVO 2023

Ciudad FUSAGASUGA

FECHA DESDE: 1 de abril **FECHA HAS TA :** 5 de mayo **Informe No.** 08 - enero

Informe No.8 - ABRIL Semana 34 34


Fecha / Hora	Lunes 29	Martes 30	Miércoles 1	Jueves 2	Viernes 3	Sábado 4
7:00 a. m.	F	S		S	N	S
8:00 a. m.	F	S		S	N	S
9:00 a. m.	M	S		S	N	S
10:00 a. m.	N	S		S	N	S
11:00 a. m.	S	S		S	N	S
12:00 p. m.	S	S		F	N	S
1:00 p. m.	N	S		F	N	S
2:00 p. m.	S	S		M	N	S
3:00 p. m.	S	S		N	S	S
4:00 p. m.	S	S		N	S	S
5:00 p. m.	S	S		N	S	S
6:00 p. m.						
Noche (f) hr						
S	6	11	0	5	3	11
N	2	0	0	3	8	0
M	1	0	0	1	0	0
F	2	0	0	2	0	0
M+F	3	0	0	3	0	0

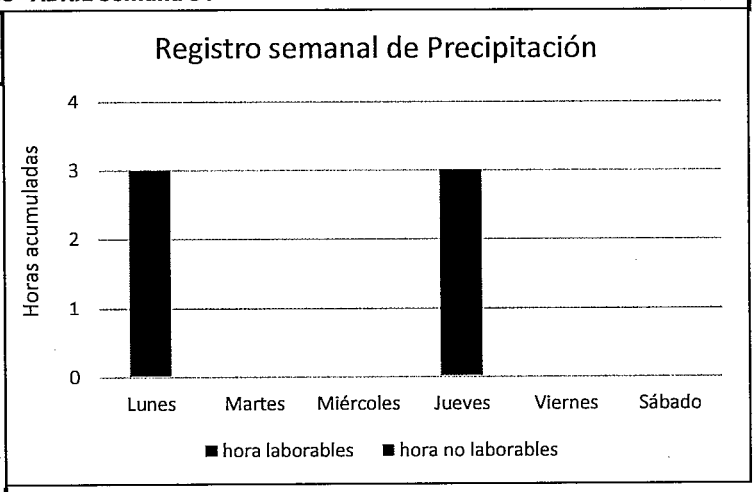

hora no laborables
Seco
Nublado
Lluvias Moderadas
Lluvias Fuertes
hora laborables

Informe No.8 - ABRIL Semana 35 35

Fecha / Hora	Lunes 6	Martes 7	Miércoles 8	Jueves 9	Viernes 10	Sábado 11
7:00 a. m.						
8:00 a. m.						
9:00 a. m.						
10:00 a. m.						
11:00 a. m.						
12:00 p. m.						
1:00 p. m.						
2:00 p. m.						
3:00 p. m.						
4:00 p. m.						
5:00 p. m.						
6:00 p. m.						
Noche (f) hr						
S	0	0	0	0	0	0
N	0	0	0	0	0	0
M	0	0	0	0	0	0
F	0	0	0	0	0	0
M+F	0	0	0	0	0	0

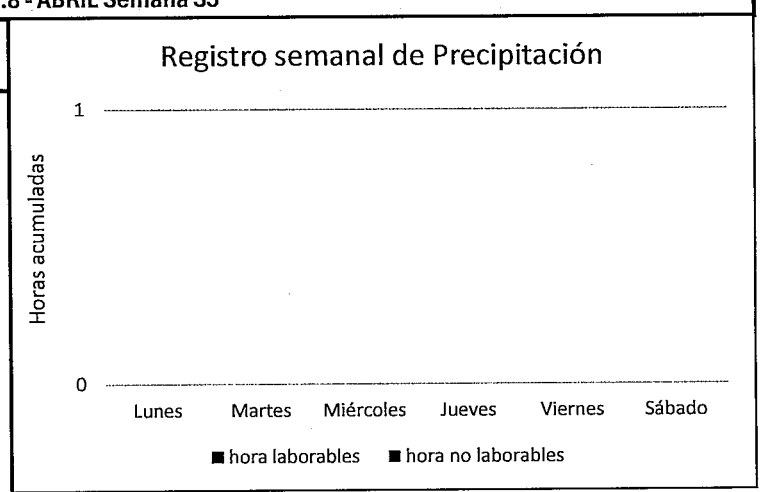

hora no laborables
Seco
Nublado
Lluvias Moderadas
Lluvias Fuertes
hora laborables

REGISTRO DE CLIMA SEGÚN HORARIO LABORAL

Objeto EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 DE 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA


Contratista CONSORCIO DEPORTIVO 2023

Ciudad FUSAGASUGA

FECHA DESDE: 6 de mayo **FECHA HAS TA :** 1 de junio **Informe No.** 08 - ABRIL

Informe No.8 - ABRIL Semana 36 36


Fecha / Hora	Lunes 6	Martes 7	Miércoles 8	Jueves 9	Viernes 10	Sábado 11
7:00 a. m.	N	S	S	M	S	S
8:00 a. m.	N	S	S	M	S	S
9:00 a. m.	S	S	S	M	S	S
10:00 a. m.	S	S	s	M	S	S
11:00 a. m.	S	S	S	M	S	S
12:00 p. m.	S	S	S	M	M	S
1:00 p. m.	S	S	S	M	M	S
2:00 p. m.	S	S	S	M	M	S
3:00 p. m.	S	S	S	M	M	S
4:00 p. m.	S	S	S	M	N	S
5:00 p. m.	S	S	s	M	N	S
6:00 p. m.						
Noche (f) hr	3					
S	9	11	11	0	5	11
N	2	0	0	0	2	0
M	0	0	0	11	4	0
F	0	0	0	0	0	0
M+F	0	0	0	11	4	0

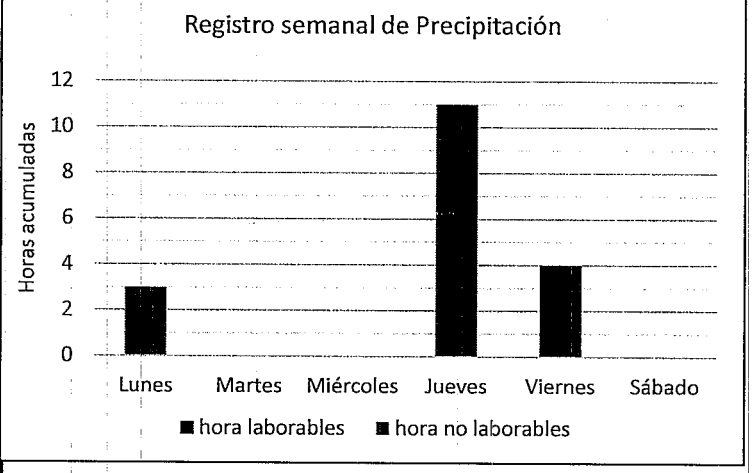

hora no laborables
Seco
Nublado
Lluvias Moderadas
Lluvias Fuertes
hora laborables

Informe No.8 - ABRIL Semana 37 37

Fecha / Hora	Lunes 13	Martes 14	Miércoles 15	Jueves 16	Viernes 17	Sábado 18
7:00 a. m.		S	S	S	S	S
8:00 a. m.		S	S	S	S	S
9:00 a. m.		S	S	S	S	S
10:00 a. m.		S	S	S	S	S
11:00 a. m.		S	M	S	S	S
12:00 p. m.		S	M	M	S	S
1:00 p. m.		S	M	M	S	S
2:00 p. m.		S	S	M	S	S
3:00 p. m.		S	S	M	S	S
4:00 p. m.		S	S	S	S	S
5:00 p. m.		S	S	S	S	S
6:00 p. m.						
Noche (f) hr		3				
S	0	11	8	7	11	11
N	0	0	0	0	0	0
M	0	0	3	4	0	0
F	0	0	0	0	0	0
M+F	0	0	3	4	0	0

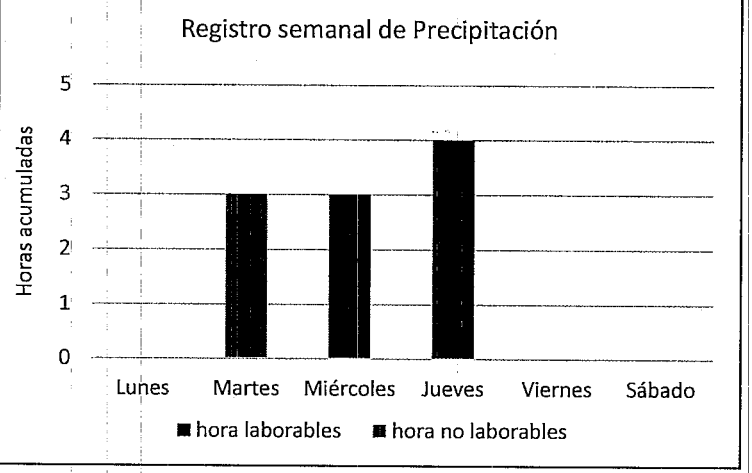

hora no laborables
Seco
Nublado
Lluvias Moderadas
Lluvias Fuertes
hora laborables

REGISTRO DE CLIMA SEGÚN HORARIO LABORAL

Objeto EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 DE 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA


Contratista CONSORCIO DEPORTIVO 2023

Ciudad FUSAGASUGA

FECHA DESDE: 6 de mayo **FECHA HAS TA :** 1 de junio **Informe No.** 08 - enero

Informe No.8 - ABRIL Semana 38 38


Fecha / Hora	Lunes 20	Martes 21	Miércoles 22	Jueves 23	Viernes 24	Sábado 25
7:00 a. m.	S	S	S	S	S	N
8:00 a. m.	S	S	S	S	S	N
9:00 a. m.	S	S	S	S	S	N
10:00 a. m.	S	S	S	S	S	N
11:00 a. m.	S	S	S	S	S	N
12:00 p. m.	S	S	S	S	S	N
1:00 p. m.	S	S	S	S	S	N
2:00 p. m.	S	S	S	S	S	N
3:00 p. m.	S	S	S	S	S	N
4:00 p. m.	S	S	S	S	S	N
5:00 p. m.	s	S	S	S	S	N
6:00 p. m.						
Noche (f) hr						
S	11	11	11	11	11	0
N	0	0	0	0	0	11
M	0	0	0	0	0	0
F	0	0	0	0	0	0
M+F	0	0	0	0	0	0

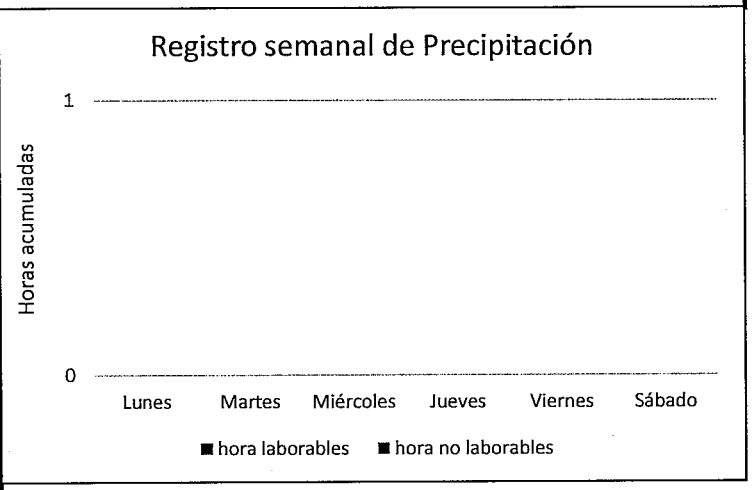

hora no laborables
Seco
Nublado
Lluvias Moderadas
Lluvias Fuertes
hora laborables

Informe No.8 - ABRIL Semana 39 39

Fecha / Hora	Lunes 27	Martes 28	Miércoles 29	Jueves 30	Viernes 31	Sábado 1
7:00 a. m.	S	S	N	S	S	S
8:00 a. m.	S	S	N	S	S	S
9:00 a. m.	S	S	S	S	S	S
10:00 a. m.	S	S	S	S	S	S
11:00 a. m.	S	S	S	S	S	S
12:00 p. m.	S	S	S	M	S	S
1:00 p. m.	S	S	S	M	S	S
2:00 p. m.	S	S	S	S	S	S
3:00 p. m.	S	S	S	S	S	S
4:00 p. m.	S	S	S	S	S	S
5:00 p. m.	S	S	S	S	S	S
6:00 p. m.						
Noche (f) hr		3				
S	11	11	9	9	11	11
N	0	0	2	0	0	0
M	0	0	0	2	0	0
F	0	0	0	0	0	0
L+F	0	0	0	2	0	0

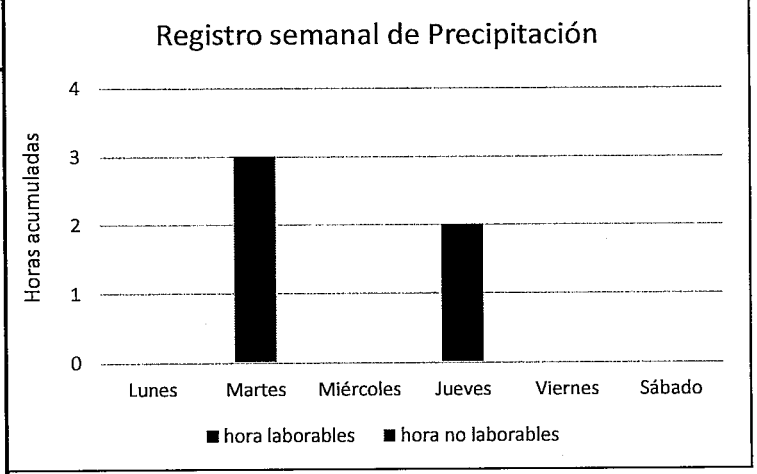

hora no laborables
Seco
Nublado
Lluvias Moderadas
Lluvias Fuertes
hora laborables

REGISTRO DE CLIMA SEGÚN HORARIO LABORAL

Objeto EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 DE 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA


Contratista CONSORCIO DEPORTIVO 2023

Ciudad FUSAGASUGA

FECHA DESDE: 6 de mayo **FECHA HAS TA :** 1 de junio **Informe No.** 08 - enero

Informe No.8 - ABRIL Semana 40 40


Fecha / Hora	Lunes 3	Martes 4	Miércoles 5	Jueves 6	Viernes 7	Sábado 8
7:00 a. m.		N	S	S	S	
8:00 a. m.		N	S	S	S	
9:00 a. m.		N	S	S	S	
10:00 a. m.		N	S	S	S	
11:00 a. m.		S	S	S	S	
12:00 p. m.		S	S	S	m	
1:00 p. m.		S	S	S	S	
2:00 p. m.		S	S	S	S	
3:00 p. m.		S	S	S	S	
4:00 p. m.		S	S	S	S	
5:00 p. m.		S	S	S	S	
6:00 p. m.						
Noche (f) hr						
S	0	7	11	11	10	0
N	0	4	0	0	0	0
M	0	0	0	0	1	0
F	0	0	0	0	0	0
M+F	0	0	0	0	1	0

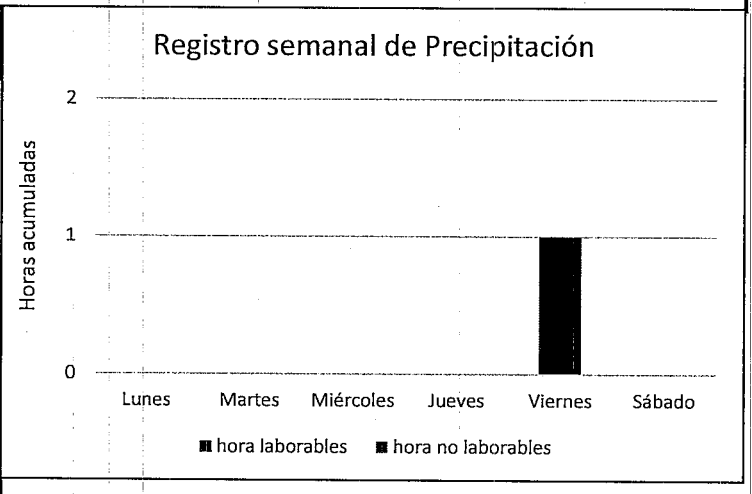

hora no laborables
Seco
Nublado
Lluvias Moderadas
Lluvias Fuertes
hora laborables

Informe No.8 - ABRIL Semana 41 41

Fecha / Hora	Lunes 10	Martes 11	Miércoles 12	Jueves 13	Viernes 14	Sábado 15
7:00 a. m.						
8:00 a. m.						
9:00 a. m.						
10:00 a. m.						
11:00 a. m.						
12:00 p. m.						
1:00 p. m.						
2:00 p. m.						
3:00 p. m.						
4:00 p. m.						
5:00 p. m.						
6:00 p. m.						
Noche (f) hr						
S	0	0	0	0	0	0
N	0	0	0	0	0	0
M	0	0	0	0	0	0
F	0	0	0	0	0	0
M+F	0	0	0	0	0	0

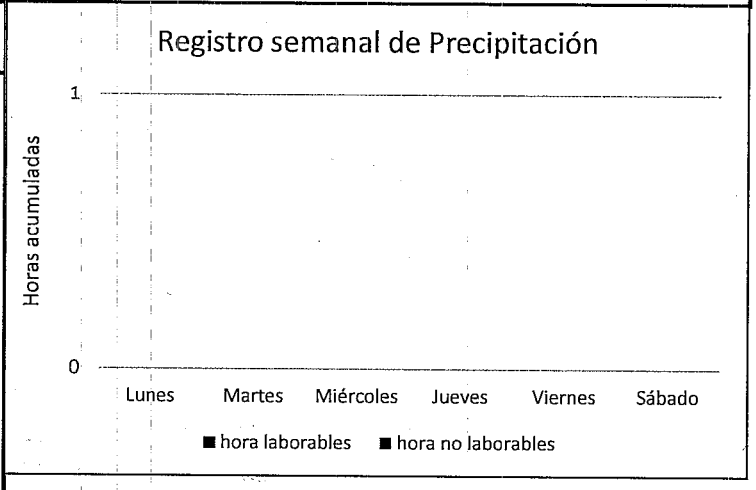

hora no laborables
Seco
Nublado
Lluvias Moderadas
Lluvias Fuertes
hora laborables

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CORREDORES	17	17-40-101028519	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	06	2024	13	11	2023	00:00	05	02	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO DEPORTIVO 2023	NIT: 901.771.549-7

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
AC 24 NRO. 51 - 40 OF 316	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6014672735

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y-O INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU	NIT: 890.680.008-4

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 6 NRO. 6 - 24	FUSAGASUGA, CUNDINAMARCA	8818181

BENEFICIARIO: 890680008 - MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y-O INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N0 831-202 CECION No.2023-0667 CUYO OBJETO ES:

ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA, PISTA ATLETICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONESDELMUNICIPIO DE FUSAGASUGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

BENEFICIARIO:
TERCEROS AFECTADOS.

ASEGURADO:/ MUNICIPIO DE FUSAGASUGA IDENTIFICADA CON NIT 890680008-4 Y EL CONTRATISTA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCANIT900258711

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	13/11/2023	05/02/2025	$650,000,000.00	$650,000,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA INDICADA SEGUN OTRO SI NO. 02 DE PRORROGA AL CONTRATO DE OBRANo.2023-0667SEPRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 05 DE OCTUBRE DEL 2024 SE MODIFICAN LA PRESENTE POLIZA Y SUS RESPETIVOS AMPAROS.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****547,602.00	$ *******3,000.00	$ *****104,614.00	$ **********655,217.00	$ ******650,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS ASESO	4627	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 17 NO 10-16 PISO 3 - TELEFONO: 3414646 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CORREDORES	17	17-40-101028519	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	06	2024	13	11	2023	00:00	05	02	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO DEPORTIVO 2023		NIT: 901.771.549-7
DIRECCION: AC 24 NRO. 51 - 40 OF 316	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELEFONO:**	6014672735

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y-O INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU		NIT: 890.680.008-4
DIRECCIÓN: CL 6 NRO. 6 - 24	**CIUDAD:** FUSAGASUGA, CUNDINAMARCA	**TELÉFONO:**	8818181

BENEFICIARIO: 890680008 - MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y-O INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ESTUDIOS E INGENIERIA SAS	900351236-1	20.00
ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE INGENIERIA S	901154986-6	80.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 17 NO 10-16 PISO 3 - TELEFONO: 3414646 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CORREDORES	17	17-44-101212847	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	06	2024	13	11	2023	00:00	05	06	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO DEPORTIVO 2023	NIT: 901.771.549-7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AC 24 NRO. 51 - 40 OF 316	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6014672735

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y-O INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU	NIT: 890.680.008-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 6 NRO. 6 - 24	FUSAGASUGA, CUNDINAMARCA	8818181

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO, ESTABILIDAD Y EL PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES SEGUN CESION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO 831-202 AL CONTRATO DE OBRANo.2023-0667 CUYO OBJETO ES:

ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA, PISTA ATLETICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONESDELMUNICIPIO DE FUSAGASUGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

ASEGURADO:/ MUNICIPIO DE FUSAGASUGA IDENTIFICADA CON NIT 890680008-4 Y EL CONTRATISTA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCANIT900258711

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/11/2023	05/06/2025	$2,473,524,116.40	$2,473,524,116.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13/11/2023	05/02/2028	$1,855,143,087.30	$1,855,143,087.30
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/06/2024	05/06/2029	$3,710,286,174.60	$3,710,286,174.60

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA INDICADA SEGUN OTRO SI NO. 02 DE PRORROGA AL CONTRATO DE OBRANo.2023-0667SEPRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 05 DE OCTUBRE DEL 2024 SE MODIFICAN LA PRESENTE POLIZA Y SUS RESPETIVOS AMPAROS.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***3,595,928.00	$ *******8,000.00	$ *****684,746.00	$ *********4,288,674.00	$ ****8,038,953,378.30	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS ASESO	4627	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 17 NO 10-16 PISO 3 - TELEFONO: 3414646 - BOGOTA, D.C.

ADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CORREDORES	17	17-44-101212847	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	06	2024	13	11	2023	00:00	05	06	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO DEPORTIVO 2023		NIT: 901.771.549-7
DIRECCIÓN: AC 24 NRO. 51 - 40 OF 316	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELEFONO:**	6014672735

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y-O INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU		NIT: 890.680.008-4
DIRECCIÓN: CL 6 NRO. 6 - 24	**CIUDAD:** FUSAGASUGA, CUNDINAMARCA	**TELÉFONO:**	8818181

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ESTUDIOS E INGENIERIA SAS	900351236-1	20.00
ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE INGENIERIA S	901154986-6	80.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 17 NO 10-16 PISO 3 - TELEFONO: 3414646 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101212847, anexo 3, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 11 días del mes de JUNIO de 2024

17-44-101212847

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO DEPORTIVO 2023
NIT 901.771.549-7
AV 24 51 40 OF 316
Tel: (601) 4672735
Bogotá - Colombia
conta.901771549@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FV 3

Señores	MUNICIPIO DE FUSAGASUGA		
NIT	890.680.008-4	**Teléfono**	(601) 8868181 - Ext. 000
Dirección	CALLE 6 6 24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/07/2024, 13:23
Expedición	03/07/2024, 13:23
Vencimiento	03/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)	1.00	1,021,849,642.56
2	ADMINISTRACION (26.00%)	1.00	265,680,907.07
3	IMPREVISTOS (2%)	1.00	20,436,992.85
4	UTILIDAD (5%)	1.00	51,092,482.13

Total Bruto	1,359,060,024.61
Total a Pagar	1,359,060,024.61

Total items: 4

Valor en Letras:
Mil trescientos cincuenta y nueve millones sesenta mil veinticuatro pesos m/cte con sesenta y uno cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-03 por $ 1,359,060,024.61

Observaciones:
Acta No. 3 del contrato de obra No. 2023-0667, consorcio deportivo 2023, proyecto cancha sintética fusagasugá, comprende que el periodo es del 16 de diciembre de 2023 al 26 de febrero de 2023 al 07 de junio de 2024.

Factura Software y Proveedor tecnológico Siigo S.A. - Nit 830.042.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vigente al 2024.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764062099597 aprobado en 20231217 prefijo FV desde el número 1 al**

rtes
nea

Planilla Resumen

DEL APORTANTE

dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
7	CONSORCIO DEPORTIVO 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AC 24 51 40	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4672734	SI

DE LA LIQUIDACION

	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	498704089	9464036225	E	2024/03/12	2024/03/06	BANCOLOMBIA	0	$805,000

TALLADA DE APORTES

EADO		NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
5	JIMENEZ CORTES LEYDI CLEMENCIA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSC34	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
8	VILLEGAS LEON MARISOL																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
2)																					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0		$805,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901771549	7	CONSORCIO DEPORTIVO 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AC 24 51 40	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4672734	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-02	2024-03	498704089	9464036225	E	2024/03/12	2024/03/06	BANCOLOMBIA	0	$805,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$416,000	$0	$0	$416,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$181,000	$0	$0	$181,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$181,000	$0	$0	$181,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$104,000	$0	$0	$104,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	2	$104,000	$0	$0	$104,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$104,000	$0	$0	$104,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$52,000	$0	$0	$52,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				**2**	**$805,000**	**$0**	**$0**	**$805,000**

2024/03/06 04:33 PM

rtes
línea

Planilla Resumen

S DEL APORTANTE

dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
7	CONSORCIO DEPORTIVO 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AC 24 51 40	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4672734	SI

S DE LA LIQUIDACION

	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
d	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	498716721	9464100705	Y	2024/03/12	2024/03/06	BANCOLOMBIA	0	$197,900

TALLADA DE APORTES

EADO		NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
	Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	Irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
5	ADAMES REYES CRISTIAN DANIEL		X					X												0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	1	$48,000	$3,400	0	$0	$0	No	$3,400
8	DIAZ PEÑUELA MARIA PAULA		X					X												0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	1	$48,000	$3,400	0	$0	$0	No	$3,400
9	MOLANO BOLIVAR HUGO LEONARDO	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,920,000	$133,700	0	$0	$0	No	$133,700
	ROMERO CANO ADRIANA MARCELA	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	19	$823,334	$57,400	0	$0	$0	No	$57,400
4)																					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,839,334	$197,900		$0	$0		$197,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901771549	7	CONSORCIO DEPORTIVO 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AC 24 51 40	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4672734	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	498716721	9464100705	Y	2024/03/12	2024/03/06	BANCOLOMBIA	0	$197,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$197,900	$0	$0	$197,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$197,900	$0	$0	$197,900
TOTAL				**4**	**$197,900**	**$0**	**$0**	**$197,900**

ortes línea

Planilla Resumen

S DEL APORTANTE

dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
1	ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV CR 24 51 40	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4672734	SI

S DE LA LIQUIDACION

	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
id	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	498360576	9464091820	E	2024/03/11	2024/03/06	BANCOLOMBIA		$55,529,000

ETALLADA DE APORTES

ADO	NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
NCIPAL (1 Afiliados)				$9,200,000	$1,564,000			$9,200,000	$368,000			$9,200,000	$368,000			$9,200,000		$640,400		$0	$0		$2,940,400
R5 PERSONAL OFIC (1 Afiliados)				$9,200,000	$1,564,000			$9,200,000	$368,000			$9,200,000	$368,000			$9,200,000		$640,400		$0	$0		$2,940,400
to: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)				$9,200,000	$1,564,000			$9,200,000	$368,000			$9,200,000	$368,000			$9,200,000		$640,400		$0	$0		$2,940,400
PARDO AVILA IVAN ALONSO		230201	30	$9,200,000	$1,564,000	EPS008	30	$9,200,000	$368,000	CCF24	30	$9,200,000	$368,000	14-11	30	$9,200,000	6.960%	$640,400	30	$0	$0	SI	$2,940,400
(1)				$9,200,000	$1,564,000			$9,200,000	$368,000			$9,200,000	$368,000			$9,200,000		$640,400		$0	$0		$2,940,400

PAGO

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
DORAS: 1)				1	$1,564,000
	230201	800,229,739	0	1	$1,564,000
DORAS: 1)				1	$640,400
	14-11	890,903,790	5	1	$640,400
DORAS: 1)				1	$368,000
	CCF24	860,066,942	7	1	$368,000
DORAS: 1)				1	$368,000
	EPS008	860,066,942	7	1	$368,000
				1	**$2,940,400**

ortes
línea

Planilla Resumen

LES DEL APORTANTE

	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
	7	CONSORCIO DEPORTIVO 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AC 24 51 40	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4672734	SI

LES DE LA LIQUIDACION

	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
lud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
02	498716721	9464100705	Y	2024/03/12	2024/03/06	BANCOLOMBIA	0	$197,900

DETALLADA DE APORTES

PLEADO		NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
ión	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
4755	ADAMES REYES CRISTIAN DANIEL		X					X												0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	1	$48,000	$3,400	0	$0	$0	No	$3,400
7748	DIAZ PEÑUELA MARIA PAULA		X					X												0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	1	$48,000	$3,400	0	$0	$0	No	$3,400
9419	MOLANO BOLIVAR HUGO LEONARDO	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,920,000	$133,700	0	$0	$0	No	$133,700
51	ROMERO CANO ADRIANA MARCELA	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	19	$823,334	$57,400	0	$0	$0	No	$57,400
s(4)																					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,839,334	$197,900		$0	$0		$197,900

ortes
línea

Planilla Resumen

ES DEL APORTANTE

dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
7	CONSORCIO DEPORTIVO 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AC 24 51 40	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4672734	SI

ES DE LA LIQUIDACION

	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2	498716721	9464100705	Y	2024/03/12	2024/03/06	BANCOLOMBIA	0	$197,900

PAGO

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
DORAS: 1)				4	$197,900	$0	$0	$197,900
	14-11	890,903,790	5	4	$197,900	$0	$0	$197,900
				4	**$197,900**	**$0**	**$0**	**$197,900**

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
O	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
:	1013630510	JEIMMY PAOLA MORA OBANDO		carrera 29 no 51b-14 sur	2701835	jeimmymora1102@hotmail.com	
MA TACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-02	I	07/03/2024	74901224	$371.200	

ALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

S	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
	Salud Total EPS	800130907-4	162.500	0		0		0	2	300	0	162.800	1

TOTALES PENSIÓN

P	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
	Proteccion (ING.+ Proteccion)	800229739-0	208.000	0	0	0	0	2	400	0	208.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

L	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

CF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

orte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
	0	0	0	0
ICBF				
	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	162.800
Pensión	1	208.000	208.400
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	370.500	371.200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ortes línea

Planilla Resumen

S DEL APORTANTE

dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
3	CONSTRUCCIONES CIVILES BURGOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIOBUCARAMANGA	calle 136 157 10	BUCARAMANGA-SANTANDER	8537006	SI

S DE LA LIQUIDACION

id	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	502509807	9464164599	E	2024/03/05	2024/03/08	BANCO CAJA SOCIAL	3	$15,097,700

ETALLADA DE APORTES

ADO	NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SORCIOBUCARAMANGA (2 Afiliados)																				$346,668	$55,600			$346,668	$14,000			$346,668	$14,000			$346,668		$24,200		$0	$0		$107,800
BUCARAMANGA (2 Afiliados)																				$346,668	$55,600			$346,668	$14,000			$346,668	$14,000			$346,668		$24,200		$0	$0		$107,800
GA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																				$346,668	$55,600			$346,668	$14,000			$346,668	$14,000			$346,668		$24,200		$0	$0		$107,800
PADRON BETANCOURT JOSE MANUEL		X																23020 1	4	$173,334	$27,800	EPS002	4	$173,334	$7,000	CCF40	4	$173,334	$7,000	14-11	4	$173,334	6.960%	$12,100	4	$0	$0	SI	$53,900
RIVERO RIVERO LUIS ALEJANDRO		X																23030 1	4	$173,334	$27,800	EPS017	4	$173,334	$7,000	CCF40	4	$173,334	$7,000	14-11	4	$173,334	6.960%	$12,100	4	$0	$0	SI	$53,900

ETALLADA DE APORTES

ADO	NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SA BOGOTA (6 Afiliados)																				$5,200,001	$832,100			$5,200,001	$208,100			$5,200,001	$208,100			$5,200,001		$362,100		$0	$0		$1,610,400
BOGOTA (6 Afiliados)																				$5,200,001	$832,100			$5,200,001	$208,100			$5,200,001	$208,100			$5,200,001		$362,100		$0	$0		$1,610,400
pto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)																				$5,200,001	$832,100			$5,200,001	$208,100			$5,200,001	$208,100			$5,200,001		$362,100		$0	$0		$1,610,400
ALBA RODRIGUEZ SEGUNDO TOBIAS																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
GARCIA HERNANDEZ HENRY																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
GUALTEROS FLORIAN JUAN DAVID		X																23030 1	9	$390,000	$62,400	EPS008	9	$390,000	$15,600	CCF24	9	$390,000	$15,600	14-11	9	$390,000	6.960%	$27,200	9	$0	$0	SI	$120,800
MARROQUIN ALVAREZ ALFONSO	X																	23020 1	17	$736,667	$117,900	EPS017	17	$736,667	$29,500	CCF24	17	$736,667	$29,500	14-11	17	$736,667	6.960%	$51,300	17	$0	$0	SI	$228,200
RODRIGUEZ BURGOS PLINIO																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
VALENCIA MONCAYO JOSE RICAURTE		X																25-14	4	$173,334	$27,800	EPS002	4	$173,334	$7,000	CCF24	4	$173,334	$7,000	14-11	4	$173,334	6.960%	$12,100	4	$0	$0	SI	$53,900

DETALLADA DE APORTES

CADO	NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
LLE (36 Afiliados)																				$41,186,671	$6,590,300			$41,186,671	$1,647,900			$41,046,671	$1,642,300			$41,186,671		$2,867,500		$0	$0		$12,748,000
: BOGOTA (36 Afiliados)																				$41,186,671	$6,590,300			$41,186,671	$1,647,900			$41,046,671	$1,642,300			$41,186,671		$2,867,500		$0	$0		$12,748,000
pto: BOGOTA D.E. (36 Afiliados)																				$41,186,671	$6,590,300			$41,186,671	$1,647,900			$41,046,671	$1,642,300			$41,186,671		$2,867,500		$0	$0		$12,748,000
ANGULO ANGULO JUNIOR MAURICIO	X																	23030 1	11	$476,667	$76,300	EPS017	11	$476,667	$19,100	CCF24	11	$476,667	$19,100	14-11	11	$476,667	6.960%	$33,200	11	$0	$0	SI	$147,700
BAEZ DIAZ ISMAEL																		23100 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
BARRETO BARRETO JOSE POMPILIO		X																25-14	4	$173,334	$27,800	EPS008	4	$173,334	$7,000	CCF24	4	$173,334	$7,000	14-11	4	$173,334	6.960%	$12,100	4	$0	$0	SI	$53,900
BOTONERO SANCHEZ LUIS OCTAVIO	X																	23020 1	11	$476,667	$76,300	EPSC34	11	$476,667	$19,100	CCF24	11	$476,667	$19,100	14-11	11	$476,667	6.960%	$33,200	11	$0	$0	SI	$147,700
BRICEÑO GONZALEZ DEIBYS NORGLEYS																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
CABICHE CONDO EHIBAR ADRIAN																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
CAICEDO CAMACHO LUIS BOLIVAR	X																	23030 1	17	$736,667	$117,900	EPS037	17	$736,667	$29,500	CCF24	17	$736,667	$29,500	14-11	17	$736,667	6.960%	$51,300	17	$0	$0	SI	$228,200

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

PO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
C	1013630510	JEIMMY PAOLA MORA OBANDO		carrera 29 no 51b-14 sur	2701835	jeimmymora1102@hotmail.com	
RMA NTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-02	I	07/03/2024	74901224	$371.200	

COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE					INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Extranjero	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
MORA OBANDO JEIMMY PAOLA	3	0			N																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	182.500		0		0		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Planilla Resumen

| | | |

portes
n línea

Planilla Resumen

DETALLADA DE APORTES

EADO		NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
n	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	fge	lma	vac	avp	vct	irl	vlp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
ICINA (2 Afiliados)																					$1,822,134	$291,700			$1,822,134	$73,000			$1,822,134	$73,000			$1,822,134		$126,900		$0	$0		$564,600
: OFICINA (2 Afiliados)																					$1,822,134	$291,700			$1,822,134	$73,000			$1,822,134	$73,000			$1,822,134		$126,900		$0	$0		$564,600
epto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																					$1,822,134	$291,700			$1,822,134	$73,000			$1,822,134	$73,000			$1,822,134		$126,900		$0	$0		$564,600
	MOLINA BECERRA OMAR ANTONIO		X																23020 1	4	$173,334	$27,800	EPS008	4	$173,334	$7,000	CCF24	4	$173,334	$7,000	14-11	4	$173,334	6.960%	$12,100	4	$0	$0	SI	$53,900
	RODRIGUEZ JIMENEZ CLAUDIA YANETH							X											23020 1	30	$1,648,800	$263,900	EPS017	30	$1,648,800	$66,000	CCF24	30	$1,648,800	$66,000	14-11	30	$1,648,800	6.960%	$114,800	30	$0	$0	SI	$510,700
s(48)																					$48,642,142	$7,783,700			$48,642,142	$1,946,600			$48,502,142	$1,941,000			$48,642,142		$3,386,900		$0	$0		$15,058,200

LES DEL APORTANTE

	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
	3	CONSTRUCCIONES CIVILES BURGOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIOBUCARAMANGA	calle 136 157 10	BUCARAMANGA-SANTANDER	8537006	SI

LES DE LA LIQUIDACION

	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
lud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
03	502509807	9464164599	E	2024/03/05	2024/03/08	BANCO CAJA SOCIAL	3	$15,097,700

E PAGO

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ADORAS: 4)				48	$7,783,700	$20,200	$0	$7,803,900
	231001	800,227,940	6	3	$792,000	$2,100	$0	$794,100
S	25-14	900,336,004	7	8	$1,102,600	$2,900	$0	$1,105,500
	230301	800,224,808	8	28	$4,806,800	$12,400	$0	$4,819,200
	230201	800,229,739	0	9	$1,082,300	$2,800	$0	$1,085,100
ADORAS: 1)				48	$3,386,900	$8,700	$0	$3,395,600
	14-11	890,903,790	5	48	$3,386,900	$8,700	$0	$3,395,600
ADORAS: 2)				48	$1,941,000	$5,100	$0	$1,946,100
SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	$14,000	$100	$0	$14,100
	CCF24	860,066,942	7	46	$1,927,000	$5,000	$0	$1,932,000
DORAS: 8)				48	$1,946,600	$5,500	$0	$1,952,100
	CCFC55	901,543,211	6	1	$1,800	$100	$0	$1,900
D	EPSC34	900,298,372	9	1	$19,100	$100	$0	$19,200
	EPS008	860,066,942	7	6	$100,800	$300	$0	$101,100
	EPS017	830,003,564	7	18	$846,600	$2,200	$0	$848,800
	EPSIC5	837,000,084	5	1	$7,000	$100	$0	$7,100
	EPS037	900,156,264	2	6	$317,700	$900	$0	$318,600
	EPS002	800,130,907	4	13	$549,600	$1,500	$0	$551,100
	EPS005	800,251,440	6	2	$104,000	$300	$0	$104,300
				48	$15,058,200	$39,500	$0	$15,097,700

ortes línea

Planilla Resumen

S DEL APORTANTE

dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
1	ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV CR 24 51 40	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4672734	SI

S DE LA LIQUIDACION

	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
id	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	498360576	9464091820	E	2024/03/11	2024/03/06	BANCOLOMBIA		$55,529,000

ETALLADA DE APORTES

ADO	NOVEDADES		PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
NCIPAL (9 Afiliados)					$28,915,000	$4,718,400			$28,915,000	$1,156,600			$27,640,000	$1,105,600			$28,915,000		$1,382,200		$0	$0		$8,362,800
CENTRO TRABAJO 1 (2 Afiliados)					$7,000,000	$1,120,000			$7,000,000	$280,000			$7,000,000	$280,000			$7,000,000		$487,300		$0	$0		$2,167,300
to: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)					$7,000,000	$1,120,000			$7,000,000	$280,000			$7,000,000	$280,000			$7,000,000		$487,300		$0	$0		$2,167,300
CARTAGENA ZARTA GERALDINE			230301	30	$3,100,000	$496,000	EPS017	30	$3,100,000	$124,000	CCF24	30	$3,100,000	$124,000	14-11	30	$3,100,000	6.960%	$215,800	30	$0	$0	SI	$959,800
MORA OBANDO JEIMMY PAOLA			230201	30	$3,900,000	$624,000	EPS002	30	$3,900,000	$156,000	CCF24	30	$3,900,000	$156,000	14-11	30	$3,900,000	6.960%	$271,500	30	$0	$0	SI	$1,207,500
OFICINA 5 (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$1,000,000	$40,000			$2,000,000		$69,600		$0	$0		$509,600
to: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$1,000,000	$40,000			$2,000,000		$69,600		$0	$0		$509,600
OCAMPO DUARTE NICOLAS	lma		230301	18	$1,000,000	$160,000	EPS008	18	$1,000,000	$40,000	CCF24	0	$0	$0	14-11	18	$1,000,000	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$200,000
OCAMPO DUARTE NICOLAS			230301	12	$1,000,000	$160,000	EPS008	12	$1,000,000	$40,000	CCF24	12	$1,000,000	$40,000	14-11	12	$1,000,000	6.960%	$69,600	12	$0	$0	SI	$309,600
R1 PERSONAR OFIC (3 Afiliados)					$7,315,000	$1,170,400			$7,315,000	$292,600			$7,040,000	$281,600			$7,315,000		$36,900		$0	$0		$1,781,500
to: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)					$7,315,000	$1,170,400			$7,315,000	$292,600			$7,040,000	$281,600			$7,315,000		$36,900		$0	$0		$1,781,500
DUARTE LEON MARTHA JOSEFA			25-14	30	$4,015,000	$642,400	EPS005	30	$4,015,000	$160,600	CCF24	30	$4,015,000	$160,600	14-11	30	$4,015,000	0.522%	$21,000	30	$0	$0	SI	$984,600
FERIA SALCEDO MELISSA	lma		230301	3	$165,000	$26,400	EPS008	3	$165,000	$6,600	CCF24	0	$0	$0	14-11	3	$165,000	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$33,000
FERIA SALCEDO MELISSA			230301	27	$1,485,000	$237,600	EPS008	27	$1,485,000	$59,400	CCF24	27	$1,485,000	$59,400	14-11	27	$1,485,000	0.522%	$7,800	27	$0	$0	SI	$364,200
MALAGON SANABRIA LAURA LIZETH	lma		230301	2	$110,000	$17,600	EPS005	2	$110,000	$4,400	CCF24	0	$0	$0	14-11	2	$110,000	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$22,000
MALAGON SANABRIA LAURA LIZETH			230301	28	$1,540,000	$246,400	EPS005	28	$1,540,000	$61,600	CCF24	28	$1,540,000	$61,600	14-11	28	$1,540,000	0.522%	$8,100	28	$0	$0	SI	$377,700
R4 PERSONAL OFC (2 Afiliados)					$3,400,000	$544,000			$3,400,000	$136,000			$3,400,000	$136,000			$3,400,000		$148,000		$0	$0		$964,000
pto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)					$3,400,000	$544,000			$3,400,000	$136,000			$3,400,000	$136,000			$3,400,000		$148,000		$0	$0		$964,000
FUNEME FUNEME ALEXANDER			230201	30	$1,900,000	$304,000	EPS002	30	$1,900,000	$76,000	CCF24	30	$1,900,000	$76,000	14-11	30	$1,900,000	4.350%	$82,700	30	$0	$0	SI	$538,700
TORRES NARANJO FRANSISCO ANDREY			25-14	30	$1,500,000	$240,000	MIN001	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	4.350%	$65,300	30	$0	$0	SI	$425,300
R5 PERSONAL OFIC (1 Afiliados)					$9,200,000	$1,564,000			$9,200,000	$368,000			$9,200,000	$368,000			$9,200,000		$640,400		$0	$0		$2,940,400
pto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$9,200,000	$1,564,000			$9,200,000	$368,000			$9,200,000	$368,000			$9,200,000		$640,400		$0	$0		$2,940,400
PARDO AVILA IVAN ALONSO			230201	30	$9,200,000	$1,564,000	EPS008	30	$9,200,000	$368,000	CCF24	30	$9,200,000	$368,000	14-11	30	$9,200,000	6.960%	$640,400	30	$0	$0	SI	$2,940,400
(9)					$28,915,000	$4,718,400			$28,915,000	$1,156,600			$27,640,000	$1,105,600			$28,915,000		$1,382,200		$0	$0		$8,362,800

PAGO

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
DORAS: 3)				9	$4,718,400
S	25-14	900,336,004	7	2	$882,400
	230301	800,224,808	8	4	$1,344,000
	230201	800,229,739	0	3	$2,492,000
DORAS: 1)				9	$1,382,200
	14-11	890,903,790	5	9	$1,382,200

Planilla Resumen

E PAGO

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
ADORAS: 1)				9	$1,105,600
	CCF24	860,066,942	7	9	$1,105,600
ADORAS: 5)				9	$1,156,600
	EPS008	860,066,942	7	3	$514,000
	EPS017	830,003,564	7	1	$124,000
	MIN001	901,037,916	1	1	$60,000
	EPS002	800,130,907	4	2	$232,000
	EPS005	800,251,440	6	2	$226,600
				9	$8,362,800

Planilla Resumen

ES DEL APORTANTE

	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
	1	ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV CR 24 51 40	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4672734	SI

ES DE LA LIQUIDACION

	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
lud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
4	567790591	9465555917	E	2024/04/09	2024/04/10	BANCOLOMBIA		$48,546,900

DETALLADA DE APORTES

CADO	NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
INCIPAL (9 Afiliados)																				$29,053,890	$4,740,700			$29,053,890	$1,162,200			$28,331,667	$1,133,300			$29,053,890		$1,412,800		$0	$0		$8,449,000
: CENTRO TRABAJO 1 (2 Afiliados)																				$7,000,000	$1,120,000			$7,000,000	$280,000			$7,000,000	$280,000			$7,000,000		$487,300		$0	$0		$2,167,300
pto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																				$7,000,000	$1,120,000			$7,000,000	$280,000			$7,000,000	$280,000			$7,000,000		$487,300		$0	$0		$2,167,300
CARTAGENA ZARTA GERALDINE																		23030 1	30	$3,100,000	$496,000	EPS017	30	$3,100,000	$124,000	CCF24	30	$3,100,000	$124,000	14-11	30	$3,100,000	6.960%	$215,800	30	$0	$0	SI	$959,800
MORA OBANDO JEIMMY PAOLA																		23020 1	30	$3,900,000	$624,000	EPS002	30	$3,900,000	$156,000	CCF24	30	$3,900,000	$156,000	14-11	30	$3,900,000	6.960%	$271,500	30	$0	$0	SI	$1,207,500
: OFICINA 5 (1 Afiliados)																				$2,138,890	$342,300			$2,138,890	$85,600			$1,416,667	$56,700			$2,138,890		$98,700		$0	$0		$583,300
pto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																				$2,138,890	$342,300			$2,138,890	$85,600			$1,416,667	$56,700			$2,138,890		$98,700		$0	$0		$583,300
OCAMPO DUARTE NICOLAS											X							23030 1	13	$722,223	$115,600	EPS008	13	$722,223	$28,900	CCF24	0	$0	$0	14-11	13	$722,223	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$144,500
OCAMPO DUARTE NICOLAS		X																23030 1	17	$1,416,667	$226,700	EPS008	17	$1,416,667	$56,700	CCF24	17	$1,416,667	$56,700	14-11	17	$1,416,667	6.960%	$98,700	17	$0	$0	SI	$438,800
: R1 PERSONAR OFIC (3 Afiliados)																				$7,315,000	$1,170,400			$7,315,000	$292,600			$7,315,000	$292,600			$7,315,000		$38,400		$0	$0		$1,794,000
pto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																				$7,315,000	$1,170,400			$7,315,000	$292,600			$7,315,000	$292,600			$7,315,000		$38,400		$0	$0		$1,794,000
DUARTE LEON MARTHA JOSEFA																		25-14	30	$4,015,000	$642,400	EPS005	30	$4,015,000	$160,600	CCF24	30	$4,015,000	$160,600	14-11	30	$4,015,000	0.522%	$21,000	30	$0	$0	SI	$984,600
FERIA SALCEDO MELISSA																		23030 1	30	$1,650,000	$264,000	EPS008	30	$1,650,000	$66,000	CCF24	30	$1,650,000	$66,000	14-11	30	$1,650,000	0.522%	$8,700	30	$0	$0	SI	$404,700
MALAGON SANABRIA LAURA LIZETH																		23030 1	30	$1,650,000	$264,000	EPS005	30	$1,650,000	$66,000	CCF24	30	$1,650,000	$66,000	14-11	30	$1,650,000	0.522%	$8,700	30	$0	$0	SI	$404,700
: R4 PERSONAL OFC (2 Afiliados)																				$3,400,000	$544,000			$3,400,000	$136,000			$3,400,000	$136,000			$3,400,000		$148,000		$0	$0		$964,000
pto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																				$3,400,000	$544,000			$3,400,000	$136,000			$3,400,000	$136,000			$3,400,000		$148,000		$0	$0		$964,000
FUNEME FUNEME ALEXANDER																		23020 1	30	$1,900,000	$304,000	EPS002	30	$1,900,000	$76,000	CCF24	30	$1,900,000	$76,000	14-11	30	$1,900,000	4.350%	$82,700	30	$0	$0	SI	$538,700
TORRES NARANJO FRANSISCO ANDREY																		25-14	30	$1,500,000	$240,000	MIN001	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	4.350%	$65,300	30	$0	$0	SI	$425,300
: R5 PERSONAL OFIC (1 Afiliados)																				$9,200,000	$1,564,000			$9,200,000	$368,000			$9,200,000	$368,000			$9,200,000		$640,400		$0	$0		$2,940,400
pto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																				$9,200,000	$1,564,000			$9,200,000	$368,000			$9,200,000	$368,000			$9,200,000		$640,400		$0	$0		$2,940,400
PARDO AVILA IVAN ALONSO																		23020 1	30	$9,200,000	$1,564,000	EPS008	30	$9,200,000	$368,000	CCF24	30	$9,200,000	$368,000	14-11	30	$9,200,000	6.960%	$640,400	30	$0	$0	SI	$2,940,400
s(9)																				$29,053,890	$4,740,700			$29,053,890	$1,162,200			$28,331,667	$1,133,300			$29,053,890		$1,412,800		$0	$0		$8,449,000

E PAGO

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
ADORAS: 3)				9	$4,740,700
ES	25-14	900,336,004	7	2	$882,400
	230301	800,224,808	8	4	$1,366,300
	230201	800,229,739	0	3	$2,492,000
ADORAS: 1)				9	$1,412,800
	14-11	890,903,790	5	9	$1,412,800
ADORAS: 1)				9	$1,133,300
	CCF24	860,066,942	7	9	$1,133,300

Planilla Resumen

E PAGO

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
ADORAS: 5)				9	$1,162,200
	EPS008	860,066,942	7	3	$519,600
	EPS017	830,003,564	7	1	$124,000
	MIN001	901,037,916	1	1	$60,000
	EPS002	800,130,907	4	2	$232,000
	EPS005	800,251,440	6	2	$226,600
				9	$8,449,000

ortes línea

Planilla Resumen

S DEL APORTANTE

dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
3	CONSTRUCCIONES CIVILES BURGOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIOBUCARAMANGA	calle 136 157 10	BUCARAMANGA-SANTANDER	8537006	SI

S DE LA LIQUIDACION

	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
4	555485231	9465381462	E	2024/04/03	2024/04/04	BANCO CAJA SOCIAL	1	$16,136,700

ETALLADA DE APORTES

ADO	NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	fge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
A BOGOTA (5 Afiliados)																				$5,373,335	$859,900			$5,373,335	$215,100			$5,373,335	$215,100			$5,373,335		$374,200		$0	$0		$1,664,300
BOGOTA (5 Afiliados)																				$5,373,335	$859,900			$5,373,335	$215,100			$5,373,335	$215,100			$5,373,335		$374,200		$0	$0		$1,664,300
to: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																				$5,373,335	$859,900			$5,373,335	$215,100			$5,373,335	$215,100			$5,373,335		$374,200		$0	$0		$1,664,300
ALBA RODRIGUEZ SEGUNDO TOBIAS																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
GARCIA HERNANDEZ LUIS MIGUEL	X																	23030 1	22	$953,334	$152,600	EPS005	22	$953,334	$38,200	CCF24	22	$953,334	$38,200	14-11	22	$953,334	6.960%	$66,400	22	$0	$0	SI	$295,400
MARROQUIN ALVAREZ ALFONSO		X																23020 1	16	$693,334	$111,000	EPS017	16	$693,334	$27,800	CCF24	16	$693,334	$27,800	14-11	16	$693,334	6.960%	$48,300	16	$0	$0	SI	$214,900
RODRIGUEZ BURGOS PLINIO																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
VALDERRAMA RODRIGUEZ JOSE MANUEL	X	X																25-14	26	$1,126,667	$180,300	EPS002	26	$1,126,667	$45,100	CCF24	26	$1,126,667	$45,100	14-11	26	$1,126,667	6.960%	$78,500	26	$0	$0	SI	$349,000

ETALLADA DE APORTES

ADO	NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	fge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
LE (33 Afiliados)																				$45,620,135	$7,263,000			$45,620,135	$1,788,600			$45,480,135	$1,783,000			$45,620,135		$3,112,700		$0	$0		$13,947,300

oortes
n línea

Planilla Resumen

| | | |

Planilla Resumen

ADO	NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
CINA (1 Afiliados)																				$1,648,800	$263,900			$1,648,800	$66,000			$1,648,800	$66,000			$1,648,800		$114,800		$0	$0		$510,700
: OFICINA (1 Afiliados)																				$1,648,800	$263,900			$1,648,800	$66,000			$1,648,800	$66,000			$1,648,800		$114,800		$0	$0		$510,700
pto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																				$1,648,800	$263,900			$1,648,800	$66,000			$1,648,800	$66,000			$1,648,800		$114,800		$0	$0		$510,700
RODRIGUEZ JIMENEZ CLAUDIA YANETH																		23020 1	30	$1,648,800	$263,900	EPS017	30	$1,648,800	$66,000	CCF24	30	$1,648,800	$66,000	14-11	30	$1,648,800	6.960%	$114,800	30	$0	$0	SI	$510,700
(39)																				$52,642,270	$8,386,800			$52,642,270	$2,069,700			$52,502,270	$2,064,100			$52,642,270		$3,601,700		$0	$0		$16,122,300

ES DEL APORTANTE

	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
	3	CONSTRUCCIONES CIVILES BURGOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIOBUCARAMANGA	calle 136 157 10	BUCARAMANGA-SANTANDER	8537006	SI

ES DE LA LIQUIDACION

	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
lud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
04	555485231	9465381462	E	2024/04/03	2024/04/04	BANCO CAJA SOCIAL	1	$16,136,700

E PAGO

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ADORAS: 4)				39	$8,386,800	$7,400	$0	$8,394,200
	231001	800,227,940	6	2	$688,000	$600	$0	$688,600
ES	25-14	900,336,004	7	6	$1,220,300	$1,100	$0	$1,221,400
	230301	800,224,808	8	24	$5,063,600	$4,400	$0	$5,068,000
	230201	800,229,739	0	7	$1,414,900	$1,300	$0	$1,416,200
ADORAS: 1)				39	$3,601,700	$3,100	$0	$3,604,800
	14-11	890,903,790	5	39	$3,601,700	$3,100	$0	$3,604,800
ADORAS: 1)				39	$2,064,100	$1,800	$0	$2,065,900
	CCF24	860,066,942	7	39	$2,064,100	$1,800	$0	$2,065,900
ADORAS: 6)				39	$2,069,700	$2,100	$0	$2,071,800
	EPS008	860,066,942	7	1	$52,000	$100	$0	$52,100
	EPS017	830,003,564	7	16	$923,300	$800	$0	$924,100
	EPSIC5	837,000,084	5	1	$52,000	$100	$0	$52,100
	EPS037	900,156,264	2	6	$373,100	$400	$0	$373,500
L	EPS002	800,130,907	4	12	$527,100	$500	$0	$527,600
	EPS005	800,251,440	6	3	$142,200	$200	$0	$142,400
				39	**$16,122,300**	**$14,400**	**$0**	**$16,136,700**

aportes en línea

Planilla Resumen

LES DEL APORTANTE

	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
	1	ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV CR 24 51 40	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4672734	SI

LES DE LA LIQUIDACION

	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ilud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
04	567790591	9465555917	E	2024/04/09	2024/04/10	BANCOLOMBIA		$48,546,900

DETALLADA DE APORTES

EADO		NOVEDADES		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
INCIPAL (1 Afiliados)					$9,200,000	$1,564,000			$9,200,000	$368,000			$9,200,000	$368,000			$9,200,000		$640,400		$0	$0		$2,940,400
: R5 PERSONAL OFIC (1 Afiliados)					$9,200,000	$1,564,000			$9,200,000	$368,000			$9,200,000	$368,000			$9,200,000		$640,400		$0	$0		$2,940,400
pto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$9,200,000	$1,564,000			$9,200,000	$368,000			$9,200,000	$368,000			$9,200,000		$640,400		$0	$0		$2,940,400
	PARDO AVILA IVAN ALONSO		23020 1	30	$9,200,000	$1,564,000	EPS008	30	$9,200,000	$368,000	CCF24	30	$9,200,000	$368,000	14-11	30	$9,200,000	6.960%	$640,400	30	$0	$0	SI	$2,940,400
s(1)					$9,200,000	$1,564,000			$9,200,000	$368,000			$9,200,000	$368,000			$9,200,000		$640,400		$0	$0		$2,940,400

E PAGO

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
DORAS: 1)				1	$1,564,000
	230201	800,229,739	0	1	$1,564,000
DORAS: 1)				1	$640,400
	14-11	890,903,790	5	1	$640,400
DORAS: 1)				1	$368,000
	CCF24	860,066,942	7	1	$368,000
DORAS: 1)				1	$368,000
	EPS008	860,066,942	7	1	$368,000
				1	**$2,940,400**

ortes
línea

Planilla Resumen

ES DEL APORTANTE

dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
	MOLANO BOLIVAR HUGO LEONARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 27 No. 24 - 30 Interior 1	DUITAMA-BOYACA	3005774846	No

ES DE LA LIQUIDACION

ud	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
3	541860321	9465048407	I	2024/04/04	2024/04/01	BANCOLOMBIA	0	$585,600

ETALLADA DE APORTES

LEADO		NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
ón	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	fge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
419	MOLANO HUGO																		230201	30	$1,920,000	$307,200	EPS017	30	$1,920,000	$240,000	CCF10	30	$1,920,000	$38,400		0	$0	$0	30	$0	$0	No	$585,600
(1)																					$1,920,000	$307,200			$1,920,000	$240,000			$1,920,000	$38,400			$0	$0		$0	$0		$585,600

ortes
línea

Planilla Resumen

LES DEL APORTANTE

dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
	MOLANO BOLIVAR HUGO LEONARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 27 No. 24 - 30 Interior 1	DUITAMA-BOYACA	3005774846	No

LES DE LA LIQUIDACION

	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
liud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
03	541860321	9465048407	I	2024/04/04	2024/04/01	BANCOLOMBIA	0	$585,600

E PAGO

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ADORAS: 1)				1	$307,200	$0	$0	$307,200
	230201	800,229,739	0	1	$307,200	$0	$0	$307,200
ADORAS: 1)				1	$38,400	$0	$0	$38,400
	CCF10	891,800,213	8	1	$38,400	$0	$0	$38,400
ADORAS: 1)				1	$240,000	$0	$0	$240,000
	EPS017	830,003,564	7	1	$240,000	$0	$0	$240,000
				1	**$585,600**	**$0**	**$0**	**$585,600**

ortes
línea

Planilla Resumen

ES DEL APORTANTE

dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
7	CONSORCIO DEPORTIVO 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AC 24 51 40	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	4672734	SI

ES DE LA LIQUIDACION

	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
3	567953776	9464815852	Y	2024/04/10	2024/04/11	BANCOLOMBIA	1	$224,400

ETALLADA DE APORTES

LEADO		NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
n	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	fge	lma	vac	avp	vct	irl	vlp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
419	MOLANO BOLIVAR HUGO LEONARDO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,920,000	$133,700	0	$0	$0	No	$133,700
1	ROMERO CANO ADRIANA MARCELA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500
(2)																					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,220,000	$224,200		$0	$0		$224,200

)ortes
línea

Planilla Resumen

LES DEL APORTANTE

	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
	7	CONSORCIO DEPORTIVO 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AC 24 51 40	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	4672734	SI

LES DE LA LIQUIDACION

	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ılud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
03	567953776	9464815852	Y	2024/04/10	2024/04/11	BANCOLOMBIA	1	$224,400

E PAGO

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ADORAS: 1)				2	$224,200	$200	$0	$224,400
	14-11	890,903,790	5	2	$224,200	$200	$0	$224,400
				2	**$224,200**	**$200**	**$0**	**$224,400**

2024/04/10 04:40 PM

rtes
inea

Planilla Resumen

S DEL APORTANTE

dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
7	CONSORCIO DEPORTIVO 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AC 24 51 40	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	4672734	SI

S DE LA LIQUIDACION

	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
d	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	567953776	9465398483	E	2024/04/10	2024/04/11	BANCOLOMBIA	1	$604,600

TALLADA DE APORTES

EADO		NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
	Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	Irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
5	JIMENEZ CORTES LEYDI CLEMENCIA		X																230301	15	$650,000	$104,000	EPSC34	15	$650,000	$26,000	CCF24	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$650,000	$45,300	15	$0	$0	SI	$201,300
8	VILLEGAS LEON MARISOL																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCFZ4	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
2)																					$1,950,000	$312,000			$1,950,000	$78,000			$1,950,000	$78,000			$1,950,000	$135,800		$0	$0		$603,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901771549	7	CONSORCIO DEPORTIVO 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AC 24 51 40	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	4672734	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	567953776	9465398483	E	2024/04/10	2024/04/11	BANCOLOMBIA	1	$604,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$312,000	$300	$0	$312,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$104,000	$100	$0	$104,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$200	$0	$208,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$135,800	$200	$0	$136,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$135,800	$200	$0	$136,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$78,000	$100	$0	$78,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	2	$78,000	$100	$0	$78,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$78,000	$200	$0	$78,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$26,000	$100	$0	$26,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$52,000	$100	$0	$52,100
TOTAL				**2**	**$603,800**	**$800**	**$0**	**$604,600**

rtes
línea

Planilla Resumen

S DEL APORTANTE

dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
7	CONSORCIO DEPORTIVO 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AC 24 51 40	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	4672734	SI

S DE LA LIQUIDACION

	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
d	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	567953776	9464815852	Y	2024/04/10	2024/04/11	BANCOLOMBIA	1	$224,400

ETALLADA DE APORTES

EADO		NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
9	MOLANO BOLIVAR HUGO LEONARDO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,920,000	$133,700	0	$0	$0	No	$133,700
	ROMERO CANO ADRIANA MARCELA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500
2)																					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,220,000	$224,200		$0	$0		$224,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901771549	7	CONSORCIO DEPORTIVO 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AC 24 51 40	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	4672734	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	567953776	9464815852	Y	2024/04/10	2024/04/11	BANCOLOMBIA	1	$224,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$224,200	$200	$0	$224,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$224,200	$200	$0	$224,400
TOTAL				2	$224,200	$200	$0	$224,400

ortes
línea

Planilla Resumen

ES DEL APORTANTE

dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
1	ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV CR 24 51 40	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4672734	SI

ES DE LA LIQUIDACION

	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
5	629743687	9466985443	E	2024/05/10	2024/05/09	BANCOLOMBIA		$33,478,500

ETALLADA DE APORTES

ADO	NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
NCIPAL (1 Afiliados)																				**$9,200,000**	**$1,564,000**			**$9,200,000**	**$368,000**			**$9,200,000**	**$368,000**			**$9,200,000**		**$640,400**		**$0**	**$0**		**$2,940,400**
R5 PERSONAL OFIC (1 Afiliados)																				$9,200,000	$1,564,000			$9,200,000	$368,000			$9,200,000	$368,000			$9,200,000		$640,400		$0	$0		$2,940,400
oto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																				$9,200,000	$1,564,000			$9,200,000	$368,000			$9,200,000	$368,000			$9,200,000		$640,400		$0	$0		$2,940,400
PARDO AVILA IVAN ALONSO																		23020 1	30	$9,200,000	$1,564,000	EPS008	30	$9,200,000	$368,000	CCF24	30	$9,200,000	$368,000	14-11	30	$9,200,000	6.960%	$640,400	30	$0	$0	SI	$2,940,400
(1)																				$9,200,000	$1,564,000			$9,200,000	$368,000			$9,200,000	$368,000			$9,200,000		$640,400		$0	$0		$2,940,400

PAGO

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
DORAS: 1)				1	$1,564,000
	230201	800,229,739	0	1	$1,564,000
DORAS: 1)				1	$640,400
	14-11	890,903,790	5	1	$640,400
DORAS: 1)				1	$368,000
	CCF24	860,066,942	7	1	$368,000
DORAS: 1)				1	$368,000
	EPS008	860,066,942	7	1	$368,000
				1	**$2,940,400**

oortes
n línea

Planilla Resumen

ES DEL APORTANTE

	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
	1	ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV CR 24 51 40	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4672734	SI

ES DE LA LIQUIDACION

	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ilud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
05	629743687	9466985443	E	2024/05/10	2024/05/09	BANCOLOMBIA		$33,478,500

DETALLADA DE APORTES

EADO	NOVEDADES		PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS					PARAFISCALES				
Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst stn fge lma vac avp vct irl vlp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
INCIPAL (7 Afiliados)				$14,718,334	$2,355,000			$14,718,334	$588,800			$14,718,334	$588,800			$14,718,334		$465,100		$0	$0		$3,997,700
: CENTRO TRABAJO 1 (2 Afiliados)				$4,003,334	$640,600			$4,003,334	$160,200			$4,003,334	$160,200			$4,003,334		$278,700		$0	$0		$1,239,700
pto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)				$4,003,334	$640,600			$4,003,334	$160,200			$4,003,334	$160,200			$4,003,334		$278,700		$0	$0		$1,239,700
CARTAGENA ZARTA GERALDINE	X	230301	1	$103,334	$16,600	EPS017	1	$103,334	$4,200	CCF24	1	$103,334	$4,200	14-11	1	$103,334	6.960%	$7,200	1	$0	$0	SI	$32,200
MORA OBANDO JEIMMY PAOLA		230201	30	$3,900,000	$624,000	EPS002	30	$3,900,000	$156,000	CCF24	30	$3,900,000	$156,000	14-11	30	$3,900,000	6.960%	$271,500	30	$0	$0	SI	$1,207,500
: R1 PERSONAR OFIC (3 Afiliados)				$7,315,000	$1,170,400			$7,315,000	$292,600			$7,315,000	$292,600			$7,315,000		$38,400		$0	$0		$1,794,000
pto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)				$7,315,000	$1,170,400			$7,315,000	$292,600			$7,315,000	$292,600			$7,315,000		$38,400		$0	$0		$1,794,000
DUARTE LEON MARTHA JOSEFA		25-14	30	$4,015,000	$642,400	EPS005	30	$4,015,000	$160,600	CCF24	30	$4,015,000	$160,600	14-11	30	$4,015,000	0.522%	$21,000	30	$0	$0	SI	$984,600
FERIA SALCEDO MELISSA		230301	30	$1,650,000	$264,000	EPS008	30	$1,650,000	$66,000	CCF24	30	$1,650,000	$66,000	14-11	30	$1,650,000	0.522%	$8,700	30	$0	$0	SI	$404,700
MALAGON SANABRIA LAURA LIZETH		230301	30	$1,650,000	$264,000	EPS005	30	$1,650,000	$66,000	CCF24	30	$1,650,000	$66,000	14-11	30	$1,650,000	0.522%	$8,700	30	$0	$0	SI	$404,700
: R4 PERSONAL OFC (2 Afiliados)				$3,400,000	$544,000			$3,400,000	$136,000			$3,400,000	$136,000			$3,400,000		$148,000		$0	$0		$964,000
pto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)				$3,400,000	$544,000			$3,400,000	$136,000			$3,400,000	$136,000			$3,400,000		$148,000		$0	$0		$964,000
FUNEME FUNEME ALEXANDER		230201	30	$1,900,000	$304,000	EPS002	30	$1,900,000	$76,000	CCF24	30	$1,900,000	$76,000	14-11	30	$1,900,000	4.350%	$82,700	30	$0	$0	SI	$538,700
TORRES NARANJO FRANSISCO ANDREY		25-14	30	$1,500,000	$240,000	MIN001	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	4.350%	$65,300	30	$0	$0	SI	$425,300
:(7)				$14,718,334	$2,355,000			$14,718,334	$588,800			$14,718,334	$588,800			$14,718,334		$465,100		$0	$0		$3,997,700

: PAGO

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
DORAS: 3)				7	$2,355,000
S	25-14	900,336,004	7	2	$882,400
	230301	800,224,808	8	3	$544,600
	230201	800,229,739	0	2	$928,000
DORAS: 1)				7	$465,100
	14-11	890,903,790	5	7	$465,100
DORAS: 1)				7	$588,800
	CCF24	860,066,942	7	7	$588,800
DORAS: 5)				7	$588,800
	EPS008	860,066,942	7	1	$66,000
	EPS017	830,003,564	7	1	$4,200
	MIN001	901,037,916	1	1	$60,000
	EPS002	800,130,907	4	2	$232,000
	EPS005	800,251,440	6	2	$226,600
				7	$3,997,700

ortes
línea

Planilla Resumen

ES DEL APORTANTE

dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
	MOLANO BOLIVAR HUGO LEONARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 27 No. 24 - 30 Interior 1	DUITAMA-BOYACA	3005774846	No

ES DE LA LIQUIDACION

	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
4	590313330	9465908233	I	2024/05/07	2024/04/22	BANCOLOMBIA	0	$585,600

DETALLADA DE APORTES

LEADO		NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
ón	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	fge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
419	MOLANO HUGO																		230201	30	$1,920,000	$307,200	EPS017	30	$1,920,000	$240,000	CCF10	30	$1,920,000	$38,400		0	$0	$0	30	$0	$0	No	$585,600
(1)																					$1,920,000	$307,200			$1,920,000	$240,000			$1,920,000	$38,400			$0	$0		$0	$0		$585,600

ortes
línea

Planilla Resumen

LES DEL APORTANTE

	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
		MOLANO BOLIVAR HUGO LEONARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 27 No. 24 - 30 interior 1	DUITAMA-BOYACA	3005774846	No

LES DE LA LIQUIDACION

	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
lud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
04	590313330	9465908233	I	2024/05/07	2024/04/22	BANCOLOMBIA	0	$585,600

E PAGO

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ADORAS: 1)				1	$307,200	$0	$0	$307,200
	230201	800,229,739	0	1	$307,200	$0	$0	$307,200
ADORAS: 1)				1	$38,400	$0	$0	$38,400
	CCF10	891,800,213	8	1	$38,400	$0	$0	$38,400
DORAS: 1)				1	$240,000	$0	$0	$240,000
	EPS017	830,003,564	7	1	$240,000	$0	$0	$240,000
				1	$585,600	$0	$0	$585,600

ortes línea

Planilla Resumen

S DEL APORTANTE

dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
3	CONSTRUCCIONES CIVILES BURGOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIOBUCARAMANGA	calle 136 157 10	BUCARAMANGA-SANTANDER	8537006	SI

S DE LA LIQUIDACION

	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ıd	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
5	628145926	9466954695	E	2024/05/06	2024/05/09	BANCO CAJA SOCIAL	3	$18,188,400

ETALLADA DE APORTES

ADO	NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
ON (3 Afiliados)																				**$1,646,667**	**$263,500**			**$1,646,667**	**$65,900**			**$1,646,667**	**$65,900**			**$1,646,667**		**$114,700**		**$0**	**$0**		**$510,000**
BOGOTA (3 Afiliados)																				$1,646,667	$263,500			$1,646,667	$65,900			$1,646,667	$65,900			$1,646,667		$114,700		$0	$0		$510,000
to: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																				$1,646,667	$263,500			$1,646,667	$65,900			$1,646,667	$65,900			$1,646,667		$114,700		$0	$0		$510,000
GARZON CASTILLO BLAS MARIA	X																	25-14	12	$520,000	$83,200	EPS037	12	$520,000	$20,800	CCF24	12	$520,000	$20,800	14-11	12	$520,000	6.960%	$36,200	12	$0	$0	SI	$161,000
LOZANO GUZMAN YUBANIS	X																	23030 1	11	$476,667	$76,300	EPSC34	11	$476,667	$19,100	CCF24	11	$476,667	$19,100	14-11	11	$476,667	6.960%	$33,200	11	$0	$0	SI	$147,700
RENDON GONZALEZ GIOVANNY ANDRES	X																	25-14	15	$650,000	$104,000	EPS002	15	$650,000	$26,000	CCF24	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$650,000	6.960%	$45,300	15	$0	$0	SI	$201,300

ETALLADA DE APORTES

ADO	NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
LE (40 Afiliados)																				**$49,158,669**	**$7,865,700**			**$49,158,669**	**$1,966,700**			**$49,018,669**	**$1,961,100**			**$49,158,669**		**$3,422,700**		**$0**	**$0**		**$15,216,200**
: BOGOTA (40 Afiliados)																				$49,158,669	$7,865,700			$49,158,669	$1,966,700			$49,018,669	$1,961,100			$49,158,669		$3,422,700		$0	$0		$15,216,200
to: BOGOTA D.E. (40 Afiliados)																				$49,158,669	$7,865,700			$49,158,669	$1,966,700			$49,018,669	$1,961,100			$49,158,669		$3,422,700		$0	$0		$15,216,200
ALBA RODRIGUEZ SEGUNDO TOBIAS								X										23030 1	30	$1,936,800	$309,900	EPS037	30	$1,936,800	$77,500	CCF24	30	$1,936,800	$77,500	14-11	30	$1,936,800	6.960%	$134,900	30	$0	$0	SI	$599,800
ANGULO ANGULO JUNIOR MAURICIO																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
BAEZ DIAZ ISMAEL																		23100 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
BOTONERO SANCHEZ LUIS OCTAVIO																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
CABICHE CONDO EDERSON	X																	23030 1	15	$650,000	$104,000	EPS002	15	$650,000	$26,000	CCF24	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$650,000	6.960%	$45,300	15	$0	$0	SI	$201,300
CABICHE CONDO EHIBAR ADRIAN																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
CAICEDO CAMACHO LUIS BOLIVAR																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
CAMARGO YENERIS DEIMER JOSE																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
CARRERO HERNANDEZ LUIS HERNANDO																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
CARRERO HERNANDEZ OMAR																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
CUERO GRANJA LUIS GERARDO																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
DIAZ CHICO SERGIO ALBERTO																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
FUENTES DAVID																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
GARCIA HERNANDEZ HENRY	X	X																23030 1	2	$86,667	$13,900	EPS005	2	$86,667	$3,500	CCF24	2	$86,667	$3,500	14-11	2	$86,667	6.960%	$6,100	2	$0	$0	SI	$27,000
GARCIA HERNANDEZ LUIS MIGUEL																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
GARCIA BUITRAGO PUBLIO																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
GONZALEZ PARRAGA JOSE YOAN																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500

Planilla Resumen

| | | |

ortes
línea

Planilla Resumen

| | | |

oortes
n línea

Planilla Resumen

LES DEL APORTANTE

	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
	3	CONSTRUCCIONES CIVILES BURGOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIOBUCARAMANGA	calle 136 157 10	BUCARAMANGA-SANTANDER	8537006	SI

LES DE LA LIQUIDACION

	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
lud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
05	628145926	9466954695	E	2024/05/06	2024/05/09	BANCO CAJA SOCIAL	3	$18,188,400

E PAGO

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ADORAS: 4)				54	$9,381,500	$22,900	$0	$9,404,400
	231001	800,227,940	6	4	$750,500	$1,900	$0	$752,400
ES	25-14	900,336,004	7	8	$1,183,000	$2,900	$0	$1,185,900
	230301	800,224,808	8	34	$5,701,100	$13,800	$0	$5,714,900
	230201	800,229,739	0	8	$1,746,900	$4,300	$0	$1,751,200
ADORAS: 1)				54	$4,082,400	$9,900	$0	$4,092,300
	14-11	890,903,790	5	54	$4,082,400	$9,900	$0	$4,092,300
ADORAS: 1)				54	$2,334,100	$5,700	$0	$2,339,800
	CCF24	860,066,942	7	54	$2,334,100	$5,700	$0	$2,339,800
DORAS: 7)				54	$2,345,800	$6,100	$0	$2,351,900
ID	EPSC34	900,298,372	9	1	$19,100	$100	$0	$19,200
	EPS008	860,066,942	7	2	$64,200	$200	$0	$64,400
	EPS017	830,003,564	7	21	$1,075,000	$2,700	$0	$1,077,700
	EPSIC5	837,000,084	5	2	$71,100	$200	$0	$71,300
	EPS037	900,156,264	2	8	$455,100	$1,200	$0	$456,300
	EPS002	800,130,907	4	17	$604,000	$1,500	$0	$605,500
	EPS005	800,251,440	6	3	$57,300	$200	$0	$57,500
				54	$18,143,800	$44,600	$0	$18,188,400

ortes
línea

Planilla Resumen

ES DEL APORTANTE

dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
7	CONSORCIO DEPORTIVO 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AC 24 51 40	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	4672734	SI

ES DE LA LIQUIDACION

	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
4	629830734	9466174338	Y	2024/05/14	2024/05/09	BANCOLOMBIA	0	$224,200

ETALLADA DE APORTES

LEADO		NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
ón	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
419	MOLANO BOLIVAR HUGO LEONARDO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,920,000	$133,700	0	$0	$0	No	$133,700
1	ROMERO CANO ADRIANA MARCELA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500
(2)																					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,220,000	$224,200		$0	$0		$224,200

ortes
línea

Planilla Resumen

LES DEL APORTANTE

	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
	7	CONSORCIO DEPORTIVO 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AC 24 51 40	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	4672734	SI

LES DE LA LIQUIDACION

	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
lud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
04	629830734	9466174338	Y	2024/05/14	2024/05/09	BANCOLOMBIA	0	$224,200

E PAGO

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ADORAS: 1)				2	$224,200	$0	$0	$224,200
	14-11	890,903,790	5	2	$224,200	$0	$0	$224,200
				2	$224,200	$0	$0	$224,200

rtes
nea

Planilla Resumen

; DEL APORTANTE

dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
7	CONSORCIO DEPORTIVO 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AC 24 51 40	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	4672734	SI

; DE LA LIQUIDACION

	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
i	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	629830734	9466174399	E	2024/05/14	2024/05/09	BANCOLOMBIA	0	$402,500

TALLADA DE APORTES

EADO		NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vlp	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
B	VILLEGAS LEON MARISOL																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
1)																					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0		$402,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901771549	7	CONSORCIO DEPORTIVO 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AC 24 51 40	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	4672734	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-04	2024-05	629830734	9466174399	E	2024/05/14	2024/05/09	BANCOLOMBIA	0	$402,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$90,500	$0	$0	$90,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$90,500	$0	$0	$90,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$0	$0	$52,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$0	$0	$52,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				**1**	**$402,500**	**$0**	**$0**	**$402,500**

rtes
nea

Planilla Resumen

DEL APORTANTE

dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
7	CONSORCIO DEPORTIVO 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AC 24 51 40	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	4672734	Si

DE LA LIQUIDACION

	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	629830734	9466174338	Y	2024/05/14	2024/05/09	BANCOLOMBIA	0	$224,200

TALLADA DE APORTES

EADO		NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
	Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
?	MOLANO BOLIVAR HUGO LEONARDO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,920,000	$133,700	0	$0	$0	No	$133,700
	ROMERO CANO ADRIANA MARCELA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500
2)																					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,220,000	$224,200		$0	$0		$224,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901771549	7	CONSORCIO DEPORTIVO 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AC 24 51 40	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	4672734	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-04	2024-04	629830734	9466174338	Y	2024/05/14	2024/05/09	BANCOLOMBIA	0	$224,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$224,200	$0	$0	$224,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$224,200	$0	$0	$224,200
TOTAL				**2**	**$224,200**	**$0**	**$0**	**$224,200**

ortes
línea

Resumen General de Pago

S DEL APORTANTE

dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
	MOLANO BOLIVAR HUGO LEONARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 27 No. 24 - 30 Interior 1	DUITAMA-BOYACA	3005774846	No

S DE LA LIQUIDACION

	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
5	665392466	9467415117	I	2024/06/07	2024/05/28	BANCOLOMBIA	0	$585,600

ETALLADA DE APORTES

LEADO				PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
ión	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
AL (1 Afiliados)				**$1,920,000**	**$307,200**			**$1,920,000**	**$240,000**			**$1,920,000**	**$38,400**			**$0**	**$0**		**$0**	**$0**
PRINCIPAL (1 Afiliados)				$1,920,000	$307,200			$1,920,000	$240,000			$1,920,000	$38,400			$0	$0		$0	$0
pto: BOYACA (1 Afiliados)				$1,920,000	$307,200			$1,920,000	$240,000			$1,920,000	$38,400			$0	$0		$0	$0
19	MOLANO HUGO	230201	30	$1,920,000	$307,200	EPS017	30	$1,920,000	$240,000	CCF10	30	$1,920,000	$38,400		0	$0	$0	30	$0	$0
liados(1)				$1,920,000	$307,200			$1,920,000	$240,000			$1,920,000	$38,400			$0	$0		$0	$0

)ortes
línea

Resumen General de Pago

LES DEL APORTANTE

	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
		MOLANO BOLIVAR HUGO LEONARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 27 No. 24 - 30 interior 1	DUITAMA-BOYACA	3005774846	No

LES DE LA LIQUIDACION

	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ılud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
05	665392466	9467415117	I	2024/06/07	2024/05/28	BANCOLOMBIA	0	$585,600

E PAGO

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ADORAS: 1)				1	$307,200	$0	$0	$307,200
	230201	800,229,739	0	1	$307,200	$0	$0	$307,200
ADORAS: 1)				1	$38,400	$0	$0	$38,400
	CCF10	891,800,213	8	1	$38,400	$0	$0	$38,400
DORAS: 1)				1	$240,000	$0	$0	$240,000
	EPS017	830,003,564	7	1	$240,000	$0	$0	$240,000
				1	$585,600	$0	$0	$585,600

2024/05/27 08:50 PM

ortes
línea

Planilla Resumen

ES DEL APORTANTE

	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
	7	CONSORCIO DEPORTIVO 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AC 24 51 40	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	4672734	SI

ES DE LA LIQUIDACION

	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
5	696780065	9467689929	Y	2024/06/14	2024/06/11	BANCOLOMBIA	0	$224,200

ETALLADA DE APORTES

LEADO		NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
in	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	fge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
419	MOLANO BOLIVAR HUGO LEONARDO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,920,000	$133,700	0	$0	$0	No	$133,700
1	ROMERO CANO ADRIANA MARCELA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500
(2)																					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,220,000	$224,200		$0	$0		$224,200

ortes
línea

Planilla Resumen

LES DEL APORTANTE

	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
	7	CONSORCIO DEPORTIVO 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AC 24 51 40	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	4672734	SI

LES DE LA LIQUIDACION

	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ılud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
05	696780065	9467689929	Y	2024/06/14	2024/06/11	BANCOLOMBIA	0	$224,200

E PAGO

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ADORAS: 1)				2	$224,200	$0	$0	$224,200
	14-11	890,903,790	5	2	$224,200	$0	$0	$224,200
				2	**$224,200**	**$0**	**$0**	**$224,200**

2024/06/11 02:16 PM

ortes
línea

Planilla Resumen

S DEL APORTANTE

dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
1	ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV CR 24 51 40	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4672734	SI

S DE LA LIQUIDACION

	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
5	697004813	9468454022	E	2024/06/13	2024/06/11	BANCOLOMBIA		$23,431,600

ETALLADA DE APORTES

ADO	NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
NCIPAL (1 Afiliados)				$9,200,000	$1,564,000			$9,200,000	$368,000			$9,200,000	$368,000			$9,200,000		$640,400		$0	$0		$2,940,400
R5 PERSONAL OFIC (1 Afiliados)				$9,200,000	$1,564,000			$9,200,000	$368,000			$9,200,000	$368,000			$9,200,000		$640,400		$0	$0		$2,940,400
to: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)				$9,200,000	$1,564,000			$9,200,000	$368,000			$9,200,000	$368,000			$9,200,000		$640,400		$0	$0		$2,940,400
PARDO AVILA IVAN ALONSO		23020 1	30	$9,200,000	$1,564,000	EPS008	30	$9,200,000	$368,000	CCF24	30	$9,200,000	$368,000	14-11	30	$9,200,000	6.960%	$640,400	30	$0	$0	SI	$2,940,400
(1)				$9,200,000	$1,564,000			$9,200,000	$368,000			$9,200,000	$368,000			$9,200,000		$640,400		$0	$0		$2,940,400

PAGO

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
DORAS: 1)				1	$1,564,000
	230201	800,229,739	0	1	$1,564,000
DORAS: 1)				1	$640,400
	14-11	890,903,790	5	1	$640,400
DORAS: 1)				1	$368,000
	CCF24	860,066,942	7	1	$368,000
DORAS: 1)				1	$368,000
	EPS008	860,066,942	7	1	$368,000
				1	**$2,940,400**

ortes línea

Planilla Resumen

ES DEL APORTANTE

dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
3	CONSTRUCCIONES CIVILES BURGOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIOBUCARAMANGA	calle 136 157 10	BUCARAMANGA-SANTANDER	8537006	SI

ES DE LA LIQUIDACION

	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
6	691724008	9468416664	E	2024/06/06	2024/06/11	BANCO CAJA SOCIAL	5	$18,502,600

DETALLADA DE APORTES

ADO	NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
ON (5 Afiliados)																			$8,836,800	$1,413,900			$8,836,800	$353,500			$8,836,800	$353,500			$8,836,800		$615,200		$0	$0		$2,736,100
: BOGOTA (5 Afiliados)																			$8,836,800	$1,413,900			$8,836,800	$353,500			$8,836,800	$353,500			$8,836,800		$615,200		$0	$0		$2,736,100
pto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																			$8,836,800	$1,413,900			$8,836,800	$353,500			$8,836,800	$353,500			$8,836,800		$615,200		$0	$0		$2,736,100
ALBA RODRIGUEZ SEGUNDO TOBIAS																		23030 1	30	$1,936,800	$309,900	EPS037	30	$1,936,800	$77,500	CCFZ4	30	$1,936,800	$77,500	14-11	30	$1,936,800	6.960%	$134,900	30	$0	$0	SI	$599,800
BAEZ DIAZ ISMAEL																		23100 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCFZ4	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
GARZON CASTILLO BLAS MARIA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCFZ4	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
LOZANO GUZMAN YUBANIS																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCFZ4	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
RODRIGUEZ BURGOS POMPILIO																		23030 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS017	30	$3,000,000	$120,000	CCFZ4	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800

DETALLADA DE APORTES

ADO	NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
7 BOGOTA (4 Afiliados)																			$6,210,134	$993,700			$6,210,134	$248,500			$6,210,134	$248,500			$6,210,134		$432,400		$0	$0		$1,923,100
: BOGOTA (4 Afiliados)																			$6,210,134	$993,700			$6,210,134	$248,500			$6,210,134	$248,500			$6,210,134		$432,400		$0	$0		$1,923,100
pto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																			$6,210,134	$993,700			$6,210,134	$248,500			$6,210,134	$248,500			$6,210,134		$432,400		$0	$0		$1,923,100
CORTES RUIZ BRAYAN ALEJANDRO	X																	23030 1	26	$1,473,334	$235,800	EPS017	26	$1,473,334	$59,000	CCFZ4	26	$1,473,334	$59,000	14-11	26	$1,473,334	6.960%	$102,600	26	$0	$0	SI	$456,400
GARCIA HERNANDEZ LUIS MIGUEL																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCFZ4	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
RODRIGUEZ QUINTANA JULIO CESAR																		23030 1	30	$1,936,800	$309,900	EPS017	30	$1,936,800	$77,500	CCFZ4	30	$1,936,800	$77,500	14-11	30	$1,936,800	6.960%	$134,900	30	$0	$0	SI	$599,800
RODRIGUEZ BURGOS PLINIO																		25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCFZ4	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400

DETALLADA DE APORTES

EADO	NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
LLE (37 Afiliados)																			$34,875,792	$5,580,700			$34,875,792	$1,395,600			$34,735,792	$1,390,000			$34,875,792		$2,428,700		$0	$0		$10,795,000
: BOGOTA (37 Afiliados)																			$34,875,792	$5,580,700			$34,875,792	$1,395,600			$34,735,792	$1,390,000			$34,875,792		$2,428,700		$0	$0		$10,795,000
epto: BOGOTA D.E. (37 Afiliados)																			$34,875,792	$5,580,700			$34,875,792	$1,395,600			$34,735,792	$1,390,000			$34,875,792		$2,428,700		$0	$0		$10,795,000
ANGULO ANGULO JUNIOR MAURICIO																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCFZ4	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
BOTONERO SANCHEZ LUIS OCTAVIO		X																23020 1	8	$346,667	$55,500	EPS002	8	$346,667	$13,900	CCFZ4	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	6.960%	$24,200	8	$0	$0	SI	$107,500
BUSTOS SANCHEZ NELSON JHOJAN	X																	23100 1	5	$216,667	$34,700	EPS002	5	$216,667	$8,700	CCFZ4	5	$216,667	$8,700	14-11	5	$216,667	6.960%	$15,100	5	$0	$0	SI	$67,200
CABICHE CONDO EDERSON																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCFZ4	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
CABICHE CONDO EHIBAR ADRIAN																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCFZ4	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
CAICEDO CAMACHO LUIS BOLIVAR		X																23030 1	8	$346,667	$55,500	EPS037	8	$346,667	$13,900	CCFZ4	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	6.960%	$24,200	8	$0	$0	SI	$107,500
CAMARGO YENERIS DEIMER JOSE																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCFZ4	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500

| | | |

ortes
línea

Planilla Resumen

| | | |

portes
n línea

Planilla Resumen

LES DEL APORTANTE

	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
	3	CONSTRUCCIONES CIVILES BURGOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIOBUCARAMANGA	calle 136 157 10	BUCARAMANGA-SANTANDER	8537006	SI

LES DE LA LIQUIDACION

	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
alud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
06	691724008	9468416664	E	2024/06/06	2024/06/11	BANCO CAJA SOCIAL	5	$18,502,600

E PAGO

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ADORAS: 4)				67	$9,524,800	$37,700	$0	$9,562,500
	231001	800,227,940	6	5	$937,700	$3,700	$0	$941,400
ES	25-14	900,336,004	7	8	$1,287,000	$5,100	$0	$1,292,100
	230301	800,224,808	8	43	$5,972,100	$23,600	$0	$5,995,700
	230201	800,229,739	0	11	$1,328,000	$5,300	$0	$1,333,300
ADORAS: 1)				67	$4,145,600	$16,400	$0	$4,162,000
	14-11	890,903,790	5	67	$4,145,600	$16,400	$0	$4,162,000
ADORAS: 1)				67	$2,376,600	$9,400	$0	$2,386,000
	CCF24	860,066,942	7	67	$2,376,600	$9,400	$0	$2,386,000
ADORAS: 7)				67	$2,382,200	$9,900	$0	$2,392,100
	EPS008	860,066,942	7	1	$52,000	$300	$0	$52,300
	EPS017	830,003,564	7	23	$1,059,500	$4,200	$0	$1,063,700
	EPSIC5	837,000,084	5	1	$52,000	$300	$0	$52,300
	EPS037	900,156,264	2	12	$438,100	$1,800	$0	$439,900
OVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$12,200	$100	$0	$12,300
	EPS002	800,130,907	4	28	$716,400	$2,900	$0	$719,300
	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$300	$0	$52,300
				67	$18,429,200	$73,400	$0	$18,502,600

Planilla Resumen

S DEL APORTANTE

dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
7	CONSORCIO DEPORTIVO 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AC 24 51 40	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	4672734	SI

S DE LA LIQUIDACION

	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
d	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	696780065	9467690021	E	2024/06/14	2024/06/11	BANCOLOMBIA	0	$402,500

TALLADA DE APORTES

EADO		NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
	Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	frl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
8	VILLEGAS LEON MARISOL																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCFZ4	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
1)																					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0		$402,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901771549	7	CONSORCIO DEPORTIVO 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AC 24 51 40	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	4672734	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	696780065	9467690021	E	2024/06/14	2024/06/11	BANCOLOMBIA	0	$402,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$90,500	$0	$0	$90,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$90,500	$0	$0	$90,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$0	$0	$52,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$0	$0	$52,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				1	$402,500	$0	$0	$402,500

rtes
nea

Planilla Resumen

DEL APORTANTE

dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
7	CONSORCIO DEPORTIVO 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AC 24 51 40	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	4672734	Si

DE LA LIQUIDACION

	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
d	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	696780065	9467689929	Y	2024/06/14	2024/06/11	BANCOLOMBIA	0	$224,200

TALLADA DE APORTES

EADO		NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
9	MOLANO BOLIVAR HUGO LEONARDO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,920,000	$133,700	0	$0	$0	No	$133,700
	ROMERO CANO ADRIANA MARCELA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500
2)																					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,220,000	$224,200		$0	$0		$224,200

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141059097184

(415)7707212489984(8020) 000014105909718 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 7 1 5 4 9	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 3 0 4 1 4	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia		
80. Desde	2 0 2 3 0 4 1 4	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 4 0 7 0 9		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141059097184

(415)7707212489984(8020) 000014105909718 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 7 1 5 4 9	7	3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 4 1 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	7 9 5 8 4 7 1 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
FARFAN	VELASQUEZ	LUIS	GABRIEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 4 1 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 2 7 2 7 6 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SANDOVAL	PARRA	EDNA	ROSALBA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141059097184

(415)7707212489984(8020) 000014105909718 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 7 1 5 4 9	7	Impuestos de Bogotá	3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
NIT 3 1	9 0 1 1 5 4 9 8 6	6	COLOMBIA	1 6 9

115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres

119. Razón social: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	8 0	2 0 2 3 0 4 1 4	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
NIT 3 1	9 0 0 3 5 1 2 3 6	1	COLOMBIA	1 6 9

115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres

119. Razón social: ESTUDIOS E INGENIERIA SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	2 0	2 0 2 3 0 4 1 4	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CONSORCIO
DEPORTIVO 2023

CONSORCIO DEPORTIVO 2023
NIT: 901.771.549

Bogotá, 13 de junio de 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

En mi condición de Representante Legal del CONSORCIO VIAS EDC 2022, con Nit 901.661.021-9, me permito manifestar bajo la gravedad de juramento que el CONSORCIO se encuentra a paz y salvo por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar durante los últimos seis (6) meses lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Acuerdo a la ley 1607-2012 nos exonera de la obligación de pago de los aportes parafiscales ICBF y SENA, por los empleados que devenguen menos de 10 Salarios Mínimos Legales Vigentes.

Cordialmente,

LUIS GABRIEL FARFAN VELASQUEZ
C.C 79.584.718 de Bogotá
Representante Legal
CONSORCIO DEPORTIVO 2023

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	111346158	697666176	11/06/2024

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901771549**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **186.28.58.24**

Su transacción fue APROBADA por la

Total Pagado **$ 3,397,650.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 3,397,650.00	COP$ 3,397,650.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	111346158	697666176	11/06/2024

Número de Identificación 901771549	**Primer Nombre ó Razón Social** CONSORCIO POLIDEPORTIVO 2023
Primer Apellido (si es Persona natural)	**Tipo de documento** 01
Dígito de Verificación (Si es persona 7	**Naturaleza Juridica** 01
Departamento BOGOTA	**Ciudad Capital** BOGOTÁ D.C.
Dirección de Domicilio CALLE 24 nO. 51-40 OF 316	**Ciudad de Domicilio** BOGOTA
Localización Nacional	**Teléfono de Contacto** +57,6014672735
Correo electrónico info@estudios.com.co	**Código SIIF** 3-2-07-1-02-1-04-43
Regional Cundinamarca	**Regional Centros SIIF** 36-02-00-025-000000
Número Licencia de Obra CTO 2023-0667	**Número Contrato de Obra** CTO 2023-0667
Nombre Obra CANCHA SINTETITA	**Fecha Inicio Obra** 06/09/2023
Fecha Terminación Obra 06/07/2024	**Ciudad de Ejecución de la Obra** 901771549
Tipo FIC Costo Total de Obra (Sin Aportes)	**Año Periodo a Pagar** 2024
Mes Periodo a Pagar 6	**Costo Total de Obra a Todo Costo** 1359060024.00
Costo Total Mano de Obra 135906002.00	**Número de Trabajadores en el Periodo** 10
Valor Intereses Moratorios 0.00	**Aporte FIC** 3397650.00

Comprobante

de pago en línea



SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Pago realizado por: SANDRA LILIANA GALINDO

Nro. de factura: 111346158

Descripción del pago: Pago Ordinario - FIC

Nro. de referencia: 186.28.58.24

Nro. de referencia 2: NIT

Nro. de referencia 3: 9003512361

Fecha y hora de la transacción: Martes 11 de Junio de 2024 03:37:02 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 3,397,650.00

Cuenta: *******5521

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

	ALCALDIA DE FUSAGASUGA	Código: DIS-2023030251	
	PROCESO SECRETARIA DE HACIENDA	Versión:	
		Página: 1 de 2	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

DIS-2023030251

Nit: 890680008-4

DIRECTOR OFICINA ASESORA DE PRESUPUESTO

martes, 28 de marzo de 2023

CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2023 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

OBJETO
EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 831 DE 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (NUEVE MESES A APARTIR DEL ACTA DE INICIO)

RUBRO - FUENTE	NOMBRE	VALOR
2.3.4002020.2.3.2 02.02.0 05.972.1.3.1.1.08	Espacio publico adecuadoVIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIOOrdenamiento territorial y desarrollo urbano - FUENTE: 1.3.1.1.08-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - CONVENIOS NAL Y/O DPTO	4,650,349,649.32
2.3.4002020.2.3.2 02.02.0 05.972.1.3.1.1.08	Espacio publico adecuadoVIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIOOrdenamiento territorial y desarrollo urbano - FUENTE: 1.3.1.1.08-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - CONVENIOS NAL Y/O DPTO	4,650,349,649.32
TOTAL CDP		**9,300,699,298.64**

SON:	NUEVE MIL TRESCIENTOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 64 CTVS. MC.

Elaboró zemayorga
Modificó:


CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

DIS-2023030251

Nit: 890680008-4

SOLICITANTE	
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - 8.0.0
RESPONSABLE:	
CARGO:	

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 28/04/2023



DIRECTOR OFICINA PRESUPUESTO

Elaboró zemayorga
Modificó:

	ALCALDIA DE FUSAGASUGA	Código: DIS-2023120283	
	PROCESO SECRETARIA DE HACIENDA	Versión:	
		Página: 1 de 2	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

DIS-2023120283

Nit: 890680008-4

DIRECTOR OFICINA ASESORA DE PRESUPUESTO

sábado, 30 de diciembre de 2023

CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2023 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

OBJETO
ADICION AL CONTRATO DE OBRA 2023 0667 CUYO OBJETO ES EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 831 DE 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

RUBRO - FUENTE	NOMBRE	VALOR
2.3.4002020.2.3.2.02.02.005.972.1.3.1.1.08	Espacio publico adecuadoVIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIOOrdenamiento territorial y desarrollo urbano - FUENTE: 1.3.1.1.08-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - CONVENIOS NAL Y/O DPTO	930,067,805.15
	TOTAL CDP	**930,067,805.15**

SON:	NOVECIENTOS TREINTA MILLONES SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS CON 15 CTVS. MC.

Elaboró zemayorga

Modificó:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

DIS-2023120283

Nit: 890680008-4

SOLICITANTE	
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - 8.0.0
RESPONSABLE:	
CARGO:	

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 30/01/2024



DIRECTOR OFICINA PRESUPUESTO

Elaboró zemayorga
Modificó:

	ALCALDIA DE FUSAGASUGA	Código: RES-202311013	
	PROCESO SECRETARIA DE HACIENDA	Versión: 1	
		Página: 1 de 2	

REGISTRO PRESUPUESTAL

RES-2023110130

Nit: 890680008-4

viernes, 10 de noviembre de 2023

DIRECTOR OFICINA ASESORA DE PRESUPUESTO

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 831 DE 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (NUEVE MESES A APARTIR DEL ACTA DE INICIO)

A FAVOR DE	CONSORCIO DEPORTIVO 2023	NIT	901771549

DISPONIBILIDAD	DIS	2023030251

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO / FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	TERCERO	VALOR
2.3.4002020.2.3.2.02.02.005.9 72.1.3.1.1.08	Espacio publico adecuadoVIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIOOrdenamiento territorial y desarrollo urbano - FUENTE: 1.3.1.1.08-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - CONVENIOS NAL Y/O DPTO	CONSORCIO DEPORTIVO 2023	3,720,281,844.17
2.3.4002020.2.3.2.02.02.005.9 72.1.3.1.1.08	Espacio publico adecuadoVIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIOOrdenamiento territorial y desarrollo urbano - FUENTE: 1.3.1.1.08-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - CONVENIOS NAL Y/O DPTO	CONSORCIO DEPORTIVO 2023	4,650,349,649.32

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL	8,370,631,493.49

SON:	OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 49 CTVS. MC.

Se expide en FUSAGASUGA a los 10 dias del mes de Noviembre de 2023

DIRECTOR OFICINA PRESUPUESTO

	ALCALDIA DE FUSAGASUGA	Código: REX-202400009	
	PROCESO SECRETARIA DE HACIENDA	Versión: 1	
		Página: 1 de 2	

REGISTRO PRESUPUESTAL (Reserva de Apropiacion)

REX-2024000094

Nit: 890680008-4

lunes, 1 de enero de 2024

DIRECTOR OFICINA ASESORA DE PRESUPUESTO

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

RESERVA RESERVA ADICION AL CONTRATO 2023 0667 CUYO OBJETO ES EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 831 DE 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

A FAVOR DE	CONSORCIO DEPORTIVO 2023	NIT	901771549
DISPONIBILIDAD	DIX 2024000094		

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO / FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	TERCERO	VALOR
3.2.3.4002020.2.3.2.02.02.005 .972.1.2.1.0.00	Espacio publico adecuadoVIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIOOrdenamiento territorial y desarrollo urbano - FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	CONSORCIO DEPORTIVO 2023	682,791,539.05
3.2.3.4002020.2.3.2.02.02.005 .972.1.2.4.3.03	Espacio publico adecuadoVIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIOOrdenamiento territorial y desarrollo urbano - FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	CONSORCIO DEPORTIVO 2023	141,900,328.29
3.2.3.4002020.2.3.2.02.02.005 .972.1.3.1.1.05	Espacio publico adecuadoVIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIOOrdenamiento territorial y desarrollo urbano - FUENTE: 1.3.1.1.05-RECURSOS DE CREDITO INTERNO	CONSORCIO DEPORTIVO 2023	120,096,721.00
3.2.3.4002020.2.3.2.02.02.005 .972.1.3.1.1.11	Espacio publico adecuadoVIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIOOrdenamiento territorial y desarrollo urbano - FUENTE: 1.3.1.1.11-REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	CONSORCIO DEPORTIVO 2023	1,027,867,039.88
3.2.3.4002020.2.3.2.02.02.005 .972.1.3.3.1.00	Espacio publico adecuadoVIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIOOrdenamiento territorial y desarrollo urbano - FUENTE: 1.3.3.1.00-RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	CONSORCIO DEPORTIVO 2023	794,265,656.54
3.2.3.4002020.2.3.2.02.02.005 .972.1.3.3.8.03	Espacio publico adecuadoVIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIOOrdenamiento territorial y desarrollo urbano - FUENTE: 1.3.3.8.03-R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	CONSORCIO DEPORTIVO 2023	299,999,998.00

Elaboró:

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL	3,066,921,282.76


SON: TRES MIL SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTI UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON 76 CTVS. MC.

Se expide en FUSAGASUGA a los 1 dias del mes de Enero de 2024

DIRECTOR OFICINA PRESUPUESTO

Elaboró:

Modificó:



ALCALDIA DE FUSAGASUGA

Nit: 890680008-4

Disponibilidad Reserva Apropiación
Número: 2024000094

FECHA 03/01/2024

TERCERO CONSORCIO DEPORTIVO 2023 **Nit / C.C.:** 901771549

COMPROBANTE AFECTADO 0

CONCEPTO:

RESERVA ADICION AL CONTRATO 2023 0667 CUYO OBJETO ES EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 831 DE 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

RUBRO / FUENTE	COD. EQUIVALE	NOMBRE	TERCERO	CREDITO	CONTRACREDITO
3.2.3.4002020.2.3.2.02.02.005.972.1.2.1.0.00		Espacio publico adecuadoVIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIOOrdenamiento territorial y desarrollo urbano - FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	CONSORCIO DEPORTIVO 2023	682,791,539.05	0.00
3.2.3.4002020.2.3.2.02.02.005.972.1.2.4.3.03		Espacio publico adecuadoVIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIOOrdenamiento territorial y desarrollo urbano - FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	CONSORCIO DEPORTIVO 2023	141,900,328.29	0.00
3.2.3.4002020.2.3.2.02.02.005.972.1.3.1.1.05		Espacio publico adecuadoVIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIOOrdenamiento territorial y desarrollo urbano - FUENTE: 1.3.1.1.05-RECURSOS DE CREDITO INTERNO	CONSORCIO DEPORTIVO 2023	120,096,721.00	0.00
3.2.3.4002020.2.3.2.02.02.005.972.1.3.1.1.11		Espacio publico adecuadoVIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIOOrdenamiento territorial y desarrollo urbano - FUENTE: 1.3.1.1.11-REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	CONSORCIO DEPORTIVO 2023	1,027,867,039.88	0.00
3.2.3.4002020.2.3.2.02.02.005.972.1.3.3.1.00		Espacio publico adecuadoVIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIOOrdenamiento territorial y desarrollo urbano - FUENTE: 1.3.3.1.00-RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	CONSORCIO DEPORTIVO 2023	794,265,656.54	0.00
3.2.3.4002020.2.3.2.02.02.005.972.1.3.3.8.03		Espacio publico adecuadoVIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIOOrdenamiento territorial y desarrollo urbano - FUENTE: 1.3.3.8.03-R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	CONSORCIO DEPORTIVO 2023	299,999,998.00	0.00
			TOTAL	3,066,921,282.76	0.00

DIRECTOR OFICINA PRESUPUESTO

	ALCALDIA DE FUSAGASUGA	Código: REX-202400009	
	PROCESO SECRETARIA DE HACIENDA	Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

REGISTRO PRESUPUESTAL (Reserva de Apropiacion)

REX-2024000096

Nit: 890680008-4

lunes, 1 de enero de 2024

DIRECTOR OFICINA ASESORA DE PRESUPUESTO

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

RESERVA RESERVA ADICION AL CONTRATO DE OBRA 2023 0667 CUYO OBJETO ES EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 831 DE 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

A FAVOR DE	CONSORCIO DEPORTIVO 2023	NIT	901771549
DISPONIBILIDAD	DIX 2024000096		

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO / FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	TERCERO	VALOR
3.2.3.4002020.2.3.2.02.02.005 .972.1.3.1.1.08	Espacio publico adecuadoVIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIOOrdenamiento territorial y desarrollo urbano - FUENTE: 1.3.1.1.08-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - CONVENIOS NAL Y/O DPTO	CONSORCIO DEPORTIVO 2023	930,067,805.15
	TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		930,067,805.15

SON: NOVECIENTOS TREINTA MILLONES SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS CON 15 CTVS. MC.

Se expide en FUSAGASUGA a los 1 dias del mes de Enero de 2024

DIRECTOR OFICINA PRESUPUESTO

Elaboró:

ALCALDIA DE FUSAGASUGA

Nit: 890680008-4

Disponibilidad Reserva Apropiación
Número: 2024000096

FECHA 03/01/2024

TERCERO CONSORCIO DEPORTIVO 2023 **Nit / C.C.:** 901771549

COMPROBANTE AFECTADO 0

CONCEPTO:

RESERVA ADICION AL CONTRATO DE OBRA 2023 0667 CUYO OBJETO ES EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 831 DE 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

RUBRO / FUENTE	COD. EQUIVALE	NOMBRE	TERCERO	CREDITO	CONTRACREDITO
3.2.3.4002020.2.3.2.02.02.005.972.1.3.1.1.08	0	Espacio publico adecuadoVIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIOOrdenamiento territorial y desarrollo urbano - FUENTE: 1.3.1.1.08-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - CONVENIOS NAL Y/O DPTO	CONSORCIO DEPORTIVO 2023	930,067,805.15	0.00
			TOTAL	930,067,805.15	0.00

DIRECTOR OFICINA PRESUPUESTO

	ALCALDIA DE FUSAGASUGA	Código: REX-202400004	
	PROCESO SECRETARIA DE HACIENDA	Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

REGISTRO PRESUPUESTAL (Reserva de Apropiacion)

REX-2024000048

Nit: 890680008-4

lunes, 1 de enero de 2024

DIRECTOR OFICINA ASESORA DE PRESUPUESTO

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

RESERVA RESERVA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 831 DE 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (NUEVE MESES A APARTIR DEL ACTA DE INICIO)...

A FAVOR DE	CONSORCIO DEPORTIVO 2023	NIT	901771549
DISPONIBILIDAD	DIX 2024000048		

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO / FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	TERCERO	VALOR
3.2.3.4002020.2.3.2.02.02.005 .972.1.3.1.1.08	Espacio publico adecuadoVIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIOOrdenamiento territorial y desarrollo urbano - FUENTE: 1.3.1.1.08-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - CONVENIOS NAL Y/O DPTO	CONSORCIO DEPORTIVO 2023	3,720,281,844.17
3.2.3.4002020.2.3.2.02.02.005 .972.1.3.1.1.08	Espacio publico adecuadoVIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIOOrdenamiento territorial y desarrollo urbano - FUENTE: 1.3.1.1.08-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - CONVENIOS NAL Y/O DPTO	CONSORCIO DEPORTIVO 2023	843,356,344.39
	TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		4,563,638,188.56

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS CON 56 CTVS. MC.

Se expide en FUSAGASUGA a los 1 dias del mes de Enero de 2024

DIRECTOR OFICINA PRESUPUESTO

Elaboró:

ALCALDIA DE FUSAGASUGA

Nit: 890680008-4

Disponibilidad Reserva Apropiación
Número: 2024000048

FECHA 03/01/2024

TERCERO CONSORCIO DEPORTIVO 2023 **Nit / C.C.:** 901771549

COMPROBANTE AFECTADO 0

CONCEPTO:

RESERVA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 831 DE 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (NUEVE MESES A APARTIR DEL ACTA DE INICIO)

RUBRO / FUENTE	COD. EQUIVALE	NOMBRE	TERCERO	CREDITO	CONTRACREDITO
3.2.3.4002020.2.3.2.02.02.005.972.1.3.1.1.08		Espacio publico adecuadoVIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIOOrdenamiento territorial y desarrollo urbano - FUENTE: 1.3.1.1.08-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - CONVENIOS NAL Y/O DPTO	CONSORCIO DEPORTIVO 2023	3,720,281,844.17	0.00
3.2.3.4002020.2.3.2.02.02.005.972.1.3.1.1.08		Espacio publico adecuadoVIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIOOrdenamiento territorial y desarrollo urbano - FUENTE: 1.3.1.1.08-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - CONVENIOS NAL Y/O DPTO	CONSORCIO DEPORTIVO 2023	843,356,344.39	0.00
			TOTAL	**4,563,638,188.56**	**0.00**

DIRECTOR OFICINA PRESUPUESTO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

DIS-2023120275

Nit: 890680008-4

SOLICITANTE	
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - 8.0.0
RESPONSABLE:	
CARGO:	

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 30/01/2024

DIRECTOR OFICINA PRESUPUESTO

Elaboró zemayorga
Modificó:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

DIS-2023120275

Nit: 890680008-4

DIRECTOR OFICINA ASESORA DE PRESUPUESTO
sábado, 30 de diciembre de 2023

CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2023 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

OBJETO
ADICION AL CONTRATO 2023 0667 CUYO OBJETO ES EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 831 DE 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

RUBRO - FUENTE	NOMBRE	VALOR
2.3.4002020.2.3.2.02.02.005.972.1.2.1.0.00	Espacio publico adecuadoVIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIOOrdenamiento territorial y desarrollo urbano - FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	682,791,539.05
2.3.4002020.2.3.2.02.02.005.972.1.2.4.3.03	Espacio publico adecuadoVIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIOOrdenamiento territorial y desarrollo urbano - FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	441,900,326.29
2.3.4002020.2.3.2.02.02.005.972.1.3.1.1.05	Espacio publico adecuadoVIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIOOrdenamiento territorial y desarrollo urbano - FUENTE: 1.3.1.1.05-RECURSOS DE CREDITO INTERNO	120,096,721.00
2.3.4002020.2.3.2.02.02.005.972.1.3.1.1.11	Espacio publico adecuadoVIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIOOrdenamiento territorial y desarrollo urbano - FUENTE: 1.3.1.1.11-REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	1,027,867,039.88
2.3.4002020.2.3.2.02.02.005.972.1.3.3.1.00	Espacio publico adecuadoVIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIOOrdenamiento territorial y desarrollo urbano - FUENTE: 1.3.3.1.00-RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	794,265,656.54
	TOTAL CDP	**3,066,921,282.76**

SON:	TRES MIL SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTI UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON 76 CTVS. MC.

Elaboró zemayorga
Modificó:

ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ

MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 2023 -0667 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y CONSORCIO DEPORTIVO 2023

Entre los suscritos **JENNIFER JULIANA ROJAS LOPEZ** mayor de edad, domiciliada y residente en Fusagasugá, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.070.952.561 expedida en Facatativá, en calidad de Secretaria Jurídica, cargo para el cual fue nombrada mediante Decreto No. 141 del 08 de marzo de 2023, según consta en el acta de posesión de la misma fecha, y delegada por el Alcalde Municipal mediante Decreto No. 106 del 01 de noviembre de 2023, el cual rige a partir del 02 de noviembre de 2023 "para celebrar contratos estatales de cualquiera de sus modalidades de selección, así como los contratos interadministrativos que resulten necesarios para el logro de los objetivos de la entidad", de una parte, quien en adelante se denominara **EL MUNICIPIO** y por la señora **LUIS GABRIEL FARFAN VELASQUEZ,** identificado con cédula de ciudadanía No 79.584.718 de Bogotá, en calidad de Representante Legal del **CONSORCIO DEPORTIVO 2023** en calidad de **CONTRATISTA ;** hemos convenido celebrar la Modificación No.1, al contrato de obra publica N° 2023-0667, el cual se regirá por las cláusulas que posteriormente se estipulan, previas las siguientes consideraciones: **1)** Que con fecha 16 de junio del 2023 se suscribió el Contrato de Obra Pública No. **2023-0667**, con el señor **GERMAN ANDRES DUARTE ROA,** mayor de edad, identificada con la cedula de ciudadanía **No. 79.951.560 de Bogotá D.C**, representante legal de la empresa **INCIVILES ASOCIADOS S.A.S,** con **Nit No. 900.226. 247-8,** cuyo objeto es ""**EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 de 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA, PISTA ATLETICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA-DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**"**2)** Que al mencionado contrato se le dio inicio el 06 de septiembre de 2023. **3)** Que el dia 13 de noviembre se realizo cesión al **CONSORCIO DEPORTIVO 2023** identificado con NIT. 901.771.549-7 representado legalmente por **LUIS GABRIEL FARFAN VELASQUEZ,** identificado con cédula de ciudadanía No 79.584.718 de Bogotá . **4)** En el Municipio de Fusagasugá, a los veintidós (22) días del mes de diciembre del año 2023, se reunieron en la secretaria de infraestructura del municipio de Fusagasugá, el ING. OSCAR FABIAN ESPINEL MANRIQUE en calidad de SUPERVISOR, la DRA. JENNIFER JULIANA ROJAS LOPEZ en calidad de la mejor ordenadora del gasto mediante el DECRETO DE DELEGACIÓN 106 DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023, el ING. LUIS GABRIEL FARFÁN VELÁSQUEZ con cedula de ciudadanía No. 79.584.718 de Bogotá D.C, representante legal CONSORCIO DEPORTIVO 2023 en calidad de CONTRATISTA, el ING. CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ con cedula de ciudadanía No. 19.275.138 de Bogotá D.C, representante legal R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS en calidad de INTERVENTOR con el fin de dar inicio al contrato cuyo objeto de "EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 DE 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA". con el fin se suscribir el presente ACTA NO. 03 MODIFICATORIO 01 MAYORES Y MENORES CANTIDADES, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: Se hace necesario realizar la modificación para la inclusión de ítems no previstos, mayores y menores cantidades verificadas en terreno y en el diseño de la cancha, estos se realizan teniendo en cuenta la revisión del proyecto en acompañamiento con la interventoría, evidenciando que las actividades no previstas son necesarias para la estabilidad y el buen desarrollo del proyecto. a. Que el día 10 de noviembre mediante oficio la interventoría realizo la solicitud de inclusión de ítems no previstos, teniendo como fundamento la propuesta presentada por parte del contratista. b. Que dentro de la propuesta del contratista se encuentra argumentada que la actúa estructura propuesta no garantiza la estabilidad del campo deportivo, la consultoría

no se cuenta con la gravilla de soporte ni el diseño de drenaje de las aguas lluvias actividades necesarias para el correcto funcionamiento de la cancha. c. Que dentro de la propuesta el contratista argumenta las características de la estructura la cual se compone: Esta propuesta garantiza mejoras sustanciales al diseño inicial, ya que cuenta con tecnología de última generación que permite: • Mayor rendimiento en instalación. • Menor tiempo en ejecución de obra. • Menor costo en mantenimiento. • Disminución en materiales y así misma disminución de la huella de carbono del proyecto. • Mejora de especificaciones • No genera sobrecosto. d. Que el dia 10 de diciembre el consorcio deportivo 2023 realiza el alcance a el balance presupuestal y solicitud de ítems no previstos, donde reajusta y proyecta las cantidades e ítems necesarios para llevar a cabo las modificaciones que permitan dar una mayor estabilidad y garantía a el proceso constructivo del proyecto. e. Que para el supervisor del contrato como de la interventoría esta propuesta es viable y acertada desde los componentes contractual y técnicos que enmarcan el contrato. f. Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones se modifica el presente contrato en el siguiente orden. g. Los valores de los ítems no previstos son sacados teniendo en cuenta los valores de las actividades como referencia en ICCU, IDRD o cotizaciones en los casos en que la actividad no estaba evidenciada o referenciada. **5)** Que para el efecto se relaciona *a continuación las mayores, menores cantidades de obra consagrados en el acta* No. 03, *a* ejecutar en el presente modificatorio así:

MAYORES CANTIDADES

No.	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	PRELIMINARES				
	1.10	PRELIMINARES				
	1.1.01	DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M	M2	1956.81	$1.527,00	$2.988.048.87
						$2.988.048.87
	2	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
3	2,010	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	M3	2.763,82	$17.445,00	$ 48.214.839,90
4	2,020	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE (Incluye suministro de equipos)	M2	1.951,85	$1.396,00	$ 2.724.782,60
	2,030	RELLENO CON MATERIALDEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	8.282,76	$20.799,00	$ 172.273.125,24
						$ 223.212.747,74
	3	ESTRUCTURAS				
	3,1	CIRCULACIÓN Y PERMANENCIA				
	3.1.1	PISOS				
	3.1.1.10	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	7.362,24	$4.534,00	$ 33.380.396,16
	3.1.1.14	BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	218,46	$70.885,00	$ 15.485.537,10
	3.1.1.16	RECUBRIMIENTO SINTÉTICO COLOR PAVE (Incluye suministros, equipos, mano de obra para su correcta instalación)	M2	486,75	$112.661,00	$ 54.837.741,75
						$ 103.703.675,01
	7	RED SANITARIA				
	7,02	RELLENO TIPO 7 "ARENADE PEÑA"	M3	0,38	$107.689,00	$ 40.921,82
	7,04	RELLENO CON MATERIALDE EXCAVACIÓN	M3	0,65	$20.799,00	$ 13.519,35

	7,06	TUBERÍA DRENAJE PVC 160	ML	24,00	$46.906,00	$ 1.125.744,00
	7,08	RED SANITARÍA PVC-S 3"	ML	16,40	$37.652,00	$ 617.492,80
	7,10	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN	1,00	$74.391,00	$ 74.391,00
	7,11	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UN	2,00	$79.451,00	$ 158.902,00
	7,15	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UN	3,00	$97.502,00	$ 292.506,00
						$ 2.376.519,37
	8	**RED PLUVIAL**				
	8,01	EXCAVACIÓN MANUAL ENMATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DESOBRANTES A UNADISTANCIA MENOR DE 5KM)	M3	13,57	$48.721,00	$ 661.143,97
	8,02	RELLENO TIPO 7 "ARENADE PEÑA"	M3	31,82	$107.689,00	$ 3.426.663,98
	8,03	RELLENO TIPO 2 "RECEBO"	M3	46,54	$79.419,00	$ 3.696.160,26
	8,04	RELLENO CON MATERIALDE EXCAVACIÓN	M3	13,27	$20.799,00	$ 276.002,73
	8,06	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	9,50	$51.069,00	$ 485.155,50
	8,09	SALIDA AGUAS LLUVIAS ACANAL DE 6" (Incluye codo90, suministros e instalación)	UN	247,75	$166.780,00	$ 41.319.745,00
	8,19	CAJA DE INSPECCIÓN DE100X100	UN	4,00	$485.070,00	$ 1.940.280,00
						$ 51.805.151,44
	9,2	**TANQUE**				
	9.2.14	REGISTRO 3/4"	UN	1,00	$79.783,00	$ 79.783,00
						$ 79.783,00
	10	**RED SUMINISTRO DE AGUA FRÍA**				
	10,01	TUBERIA PVC P 3" RDE 21 (Incluye accesorios suministros e instalación)	ML	0,40	$57.401,00	$ 22.960,40
						$ 22.960,40
	12	**REDES ELÉCTRICAS**				
	12,1	**RED DE ENERGIA**				
	12.1.02	4 DUCTOS D=4" PVC-TDP(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS) NORMA CS209.	ML	80,10	$88.688,00	$ 7.103.908,80
						$ 7.103.908,80
	12.2	**RED DE ALUMBRADO PÚBLICO**				
	12.2.05	POSTE METALICO H=24M.INCLUYE CANASTILLA Y BRAZO SENCILLO. (INC. SUMINISTRO, IZAJE, APLOMADO E INSTALACIÓN. INC. BRAZOSENCILLO Y BASE EN CONCRETO Y BASE GRANULAR B-600)	UN	1,00	$11.757.090,00	$ 11.757.090,00
						$ 11.757.090,00

COSTO DIRECTO		**$ 403.049.884,63**
ADMINISTRACION	26%	**$ 104.792.970,00**
IMPREVISTOS	2%	**$ 8.060.997,69**
UTILIDAD	5%	**$ 20.152.494,23**
COSTO DIRECTO + A.I.U		**$ 536.056.346,56**
AJUESTE AL PRESUPUESTO		
VALOR TOTAL		**$**

No.	ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	PRELIMINARES				
	1.10	PRELIMINARES				
2	1.1.02	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXCANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	-3.474,67	$1.300,00	$ -4.517.071,00
						$ -4.517.071,00
	3	ESTRUCTURAS				
	3,1	CIRCULACIÓN Y PERMANENCIA				
	3.1.1	PISOS				
8	3.1.1.03	SUBBASE GRANULAR	M3	-2.788,82	$170.944,00	$ -476.732.046,08
9	3.1.1.04	ANDÉN CONCRETO 3000PSI EN SITIO E=0.1M	M2	-1.875,00	$62.959,00	$ -118.048.125,00
11	3.1.1.06	RELLENO GRAVILLA DE RÍO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	-2.084,00	$98.043,00	$ -204.321.612,00
12	3.1.1.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1700 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	-9.731,74	$6.427,00	$ -62.545.892,98
13	3.1.1.08	RELLENO TIPO 7 "ARENADE PEÑA"	M3	-1.946,35	$107.689,00	$ -209.600.485,15
14	3.1.1.09	GRAMA SINTÉTICA PARACAMPOS DEPORTIVOS	M2	-7,76	$127.347,00	$ -988.212,72
16	3.1.1.11	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	-82,63	$877.156,00	$ -72.479.400,28
17	3.1.1.12	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2	-2.362,00	$2.199,00	$ -5.194.038,00
18	3.1.1.13	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	-82,63	$903.931,00	$ -74.691.818,53
20	3.1.1.15	SISTEMA BICAPA O SÁNDWICH CON ESTRUCTURA GRANULADA, ANTIDESLIZANTE E IMPERMEABLE FUNDIDA EN SITIO CON PROTECCIÓN UV Y RESISTENTE A LOS CLAVOS, CUMPLE CON NORMAS DIN EN 14877 Y DIN 18035-6. ESPESOR 13 MM, CONSISTE DE IMPRIMACIÓN CON VIASOL EP-P210, 1 CAPAELASTICA DE 10 A 12 MM DE SBR 1 A 4 MM, CAPA DE TAPAPOROS Y UNA CAPA DE 3 A 5MM VERTIDA Y ESTRUCTURADA DE EPDM 1 A 4 MM DE COLOR ROJO.INCLUYE RECUBRIMIENTO EN PISTA Y CARRILES DE SALTO TRIPLE PARA PISTA ATLÉTICA CERTIFICADA. (Incluye suministros e instalación)	M2	-0,25	$413.168,00	$ -103.292,00
						$ -1.224.704.922,74
	5	EDIFICACIONES				
	5,1	RED SUMINISTRO DE AGUA FRÍA				
20	5.1.01	RED SUMINISTRO PVC 2"	ML	-7,00	$34.577,00	$ -242.039,00
32	5.1.07	REGISTRO DE 1 1/4" (Incluye accesorios, suministros e instalación)	UN	-1,00	$213.835,00	$ -213.835,00
36	5.1.11	LLAVE MANGUERA	UN	-1,00	$38.255,00	$ -38.255,00
						$ -494.129,00
	7	RED SANITARIA				
43	7,03	RELLENO TIPO 2 "RECEBO"	M3	-0,70	$79.419,00	$ -55.593,30

54	7,14	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN	-17,00	$74.391,00	$ - 1.264.647,00
						$ - 2.305.433,30
	8	**RED PLUVIAL**				
60	8,05	RELLENO TIPO 1"GRAVILLA"	M3	-8,97	$84.906,00	$ - 761.606,82
62	8,07	RED SANITARIA PVC-S 6"	ML	-65,00	$93.407,00	$ - 6.071.455,00
63	8,08	SALIDA AGUAS LLUVIAS ACANAL DE 4" (Incluye codo90, suministros e instalación)	UN	-4,00	$61.452,00	$ - 245.808,00
65	8,10	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 6"_160MM (Incluye suministros e instalación)	ML	-109,00	$40.132,00	$ - 4.374.388,00
66	8,11	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"	ML	-2,60	$72.433,00	$ - 188.325,80
67	8,12	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12"	ML	-18,36	$104.270,00	$ - 1.914.397,20
68	8,13	TUBERIA PVCLCANTARILLADO 14"_355MM (Incluye suministros e instalación)	ML	-40,00	$152.314,00	$ - 6.092.560,00
69	8,14	TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	-1.161,00	$29.468,00	$ - 34.212.348,00
70	8,15	TUBERÍA DRENAJE PVC 200	ML	-166,00	$61.267,00	$ - 10.170.322,00
71	8,16	SUMINISTRO EINSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	-796,00	$7.569,00	$ - 6.024.924,00
72	8,17	CAJA DE INSPECCIÓN DE40X40	UN	-1,00	$241.560,00	$ - 241.560,00
75	8,20	CANAL ACO SPORT DEDRENAJE EN POLICONCRETO _LW125H200B125 + REJILLA (Incluye suministros, excavación, rellenos, mano de obra para su instalación)	M	-635,00	$708.435,00	$ - 449.856.225,00
76	8,21	SUMIDERO LW125K +REJILLA LW125 L =0,50(Incluye suministros e instalación)	UN	-10,00	$1.116.611,00	$ - 11.166.110,00
						$ - 531.320.029,82
	9	**RED GENERAL DE SUMINISTRO**				
	9,1	**ACOMETIDA MEDIDOR YLLENADO DE TANQUE**				
80	9.1.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	M3	-175,51	$48.721,00	$ - 8.551.022,71
81	9.1.02	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	-142,76	$20.799,00	$ - 2.969.265,24
82	9.1.03	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	-33,30	$107.689,00	$ - 3.586.043,70
83	9.1.04	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	-6,20	$11.472,00	$ -71.126,40
84	9.1.05	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	-4,74	$9.213,00	$ -43.669,62
85	9.1.06	ACOMETIDA DE 1/2" (Incluye suministros e instalación de accesorios y medidor)	UN	-9,00	$211.416,00	$ - 1.902.744,00
						$ - 17.123.871,67
	9,2	**TANQUE**				
88	9.2.01	EXCAVACIÓN MANUAL ENMATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	M3	-19,60	$48.721,00	$ - 954.931,60
93	9.2.06	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	-295,12	$9.522,00	$ - 2.810.132,64
94	9.2.07	CORTE PARA JUNTA DEDILATACIÓN EN PISO DECONCRETO AL 1/3 DEL ESPESOR DE LA PLACA (INCLUYE EQUIPOS Y MANO DE OBRA PARA EJECUCIÓN)	ML	-73,67	$1.798,00	$ - 132.458,66
95	9.2.08	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO YSELLANTE)	ML	-73,67	$7.699,00	$ - 567.185,33

103	9.2.16	VÁLVULA CHEQUE DE 3" (Incluye suministro e instalación)	UN	-1,00	$296.695,00	$ - 296.695,00
104	9.2.17	VÁLVULA DE BOLA METÁLICA 1" (Suministro e instalación)	UN	-6,00	$40.835,00	$ - 245.010,00
						$ - 5.342.827,23
	10	RED SUMINISTRO DE AGUA FRÍA				
109	10,02	RED SUMINISTRO PVC 2 1/2"	ML	-147,13	$53.613,00	$ - 7.888.080,69
110	10,03	RED SUMINISTRO PVC 2"	ML	-13,00	$34.577,00	$ - 449.501,00
111	10,04	RED SUMINISTRO PVC 1 1/2"	ML	-5,42	$24.424,00	$ - 132.378,08
112	10,05	TUBERIA PVC P 1 1/4" RDE 21 (Incluye accesorios suministros e instalación)	ML	-24,00	$17.111,00	$ - 410.664,00
113	10,06	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	-50,10	$15.280,00	$ - 765.528,00
114	10,07	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	-191,00	$9.213,00	$ - 1.759.683,00
115	10,08	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	-15,00	$11.472,00	$ - 172.080,00
116	10,09	REGISTRO 1/2"	UN	-7,00	$63.092,00	$ - 441.644,00
117	10,10	LLAVE MANGUERA	UN	-1,00	$38.255,00	$ -38.255,00
						$ - 12.057.813,77
	11	PUNTOS HIDRAÚLICOS DEAGUA FRIA h max 2,50m				
118	11,01	PUNTO AF LLAVE MANGUERA (incluye suministros e instalaciones)	UN	-13,00	$34.443,00	$ - 447.759,00
120	11,03	PUNTO AF DISPENSADOR DE AGUA (Incluye suministros e instalaciones)	UN	-5,00	$34.443,00	$ - 172.215,00
						$ - 619.974,00
	12	REDES ELÉCTRICAS				
	12,1	**RED DE ENERGIA**				
121	12.1.01	4 DUCTOS D=3" PVC-TDP(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS) NORMA CS209.	ML	-5,00	$73.759,00	$ - 368.795,00
123	12.1.03	6 DUCTOS D=6" PVC-TDP(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS). NORMA CS212.	ML	-16,00	$293.179,00	$ - 4.690.864,00
124	12.1.04	CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274(ZVERDE. INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPA). MEDIDAS EXTERNAS: 0.90 X 0.90M. MEDIDAS INTERNAS: 0.60X 0.60M. ALTURA: 0.93M.	UN	-72,00	$521.297,00	$ - 37.533.384,00
129	12.1.09	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA AP Y EMPALME DE DERIVACIÓN RESINA (Incluye suministros e instalación)	UN	-76,00	$2.476.732,00	$ - 188.231.632,00
131	12.1.11	RED SUBTERRANEA 1x2+1x2 ALUMINIO 600V THW AWG (Incluye suministro e instalación).	ML	-1.600,00	$40.331,00	$ - 64.529.600,00
						$ - 295.354.275,00
	12,2	RED DE ALÚMBRADO PÚBLICO				
134	12.2.01	2 DUCTOS D=3" PVC-TDP(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS) NORMA CS207.	ML	-1.297,00	$36.680,00	$ - 47.573.960,00
135	12.2.02	POSTE METÁLICO 6M	UN	-48,00	$1.330.923,00	$ - 63.884.304,00
136	12.2.03	POSTE METALICO AP, H=8M (INC. SUMINISTRO, IZAJE, APLOMADO E INSTALACIÓN. INC. BRAZO SENCILLO Y BASE SEGÚN NORMA AP802)	UN	-14,00	$2.841.380,00	$ - 39.779.320,00
137	12.2.04	POSTE METALICO AP, H=12M (INC. SUMINISTRO, IZAJE APLOMADO E INSTALACIÓN. INC. BRAZO	UN	-4,00	$3.534.657,00	$ -

140	12.2.07	LUMINARIA REF.: OMEGA MP II 128 LED . NW. 4000K.T02. 70W 9.668 Lúmenes. 120/277V. 100.000 HORAS. IP66. SPD 10KV-10KA. MARCA ROY ALPHA. Con Base para Fotocelda y Fotocelda y brazo de 0,5 mx 11/2". GARANTIA: 5AÑOS.	UN	-15,00	$1.022.312,00	$ - 15.334.680,00
141	12.2.08	REFLECTOR TAYRONA LED I I92 LED. P04 5000K.103W 14.344 Lúmenes. IRC 80 120/277V. 50.000HORAS. IP66. MARCA ROY ALPHA. Garantía: 5 AÑOS.	UN	-5,00	$1.090.877,00	$ - 5.454.385,00
142	12.2.09	REFLECTOR TAYRONA LED II 320 LED. P04 170W 24.297 Lúmenes. 120/277V. SPD 10KV- 10KA. CTRL 0-10V 50.000 Horas. 5000K. IRC 80 MARCA: ROY ALPHA. GARANTIA: 5 AÑOS	UN	-18,00	$1.253.134,00	$ - 22.556.412,00
144	12.2.11	Proyector H bay de 960W124.000 Lúmenes IP66 4000K Y/O 6500K DRIVER MULTIVOLTAJE 120-277V. VIDA UTIL PROMEDIO :100.000 HORAS. CTRL O- 1OV. GARANTIA : 7 AÑOS.A 30°	UN	-43,00	$10.077.467,00	$ - 433.331.081,00
145	12.2.12	LUMINARIA HERMETICA DE ALTO RENDIMIENTO121 CMS IP65 40W 4.969 Lúmenes . 120/277V. 100.000 HORAS. Garantías: 7 años. MARCA. ROY ALPHA.	UN	-8,00	$275.468,00	$ - 2.203.744,00
146	12.2.13	LUMINARIA LED HERMETICA 40W 100-277V	UN	-56,00	$275.468,00	$ - 15.426.208,00
147	12.2.14	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UN	-36,00	$58.370,00	$ - 2.101.320,00
148	12.2.15	SALIDA TRIFÁSICA PVC COMPLETA	UN	-18,00	$133.539,00	$ - 2.403.702,00
						$ - 692.066.036,00

COSTO DIRECTO		**2.785.906.383,53**
ADMINISTRACION	26%	**724.335.659,72**
IMPREVISTOS	2%	**55.718.127,67**
UTILIDAD	5%	**139.295.319,18**
COSTO DIRECTO + A.I.U		**3.705.255.490,10**
AJUESTE AL PRESUPUESTO		
VALOR TOTAL		**3.705.255.490,10**

ÍTEMS NO PREVISTOS.

NP	ITEMS NO PREVISTOS	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
NP-01	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	M3	10.325,30	$77.321,00	$ 798.362.521,30
NP-02	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	118,08	$1.090.541,00	$ 128.771.081,28
NP-03	Shockpad Refosport 16 mm	M2	7.362,24	$108.500,00	$ 798.803.040,00
NP-04	CarcamoT-2 2500 psi+Rejilla Peat.Conc.Ref. (canal) seccion de 35x40x100	ML	640,00	$269.269,36	$ 172.332.390,40
NP-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T 2100 (ESTABILIZACION, FILTRO Y SEPARACION)	M2	7.362,24	$11.764,00	$ 86.609.391,36
NP-06	FILTRO LATERAL DE VIA ALVEOLAR IMPERMEABLE	ML	354,00	$107.220,00	$ 37.955.880,00
NP-07	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	ML	601,77	$27.272,67	$ 16.411.874,63
NP-08	CerramMallaEslaCal10 h=2.5+Malla Nylonh=2.5	ML	353,81	$971.171,87	$ 343.610.319,32

COSTO DIRECTO		$ 2.382.856.498,29
ADMINISTRACION	26%	$ 619.542.689,56
IMPREVISTOS	2%	$ 47.657.129,97
UTILIDAD	5%	$ 119.142.824,91
COSTO DIRECTO + A.I.U		$ 3.169.199.142,73
AJUESTE AL PESO		$ -0,01
VALOR TOTAL		$ 3.169.199.142,72

6) Que en vista de lo anterior se hace necesario modificar el contrato por las mayores, menores cantidades de obra, como se estipula en el acta No. 03. **11)** Que en mérito de lo expuesto, las partes acuerdan modificar el contrato en los siguientes términos: **CLAUSULA PRIMERA: MODIFIQUESE LA CLAUSULA SEXTA: DESCRIPCION DE LOS ITEMS A EJECUTAR,** la cual quedara así: **CLAUSULA SEXTA: DESCRIPCION DE LOS ITEMS A EJECUTAR**: El contratista se compromete a ejecutar la obra en cada uno de los ítems descritos de acuerdo a las unidades, cantidades, precios, y especificaciones técnicas, conforme a las mayores, menores cantidades e ítems no previstos que se aprueben en la presente y Modificatorio No. 1 así:

CUADRO CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE Y MODIFICACIÓN No. 01

No.	ITEM	DESCRIPCION	UND	Vr Unit Directo	CANT.	Vr Parcial Directo
	1	PRELIMINARES				
	1.10	PRELIMINARES				
1	1.1.01	DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M	M2	$1,527.00	13,563.81	$ 20,711,937.87
2	1.1.02	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXCANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	$1,300.00	9,293.33	$ 12,081,329.00
						$ 32,793,266.87
	2	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
3	2.010	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	M3	$17,445.00	10,354.82	$ 180,639,834.90
4	2.020	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE (Incluye suministro de equipos)	M2	$1,396.00	13,559.27	$ 18,928,740.92
5	2.030	RELLENO CON MATERIALDEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	$20,799.00	11,230.76	$ 233,588,577.24
						$ 433,157,153.06
	3	ESTRUCTURAS				
	3.1	CIRCULACIÓN Y PERMANENCIA				
	3.1.1	PISOS				
6	3.1.1.01	RELLENO TIPO 4 "SUBBASEB-200"	M3	$87,728.00	-	$ -
7	3.1.1.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	$9,549.00	579.11	$ 5,529,921.39
8	3.1.1.03	SUBBASE GRANULAR	M3	$170,944.00	2,536.00	$ 433,513,984.00
9	3.1.1.04	ANDÉN CONCRETO 3000PSI EN SITIO E=0.1M	M2	$62,959.00	-	$ -
10	3.1.1.05	CONCRETO 3000 PSI	M3	$439,638.00	-	$ -

12	3.1.1.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1700 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	$6,427.00	-	$ -
13	3.1.1.08	RELLENO TIPO 7 "ARENADE PEÑA"	M3	$107,689.00	-	$ -
14	3.1.1.09	GRAMA SINTÉTICA PARACAMPOS DEPORTIVOS	M2	$127,347.00	7,362.24	$ 937,559,177.28
15	3.1.1.10	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	$4,534.00	9,724.24	$ 44,089,704.16
16	3.1.1.11	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	$877,156.00	-	$ -
17	3.1.1.12	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2	$2,199.00	-	$ -
18	3.1.1.13	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	$903,931.00	-	$ -
19	3.1.1.14	BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	$70,885.00	750.00	$ 53,163,750.00
20	3.1.1.15	SISTEMA BICAPA O SÁNDWICH CON ESTRUCTURA GRANULADA, ANTIDESLIZANTE E IMPERMEABLE FUNDIDA EN SITIO CON PROTECCIÓN UV Y RESISTENTE A LOS CLAVOS, CUMPLE CON NORMAS DIN EN 14877 YDIN 18035-6. ESPESOR 13 MM, CONSISTE DE IMPRIMACIÓN CON VIASOL EP-P210, 1 CAPAELASTICA DE 10 A 12 MM DE SBR 1 A 4 MM, CAPA DE TAPAPOROS Y UNA CAPA DE 3 A 5MM VERTIDA Y ESTRUCTURADA DE EPDM1 A 4 MM DE COLOR ROJO.INCLUYE RECUBRIMIENTO EN PISTA Y CARRILES DE SALTO TRIPLE PARA PISTA ATLÉTICA CERTIFICADA. (Incluye suministros e instalación)	M2	$413,168.00	2,361.75	$ 975,799,524.00
21	3.1.1.16	RECUBRIMIENTO SINTÉTICO COLOR PAVE (Incluye suministros, equipos, mano de obra para su correcta instalación)	M2	$112,661.00	2,361.75	$ 266,077,116.75
						$ 2,715,733,177.58
	3.2	**MOBILIARIO**				
22	3.2.01	ARCOS DE FÚTBOL 11 X 2JUEGOS (Incluye mallas impermeabilizadas) (Incluye suministros, equipos y mano de obra para su correcta instalación)	JG	$9,031,568.00	1.00	$ 9,031,568.00
23	3.2.02	EQUIPO PARA PISTA DE ATLETISMO (Incluye suministros 4 obstáculos y17 tacos de salida)	UN	$90,598,364.00	1.00	$ 90,598,364.00
24	3.2.03	FOSO DE ARENA PARASALTO LARGO Y SALTOTRIPLE (Incluye cantonera final y arena de sílice al99%)	UN	$21,064,211.00	2.00	$ 42,128,422.00
						$ 141,758,354.00
	4	**PAISAJISMO**				
25	4.01	EMPRADIZACIÓN CON BIOMANTO NATURAL	M2	$28,594.00	-	$ -
						$ -
	5	**EDIFICACIONES**				
	5.1	**RED SUMINISTRO DE AGUA FRÍA**				
26	5.1.01	RED SUMINISTRO PVC 2"	ML	$34,577.00	-	$ -
27	5.1.02	RED SUMINISTRO PVC 11/2"	ML	$24,424.00	13.00	$ 317,512.00
28	5.1.03	TUBERIA PVC P 1 1/4" RDE 21 (Incluye accesorios suministros e instalación)	ML	$17,111.00	9.00	$ 153,999.00
29	5.1.04	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	$15,280.00	31.00	$ 473,680.00
30	5.1.05	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	$9,213.00	129.00	$ 1,188,477.00
31	5.1.06	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	$11,472.00	36.00	$ 412,992.00
32	5.1.07	REGISTRO DE 1 1/4" (Incluye accesorios, suministros e instalación)	UN	$213,835.00	2.00	$ 427,670.00
						$

35	5.1.10	REGISTRO 1/2"	UN	$63,092.00	2.00	$ 126,184.00
36	5.1.11	LLAVE MANGUERA	UN	$38,255.00	-	$ -
						$ 3,451,166.00
	6	**PUNTOS HIDRÁULICOS DEAGUA FRÍA**				
37	6.01	PUNTO AF REGADERA (Incluye suministros e instalaciones)	UN	$177,836.00	-	$ -
38	6.02	PUNTO AF LLAVE MANGUERA (Incluye suministros e instalaciones)	UN	$34,443.00	15.00	$ 516,645.00
39	6.03	PUNTO AF DISPENSADOR DE AGUA (Incluye suministros e instalaciones)	UN	$34,443.00	6.00	$ 206,658.00
40	6.04	REGISTRO 1/2"	UN	$70,101.00	-	$ -
						$ 723,303.00
	7	**RED SANITARIA**				
41	7.01	EXCAVACIÓN MANUAL ENMATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	M3	$48,721.00	19.00	$ 925,699.00
42	7.02	RELLENO TIPO 7 "ARENADE PEÑA"	M3	$107,689.00	6.38	$ 687,055.82
43	7.03	RELLENO TIPO 2 "RECEBO"	M3	$79,419.00	15.30	$ 1,215,110.70
44	7.04	RELLENO CON MATERIALDE EXCAVACIÓN	M3	$20,799.00	7.65	$ 159,112.35
45	7.05	TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	$29,468.00	38.80	$ 1,143,358.40
46	7.06	TUBERÍA DRENAJE PVC 160	ML	$46,906.00	37.00	$ 1,735,522.00
47	7.07	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	$27,347.00	13.00	$ 355,511.00
48	7.08	RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	$37,652.00	29.40	$ 1,106,968.80
49	7.09	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	$56,742.00	-	$ -
50	7.10	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN	$74,391.00	5.00	$ 371,955.00
51	7.11	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UN	$79,451.00	11.00	$ 873,961.00
52	7.12	CAJA DE INSPECCIÓN DE60X60	UN	$274,171.00	6.00	$ 1,645,026.00
53	7.13	REVENTILACIÓN 2"	ML	$19,248.00	27.00	$ 519,696.00
54	7.14	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN	$74,391.00	12.00	$ 892,692.00
55	7.15	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UN	$97,502.00	10.00	$ 975,020.00
						$ 12,606,688.07
	8	**RED PLUVIAL**				
56	8.01	EXCAVACIÓN MANUAL ENMATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DESOBRANTES A UNADISTANCIA MENOR DE 5KM)	M3	$48,721.00	107.57	$ 5,240,917.97
57	8.02	RELLENO TIPO 7 "ARENADE PEÑA"	M3	$107,689.00	44.82	$ 4,826,620.98
58	8.03	RELLENO TIPO 2 "RECEBO"	M3	$79,419.00	64.54	$ 5,125,702.26
59	8.04	RELLENO CON MATERIALDE EXCAVACIÓN	M3	$20,799.00	32.27	$ 671,183.73
60	8.05	RELLENO TIPO 1"GRAVILLA"	M3	$84,906.00	43.03	$ 3,653,505.18
61	8.06	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	$51,069.00	55.50	$ 2,834,329.50
62	8.07	RED SANITARIA PVC-S 6"	ML	$93,407.00	-	$ -
63	8.08	SALIDA AGUAS LLUVIAS ACANAL DE 4" (Incluye codo90, surninistros e instalación)	UN	$61,452.00	-	$ -
64		SALIDA AGUAS LLUVIAS ACANAL DE 6" (Incluye				$

66	8.11	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"	ML	$72,433.00	23.40	$ 1,694,932.20
67	8.12	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12"	ML	$104,270.00	35.64	$ 3,716,182.80
68	8.13	TUBERIA PVCLCANTARILLADO 14"_355MM (Incluye suministros e instalación)	ML	$152,314.00	-	$ -
69	8.14	TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	$29,468.00	-	$ -
70	8.15	TUBERÍA DRENAJE PVC 200	ML	$61,267.00	-	$ -
71	8.16	SUMINISTRO EINSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	$7,569.00	-	$ -
72	8.17	CAJA DE INSPECCIÓN DE 40X40	UN	$241,560.00	-	$ -
73	8.18	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	UN	$395,145.00	-	$ -
74	8.19	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100	UN	$485,070.00	10.00	$ 4,850,700.00
75	8.20	CANAL ACO SPORT DEDRENAJE EN POLICONCRETO _LW125 H200B125 + REJILLA (Incluye suministros, excavación, rellenos, mano de obra para su instalación)	M	$708,435.00	-	$ -
76	8.21	SUMIDERO LW125K +REJILLA LW125 L =0,50(Incluye suministros e instalación)	UN	$1,116,611.00	-	$ -
77	8.22	CANAL ACO ENPOLICONCRETO_N150_H31 + REJILLA(Incluye suministros, excavación, rellenos, mano de obra para su instalación)	ML	$542,697.00	-	$ -
78	8.23	CONCRETO 4000 PSI	M3	$456,485.00	3.30	$ 1,506,400.50
79	8.24	ACERO FIGURADO 60000PSI	KG	$7,588.00	100.89	$ 765,553.32
						$ 76,872,893.44
	9	**RED GENERAL DE SUMINISTRO**				
	9.1	**ACOMETIDA MEDIDOR YLLENADO DE TANQUE**				
80	9.1.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	M3	$48,721.00	6.49	$ 316,199.29
81	9.1.02	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	$20,799.00	3.24	$ 67,388.76
82	9.1.03	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	$107,689.00	2.70	$ 290,760.30
83	9.1.04	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	$11,472.00	16.80	$ 192,729.60
84	9.1.05	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	$9,213.00	9.26	$ 85,312.38
85	9.1.06	ACOMETIDA DE 1/2" (Incluye suministros e instalación de accesorios y medidor)	UN	$211,416.00	-	$ -
86	9.1.07	FLOTADOR MECANICO DE1/2" (Incluye suministro e instalación)	UN	$99,516.00	2.00	$ 199,032.00
87	9.1.08	CAJA CONTADOR DE AGUA	UN	$80,601.00	1.00	$ 80,601.00
						$ 1,232,023.33
	9.2	**TANQUE**				
88	9.2.01	EXCAVACIÓN MANUAL ENMATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	M3	$48,721.00	28.00	$ 1,364,188.00
89	9.2.02	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	$84,621.00	19.60	$ 1,658,571.60
90	9.2.03	RELLENO TIPO 4 "SUBBASEB-200"	M3	$78,956.00	2.80	$ 221,076.80
91	9.2.04	SUBBASE GRANULAR	M3	$170,944.00	16.80	$ 2,871,859.20
91	9.2.05	PLACA EN CONCRETO DE 24 MPa, e=0.15 m (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y VIBRADO.NO INCLUYE	M2	$147,052.00	56.00	$ 8,234,912.00

94	9.2.07	CORTE PARA JUNTA DEDILATACIÓN EN PISO DECONCRETO AL 1/3 DEL ESPESOR DE LA PLACA (INCLUYE EQUIPOS Y MANO DE OBRA PARA EJECUCIÓN)	ML	$1,798.00	113.00	$ 203,174.00
95	9.2.08	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO YSELLANTE)	ML	$7,699.00	113.00	$ 869,987.00
96	9.2.09	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 15000 LTRS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIONES)	UN	$25,260,058.00	2.00	$ 50,520,116.00
97	9.2.10	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	M2	$112,772.00	60.00	$ 6,766,320.00
98	9.2.11	VÁLVULA MARIPOSA 3"	UN	$659,205.00	3.00	$ 1,977,615.00
99	9.2.12	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	$11,472.00	10.00	$ 114,720.00
100	9.2.13	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	$15,280.00	17.00	$ 259,760.00
101	9.2.14	REGISTRO 3/4"	UN	$79,783.00	2.00	$ 159,566.00
102	9.2.15	UNIÓN UNIVERSAL PVC3"(Incluye suministro e instalación)	UN	$56,069.00	2.00	$ 112,138.00
103	9.2.16	VÁLVULA CHEQUE DE 3" (Incluye suministro e instalación)	UN	$296,695.00	-	$ -
104	9.2.17	VÁLVULA DE BOLA METÁLICA 1" (Suministro e instalación)	UN	$40,835.00	1.00	$ 40,835.00
105	9.2.18	UNIÓN UNIVERSAL PVC1"(Incluye suministro e instalación)	UN	$18,396.00	2.00	$ 36,792.00
106	9.2.19	UNIÓN UNIVERSAL PVC3/4"(Incluye suministro e instalación)	UN	$15,387.00	1.00	$ 15,387.00
107	9.2.20	VÁLVULA CHEQUE DE 3/4" (Incluye suministro e instalación)	UN	$53,100.00	1.00	$ 53,100.00
						$ 76,189,316.16
	10	**RED SUMINISTRO DE AGUA FRÍA**				
108	10.01	TUBERIA PVC P 3" RDE 21 (Incluye accesorios suministros e instalación)	ML	$57,401.00	119.40	$ 6,853,679.40
103	10.02	RED SUMINISTRO PVC 2 1/2"	ML	$53,613.00	176.87	$ 9,482,531.31
110	10.03	RED SUMINISTRO PVC 2"	ML	$34,577.00	-	$ -
111	10.04	RED SUMINISTRO PVC 1 1/2"	ML	$24,424.00	82.58	$ 2,016,933.92
112	10.05	TUBERIA PVC P 1 1/4" RDE 21 (Incluye accesorios suministros e instalación)	ML	$17,111.00	-	$ -
113	10.06	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	$15,280.00	286.90	$ 4,383,832.00
114	10.07	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	$9,213.00	-	$ -
115	10.08	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	$11,472.00	-	$ -
116	10.09	REGISTRO 1/2"	UN	$63,092.00	12.00	$ 757,104.00
117	10.10	LLAVE MANGUERA	UN	$38,255.00	12.00	$ 459,060.00
						$ 23,953,140.63
	11	**PUNTOS HIDRAULICOS DEAGUA FRIA h max 2,50m**				
118	11.01	PUNTO AF LLAVE MANGUERA (incluye suministros e instalaciones)	UN	$34,443.00	-	$ -
119	11.02	PUNTO AF LAVADO DE PIES (Incluye suministros e instalaciones)	UN	$36,794.00	1.00	$ 36,794.00
120	11.03	PUNTO AF DISPENSADOR DE AGUA (Incluye suministros e instalaciones)	UN	$34,443.00	-	$ -
						$ 36,794.00

121	12.1.01	4 DUCTOS D=3" PVC-TDP(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS) NORMA CS209.	ML	$73,759.00	45.00	$ 3,319,155.00
122	12.1.02	4 DUCTOS D=4" PVC-TDP(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS) NORMA CS209.	ML	$88,688.00	130.10	$ 11,538,308.80
123	12.1.03	6 DUCTOS D=6" PVC-TDP(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS). NORMA CS212.	ML	$293,179.00	29.00	$ 8,502,191.00
124	12.1.04	CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274(ZVERDE. INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPA). MEDIDAS EXTERNAS: 0.90 X 0.90M. MEDIDAS INTERNAS: 0.60X 0.60M. ALTURA: 0.93M.	UN	$521,297.00	14.00	$ 7,298,158.00
125	12.1.05	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 275 (ZVERDE.INCLUYE BASE, MUROS,PAÑETE, MARCO Y TAPA). MEDIDAS EXTERNAS: 1.49 X 0.99M. MEDIDAS INTERNAS: 1.19 X 0.69M. ALTURA: 1.37M.	UN	$884,588.00	6.00	$ 5,307,528.00
126	12.1.06	CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276 (ZVERDE.INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPAS). MEDIDAS EXTERNAS: 1.79 X 1.49M. MEDIDAS INTERNAS: 1.49 X 1.19M. ALTURA: 1.22M.	UN	$1,255,733.00	6.00	$ 7,534,398.00
127	12.1.07	TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	$431,487.00	2.00	$ 862,974.00
128	12.1.08	MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN SUBTERRÁNEO RED DISTRIBUCIÓN O ALUMBRADO PUBLICO, RESISTIVIDAD DE TERRENO DE 42.42 O-M. (INCLUYE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, POZOS CAPACITIVOS, TRATAMIENTO DE SUELO TIPO HIDROSOLTA, CABLE 2/0 CU DESNUDO, CONECTORES CERTIFICADOS.) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	$3,944,905.00	1.00	$ 3,944,905.00
129	12.1.09	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA AP Y EMPALME DE DERIVACIÓN RESINA (Incluye suministros e instalación)	UN	$2,476,732.00	8.00	$ 19,813,856.00
130	12.1.10	CABLE ELÉCTRICO 2X8 AWG PARA ACOMETIDA TIPO ST CU 600V 75°C. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	ML	$14,917.00	775.00	$ 11,560,675.00
131	12.1.11	RED SUBTERRANEA 1x2+1x2 ALUMINIO 600V THW AWG (Incluye suministro e instalación).	ML	$40,331.00	250.00	$ 10,082,750.00
132	12.1.12	RED SUBTERRANEA 3x185mm2 ALUMINIO XLPE 15kV (Incluye suministro e instalación).	ML	$181,609.00	60.00	$ 10,896,540.00
133	12.1.13	SUBESTACIÓN SEMISUMERGIBLE DE 150 KVA 13200/208-120V, CAJA DE MANIOBRA ENTRADA Y SALIDA DE 3 VÍAS 600A 15 KV (Incluye suministro, transporte, accesorios e instalación). Norma CODENSA CTS 534.	UN	$30,188,596.00	1.00	$ 30,188,596.00
						$ 130,850,034.80
	12.2	**RED DE ALUMBRADO PÚBLICO**				
134	12.2.01	2 DUCTOS D=3" PVC-TDP(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS) NORMA CS207.	ML	$36,680.00	250.00	$ 9,170,000.00
135	12.2.02	POSTE METÁLICO 6M	UN	$1,330,923.00	5.00	$ 6,654,615.00
136	12.2.03	POSTE METALICO AP, H=8M (INC. SUMINISTRO, IZAJE, APLOMADO E INSTALACIÓN. INC. BRAZOSENCILLO Y BASE SEGÚN NORMA AP802)	UN	$2,841,380.00	9.00	$ 25,572,420.00
137	12.2.04	POSTE METALICO AP, H=12M (INC. SUMINISTRO, IZAJE, APLOMADO E INSTALACIÓN. INC. BRAZOSENCILLO Y BASE SEGÚN NORMA AP802)	UN	$3,534,657.00	-	$ -
138		POSTE METALICO H=24M.INCLUYE				

AJUESTE AL PRESUPUESTO	$ 0.81
VALOR TOTAL	$ 8,370,631,493.49

CLAUSULA CUARTA: GARANTIA UNICA: El CONTRATISTA se obliga a ampliar la vigencia de la garantía única, con sus respectivos amparos, modificándola con respecto a la Modificatorio No 01 aquí contenida, realizando el correspondiente cargue en la plataforma SECOP II. **CLAUSULA QUINTA: VALIDEZ DEL CONTRATO PRINCIPAL:** Todas las demás cláusulas y condiciones al contrato de obra pública N° 2023-0667, a que se ha hecho referencia, permanecerán inalterables y conservarán toda su vigencia y efecto, mientras no se encuentren en contradicción con lo estipulado en la presente Modificatorio No 01. **CLAUSULA SEXTA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION:** El presente contrato de Modificatorio No 01, se perfecciona con la aprobación de las partes en la plataforma SECOPII.

ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ

ADICION No. 1 Y MODIFICATORIO No. 2 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 2023-0667 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y CONSORCIO DEPORTIVO 2023

Entre los suscritos **JENNIFER JULIANA ROJAS LOPEZ** mayor de edad, domiciliada y residente en Fusagasugá, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.070.952.561 expedida en Facatativá, en calidad de Secretaria Jurídica, cargo para el cual fue nombrada mediante Decreto No. 141 del 08 de marzo de 2023, según consta en el acta de posesión de la misma fecha, y delegada por el Alcalde Municipal mediante Decreto No. 044 del 12 de mayo de 2023, el cual rige a partir del 15 de mayo de 2023 "para celebrar contratos estatales de cualquiera de sus modalidades de selección, así como los contratos interadministrativos que resulten necesarios para el logro de los objetivos de la entidad", de una parte, quien en adelante se denominara **EL MUNICIPIO** y por la señora **ING. LUIS GABRIEL FARFÁN VELÁSQUEZ** con cedula de ciudadanía No. 79.584.718 de Bogotá D.C, representante legal **CONSORCIO DEPORTIVO 2023** en calidad de **CONTRATISTA;** hemos convenido celebrar la Adición No. 1 y Modificación No.2, al contrato de obra pública N° 2023-0667, el cual se regirá por las cláusulas que posteriormente se estipulan, previas las siguientes consideraciones: **1)** Que con fecha 16 de junio del 2023 se suscribió el Contrato de Obra Pública No. 2023-0667, con el señor GERMAN ANDRES DUARTE ROA, mayor de edad, identificada con la cedula de ciudadanía No. 79.951.560 de Bogotá D.C., representante legal de la empresa INCIVILES ASOCIADOS S.A.S, con Nit No. 900.226. 247-8, cuyo objeto es ""EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 de 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA, PISTA ATLETICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGADEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" **2)** Que al mencionado contrato se le dio inicio el 06 de septiembre de 2023. **3)** Que el dia 13 de noviembre se realizo cesión al CONSORCIO DEPORTIVO 2023 identificado con NIT. 901.771.549-7 representado legalmente por LUIS GABRIEL FARFAN VELASQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No 79.584.718 de Bogotá . **4)** En el Municipio de Fusagasugá, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre del año 2023, se reunieron en la secretaria de infraestructura del municipio de Fusagasugá, el ING. OSCAR FABIAN ESPINEL MANRIQUE en calidad de SUPERVISOR, la DRA. JENNIFER JULIANA ROJAS LOPEZ en calidad de la mejor ordenadora del gasto mediante el DECRETO DE DELEGACIÓN 106 DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023, el ING. LUIS GABRIEL FARFÁN VELÁSQUEZ con cedula de ciudadanía No. 79.584.718 de Bogotá D.C, representante legal CONSORCIO DEPORTIVO 2023 en calidad de CONTRATISTA, el ING. CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ con cedula de ciudadanía No. 19.275.138 de Bogotá D.C, representante legal R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS en calidad de INTERVENTOR con el fin de dar inicio al contrato cuyo objeto de "EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 DE 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA". con el fin se suscribir el presente ACTA NO. 05 MODIFICACION 02 ADICION O1 teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 1. Que el día 10 de noviembre mediante oficio la interventoría realizo la solicitud de inclusión de ítems no previstos, teniendo como fundamento la propuesta presentada por parte del contratista. 2. Que el dia 15 de diciembre quedo suscrito el modificatorio No. Al CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 DE 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA". en el cual el iccu permite la inclusión de los saldos diferenciales del presupuesto oficial del proceso

presupuesta de inclusión al presupuesto de $ 930.067.805,15. 4. Que el contratista mediante oficio y en aval de la interventoría presenta una propuesta donde se da una destinación a los recursos aprobados por el ICCU. 5. Que dentro de la propuesta se ve necesario la inclusión de actividades complementarias para poder generar un alcance pleno de la etapa propuesta de parque de las generaciones, donde se ve la necesidad de inclusión de recursos de la administración municipal para dicha adición y destinación. 6. Que para el supervisor del contrato como de la interventoría esta propuesta es viable y acertada desde los componentes contractual y técnicos que enmarcan el contrato. 7. Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones se modifica el presente contrato en el siguiente orden. 8. Los valores de los ítems no previstos son sacados teniendo en cuenta los valores de las actividades como referencia en ICCU, IDRD o cotizaciones en los casos en que la actividad no estaba evidenciada o referenciada. **5)** Que para el efecto se relaciona a continuación las mayores, menores cantidades de obra, e ítems no previstos consagrados en el acta No. 06, a ejecutar en el presente modificatorio y adición así:

MAYORES CANTIDADES

ITEM	ITEM ICCU	DESCRIPCION	UND	CANT		Vr Unit Directo	
1		**PRELIMINARES**					
1.10		**PRELIMINARES**					
1.1.01		DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M	M2	13.563,81	20.272,47	$1.527,00	$ 30.956.061,69
							$ 30.956.061,69
2		**MOVIMIENTO DE TIERRAS**					
2,010		EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	M3	10.354,82	3.020,82	$17.445,00	$ 52.698.204,90
2,020		NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE (Incluye suministro de equipos)	M2	13.559,27	4.155,42	$1.396,00	$ 5.800.966,32
							$ 58.499.171,22
3		**ESTRUCTURAS**					
3,1		***CIRCULACIÓN* Y PERMANENCIA**					
3.1.1		**PISOS**					
3.1.1.02		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	579,11	7.411,59	$9.549,00	$ 70.773.272,91
3.1.1.03		SUBBASE GRANULAR	M3	2.536,00	1.006,94	$170.944,00	$ 172.130.351,36
3.1.1.04		ANDÉN CONCRETO 3000PSI EN SITIO E=0.1M	M2	0,00	1.667,17	$62.959,00	$ 104.963.356,03
3.1.1.05		CONCRETO 3000 PSI	M3	0,00	309,77	$439.638,00	$ 136.186.663,26
3.1.1.14		BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	750,00	2.472,76	$70.885,00	$ 175.281.592,60
							$ 659.335.236,16
8		**RED PLUVIAL**					
8,10		TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 6"_160MM (Incluye suministros e instalación)	ML	0,00	349,59	$40.132,00	$ 14.029.745,88
							$ 14.029.745,88
12		**REDES ELÉCTRICAS**					
12,1		**RED DE ENERGIA**					

12.1.04		CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274(ZVERDE. INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPA). MEDIDAS EXTERNAS: 0.90 X 0.90M. MEDIDAS INTERNAS: 0.60X 0.60M. ALTURA: 0.93M.	UN	14,00	50,00	$521.297,00	$ 26.064.850,00
							$ 26.433.645,00
12,2		**RED DE ALÚMBRADO PÚBLICO**					
12.2.01		2 DUCTOS D=3" PVC-TDP(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS) NORMA CS207.	ML	250,00	851,51	$36.680,00	$ 31.233.386,80
12.2.11		Proyector H bay de 960W124.000 Lúmenes IP66 4000K Y/O 6500K DRIVERMULTIVOLTAJE 120-277V. VIDA UTIL PROMEDIO :100.000 HORAS. CTRL O-1OV. GARANTIA : 7 AÑOS.A 30°	UN	8,00	44,00	$10.077.467,00	$ 443.408.548,00
							$ 474.641.934,80
		ITEMS NO PREVISTOS					
NP-07	IDRD 11646	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	ml	601,77	344,07	$27.272,67	$ 9.383.707,57
							$ 9.383.707,57
		COSTO DIRECTO					**$ 1.273.279.502,32**
		ADMINISTRACION				26%	**$ 331.052.670,60**
		IMPREVISTOS				2%	**$ 25.465.590,05**
		UTILIDAD				5%	**$ 63.663.975,12**
		COSTO DIRECTO + A.I.U					**$ 1.693.461.738,09**
		AJUESTE AL PRESUPUESTO					
		VALOR TOTAL					**$ 1.693.461.738,09**

MENORES CANTIDADES

ITEM	ITEM ICCU	DESCRIPCION	UND	CANT		Vr Unit Directo	
1		**PRELIMINARES**					
1.10		**PRELIMINARES**					
1.1.02		TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXCANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	9.293,33	-3.401,93	$1.300,00	-$ 4.422.509,00
							-$ 4.422.509,00
8		**RED PLUVIAL**					
8,09		SALIDA AGUAS LLUVIAS ACANAL DE 6" (Incluye codo90, suministros e instalación)	UN	251,75	-251,75	$166.780,00	-$ 41.986.865,00
							-$ 41.986.865,00
12		**REDES ELÉCTRICAS**					
12,1		**RED DE ENERGIA**					
12.1.07		TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	2,00	-2,00	$431.487,00	-$ 862.974,00

12.1.08		MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN SUBTERRÁNEO RED DISTRIBUCIÓN O ALUMBRADO PUBLICO, RESISTIVIDAD DE TERRENODE 42.42 O-M. (INCLÚYESISTEM INSTALACIÓN).A DE PUESTA A TIERRA, POZOS CAPACITIVOS, TRATAMIENTO DE SUELOTIPO HIDROSOLTA, CABLE 2/0 CU DESNUDO, CONECTORES CERTIFICADOS.) (INCLUYE SUMINISTRO E	UN	1,00	-1,00	$3.944.905,00	-$ 3.944.905,00
12.1.09		SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA AP Y EMPALME DE DERIVACIÓN RESINA (Incluye suministros e instalación)	UN	8,00	-8,00	$2.476.732,00	-$ 19.813.856,00
12.1.10		CABLE ELECTRICO 2X8 AWG PARA ACOMETIDA TIPO ST CU 600V 75°C. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	ML	775,00	-549,16	$14.917,00	-$ 8.191.819,72
12.1.11		RED SUBTERRANEA 1x2+1x2 ALUMINIO 600V THW AWG (Incluye suministro e instalación).	ML	250,00	-24,16	$40.331,00	-$ 974.396,96
12.1.13		SUBESTACION SEMISUMERGIBLE DE 150 KVA 13200/208-120V, CAJA DE MANIOBRA ENTRADA Y SALIDA DE 3VÍAS 600A 15 KV (Incluye suministro, transporte, accesorios e instalación). Norma CODENSA CTS 534.	UN	1,00	-1,00	$30.188.596,00	-$ 30.188.596,00
							-$ 63.976.547,68
12,2		**RED DE ALÚMBRADO PÚBLICO**					
12.2.02		POSTE METÁLICO 6M	UN	5,00	-5,00	$1.330.923,00	-$ 6.654.615,00
12.2.03		POSTE METALICO AP, H=8M (INC. SUMINISTRO, IZAJE, APLOMADO E INSTALACIÓN. INC. BRAZOSENCILLO Y BASE SEGÚN NORMA AP802)	UN	9,00	-9,00	$2.841.380,00	-$ 25.572.420,00
12.2.06		LUMINARIA REF.: OMEGA I MP 48 LED. 4000K. T07.28W 3.541 LM. 120/277V. 50.000 HORAS.	UN	5,00	-5,00	$536.121,00	-$ 2.680.605,00
12.2.07		LUMINARIA REF.: OMEGA MP II 128 LED . NW. 4000K.T02. 70W 9.668 Lúmenes. 120/277V. 100.000 HORAS. IP66. SPD 10KV-10KA. MARCA ROY ALPHA. Con Base para Fotocelda y Fotocelda y brazo de 0,5 mx 11/2". GARANTIA: 5AÑOS.	UN	9,00	-9,00	$1.022.312,00	-$ 9.200.808,00
							-$ 44.108.448,00
		ITEMS NO PREVISTOS					
NP-01	ICCU VIAS 2.10 600,1	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	M3	10.325,30	-134,08	$77.321,00	-$ 10.367.199,68
							-$ 10.367.199,68
		COSTO DIRECTO					**-$ 164.861.569,36**
		ADMINISTRACION				26%	**-$ 42.864.008,03**
		IMPREVISTOS				2%	**-$ 3.297.231,39**
		UTILIDAD				5%	**-$ 8.243.078,47**
		COSTO DIRECTO + A.I.U					**-$ 219.265.887,25**
		AJUESTE AL PRESUPUESTO					
		VALOR TOTAL					**-$ 219.265.887,25**

ITEM	ITEM ICCU	DESCRIPCION	UND	CANT		Vr Unit Directo	
NP-09	IDRD COD 16678	PISO CAUCHO RECICLADO 6CM (EPDM 1CM +SBR 5CM SUM+INST) COD IRD 16678	M2		407,17	$693.139,00	$ 282.225.406,63
NP-10	COTIZACIONES	RECUBRIMIENTO SINTETICO SPORT MASTER PARA CAMPOS MULTIPLES	M2		1.883,41	$125.716,46	$ 236.775.637,93
NP-11	ICCU 5,5.1.	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	M2		2.150,42	$95.790,00	$ 205.988.731,80
NP-12	IDRD CIO 106048	Juegocuerdaspoliedro 5-12añosCap:40niñosH=4.5m	UND		1,00	$227.305.370,00	$ 227.305.370,00
NP-13	IDRD CIO 106849	JUEGO COLUMPIO MULTIPLE 9 U(2+añosCap:9 niñosH=2.6	UND		1,00	$95.628.847,00	$ 95.628.847,00
NP-14	IDRD CIO 100575	Juego gran escala circuito 3a5 años cap: 61 niños	UND		1,00	$596.957.187,00	$ 596.957.187,00
NP-15	IDRD CIO 101275	Juego Muelle Paneles laterales Animal2+años Cap4	UND		1,00	$21.125.320,00	$ 21.125.320,00
NP-16	IDRD CIO 106003	Juego muro escalar trepar deslizar:2-8AñosCap:5niñ	UND		1,00	$57.917.342,99	$ 57.917.342,99
NP-17	IDRD CIO 109157	Juego Arenero multifuncion 2+años Cap28 niños P.N	UND		1,00	$167.723.533,00	$ 167.723.533,00
NP-18	IDRD CIO 105668	Mesa- ping pong en fibra de vidrio de 2.74m x1.74m	UND		1,00	$3.153.500,00	$ 3.153.500,00
NP-19	IDRD CIO 105669	Mesa- ping pong en fibra de vidrio de 2.74m x1.74m	UND		2,00	$1.018.072,00	$ 2.036.144,00
							$ 1.896.837.020,35
		COSTO DIRECTO					**$ 1.896.837.020,35**
		ADMINISTRACION				26%	**$ 493.177.625,29**
		IMPREVISTOS				2%	**$ 37.936.740,41**
		UTILIDAD				5%	**$ 94.841.851,02**
		COSTO DIRECTO + A.I.U					**$ 2.522.793.237,07**
		AJUESTE AL PRESUPUESTO					
		VALOR TOTAL					**$ 2.522.793.237,07**

6) Que en vista de lo anterior se hace necesario modificar el contrato por las mayores

en los siguientes términos: **CLAUSULA PRIMERA: MODIFIQUESE LA CLAUSULA SEXTA: DESCRIPCION DE LOS ITEMS A EJECUTAR,** la cual quedara así: **CLAUSULA SEXTA: DESCRIPCION DE LOS ITEMS A EJECUTAR**: El contratista se compromete a ejecutar la obra en cada uno de los ítems descritos de acuerdo a las unidades, cantidades, precios, y especificaciones técnicas, conforme a las mayores, menores cantidades e ítems no previstos que se aprueben en la presente Adición No. 1 y Modificatorio No. 2 así:

CUADRO CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ADICIÓN No. 01 Y MODIFICACIÓN No. 02

ITEM	ITEM ICCU	DESCRIPCION	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo
1		**PRELIMINARES**				
1.10		**PRELIMINARES**				
1.1.01		DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M	M2	33.836,28	$ 1.527,00	$ 51.667.999,56
1.1.02		TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXCANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	5.891,40	$ 1.300,00	$ 7.658.820,00
						$ 59.326.819,56
2		**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				
2,01		EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	M3	13.375,64	$ 17.445,00	$ 233.338.039,80
2,02		NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE (Incluye suministro de equipos)	M2	17.714,69	$ 1.396,00	$ 24.729.707,24
2,03		RELLENO CON MATERIALDEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	11.230,76	$ 20.799,00	$ 233.588.577,24
						$ 491.656.324,28
3		**ESTRUCTURAS**				
3,1		**CIRCULACIÓN Y PERMANENCIA**				
3.1.1		**PISOS**				
3.1.1.01		RELLENO TIPO 4 "SUBBASEB-200"	M3	-	$ 87.728,00	$ -
3.1.1.02		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	7.990,70	$ 9.549,00	$ 76.303.194,30
3.1.1.03		SUBBASE GRANULAR	M3	3.542,94	$ 170.944,00	$ 605.644.335,36
3.1.1.04		ANDÉN CONCRETO 3000PSI EN SITIO E=0.1M	M2	1.667,17	$ 62.959,00	$ 104.963.356,03
3.1.1.05		CONCRETO 3000 PSI	M3	309,77	$ 439.638,00	$ 136.186.663,26
3.1.1.06		RELLENO GRAVILLA DE RÍO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	-	$ 98.043,00	$ -
3.1.1.07		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1700 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	-	$ 6.427,00	$ -
3.1.1.08		RELLENO TIPO 7 "ARENADE PEÑA"	M3	-	$ 107.689,00	$ -
3.1.1.09		GRAMA SINTÉTICA PARACAMPOS DEPORTIVOS	M2	7.362,24	$ 127.347,00	$ 937.559.177,28

3.1.1.11		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	-	$ 877.156,00	$ -
3.1.1.12		RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2	-	$ 2.199,00	$ -
3.1.1.13		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	-	$ 903.931,00	$ -
3.1.1.14		BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	3.222,76	$ 70.885,00	$ 228.445.342,60
3.1.1.15		SISTEMA BICAPA O SÁNDWICH CON ESTRUCTURA GRANULADA, ANTIDESLIZANTE E IMPERMEABLE FUNDIDA EN SITIO CON PROTECCIÓN UV Y RESISTENTE A LOS CLAVOS, CUMPLE CON NORMAS DIN EN 14877 YDIN 18035-6. ESPESOR 13 MM, CONSISTE DE IMPRIMACIÓN CON VIASOL EP-P210, 1 CAPAELASTICA DE 10 A 12 MM DE SBR 1 A 4 MM, CAPA DE TAPAPOROS Y UNA CAPA DE 3 A 5MM VERTIDA Y ESTRUCTURADA DE EPDM1 A 4 MM DE COLOR ROJO.INCLUYE RECUBRIMIENTO EN PISTA Y CARRILES DE SALTO TRIPLE PARA PISTA ATLÉTICA CERTIFICADA. (Incluye suministros e instalación)	M2	2.361,75	$ 413.168,00	$ 975.799.524,00
3.1.1.16		RECUBRIMIENTO SINTÉTICO COLOR PAVE (Incluye suministros, equipos, mano de obra para su correcta instalación)	M2	2.361,75	$ 112.661,00	$ 266.077.116,75
						$ 3.375.068.413,74
3,2		**MOBILIARIO**				
3.2.01		ARCOS DE FÚTBOL 11 X 2JUEGOS (Incluye mallas impermeabilizadas) (Incluye suministros, equipos y mano de obra para su correcta instalación)	JG	1,00	$ 9.031.568,00	$ 9.031.568,00
3.2.02		EQUIPO PARA PISTA DE ATLETISMO (Incluye suministros 4 obstáculos y17 tacos de salida)	UN	1,00	$ 90.598.364,00	$ 90.598.364,00
3.2.03		FOSO DE ARENA PARASALTO LARGO Y SALTOTRIPLE (Incluye cantonera final y arena de sílice al99%)	UN	2,00	$ 21.064.211,00	$ 42.128.422,00
						$ 141.758.354,00
4		**PAISAJISMO**		-		
4,01		EMPRADIZACIÓN CON BIOMANTO NATURAL	M2	-	$ 28.594,00	$ -
				-		**$** -
5		**EDIFICACIONES**				
5,1		RED SUMINISTRO DE AGUA FRÍA				
5.1.01		RED SUMINISTRO PVC 2"	ML	-	$ 34.577,00	$ -
5.1.02		RED SUMINISTRO PVC 11/2"	ML	13,00	$ 24.424,00	$ 317.512,00
		TUBERIA PVC P 1 1/4" RDE 21				

5.1.05		RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	129,00	$	9.213,00	$ 1.188.477,00
5.1.06		RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	36,00	$	11.472,00	$ 412.992,00
5.1.07		REGISTRO DE 1 1/4" (Incluye accesorios, suministros e instalación)	UN	2,00	$	213.835,00	$ 427.670,00
5.1.08		REGISTRO 1 1/2"	UN	1,00	$	191.086,00	$ 191.086,00
5.1.09		REGISTRO 3/4"	UN	2,00	$	79.783,00	$ 159.566,00
5.1.10		REGISTRO 1/2"	UN	2,00	$	63.092,00	$ 126.184,00
5.1.11		LLAVE MANGUERA	UN	-	$	38.255,00	$ -
							$ 3.451.166,00
6		**PUNTOS HIDRÁULICOS DEAGUA FRÍA**					
6,01		PUNTO AF REGADERA (Incluye suministros e instalaciones)	UN	-	$	177.836,00	$ -
6,02		PUNTO AF LLAVE MANGUERA (Incluye suministros e instalaciones)	UN	15,00	$	34.443,00	$ 516.645,00
6,03		PUNTO AF DISPENSADOR DE AGUA (Incluye suministros e instalaciones)	UN	6,00	$	34.443,00	$ 206.658,00
6,04		REGISTRO 1/2"	UN	-	$	70.101,00	$ -
							$ 723.303,00
7		**RED SANITARIA**					
7,01		EXCAVACIÓN MANUAL ENMATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	M3	19,00	$	48.721,00	$ 925.699,00
7,02		RELLENO TIPO 7 "ARENADE PEÑA"	M3	6,38	$	107.689,00	$ 687.055,82
7,03		RELLENO TIPO 2 "RECEBO"	M3	15,30	$	79.419,00	$ 1.215.110,70
7,04		RELLENO CON MATERIALDE EXCAVACIÓN	M3	7,65	$	20.799,00	$ 159.112,35
7,05		TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	38,80	$	29.468,00	$ 1.143.358,40
7,06		TUBERÍA DRENAJE PVC 160	ML	37,00	$	46.906,00	$ 1.735.522,00
7,07		RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	13,00	$	27.347,00	$ 355.511,00
7,08		RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	29,40	$	37.652,00	$ 1.106.968,80
7,09		RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	-	$	56.742,00	$ -
7,1		SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN	5,00	$	74.391,00	$ 371.955,00
7,11		SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UN	11,00	$	79.451,00	$ 873.961,00
7,12		CAJA DE INSPECCION DE60X60	UN	6,00	$	274.171,00	$ 1.645.026,00
7,13		REVENTILACIÓN 2"	ML	27,00	$	19.248,00	$ 519.696,00
7,14		SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN	12,00	$	74.391,00	$ 892.692,00
7,15		SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UN	10,00	$	97.502,00	$ 975.020,00
							$ 12.606.688,07
8		**RED PLUVIAL**					
8,01		EXCAVACIÓN MANUAL ENMATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DESOBRANTES A UNADISTANCIA MENOR DE 5KM)	M3	107,57	$	48.721,00	$ 5.240.917,97
		RELLENO TIPO 7 "ARENADE					

8,05			RELLENO TIPO 1"GRAVILLA"	M3	43,03	$	84.906,00	$ 3.653.505,18
8,06			RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	55,50	$	51.069,00	$ 2.834.329,50
8,07			RED SANITARIA PVC-S 6"	ML	-	$	93.407,00	$ -
8,08			SALIDA AGUAS LLUVIAS ACANAL DE 4" (Incluye codo90, suministros e instalación)	UN	-	$	61.452,00	$ -
8,09			SALIDA AGUAS LLUVIAS ACANAL DE 6" (Incluye codo90, suministros e instalación)	UN	-	$	166.780,00	$ -
8,1			TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 6"_160MM (Incluye suministros e instalación)	ML	349,59	$	40.132,00	$ 14.029.745,88
8,11			TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"	ML	23,40	$	72.433,00	$ 1.694.932,20
8,12			TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12"	ML	35,64	$	104.270,00	$ 3.716.182,80
8,13			TUBERIA PVCLCANTARILLADO 14"_355MM (Incluye suministros e instalación)	ML	-	$	152.314,00	$ -
8,14			TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	-	$	29.468,00	$ -
8,15			TUBERÍA DRENAJE PVC 200	ML	-	$	61.267,00	$ -
8,16			SUMINISTRO EINSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	-	$	7.569,00	$ -
8,17			CAJA DE INSPECCIÓN DE40X40	UN	-	$	241.560,00	$ -
8,18			CAJA DE INSPECCIÓN DE80X80	UN	-	$	395.145,00	$ -
8,19			CAJA DE INSPECCIÓN DE100X100	UN	10,00	$	485.070,00	$ 4.850.700,00
8,2			CANAL ACO SPORT DEDRENAJE EN POLICONCRETO _LW125H200B125 + REJILLA (Incluye suministros, excavación, rellenos, mano de obra para su instalación)	M	-	$	708.435,00	$ -
8,21			SUMIDERO LW125K +REJILLA LW125 L =0,50(Incluye suministros e instalación)	UN	-	$	1.116.611,00	$ -
8,22			CANAL ACO ENPOLICONCRETO_N150_H31 + REJILLA(Incluye suministros, excavación, rellenos, mano de obra para su instalación)	ML	-	$	542.697,00	$ -
8,23			CONCRETO 4000 PSI	M3	3,30	$	456.485,00	$ 1.506.400,50
8,24			ACERO FIGURADO 60000PSI	KG	100,89	$	7.588,00	$ 765.553,32
								$ 48.915.774,32
9			**RED GENERAL DE SUMINISTRO**					
9,1			ACOMETIDA MEDIDOR YLLENADO DE TANQUE					
9.1.01			EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	M3	6,49	$	48.721,00	$ 316.199,29
9.1.02			RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	3,24	$	20.799,00	$ 67.388,76
9.1.03			RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	2,70	$	107.689,00	$ 290.760,30
9.1.04			RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	16,80	$	11.472,00	$ 192.729,60

		instalación de accesorios y medidor)				
9.1.07		FLOTADOR MECANICO DE1/2" (Incluye surministro e instalación)	UN	2,00	$ 99.516,00	$ 199.032,00
9.1.08		CAJA CONTADOR DE AGUA	UN	1,00	$ 80.601,00	$ 80.601,00
						$ **1.232.023,33**
9.2		**TANQUE**				
9.2.01		EXCAVACIÓN MANUAL ENMATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	M3	28,00	$ 48.721,00	$ 1.364.188,00
9.2.02		RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	19,60	$ 84.621,00	$ 1.658.571,60
9.2.03		RELLENO TIPO 4 "SUBBASEB-200"	M3	2,80	$ 78.956,00	$ 221.076,80
9.2.04		SUBBASE GRANULAR	M3	16,80	$ 170.944,00	$ 2.871.859,20
9.2.05		PLACA EN CONCRETO DE 24 MPa, e=0.15 m (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y VIBRADO.NO INCLUYE ACERO)	M2	56,00	$ 147.052,00	$ 8.234.912,00
9.2.06		REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	74,48	$ 9.522,00	$ 709.198,56
9.2.07		CORTE PARA JUNTA DEDILATACIÓN EN PISO DECONCRETO AL 1/3 DEL ESPESOR DE LA PLACA (INCLUYE EQUIPOS Y MANO DE OBRA PARA EJECUCIÓN)	ML	113,00	$ 1.798,00	$ 203.174,00
9.2.08		SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO YSELLANTE)	ML	113,00	$ 7.699,00	$ 869.987,00
9.2.09		TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 15000 LTRS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIONES)	UN	2,00	$ 25.260.058,00	$ 50.520.116,00
9.2.10		CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	M2	60,00	$ 112.772,00	$ 6.766.320,00
9.2.11		VÁLVULA MARIPOSA 3"	UN	3,00	$ 659.205,00	$ 1.977.615,00
9.2.12		RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	10,00	$ 11.472,00	$ 114.720,00
9.2.13		RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	17,00	$ 15.280,00	$ 259.760,00
9.2.14		REGISTRO 3/4"	UN	2,00	$ 79.783,00	$ 159.566,00
9.2.15		UNIÓN UNIVERSAL PVC3"(Incluye suministro e instalación)	UN	2,00	$ 56.069,00	$ 112.138,00
9.2.16		VÁLVULA CHEQUE DE 3" (Incluye suministro e instalación)	UN	-	$ 296.695,00	$ -
9.2.17		VÁLVULA DE BOLA METÁLICA 1" (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 40.835,00	$ 40.835,00
9.2.18		UNIÓN UNIVERSAL PVC1"(Incluye suministro e instalación)	UN	2,00	$ 18.396,00	$ 36.792,00

9.2.20		VÁLVULA CHEQUE DE 3/4" (Incluye suministro e instalación)	UN	1,00	$	53.100,00	$ 53.100,00
							$ 76.189.316,16
10		**RED SUMINISTRO DE AGUA FRÍA**					
10,01		TUBERIA PVC P 3" RDE 21 (Incluye accesorios suministros e instalación)	ML	119,40	$	57.401,00	$ 6.853.679,40
10,02		RED SUMINISTRO PVC 2 1/2"	ML	176,87	$	53.613,00	$ 9.482.531,31
10,03		RED SUMINISTRO PVC 2"	ML	-	$	34.577,00	$ -
10,04		RED SUMINISTRO PVC 1 1/2"	ML	82,58	$	24.424,00	$ 2.016.933,92
10,05		TUBERIA PVC P 1 1/4" RDE 21 (Incluye accesorios suministros e instalación)	ML	-	$	17.111,00	$ -
10,06		RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	286,90	$	15.280,00	$ 4.383.832,00
10,07		RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	-	$	9.213,00	$ -
10,08		RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	-	$	11.472,00	$ -
10,09		REGISTRO 1/2"	UN	12,00	$	63.092,00	$ 757.104,00
10,1		LLAVE MANGUERA	UN	12,00	$	38.255,00	$ 459.060,00
							$ 23.953.140,63
11		**PUNTOS HIDRAÚLICOS DEAGUA FRIA h max 2,50m**					
11,01		PUNTO AF LLAVE MANGUERA (incluye suministros e instalaciones)	UN	-	$	34.443,00	$ -
11,02		PUNTO AF LAVADO DE PIES (Incluye suministros e instalaciones)	UN	1,00	$	36.794,00	$ 36.794,00
11,03		PUNTO AF DISPENSADOR DE AGUA (Incluye suministros e instalaciones)	UN	-	$	34.443,00	$ -
							$ 36.794,00
12		REDES ELÉCTRICAS					
12,1		RED DE ENERGIA					
12.1.01		4 DUCTOS D=3" PVC-TDP(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS) NORMA CS209.	ML	50,00	$	73.759,00	$ 3.687.950,00
12.1.02		4 DUCTOS D=4" PVC-TDP(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS) NORMA CS209.	ML	130,10	$	88.688,00	$ 11.538.308,80
12.1.03		6 DUCTOS D=6" PVC-TDP(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS). NORMA CS212.	ML	29,00	$	293.179,00	$ 8.502.191,00
12.1.04		CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274(ZVERDE. INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPA). MEDIDAS EXTERNAS: 0.90 X 0.90M. MEDIDAS INTERNAS: 0.60X 0.60M. ALTURA: 0.93M.	UN	64,00	$	521.297,00	$ 33.363.008,00

12.1.05		CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 275 (ZVERDE.INCLUYE BASE, MUROS,PAÑETE, MARCO Y TAPA). MEDIDAS EXTERNAS: 1.49 X 0.99M. MEDIDAS INTERNAS: 1.19 X 0.69M. ALTURA: 1.37M.	UN	6,00	$ 884.588,00	$ 5.307.528,00
12.1.06		CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276 (ZVERDE.INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPAS). MEDIDAS EXTERNAS: 1.79 X 1.49M. MEDIDAS INTERNAS: 1.49 X 1.19M. ALTURA: 1.22M.	UN	6,00	$ 1.255.733,00	$ 7.534.398,00
12.1.07		TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	-	$ 431.487,00	$ -
12.1.08		MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN SUBTERRÁNEO RED DISTRIBUCIÓN O ALUMBRADO PUBLICO, RESISTIVIDAD DE TERRENODE 42.42 O-M. (INCLUYESISTEM INSTALACIÓN).A DE PUESTA A TIERRA, POZOS CAPACITIVOS, TRATAMIENTO DE SUELOTIPO HIDROSOLTA, CABLE 2/0 CU DESNUDO, CONECTORES CERTIFICADOS.) (INCLUYE SUMINISTRO E	UN	-	$ 3.944.905,00	$ -
12.1.09		SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA AP Y EMPALME DE DERIVACIÓN RESINA (Incluye suministros e instalación)	UN	-	$ 2.476.732,00	$ -
12.1.10		CABLE ELÉCTRICO 2X8 AWG PARA ACOMETIDA TIPO ST CU 600V 75°C. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	ML	225,84	$ 14.917,00	$ 3.368.855,28
12.1.11		RED SUBTERRANEA 1x2+1x2 ALUMINIO 600V THW AWG (Incluye suministro e instalación).	ML	225,84	$ 40.331,00	$ 9.108.353,04
12.1.12		RED SUBTERRANEA 3x185mm2 ALUMINIO XLPE 15kV (Incluye suministro e instalación).	ML	60,00	$ 181.609,00	$ 10.896.540,00
12.1.13		SUBESTACIÓN SEMISUMERGIBLE DE 150 KVA 13200/208-120V, CAJA DE MANIOBRA ENTRADA Y SALIDA DE 3VÍAS 600A 15 KV (Incluye suministro, transporte, accesorios e instalación). Norma CODENSA CTS 534.	UN	-	$ 30.188.596,00	$ -
						$ **93.307.132,12**
12,2		**RED DE ALUMBRADO PÚBLICO**				
		2 DUCTOS D=3" PVC-TDP(INCLUYE SUMINISTRO				

12.2.02		POSTE METÁLICO 6M	UN	-	$ 1.330.923,00	$	-
12.2.03		POSTE METALICO AP, H=8M (INC. SUMINISTRO, IZAJE, APLOMADO E INSTALACIÓN. INC. BRAZOSENCILLO Y BASE SEGÚN NORMA AP802)	UN	-	$ 2.841.380,00	$	-
12.2.04		POSTE METALICO AP, H=12M (INC. SUMINISTRO, IZAJE, APLOMADO E INSTALACIÓN. INC. BRAZOSENCILLO Y BASE SEGÚN NORMA AP802)	UN	-	$ 3.534.657,00	$	-
12.2.05		POSTE METALICO H=24M.INCLUYE CANASTILLA Y BRAZO SENCILLO. (INC. SUMINISTRO, IZAJE, APLOMADO E INSTALACIÓN. INC. BRAZOSENCILLO Y BASE EN CONCRETO Y BASE GRANULAR B-600)	UN	4,00	$ 11.757.090,00	$	47.028.360,00
12.2.06		LUMINARIA REF.: OMEGA I MP 48 LED. 4000K. T07.28W 3.541 LM. 120/277V. 50.000 HORAS.	UN	-	$ 536.121,00	$	-
12.2.07		LUMINARIA REF.: OMEGA MP II 128 LED . NW. 4000K.T02. 70W 9.668 Lúmenes. 120/277V. 100.000 HORAS. IP66. SPD 10KV-10KA. MARCA ROY ALPHA. Con Base para Fotocelda y Fotocelda y brazo de 0,5 mx 11/2". GARANTIA: 5AÑOS.	UN	-	$ 1.022.312,00	$	-
12.2.08		REFLECTOR TAYRONA LED I I92 LED. P04 5000K.103W 14.344 Lúmenes. IRC 80 120/277V. 50.000HORAS. IP66. MARCA ROY ALPHA. Garantía: 5 AÑOS.	UN	-	$ 1.090.877,00	$	-
12.2.09		REFLECTOR TAYRONA LED II 320 LED. P04 170W 24.297 Lúmenes. 120/277V. SPD 10KV- 10KA. CTRL 0-10V 50.000 Horas. 5000K. IRC 80 MARCA: ROY ALPHA. GARANTIA: 5 AÑOS	UN	-	$ 1.253.134,00	$	-
12.2.10		Proyector H bay de 960W124.000 Lúmenes IP66 4000K Y/O 6.500K DRIVER MULTIVOLTAJE 120-277V.CTRL 0-10V VIDAUTIL PROMEDIO: 100.000 HORAS. GARANTIA: 7 AÑOS. A 15°	UN	8,00	$ 10.070.942,00	$	80.567.536,00
12.2.11		Proyector H bay de 960W124.000 Lúmenes IP66 4000K Y/O 6500K DRIVERMULTIVOLTAJE 120-277V. VIDA UTIL PROMEDIO :100.000 HORAS. CTRL O-10V. GARANTIA : 7 AÑOS.A 30°	UN	52,00	$ 10.077.467,00	$	524.028.284,00
12.2.12		LUMINARIA HERMETICA DE ALTO RENDIMIENTO121 CMS IP65 40W 4.969 Lúmenes . 120/277V. 100.000 HORAS. Garantías: 7 años. MARCA. ROY ALPHA.	UN	-	$ 275.468,00	$	-
12.2.13		LUMINARIA LED HERMETICA 40W 100-277V	UN	-	$ 275.468,00	$	-

						$ 692.027.566,80
		ITEMS NO PREVISTOS				
NP-01	ICCU VIAS 2.10 600,1	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	M3	10.191,22	$ 77.321,00	$ 787.995.321,62
NP-02	ICCU VIAS 450,1 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	118,08	$ 1.090.541,00	$ 128.771.081,28
NP-03		Shockpad Refosport	M2	7.362,24	$ 108.500,00	$ 798.803.040,00
NP-04	IDRD 11460	CarcamoT-2 2500 psi+Rejilla Peat.Conc.Ref. (canal)	ML	640,00	$ 269.269,36	$ 172.332.390,40
NP-05	ICCU 4,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T 2100 (ESTABILIZACION, FILTRO Y SEPARACION)	M2	7.362,24	$ 11.764,00	$ 86.609.391,36
NP-06	ICCU 4.59	FILTRO LATERAL DE VIA ALVEOLAR IMPERMEABLE	ML	354,00	$ 107.220,00	$ 37.955.880,00
NP-07	IDRD 11646	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	ml	945,84	$ 27.272,67	$ 25.795.582,19
NP-08	IDRD 16766	CerramMallaEslaCal10 h=2.5+Malla Nylonh=2.5	ml	353,81	$ 971.171,87	$ 343.610.319,32
						$ 2.381.873.006,17
		ITEMS NO PREVISTOS MOD No. 02				
NP-09	IDRD COD 16678	PISO CAUCHO RECICLADO 6CM (EPDM 1CM +SBR 5CM SUM+INST) COD IRD 16678	M2	407,17	$ 693.139,00	$ 282.225.406,63
NP-10	COTIZACIONES	RECUBRIMIENTO SINTETICO SPORT MASTER PARA CAMPOS MULTIPLES	M2	1.883,41	$ 125.716,46	$ 236.775.637,93
NP-11	ICCU 5,5.1.	ADOQUIN DE ARCILLA 20X10X6CM	M2	2.150,42	$ 95.790,00	$ 205.988.731,80
NP-12	IDRD CIO 106048	Juegocuerdaspoliedro 5-12añosCap:40niñosH=4.5m	UND	1,00	$ 227.305.370,00	$ 227.305.370,00
NP-13	IDRD CIO 106849	JUEGO COLUMPIO MULTIPLE 9 U(2+añosCap:9 niñosH=2.6	UND	1,00	$ 95.628.847,00	$ 95.628.847,00
NP-14	IDRD CIO 100575	Juego gran escala circuito 3a5 años cap: 61 niños	UND	1,00	$ 596.957.187,00	$ 596.957.187,00
NP-15	IDRD CIO 101275	Juego Muelle Paneles laterales Animal2+años Cap4	UND	1,00	$ 21.125.320,00	$ 21.125.320,00
NP-16	IDRD CIO 106003	Juego muro escalar trepar deslizar:2-8AñosCap:5niñ	UND	1,00	$ 57.917.342,99	$ 57.917.342,99
NP-17	IDRD CIO 109157	Juego Arenero multifuncion 2+años Cap28 niños P.N	UND	1,00	$ 167.723.533,00	$ 167.723.533,00
NP-18	IDRD CIO 105668	Mesa- ping pong en fibra de vidrio de 2.74m x1.74m	UND	1,00	$ 3.153.500,00	$ 3.153.500,00
NP-19	IDRD CIO 105669	Mesa- ping pong en fibra de vidrio de 2.74m x1.74m	UND	2,00	$ 1.018.072,00	$ 2.036.144,00
NP-20	ICCU 5.5.15	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	-	$ 129.013,00	$ -
						$ 1.896.837.020,35

COSTO DIRECTO			**$ 9.298.962.843,00**
[illegible]		26%	$ 2.417.730.339,18

COSTO DIRECTO + A.I.U		$ 12.367.620.581,19
AJUESTE AL PRESUPUESTO		
VALOR TOTAL		$ 12.367.620.581,19

CLAUSULA SEGUNDA: Adicionar el Valor al contrato de obra pública N° 2023-0667, en la suma de **TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS Y UN CENTAVO. ($ 3.996.989.087,91) M/TCE**. **CLAUSULA TERCERA:** Que se obtuvo de la oficina Asesora de presupuesto Municipal la correspondiente disponibilidad presupuestal, la cual se determina, así: Certificado de disponibilidad No. 2023120283 y 2023120275. **CLAUSULA CUARTA: GARANTIA UNICA**: El CONTRATISTA se obliga a ampliar la vigencia de la garantía única, con sus respectivos amparos, modificándola con respecto a la Adición No. 01 y Modificatorio No 02 aquí contenida, realizando el correspondiente cargue en la plataforma SECOP II. **CLAUSULA QUINTA: VALIDEZ DEL CONTRATO PRINCIPAL:** Todas las demás cláusulas y condiciones al contrato de obra pública N° 2023-0667, a que se ha hecho referencia, permanecerán inalterables y conservarán toda su vigencia y efecto, mientras no se encuentren en contradicción con lo estipulado en la presente Adición, y Modificatorio No 01. **CLAUSULA SEXTA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION:** El presente contrato de Adición No. 1 y Modificatorio No. 2, se perfecciona con la aprobación de las partes en la plataforma SECOPII.

	FORMATO DE ACTAS	Espacio exclusivo para el rótulo de radicación
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	R4D1C4D0_1 R4D1C4D0_2 R4D1C4D0_3 R4D1C4D0_4 R4D1C4D0_5
Código: FO-GJ-011	Elaboró: Dirección de Contratación	
Versión: 3	Revisó: Oficina de Desarrollo Institucional	
Página 1 de 9	Aprobó: Comité técnico de calidad	

ACTA No. 07									
CIUDAD	FUSAGASUGÁ	FECHA PRESENTE ACTA			05	04	2024		
	INICIO			SUSPENSIÓN					
	REINICIO			PRORROGA					
	ADICIÓN			MODIFICACIÓN					
	ENTREGA Y RECIBO			LIQUIDACIÓN					
X	PAGO PARCIAL No. 02			OTRA CUAL?					
	FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL								
Contrato No.	Contrato de obra 2023-0667	Fecha de Suscripción del Contrato			16	06	2023		
Objeto	"EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 DE 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".								
Plazo de Ejecución	Nueve (9) meses a partir de la fecha de inicio	Fecha Acta de Inicio	06	09	2023	Fecha de Terminación	05	06	2024
ACTA No. 01 INICIO	Fecha Acta de Inicio		06	09	2023	Fecha de Terminación	05	06	2024
ACTA No. 02 FIJACION DE ITEMS NO PREVISTOS Y PACTACION DE PRECIOS	Fecha		22	12	2023				
ACTA No. 03 MODIFICACIÓN No. 01 MAYORES Y MENORES CANTIDADES.	Fecha		22	12	2023				
ACTA No. 04 PAGO No. 01	Fecha		26	12	2023	Valor a pagar:	3.806.993.304,93		
ACTA NO 05 FIJACION DE ITEMNS NO PREVISTOS Y PACTACION DE PREIOS	Fecha		29	12	2023				
ACTA NO. 06 MODIFICACION NO 02 MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS Y ADICION NO. 01	Fecha		29	12	2023		$3.996.989.087,91		
Fecha de Suspensión			Nueva Fecha de Terminación						
Valor del Contrato	OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($8.370.631.493,49) MCTE								
Valor adición No. 01	TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS Y UN CENTAVO. ($ 3.996.989.087,91) M/TCE								

Ingreso al almacén	No Aplica	x	Aplica		Número		Fecha ingreso			

En el Municipio de Fusagasugá, a los cinco (05) días del mes de abril del año 2024, se reunieron en la secretaria de infraestructura del municipio de Fusagasugá, el **ING. RAUL ARAGUREN MARTINEZ** en calidad de **SUPERVISOR**, el **ARQ. LERMAN FERNANDO YOPASA BELTRAN** en calidad de apoyo a la supervisión el **ING. LUIS GABRIEL FARFÁN VELÁSQUEZ** con cedula de ciudadanía No. 79.584.718 de Bogotá D.C, representante legal **CONSORCIO DEPORTIVO 2023** en calidad de **CONTRATISTA**, el **ING. CESAR EDUARDO GÓMEZ GOMEZ** con cedula de ciudadanía No. 19.275.138 de Bogotá D.C, representante legal **R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS** en calidad de **INTERVENTOR** con el fin de dar inicio al contrato cuyo objeto **"EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 DE 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".** con el fin se suscribir el presente **ACTA NO. 07 PAGO PARCIAL 02** teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

CANTIDADES A EJECUTAR MODIFICATORIO NO. 01 – PAGO PARCIAL NO: 02

CONDICIONES CONTRACTUALES						PAGO 02	
			CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	TOTAL
1	PRELIMINARES						
1.10	PRELIMINARES						
1.1.01	DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M	M2	33.836,28	$1.527,00	$ 51.667.999,56	8.105,79	$ 12.377.541,33
1.1.02	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXCANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	5.891,40	$1.300,00	$ 7.658.820,00		$ 0,00
					$ 59.326.819,56		$ 12.377.541,33
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
2,010	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	M3	13.375,64	$17.445,00	$ 233.338.039,80	6.593,59	$ 115.025.177,55
2,020	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE (Incluye suministro de equipos)	M2	17.714,69	$1.396,00	$ 24.729.707,24		$ 0,00
2,030	RELLENO CON MATERIALDEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	11.230,76	$20.799,00	$ 233.588.577,24	5.160,68	$ 107.336.983,32
					$ 491.656.324,28		$ 222.362.160,87
3	ESTRUCTURAS						
3,1	CIRCULACIÓN Y PERMANENCIA						
3.1.1	PISOS						
3.1.1.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y	M2	7.990,70	$9.549,00	$ 76.303.194,30		

3.1.1.15	SISTEMA BICAPA O SÁNDWICH CON ESTRUCTURA GRANULADA, ANTIDESLIZANTE E IMPERMEABLE FUNDIDA EN SITIO CON PROTECCIÓN UV Y RESISTENTE A LOS CLAVOS, CUMPLE CON NORMAS DIN EN 14877 YDIN 18035-6. ESPESOR 13 MM, CONSISTE DE IMPRIMACIÓN CON VIASOL EP-P210, 1 CAPAELASTICA DE 10 A 12 MM DE SBR 1 A 4 MM, CAPA DE TAPAPOROS Y UNA CAPA DE 3 A 5MM VERTIDA Y ESTRUCTURADA DE EPDM1 A 4 MM DE COLOR ROJO.INCLUYE RECUBRIMIENTO EN PISTA Y CARRILES DE SALTO TRIPLE PARA PISTA ATLÉTICA CERTIFICADA. (Incluye suministros e instalación)	M2	2.361,75	$413.168,00	$ 975.799.524,00	472,35	$ 195.159.904,80
3.1.1.16	RECUBRIMIENTO SINTÉTICO COLOR PAVE (Incluye suministros, equipos, mano de obra para su correcta instalación)	M2	2.361,75	$112.661,00	$ 266.077.116,75		$ 0,00
					$ 3.375.068.413,74		$ 530.597.975,63
3,2	MOBILIARIO						
3.2.01	ARCOS DE FÚTBOL 11 X 2JUEGOS (Incluye mallas impermeabilizadas) (Incluye suministros, equipos y mano de obra para su correcta instalación)	JG	1,00	$9.031.568,00	$ 9.031.568,00		$ 0,00
3.2.02	EQUIPO PARA PISTA DE ATLETISMO (Incluye suministros 4 obstáculos y17 tacos de salida)	UN	1,00	$90.598.364,00	$ 90.598.364,00		$ 0,00
3.2.03	FOSO DE ARENA PARASALTO LARGO Y SALTOTRIPLE (Incluye cantonera final y arena de sílice al99%)	UN	2,00	$21.064.211,00	$ 42.128.422,00		$ 0,00
					$ 141.758.354,00		$ 0,00
5	EDIFICACIONES						
5,1	RED SUMINISTRO DE AGUA FRÍA						
5.1.02	RED SUMINISTRO PVC 11/2"	ML	13,00	$24.424,00	$ 317.512,00		$ 0,00
5.1.03	TUBERIA PVC P 1 1/4" RDE 21 (Incluye accesorios suministros e instalación)	ML	9,00	$17.111,00	$ 153.999,00		$ 0,00
5.1.04	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	31,00	$15.280,00	$ 473.680,00		$ 0,00
5.1.05	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	129,00	$9.213,00	$ 1.188.477,00		$ 0,00
5.1.06	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	36,00	$11.472,00	$ 412.992,00		$ 0,00
5.1.07	REGISTRO DE 1 1/4" (Incluye accesorios, suministros e instalación)	UN	2,00	$213.835,00	$ 427.670,00		$ 0,00
5.1.08	REGISTRO 1 1/2"	UN	1,00	$191.086,00	$ 191.086,00		$ 0,00
5.1.09	REGISTRO 3/4"	UN	2,00	$79.783,00	$ 159.566,00		$ 0,00
5.1.10	REGISTRO 1/2"	UN	2,00	$63.092,00	$ 126.184,00		$ 0,00
					$ 3.451.166,00		$ 0,00

7,01	EXCAVACIÓN MANUAL ENMATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	M3	19,00	$48.721,00	$ 925.699,00		$ 0,00
7,02	RELLENO TIPO 7 "ARENADE PEÑA"	M3	6,38	$107.689,00	$ 687.055,82		$ 0,00
7,03	RELLENO TIPO 2 "RECEBO"	M3	15,30	$79.419,00	$ 1.215.110,70		$ 0,00
7,04	RELLENO CON MATERIALDE EXCAVACIÓN	M3	7,65	$20.799,00	$ 159.112,35		$ 0,00
7,05	TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	38,80	$29.468,00	$ 1.143.358,40		$ 0,00
7,06	TUBERÍA DRENAJE PVC 160	ML	37,00	$46.906,00	$ 1.735.522,00		$ 0,00
7,07	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	13,00	$27.347,00	$ 355.511,00		$ 0,00
7,08	RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	29,40	$37.652,00	$ 1.106.968,80		$ 0,00
7,10	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN	5,00	$74.391,00	$ 371.955,00		$ 0,00
7,11	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UN	11,00	$79.451,00	$ 873.961,00		$ 0,00
7,12	CAJA DE INSPECCIÓN DE60X60	UN	6,00	$274.171,00	$ 1.645.026,00		$ 0,00
7,13	REVENTILACIÓN 2"	ML	27,00	$19.248,00	$ 519.696,00		$ 0,00
7,14	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN	12,00	$74.391,00	$ 892.692,00		$ 0,00
7,15	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UN	10,00	$97.502,00	$ 975.020,00		$ 0,00
					$ 12.606.688,07		$ 0,00
8	RED PLUVIAL						
8,01	EXCAVACIÓN MANUAL ENMATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DESOBRANTES A UNADISTANCIA MENOR DE 5KM)	M3	107,57	$48.721,00	$ 5.240.917,97		$ 0,00
8,02	RELLENO TIPO 7 "ARENADE PEÑA"	M3	44,82	$107.689,00	$ 4.826.620,98		$ 0,00
8,03	RELLENO TIPO 2 "RECEBO"	M3	64,54	$79.419,00	$ 5.125.702,26		$ 0,00
8,04	RELLENO CON MATERIALDE EXCAVACIÓN	M3	32,27	$20.799,00	$ 671.183,73		$ 0,00
8,05	RELLENO TIPO 1"GRAVILLA"	M3	43,03	$84.906,00	$ 3.653.505,18		$ 0,00
8,06	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	55,50	$51.069,00	$ 2.834.329,50		$ 0,00
8,10	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 6"_160MM (Incluye suministros e instalación)	ML	349,59	$40.132,00	$ 14.029.745,88	138,70	$ 5.566.308,40
8,11	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"	ML	23,40	$72.433,00	$ 1.694.932,20		$ 0,00
8,12	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12"	ML	35,64	$104.270,00	$ 3.716.182,80	35,64	$ 3.716.182,80
8,19	CAJA DE INSPECCIÓN DE100X100	UN	10,00	$485.070,00	$ 4.850.700,00	4,00	$ 1.940.280,00
8,23	CONCRETO 4000 PSI	M3	3,30	$456.485,00	$ 1.506.400,50		$ 0,00
8,24	ACERO FIGURADO 60000PSI	KG	100,89	$7.588,00	$ 765.553,32		$ 0,00

9.1.03	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	2,70	$107.689,00	$ 290.760,30		$ 0,00
9.1.04	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	16,80	$11.472,00	$ 192.729,60		$ 0,00
9.1.05	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	9,26	$9.213,00	$ 85.312,38		$ 0,00
9.1.07	FLOTADOR MECANICO DE1/2" (Incluye suministro e instalación)	UN	2,00	$99.516,00	$ 199.032,00		$ 0,00
9.1.08	CAJA CONTADOR DE AGUA	UN	1,00	$80.601,00	$ 80.601,00		$ 0,00
					$ 1.232.023,33		$ 0,00
9,2	TANQUE						
9.2.01	EXCAVACIÓN MANUAL ENMATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	M3	28,00	$48.721,00	$ 1.364.188,00		$ 0,00
9.2.02	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	19,60	$84.621,00	$ 1.658.571,60		$ 0,00
9.2.03	RELLENO TIPO 4 "SUBBASEB-200"	M3	2,80	$78.956,00	$ 221.076,80		$ 0,00
9.2.04	SUBBASE GRANULAR	M3	16,80	$170.944,00	$ 2.871.859,20		$ 0,00
9.2.05	PLACA EN CONCRETO DE 24 MPa, e=0.15 m (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y VIBRADO.NO INCLUYE ACERO)	M2	56,00	$147.052,00	$ 8.234.912,00		$ 0,00
9.2.06	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	74,48	$9.522,00	$ 709.198,56		$ 0,00
9.2.07	CORTE PARA JUNTA DEDILATACIÓN EN PISO DECONCRETO AL 1/3 DEL ESPESOR DE LA PLACA (INCLUYE EQUIPOS Y MANO DE OBRA PARA EJECUCIÓN)	ML	113,00	$1.798,00	$ 203.174,00		$ 0,00
9.2.08	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO YSELLANTE)	ML	113,00	$7.699,00	$ 869.987,00		$ 0,00
9.2.09	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 15000 LTRS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIONES)	UN	2,00	$25.260.058,00	$ 50.520.116,00		$ 0,00
9.2.10	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	M2	60,00	$112.772,00	$ 6.766.320,00		$ 0,00
9.2.11	VÁLVULA MARIPOSA 3"	UN	3,00	$659.205,00	$ 1.977.615,00		$ 0,00
9.2.12	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	10,00	$11.472,00	$ 114.720,00		$ 0,00
9.2.13	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	17,00	$15.280,00	$ 259.760,00		$ 0,00
9.2.14	REGISTRO 3/4"	UN	2,00	$79.783,00	$ 159.566,00		$ 0,00
9.2.15	UNIÓN UNIVERSAL PVC3"(Incluye suministro e instalación)	UN	2,00	$56.069,00	$ 112.138,00		$ 0,00
9.2.17	VÁLVULA DE BOLA METÁLICA 1" (Suministro e instalación)	UN	1,00	$40.835,00	$ 40.835,00		$ 0,00
9.2.18	UNIÓN UNIVERSAL PVC1"(Incluye suministro e instalación)	UN	2,00	$18.396,00	$ 36.792,00		$ 0,00

10,02	RED SUMINISTRO PVC 2 1/2"	ML	176,87	$53.613,00	$ 9.482.531,31		$ 0,00
10,04	RED SUMINISTRO PVC 1 1/2"	ML	82,58	$24.424,00	$ 2.016.933,92		$ 0,00
10,06	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	286,90	$15.280,00	$ 4.383.832,00		$ 0,00
10,09	REGISTRO 1/2"	UN	12,00	$63.092,00	$ 757.104,00		$ 0,00
10,10	LLAVE MANGUERA	UN	12,00	$38.255,00	$ 459.060,00		$ 0,00
					$ 23.953.140,63		$ 0,00
11	**PUNTOS HIDRAÚLICOS DEAGUA FRIA h max 2,50m**						
11,02	PUNTO AF LAVADO DE PIES (Incluye suministros e instalaciones)	UN	1,00	$36.794,00	$ 36.794,00		$ 0,00
					$ 36.794,00		$ 0,00
12	**REDES ELÉCTRICAS**						
12,1	**RED DE ENERGIA**						
12.1.01	4 DUCTOS D=3" PVC-TDP(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS) NORMA CS209.	ML	50,00	$73.759,00	$ 3.687.950,00	50,00	$ 3.687.950,00
12.1.02	4 DUCTOS D=4" PVC-TDP(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS) NORMA CS209.	ML	130,10	$88.688,00	$ 11.538.308,80		$ 0,00
12.1.03	6 DUCTOS D=6" PVC-TDP(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS). NORMA CS212.	ML	29,00	$293.179,00	$ 8.502.191,00		$ 0,00
12.1.04	CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274(ZVERDE. INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPA). MEDIDAS EXTERNAS: 0.90 X 0.90M. MEDIDAS INTERNAS: 0.60X 0.60M. ALTURA: 0.93M.	UN	64,00	$521.297,00	$ 33.363.008,00		$ 0,00
12.1.05	*CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA* PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 275 (ZVERDE.INCLUYE BASE, MUROS,PAÑETE, MARCO Y TAPA). MEDIDAS EXTERNAS: 1.49 X 0.99M. MEDIDAS INTERNAS: 1.19 X 0.69M. ALTURA: 1.37M.	UN	6,00	$884.588,00	$ 5.307.528,00		$ 0,00
12.1.06	CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276 (ZVERDE.INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPAS). MEDIDAS EXTERNAS: 1.79 X 1.49M. MEDIDAS INTERNAS: 1.49 X 1.19M. ALTURA: 1.22M.	UN	6,00	$1.255.733,00	$ 7.534.398,00		$ 0,00
12.1.10	CABLE ELÉCTRICO 2X8 AWG PARA ACOMETIDA TIPO ST CU 600V 75°C. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	ML	225,84	$14.917,00	$ 3.368.855,28		$ 0,00
12.1.11	RED SUBTERRANEA 1x2+1x2 ALUMINIO 600V THW AWG (Incluye	ML	225,84	$40.331,00	$ 9.108.353,04		

12.2.05	POSTE METALICO H=24M.INCLUYE CANASTILLA Y BRAZO SENCILLO. (INC. SUMINISTRO, IZAJE, APLOMADO E INSTALACIÓN. INC. BRAZOSENCILLO Y BASE EN CONCRETO Y BASE GRANULAR B-600)	UN	4,00	$11.757.090,00	$ 47.028.360,00		$ 0,00
12.2.10	Proyector H bay de 960W124.000 Lúmenes IP66 4000K Y/O 6.500K DRIVER MULTIVOLTAJE 120-277V.CTRL 0-10V VIDAUTIL PROMEDIO: 100.000 HORAS. GARANTIA: 7 AÑOS. A 15°	UN	8,00	$10.070.942,00	$ 80.567.536,00		$ 0,00
12.2.11	Proyector H bay de 960W124.000 Lúmenes IP66 4000K Y/O 6500K DRIVERMULTIVOLTAJE 120-277V. VIDA UTIL PROMEDIO :100.000 HORAS. CTRL O- 10V. GARANTIA : 7 AÑOS.A 30°	UN	52,00	$10.077.467,00	$ 524.028.284,00		$ 0,00
					$ 692.027.566,80		**$ 0,00**
	ITEMS NO PREVISTOS						
NP-01	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	M3	10.191,22	$77.321,00	$ 787.995.321,62	931,14	$ 71.996.675,94
NP-02	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	118,08	$1.090.541,00	$ 128.771.081,28		$ 0,00
NP-03	Shockpad Refosport	M2	7.362,24	$108.500,00	$ 798.803.040,00	1.472,45	$ 159.760.825,00
NP-04	CarcamoT-2 2500 psi+Rejilla Peat.Conc.Ref. (canal)	ML	640,00	$269.269,36	$ 172.332.390,40		$ 0,00
NP-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T 2100 (ESTABILIZACION, FILTRO Y SEPARACION)	M2	7.362,24	$11.764,00	$ 86.609.391,36	3.681,12	$ 43.304.695,68
NP-06	FILTRO LATERAL DE VIA ALVEOLAR IMPERMEABLE	ML	354,00	$107.220,00	$ 37.955.880,00	218,40	$ 23.416.848,00
NP-07	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	ml	945,84	$27.272,67	$ 25.795.582,19		$ 0,00
NP-08	CerramMallaEslaCal10 h=2.5+Malla Nylonh=2.5	ml	353,81	$971.171,87	$ 343.610.319,32		$ 0,00
					$ 2.381.873.006,17		**$ 298.479.044,62**
	ITEMS NO PREVISTOS MOD No. 02						
NP-09	PISO CAUCHO RECICLADO 6CM (EPDM 1CM +SBR 5CM SUM+INST) COD IRD 16678	M2	407,17	$693.139,00	$ 282.225.406,63		$ 0,00
NP-10	RECUBRIMIENTO SINTETICO SPORT MASTER PARA CAMPOS MULTIPLES	M2	1.883,41	$125.716,46	$ 236.775.637,93		$ 0,00
NP-11	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	M2	2.150,42	$95.790,00	$ 205.988.731,80		$ 0,00
NP-12	Juegocuerdaspoliedro 5-12añosCap:40niñosH=4.5m	UND	1,00	$227.305.370,00	$ 227.305.370,00		$ 0,00
NP-13	JUEGO COLUMPIO MULTIPLE 9 U(2+añosCap:9 niñosH=2.6	UND	1,00	$95.628.847,00	$ 95.628.847,00		$ 0,00
NP-14	Juego gran escala circuito 3a5 años	UND	1,00	$596.957.187,00	$		

	COSTO DIRECTO				9.298.962.843,00		$ 1.078.727.443,65
	ADMINISTRACION			26%	2.417.730.339,18		$ 280.469.135,35
	IMPREVISTOS			2%	185.979.256,86		$ 21.574.548,87
	UTILIDAD			5%	464.948.142,15		$ 53.936.372,18
	VALOR TOTAL				12.367.620.581,19		$ 1.434.707.500,05

EL VALOR A CANCELAR EN LA PRESENTE ACTA ES **MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON CINCO CENTAVOS. ($ 1.434.707.500,05) M/TCE.**

ESTADO JURIDICO

DESCRIPCIÓN	HUBO	NO HUBO	OBSERVACIONES
Modificatorio	X		
Suspensiones		X	
Reinicio		X	
Prorrogas		X	
Multas		X	
Declaratorias de incumplimiento		X	
Adiciones	X		
caducidad		X	

RELACIÓN DE ACTAS

No. ACTA	PERIODO	VALOR ACTA ANTERIOR	VALOR DEL SERVICIO	VALOR PRESENTE ACTA	SALDO
ACTA DE INICIO NO. 1					$ 8.370.631.493,49
ACTA No. 02 FIJACION DE ITEMS NO PREVISTOS Y PACTACION DE PRECIOS					$ 8.370.631.493,49
ACTA No. 03 MODIFICACIÓN No. 01 MAYORES Y MENORES CANTIDADES.					$ 8.370.631.493,49
ACTA No. 04 PAGO PARCIAL 01	06 de septiembre de 2023 al 15 de diciembre de 2023		$ 3.806.993.304,93	$ 3.806.993.304,93	$ 4.563.938.188,56
ACTA NO 05 FIJACION DE ITEMNS NO PREVISTOS Y					

	FORMATO DE ACTAS	Espacio exclusivo para el rótulo de radicación
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	R4D1C4D0_1 R4D1C4D0_2 R4D1C4D0_3 R4D1C4D0_4 R4D1C4D0_5
Código: FO-GJ-011	Elaboró: Dirección de Contratación	
Versión: 3	Revisó: Oficina de Desarrollo Institucional	
Página 9 de 9	Aprobó: Comité técnico de calidad	

Firmas		
CONTRATISTA **CONSORCIO DEPORTIVO 2023** **R.L LUIS GABRIEL FARFÁN VELÁSQUEZ.**	**INTERVENTORÍA** **R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS** **R.L CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ**	**SUPERVISOR** **ING. RAUL ARAGUREN MARTINEZ**
Firma y Nombre:	Firma y Nombre:	Firma y Nombre:
APOOYO A LA SUPERVISION **ARQ. LERMAN FERNANDO YOPASA BELTRAN**		
Firma y Nombre:		

GESTIÓN DOCUMENTAL:
Original: Dirección de Contratación
Nombre del archivo sistematizado:
Proyectó: Arq. Lerman Fernando Yopasa Beltrán – profesional universitario
Revisó: Ing. Raúl Aranguren Martínez – secretario de infraestructura

	FORMATO DE ACTAS	Espacio exclusivo para el rótulo de radicación
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	Al contestar cite Radicado I-2024-09257 Id: 394432 Folios: 5 Fecha: 2024-05-28 13:37:30 Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO, 1 MEDIO MAGNETICO, 1 MEDIO MAGNETICO Remitente: SECRETARIA JURIDICA Destinatario: SECRETARIA JURIDICA
Código: FO-GJ-011	Elaboró: Dirección de Contratación	ALCALDIA DE FUSAGASUGA 29 MAY 2024 SECRETARIA JURIDICA
Versión: 3	Revisó: Oficina de Desarrollo Institucional	
Página 1 de 5	Aprobó: Comité técnico de calidad	

ACTA No. 08

CIUDAD	FUSAGASUGÁ	FECHA PRESENTE ACTA				28	05	2024	
	INICIO			SUSPENSIÓN					
	REINICIO		X	PRORROGA No.1					
	ADICIÓN			MODIFICACIÓN					
	ENTREGA Y RECIBO			LIQUIDACIÓN					
	PAGO PARCIAL		X	¿OTRA CUAL?					
	FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL								
Contrato No.	Contrato de obra 2023-0667	Fecha de Suscripción del Contrato				16	06	2023	
Objeto	"EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 DE 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".								
Plazo de Ejecución	Nueve (9) meses a partir de la fecha de inicio	Fecha Acta de Inicio	06	09	2023	Fecha de Terminación	05	06	2024
ACTA No. 01 INICIO	Fecha Acta de Inicio		06	09	2023	Fecha de Terminación	05	06	2024
ACTA No. 02 FIJACION DE ITEMS NO PREVISTOS Y PACTACION DE PRECIOS No.1	Fecha		22	12	2023				
ACTA No. 03 MODIFICACIÓN No. 01 MAYORES Y MENORES CANTIDADES.	Fecha		22	12	2023				
ACTA No. 04 PAGO PARCIAL No. 01	Fecha		26	12	2023	Valor pagado:	$ 3.806.993.304,93		
ACTA No. 05 FIJACION DE ITEMNS NO PREVISTOS Y PACTACION DE PRECIOS No.2	Fecha		29	12	2023				
ACTA No. 06 MODIFICACION No 02 MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS Y ADICION No. 01	Fecha		29	12	2023	Valor de la Adición:	$ 3.996.989.087,91		
ACTA No.07 PAGO PARCIAL No.2	Fecha		05	04	2024	Valor pagado:	$ 1.434.707.500,05		

Valor del Contrato	OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($8.370.631.493,49) MCTE										
Valor adición No. 01	TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y UNO CENTAVOS. ($ 3.996.989.087,91) M/TCE										
Valor final contrato	DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS ($ 12.367.620.581,19) M/TCE										
Nombre del Contratista	CONSORCIO DEPORTIVO 2023 NIT: 901771549-7 ING. LUIS GABRIEL FARFÁN VELÁSQUEZ. C.C 79.584.718 DE BOGOTÁ D.C.										
Supervisor	ING. RAUL ARANGUREN MARTINEZ SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA										
Interventor	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS NIT. 830.028.126-2 R.L CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ C.C. 19.275.138 DE BOGOTA D.C.										
Ingreso al almacén	No Aplica	x	Aplica		Número		Fecha ingreso				

En el Municipio de Fusagasugá, a los VEINTIOCHO (28) días del mes de MAYO del año 2024, se reunieron la **DRA SONIA SMITH NIÑO SUAREZ,** Secretaria Jurídica, en calidad de **ORDENADORA DEL GASTO** por medio del decreto de delegación 003 de 2024 , el **ING. RAUL ARAGUREN MARTINEZ,** Secretario de Infraestructura, en calidad de **SUPERVISOR**, el **ING. JOSE MELCO JIMENEZ CRUZ** en calidad de apoyo a la supervisión de la Secretaria de Infraestructura, el **ING. LUIS GABRIEL FARFÁN VELÁSQUEZ** con cedula de ciudadanía No. 79.584.718 de Bogotá D.C, representante legal **CONSORCIO DEPORTIVO 2023 NIT: 901771549-7** en calidad de **CONTRATISTA**, el **ING. CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ** con cedula de ciudadanía No. 19.275.138 de Bogotá D.C, representante legal **R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS NIT. 830.028.126-2** en calidad de **INTERVENTOR;** con el fin de suscribir la presente **ACTA No. 08 DE PRORROGA No.1** al Contrato de Obra pública No. 2023-0667. Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. **JUSTIFICACION PRORROGA No.1:**

1.1. Que el contratista de obra mediante oficio CP-033-0667-2023 fechado el 16 de mayo de 2024, solicitó a la interventoría R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS NIT. 830.028.126-2, la prórroga No.1 del Contrato De Obra Pública 2023 – 0667

1.2. Que el 18 de mayo de 2024 la interventoría R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS NIT. 830.028.126-2 allego al correo institucional de la supervisión el oficio R&M-CTO-0780-050-2023 fechado del 17 de mayo 2024 con asunto *<Solicitud de prorroga No. 1 al contrato de obra No. 2023-0667 y al contrato de consultoría No. 2023-0780>* dentro del cual emiten aprobación de la pretensión del contratista de obra de ampliar el plazo de ejecución en los siguientes términos:

- Dentro del oficio del contratista de obra CP-033-0667-2023 fechado el 16 de mayo de 2024 se vislumbra la necesidad de ampliar el plazo de ejecución para dar cumplimiento idóneo y correcto a las actividades no previstas en la suscripción del modificatorio No.2 y su incorporación de recursos adicionales. Seguidamente el contratista de obra manifiesta en su solicitud de prorroga lo siguiente: (...) *Si bien es cierto, durante el modificatorio No. 02 Adición 01, se estableció que dichas obras complementarias, se ejecutarían en el transcurso del plazo contractual vigente, dichas actividades*

han sido retrasadas por los tiempos de lluvias del presente año, trayendo consigo, disminución en rendimientos en movimiento de tierras, instalación de cárcamos, y cerramiento de cancha, y en algunos casos la suspensión total de actividades, como se puede observar en el reporte del IDEAM y el análisis de lluvias y afectaciones que se adjunta. Por otro lado, durante los comités realizados en conjunto con interventoría, supervisión y contratista en el año 2024, han denotado la necesidad de garantizar los camerinos para hombres y mujeres al igual que el espacio necesario para la comodidad de los asistentes a los eventos (graderías), como ciertamente se realizarán en dichas instalaciones una vez culminadas las obras en ejecución. Esta situación evidencio la necesidad de realizar un modificatorio 3, en el cual se contemplarán ítems no previstos y cantidades mayores y menores que garanticen suplir las necesidades evidenciadas por el contratante, y que a la fecha se encuentra en fase de proyección para la aprobación de la entidad (...)

- Que teniendo en cuenta el Modificatorio No.2 que corresponde a la Adición No. 1, se actualizo el alcance de obra reportando mayores y menores cantidades, así como también la necesidad de la construcción de obras complementarias y la inclusión de actividades no previstas para la correcta ejecución del contrato. Adicionalmente, de acuerdo a los requerimientos realizados por la supervisión en el presente año, se ha evidenciado la necesidad de realizar nuevas obras complementarias para el correcto funcionamiento de las obras a ejecutar como lo son la construcción de camerinos y graderías.
- Que, de acuerdo a lo anterior, se encuentra en proyección la solicitud de realizar la modificación No. 3 al contrato de obra según los requerimientos de la entidad contratante mediante la cual se tienen en cuenta la inclusión de actividades no previstas y mayores y menores cantidades.
- Que, por otra parte para el periodo comprendido desde el 27 de enero al 15 de mayo del presente año, se han presentado lluvias antes, durante y después de la ejecución de las actividades previstas para ejecutar en obra, las *cuales de acuerdo al registro realizado de las h/día, se evidenciaron 20 días en los cuales se presentaron lluvias antes* de la jornada laboral, representando un retraso en 60 horas en total, además de lo anterior se presentan lluvias durante 92 horas laborares, para un total de 152 horas equivalentes a 19 días laborales.(Ver oficio CP-033-0667-2023)
- Que, teniendo en cuenta lo anterior, el avance se obra se ha visto afectado a raíz de las lluvias, situación que ha generado atrasos en la ejecución de las actividades previstas de acuerdo al cronograma de la obra. Así las cosas, partiendo de las razones anteriormente expuestas se hace necesario prorrogar el contrato de obra por un término de cuatro (4) meses y por ende con el fin de realizar acompañamiento, seguimiento y control a las actividades ejecutadas por el contratista, se requiere de igual manera prorrogar el contrato de consultoría por el mismo tiempo
- Es evidente para las partes la necesidad establecida de ampliar el plazo de ejecución dentro del término del cumplimiento de ejecución de las actividades no previstas y recursos adicionales del modificatorio No.2, y la proyección de estructurar un tercer modificatorio al contrato de obra

Es relevante establecer que la estructuración del un tercer modificatorio abarca actuaciones de evaluación técnica, administrativa y jurídica en debida forma, donde la naturaleza y envergadura del proyecto, y las obligaciones conexas con su Convenio Interadministrativo ICCU No.831-2022, se requiere surtir mesas técnicas y/o comités entre las partes para obtener un resultado definitivo del alcance de cantidades mayores y menores, fijación de ítems no previstos y pactacion de precios unitarios, y posible adición en recursos si hubiese lugar

2. PLAZO DE EJECUCIÓN

CLÁUSULA QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN: Se modifica y ajusta al plazo contractual vigente y la fecha de terminación

inicial, prorrogando el contrato CUATRO (04) MESES

PLAZO INICIAL	9 MESES
PRÓRROGA No. 1	4 MESES
PLAZO FINAL	13 MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	05 DE OCTUBRE DE 2024

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

De acuerdo a los fundamentos de la necesidad y conveniencia, en el presente acto aplican de acuerdo a la normatividad vigente:
MODIFICACIÓN: Cambiar alguna o varias cláusulas del contrato a solicitud del contratista y /o supervisor de acuerdo a la necesidad para la ejecución.
NORMAS: las normas que amparan las anteriores actuaciones son:
Ley 80 de 1993: Estatuto General de Contratación de la Administración pública.
Ley 1150 de 2007: Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la trasparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones Decreto 1082 de 2015 "Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública.

4. FORMA DE PAGO Y REQUISITOS
Se mantienen las del contrato inicial.

5. OTRAS DISPOSICIONES
Se mantienen las demás disposiciones del contrato inicial.

6. DOCUMENTOS ANEXOS

- Oficio CP-033-0667-2023 de solicitud del contratista de obra
- Oficio R&M-CTO-0780-050-2023 de aprobación de la interventoría
- Cronograma de obra actualizado

7. MODIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS

El contratista se obliga a ampliar la vigencia de las garantías con sus respectivos amparos, modificándola con respecto a la adición en tiempo aquí contenida y además realizando el respectivo cargue en la plataforma Secop II para su aprobación.

No siendo otro el objeto de la presente se firma en Fusagasugá, a los VEINTIOCHO (28) días del mes de MAYO del año dos mil veinticuatro (2024).

Firmas

SUPERVISOR	APOYO A LA SUPERVISIÓN	CONTRATISTA
ING. RAUL ARANGUREN MARTINEZ Secretario de Infraestructura	**ING. JOSÉ MELCO JIMÉNEZ CRUZ** Profesional Universitario Secretario de Infraestructura	**CONSORCIO DEPORTIVO 2023** **NIT. 901771549-7** **R.L.** LUIS GABRIEL FARFÁN VELÁSQUEZ. **C.C 79.584.718 DE BOGOTÁ D.C.**
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
INTERVENTORIA	**ORDENADOR DEL GASTO**	
R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS **NIT. 830.028.126-2** **R.L.** CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ **C.C. 19.275.138 DE BOGOTA D.C.**	**DRA. SONIA SMITH NIÑO SUAREZ** Secretaria Jurídica Decreto de Delegación 003 de 2024	
FIRMA:	FIRMA:	

GESTIÓN DOCUMENTAL:
Original: Dirección de Contratación
Nombre del archivo sistematizado:
Proyectó: Ing. Jose Melco Jiménez Cruz– Profesional Universitario – Secretaria de Infraestructura

Revisó: Ing. Raúl Aranguren Martínez – secretario de infraestructura

Reviso y Aprobó: Yeannet Vanessa Uricoechea Villalba Profesional Universitario

Reviso y Aprobó: Javier Oswaldo Jiménez – Director de Contratación

ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ

PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 2023-0667 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA E INCIVILES ASOCIADOS S.A.S. Y CEDIDO AL CONSORCIO DEPORTIVO 2023.

Entre los suscritos **SONIA SMITH NIÑO SUAREZ** mayor de edad, domiciliada y residente en Fusagasugá, identificada con la cédula de ciudadanía número 40.031.229 expedida en Tunja, en calidad de Secretaria Jurídica, cargo para el cual fue nombrada mediante Resolución No. 004 del 01 de enero de 2024, según consta en el acta de posesión de la misma fecha, y delegada por el Alcalde Municipal mediante Decreto No. 003 del 4 de enero de 2024, "para celebrar contratos estatales de cualquiera de sus modalidades de selección, así como los contratos interadministrativos que resulten necesarios para el logro de los objetivos de la entidad", de una parte, quien en adelante se denominara **EL MUNICIPIO** y por la otra el señor **LUIS GABRIEL FARFÁN VELÁSQUEZ,** mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.584.718 de Bogotá D.C, representante legal **CONSORCIO DEPORTIVO 2023,** con **NIT: 901771549-7** quien para efectos legales del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente Prorroga No. 1 al contrato de obra pública N° 2023- 0667, el cual se regirá por las cláusulas que posteriormente se estipulan, previas las siguientes consideraciones: **1)** Que con fecha 16 de junio de 2023 se suscribió el Contrato de Obra Pública No. 2023-0667, con la empresa **INCIVILES ASOCIADOS S.A.S** , con **NIT: 900226247-8,** a través de su representante legal, cuyo objeto es "**EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 DE 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA". 2)** Que el 9 de noviembre de 2023 le fue cedido el Contrato de Obra Pública No. 2023-0667 al CONSORCIO DEPORTIVO 2023, como consta en la plataforma secop II. **3)** Que el 23 de diciembre de 2023 se suscribió el modificatorio No. 1 al mencionado contrato. **4)** Que 30 de diciembre de 2023 se suscribió la Modificación No. 2 y la Adición No. 1 al mismo. **5)** Que en el municipio de Fusagasugá, a los VEINTIOCHO (28) días del mes de MAYO del año 2024, se reunieron la **DRA SONIA SMITH NIÑO SUAREZ,** Secretaria Jurídica, en calidad de **ORDENADORA DEL GASTO** por medio del decreto de delegación 003 de 2024, el **ING. RAUL ARAGUREN MARTINEZ,** Secretario de Infraestructura, en calidad de **SUPERVISOR**, el **ING. JOSE MELCO JIMENEZ CRUZ** en calidad de apoyo a la supervisión de la Secretaria de Infraestructura, el **ING. LUIS GABRIEL FARFÁN VELÁSQUEZ** con cedula de ciudadanía No. 79.584.718 de Bogotá D.C, representante legal **CONSORCIO DEPORTIVO 2023 NIT: 901771549-7** en calidad de **CONTRATISTA**, el **ING. CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ** con cedula de ciudadanía No. 19.275.138 de Bogotá D.C, representante legal **R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS,** con **NIT. 830.028.126-2** en calidad de **INTERVENTOR;** con el fin de suscribir el **ACTA No. 08 DE PRORROGA No.1** al Contrato de Obra pública No. 2023-0667. **6)** Que el contratista de obra mediante oficio CP-033-0667-2023 fechado el 16 de mayo de 2024, solicitó a la interventoría R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS NIT. 830.028.126-2, la prórroga No.1 del Contrato De Obra Pública 2023 – 0667. **7)** Que el 18 de mayo de 2024 la interventoría R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS NIT. 830.028.126-2 allego al correo institucional de la supervisión el oficio R&M-CTO-0780-050-2023 fechado del 17 de mayo 2024 con asunto *<Solicitud de prorroga No. 1 al contrato de obra No. 2023-0667 y al contrato de consultoría No. 2023-0780>* dentro del cual emiten aprobación de la pretensión del contratista de obra de ampliar el plazo de ejecución en los siguientes términos: " Dentro del oficio del contratista de obra CP-033-0667-2023 fechado el 16 de mayo de 2024 se vislumbra la necesidad de ampliar el plazo de ejecución para dar cumplimiento idóneo y correcto a las actividades no previstas en la suscripción del modificatorio No.2 y su incorporación de recursos adicionales. Seguidamente el contratista de obra manifiesta en su solicitud de prorroga lo siguiente: (…) *Si bien*

es cierto, durante el modificatorio No. 02 Adición 01, se estableció que dichas obras complementarias, se ejecutarían en el transcurso del plazo contractual vigente, dichas actividades han sido retrasadas por los tiempos de lluvias del presente año, trayendo consigo, disminución en rendimientos en movimiento de tierras, instalación de cárcamos, y cerramiento de cancha, y en algunos casos la suspensión total de actividades, como se puede observar en el reporte del IDEAM y el análisis de lluvias y afectaciones que se adjunta. Por otro lado, durante los comités realizados en conjunto con interventoría, supervisión y contratista en el año 2024, han denotado la necesidad de garantizar los camerinos para hombres y mujeres al igual que el espacio necesario para la comodidad de los asistentes a los eventos (graderías), como ciertamente se realizarán en dichas instalaciones una vez culminadas las obras en ejecución. Esta situación evidencio la necesidad de realizar un modificatorio 3, en el cual se contemplarán ítems no previstos y cantidades mayores y menores que garanticen suplir las necesidades evidenciadas por el contratante, y que a la fecha se encuentra en fase de proyección para la aprobación de la entidad (...). **8)** Que teniendo en cuenta el Modificatorio No.2 que corresponde a la Adición No. 1, se actualizo el alcance de obra reportando mayores y menores cantidades, así como también la necesidad de la construcción de obras complementarias y la inclusión de actividades no previstas para la correcta ejecución del contrato. Adicionalmente, de acuerdo a los requerimientos realizados por la supervisión en el presente año, se ha evidenciado la necesidad de realizar nuevas obras complementarias para el correcto funcionamiento de las obras a ejecutar como lo son la construcción de camerinos y graderías. **9)** Que, de acuerdo a lo anterior, se encuentra en proyección la solicitud de realizar la modificación No. 3 al contrato de obra según los requerimientos de la entidad contratante mediante la cual se tienen en cuenta la inclusión de actividades no previstas y mayores y menores cantidades. **10)** Que, por otra parte para el periodo comprendido desde el 27 de enero al 15 de mayo del presente año, se han presentado lluvias antes, durante y después de la ejecución de las actividades previstas para ejecutar en obra, las cuales de acuerdo al registro realizado de las h/día, se evidenciaron 20 días en los cuales se presentaron lluvias antes de la jornada laboral, representando un retraso en 60 horas en total, además de lo anterior se presentan lluvias durante 92 horas laborares, para un total de 152 horas equivalentes a 19 días laborales.(Ver oficio CP-033-0667-2023). **11)** Que, teniendo en cuenta lo anterior, el avance se obra se ha visto afectado a raíz de las lluvias, situación que ha generado atrasos en la ejecución de las actividades previstas de acuerdo al cronograma de la obra. Así las cosas, partiendo de las razones anteriormente expuestas se hace necesario prorrogar el contrato de obra por un término de cuatro (4) meses y por ende con el fin de realizar acompañamiento, seguimiento y control a las actividades ejecutadas por el contratista, se requiere de igual manera prorrogar el contrato de consultoría por el mismo tiempo. **12)** Que es evidente para las partes la necesidad establecida de ampliar el plazo de ejecución dentro del término del cumplimiento de ejecución de las actividades no previstas y recursos adicionales del modificatorio No.2, y la proyección de estructurar un tercer modificatorio al contrato de obra. **13)** Que es relevante establecer que la estructuración de un tercer modificatorio abarca actuaciones de evaluación técnica, administrativa y jurídica en debida forma, donde la naturaleza y envergadura del proyecto, y las obligaciones conexas con su Convenio Interadministrativo ICCU No.831-2022, se requiere surtir mesas técnicas y/o comités entre las partes para obtener un resultado definitivo del alcance de cantidades mayores y menores, fijación de ítems no previstos y pactacion de precios unitarios, y posible adición en recursos si hubiese lugar. **14)** Que teniendo en cuento lo anteriormente expuesto es necesario adicionar **CUATRO MESES (4)** de ejecución para lo cual la nueva fecha de terminación del presente contrato será 5 de octubre del 2024**. 15)** Que en mérito de lo expuesto, las partes acuerdan prorrogar el contrato en los siguientes términos: **CLAUSULA PRIMERA:** PRORROGAR el **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2023-0667, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ E INCIVILES ASOCIADOS S.A.S. Y CEDIDO AL CONSORCIO DEPORTIVO 2023,** cuyo objeto es "**EJECUCIÓN DEL**

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 DE 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA", conforme a la parte motiva. **CLAUSULA SEGUNDA:** Prorrogar el Plazo de ejecución del contrato de obra pública N° 2023-0667, en un término de cuatro (04) meses, tiempo que se adiciona al contrato inicial, quedando un plazo de ejecución total de trece (13) meses. **CLAUSULA TERCERA: GARANTIA UNICA**: El CONTRATISTA se obliga a ampliar la vigencia de la garantía única, con sus respectivos amparos, modificándola con respecto a la Prorroga No. 1 aquí contenida, realizando el correspondiente cargue en la plataforma SECOP II. **CLAUSULA CUARTA: VALIDEZ DEL CONTRATO PRINCIPAL:** Todas las demás cláusulas y condiciones al contrato de obra pública N° 2023-0667, a que se ha hecho referencia, permanecerán inalterables y conservarán toda su vigencia y efecto, mientras no se encuentren en contradicción con lo estipulado en la presente Prorroga No. 1. **CLAUSULA QUINTA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION:** La presente prorroga No. 1, se perfecciona con la aprobación de las partes en la plataforma SECOPII.

	ALCALDIA DE FUSAGASUGA	Código:	
	PROCESO SECRETARIA DE HACIENDA	Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2024001188

Nit: 890680008-4

jueves, 16 de mayo de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000917	16-may.-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	CONSORCIO DEPORTIVO 2023		CC o NIT	901771549	DV 7
DIRECCION	AC 24 # 51 - 40 OF 316		TELEFONO	6014672735	
BANCO	01	CUENTA	TIPO CUENTA		
CHEQUE No	PAGO ELECTRONICO		VALOR PAGO	1,189,374,500.05	
DESCRIPCION					

CANC. ACTA PARCIAL DE PAGO NO. 02 CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 2023-00667: EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 831 DEL 2022, ENTRE EL MPIO DE FGGA Y EL ICCU, PARA LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA SINTETICA, PISTA ATLETICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MPIO DE FGGA. - DEPTO DE CUNDI. PREDIO UBICADO EN SANTA CESAREA DEL BARRIO VILLA PATRICIA , EN LA COMUNA SUROCCIDENTAL. PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 25 DE FEBRERO DE 2024. VR TOTAL CONTRATO $8.370.631.493.49. PLAZO DE EJECUCION 09 MESES. (FINAL 05/06/2024). MAS ADICION DE $3.996.989.037.91. GRAN TOTAL DEL CONTRATO $12.367.620.581.19. VR PAGO PARCIAL NO. 02 $1.434.707.500.05. FACTURA NO. FV-2

SON: UN MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CON 5 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
11100505012		Cta No. 378-017446 Recursos Propios	00.00	1,189,374,500.05			
24010204 901771549 001	3.2.3.4002020	Proyectos de inversiòn sector Deporte CONSORCIO DEPORTIVO 2023	489,918,911.71	00.00			
24010204 901771549 001	3.2.3.4002020	Proyectos de inversiòn sector Deporte CONSORCIO DEPORTIVO 2023	120,096,721.00	00.00			
24010204 901771549 001	3.2.3.4002020	Proyectos de inversiòn sector Deporte CONSORCIO DEPORTIVO 2023	141,900,328.29	00.00			
24010204 901771549 001	3.2.3.4002020	Proyectos de inversiòn sector Deporte CONSORCIO DEPORTIVO 2023	437,458,539.05	00.00			
		SUMAS IGUALES	1,189,374,500.05	1,189,374,500.05			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000094	2024000094	3.2.3.4002020.2.3.2.02.02.005.972.1.2.1.0.00	Espacio publico adecuadoVIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIOOrdenamiento territorial y desarrollo urbano . FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	682,791,539.05
Meta : 972	Adecuar, mantener y/o rehabilitar 3000 m2 de espacio público			
2024000094	2024000094	3.2.3.4002020.2.3.2.02.02.005.972.1.2.4.3.03	Espacio publico adecuadoVIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIOOrdenamiento territorial y desarrollo urbano . FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	141,900,328.29
Meta : 972	Adecuar, mantener y/o rehabilitar 3000 m2 de espacio público			
2024000094	2024000094	3.2.3.4002020.2.3.2.02.02.005.972.1.3.1.1.05	Espacio publico adecuadoVIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIOOrdenamiento territorial y desarrollo urbano . FUENTE: 1.3.1.1.05-RECURSOS DE CREDITO INTERNO	120,096,721.00
Meta : 972	Adecuar, mantener y/o rehabilitar 3000 m2 de espacio público			
2024000094	2024000094	3.2.3.4002020.2.3.2.02.02.005.972.1.3.1.1.11	Espacio publico adecuadoVIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIOOrdenamiento territorial y desarrollo urbano . FUENTE: 1.3.1.1.11-REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	489,918,911.71
Meta : 972	Adecuar, mantener y/o rehabilitar 3000 m2 de espacio público			
TOTAL PRESUPUESTO				1,434,707,500.05

Elaboró: CAMURCIA Aprobo:	Modifico: Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
FIRMA ELABORO	JOSE ARMANDO CAMARGO ESPINOSA Tesorero Municipal	c.c ó Nit

Bancolombia

Bogotá, 11 de Junio de 2024

Señores:
A quien interese
Ciudad

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO DEPORTIVO 2023 identificado con Nit. 901771549 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco el siguiente producto:

Nombre Producto	No Producto	Fecha apertura
CUENTA CORRIENTE	193-000022-36	2023/12/20

El manejo de este producto es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 4886000 extensión 14241 de Bogotá, Av. Cra 11 N. 91 42 EDIFICIO FIC 9211 P. 3

Marily Castillo Jimenez
Asesor comercial

* Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

lar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

CONTRATO

n del Contrato

ntaje Recepción de artículos

Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
001	FV 1	29/12/2023 11:30:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	3.806.993.304,93 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
002	FV 2	22/04/2024 11:37:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	1.434.707.500,05 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
003	FV 3	14 minutos de tiempo transcurrido (4/07/2024 11:46:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	1.359.060.024,61 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

entos de ejecución del contrato

Documentos de ejecución del contrato

Descripción Nombre del archivo Cargado por
