INFORME DE INSPECCIÓN EN REDES DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO CCTV OSCILOGIRATORIO

DIRECCIÓN

KR 75 ENTRE 57 R 60S Y 57 R 25S

CIV19000081

SISTEMA INSPECCIONADO

PLUVIAL

CONTRAFLUJO

FECHA DE LA INSPECCIÓN

8/08/2025

MATERIAL TUBERIA

CONCRETO

EJECUTADO POR:

Oficina: CRA 103 75 B 06
Tel oficina: 9247446
Moviles: 3204927694 / 3118137659

NORMA: NS-058
VERSION: 4.1
ORIGEN: EAAB- NTS

INDRAA Ingenieria en Diagnostico y
Rehabilitacion de Acueductos y Alcantarillados

Inspecionado por	Numero certificado	Cliente	Area de drenaje	Pagina
CRISTIAN ALVARADO	U-219-06S114	JPS INGENIEROS	N/A	1

N° O/C	RST	Ciudad	Fecha	Hora
	CIV19000081	Bogota	8/08/2025	18:38:09 p. m.

Direccion de la tuberia							N° PZ A. Arriba	N° PZ A. Abajo	Control de Flujo
KR 75	ENTRE	57	R 60S	Y	57	*R 25S*	PZ141	PZ144	N No Controlado

Detalles de la Ubicacion	Uso del Alcantarillado
KR 75 ENTRE 57R 60S Y 57 R 25S	SS PLUVIAL

Distancia del marco a la solera A. Arriba (m)	2,87	Distancia del suelo a la solera A. Arriba (m)	2,92	Distancia del marco al suelo A. Arriba (m)	0,5
Distancia del marco a la solera A. Abajo (m)	2,87	Distancia del suelo a la solera A. Abajo (m)	2,92	Distancia del marco al suelo A. Abajo (m)	0,5

Material de tuberia	Dieccion inspeccion	Altura tuberia (mm)	Ancho tuberia (mm)	Perfil	Limpieza previa
CONCRETO	D Aguas Arriba	700	700	C Circular	H limpieza profunda

Longitud total (m)	Long inspeccionada (m)	Longitud juntas (m)	Año construccion	Categoria
59,63	59,63	N/A	N/A	N/A

Metodo de revestimiento	Año de rehabilitacion		Ubicación	Estado del tiempo	Fecha de Limpieza
N/A		N/A	RESIDENCIAL	1 Seco	8/08/2025

Objetivo de la Inspeccion	Proyecto	Informacion Adicional
G Evaluacion de mejoras publicas	LA ESTANCIA	N/A

TABULACION CODIFICACION

Distancia (m)	ES	Codigo	OP	1a	2a	Defecto continuo	%	JTA	DE	A	Observaciones

0	MSI	Arranque de inspeccion
0	MWL	Nivel del Agua 5%
23,80	IW	lagrimeo
59,63	MEI	Fin de Inspeccion

59,63	Longitud Inspeccionada				1	*Pico Estructural*	
					1	*Pico O & M*	

NORMA: NS-058
VERSION: 4.1
ORIGEN: EAAB- NTS

INDRAA Ingenieria en Diagnostico y
Rehabilitacion de Acueductos y Alcantarillados

Inspecionado por	Numero certificado	Cliente	Area de drenaje	Pagina
CRISTIAN ALVARADO	U-219-06S114	JPS INGENIEROS	N/A	2

N° O/C	RST	Ciudad	Fecha	Hora
0	CIV19000081	Bogota	8/08/2025	18:38:09 p. m.

Direccion de la tuberia							N° PZ A. Arriba	N° PZ A. Abajo	Control de Flujo
KR 75	ENTRE	57	R 60 S	Y	57	R 25S	PZ141	PZ144	N No Controlado

Detalles de la Ubicacion	Uso del Alcantarillado
KR 75 ENTRE 57R 60S Y 57 R 25S	SS PLUVIAL

Material de tuberia	Dieccion inspeccion	Altura tuberia (mm)	Ancho tuberia (mm)	Perfil	Limpieza previa
CONCRETO	D Aguas Arriba	700	700	C Circular	H limpieza profunda

Longitud total (m)	Long inspeccionada (m)	Longitud juntas (m)	Categoria	Ubicación
59,63	59,63	N/A	N/A	RESIDENCIAL

Objetivo de la Inspeccion	Fecha de Limpieza	Estado del tiempo	Informacion Adicional
G Evaluacion de mejoras publicas	8/08/2025	1 Seco	N/A

CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES

EVALUACION ESTRUCTURAL

PUNTUACIONES POR SEGMENTO ESTRUCTURAL	GRADO	PUNTUACIONES
	1	0
	2	1
	3	0
	4	0
	5	0

CLASIFICACION GLOBAL ESTRUCTURAL
1
INDICE ESTRUCTURAL
1,0

Diagnostico	*No se encontraron daños o los pequeños defectos encontradosno son importantes par comprometer la estabilidad estrcutural del sistema.*
Recomendación	*se recomienda realizar una nueva inspeccion en un plazo de 4 a 5 años para verificar el estado estructural de la red.*

EVALUACION OPERACIONAL Y MANTENIMIENTO

PUNTUACIONES POR SEGMENTO O & M	GRADO	PUNTUACIONES
	1	1
	2	0
	3	0
	4	0
	5	0

CLASIFICACION GLOBAL O & M
1
INDICE OPERACIONAL Y MANTENIMIENTO
1,0

Diagnostico	*no se encontraron defectos operacionales en la inspeccion, o los defectos encontrados no son importantes para la fun*
Recomendación	*Se recomienda realizar nueva inspeccion en un plazo de 2 a 3 años, para verificar el estado operativo del tramo.*

CLASIFICACION RAPIDA PACP NASSCO V7.0

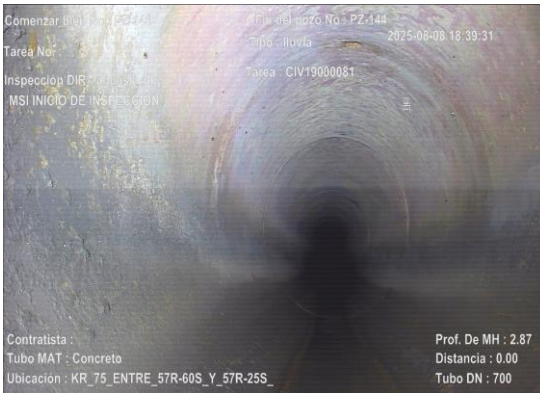
CLASIFICACION ESTRUCTURAL			
MAYOR GRADO ENCONTRADO	CANTIDAD ENCONTRADA	SEGUNDO MAYOR GRADO ENCONTRADO	CANTIDAD ENCONTRADA
2	1	0	0

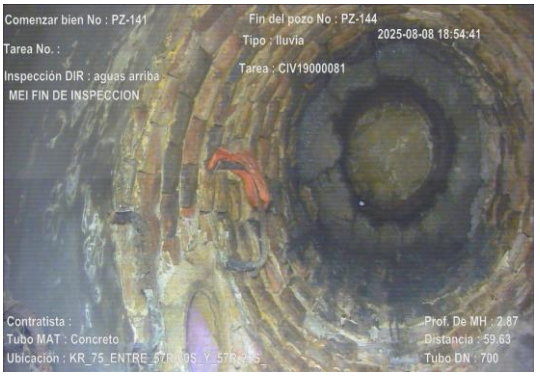
CLASIFICACION OPERACIONAL Y MANTENIMIENTO			
MAYOR GRADO ENCONTRADO	CANTIDAD ENCONTRADA	SEGUNDO MAYOR GRADO ENCONTRADO	CANTIDAD ENCONTRADA
0	0	0	0

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES ADICIONALES

REGISTRO FOTOGRAFICO

Fecha:	8/11/2025	**Tubería SECT:**	PZ-141~PZ-144
Long. Tubo:	59,63 m	**MH aguas**	PZ-141
Altura (diámetro):	700 mm	**MH aguas abajo:**	PZ-144
Material:	Concreto	**Dirección DIR:**	Aguas arriba
Calle:	KR 75 ENTRE 57R-60S Y 57R-25S		

Distanci	Observación de	tiemp	Imagen
0 m	Observación: PANEO	0 s	
0 m	Observación: MSI INICIO DE INSPECCION	1 s	
0 m	Observación: MWL NIVEL DE AGUA 5%	84 s	

Distanci	Observación de fallas	tiemp	Imagen
23,80 m	Observación: IW INFILTRACION POR LAGRIMEO	102 s	
59,63 m	Observación: MEI FIN DE INSPECCION	102 s	



INDRAA S.A.S

KR 75 ENTRE 57 R 60S Y 57 R 25S

PLUVIAL

CONTRAFLUJO

PZ141 – PZ144
