UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 04
DEL: 01 DE AGOSTO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA ". BPIN 20243218000007

ENTIDAD CONTRATANTE:
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA
CORPOGUAJIRA

CONTRATISTA:
UNIÓN TEMPORAL INTER ECOESTUF

AGOSTO DEL 2025

CLL 18 NO. 7 85 BARRIO LAS VILLAS
Teléfono Celular: 310 5118311
Email:inversionesysolucioneslvsb@hotmail.com
Riohacha – La Guajira.

INTRODUCCIÓN 3
OBJETIVO GENERAL. 4
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 4
DESCRIPCIÒN DEL PROYECTO 4
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 5
DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA 6
DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 7
PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROYECTO 7
PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA 7
PERSONAL DEL CONTRATISTA 8
INFORMACION LEGAL Y FINANCIERA 8
INFORMACIÓN LEGAL. 8
INFORMACIÓN FINANCIERA. 10
ACTIVIDADES EJECUTADAS 11
ACTIVIDADES FINANCIERAS 19
INFORMACIÓN TÉCNICA. 20
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS .....
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 21

CLL 18 NO. 7 85 BARRIO LAS VILLAS
Teléfono Celular: 310 5118311
Email:inversionesysolucioneslvsb@hotmail.com
Riohacha – La Guajira.

INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a las actividades de interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y ambiental del proyecto denominado “construcción de estufas ecoeficientes como medida de mitigación al cambio climático en zona rural del departamento de la guajira”.

La interventoría tiene como propósito verificar el cumplimiento integral del objeto contractual, asegurando que las obras se ejecuten conforme a los diseños, especificaciones técnicas, normativas ambientales vigentes y condiciones establecidas en el contrato. Así mismo, se realiza seguimiento al manejo administrativo y financiero del proyecto, garantizando una gestión eficiente, transparente y alineada con los objetivos institucionales.

Este informe presenta el seguimiento correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de agosto de 2025 hasta 31 de agosto de 2025, incluyendo los anexos pertenecientes al presente contrato; de igual forma presenta la información general del contrato y una descripción del avance de las obras adelantadas en los diferentes frentes de obra, actividades administrativas, como el estado financiero del contrato, así como las observaciones y recomendaciones necesarias para el adecuado desarrollo del proyecto.

OBJETIVO GENERAL.

Ejercer la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA", con el fin de garantizar que su ejecución se realice conforme a los términos contractuales, especificaciones técnicas, normativas vigentes y principios de eficiencia, transparencia, calidad y sostenibilidad ambiental, velando por el cumplimiento integral de los objetivos del proyecto y la correcta inversión de los recursos públicos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- Realizar el seguimiento de las diferentes actividades a ejecutar para dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato.
- Mostrar el avance que presenta la obra.
- Informar la gestión de la Interventoría.
- Garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el contrato de obra.

DESCRIPCIÒN DEL PROYECTO


El contrato de obra 0051 DE 2025 el cual tiene por objeto CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA la construcción de 1200 estufas ecoeficientes, ubicados en zonas rurales de 9 municipios, distribuidos de la siguiente manera:

1. 266 estufas ecoeficientes en Riohacha
2. 225 estufas ecoeficientes en el municipio de Barrancas
3. 252 estufas ecoeficientes en el municipio de Distracción
4. 223 estufas ecoeficientes en el municipio de la jagua del Pilar
5. 66 estufas ecoeficientes en el municipio de Hatonuevo
6. 61 estufas ecoeficientes en el municipio de Maicao
7. 51 estufas ecoeficientes en el municipio de Villa nueva
8. 29 estufas ecoeficientes en el municipio de Uribia
9. 27 estufas ecoeficientes en el municipio de Manaure

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto a intervenir se encuentra localizado en la Zona rural de 9 municipios del departamento de la Guajira, A continuación, se relaciona la localización de los sitios donde se ejecutará el proyecto.

Uribia, Riohacha, Maicao, Hatonuevo, Barrancas, Distracción, Manaure, Villanueva y La Jagua del Pilar

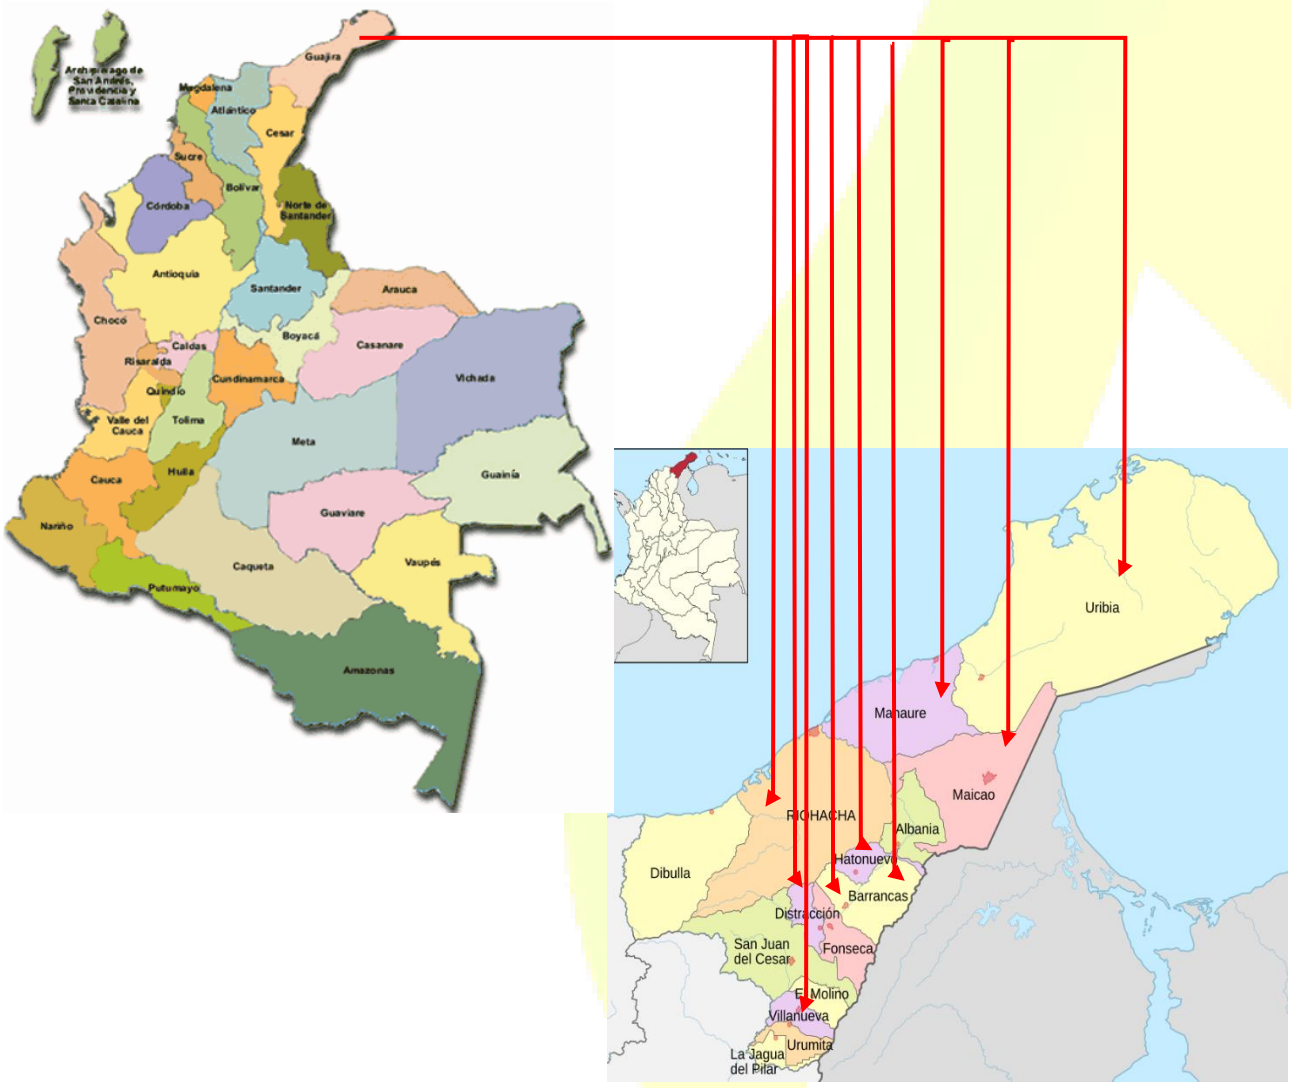

CLL 18 NO. 7 85 BARRIO LAS VILLAS

Teléfono Celular: 310 5118311

Email:inversionesysolucioneslvsb@hotmail.com
Riohacha – La Guajira.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 0051 DE 2025.	
ENTIDAD CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, CORPOGUAJIRA NIT: 892.115.314-9
INTERVENTORÍA:	UNIÓN TEMPORAL INTER ECOESTUF
SUPERVISOR:	KIANA VALBUENA MEJÍA
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA BPIN 20243218000007
CONTRATO NO:	0051 - 2025
CONTRATISTA DE LA OBRA:	FUNDACIÓN AGUA LUNA Nit. 900345569-4
REPRESENTANTE LEGAL:	GERALD BRISSON MENDOZA CC. 19.486.085 de Bogotá D.C
VALOR DEL CONTRATO:	CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS ($ 5.656.614.670.00)
VALOR DEL ANTICIPO:	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	DIEZ (10) MESES
FECHA DE INICIO:	14 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	13 MARZO DE 2026

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-0060-2025	
CONTRATANTE	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, CORPOGUAJIRA NIT: 892.115.314-9
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL INTER ECOESTUF NIT: 901941657-4
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA". BPIN 20243218000007
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) MESES
VALOR CONTRATO	CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS ($409.937.150,00) M/L
SUPERVISOR	KIANA VALBUENA MEJÍA
FECHA DE INICIACIÓN	14 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	13 MARZO DE 2026

PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROYECTO

PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

NOMBRE	CEDULA	CARGO
Samir Jose Cardozo Solano	1118806268	DIRECTOR
Bielca Silena Pimienta Padilla	40.928.933	RESIDENTE
Zunilda Amaya Uriana	40951297	PROFESIONAL SOCIAL
Carlos Antonio Brito Avila	84090164	CONTADOR
Loranis Maxiel Diaz Mercado	1118838660	TECNICO DE CAMPO
Yenifer Soto Vargas	1124409653	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Marianne Mejia Cardozo	1118800355	AUXILIAR DE OFICINA

PERSONAL DEL CONTRATISTA

NOMBRE	CEDULA	CARGO
Daniel Quintero Manotas	1122818210	ING. CIVIL
Luisa Fernanda Guerra	1062401355	ING. AMBIENTAL
María Fernanda Vargas	56078712	TRABAJADORA SOCIAL

INFORMACION LEGAL Y FINANCIERA

INFORMACIÓN LEGAL.

Pólizas contrato de Obra.

Se aprueban las garantías únicas establecida en la póliza de cumplimiento No. 47-44-101030695 y responsabilidad civil extracontractual No. 47-40-101009486, expedidas por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, para garantizar las obligaciones adquiridas en virtud del contrato electrónico de obra pública Nº 0051 del 2025 14 de mayo del 2025, celebrado entre la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, CORPOGUAJIRA y FUNDACION AGUA LUNA, cuyas características se describen a continuación:

PÓLIZAS: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
AMPAROS	**Nº DE POLIZA**	**VIGENCIAS**		**VALOR**
		DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	47-44-101030695	14/05/2025	20/07/2026	$565,661,467
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	47-44-101030695	14/05/2025	20/07/2026	$2,828,307,335
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	47-44-101030695	14/05/2025	22/03/2029	$282,830,733.50
CALIDAD DEL SERVICIO	47-44-101030695	16/03/2026	16/03/2031	$282,830,733.50
RSPONSABILIDAD CIVIL	47-40-101009486	14/05/2025	22/03/2026	$569,400,000

Pólizas contrato de Interventoría.

Se presenta en su orden: Aprobación de garantías de cumplimiento del contrato, buen manejo del anticipo, pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones y calidad del servicio de la obra del Contrato de interventoría No. CI-0060-2025, amparados según pólizas de garantía de cumplimiento No. 46-44-101013376 y responsabilidad civil extracontractual, expedidas por la Compañía de Seguros SEGUROS DEL ESTADO, como se detalla a continuación:

PÓLIZAS: SEGUROS DELESTADO S.A				
AMPAROS	Nº DE POLIZA	VIGENCIAS		VALOR
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	46-44-101013376	14/05/2025	13/09/2026	$81,987,430
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	46-44-101013376	14/05/2025	13/09/2026	$204,968,575
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	46-44-101013376	14/05/2025	14/03/2029	$20,496,857.50
CALIDAD DEL SERVICIO	46-44-101013376	14/03/2026	14/03/2031	$81,987,430.00
RSPONSABILIDAD CIVIL	46-40-101006756	14/05/2025	14/03/2026	$284,700,000

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

INFORMACIÓN FINANCIERA.

Contrato de Obra:

CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	VR. PARCIAL
1	CONSTRUIR ESTUFAS FIJAS ECOEFICIENTES				
1,1	Construir estufa fija ecoeficiente (0.73 m x 1.05 m) h=0.83 m	Un	1.156,0	3.332.598,00	3.852.483.288,00
1,2	Construir estufa fija ecoeficiente (1.00 m x 3.00 m) h=0.40 m.	Un	44,0	3.171.628,00	139.551.632,00
			Subtotal costos directos		3.992.034.920,00
				Administraciòn 24%	958.088.381,00
				Imprevistos 1%	39.920.349,00
				Utilidades 5%	199.601.746,00
				Iva sobre Utilidad 19%	37.924.332,00
				SUBBTOTAL 1	5.227.569.728,00
2	REALIZAR TALLERES Y CAPACITACIÓN PARA FAMILIAS BENEFICIADAS				
2,1	Realizar talleres de socializacion del proyecto a la comunidad y familias beneficiadas.	Un	28,0	2.202.285,00	61.663.980,00
2,2	Realizar talleres de capacitación a los beneficiarios sobre la operación y mantenimiento del sistema de cocción eficiente.	Un	34,0	3.077.285,00	104.627.690,00
2,3	Realizar la divulgacion del proyecto	Un	1,0	13.350.000,00	13.350.000,00
			Subtotal costos directos		179.641.670,00
				Administraciòn 24%	43.114.001,00
				SUBBTOTAL 2	222.755.671,00
3	MONITOREO Y SEGUIMIENTO				
3,1	Realizar monitoreo a los impactos del uso de las estufas ecoeficientes	Und	1,0	166.362.315,00	166.362.315,00
			Subtotal costos directos		166.362.315,00
				Administraciòn 24%	39.926.956,00
				SUBBTOTAL 3	206.289.271,00
	TOTAL COSTO DE OBRA				5.656.614.670,00

PROGRAMACIÒN

Detalle Actividad	Unidad	tidad T	2025 / 05	2025 / 06	2025 / 07	2025 / 08	2025 / 09	2025 / 10	2025 / 11	2025 / 12	2026 / 01	2026 / 02	2026 / 03
REALIZAR APOYO A LA SUPERVISIÓN	und	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	und	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
REALIZAR MONITOREO A LOS IMPACTOS DEL USO DE LAS ESTUFAS ECOEFICIENTES	und	1										1	
CONSTRUIR ESTUFA FIJA ECOEFICIENTE (0.73 M X 1.05 M) H0.83 M.	und	1156		70	150	150	165	165	156	150	150		
CONSTRUIR ESTUFA FIJA ECOEFICIENTE (1.00 M X 3.00 M) H0.40 M.	und	44					22	22					
REALIZAR LA DIVULGACIÓN DEL PROYECTO	und	1		0,2			0,4					0,4	
REALIZAR TALLERES DE CAPACITACIÓN A LOS BENEFICIARIOS SOBRE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COCCIÓNEFICIENTE.	und	34				5	10		10			9	
REALIZAR TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A LACOMUNIDAD Y FAMILIAS BENEFICIADAS.	und	28	7	7									14

CLL 18 NO. 7 85 BARRIO LAS VILLAS

Teléfono Celular: 310 5118311

Email:inversionesysolucioneslvsb@hotmail.com

Riohacha – La Guajira.

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante el periodo evaluado, se efectuó la verificación técnica de los predios, corroborando las condiciones mínimas necesarias para la instalación de las estufas ecoeficiente. Se revisaron aspectos como:

- Que el predio este habitado.
- Que cuente con una pared de soporte para la construcción de la estufa
- Que cuente con techo de cubierta para la estufa
- Disponibilidad y aceptación del beneficiario para participar en el proceso constructivo

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
</table>

CLL 18 NO. 7 85 BARRIO LAS VILLAS

Teléfono Celular: 310 5118311

Email:inversionesysolucioneslvsb@hotmail.com
Riohacha – La Guajira.

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

CLL 18 NO. 7 85 BARRIO LAS VILLAS

Teléfono Celular: 310 5118311

Email:inversionesysolucioneslvsb@hotmail.com
Riohacha – La Guajira.

Paralelamente, se realizó la entrega de materiales a las comunidades beneficiarias, garantizando que los insumos suministrados fueran acordes con las especificaciones requeridas para la correcta ejecución de la actividad. La interventoría realizó seguimiento a estas entregas, verificando cantidades, calidad y oportunidad.

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

CLL 18 NO. 7 85 BARRIO LAS VILLAS

Teléfono Celular: 310 5118311

Email:inversionesysolucioneslvsb@hotmail.com
Riohacha – La Guajira.

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

Se llevó a cabo la construcción de **150 estufas ecoeficientes**, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto y en cumplimiento de los cronogramas establecidos. Estas actividades fueron verificadas en campo mediante visitas, en las que se constató la correcta ejecución de los trabajos, así como la calidad de los materiales empleados.


		

CLL 18 NO. 7 85 BARRIO LAS VILLAS

Teléfono Celular: 310 5118311

Email:inversionesysolucioneslvsb@hotmail.com
Riohacha – La Guajira.

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

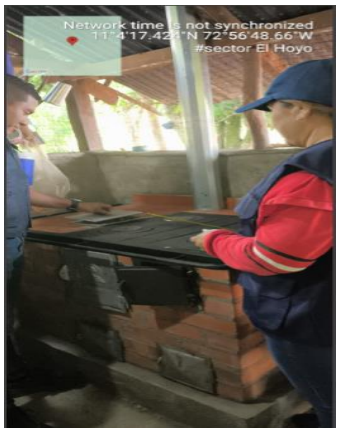CLL 18 NO. 7 85 BARRIO LAS VILLAS

Teléfono Celular: 310 5118311

Email:inversionesysolucioneslvsb@hotmail.com
Riohacha – La Guajira.

Y se realizaron jornadas de capacitación dirigidas a los beneficiarios del proyecto, con el fin de brindarles conocimientos prácticos y teóricos sobre el uso adecuado, cuidado y mantenimiento del sistema de cocción eficiente. Durante la capacitación se explicarán las principales características del sistema, las recomendaciones para su correcto funcionamiento, las medidas de seguridad que deben tener en cuenta y las prácticas de limpieza y mantenimiento preventivo que prolongan la vida útil del equipo.

Asimismo, se promoverá la adopción de hábitos responsables que contribuyan a la reducción del consumo de leña, la disminución de emisiones contaminantes y la mejora de la salud de las familias beneficiadas. La capacitación se llevará a cabo mediante talleres participativos, demostraciones prácticas y entrega de material informativo, garantizando que los usuarios cuenten con las herramientas necesarias para un manejo adecuado y sostenible del sistema de cocción eficiente.

CLL 18 NO. 7 85 BARRIO LAS VILLAS

Teléfono Celular: 310 5118311

Email:inversionesysolucioneslvsb@hotmail.com
Riohacha – La Guajira.

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

En general, se evidencia un avance positivo en el desarrollo del proyecto, con cumplimiento de metas y buena articulación entre el contratista y la comunidad. presentando los siguientes avances: Programado: 11,91% - Ejecutado: 11,91%

CLL 18 NO. 7 85 BARRIO LAS VILLAS

Teléfono Celular: 310 5118311

Email:inversionesysolucioneslvsb@hotmail.com
Riohacha – La Guajira.

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO	
% PROGRAMADO MAYO	0,34%
% EJECUTADO MAYO	0,34%
% PROGRAMADO JUNIO	5,80%
% EJECUTADO JUNIO	5,80%
% PROGRAMADO JULIO	11,57%
% EJECUTADO JULIO	11,57%
% PROGRAMADO AGOSTO	11,91%
% EJECUTADO AGOSTO	11,91%
AVANCE TOTAL EJECUTADO	**29,62%**

Contrato de Interventoría:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

N°	CONCEPTO	A	B	C	D	E	F	G
		SUELDO MES BÁSICO	CANTIDAD	%DE DEDICACIÓN	F.M.	VALOR MES	N° DE MESES	TOTAL PARCIAL (A*B*C*D*E * F)
1	PERSONAL							
1.1	PERSONAL DE SUPERVISIÓN							
1.1.1	Director de Interventoría	$ 5.500.000,00	1	50%	210,00%	$ 5.775.000	10,0	$ 57.750.000
1.1.2	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.000.000,00	1	100%	210,00%	$ 8.400.000	10,0	$ 84.000.000
1.1.3	Tecnico de campo	$ 2.800.000,00	1	100%	210,00%	$ 5.880.000	10,0	$ 58.800.000
1.1.4	Profesional social	$ 3.500.000,00	1	50%	210,00%	$ 3.675.000	10,0	$ 36.750.000
1.3	PERSONAL DE APOYO							
1.3.1	Contador	$ 4.500.000,00	1	15%	210,00%	$ 1.417.500	10,0	$ 14.175.000
1.3.2	Auxiliar administrativo	$ 2.700.000,00	2	15%	210,00%	$ 1.701.000	10,0	$ 17.010.000
	SUB-TOTAL COSTOS DE PERSONAL							$268.485.000
	OTROS COSTOS DIRECTOS							
2	OTROS COSTOS DIRECTOS	UND	CANTIDAD	%DE DEDICACIÓN	VALOR UNITARIO		N° DE MESES	TOTAL PARCIAL
2.1	Papelería y copias	glb	1	100%	$ 100.000,00		10,0	$ 1.000.000
2.2	Transporte (Alquiler de vehiculo)	un	1	100%	$ 7.500.000,00		10,0	$ 75.000.000
	SUB-TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS							$76.000.000
	RESUMEN GENERAL							
	COSTO TOTAL (1 + 2)							$344.485.000
	IVA (19%)							$65.452.150
								$409.937.150

CLL 18 NO. 7 85 BARRIO LAS VILLAS


Teléfono Celular: 310 5118311

Email:inversionesysolucioneslvsb@hotmail.com

Riohacha – La Guajira.

ACTIVIDADES FINANCIERAS

La interventoría durante el periodo del presente informe realizó un avance físico del 10%. Por su parte, el contrato de obras presenta un avance físico acumulado del 29,62%.

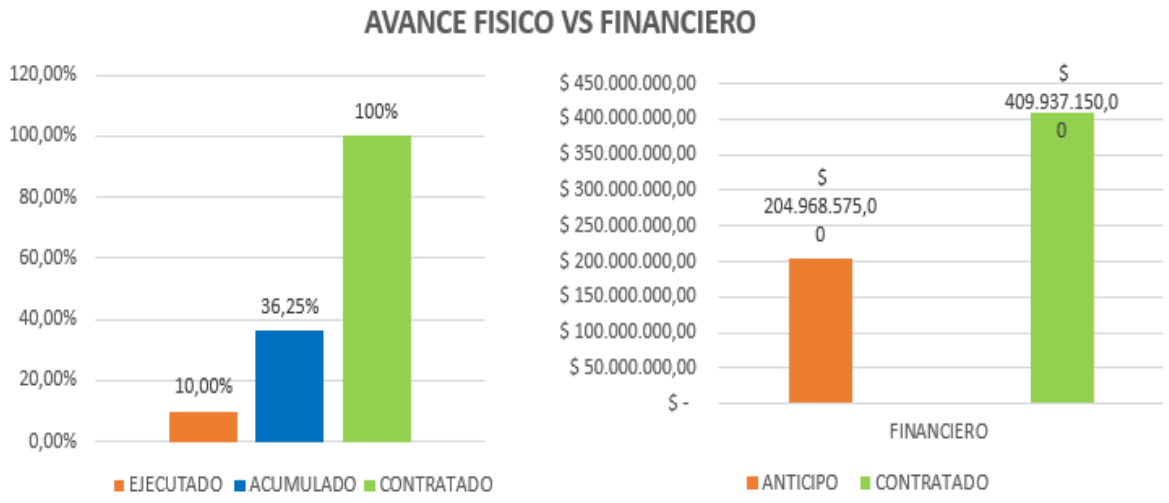

Control Financiero Inversión Anticipo de obra

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO.	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 0051 DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. BPIN 20243218000007
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DIEZ (10) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	$ 5,656,614,670.00
VALOR DEL ANTICIPO 50%:	$ 2,828,307,335.00
CONTRATISTA:	FUNDACION AGUA LUNA
NIT:	900.345.569-5
INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL INTER ECOESTUF
NIT:	901.941.657-4

En la siguiente tabla lista de ítems en los cuales se programa invertir el anticipo de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	%
1	**MANO DE OBRA**				**$ 272,719,200**	**9.64%**
1.1	Mano de obra de instalacion KIT de Herrajes (0.73 m x 1.05 m)	UND	300	466,187	$ 139,856,100	*25.00%*
1.2	Mano de obra de instalacion KIT de Herrajes (1.00 m x 3.00 m)	UND	300	442,877	$ 132,863,100	*25.00%*
2	**TRANSPORTE**				**$ 270,078,900**	**9.55%**
2.1	Transporte al sitio de la obra de KIT de Herrajes (0.73 m x 1.05 m)	UND	300	558,018	$ 167,405,400	25.00%
2.2	Transporte al sitio de la obra de KIT de Herrajes (1.00 m x 3.00 m)	UND	300	342,245	$ 102,673,500	25.00%
3	**MATERIALES**				**$ 2,274,241,078**	**80.41%**
3.1	Ladrillo tipo bocadillo 5X10X20	UND	190,000	3,200	$ 304,000,000	41.67%
3.2	Ladrillo Macizo de 10*20*30 cm	UND	34,191	2,800	$ 47,867,854	46.20%
3.3	kit de herraje (0.73 m x 1.05 m)	UND	1,156	1,617,354	$ 1,869,661,224	100.00%
3.4	kit de herraje (1.00 m x 3.00 m)	UND	44	1,198,000	$ 52,712,000	100.00%
4	**GMF (4X1000)**				**$ 11,268,157**	
	TOTAL		-	-	**2,828,307,335.00**	**100%**

Control Financiero Inversión Anticipo interventoría

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO		
CONTRATO No	CI-0060-2025	
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA". BPIN 20243218000007	
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL INTER ECOESTUF	NIT. 901941657-4
VALOR CONTRATADO	CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS	
	$	409.937.150,00
PLAZO DE EJECUCION	DIEZ (10) MESES	
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, CORPOGUAJIRA	
SUPERVISOR	ING. KIANA RAFAELA VALBUENA MEJIA	
ANTICIPO (50%) :	$	204.968.575,00

PROGRAMACION INICIAL						
ITEM	DESCRIPCION / DETALLE	CANTIDAD A EJECUTAR CON ANTICIPO	VALOR A EJECUJAR CON ANTICIPO		VALOR NETO A GIRAR	
1	HONORARIOS PROFESIONALES	65%	$	134.242.500,00	$	134.242.500,00
2	TRANSPORTE	35%	$	70.726.075,00	$	70.726.075,00
TOTAL		100%	$	204.968.575,00	$	204.968.575,00

INFORMACIÓN TÉCNICA.

RESUMEN AVANCE ESTUFAS ECOLOGICAS					
MUNICIPIO	ESTUFAS CONTRATADAS	ESTUFAS VERIFICADAS	SI APLICAN	NO APLICA	ESTUFA CONSTRUIDA
DISTRACCION	252	252	217	35	109
BARRANCAS	225	225	163	62	58
VILLANUEVA	51	51	50	1	50
URIBIA	29	29	29	0	29
HATONUEVO	66	66	64	2	64
RIOHACHA	266	266	215	51	37
MANAURE	27	27	27	0	
LA JAGUA DEL PILAR	223	200	170	30	
MAICAO	61	61	48	13	23
	1200	**1177**	**983**	**194**	**370**

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIÓN

Durante el periodo evaluado, se evidenció un avance significativo en la ejecución del proyecto, destacándose la construcción de 150 estufas ecoeficientes, la entrega oportuna de materiales, la verificación técnica de los predios intervenidos y la realización de los talleres de capacitación. Las actividades se desarrollaron conforme a las especificaciones técnicas y a lo establecido en el cronograma de trabajo, permitiendo constatar un adecuado cumplimiento por parte del contratista. La articulación entre los equipos técnicos, la comunidad beneficiaria y el personal de interventoría ha facilitado el desarrollo eficiente de las labores, garantizando la calidad y funcionalidad de las soluciones implementadas.



LUIS VICENTE SOCARRAS BERTY
Interventor
UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	03 – 08 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	MAICAO – CARRAIPIA		
BENEFICIARIO:	YESICA EPIEYU – CC: 1.134.177.183		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	04 – 08 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	MAICAO – CARRAIPIA		
BENEFICIARIO:	MARIA ZABALETA M. – CC:1.006.890.705		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	04 – 08 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	MAICAO – CARRAIPIA		
BENEFICIARIO:	MARTIN MERIÑO MUÑOZ – CC:12.395.704		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	28– 07 - 25
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	MAICAO – CARRAIPIA		
BENEFICIARIO:	EDGAR LARRADA – CC:17.809.807		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	30– 07 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	MAICAO – CARRAIPIA		
BENEFICIARIO:	ABIMAEL LOPEZ – CC: 17.845.705		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	30 – 07 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	MAICAO – CARRAIPIA		
BENEFICIARIO:	JAIME SOLANO – CC: 72.126.026		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	28 – 07 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	MAICAO – CARRAIPIA		
BENEFICIARIO:	HELDA MARIA DAZA – CC: 26.993.904		


VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA

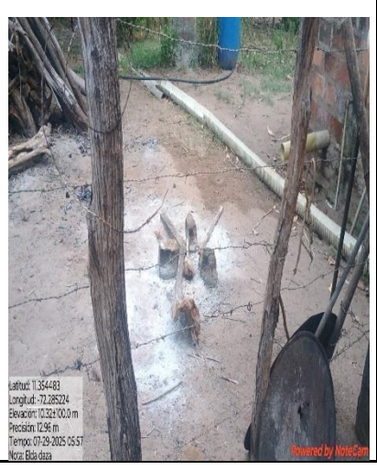





UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	08 – 08 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	MAICAO – CARRAIPIA		
BENEFICIARIO:	EVER SARDOT – CC:84.069.916		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO


ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA



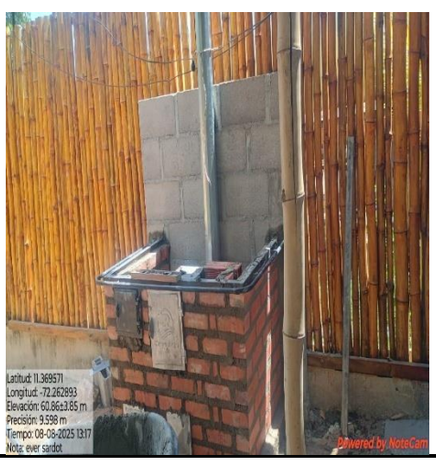



UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	15 – 08 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	MAICAO – CARRAIPIA		
BENEFICIARIO:	RUTH FERREIRA – CC:57.403.949		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	27– 07 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	MAICAO – CARRAIPIA		
BENEFICIARIO:	CARLOS CHOLES – CC: 91.201.053		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI


VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA





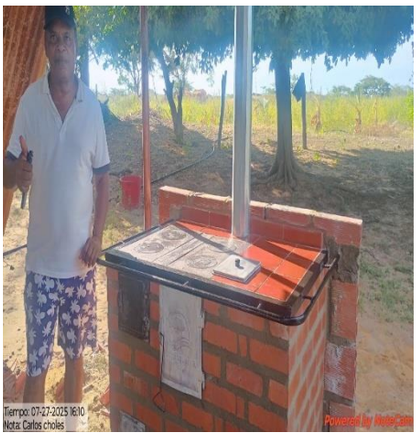

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	26 – 07- 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	MAICAO – CARRAIPIA		
BENEFICIARIO:	ORLANDO ARTEAGA – CC: 8.698.906		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
SI4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	26– 07 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	MAICAO – CARRAIPIA		
BENEFICIARIO:	GREICI M. BARLIZA – CC:26.987.625		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	07– 08 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	MAICAO – CARRAIPIA		
BENEFICIARIO:	MARCOS M. REYES – CC:92.671.023		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	05 – 08 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	MAICAO – CARRAIPIA		
BENEFICIARIO:	EVA BELTRAN REYES – CC:33.000.031		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	06– 08 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	MAICAO – CARRAIPIA		
BENEFICIARIO:	AGRIPINA GONZALES – CC:27.041.664		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	06 – 08 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	MAICAO – CARRAIPIA		
BENEFICIARIO:	ZENAIDA PINEDA – CC:40.951.681		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	01 – 08 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	MAICAO – CARRAIPIA		
BENEFICIARIO:	NEFFER C. MARTINEZ – CC:84.041.930		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	02 – 08 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	MAICAO – CARRAIPIA		
BENEFICIARIO:	JOEL ARIAS – CC: 77.021.018		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	03 – 08 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	MAICAO – CARRAIPIA		
BENEFICIARIO:	MARIA ANGELA ROMERO – CC: 40.951.707		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	02 – 08 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	MAICAO – CARRAIPIA		
BENEFICIARIO:	ANTONIO DAZA – CC:17.841.456		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	24 – 07 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	MAICAO – CARRAIPIA		
BENEFICIARIO:	ERNESTO QUINTERO – CC:8.699.917		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	25– 07 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	MAICAO – CARRAIPIA		
BENEFICIARIO:	ISMENIA POCATERRA – CC:1.124.029.790		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	07– 08 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	MAICAO – CARRAIPIA		
BENEFICIARIO:	NOELIA MARQUEZ – CC:27.024.833		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	17 – 08 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCIÓN – EL PULGAR		
BENEFICIARIO:	NAIR ANTONI HERNANDEZ – CC: 1.121.044.673		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	08 – 08 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCIÓN – EL CHORRO		
BENEFICIARIO:	MAGALIS M CARRILLO – CC:26.997.119		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	07 – 08 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCIÓN – CAIMITO		
BENEFICIARIO:	YENIS SOLANO – CC: 26.998.753		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	11– 08 - 25
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCIÓN – EL CHORRO		
BENEFICIARIO:	SOCORRO A. SUAREZ – CC:26.998.572		


VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA

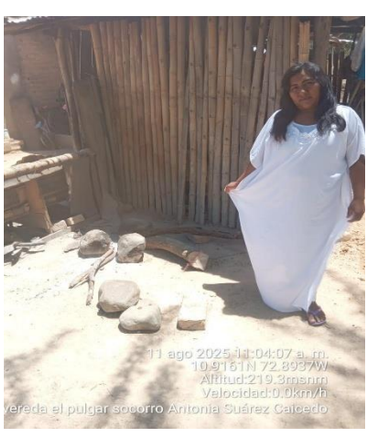





UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	01– 08 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCIÓN – LOS HORNITOS		
BENEFICIARIO:	SILVIA GONZALES – CC: 26.998.952		


VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA

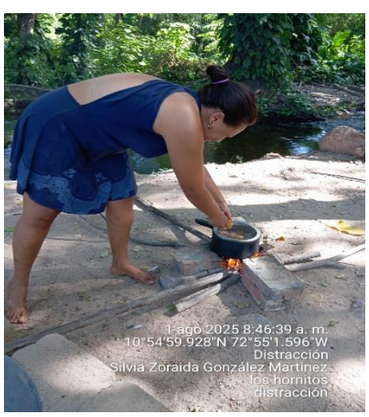





UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	02 – 08 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCIÓN - PULGAR		
BENEFICIARIO:	ALEXIS BRITO - CC:56.056.551		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	15 – 08 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCIÓN – LA DUDA		
BENEFICIARIO:	LEIDER ARGUELLES – CC: 17.956.832		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	12 – 08 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCIÓN – LA DUDA		
BENEFICIARIO:	DORIS MARELIS DAZA ORTEGA – CC:26.994.738		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	05 – 08 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCIÓN – EL CHORRO		
BENEFICIARIO:	ANA MARIA CARRILLO BRITO – CC: 1.193.381.364		


VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA

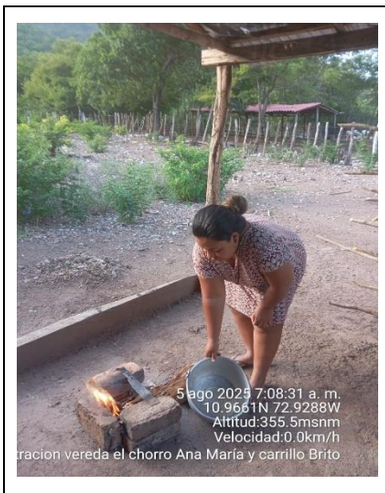





UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	13 – 08 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCIÓN – EL CHORRO		
BENEFICIARIO:	KATERIN SOLANO – CC:1.121.041.302		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	17 – 08 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCIÓN – LOS HORNITOS		
BENEFICIARIO:	GLADIS MARTINEZ – CC: 26.995.608		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
SI4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	23 – 08 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCIÓN – LOS HORNITOS		
BENEFICIARIO:	ANA MARTINEZ – CC:56.054.657		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	09– 08 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCIÓN – CAIMITO		
BENEFICIARIO:	LUIS MANUEL CORDOBA – 1.120.739.878		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	23 – 08 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCIÓN – CAIMITO		
BENEFICIARIO:	EDILMA SOLANO – CC: 56.057.124		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	05– 08 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCIÓN – EL. CHORRO		
BENEFICIARIO:	MARIA ISABEL MOLINA – CC:1.121.040.855		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	30 – 07 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCIÓN – EL. CHORRO		
BENEFICIARIO:	MARIA DOMINGUEZ ALVAREZ – CC: 22.907.483		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	03 – 08 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCIÓN – EL CHORRO		
BENEFICIARIO:	MARIA MANUELA URIANA – CC: 56.056.791		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	31 – 08 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCIÓN – EL CHORRO		
BENEFICIARIO:	YASELENIS DAZA DAZA – CC:56.056.405		


VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA

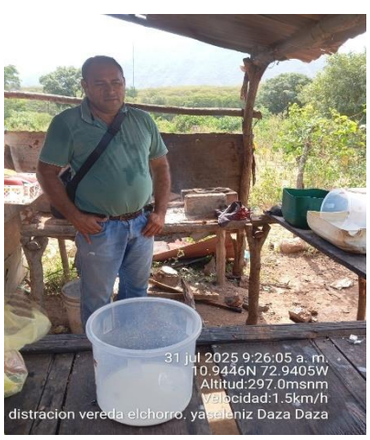





UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	20 – 08 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCIÓN – POTRERITO		
BENEFICIARIO:	MARYURIS ROMERO – CC: 1.193.453.147		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	05 – 08 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCIÓN – POTRERITO		
BENEFICIARIO:	ZOILA MOLINA PUSHAINA – CC:40.807.184		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	27 – 08 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCIÓN - ROSASIBARRO		
BENEFICIARIO:	MIRIAN GLADIS MOLINA – CC:26.995.575		


VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA

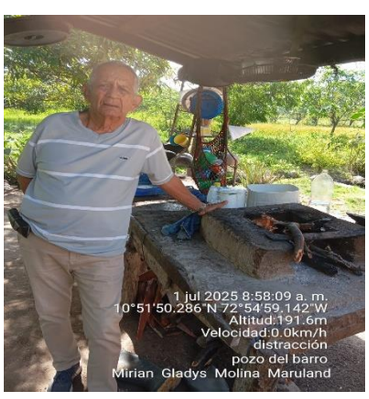





UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	25– 07 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCIÓN – EL CHORRO		
BENEFICIARIO:	MARIA ALEJANDRA ACOSTA – CC: 1.121.040.530		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	21– 08 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCIÓN – EL CHORRO		
BENEFICIARIO:	CLAUDIA P.GOURIYU – CC:121.043.352		


VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA

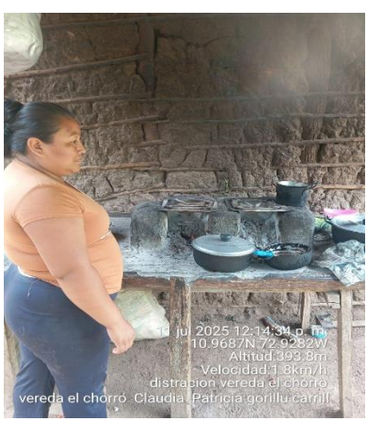





UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	26– 08 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCIÓN – EL CHORRO		
BENEFICIARIO:	JAIRO JOSE CARRILLO – CC: 17.954.203		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	09 – 08 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCIÓN – EL ESCONDIO		
BENEFICIARIO:	GERMAN SOLANO – CC:17.952.547		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	10– 08 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCIÓN - PULGAR		
BENEFICIARIO:	CARMEN ARGUELLES – CC: 26.998.139		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	11 – 08 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCIÓN – LOS HORNITOS		
BENEFICIARIO:	NAYETH MARTINEZ – CC:1.121.041.373		


VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA

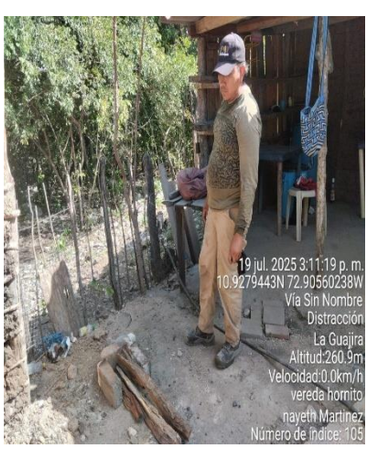





UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	12 – 08- 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCIÓN – LOS HORNITOS		
BENEFICIARIO:	NAILETH MARTINEZ – CC:1.121.043.399		


VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI


VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA

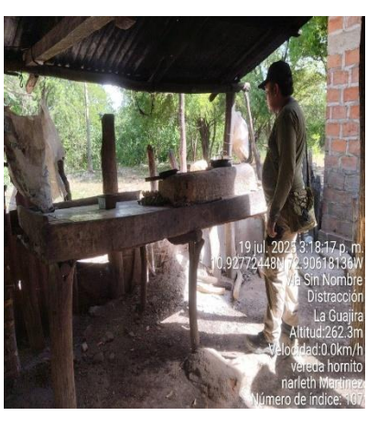



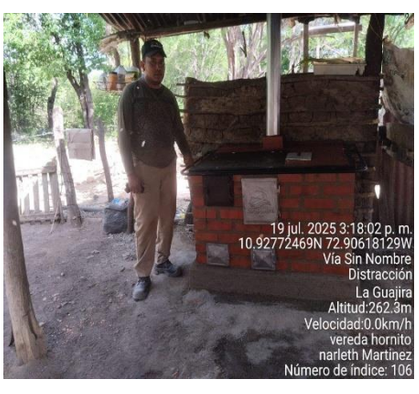

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	21 – 08 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCIÓN – EL CHORRO		
BENEFICIARIO:	JUAN CARRILLO BRITO – CC:1.193.461.524		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	26– 08 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCIÓN – POTRERITO		
BENEFICIARIO:	YANELIS RODRIGUEZ – CC:1.121.045.299		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	22 – 08 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCIÓN - PULGAR		
BENEFICIARIO:	JORGE ARTURO PALOMINO – CC:17.958.356		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	22 – 08 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCIÓN – RESGUARDO POTRENTO		
BENEFICIARIO:	YURIMAR ROJAS PUSHAINA – CC: 1.121.043.107		


VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA

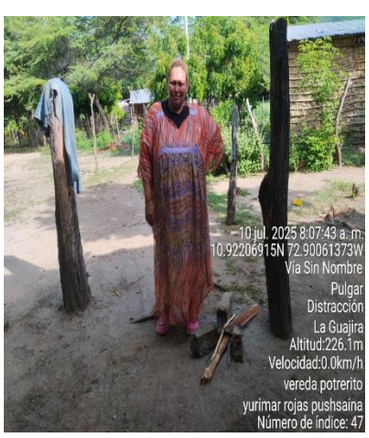





UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	13 – 08 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCIÓN		
BENEFICIARIO:	JOAQUIN SIERRA DAZA – CC:2.769.885		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	05 – 08 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCIÓN – EL CHORRO		
BENEFICIARIO:	JUAN SEGUNDO CARRILLO URIANA – CC:17.954.146		


VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA

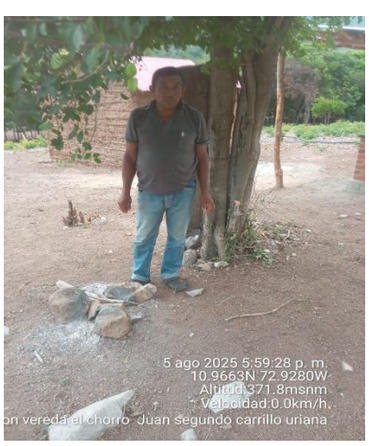





UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	31 – 07 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCIÓN – LOS HORNITOS		
BENEFICIARIO:	MARELVIS MADERA – CC:56.054.563		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	30 – 07 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCIÓN – LOS HORNITOS		
BENEFICIARIO:	JEAN CARLOS CARRILLO – CC: 17.956.522		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	29 – 07 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCIÓN – LA MATA		
BENEFICIARIO:	JOSE MIGUEL GOMEZ – CC: 17.951.724		


VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA

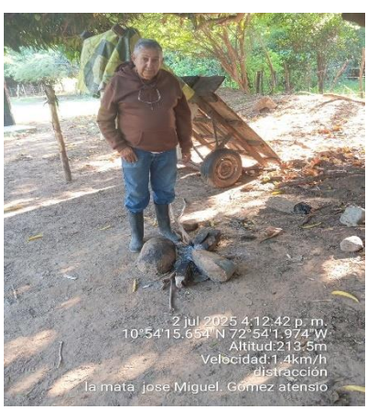





UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	28 – 07 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCIÓN – EL CHORRO		
BENEFICIARIO:	JOSÉ RENÉ VERGARA BRITO – CC: 17.958.578		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	08 – 08 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCIÓN – EL CHORRO		
BENEFICIARIO:	ENER MARIA CARRILLO URIANA – CC: 26.997.118		


VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA

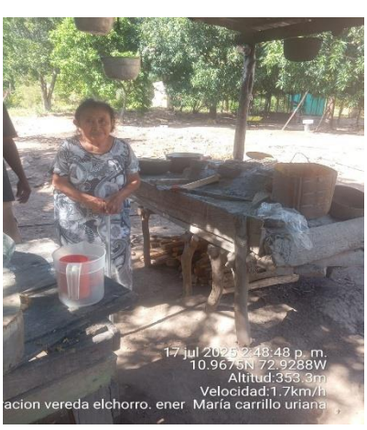





UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	19 – 08 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCIÓN – EL CHORRO		
BENEFICIARIO:	ADRIANA SOLANO – CC:1.193.431.233		


VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA

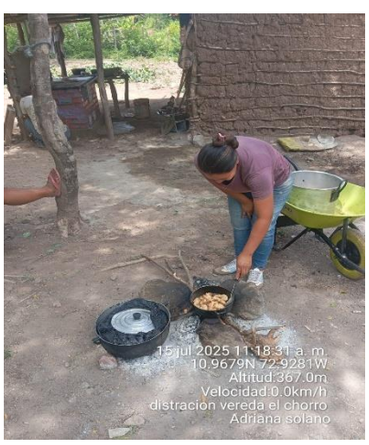





UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	20 – 08 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCIÓN – EL CHORRO		
BENEFICIARIO:	LUZ ESTELLA. URIANA SOLANO – CC: 1.010.069.504		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	24 – 08 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCIÓN – LOS HORNITOS		
BENEFICIARIO:	GENITH SOLANO – CC:26.994.270		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	29 – 08 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCIÓN - POTRERITO		
BENEFICIARIO:	ANA JULIA ARPUSHANA – CC:26.998.876		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	29 – 08 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCIÓN - POTRERITO		
BENEFICIARIO:	MARGOT EPIAYU – CC:27.026.183		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	26 – 07 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	HATO NUEVO – CERRO ALTO		
BENEFICIARIO:	EUNIS MARTINEZ – CC: 26.995.447		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	20 – 08 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCIÓN – LOS HORNITOS		
BENEFICIARIO:	MARTA BENJUMEA – CC: 42.494.971		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	05 – 08 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCIÓN – EL CHORRO		
BENEFICIARIO:	ESTEFANY GONZALES – CC: 1.006.680.267		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	17 – 08 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	HATONUEVO - MANANTIAL GRANDE		
BENEFICIARIO:	LEYDIS GUARIYU – CC: 1.006.734.808		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	02 – 08 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	HATONUEVO - MANANTIAL GRANDE		
BENEFICIARIO:	GUSTAVO GUARIYU – CC:84.062.937		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	03 – 08 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	HATONUEVO - MANANTIAL GRANDE		
BENEFICIARIO:	DEICY VERONICA GUARIYU – CC: 1.121.302.515		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	06 – 08- 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	HATONUEVO - MANANTIAL GRANDE		
BENEFICIARIO:	MINGO URRARIYU – CC:5.153.887		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	11– 08 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	HATONUEVO - MANANTIAL GRANDE		
BENEFICIARIO:	YANETH ORTIZ BOURIYU – CC: 1.122.813.428		


VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA

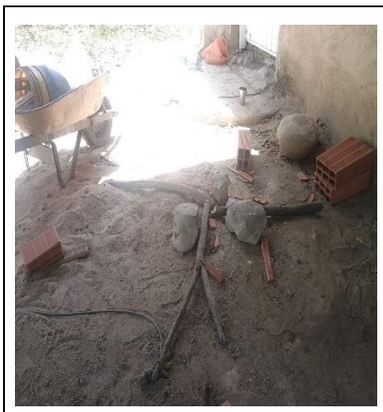





UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	05 – 08 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	HATONUEVO - MANANTIAL GRANDE		
BENEFICIARIO:	CARMEN F. PUSHAINA – CC: 26.987.247		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	12 – 08 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	HATONUEVO - MANANTIAL GRANDE		
BENEFICIARIO:	JUAN RAMIRO ORTIZ – C:77.029.695		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	14 – 08 – 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	HATONUEVO - MANANTIAL GRANDE		
BENEFICIARIO:	MARIA ISABEL RICARDO – C:40.960.097		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	16 – 08 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	HATONUEVO - MANANTIAL GRANDE		
BENEFICIARIO:	MARIA V, ORTIZ – CC: 49.789.474		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	18 – 08 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	HATONUEVO – LAS LOMITAS		
BENEFICIARIO:	GUSTAVO A. FRAGOZO – CC:84.006.964		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	09 – 08 – 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	HATONUEVO - MANANTIAL GRANDE		
BENEFICIARIO:	ANITA BOURIYU – CC: 26.986.646		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	01-08-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Villanueva		
BENEFICIARIO:	Felix Ortega – C.C: 17972781		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Villanueva		
BENEFICIARIO:	Rafael Guerra – C.C : 17971247		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	04-08-25
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Villanueva		
BENEFICIARIO:	Kenelma Rosa García - C.C:40.940.811		


VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA

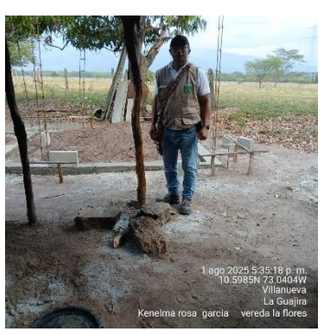





UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	03-08-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Villanueva		
BENEFICIARIO:	Maribel Gonzales – C.C: 56.056.471		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	07-08-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas		
BENEFICIARIO:	Diana Brito -C.C:1.122.821.095		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	06-08-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas		
BENEFICIARIO:	Ada Luz Uriana -C.C: 1.122.811.800		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	10-082025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas		
BENEFICIARIO:	Felipe Uriana Epiayu – C.C:5152314		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	01-08-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas		
BENEFICIARIO:	Danica Alarza C.C: 1192787788		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	07-08-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas		
BENEFICIARIO:	Maura Epinayu – C.C :26988363		


VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	17-08-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RU DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas		
BENEFICIARIO:	Adela Mena Iguaran -C.C: 26.987.738		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO


ITEM	Actividad	Cumple (Sí/N
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respe borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con material (Sí/
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA



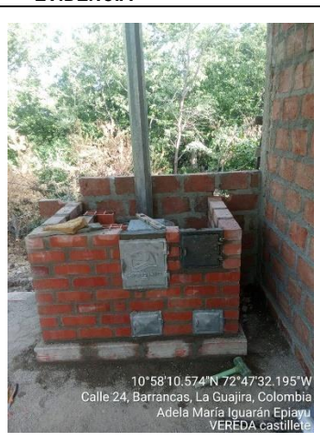



UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	29-07-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas		
BENEFICIARIO:	Geogina Gouriyu – C.C:26.984.410		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	29-07-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas /Castillete		
BENEFICIARIO:	Alix Yorgelis Gonzales -C.C:1122808029		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	31-07-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas		
BENEFICIARIO:	Irida Amaya - C.C 1050008540		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	02-08-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas		
BENEFICIARIO:	Danilza Daniela Epiayu -1120659052		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	6-08-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas		
BENEFICIARIO:	Yoider Medina Epiayu – C.C:1193243104		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	11-08-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas		
BENEFICIARIO:	Elvia Marina Ipuana C.C: 1122810531		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	1-07-82025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas		
BENEFICIARIO:	Donelis Duarte C.C: 1122813281		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	10-08-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas		
BENEFICIARIO:	Jose Antonio Uriana -C.C:84.008.976		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	08-08-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas		
BENEFICIARIO:	Juana Mercedes Uriana C.C:26.988.390		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	01-08-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas		
BENEFICIARIO:	Lisnay Eliana Iguaran – C.C:1124044536		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	03-08-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas		
BENEFICIARIO:	José Gregorio Uriana- C.C :84066559		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	02-08-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas		
BENEFICIARIO:	Fernando Francisco Epiayu -C.C:101001625		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	02-08-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas		
BENEFICIARIO:	Alfredo José Epinayu – C.C:5153375		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	01-08-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas		
BENEFICIARIO:	Eliseth María Uriana -C.C:1122810200		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	08-08-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas		
BENEFICIARIO:	Ana Isabel Epiayu C.C :26988065		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	13-08-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas		
BENEFICIARIO:	Luz Elena Iguaran -26984915		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	08-08-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas		
BENEFICIARIO:	Silvia Ipuana -C.C:26983892		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	15-08-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas		
BENEFICIARIO:	Luis Manuel Epinayu -C.C: 1192897463		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	20-08-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas		
BENEFICIARIO:	Hermelinda Epiayu – C.C:26981733		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	16 -08-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas		
BENEFICIARIO:	Cecilia Epiayu – C.C:26986609		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	15-08-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas		
BENEFICIARIO:	Fredy Gabriel Epinayu – C.C: 1192761706		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si


VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA





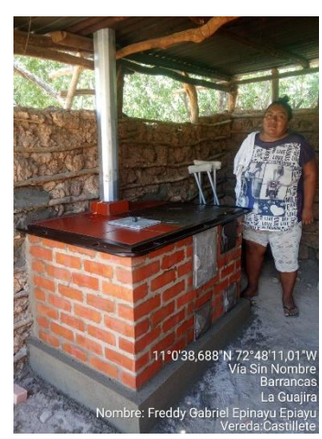

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	14-08-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas		
BENEFICIARIO:	Maritza Pushaina – C.C: 26984857		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	14-08-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Riohacha /La Gloria		
BENEFICIARIO:	Luis Alberto Criado - CC: 17.956.363		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	09-08-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Riohacha / La Gloria		
BENEFICIARIO:	María del socorro - C.C:22.649.457		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en "V" para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½" x 1/8" de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	21-08-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Riohacha – Mundo Nuevo		
BENEFICIARIO:	Yudi Agustín Caballero - C.C:78.688.977		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	20-08-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Riohacha – Mundo Nuevo		
BENEFICIARIO:	Said de la cruz Puente – C.C:40.797.947		


VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA

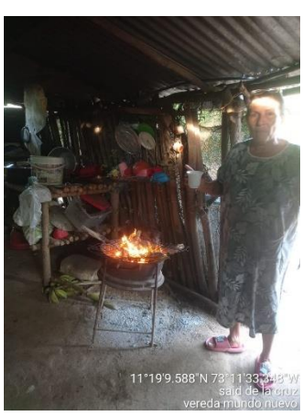





UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	16-08-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Riohacha / Mundo Nuevo		
BENEFICIARIO:	Concepción Mendoza - C.C:12.445.965		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	14-08-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Riohacha – La Guajira		
BENEFICIARIO:	José Antonio Bustamante – C.C:109.999.1443		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	13-08-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Riohacha- Mundo Nuevo		
BENEFICIARIO:	Jorge Luis Devias -C.C:85.453.964		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	20-08-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Riohacha – Nuevo		
BENEFICIARIO:	Gilberto Millán - C.C:15.044.272		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	19-08-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Riohacha /Mundo Nuevo		
BENEFICIARIO:	Edgar Hernán Mancilla -C.C:19.588.265		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	19-08-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Riohacha / Mundo Nuevo		
BENEFICIARIO:	Victor Manuel Martinez -C.C:12.593.639		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO


ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA



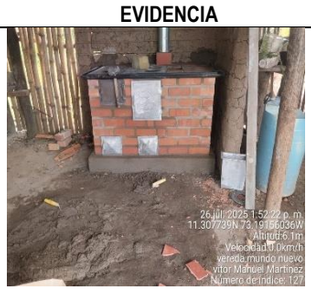



UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	18-08-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Riohacha – Mundo Nuevo		
BENEFICIARIO:	Eramidez Narváez -C.C:84.087.773		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	25-07-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Riohacha – Mundo Nuevo		
BENEFICIARIO:	Presentacion Sidray -C.C:26.765.744		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	19-08-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Riohacha – Mundo Nuevo		
BENEFICIARIO:	Vilma del Carmen Lugo-C.C:57.423.937		


VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA

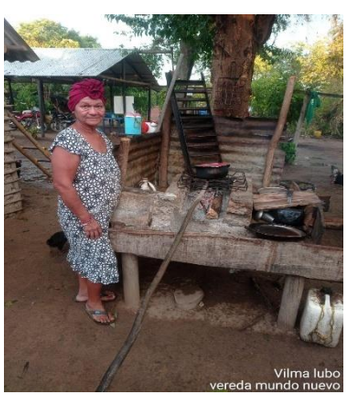





UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	26-08-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Riohacha - Mundo Nuevo		
BENEFICIARIO:	Manuel Segundo Rodríguez -C.C:12.629.407		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	28- 08-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Riohacha / Mundo Nuevo		
BENEFICIARIO:	Edilberto Manuel Gerrero- C.C : 19.531.015		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	16-08-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Riohacha/ Mundo Nuevo		
BENEFICIARIO:	Oscar Daniel Suarez – C.C:84.068.396		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	03- 08-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Riohacha – Mundo Nuevo		
BENEFICIARIO:	Claudia Rosa Ipuana -C.C:40.879.370		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	07- 08-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Riohacha – Mundo Nuevo		
BENEFICIARIO:	Elkin de Jesús Ospino – C.C:19.619.811		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	26-08-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Riohacha – Mundo Nuevo		
BENEFICIARIO:	Vidal Mejía Álvarez – C.C:84.032.576		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	11-08-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Riohacha – Mundo Nuevo		
BENEFICIARIO:	Yolanda Morales - C.C: 65.792.045		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	17-08-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Riohacha – Mundo Nuevo		
BENEFICIARIO:	Andrés Rojano - C.C:19.505.317		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	16-08-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Riohacha – Mundo Nuevo		
BENEFICIARIO:	Denis Esther Maldonado – C.C: 40.919.717		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	19-08-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Riohacha – Mundo Nuevo		
BENEFICIARIO:	Pedro Manuel Toro - C.C: 5.122.671		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en "V" para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½" x 1/8" de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	24-08-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Riohacha – Mundo Nuevo		
BENEFICIARIO:	Miguel Martinez Vergara -12.592.836		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	08-08-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Riohacha – La Gloria		
BENEFICIARIO:	Jorge Luis Brito - CC:92.505.174		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	09-08-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Riohacha – La Gloria		
BENEFICIARIO:	Pedro Berrio CC :81.866.33		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	10-08-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Riohacha – La gloria		
BENEFICIARIO:	Edgar Reinoso C.C :84.025.103		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	11-08-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Riohacha – La Gloria		
BENEFICIARIO:	Gustavo Moscote Valera - 84027182		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	12-08-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Riohacha – La Gloria		
BENEFICIARIO:	Sixta Reyes -C.C:1.118.801.529		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	12-08-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Riohacha – La Gloria		
BENEFICIARIO:	Juana Fonseca - C.C:40.916.981		


VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA

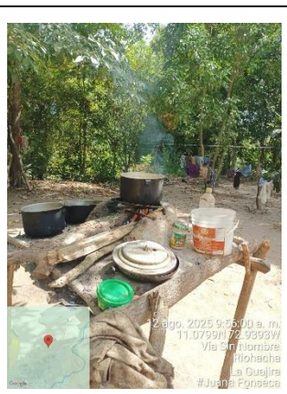





UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	13-08-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Riohacha – La Gloria		
BENEFICIARIO:	Kendy Badillo - C.C: 1.118.850.512		


VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA

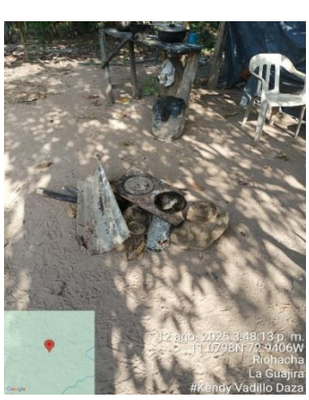





UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	13-08-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Riohacha – La Gloria		
BENEFICIARIO:	Cecilia Palacio - C.C: 26.984.861		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO


ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA



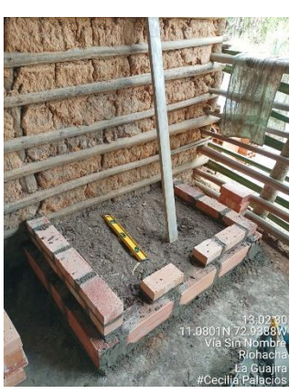



UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	06-08-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Riohacha – La Gloria		
BENEFICIARIO:	Zulay Guerra - C.C : 1.148.144.002		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	05-08-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Riohacha – La Gloria		
BENEFICIARIO:	Yamile Guerra - C.C : 40.934.665		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	06-08-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Riohacha – La Gloria		
BENEFICIARIO:	Lisbeth Ñungo - C.C: 1.134.180.636		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	08-08-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Riohacha – La Gloria		
BENEFICIARIO:	Marisol López – C.C: 40.927.894		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	07-08-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Riohacha – La Gloria		
BENEFICIARIO:	Ledis Barbosa C.C: 26.006.583		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO


ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA



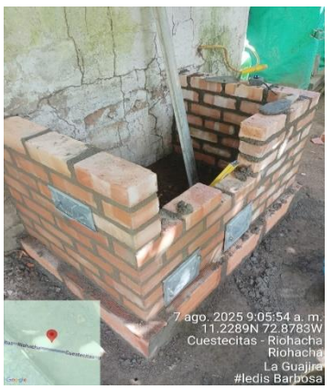



UNION TEMPORAL ECOESTUF INTER

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

FECHA: 27-02-2025 LUGAR: Urbanizero

No.	Nombre Completo	Cédula de Ciudadanía	Cominidad	Teléfono / Correo	Firma
1	Evelina Guerrero Fonseca	1007612427	Las Lomitas	3226439289	Evelina Guerrero
2	Deris Fonseca Jayariyu	56057091	"	31125a0864	
3	Yeida Rodriguez M.	26995360	"	3008084429	
4	Ines Fuchado	40.798.542	"	3156626295	Ines Fuchado
5	Margareth Ortiz fonseca	1.121.298049	"	3158788437	Margareth Ortiz
6	Rosario Jayariyu	1121297947	"	3028658785	Rosario Jayariyu
7	Jose Felix Brito F	84006778	"	3009761555	Jose Felix Brito J
8	Maria Jose ortiz F	1193448631	"	3105129423	Maria Jose ortiz F
9	carlos andres fonseca		"		
10	Judith Fonseca	26983626	"	3188738640	Judith Fonseca
11	ALIXTO FONSECA	5153742	"	3026266953	
12					
13					
14					
15					
16					
17					

UNION TEMPORAL ECOESTUF INTER

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

FECHA: 27-08-2025 LUGAR: Hatonuevo.

No.	Nombre Completo	Cédula de Ciudadanía	Cominidad	Teléfono / Correo	Firma
1	Graciela Guariyu	1121299619	Manantial Grande	3122577386	Graciela G.E
2	Leidis Guariyu	1006734808	"	3006968075	Leidis Guariyu
3	Gustavo. Guariyuu	84062937	"	3226413482	Gustavo. G.G
4	Beatriz ortiz Guariyú	40960178	"	3135863557	Beatriz O.
5	Dairi Veronica Guariyu	1121302515	"	3235190359	Dairi Ver
6	ninfa urrutiyu. G	51533887	"	3129571287	ninfa. urrutiyu
7	Rosa Ortiz Guariyu	26986857	"	3135557769	Rosa Ortiz
8	Judith Esther Mendoza	1121298141	"	3009832715	Judith Mendoza
9	Yaneth Ortiz Bouriyu	1122813428	"	3044797088	Yaneth Ortiz
10	Amalia Ortiz	26.987.948	"	3106335762	Amalia Ortiz
11	Carmen Gonzalez Guariyú	56054304	"	3216620478	Carmen Gonzalez G
12	Anita Bouriy	26.986.646	"		Anita Bouriyu
13	Yarue Isabel D. C.	40960097.	"	3175356174	Yarue Isabel D. C.
14	Maria V. Ortiz Gouriyu	49789474	"	317 644 4304	Maria V. Ortiz
15			"		
16					
17					

CLL 18 NO. 7 85 BARRIO LAS VILLAS
Teléfono Celular: 310 5118311
E mail:inversionesysolucioneslvsb@hotmail.com
Riohacha – La Guajira.

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

FECHA: 27-08-2025 **LUGAR:** Distracción.

No.	Nombre Completo	Cédula de Ciudadanía	Cominidad	Teléfono / Correo	Firma
1	Balkis Paternina Brito	63550335	Caimito	3135748864	
2	Maria clara Apushana	56057133	Caimito		Maria Apushana
3	Yuleth Rocio Uriana Ibn	26.998914.	Caimito	3127946505	
4	Lunilda uriana epiayu.	1121040993	Caimito	3012313691	
5	Nexida Epinayu	39.495062	Caimito		
6	Autora. Pro-gen.	26 995 193	Caimito	3113779955	
7	Nathy Filomena Perez A.	1122810238	Caimito	3225439359	Null
8	Yenis del Pilar Solano	26998753	Caimito	3508345109	Yenis Solano
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

CLL 18 NO. 7 85 BARRIO LAS VILLAS
Teléfono Celular: 310 5118311
E mail:inversionesysolucioneslvsb@hotmail.com
Riohacha – La Guajira.

UNION TEMPORAL ECOESTUF INTER

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

FECHA: 27-08-2025 **LUGAR:** Distracción.

No.	Nombre Completo	Cédula de Ciudadanía	Cominidad	Teléfono / Correo	Firma
1	PP	17815004	Caimito		ISi Provedo Pushaina
2	EMMA Rosalba Ramirez	40807041	Caimito	3145567251	
3	Carmen Ufanca	26994663	Caimito	3216440.8059	
4	Josefa Maria epieyu	56057121	Caimito	3234211878	
5	marilin lopez E	26998875	Caimito	3205594675	marilin lopez E
6	Rosalia epieyu	15200057	Caimito	3145375273	
7	leida pushaina	40807194	Caimito	3197667029	leida pushaina
8	Yericeth pushaina	1192783605	Caimito		Yericeth Pushaina
9	Alfonso Luis Bolivar	17956958	Caimito	3136967704	Alfonso Luis Bolivar
10	mafildelena	56057031	caimito		mafildelena
11	Mauricia Pushaina	56056412	Caimito		mauricia Pushaina
12	Juana m Pushaina	56057135	Caimito		Juana Pushaina
13	Imelda solano.	56055639	Caimito	3218163166.	Imelda solano.
14	Beatris. Apushana	56057129.	Caimito		
15	Arminda Apushana	40807036	Caimito		
16	Glenis Epinayu	56057132	Caimito	3249045271	Glenis Epinayu
17	Dilia Solano Ramirez	56058155	Caimito	3027467999	Dilia Solano

CLL 18 NO. 7 85 BARRIO LAS VILLAS
Teléfono Celular: 310 5118311
E mail:inversionesysolucioneslvsb@hotmail.com
Riohacha – La Guajira.

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

FECHA: 27-08-25 **LUGAR:** Distracción

No.	Nombre Completo	Cédula de Ciudadanía	Cominidad	Teléfono / Correo	Firma
1	Marian Sulo Iguaran	56058387	El chorro	3154311971	Mariangela I
2	Juan segundo Carrillo	1193461524	El chorro	3228313712	Juan Carrillo
3	Martha L. Buitrago	1118873415	El chorro	3122036783	Martha B.
4	Alix Salano	1193431236	El chorro	3218747600	Alix Salano
5	Jose Ricardo Pushaina Pushaina	1121040200	El chorro	3116397630	
6	Rosa M. Herrera Gonzalez	1066796374	El chorro	3206985637	Rosa Herrera
7	Jairo Jose Carrillo	17954203	El chorro	3127425204	
8	Duvis Ster Rodero	56057174	El chorro	3122036783	Duvis Rodero
9	Claudia Gouriyu	1795900660	El chorro	3148251352	Clau
10	maricela	1727043352	El chorro		
11	Magalis Carrillo U	56055748	El chorro	3207319857	maricela
12	Magalis Carrillo U	26 997 119	El chorro	3106553156	Magalis Carrillo
13	Ana Maria Gouriyu C	1118836386	El chorro	3007838603	Ana Gouriyu
14	Julio Mario Rondon Brito	1121040353	El chorro	3226379378	Julio Rondon
15	Luz Estella Arias S	1010.069504	El chorro	3216615304	Luzes Estella
16	Adolvelo Riva	5.761839	El chorro		Adalberto Riva
17	Ener Maria Carrillo	26997118	El chorro		Ener Carrillo

CLL 18 NO. 7 85 BARRIO LAS VILLAS
Teléfono Celular: 310 5118311
E mail:inversionesysolucionesivsb@hotmail.com
Riohacha – La Guajira.

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

FECHA: 29-08-2025 **LUGAR:** Pamoncas

No.	Nombre Completo	Cédula de Ciudadanía	Cominidad	Teléfono / Correo	Firma
1	Guajira Epiayu	26984410	Cashllete	3205130649	Guajira
2	Alix Gonzalez	1122808029	"	3235786514	Alix Gonzalez
3	Juana Epiayu	1122298593	"	3224922561	Juana G.
4	Jose Uriana	84.005476	"		Jose.
5	Yandra Cecilia Epiayu	1122808579	"	3126339745	Yandra
6	maria luisa Jarariyu	40.983.133	"		maria luisa
7	Jose Gregorio Zuiga	84.006.576	"	3105183283	Jose Zuiga E.
8	Gabriel Francisco Iguaran e	1 1122816760	"	3126339745	Gabriel Iguaran
9	Anibel maria Iguaje Epiayu	26987738	"		Anibel Iguaje Epiayu
10	Hermelinda Epiayu	26.981.733	"		Hermelinda.
11	Julieth Rios	1.192.890.980	"		Julieth Ríos
12	Linda Rios	1.121.044.307	"		Linda Rios
13	Ramiro Iguaran Epiayu	84.044.992	"	304.595 3850	Ramiro Iguaran
14	Eduardo Iguaran Barcán	86087449	"	3246583843	Eduardo Iguaran B.
15	Sandra Duarte	84009687	"	3152704563	Sandra
16	Petronila Epiayu	26.981.513	"		Petronila
17	Elsa M Iguaran E.	1122819557	"	3215965120	[illegible]
