CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02).

INFORME MENSUAL DE OBRA No. 13

PERIODO DE EJECUCIÓN: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025



CONTRATISTA: CONSORCIO CAUCE

CONTRATO – 210-15410-6

1. INTRODUCCIÓN

La Central de Abastos de Bucaramanga S.A., es el principal operador logístico de productos agroalimentarios del Nororiente Colombiano, siendo la tercera mayor Central de abasto con mayores volúmenes comercializados del país, con 32 años de historia, ocupa 26 hectáreas, y alberga aproximadamente 1.300 establecimientos comerciales, que generan visitas entre 13.000 y 15.000 personas por día y 27.000 empleos directos e indirectos, desempeñando un papel clave en el desarrollo regional.

La sede de la Empresa Centroabastos se localiza entre el anillo vial y el Río de Oro; En el año 2006 se habían construido muros en gavión de 3 m de altura cimentados sobre un dentellón de 4 m de profundidad; no obstante, la estructura ya fue socavada por la erosión lateral del cauce y se ha presentado el colapso de varios tramos de muro en una longitud aproximada de 200 m.

Además, existen factores antrópicos, como la extracción minera en el Río de Oro, que han provocado una profundización del cauce, difícil de medir desde el ámbito de la ingeniería, pero evidente en zonas con obras de control del cauce, como en el caso de Centro abastos, la socavación ha superado los 4 metros de profundidad en estructuras de aproximadamente 15 años de existencia, lo que ha contribuido al colapso de varios tramos de muro de gavión.

El presente documento corresponde al **Informe Técnico No. 13**, en el cual se registran las actividades ejecutadas durante el período comprendido entre el **1 y el 30 de septiembre de 2025**. En dicho intervalo se desarrollaron labores de manera simultánea en los tres frentes de obra, abarcando principalmente: suministro y colocación de concretos para recubrimientos, y la perforación, suministro, colocación, llenado e inyección de anclajes.

En cuanto a las condiciones meteorológicas, durante el mes de septiembre se evidenció un detrimento en las condiciones climáticas, particularmente en las primeras semanas, cuando se presentaron varios eventos de precipitaciones intensas que limitaron la ejecución de determinadas actividades contractuales. Que pese a la implementación del plan de contingencia ante las fuertes precipitaciones las consecuencias de estos fenómenos atípicos a la época del año impidieron el normal desarrollo de las actividades, generando un atraso en el cumplimiento del cronograma de obra.

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 1
2. OBJETIVO GENERAL 4
2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4
3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 5
4. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 6
4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 6
4.2. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATISTA 7
4.3. CAMBIOS TECNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/O PROYECTO 7
4.4. CUADROS DE CONTROL DE PÓLIZAS 8
5. RELACIÓN DEL PERSONAL Y EQUIPOS UTILIZADOS POR CONSORCIO CAUCE. 10
6. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA 17
ACTIVIDADES DE TIPO TÉCNICO 17
6.1. SECCIÓN TERCERA 18
6.1.1. Suministro y colocación de concreto de 3000 psi 18
6.1.2. Llenado e inyección con lechada cementicia para anclajes. 20
6.2. SECCIÓN CUARTA 22
6.2.1. Suministro y colocación de anclajes de 3 cables ø=1/2" de L=20m 22
6.3. SECCIÓN QUINTA 24
6.5.1 Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0.00m a 15.00m 24
6.5.2 Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15.00m 26
6.5.3 Jacket de respaldo para revestimiento de perforación horizontal en anclajes y drenes de penetración 27
6.4. SECCIÓN SEXTA 29
6.4.1. Estructura de disipación de energía 29
6.4.2. Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" pasamuros o lloraderos 31
6.5. CANITIDADES TOTALES 33
6.6. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 34
6.6.1. Relación de actas de reunión. 34
6.6.2. Bitácora de obra 34
6.6.3. Afiliación seguridad social 34
6.6.4. Seguimiento y control 35
6.7. ACTIVIDADES FINANCIERAS 35
6.7.1. Variaciones financieras 35
6.7.2. Relación de pagos efectuados 36
6.8. ACTIVIDADES DE CALIDAD 36
6.9. ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 36
6.9.1. Actividades componente ambiental y social 36
6.9.2. Actividades componente seguridad y salud en el trabajo (SST) 37
7. INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO 37

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 39

2. OBJETIVO GENERAL


El propósito principal del actual informe de obra consiste en evidenciar y soportar técnicamente el desarrollo de las actividades de obra comprendidas en el CONTRATO No. 15410-6, cuyo objeto consiste en la "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR DE CENTROABASTOS MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)", durante el periodo establecido entre **el 01 al 30 de septiembre de 2025**

Así mismo demostrar las actividades realizadas, gestión y seguimiento tanto en obra con la ejecución de los trabajos, como a nivel social y a su vez exponer el desarrollo del proyecto en el ámbito administrativo, técnico y climatológico comprobando que se está en ejecución de acuerdo con lo programado.

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Demostrar técnica y visualmente la ejecución de cada una de las actividades realizadas en el periodo de este informe.
- Informar la gestión administrativa y el complemento social, ambiental, de seguridad y económico del contrato.
- Dar evidencia de las afiliaciones sociales de cada uno de los trabajadores operativos y personal administrativo.

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

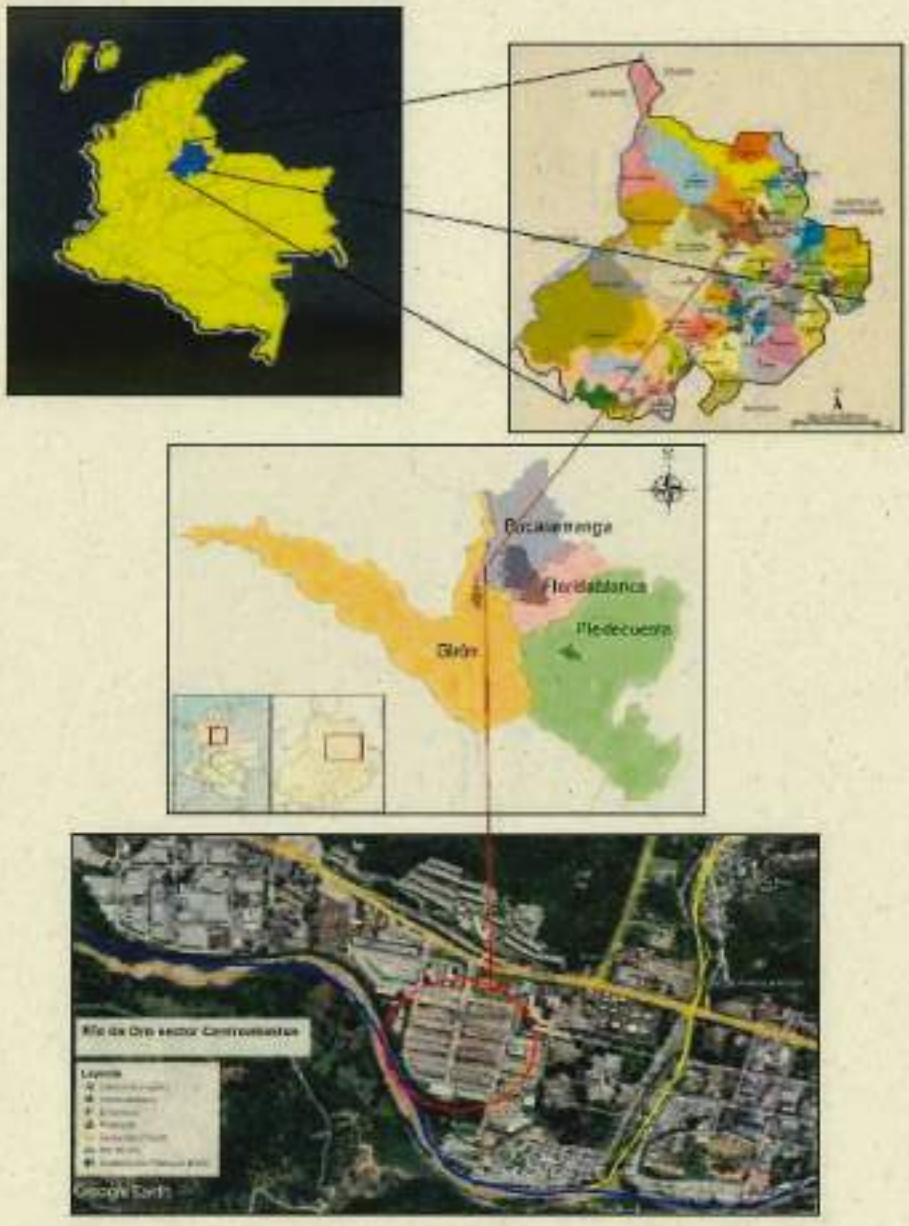

El proyecto se encuentra ubicado en la Vía Palenque a Café Madrid No. 44-96 del Municipio de Bucaramanga, hacia la margen derecha del Rio de Oro.

Cuadro de coordenadas:	
Norte	7°06'10.72"
Oeste	73°08'57.77"

4. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA	N° 210-15410 – 6
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR DE CENTROABASTOS MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)
ENTIDAD CONTRATANTE	CDMB – CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA.
SUPERVISOR CONTRATANTE	ARQ. CARLOS DIAZ BARRERA
CONTRATISTA	CONSORCIO CAUCE
REPRESENTANTE LEGAL	JULIAN ANDRÉS SERRANO GÓMEZ
NIT	901.855.581-5
INTERVENTORIA	CONSORCIO CENTROABASTOS
REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL FERNANDO QUIRÓS GÓMEZ
VALOR FISCAL DEL CONTRATO	$16.738.177.417,42
VALOR ADICIONAL	$8.100.000.000,00
NUEVO VALOR DEL CONTRATO	$24.838.177.417,42
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	4 MESES
PLAZO ADICIONAL DE EJECUCIÓN	11 MESES
FECHA DE INICIO	06 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE NOVIEMBRE DE 2025
DEPARTAMENTO	SANTANDER

4.2. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATISTA

Tabla No. 1 Relación de actas del contratista:

RELACIÓN DE ACTAS			
ACTA	**FECHA**	**OBSERVACIONES**	**VALOR**
Contrato	01/08/2024	210-15410-6	**$16.738.177.417,42**
Acta de inicio	06/09/2024	Se fijó el día 06 de septiembre del 2024 como fecha de inicio, y el día 31 de diciembre del 2024 como fecha límite de cumplimiento.	N/A
Acta de entrega de anticipo	10/10/2024	Anticipo correspondiente al 40,00% del contrato de Obra	$ 6.695.270.967,00
Ampliación de plazo y valor fiscal	12/11/2024	Se concertó adicional en valor en ocho mil cien millones **($8.100.000.000)** m/cte, y ampliar el plazo del contrato por un periodo de ocho (8) meses	**$24.838.177.417,42**
Acta parcial de cobro N°1	18/12/2024	**Periodo a que corresponde el acta:** 06 de septiembre de 2024 al 05 de diciembre de 2024	$2.312.647.683,52
Acta parcial de cobro N°2	24/02/2025	**Periodo a que corresponde el acta:** 06 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2024	$3.450.525.825,85
Acta parcial de cobro N°3	06/05/2025	**Periodo a que corresponde el acta:** 01 de febrero al 30 de abril de 2025	$5.169.347.832,72
Ampliación de plazo (OTROSÍ No.02)	10/07/2025	Se amplió el plazo del contrato por un periodo de tres (3) meses, estableciendo como nueva fecha de terminación el 30 de noviembre de 2025.	N/A
Acta parcial de cobro N°4	19/08/2025	**Periodo a que corresponde el acta:** 01 de mayo al 31 de julio de 2025	$4.295.571.866,47

4.3. CAMBIOS TECNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/O PROYECTO

- Durante el periodo del presente informe no se presentaron cambios técnicos y/o modificaciones del contrato.

4.4. CUADROS DE CONTROL DE PÓLIZAS

Tabla No. 2 Cuadro control de pólizas del contrato N° 210-15410-6 Acta de inicio.

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL A FIRMA DE ACTA DE INICIO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
POLIZA No.	96-44-101191089	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	10/09/2024
AMPAROS OTORGADOS	**VALOR**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 6.695.270.967,20	06/09/2024	05/06/2025
Cumplimiento del contrato	$ 3.347.635.483,60	06/09/2024	05/06/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 836.908.870,90	06/09/2024	05/02/2028
Estabilidad y calidad de la Obra	$ 3.347.635.483,60	Si ampara 5 años	

Tabla No. 3 Cuadro control de pólizas del contrato N° 210-15410-correspondiente al Otrosí 1

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL A FIRMA DE OTROSI No1			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
POLIZA No.	96-44-101191089	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	19/11/2024
AMPAROS OTORGADOS	**VALOR**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 6.695.270.967,20	06/09/2024	31/12/2025
Cumplimiento del contrato	$ 4.967.635.483,48	06/09/2024	31/12/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 1.241.908.870,87	06/09/2024	31/08/2028
Estabilidad y calidad de la Obra	$ 4.967.635.483,48	Si ampara 5 años	

Tabla No. 4 Cuadro control de pólizas del contrato N° 210-15410-correspondiente al Otrosí 2

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL A FIRMA DE OTROSI No2			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
POLIZA No.	96-44-101191089	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	25/07/2025
AMPAROS OTORGADOS	**VALOR**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 6.695.270.967,20	06/09/2024	31/03/2026
Cumplimiento del contrato	$ 4.967.635.483,48	06/09/2024	31/03/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 1.241.908.870,87	06/09/2024	30/11/2028
Estabilidad y calidad de la Obra	$ 4.967.635.483,48	Si ampara 5 años	
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL A FIRMA DE OTROSI No2			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
POLIZA No.	96-40-101067569	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	25/07/2025
AMPAROS OTORGADOS	**VALOR**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
Predios Labores y operaciones	10% del valor de la perdida Mínimo 1.00 SMMLV $ 1.241.908.870,87	06/09/2024	30/11/2025
Contratistas y subcontratistas	10% del valor de la perdida Mínimo 1.00 SMMLV $ 1.241.908.870,87	06/09/2024	30/11/2025
Vehículos propios y no propios	10% del valor de la perdida Mínimo 1.00 SMMLV $ 1.241.908.870,87	06/09/2024	30/11/2025

5. RELACIÓN DEL PERSONAL Y EQUIPOS UTILIZADOS POR CONSORCIO CAUCE.

Tabla No.5 Personal solicitado según el pliego de condiciones o términos de referencia

ITEM	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	JULIÁN ANDRÉS SERRANO GÓMEZ	(C.C. 13.870.690)	DIRECTOR DE OBRA & REPRESENTANTE LEGAL
2	DIEGO ANTONIO LÓPEZ SANTAMARIA	(C.C. 13.862.051)	RESIDENTE DE OBRA
3	WILLIAM EDUARDO CORTES PEÑA	(C.C. 91.2 78.912)	ASESOR EN GEOTECNIA
4.	LISSETTE XIMENA NIÑO CARVAJAL	(C.C. 63.395.720)	ASESOR AMBIENTAL
5.	VICTOR JULIO GAMBOA CARDOZO	(C.C. 91.265.828)	PROFESIONAL HIDRAULICO
6.	JOSÉ ORLANDO ALBA JAIMES	(C.C. 91.499.520)	PROFESIONAL SISO
7.	ANDRES LEONARDO LASSO AGUIRRE	(C.C. 80.187.378)	IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

Tabla No. 6 Personal utilizado en la ejecución del contrato

ITEM	NOMBRES	CÉDULA	CARGO
1	MAYRA ALEJANDRA QUINTERO DELGADO	(C.C. 1.095.831.315)	RESIDENTE AUXILIAR DE OBRA
2	SANTIAGO SERRANO TRUJILLO	(C.C. 1.098.822.060)	RESIDENTE AUXILIAR DE OBRA
3	JUAN DE DIOS GARCIA SANABRIA	(C.C. 91.079.903)	MAESTRO DE OBRA
4	FREDDY FUENTES GYL	(C.C. 91.272.408)	ALMACENISTA
5	VICTOR MANUEL TRUJILLO ARIAS	(C.C. 91.250.524)	AYUDANTE DE OBRA
6	URIEL ALONSO RIVERA BARAJAS	(C.C. 1.102.383.610)	OPERADOR DE MAQUINARIA
7	IVAN RENE ROMAN	(C.C.1.098.745.891)	AYUDANTE DE OBRA
8	FREDDY ALEXANDER GALVIS	(C.C.1.095.909.154)	OPERADOR DE MAQUINARIA
9	MAURICIO ANDRES BECERRA ORTIZ	(C.C. 1.063.562.221)	OPERADOR DE MAQUINARIA
10	JESUS ALBERTO MEDRANO LANZ	(C.C. 1.037.479.814)	OPERADOR DE MAQUINARIA

11	EDGAR IVAN PALOMINO HOLGUIN	(C.C.1.098.636.620)	TOPOGRAFO
12	LUIS ALBERTO CANO PABA	(C.C.1.082.475.667)	OPERADOR DE PERFORACIÓN

Tabla No. 7 Personal Aliado utilizado en la ejecución del contrato (LERMA CONSTRUCCIONES S.A.S)

ITEM	NOMBRES	CÉDULA	CARGO
1	URIEL QUINTERO	(C.C.12.502.397)	MAESTRO DE OBRA
2	LUIS ADRIAN REY PEREIRA	(C.C. 91.298.926)	AYUDANTE DE OBRA
3	JHON FREDDY VALENCIA	(C.C. 1.005.149.383)	OFICIAL
4	DEIBYS GONZALO ECHEVERRIA	(C.C. 5.073.350)	OFICIAL
5	CARLOS HUMBERTO MEJÍA	(C.C. 91.181.080)	OFICIAL
6	ALVARO ANAYA	(C.C. 13.741.744)	AYUDANTE DE OBRA
7	GIOVANY RINCON JAIMES	(C.C. 1.095.828.352)	OFICIAL
8	LUIS GUILLERMO MELGAREJO	(C.C. 15.451.774)	AYUDANTE DE OBRA

Tabla No. 8 Personal Aliado utilizado en la ejecución del contrato (PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCCIONES S.A.S)

ITEM	NOMBRES	CÉDULA	CARGO
1	LUIS FERNANDO JIMÉNEZ	(C.C.91.103.462)	MAESTRO DE OBRA
2	DUVAN YESID CÁRDENAS MANTILLA	(C.C. 1.100.896.238)	OFICIAL
3	JOHN JAIRO CÁRDENAS MANTILLA	(C.C. 1.095.936.735)	OFICIAL
4	JOAM CAMILO CÁRDENAS VIVAS	(C.C.1.100.888.009)	OFICIAL
5	DIEGO ALEJANDRO GALVIS DURAN	(C.C. 1.098.506.084)	AYUDANTE DE OBRA
6	JULIO ERASMO TREJOS PINOS	(C.C.1.087.986.614)	AYUDANTE DE OBRA

7	GERALDINE PATIÑO RAMÍREZ	(C.C. 1.098.739.437)	SST
8	CRISTIAN FABIAN MALDONADO	(C.C.1.005.448.149)	AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN
9	ENDERBI ALEXANDER SALAZAR	(C.C.5.688268)	AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN
10	ANTONIO GOZALES OCHOA	(C.C.1.095.797.433)	AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN
11	LUIS ALEJANDRO LEAL SANABRIA	(C.C.91.352.138)	AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN
12	JORGE ALIRIO PEÑA SANCHEZ	(C.C.1.098.771.884)	AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN
13	DUBAN ANDRES JAIMES GONZALEZ	(C.C.1.095.791.890)	AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN
14	LUIS ALBERTO LUNA RUEDA	(C.C.1.005.344.971)	AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN
15	RAUL GABRIEL MELO OLAYA	(C.C. 1.006.572.279)	AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN
16	HUVER DAVID RIVERA VILLALOBOS	(C.C.1.048.271.660)	AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN
17	YEISON FERLEY VARON PARRA	(C.C.1.106.486.177)	AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN
18	YERSON DUVAN ALFONZO ROMERO	(C.C.1.124.244.418)	AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN
19	EDWIN SARATE HERNANDEZ	(C.C.1.003.568.429)	AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN
20	HECTOR MANUEL RAQUEJO JIMENEZ	(C.C.1.003.568.429)	AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN

Tabla No. 9 Relación de equipo utilizado en el desarrollo del presente contrato en el periodo de este informe.

EQUIPO		
ITEM	MAQUINARIA / EQUIPO	REGISTRO FOTOGRÁFICO
1	RETROEXCAVADORA DOOSAN DX225LCV	
2	RETROEXCAVADORA DOOSAN DX225LCV	
3	RETROEXCAVADORA DOOSAN DX225LCA	

4	MINI CARGADOR BOBCAT 25	
5	MOTOBOMBAS	 
6	VOLQUETA	
7	VOLQUETA	

8	PAJARITA		
9	MIXER Y BOMBA DE CONCRETO		
10	UNIDAD DE INYECCIÓN		
11	UNIDAD DE PERFORACIÓN		

12	COMPRESOR	

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

ACTIVIDADES DE TIPO TÉCNICO

En el marco del Contrato No. 210-15410-6, el presente Informe Técnico Mensual No. 13 tiene como objetivo documentar y evidenciar, tanto de manera técnica como visual, el conjunto de actividades desarrolladas durante el período correspondiente, orientadas a la mitigación del riesgo de inundación, la rehabilitación y recuperación de la margen derecha del río de Oro, específicamente en el sector de Centro abastos, municipio de Bucaramanga, Santander.

Este informe presenta el avance físico de las actividades contractuales ejecutadas en los tres frentes de obra actualmente activos, detallando los siguientes ítems de intervención:

- Suministro y vaciado de concreto de 3.000 psi para el recubrimiento de estructuras en gaviones.
- Suministro de lechada cementicia para llenado e inyección de anclajes
- Suministro y colocación de anclajes de 3 cables ø=1/2" de L=20m.
- Ejecución de perforaciones horizontales para anclajes de 0,00 a 20m con su respectivo encamisado.
- Jacket de respaldo para revestimiento de la perforación horizontal en anclajes.
- Estructura de disipación de energía
- Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" para los lloraderos en los muros gaviones

La información contenida en este documento permite realizar un seguimiento técnico detallado del avance del contrato, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por la entidad contratante y de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto.

6.1. SECCIÓN TERCERA

6.1.1. Suministro y colocación de concreto de 3000 psi

Una vez concluida la construcción de los gaviones, se procedió con el suministro y colocación de concreto de 3.000 psi para el recubrimiento de su cara expuesta al río. Este recubrimiento, con un espesor de 10 cm de acuerdo con lo establecido en el diseño, tiene como finalidad principal proteger la estructura de gaviones, en especial la malla de triple torsión, frente a la acción de la intemperie y del flujo hidráulico, además de proporcionar un acabado con mejores condiciones estéticas.

Durante la ejecución de la actividad se realizaron los ensayos técnicos de control de calidad pertinentes, con el propósito de verificar el cumplimiento de los parámetros establecidos en los diseños de mezcla. Entre estos ensayos se incluyeron pruebas de resistencia a la compresión, consistencia y trabajabilidad del concreto, asegurando así la conformidad con las especificaciones técnicas del proyecto. **Ver anexo No.09 Ensayos de laboratorio**.

DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDADES CONTRACTUALES	CANT. EJECUTADA EN EL PRESENTE INFORME 13	CANTIDADES ACUMULADAS	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN TERCERA					
Suministro y colocación de concreto de 3000 psi	m3	925,10	41,50	402,35	43,49%



Suministro de concreto de 3.000 psi para recubrimiento de los gaviones





Suministro de concreto de 3.000 psi para recubrimiento de los gaviones

6.1.2. Llenado e inyección con lechada cementicia para anclajes.

Una vez instalada la cabeza activa del anclaje en su posición final, se procedió con el llenado e inyección de lechada cementicia, actividad destinada a garantizar la adecuada adherencia del anclaje al terreno, optimizando su comportamiento estructural y capacidad de carga. Para este procedimiento se empleó una unidad de inyección especializada, la cual permitió aplicar una presión controlada durante el proceso de llenado, asegurando la penetración de la lechada en todas las oquedades del terreno, con lo que se incrementa la adherencia y, en consecuencia, la estabilidad del sistema de anclaje. La lechada utilizada fue preparada conforme a las dosificaciones establecidas en el diseño de mezcla aprobado, garantizando la relación agua-cemento y la consistencia requerida para lograr una inyección eficiente. Durante la ejecución se implementó un control técnico riguroso, en el cual se registraron en el formato correspondiente los parámetros clave del proceso, tales como: fecha de ejecución, presión de inyección, volumen de lechada inyectado y proporciones de mezcla utilizadas, asegurando la trazabilidad y el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto.

Cabe resaltar que todo el procedimiento fue ejecutado bajo la supervisión de la interventoría, quien validó previamente las condiciones técnicas del proceso y realizó las observaciones pertinentes, con el fin de garantizar la conformidad con los requisitos del proyecto y las especificaciones contractuales.

DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDADES CONTRACTUALES	CANT. EJECUTADA EN EL PRESENTE INFORME 13	CANTIDADES ACUMULADAS	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN TERCERA					
Llenado de inyección con lechada cementicia para anclajes	m3	47,50	5,00	31,50	66,32%



Llenado e inyección de anclajes





Llenado e inyección de anclajes

6.2. SECCIÓN CUARTA

6.2.1. Suministro y colocación de anclajes de 3 cables ø=1/2" de L=20m

Durante el periodo del presente informe, se continuó con actividades de suministro e instalación de anclajes activos 3 cables D=1/2" ubicados en la última sección de gaviones. Una vez la perforación es terminada se procede a la instalación del anclaje activo con una longitud de 20m. La verificación de la ubicación y alineación de cada punto de anclaje se realizó mediante control topográfico, con el fin de asegurar el adecuado punto de anclaje en la inclinación respectiva de 15° aproximadamente, garantizando la continuidad y funcionalidad del conjunto estabilizador.

DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDADES CONTRACTUALES	CANT. EJECUTADA EN EL PRESENTE INFORME 13	CANTIDADES ACUMULADAS	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN CUARTA					
Suministro e instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=20m	und	95,00	10,00	63,00	66,32%



Suministro e instalación de anclajes.





Suministro e instalación de anclajes.

6.3. SECCIÓN QUINTA

6.5.1 Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0.00m a 15.00m

Una vez determinada la ubicación y alineación de cada punto de anclaje, conforme a lo establecido en los planos y en las especificaciones técnicas, se procedió con la perforación horizontal destinada a la instalación de los anclajes, ejecutada con una inclinación aproximada de 15°. Las perforaciones se realizaron mediante el uso de equipo rotopercutor, incorporando la respectiva tubería de revestimiento. De acuerdo con el alcance definido en este ítem, las perforaciones presentaron profundidades comprendidas entre 0 y 15 m. Durante el desarrollo de la actividad se implementó un control técnico individual de cada perforación de anclaje, registrando información clave como: número de anclaje, fecha de perforación, ubicación del elemento, tipo de perforación, fecha de instalación del anclaje y composición del mismo. **Ver Anexo No.10. Control de perforación**

DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDADES CONTRACTUALES	CANT. EJECUTADA EN EL PRESENTE INFORME 13	CANTIDADES ACUMULADAS	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN QUINTA					
Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m	m	1425,00	150,00	945,00	66,32%



Ejecución de perforación horizontal para anclajes de 0,00m a 15,00 m





Ejecución de perforación horizontal para anclajes de 0,00m a 15,00 m

6.5.2 Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15.00m

Una vez determinada la ubicación y alineación de cada punto de anclaje, conforme a lo establecido en los planos y en las especificaciones técnicas, se procedió con la perforación horizontal destinada a la instalación de los anclajes, ejecutada con una inclinación aproximada de 15°. Las perforaciones se realizaron mediante el uso de equipo rotopercutor, incorporando la respectiva tubería de revestimiento. De acuerdo con el alcance definido en este ítem, las perforaciones presentaron profundidades comprendidas entre 15 y 20m. Durante el desarrollo de la actividad se implementó un control técnico individual de cada perforación de anclaje, registrando información clave como: número de anclaje, fecha de perforación, ubicación del elemento, tipo de perforación, fecha de instalación del anclaje y composición del mismo. **Ver Anexo No.10. Control de perforación**

DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDADES CONTRACTUALES	CANT. EJECUTADA EN EL PRESENTE INFORME 13	CANTIDADES ACUMULADAS	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN QUINTA					
Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00m	m	475,00	50,00	315,00	66,32%




Ejecución de perforación horizontal para anclajes mayores a 15,00 m

6.5.3 Jacket de respaldo para revestimiento de perforación horizontal en anclajes y drenes de penetración


Durante la ejecución de las actividades de perforación se empleó el jacket de respaldo como sistema de revestimiento para las perforaciones horizontales, debido a la presencia de aguas subterráneas características de la zona de intervención. Esta condición generaba afloramientos y desmoronamientos internos en las perforaciones, asociados al bajo ángulo de fricción del terreno, lo que hacía indispensable la implementación del revestimiento para garantizar la estabilidad del taladro y la correcta instalación de los anclajes.

DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDADES CONTRACTUALES	CANT. EJECUTADA EN EL PRESENTE INFORME 13	CANTIDADES ACUMULADAS	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN QUINTA					
Jacket de respaldo para revestimiento de perforación horizontal en anclajes y drenes de penetración	m	1900,00	200,00	1260,00	66,32%

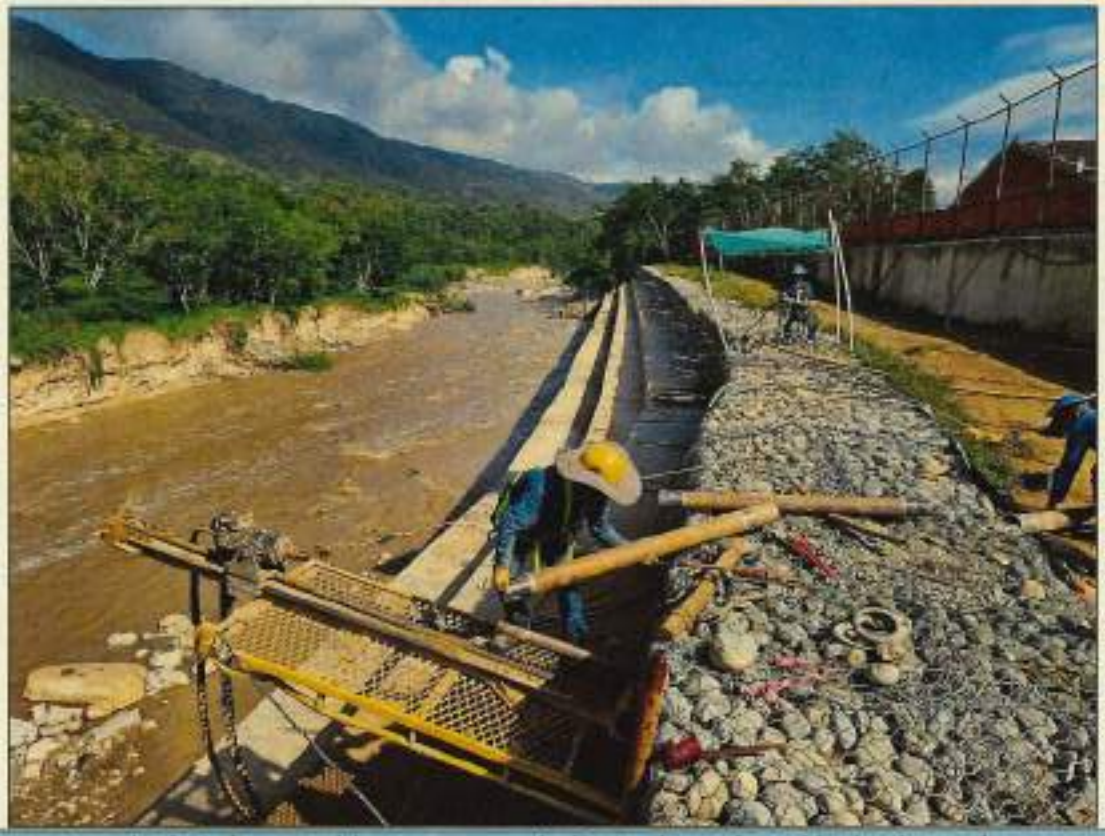

Jacket de respaldo para revestimiento de perforación horizontal



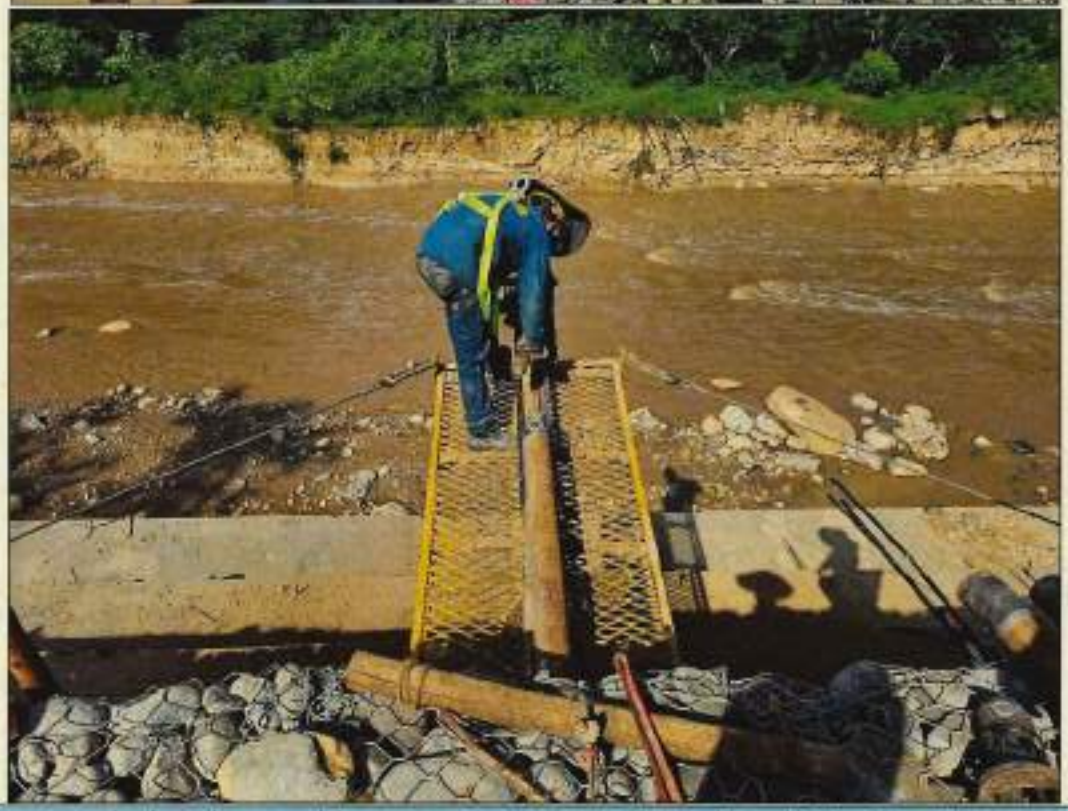

Jacket de respaldo para revestimiento de perforación horizontal

6.4. SECCIÓN SEXTA

6.4.1. Estructura de disipación de energía

Se avanzó en la construcción de las estructuras de disipación de energía, cuya función principal es asegurar la conducción y descarga controlada de las aguas lluvias y de escorrentía superficial provenientes de la zona industrial adyacente. Estas estructuras fueron diseñadas con el propósito de evitar que dichos caudales, con posible carga contaminante, impacten de manera directa sobre el sistema de contención existente conformado por gaviones en la margen derecha del río de Oro, previniendo así su deterioro acelerado por descargas no controladas. La nueva obra de disipación permite redirigir de forma eficiente los flujos hacia el cauce del río, reduciendo su velocidad y energía en el punto de descarga, lo que contribuye a mitigar procesos erosivos, prevenir infiltraciones no deseadas y evitar afectaciones estructurales en los elementos de estabilización. Con esta intervención se busca preservar la integridad de las obras de gaviones previamente ejecutadas, prolongar su vida útil.

DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDADES CONTRACTUALES	CANT. EJECUTADA EN EL PRESENTE INFORME 13	CANTIDADES ACUMULADAS	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN SEXTA					
Estructura de disipación de energía	m	220,00	20,00	86,50	39,32%



Estructura de disipación de energía





Estructura de disipación de energía

6.4.2. Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" pasamuros o lloraderos

En el periodo que comprende el presente informe se continuaron las actividades de suministro e instalación de tubería en PVC, destinadas a la construcción de drenajes tipo "lloradero", los cuales permiten la evacuación de aguas infiltradas al interior de la estructura de gaviones. La distribución de los drenajes se ejecutó de manera homogénea, conforme a la disposición establecida en los planos derivados de los estudios y diseños del proyecto, contando con el apoyo del equipo de topografía para asegurar la correcta ubicación y pendiente de las tuberías.

DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDADES CONTRACTUALES	CANT. EJECUTADA EN EL PRESENTE INFORME 13	CANTIDADES ACUMULADAS	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN SEXTA					
Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" - pasamuros o lloraderos	m	346,40	20,00	144,40	41,69%



Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" pasamuros o lloraderos



Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" pasamuros o lloraderos

6.5. CANITIDADES TOTALES

ITEM	CONCEPTO	UND	CANTIDAD APROBADA	INFORME 1 (01 de septiembre al 30 de octubre)	INFORME 2 (31 de octubre al 01 de noviembre)	INFORME 3 (01 de noviembre al 30 de diciembre)	INFORME 4 (30 de diciembre al 31 de diciembre)	INFORME 5 (31 de enero del 2025	INFORME 6 (01 de febrero al 28 de febrero)	INFORME 7 (01 de marzo al 31 de marzo)	INFORME 8 (01 de abril al 30 de abril)	INFORME 9 (01 de mayo al 31 de mayo)	INFORME 10 (01 de junio al 30 de junio)	INFORME 11 (01 de julio al 31 de julio)	INFORME 12 (01 de agosto al 31 de agosto)	INFORME 13 (01 de septiembre al 31 de septiembre)	CANTIDADES ACUMULADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)
1	SECCIÓN PRIMERA																	
1.00	Replanteo, control y vigilancia de la obra	mes	13.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	13.00	100.00%
	Vallas y señales preventivas																0.00	
1.03.01.A	Valla tipo 1A (3.00m x 2.80 m)	Und	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%
1.04	Elementos y/o equipos	mes	4840.00	968.00	968.00	968.00	0.00	0.00	968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4840.00	100.00%
1.05	Retiro de basuras y escombros	m3	3840.00	288.00	512.00	1791.20	0.00	0.00	998.80	0.00	16.80	34.00	0.00	0.00	77.00	0.00	3540.80	100.00%
2	SECCIÓN SEGUNDA																	
2.01.A.01	Excavación mecánica bajo agua	m3	7775.00	0.00	0.00	2041.78	1.70.98	874.97	161.69	2108.41	446.00	734.76	111.58	0.00	0.00	0.00	7435.57	95.61%
2.01.A.01	Excavación en roca bajo agua	m3	11608.00	0.00	0.00	2811.87	343.98	671.93	262.61	3638.95	669.00	1987.13	167.38	0.00	0.00	0.00	11460.86	98.73%
2.02	Sobreacarreo para acarreos totales mayores de 1.000.00 m	estima	161661.30	0.00	0.00	49564.71	6447.45	7288.98	3643.70	66745.24	9491.68	15457.28	2374.97	0.00	0.00	0.00	160614.86	99.40%
2.03	Cajuela inicial para conformación de pilotín provisional con mat	mts	1440.00	0.00	1440.00	1440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1440.00	2880.00	0.00	0.00	4440.00	0.00	14400.00	100.00%
3	SECCIÓN TERCERA																	
3012.2	Suministro y colocación de concreto ciclopeo 40% roca de piedra y 60% concreto de 3000 psi con emplazamiento manual de formaletas y nivelación de obra	m3	4760.00	0.00	0.00	163.80	145.60	273.00	139.50	198.09	448.00	0.00	715.00	110.00	0.00	0.00	2207.58	46.77%
3.04	Suministro y colocación de concreto de 3000 psi	m3	925.30	0.00	0.00	0.00	0.00	40.80	16.92	86.85	52.00	12.50	37.20	112.00	30.00	31.20	422.00	45.60%
3.08	Lavado de inyección con lechada cemento/bentonita para anclajes	m3	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50	0.00	0.00	31.50	66.32%
3.09	Retiro y colocación de concreto de 3000 psi para sobre e=10	m3	424.00	0.00	0.00	0.00	367.89	731.12	390.80	203.09	160.00	0.00	360.08	367.80	80.00	0.00	2469.00	57.75%
4	SECCIÓN CUARTA																	
4.01	Suministro y colocación acero de refuerzo fy 4200 kg / cm2	kg	671.30	0.00	0.00	0.00	202.40	630.00	113.80	139.10	310.00	0.00	1317.50	634.87		0.00	3138.70	46.75%
	Suministro y colocación de anclajes																0.00	
4.02.02	Suministro e instalación de 3 cables 8T15 0" de=15mm	Und	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	29.00	10.00	10.00	63.00	67.74%
4.03	Tensionamiento de anclajes	Und	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4.05	Suministro e instalación de placa de 200 mm x 200 mm x 12 mm con hue	Und	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4.06	Suministro e instalación de porta de 3 agujeros conicos para cuña de	Und	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4.07	Suministro e instalación de tri de cuñas de 15 1/2" para anclaje	Und	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5	SECCIÓN QUINTA																	
5.02	Ejecución perforación horizontal diámetro con persistencia mayores a 1:1 con equipo de perforación direccionado para anclajes de 0.00m a 15.00m	m	1455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	340.00	150.00	100.00	945.00	65.32%
5.03	Ejecución de pre-tensiones horizontales en taludes con pendiente mayores a 1:1 con equipo de perforación direccionado para anclajes mayores a 15.00m.	m	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	115.00	30.00	30.00	305.00	66.32%
5.08	Aditivo de rapidez para revestimiento de perforación horizontal en anclajes y clavos de consolidación	m	1955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	440.00	200.00	100.00	1260.00	64.50%
6	SECCIÓN SEXTA																	
6.04	Estructura de disipación de energía	m	226.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.70	0.00	29.90	30.00	90.60	39.32%
6.07.01	Gaviones con malla electrosoldada, de cuerpo 0.80 X 1.00 x 1.0	m3	1883.00	0.00	0.00	0.00	1493.09	3234.91	1260.00	1223.00	1480.00	620.00	480.08	489.90	106.00	0.00	10679.00	83.08%
6.07.03	Estructura estabilizante en muro flexible de gaviones con anclaje activo y recubrimiento en concreto reforzado (e=10cm) de sección 2m x 1m x 1m, incluye apoyo de concreto reforzada del anclaje, incluido perforación, el anclaje	Und	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6.11	Gaviton tipo colchoneta de concreto ciclopeo en 0.30m, no incluye cargue	m3	1788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	380.00	0.00	0.00	770.00	0.00	1190.00	100.00%
6.12	Retiro e instalación de tubería sanitaria de 2" - piezometros o lloraderos	m	346.40	0.00	0.00	0.00		120.00	0.00	36.00	0.00	34.00	30.80	28.20	15.40	30.00	144.40	41.69%
7	SECCIÓN SÉPTIMA																	
7.01	Cerramiento Tipo H=2.50 No Tejido Calmalla	m2	3440.00	0.00	0.00	0.00	440.00	220.00	0.00	440.09	570.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	1830.00	74.65%
7.02	Relleno estructural	m3	3600.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1684.50	0.00	1180.1	0.00	0.00	2864.31	79.54%
7.03	Demolición mecánica de estructura existente, incluye disposición	m3	3440.00	0.00	0.00	3440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3440.00	100.00%

6.6. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

6.6.1. Relación de actas de reunión.

Se realizó los siguientes Actas de reunión con los profesionales del contratista e interventoría del contrato y la supervisión (CDMB), para realizar revisiones al avance de obra, verificando el cumplimiento del contrato y las socializaciones en cada uno de los frentes. De igual forma en el presente informe se anexa la hoja de visita por parte de la cdmb en la cual evidencia el recorrido de obra realizado y la revisión de las afectaciones del muro de cerramiento en el frente de obra Galán. **Ver anexo No. 02 Actas de comité**

Tabla No. 8 Actas de reunión

RELACIÓN DE COMITES TÉCNICOS REALIZADOS	
# COMITÉ	FECHA
Hoja de visita CDMB	23/09/2025
Acta de reunión No. 25	05/09/2025
Acta de reunión No. 26	17/09/2025

6.6.2. Bitácora de obra

Por parte del contratista se lleva un registro diario en un único libro de actas autorizado por la Interventoría en la que se describe las actividades realizadas diariamente, el personal directo que se encuentra en la obra, los equipos presentes usados, al igual los cambios de clima durante el día y la noche anterior, las reuniones ejecutadas con la participación de los representantes de interventoria, contratista y el personal de la CDMB, cuando se requería. Este registro es revisado por la interventoría y firmado para su aprobación, así mismo, se registran las firmas del personal profesional presente, con la finalidad de llevar un control detallado diario del proceso constructivo del proyecto.
Ver anexo No. 3. Bitácora de obra

6.6.3. Afiliación seguridad social

En cumplimiento de las obligaciones contractuales y como parte de sus actividades administrativas, el contratista mantiene afiliado a todo el personal vinculado al desarrollo del proyecto al sistema de seguridad social integral. Para tal fin, se recopiló la documentación requerida de cada trabajador, gestionando su inscripción ante las respectivas Entidades Promotoras de Salud (EPS) y asegurando la actualización permanente de la información y los pagos correspondientes. El personal operativo y administrativo vinculado directamente se encuentra afiliado al sistema bajo la razón social **CONSORCIO CAUCE y MAQUINOBRAS S.A.S**. Se exceptúan los asesores técnicos y profesionales especializados,

quienes están afiliados como trabajadores independientes conforme a la normatividad vigente. **Ver anexo No. 4. Seguridad social.**

6.6.4. Seguimiento y control

El contratista ha implementado un control riguroso, así como el análisis y seguimiento sistemático de cada una de las actividades ejecutadas durante el periodo reportado. Así mismo, se ha mantenido una comunicación constante con la comunidad y con la interventoría, representada por el **CONSORCIO CENTROABASTOS**, a través de su residente y director de interventoria, brindando información oportuna y atendiendo las inquietudes planteadas. La gestión de estos requerimientos se ha realizado mediante correos electrónicos y reuniones presenciales en las instalaciones tanto del contratista como de la interventoría.

Adicionalmente, se han llevado a cabo reuniones de seguimiento en campo con personal de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), con el objetivo de verificar el avance físico de la obra, evaluar los porcentajes de ejecución y registrar las observaciones pertinentes. Toda la información generada ha sido debidamente consignada en las actas de reunión y en la bitácora oficial del proyecto.

6.7. ACTIVIDADES FINANCIERAS

6.7.1. Variaciones financieras

- Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de septiembre de 2025, no se realizaron variaciones financieras.

BALANCE FINANCIERO CONTRATO 210-15410-6					
DETALLE	**PERIODO**	**CONTRATADO**	**PAGOS REALIZADOS**	**PORCENTAJE %**	**VALOR AMORTIZADO**
Contrato inicial	01 de agosto del 2024	$16.738.177.417,42		100%	
Anticipo pagado	10 de octubre del 2024		$6.695.270.967,00	40%	
Adicional en valor	12 de noviembre del 2024	$ 8.100.000.000,00		-	
Acta parcial de cobro No.01	Del 06 de septiembre al 05 de diciembre del 2024		$ 2.312.647.683,52	9,31%	$623.387.241,03
Acta parcial de cobro No.02	Del 06 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025		$ 3.450.525.825,85	23,20%	$ 930.108.719,11
Acta parcial de cobro No.03	Del 01 de febrero al 30 de abril del 2025		$ 5.169.347.832,72	44,01%	$1.393.426.896,06
Acta parcial de cobro No.04	Del 01 de mayo al 31 de julio del 2025		$ 4.295.571.866,47	61,31%	$1.157.895.650,75

6.7.2. Relación de pagos efectuados

- Durante el periodo comprendido entre el 01 de septiembre hasta el 30 de septiembre de 2025 no se efectuaron pagos al consorcio cauce

6.8. ACTIVIDADES DE CALIDAD

En el anexo se adjuntarán según la ejecución de la obra los certificados de aseguramiento de la calidad para los materiales utilizados y/o actividades desarrolladas durante el avance de la obra según el plan de calidad entregado a Interventoría. **Ver anexo No.05 Informe de Calidad**

6.9. ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

6.9.1. Actividades componente ambiental y social

Respecto a las actividades ambientales desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 01 de septiembre hasta el 30 de septiembre de 2025, los principales aspectos relacionados con el manejo y protección ambiental que se deben considerar para la ejecución del proyecto, son los siguientes programas:

- PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS
- PROGRAMA CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS
- PROGRAMA USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
- PROGRAMA PROTECCIÓN DEL SUELO – PREVENCIÓN DE PROCESOS EROSIVOS Y CONTROL SOBRE LA ESCORRENTÍA.
- PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS
- PROGRAMA PARA EL MANEJO DE LA VEGETACION LA FAUNA Y EL PAISAJE.
- PROGRAMA DE SEÑALIZACION
- PROGRAMA DE ADECUACION DE CAMPAMENTOS

Ver anexo No. 6 Informe Ambiental.

6.9.2. Actividades componente seguridad y salud en el trabajo (SST)

El contratista durante el presente periodo realizó la entrega de elementos de protección personal para la realización de actividades a desarrollar en obra, brindando elementos específicos, entre estos, se encuentran: guantes, gafas, camisa, pantalón, botas de caucho, tapa oídos, cascos, etc. Siguiendo las políticas de prevención de accidentes laborales y el programa interno de cero accidentes laborales.

El contratista cuenta con personal capacitado que brinda regularmente charlas de seguridad laboral, pausas activas y demás. Esto con el fin de mantener un ambiente seguro de trabajo y empleados competentes ante cualquier imprevisto.

Algunas otras actividades realizadas por el contratista fueron:

- Capacitación del personal
- Vinculación al sistema de seguridad social del personal que ingresa, bajo CONSORCIO CAUCE.
- Atención oportuna a los requerimientos y comunicaciones de la Interventoría con respecto a las medidas a tener en cuenta con el personal en alturas.
- Exigencia en el uso de los equipos y elementos de protección personal adecuados.
- Charlas, capacitaciones, inducciones y entrenamiento en obra.
- Inspección de herramientas y elementos de trabajo.
- Implementación de permisos de trabajo en alturas.


Ver anexo No.7. Informe mensual de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

7. INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO

Durante las primeras semanas del mes de septiembre se registró un deterioro significativo en las condiciones climáticas en comparación con el mes anterior. Aunque hacia finales del mes se evidenció una mejora, con aproximadamente un 60% de días soleados, las precipitaciones recurrentes presentadas al inicio del periodo generaron afectaciones en el desarrollo y la programación de las actividades del proyecto, principalmente por el incremento del nivel del río, lo que generó daños en las estructuras de protección hidráulica, las cuales también cumplen la función de vías de acceso para el tránsito de personal, maquinaria y equipos. Estas condiciones ocasionaron inundaciones y contaminación en las áreas de trabajo, haciendo necesario ejecutar labores adicionales de reconformación, reparación, limpieza y restablecimiento de frentes, con el fin de retomar la ejecución de las actividades contractuales. Dichas contingencias representaron retrasos operativos asociados a retrabajos en actividades no previstas contractualmente, así como pérdida de horas-hombre y horas-máquina en dichas labores. **Ver anexo No.8. Estado general del tiempo.**

Se llevó a cabo la consolidación de la información correspondiente a las horas no laboradas durante el mes, producto de las condiciones meteorológicas adversas, en particular las precipitaciones registradas en el periodo de análisis. Como resultado de este seguimiento, se contabilizó un total de 46 horas no laboradas, lo que equivale aproximadamente al 19,17% del tiempo total programado para la ejecución de actividades en obra. A continuación, se presenta el detalle de dicha afectación: para labores en obra. A continuación, se presenta el detalle de esta afectación:

RESUMEN	
SECO	57,08%
NUBOSIDAD	23,75%
LLUVIA MODERADA	9,58%
LLUVIA INTENSA	3,33%
AUMENTO NIVEL RÍO	6,25%

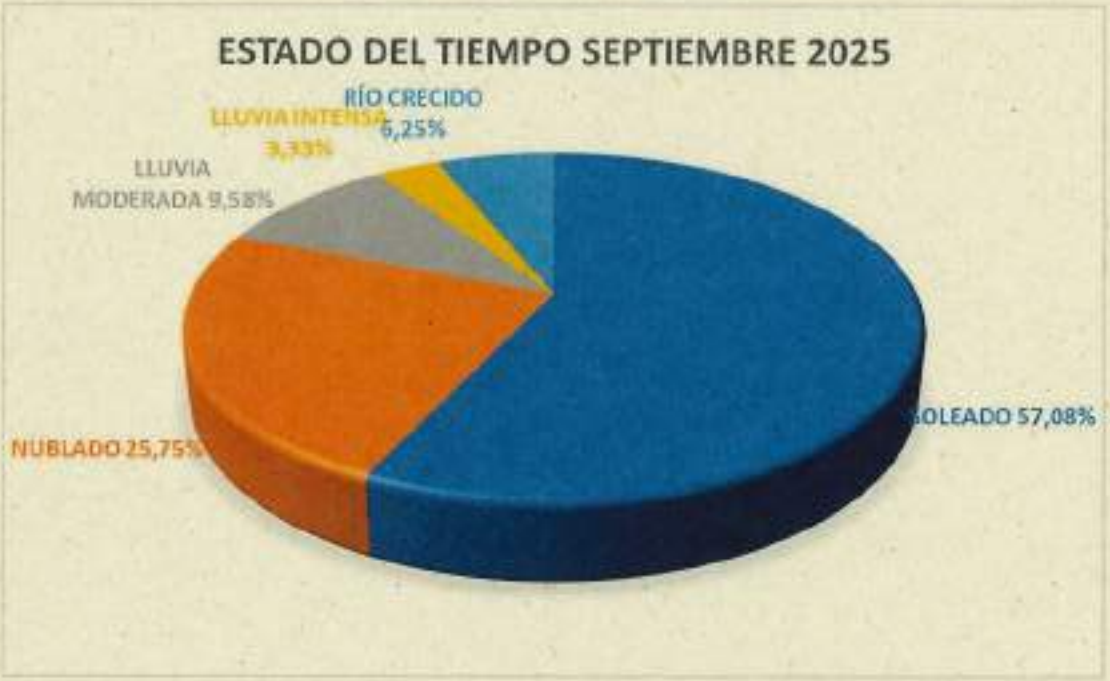



8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Durante el mes de septiembre, y en el marco del plan de contingencia establecido frente a las altas precipitaciones que se han presentado de manera recurrente durante la ejecución del proyecto, se continuaron desarrollando actividades de forma simultánea en los tres frentes de obra activos. Todas estas labores fueron ejecutadas bajo la supervisión directa y permanente de la interventoría, quien verificó el cumplimiento de los controles técnicos establecidos y la realización de los ensayos de laboratorio correspondientes, garantizando la calidad, seguridad y conformidad de los procesos constructivos con los lineamientos del proyecto.

- Durante las primeras semanas del mes se presentaron eventos de precipitación de alta intensidad que, a pesar de la implementación del plan de mitigación establecido, superaron la capacidad de respuesta prevista, generando afectaciones significativas en las áreas de trabajo. Como consecuencia, una parte considerable de las actividades ejecutadas debió enfocarse en labores de retrabajo, orientadas a la restauración de las estructuras en construcción y a la reparación de las obras de protección hidráulica temporales, las cuales además funcionan como vías de acceso para el tránsito de personal, maquinaria y materiales. Debido a lo anterior, el avance físico acumulado alcanzado fue del 66,42%, evidenciando un desfase respecto al cronograma proyectado. En atención a esta situación, se plantea la implementación de una nueva estrategia técnica y operativa que permita mitigar de manera más efectiva los impactos de las precipitaciones sobre la obra y asegurar el cumplimiento de las metas contractuales dentro de los plazos establecidos.

- Se mantuvo la ejecución sistemática de ensayos de resistencia a la compresión para concretos de 2.000 y 3.000 psi, en cumplimiento de la normativa técnica vigente y de las especificaciones del proyecto. De igual forma, en las actividades de conformación de relleno con material seleccionado se aplicó un estricto control de calidad, mediante la realización de ensayos de laboratorio orientados a verificar la densidad y el peso unitario del suelo, empleando para ello el método del cono de arena (Norma INV-E 161-13). Todos los resultados obtenidos han sido incorporados al presente informe y cuentan con la validación y conformidad de la interventoría, garantizando así la trazabilidad y confiabilidad de los procesos constructivos ejecutados.

JULIAN ANDRÉS SERRANO GÓMEZ
Director de Obra

LISTA DE ANEXOS DEL INFORME

- ANEXO No. 1: ACTAS DE REUNIÓN.
- ANEXO No. 2: BITÁCORA DE OBRA.
- ANEXO No. 3: SEGURIDAD SOCIAL.
- ANEXO No. 4: INFORME DE CALIDAD.
- ANEXO No. 5: INFORME AMBIENTAL.
- ANEXO No. 6: INFORME SST.
- ANEXO No. 7: ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.
- ANEXO No.8: ENSAYOS DE LABORATORIO
- ANEXO No.9: CONTROL DE PERFORACIÓN

ANEXO No. 1: ACTAS DE REUNIÓN.

CDMB	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A.PI.FO05 / VERSION: 5	ACTA DE REUNIÓN		


TEMA:	RECORRIDO DE OBRA PARA REVISAR EL AVANCE DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO Y AFECTACIONES OCURRIDAS POR FUERTES PRECIPITACIONES EN LOS PRIMEROS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)".
LUGAR:	Frente de Obra - Centro Abastos

ACTA No.	FECHA		
	DD	MM	AA
25	05	09	2025
Hora Inicio	2:00 pm		
Hora final	4:00 pm		

AGENDA		
No.	ORDEN DEL DIA	RESPONSABLE
1	Recorrido avance de actividades en obra para realizar el seguimiento del estado actual en los diferentes frentes	Contratista – Interventoría - CDMB
2	Seguimiento a las afectaciones generadas por las altas precipitaciones	Contratista – Interventoría - CDMB

No.	DESARROLLO ORDEN DEL DÍA
1	Siendo las 2:00 p.m., se da inicio al comité de obra con la presencia del equipo técnico de la interventoría, el personal profesional del contratista y los representantes técnicos de la CDMB, con el propósito de realizar un recorrido técnico de inspección y supervisar el avance de las actividades contractuales ejecutadas en el proyecto. El recorrido de obra inició en el frente de obra Centroabastos, donde se evidenció el avance en recubrimientos de algunos tramos en las abscisas iniciales del proyecto. El contratista informó que, en conjunto con la interventoría, se realiza un control de calidad mediante la toma de muestras de laboratorio, con el fin de verificar que el concreto utilizado en los recubrimientos cumpla con la resistencia especificada de 3000 psi. Asimismo, se observó el desarrollo de las actividades de perforación para anclajes de 20 metros de profundidad con una inclinación de 15 grados. El contratista indicó que, en coordinación con la interventoría, se lleva a cabo un control técnico detallado de cada perforación, registrando los parámetros en campo para garantizar el cumplimiento de los diseños y especificaciones técnicas. Finalmente, se constató que las actividades de conformación de gaviones y la ejecución de recubrimientos en las abscisas iniciales se vieron interrumpidas por el aumento del nivel del río, lo que ocasionó inundación y contaminación en las áreas de trabajo, así como la imposibilidad de reconstruir de manera eficiente la estructura de protección hidráulica (jarillón), la cual también funciona como vía de acceso a los frentes de obra.

	Posteriormente, el recorrido de obra continuó en los frentes Puerta Galán y Galán, donde se evidenció el avance en la construcción de las estructuras de disipación destinadas a la entrega de las aguas provenientes de la Central de Abastos. De igual manera, al igual que en el frente Centroabastos, se observó progreso en la ejecución de los recubrimientos con gaviones en algunos tramos del proyecto. No obstante, se constató la imposibilidad de continuar con la conformación de gaviones y la ejecución de recubrimientos debido a las condiciones del río de Oro previamente mencionadas, las cuales afectan directamente el desarrollo normal de las actividades. Como constancia de la visita, se anexa a la presente acta el registro fotográfico correspondiente.
2	Durante los primeros días del mes de septiembre se han registrado precipitaciones de alta intensidad de manera reiterada en el área metropolitana de Bucaramanga, particularmente en las zonas de influencia del proyecto. Estas condiciones climáticas han provocado un incremento considerable en el caudal y nivel del río de Oro, generando afectaciones directas sobre las áreas de intervención y el desarrollo de las actividades del proyecto. El punto más crítico y vulnerable frente a estos fenómenos corresponde al tramo comprendido entre las abscisas K0+000 y K0+550, donde ha resultado imposible la conformación y estabilización del jarillón provisional, estructura temporal esencial para garantizar el acceso seguro de maquinaria, equipos y personal a este sector de la obra. Las crecientes del río, derivadas de las precipitaciones mencionadas, han destruido de manera reiterada dicha estructura, impidiendo su reconstrucción y el restablecimiento de las condiciones mínimas necesarias para el desarrollo de las labores. Como consecuencia directa, se ha producido la pérdida de los avances previamente ejecutados en este sector, lo que representa un impacto negativo significativo en términos de recursos invertidos, tanto en horas-hombre como en horas-máquina. Esta situación ha generado retrasos en la ejecución de las actividades contractuales programadas y ha comprometido el cumplimiento de la programación inicial. En atención a lo anterior, se deja constancia de esta situación en la presente acta de comité. Se anexan registros fotográficos como evidencia de los daños ocasionados por la temporada invernal en el frente de obra mencionado.

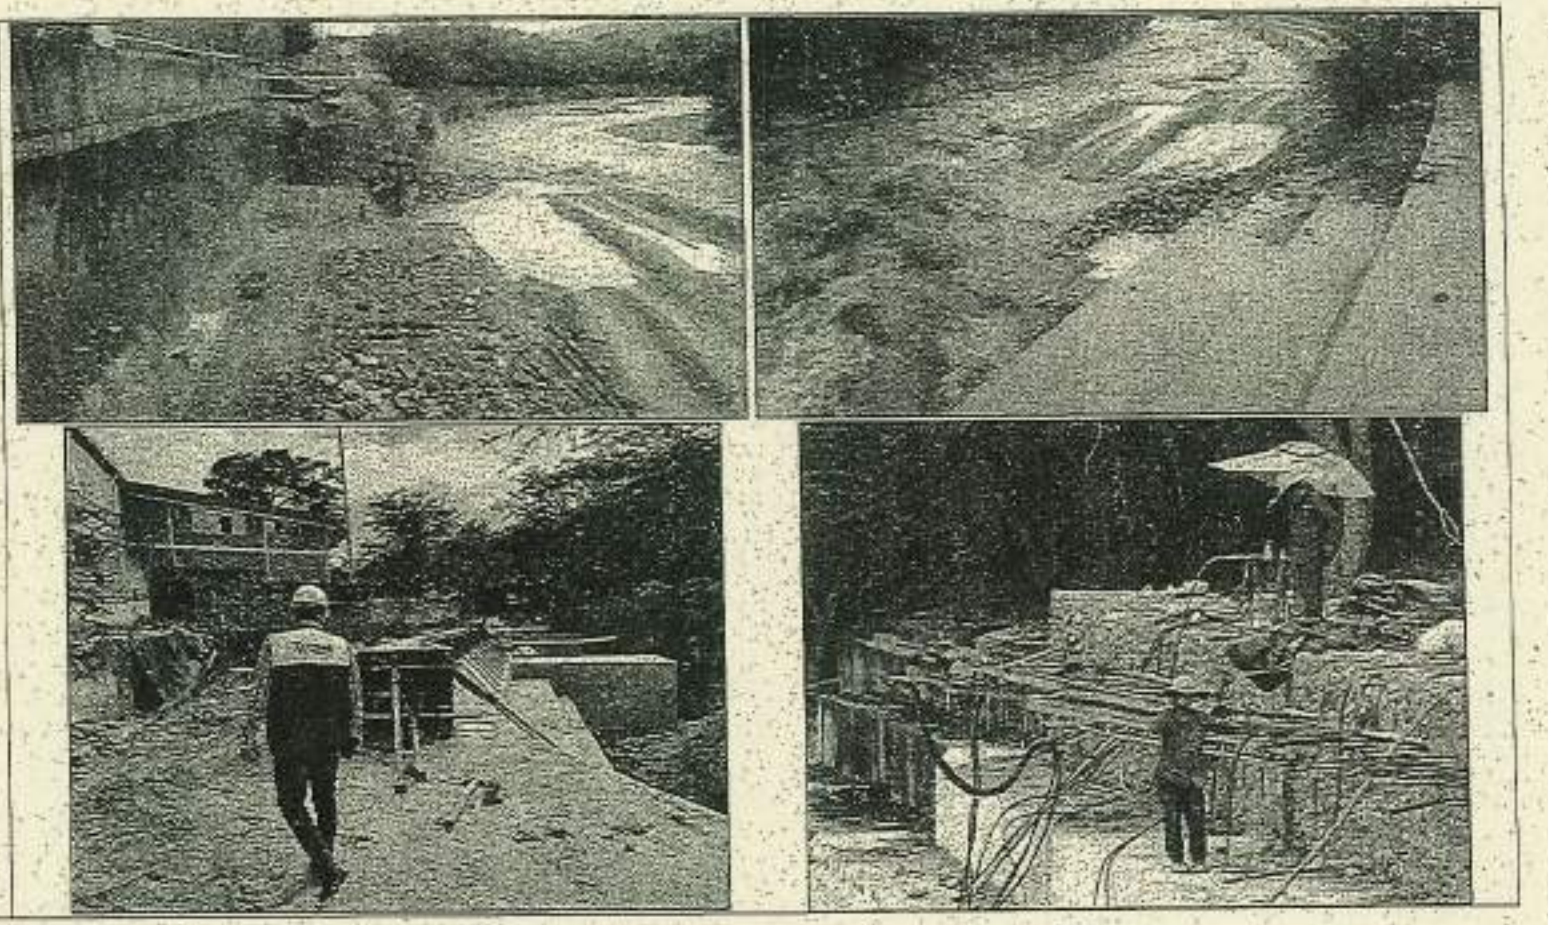

CDMB	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A-PI-F005	VERSION: 5	ACTA DE REUNIÓN	

No.	TAREAS	RESPONSABLE	FECHA
1	La Interventoria y el Contratista acuerdan realizar seguimiento técnico y contractual detallado al proyecto, évaluando los efectos de las lluvias continuas sobre el cronograma de obra y estableciendo estrategias de mitigación para minimizar su impacto sobre el avance físico y el cumplimiento de metas contractuales.	Contratista- Interventoría	15/09/2025

PRÓXIMA REUNIÓN					
FECHA:	15/09/2025	HORA:	8:00	LUGAR:	Frente de Obra: Centro Abastos

Elaboró Acta	Cargo	Firma
Diego Antonio López Santamaria	Residente de Obra	
Revisó Acta	**Cargo**	**Firma**
Ledding Vera	Residente de Interventoría	Ledding Farley Vera

CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A-PI-F-003 / VERSION: 5	ACTA DE REUNIÓN		

		ACTA No.	FECHA		
TEMA:	RECORRIDO DE OBRA PARA REVISAR EL AVANCE DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO Y AFECTACIONES OCURRIDAS POR FUERTES PRECIPITACIONES EN LOS PRIMEROS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)".	25	DD	MM	AA
LUGAR:	Central de Abastos – Bucaramanga, Santander		05	09	25

LISTADO DE ASISTENTES REUNIONES INTERNAS

No.	NOMBRE	GÉNERO M	GÉNERO F	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	Diego Antonio López Santamaría	x		Residente de Contratista	Contratista	
2	Laura Natalia Rodríguez		x	Profesional de apoyo	CDMB	
3	Carlos Daniel Gómez Quintero	x		Profesional de apoyo	CDMB	
4	Ledding Vera	x		Residente de Interventoría	Interventoría	
5	Mayra Alejandra Quintero Delgado		x	Residente Auxiliar del contratista	Contratista	
6	Santiago Serrano Trujillo	x		Residente Auxiliar del contratista	Contratista	
7	Omar Ruiz	x		Residente Auxiliar de Interventoría	Interventoría	
8	Daniela Merchán		x	Ingeniera Ambiental	Interventoría	

9	Diana Contreras		x	Hidráulica	Interventoria	
10	Diana Ortiz		x	Profesional Siso	Interventoria	

	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Procesos Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A-PI-FO05 / VERSION: 5	ACTA DE REUNIÓN		

TEMA:	RECORRIDO DE OBRA PARA EL AVANCE DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO: **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)".**
LUGAR:	Frente de Obra - Centro Abastos

ACTA No.	**FECHA**		
	DD	**MM**	**AA**
26	17	09	2025
Hora Inicio	10:00 am		
Hora final	12:00 m		


AGENDA

No.	ORDEN DEL DIA	RESPONSABLE
1	Recorrido avance de actividades en obra	Contratista – Interventoria

No.	DESARROLLO ORDEN DEL DÍA
1	Siendo las 10:00 a.m. del dia 17 de septiembre de 2025, y con la presencia del equipo técnico de la interventoría y el personal profesional del Consorcio Cauce, se dio inicio al comité de obra, cuyo objetivo fue realizar seguimiento técnico al avance de las actividades contractuales, así como a las labores no contractuales orientadas a la restauración de las estructuras de protección hidráulica y de aquellas que garantizan la movilidad hacia los diferentes frentes de trabajo. De igual forma, se abordaron las acciones de limpieza y recuperación de las zonas de intervención afectadas por las precipitaciones registradas durante los primeros días del mes. El recorrido comenzó en las abscisas iniciales del frente de obra Centroabastos, donde se verificó el avance en la ejecución de los recubrimientos en gaviones. Estas actividades se supervisan mediante ensayos de laboratorio que permiten comprobar que la resistencia del concreto utilizado cumple con los parámetros de diseño, superiores a 3000 psi. Asimismo, se observó la ejecución de las actividades de perforación, suministro, instalación, llenado e inyección de anclajes, las cuales son objeto de un control técnico detallado, registrando en campo los parámetros requeridos para garantizar el cumplimiento de los diseños y especificaciones técnicas. Posteriormente, en los frentes de trabajo Galán y Puerta Galán, se evidenció el desarrollo de las estructuras de disipación necesarias para el manejo de las aguas provenientes de la Central de Abastos, así como la ejecución de recubrimientos, siguiendo el mismo procedimiento técnico implementado en el frente de Centroabastos.

El contratista manifestó que los esfuerzos actuales se concentran en la recuperación de las estructuras de protección y en la rehabilitación de las zonas de trabajo afectadas, con el fin de restablecer las condiciones que permitan el desarrollo normal de las actividades. De manera paralela, se adelantan labores complementarias en sectores fuera del nivel del río, mientras se completan las obras de recuperación en las áreas comprometidas.



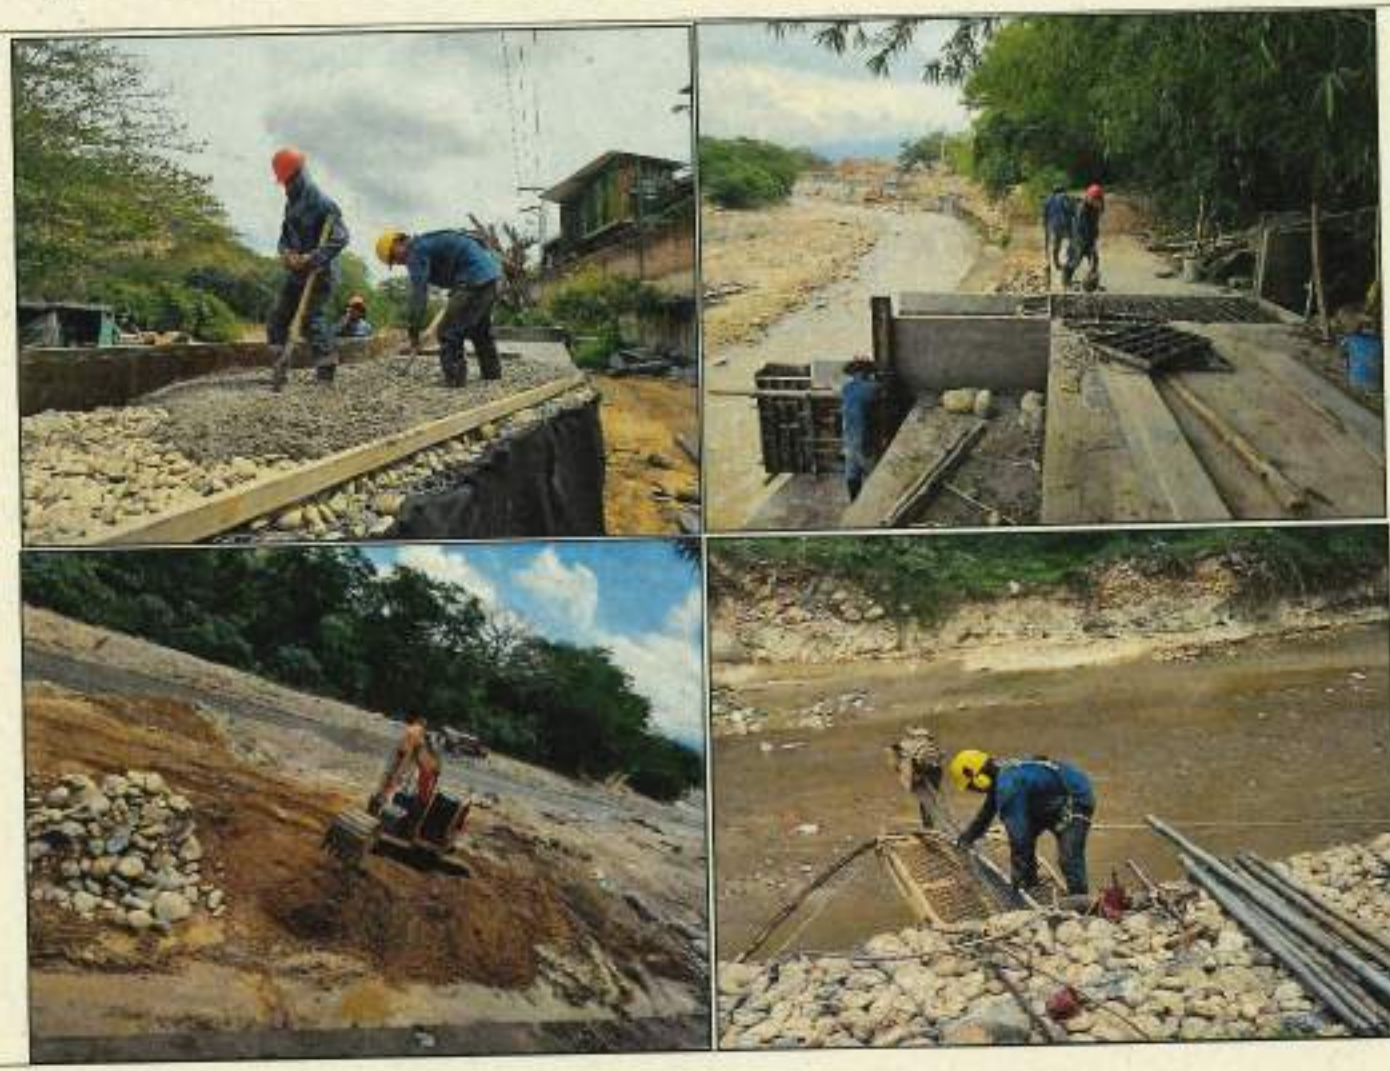

CDMB	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A-PI-F005	VERSION: 5	ACTA DE REUNIÓN	

No.	TAREAS	RESPONSABLE	FECHA
1	La interventoría y el contratista acuerdan realizar un seguimiento técnico y contractual detallado a la ejecución de las actividades del proyecto, con el fin de garantizar el cumplimiento de los diseños, especificaciones y metas programadas. Así mismo, se establece la implementación de estrategias de mitigación y planes de contingencia frente a posibles eventos de precipitación, con el propósito de minimizar afectaciones en el desarrollo de la obra para optimizar el ritmo de ejecución de las actividades contractuales.	Contratista- Interventoría	10/10/2025

PRÓXIMA REUNIÓN					
FECHA:	07/10/2025	**HORA:**	8:00	**LUGAR:**	Frente de Obra: Centro Abastos-

Elaboró Acta	Cargo	Firma
Diego Antonio López Santamaria	Residente de Obra	
Revisó Acta	**Cargo**	**Firma**
Ledding Vera	Residente de Interventoría	Ledding Farley Vera

1

CDMB	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A-PI-F005 / VERSION: 5	ACTA DE REUNIÓN		

TEMA:	RECORRIDO DE OBRA PARA EL AVANCE DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO: **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)".**
LUGAR:	Central de Abastos – Bucaramanga, Santander

ACTA No.	FECHA		
	DD	MM	AA
26	17	09	25

LISTADO DE ASISTENTES REUNIONES INTERNAS

No.	NOMBRE	GÉNERO		CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
		M	F			
1	Diego Antonio López Santamaria	x		Residente de Contratista	Contratista	
2	Ledding Vera	x		Residente de Interventoria	Interventoría	Ledding Farlley Vera
3	Mayra Alejandra Quintero Delgado		x	Residente Auxiliar del contratista	Contratista	
4	Santiago Serrano Trujillo	x		Residente Auxiliar del contratista	Contratista	
5	Omar Ruiz	x		Residente Auxiliar de Interventoría	Interventoría	
6	Daniela Merchán		x	Ingeniera Ambiental	Interventoría	
7	Diana Contreras		x	Hidráulica	Interventoría	
8	Diana Ortiz		x	Profesional Siso	Interventoría	

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB

ELABORÓ:	REVISÓ	APROBÓ:
Coordinador(a) Zona Piedemonte SUGAR	Representante Dirección SOC	Director(a) General

CÓDIGO	VERSIÓN
64-04-F092	01

HOJA DE VISITA

MOTIVO DE LA VISITA: Seguimiento Contrato de obra No. 154-10-6 de 2024

FECHA DE VISITA: DÍA 23 | MES 09 | AÑO 2025

FINCA: | VEREDA: | MUNICIPIO: Bucaramanga | MICROCUENCA:

COTA: 663 | 7° 6' 21.07" | E: 73° 9' 56"

PROPIETARIO: | C.C / NIT: 9018555B9

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: Consorciocauce@gmail.com | TELÉFONO FIJO:

CELULAR:

QUIEN ATIENDE LA VISITA: Consorcio Cauce | CELULAR:

SITUACIÓN ENCONTRADA:

Se constato el desarrollo de las actividades correspondientes al contrato de obra No. 154-10-6 del 01 de agosto de 2024 a cargo del Consorcio Cauce y con interventoría del Consorcio Cauce Contratistas. Se verifico el estado actual de los trabajos y el avance general de la misma, los cuales se desarrollan conforme al objeto contractual

EVIDENCIAS:

Registro fotográfico - coordenadas - Hoja de visita

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se recomienda al contratista continuar con la ejecución de las obras conforme a lo establecido en el contrato y bajo la verificación permanente de la interventoría.

Así mismo, se solicita a la interventoría mantener informada a la entidad sobre el avance, las novedades y los soportes que correspondan al seguimiento técnico y financiero del Proyecto

QUIEN ATIENDE LA VISITA - FIRMA / CÉDULA

NOMBRE Y FIRMA SERVIDOR PÚBLICO CDMB

OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA

OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA

ANEXO No. 2: BITÁCORA DE OBRA.

En el frente de obra Puerta Galan se realizo el suministro y colocación del concreto de 3000 PSI para recubrimientos y en todos los frentes de obra se continuó con la conformación de gaviones.

- Personal: (2) Directores de obra; (2) Residentes de obra; (3) SST Contratista/Interventoría; (2) Ingenieros auxiliares; (3) Maestros; (3) oficiales; (7) almacenistas; (5) operadores; (45) ayudantes de obra.
- Equipo: (3) Retroexcavadoras; (1) Pajarita; (1) Mini cargador; (1) Jala-bobos; (1) volqueta; (4) motobombas.

02 de Septiembre de 2025

- Estado del tiempo: lluvia
- Descripción: se realizó recorrido por obra en conjunto con funcionarios de la CDMB e interventoría. Se presentaron lluvias finalizando la jornada de la tarde. Durante la jornada de la mañana se llevo a cabo la adecuación, arreglo, reconformación y limpieza de las estructuras de protección hidráulica y las zonas de trabajo. Posteriormente, se pudo reanudar la conformación de gaviones en los 3 frentes de obra.
- Personal: (2) Residentes de obra; (3) SST contratista/interventoría. (2) Ingenieros auxiliares; (3) Maestros; (3) Oficiales; (1) almacenista; (5) operadores; (45) ayudantes de obra.
- Equipo: (3) Retroexcavadoras; (1) ~~Pajarita~~; (1) Mini cargador; (1) Jalabobos (1) Volqueta; (4) motobombas.

03 de Septiembre de 2025

- Estado del tiempo: Nublado
- Descripción: En los 3 frentes de obra se continuó con la conformación de gaviones y puntualmente en el frente de obra Puerta Galan se conformo un tramo de la estructura de cimentación dentellon en concreto ciclopeo de 3000 PSI.

• Personal: (2) Residentes de obra; (3) SST Contratista/interventoria. (2) ingenieros auxiliares; (3) ~~maestros~~; (3) Oficiales; (1) almacenistas; (1) topografo; (3) operadores; (44) ayudantes de obra.

04 de Septiembre de 2025

• Estado del tiempo: Soleado

• Descripción: En los 3 frentes de obra se continuó con la conformación de gaviones. Puntualmente en el frente de obra Galos se suministro y colocó el concreto de 3000 PSI para recubrimiento. En Puerto Galan se fundio el Solado en concreto de 2000 PSI.

• Personal: (2) Directores de obra; (2) Residentes de obra; (3) SST contratista/interventoria. (2) ingenieros auxiliares; (3) maestros; (3) oficiales; (1) almacenista; (5) operadores; (39) ayudantes de obra.

• Equipo: (3) Retroexcavadoras; (1) Pajarita; (1) ~~Mini~~cargador; (1) Jalabobos (1) Volqueta; (4) Motobombas.

05 de Septiembre de 2025

• Estado del tiempo: Lluvia

• Descripción: En los 3 frentes de obra se continuó con la conformación de gaviones. Puntualmente en el frente de obra Puerta Galan se realizó la construcción de un tramo de dentellon en concreto ciclopeo de 3000 PSI. Finalizando la jornada de la tarde comenzó a llover. Situación que obligo a terminar labores antes de tiempo

• Personal: (2) Residente de obra; (3) SST contratista/interventoria. (2) ingenieros auxiliares; (3) maestros; (3) Oficiales; (1) almacenista; (5) operadores; (38) ayudantes; (1) Topografo

• Equipo: (3) Retroexcavadoras; (1) Pajarita; (1) Mini Cargador; (1) Jalabobos (1) Volqueta; (4) motobombas; (1) Estación topografica

06 de Septiembre de 2025

- Estado del tiempo: Nublado
- Descripción: No se pudo llevar a cabo la ejecución de ninguna actividad contractual, ya que se centraron todos los esfuerzos en la recuperación, reconformación, limpiez y arreglos de las vías de acceso y zonas de trabajo.
- Personal: (2) Residentes de obra; (3) SST contratista/interventoría (2) ingenieros auxiliares; (3) maestros; (3) oficiales; (1) almacenista (5) operadores; (32) ayudantes de obra
- Equipo: (3) Retroexcavadoras; (1) ~~Pajarita~~; (2) Minicargador; (1) Jalabobos (1) Volqueta; (4) motobombas

08 de Septiembre de 2025

- Estado del tiempo: Nublado
- Descripción: se reanudan las actividades contractuales en los distintos frentes de obra. En contrabastos la perforación, suministro y colocación de anclajes además de su inyección y llenado con lechada cementicra. En puerta Galan se realizó la fundida del recubrimiento en concreto de 3000 psi. y en todo los frentes de obra se da reanudación a la conformación de gaviones.
- Personal: (2) Directores de obra; (3) SST; (4) Residentes de obra; (2) ingenieros ambientales contratista/interventoría. (2) ingenieros auxiliares; (3) Maestros; (3) oficiales; (1) almacenista; (7); Operadores; (41) ayudantes de obra
- Equipo: (3) Retroexcavadoras; (1) Pajarita; (1) minicargador; (1. Jalabobas; (2) equipos de perforación; (2) compresores; (1) unidad de inyección; (1) Volqueta; (4) motobombas

09 de Septiembre de 2025

- Estado del tiempo: Soleado

- Descripción: En todos los frentes de obra se continuó con la conformación de gaviones. Puntualmente en los frentes de obra Galan y Puerta galan se fundieron recubrimientos. y llenado e inyección de anclajes en contratalastos.
- Personal: (2) Residentes de obra, (3) SST contratista/interventoría. (2) Ingenieros auxiliares; (3) Maestros; (3) oficiales; (1) almacenista; (7) operadores; (41) ayudantes de obra.
- Equipo: (3) Retroexcavadoras; (1) Pajarita; (1) Minicargador; (1) Jobobobas; (2) Equipos de perforación; (2) Compresores; (1) unidad de inyección; (1) Volqueta y (4) Motobombas.

10 de Septiembre de 2025

- Estado del tiempo: Lluvia
- Descripción: En la jornada de la mañana se pudieron llevar a cabo actividades de conformación de gaviones, perforación, llenado, inyección y suministro de anclajes, así como la construcción de estructuras de disipación. Sin embargo, estas se veran interrumpidas por las fuertes lluvias en las horas de la tarde.
- Personal: (2) Residentes de obra; (3) SST contratista/interventoría. (2) Ingenieros auxiliares; (3) Maestros; (3) oficiales; (1) almacenista; (44) ayudantes de obra.
- Equipo: (3) Retroexcavadoras; (1) Pajarita; (1) Minicargador; (1) Jobobobas; (2) Equipos de perforación; (2) ~~Compresores~~; (1) unidad de inyección; (1) volqueta; (4) motobombas.

11 de Septiembre de 2025

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: En todos los frentes de obra se continuó con la conformación de gaviones. Puntualmente en los frentes de obra Galan y Puerta Galan se llevo a cabo la actividad de recubrimiento de gaviones en concreto de 3000 PSI

15 de Septiembre de 2025

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: En todos los frentes de obra se continuó con la conformación de gaviones. Puntualmente, en el frente de obra Puerta Galan se fundió el dentellon en concreto ciclopeo de 3000 PSI, en el frente de obra Centroabastos se continuó con la perforacrón, instalación e inyeccion de anclajes
- Personal: (2) Residentes de obra; (3) SST; (2) Ingenieros auxiliares; (3) Maestros; (3) oficiales; (1) almacensia; (2) operadores; (38) ayudantes de obra.
- Equipo: (3) Retroexcavadoras; (1) Pajarita; (1) Minicargador; (2) Jobobos; (2) equipos de perforación; (1) unidad de inyección; (2) Compresores; (1) volqueta.

16 de Septiembre de 2025

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: En todos los frentes de obra se continuó con la conformación de gaviones. Puntualmente, en el frente de obra Puerta Galan se llevo a cabo la fundida de un tramo de dentellon en concreto ciclopeo de 3000 PSI y en el frente de obra Centroabastes se continuó con la perforación, instalación e inyeccion de anclajes
- Personal: (2) Directores de obra; (2) residentes de obra; (3) SST; (2) Ingenieros ambientales; (2) ingenieros auxiliares; (3) Maestros; (3) oficiales; (1) almacenista; (1) Topografo; (32) ayudantes de obra.
- Equipo: (3) Retroexcavadoras; (1) Pajarita; (1) Mini cargador; (1) Jobobos; (2) equipos de perforación; (1) unidad de inyección; (2) compresores; (1) volqueta.

17 de septiembre de 2025

- Estado del tiempo: Soleado

• Descripción: El día de hoy se realizó recorrido de obra con funcionarios de la CDMB. En todos los frentes de obra se continuó con la conformación de gaviones. Puntualmente en los frentes de obra Golan y Puerto Golan se llevó a cabo el suministro y colocación de concreto de 3000 PSI para recubrimientos y en el frente contraembalses se continuo con la perforación, colocación e inyección de anclajes

• Personal: (2) Residentes de obra; (2) SST Contratista/Interventoría (2) Ingenieros auxiliares; (3) Maestros; (3) Oficiales; (7) Almacenista; (7) operadores; (36) ayudantes de obra

• Equipo: (3) Retroexcavadoras; (1) Pajarita; (1) Minicargador; (1) Jumbolados; (1) unidades de inyección; (2) unidades de perforación; (2) Compresores; (1) Volqueta; (4) Motobombas.

18 de Septiembre de 2025

• Estado del tiempo: Soleado

• Descripción: Se continuó con la conformación de los gaviones en todos los frentes de obra. Puntualmente, en el frente de obra Puerta golan se fundio un tramo de dentellon en concreto ciclopeo de 3000 PSI. y en el frente de obra Golan el suministro y colocación de concreto de 3000 PSI para recubrimientos.

• Personal: (2) Residentes de obra; (2) SST Contratista/Interventoría (1) Ingeniero auxiliar; (3) Maestros; (3) oficiales; (1) almacenista; (7) operadores; (40) ayudantes de obra.

• Equipo: (3) Retroexcavadoras; (1) Pajarita; (1) Minicargador; (1) Jumbolado (1) Unidad de inyección; (2) unidades de perforación; (2) Compresores (1) Volqueta; (4) Motobombas.

19 de Septiembre de 2025

• Estado del tiempo: Nublado

• Descripción: Se continuó con la conformación de los

gaviones en todos los frentes de obra. Actualmente, en el frente de obra Puerta Galan se fundio un tramo de concreto de 2000 PSI para Solado y uno de 3000 PSI para recubrimientos.

- Personal: (2) Directores de obra; (2) Residentes de obra; (2) ingenieros ambientales; (2) SST contratista/interventoria; (1) Ingeniero auxiliar; (3) maestros; (3) oficiales; (1) almacenista; (5) operadores; (36) ayudantes de obra.
- Equipo: (3) Retroexcavadoras; (1) Pajarita; (1) Minicargador; (1) Jobobos (2) unidades de perforación; (2) compresores; (1) Unidad de inyección; (1) Volqueta; (1) Motobombas

20 de Septiembre de 2025

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se continuó con la conformación de los gaviones en todos los frentes de obra. Puntualmente en el frente de obra Galan se realizó el suministro y colocación de concreto de 3000 PSI para recubrimientos.
- Personal: (2) Residentes de obra; (2) SST contratista/interventoria; (1) ingeniero auxiliar; (3) Maestros; (3) oficiales; (1) almacenista; (34) ayudantes de obra.
- Equipo: (3) Retroexcavadoras; (1) Pajarita; (1) Min. Cargador; (1) Jobobos (4) motobombas; (1) Volqueta.

22 de Septiembre de 2025

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se continuó con la conformación de los gaviones en todos los frentes de obra. De manera Puntual en el frente de obra Puerta Galan se realizó el Suministro y colocación de concreto ciclopeo de 3000 PSI, para un tramo de dentellón. En el frente de obra se fundió un tramo de recubrimiento en concreto de 3000 PSI.

- Personal: (2) Residentes de obra; (2) SST Contratista/Interventoría. (2) Ingenieros auxiliares; (3) Maestros; (3) oficiales de obra; (7) almacenista; (5) operadores; (48) ayudantes de obra.
- Equipo: (3) Retroexcavadoras; (1) Pajarita; (1) mini cargador; (1) Soldadora; (4) motobombas; (1) volqueta.

23 de Septiembre de 2025

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se realizo recorrido de obra junto con personal de la CDMB. En el frente Centroabastos se continuó con el suministro, colocacion, llenado e inyección de anclajes. así como, con la conformación de gaviones en todos los frentes de obra.
- Personal: (2) Directores de obra; (2) Residentes de obra; (2) ingenieros ambientales; (2) SST Contratista/interventoría; (1) ingeniero auxiliar; (3) Maestros; (3) oficiales; (1) almacenista; (7) operadores; (38) ayudantes de obra
- Equipo: (3) Retroexcavadoras; (1) Pajarita; (1) minicargador; (2) Equipos de perforación; (2) Compresores; (1) unidad de inyección; (4) motobombas; (2) Volquetas

24 de Septiembre de 2025

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se continuó con la conformación de gaviones en todos los frentes de obra, así como con el recubrimiento de los mismos en concreto de 3000 PSI. En el frente de obra Centroabastos se realizó la perforación, suministro, instalación e inyección de anclajes.
- Personal: (2) residentes de obra; (2) SST contratista/interventoría (1) ingeniero auxiliar; (3) maestros; (3) oficiales; (1) almacenista; (7) operadores; (40) ayudantes de obra

- Equipo: (3) Retroexcavadoras; (1) Pajarita; (1) minicargador; (2) equipos de perforación; (2) compresores; (1) unidad de inyección (4) motobombas; (2) voladuras.

25 de Septiembre de 2025

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se continuó con la conformación de gaviones en todos los frentes de obra, así como, con el recubrimiento de los mismos en concreto de 3000 PSI. En el frente de obra Centroabastos se realizó la perforación, suministro, instalación e inyección de los anclajes.
- Personal: (2) Residentes de obra; (2) SST contratista/interventoría (1) ingeniero auxiliar; (3) Maestros; (3) oficiales; (1) almacenista (2) operadores; (40) ayudantes de obra.

26 de Septiembre de 2025

- Estado del tiempo: Nublado
- Descripción: En el frente de obra Centroabastos se continuó con las perforaciones, el suministro, colocación e inyección de los anclajes. En todos los frentes de obra se siguieron conformando gaviones.
- Personal: (2) Directores de obra; (2) Residentes de obra; (2) ingenieros ambientales; (2) SST y contratista / interventoría (1) ingeniero auxiliar; (1) ingeniero hidráulico; (1) topógrafo; (3) Maestros; (3) oficiales; (1) almacenista; (7) operadores; (38) ayudantes de obra
- Equipo: (3) Retroexcavadoras; (1) Pajarita; (1) minicargador; (2) equipos de perforación; (2) compresores; (1) unidad de inyección; (1) RTK; (4) motobombas; (2) voladuras.

27 de Septiembre de 2025
- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se continuo con la conformacion de gaviones y el recubrimiento en concreto de 3000 PSI. Así mismo se reanudo la construcción de las entregas. En el frente de obra contraabastos se realizó la Perforacion Suministro y colocación de anclajes, ademas de su llenado e inyección
- Personal: (2) Residentes de obra; (2) SST Contratista/Interventoria (1) ingeniero auxiliar; (3) maestros; (3) oficiales; (1) almacenista; (7) Operadores; (36) ayudantes de obra.
- Equipo: (3) Retroexcavadoras; (1) Pajarita; (1) Mini cargador; (2) equipos de perforación; (2) Compresores; (1) Equipo de inyección; (2) volquetas; (4) motobombas.

29 de Septiembre de 2025
- Estado del tiempo: Nublado
- Descripción: Se continuo con la conformacion de gaviones y su recubrimiento en concreto de 3000 PSI, Ademas de la construcción de las entregas. En el frente de obra contraabastos se realizó la perforación, Suministro, instalación e inyeccion de anclajes
- Personal: (2) Residentes de obra; (2) SST contratista/interventoria (1) ingeniero auxiliar; (3) maestros; (3) oficiales; (1) almacenista (7) Operadores; (40) ayudantes de obra
- Equipo: (3) Retroexcavadoras; (1) pajarita; (1) mini cargador; (2) equipos de perforacion; (2) compresores; (1) unidad de inyeccion; (2) volquetas; (4) motobombas

30 de Septiembre de 2025
- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se continuo con la conformacion de gaviones y

su recubrimiento en concreto de 3000 PSI. Además de la construcción de las entregas. En el frente de obra contra abastos se realizó la perforación, suministro, instalación e inyección de los anclajes

- Personal: (2) Directores de obra; (2) Residentes de obra; (2) SST (2) Ingenieros ambientales; contratista/interventoría. (1) Ingeniero auxiliar; (3) maestros; (3) oficiales; (1) almacenista; (7) operadores; (38) ayudantes de obra.
- Equipo: (3) Retroexcavadoras; (1) Pajarita; (1) minicargador; (2) equipos de perforación; (2) compresores; (1) unidad de inyección; (2) volquetas; (4) motobombas.

ANEXO No. 3: SEGURIDAD SOCIAL.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-06, 04:25:50 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1076112378

Periodo Cotización: septiembre de 2025 **Periodo Servicio:** octubre de 2025

PAGADO 06/10/2025

OS DEL APORTANTE

Social	CONSORCIO CAUCE		
ento	NI901855581	Dirección	KM 7 #22 - 31 BODEGA 16
Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3152946557
ersona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
	GIRON	Departamento	SANTANDER
entante Legal	SERRANO GOMEZ JULIAN ANDRES	Identificación	CC 13870690
filiados	8	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

ALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				To
	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante																																					Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	
	LUIS ALBERTO CANO PARA	01	00											X																									30 30 30 30	(230301) PORVENIR	$ 1.717.260	$ 274.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.717.260	$ 68.700				(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.717.260	$ 68.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	BALDELIO RIVERA GOMEZ	01	00	X																																			0 3 3 3 3	(25-14) COLPENSIONES	$ 94.300	$ 15.100	(EPS045) SALUD TOTAL EPS	$ 94.300	$ 3.800				(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 94.300	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	MOYRA ALEJANDRA QUINTERO DELGADO	01	00																																			X		0 3 3 3 3	(230301) PORVENIR	$ 187.200	$ 30.000	(EPS010) EPS SURA	$ 187.200	$ 7.500	$ 0			(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 187.200	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	MOYRA ALEJANDRA QUINTERO DELGADO	01	00	X																																			0 28 28 28	(230301) PORVENIR	$ 2.630.400	$ 419.400	(EPS010) EPS SURA	$ 2.630.400	$ 104.800	$ 0			(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.630.400	$ 105.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	IVAN RENE ROMAN CARVAJAL	01	00											X																									0 30 30 30 30	(230501) PROTECCION	$ 1.740.981	$ 278.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.740.981	$ 69.600	$ 0			(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.740.981	$ 69.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	ANDRES LEONARDO LASSO AGUIRRE	01	00																																					0 30 30 30 30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0			(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	JUAN DE DIOS GARCIA HERRERA	01	00											X																									0 30 30 30 30	(230301) PORVENIR	$ 4.210.800	$ 673.800	(EPS045) SALUD TOTAL EPS	$ 4.210.800	$ 168.500	$ 0			(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 4.210.800	$ 168.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	VICTOR MANUEL TRUJILLO ARIAS	01	00											X																									0 30 30 30 30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.760.280	$ 281.600	(EPS045) SALUD TOTAL EPS	$ 1.760.280	$ 71.400	$ 0			(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.760.280	$ 71.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	FREDDY FUENTES GIL	01	01											X																									0 0 30 30 30	(999-47) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS008) EPS SANITAS	$ 1.809.780	$ 72.400	$ 0			(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.809.780	$ 72.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

OTALES

Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
13.784.701	$ 15.594.481	$ 15.594.481	$ 16.124.280	$ 2.235.600	$ 934.100	$ 1.672.900	$ 645.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.548.100	$ 0	$ 4.548.100

sas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5166669 - Bucaramanga: 607 6438660 - Cartagena: 605 6645644 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618880 - Resto del País: 018000 971 371 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-06, 04:32:24 PM Tipo Planilla: I. PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1076120619

Periodo Cotización: septiembre de 2025 Periodo Servicio: septiembre de 2025

PAGADO 06/10/2025

OS DEL APORTANTE

Social	JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ		
ento	CC13870690	Dirección	CR 26 #36 - 14 OFICINA 403
Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	6914305
ersona	NATURAL	Forma Presentación	UNICO
	BUCARAMANGA	Departamento	SANTANDER
entante Legal		Identificación	
filiados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

ALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					To
	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	IRT	SLN	INGRESO	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLE	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días IRP	Días PEN	Días ARP	Días ARP	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	
	JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ	01	00																			0	30	30	30	0															

TOTALES

Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 35,567,000	$ 35,567,000	$ 35,567,000	$ 0	$ 6,409,800	$ 4,448,800	$ 2,476,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13,334,300	$ 0	$ 13,334,300

Línea de Servicio PagoSIMPLE: Bogotá 601 4448634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6436000 - Cartagena: 605 6645444 - Pereira: 606 3403582 - Barranquilla: 605 3618000 - Resto del País: 018000 571 571 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-03, 11:18:30 AM **Tipo Planilla:** I PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1075958296

Periodo Cotización: septiembre de 2025 **Periodo Servicio:** septiembre de 2025

PAGADO 26/09/2025

OS DEL APORTANTE

Social	LISSETTH XIMENA NIÑO CARVAJAL		
ento	CC63395720	Dirección	CR 26 #36 - 14
Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	6914305
rsona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
	BUCARAMANGA	Departamento	SANTANDER
entante Legal		Identificación	
filiados	1	ARP	ARL SURA

ALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					
	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días IRP	Días PEN	Días RSP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	T
	LISSETTH XIMENA NIÑO CARVAJAL	01	00																		0	30	30	0	(CB-11) COMFENALCO	$ 2,097,511	$ 335,700	(EPS010) EPS SURA	$ 2,097,511	$ 252,300	2.436	$ 2,097,511	$ 51,100	(NSNCC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

TOTALES

Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2,097,511	$ 2,097,511	$ 2,097,511	$ 0	$ 335,700	$ 252,300	$ 51,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 639,000	$ 0	$ 639,000

eas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4449634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618880 - Resto del País: 018000 931 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protegar el medio ambiente está en nuestras manos.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		PRIMER APELLIDO:	WILLIAM EDUARDO
PRIMER APELLIDO:	FLOREZ BLANCA	SEGUNDO APELLIDO:	CORTES
DIRECCIÓN:	TRANS 73#FE54-69 T16 APTO 101	PRIMER NOMBRE:	PENA
TIPO APORTANTE:	DEPENDIENTE	SEGUNDO NOMBRE:	EDGAR
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Otras actividades profesionales, científicas y t
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	101 - INDEPENDIENTE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, ICBF Y SENA (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			79843227781	TIPO DE PLANILLA:					I-INDEPENDIENTES
NÚMERO DE RADICACIÓN O PAGO:	MES	septiembre	AÑO	2025	PERIODO DE LIQUIDACIÓN SALUD:		MES	septiembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:				0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):				2025/09/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				79843227781

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			DEPENDIENTES	ESTADO(S)	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	COLPENSIONES	1	$ 884.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 884.000	$ 0	$ 884.000
SUBTOTALES										$ 884.000	$ 0	$ 884.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LICENCIAS		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR AGREG	COTIZACIÓN	VALOR AGREG	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	NUEVA EMPRESAS DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 884.000	$ 0	$ 0	$ 884.000
SUBTOTALES													$ 884.000	$ 0	$ 0	$ 884.000

Planilla Pagada

DETALLE PLANILLA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE

TIPO COTIZANTE	NOMBRES	TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	ACTUALIZACIÓN DE DATOS
01	EDGAR WILLIAM EDUARDO CORTES PEÑA	CÉDULA DE CIUDADANÍA	1.030.[illegible]	$ 1.423.500				NO

LIQUIDACIÓN

ADMINISTRADORA		IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN							SALUD						ARL					PARAFISCALES						
				FSP		APORTES VOLUNTARIOS			TOTAL APORTES														CCF		ICBF		SENA	
ADMIN	EST. COTIZ.			SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL		ADMIN	EST. COTIZ.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR AGREG	TOTAL APORTES	ADMIN	EST. COTIZ.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTES	IBC	ADMIN	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES
CREFI-PORVENIR	A	$ 1.423.500	$ 1.780.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	16.00%	$ 284.000	Caja de Compensación Caja de Servicio S DE SALUD	A	$ 1.423.500	$ 800.000	$ 0	$ 800.000			$ 0		$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 884.000

Planilla Pagada

Planilla Pagada

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-06, 04:25:52 PM Tipo Planilla: Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS Número Planilla: 1078056404

Periodo Cotización: septiembre de 2025 Periodo Servicio: septiembre de 2025

PAGADO 06/10/2025

OS DEL APORTANTE

Social	CONSORCIO CAUCE		
ento	NI901855581	Dirección	KM 7 #22 - 31 BODEGA 16
Empresa	CONTRATANTE	Teléfono	3152948557
rsona	JURIDICA	Forma Presentación	UNICO
	GIRON	Departamento	SANTANDER
entante Legal	SERRANO GOMEZ JULIAN ANDRES	Identificación	CC 13870690
filiados	3	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

ALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					To
#	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante																				Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Minsalud	T
	JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ	59	00																				(900.337) WINDJAN AFP	$ 0	$ 0	(900.917) WINDJAN EPS	$ 0	$ 0	6.960	$ 1.423.500	$ 99.108	(900-CC) WINDJAN CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	LISSETTE ARENAS ORTIZ CARVAJAL	59	00																				(900.337) WINDJAN AFP	$ 0	$ 0	(900.917) WINDJAN EPS	$ 0	$ 0	6.960	$ 1.423.500	$ 99.108	(900-CC) WINDJAN CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	WILLIAM EDUARDO CORTES ROA	59	00																				(900.337) WINDJAN AFP	$ 0	$ 0	(900.917) WINDJAN EPS	$ 0	$ 0	6.960	$ 1.423.500	$ 99.108	(900-CC) WINDJAN CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

OTALES

Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 4.379.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 297.306	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 297.306	$ 0	$ 297.306

as de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4468534 - Cali: 602 3540877 - Medellín: 604 5148869 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618650 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protegar el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-02, 03:56:45 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 1076074146

Periodo Cotización: septiembre de 2025 **Periodo Servicio:** octubre de 2025

PAGADO 02/10/2025

OS DEL APORTANTE

Social	MAQUINOBRAS		
ento	NI900849537	Dirección	AV 0 #22 - 31 CENTRO IND SAN JORGE BD 16
Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	6914305
ersona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
	BUCARAMANGA	Departamento	SANTANDER
entante Legal	SERRANO GOMEZ JULIAN ANDRES	Identificación	CC 13870690
filiados	53	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

ALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades																					Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				To
#	Apellidos y nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días PPA	Días PPD	Días PPL	Días CDT	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	
1	LUIS FERNANDO ARAVALO PULIDO	H	51																X	30	30	30	30	(23)(50) PORVENIR	$ 2.160.000	$ 345.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.160.000	$ 86.400	0,004	$ 2.160.000	$ 8.640	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.160.000	$ 86.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
2	JESUS ALBERTO GIMENEZ LANE	H	51										X						X	30	30	30	30	(23)(50) PORVENIR	$ 2.829.280	$ 452.700	(EPS032) SALUD TOTAL EPS	$ 2.829.280	$ 113.100	0,004	$ 2.829.280	$ 11.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.829.280	$ 113.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
3	MAURICIO ANDRES BECERRA ORTIZ	H	51										X						X	30	30	30	30	(23)(50) PROTECCION	$ 2.646.480	$ 471.200	(EPS010) EPS SURA	$ 2.646.480	$ 105.900	0,004	$ 2.646.480	$ 10.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.646.480	$ 105.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
4	ADRIAN JOSE BOLAÑO PERAZA	H	51										X						X	30	30	30	30	(23)(50) PORVENIR	$ 2.800.000	$ 392.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.800.000	$ 42.700	0,002	$ 2.800.000	$ 5.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.800.000	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
5	JENNIFER PAOLA CARDENAS ESTUPIÑAN	H	51																X	30	30	30	30	(23)(50) PORVENIR	$ 1.800.000	$ 324.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.800.000	$ 76.100	0,004	$ 1.800.000	$ 7.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.800.000	$ 76.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
6	HILTON JOSE DIAZ RIOS	H	51										X						X	29	29	29	29	(23)(50) PROTECCION	$ 3.422.481	$ 547.600	(EPS046) SALUD MIA EPS	$ 3.422.481	$ 136.900	0,004	$ 3.422.481	$ 13.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.422.481	$ 136.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
7	HILTON JOSE DIAZ RIOS	H	51														X		X	4	4	4	4	(23)(50) PROTECCION	$ 366.542	$ 63.200	(EPS046) SALUD MIA EPS	$ 366.542	$ 15.000	0,004	$ 366.542	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 366.542	$ 15.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
8	OSCAR JULIAN PALOMINO DURAN	H	51																X	30	30	30	30	(23)(50) PORVENIR	$ 2.464.000	$ 394.200	(EPS010) EPS SURA	$ 2.464.000	$ 99.000	0,004	$ 2.464.000	$ 10.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.464.000	$ 99.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
9	SERGIO ANDRES ORGUETOUA ARDILA	H	51																X	28	28	28	28	(23)(50) PORVENIR	$ 1.740.000	$ 278.400	(EPS010) EPS SURA	$ 1.740.000	$ 69.600	0,004	$ 1.740.000	$ 7.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.740.000	$ 69.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
10	SERGIO ANDRES ORGUETOUA ARDILA	H	51														X		X	1	1	1	1	(23)(50) PORVENIR	$ 80.000	$ 8.800	(EPS010) EPS SURA	$ 80.000	$ 3.400	0,004	$ 80.000	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 80.000	$ 3.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
11	SERGIO ANDRES PARRA VILLAMIZAR	H	51										X						X	30	30	30	30	(23)(50) COLFONDOS	$ 3.443.200	$ 550.900	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 3.443.200	$ 137.700	0,004	$ 3.443.200	$ 13.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.443.200	$ 137.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
12	RUBEN DARIO BAUTISTA CONTRERAS	H	51																X	28	28	28	28	(23)(50) PROTECCION	$ 1.791.004	$ 286.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.791.004	$ 71.700	0,004	$ 1.791.004	$ 7.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.791.004	$ 71.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
13	RUBEN DARIO BAUTISTA CONTRERAS	H	51									X							X	1	1	1	1	(23)(50) PROTECCION	$ 61.777	$ 9.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 61.777	$ 2.500	0,004	$ 61.777	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 61.777	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
14	DAVIER FABIAN LOPEZ PADILLA	H	51									X							X	30	30	30	30	(23)(50) PROTECCION	$ 3.554.681	$ 570.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 3.554.681	$ 142.200	0,004	$ 3.554.681	$ 14.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.554.681	$ 142.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
15	FREDDY ALEXANDER SALAS MUÑOZ	H	51									X							X	30	30	30	30	(23)(50) PORVENIR	$ 2.745.388	$ 439.700	(EPS032) SALUD TOTAL EPS	$ 2.745.388	$ 171.000	0,004	$ 2.745.388	$ 10.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.745.388	$ 171.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
16	LIBERTH YOLANDA PEREZ PRADO	H	51																X	30	30	30	30	(23)(50) PORVENIR	$ 1.400.000	$ 224.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.400.000	$ 57.000	0,004	$ 1.400.000	$ 5.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.400.000	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
17	MIGUEL ANGEL ALVAREZ COCINERO	H	51									X							X	30	30	30	30	(23)(50) PORVENIR	$ 2.386.341	$ 381.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.386.341	$ 95.500	0,004	$ 2.386.341	$ 9.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.386.341	$ 95.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
18	EDGAR IVAN PALOMINO POLGUIN	H	51																X	23	23	23	23	(23)(50) COLFONDOS	$ 2.954.545	$ 505.200	(EPS010) EPS SURA	$ 2.954.545	$ 93.000	0,004	$ 2.954.545	$ 11.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.954.545	$ 93.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
19	EDGAR IVAN PALOMINO POLGUIN	H	51										X						X	7	7	7	7	(23)(50) COLFONDOS	$ 607.500	$ 102.100	(EPS010) EPS SURA	$ 607.500	$ 20.000	0,004	$ 607.500	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 607.500	$ 20.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

sea de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540977 - Medellín: 604 6146569 - Bucaramanga: 607 6436000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3616650 - Resto del País: 018000 571 571 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 02/10/2025 | Empresa NI900849507 MAQUINOBRAS | Planilla Nro: 1076074146 | Periodo Cotiza[illegible]n: septiembre de 2025 | Periodo Servicio: octubre de 2025

ALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				To
#	Apellidos y Nombres	Tipo Documento	Número Documento	ING	RET	RET F	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	IGE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APO	Días IBC	Días COT	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	T
1	YURIS MILADYS ESCOBAR MEDINA	CC	00																		0	30	30	30	(EPS010) FOMVIVIR	$ 1.729.000	$ 276.500	(EPS010) SALUD TOTAL EPS	$ 1.729.000	$ 68.200	0,522	$ 1.729.000	$ 9.100	COMFAB| COMFENALCO SANTANDER	$ 1.729.000	$ 68.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
2	ALEJANDRO LOAIZA GUTIERREZ	CC	00																		0	30	30	30	(EPS037) DUQ MUTUAL BARRERA	$ 3.281.800	$ 527.800	(EPS016) EPS SURA	$ 3.281.800	$ 130.600	4,040	$ 3.281.800	$ 227.800	COMFAB| COMFENALCO SANTANDER	$ 3.281.800	$ 130.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$
3	EDGAR JAVIER ASIJO KUNDA	CC	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.403.500	$ 337.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.403.500	$ 57.200	4,040	$ 1.403.500	$ 56.700	COMFAB| COMFENALCO SANTANDER	$ 1.403.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
4	YEFERSON ACEVEDO SUAREZ	CC	00					X													0	30	30	30	(25037) PROTECCION	$ 1.091.100	$ 305.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.091.100	$ 73.500	4,040	$ 1.091.100	$ 133.100	COMFAB| COMFENALCO SANTANDER	$ 1.091.100	$ 73.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
5	YESICA PAOLA RUFFILLO	CC	00																		0	30	30	30	(25037) FOMVIVIR	$ 2.057.800	$ 405.800	(EPS046) SALUD MIA EPS	$ 2.057.800	$ 139.400	0,522	$ 2.057.800	$ 13.900	COMFAB| COMFENALCO SANTANDER	$ 2.057.800	$ 138.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
6	JHON JAIRO MARTINEZ AGAMEZ	CC	00						X												0	30	30	30	(25038) FOMVIVIR	$ 3.090.250	$ 401.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.090.250	$ 197.900	4,040	$ 3.090.250	$ 197.900	COMFAB| COMFENALCO SANTANDER	$ 3.090.250	$ 197.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
7	EDER ESNEIDER GARCIA MARTINEZ	CC	00																		0	30	30	30	(25037) PROTECCION	$ 3.595.300	$ 540.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 3.595.300	$ 155.800	4,040	$ 3.595.300	$ 235.400	COMFAB| COMFENALCO SANTANDER	$ 3.595.300	$ 155.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$
8	KAREL JOHANNA SALVO RODRIGUEZ	CC	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.195.640	$ 331.400	(EPS046) SALUD MIA EPS	$ 2.195.640	$ 87.900	0,522	$ 2.195.640	$ 11.500	COMFAB| COMFENALCO SANTANDER	$ 2.195.640	$ 87.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
9	JHONATAN ALBERTO BRAVO ASESMO	CC	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.042.314	$ 466.600	(EPS016) EPS SURA	$ 3.042.314	$ 121.700	4,040	$ 3.042.314	$ 21.600	COMFAB| COMFENALCO SANTANDER	$ 3.042.314	$ 121.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
10	JULIAN ANDRES ALVAREZ PINZON	CC	00						X												0	30	30	30	(25037) PROTECCION	$ 1.843.227	$ 283.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.811.227	$ 72.500	4,040	$ 1.811.227	$ 129.600	COMFAB| COMFENALCO SANTANDER	$ 1.811.227	$ 72.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
11	MARIA FERNANDA RIVERA SEPULVEDA	CC	00																		0	28	28	28	(25037) DUQ MUTUAL BARRERA	$ 3.600.800	$ 600.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 3.600.800	$ 150.800	4,040	$ 3.600.800	$ 179.400	COMFAB| COMFENALCO SANTANDER	$ 3.600.800	$ 150.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
12	MARIA FERNANDA RIVERA SEPULVEDA	CC	00									X									0	2	2	2	(25038) DUQ MUTUAL BARRERA	$ 150.800	$ 38.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 150.800	$ 7.300	4,040	$ 150.800	$ 0	COMFAB| COMFENALCO SANTANDER	$ 150.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
13	MAIRA ALEJANDRA PEREZ SEABOYAL	CC	00																		0	29	30	30	(25038) FOMVIVIR	$ 1.519.807	$ 242.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.519.807	$ 60.700	4,040	$ 1.519.807	$ 105.800	COMFAB| COMFENALCO SANTANDER	$ 1.519.807	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
14	MAIRA ALEJANDRA PEREZ SEABOYAL	CC	00													X					0	4	4	4	(25038) FOMVIVIR	$ 233.334	$ 37.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 233.334	$ 9.400	4,040	$ 233.334	$ 0	COMFAB| COMFENALCO SANTANDER	$ 233.334	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
15	DIEGO MAURICIO NIÑO MIRCHI	CC	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS016) EPS SURA	$ 2.500.000	$ 100.000	4,040	$ 2.500.000	$ 174.000	COMFAB| COMFENALCO SANTANDER	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
16	OSCAR IVAN URIBE TORRES	CC	00																		0	30	30	30	(25038) FOMVIVIR	$ 1.403.500	$ 337.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.403.500	$ 57.200	4,040	$ 1.403.500	$ 56.700	COMFAB| COMFENALCO SANTANDER	$ 1.403.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
17	SANTIAGO SERRANO TRUJILLO	CC	00																		0	30	30	30	(25038) FOMVIVIR	$ 2.915.000	$ 466.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.915.000	$ 116.700	4,040	$ 2.915.000	$ 253.600	COMFAB| COMFENALCO SANTANDER	$ 2.915.000	$ 116.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
18	MARIA DAVID TOLOZA RAMIREZ	CC	00							X											0	28	28	28	(25038) FOMVIVIR	$ 1.384.108	$ 221.300	(EPS034) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.384.108	$ 55.400	4,040	$ 1.384.108	$ 80.600	COMFAB| COMFENALCO SANTANDER	$ 1.384.108	$ 55.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
19	MARIA DAVID TOLOZA RAMIREZ	CC	00													X					0	1	1	1	(25038) FOMVIVIR	$ 47.800	$ 7.700	(EPS034) NUEVA EPS S.A. CM	$ 47.800	$ 2.000	4,040	$ 47.800	$ 0	COMFAB| COMFENALCO SANTANDER	$ 47.800	$ 2.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
20	MAURICIO SUAREZ PEDRAZA	CC	00																		0	30	30	30	(25038) FOMVIVIR	$ 1.895.400	$ 305.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.895.400	$ 75.900	4,040	$ 1.895.400	$ 132.000	COMFAB| COMFENALCO SANTANDER	$ 1.895.400	$ 75.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
21	EDER ANDRES GARCIA LOPEZ	CC	00						X												0	23	23	23	(25038) PROTECCION	$ 1.697.240	$ 300.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.697.240	$ 75.900	4,040	$ 1.697.240	$ 192.100	COMFAB| COMFENALCO SANTANDER	$ 1.697.240	$ 75.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
22	EDER ANDRES GARCIA LOPEZ	CC	00													X					0	7	7	7	(25038) PROTECCION	$ 526.718	$ 84.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 526.718	$ 21.300	4,040	$ 526.718	$ 0	COMFAB| COMFENALCO SANTANDER	$ 526.718	$ 21.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
23	VICTOR MANUEL DIAZ TORRES	CC	00						X												0	28	28	28	(25038) FOMVIVIR	$ 2.086.868	$ 334.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.086.868	$ 83.500	4,040	$ 2.086.868	$ 143.300	COMFAB| COMFENALCO SANTANDER	$ 2.086.868	$ 83.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
24	VICTOR MANUEL DIAZ TORRES	CC	00									X									0	2	2	2	(25038) FOMVIVIR	$ 143.868	$ 25.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 143.868	$ 5.800	4,040	$ 143.868	$ 0	COMFAB| COMFENALCO SANTANDER	$ 143.868	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
25	JOHN ALEJANDRO PEREZ ARANGO	CC	00						X												0	30	30	30	(25038) COLPENSIONES	$ 2.071.200	$ 331.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.071.200	$ 82.900	4,040	$ 2.071.200	$ 142.000	COMFAB| COMFENALCO SANTANDER	$ 2.071.200	$ 82.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
26	ORIEL ALONSO RIVERA GARIANO	CC	00						X												0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.121.700	$ 499.400	(EPS034) NUEVA EPS S.A. CM	$ 3.121.700	$ 124.900	4,040	$ 3.121.700	$ 214.700	COMFAB| COMFENALCO SANTANDER	$ 3.121.700	$ 124.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
27	JONATAN RAMIRO CORDOBA GAONA	CC	00																		0	30	30	30	(25038) FOMVIVIR	$ 2.376.000	$ 380.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.376.000	$ 95.100	4,040	$ 2.376.000	$ 163.400	COMFAB| COMFENALCO SANTANDER	$ 2.376.000	$ 95.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
28	OSCAR ARTURO BARON JAIMES	CC	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.019.000	$ 309.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.019.000	$ 80.600	4,040	$ 3.019.000	$ 140.600	COMFAB| COMFENALCO SANTANDER	$ 3.019.000	$ 80.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
29	JAIRO ENRIQUE CORNELIO MARTINEZ	CC	00						X												0	30	30	30	(25038) FOMVIVIR	$ 2.226.838	$ 356.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.226.838	$ 84.600	4,040	$ 2.226.838	$ 150.900	COMFAB| COMFENALCO SANTANDER	$ 2.226.838	$ 88.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
30	JAVIER HUMBERTO DIAZ GOMEZ	CC	00																		0	28	28	28	(25038) FOMVIVIR	$ 4.760.648	$ 762.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 4.760.648	$ 190.600	4,040	$ 4.760.648	$ 331.000	COMFAB| COMFENALCO SANTANDER	$ 4.760.648	$ 190.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$
31	SERGIO ANTONIO LOPEZ SANTAMARIA	CC	00																		0	30	30	30	(25038) FOMVIVIR	$ 5.256.000	$ 606.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 5.256.000	$ 289.600	4,040	$ 5.256.000	$ 366.100	COMFAB| COMFENALCO SANTANDER	$ 5.256.000	$ 256.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$
32	JESUS ALEXIS MANTILLA AMADO	CC	00						X												0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.340.648	$ 703.000	(EPS016) EPS SURA	$ 4.340.648	$ 170.400	4,040	$ 4.340.648	$ 303.400	COMFAB| COMFENALCO SANTANDER	$ 4.340.648	$ 173.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$
33	CARMEN EDITH CORTES CALDERON	CC	00																		0	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.581.707	$ 1.115.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 3.581.707	$ 260.500	4,040	$ 3.581.707	$ 466.700	COMFAB| COMFENALCO SANTANDER	$ 3.581.707	$ 260.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$
34	CARMEN EDITH CORTES CALDERON	CC	00									X									0	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 466.094	$ 79.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 466.094	$ 10.000	4,040	$ 466.094	$ 0	COMFAB| COMFENALCO SANTANDER	$ 466.094	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
35	ALBA LORENA VELASCO GOMEZ	CC	00																		0	30	30	30	(25038) PROTECCION	$ 3.595.000	$ 1.135.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.595.000	$ 280.000	4,040	$ 3.595.000	$ 463.400	COMFAB| COMFENALCO SANTANDER	$ 3.595.000	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$
36	LINETH MARITZA RODRIGUEZ VEGA	CC	00																		0	30	30	30	(25038) COLPENSIONES	$ 2.865.248	$ 474.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.865.248	$ 114.700	4,040	$ 2.865.248	$ 236.400	COMFAB| COMFENALCO SANTANDER	$ 2.865.248	$ 114.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
37	PERLA JOHANNA DREJUELA RAMOS	CC	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.123.128	$ 466.700	(EPS016) EPS SURA	$ 3.123.128	$ 125.000	4,040	$ 3.123.128	$ 217.400	COMFAB| COMFENALCO SANTANDER	$ 3.123.128	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
38	ALBA LUCIA SANTOS ALEDA	CC	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.739.000	$ 596.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 3.739.000	$ 149.600	4,040	$ 3.739.000	$ 280.000	COMFAB| COMFENALCO SANTANDER	$ 3.739.000	$ 149.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$

eas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146569 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6545444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618650 - Resto del País: 018000 571 171 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 02/10/2025 | Empresa NI900849507 MAQUINOBRAS | Planilla Nro: 1076074146 | Periodo Cotiza[illegible]: septiembre de 2025 | Periodo Servicio: octubre de 2025

ALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																							Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				To
	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	RET P	TDE	TDE	TDP	TDP	VSP	COR	SLN	IGE	LMA	VAC	SUP	RET	ERP	Días APF	Días PPE	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte ICBF	Aporte SENA	Aporte ESAP	Aporte Min Educación	Aporte ESAP	T
	ADRIANA VERENA SERRANO AREVALO	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 11.000.000	$ 1.320.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 11.000.000	$ 440.000	4.350	$ 11.000.000	$ 783.500	COMFAB COMFENALCO SANTANDER	$ 11.000.000	$ 440.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	LUIS ANTONIO SANABRIA REY	01	01																	0	0	30	30	(60-04) SIN AFILIACION AFP	$ 0	$ 0	(EPS090) SALUD MIA EPS	$ 1.420.000	$ 57.000	4.350	$ 1.420.000	$ 99.400	COMFAB COMFENALCO SANTANDER	$ 1.420.000	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	VICTOR JULIO BARBOSA HABEDID	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.420.000	$ 227.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.420.000	$ 56.800	1.040	$ 1.420.000	$ 99.400	COMFAB COMFENALCO SANTANDER	$ 1.420.000	$ 56.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	EDGARDO MATOS UBEDIME	01	00											X						0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.395.000	$ 383.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.395.000	$ 95.800	1.040	$ 2.395.000	$ 167.700	COMFAB COMFENALCO SANTANDER	$ 2.395.000	$ 95.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	JOSE ORLANDO SUAZA JUNIOS	01	00																	0	30	30	30	(60-09) PROTECCION	$ 4.760.840	$ 761.800	(EPS042) COOSALUD	$ 4.760.840	$ 190.400	1.040	$ 4.760.840	$ 333.300	COMFAB COMFENALCO SANTANDER	$ 4.760.840	$ 190.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	JOSE LUIS BECERRA HERNANDEZ	01	00											X						0	30	30	30	(60-09) PROTECCION	$ 3.134.200	$ 501.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 3.134.200	$ 125.400	1.040	$ 3.134.200	$ 219.400	COMFAB COMFENALCO SANTANDER	$ 3.134.200	$ 125.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

TOTALES

Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$1.888.274	$ 183.270.774	$ 183.270.774	$ 183.270.774	$ 24.841.900	$ 9.134.000	$ 9.963.930	$ 5.089.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.142.130	$ 0	$ 46.142.130

sas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4846634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146569 - Bucaramanga: 607 6436000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 571 171 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901080177	7	LERMA CONSTRUCCIONES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	0001	CRA 5 No. 8-03 SANTA ANA	BUCARAMANGA-SANTANDER	6438312	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	0807057791	94635103185	E	2025/10/20	2025/10/21	BANCOLOMBIA	1	$15,503,980

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION											SALUD						
Fecha Inicio vst	Fecha Fin vst	Ln	Fecha Inicio sit	Fecha Fin sit	Hp	Valor	Sal Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alta Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Variable Subsistencia	Valor No Retenido	Total	APF Decreto	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
																				$1,489,000						$1,189,200	
																				$127,800						$22,800	
																				$127,800						$67,800	
						$1,423,500	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,423,500		1.044% RIESGO	$127,800	$0	$0	$0	$0	$0	$127,800		NUEVA E.P.S.	30	$1,423,500	4%	$57,000	
																				$7,660,800						$2,948,500	
																				$7,660,800						$2,948,500	
						$1,423,500	No	Fijo	PROTECCION	12	$569,400		1.044% RIESGO	$91,200	$0	$0	$0	$0	$0	$91,200		SALUD TOTAL	12	$569,400	4%	$22,800	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500		1.044% RIESGO	$127,800	$0	$0	$0	$0	$0	$127,800		NUEVA E.P.S.	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,423,500		1.044% RIESGO	$127,800	$0	$0	$0	$0	$0	$127,800		NUEVA EPS NOVEDAD	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	COLPENSIONES	5	$237,250		1.044% RIESGO	$21,300	$0	$0	$0	$0	$0	$21,300		CONSALUD EPS	5	$237,250	4%	$9,500	
						$1,423,500	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,423,500		1.044% RIESGO	$127,800	$0	$0	$0	$0	$0	$127,800		SALUD TOTAL	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500		1.044% RIESGO	$127,800	$0	$0	$0	$0	$0	$127,800		SANITAS	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	12	$569,400		1.044% RIESGO	$51,300	$0	$0	$0	$0	$0	$51,300		NUEVA E.P.S.	12	$569,400	4%	$22,800	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	1	$47,450		1.044% RIESGO	$4,275	$0	$0	$0	$0	$0	$4,275		SALUD TOTAL	1	$47,450	4%	$1,900	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	28	$1,423,500		1.044% RIESGO	$127,800	$0	$0	$0	$0	$0	$127,800		SANITAS	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	COLPENSIONES	4	$189,800		1.044% RIESGO	$17,100	$0	$0	$0	$0	$0	$17,100		FAMISANAR	4	$189,800	4%	$7,600	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	21	$996,450		1.044% RIESGO	$89,805	$0	$0	$0	$0	$0	$89,805		SALUD TOTAL	21	$996,450	4%	$39,900	
						$1,423,500	No	Fijo	PROTECCION	1	$47,450		1.044% RIESGO	$4,275	$0	$0	$0	$0	$0	$4,275		NUEVA EPS NOVEDAD	1	$47,450	4%	$1,900	
						$1,423,500	No	Fijo		0	$0		0.00% RIESGO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		CONSALUD NOVEDAD	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500		1.044% RIESGO	$127,800	$0	$0	$0	$0	$0	$127,800		NUEVA E.P.S.	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500		1.044% RIESGO	$127,800	$0	$0	$0	$0	$0	$127,800		NUEVA E.P.S.	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500		1.044% RIESGO	$127,800	$0	$0	$0	$0	$0	$127,800		NUEVA E.P.S.	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	MR	Fijo	COLPENSIONES	1	$237,250		1.044% RIESGO	$21,300	$0	$0	$0	$0	$0	$21,300		SALUD TOTAL	1	$237,250	4%	$9,500	
						$1,423,500	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,423,500		1.044% RIESGO	$127,800	$0	$0	$0	$0	$0	$127,800		FAMISANAR	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500		1.044% RIESGO	$127,800	$0	$0	$0	$0	$0	$127,800		EPS SURA (ANTES SURAMUDI)	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	COLPENSIONES	2	$94,900		1.044% RIESGO	$8,550	$0	$0	$0	$0	$0	$8,550		SALUD TOTAL	2	$94,900	4%	$3,800	
						$1,423,500	No	Fijo	PROTECCION	6	$142,350		1.044% RIESGO	$12,800	$0	$0	$0	$0	$0	$12,800		NUEVA E.P.S.	6	$142,350	4%	$5,700	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	1	$47,450		1.044% RIESGO	$4,275	$0	$0	$0	$0	$0	$4,275		ASMET SALUD EPS SAS	1	$47,450	4%	$1,900	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500		1.044% RIESGO	$127,800	$0	$0	$0	$0	$0	$127,800		NUEVA E.P.S.	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,423,500		1.044% RIESGO	$127,800	$0	$0	$0	$0	$0	$127,800		NUEVA E.P.S.	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500		1.044% RIESGO	$127,800	$0	$0	$0	$0	$0	$127,800		NUEVA E.P.S.	30	$1,423,500	4%	$57,000	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C.	Total	DIS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$1,781,208						$1,513,240						$1,406,000				30		30		30		30	
	$37,800						$32,130						$29,820				30		30		30		30	
	$37,800						$32,130						$29,820				30		30		30		30	
63	$37,800		CAJASAN	30	$1,423,500	4%	$57,000	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	0.526%	1	$7,500	30	30	0%	30	0%	30	0%	30	0%	30	0
	$2,848,308						$1,972,260						$1,481,208				30		30		30		30	
	$2,848,308						$1,972,260						$1,481,208				30		30		30		30	
58	$32,800		CAJASAN	23	$869,400	4%	$32,800	COLPATRIA ARP	23	$869,400	0.960%	5	$31,920	23	23	0%	23	0%	23	0%	23	0%	23	0
58	$37,000		CAJASAN	30	$1,423,500	4%	$57,000	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	0.960%	5	$37,920	30	30	0%	30	0%	30	0%	30	0%	30	0
58	$37,000		CAJASAN	30	$1,423,500	4%	$57,000	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	0.960%	5	$37,920	30	30	0%	30	0%	30	0%	30	0%	30	0
58	$9,500		CAJASAN	7	$237,250	4%	$9,500	COLPATRIA ARP	7	$237,250	0.960%	5	$9,480	7	7	0%	7	0%	7	0%	7	0%	7	0
58	$37,000		CAJASAN	30	$1,423,500	4%	$57,000	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	0.960%	5	$37,920	30	30	0%	30	0%	30	0%	30	0%	30	0
58	$37,000		CAJASAN	30	$1,423,500	4%	$57,000	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	0.960%	5	$37,920	30	30	0%	30	0%	30	0%	30	0%	30	0
58	$22,800		CAJASAN	13	$615,900	4%	$24,600	COLPATRIA ARP	13	$615,900	0.960%	5	$23,760	13	13	0%	13	0%	13	0%	13	0%	13	0
58	$1,900		CAJASAN	1	$47,450	4%	$1,900	COLPATRIA ARP	1	$47,450	0.960%	5	$1,980	1	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1	0
59	$37,800		CAJASAN	30	$1,423,500	4%	$57,000	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	0.960%	5	$37,920	30	30	0%	30	0%	30	0%	30	0%	30	0
59	$7,600		CAJASAN	4	$189,800	4%	$7,600	COLPATRIA ARP	4	$189,800	0.960%	5	$7,580	4	4	0%	4	0%	4	0%	4	0%	4	0
59	$39,900		CAJASAN	21	$996,450	4%	$39,900	COLPATRIA ARP	21	$996,450	0.960%	5	$39,480	21	21	0%	21	0%	21	0%	21	0%	21	0
59	$1,900		CAJASAN	1	$47,450	4%	$1,900	COLPATRIA ARP	1	$47,450	0.960%	5	$1,980	1	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1	0
59	$37,800		CAJASAN	30	$1,423,500	4%	$57,000	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	0.960%	5	$37,920	30	30	0%	30	0%	30	0%	30	0%	30	0
59	$37,800		CAJASAN	30	$1,423,500	4%	$57,000	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	0.960%	5	$37,920	30	30	0%	30	0%	30	0%	30	0%	30	0
59	$37,800		CAJASAN	30	$1,423,500	4%	$57,000	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	0.960%	5	$37,920	30	30	0%	30	0%	30	0%	30	0%	30	0
59	$37,800		CAJASAN	30	$1,423,500	4%	$57,000	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	0.960%	5	$37,920	30	30	0%	30	0%	30	0%	30	0%	30	0
59	$9,500		CAJASAN	7	$237,250	4%	$9,500	COLPATRIA ARP	7	$237,250	0.960%	5	$9,480	7	7	0%	7	0%	7	0%	7	0%	7	0
59	$37,000		CAJASAN	30	$1,423,500	4%	$57,000	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	0.960%	5	$37,920	30	30	0%	30	0%	30	0%	30	0%	30	0
59	$37,000		CAJASAN	30	$1,423,500	4%	$57,000	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	0.960%	5	$37,920	30	30	0%	30	0%	30	0%	30	0%	30	0
59	$3,800		CAJASAN	2	$94,900	4%	$3,800	COLPATRIA ARP	2	$94,900	0.960%	5	$3,760	2	2	0%	2	0%	2	0%	2	0%	2	0
59	$5,700		CAJASAN	3	$142,350	4%	$5,700	COLPATRIA ARP	3	$142,350	0.960%	5	$5,640	3	3	0%	3	0%	3	0%	3	0%	3	0
59	$1,900		CAJASAN	1	$47,450	4%	$1,900	COLPATRIA ARP	1	$47,450	0.960%	5	$1,880	1	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1	0
59	$37,000		CAJASAN	30	$1,423,500	4%	$57,000	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	0.960%	5	$37,920	30	30	0%	30	0%	30	0%	30	0%	30	0
59	$37,000		CAJASAN	30	$1,423,500	4%	$57,000	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	0.960%	5	$37,920	30	30	0%	30	0%	30	0%	30	0%	30	0
59	$37,000		CAJASAN	30	$1,423,500	4%	$57,000	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	0.960%	5	$37,920	30	30	0%	30	0%	30	0%	30	0%	30	0

aportes en línea

Planilla Integrada

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION												SALUD					
Fecha Inicio vst	Fecha Fin vst	ige	Fecha Inicio ln	Fecha Fin ln	ing	Valor	Actual sit.	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Aca Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Retiro Subsistencia	Valor No Retenido	Total	APF Decreto	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	1.0%	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		NUEVA E.P.S.	30	$1,423,500	4%	$57,000

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
#	Tipo	VSP Sistema	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Descuento SENA e ICBF
58	$97,000		CAJASAN	30	$1,423,500	4%	$57,000	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	0.76%	I	$999,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
59	$22,889		CAJASAN	12	$569,400	4%	$22,800	COLPATRIA ARP	12	$569,400	0.76%	I	$39,900	12	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
60	$1,900		CAJASAN	1	$47,450	4%	$1,900	COLPATRIA ARP	1	$47,450	0.76%	I	$3,400	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
61	$1,900		CAJASAN	1	$47,450	4%	$1,900	COLPATRIA ARP	1	$47,450	0.76%	I	$3,400	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
62	$22,800		CAJASAN	4	$142,350	4%	$5,700	COLPATRIA ARP	3	$142,350	0.76%	I	$10,800	3	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
63	$364,800		CAJASAN	15	$1,516,850	4%	$14,700	COLPATRIA ARP	15	$1,516,850	0.76%	I	$43,000	15	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
64	$97,000		CAJASAN	30	$1,423,500	4%	$57,000	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	0.76%	I	$999,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
65	$97,000		CAJASAN	30	$1,423,500	4%	$57,000	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	0.76%	I	$999,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
66	$7,600		CAJASAN	4	$189,800	4%	$7,600	COLPATRIA ARP	4	$189,800	0.76%	I	$13,300	4	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
67	$7,600		CAJASAN	4	$189,800	4%	$7,600	COLPATRIA ARP	4	$189,800	0.76%	I	$13,300	4	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
68	$3,800		CAJASAN	2	$94,900	4%	$3,800	COLPATRIA ARP	2	$94,900	0.76%	I	$6,700	2	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
69	$3,800		CAJASAN	2	$94,900	4%	$3,800	COLPATRIA ARP	2	$94,900	0.76%	I	$6,700	2	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
70	$97,000		CAJASAN	30	$1,423,500	4%	$57,000	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	0.76%	I	$991,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
71	$97,000		CAJASAN	30	$1,423,500	4%	$57,000	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	0.76%	I	$991,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
72	$3,800		CAJASAN	2	$94,900	4%	$3,800	COLPATRIA ARP	2	$94,900	0.76%	I	$6,700	2	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
73	$9,500		CAJASAN	5	$237,250	4%	$9,500	COLPATRIA ARP	5	$237,250	0.76%	I	$16,600	5	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
74	$97,000		CAJASAN	30	$1,423,500	4%	$57,000	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	0.76%	I	$999,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
75	$97,000		CAJASAN	30	$1,423,500	4%	$57,000	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	0.76%	I	$999,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
76	$97,000		CAJASAN	30	$1,423,500	4%	$57,000	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	0.76%	I	$999,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
77	$97,000		CAJASAN	30	$1,423,500	4%	$57,000	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	0.76%	I	$999,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
78	$28,980		CAJASAN	11	$521,940	4%	$20,900	COLPATRIA ARP	11	$521,940	0.76%	I	$36,400	11	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
79	$5,700		CAJASAN	3	$142,350	4%	$5,700	COLPATRIA ARP	3	$142,350	0.76%	I	$10,000	3	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
80	$9,500		CAJASAN	5	$237,250	4%	$9,500	COLPATRIA ARP	5	$237,250	0.76%	I	$16,600	5	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
81	$1,900		CAJASAN	1	$47,450	4%	$1,900	COLPATRIA ARP	1	$47,450	0.76%	I	$3,300	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
82	$97,000		CAJASAN	30	$1,423,500	4%	$57,000	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	0.76%	I	$999,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
83	$97,000		CAJASAN	30	$1,423,500	4%	$57,000	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	0.76%	I	$999,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
84	$114,000		CAJASAN	30	$1,949,000	4%	$78,000	COLPATRIA ARP	30	$1,949,000	0.76%	I	$999,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
85	$10,200		CAJASAN	6	$0	4%	$0	COLPATRIA ARP	6	$474,300	0%	I	$0	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
86	$97,000		CAJASAN	30	$1,423,500	4%	$57,000	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	0.76%	I	$999,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
87	$97,000		CAJASAN	30	$1,423,500	4%	$57,000	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	0.76%	I	$999,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
88	$57,000		CAJASAN	12	$1,423,500	4%	$57,000	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	0.76%	I	$999,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
89	$9,080		CAJASAN	4	$227,000	4%	$9,100	COLPATRIA ARP	4	$227,000	0.76%	I	$16,000	4	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0

aportes en línea

Planilla Integrada

| EMPLEADO | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio ret	Fecha Fin ret	ret	Fecha Inicio VS	Fecha Fin VS	VSP	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotizante	Cotización Aportante Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No Retenido	Total	AVP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotizante	Valor UPC
						$1,423,500	No	Fijo	SOLIPENSIONES	9	$237,250			$28,500	$0	$0	$0	$0	$0	$28,500		FAMISANAS E.P.S.	9	$237,250	4%	$9,500	
																				$1,400,000						$2,365,500	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES									
E	Total	CPE Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa Adm	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
SU	$1,500		CAJASAN	1	$1,237,200	4%	$1,500	COLPATRIA ARP	1	$1,237,200	0.348%	1	$4,300	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	S
	$1,191,000						$1,029,000						$2,438,700				$0		$0		$0		$0	

2025/10/21 11:48 AM

compensar | miplanilla.com

REPORTE D[illegible]LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APO[illegible]TES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX
NI	901259283	PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS	calle 13c -12a-34 villas de don juan 2	3165366089	

FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
S	B	GAVIONES CAUCE	CAUCE	SANTANDER	BUCARAMANGA

DATOS DE LA PLANILLA

PERIODO LIQUIDACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO RADICACIÓN	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
SALUD		PENSIÓN, RIESGOS LAB, CAJA, SENA, ICBF						
MES	AÑO	MES	AÑO					
10	2025	9	2025	E	14 10 2025	90996508	SI	No

| CENTRO DE TRABAJO | | Todos | NÚMERO DE EMPLEADOS | | | | | ZT | | | | | NIT EMPRESA CONTENIDO | | | | | | | | Todos | | | | | | | |

compensar | miplanilla.com

REPORTE D[illegible]A PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APO[illegible]TES

PAGO $ [illegible] $

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUB COT	EXT	COL EXT	ESTR	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	EPS	APP	ARL	CCF	CODIGO EPS	IBC EPS	CÓDIGO AFP	IBC AFP	CODIGO ARL	IBC ARL	CÓDIGO CCF	IBC CCF
24	CC 1124244418	ALFONSO ROMERO YERSON DUVAN	1	0			SI	001	68	X															7	7	7	7	EPS037	$332,150	230301	$332,150	14-11	$332,150	CCF39	$332,150
25	PT 5066255	SALAZAR NAVAS ENDERBI ALEXANDER	1	0			SI	001	68																30	30	30	30	EPS041	$1,423,500	230301	$1,423,500	14-11	$1,423,500	CCF39	$1,423,500
26	PT 6103309	LEON ARANGUREN JUAN CARLOS	1	0			SI	001	68		X														19	19	19	19	EPS037	$901,350	230301	$901,350	14-11	$901,350	CCF39	$901,350
27	PT 6484810	SILVA BALAZA OMAR ENRIQUE	1	0			SI	001	68		X														17	17	17	17	EPS010	$806,850	230301	$806,850	14-11	$806,850	CCF39	$806,850
28	PT 6484810	SILVA BALAZA OMAR ENRIQUE	1	0			SI	001	68									X							1	1	1	1	EPS010	$47,450	230301	$47,450	14-11	$47,450	CCF39	$47,450
29	PT 6966502	GARCIA MORALES LUIS JOSE	1	0			SI	001	68																30	30	30	30	EPS037	$1,423,500	230301	$1,423,500	14-11	$1,423,500	CCF39	$1,423,500
30	CC 91103462	JIMENEZ LUIS FERNANDO	1	0			SI	001	68																30	30	30	30	EPS002	$2,521,739	230301	$2,521,739	14-11	$2,521,739	CCF39	$2,521,739
31	CC 91052196	LEAL SANABRIA LUIS ALEJANDRO	1	0			SI	001	68																30	30	30	30	EPS037	$1,423,500	230301	$1,423,500	14-11	$1,423,500	CCF39	$1,423,500
32	CC 91300995	VALBUENA SILVA JORGE	1	0			SI	001	68																30	30	30	30	EPS041	$1,739,130	230301	$1,739,130	14-11	$1,739,130	CCF39	$1,739,130

PAGADO

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ANEXO No. 4: INFORME DE CALIDAD.

INFORME PLAN DE CALIDAD 013

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR DE CENTROABASTOS MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)

CONTRATO Nº 210-15410-6

Fecha	Elaboró	Revisó	Aprobó
15/10/2025	Ing. Sindy Sared Cano	Ing. Santiago Serrano	Julián A Serrano Gómez

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3
1. CONSIDERACIONES GENERALES 3
2. GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO 4
2.1 Talento humano 4
2.2 Infraestructura 5
2.3 Conocimiento y toma de conciencia 7
2.4 Comunicaciones 7
2.5 Información documentada 8
3. OPERACIÓN 9
3.1 Planificación y control operacional 9
3.2 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 11
3.3 Control en la prestación del servicio 12
3.4 Liberación de productos y servicios 12
3.5 Control de salidas no conformes 12
3.6 Encuesta de satisfacción del cliente 13
4. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 13
5. AUDITORIAS INTERNAS 14
6. REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN 14
7. MEJORA CONTINUA 15
8. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 15
9. CONCLUSIONES 15
10. RECOMENDACIONES 15

INTRODUCCIÓN

El CONSORCIO CAUCE motivado a mejorar continuamente la eficacia de su sistema de gestión de calidad, se compromete en su participación directa, liderando, creando una cultura de calidad en la organización, fomentando la participación positiva de todo el personal en la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR DE CENTROABASTOS MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)".

El presente informe comprende el periodo entre el 01 y el 30 septiembre 2025, describe el cumplimiento de las actividades de los tres frentes de obra garantizando el aseguramiento y control de la calidad del proyecto contenidas en el plan de calidad del proyecto y el plan de inspección y ensayo. Los formatos utilizados para el seguimiento y control de este proyecto están acogidos al sistema de calidad de las empresas consorciadas.

Para el periodo se realizan las siguientes actividades:

- Suministro y vaciado de concreto de 3.000 psi para el recubrimiento de estructuras en gaviones.
- Suministro de lechada cementicia para llenado e inyección de anclajes.
- Suministro y colocación de anclajes de 3 cables ø=1/2" de L=20m.
- Ejecución de perforaciones horizontales para anclajes de 0,00 a 20m con su respectivo encamisado.
- Jacket de respaldo para revestimiento de la perforación horizontal en anclajes.
- Estructura de disipación de energía.
- Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" para los lloraderos en los muros gaviones.

1. CONSIDERACIONES GENERALES

CONTRATO DE OBRA	N° 210-15410-6
OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR DE CENTROABASTOS MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)".
ENTIDAD CONTRATANTE	CDMB – CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA.
SUPERVISOR CONTRATANTE	ARQ. CARLOS DIAZ BARRERA
CONTRATISTA	CONSORCIO CAUCE
REPRESENTANTE LEGAL	JULIAN ANDRÉS SERRANO GÓMEZ
NIT	901.855.581-5
INTERVENTORIA	CONSORCIO CENTROABASTOS
REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL FERNANDO QUIRÓS GÓMEZ
NIT	901.857.454-7
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	4 MESES
PLAZO ADICIONAL DE EJECUCIÓN	11 MESES
FECHA DE INICIO	06/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	30/11/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA- SANTANDER

2. GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO

2.1 Talento humano

El CONSORCIO CAUCE tiene establecido los perfiles y funciones de los cargos para el personal administrativo y obra. Para el periodo comprendido entre el 01 y el 30 septiembre 2025

se generó UN (1) ingreso por parte del consorcio y se registró UN (1) egreso de personal a la obra por parte del CONSORCIO CAUCE según la relación en la tabla.

INGRESO DE PERSONAL	
NOMBRE	**CARGO**
Baudillo Rivera Gomez	Ayudante de Obra
EGRESO DE PERSONAL	
Mayra Alejandra Quintero Delgado	Ingeniero Auxiliar

Para el periodo todas las novedades de personal se realizaron de acuerdo con lo establecido en la legislación laboral, fueron validadas y verificadas según lo establece la norma, el pago a los trabajadores hace parte de las obligaciones legales del CONSORCIO CAUCE y para el personal aliado hace parte de la obligaciones legales de Lerma Construcciones SAS Y Peñaranda Y Ramírez Construcciones SAS respectivamente, realizándose en los términos pactados y dejando su correspondiente registro documental, los soportes de pago de seguridad social, relación de personal aliado, para el periodo comprendido son verificadas en las entregas realizadas a interventoría en el informe de SST.

Anexo 1. Documentos soporte de ingreso y retiro de personal.

2.2 Infraestructura

El CONSORCIO CAUCE ha destinado como lugar de trabajo la oficina principal de la empresa MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS, la cual se encuentra ubicada en el Centro industrial y logístico San Jorge Bodega 16, esta oficina cuenta con la estructura y los espacios necesarios para llevar a cabo las actividades de revisión y ajustes de diseños.

Adicionalmente, se realizan visitas a la zona de influencia del proyecto, donde se realizan estudios topográficos que permiten la revisión y ajuste de los diseños, la obra cuenta con un campamento donde se almacenan los productos necesarios para el desarrollo de la obra.



Tabla 3. Ubicación del proyecto

En la ejecución de las actividades del periodo en mención, se utilizaron los siguientes equipos y maquinaria:

MAQUINARIA Y EQUIPO	
	
RETROEXCAVADORA DOOSAN DX225LCV	RETROEXCAVADORA DOOSAN DX225LCV
	
RETROEXCAVADORA DOOSAN DX225LCV	Minicargador BOB CAT 24
	
VOLQUETA	VOLQUETA
	
PAJARITA	MIXER & BOMBA DE CONCRETO (vehículo propiedad del proveedor)



UNIDAD DE INYECCIÓN



UNIDAD DE PERFORACIÓN MQ 17



COMPRESOR MQ 59

Anexo 2. Control de Maquinaria y equipo.

2.3 Conocimiento y toma de conciencia

El CONOSORCIO CAUCE tiene dentro de sus responsabilidades la capacitación y formación del personal, para el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de septiembre se presentaron 5 capacitaciones. 2 del área SST; Peligros físicos y cuidado visual; 2 capacitaciones del área ambiental; Normativa legal ambiental y Prevención de la contaminación de cuerpos de agua y redes de servicios públicos; y 1 capacitación social; Fortalecimiento de valores (tomar decisiones), educación vial y oficina de atención a la comunidad, ver soportes en los informes de SST y PASA anexos en el informe técnico.

2.4 Comunicaciones

La comunicación con las partes interesadas se realiza mediante, Bitácora de obra diaria, Comités técnicos, informes y control de la correspondencia y comunicaciones internas.

Durante el periodo establecido entre el 01 y el 30 de septiembre se realizaron dos comités técnicos y una reunión con el cliente, las actas de dichos comités se encuentran consignados en el informe técnico y el acta de reunión con la comunidad se entrega en el informe social entregados a la interventoría.

RELACIÓN DE COMITES	
COMITÉ	**FECHA**
Acta de Visita CDMB	23/09/2025
Acta de reunión No. 25	05/09/2025
Acta de reunión No. 26	17/09/2025

Con el personal vinculado durante este periodo se utilizaron medios tecnológicos aprobados por la gerencia como, sistema de gestión de personas, correo electrónico, mensajería instantánea y correspondencia interna para tener conocimiento de las actividades e información importante de la organización.

2.5 Información documentada

Los documentos internos y externos se mantienen controlados de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de control de documentos y registros, disponiendo de un mecanismo sistemático para editarlo, adecuarlo, aprobarlo, almacenarlo, distribuirlo, revisarlo, actualizarlo y generar un ciclo, los listados se entregan en los diferentes informes de SST y calidad.

Para el control documental del plan de calidad durante este periodo se utilizaron los siguientes procedimientos y formatos, los cuales se han tomado del sistema de gestión de calidad del contratista Maquinobras de Colombia S.A.S.

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS				
CODIGO	**NOMBRE**	**TIPO DE DOCUMENTO**	**VERSIÓN**	**FECHA**
RH-M-01	Manual de funciones y responsabilidades	Manual	6	28/05/2024
OB-P-31	Procedimiento de revisión y ajuste de diseños y desarrollo de proyectos	Procedimiento	1	01/12/2021
RH-F-28	Formato Asistencia de Entrenamiento ,Charlas y Capacitaciones por empresa	Formato	2	31/10/2022
SST-F-02	Formato de inducción y reinducción	Formato	4	02/01/2024
SST-F-03	Evaluación de inducción y reinducción	Formato	3	01/09/2022
SST-F-06	Notificación de riesgos en seguridad y salud en el trabajo	Formato	2	15/05/2020
SST-F-44	Ficha de indicadores	Formato	2	03/05/2021
SST-P-15	Procedimiento de reporte e investigación de accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades laborales	Procedimiento	3	01/11/2022
SST-P-19	Procedimiento para la entrega de Epp's	Procedimiento	3	27/07/2021
SST-P-20	Procedimiento de capacitación y entrenamiento	Procedimiento	2	24/05/2021

SST-PR-10	Programa para trabajo seguro en alturas	Programa	3	01/11/2023
SST-PT-01	Política de seguridad y salud en el trabajo	Política	2	21/04/2021
SST-R-01	Reglamento de higiene y seguridad industrial	Reglamento	2	10/03/2021

Adicionalmente, se deben tener en cuenta los documentos externos que son sugeridos por el cliente y en algunos casos por la interventoría. A continuación, se presentan los documentos identificados a la fecha:

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS	
NOMBRE	**TIPO DE DOCUMENTO**
Contrato de obra	Documento
Pólizas del contrato	Documento
Acta de inicio	Formato
Informe semanal de obra	Formato
Acta de comité técnico	Formato
Control de asistencia a reuniones	Formato

El CONSORCIO CAUCE conservará los registros de calidad durante cinco (5) años; al cumplirse este período, y un mes antes de destruir dichos registros, se informará a la CDMB – CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA sobre tal acción, y si éste lo considera adecuado, podrá conservarlos, evitando así su destrucción.

Los documentos generados a la fecha se encuentran en custodia del director de Obra, quien realiza su respectiva conservación y control.

3. OPERACIÓN


3.1 Planificación y control operacional.


En la ejecución del proyecto CAUCE, orientado a la estabilización de la banca y mitigación del riesgo de la margen derecha del Río de Oro mediante la construcción de gaviones, se han implementado controles operacionales para garantizar la calidad de los trabajos de los cuales para el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de septiembre 2025, se desarrollaron las siguientes actividades contempladas en el cronograma de trabajo y según el avance de obra comprendidas por el suministro y vaciado de concreto de 3.000 psi para el recubrimiento de las estructuras en gaviones, la inyección de lechada cementicia para el llenado de anclajes, y la instalación de anclajes conformados por tres cables de ½" y 20 m de longitud. Asimismo, se ejecutaron perforaciones horizontales con su respectivo encamisado y jacket de respaldo, se construyó la estructura de disipación de energía, y se instaló la tubería sanitaria de 2" para los

lloraderos en los muros gaviones. cumpliendo con los lineamientos del diseño y la programación establecida.

Durante el período mencionado, se ha logrado avanzar conforme a lo establecido en la programación inicial del proyecto. Las actividades planificadas para esta etapa han sido ejecutadas de manera progresiva y organizada, empleando estrategias para mitigar el impacto negativo que se ha mantenido respecto a las altas precipitaciones del rio.

El informe técnico correspondiente detalla de manera clara y precisa el desarrollo de las tareas realizadas, evidenciando el progreso alcanzado en cada una de las actividades contempladas. Este documento permite verificar que se han seguido los lineamientos establecidos, garantizando así la coherencia entre la planificación y la ejecución.

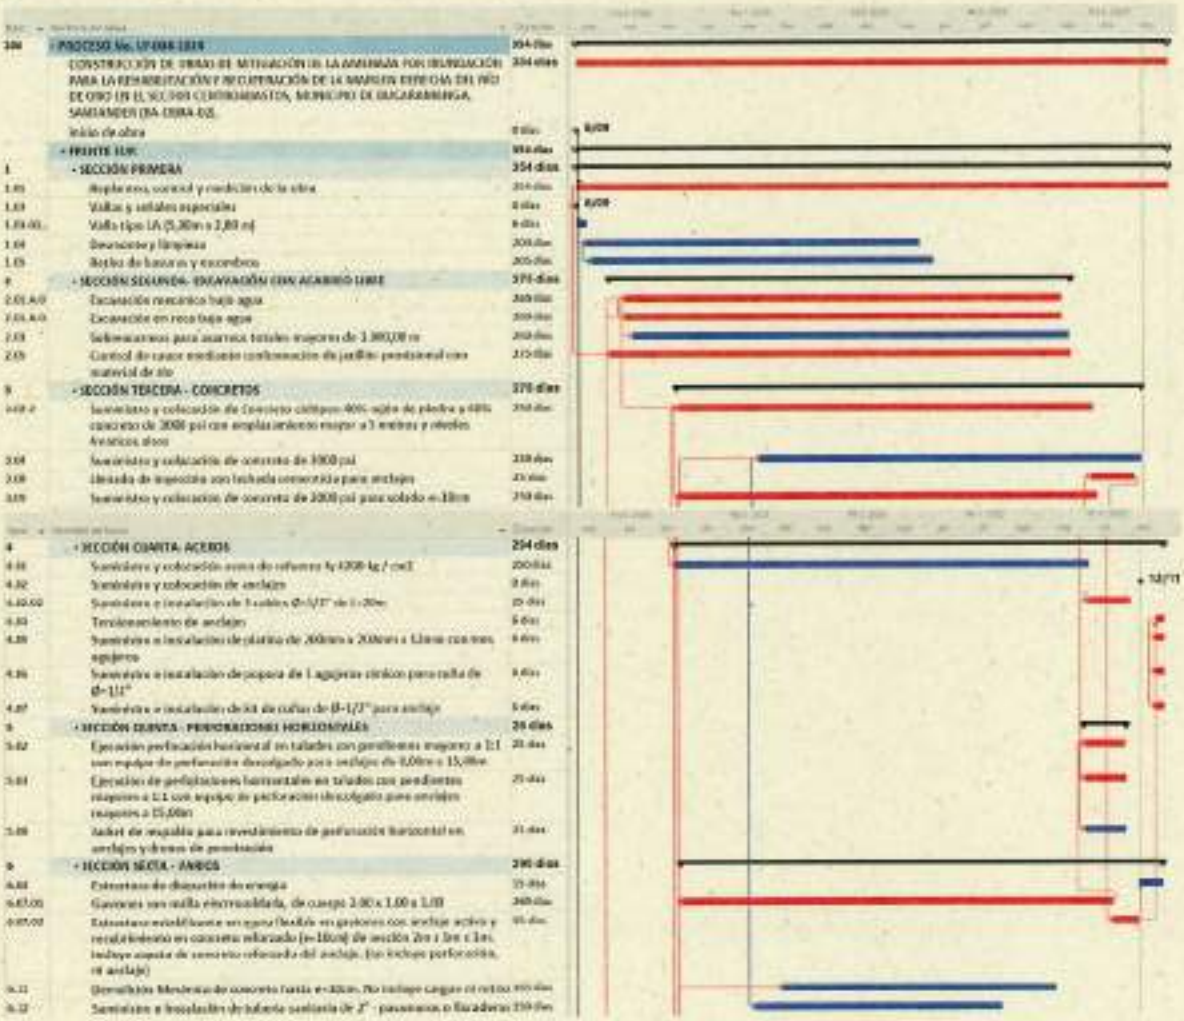

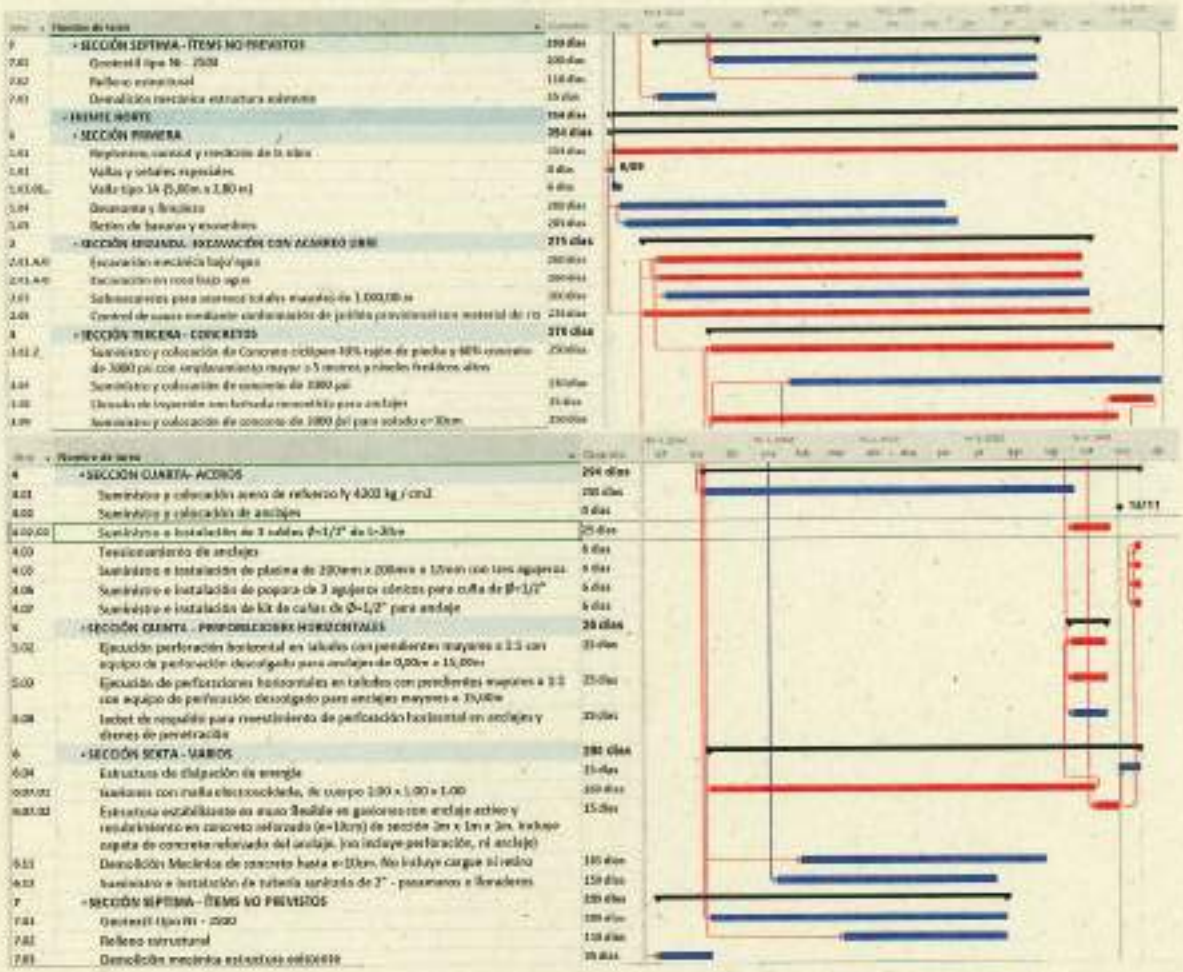

3.2 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente

En el periodo se realizó la adquisición de los siguientes materiales ya que las actividades a ejecutar lo requieren.

LISTA DE MATERIALES
ACERO
ALAMBRE
CEMENTO
GAVIONES
DIAFRAGMAS DE GAVIONES
MALLAS

Para el periodo no se presenta evaluación de proveedores, ya que la selección de proveedores se realizó de acuerdo a la evaluación realizada en mayo 2025 por la empresa consorciada MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS el cual garantiza las actividades de compras involucradas con la ejecución del proyecto.

Anexo 3. Control de ingreso y salida de material.- certificados de calidad.

3.3 Control en la prestación del servicio

Ejecución de la revisión y ajuste de diseños, se ha dado cumplimiento al procedimiento de desarrollo y ajuste de diseños, donde se especifican las actividades que componen este proceso, se tiene como soporte, control y trazabilidad de las actividades:

1. Informes semanales/mensuales.
2. Fotografías.
3. Actas de comités.
4. Carteras topográficas.
5. Bitácora de obra.

Esta información se encuentra consignada en los informes mensuales de avance de obra.

3.4 Liberación de productos y servicios.

Para el control de los materiales y procesos constructivos se realiza seguimiento al plan de inspección y ensayo, se presenta resultados del ensayo de resistencia a la compresión realizado sobre cilindros de concreto, siguiendo la norma **INV E-410-13**. Los ensayos fueron realizados en el laboratorio de **Hidrosuelos de Colombia S.A.S.** y corresponden a muestras tomadas por el **Consorcio Cauce**.

Para el periodo comprendido no se realiza la revisión y ajuste de los diseños, donde se requiere de estudios y recolección de información para realizar los cambios que sean necesarios, el especialista encargado mediante documento escrito y reuniones periódicas, las cuales son evidenciadas en las actas de reunión, hace las respectivas aclaraciones y conciliaciones de los diseños.

Para el desarrollo de esta actividad se cuenta con un equipo de topografía el cual se encuentra calibrado de acuerdo a las especificaciones del equipo.

Anexo 4. Resultado de ensayos.

3.5 Control de salidas no conformes.

Durante el periodo no se identificaron elementos que no cumplieran con los requisitos de conformidad, por lo que no fue necesario implementar ningún tratamiento de acuerdo con lo dispuesto en el procedimiento de producto no conforme.

3.6 Encuesta de satisfacción del cliente.

En el sector de la contratación con el Estado colombiano tanto los requisitos como la satisfacción del cliente se encuentran manifiestos de forma escrita, en el caso de los requisitos se manifiestan en los términos de referencia, contrato o especificaciones. Las actas de recibo parcial mensuales de avance de obra y acta de recibo definitivo revisadas, aceptadas y recibidas manifiestan la satisfacción del cliente a través de la interventoría y/o supervisor de la entidad, por lo cual para los proyectos de obra pública lo establecido por el CONSORCIO CAUCE se convalida como demostración de satisfacción del cliente las actas parciales de avance aprobadas y el acta de recibo final.

A la fecha no se han recibido actas que manifiesten la no conformidad del cliente y por los avances en obra no se han realizado encuestas o comunicados que aprueben la satisfacción de las demás partes interesadas.

4. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Para el seguimiento, medición, análisis y evaluación de la gestión de calidad del proyecto, para el periodo establecido se miden los siguientes indicadores a corte del 30 septiembre de 2025:

INDICADOR	FRECUENCIA	META	LOGRO
Cumplimiento del avance de obra	Mensual	>90%	76.06%
Atención de quejas	Mensual	100%	No se recibieron quejas en el periodo.
Desempeño de los proveedores externos	Anual	>80%	93% realizada el mes de mayo 2025.
Multas en el periodo	Mensual	0	No se han presentado multas
Ejecución del Plan de Capacitación y Formación	Mensual	100%	100%

- Para el periodo comprendido entre el 01 y el 30 septiembre 2025 se evidencia avance en la programación de las actividades de forma simultánea en los tres frentes de obra activos con un porcentaje del 66,48% de las actividades proyectadas, sin embargo, por el impacto climático que se está presentando en la zona debido a las fuertes lluvias se ve reflejado el 87,40% de lo proyectado, desde el área técnica junto con la interventoría se está avanzando en las estrategias para mitigar y continuar con el desarrollo del as actividades previstas.
- En el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de septiembre 2025 no se recibieron quejas por parte de las partes interesadas.
- Dentro del periodo establecido no se reportaron productos no conformes y/o presentación de quejas, manteniendo los indicadores satisfactorios.
- Durante el periodo no se presentan multas al proyecto, por lo cual el indicador se mantiene satisfactorio.
- Para el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de septiembre se presentaron 5 capacitaciones. 2 del área SST; Peligros físicos y cuidado visual; 2 capacitaciones del área ambiental; Normativa legal ambiental y Prevención de la contaminación de cuerpos de agua y redes de servicios públicos; y 1 capacitación social; Fortalecimiento de valores (tomar decisiones), educación vial y oficina de atención a la comunidad, ver soportes en los informes de SST y PASA anexos en el informe técnico.
- Los indicadores asociados a SST se encuentran establecidos en el informe SST del periodo.
- Los indicadores asociados al medio ambiente se encuentran establecidos en el PASA del proyecto.

Ver Anexo 5. Ficha de indicadores.

5. AUDITORIAS INTERNAS

La auditoria interna del Sistema de Gestión Integrado se realizó en el mes de junio, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos, evaluar la eficacia de los procesos y asegurar la mejora continua de las actividades, este proceso se llevó a cabo en la obra el día 20 junio de 2025.

6. REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN

La revisión por parte de la dirección para temas organizacionales y de calidad se realiza anualmente, para el periodo establecido se realizó la revisión por la dirección el 08 agosto 2025.

Adicionalmente, se realiza revisión del contrato mediante comités de obra semanales o según lo establezca en conjunto con la interventoría donde se evaluará el avance del proyecto de acuerdo con la programación de obra, verificando tiempos de ejecución y programa de

inversión, a la fecha no se han evidenciado factores de preocupación en el desarrollo de la obra.

7. MEJORA CONTINUA

El CONSORCIO CAUCE durante el periodo organizó con el equipo de trabajo encargado de la ejecución del proyecto un plan de mejora de procesos enfocado en identificar los eslabones débiles en la cadena de procesos o cuellos de botella que impiden el trabajo tanto administrativos, de apoyo como de construcción, y luego encontrar formas de rectificar esas ineficiencias.

A la fecha no se han identificado procesos o actividades que perjudiquen el avance en el proyecto.

8. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

En este periodo no se presentan acciones correctivas y preventivas.

9. CONCLUSIONES

1. Se realizaron reuniones
2. Se cuenta con los equipos y la infraestructura necesaria para ejecutar las actividades de este periodo a satisfacción.
3. Se cuenta con registros y soportes que permiten llevar el seguimiento del proyecto,
4. Se han realizado los respectivos informes y actas de comité que soportan dicho seguimiento.
5. No se han presentado quejas, multas o productos no conformes que interfieran con las actividades del proyecto.

10. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda continuar con la elaboración de informes y actas de comités del proyecto que permitan realizar el correcto seguimiento de las actividades y registro de las estrategias que soportan el impacto climático por la alta precipitación fluvial en la zona de la obra.
2. Planear detalladamente las actividades del proyecto y realizar seguimiento a los equipos y/o materiales que se requieran.
3. Seguir con el detalle de las estrategias de mitigación del impacto climático en la obra con el fin de seguir cumpliendo con las actividades programadas y la entrega oportuna de la obra.

Anexo 1. Documentos soporte de ingreso y retiro de personal.

NOMBRE DEL EMPLEADOR:	**CONSORCIO CAUCE**
NIT:	**901.855.581-5**
DOMICILIO DEL EMPLEADOR:	**Centro Industrial y Logístico San Jorge - Bodega 16, Girón, Santander**
NOMBRE DEL TRABAJADOR:	**Baudillo Rivera Gomez**
OFICIO QUE DESEMPEÑARA	**Ayudante de Obra**
IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJADOR:	**Cédula de Ciudadanía: 1.093.738.325**
JEFE INMEDIATO:	**Santiago Serrano Trujillo**
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:	**Ingeniero Auxiliar**
IDENTIFICACION DEL JEFE INMEDIATO:	**Cédula de Ciudadania: 1.098.822.060**

DESCRIPCION DEL CARGO

 Objetivo: Realizar actividades asignadas para la ejecución de obras civiles, optimizando los recursos dispuestos en la ejecución de sus labores.

✔ Funciones Principales:
• Limpiar y preparar terrenos de construcción.
• Preparar y disponer los concretos y morteros de acuerdo con las instrucciones del oficial a cargo.
• Apoyar los movimientos de tierra atendiendo las indicaciones (excavaciones, rellenos, cargue de volqueta, etc).
• Cargar y descargar materiales de construcción y moverlos a las áreas de trabajo.
• Apoyar en el montaje y desmontaje de andamios y barricadas en los sitios de construcción.
• Mezclar, regar y extender materiales como asfalto y concreto.
• Nivelar el terreno utilizando herramientas menores propias de la actividad en ejecución de acuerdo a especificaciones.
• Retirar los escombros y otros desechos de los sitios de construcción utilizando rastrillos, palas, carretillas y otro equipo.
• Realizar las actividades de mantenimientos preventivos y correctivos de las instalaciones locativas.
• Realizar las actividades de orden y aseo de las instalaciones locativas.
• Realizar todas las demás funciones que sean asignadas por el superior inmediato y que correspondan a la naturaleza del cargo.

Responsabilidad con el sistema de gestión integral (SST, CALIDAD Y AMBIENTAL):
• Conocer y aplicar las políticas de la organización, los objetivos del Sistema de Gestión Integral, ejecutando las actividades asignadas en los procedimientos, instructivos y perfiles de cargo.
• Procurar el cuidado integral de su salud suministrando información clara, completa y veraz sobre el mismo.
• Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión Integrado.
• Asistir procesos de inducción y entrenamientos en temas del SGI.
• Participar en las actividades de capacitación definidas en los planes de capacitación de

SG-SST y organizacional.
• Informar oportunamente al jefe inmediato o al coordinador SST acerca de peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo, así como de nuevos aspectos e impactos ambientales asociados a sus actividades.
• Cumplir con los requisitos legales aplicables SST, Ambiental y otros compromisos que adquiera la empresa con el reglamento interno de trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial.
• Demostrar compromiso a través de una participación activa y visible con el Sistema de Gestión Integral.
• Reportar los accidentes que se presenten en su puesto de trabajo y suministrar la información verídica y oportuna para elaborar reporte y la investigación del mismo.
• Reportar los aspectos e impactos ambientales que se puedan generar en su lugar de trabajo.
• Reportar al COPASST y/o supervisor de Seguridad y salud en el trabajo los nuevos peligros, riesgos, aspectos e impactos, así como actos y condiciones inseguras, oportunidades de mejora y sugerencias para el Sistema de Gestión.
• Aplicar las actividades de seguridad como orden y aseo, pausas activas, prevención de lesiones musculares y los programas y procedimientos de la gestión ambiental.
• Cumplir con los lineamientos establecidos en los programas ambientales de la organización.
• Hacer uso de los elementos de protección personal y seguridad industrial requeridos.
• Participar de los simulacros de emergencias de SST y Ambientales definidos en el plan de actividades de la Organización.
• Firmar los Formatos de permisos de trabajos con actividades críticas (ats, aptitud física, entre otros) diligenciados por el coordinador de alturas y /o responsable de la actividad.
• Hacer uso de los elementos de protección personal y seguridad industrial requeridos.
• Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del SGI.

Doy fe de haber recibido a satisfacción los elementos, dotación, funciones y responsabilidades de mi cargo, las políticas y procedimientos de la empresa de acuerdo al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.

Fecha de entrega y socialización del manual de funciones y responsabilidades 2025-09-18.

Firma de Recibido:

Firmado electrónicamente por:

Nombre	Baudilio Rivera Gomez
Número de Documento	1.093.738.325
Email	arrigierubiokatha@gmail.com
Fecha	26/09/2025 a las 16:58
IP	179.19.77.0
Token	4a5dd72f768f359dedfed60d6a613a1e

Verifique la validez de este documento escaneando el siguiente código



CONSORCIO	**Preaviso Terminación del Contrato a Termino Fijo**	**Código** RH-F-18 **Fecha** 27/08/2024 **Versión** 3

Girón, 12-agosto-2025

Señor(a)

Mayra Alejandra Quintero Delgado

Cédula de Ciudadanía 1.095.831.315

Ingeniero Auxiliar

Asunto: Preaviso de terminación de contrato de trabajo a termino fijo.

Me permito comunicarle que en virtud a que el término de vigencia pactado en el contrato individual de trabajo suscrito con usted está próximo a vencerse, esta empresa ha decidido no darlo por prorrogado. Por lo anterior, le comunico que se ha decidido dar por terminado su contrato de trabajo, de conformidad con el artículo 61 numeral C del Código Sustantivo del Trabajo.

Le indicamos que la fecha de terminación de su contrato se hará efectiva a partir del día**30-septiembre-2025** Por lo tanto, terminada la jornada laboral debe contactarse con el área de gestión humana para iniciar el tramite para su liquidación de prestaciones sociales y salario adeudados conforme a lo enunciado en el Código Sustantivo del Trabajo. Adicional debe solicitar la orden para realizarse exámenes de egreso, para lo que tendrá 5 días siguientes a su retiro.

Es oportuno manifestarle nuestro agradecimiento por su labor prestada en la empresa, por lo que nos vemos en la obligación de resaltar y aplaudir su desempeño.

Atentamente,

Darly Paola Peñaranda Rodriguez

Coordinador de Gestión Humana

Contacto: gestion.humana@jsgingenieria.com.co

Recibí:

Firmado electrónicamente por:

Nombre	Mayra Alejandra Quintero Delgado
Número de Documento	1.095.831.315
Email	alejandra01quintero@gmail.com
Fecha	12/06/2025 a las 10:25
IP	181.48.103.202
Token	c26a58b467857e82d0b47aa6c6089e59

Verifique la validez de este documento escaneando el siguiente código

Anexo 2. Control de Maquinaria y equipo.

MAQUINARIAS DE COLOMBIA	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MAQUINARIA	Código	GM-F-28
		Fecha	10/09/2022
		Versión	2
		Página 1 de 2	

TIPO DE MAQUINARIA | **COMPRESOR**

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	ID INTERNO	UBICACIÓN
Hy Alberto Cano	# 59	Bucaramanga

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES	septiembre			AÑO	2025		
			01	02	03	04	D/A	D/A	D/A	
1	REVISION DIARIA	Estructura de soporte en buena condición	✓	✓	✓	✓				
2		Patas de anclaje en buena condición	✓	✓	✓	✓				
3		Unidad en buen estado	✓	✓	✓	✓				
4		Motor en buen estado	✓	✓	✓	✓				
5		Tanque de combustible en buen estado	✓	✓	✓	✓				
6		Válvula de seguridad funcionando	✓	✓	✓	✓				
7		Salida de Aire en buen estado	✓	✓	✓	✓				
8		Nivel de aceite de motor	✓	✓	✓	✓				
9		Nivel de refrigerante	✓	✓	✓	✓				
10		Nivel de aceite en la unidad	✓	✓	✓	✓				
11		Control de fugas	✓	✓	✓	✓				
12		Válvulas de alivio operando	✓	✓	✓	✓				
13		Mangueras con abrazaderas en buen estado	✓	✓	✓	✓				
14		Racores de empalme en buena condición	✓	✓	✓	✓				
15		Encendido del motor en buena condición	✓	✓	✓	✓				
16		Barra de remolque, palanca de freno de mano, accionador de rearme y todas las partes móviles para facilitar el movimiento (tiro)	✓	✓	✓	✓				
17		Acoples rápidos de mangueras con seguros	✓	✓	✓	✓				
18		Indicadores de tablero (horómetro, manometro de presión de aire, aceite de motor, refrigerante)	✓	✓	✓	✓				
19		Sistema de enfriamiento	✓	✓	✓	✓				
20		Estado de llantas	✓	✓	✓	✓				
21		Estado de Sistema de muelles de amortiguacion	✓	✓	✓	✓				
22		Baterias y cables	✓	✓	✓	✓				
23		Estado general del motor	✓	✓	✓	✓				
24	SEMANAL	Verificar estado de botiquin.			✓	✓				
25		Verificar estado de la pintura.	✓	✓	✓	✓				
26		Verificar estado de seguros de las puertas laterales	✓	✓	✓	✓				

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

X Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

IV. OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	GMF-28
Fecha	10/11/2012
Versión	2
Página 1 de 2	

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Bucaramanga

OPERADOR: Luis Alberto Cano

PROYECTO: Consorcio Cano

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	01-09-25	02-09-25	03/09	04/09	05/09	06/09	
HORÓMETRO	3350	3357	3365	3373	3381	3389	
COMBUSTIBLE	40 gl	35 gl	30 gl	50 gl	40 gl		
ACEITE DE MOTOR	✓	✓	✓	✓	✓		
REFRIGERANTE	✓	✓	✓	✓	✓		
ACEITE DE LA UNIDAD	✓	✓	✓	✓	✓		
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Luis Alberto C.
FECHA	01-09-25 - 05-09-25
FIRMA INSPECCION	
FECHA	

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: CENTRO ABASTOS
OPERADOR: FRANCISCO ALBERTO O
PROYECTO: CONCRETO CAFE

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	1	2	3	4	5	6	
HORÓMETRO	1692.1	1693.5	1695.3	1681.7	1629.8	1699.0	
COMBUSTIBLE	60	✓	✓	55	✓	✓	
ACEITE MOTOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ACEITE HIDRAULICO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ACEITE TRANSMISION	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GRASA	✓	✓	✓ 1 CARGA	1 CARGA	1 CARGA	1 CARGA	
REFRIGERANTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	
FECHA	1-30-7-2025
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

TIPO DE MAQUINARIA

METODO ESCALERA DE TIJERA

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CEDULA	N. INTERNO	HORA	MOTIVO
ENRIQUE A BECERRA O	1065622021	74	08:40	CAMBIOS

INSPECCIÓN

	CRITERIO DE CONTROL	MES	1	2	3	4	5	6
			2	TIEMPOS				2025
1	Verificar el funcionamiento de todos los tipos suspendido, de la bocina y de las luces indicadoras y de seguridad de la cabina de control.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Verificar estado de extintor de emergencia.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Verificar estado del botiquín.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Verificar estado de herramientas (llaves, martillo).		✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Verificar estado de pinchos.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Verificar estado de los neumáticos.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Verificar cinta antideslizante.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Verificar estado de extintor y cilindro.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Verificar accidentes y cumplir día anterior.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	Confirmar el correcto funcionamiento del dinamo de seguridad.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	Verificar circuitos de baterías.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	Controlar el sistema de elevación de alta (Limite Alto).		✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	Verificar el interior de emergencia (Freno de emergencia).		✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	Verificar el funcionamiento de las conexiones (Manguera, refrigerante, combustible, conexión).		✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	Controlar el nivel de aceite del motor.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	Controlar el nivel de aceite hidráulico.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	Controlar el nivel de combustible.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	Controlar el sistema de combustible y el drenaje de agua según sea necesario.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	Verificar estado del mangueras.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	Verificar el funcionamiento de todas las luces de advertencia y alarma del tanque.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	Engrasar pasadores de cilindro, brazo y accesorio frontal.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	Inspeccionar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el humo (no excesivo durante la prueba de arranque y con temperatura operativa normal). Escuchar si hay ruidos anormales.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	Verificar el sistema de cableado.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	Engrasar el cojinete de Giro.		✓	✓	✓			
29	Verificar estado del botiquín.							
30	Inspeccionar el extintor(es) del motor.							
31	Revisar si la puerta del operador del motor tiene gancho, pestillo y de tener cumplir.							
32	Limpiar el motor, enfriador, radiador del refrigerante de aceite y el cableado (marcado).							
33	Verificar estado de Cabina.							
34	Verificar estado de las cuerdas.							
35	Controlar el nivel de aceite del motor de tracción.							
36	Verificar el estado general del cuerpo (luces, pasadores, tornos, escuchar).							
37	Inspeccionar que las ruedas tengan la tensión correcta, y que no haya estado flojas, gastadas o dañadas (rodillos, tapones, motivo, guías).							

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de evaluación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple tener observaciones.

OBSERVACIONES

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	
Fecha	
Versión	1
Página	1 de 1

TIPO DE MAQUINARIA

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR				
MAURICIO A BECERRA O	1006422731	74	DE 40	C ABASTOS

INSPECCIÓN

CRITERIOS DE CONTROL	MES					
	8	9	10	11	12	
Verificar el funcionamiento de todos los tanques hidráulicos, de la bomba y de las líneas hidráulicas y de engrase en la totalidad de cilindros	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar ajustes de ejercicio de cilindros	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar el ajuste sobre mandíbulas	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar ajustes de tornillería (Pernos, tuercas)	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar ajuste de las mangas	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar ajuste de los retenes	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar ajuste correspondiente	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado de cadenas y rodillos	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar el estado y ajustes de la cuna	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar el correcto funcionamiento del sistema de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar pico-flauta del pescante	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar el estado de aditivos de pico y cuna (Dientes)	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar el estado de extintor (Fecha de vencimiento)	✓	✓	✓	✓	✓	
Lubricar todas las graseras y articulaciones hidráulicas en la maquinaria	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar el funcionamiento de todos los instrumentos	✓	✓	✓	✓	✓	
Revisar el funcionamiento de las luminarias (Direccionales, reflectores, luz interior, cornetas)	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar el nivel de aceite del motor	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar el nivel de aceite hidráulico	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar el nivel de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar el sistema de combustible y el drenaje de agua, vapor son necesario	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar el sistema refrigerante y radiador si es necesario	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar el nivel de aceite del biodiesel de inyección de gas	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado de mangueras	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar el funcionamiento de todos los sensores, las alarmas y bocina del pluto	✓	✓	✓	✓	✓	
Engrasar pescante en pluma, brazo y accesorio frontal						
Arranque el motor, verificar la capacidad de aceleración y observar si todo se encuentra normal la presión en manómetros y con temperaturas operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar el estado del acumulador	✓	✓	✓	✓	✓	
Limpiar el cojinete de Giro.	✓					
Verificar estado de baterías.						
Engrasar todos los elementos del motor.						
Revisar si la bomba del electrolito del motor tiene grietas, desgaste o de tamaño anormal.						
Revisar si hay fugas anormales debajo del refrigerante de aceite y el radiador diagnóstico.						
Verificar estado de baterías						
Verificar estado de las cuchillas						
Controlar el nivel de aceite del motor de tracción						
Verificar el estado general del cable, frenos, pasadores, pernos, engrasarlos						
Inspeccionar que los cilindros tengan la presión correcta, que no haya pérdida. Todas (gatillos y defectos: cerillas, cilindros, cortinas, guías)						

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y no cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple debe observarse

OBSERVACIONES

- EL DIA 10-SEP SE AFILA EL AIRE ACONDICIONADO Y SE CAMBIAN LOS ORINGS.
- BUJES Y PALADARES DEL BALDE DESGASTADOS POR LA ARENA DE LAS EXCAVACIONES.



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: CENTRO ABASTOS
OPERADOR: MAURICIO A BECERRA O
PROYECTO: CONSORCIO CAXÉ

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	2	9	10	11	12		
HOROMETRO	1702.7	1709.4	1716.1	1721.9	1730.4		
COMBUSTIBLE	✓	60	✓	✓	✓		
ACEITE MOTOR	✓	✓	✓	✓	✓		
ACEITE HIDRAULICO	✓	✓	✓	✓	✓		
ACEITE TRANSMISION	✓	✓	✓	✓	✓		
GRASA	L CARGA	L CARGA	L CARGA	L CARGA	L CARGA		
REFRIGERANTE	✓	✓	✓	✓	✓		
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	
FECHA	8-SEP-2023
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA SY 135C8

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CEDULA	N° INTERNO	HORA	AREA/CC
VELASCO J PEDRO O	1065[illegible]991	74	01 40	C. MEDIDORES

INSPECCIÓN

CRITERIO DE CONTROL	MES: SEPTIEMBRE 2025					
	16	17	18	19	20	
Verificar el funcionamiento de luces (de frenos, direccionales, de la cabina y de las luces estacionarias) y de retroceso. De no cumplir no operar	✓	-	✓	✓	✓	✓
Verificar estado de extintor de incendios	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado cinturón pantalonero	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado de limpiaparabrisas (líquido, plumillas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado de espejos	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar ajuste de los pedales	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar aire acondicionado	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado de pasadores y pasadores	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar ajustadores y seguros de la cabina	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cuidar en el momento funcionamiento del extintor de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar uso correcto de cinturones	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Comunicar el sistema de comunicación de alta (Cargue Alto)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar el manejo de extintor manual. Ubicarlo de emergencia	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mantenimiento de las grasas a satisfacción satisfactoria de la maquina	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar el funcionamiento de todas las alarmas/luces	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar el funcionamiento de las indicaciones (retroceso, refrigerante, hidráulico, combustible)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Controlar el nivel de aceite del motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Controlar el nivel de aceite hidráulico	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Controlar el nivel de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Controlar el sistema de combustible y en drenaje de agua, según sea necesario	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Controlar el nivel de aceite con indicación de reducción de giro	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado de mangueras	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar el funcionamiento de todos los frenos de servicio y de parada del motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Limpiar elementos de aceite, motor y aceite/otro material	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar el nivel, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape (cuando la puesta en marcha y con temperatura ligeramente normal. Especificar si hay color anormal)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar el sistema de limpieza	✓		✓		✓	
Limpiar el exterior de vidrio	✓					
Verificar estado de bateria						
Inspeccionar el ventilador del motor						
Verificar la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta						
Limpiar el radio enfriador, sistema del refrigerante, el aceite y el radiador enfriado						
Verificar estado de batería						
Verificar estado de los pernos						
Controlar el nivel de aceite del motor de mando						
Verificar el estado general del cable (fleno, pasadores, pernos, engrasadores)						
Inspeccionar que las etiquetas de la maquina estén completas, y que no hayan piezas flojas, partidas o faltantes (cabina, capotes, cofres, guías)						

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

X Se ejecuta la actividad y no cumple con el criterio de aceptación. Se no cumple tiene observación

OBSERVACIONES

- BUJES Y PASADORES DEL BALDE DESGASTADOS POR LA ARENA EN LAS EXCAVACIONES

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: CENTRO ADIESTR
OPERADOR: LLAMADO A RESERVA O
PROYECTO: CONSORCIO CAVE

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	15	16	17	18	19	20	
HORÓMETRO	17380	17426	17521	17554	17733	17830	
COMBUSTIBLE	60	✓	✓	60	✓	✓	
ACEITE MOTOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ACEITE HIDRAULICO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ACEITE TRANSMISION	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GRASA	LCARGA	LCARGA	LCARGA	LCARGA	LCARGA	LCARGA	
REFRIGERANTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	
FECHA	15-SEP-2025
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	
Fecha	
Versión	
Página	

TIPO DE MAQUINARIA

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERARIO	CARGO	N° INTERNO	MES	OBSERVACIÓN
MARICIO A. BARRERA O	INGENIERO	7A	DE 140	L. ABASTOS

INSPECCIÓN

CRITERIO DE CONTROL	MES					2023
	22	23	24	25	26	
Verificar el funcionamiento de todos los luces exteriores, de la cabina y de las luces adicionales y de seguridad en el momento de encender	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado de cuadro de mandos	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado cinturón de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar niveles de lubricación (Aceite, refrigerante)	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado de neumáticos	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado de los espejos	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar alarma de retroceso	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar pito automáticamente	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado del extintores y botiquín	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar limpiabrisas y estado de brazos	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar el correcto funcionamiento del estado de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar pito alarma de retroceso	✓	✓	✓	✓	✓	
Examinar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro)	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar el correcto funcionamiento de frenos de estacionamiento	✓	✓	✓	✓	✓	
Inspeccionar si hay grietas o modificaciones no autorizadas en la estructura	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar el funcionamiento de todos los cinturones	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar el funcionamiento de los accesorios hidráulicos, refrigerantes, herramienta neumática	✓	✓	✓	✓	✓	
Comprobar el nivel de aceite del motor	✓	✓	✓	✓	✓	
Comprobar el nivel de aceite hidráulico	✓	✓	✓	✓	✓	
Comprobar el nivel de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	
Comprobar el problema de combustible y el drenaje de agua, según sea necesario	✓	✓	✓	✓	✓	
Comprobar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario	✓	✓	✓	✓	✓	
Comprobar el nivel de aceite del engranaje de reducción de giro	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado de mangueras	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar el funcionamiento de cierre del cilindro de pluma y brazo del brazo	✓	✓	✓	✓	✓	
Engrasar puntos de pivote y articulación frontal	✓	✓	✓	✓	✓	
Arrancar el motor, verificar el funcionamiento de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar el sistema de escape	✓		✓		✓	
Examinar el número de horas						
Verificar estado de neumáticos						
Inspeccionar el estabilidad del motor						
Revisar si el sistema del ventilador del motor está ajustado, desgaste y la tensión correcta						
Limpiar la malla enfriadora cuando los refrigerantes de aceite y el radiador enfriando						
Verificar estado de batería						
Verificar estado de los cinturones						
Controlar el nivel de aceite del motor de tracción						
Realizar el estado general del equipo (cristal, parachoques, escalas, escalones)						
Inspeccionar que no existan fugas de aceites combustible, o que no haya piezas flojas, golpeadas o rotas (tornillos, pasadores, soldaduras, pernos)						

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Evalúa la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Evalúa la actividad y No cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple favor observaciones

OBSERVACIONES

- RESANTIRES Y PUNTOS DEL BALDE DESGASTADOS POR LA ARENA EN LAS EXCAVACIONES.



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: CENTRO ABASTOS
OPERADOR: MANUEL A BECERRA O
PROYECTO: CONSORCIO CAUCE

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	22	23	24	25	26		
HOROMETRO	17899	18005	18113	18206	18301		
COMBUSTIBLE	60	✓	✓	60	✓		
ACEITE MOTOR	✓	✓	✓	✓	✓		
ACEITE HIDRAULICO	✓	✓	✓	✓	✓		
ACEITE TRANSMISION	✓	✓	✓	✓	✓		
GRASA	1 CARGA	1 CARGA	1 CARGA	1 CARGA	1 CARGA		
REFRIGERANTE	✓	✓	✓	✓	✓		
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	
FECHA	22 SEP-2025
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	
Fecha	
Versión	
Página	

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	N° INTERNO	DÍA	MES
JULIO A BECERRA O	1063822121	74	DX 140	G. AGOSTOS

INSPECCIÓN

CRITERIOS DE CONTROL	SEM 29	SEM 30					AÑO 2025
		APLICABLE					
Verificar el funcionamiento de todas las luces exteriores, de la alarma y de los kits de seguridad, y de seguridad de la cabina, de aseo	✓	✓					
Verificar el nivel de aceite de la batería	✓	✓					
Verificar estado de la batería	✓	✓					
Verificar estado de mangueras/cables (fugas, cortes)	✓	✓					
Verificar estado de la batería	✓	✓					
Verificar estado de los espejos	✓	✓					
Verificar aire acondicionado	✓	✓					
Verificar estado de pasadores y pedales	✓	✓					
Verificar cauchera y ajuste de pernos	✓	✓					
Verificar el correcto funcionamiento del cinturón de seguridad	✓	✓					
Verificar una alarma de retroceso	✓	✓					
Controlar el estado de extintor de seis kilos (cumplir fecha)	✓	✓					
Verificar el nivel de refrigerante (Nunca en caliente)	✓	✓					
Reportar si hay goteos o novedades relacionadas en la estructura	✓	✓					
Verificar el funcionamiento de todas las interiores	✓	✓					
Verificar el funcionamiento de las indicadores y controles, refrigerante, radiadores, combustible)	✓	✓					
Controlar el nivel de aceite del motor	✓	✓					
Controlar el nivel de aceite hidráulico	✓	✓					
Controlar el nivel de combustible	✓	✓					
Verificar si existen no combustible y si cumple de agua, limpiar esa necesario	✓	✓					
Verificar el sistema refrigerante y retirar si es necesario	✓	✓					
Controlar el nivel de aceite del diferencial de reductor de giro	✓	✓					
Verificar ajuste de orugadores	✓	✓					
Verificar el funcionamiento de todos los mandos de arranque y parada del brazo	✓	✓					
Engrasar pasadores de cilindro, brazo y estructura metal	✓						
Limpiar el motor, verificar la seguridad de encender y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con herramientas apropiadas externa. Encender el vez hidráulica principal	✓	✓					
Verificar la cabecera de escape	✓	✓					
Engrasar la corona de Giro							
Verificar el nivel de hidráulico							
Regular nivel y activación del motor							
Revisar si la correa del alternador esta suelta tiene grietas, holgados y la tensión correcta							
Limpiar la malla enfriadora externa del refrigerante sin aceite y el radiador interiormente							
Verificar estado de baterías							
Verificar estado de los cilindros							
Controlar el nivel de aceite del motor de oscilación							
Verificar el estado general del cable frenos, pasadores, ajustes, lubricantes)							
Diligenciar con las cargas limpias la tensión correcta, y que no haya aceites flojos, gaseosas o defectos (cables, tuercas, tornillos, guías)							

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ La Opción la actividad y cumple con el criterio de aceptación

X No Cumple la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple debe observaciones

OBSERVACIONES

PASADORES Y BUJES DEL BRAZO DESGASTADOS POR LA ARENA



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: CENTRO ABASTOS
OPERARIO: MAURICIO A DISCERRA O
PROYECTO: CONSORCIO CACC

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	29	30					
HORÓMETRO	12360	12666					
COMBUSTIBLE	✓	60					
ACEITE MOTOR	✓	✓					
ACEITE HIDRAULICO	✓	✓					
ACEITE TRANSMISION	✓	✓					
GRASA	2 CARGA	2 CARGA					
REFRIGERANTE	✓	✓					
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	
FECHA	29 - SEP. 2023
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	
Fecha	
Versión	
Página	

INFORMACIÓN

UBICACIÓN:	Cyhra adapsto -
OPERADOR:	Fredy Galvis
PROYECTO:	Consorcio Cauca

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	1	2	3	4	5	6	7
HORÓMETRO	1678	1686	1694	1702	1700	1714	
COMBUSTIBLE	60	—	—	60	—	—	
ACEITE MOTOR	—	—	—				
ACEITE HIDRAULICO	—	—	—				
ACEITE TRANSMISION	—	—	—				
GRASA	✓	—	—				
REFRIGERANTE							
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Fredy Galvis
FECHA	01 - 09 - 2025
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	GEP-01
Fecha	01/10/24
Versión	1
Página	1 de 1

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CEDULA	N° INTERNO	TURNO	UBICACIÓN
Freddy Galvis	1095910951	73	1140	Cartagena

INSPECCIÓN

CRITERIO DE CONTROL	MES: 9				MES: 10		
	1	2	3	4	5	6	7
Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las alarmas retroceso y de seguimiento de la cámara de control.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado de extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado vidrio panorámico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado de mangueras/mallas (liquido, cilindro).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado de acumulador.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado de los espejos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar aire acondicionado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado de palancas y pedales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar escalones y apoyos de acceso.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Confirmar el correcto funcionamiento del cinturón de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar presencia de extintores.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Controlar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar el manejo de estacionamiento (Freno de emergencia).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidráulicos, refrigerante, kilometro, combustible).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Controlar el nivel de aceite del motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Controlar el nivel de aceite hidráulico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Controlar el nivel de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Controlar el prefiltro de combustible y el drenaje de agua, sea/an sea necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado de mangueras.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante del brazo.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Arranque el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓	✓	-	✓	
Verificar el sistema de escape.	✓	✓	✓	✓	-	✓	
Engrasar el conjunto de Giro.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado de bateria.							
Inspeccionar el ventilador del motor.							
Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta.							
Limpiar la malla antipolvo delante del refrigerante de aceite y el radiador intermedio.							
Verificar estado de bateria.							
Verificar estado de los cilindros.							
Controlar el nivel de aceite del motor de inclinación.							
Verificar el estado general del balde (dientes, pasadores, dientes, esquineros).							
Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya piezas flojas, perdidas o defectos (cadenas, zapatas, rodillos, guías).							

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

X Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código Fecha Versión Página

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	MARCA	UBICACIÓN
Freddy Soto	1075960304	23	JCB	Cerrito

INSPECCIÓN

CRITERIO DE CONTROL	MES	09			AÑO	2023
	8	9	10	11	12	13
Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras y de seguimiento de la cabina de control.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado de estribo de herramientas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado vidrio panorámico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado de limpiaparabrisas (líquido, plumillas).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado de asientos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado de los espejos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar aire acondicionado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado de palancas y pedales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar escalera y apoyos de acceso.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Confirmar el correcto funcionamiento del cinturón de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Controlar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar el manejo de estacionamiento (Freno de emergencia).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidraulicos, refrigerante, horometro, voltaje).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Controlar el nivel de aceite del motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Controlar el nivel de aceite hidraulico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Controlar el nivel de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Controlar el prefiltro de combustible y el drenaje de agua, según sea necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado de mangueras.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante del brazo.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar el sistema de escape	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Engrasar el cojinete de Giro.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado de bodoquín.						
Inspeccionar el ventilador del motor.						
Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta.						
Limpiar la malla antipolvo delante del refrigerante de aceite y el radiador intermedio.						
Verificar estado de batería.						
Verificar estado de los cilindros.						
Controlar el nivel de aceite del motor de traslación.						
Verificar el estado general del bolde (bujes, pasadores, dientes, esquineros).						
Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya piezas flojas, gastadas o dañadas (rieles, zapatas, rodillos, guías).						

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

X Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	
Fecha	
Versión	
Página	

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Centro abastos
OPERACIÓN: Fedda Colm.
PROYECTO: Consolido

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	8	9	10	11	12	13	14
HOROMETRO	1721	1729	1737	1745	1752	—	
COMBUSTIBLE	—	60	—	—	/	—	
ACEITE MOTOR	—	—	—	—	/	—	
ACEITE HIDRAULICO	—	—	—	—	/	—	
ACEITE TRANSMISION	—	—	—	—	—	—	
GRASA	✓	✓	/	✓	/		
REFRIGERANTE						—	
OTRO						—	

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Fedda Colmenares
FECHA	8-09-2025
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código
Fecha
Versión
Página

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	HORÓMETRO	UBICACIÓN
Fredy Cano	1095909254	73	140	Cerrejón

INSPECCIÓN

CRITERIO DE CONTROL	MES					
	DÍA	15	16	17	18	19	20
Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras y de seguimiento de la consola de control.							
Verificar estado de extintor de incendios.							
Verificar estado vidrio panorámico.							
Verificar estado de limpiaparabrisas (líquido, plumillas).							
Verificar estado de asientos.							
Verificar estado de los espejos.							
Verificar aire acondicionado.							
Verificar estado de palancas y pedales.							
Verificar escaleras y apoyos de acceso.							
Conformar el correcto funcionamiento del cinturon de seguridad.							
Verificar pito-alarma de retroceso.							
Controlar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro).							
Verificar el freno de estacionamiento (Freno de emergencia).							
Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.							
Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.							
Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidráulicos, refrigerante, horometro, combustible).							
Controlar el nivel de aceite del motor.							
Controlar el nivel de aceite hidráulico.							
Controlar el nivel de combustible.							
Controlar el prefiltro de combustible y el drenaje de agua, según sea necesario.							
Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.							
Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro.							
Verificar estado de manijas/asas.							
Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y recorrido del brazo.							
Expresar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal.							
Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.							
Verificar el sistema de escape.							
Engrasar el cojinete de Giro.							
Verificar estado de botiquín.							
Inspeccionar el ventilador del motor.							
Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta.							
Limpiar la malla antipolvo delante del refrigerante de aceite y el radiador intermedio.							
Verificar estado de batería.							
Verificar estado de los cilindros.							
Controlar el nivel de aceite del motor de traslación.							
Verificar el estado general del bastidor (bujes, pasadores, dientes, escarificador).							
Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya piezas flojas, partidas o dañadas (rodillos, zapatas, rodillos, guías).							

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

X Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Centro Labores
OPERADOR: Freddy Galvis
PROYECTO: Concesión Cauca

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	15	16	17	18	19	20	21
HOROMETRO	1761	1770	1779	1787	1796	1801	
COMBUSTIBLE	60	—	—	60	—	—	
ACEITE MOTOR	—	—	—	—	—	—	
ACEITE HIDRAULICO	—	—	—	—	—	—	
ACEITE TRANSMISION	—	—	—	—	—	—	
GRASA	—	✓	—	✓	—	—	
REFRIGERANTE							
OTRO				—			

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Freddy Galvis
FECHA	15-09-2025.
FIRMA INSPECCION	
FECHA	

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	
Fecha	
Versión	
Página	

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	PLACA	# INTERNO	MODELO	UBICACIÓN
	DOC 1590720	43	440	Cundinamarca

INSPECCIÓN

CRITERIO DE CONTROL	MES	09			MES	2023	
	22	25	24	25	26	27	28
Revisar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces cabinas y de seguimiento de la consola de control.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Revisar estado de extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Revisar estado vidrio panorámico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Revisar estado de limpiaparabrisas (plumas, cuchillas).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Revisar estado de asientos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Revisar estado de los espejos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Revisar cinturón retractil.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Revisar estado de pulsadores y pedales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Revisar escalones y apoyos de manos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Revisar el correcto funcionamiento del cinturon de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Revisar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Revisar el estado de extintor de aire (Limpiar filtro).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Revisar el manejo de estacionamiento (Freno de emergencia).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Revisar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Revisar el funcionamiento de todos los interruptores.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Revisar el funcionamiento de los indicadores (Hidraulicos, refrigerante, horometro, entre)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Revisar el nivel de aceite del motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Revisar el nivel de aceite hidráulico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Revisar el nivel de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Revisar el prefiltro de combustible y el drenaje de agua, según sea necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Revisar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Revisar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Revisar estado de mangueras.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Revisar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante del brazo.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Revisar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Revisar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Revisar el sistema de escape	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Revisar el corona de Giro							
Revisar estado de bofquin.							
Revisar el ventilador del motor.							
Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta.							
Revisar la malla entre el radiador del refrigerante de aceite y el radiador intermedio.							
Revisar el estado de bateria.							
Revisar el estado de los cilindros.							
Revisar el nivel de aceite del motor de traslación.							
Revisar el estado general del balde (dujes, pasadores, dientes, cuchillas).							
Verificar que los anclajes tengan la tensión correcta, y que no haya piezas flojas.							
Revisar los dañadores (varillas, zapatas, rodillos, guías).							

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

X Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple tener observaciones.

OBSERVACIONES

MAQUINARIAS INGENIERIA

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Fredy Galvis Centro obras
OPERADOR: Fredy Galvis
PROYECTO: Consorcio Cauca

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	22	23	24	25	26	27	28
HOROMETRO	1830	1819	1827	1836	1846	1850	
COMBUSTIBLE	60	—	—	60	—	—	
ACEITE MOTOR	—	—	—	—	—	—	
ACEITE HIDRAULICO	—	—	—	—	—		
ACEITE TRANSMISION	—	—	—	—	—		
GRASA	✓	—	—	✓	—	—	
REFRIGERANTE							
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Fredy Galvis
FECHA	22-09-2023
FIRMA INSPECCION	
FECHA	

MAQUINARIA DE EXPLORACIÓN	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACIÓN NEUMÁTICA	Código	GM-F-39
		Fecha	12/04/2024
		Versión	2
		Página 1 de 2	

TIPO DE MAQUINARIA	UNIDAD NEUMÁTICA DE PERFORACIÓN	ID INTERNO	# 17
OBRA/PROYECTO	Consorcio Cauca	MES	Septiembre
OPERADOR	Jair Alonso Cano	SEMANA	01-09

ITEM		ACTIVIDADES	DIAS DE LA SEMANA						
			01	02	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA
1	CANASTA DE PERFORACIÓN	Estado de riel canasta.	✓	✓					
2		*Estado de teflones.	✓	✓					
3		*Estado de motor de rotación.	✓	✓					
4		*Inspeccionar fugas de rotaria.	✓	✓					
5		*Estado de rosca de eje principal de rotaria.	✓	✓					
6		*Estado motor de avance.	✓	✓					
7		Estado de tensión de cadena de avance.	✓	✓					
8		*Estado de piñon de avance.	✓	✓					
9		*Inspeccionar el nivel de grasa a la rotaria	✓	✓					
10		Estado de acoples rápidos.	NA	NA					
11		*Inspeccionar motor de giro.	✓	✓					
12		Estado de mandos.	✓	✓					
13		Estado de tornillos de soporte de la rotaria.	✓	✓					
14		Engrasar sistema rotario.	✓	✓					
15		Estado de mangueras y abrazaderas.	✓	✓					
17		Estado de válvulas de paso de aire.	✓	✓					
18		*Estado del pulmón.	✓	✓					
19	ASPECTOS GENERALES	Pintura – mantenimiento.	✓	✓					
20		Tanque de combustible en buen estado	✓	✓					
21		Limpieza general.	✓	✓					
22		Estado de acoples.	✓	✓					
23	CONSUMIBLES	Estado del martillo de fondo de 3PG DHD3.5" rosca 2 3/8PG.	✓	✓					
24		Estado de Broca trialeta 4".	✓	✓					
25		Estado de inyector de grasa.	✓	✓					
26		Estado de los estrobos y barras de punto de anclaje.	✓	✓					
27		Estado de los tubos de perforación.	✓	✓					
28		Tiflors.	✓	✓					
		FIRMA DEL RESPONSABE							

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR.

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple diligenciar observaciones.

IV. OBSERVACIONES

parada por falla de tubería se parte desde el dia 2 de septiembre

Powered by CamScanner

	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACIÓN NEUMÁTICA	Código	[illegible]
		Fecha	12/04/24
		Versión	2
		Página 2 de 2	

INFORMACIÓN

UBICACIÓN	Bucaramanga
INSPECCIONADO POR:	Ing Alberto Cano
PROYECTO:	Consolid Cobre

REPORTE DE CONSUMOS

FECHA	01-09-25	02-09-25	—	—	—	—	—
GRASA	500gr	500gr	—	—	—	—	—
OTRO _____							

OBSERVACIONES

FIRMA INSPECTOR	[signature]
FECHA	01-09-25 — 02-09-25
FIRMA SUPERVISOR	
FECHA	

Powered by CamScanner



INSPECCION PRECOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	GA-F-06
Fecha	01/11/2022
Versión	1
Página	1 de 1

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACION GENERAL

Nombre del operador	CÉDULA	ID INTERNO	HORA	UBICACIÓN
Oscar Alfredo Ramirez	4715794	35	225	obastos

INSPECCIÓN

	CRITERIO DE CONTROL	MES	09			AÑO	2025
			01	02	03	04	05	06
1	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces intermitentes y de seguridad de la cabeza de carga.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Verificar estado de cristales de la cabina.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Verificar estado retrovisores panoramicos.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Verificar estado de limpiaparabrisas (Aspecto, plumillas).		✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Verificar estado de asientos.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Verificar estado de los cinturones.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Verificar aire acondicionado.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Verificar estado de baldosas y pedales.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Verificar estado y aspecto de asientos.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	Controlar el correcto funcionamiento del cinturon de seguridad.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	Verificar alarma de retroceso.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	Controlar el sistema de admision de aire (Limpiar filtro).		✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	Verificar el manejo de estacionamiento (Freno de emergencia).		✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidraulicos, refrigeración, locomotor, voltimetro).		✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	Controlar el nivel de aceite del motor.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	Controlar el nivel de aceite hidraulico.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	Controlar el nivel de combustible.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	Controlar el prefiltro de combustible y el drenaje de agua, según sea necesario.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reduccion de giro.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	Verificar estado de mangueras.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	Verificar el funcionamiento de todos los manómetros de alarmas y revisar daños visibles.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	Verificar el sistema de escape.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	Engrasar el rodamiento de Giro.		✓		✓		✓	
29	Verificar estado de frenos.							
30	Inspeccionar el ventilador del motor.							
31	Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta.							
32	Limpiar la malla ubicada delante del refrigerante de aceite y el radiador intermedio.							
33	Verificar estado de bateria.							
34	Verificar estado de los cilindros.							
35	Controlar el nivel de aceite del motor de traslación.							
36	Analizar el estado general del balde (bujes, pasadores, dientes, esquineros).							
37	Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya piezas flojas, partidas o dañadas (Vainas, zapatas, rodillos, guias).							

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

X Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

INFORMACIÓN

UBICACIÓN
OPERADOR
PROYECTO

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	0901	0902	0903	0904	0905	0906	
HOROMETRO	74862	74870	74878	74888	74896	74905	
COMBUSTIBLE	bo	no	bo	no	no	no	
ACEITE MOTOR	no	no	no	no	no	no	
ACEITE HIDRAULICO	no	no	no	no	no	no	
ACEITE TRANSMISION	no	no	no	no	no	no	
GRASA	si	si	si	si	si	no	
REFRIGERANTE	no	no	no	no	no	no	
OTRO	no	no	no	no	no	no	

OBSERVACIONES

exte dañado unos carriles tiene fuga de itoblico por los gusto
Cugos por una botella tiene unos sepotos sueltos
tiene dañadas un guarda cadena le falta un guarda cadena
sedaño el bolde sepone martillo
se exte traborde con el martillo

FIRMA OPERADOR

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	
Fecha	
Versión	
Página	

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CEDULA	# INTERNO	SERIE	UBICACION
Pedro Beltrago Ramirez	9735094	35	225	obestos

INSPECCIÓN

CRITERIO DE CONTROL	MES: 08	09				AÑO: 2025
		09	10	11	12	
Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras y de seguimiento de la consola de control	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado del extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado vidrio panoramico	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado de limpiaparabrisas (Escobillas, plumillas)	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado de asientos	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado de los espejos	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar aire acondicionado.	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado de pedales y pedales.	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar escaleras y apoyos de acceso	✓	✓	✓	✓	✓	
Confirmar el correcto funcionamiento del cinturon de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar plataforma de retroceso	✓	✓	✓	✓	✓	
Controlar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro)	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar el manejo de estacionamiento (Freno de emergencia)	✓	✓	✓	✓	✓	
Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar el funcionamiento de todos los interruptores	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidraulicos, refrigerante, horometro, amperio)	✓	✓	✓	✓	✓	
Controlar el nivel de aceite del motor.	✓	✓	✓	✓	✓	
Controlar el nivel de aceite hidraulico.	✓	✓	✓	✓	✓	
Controlar el nivel de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	
Controlar el prefiltro de combustible y el drenaje de agua, segun sea necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	
Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	
Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción del giro.	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado de mangueras.	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y tensión del brazo.	✓	✓	✓	✓	✓	
Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal.	✓	✓	✓	✓	✓	
Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar el sistema de escape	✓	✓	✓	✓	✓	
Engrasar el cojinete de Giro.						
Verificar estado de bolígrafo						
Inspeccionar el ventilador del motor						
Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta						
Limpiar la malla antipolvo delante del refrigerante de aceite y el radiador intermedio						
Verificar estado de batería						
Verificar estado de los cilindros.						
Controlar el nivel de aceite del motor de traslación.						
Verificar el estado general del balde (bujes, pasadores, dientes, esquineras).						
Asegurarse que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya piezas flojas, faltantes o dañadas (varillas, zapatas, rodillos, guías).						

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✓ ... llenar observaciones



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: obstas
OPERADOR: Cesar Buitrago Ramirez
PROYECTO: Loeb

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	0908	0909	0910	0911	0912		
HOROMETRO	74905	74913	74921	74931	74940		
COMBUSTIBLE	bo	no	bo	no	bo		
ACEITE MOTOR	no	no	no	no	no		
ACEITE HIDRAULICO	no	no	no	no	no		
ACEITE TRANSMISION	no	no	no	no	no		
GRASA	si	si	si	si	si		
REFRIGERANTE	no	no	no	no	no		
OTRO	no	no	no	no	no		

OBSERVACIONES

tiene fugo de ideblico golos expunes delos yestin
i por un silindro delestil tiene deñados unos cauchos
tiene unas tetas sueltas le faltan los guarda cadenas
tiene ruido en la bomba ideblica



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	
Fecha	
Versión	
Página	

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Oscar Restrepo Ramirez	9735704	35	225	obras

INSPECCIÓN

CRITERIO DE CONTROL	MES: 75	07 / 76	77	78	MES: 11	2025 / 20
Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras y de seguimiento de la consola de control.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado de extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado vidrio panorámico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado de limpiaparabrisas (llaves, plumillas).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado de asientos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado de los espejos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar aire acondicionado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado de palancas y pedales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar escaleras y agarres de accesos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Confirmar el correcto funcionamiento del cinturón de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar alarma de retroceso.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Comprobar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar el freno de estacionamiento (Freno de emergencia).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidráulicos, refrigerante, horómetro, diesel).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Revisar el nivel de aceite del motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Revisar el nivel de aceite hidráulico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Revisar el nivel de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Drenar el prefiltro de combustible y el drenaje de agua, según sea necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Revisar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Revisar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de gas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Revisar estado de mangueras.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Revisar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante del brazo.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Revisar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Encender el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape después de la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos inusuales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Revisar el sistema de escape.	✓		✓		✓	
Revisar el cojinete de Giro.						
Revisar el estado de balancín.						
Revisar el ventilador del motor.						
Revisar si las láminas del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta.						
Revisar la malla antipolvo delante del refrigerante de aceite y el radiador intermedio.						
Revisar el estado de batería.						
Revisar el estado de los cinturones.						
Revisar el nivel de aceite del motor de traslación.						
Revisar el estado general del balde (bujes, pasadores, dientes, esquineras).						
Asegurar que las zingas tengan la tensión correcta, y que no haya piezas flojas, rotas o dañadas (ventilas, zapatas, rodillos, guías).						

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se ejecuta la actividad acorde con el criterio de aceptación



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: 060505

OPERADOR: Oscar Beltrán Ramírez

PROYECTO: Cause

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	0975	0976	0977	0978	0979	0920	
HOROMETRO	74947	74957	74967	74979	74985	74995	
COMBUSTIBLE	no	60	60	no	60	no	
ACEITE MOTOR	no	no	no	no	no	no	
ACEITE HIDRAULICO	no	no	no	no	no	no	
ACEITE TRANSMISION	no	no	no	no	no	no	
GRASA	si	si	si	si	si	si	
REFRIGERANTE	no	no	no	no	no	no	
OTRO	no	no	no	no	no	no	

OBSERVACIONES



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	
Fecha	
Versión	
Página	

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACION GENERAL

APELLIDOS DEL OPERADOR	CEDULA	N° INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Bautista Ram. Rez	9735704	35	225	abastos

INSPECCIÓN

CRITERIO DE CONTROL	MES: 09				AÑO: 2025	
	22	23	24	25	26	27
...funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces ...ia y de seguridad de la cabina de control.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...estado de estrías de ox-estrías	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...estado vidrio panorámico	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...estado de mangueras (liquido, pluviales)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...estado de pedales	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...ajuste de los asientos	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...de acondicionado	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...nivel de cuñadas y pistas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...cables y apoyo de zapatas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...correcto funcionamiento del cinturon de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...sistema de retroceso	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...ltro y de admisión de aire (Limpiar filtro)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...ndo de estacionamiento (Freno de emergencia)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...funcionamiento de todos los interruptores	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...funcionamiento de los indicadores (hidraulicos, refrigerante, horometro	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...el de aceite del motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...el de aceite hidraulico	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...e de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...de combustible y el drenaje de agua, segun sea necesario	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...refrigerante y rellenar si es necesario	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...el aceite del dispositivo de reducción de giro	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...la mangueras	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...rumento de todos los mandos de alcance y levares del brazo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...es de pluma, brazo y accesorio frontal	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...r de escape	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...e de Gas						
...bustible						
...motor del motor						
...del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta						
...polvo retarte del refrigerante de aceite y el radiador intermedio						
...tería						
...cinturon						
...ajuste del motor de nivelación						
...ural del botón (tuercas, pasadores, dientes, asgunerias)						
...mpos tengan la tensión correcta, y que no haya piezas flojas, ...ortes, poleas, rodillos, guías)						



INSPECCION PRECOPERACIONAL DE MAQUINARIA

INFORMACION

UBICACION: abastos
OPERADOR: Ruben Restrepo Ramirez
PROYECTO: cerro

REPORTE DE HORIMETROS Y CONSUMOS

FECHA	0922	0923	0924	0925	0926	0927	
HOROMETRO	75000	75006	75076	75025	75034	75044	
COMBUSTIBLE	bo	no	bo	no	bo	no	
ACEITE MOTOR	no	no	no	no	no	no	
ACEITE HIDRAULICO	no	no	no	no	no	no	
ACEITE TRANSMISION	no	no	no	no	no	no	
GRASA	si	si	si	si	si	si	
REFRIGERANTE	no	no	no	no	no	no	
OTRO	no	no	no	no	no	no	

OBSERVACIONES

Sele cambio unos cojinetes internos de las zapatas



INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	
Fecha	
Versión	
Página	1 de 1

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CEDULA	N° INTERNO	SERIE	HORÓMETRO
Gustavo Ramirez	9735794	35	225	4665705

INSPECCIÓN

CRITERIO DE CONTROL	MES: 09					
	29	30	01	02	03	2025
Verificar el funcionamiento de todas las luces externas: de la cabina y de las luces indicadoras y de seguridad en la consola de control	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado de estado de neumáticos	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado de cinturón de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado de lubricantes (liquido, planillas)	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado de asiento	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado de los espejos	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar sirena retroceso/alarma	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado de palancas y pedales	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar accidentes y alcohol de ocupantes	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar el correcto funcionamiento del cinturon de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar pito/alarma de retroceso	✓	✓	✓	✓	✓	
Controlar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro)	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar el mando de estacionamiento (Freno de emergencia)	✓	✓	✓	✓	✓	
Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar el funcionamiento de todos los interruptores	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidraulicos, refrigerante, horometro, presion)	✓	✓	✓	✓	✓	
Controlar el nivel de aceite del motor.	✓	✓	✓	✓	✓	
Controlar el nivel de aceite hidraulico	✓	✓	✓	✓	✓	
Controlar el nivel de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	
Drenar el prefiltro de combustible y el drenaje de agua, según sea necesario	✓	✓	✓	✓	✓	
Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario	✓	✓	✓	✓	✓	
Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro.	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado de mangueras	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante del cucharon	✓	✓	✓	✓	✓	
Inspeccionar cazoletas de pluma, brazo y accesorio frontal.	✓	✓	✓	✓	✓	
Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape de la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos inusuales.	✓	✓	✓	✓	✓	
Revisar el sistema de escape	✓				✓	
Revisar el cuerpo de Gas						
Revisar el ventilador de radiador.						
Revisar el ventilador del motor.						
Revisar la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta.						
Revisar la malla antipolvo delante del refrigerante de aceite y el radiador intermedio.						
Revisar el estado de bateria.						
Revisar el estado de los cilindros.						
Revisar el nivel de aceite del motor de traslación.						
Revisar el estado general del balde (bujes, pasadores, dientes, esquineras).						
Revisar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya piezas flojas, o faltantes (pernos, cuñas, rodillos, guias).						



INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

INFORMACION

UBICACION: abastos
OPERADOR: Duvan Bustos Ramirez
PROYECTO: Cauca

REPORTE DE HOROMETROS Y CONSUMOS

FECHA	0929	0930	10/01	10/02	10/03			
HOROMETRO	75049	75060	75069	75077	75087			
COMBUSTIBLE	no	bo	bo	no	bo			
ACEITE MOTOR	no	no	no	no	no			
ACEITE HIDRAULICO	no	no	no	no	no			
ACEITE TRANSMISION	no	no	no	no	no			
GRASA	si	si	si	si	si			
REFRIGERANTE	no	no	no	no	no			
OTRO	no	no	no	no	no			

OBSERVACIONES

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-13
		Fecha	1/11/2019
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA: MINICARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Uriel Alonso Rivera.	1.102383660	#24	Bobcat S-185	Bucaramanga.

INSPECCIÓN

		CRITERIO DE CONTROL	MES	Septiembre.			AÑO	2025	
			01	02	03	04	05	06	
1	REVISIÓN DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces delanteras, de la bocina y de las luces indicadoras.	!				X	X	
2		Verificar estado de extintor de incendios.					✓	✓	
3		Verificar estado de asientos.					X	X	
4		Verificar escalones y apoyos accesos.					✓	✓	
5		Verificar pito-alarma de retroceso.					X	X	
6		Revisar cinturón de seguridad, retractores del cinturón de seguridad, barra de asiento y enclavamiento de control.					✓	✓	
7		Verificar estado de espejos.					X	X	
8		Revisar freno de parqueo, pedales, controles manuales y palancas de dirección o palancas de mandos.					✓	X	
9		Verificar freno de servicio.					✓	✓	
10		Revisar el nivel de aceite de motor.					✓	✓	
11		Limpiar filtro y sistema de aire del motor.					✓	✓	
12		Revisar radiador y nivel del refrigerante.					✓	✓	
13		Revisar filtro de combustible.					✓	✓	
14		Limpiar y drenar separador de agua.					✓	✓	
15		Lubricar los brazos elevadores, cilindros de elevación, cilindros, enganche rápido, pines de pivote y cuñas.					✓	✓	
16		Verificar estado de las llantas (presiones de neumáticos, cortaduras, abultamientos).					✓	✓	
17		Revisar mangueras y tuberías hidráulicas.					✓	✓	
18		Revisar niveles de fluido Hidráulico.					✓	✓	
19		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.					✓	✓	
20	REVISIÓN SEMANAL	Verificar estado de botiquín.							✓
21		Verificar estado de la batería.							✓
22		Verificar estado de los cilindros.							✓
23		Revisar tuercas de las ruedas.							✓
24		Revisar el nivel de la transmisión final.							✓
25		Verificar estado general de la pala (bolas, pasadores, soldaduras, cuchillas).							X
26		Revisar motor/ correa de transmisión hidrostática.							✓

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

- ✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación
- X Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

el dia 02 de septiembre viene el tecnico de servinyeccion y baja la bomba de inyeccion y se la lleva a revision.

el dia 04 de septiembre se monta nuevamente la bomba de inyeccion ya reparada el equipo queda operativo.
Pito y alarma de retroceso no funciona.
el asiento esta roto.
espejos no tiene.
Pedales necesitan ajuste los mandos de contramarcha se necesitan rolibros
los bujes de los brazos elevadores estan para cambio.

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GH-F-13
		Fecha	1/11/2008
		Versión	1
		Página	2 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Bucaramanga.
OPERADOR: Uriel Rivera
PROYECTO: Consorcio Cause.

REPORTE DE HOROMETROS Y CONSUMOS

FECHA	01/09	04/09	03/09	04/09	05/09	06/09	
HOROMETRO	—	—	—	—	2307	2314	
COMBUSTIBLE	—	—	—	—	—	75 gl	
ACEITE MOTOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ACEITE HIDRÁULICO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ACEITE TRANSMISIÓN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GRASA	—	—	—	—	1/4 gl	—	
REFRIGERANTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
OTRO							

OBSERVACIONES

Se le hace cambio de aceite de motor el dia 05 de septiembre a las 2311 h.

el día 05 de septiembre queda nuevamente operativa la maquina.

FIRMA OPERADOR	
FECHA	
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-53
		Fecha	1/11/2022
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA: MINICARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Uriel Alonso Rivera.	1.102.383.610	#24	bobcat S-185	Bucaramanga

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES	Septiembre			AÑO	2025	
			08	09	10	11	12	13	
1	REVISION DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras.	X	X	✓	✓	X		
2		Verificar estado de extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓	✓		
3		Verificar estado de asientos.	X	X	✓	✓	✓		
4		Verificar escaleras y apoyos accesos.	✓	✓	✓	✓	✓		
5		Verificar pito-alarma de retroceso.	X	X	X	X	X		
6		Revisar cinturón de seguridad, retractores del cinturón de seguridad, barra de asiento y enclavamiento de control.	✓	✓	✓	✓	✓		
7		Verificar estado de espejos.	X	X	X	X	X		
8		Revisar freno de parqueo, pedales, controles manuales y palancas de dirección o palancas de mandos.	X	X	X	X	X		
9		Verificar freno de servicios.	✓	✓	✓	✓	✓		
10		Revisar el nivel de aceite de motor.	✓	✓	✓	✓	✓		
11		Limpiar filtro y sistema de giro del motor.	✓	✓	✓	✓	✓		
12		Revisar radiador y nivel del refrigerante.	✓	✓	✓	✓	—		
13		Revisar filtro de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓		
14		Limpiar y drenar separador de agua.	✓	✓	✓	✓	—		
15		Lubricar los brazos elevadores, eslabones de elevación, cilindros, enganche rapido, pines de pivote y cuñas.	✓	✓	✓	✓	✓		
16		Verificar estado de las llantas (presiones de neumaticos, cortaduras, abultamientos).	✓	✓	✓	✓	✓		
17		Revisar mangueras y tuberias hidráulicas.	✓	✓	✓	✓	✓		
18		Revisar niveles de fluido Hidraulico.	✓	✓	✓	✓	✓		
19		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓	✓	✓		
20	REVISION SEMANAL	Verificar estado de bolsquin.							✓
21		Verificar estado de la balería.							✓
22		Verificar estado de los cilindros.							✓
23		Revisar tuercas de las ruedas.							✗
24		Revisar el nivel de la transmisión final.							✓
25		Verificar estado general de la pala (bujes, pasadores, esquineras, cuchillas).							✗
26		Revisar motor correa de trasmisión hidrostatica.							✓

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

Luces traseras no funcionan.
Cojin esta roto
Pito y alarma de retroceso no funcionan.
Espejos no tiene
Pedales necesitan ajuste
los mandos se necesitan calibrar tira mas para la derecha

bujes y pasadores de los brazos elevadores estan desgastados

Powered by CamScanner

MAQUINARIAS	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	CM-F-13
		Fecha	1/11/2020
		Versión	1
		Página	3 de 3

INFORMACION

UBICACIÓN:	Bucaramanga.
OPERADOR:	Uriel Alonso Rivera Barajas.
PROYECTO:	Consorcio Cauce.

REPORTE DE HOROMETROS Y CONSUMOS

FECHA	08/09 2025	09/09 2025	10/09 2025	11/09 2025	12/09 2025	13/09 2025	
HOROMETRO	2318	2326	2330	2338	2346	—	
COMBUSTIBLE	O	15 gl	O				
ACEITE MOTOR	✓	✓	✓				
ACEITE HIDRÁULICO	✓	✓	✓				
ACEITE TRANSMISIÓN	✓	✓	✓				
GRASA	1/4 galon	—					
REFRIGERANTE	✓	✓					
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Uriel Rivera
FECHA	08/09/2025
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GH-F-03
		Fecha	1/11/2022
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA: MINICARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Uriel Alonso Rivera.	1.102-383.610	# 24	bobcat S-185	Bucaramanga

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES	Septiembre			AÑO	2025	
				15	16	17	18	19	20	
1	REVISIÓN DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces delanas, de la bocina y de las luces indicadoras.		X	X	X	X	X	X	
2		Verificar estado de extintor de incendios.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3		Verificar estado de asientos.		X	X	X	X	X	X	
4		Verificar escaleras y apoyos accesos.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5		Verificar pito-alarma de retroceso.		X	X	X	X	X	X	
6		Revisar cinturón de seguridad, retractores del cinturón de seguridad, barra de anclaje y ensamblamiento de control.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7		Verificar estado de espejos.		X	X	X	X	X	X	
8		Revisar freno de parqueo, pedales, controles manuales y palancas de dirección o palancas de mando.		X	X	X	X	X	X	
9		Verificar freno de servicio.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10		Revisar el nivel de aceite de motor.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11		Limpiar filtro y sistema de aire del motor.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12		Revisar radiador y nivel del refrigerante.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13		Revisar filtro de combustible.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14		Limpiar y drenar separador de agua.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15		Lubricar los brazos elevadores, eslabones de elevación, cilindros, enganche rapido, pines de pivote y cuñas.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16		Verificar estado de las llantas (presiones de neumáticos, cortaduras, abultamientos).		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17		Revisar mangueras y tuberias hidráulicas.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18		Revisar niveles de fluido Hidráulico.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	REVISIÓN SEMANAL	Verificar estado de bateria.								✓
21		Verificar estado de la bateria.								✓
22		Verificar estado de los cilindros.								✓
23		Revisar tuercas de las ruedas.								✓
24		Revisar el nivel de la transmisión final.								✓
25		Verificar estado general de la pala (bujes, pasadores, esquineras, cuchillas).								✓
26		Revisar motor correa de transmisión hidrostatica.								X

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

X Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

Luces traseras no Funsionan
Cojin esta roto
Pito y alarma de retroceso no Funsiona.
Espejos no tiene.
Pedales necesitan ajuste.
Los mandos necesitan ajuste una mas Para la derecha.

bujes y Pasadores de los brazos de elevacion estan desgastados

la correa del mini esta bastante chitiada y desdentada y se Patina

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GMP-12
		Fecha	5/11/2025
		Versión	1
		Página	2 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Bucaramanga
OPERADOR: Uriel Alonso Rivera.
PROYECTO: Consorcio Cauce.

REPORTE DE HORONETROS Y CONSUMOS

FECHA	15/09/2025	16/09/2025	17/09/2025	18/09/2025	19/09/2025	20/09/2025	
HOROMETRO	2354	2361	2370	2377	2382	2388	
COMBUSTIBLE	15 gl	0	15 gl	—	—	16 gl	
ACEITE MOTOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ACEITE HIDRÁULICO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ACEITE TRANSMISIÓN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GRASA	1/4 gl	—	1/4 gl	—	1/4 gl	—	
REFRIGERANTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Uriel Rivera.
FECHA	15/09/2025
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	

Powered by CamScanner

MAQUINARIAS EL CERRITO	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA**	Código	GM-F-13
		Fecha	1/11/2023
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA: MINICARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Uriel Rivera.	1.102.383.610	# 24	bobcat S-185	Bucaramanga.

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	AGO	Septiembre			AÑO	2025	
			22	23	24	25	26	27	
1	REVISIÓN DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras.	X	X	X	X			
2		Verificar estado de extintor de incendios.	✓	✓	✓				
3		Verificar estado de asiento.	X	X	X	X			
4		Verificar escalones y apoyos accesos.	✓	✓	✓	✓			
5		Verificar pito-alarma de retroceso.	X	X	X	X			
6		Revisar cinturón de seguridad, retractores del cinturón de seguridad, barra de asiento y enclavamiento de control.	✓	✓	✓	✓			
7		Verificar estado de espejos.	X	X	X	X			
8		Revisar freno de parqueo, pedales, controles manuales y palancas de dirección o palancas de mandos.	✓	✓	✓	✓			
9		Verificar freno de servicios.	✓	✓	✓	✓			
10		Revisar el nivel de aceite de motor.	✓	✓	✓	✓			
11		Limpiar filtro y sistema de aire del motor.	✓	✓	✓	✓			
12		Revisar radiador y nivel del refrigerante.	✓	✓	✓	✓			
13		Revisar filtro de combustible.	✓	✓	✓	✓			
14		Limpiar y drenar separador de agua.	✓	✓	✓	✓			
15		Lubricar los brazos elevadores, estabones de elevación, cilindros, enganche rapido, pines de pivote y cuñas.	✓	✓	✓	✓			
16		Verificar estado de las llantas (presiones de neumaticos, cortaduras, abultamientos).	✓	✓	✓	✓			
17		Revisar mangueras y tuberias hidraulicas.	✓	✓	X	X			
18		Revisar niveles de fluido Hidraulico.	✓	✓	✓	✓			
19		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓	X			
20	REVISIÓN SEMANAL	Verificar estado de bolloquin.							
21		Verificar estado de la bateria.							
22		Verificar estado de los cilindros.							
23		Revisar tuercas de las ruedas.							
24		Revisar el nivel de la transmisión final.							
25		Verificar estado general de la pala (filos, pasadores, esquineras, cuchillas).							
26		Revisar motor correa de transmisión hidrostatica.							

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

X Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

Luces traseras no funcionan
cojin esta roto
Pito y alarma. de retroceso no funciona.
espejos no tiene.
Pedales necesitan ajuste.
Los mandos necesitan ajuste tira mas para la derecha que para la izquierda

buyes y pasadores de los brazos de elevacion estan desgastados.

la correa esta chitiada y desdientada y se patina.
Una mangera de hidraulico Presenta fuga. Se reporta 24/09/2025 el motor presenta ruido anormal. Se para el equipo.

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	SM.F-13
		Fecha	1/11/2025
		Versión	1
		Página	2 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN:	Bucaramanga
OPERADOR:	Uriel Rivera.
PROYECTO:	Consorcio Cacce.

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	22/09 2025	23/09 2025	24/09 2025	25/09 2025	26/09 2025	27/09 2025	
HORÓMETRO	2391	2399	2405	2413			
COMBUSTIBLE	0	0	15 gL				
ACEITE MOTOR	✓	✓	✓	✓			
ACEITE HIDRÁULICO	✓	✓	✓	✓			
ACEITE TRANSMISIÓN	✓	✓	✓	✓			
GRASA	—	1/4 gL	—	1/4 gL			
REFRIGERANTE	✓	✓	✓	✓			
OTRO							

OBSERVACIONES

25 - 09 - 2025 Se Para el equipo Presenta sonido extraño en el motor.

FIRMA OPERADOR	Uriel Rivera.
FECHA	22/09/2025
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	GM-F-11
Fecha	3/11/2023
Versión	1
Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA: RETROCARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CEDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Jesus Alexis Medrano		H 8	CAT 416 D2	

INSPECCIÓN

ITEM	CRITERIO DE CONTROL	MES: Septiembre				MES: 2023	
		1	2	3	4	5	6
1	Verificar el funcionamiento de todas las luces exteriores (delanteras, traseras, direccionales, stops)	/	/	/	/	/	/
2	Verificar estado estricto de retenidas.	/	/	/	/	/	/
3	Verificar estado de vidrio panoramico.	/	/	/	/	/	/
4	Verificar estado de limpiaparabrisas (liquido, plumillas).	/	/	/	/	/	/
5	Verificar estado del asiento y cinturón de seguridad.	/	/	/	/	/	/
6	Verificar escalerilla y apoyos de acceso.	/	/	/	/	/	/
7	Verificar estado de palancas y pedales.	/	/	/	/	/	/
8	Verificar aire acondicionado.	/	-	/	/	/	/
9	Verificar estado de espejos.	/	/	/	/	/	/
10	Verificar pito-alarma de retroceso.	/	/	/	/	/	/
11	Verificar funcionamiento de freno de mano.	/	/	/	/	/	/
12	Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.	/	/	/	/	/	/
13	Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.	/	/	/	/	/	/
14	Verificar el estado de todos los equipos eléctricos.	/	/	/	/	/	/
15	Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidraulicos, refrigerante, horometro, corriente)	/	/	/	/	/	/
16	Verificar nivel de aceite del motor.	/	/	/	/	/	/
17	Verificar el nivel de aceite en sistema hidráulico.	/	/	/	/	/	/
18	Controlar el nivel de combustible.	/	/	/	/	/	/
19	Limpiar y drenar separador de agua.	/	/	/	/	/	/
20	Verificar nivel de aceite de la servo transmisión.	/	/	/	/	/	/
21	Verificar estado y nivel de refrigerante.	/	/	/	/	/	/
22	Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante de brazo.	/	/	/	/	/	/
23	Lubricar dispositivo de enganche rápido de la excavadora y el brazo de la cargadora.	/	/	/	/	/	/
24	Verificar estado y funcionamiento del motor de arranque.	/	/	/	/	/	/
25	Lubrica pala de cuchara.	/	/	/	/	/	/
26	Verificar estado de accionamiento del cierre de la pluma.	/	/	/	/	/	/
27	verificar estado de mangueras.	/	/	/	/	/	/
28	Verificar estado de las llantas (presiones de neumaticos, cortaduras, abultamientos).	/	/	/	/	/	/
29	Verificar estado brillaun.						
30	Verificar estado de la pintura.						
31	Verificar puertas y ventanillas.						
32	Verificar estado de pisporos de los estabilizadores y estado de cilindros (empotramiento lateral).						
33	Verificar el estado de la bateria.						
34	Verificar estado general del balde y pala (bujes, pasadores, dientes, esquineras, cuchillas).						
35	Verificar estado del seguridad del par de apriete de las tuercas de ruedas.						
36	Verificar estado del sistema de escape.						
37	Verificar funcionamiento de arranque en punto muerto.						
38	Verificar estado de sistema de direccion de emergencia.						
39	Lubricar pivotes y varillajes del eje de la dirección.						
40	Verificar estado de la dirección y funcionamiento/fugas.						

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación.

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

Equipo frontal presenta fallas en el mando.

El equipo presenta falla en el encendido

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-11
		Fecha	5/11/2020
		Versión	1
		Página	2 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: centro abastos – Bucaramanga
OPERADOR: Jesus Alberto Medrano lanz
PROYECTO: CONSORCIO CAUCE

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	04-9-23	8-9-23	08-09-23	04-9-23	05-09-23	06-9-23	07-09-23
HORÓMETRO	13758	13759	13761	13765	13766	13767	/
COMBUSTIBLE	/	/	/	/	/	30	/
ACEITE MOTOR	/	/	/	/	/	/	/
ACEITE HIDRÁULICO	/	/	/	/	/	/	/
ACEITE TRANSMISIÓN	/	/	/	/	/	/	/
GRASA	/	/	/	/	/	/	/
REFRIGERANTE	/	/	/	/	/	/	/
OTRO	/	/	/	/	/	/	/

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Jesus Alberto M.
FECHA	
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	GM-F-11
Fecha	6/11/2020
Versión	1
Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA RETROCARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CEDULA	ID INTERNO	MARCA	UBICACIÓN
Jesus Alberto M.		H 09	CAT 420F	

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES	Septiembre			AÑO	2025	
			08	9	10	11	12		
1	REVISIÓN DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas (delanteras, traseras, direccionales, stops).	/	/	/	/	/		
2		Verificar estado estético de los vidrios.	/	/	/	/	/		
3		Verificar estado de vidrio panorámico.	/	/	/	/	/		
4		Verificar estado de limpiaparabrisas (líquido, plumillas).	/	/	/	/	/		
5		Verificar estado del asiento y cinturón de seguridad.	/	/	/	/	/		
6		Verificar escaleras y apoyos de acceso.	/	/	/	/	/		
7		Verificar estado de palancas y pedales.	/	/	/	/	/		
8		Verificar aire acondicionado.	/	/	/	/	/		
9		Verificar estado de espejos.	/	/	/	/	/		
10		Verificar alto-alarma de retroceso.	/	/	/	/	/		
11		Verificar funcionamiento de freno de mano.	/	/	/	/	/		
12		Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.	/	/	/	/	/		
13		Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.	/	/	/	/	/		
14		Verificar el estado de todos los equipos eléctricos.	/	/	/	/	/		
15		Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidráulicos, refrigerante, horómetro, corriente)	/	/	/	/	/		
16		Verificar nivel de aceite del motor.	/	/	/	/	/		
17		Verificar el nivel de aceite en sistema hidráulico.	/	/	/	/	/		
18		Controlar el nivel de combustible.	/	/	/	/	/		
19		Limpiar y drenar separador de agua.	/	/	/	/	/		
20		Verificar nivel de aceite de la servo transmisión.	/	/	/	/	/		
21		Verificar estado y nivel de refrigerante.	/	/	/	/	/		
22		Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante de brazo.	/	/	/	/	/		
23		Lubricar dispositivo de enganche rapido de la excavadora y el brazo de la cargadora.	/	/	/	/	/		
24		Verificar estado y funcionamiento del motor de arranque.	/	/	/	/	/		
25		Lubrica pala de cuchara.	/	/	/	/	/		
26		Verificar estado de anclaje/amiento del cierre de la pluma.	/	/	/	/	/		
27		verificar estado de mangueras.	/	/	/	/	/		
28		Verificar estado de las llantas (presiones de neumaticos, cortaduras, abultamientos).	/	/	/	/	/		
29	REVISIÓN SEMANAL	Verificar estado botiquín.							
30		Verificar estado de la pintura.							
31		Verificar puertas y ventanillas.							
32		Verificar estado de soportes de los estabilizadores y estado de cilindros (desplazamiento lateral)							
33		Verificar el estado de la bateria.							
34		Verificar estado general del balde y pala (bujes, pasadores, dientes, esquineras, cuchillas).							
35		Verificar estado del seguridad del par de apriete de las tuercas de ruedas.							
36		Verificar estado del sistema de escape.							
37		Verificar funcionamiento de arranque en punto muerto.							
38		Verificar estado de sistema de dirección de emergencia.							
39		Lubricar pivotes y varillajes del eje de la dirección.							
40		Verificar estado de la dirección y funcionamiento/fugas.							

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación.

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple llenar observaciones

OBSERVACIONES

Equipo frontal presenta falla en el mando

hidráulicos de desgaste

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	
Fecha	
Versión	
Página	

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: CAMPO OBANDOS BUCARAMANGA
OPERADOR: JESUS ALBERTO RECALDO LUNA
PROYECTO: CONSORCIO CAUCE

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	08-09-25	09-09-25	10-09-25	11-09-25	12-09-25		
HORÓMETRO	13768	13770	13773	13780	13782		
COMBUSTIBLE	✓	✓					
ACEITE MOTOR	✓	✓	✓	✓	✓		
ACEITE HIDRÁULICO	✓	✓	✓	✓	✓		
ACEITE TRANSMISIÓN	✓	✓	✓	✓	✓		
GRASA	✓	✓	✓	✓	✓		
REFRIGERANTE	✓	✓	✓	✓	✓		
OTRO	✓	✓	✓	✓	✓		

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Jesus Alberto R.
FECHA	
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	GM-F-11
Fecha	3/11/2020
Versión	1
Página	1 de 1

TIPO DE MAQUINARIA: RETROCARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CEDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
JESUS Alberto M.		# 09	CAT 420 E	

INSPECCIÓN

ITEM	CRITERIO DE CONTROL	MES: Septiembre				AÑO: 2021	
		16	16	17	13	13	20
1	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas (delanteras, traseras, direccionales, etcps).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Verificar estado extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Verificar estado de vidrio panoramico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Verificar estado de limpiaparabrisas (liquido, plumillas).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Verificar estado del asiento y cinturón de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Verificar escalerilla y apoyos de acceso.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Verificar estado de palancas y pedales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Verificar aire acondicionado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Verificar estado de espejos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	Verificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	Verificar funcionamiento de freno de mano.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	Verificar el estado de todos los equipos eléctricos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidráulicos, refrigerante, horómetro, corriente).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	Verificar nivel de aceite del motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	Verificar el nivel de aceite en sistema hidráulico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	Controlar el nivel de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	Limpiar y drenar separador de agua.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	Verificar nivel de aceite de la servo transmisión.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	Verificar estado y nivel de refrigerante.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante de brazo.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	Lubricar dispositivo de enganche rápido de la excavadora y el brazo de la cargadora.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	Verificar estado y funcionamiento del motor de arranque.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	Lubrica pala de cucharon.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	Verificar estado de accionamiento del cierre de la pluma.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	Verificar estado de mangueras.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	Verificar estado de las llantas (presiones de neumaticos, cortaduras, abultamientos).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	Verificar estado bolsillón.						
30	Verificar estado de la pintura.						
31	Verificar puertas y ventanillas.						
32	Verificar estado de soportes de los estabilizadores y estado de cilindros (desplazamiento lateral).						
33	Verificar el estado de la boteria.						
34	Verificar estado general del balde y pala (bujes, pasadores, dientes, esquineras, cortibles).						
35	Verificar estado del seguridad del par de apriete de las tuercas de ruedas.						
36	Verificar estado del sistema de escape.						
37	Verificar funcionamiento de arranque en punto muerto.						
38	Verificar estado de sistema de dirección de emergencia.						
39	Lubricar pivotes y varillajes del eje de la dirección.						
40	Verificar estado de la dirección y funcionamiento/fugas.						

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación.

X Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GMA-11
		Fecha	3/11/2020
		Versión	1
		Página	2 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: centro abastos Bucaramanga
OPERADOR: Jesus Alberto Hedriano Luz
PROYECTO: CONSORCIO CAUCE

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	15-09-20	16-09-20	17-09-20	18-09	19	20-	
HORÓMETRO	13786	13793	13801	13870	13818	13822	
COMBUSTIBLE	/	/	35	/	/	/	
ACEITE MOTOR	/	/	/	/	/	/	
ACEITE HIDRÁULICO	/	/	/	/	/	/	
ACEITE TRANSMISIÓN	/	/	/	/	/	/	
GRASA	/	/	/	/	/	/	
REFRIGERANTE	/	/	/	/	/	/	
OTRO	/	/	/	/	/	/	

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Jesus Alberto H.
FECHA	
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	GM-F-11
Fecha	3/11/2020
Versión	1
Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA: RETROCARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CEDULA	EQUIPO	SERIE	UBICACIÓN
Jesus Alberto M		4 9	CAT 420 f2	

INSPECCIÓN

CRITERIO DE CONTROL	MES:	Septiembre			AÑO:	2025
	22	23	24	33	26	27
Verificar el funcionamiento de todas las luces externas (delanteras, traseras, direccionales, stops)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado extintor de incendios	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado de vidrio panoramico	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado de limpiaparabrisas (liquido, plumillas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado del asiento y cinturón de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar escaleras y apoyos de accesos	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado de palancas y pedales	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar aire acondicionado	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado de espejos	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar pito-alarma de retroceso	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar funcionamiento de freno de mano	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar el funcionamiento de todos los interruptores	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar el estado de todos los equipos electricos	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidraulicos, refrigerante, horómetro, corriente)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar nivel de aceite del motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar el nivel de aceite en sistema hidraulico	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Controlar el nivel de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Limpiar y drenar separador de agua	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar nivel de aceite de la servo transmision	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado y nivel de refrigerante	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar el funcionamiento de todos los mandos de arranque y levante de brazo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lubricar dispositivo de enganche rápido de la excavadora y el brazo de la cargadora	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado y funcionamiento del motor de arranque	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lubrica pala de cuchara	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado de accionamiento del cierre de la pluma	✓	✓	✓	✓	✓	✓
verificar estado de mangueras	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado de las llantas (presiones de neumaticos, cortaduras, abultamientos)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado bocinas	✓					✓
Verificar estado de la pintura	✓					✓
Verificar puertas y ventanillas	✓					✓
Verificar estado de soportes de los estabilizadores y estado de cilindros (emplazamiento lateral)	✓					✓
Verificar el estado de la bateria	✓					✓
Verificar estado general del balde y pala (bujes, pasadores, dientes, soldaduras, rajaduras)	✓					✓
Verificar estado del seguridad del par de apriete de las tuercas de ruedas	✓					✓
Verificar estado del sistema de escape	✓					✓
Verificar funcionamiento de arranque en punto muerto	✓					✓
Verificar estado de sistema de dirección de emergencia	✓					✓
Lubricar pivotes y varillajes del eje de la dirección	✓					✓
Verificar estado de la dirección y funcionamiento/fugas	✓					✓

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación.

X Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple llenar observaciones

OBSERVACIONES

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	GM-F-...
Fecha	31/10/20...
Versión	1
Página	1 de 1

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: centro abastos Bucaramanga
OPERADOR: JESUS ALBERTO HIJUELOS LUNA
PROYECTO: CONSORCIO COVE

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	22	23	24	25	26	27	
HORÓMETRO	13831	13840	13848	13855	13863	13867	
COMBUSTIBLE	/	/	30	/	/	30	
ACEITE MOTOR	/	/	/	/	/		
ACEITE HIDRÁULICO	/	/	/	/	/		
ACEITE TRANSMISIÓN	/	/	/	/	/		
GRASA	/	/	/	/	/		
REFRIGERANTE	/	/	/	/	/		
OTRO	/	/	/	/	/		

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Jesus Alberto H.
FECHA	
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	GMF-11
Fecha	3/11/2023
Versión	1
Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA: RETROCARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	EQUIPO	PLACA	UBICACIÓN
Jesus Alberto L		# 9	CAT 416F	

INSPECCIÓN

CRITERIO DE CONTROL	MES	Octubre				AÑO	2023	
		29	30	1	2	3	4	5
Verificar el funcionamiento de todas las luces externas (delanteras, traseras, direccionales, stops)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado extintor de incendios.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado de vidrio panoramico.		✓	✓	✓	✓	✓		
Verificar estado de limpiaparabrisas (liquido, plumillas).		✓	✓	✓	✓	✓		
Verificar estado del asiento y cinturón de seguridad.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar escaleras y apoyos de acceso.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado de palancas y pedales.		✓	✓	✓	✓	✓		✓
Verificar aire acondicionado.		✓	✓	✓	✓	✓		✓
Verificar estado de espejos.		✓	✓	✓	✓	✓		✓
Verificar pito-alarma de retroceso.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar funcionamiento de freno de mano.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.		✓	✓	✓	✓	✓		
Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.		✓	✓	✓	✓	✓		
Verificar el estado de todos los equipos eléctricos.		✓	✓	✓	✓	✓	O	✓
Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidráulicos, refrigerante, horómetro, corriente).		✓	✓	✓	✓	✓		✓
Verificar nivel de aceite del motor.		✓	✓	✓	✓	✓		
Verificar el nivel de aceite en sistema hidráulico.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Controlar el nivel de combustible.		✓	✓	✓	✓	✓		
Limpiar y drenar separador de agua.		✓	✓	✓	✓	✓		O
Verificar nivel de aceite de la servo transmisión.		✓	✓	✓	✓	✓		
Verificar estado y nivel de refrigerante.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante de brazo.		✓	✓	✓	✓	✓		
Lubricar dispositivo de enganche rápido de la excavadora y el brazo de la cargadora.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado y funcionamiento del motor de arranque.		✓	✓	✓	✓	✓		
Lubrica pala de cuchara.		✓	✓	✓	✓	✓		
Verificar estado de accionamiento del cierre de la pluma.		✓	✓	✓	✓	✓		
verificar estado de mangueras.		✓	✓	✓	✓	✓		
Verificar estado de las llantas (presiones de neumaticos, cortaduras, abultamientos).		✓	✓	✓	✓	✓		
Verificar estado bulquin.								
Verificar estado de la pintura.								
Verificar puertas y ventanillas.								
Verificar estado de soportes de los estabilizadores y estado de cilindros (desplazamiento lateral)								
Verificar el estado de la bateria.								
Verificar estado general del balde y pala (bujes, pasadores, dientes, esquineras, cuchillas).								
Verificar estado del seguridad del par de apriete de las tuercas de ruedas.								
Verificar estado del sistema de escape.								
Verificar funcionamiento de arranque en punto muerto.								
Verificar estado de sistema de direccion de emergencia.								
Lubricar pivotes y varillajes del eje de la dirección.								
Verificar estado de la dirección y funcionamiento/fugas.								

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación.

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

solicito mantenicion mando delantero por mal funcionamiento

encendido del equipo tardan fuera de lo normal

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	GM-F-11
Fecha	3/10/2025
Versión	1
Página	2 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: centro Abastos Bucaramanga
OPERADOR: Jesus Alberto Medina Luna
PROYECTO: CONSORCIO CAUCE

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	29	30	1	2	3	4	5
HORÓMETRO	13883	13883	13888	13898	/	/	/
COMBUSTIBLE		/	/	30	/	/	/
ACEITE MOTOR	/	/	/	/	/	/	/
ACEITE HIDRÁULICO	/	/	/	/	/	/	/
ACEITE TRANSMISIÓN	/	/	/	/	/	/	/
GRASA	/	/	/	/	/	/	/
REFRIGERANTE	/	/	/	/	/	/	/
OTRO	/	/	/	/	/	/	/

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Jesus Alberto M
FECHA	
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	

Anexo 3. Control de ingreso y salida de material.- certificados de calidad.

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Consorcio Cauca — MATERIAL: ACPM
RESPONSABLE: Freddy Fredy Gil — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT
						26 07 25	30	Compresor #59		330
						26 07 25	30	Compresor #70		300
						26 07 25	60	Retro # 29		240
						26 07 25	60	Retro # 33		180
28 07 25				Gal	360					540
						28 07 25	30	Compresor #59		510
						28 07 25	5	Mantenimiento		505
						29 07 25	40	Compresor #70		465
						29 07 25	60	Retro # 33		405
						29 07 25	10	Mini #24		395
						29 07 25	30	Compresor #59		365
						30 07 25	60	Retro # 29		245
30 07 25						30 07 25	40	Compresor #59		255
30 07 25				Gal	360					615
						31 07 25	60	Retro # 35		555
						31 07 25	60	Retro # 76		495
						31 07 25	35	Planta # 9		460
						31 07 25	60	Compresor #37		400
						31 07 25	5	Mantenimiento		395
						01 08 25	60	Retro # 33		335
						01 08 25	60	Retro # 76		275
						01 08 25	40	Compresor #59		235
						04 08 25	25	Planta # 9		210
						04 08 25	9	Mini #24		201
						04 08 25	40	Compresor #59		161
						04 08 25	55	Compresor #69		106

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 15

PROYECTO: Camerino Gasca | MATERIAL: ACERO
RESPONSABLE: Teddy Yunior G. | CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
04.08.25				Gal	300	05.08.25	60	Pedro #39		346
						05.08.25	60	Pedro #38		286
						05.08.25	25	Compresor #69		261
						05.08.25	5	Mantenimiento		256
						06.08.25	60	Pedro #35		196
						06.08.25	40	Compresor #39		156
06.08.25				Gal	360				Jhonatan	516
						07.08.25	60	Pedro #32		456
						07.08.25	35	Pequeño #9		421
						07.08.25	20	Compresor #98		401
						08.08.25	30	Compresor #70		371
						08.08.25	60	Pedro #36		311
						08.08.25	60	Pedro #33		251
						08.08.25	10	Compresor #98		241
						08.08.25	5	Mantenimiento		236
						09.08.25	30	Compresor #70		206
						09.08.25	55	Pedro #32		151
						09.08.25	30	Compresor #98		121
09.08.25				Gal	360				Jhonatan	481
						11.08.25	60	Pedro #39		421
						11.08.25	25	Pequeño #9		396
						11.08.25	30	Compresor #98		366
						11.08.25	30	Compresor #70		336
						11.08.25	5	Mantenimiento		331
						11.08.25	60	Pedro #35		271
						12.08.25	30	Compresor #98		241

Powered by CamScanner


	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-35
		Fecha	18/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 16

PROYECTO: Conjunto Cayeth
RESPONSABLE: Teddy Fuentes Gil

MATERIAL: ACPM
CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
						12 08 25	50	Compresor #70		131
12 08 25				Gal	360				Jose Silva	491
						13 08 25	60	Compresor #38		431
						13 08 25	40	Compresor #58		391
						13 08 25	30	Compresor #59		361
						13 08 25	30	Compresor #70		331
						13 08 25	60	Retro #35		271
						13 08 25	60	Retro #7A		211
						14 08 25	35	Pavimentadora #9		176
						14 08 25	20	Mini #93		156
						14 08 25	10	Compresor #59		146
14 08 25				Gal	360					506
						15 08 25	60	Retro #73		446
						15 08 25	60	Retro #7A		386
						15 08 25	60	Retro #35		326
						15 08 25	5	Mini #7A		321
						15 08 25	30	Compresor #30		291
						19 08 25	50	Compresor #59		241
						19 08 25	60	Compresor #70		181
						19 08 25	5	Motobomba #0		176
						20 08 25	60	Retro #35		116
						20 08 25	15	Mini #7A		101
20 08 25				Gal	360					461
						20 08 25	40	Compresor #30		421
						20 08 25	30	Pavimentadora #9		391
						20 08 25	60	Retro #73		331

Powered by CamScanner

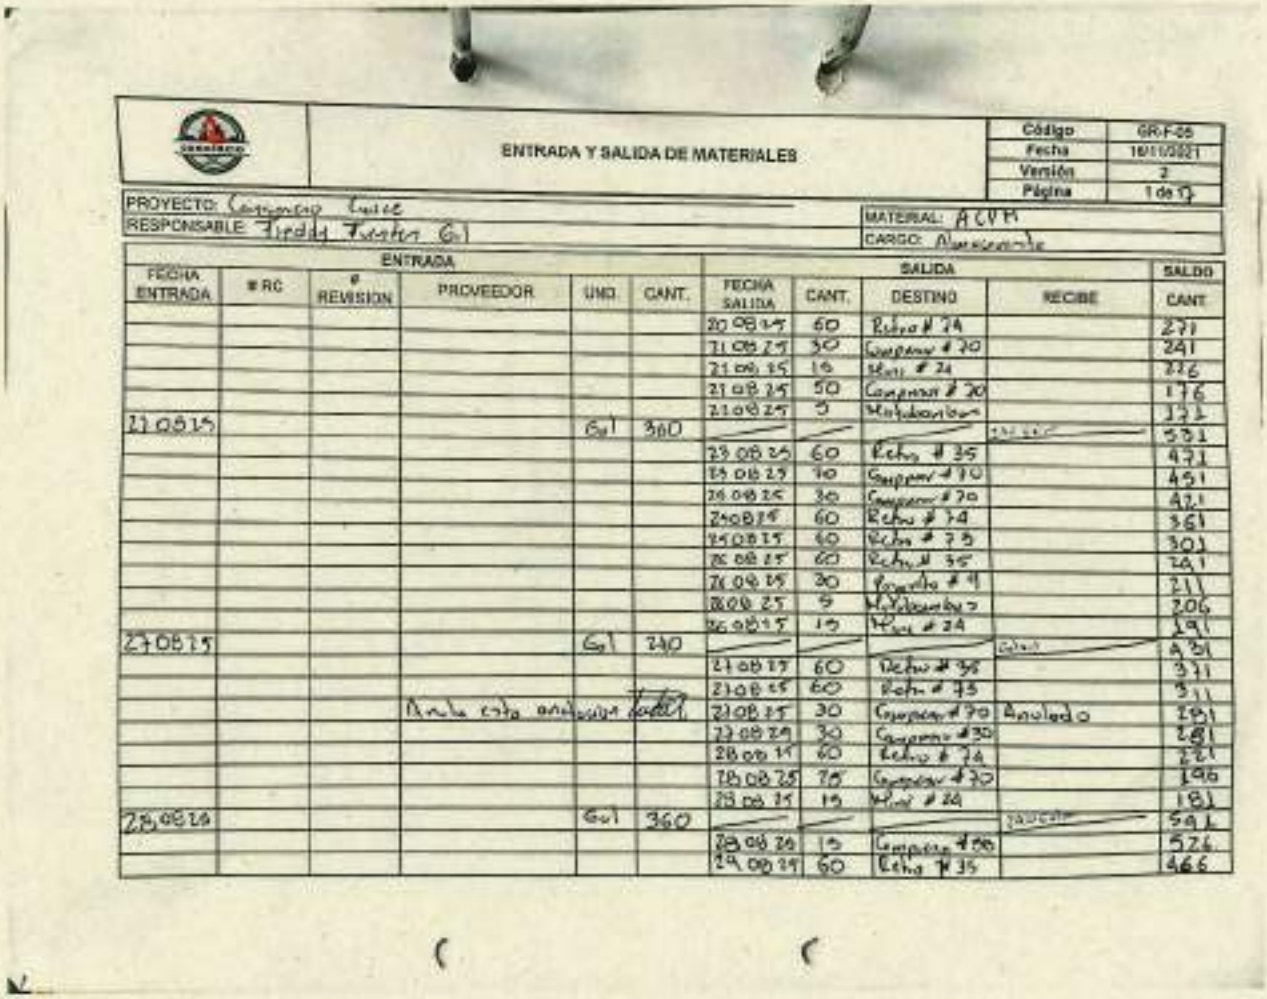

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	18/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Campamento Cuiva
RESPONSABLE: Freddy Fuentes Gil

MATERIAL: ACPM
CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REVISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
						20 08 25	60	Retro # 74		271
						21 08 25	30	Compac # 70		241
						21 08 25	15	Mini # 24		226
						21 08 25	50	Compac # 70		176
						21 08 25	5	Motobombas		171
21 08 25				Gal	360				[illegible]	531
						23 08 25	60	Retro # 35		471
						23 08 25	40	Compac # 70		431
						24 08 25	30	Compac # 70		401
						24 08 25	60	Retro # 74		341
						24 08 25	60	Retro # 75		281
						25 08 25	60	Retro # 35		221
						26 08 25	30	Compac # 9		191
						26 08 25	5	Motobombas		186
						26 08 25	15	Mini # 24		171
27 08 25				Gal	240				[illegible]	411
						27 08 25	60	Retro # 35		351
						27 08 25	60	Retro # 75		291
			Anula esta anotación [illegible]			27 08 25	30	Compac # 70	Anulado	291
						27 08 29	30	Compac # 30		261
						28 08 25	60	Retro # 74		201
						28 08 25	75	Compac # 70		126
						28 08 25	15	Mini # 24		111
28 08 25				Gal	360				[illegible]	471
						28 08 25	15	Compac # 70		456
						29 08 25	60	Retro # 35		396

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	15/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 15

PROYECTO Catamaran Coupe — MATERIAL ACERO

RESPONSABLE Jhon Tuirán G.I — CARGO Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT	FECHA SALIDA	CANT	DESTINO	RECIBE	CANT.
						29/08/19	30	Polipasto # 9		416
						29/08/19	19	Compuerta #46		421
						29/08/19	5	Bol[illegible]		416
						30/08/19	50	Compuerta #30		366
31/08/19				GJ.	240				Cancelado	606
						01/09/19	60	Eje # 55		546
						01/09/19	60	Eje # 75		486
						01/09/19	60	Eje # 58		426
						01/09/19	30	Compuerta #33		396
						01/09/19	60	Compuerta #49		336
						01/09/19	5	Polipasto		331
						02/09/19	20	Compuerta #64		311
						03/09/19	60	Eje # 35		251
						03/09/19	30	Compuerta #44		221
03/09/19				GJ	360				Sin Saldo	581
03/09/19				GJ	120					701
						04/09/19	60	Eje # 33		641
						04/09/19	59	Eje # 74		586
						04/09/19	50	Compuerta #39		536
						05/09/19	40	Compuerta #39		496
						05/09/19	5	Polipasto		491
						06/09/19	30	Polipasto # 9		461
						06/09/19	19	Compuerta #28		442
						08/09/19	60	Eje # 39		382
						08/09/19	30	Compuerta #38		352
08/09/19				GJ	410				Sin saldo	762

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 20

PROYECTO: Consorcio Cauce — MATERIAL: ACPM
RESPONSABLE: Yenddy Tarazona Gil — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
						09.09.25	60	Retro #34		706
						09.09.25	60	Retro #26		646
						09.09.25	40	Compresor #58		606
						09.09.25	5	Motobomba		601
						09.09.25	15	Mini #28		586
						09.09.25	60	Retro #34		526
						10.09.25	5	Formaleta - Tensor		521
						10.09.25	40	Compresor #58		481
						11.09.25	40	Compresor #58		441
						12.09.25	20	Compresor #58		421
						12.09.25	60	Retro #35		361
						15.09.25	60	Retro #33		301
						15.09.25	60	Retro #34		241
						15.09.25	15	Mini #28		226
						15.09.25	5	Motobomba		221
15.09.25				Gal	360					581
						16.09.25	60	Retro #33		521
						16.09.25	5	Formaleta - Tensor		516
						16.09.25	25	Pajarito #9		491
						16.09.25	5	Compresor #58		486
						16.09.25	5	Compresor #59		481
						17.09.25	60	Retro #33		421
						17.09.25	15	Mini #28		406
						18.09.25	60	Retro #36		346
						18.09.25	60	Retro #36		286
						18.09.25	35	Pajarito #9		251

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	18/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 38

PROYECTO: Campamento Cauca — MATERIAL: ACPM

RESPONSABLE: Freddy Fredy Gil — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
						18.09.25	9	Compresor #59		246
18.09.25				Gal	240					486
						19.09.25	60	Retro #39		426
						19.09.25	5	Trompo Concreto		421
						20.09.25	16	Mini #24		405
						22.09.25	60	Retro #37		345
						22.09.25	60	Retro #33		285
						22.09.25	60	Retro #34		225
						22.09.25	25	Pajarito #9		200
						22.09.25	10	Compresor #59		190
						22.09.25	5	Motobomba		185
23.09.25				Gal	360					545
						24.09.25	60	Retro #35		485
						24.09.25	30	Pajarito #9		455
						24.09.25	15	Mini #24		440
						25.09.25	60	Retro #33		380
						25.09.25	60	Retro #34		320
						26.09.25	60	Retro #36		260
						26.09.25	5	Motobomba		255
						27.09.25	30	Pajarito #9		225
						29.09.25	60	Ret #33		165
29.09.25				Gal	360					525
						30.09.25	60	Retro #34		465
						30.09.25	60	Retro #35		405
						01.10.25	60	Retro #35		345
						02.10.25	60	Retro #33		285

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	18/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Consorcio Conif — MATERIAL: Acero - Anclas 100

RESPONSABLE: Freddy Fuentes Gil — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
04 07 25		Transf. 3169	El Carmelo	Lt.	19	08 07 25	1	Montaje Mza 12		18
						09 07 25	1	Montaje Mza 17	HP1	17
						15 07 25	1	Montaje Mza 12		16
						17 07 25	1	Montaje Mza 12		15
						22 07 25	1	Montaje Mza 12		14
						24 07 25	1	Montaje Mza 17	HP1	13
						28 07 25	1	Montaje Mza 17	HP1	12
						28 07 25	1	Montaje Mza 12		11
						04 08 25	1	Montaje Mza 17	HP1	10
						05 08 25	1	Montaje Mza 12		9
						07 08 25	1	Montaje Mza 17	HP1	8
						08 08 25	1	Montaje Mza 7	Jairo Garcia	7
						11 08 25	1	Montaje Mza		6
15 08 25		29895	Tillay Chevrolet Willy	Lt.	19					25
						11 08 25	1	Montaje Mza 17	HP1	24
						20 08 25	1	Montaje Mza 17	HP1	23
						20 08 25	1	Montaje Mza 7	Jairo Garcia	22
						23 08 25	1	Montaje Mza 17	HP1	21
						08 09 25	1	Montaje Mza 7	Jairo Garcia	20

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-06
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Comando Cenit | MATERIAL: Hierro Figurado Ø 8m

RESPONSABLE: Freddy Tuesta Gil | CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
						07 09 25	1 H	Pinos Tramo 1	Luis Fernando Tuesta	28
						28 09 25	1 H	Pinos Tramo 1	Luis Fernando Tuesta	27
						30 09 25	1 E	Pinos Tramo 1	Yuriel Quintero	26
						31 09 25	1 E	Pinos Tramo 1	Yuriel Quintero	25
						04 08 25	1 H	Pinos Tramo 1	Luis Fernando Tuesta	24
						04 08 25	1 E	Pinos Tramo 1	Yuriel Quintero	23
						05 08 25	1 H	Pinos Tramo 1	Luis Fernando Tuesta	22
						11 08 25	2 E	Pinos Tramo 1	Yuriel Quintero	20
13 08 25		A9697	Condirecto	UND	30					50
						15 08 25	1 H	Pinos Tramo 1	Luis Fernando Tuesta	49
						19 08 25	1 H	Pinos Tramo 1	Luis Fernando Tuesta	48
						20 08 25	2 E	Pinos Tramo 1	Yuriel Quintero	46
						21 08 25	1 H	Pinos Tramo 1	Luis Fernando Tuesta	45
						29 08 25	1 E	Pinos Tramo 1	Yuriel Quintero	44
						29 08 25	2 E	Pinos Tramo 1	Yuriel Quintero	42
						04 09 25	1 H	Pinos Tramo 1	Luis Fernando Tuesta	41
						05 09 25	1 H	Pinos Tramo 1	Luis Fernando Tuesta	40
						08 09 25	2 H	Pinos Tramo 1	Luis Fernando Tuesta	38
						11 09 25	2 H	Pinos Tramo 1	Luis Fernando Tuesta	36
						15 09 25	2 H	Pinos Tramo 1	Luis Fernando Tuesta	34
						16 09 25	3 H	Pinos Tramo 1	Luis Fernando Tuesta	31
						17 09 25	4 H	Pinos Tramo 1	Luis Fernando Tuesta	27
						17 09 25	2 E	Pinos Tramo 1	Yuriel Quintero	25
						22 09 25	2 H	Pinos Tramo 1	Luis Fernando Tuesta	23
						26 09 25	2 H	Pinos Tramo 1	Luis Fernando Tuesta	21
						26 09 25	2 E	Pinos Tramo 1	Yuriel Quintero	19

Powered by CamScanner


	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	OR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Comercio Cojec
RESPONSABLE: Freddy Fuentes G.

MATERIAL: Acero Figurado 3/8 a 6m
CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
23 07 25		63182997	Gyl Inversiones	UND	100	28 07 25	18 M	Dinpadores	Luis fernando Tuesta	82
						26 07 25	14 M	Dinpadores	Luis fernando Tuesta	68
						28 07 25	6 M	Dinpadores	Luis fernando Tuesta	62
						31 07 25	7 M	Dinpadores	Luis fernando Tuesta	55
						01 08 25	12 M	Dinpadores	Luis fernando Tuesta	43
						04 08 25	8 M	Dinpadores	Luis fernando Tuesta	35
						05 08 25	7 M	Dinpadores	Luis fernando Tuesta	28
						06 08 25	9 M	Dinpadores	Luis fernando Tuesta	19
						07 08 25	8 M	Dinpadores	Luis fernando Tuesta	11
						08 08 25	6 M	Dinpadores	Luis fernando Tuesta	5
						09 08 25	1 M	Dinpadores	Luis fernando Tuesta	413
13 08 25		A9681	Conducto	UND	200					209
						13 08 25	20 M	Dinpadores	Luis fernando Tuesta	184
						14 08 25	14 M	Dinpadores	Luis fernando Tuesta	170
						18 08 25	21 M	Dinpadores	Luis fernando Tuesta	149
						19 08 25	17 M	Dinpadores	Luis fernando Tuesta	132
						20 08 25	10 M	Dinpadores	Luis fernando Tuesta	122
						21 08 25	5 M	Dinpadores	Luis fernando Tuesta	117
						22 08 25	2 M	Dinpadores	Luis fernando Tuesta	115
						25 08 25	4 M	Dinpadores	Luis fernando Tuesta	111
						01 09 25	52 M	Dinpadores	Luis fernando Tuesta	59
						02 09 25	7 M	Dinpadores	Luis fernando Tuesta	52
						03 09 25	10 M	Dinpadores	Luis fernando Tuesta	42
						05 09 25	8 M	Dinpadores	Luis fernando Tuesta	34
						08 09 25	11 M	Dinpadores	Luis fernando Tuesta	23
						12 09 25	4 M	Dinpadores	Luis fernando Tuesta	19

Powered by CamScanner

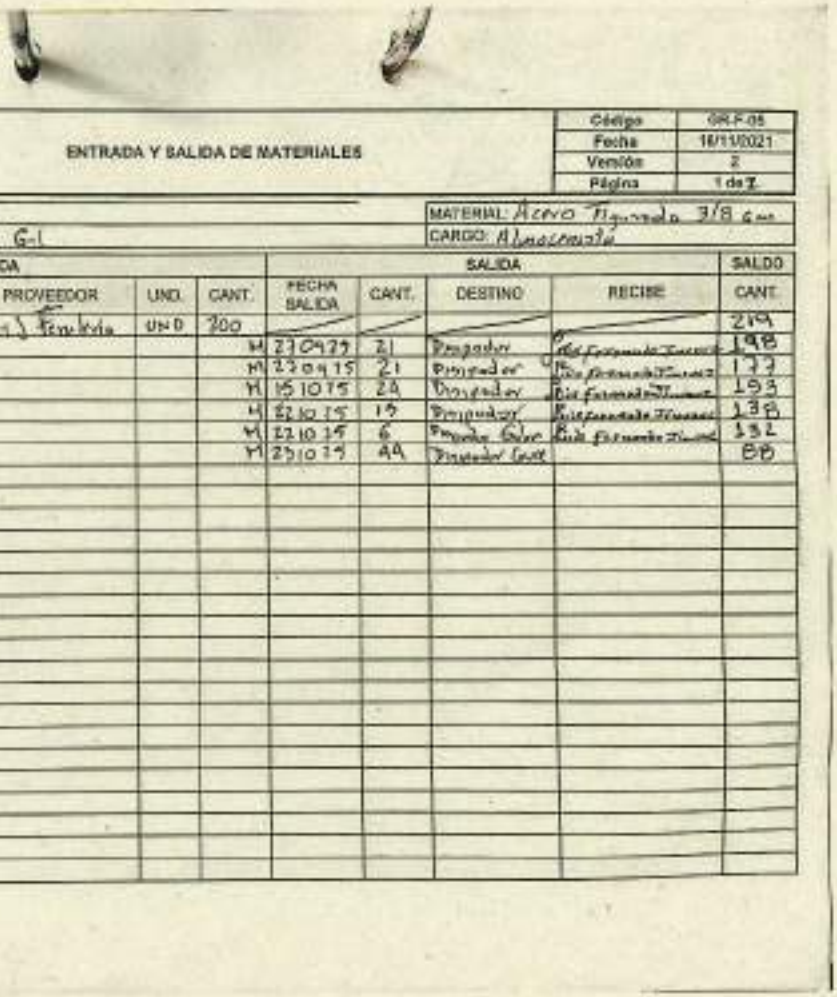


	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GRF-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Comercio Civil — MATERIAL: Acero Figurado 3/8 cm

RESPONSABLE: Teddy Tunka G-1 — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
16 09 25		6778115	Co-J Ferreteria	UND	200					219
						M 27 09 25	21	Pregador	Ale Fernando Tunca	198
						M 27 09 25	21	Pregador	Ale Fernando Tunca	177
						M 15 10 25	24	Pregador	Ale Fernando Tunca	153
						M 22 10 25	15	Pregador	Ale Fernando Tunca	138
						M 22 10 25	6	Pregador Color	Ale Fernando Tunca	132
						M 25 10 25	44	Pregador Civil		88

Powered by CamScanner



	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	18/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Consorcio Cauca — MATERIAL: Acero Figurado 6/8 x 240

RESPONSABLE: Todd Tumbo G. — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMESION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
						25 09 25	14 H	Drekllon C	Disponible Turno	121
						26 09 25	20 E	Drekllon E	Yuriel Quintero	101
						30 09 25	20 E	Drekllon P	Yuriel Quintero	81
						01 10 25	21 E	Drekllon P	Yuriel Quintero	60
						02 10 25	14 H	Drekllon C	Disponible Turno	46
						02 10 25	18 H	Drekllon C	Disponible Turno	28
						02 10 25	20 H	Drekllon C	Disponible Turno	8
						30 09 25	07 E	Drekllon M	Yuriel Quintero	0
19 09 25		83758168	Cons Ingeniería	UND	300	16 09 25	9 E	Drekllon	Yuriel Quintero	291
						19 09 25	18 E	Drekllon	Yuriel Quintero	273
						19 09 25	18 E	Drekllon	Yuriel Quintero	255
						22 09 25	18 E	Drekllon	Yuriel Quintero	237
						23 09 25	16 E	Drekllon	Yuriel Quintero	221
						25 09 25	16 E	Drekllon	Yuriel Quintero	205
						29 09 25	22 H	Drekllon	Disponible Turno	183
						29 09 25	18 E	Drekllon	Yuriel Quintero	163
						30 09 25	19 H	Drekllon	Disponible Turno	144
						01 10 25	18 E	Drekllon	Yuriel Quintero	130
						02 10 25	10 H	Drekllon	Disponible Turno	120
						03 10 25	20 E	Drekllon		100
						03 10 25	2 E	Drekllon		98
						03 10 25	16 H	Drekllon	Disponible Turno	82
						06 10 25	12 H	Drekllon	Disponible Turno	70
						06 10 25	19 E	Drekllon		51
						07 10 25	11 H	Drekllon	Disponible Turno	40
						07 10 25	20 E	Drekllon		20

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Commercio Court — MATERIAL: Acero Troquelado 5/8 x 6m
RESPONSABLE: Freddy Tuesta Gil — CARGO: Almacenero

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REVISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
13 08 25		6333954	G y J Ferreyros	UNID	50	14 08 25	3 E	Perfiles RG	Daniel Quispe	47
						20 08 25	6 E	Perfiles C	Daniel Quispe	41
						21 08 25	6 E	Perfiles C	Daniel Quispe	35
						26 08 25	6 E	Perfiles C	Daniel Quispe	29
						29 08 25	8 E	Perfiles C	Daniel Quispe	21
						01 09 25	6 E	Perfiles C	Daniel Quispe	15
						05 09 25	6 E	Perfiles C	Daniel Quispe	9
						10 09 25	6 E	Perfiles C	Daniel Quispe	3
						16 09 25	3 E	Perfiles C	Daniel Quispe	0

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Consorcio Cusco — MATERIAL: Revestido

RESPONSABLE: Freddy Fuentes Gil — CARGO: Almacenero

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	#RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
06-11-24				UND	1	07-11-24	1	Topografia		0
21-11-24		3/Rem	Consorcio	UND	4	26-11-24	1	Topografia		3
					M	22-01-25	1	Cont. Martinez		2
						20.01.25	1	Topografia		1
31.03.25		1-0402	Daniel Tuvalano	UND	2 M	01.04.25	2	Contratista Maldonado		1
						09.04.25	1	Fabio Bautista		0
21.05.25		1-0529	Daniel Tuvalano	UND	4 M	09.06.25	1	Contratista Maldonado		3
					M	08.09.25	1	Contratista Maldonado		2
						08.09.25	1	Topografia		1
					M	10.09.25	1	Contratista Maldonado		1
						09.09.25	1	Mario Arriaga		0
22.09.25		1-0910	Daniel Tuvalano	UND	2	23.09.25	1	Mario Arriaga		1

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Comercio Cauce — MATERIAL: Alambre Galvanizado #12 Galvan
RESPONSABLE: Freddy — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
					E	19 06 25	100	Galvanizado	Uriel Quintero	2767
					M	19 06 25	100	Galvanizado	Luis Fernando Tigreros	2667
					M	20 06 25	100	Galvanizado	Luis Fernando Tigreros	2967
29 06 25		2506187	Melón y Galvanizado	Kg	600					3167
					E	25 06 25	100	Galvanizado	Uriel Quintero	3067
					E	27 06 25	100	Galvanizado	Uriel Quintero	2967
					M	30 06 25	100	Galvanizado	Luis Fernando Tigreros	2867
					E	03 07 25	80	Galvanizado	Uriel Quintero	2787
					E	07 07 25	100	Galvanizado	Uriel Quintero	2687
					E	10 07 25	100	Galvanizado	Uriel Quintero	2587
					E	13 07 25	100	Galvanizado	Uriel Quintero	2487
					M	16 07 25	100	Galvanizado	Luis Fernando Tigreros	2387
					E	17 07 25	100	Galvanizado	Uriel Quintero	2287
					M	18 07 25	100	Galvanizado	Luis Fernando Tigreros	2187
					E	21 07 25	100	Galvanizado	Uriel Quintero	2087
					M	29 07 25	100	Galvanizado	Luis Fernando Tigreros	1987
					E	26 07 25	160	Galvanizado	Uriel Quintero	1827
					M	29 07 25	108	Galvanizado	Luis Fernando Tigreros	1719
					E	31 07 25	100	Galvanizado	Uriel Quintero	1619
					E	05 08 25	88	Galvanizado	Uriel Quintero	1527
					M	05 08 25	100	Galvanizado	Luis Fernando Tigreros	1427
					M	08 08 25	100	Galvanizado	Luis Fernando Tigreros	1327
					E	08 08 25	100	Galvanizado	Uriel Quintero	1227
					E	12 08 25	100	Galvanizado	Uriel Quintero	1127
					M	14 08 25	100	Galvanizado	Luis Fernando Tigreros	1027
					E	19 08 25	100	Galvanizado	Uriel Quintero	927

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GRF-35
		Fecha	18/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 5

PROYECTO: Corporativo Cavas — MATERIAL: Alambre Galvanizado #12 Grado
RESPONSABLE: Yuddy Ruano G. — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
						E 19/08/25	100	Gaviones	Oziel Quintero	827
						M 25/08/25	100	Gaviones	Luis Fernando Tunch	700
						E 25/08/25	105	Gaviones	Oziel Quintero	595
						M 26/08/25	105	Gaviones	Luis Fernando Tunch	490
						E 27/08/25	110	Gaviones	Oziel Quintero	380
						M 29/08/25	100	Gaviones	Luis Fernando Tunch	280
						E 01/09/25	100	Gaviones	Oziel Quintero	180
						M 02/09/25	100	Gaviones	Luis Fernando Tunch	80
03/09/25		2509032	Malla y Gaviones	Kg	300	M 04/09/25	80	Gaviones	Luis Fernando Tunch	300
						M 08/09/25	100	Gaviones	Luis Fernando Tunch	200
						E 09/09/25	100	Gaviones	Oziel Quintero	100
08/09/25		2509071	Malla y Gaviones	Kg	400					500
10/09/25		2509109	Malla y Gaviones	Kg	300					800
						M 15/09/25	100	Gaviones	Luis Fernando Tunch	700
						E 17/09/25	100	Gaviones	Oziel Quintero	600
						M 19/09/25	100	Gaviones	Luis Fernando Tunch	500
						C 25/09/25	100	Gaviones	Oziel Quintero	400
						M 25/09/25	100	Gaviones	Luis Fernando Tunch	300
						M 29/09/25	100	Gaviones	Luis Fernando Tunch	200
						E 30/09/25	100	Gaviones	Oziel Quintero	100
						M 01/10/25	100	Gaviones	Luis Fernando Tunch	0
05/10/25		2509[illegible]	Malla y Gaviones	Kg	600	M 07/10/25	100	Gaviones	Luis Fernando Tunch	500
						C 09/10/25	100	Gaviones		400
09/10/25		2510092	Malla y Gaviones	Kg	250					650
						M 10/10/25	96	Gaviones	Luis Fernando Tunch	554
18/10/25		2510121	Malla y Gaviones	Kg	200					754

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GRF-03
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 2

PROYECTO: Consorcio Covel — MATERIAL: Alambre Galvanizado #14 Liso

RESPONSABLE: Freddy Fuentes G. — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	#RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
										1429
17 05 25		2505160	Mallas y Gaviones	Kg.	300					1729
						02 06 25	100 M	Gaviones	Luis Fernando Jimenez	1629
						05 06 25	100 E	Gaviones	Uriel Quintero	1529
						11 06 25	100 M	Gaviones	Luis Fernando Jimenez	1429
						24 06 25	100 M	Gaviones	Luis Fernando Jimenez	1329
						28 06 25	100 E	Gaviones	Uriel Quintero	1229
						29 06 25	50	Mamposteria	Uriel	1179
06 05 25		2505035	Mallas y Gaviones	Kg.	300					1479
						08 08 25	100 E	Gaviones	Uriel Quintero	1379
						08 08 25	100 M	Gaviones	Luis Fernando Jimenez	1279
17 05 25		2505116	Mallas y Gaviones	Kgs	150					1429
						20 08 25	100 M	Gaviones	Luis Fernando Jimenez	1329
22 05 25		2505166	Mallas y Gaviones	Kg.	150					1479
26 05 25		2505199	Mallas y Gaviones	Kg.	150					1629
03 06 25		2506009	Mallas y Gaviones	Kg.	300					1529
						05 06 25	100 M	Gaviones	Luis Fernando Jimenez	1429
						11 06 25	100 E	Gaviones	Uriel Quintero	1329
						11 06 25	100 M	Gaviones	Luis Fernando Jimenez	1629
11 06 25		2506076	Mallas y Gaviones	Kg	300					1929
20 06 25		2506183	Mallas y Gaviones	Kg	300					1829
						27 06 25	100 E	Gaviones	Uriel Quintero	1629
						27 06 25	200 M	Gaviones	Luis Fernando Jimenez	1329
						16 07 25	100 M	Gaviones	Luis Fernando Jimenez	1429
						21 07 25	100 E	Gaviones	Uriel Quintero	1379
						29 07 25	50 M	Gaviones	Luis Fernando Jimenez	1279
						04 08 25	100 E	Gaviones	Uriel Quintero	

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 3

PROYECTO: Consorcio Canal — MATERIAL: Alambre Galvanizado #14 Fino

RESPONSABLE: Freddy Fuentes G. — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
						11 08 25	100 M	Ganancia	Luis fernando tiznado	1279
						19 08 25	100 E	Ganancia	Yuri Alquiatore	1079
						22 08 25	25 M	Ganancia	Luis fernando tiznado	1054
						27 08 25	50 M	Ganancia	Luis fernando tiznado	1004
						29 08 25	100 M	Ganancia	Luis fernando tiznado	904
						05 09 25	50 E	Ganancia	Yuri Alquiatore	854
						08 09 25	100 M	Ganancia	Luis fernando tiznado	754
						15 09 25	75 M	Ganancia	Luis fernando tiznado	679
						17 09 25	99 E	Ganancia	Yuri Alquiatore	580
						23 09 25	108 M	Ganancia	Luis fernando tiznado	472
						02 10 25	100 M	Ganancia	Luis fernando tiznado	372
03 10 25		25 0091	Rollo y Ganancia	Kg	300					672
						06 10 25	100 E	Ganancia		572
09 10 25		25 0092	Rollos y Ganancia	Kg	125					697
						10 10 25	92.5 M	Ganancia	Luis fernando tiznado	604.5
14 10 25		25 0121	Rollos y Ganancia	Kg	100					704.5
						17 10 25	90 E	Ganancia		614.5
						21 10 25	30 M	Ganancia	Luis fernando tiznado	584.5

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Comercio Cauca — MATERIAL: Alambre Negro Cal. 17

RESPONSABLE: Freddy Trujillo G. — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
05-12-24		3619	La casa del Grupo	Kg	5	05-12-24	1	Varios		4
12-12-24		Ninguna	Ferretería Paredes	Kg	25					29
29-01-25		63227687	G y J. Ferretero	Kg	150					179
						H 30-01-25	12½	Aseo Oficinas	Luis Fernando Tamayo	166.5
						E 14-01-25	12½	Aseo Oficinas	Local Oficinas	154
05-03-25		63272811	G y J. Ferretero	Kg	150					304
						05-03-25	25	Pantallas	Uriel Rivera	279
						02-05-25	25	Pantallas	Angel Garcia	254
						06-05-25	25	Aseo Oficinas	Reinaldo Silva	229
						12-05-25	50	Aseo Oficinas	Reinaldo Silva	179
						12-05-25	3	Varios	Juan Carlos Cardona	176
						13-05-25	25	Pantallas	Victor Trujillo	151
						13-05-25	25	Aseo Oficinas	Reinaldo Silva	126
						17-05-25	25	Pantallas	Angel Garcia	101
						E 05-06-25	12½	Aseo Oficinas	Uriel Rivera	88.5
						H 24-06-25	12½	Aseo Oficinas	Luis Fernando Tamayo	76
						21-07-25	25	Pantallas	Luis Cano	51
29-01-25		63252397	G y J. Ferretero	Kg	50					101
						H 28-07-25	25	Aseo Oficinas	Luis Fernando Tamayo	76
						H 14-08-25	25	Pantallas	Luis Fernando Tamayo	51
						E 19-08-25	25	Pantallas	Uriel Rivera	26
						20-08-25	26	Pantallas	Jhonatan Garcia	0
28-08-25		63283908	G y J. Ferretero	Kg	50	H 10-08-25	25	Aseo Oficinas	Luis Fernando Tamayo	25
16-09-25		63294125	G y J. Ferretero	Kg	50					75
						H 29-09-25	25	Aseo Oficinas	Luis Fernando Tamayo	50
						H 29-10-25	25	Aseo Oficinas	Reinaldo	25

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-35
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 2

PROYECTO: Conjunto Cauce

RESPONSABLE: Yudy Yurley Gil

MATERIAL: Bolsa Roja Juntas Negra-Roja-Blanca-Verde

CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
						09-06-25	3	Negra, Verde, Roja		83
						13-06-25	3	Negras		80
						16-06-25	2	Negras		78
18-06-25		2099	Soyga	UND	20					98
						20-06-25	4	Negra Roja, Verde Blanca Cabeza		94
						24-06-25	2	Negra		92
						02-07-25	2	Negra - Blanca	Cabeza	90
						04-07-25	3	Negra Cauce		87
						07-07-25	2	Verde - Negra C		85
						10-07-25	2	Negras Cauce		83
						14-07-25	4	Negra Blanca, Verde Roja Cabeza		81
16-07-25		2124	Soyga	UND	50					131
						18-07-25	2	Negras		129
						21-07-25	4	Negra, Blanca, Verde Roja		125
						23-07-25	4	Negras		121
						25-07-25	1	Roja		120
						28-07-25	4	Negra, Blanca, Verde Roja Cabeza		116
						04-08-25	2	Negras - Verde		114
						11-08-25	4	Negras		110
						13-08-25	4	Negras - Roja - Verde		106
						20-08-25	3	Negras		103
						28-08-25	4	Negra, Verde, Roja, Blanca		99
						01-09-25	4	Negra, Verde, Roja, Blanca		95
						01-09-25	4	Negra, Verde, Roja, Blanca		91
						05-09-25	4	Negra, Verde, Roja, Blanca		87
						05-09-25	4	Negra, Verde, Roja, Blanca		83

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 3

PROYECTO: Cartagena Center
RESPONSABLE: Freddy Tordecilla

MATERIAL: Bolsa Mezcla Junto Alpha Tex
CARGO: Almacenista Planta Verde

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
						09 09 25	4			79
						11 09 25	4			75
						23 09 25	4			71
						25 09 25	4			67
						2A 10 25	4			63
						28 10 25	4			59
						29 10 25	4			55
						14 11 25	4			51
						15 11 25	4			47

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	18/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Comando Tarif — MATERIAL: Brocas Puntas Protección
RESPONSABLE: Brady Tuesta G. — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
10 07 15		3/5	San Jorge	UNO	2	15 07 15	1	Mapiri # 17	Luis Cano	1
						29 07 15	1	Mapiri # 12	Oriel Rueda	0
11 09 15			San Jorge	UNO	1	18 09 15	1	Mapiri # 17	Franco	0

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 5

PROYECTO: Condominio Coral — MATERIAL: Cemento Gris 50 Kg

RESPONSABLE: Freddy Fuentes Gil — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
						11 07 25	2	Punga - Galon	Gilberto Galan	16
						15 07 25	2	Punga Galon	Elvis Perez	14
						16 07 25	2	Punga - Galon	Leiva Perez	12
						18 07 25	2	Punga - Galon	Leiva Perez	10
						18 07 25	1	Cemento gris		9
						19 07 25	6	P TCA Cemex	Transf. 3197	3
						21 07 25	2	Punga Galon	Leiva Perez	1
					M	23 07 25	1	Arreglo fachada	[illegible]	0
18 07 25			Bodega (Cemex)	UNID	30	24 07 25	2	Punga Galon 2	Leiva Perez	28
						25 07 25	2	Punga Galon 2	Wilmer Fuentes	26
						26 07 25	2	Punga Galon	Wilmer Fuentes	24
					M	28 07 25	8	Piso Polideportivo	[illegible]	16
						28 07 25	2	Punga Galon	Leiva Perez	14
						28 07 25	2	Punga Pto Galon	Leiva Perez	12
					M	29 07 25	7	Piso Polideportivo	[illegible]	5
29 07 25			Bodega (Cemex)	UNID	30					35
					M	29 07 25	4	Piso Polideportivo	[illegible]	31
						29 07 25	4	Punga Pto Galon	Leiva Perez	27
						30 07 25	2	Punga Pto Galon	Leiva Perez	25
						31 07 25	6	Punga - Terminada	Leiva Perez	19
31 07 25			Bodega Cemex	UNID	23					42
						31 07 25	1	Punga Bodega	Leiva Perez	41
						01 08 25	2	Punga Pto G.	Leiva Perez	39
						04 08 25	2	Piso Acm C	Victor Murillo	37
						04 08 25	1	Arreglo Pasarela	[illegible]	36
						05 08 25	1	Punga corral	Leiva Perez	35


Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	18/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 5

PROYECTO: Comercio Civil — MATERIAL: Concreto Gris 50 kg
RESPONSABLE: Teddy Tinoco 61 — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
						04-08-19	4	Mantenimiento	Luis Fernando Tinoco	34
						06-08-19	4	Piso Cocina	Lewis Perez	30
06-08-19		30/66501C	Comer	Bulto	100					130
						07-08-19	3	Piso Pte G	Bryan Rojas	127
						08-08-19	1	Piso Cocina	Lewis Perez	126
						09-08-19	3	Piso Pte G	Lewis Perez	123
						09-08-19	6	Bloquetas	Luis Fernando Tinoco	117
						11-08-19	8	Bodegones	Luis Fernando Tinoco	109
						12-08-19	4	Bodegones	Luis Fernando Tinoco	105
12-08-19		30/66661	Comer	Bulto	100					205
						13-08-19	54	Llenado Andenes	Oliver Sequeira	151
						13-08-19	4	Piso Cocina	Lewis Rojas	147
						14-08-19	85	Llenado Andenes	Oliver Sequeira	62
						14-08-19	2	Piso Cocina	Lewis Rojas	60
						15-08-19	2	Piso	Joseph Caballero	58
19-08-19		30/67911V	Comer	Bulto	100	19-08-19	12	Bodegones	Luis Fernando Tinoco	146
						16-08-19	2	Piso	Lewis	144
						19-08-19	2	Piso	Bryan Rojas	142
						20-08-19	3	Piso	Bryan Rojas	139
						21-08-19	72	Llenado Andenes	Oliver Sequeira	67
						21-08-19	2	Piso	Wilton Torres	65
						22-08-19	18	Bodegones	Luis Fernando Tinoco	47
						22-08-19	1	Arreglos		46
						22-08-19	2	Piso	Wilton Torres	44
						25-08-19	6	Bodegones	Luis Fernando Tinoco	38
						25-08-19	4	Piso Cocina	Bryan Rojas	34

Powered by CamScanner



	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	18/1/2021
		Versión	2
		Página	1 de 7

PROYECTO: Cemento Gris — MATERIAL: Cemento Gris 50 Kg
RESPONSABLE: Teddy Fuentes G. — CARGO: Almacenista

ENTRADA							SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISIÓN	PROVEEDOR	UNO.	CANT.		FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
						M	26/08/25	3	Bodega	Ing. Fernando Tinoco	31
							27/08/25	2	Proyecto Costa	Obrero Rojas	29
						M	27/08/25	1	Bodega	Ing. Fernando Tinoco	28
						M	27/08/25	4	Bodega	Ing. Fernando Tinoco	24
							28/08/25	2	Proyecto Tres	Obrero Rojas	22
						M	28/08/25	1	Bodega	Ing. Fernando Tinoco	21
28/08/25		50306890	Cemex	Bulto	100						121
							28/08/25	1	Proyecto Salem	Obrero Rojas	120
							29/08/25	2	Proyecto Costa	Obrero Rojas	118
						C	29/08/25	1	Bodega Residencial	Arq. Alejandro	117
							30/08/25	2	Proyecto	Obrero Rojas	115
						C	30/08/25	1	Bodega Residencial	Arq. Alejandro	114
							01/09/25	2	Proyecto Salem	Obrero Rojas	112
							01/09/25	4	Proyecto Costa	Obrero Rojas	108
02/09/25		50318983	Cemex	Bulto	100						208
							02/09/25	60	Llevado A.	Olger Sepulveda	148
						M	02/09/25	11	Bodega Residencial	Ing. Fernando Tinoco	137
						M	02/09/25	1	Bodega Residencial	Ing. Fernando Tinoco	136
							03/09/25	51	Llevado A.	Olger Sepulveda	85
						M	03/09/25	9	Bodega Residencial	Ing. Fernando Tinoco	76
							03/09/25	2	Proyecto Costa	Obrero Rojas	74
							04/09/25	36	Llevado A.	Olger Sepulveda	38
							04/09/25	2	Proyecto Costa	Yuneys Caballero	36
							05/09/25	2	Proyecto Costa	Yuneys Caballero	34
06/09/25		63707823	Cemex	Bulto	50						84
							09/09/25	18	Llevado A.	Olger Sepulveda	66

Powered by CamScanner



	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 8

PROYECTO: Campamento Cauce — MATERIAL: Concreto 6MPa x 50 Kg

RESPONSABLE: Freddy Pinchao G.I — CARGO: Maestro constructor

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
08.09.25		80969793	Cemex	Bulto	200					266
						08.09.25	105	Lenzo Llenado	Oscar Sepulveda	161
						08.09.25	2	Pareja	Lenzo Rojas	159
					H	08.09.25	1	Arreglo Rastrillo	Luis fernando Sinchi	158
						09.09.25	4	Pareja Galan	Lenzo Rojas	154
						09.09.25	3	Pareja Cauce	Lenzo Rojas	151
						09.09.25	69	Retorno Usado	Oscar Sepulveda	82
					H	10.09.25	13	Pisa Destapada	Luis fernando Tingo	69
						10.09.25	30	Inspeccion Anclaj	Oscar Sepulveda	39
						11.09.25	20	Inspeccion Anclaj	Oscar Sepulveda	19
						11.09.25	2	Pareja Galan	Lenzo Rojas	17
						11.09.25	2	Pareja Cauce	Lenzo Rojas	15
					E	11.09.25	1	Arreglo Cenefa	Jesus E/ Bustamante	14
					H	11.09.25	1	Arreglo Cenefa	Luis fernando Sinchi	13
					H	11.09.25	10	Prob Pisos	Luis fernando Sinchi	3
						11.09.25	2	Recorte Bordes	Inspeccion (Oscar)	1
					H	12.09.25	1	Arreglo Frontal	Luis fernando Sinchi	0
12.09.25		80969793	Cemex	Bulto	100					100
12.09.25		63184426	Gil Ferreteria	Bulto	50					150
					H	12.09.25	7	Pared Atrasada	Luis fernando Sinchi	143
						12.09.25	21	Inspeccion Anclaj	Oscar Sepulveda	122
						13.09.25	2	Pareja Galan		120
						15.09.25	2	Pareja Galan	Yhonayn Labrador	118
					H	15.09.25	7	Pared Atrasada	Luis fernando Sinchi	111
						15.09.25	33	Inspeccion Anclaj	Oscar Sepulveda	78
15.09.25		80969793	Cemex	Bulto	100					178

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 9

PROYECTO: Consumo Cemex — MATERIAL: Cemento Gris x 50 Kg
RESPONSABLE: Freddy Franky Gil — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
15 09 25		5053[illegible]	Cemex	Bulto	100					278
						16 09 25	2	Punga cuce	Yunior Caballero	276
						M 16 09 25	1	Dobla Fracturada	Mantenimiento Locativo	275
						16 09 25	47	Inyeccion. 2	Olger Sepulveda	228
						17 09 25	4	Punga Cuce	Yunior Caballero	224
						17 09 25	51	inyeccion 1.	Olger Sepulveda	173
						17 09 25	33	Llenado 1.	Olger Sepulveda	140
18 09 25		5055[illegible]	Cemex	Bulto	100					240
						18 09 25	5	Punga Muro Cuarto	Diegui Rojas	235
						M 18 09 25	16	Reubicacion de Cable	Mantenimiento Locativo	219
						E 18 09 25	1	Desplazamiento		218
						19 09 25	4	Punga	Brayan Rojas	214
						19 09 25	4	Punga	Brayan Rojas	210
						22 09 25	1	Punga Cuce	Lenin Rojas	209
						22 09 25	2	Punga Cuce	Lenin Rojas	207
						M 22 09 25	1	Dobla Pared	Mantenimiento Locativo	206
						22 09 25	60	Llenado Muro	Olger Sepulveda	146
23 09 25		5058[illegible]	Cemex	Bulto	200					346
						23 09 25	70	Llenado Inyeccion	Olger Sepulveda	276
						23 09 25	3	Punga Cuce	Hilton Tordo	273
						24 09 25	2	Punga Cuce	Hilton Tordo	271
						24 09 25	29	Inyeccion	Olger Sepulveda	296
						25 09 25	3	Punga Pto G	Hilton Tordo	293
						26 09 25	2	Punga Pto G	Hilton Tordo	291
						29 09 25	2	Punga Cuce	Hilton Tordo	289
						29 09 25	2	Punga Cuce Alcal	Yunior Caballero	287

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	18/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 10

PROYECTO: Campana Lauca
RESPONSABLE: Freddy Tuana Gil

MATERIAL: Concreto Guay X 30 Kg
CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	#RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
						20 09 19	56	Inspección Anal	Olger Tejeda	101
						23 09 19	2	Ronda Cuca	M. Ilga Tovar	159
						26 09 19	2	Ronda Cuca	M. Ilga Tovar	177
						27 09 19	2	Ronda Cuca	Prevesa	175
						28 09 19	20	Inspección Anal	Olger Tejeda	155
						29 09 19	3	Ronda Cuca	Lewis Pérez	152
						29 09 19	2	Ronda Cuca	Lewis Pérez	150
						29 09 19	1	Ronda Cuca	Prevesa	149
						30 09 19	2	Ronda Pla Cuba	Lewis Pérez	147
						30 09 19	1	Ronda Cuca	Lewis Pérez	146
						01 10 19	1	Ronda Cuca	Prevesa	145
						01 10 19	3	Ronda Cuca	Prevesa	142
						01 10 19	1	Ronda Cuca	Lewis Pérez	141
						02 10 19	17	Inspección Anal	Olger Tejeda	124
						02 10 19	3	Ronda Pla Cuba	Lewis Pérez	121
						02 10 19	1	Ronda Cuca	Prevesa	126
						02 10 19	5	Concreto	Transf. # 3279	113
						03 10 19	1	Ronda Pla Cuba	Lewis Pérez	122
						03 10 19	2	Ronda Cuca	Prevesa	120
						05 10 19	2	Concreto	Transf # 3281	118
					E	05 10 19	1	Anclaje Puente		117
						05 10 19	3	Ronda Columnas	Prevesa	114
						05 10 19	1	Ronda Cuca	Lewis Pérez	113
						06 10 19	1	Ronda Cuca	Prevesa	112
						06 10 19	1	Ronda Cuca	Miguel Ruiz	111
						06 10 19	26	Inspección Anal	Olger Tejeda	85

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Codigo	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Freddy Fuentes G.I — MATERIAL: Cerros 8 vs 3 mts

RESPONSABLE: Freddy Fuentes G.I — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
06-11-24		2803	Lubegan Sas	UNS	39	16-11-24	15 M	Tab. Fuentes	Luis Fernando Zapata	20
						18-11-24	20 E	Gerencia	Gerencia Fuentes	0
22-11-24		2809	Lubegan Sas	UNO	16	22-11-24	16 M	Tab. Gerencia	Luis Fernando Zapata	0
17-01-24		2803	Lubegas Sas	UNO	15	17-01-25	15 M	Tab. Gerencia	Luis Fernando Zapata	0
27-01-25		2969	Lubegas Sas	UNO	20	27-01-25	20 E	Tab. Gerencia	Uriel Quintero	0
29-03-25		3356	Lubegan Sas	UNO	10	29-03-25	10 M	Tab. Gerencia	Luis Fernando Zapata	0
23-05-25		3516	Lubegan Sas	UNO	20	23-05-25	10 E	Tab. Gerencia	Uriel Quintero	10
						23-05-25	10 E	Tab. Gerencia	Uriel Quintero	0
30-07-25		3736	Lubegan Sas	UNO	10	30-07-25	10 M	Propietarios	Luis Fernando Zapata	0
06-08-25		3747	Lubegan Sas	UNO	15	08-08-25	15 M	Tab. Gerencia	Luis Fernando Zapata	0
27-08-25		3932	Lubegan Sas	UNO	12	27-08-25	12 E	Talleres	Uriel Quintero	0
22-09-25		4000	Lubegan Sas	UNO	6	22-09-25	6 M	Talleres	Luis Fernando Zapata	0

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Campamento Cavet — MATERIAL: Cinta Peligro

RESPONSABLE: Fredely Trentes Gil — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
30-10-24		1092	Carga	Rollo	500	05-11-24	100	Prevencion	[illegible]	400
						05-11-24	60	Fortalecimiento Tunja	[illegible]	340
						03-03-25	340	Prevencion en Barrio Galan		0
31/03/25		1-4402	Angel - Tarazona	Rollo	500	07-05-25	20	Prevencion Galan	[illegible]	480
						07-05-25	10	Tubria Fundida	[illegible]	470
						28-05-25	220	Prevencion Galan	Angel Conde	250
						28-05-25	60	Prevencion Tunja Entrega Angel Conde		190
						05-06-25	100	Prevencion Tunja	Angel Conde	90
						18-06-25	50	Prevencion Galan	Victor Trujillo	40
19-06-25			Ing. Jose Alba	Metro	500					540
						09-07-25	50	Prevencion Galan	Juan Cardozo	490
						14-07-25	20	Prevencion Galan	Juan Cardozo	470
						18-07-25	280	Prevencion G.	Juan Romero	190
						21-08-25	200	Prevencion C	Juan Romero	40
						21-08-25	40	Prevencion G	Juan de Dio Gomez	0
21-06-25			Ing Flavia	Rollo	200	22-08-25	100	Prevencion PG	Juan de Dio Gomez	100
						22-08-25	50	Prevencion PG	Juan Romero	50
						28-08-25	50	Prevencion	[illegible]	0

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Comercio Conf
RESPONSABLE: Freddy Fuentes

MATERIAL: Clavos 2"
CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
28 09 25		3/N		Cajas	6	06 10 25	1	Depósito	Luis Fernando Fuentes	5

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Convenio Cenit
RESPONSABLE: Teddy Turbay G.

MATERIAL: Clavos 2½"
CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REVISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
28.09.21		I-6054	Panel Navarro	Caja	6	28.09.21	1 M	Obra	Luis Fernando Tirado	5
						28.09.21	1 M	Tablero	Luis Fernando Tirado	4
						29.09.21	1 M	Tablero	Luis Fernando Tirado	3
						30.09.21	1 M	Tablero	Luis Fernando Tirado	2
						01.10.21	2 M	Tablero	Luis Fernando Tirado	1
						08.10.21	1 M	Tablero	Luis Fernando Tirado	0

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Cauce — MATERIAL: Clavo 2½"

RESPONSABLE: Freddy Fuentes Gil — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
21-10-24		1-3490	Daniel Tarazona	Caja	5	21-10-24	1	Campamento	Juan de Dios Conde	4
						25-10-24	1	Campamento	Juan de Dios Conde	3
						25-10-24	2	Campamento	Juan de Dios Conde	1
29-10-24		1-3968	Daniel Tarazona	Caja	3					4
06-11-24	[illegible]	—	Ferretería Barcelona	Caja	5					9
						16-11-24	5 M	Generales	Luis Fernando Duque	4
						12-12-24	2	Varios	Juan Carlos Cardozo	2
						17-12-24	1	Mano Obra	Juan de Dios Conde	1
						10-01-25	1	Mano Obra	Juan de Dios Conde	0
20-01-25		1-8193	Daniel Tarazona	Caja	13	20-01-25	6 M	Tablones	Luis Fernando Duque	7
						01-02-25	1	Mano Obra Rio	Uriel Rivero	6
						20-02-25	1	Anclaje Gaviones	Victor Trujillo	5
						06-03-25	1	Mano Obra Rio	Juan de Dios Conde	4
						10-03-25	2	Obras Varias	[illegible]	2
						20-04-25	1	Anclaje Varios	[illegible]	2
						12-05-25	1	Anclaje Varios	[illegible]	1
28-06-25		1-8685	Daniel Tarazona	Caja	5 Und.					6
						28-06-25	1 M	Cabl. Hidrico	Luis Fernando Duque	5
						01-07-25	1	Peldaños Tanque	Juan Cardozo	4
						10-07-25	1 M	Cabal. Hidrico	Luis Fernando Duque	3
23-07-25		69302597	Coll Ferretería	Caja	7 Und.					10
						05-08-25	1 M	Cabl. Hidrico	Luis Fernando Duque	9
						09-08-25	1 M	Disipadores	Luis Fernando Duque	8
						06-08-25	1 M	Disipadores	Luis Fernando Duque	7
						16-08-25	1	Mano Cauce Rio	Juan Cardozo	6
						11-08-25	1 M	Disipadores	Luis Fernando Duque	5

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Campanario Cauca — MATERIAL: Clavos 3"

RESPONSABLE: Freddy Fernando G. — CARGO: Almacenado

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
29 01 25		1-4186	Daniel Tamayo	Caja	13	29 01 25	10 E	Tableros	Uriel Quintero	3
21 05 25		1-4929	Daniel Tamayo	Caja	6	23 05 25	6 E	Tableros	Uriel Quintero	3
						27 08 25	2 E	Tableros	Uriel Quintero	1
28 08 25		1-4959	Daniel Tamayo	Caja	6					7
						15 09 25	1 E	Tableros	Uriel Quintero	6
						13 10 25	1 H	Tableros	Luis Fernando Gomez	5

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	CR-F-03
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Consorcio Coulé — MATERIAL: Pino cork Metal 7"

RESPONSABLE: Freddy Fuentes G. — CARGO: Almacenamiento

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
11-02-25		5/N°	Ferretería el Arenero	und	5	08.05.25	1	Carlos Quiroga	[illegible]	4
						09.05.25	1	Carlos Quiroga	[illegible]	3
						12.05.25	1	Carlos Quiroga	[illegible]	2
						13.05.25	1	Carlos Quiroga	[illegible]	1
						15.05.25	1	Carlos Quiroga	[illegible]	0
21.05.25		1.4589	Daniel Tarazona	und	3	21.05.25	1	Carlos Quiroga	Ricardo Silva	2
						19.07.25	1	Carlos Ventura	[illegible]	1
						28.07.25	1	Carlos Quiroga	Luis Cortez	0
22.09.25		1.0930	Daniel Tarazona	und	3					

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-06
		Fecha	18/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Consorcio Cauca
RESPONSABLE: Freddy Pinedo

MATERIAL: Pino Dimensionado 9"
CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RO	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
20 08 25		AB779	Comercio 925	und	9	2808 25	1	Cont. Medina	Ejecutor Tipanal	8
						11 08 25	1	Cont. Medina	Ejecutor Tipanal	7
						14 08 25	1	Cont. Medina	Ejecutor Tipanal	6
28 08 25		1-855A	Daniel Tenorio	und	5	02 09 25	1	Cont. Medina	Ejecutor Tipanal	4
						16 09 25	1	Cont. Medina	Ejecutor Tipanal	3

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-06
		Fecha	18/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Condominio Torre C — MATERIAL: Disco corte Trompudero 4"

RESPONSABLE: Freddy Franco G1 — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
11-02-25		1-4214	Dimipi Torretorto	UNID	5					5
13 DE 25		6339350564	Gyl Tornalevio	UND	2					7
						E 21 02 25	1	Cent. Grupo	Wilson Quintero	6
						E 2 02 25	1	Cortes Antillo	Wilson Quintero	5
						11 10 25	1	Cortes Trujillo	Victor Trujillo	4
						E 23 10 25	1	Cortes Trujillo		3

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GK-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 10

PROYECTO: Cogorro Cauca — MATERIAL: Diafragmas Guiones

RESPONSABLE: Teddy Franko G. — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
						26 08 25	1	Guiones	Uriel Quintero	644
						27 08 25	5	Guiones	Uriel Quintero	639
						01 09 25	52 KG	Guiones	Uriel Quintero	587
						04 09 25	50 KG	Guiones	Uriel Quintero	537
04-09-25		2509092	Muller y Gonzalez	UND	225					762
						07 09 25	75 G	Guiones	Luis Fernando Zuñiga	687
						08 09 25	50 KG	Guiones	Uriel Quintero	637
						10 09 25	50 KG	Guiones	Uriel Quintero	587
						16 09 25	50 KG	Guiones	Uriel Quintero	537
						17 09 25	50 G	Guiones	Luis Fernando Zuñiga	487
						18 09 25	75 G	Guiones	Luis Fernando Zuñiga	412
						21 09 25	77 G	Guiones	Uriel Quintero	339
						24 09 25	79 G	Guiones	Luis Fernando Zuñiga	260
						29 09 25	50 G	Guiones	Uriel Quintero	210
						29 09 25	50 G	Guiones	Luis Fernando Zuñiga	160
						30 09 25	3 G	Guiones	Uriel Quintero	157
						31 09 25	3 G	Guiones	Uriel Quintero	154
						01 08 25	55 G	Guiones	Luis Fernando Zuñiga	99
						04 08 25	85 G	Guiones	Uriel Quintero	14
						04 08 25	4 G	Guiones	Uriel Quintero	10
04 08 25		2508018	Muller y Gonzalez	UND	300					310
						05 08 25	1 G	Guiones	Uriel Quintero	309
						08 08 25	50 G	Guiones	Luis Fernando Zuñiga	259
						09 08 25	50 G	Guiones	Uriel Quintero	209
08 08 25		2508061	Muller y Gonzalez	UND	100					309
					De ahí la anotación Anterior x Error quedan					209

Powered by CamScanner



	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-06
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 15

PROYECTO: Comercio Local — MATERIAL: Platinas y Ganchos

RESPONSABLE: Freddy Fuentes G. — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
11-08-25			Platinas y Ganchos	UND	700					409
						H 13-08-25	25	Ganchos	Edgar Fernando Vargas	384
						E 14-08-25	75	Ganchos	Yuriel Quintero	309
						H 13-08-25	9	Ganchos	Luis Fernando Vargas	300
						E 13-08-25	9	Ganchos	Yuriel Quintero	291
						H 19-08-25	10	Ganchos	Luis Fernando Vargas	281
						H 20-08-25	42	Ganchos	Luis Fernando Vargas	239
						E 20-08-25	1	Ganchos	Yuriel Quintero	238
20-08-25		1608146	Platinas y Ganchos	UND	300					538
						E 21-08-25	1	Ganchos	Yuriel Quintero	237
						H 21-08-25	24	Ganchos	Edgar Fernando Vargas	513
						H 22-08-25	20	Ganchos	Luis Fernando Vargas	493
						E 22-08-25	3	Ganchos	Yuriel Quintero	490
						H 23-08-25	4	Ganchos	Luis Fernando Vargas	486
						E 19-08-25	14	Ganchos	Yuriel Quintero	472
						H 25-08-25	7	Ganchos	Luis Fernando Vargas	465
						E 25-08-25	28	Ganchos	Yuriel Quintero	437
						H 26-08-25	57	Ganchos	Luis Fernando Vargas	380
						E 26-08-25	11	Ganchos	Yuriel Quintero	369
						H 27-08-25	33	Ganchos	Edgar Fernando Vargas	336
						E 27-08-25	19	Ganchos	Yuriel Quintero	317
						H 28-08-25	15	Ganchos	Luis Fernando Vargas	302
						E 28-08-25	20	Ganchos	Yuriel Quintero	282
						H 29-08-25	29	Ganchos	Luis Fernando Vargas	253
						E 29-08-25	20	Ganchos	Yuriel Quintero	233
						H 01-09-25	30	Ganchos	Edgar Fernando Vargas	203

Powered by CamScanner



	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-06
		Fecha	18/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Cargovia Cargo — MATERIAL: Distanciamiento Guadua

RESPONSABLE: Freddy Fuentes Gil — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
						E 01 09 25	10	Cubierta	Uriel Quintero	189
						H 02 09 25	3	Cubierta	Luis Fernando Tuesca	186
						E 02 09 25	3	Cubierta	Uriel Quintero	183
						H 03 09 25	46	Cubierta	Luis Fernando Tuesca	137
						E 03 09 25	10	Cubierta	Uriel Quintero	127
						H 04 09 25	14	Cubierta	Luis Fernando Tuesca	109
						E 04 09 25	11	Cubierta	Uriel Quintero	98
05 09 25		2509055	Pallas y Guaduas	UND	200					298
						H 05 09 25	29	Cubierta	Luis Fernando Tuesca	273
						E 05 09 25	16	Cubierta	Uriel Quintero	257
						E 08 09 25	3	Cubierta	Uriel Quintero	254
						H 08 09 25	29	Cubierta	Luis Fernando Tuesca	225
						E 09 09 25	3	Cubierta	Uriel Quintero	222
						E 09 09 25	3	Cubierta	Uriel Quintero	219
10 09 25		2509105	Pallas y Guaduas	UND	300					519
						H 10 09 25	16	Cubierta	Luis Fernando Tuesca	503
						H 11 09 25	21	Cubierta	Luis Fernando Tuesca	482
						E 12 09 25	5	Cubierta	Uriel Quintero	477
						H 12 09 25	36	Cubierta	Luis Fernando Tuesca	441
						H 15 09 25	8	Cubierta	Luis Fernando Tuesca	433
						E 15 09 25	11	Cubierta	Uriel Quintero	422
						H 16 09 25	30	Cubierta	Luis Fernando Tuesca	392
						E 16 09 25	30	Cubierta	Uriel Quintero	362
						H 17 09 25	5	Cubierta	Luis Fernando Tuesca	357
						E 17 09 25	15	Cubierta	Uriel Quintero	342
						H 18 09 25	16	Cubierta	Luis Fernando Tuesca	326

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-08
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 15

PROYECTO: Conjunto Cauce
RESPONSABLE: Freddy Fuentes Gil
MATERIAL: Drafting pipe Ganchos
CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
						E 18 09 25	17	Ganchos	Uriel Quintero	333
						H 19 09 25	8	Ganchos	Luis Fernando Jimenez	325
						E 19 09 25	26	Ganchos	Uriel Quintero	299
						H 20 09 25	10	Ganchos	Luis Fernando Jimenez	289
						H 22 09 25	9	Ganchos	Luis Fernando Jimenez	280
						E 22 09 25	15	Ganchos	Uriel Quintero	265
						H 23 09 25	13	Ganchos	Luis Fernando Jimenez	390
						E 23 09 25	21	Ganchos	Uriel Quintero	279
						H 24 09 25	18	Ganchos	Luis Fernando Jimenez	711
						E 24 09 25	16	Ganchos	Uriel Quintero	193
						H 25 09 25	10	Ganchos	Luis Fernando Jimenez	183
						E 25 09 25	9	Ganchos	Uriel Quintero	183
						H 26 09 25	20	Ganchos	Luis Fernando Jimenez	161
						E 26 09 25	6	Ganchos	Uriel Quintero	154
						H 27 09 25	10	Ganchos	Luis Fernando Jimenez	145
						E 27 09 25	6	Ganchos	Uriel Quintero	139
						H 29 09 25	26	Ganchos	Luis Fernando Jimenez	113
						E 29 09 25	13	Ganchos	Uriel Quintero	100
						H 30 09 25	22	Ganchos	Luis Fernando Jimenez	36
						E 30 09 25	23	Ganchos	Uriel Quintero	69
						H 01 10 25	16	Ganchos	Luis Fernando Jimenez	89
						E 01 10 25	16	Ganchos	Uriel Quintero	33
01 10 25		196098	Hallago y Ganchos	UND	42					185
						H 02 10 25	30	Ganchos	Luis Fernando Jimenez	88
						E 02 10 25	3	Ganchos		85
						H 03 10 25	16	Ganchos	Luis Fernando Jimenez	29

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Concreto Carle — MATERIAL: Galon Oxigeno

RESPONSABLE: Freddy Trujillo C.I — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
30-10-24		1591	Soyaga	und	12	30 10 24	1	Miguel Alvarez		11
						01-11-24	1	Victor Trujillo	Victor Trujillo	10
						01-11-24	1	Uriel Rivero	Uriel Rivera.	9
						06 02 25	1	Angel Calvio Gomez		8
						06 02 25	1	Jorge Cordero		7
						20 03 25	1	Uriel Rivero	Uriel Rivera	6
						20 03 25	1	Jose de Dios		5
						27 05 25	1	Luis Lugo		4
						29 05 25	1	Oscar Bueno		3
						04 06 25	1	Jesus Medrano		2
18 06 25		2099	Soyaga	UND	12					14
						20 06 25	1	Juan Cordero		13
						03 07 25	1	Arley Prado		12
						04 07 25	1	Juan Ramos		11
						07 07 25	5	Eng Jose Sebastian	Luis Lugo.	6
16 07 25		2124	Soyaga	UND	24					30
						25 07 25	1	Juan Ramos		29
						26 07 25	1	Arley Prado		28
						30 07 25	1	Luis Lugo		27
						08 08 25	1	Edwin Navarro		26
						20 08 25	1	Juan Cordero		25
						20 08 25	1	Arley Prado		24
						21 08 25	1	Edwin Navarro		23
						22 08 25	1	Uriel Rivero		22
						02 09 25	1	Arley Prado		21
						02 09 25	1	Olger Capriles		20

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-03
		Fecha	18/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Consorcio Level
RESPONSABLE: Freddy Funkes Gil

MATERIAL: Colores Oscuros
CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
						08.09.25	1	Lavamos Cuadrados en cuarto		19
						10.09.25	1	Luis Cano	Liceny P	18
						18.09.25	1	Juan Ramos		17
						29.09.25	1	Yiley Prada	Apt	16
						29.09.25	1	[illegible]	Osmilio Rivas	15
						02.10.25	1	Colum Cuadrados	Colum cuadrados	14
						06.10.25	1	Colum Redondo	Freddy GF	13
						06.10.25	1	Colum Cuadrados	Colum cuadrados	12
						07.10.25	1	Juan Ramos		11

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 10

PROYECTO: Campamento Cauca — MATERIAL: Guantes Malla

RESPONSABLE: Yudy Tatiana Gil — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
						E 26 06 25	1	Guantes	Uriel Quintero	639
						E 27 06 25	5	Guantes	Uriel Quintero	634
						E 01 07 25	32 Pares	Guantes	Uriel Quintero	582
						E 04 07 25	50 Pares	Guantes	Uriel Quintero	532
08 07 25		2907051	Mallas y Guantes	UND	225					757
						H 01 07 25	75 G	Guantes	Luis Fernando Tirado	682
						E 03 07 25	50 Pares	Guantes	Uriel Quintero	632
						E 14 07 25	50 Pares	Guantes	Uriel Quintero	582
						E 16 07 25	50 Pares	Guantes	Uriel Quintero	532
						H 17 07 25	50 G	Guantes	Luis Fernando Tirado	482
						H 18 07 25	75 G	Guantes	Luis Fernando Tirado	407
						E 21 07 25	77 G	Guantes	Uriel Quintero	330
						H 28 07 25	75 G	Guantes	Luis Fernando Tirado	255
						E 29 07 25	50 G	Guantes	Uriel Quintero	205
						H 29 07 25	50 G	Guantes	Luis Fernando Tirado	155
						E 30 07 25	3 G	Guantes	Uriel Quintero	152
						E 31 07 25	3 G	Guantes	Uriel Quintero	149
						H 01 08 25	55 G	Guantes	Luis Fernando Tirado	94
						E 04 08 25	85 G	Guantes	Uriel Quintero	9
						E 04 08 25	8 G	Guantes	Uriel Quintero	1
04 08 25		2608013	Mallas y Guantes	UND	300					305
						E 05 08 25	1 G	Guantes	Uriel Quintero	304
						H 08 08 25	50 G	Guantes	Luis Fernando Tirado	254
						E 09 08 25	50 G	Guantes	Uriel Quintero	204
08 08 25		2608061	Mallas y Guantes	UND	100					304
11 08 25		2608076	Mallas y Guantes	UND	150					454

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GH-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Consorcio Covic — MATERIAL: Guayones Hollow
RESPONSABLE: Jhonny Tunkis Gil — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	ERC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
					H	13 08 25	25	Guayones	Luis Fernando Tunjano	429
					E	14 08 25	75	Guayones	Uriel Quintero	354
					H	19 08 25	9	Guayones	Luis Fernando Tunjano	345
					E	19 08 25	9	Guayones	Uriel Quintero	336
					H	19 08 25	10	Guayones	Luis Fernando Tunjano	326
					H	18 08 25	92	Guayones	Luis Fernando Tunjano	234
					E	20 08 25	1	Guayones	Uriel Quintero	233
20 08 25		16 08 195	Hollow y Guayones	UND	500					583
					E	21 08 25	1	Guayones	Uriel Quintero	582
					H	21 08 25	24	Guayones	Luis Fernando Tunjano	558
					H	22 08 25	20	Guayones	Luis Fernando Tunjano	538
					E	22 08 25	3	Guayones	Uriel Quintero	535
					H	23 08 25	4	Guayones	Luis Fernando Tunjano	531
					E	23 08 25	14	Guayones	Uriel Quintero	517
					E	25 08 25	7	Guayones	Luis Fernando Tunjano	510
					H	25 08 25	28	Guayones	Uriel Quintero	482
					H	26 08 25	57	Guayones	Luis Fernando Tunjano	425
					E	26 08 25	11	Guayones	Uriel Quintero	414
					H	27 08 25	33	Guayones	Luis Fernando Tunjano	381
					E	27 08 25	19	Guayones	Uriel Quintero	362
					H	28 08 25	15	Guayones	Luis Fernando Tunjano	347
					E	28 08 25	20	Guayones	Uriel Quintero	327
					H	29 08 25	29	Guayones	Luis Fernando Tunjano	298
					E	29 08 25	20	Guayones	Uriel Quintero	278
					H	01 09 25	30	Guayones	Luis Fernando Tunjano	248
					E	01 09 25	19	Guayones	Uriel Quintero	229

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-08
		Fecha	18/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 12

PROYECTO: Consorcio Conect.
RESPONSABLE: Andy Fuentes G.
MATERIAL: Guayacán Pelón
CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
						H 02 09 25	4	Guayacán	Luis Fernando Jiménez	330
						E 03 09 25	3	Guayacán	Uriel Quintero	227
						H 03 09 25	45	Guayacán	Luis Fernando Jiménez	182
						E 08 09 25	14	Guayacán	Uriel Quintero	168
						H 08 09 25	10	Guayacán	Luis Fernando Jiménez	158
						E 09 09 25	11	Guayacán	Uriel Quintero	193
05 09 25		260904	Pelón y Guayacán	UND	200					393
						H 05 09 25	25	Guayacán	Luis Fernando Jiménez	318
						E 05 09 25	16	Guayacán	Uriel Quintero	302
						E 08 09 25	3	Guayacán	Uriel Quintero	299
						H 09 09 25	29	Guayacán	Luis Fernando Jiménez	270
						E 09 09 25	3	Guayacán	Uriel Quintero	267
10 09 25		260904	Pelón y Guayacán	UND	300					567
						H 10 09 25	16	Guayacán	Luis Fernando Jiménez	551
						H 11 09 25	21	Guayacán	Luis Fernando Jiménez	530
						E 12 09 25	5	Guayacán	Uriel Quintero	525
						H 12 09 25	36	Guayacán	Luis Fernando Jiménez	489
						H 15 09 25	8	Guayacán	Luis Fernando Jiménez	481
						E 15 09 25	11	Guayacán	Uriel Quintero	470
						H 16 09 25	30	Guayacán	Luis Fernando Jiménez	440
						E 16 09 25	10	Guayacán	Uriel Quintero	430
						H 17 09 25	5	Guayacán	Luis Fernando Jiménez	425
						E 17 09 25	15	Guayacán	Uriel Quintero	410
						H 18 09 25	16	Guayacán	Luis Fernando Jiménez	394
						E 18 09 25	12	Guayacán	Uriel Quintero	382
						E 19 09 25	8	Guayacán	Uriel Quintero	374

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-65
		Fecha	10/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 13

PROYECTO: Comercio Center — MATERIAL: Ganchos Hellus

RESPONSABLE: Isabel Trujillo G. — CARGO: Almacenamiento

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	#RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
						M 19 09 25	26	Ganchos	Luis Fernando Tirado	343
						M 20 09 25	10	Ganchos	Luis Fernando Tirado	333
						M 22 09 25	9	Ganchos	Luis Fernando Tirado	326
						E 22 09 25	13	Ganchos	Uriel Quintero	313
						M 23 09 25	18	Ganchos	Luis Fernando Tirado	295
						E 23 09 25	21	Ganchos	Uriel Quintero	274
						M 24 09 25	18	Ganchos	Luis Fernando Tirado	256
						E 24 09 25	16	Ganchos	Uriel Quintero	240
						M 26 09 25	10	Ganchos	Luis Fernando Tirado	233
						E 26 09 25	4	Ganchos	Uriel Quintero	229
						M 26 09 25	20	Ganchos	Luis Fernando Tirado	209
						E 26 09 25	6	Ganchos	Uriel Quintero	203
						M 27 09 25	10	Ganchos	Luis Fernando Tirado	193
						E 27 09 25	6	Ganchos	Uriel Quintero	187
						M 29 09 25	26	Ganchos	Luis Fernando Tirado	161
						E 29 09 25	13	Ganchos	Uriel Quintero	148
						M 30 09 25	22	Ganchos	Luis Fernando Tirado	126
						E 30 09 25	13	Ganchos	Uriel Quintero	113
						M 01 10 25	16	Ganchos	Luis Fernando Tirado	97
						E 01 10 25	16	Ganchos	Uriel Quintero	81
						M 02 10 25	30	Ganchos	Luis Fernando Tirado	51
						E 02 10 25	3	Ganchos		48
						M 03 10 25	16	Ganchos	Luis Fernando Tirado	32
						E 03 10 25	7	Ganchos		25
03 10 25		26WOAO	Rollo y Ganchos	UND	200					225
						M 06 10 25	6	Ganchos	Luis Fernando Tirado	219

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	18/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Camposeco Cauce — MATERIAL: Gravilla Vaqueta

RESPONSABLE: Judely Fuentes G. — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
						19 05 25	1	Mauricio Arcadio		11
						21 05 25	1	Luis Cano		10
						30 05 25	1	Jesus Hernandez		9
						30 06 25	1	Oscar Baran		8
						04 06 25	1	Uriel Bravo		7
						04 06 25	1	Luis Cano		6
180625		2094	Sotago	UND	12					18
						01 07 25	1	Jhon Martinez		17
						02 07 25	1	Luis Cano		16
						03 07 25	1	Arley Prado		15
						03 07 25	1	Edinson Navarro		14
						07 07 25	1	Juan Ramos		13
						10 07 25	1	Arley Prado		12
						14 07 25	1	Juan Ramos		11
						16 07 25	1	Victor Trujillo		10
						21 07 25	1	Arley Prado		9
						23 07 25	1	Luis Cano		8
						28 07 25	1	Juan Ramos		7
						29 07 25	1	Arley Prado		6
						08 08 25	1	Edinson Navarro		5
090825		2159	Sotago	UND	24	09 08 25	1	Luis Cano		28
						12 08 25	1	Arley Prado		27
						12 08 25	1	Mauricio Arcadio		26
						20 08 25	1	Damian Barbosa		25
						30 08 25	1	Jesus Hernandez		24
						30 08 25	1	Mauricio Sierra		23

Powered by CamScanner



	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	CH-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 3

PROYECTO: Contenedor Cartí | MATERIAL: Concreto Vaciado

RESPONSABLE: Freddy Turner Gil | CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
						22.09.15	1	Fredy Gavil		22
						01.09.15	1	Fredy Prada		21
						01.09.15	1	Luis Cano		20
						01.09.15	1	Edinson Mendoza		19
						09.09.15	1	Luis Cano		18
						16.09.15	1	Victor Tapia		17
						18.09.15	1	Ramon Acosta		16
						22.09.15	1	Freddy Gil		15
						23.09.15	1	Fredy Prada		14
						29.09.15	1	Reinaldo Prada		13
						08.10.15	1	Jose Rodrigo		12
						09.10.15	1	Reinaldo Prada		11
						14.10.15	1	Alberto Mejia		10
						14.10.15	1	Jugo Cano		9
						15.10.15	1	Hans Arias		8

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Consorcio Cauca — MATERIAL: Cobre Azul

RESPONSABLE: Freddy Tunja G. — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
03 0125		1635	San Jorge	Cubeta	1	03 07 25	1	Mejoras Polvorazo	Luis Cano	0
15 08 25		24845	Ferretería Ladrillera Vall.	Cubeta	2	16 08 25	1	Mejoras Polvorazo	Jhonis Garcia	1

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Cantaclaro Tower
RESPONSABLE: Textil Urabá SAS

MATERIAL: Tela Pil 3D
CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	#RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
150819		15370	Talleres Rojas	und	50	160825	50	Entrenamiento Atlas	Urdy Ingils	0

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Codigo	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Comercio Cauca — MATERIAL: Manguera Polietileno 1/2

RESPONSABLE: Freddy Fuenko Gil — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
11-01-25		S/N°	Ferreteria el Porvenir	UNO	35	08 05 25	4	Anclajes		31
						09 05 25	6	Anclajes		25
						12 05 25	5	Anclajes		20
						13 05 25	6	Anclajes		14
						14 05 25	2	Anclajes		12
						15 05 25	5	Anclajes		7
						16 05 25	2	Anclajes		5
						19 05 25	5	Anclajes	Reinaldo Silva	0
19-07-25		S/N°	Ferreteria El Porvenir	UNO	2	22 07 25	2	Almacenaje Anclajes		0
16 07 25		S/N°	Ferreteria	UNO	1	22 07 25	1	Almacenaje Anclajes		0

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Comercio Cuc P
RESPONSABLE: Freddy Fierro Gil

MATERIAL: Plasto 400u 20kg. Jibre
CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
29-01-25		63827623	G y J Ferretería	UNID	3	13 08 25	1	Llanada Anclajes	Olger Sepulveda	2
						15 08 25	1	Llanada Anclajes	Olger Sepulveda	1
15 08 25		63739117	G y J Ferretería	UNID	2					3
						02 09 25	1	Llanada Anclajes	Olger Sepulveda	2
						05 09 25	1	Anclajes	Olger Sepulveda	1
						30 08 25	1	Anclajes	Olger Sepulveda	0
11 09 25		51660501	G y J Ferretería	UNID	1	15 09 25	1	Anclajes	Olger Sepulveda	0
29 09 25		51676408	G y J Ferretería	UNID	1	29 09 25	1	Anclajes	Olger Sepulveda	0

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Comunero Cauce — MATERIAL: Plastico Negro

RESPONSABLE: Freddy Tenelema G.1 — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
26 11 24		6772664?	Tenelema G y J	Kilo	100	05-12-24	40	Tapar Talud	Uriel Rivera	60
						09-12-24	60	Tapar Talud	Uriel Rivera	0
16 12 24		s/n	Tenelema Perugachi	Kilo	100	19-12-24	20	Cunet		80
						28 01-25	10	Cunet	Trauco	70
						05-02-25	10	Tapar Talud		60
						03 03 25	10	Tapar Alcantarilla		50
						05 05 25	5	Tapar cunetas		45
						08 05 25	5	Tapar Taludes		40
						09 05 25	10	Tapar Andenes		30
						16 05 25	30	Tapar Talud	Juan Condoy	0
17 06 25		6373911	G y J Tenelema	Kilo	100	18 05 25	15	Cunetas	Juan Condoy	85
						19 05 25	5	Tapar cunetas	Luis Cuyo	80
						19 05 25	5	Tapar Alcantarilla	Angel Cuyo	75
						20 05 25	2	Tapar cunetas		73
						29 05 25	5	Tapar Alcantarilla	Luis Cuyo	68
						04 07 25	7	Tapar Cunetas		61
						05 07 25	10	Tapar Alcantarilla	Luis Cuyo	51
						05 07 25	10	Tapar Cunetas		41
						16 07 25	20	Tapar Talud	Juan Condoy	21
						17 01 25	21	Tapar Talud	Victor Trujillo	0
23 01 25		(3783293	G y J Tenelema	Kilo	100	05 02 25	2	Tapar Alcantarilla	Luis Cuyo	98
						25 02 25	12	Tapar Talud	Juan Condoy	86
						28 02 25	3	Tapar Talud	Juan Condoy	83
						03 03 25	5	Tapar Cunetas	Uriel Rivera	78
						12 03 25	10	Tapar Cunetas	Juan Noman	68
						05 04 25	68	Ing Marcela Palacios - Biologa		0

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Covid — MATERIAL: Sequeta Roja

RESPONSABLE: Teddy Tunkes G.I — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
21-10-24		1-3950	Daniel Tunkes	UND	12	08-11-24	1	Unión	Teddy Tunkes	11
						23 12 24	1	Hospital Santa		10
						07 01 24	1	Carlos Prieto	Abel Rios	9
						20 01 25	1	Carlos Varilla	Victor Trujillo	8
						26 02 25	1	Carlos Varilla	Unit Rivas	7
31 03 25		1-4902	Daniel Tunkes	UND	1					8
						10 05 25	1	Carlos Varilla	Unit Rivas	7
						16 07 25	1	Carlos Varilla	Victor Trujillo	6
						17 07 25	1	Carlos Marquez	Edinson Navarro	5
						13 08 25	1	Taller Varilla	Edinson Navarro	4
29-08 25		1-4991	Daniel Tunkes	UND	10					14
						09 09 25	1	Carlos Varilla	Victor Trujillo	13
						10 09 25	1	Carlos Varilla	Juan Ramon	12
						09-10 25	1	Carlos Varilla	Unit Olivero	11
						18 10 25	1	Carlos Varilla	Victor Trujillo	10
						22 10 25	1	Carlos Varilla	Bandilio Rivera	9

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Campoyuco Cont C
RESPONSABLE: Freddy Pinto Gil
MATERIAL: Tubo 20 x 3 x 3 mt
CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
23 08 25		3472	Lubegas	UND	20 E	230825	20	Tubería [illegible]	[illegible]	0
10 09 25		3985	Lubegas	UND	12 E	100925	12	Cont. Eléctrico	[illegible]	0
22 09 25		4000	Lubegas	UND	12 E	220925	12	Cont. Hortón	[illegible]	

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	10/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Conjunto Cañaveral — MATERIAL: Tablon 24x9 x3mts

RESPONSABLE: Freddy Franco Gil — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
17-01-25		2893	Ladrillera sur	UND	10	17-01-25	10 M	Parqueadero	Raúl [illegible]	0
29-03-25		3856	Ladrillera sur	UND	20	29-03-25	20 E	Parqueaderos	[illegible]	0
30-04-25		3958	Ladrillera sur	UND	15	30-04-25	8 M	Parqueaderos	[illegible]	7
29-08-25		20175	Distribuidora de Madera	UND	2					

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Concesión Cauca — MATERIAL: Tapabarro

RESPONSABLE: Freddy Fuentes Gil — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
30 10 24		1592	Soygo	UND	12	01-11-24	1	Víctor Trujillo	Victor Trujillo	11
						26-11-24	1	Uriel Rivera	Uriel Rivera	10
						06 02 25	1	Angel Garcia		9
						06 02 25	1	Juan Cadavid	Freddy Carlos C	8
						27 02 25	1	Angel Rivera	Uriel Rivera	7
						13 05 25	1	Victor Galan	Victor Galan	6
						27 05 25	1	Oscar Ramon		5
						01 07 25	1	Juan Holguin	Juan S M	4
						01 09 25	1	Uriel Rivera	Uriel Rivera	3
						08 07 25	1	Juan Ramon		2
						08 09 25	1	Victor Trujillo		1
						16 07 25	1	Juan Ramon		0
16 07 25		2174	Soygo	UND	24	18 07 25	1	Arley Prada	HPI	23
						18 07 25	1	Luis Cano		22
						25 07 25	1	Luis Cano		21
						28 07 25	1	Luis Cano		20
						30 07 25	1	Luis Cano		19
						01 09 25	1	Luis Cano		18
						04 09 25	1	Arley Prada	HPI	17
						09 09 25	1	Edinson Cardenas	Edinson Cardenas	16
						09 09 25	1	Arley Prada	HPI	15
						09 09 25	1	Edinson	Edinson Cardenas	14
						08 09 25	1	Oscar Sepulveda		13
						08 09 25	1	Arley Prada	HPI	12
						09 09 25	1	Arley Prada	HPI	11
						10 09 25	1	Arley Prada	HPI	10

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	19/1/2021
		Versión	2
		Pagina	1 de 1

PROYECTO: Contrato Cauca

RESPONSABLE: Freddy Fredy Gil

MATERIAL: Soldadura 6013

CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
						10/09/25	1	Oscar Sepulveda		9
						11/09/25	1	Arley Prada	HPJ	8
						12/09/25	1	Arley Prada	HPJ	7
						15/09/25	1	Arley Prada	HPJ	6
						15/09/25	1	Luis Cano		5
						15/09/25	1	Edwar Navarro	Edwar Navarro	4
						16/09/25	1	Arley Prada	HPJ	3
						22/09/25	1	Luis Cano		2
						23/09/25	1	Arley Prada	HPJ	1
						23/09/25	1	Luis Cano		0
23/09/25		2952	Soldyp	UND	100	23/09/25	1	Arley Prada	HPJ	99
						24/09/25	1	Arley Prada	HPJ	98
						24/09/25	1	Esteban Cuervo	Esteban cuervo	97
						24/09/25	1	Arley Prada	HPJ	96
						25/09/25	1	Arley Prada	HPJ	95
						25/09/25	1	Esteban Cuervo	Esteban cuervo	94
						29/09/25	1	Arley Prada	HPJ	93
						29/09/25	1	Brandon Prada	Brandon Prada	92
						02/10/25	1	Oscar Sepulveda		91
						02/10/25	1	Esteban Cuervo	Esteban cuervo	90
						06/10/25	1	Edwar Cuervo	Esteban cuervo	89
						06/10/25	1	Oscar Sepulveda		88
						06/10/25	1	Brandon Prada	Brandon	87
						06/10/25	1	Victor Trujillo	Victor Trujillo	86

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	10/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Consorcio Cauce — MATERIAL: Tejas de zinc inoxidable

RESPONSABLE: Freddy Fredes Gil — CARGO: Almacenero

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
30-10-24		1592	Soraya	UND	6	09.12.24	1	Uriel Rivera	Uriel Rivera	5
						06 02 25	1	Angel Gaeta		4
						06 02 25	1	Juan Cordero	Juan Carlos C	3
						01 03 25	1	Juan Mallarino	Juan M	2
						08 03 25	1	Parlay Prado	"	1
						10 03 25	1	Uriel Rivera	Uriel Rivera.	0
16 07 25		2134	Soraya	UND	24	19 08 25	1	Jamison Cuadro	Jamison Cuadro	23
						05 09 25	1	Reynaldo Arrieta		22

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO
RESPONSABLE

MATERIAL Tubo Cuadrado 2" x 6m
CARGO Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REVISION	PROVEEDOR	UNID	CANT	FECHA SALIDA	CANT	DESTINO	RECIBE	CANT
14-11-24		0172000	Comercio G y J	UNID	24	30 01 25	1 M	Obrero 29	Jesus Martinez	23
						17 01 25	1 E	Obrero 07	Miguel Quintero	22
						03 04 25	1 E	Obrero 07	Miguel Quintero	21
						07 04 25	1 M	Obrero 07	Jesus Martinez	20
						08 04 25	1 M	Obrero 07	Jesus Martinez	19
						02 05 25	1 E	Obrero 07	Miguel Quintero	18
						02 05 25	1 M	Obrero 07	Jesus Martinez	17
						07 05 25	1 E	Obrero 07	Miguel Quintero	16
						04 06 25	1 E	Obrero 07	Miguel Quintero	15
						05 06 25	1 E	Obrero 07	Miguel Quintero	14
						14 06 25	1 M	Obrero 07	Jesus Martinez	13
						16 06 25	1 M	Obrero 07	Jesus Martinez	12
						17 06 25	1 M	Obrero 07	Jesus Martinez	11
						26 06 25	1 M	Obrero 07	Jesus Martinez	10
						29 01 25	1 E	Obrero PG	Miguel Quintero	9
						31 01 25	1 E	Obrero PG	Miguel Quintero	8
						04 02 25	1 E	Obrero PG	Miguel Quintero	7
						05 02 25	1 E	Obrero PG	Miguel Quintero	6
13 02 25		4455BL	Comercio	UNID	24	13 02 25	1 M	Obrero 07	Jesus Martinez	29
						14 02 25	1 E	Obrero PG	Miguel Quintero	28
						19 02 25	1 E	Obrero PG	Miguel Quintero	27
						21 02 25	1 E	Obrero PG		26
						26 02 25	2 E	Obrero PG		24
						28 02 25	1 M	Obrero 07	Jesus Martinez	23
						01 04 25	1 E	Obrero		22
						01 04 25	1 M	Obrero 07	Jesus Martinez	21

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-03
		Fecha	18/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Carnaval Cali
RESPONSABLE: Jacobo Tuzka G.
MATERIAL: Tubo Cuadrado 2" x 6m
CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
						08 09 25	1 E	Llanderas	Uriel Quintero	20
						09 09 25	1 M	Llanderas	Luis fernando Tiznes	19
						15 09 25	1 M	Llanderas	Luis fernando Tiznes	18
						16 09 25	1 M	Llanderas	Luis fernando Tiznes	17
						18 09 25	1 M	Llanderas	Luis fernando Tiznes	16
						22 09 25	1 E	Llanderas	Uriel Quintero	15
						23 09 25	1 M	Llanderas	Luis Fernando Tiznes	14
						23 09 25	1 E	Llanderas	Uriel Quintero	13
						26 09 25	1 M	Llanderas	Luis Fernando Tiznes	12
						26 09 25	1 E	Llanderas	Uriel Quintero	11
						29 09 25	2 M	Llanderas	Luis Fernando Tiznes	9
						30 09 25	1 E	Llanderas	Uriel Quintero	8
						01 10 25	1 E	Llanderas	Uriel Quintero	7
01 10 25		6939700	Gyl Tangelo	UND	10					17
						06 10 25	1 M	Llanderas	Luis Fernando Tiznes	16
						09 10 25	1 M	Llanderas	Luis Fernando Tiznes	15
						10 10 25	1 E	Llanderas		14
						20 10 25	2 E	Llanderas		12

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	10/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 2

PROYECTO: Consorcio Cauce — MATERIAL: Tubo PVC Corrugado 6" x 6mts
RESPONSABLE: Teddy Tenko G. — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
						E 10 05 25	1	Cuneta Antiguo	Oriel Quintero	10
						E 16 05 25	1	Cuneta Antiguo	Oriel Quintero	9
						S 11 06 25	7	Canalizar Cables		2
						E 20 06 25	1	Cuneta Antiguo	Oriel Quintero	1
20 06 25		48779	Constructo sas	UND	6					7
						E 25 06 25	1	Cuneta Antiguo	Oriel Quintero	6
						H 25 06 25	2	Cuneta Antiguo	Luis Fernando Tinjaca	4
						H 26 06 25	1	Cuneta Antiguo	Luis Fernando Tinjaca	3
						H 28 06 25	1	Cuneta Antiguo	Luis Fernando Tinjaca	2
						E 29 06 25	1	Cuneta Antiguo	Oriel Quintero	1
						S 02 07 25	1	Medidor para Celas		0
04 09 25			Consorcio Almacen	UND	6					6
10 09 25		63733932	G y T Ferretero	UND	6					12

Powered by CamScanner



REPORTE DE CALIDAD

CEMEX Uso General

Fecha de Emisión: 26-sep-25
Número de Reporte: IBG-UG-37-2025
Km 5 Vía Buenos Aires-Payandé, Tolima, Colombia
Planta Caracolito

Fecha Inicial* 7-sep-25 ..... Fecha final* 13-sep-25

Cemento Hidráulico Tipo UG

Resistencia a la compresión	Método de ensayo	Resultados	Requisitos norma
1 día	NTC 220	10.4 MPa	No especificado
3 días	NTC 220	18.3 MPa	Mínimo 8.0
7 días	NTC 220	21.4 MPa	Mínimo 15.0
28 días	NTC 220	28.2 MPa	Mínimo 24.0

Otros parámetros físicos	Método de ensayo	Resultados
Retenido en Tamiz 45 µm	NTC 294	8.05 %
Superficie Específica Blaine	NTC 33	433 m²/kg
Tiempo de Fraguado Final	NTC 118	355 min

Otros parámetros físicos

Tiempo de Fraguado Inicial (min)



Resultado: 184 min
Método de ensayo: NTC 118

Contenido de Aire en Mortero (%)



Reesultado: 7.8%
Método de ensayo: NTC 224

Expansión de Barra de Mortero a 14 días (%)



Resultado: 0.001%
Método de ensayo: NTC 4827

Nuestros productos cumplen con la **Norma Técnica Colombiana NTC 121:2023 "ESPECIFICACIONES DE DESEMPEÑO PARA CEMENTO HIDRÁULICO"**. Adicionalmente contamos con la certificación **ISO 9001 versión 2015** para "Producción de Cemento Hidráulico" emitida por el **ICONTEC**, el cual ejecuta auditorías periódicas de seguimiento a nuestro Sistema de Gestión de Calidad para verificar el cumplimiento de nuestros procesos y garantizar la calidad de nuestros productos.

* Este Reporte de Calidad corresponde a valores promedio de los análisis del producto entre las fechas del período indicado.
** El muestreo y análisis fueron realizados de acuerdo al procedimiento CGC-VIP-PT-05.
*** Este Reporte de Calidad no podrá ser reproducido parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de Cemex Colombia S.A.
(+) Valores reportados del periodo mensual anterior.

Carlos Andrés Parra Bermúdez
Coordinador de Aseguramiento de Calidad

CEMEX COLOMBIA S.A. | Calle 99 # 9A - 54 Piso 7 | (571) 6020000 | (571) 6400000 | Bogotá, D.C. Colombia



REPORTE DE CALIDAD

CEMEX Uso General

Fecha de Emisión: 03-oct-25
Número de Reporte: IBG-UG-38-2025

Km 5 Vía Buenos Aires-Payandé, Tolima, Colombia
Planta Caracolito

Cemento Hidráulico Tipo UG

Fecha inicial* 14-sep-25 ..... Fecha final* 20-sep-25

Resistencia a la compresión	Método de ensayo	Resultados	Requisitos norma
1 día	NTC 220	10.2 MPa	No especificado
3 días	NTC 220	17.6 MPa	Mínimo 8.0
7 días	NTC 220	20.9 MPa	Mínimo 15.0
28 días**	NTC 220	25.8 MPa	Mínimo 24.0

Otros parámetros físicos	Método de ensayo	Resultados
Retenido en Tamiz 45 µm	NTC 294	8.03 %
Superficie Específica Blaine	NTC 33	428 m²/kg
Tiempo de Fraguado Final	NTC 118	337 min

Otros parámetros físicos

Tiempo de Fraguado Inicial (min)



Resultado: 166 min
Método de ensayo: NTC 118

Contenido de Aire en Mortero (%)



Resultado: 10.4%
Método de ensayo: NTC 224

Expansión de Barra de Mortero a 14 días (%)



Resultado: 0.001%
Método de ensayo: NTC 4027

(+)

Nuestros productos cumplen con la **Norma Técnica Colombiana NTC 121:2023 "ESPECIFICACIONES DE DESEMPEÑO PARA CEMENTO HIDRÁULICO"**. Adicionalmente contamos con la certificación **ISO 9001 versión 2015** para "Producción de Cemento Hidráulico" emitida por el **ICONTEC**, el cual ejecuta auditorías periódicas de seguimiento a nuestro Sistema de Gestión de Calidad para verificar el cumplimiento de nuestros procesos y garantizar la calidad de nuestros productos.

* Este Reporte de Calidad corresponde a valores promedio de los análisis del producto entre las fechas del periodo indicado.
** El muestreo y análisis fueron realizados de acuerdo al procedimiento CGC-VIP-PT-05.
*** Este Reporte de Calidad no podrá ser reproducido parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de Cemex Colombia S.A.
(+) Valores reportados del periodo mensual anterior.

Carlos Andrés Parra Bermúdez
Coordinador de Aseguramiento de Calidad

CEMEX COLOMBIA S.A. | Calle 99 # 9A - 54 Piso 7 | (571) 6038000 | (571) 6468000 | Bogotá, D.C. Colombia



REPORTE DE CALIDAD

CEMEX Uso General

Fecha de Emisión: 10-oct-25
Número de Reporte: IBG-UG-39-2025
Km 5 Via Buenos Aires-Payandé, Tolima, Colombia
Planta Caracolito

Cemento Hidráulico Tipo UG

Fecha Inicial* 21-sep-25 ..... Fecha final* 27-sep-25

Resistencia a la compresión	Método de ensayo	Resultados	Requisitos norma
1 día	NTC 220	10.2 MPa	No especificado
3 días	NTC 220	18.1 MPa	Mínimo 8.0
7 días	NTC 220	20.6 MPa	Mínimo 15.0
28 días**	NTC 220	26.3 MPa	Mínimo 24.0

Otros parámetros físicos	Método de ensayo	Resultados
Retenido en Tamiz 45 µm	NTC 294	8.59 %
Superficie Específica Blaine	NTC 33	408 m²/kg
Tiempo de Fraguado Final	NTC 118	330 min

Otros parámetros físicos



Resultado: 173 min
Método de ensayo: NTC 118



Resultado: 11.1%
Método de ensayo: NTC 224



Resultado: 0.001%
Método de ensayo: NTC 4027

(+)

Nuestros productos cumplen con la **Norma Técnica Colombiana NTC 121:2023 "ESPECIFICACIONES DE DESEMPEÑO PARA CEMENTO HIDRÁULICO"**. Adicionalmente contamos con la certificación **ISO 9001 versión 2015** para "Producción de Cemento Hidráulico" emitida por el **ICONTEC**, el cual ejecuta auditorías periódicas de seguimiento a nuestro Sistema de Gestión de Calidad para verificar el cumplimiento de nuestros procesos y garantizar la calidad de nuestros productos.

* Este Reporte de Calidad corresponde a valores promedio de los análisis del producto entre las fechas del periodo indicado.
** El muestreo y análisis fueron realizados de acuerdo al procedimiento CGC-VIP-PT-05.
*** Este Reporte de Calidad no podrá ser reproducido parcial ó totalmente sin la aprobación por escrito de Cemex Colombia S.A.
(+) Valores reportados del periodo mensual anterior.

Carlos Andrés Parra Bermúdez
Coordinador de Aseguramiento de Calidad

CEMEX COLOMBIA S.A. | Calle 99 # 9A - 54 Piso 7 | (571) 6039000 | (571) 6469000 | Bogotá, D.C. Colombia

Mallasan S.A.S

Mallas y Gaviones de Santander

CERTIFICADO DE CALIDAD GAVION TRIPLE TORSION C12 HUECO 10*10

FECHA:	**27 DE OCTUBRE DEL 2025**
CLIENTE:	**CONSORCIO CAUCE**
CIUDAD:	**BUCARAMANGA**
NORMA:	NTC 2403:2004

PRODUCTO FABRICADO EN CALIBRE 12 (2.70m) EN ALAMBRONES IMPORTADOS DE COREA DEL SUR N. DE COLADA SA46937

ANEXAMOS CERTIFICACION DE NUESTRO PROVEEDOR E INFORME DE ENSAYOS

CARACTERISTICAS DEL ALAMBRE

Galvanizado en caliente clase 1 A NTC 2403 con zinc de 99% de pureza, con las siguientes características:

DIAMETRO (mm): 2.77 +/-0.08
OVALAMIENTO MAXIMO (mm): 0.08
CALIBRE MALLA: Tejido calibre 12, refuerzo calibre 10
ADHERENCIA DE ZINC: SIN GRIETAS
LIMITE DE FLUENCIA (Kgf/mm2)
RESISTENCIA TRACCION: 49 Kg / mm2

CARACTERISTICAS DEL GAVION

RED:
Tejido a máquina hexagonal a triple torsión
CALIBRE RED : N. 12
Calibre refuerzo N. 10
ORIFICIO DE LA RED:
MEDIDAS NOMINALES: 10x10 cm

TOLERANCIAS:
DIMENSIONES DEL GAVION : +/- 5%
DIMENSIONES DEL ORIFICIO: +/- 8%
DIAMETRO DEL ALAMBRE : +/- 00.8%

Mallasan S.A.S. Mallas y Gaviones de Santander	INFORME GENERICO DE PRODUCTO TERMINADO ALAMBRE GALVANIZADO PARA USOS GENERALES	CÓDIGO	FO-01-68
		VERSIÓN	10

ESPECIFICACIONES TECNICAS / *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

CODIGO SAP *SAP CODE*	CARACTERISTICAS FISICAS, QUIMICAS Y MECÁNICAS							
	CALIBRE (BWG)	DIAMETRO *DIAMETER* (mm)	TOLERANCIA *TOLERANCE* (mm)	OVALIDAD *OVALITY* (mm)	CAPA ZINC ZINC COAT (g/m²)		RESISTENCIA *TENSILE STRENGHT* (Kg/mm²)	
				Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.
210371	18	1,25	± 0,04	± 0,02	30	55	40	70
210345	18	1,25	± 0,04	± 0,02	30	55	40	70
655942	18	1,25	± 0,04	± 0,02	30	55	40	70
254628	18	1,25	± 0,04	± 0,02	80	105	40	60
254630	18	1,25	± 0,04	± 0,02	80	105	40	60
210368	18	1,25	± 0,05	± 0,02	30	55	40	70
209595 -210247-210251 -210252- 210255- 210256-210272 -210279- 210288 -210311- 210328-210330 - 210351- 212789	18	1,25	± 0,02	± 0,02	50	75	40	58
650090	18	1,25	± 0,04	± 0,02	30	55	40	70
260910 - 210237	18	1,36	-0,03/ +0,00	± 0,02	30	55	60	-
668383 - 668384	17	1,45	± 0,02	0,02	200	240	71	92
657322	18	1,40	± 0,03	± 0,02	30	55	60	95
659274	18	1,40	± 0,03	± 0,02	40	60	60	95
210235-210236-210234-210229-210230	17	1,41	-0,04/ +0,00	± 0,02	200	240	60	-
651847	17	1,43	± 0,03	0,02	210	260	71	103
260910 - 210237	17	1,45	-0,03/ +0,00	± 0,02	30	55	92	130
225332	17	1,47	± 0,02	± 0,02	200	240	60	100
657322	17	1,50	± 0,03	± 0,02	30	55	110	130
659274	17	1,50	± 0,03	± 0,02	40	60	110	130
210235 - 210236	16,5	1,51	-0,04/ +0,00	± 0,02	200	240	107	130
283221	16,5	1,52	± 0,02	± 0,02	30	55	92	130
668383 - 668384	16,5	1,52	± 0,02	0,02	200	240	112	130
645470	16,5	1,54	± 0,02	± 0,02	40	65	50	65
651847	16	1,57	± 0,05	0,02	210	260	110	130
639069	16	1,63	± 0,02	± 0,02	200	240	65	-
244130	16	1,65	± 0,04	± 0,02	80	105	40	65
210282	16	1,65	± 0,04	± 0,02	30	55	40	70
210346	16	1,65	± 0,04	± 0,02	30	55	40	70
655941	16	1,65	± 0,04	± 0,02	30	55	40	70
210370	16	1,65	± 0,04	± 0,02	30	55	40	70
210365	16	1,65	± 0,05	± 0,02	30	55	40	70
209592 - 209593 - 209596 - 210257 - 210287 - 210289 - 210298 - 210299 - 210326 - 210329 - 210331 - 218335 - 210344 - 210348 - 210361	16	1,65	± 0,02	± 0,02	50	75	40	58
244129	16	1,65	± 0,04	± 0,02	80	105	40	65
225332	15,5	1,67	± 0,02	± 0,02	200	240	100	130
210234 - 210229 - 210230	15	1,80	-0,04/ +0,00	± 0,02	210	250	99	-
652196	15	1,83	± 0,02	0,02	30	55	40	56
628765-628768-651462-651463	15	1,83	± 0,02	0,02	45	70	40	56
210783	15	1,83	± 0,04	± 0,02	240	280	40	60
210226 -210241- 210242-210221-210228 -210224-210243- 210246-212572- 210238- 210239-210240 - 212764- 212765 -210227- 210244 - 210245 210225	15	1,83	± 0,02	± 0,02	30	55	40	56
209594	15	1,83	± 0,04	± 0,02	75	110	-	46
629419-629420	15	1,83	± 0,02	± 0,02	30	55	40	56
639068	15	1,83	± 0,02	± 0,02	200	240	140	-
645470	15	1,86	± 0,02	± 0,02	40	65	50	65
651852	15	1,90	+0,05/-0,02	0,02	65	90	-	55

"Las copias impresas son sólo válidas garantizando su actualización con sello original del sistema documental"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / *TECHNICAL SPECIFICATIONS*								
CODIGO SAP *SAP CODE*	**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUIMICAS Y MECÁNICAS**							
	CALIBRE (BWG)	**DIAMETRO** *DIAMETER* **(mm)**	**TOLERANCIA** *TOLERANCE* **(mm)**	**OVALIDAD** *OVALITY* **(mm)**	**CAPA ZINC ZINC COAT (g/m²)**		**RESISTENCIA** *TENSILE STRENGHT* **(Kg/mm²)**	
				Máx.	**Min.**	**Máx.**	**Min.**	**Máx.**
651462-651463	14	2,00	± 0,02	0,02	40	70	40	56
210766	14	2,00	± 0,08	± 0,02	100	140	65	-
210226 -210241- 210242 -210221- 210228- 210224- 210243 - 210246	14	2,00	± 0,02	± 0,02	30	55	40	56
629420	14	2,00	± 0,02	± 0,02	30	55	40	56
651852	14	2,03	± 0,03	0,02	50	75	-	55
210761	14	2,06	± 0,04	± 0,02	100	140	65	-
210756	14	2,06	± 0,04	± 0,02	200	240	140	-
639087	14	2,06	± 0,04	± 0,02	200	240	140	-
210768	14	2,06	± 0,04	± 0,02	200	240	140	-
645866	14	2,11	± 0,04	± 0,02	40	65	40	52
210259	14	2,11	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
210372	14	2,11	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
210342	14	2,11	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
210366	14	2,11	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
244136	14	2,11	± 0,04	± 0,02	80	105	40	65
244140	14	2,11	± 0,04	± 0,02	80	105	40	65
210357	14	2,11	± 0,04	± 0,02	40	70	-	42
657317	14	2,11	± 0,04	± 0,02	80	105	40	65
608650 - 606868 - 608669 - 608670 - 608671	14	2,11	± 0,02	± 0,02	60	85	40	56
210347	13,5	2,25	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
210338	13,5	2,25	± 0,04	± 0,02	40	70	-	42
209612 - 209620 - 209927 - 209931 - 210801 - 210802 - 210819 - 210820 - 210822 - 210824	13,5	2,25	± 0,02	± 0,02	30	55	40	60
279746 - 279747 - 279758	13,5	2,25	± 0,04	± 0,02	260	310	40	60
279738	13,5	2,26	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
603768	13	2,34	± 0,08	± 0,02	220	260	140	-
210360	13	2,40	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
210319	13	2,40	± 0,04	± 0,02	40	70	-	42
209610 - 209618 -210303 - 210796 - 210797 - 210817 - 210818 - 210823	13	2,40	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
279736	13	2,41	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
628761	13	2,41	± 0,02	± 0,02	46	60	47	60
645867	13	2,41	± 0,04	± 0,02	40	65	40	52
652196	12,5	2,47	± 0,02	0,02	30	55	40	56
212572 - 210238 - 210239 - 210240 - 212784 - 212785 - 210227 - 210244 - 210245 - 210225	12,5	2,47	± 0,02	± 0,02	30	55	40	56
629419	12,5	2,47	± 0,02	± 0,02	30	55	40	56
647617	12,5	2,47	± 0,02	± 0,02	40	55	40	56
210757	12,5	2,50	± 0,08	± 0,02	220	260	140	-
210760	12,5	2,50	± 0,08	± 0,02	110	150	65	-
210767	12,5	2,50	± 0,08	± 0,02	110	150	65	-
210355	12,5	2,50	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
210352	12,5	2,50	± 0,04	± 0,02	40	70	-	42
209609 - 209614 - 210803 - 210804 - 210821	12,5	2,50	± 0,02	± 0,02	30	55	40	60
210759	12,5	2,50	± 0,08	± 0,02	220	260	140	-
608650 - 608668 - 608669 - 608670 - 608671	12,5	2,59	± 0,02	0,02	60	85	40	56
279733 - 279736 - 279737 - 279738	12	2,70	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
279746 - 279747 - 279758	12	2,70	± 0,04	± 0,02	260	310	40	60
209615 - 209616 - 209622 - 209925 - 209928 - 210782 - 210787 - 210800 - 215724 - 223302 - 223303 - 227461	12	2,70	± 0,04	± 0,02	240	280	40	60
210253	12	2,71	± 0,04	± 0,02	40	55	40	60
210340	12	2,77	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
210364	12	2,77	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
210369	12	2,77	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
244141	12	2,77	± 0,04	± 0,02	30	55	40	65

"Las copias impresas son sólo válidas garantizando su actualización con sello original del sistema documental"

ESPECIFICACIONES TECNICAS / *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

CODIGO SAP *SAP CODE*	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUIMICAS Y MECÁNICAS							
	CALIBRE (BWG)	DIAMETRO *DIAMETER* (mm)	TOLERANCIA *TOLERANCE* (mm)	OVALIDAD *OVALITY* (mm)	CAPA ZINC ZINC COAT (g/m²)		RESISTENCIA *TENSILE STRENGHT* (Kg/mm²)	
				Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.
244142	12	2,77	± 0,04	± 0,02	80	105	40	65
210354	12	2,77	± 0,04	± 0,02	80	105	-	42
210848 - 210853 - 210866 - 210867 - 210868 - 210869 - 611898	12	2,77	± 0,04	± 0,02	40	70	40	55
209611 - 209619 - 209860 - 209861 - 209926 - 209930 -210793 - 210794	12	2,77	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
645863	12	2,77	± 0,04	± 0,02	40	65	40	52
209526	12	2,85	± 0,02	± 0,02	30	55	40	55
209617 - 209929 - 210795 - 210798 - 215725 - 216799 - 227459 - 228618	11	3,00	± 0,04	± 0,02	240	280	40	60
279739 - 279740 - 279742 - 279743	11	3,00	± 0,04	± 0,02	260	310	40	60
279733 - 279737	11	3,04	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
210336	11	3,05	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
210316	11	3,05	± 0,04	± 0,02	40	80	-	42
209613 - 209621 - 210781 - 210786	11	3,05	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
218830	10,5	3,10	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
210849 - 210850 - 210851 - 210855 -210861 - 210871 - 210875 - 210876 - 210877 - 210878 - 210879 - 236512 - 262067 - 262068- 647506- 647507- 647508	10,5	3,17	± 0,02	± 0,02	40	55	40	55
212798	10,5	3,25	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
210269	10,5	3,25	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
210362	10,5	3,25	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
215358	10,5	3,25	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
210358	10,5	3,25	± 0,04	± 0,02	40	80	-	42
209503	10,5	3,25	± 0,04	± 0,02	40	80	-	42
645865	10,5	3,25	± 0,04	± 0,02	40	65	40	52
210305	10	3,40	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
210367	10	3,40	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
210353	10	3,40	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
215357	10	3,40	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
210349	10	3,40	± 0,04	± 0,02	40	80	-	42
210852 - 210854 - 210856 - 210858 - 210859 - 210860 - 213697 - 213700 - 213702 - 213703 - 213705 - 213706	10	3,40	-0,04+0,00	± 0,02	40	55	40	55
654242	10	3,40	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
210304	9	3,76	± 0,04	± 0,02	40	80	-	42
214342	9	3,76	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
215466 - 215467	9	3,76	± 0,04	± 0,02	240	280	40	60
649083-649084	9	3,76	± 0,04	0,02	200	240	40	55
279739 - 279740 - 279742 - 279743	9	3,80	± 0,04	± 0,02	260	310	40	60
649085 - 649087	9	3,80	± 0,04	0,02	30	65	40	55
209524 - 209525 - 209905 - 209906	9	3,84	± 0,02	± 0,02	30	55	40	55
218282 - 227591	9	3,84	± 0,04	± 0,02	240	280	40	55
649088	9	3,90	± 0,04	0,02	30	65	40	55
655345	9	3,90	± 0,04	0,02	200	240	40	55
649059	9	3,90	± 0,04	0,02	200	240	40	55
210260	8	4,19	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
210363	8	4,19	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
216385	8	4,19	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
210337	8	4,19	± 0,04	± 0,02	40	80	-	42
210356	6	5,15	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
210309	6	5,15	± 0,04	± 0,02	40	80	-	42
211028 - 211016 - 211005 - 210982 - 210971	6	5,15	± 0,03	± 0,02	50	80	39	52
210314	5	5,59	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60

"Las copias impresas son sólo válidas garantizando su actualización con sello original del sistema documental"

Anexo 4. Resultado de ensayos.

HSC

FORMATO DE GESTIÓN DE LABORATORIO


CÓDIGO	FO-GL-044
FECHA	3/05/2023
VERSIÓN	4
Página 1 de 1	

INFORME DE RESULTADO
DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES DE CONCRETO
NTC 673 - 396 - 722


LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S
CENTRO INDUSTRIAL Y LOGÍSTICO AVENIDA CRA 27 # 450 M ANILLO VIAL FLORIDA, SANTANDER, COLOMBIA

FECHA DE REPORTE	Nº DE REPORTE	FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRA	Nº DE ORDEN DE SERVICIO	FACTURA DE VENTA	INFORMACIÓN DEL CLIENTE
[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ITEM DEL INFORME	FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYO	EDAD (DÍAS)	ELEMENTO	DIÁMETRO (mm)			LONGITUD (mm)				ÁREA (cm²)	RELACIÓN LONGITUD/DIÁMETRO	FACTOR DE CORRECCIÓN	TIPO DE FRACTURA	PESO (g)	DENSIDAD (kg/m³)	CARGA MÁXIMA (kN)	RESISTENCIA OBTENIDA POR EL ELEMENTO (MPa)	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			PORCIÓN DE FRACTURA
					Diámetro 1	Diámetro 2	Promedio	Longitud 1	Longitud 2	Longitud 3	Promedio									(MPa)	(kg/cm²)	(PSI)	
1	[illegible]	[illegible]	7	CON ESCOLLO Y/O GRAVA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	28		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]



Tipo 1
Cono combinado con 2 tipos diferentes de fractura en ambos extremos



Tipo 2
Cono con fracturación vertical atravesando uno de los extremos. Cilindro con fracturación cónica. Dejar en el mismo sentido.



Tipo 3
Agrietamiento vertical dividiendo una de las caras en dos partes aproximadamente iguales. Muchas veces libre de escombros.



Tipo 4
Fractura diagonal sin grietas a través de los dos extremos. Se distingue por no tener fracturas en el lado opuesto del tipo 1.



Tipo 5
Fractura en forma cónica (combinación diferentes de anteriores)



Tipo 6
Similar al tipo 3, pero no presenta divisiones a través de la superficie de la base.

OBSERVACIONES

- ESTE ENSAYO FUE REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO.
- INFORMACIÓN DEL CONCRETO: EL CLIENTE NO SUMINISTRO ESTA INFORMACIÓN.
- LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME CORresponden ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.

LOS DATOS DE FECHA DE TOMA, DESCRIPCIÓN DEL CONCRETO, ELEMENTO Y RESISTENCIA ESPERADA CORresponden A INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE. CUALQUIER OTRO DATO SUMINISTRADO POR ESTE DEBERÁ SER IDENTIFICADO EN EL INFORME CON EL CARÁCTER (*). HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S. NO SE RESPONSABILIZA POR LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE INCLUIDA EN ESTE INFORME Y QUE PUEDA AFECTAR LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.

REVISÓ	APROBÓ
[signature]	[signature]
NOMBRE: [illegible]	NOMBRE: [illegible]
CARGO: COORDINADOR DE LABORATORIO	CARGO: GERENTE

[illegible]

FORMATO DE GESTIÓN DE LABORATORIO

INFORME DE ENSAYO
DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
NTC 673 – ASTM C39

CÓDIGO	F-GLA-002
FECHA	5/1/2022
VERSIÓN	5
Página 1 de 1	

LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS HORMIGUEROS DE COLOMBIA S.A.S
CENTRO INDUSTRIAL Y LOGÍSTICO GAVILANES KM 7 Y 400 M ANILLO VIAL, PALENQUE, DIAGONAL FLORIDABLANCA Nº 33-11, BODEGA 10 - PISO 1, GIRÓN, SANTANDER, COLOMBIA.

FECHA DE REPORTE	Nº DE MUESTRAS	FECHA DE RECIBO DE LA MUESTRA	Nº DE ORDEN DE SERVICIO	OBJETO DE OBRA	INFORMACIÓN DEL CLIENTE
19/abril/2022	1	14/abril/2022	14-22	Aislador	CONSTRUCTORA CAMILO ANDRES PUENTES

# DE MUESTRA	FECHA DE ENSAYO	EDAD (DÍAS)	ELEMENTO	DIÁMETRO (cm)			LONGITUD (cm)				ÁREA (cm²)	RELACIÓN L/D	VALOR DE CORRECCIÓN	DEFECTOS EN EL CONCRETO	CARGA (kg)	ESFUERZO (kg/cm²)	CARGA MÁXIMA (kN)	RESISTENCIA ESPERADA (28 DÍAS) (MPa)	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			PATRÓN DE FRACTURA
				Diámetro 1	Diámetro 2	Promedio	Longitud 1	Longitud 2	Longitud 3	Promedio									(MPa)	(kg/cm²)	(PSI)	
1	25/5/2022	28	CIMENTACIÓN MURO	15,24	15,26	15,25	30	30	30	30	182,65	2,0	1,00	NORMAL	31.870	174	312,70	25,0	17,8	182	2.587	4
2	25/5/2022	28	CIMENTACIÓN MURO	15,24	15,26	15,25	30	30	30	30	182,65	2,0	1,00	NORMAL	31.870	174	312,70	25,0	17,8	182	2.587	4
3	25/5/2022	28	CIMENTACIÓN MURO	15,24	15,26	15,25	30	30	30	30	182,65	2,0	1,00	NORMAL	31.870	174	312,70	25,0	17,8	182	2.587	4
4	25/5/2022	28	CIMENTACIÓN MURO	15,24	15,26	15,25	30	30	30	30	182,65	2,0	1,00	NORMAL	31.870	174	312,70	25,0	17,8	182	2.587	4
5	25/5/2022	28	CIMENTACIÓN MURO	15,24	15,26	15,25	30	30	30	30	182,65	2,0	1,00	NORMAL	31.870	174	312,70	25,0	17,8	182	2.587	4
6	25/5/2022	28	CIMENTACIÓN MURO	15,24	15,26	15,25	30	30	30	30	182,65	2,0	1,00	NORMAL	31.870	174	312,70	25,0	17,8	182	2.587	4

Tipo 1
Fisura columnar en dos lados formando un ángulo entre ellos.

Tipo 2
Fisura lateral cónica en un extremo pero no en el otro, debido a cabeceo que impide la fricción.

Tipo 3
Agrietamiento vertical en columnas con ruptura cónica en ambos extremos. No hay corrección por cabeceo.

Tipo 4
Fractura diagonal sin grietas a través de los extremos, las cabezas pueden estar desiguales debido al cabeceo.

Tipo 5
Fractura en la parte superior en forma de cono.

Tipo 6
Similar al tipo 3, pero la grieta termina a través de la superficie del cilindro.

OBSERVACIONES

- ENSAYO REALIZADO POR PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO.
- INFORMACIÓN DEL CONCRETO: EL CLIENTE NO SUMINISTRO ESTA INFORMACIÓN.
- LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME CORRESPONDEN PRECISA Y EXCLUSIVAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
- CUALQUIER CAMBIO DE FECHA DE TOMA, INFORMACIÓN DEL CONCRETO, ELEMENTO Y RESISTENCIA ESPERADA CORRESPONDIENTE A INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE, SUCEDIDO ANTES DE RECIBIDA Y REVISADA EN EL INFORME CON EL CASAS SAS (*), HORMIGUEROS DE COLOMBIA O SE DESCONOCIDA POR LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE INCLUIDA EN ESTE INFORME Y QUE PUEDA AFECTAR LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.

REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: WILLIAM EDUARDO CASTRO	NOMBRE:
CARGO: LABORATORISTA	CARGO:

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la previa autorización de HORMIGUEROS DE COLOMBIA S.A.S.
Este documento no puede ser modificado ni alterado en ninguna forma o por ningún medio.
NIT 901.[illegible]

HSC

FORMATO DE GESTIÓN DE LABORATORIO


INFORME DE ENSAYO
DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
NTC 0 - 478 - 11

Código	FT-CS-044
Fecha	2019/05/01
Versión	6
Página 1 de 1	


LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS HIDROGEOLOGIA DE COLOMBIA S.A.S
CENTRO INDUSTRIAL Y LOGÍSTICO SAN JOSE AK 7 # 409 M ANILLO VIAL PALERMO, DIAGONAL 75 CARRARANCA N° 30-31, BODEGA 10 - PISO 1, BARRIO, SANTANDER, COLOMBIA.

FECHA DE INFORME	N° DE INFORME	FECHA DE MUESTREO DE LA MUESTRA	N° DE CILINDROS RECIBIDOS	PROYECTO	INFORMACIÓN DEL CLIENTE
[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CONSORCIO CAMCE HIDROGEOLOGIA@GMAIL.COM

N° DEL CILINDRO	FECHA DE FALLA	FECHA DE VACIADO	EDAD	ELEMENTO	DIÁMETRO (cm)			LONGITUD (cm)				ÁREA (cm²)	RELACIÓN LONGITUD / DIÁMETRO	FACTOR DE CORRECCIÓN	CLASIFICACIÓN CLASTOMANTA	PESO	DENSIDAD	CARGA MÁXIMA	RESISTENCIA OBTENIDA POR EL CLIENTE	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			TIPO DE FRACTURA
			(DÍAS)		Diámetro 1	Diámetro 2	Promedio	Longitud 1	Longitud 2	Longitud 3	Promedio					(g)	(kg/m³)	(lb)	(MPa)	(MPa)	(kg/cm²)	(PSI)	
1	[illegible]	[illegible]	7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	56	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	56	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]



Tipo 1
Cono oblicuo con una fractura a través de ambos extremos



Tipo 2
Cono oblicuo con una fractura a través de un extremo



Tipo 3
Columnar con fracturas a través de ambos extremos



Tipo 4
Fractura diagonal sin golpes en los extremos



Tipo 5
Fractura columnar en ambos extremos



Tipo 6
Similar al tipo 5, pero con golpes en uno o en ambos extremos

OBSERVACIONES

- ESTE ENSAYO FUE REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO.
- INFORMACIÓN DEL CONCRETO: EL CLIENTE NO SUMINISTRÓ ESTA INFORMACIÓN.
- LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y ESTABLECIDA PARA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.
- [illegible] DE FECHA DE TOMA, INFORMACIÓN DEL CONCRETO, ELEMENTO Y RESISTENCIA ESPERADA CORRESPONDEN A INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE, CUALQUIER OTRA DATO SUMINISTRADO POR ESTE NO INCLUIDO Y SE HAN INDICADO EN EL INFORME CON EL CARÁCTER (*). HIDROGEOLOGIA DE COLOMBIA NO SE RESPONSABILIZA POR LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE INCLUIDA EN ESTE INFORME Y QUE PUEDA AFECTAR LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.

AVALÓ	APROBÓ
NOMBRE: WILMER EDUARDO CORTES	NOMBRE: MARTHA LILIANA RIVERA ORTIZ
CARGO: COORDINADOR DE LABORATORIO	CARGO: GERENTE

	FORMATO DE GESTIÓN DE LABORATORIO	CÓDIGO	FT-GL-043
HSC	INFORME DE ENSAYO DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DE MORTEROS DE CEMENTO HIDRÁULICO A LA COMPRESIÓN, USANDO CUBOS DE 50 MM Ó 2"PULGADAS DE LADO. NTC 220-2002	FECHA	30/06/2023
		VERSIÓN	6
			Página 1 de 3

LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS HORIGUELOS DE COLOMBIA S.A.S
CENTRO INDUSTRIAL Y LOGISTICO SAN JORGE KM 7 + 400 M ANILLO VIAL PALENQUE - FLORIDABLANCA Nº 22-31, BODEGA 15 - PISO 1, GIRON, SANTANDER, COLOMBIA.

FECHA DE INFORME	Nº DE INFORME	FECHA DE INGRESO DE LA MUESTRA	Nº DE ORDEN DE SERVICIO	FRENTE DE OBRA	INFORMACIÓN DEL CLIENTE
13/06/2025	1	10/06/2025	136-25	CAGDE	CONSORCIO CAUCE consorciocauce@gmail.com

Nº I.D. DEL CUBO	FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYO	EDAD	IDENTIFICACIÓN DEL CUBO	LARGO	ANCHO	ÁREA	ALTURA	PESO	DENSIDAD	CARGA MÁXIMA	RESISTENCIA ESPECIFICADA	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			% RESISTENCIA
					(mm)	(mm)	(cm^2)	(mm)	(g)	(g/cm^3)	(N)	(Mpa)	(MPa)	(PSI)	(kg/cm^2)	ESPECIFICADA
1	10/06/2025	09/06/2025	1	LLENADO DE ANCLAJES	50,62	50,61	2562	52,30	2153	1,606	65838	30,7	24,3	3522	248,7	118%
1,1	10/06/2025	27/06/2025	11		52,78	52,66	2780	51,33	2803	1,608	73810	30,7	25,4	3681	260,8	123%
1,2	10/06/2025	18/06/2025	30		50,0	51,00	2775	51,14	2800	1,609	82440	30,7	30,3	4390	308,8	148%
2	14/06/2025	21/06/2025	7	LLENADO DE ANCLAJES	51,03	51,42	2639	51,21	2073	1,605	48700	30,7	18,2	2670	188,2	59%
2,1	14/06/2025	28/06/2025	11		52,01	51,38	2681	52,14	2172	1,631	52200	30,7	19,0	2810	198,4	64%
2,2	14/06/2025	11/06/2025	30		52,16	52,09	2769	52,72	2153	1,618	78600	30,7	28,8	4138	290,8	131%
3	10/06/2025	23/06/2025	7	LLENADO DE ANCLAJES	52,27	51,99	2674	51,85	2038	1,614	49800	30,7	18,8	2694	189,4	60%
3,1	10/06/2025	29/06/2025	11		52,11	49,68	2589	52,65	2103	1,636	53160	30,7	20,8	3002	210,4	191%
3,2	10/06/2025	13/06/2025	30		52,76	53,07	2899	51,30	2363	1,704	68430	30,7	23,6	2959	210,2	190%

OBSERVACIONES

- ESTE ENSAYO FUE REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO.
- LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME CORRESPONDEN ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
- LOS DATOS DE FECHA DE TOMA, INFORMACIÓN DEL CONCRETO, ELEMENTO Y RESISTENCIA ESPERADA CORRESPONDEN A INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE, CUALQUIER OTRO DATO SUMINISTRADO POR ESTE SE INCLUIRÁ Y SE IDENTIFICARÁ EN EL INFORME CON EL CARÁCTER [*]. HORIGUELOS DE COLOMBIA S.A.S. NO SE RESPONSABILIZA POR LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE INCLUIDA EN ESTE INFORME Y QUE PUEDA AFECTAR LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.

REVISÓ:	APROBÓ:
NOMBRE: WILLIAM EDUARDO CORTES	NOMBRE: MARTHA LILIANA ESPINOSA
CARGO: COORDINADOR DE LABORATORIO	CARGO: GERENTE

Queda totalmente prohibida la reproducción parcial de este informe sin la previa autorización de HORIGUELOS DE COLOMBIA SAS.

Este documento es válido cuando lleve la firma de quien lo revisó y lo aprobó.

FIN DEL INFORME

Anexo 5. Ficha de indicadores.

	FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN	CODIGO	SST-F-46
		FECHA	10/02/21
		VERSIÓN	2
		PAGINA 1 DE 1	

1. DATOS DEL INDICADOR												
Objetivo del indicador	Analizar el porcentaje de avance de obra ejecutado a lo largo del proyecto				Nombre del indicador	Avance de obra						
Interpretación del indicador	Porcentaje de avance de obra ejecutado vs proyectado				Formula de calculo	(% avance ejecutado / % avance proyectado)*100						
Fuente de información	Informes tecnicos mensuales de obra				Tipo de indicador	Cuantitativo						
Responsable de medición	Director de obra				A quien se entrega los	Gerente general						
Frecuencia	Mensual	Trimestral	Acumulado	Unidad	Porcentaje	Mide	100%	Nivel satisfactorio	80%	Nivel Critico	70%	

2. RESULTADOS 2025														
Periodo	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	Logro
% AVANCE OBRA - EJECUTADO	0,29%	0,79%	8,56%	19,85%	34,26%	27,88%	31,30%	44,01%	49,583%	56,25%	61,31%	68,30%	68,68%	435,05%
% AVANCE OBRA - PROYECTADO	0,51%	2,55%	4,59%	18,14%	34,49%	38,38%	61,84%	63,94%	55,533%	63,01%	72,36%	78,89%	87,68%	583,13%
Resultado	46,62%	30,80%	186,37%	91,46%	99,19%	70,36%	71,84%	68,16%	88,78%	89,21%	84,73%	81,64%	78,66%	81,24%



3. ANALISIS Y SEGUIMIENTO
En el periodo del 05 de septiembre al 05 de octubre se evidencia el 46% de cumplimiento en las actividades programadas debido a la alta afluencia del caudal
En el periodo del 06 de octubre al 05 de septiembre se evidencia el 30,26% de cumplimiento en las actividades programadas debido a la alta afluencia del caudal.
En el periodo del 06 de noviembre al 05 de diciembre se evidencia en 186,37% el cual cumple las actividades programadas, dentro de las actividades se hace disposición final de material sobrante producto de excavaciones en el relleno sanitario el carrasco, el cual está certificado y detallado en el informe PASA entregado como anexo del informe técnico del periodo.
En el periodo del 06 al 31 de diciembre 2024 se evidencia el 91,46% el cual cumple las actividades programadas, dentro de las actividades se hace Replanteo, control y medición de la obra, Seguridad y limpieza, Retiro de basuras y escombros, Control de aguas mediante instalación de Jarrillo provisional con material de río, excavación mecánica bajo agua para material granular y roca, suministro e colocación de concreto ciclópeo, para la construcción de dentellón, suministro de concreto de 3000psi para solado, así mismo se realizó el suministro y colocación de anclaje de viñatería.
En el periodo del 06 al 31 de enero 2025 se evidencia el 99,19% el cual cumple las actividades programadas, dentro de las actividades se hace reparado, control y medición de la obra, excavación mecánica bajo el agua de material granular y rocoso, suministro y colocación de concreto ciclópeo para la construcción de dentellón, suministro de concreto de 3000 psi para el recubrimiento de los gaviones, suministro y colocación de mano de enfierrado, suministro e instalación de geotextil no tejido tejido tipo 10, conformado y diseño y planos estabilización, suministro e instalación de tubería sanitaria para las pasamuros o lloraderos; y, finalmente, la colocación de geotextil entre los gaviones y el terreno natural para prevenir filtraciones
En el periodo del 01 al 28 febrero se evidencia avance en la programación de las actividades teniendo como resultado el 70,36% las fuertes precipitaciones ocurridas en zonas aledañas al proyecto ocasiona un aumento significativo del caudal del río, afectando la infraestructura de protección, elevando los niveles generando pérdidas de productividad por riesgos de crecientes súbitas. Aunque no lluvió directamente en el área del proyecto, el ascenso brusco de niveles puede causar inundaciones y socavación provoca afectaciones en la operación.
En el periodo del 01 al 31 marzo de 2025 se evidencia avance en la programación de las actividades teniendo como resultado el 72,04% las fuertes precipitaciones ocurridas en zonas aledañas al proyecto ocasionan un aumento significativo del caudal del río. Se cumple las actividades programadas, dentro de las actividades se presentan actividades en los dos frentes de trabajo, se tuvo atraso en la ejecución debido a las lluvias frecuentes en el proyecto.
En el periodo del 01 y el 31 de abril se evidencia el 80,18% el cual cumple las actividades programadas, dentro de las actividades se desarrollan actividades continuas en los dos frentes de trabajo, presenta un atraso en las actividades debido a las condiciones climáticas las cuales han afectado en el mes de febrero, se está trabajando en conjunto para subsanar la cronología de la ejecución de las actividades programadas al inicio del proyecto.
Para el periodo del 01 al 31 mayo de 2025 se evidencia avance de obra con un porcentaje del 49,58 % con un cumplimiento respecto a lo programado del 68,76%, se registra un retraso significativo en la ejecución de obra debido a las altas precipitación en la zona. El equipo técnico está trabajando en estrategias que mitiguen el impacto climático en la obra.
Para el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de junio 2025 se evidencia un avance en ejecución de obra del 56,25% realizando la ejecución continua de actividades programadas sin embargo por las fuertes lluvias lo retrasado el cumplimiento de las proyectadas dando un porcentaje de cumplimiento del 88,78%, reflejando el compromiso técnico y el cumplimiento de los objetivos de la obra. Cabe destacar que, a pesar de las lluvias nuestros que afectaron el desarrollo de algunas labores, se mantiene al mínimo de trabajo en áreas de garantizar el progreso planificado.
Para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de julio 2025 se evidencia avance en la programación de las actividades con un porcentaje del 81,21% de las actividades proyectadas, sin embargo, por el impacto climático que se está presentando en la zona debido a las fuertes lluvias se ve reflejado el 84,73% de lo proyectado, desde el área técnica junto con la interventoría se está avanzando en las estrategias para mitigar y continuar con el desarrollo de las actividades pendientes.
Para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de agosto 2025 se evidencia avances en la programación de las actividades de forma simultánea en los dos frentes de obra activos con un porcentaje del 81,30% de las actividades proyectadas, sin embargo, por el impacto climático que se está presentando en la zona debido a las fuertes lluvias se ve reflejada el 81,64% de lo proyectado, desde el área técnica junto con la interventoría se está avanzando en las estrategias para mitigar y continuar con el desarrollo de las actividades pendientes.
Para el periodo comprendido entre el 01 y el 30 septiembre 2025 se evidencia avance en la programación de las actividades de forma simultánea en los dos frentes de obra activos con un porcentaje del 68,68% de las actividades proyectadas, sin embargo, por el impacto climático que se está presentando en la zona debido a las fuertes lluvias se ve reflejada el 87,40% de lo proyectado, desde el área técnica junto con la interventoría se está avanzando en las estrategias para mitigar y continuar con el desarrollo de las actividades pendientes.

4. PLAN DE ACCIÓN				
Actividad	Plazo ejecución	Responsable	Proceso	Recursos
Estrategias de mitigación al impacto climático.	mensual	Residente de Obra Ing. Auxiliar	Obra y servicios	Humanos y Técnicos

5. OBSERVACIONES
Las estrategias de mitigación en el impacto a las altas precipitaciones en la zona se dejan consignadas en actas de las actas de comité técnicas mensuales, estas se desarrollan de acuerdo a las afluencia del clima y el impacto que se genere en la obra.
Para el periodo se aplicaron estrategias preventivas en el plan de acción en asuento clímico con la interventoría y el cliente.

	FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN	CODIGO	SST-F-44
		FECHA	3/5/2021
		VERSIÓN	2
		PAGINA 1 DE 1	

1. DATOS DEL INDICADOR

Objetivo del indicador	Evaluar el porcentaje de quejas presentadas por periodo				Nombre del indicador	Atención de quejas						
Interpretación del indicador	Porcentaje de quejas mensuales respecto al periodo inmediatamente anterior				Formula de calculo	(N° de quejas mes anterior - N° de quejas mes actual)/N° de quejas mes anterior)*100						
Fuente de información	No conformidades presentadas por las partes interesadas				Tipo de Indicador	Cuantitativo						
Responsable de medición	Director de obra				A quien se comunica	Gerente general						
Frecuencia	Mensual	Tendencia	Descendente	Unidad	Porcentaje	Meta	100%	Nivel satisfactorio	80%	Nivel Critico	<80%	

2. RESULTADOS 2025

Periodo	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	Logro
N° de quejas recibidas	0,00	0,00	n.a	n.a	1,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	6,00
N° de quejas atendidas	0,00	0,00	n.a	n.a	1,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	6,00
Resultado	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	#¡DIV/0!	100%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100%	#¡DIV/0!	100%



3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO

En el periodo comprendido entre el 05 de septiembre y 05 de octubre no se presentaron quejas por parte de las partes interesadas.

En el periodo comprendido entre el 05 de octubre y 05 de noviembre no se presentaron quejas por parte de las partes interesadas.

En el periodo comprendido entre el 05 de octubre y 05 de noviembre no se presentaron quejas por parte de las partes interesadas.

En el periodo comprendido entre el 06 y el 31 de diciembre 2024 no se presentaron quejas por parte de las partes interesadas.

En el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de enero 2025 se presentaron 1 quejas por parte de las partes interesadas la cual se atendió atención por parte del contratista.

En el periodo comprendido entre el 01 y el 28 de febrero 2025 no se presentaron quejas por parte de las partes interesadas.

En el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de marzo 2025 se presentaron 3 quejas por parte de las partes interesadas las cuales se le dieron atención de acuerdo a las solicitudes recibidas.

En el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de abril 2025 no se presentaron quejas por parte de las partes interesadas.

En el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo 2025 se presentaron 1 queja por parte de las partes interesadas, se atendió de acuerdo a la solicitud recibida.

En el periodo comprendido entre el 01 y el 30 junio 2025 no se presentaron quejas por parte de las partes interesadas.

En el periodo comprendido entre el 01 y el 31 julio 2025 no se presentaron quejas por parte de las partes interesadas.

En el periodo comprendido entre el 01 y el 31 agosto 2025 se presentó una queja por parte de una persona de la comunidad en la que por atropellamiento de una de las maquinas que ejecutaba labores en la obra golpeo un carro, el dueño solicita al contratista atención inmediata, se hace la debida diligencia, se trasladó el carro al centro de atención veterinaria donde finalmente fallece, se hace un acuerdo de indemnización al dueño por su perdida.

En el periodo comprendido entre el 01 y el 31 septiembre 2025 no se presentaron quejas por parte de las partes interesadas.

4. PLAN DE ACCIÓN

Actividad	Plazo ejecución	Responsable	Proceso	Recursos
n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

5. OBSERVACIONES

	FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN	CODIGO	SST-F-44
		FECHA	1/5/2021
		VERSIÓN	2
		PÁGINA 1 DE 1	

1. DATOS DEL INDICADOR													
Objetivo del Indicador	Identificar el porcentaje de multas en los proyectos					Nombre del Indicador	Multas en los proyectos						
Interpretación del Indicador	Porcentaje de multas mensuales					Formula de calculo	(N° de multas mes anterior - N° de multas mes actual)/N° de multas mes anterior)*100						
Fuente de información	Correspondencia de multas generadas en el periodo					Tipo de Indicador	Cuantitativo						
Responsable de medición	Director de obra					A quien se comunica	Gerencia general						
Frecuencia	Mensual	Tendencia	Ascendente	Unidad	Porcentaje	Meta	100%	Nivel satisfactorio	95%	Nivel Crítico		90%	

2. RESULTADOS 2024 / 2025														
Periodo	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	Logro
N° de multas mes anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N° de multas mes actual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	#¡DIV/0!



3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO
En el periodo comprendido entre el 05 de septiembre y 05 de octubre no se presentaron multas que afecten el desarrollo del proyecto.
En el periodo comprendido entre el 05 de octubre y 05 de noviembre no se presentaron multas que afecten el desarrollo del proyecto.
En el periodo comprendido entre el 05 de noviembre y 05 de diciembre no se presentaron multas que afecten el desarrollo del proyecto.
En el periodo comprendido entre el 05 y el 31 de diciembre no se presentaron multas que afecten el desarrollo del proyecto.
En el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de enero de 2025 no se presentaron multas que afecten el desarrollo del proyecto.
En el periodo comprendido entre el 01 y el 28 de febrero de 2025 no se presentaron multas que afecten el desarrollo del proyecto.
En el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de marzo de 2025 no se presentaron multas que afecten el desarrollo del proyecto.
En el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2025 no se presentaron multas que afecten el desarrollo del proyecto.
En el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de junio de 2025 no se presentaron multas que afecten el desarrollo del proyecto.
En el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de julio de 2025 no se presentaron multas que afecten el desarrollo del proyecto.
En el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de agosto de 2025 no se presentaron multas que afecten el desarrollo del proyecto.
En el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de septiembre de 2025 no se presentaron multas que afecten el desarrollo del proyecto.

4. PLAN DE ACCIÓN				
Actividad	Plazo ejecución	Responsable	Presupu	Recursos
n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

5. OBSERVACIONES

	FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN	CODIGO	SST-F-44
		FECHA	8/5/2025
		versión	1
		PAGINA 1 DE 1	

1. DATOS DEL INDICADOR												
Objetivo del indicador	Medir el desempeño de los proveedores dentro de la organización				Nombre del indicador	Desempeño de proveedores						
Interpretación del indicador	Mide la eficacia de los proveedores				Formula de calculo	Calificación promedio de proveedores / Mayor calificación de proveedores						
Fuente de información	Evaluación de desempeño de proveedores				Tipo de indicador	Cuantitativo						
Responsable de medición	Coordinador de compras				A quien se consulta	Gerente general						
Frecuencia	Anual	Tendencia	Ascendente	Unidad	Porcentaje	Meta	100%	Nivel satisfactorio	90%	Nivel Critico	70%	

2. RESULTADOS 2026/2025	
Periodo	may-25
promedio de calificación de proveedores	4,65
Mayor calificación	5,00
Resultado	93%



3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO
Se realiza evaluación de desempeño de los proveedores en el mes de Mayo de 2025 el cual da una puntuación satisfactoria (93% satisfactorio) de los proveedores monitoreados, dicha evaluación es compartida a los proveedores con el fin de generar el conocimiento y resaltar el compromiso para con la empresa.

4. PLAN DE ACCIÓN				
Actividad	Plazo ejecución	Responsable	Proceso	Recursos
na	n.a	n.a	n.a	n.a

n.a

	FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN	CODIGO	SST-F-01
		FECHA	30/09/21
		VERSIÓN	2
		PAGINA 1 DE 1	

1. DATOS DEL INDICADOR											
Objetivo del Indicador	Identificar el cumplimiento del plan de capacitación				Nombre del Indicador	Cumplimiento del plan de capacitación organizacional					
Interpretación del Indicador	capacitaciones				Formula de calculo	(N° de capacitaciones programadas/N° de capacitaciones ejecutadas)*100					
Fuente de Información	Plan de capacitación				Tipo de Indicador	Cuantitativo					
Responsable de medición	Coordinador recursos humanos				A quien se comunica	Gerente					
Frecuencia	mensual	Tendencia	Ascendente	Unidad	porcentaje	Meta	100%	Nivel satisfactorio	99%	Nivel Critico	98%

2. RESULTADOS														
PERIODO 2024-2025														
Periodo	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	Logro
# capacitaciones ejecutadas	3,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	66,00
# capacitaciones programadas	3,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	66,00
Resultado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO
Para el periodo establecido se realizaron 3 capacitaciones, 1 del área SST; Nivel peligro y riesgos 1 capacitación del área ambiental y 1 capacitación social; Fortalecimiento de valores (trabajo en equipo), educación vial y oficina de atención a la comunidad.
Para el periodo se presentaron 5 capacitaciones, 3 del área SST; Manejo de Cargas, Autocuidado, Identificación de peligros y riesgos, 1 capacitación del área ambiental manejo y disposición de residuos sólidos y 1 capacitación social; Fortalecimiento de valores (compartir), educación vial y oficina de atención a la comunidad.
Para el periodo se presentaron 4 capacitaciones, 3 del área SST; riesgo biológico, prevención de lesiones 1 capacitación del área ambiental; manejo riesgos biológicos y 1 capacitación
Para el periodo comprendido entre el 06 de diciembre y 31 de diciembre se presentaron 4 capacitaciones, 2 del área SST; Cuidado de los ojos, gestión del tiempo, 1 capacitación del área ambiental; Buen uso del agua y 1 capacitación social; Fortalecimiento de valores (tolerancia), educación vial y oficina de atención a la comunidad
Para el periodo comprendido entre para el periodo comprendido entre el 01 y el 28 de febrero se presentaron 4 capacitaciones, 2 del área SST; Aseo y condiciones inseguras, Hábitos y estilos de vida saludable, 1 capacitación del área ambiental; Manejo Adecuado de Punto Ecológico y 1 capacitación social; Fortalecimiento de valores (amor una familia), educación vial y oficina de atención a la comunidad
para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de marzo se presentaron 4 capacitaciones, 2 del área SST; Importancia de la seguridad vial, funciones y responsabilidades del SGSST, 1 capacitación del área ambiental Gestión Adecuada de Bolsas de Cemento y 1 capacitación social; Fortalecimiento de valores (pensamiento lógico), educación vial y oficina de atención a la comunidad, ver soportes en los informes de SST y PASA anexos en el informe técnico.
capacitaciones, 2 del área SST; prevención del consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas, Identificación de peligros y riesgos en el Lugar de trabajo, 1 capacitación del área ambiental, Conservación y Protección Fuente Hídrica Río de Oro y 1 capacitación social; Fortalecimiento de valores (valor, independencia), educación vial y oficina de atención a la comunidad
Para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo se presentaron 4 capacitaciones, 2 del área SST; Riesgo químicos, Hojas de seguridad de productos químicos / matriz de compatibilidad, 1 capacitación del área ambiental; Aspectos e impactos ambientales asociados a la ejecución del proyecto y 1 capacitación social; Fortalecimiento de valores (inteligencia), educación vial y oficina de atención a la comunidad, ver soportes en los informes de SST y PASA anexos en el informe técnico.
para el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de junio se presentaron 4 capacitaciones, 2 del área SST; Uso hacer en caso de incidentes/accidentes, identificación de condiciones inseguras, 1 capacitación del área ambiental; Política y cumplimiento ambientales, Matriz Legal y 1 capacitación social; Fortalecimiento de valores (empoderamiento), educación vial y oficina de atención a la comunidad
Para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de julio se presentaron 6 capacitaciones, 3 del área SST; Medidas de prevención de la fatiga ocular, orden y Aseo en el lugar de trabajo, Manipulación de cargas; 1 capacitación del área ambiental; Manejo y almacenamiento de sustancias químicas y 1 capacitación social; Fortalecimiento de valores (tolerancia), educación vial y oficina de atención a la comunidad, ver soportes en los informes de SST y PASA anexos en el informe técnico.
para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de agosto se presentaron 5 capacitaciones, 2 del área SST; políticas del SGSST y Medidas de prevención por caídas de nivel y con diferencia de nivel; 2 capacitaciones del área ambiental; Manejo y disposición de RCD y Manejo y disposición de residuos peligrosos – RESPEL y 1 capacitación social; Fortalecimiento de valores (agradecimiento), educación vial y oficina de atención a la comunidad
Para el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de septiembre se presentaron 5 capacitaciones, 2 del área SST; Peligros físicos y cuidado visual, 2 capacitaciones del área ambiental; Normativa legal ambiental y Prevención de la contaminación de cuerpos de agua y redes de servicios públicos; y 1 capacitación social; Fortalecimiento de valores (toma decisiones), educación vial y oficina de atención a la comunidad,

4. PLAN DE ACCION				
Actividad	Plazo ejecución	Responsable	Proceso	Recursos
n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

5. OBSERVACIONES
n.a

ANEXO No. 5: INFORME AMBIENTAL.

PLAN DE ACCION SOCIO AMBIENTAL

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02).

ELABORADO POR:

CONSORCIO CAUCE

BUCARAMANGA – SANTANDER

01 AL 30 DE SEPTIEMBRE
2025

1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1 INTRODUCCION

El presente documento, corresponde a la información obtenida por **CONSORCIO CAUCE** durante la ejecución de las obras civiles que conllevan la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02).", se tiene claro que para su desarrollo el proyecto no requiere de trámite de Licencia Ambiental, según lo establecido en la normatividad ambiental, por esta razón CONSORCIO CAUCE en cumplimiento de su responsabilidad ambiental aplica los programas basados en los lineamientos establecidos en el Plan de Acción Socio Ambiental para obras de construcción.

El objetivo del Plan de acción socio ambiental, es definir las medidas de prevención y/o corrección de los impactos negativos directos e indirectos que se puedan generar durante las etapas de desarrollo de la obra, teniendo como base, las características del área y las actividades a realizar para cumplir con las especificaciones del proyecto, en el cual se dispone que el desarrollo del mismo mejorará la calidad de vida de los habitantes del municipio y del área de influencia indirecta de la obra.

El Plan de acción se encuentra enmarcado en la normatividad legal vigente en el país, que requiere imponer una práctica apropiada del manejo del espacio físico y de todos sus recursos naturales, tratando de conservar, mejorar y recuperar la calidad ambiental que conlleva al desarrollo sustentable del área a intervenir.

Todos los proyectos que se desarrollan en el Departamento de Santander deben realizarse dentro de un marco de actuación respetuoso con el ambiente, garantizando el uso racional, sostenible de los recursos naturales renovables, que intervienen y que deben incluir, para la ejecución, la presentación del plan de acción socio ambiental a las Autoridades que lo exijan según el marco de sus competencias.

Para la ejecución de este proyecto, se hace indispensable el cumplimiento de la normativa establecida por la autoridad ambiental y la legislación correspondiente; por lo cual se busca disponer de las acciones de la ley 99 de 1993 para el manejo ambiental de los proyectos como parte del buen ejercicio de la ingeniería.

En este sentido, el Plan de acción socio ambiental, propone con el presente documento, la orientación en el cumplimiento de las normas ambientales, con el fin de ejercer control antes, durante y después de la ejecución de las obras civiles necesarias para construir y mejorar las áreas que se puedan ver afectadas con el desarrollo del proyecto.

La aplicación de las medidas planteadas en este plan, optimizarán el uso racional y el usufructo de los recursos naturales en este sector, ayudarán a mejorar la gestión ambiental al interior de la

ejecución de la obra, con el desarrollo de los programas establecidos según las necesidades y dinámica propia del proyecto, proporcionando el mejoramiento de la calidad de vida del entorno social, otorgando una mejor comprensión de la variable ambiental en la ejecución del proyecto por parte del ejecutor, el cual es completamente conscientes de su significado e importancia.

Por último, se busca, unificar y armonizar los lenguajes ingenieril y ambiental, de tal manera que las actividades desarrolladas en el proyecto, sean compatibles con el entorno en el cual se ejecutan y de esta manera permitir la sostenibilidad de los recursos naturales, acorde con los lineamientos consagrados en la Constitución Nacional, la ley 99 de 1993 y demás normatividad para la protección del medio ambiente.

El objetivo principal de este Plan de Acción es formular los mecanismos que permitan aplicar oportunamente una medida, bien sea de manejo, prevención, mitigación, control, protección, vigilancia o compensación, en las áreas de interés humano y ecológico para la zona de influencia del proyecto.

Los principales aspectos relacionados con el manejo y protección ambiental que se deben considerar para la ejecución del proyecto son los siguientes programas:

1. PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS
2. PROGRAMA PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS
3. PROGRAMA CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS
4. PROGRAMA USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
5. PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS
6. PROGRAMA PARA EL MANEJO DE LA VEGETACION LA FAUNA Y EL PAISAJE.
7. PROGRAMA DE SEÑALIZACION
8. PROGRAMA DE ADECUACION DE CAMPAMENTOS.
9. PROGRAMA DE GESTION SOCIAL

Las medidas de manejo ambiental que se presentan a continuación corresponden a las acciones a implementar para controlar, mitigar, prevenir y/o compensar los diferentes impactos que se pueden presentar con la ejecución de las obras de " CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER."

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo General

Implementar las medidas de manejo que se deben aplicar en el desarrollo de las actividades de obra de " CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)", con el fin de prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos o afectaciones que se pueden generar sobre los recursos naturales y el medio ambiente y así mismo realizar una adecuada gestión social en la población influenciada directamente por el proyecto.

1.2.2 Objetivos específicos

- Implementar las medidas de manejo ambiental para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos identificados y analizados para el proyecto.

- Lograr satisfactoriamente el cumplimiento de los indicadores de seguimiento y monitoreo para las medidas de manejo planteadas.

2. INFORME MENSUAL

En el desarrollo de las obras de MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)", en línea con este propósito, el proyecto fomenta la educación ambiental entre los trabajadores y las comunidades del área de influencia, promoviendo la adopción de buenas prácticas para la conservación del medio ambiente y el uso responsable de los recursos naturales. Asimismo, se implementan políticas y acciones concretas que buscan garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, mediante estrategias como la gestión adecuada de residuos, la preservación de la biodiversidad y la adopción de medidas para mitigar impactos negativos durante las obras.

El presente informe corresponde al periodo entre el 01 al 30 de septiembre de 2025, en el cual se realizaron las siguientes actividades técnicas:

- Suministro y vaciado de concreto de 3.000 psi para el recubrimiento de estructuras en gaviones.
- Suministro de lechada cementicia para llenado e inyección de anclajes
- Suministro y colocación de anclajes de 3 cables ø=1/2" de L=20m.
- Ejecución de perforaciones horizontales para anclajes de 0,00 a 20m con su respectivo encamisado
- Jacket de respaldo para revestimiento de la perforación horizontal en anclajes.
- Estructura de disipación de energía
- Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" para los lloraderos en los muros gaviones

3. PROGRAMAS IMPLEMENTADOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL MANEJO AMBIENTAL.

3.1 PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS

PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS							PASA -01
OBJETIVO							
Prevenir y controlar la contaminación de los recursos: agua, suelo y aire, así como la afectación a la salud de las personas, mediante un manejo integral de los residuos sólidos convencionales y especiales que se generan durante el desarrollo de la obra.							
TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación		Compensación	
BENEFICIOS							

A través de un adecuado manejo de los residuos de la obra se logra:

- Reducir la generación de emisiones atmosféricas.
- Reducir el impacto visual de la obra y minimizar el área de afectación por presencia de residuos o escombros.
- Minimizar las necesidades de transporte de residuos.
- Asegurar el buen funcionamiento de las escombreras y maximizar su vida útil.
- Reducir costos financieros.
- Optimizar la administración de materiales.
- Reducir riesgos inherentes al almacenamiento de residuos.

- ACCIONES A EJECUTAR

Durante las actividades de construcción de las obras de Mitigación De La Amenaza Por Inundación Para La Rehabilitación Y Recuperación De La Margen Derecha Del Río De Oro En El Sector Centroabastos, Municipio De Bucaramanga, Santander (Ra-Obra-02)", se generarán diferentes tipos de residuos los cuales se consideran domésticos, reciclables y de disposición especial o peligrosa, que recibirán el tratamiento adecuado.

A continuación, se describe el procedimiento aplicado con el fin de dar cumplimiento al manejo integral de residuos sólidos, con lo cual se busca minimizar los impactos temporales que se puedan generar por su inadecuado manejo, estas son:

- Clasificar y reducir en la fuente.
- Recolectar y almacenar temporalmente.
- Disposición final adecuada.

Los residuos sólidos generados durante el proceso de construcción son de diversos tipos. Una adecuada clasificación de los mismos permite reciclar o reutilizar algunos de los materiales, minimizando así la cantidad de desechos no aprovechables. De esta forma, se reducen costos de disposición final, se optimiza el uso de los materiales y se alcanza un menor impacto ambiental.

Los residuos sólidos generados durante el periodo correspondiente del 01 al 30 de septiembre de 2025 se presentan a continuación:

RESIDUOS ORDINARIOS	RESIDUOS RECICLABLES
8.4 kg	4.7 Kg

(Ver Anexo No 1. Manejo de residuos sólidos).

Durante el periodo de ejecución de la obra, se llevó a cabo la recolección de residuos sólidos ordinarios generados en el frente de obra. Posteriormente, estos residuos fueron recolectados por la empresa Veolia, entidad responsable del servicio de recolección y transporte de residuos en la zona. Esta empresa garantiza que los materiales recolectados sean llevados de forma segura y eficiente al relleno sanitario El Carrasco, único sitio autorizado a nivel regional para la disposición final de residuos sólidos, el cual opera bajo la figura de emergencia sanitaria, cumpliendo con la normativa ambiental vigente.

Adicionalmente, se realizaron jornadas de limpieza y adecuación del terreno en el frente de obra, con el objetivo de mantener el área ordenada, segura y en óptimas condiciones para el desarrollo de las actividades del proyecto.

Generación de residuos Reciclables

En el periodo relacionado se generaron **4.7 kg** de residuos sólidos reciclables, los cuales se encuentran en almacenamiento temporal hasta tener un volumen considerable para ser entregados a la empresa RECICLAYMAS, gestor legalmente constituido para realizar el aprovechamiento de estos residuos.

Así mismo en el periodo relacionado se generaron bolsas de cemento que se encuentran en almacenamiento temporal para ser entregadas al PROGRAMA SACOS VERDES de Cemento Argos; y reincorporadas al ciclo de vida.

Generación de residuos sólidos especiales

En el periodo relacionado no se generaron residuos sólidos peligrosos, cuando se generen residuos peligrosos, estos serán entregados a un gestor autorizado para realizar su tratamiento y disposición final adecuada.

Activades de Capacitación

En el periodo relacionado se brindó al personal del frente de obra los siguientes temas de Capacitación Ambiental.

FECHA	CAPACITACION
Normativa legal ambiental	11 de septiembre de 2025
Prevención de la contaminación de cuerpos de agua y redes de servicios públicos	18 de septiembre de 2025

(ver Anexo No 2. Registro de asistencia a Capacitación).





Jornada de orden y aseo en áreas de campamento



Punto ecológico





Actividades de Capacitación

CONSORCIO	CONSORCIO CAUCE CONTRATO No. 210-15410-6 **PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL**	CDMB

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	X

LUGAR DE APLICACIÓN

FRENTE DE OBRA RIO DE ORO SECTOR CENTROABASTOS

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN			
	1	2	3	4
Manejo para separación en la fuente de residuos sólidos				
Recolección de Residuos ordinarios y disposición final				
Recolección de residuos reciclables y especiales con disposición final				

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO CAUCE

Indicador

- Volumen de residuos ordinarios
- Volumen de residuos especiales
- Volumen de residuos reciclables

Descripción del Indicador

Cantidad de residuos ordinarios generados en la obra

Indicador de calificación

- Volumen residuos entregados gestor ambiental / Volumen residuos generados en el periodo X 100

$$\frac{8.4}{8.4} * 100 = 100\%$$

- Volumen de RESPEL entregados a empresa autorizada/ Volumen RESPEL generado en el periodo X 100

No aplica para el periodo relacionado

- Volumen residuos reciclables entregados a empresas recicladoras / Volumen residuos reciclables generados en el periodo X 100

No aplica para el periodo relacionado

Frecuencia de verificación

Mensual a medida que la necesidad lo amerite, y las actividades de la obra los generen

Tipo de indicador

Cuantitativo.

Registro de cumplimiento

Informe mensual
Registro fotográfico

Cronograma

La aplicación de las medidas establecidas en el Manual de Gestión Socio-Ambiental tiene el mismo tiempo y duración de las actividades constructivas, o el tiempo que sea necesario, con el fin de asegurar el manejo integral de los residuos sólidos durante la ejecución de la obra.

3.2 PROGRAMA PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS

PROGRAMA PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS								PASA -03
OBJETIVO								
Cumplir con las normas legales vigentes para el manejo, transporte y disposición final de los escombros.								
TIPO DE MEDIDA								
Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación		
BENEFICIOS								
A través de un adecuado manejo y disposición final de los escombros de la obra se logra: • Reducir la generación de emisiones atmosféricas • Evitar alteración de la morfología • Reducir el impacto visual de la obra y minimizar el área de afectación por presencia de escombros. • Asegurar el buen funcionamiento de los sitios de disposición final y maximizar su vida útil. • Evitar alteración de cobertura vegetal • Reducir riesgos inherentes al almacenamiento de residuos.								
• ACCIONES A EJECUTAR								
Consorcio Cauce aseguro la gestión adecuada y disposición final de los RCD generados en las actividades de obra realizando la disposición final en escombrera legal debidamente aprobada por la Autoridad Ambiental, tal y como se establece en la resolución 1257 de 2021. Las acciones establecidas para el adecuado manejo y disposición final de escombros fueron: • De acuerdo con la norma vigente, el tiempo, máximo permitido para el almacenamiento de escombros o material sobrante en espacios públicos fue de 24 horas. • Se prohibe el uso de zonas verdes o rondas hidráulicas para el almacenamiento temporal o disposición final los residuos. • Los vehículos destinados para tal fin tendrán involucrados a su carrocería los contenedores o platones aprobados para que la carga depositada en ellos quede contenida en su totalidad, en forma tal que se evite el derrame. De acuerdo con el desarrollo de actividades técnicas de la obra, durante el periodo de ejecución no se realizaron actividades de demolición; cuando se genera dicho material es dispuesto en la escombrera El Cairo; la cual cuenta con concepto de viabilidad ambiental aprobada por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB mediante el Radicado 15892 del 18-11-2021 Asi mismo, los vehículos destinados al transporte de material sobrante son llenados hasta su capacidad, la carga está cubierta con una lona o plástico, que baja no menos de 30 centímetros contados de su borde superior hacia abajo, cubriendo los costados y la compuerta, atendiendo las medidas de manejo enunciadas en la Resolución 1257 de 2021 Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y se adoptan otras disposiciones.								

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	X

LUGAR DE APLICACIÓN
FRENTE DE OBRA RIO DE ORO SECTOR CENTROABASTOS

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN			
	1	2	3	4
Cumplir con las acciones propuestas para el manejo y disposición de material sobrante y escombros				
Realizar la adecuada disposición de los materiales sobrantes y escombros				

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN

CONSORCIO CAUCE

INDICADOR

- Volumen de residuos sobrantes y escombros

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

- Cantidad de residuos sobrantes dispuestos en escombrera autorizada y escombros generados en obra

INDICADOR DE CALIFICACIÓN

- Volumen residuos sobrantes y escombros dispuestos / Volumen de residuos sobrantes y escombros generados x 100

No aplica para el periodo relacionado

FRECUENCIA DE VERIFICACIÓN

Mensual a medida que la necesidad lo amerite, y las actividades de la obra los generen

TIPO DE INDICADOR

Cuantitativo.

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO

Informe mensual
Registro fotográfico

CRONOGRAMA

La aplicación de las medidas establecidas en el Manual de Gestión Socio-Ambiental tiene el mismo tiempo y duración de las actividades constructivas, o el tiempo que sea necesario, con el fin de asegurar el manejo integral de los residuos durante la ejecución de la obra.

3.3 PROGRAMA CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Programa control de emisiones atmosféricas.							PASA - 02
OBJETIVO							
Controlar las emisiones de material particulado y gases a la atmósfera como resultado de los movimientos de tierra y operación de vehículos, equipos y maquinaria. Prevenir el incremento en los niveles de ruido durante las actividades constructivas del proyecto.							
Tipo de medida							
Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	
BENEFICIOS							

A través de la aplicación de las medidas ambientales se espera:

- Minimizar los efectos adversos al medio ambiente controlando la generación de material particulado.
- Controlar los niveles de ruido, durante la ejecución de la obra, garantizando que este se encuentre por debajo de los límites permisibles.
- Minimizar las quejas y reclamos por parte de la comunidad durante la ejecución del proyecto.

ACCIONES A EJECUTAR

Teniendo en cuenta las actividades constructivas del periodo del 01 al 30 de septiembre de 2025, se realizaron las siguientes acciones para controlar las afectaciones temporales producto de las emisiones atmosféricas se relacionan a continuación:

- Cuando se haga necesario se realizará instalación de cerramiento perimetral, con el objetivo de mitigar las emisiones de material particulado a la atmosfera.
- Dentro de la implementación de medidas de manejo para el uso de maquinaria y equipos de construcción se garantizan las condiciones óptimas de funcionamiento.
- En el frente de obra está prohibido el uso de corneta, pitos ni sirenas de los vehículos que hacen parte del proyecto, salvo la alarma de reversa.
- Se restringe la operación de los equipos y herramientas de construcción, perforación y compresión generadores de ruido ambiental en la zona con uso residenciales, en horarios comprendidos entre las 7:00 p.m. y las 7:00 a.m. de lunes a sábado, o en cualquier horario los días domingos y feriados.
- Se prohíbe realizar quemas a cielo abierto de llantas, baterías, plásticos, lubricantes usados o cualquier otro elemento que emita contaminantes tóxicos al aire.
- Cuando se hace necesario se realizan jornadas de limpieza mediante barrido con hidratación previa, del área de influencia directa del proyecto.
- Los equipos y maquinaria presente en el frente de obra son sometidos a chequeos y mantenimientos preventivos con el fin de evitar afectaciones al medio ambiente y garantizar su buen funcionamiento.
- En el periodo de ejecución relacionado se requirió el uso de vehículos tipo volqueta teniendo en cuenta el retiro de basuras y escombros. (Ver anexo No 3. Documentos de volquetas).

RELACION DE VEHÍCULOS				
PLACA	SOAT	FECHA	RTM	FECHA
TTW 843	9310009606002	31/10/2025	177552748	30/11/2025
WFD 114	9310013958601	31/05/2026	175856370	12/09/2026
XMD 821	1530102642103	17/11/2025	179940415	03/03/2026
GQV 575	89134412	07/09/2026	175815675	11/09/2026
BAK 481	330800588514300	09/06/2026	178767953	15/11/2026
TPJ 349	8901138189501	14/01/2026	180339220	20/03/2026

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	X

LUGAR DE APLICACIÓN

FRENTE DE OBRA RIO DE ORO SECTOR CENTROABASTOS

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN			
	1	2	3	4
Manejo adecuado de material de construcción				
Mantenimiento de vehículos y maquinaria				

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO CAUCE

Indicador

- Acopio de materiales
- Control de emisiones atmosféricas, generadas por los vehículos maquinaria y los equipos

Descripción del Indicador

Manejo de acopio de materiales
Verificación de estado de equipos y vehículos

Indicador de calificación

- Acopio de materiales autorizado / Número total de acopios

$$\frac{1}{1} * 100 = 100\%$$

- Vehículos con certificados técnico mecánico/ vehículos en obra x 100 = 100%

$$\frac{6}{6} * 100 = 100\%$$

Frecuencia de verificación

Mensual a medida que la necesidad lo amerite, y las actividades de la obra los generen.

Tipo de indicador

Cuantitativo.

Registro de cumplimiento

Informe mensual

Cronograma

Estas actividades tienen el mismo tiempo y duración de las actividades constructivas y en la etapa de desmantelamiento o el tiempo que sea necesario.

3.4 PROGRAMA USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Programa Uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción	PASA -03
OBJETIVO	

Establecer los procedimientos que serán implementados para el adecuado manejo del material de construcción, desde el almacenamiento temporal, transporte, uso hasta su disposición final, esto con fin de prevenir, controlar y minimizar los posibles impactos que se generen sobre el ambiente.

Garantizar la mínima incidencia ambiental, producto del empleo de diferentes insumos, materiales, y dispositivos para las obras.

TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación		Compensación	

Beneficios

Al establecer un sistema de manejo adecuado para el transporte, cargue, descargue y manipulación de los materiales de construcción (arenas, grava, triturados, recebos, ladrillos, triturados de arcilla y otros) se evitan pérdidas del mismo y por lo tanto se generan múltiples ventajas de orden financiero, logístico y ambiental. Al mismo tiempo, se reduce la cantidad de escombros y residuos generados, y el aporte de sedimentos y otros contaminantes a las redes de servicios públicos y fuentes de agua.

ACCIONES A EJECUTAR

Se consideran materiales de construcción, los productos pétreos explotados en minas y canteras usados, generalmente, en la industria de la construcción como agregados en la fabricación de piezas de concreto, morteros, pavimentos, obras de tierra y otros productos similares.

Durante las actividades de Construcción De Obras De Mitigación De La Amenaza Por Inundación Para La Rehabilitación Y Recuperación De La Margen Derecha Del Río De Oro En El Sector Centroabastos, Municipio De Bucaramanga, Santander (RA-OBRA-02), se requiere la utilización de triturado, arena, cemento, los cuales serán adquiridos a través de proveedores externos que cuenten con los respectivos permisos mineros y ambientales.

Manejo de materiales de construcción:

El Consorcio Cauce asegura que las empresas que suministren materiales de construcción cumplan con todas las exigencias normativas establecidas por las autoridades competentes. Para ello, se verifica que cada proveedor cuente con un plan de contingencia detallado, el cual contempla medidas de seguridad, prevención de riesgos, protocolos de organización y respuesta ante emergencias, equipos adecuados, personal capacitado y un presupuesto destinado a la prevención y control de emisiones contaminantes, así como la reparación de posibles daños ambientales.

Durante el periodo de ejecución, los materiales de construcción fueron suministrados por la empresa Comercializadora AGREMAX., la cual demostró cumplir con los requisitos exigidos, incluyendo el cumplimiento de normativas ambientales y de seguridad laboral. Esta empresa, contribuyó al desarrollo del proyecto al garantizar que sus productos fueran acordes con los lineamientos establecidos por el Consorcio y las regulaciones aplicables.

Medidas aplicadas para el manejo de concreto

1. El procedimiento para la mezcla y el vaciado del concreto y/o cemento, se realiza considerando una adecuada regulación de la mezcla, se protege el suelo mediante material impermeable (plástico) evitando afectaciones temporales en el área de influencia directa de esta actividad.

2. El personal de obra deberá utilizar los respectivos elementos de protección personal para la manipulación del cemento y concreto con el fin de prevenir accidentes de trabajo

Almacenamiento temporal de materiales

1. . Para el almacenamiento de materiales durante la construcción, se dispone de un área localizada de forma estratégica que favorece la cercanía entre el sitio de almacenamiento y los sitios de obra.
2. La zona de almacenamiento temporal se encuentra señalizada, los materiales acopiados son cubiertos completamente para evitar la contaminación y dispersión por efecto del agua o del viento.
3. Se dispone de un sitio debidamente demarcado para el almacenamiento de materiales, el apilamiento de estos materiales no supera el 1.5 metros de altura.
4. El sitio de almacenamiento por estar localizado dentro del área directa de la obra es de fácil acceso y no interfiere con el tráfico vehicular y peatonal en la zona.
5. Se prohíbe el almacenamiento temporal de materiales de construcción cerca a zonas verdes, ríos, quebradas, canales y caños.

Teniendo en cuenta las actividades técnicas del periodo de informe, se dio uso a los siguientes materiales de construcción

MATERIALES	CANTIDADES
Triturado	16 m3
Cemento	1000 bultos
Arena	16 m3





Suministro y Almacenamiento Adecuado de materiales

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	X
LUGAR DE APLICACIÓN			
FRENTE DE OBRA RIO DE ORO SECTOR CENTROABASTOS			
CRONOGRAMA DE EJECUCION			

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN			
	1	2	3	4
Identificación y obtención de los materiales de construcción				
Transporte y disposición de materiales				
Medidas de manejo para concretos				

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO CAUCE

Indicador

Cumplir con los procedimientos propuestos para el manejo de materiales de construcción durante el proyecto

Descripción del Indicador

1. Cumplir con el 100% de las acciones propuestas para el manejo de materiales de construcción.
2. Aprovechamiento de material de construcción

Indicador de calificación

1. Número de acciones realizadas en obra para el manejo de los materiales de construcción / Número de acciones establecidas*100

$$\frac{7}{7} * 100 = 100\%$$

2. Cantidad total de material utilizado en obra / Cantidad de material de fuentes autorizadas *100

Cemento (bultos)

$$\frac{1000}{1000} * 100 = 100\%$$

Triturado (m3)

$$\frac{16}{16} * 100 = 100\%$$

Arena (m3)

$$\frac{16}{16} * 100 = 100\%$$

Frecuencia de verificación

Mensual

Tipo de indicador

Cuantitativo

3.5 PROGRAMA PROTECCIÓN DEL SUELO – PREVENCIÓN DE PROCESOS EROSIVOS Y CONTROL SOBRE LA ESCORRENTÍA

Programa Protección del suelo – prevención de procesos erosivos y control sobre la escorrentía							PASA -04
OBJETIVO							
Garantizar la mínima incidencia ambiental, producto de la remoción de cobertura vegetal necesaria para la ejecución de la obra. Controlar los sedimentos generados por el retiro de materiales de recubrimiento en los sitios de obras que pueden ser arrastrados por la escorrentía, así mismo controlar la sedimentación y erosión causados por las obras hidráulicas requeridos por el proyecto, vertimientos de aguas con contenido de sedimentos, entre otros y evitar la aparición de focos erosivos en los frentes de obra.							
TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación		Compensación	
BENEFICIOS							
El suelo es uno de los recursos que puede resultar más afectado a causa de las actividades asociadas con la construcción de obras civiles. La necesidad de retirar la cobertura vegetal y remover grandes volúmenes de tierra acelera procesos erosivos. Igualmente, el suelo se puede ver afectado por la compactación, manipulación inadecuada de ciertas sustancias contaminantes y el almacenamiento de escombros o materiales de construcción. La acción de los agentes erosivos provoca una degradación progresiva de la estructura física del suelo lo que, a su vez, aumenta la vulnerabilidad de este a ser degradado y afecta al resto de las funciones del suelo. Por todo lo anterior, el suelo manifiesta una disminución progresiva en su capacidad de retención de agua y nutrientes disponibles para las plantas, lo que repercute en una reducción drástica de su fertilidad.							
ACCIONES A EJECUTAR							
El proyecto "Construcción de Obras de Mitigación de la Amenaza por Inundación para la Rehabilitación y Recuperación de la Margen Derecha del Río de Oro en el sector Centroabastos, Municipio de Bucaramanga, Santander (RA-OBRA-02)" responde a la necesidad de reducir el riesgo de inundaciones que históricamente han afectado la zona, protegiendo la infraestructura crítica del Centroabastos, clave para la economía regional. Además, busca la recuperación ambiental de las márgenes del río, deterioradas por procesos erosivos y actividades humanas no reguladas, en cumplimiento con las políticas de gestión del riesgo, promoviendo así el desarrollo sostenible y la seguridad en esta área vulnerable. Teniendo en cuenta lo anterior el objeto de la obra está ligado con la mitigación de impactos de erosión que presenta el suelo del sector; sin embargo, el Consorcio Cauce, implementa las siguientes acciones de manejo: • En el periodo de ejecución fue necesario realizar mezclas de concreto, al momento de realizar esta actividad se aseguró la protección del suelo para la prevención de la contaminación mediante el uso de geotextil o material impermeable que evite el contacto directo del material con el suelo. • Se controla el arrastre de sedimentos mediante la protección en geomembrana y trasporte inmediato de materiales sobrantes de excavación a los sitios de disposición final autorizados. • El abastecimiento de combustibles para la maquinaria se realiza evitando derrames accidentales, de igual formas en caso de presentarse un derrame accidental, será recogido inmediatamente, ya que se cuenta con los elementos necesarios en el Kit Antiderrame.							

- El volumen derramado es superior a 5 galones, debe removerse el suelo contaminado en su totalidad y restaurar la zona afectada.

- El sitio para la ubicación del campamento y despachos (almacén y depósito) se seleccionó el lugar donde se necesitó menor intervención sobre el suelo.

- Mediante la ejecución de las actividades propias de la obra se asegura la estabilidad del talud intervenido

- El ACPM utilizado durante las actividades de la obra es almacenado en un recipiente plástico con capacidad para 55 galones. Este recipiente se encuentra ubicado en un área específica diseñada para su almacenamiento temporal, cumpliendo con las medidas de seguridad requeridas. Adicionalmente, se ha dispuesto que el almacenamiento esté aislado del campamento para minimizar riesgos asociados, tales como derrames accidentales, incendios o contaminación ambiental





Suministro de concreto de 3.000 psi para recubrimiento de los gaviones





Suministro e instalación de anclajes

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	
LUGAR DE APLICACIÓN			

FRENTE DE OBRA RIO DE ORO SECTOR CENTROABASTOS

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN			
	1	2	3	4
Cumplir con las acciones propuestas para manejo y disposición de material sobrante				

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO CAUCE

Indicador

- Cumplir con las acciones propuestas para manejo de la erosión y arrastre de sedimentos.
- Cumplir con los requerimientos ambientales

Descripción del Indicador

- Aplicación de acciones de manejo para el control de la erosión y arrastre de materiales

Indicador de calificación

- Número de acciones realizadas / Número de acciones establecidas en el PASA*100

$$\frac{7}{7} * 100 = 100\%$$

Frecuencia de verificación

Mensual

Tipo de indicador

Cuantitativo.

Cronograma

El proyecto tiene el mismo tiempo de las actividades del desarrollo del mismo, teniendo en cuenta la necesidad de la construcción obras de mitigación de la amenaza por inundación para la rehabilitación y recuperación de la margen derecha del rio de oro en el sector centroabastos.

3.6. PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS

Programa de prevención de la contaminación de cuerpos de agua y redes de servicios públicos	PASA-05

OBJETIVO

Implementar medidas ambientales que minimicen las afectaciones por arrastre de materiales hacia cuerpos hídricos o redes de servicios públicos.

TIPO DE MEDIDA

	Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación

BENEFICIOS

En las obras de construcción, el agua debe manejaree considerando los siguientes criterios de manejo:

- Reducir el consumo
- Prevenir la contaminación.

ACCIONES A EJECUTAR

Para el periodo de ejecución del 01 al 30 de septiembre de 2025, con el fin de dar cumplimiento al programa se ejecutaron las siguientes actividades:

- Se solicito un punto de agua al predio contiguo, propiedad de Centroabastos, el cual ha otorgado la autorización para su uso en el desarrollo del proyecto. Este punto de agua es abastecido por el acueducto metropolitano, lo que asegura un suministro confiable y continuo para las actividades previstas. Además, se instala un contador con el fin de medir con precisión el consumo de agua, permitiendo la facturación correspondiente y promoviendo un uso eficiente y responsable del recurso.

- Se prohibe el vertimiento de residuos liquidos en las calles y zonas aledañas al frente de obra.

- Se cuenta con tres unidades sanitarias portátiles en los frentes de obra, con el propósito de garantizar condiciones higiénicas adecuadas para los trabajadores. El mantenimiento de estas unidades fue gestionado por la empresa RETCOR quien presto el servicio hasta el 15 de septiembre del presente año y la instalación y mantenimiento de las nuevas unidades sanitarias fueron gestionados por la empresa MASSI, encargada de brindar servicios de limpieza y desinfección periódica, así como la reposición de los insumos necesarios para su óptimo funcionamiento. Este mantenimiento incluye limpiezas completas de las unidades sanitarias en intervalos previamente establecidos, asegurando que se mantenga en perfectas condiciones de uso y que se cumplan los estándares de salubridad requeridos para este tipo de instalaciones temporales. (Ver Anexo No 4. Mantenimientos Unidad Sanitaria)

- El lavado de maquinaria, reparación y mantenimiento de vehículos está prohibido en el frente de obra con el fin de evitar verter aceites y residuos liquidos al suelo.

- No se registraron derrames o fugas de combustibles o residuos liquidos dentro o fuera del área de influencia, de presentarse un derrame este será recolectado, almacenado y enviado a tratamiento con una empresa especializada que cuente con las autorizaciones del caso, con el fin de evitar la contaminación del agua de escorrentía.





Unidades Sanitarias

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	
LUGAR DE APLICACIÓN			
FRENTE DE OBRA RIO DE ORO SECTOR CENTROABASTOS			

CRONOGRAMA DE EJECUCION				
ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN			
	1	2	3	4
Ejecución de medidas de manejo sanitario				
Ejecución de medidas de maneo de residuos y liquidos industriales				

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO CAUCE

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO

Indicador

Cumplir con las actividades propuestas para controlar la totalidad de los vertimientos generados durante el proyecto.

Descripción del Indicador

- Indicador servicio de baños.
- Manejo de Residuos liquidos, Domésticos e Industriales.

Indicador de calificación

- No de US utilizadas/ No de US requeridas*100

$$\frac{3}{3} * 100 = 100\%$$

Frecuencia de verificación

Mensual

Tipo de indicador

Cuantitativo.

Registro de cumplimiento

Informe Mensual
Registro fotográfico

Cronograma

Este programa se ejecutará durante el periodo de construcción de obras de mitigación de la amenaza por inundación para la rehabilitación y recuperación de la margen derecha del rio de oro en el sector centroabastos

3.7 PROGRAMA PARA EL MANEJO DE LA VEGETACION LA FAUNA Y EL PAISAJE.

Programa para el manejo de la vegetación la fauna y el paisaje							PASA -06
OBJETIVO							
Implementar medidas ambientales que minimicen las alteraciones del paisaje debido a la ejecución de las obras civiles de mitigación.							
TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	
BENEFICIOS							
La intervención racional y la adecuación del paisaje posterior a la terminación de la obra, permitirá que la comunidad que habita la zona pueda disfrutar de la mejora de su entorno.							

ACCIONES A EJECUTAR

En el proyecto Construcción de Obras de Mitigación de la Amenaza por Inundación para la Rehabilitación y Recuperación de la Margen Derecha del Rio de Oro en el sector Centroabastos, se implementó en el periodo de ejecución las siguientes medidas para el manejo de la vegetación la fauna y la flora:

- El descapote se realizó únicamente en las áreas estrictamente requeridas para la obra, las cuales se encuentran definidas en el diseño técnico.
- Está prohibido la realización de quemas y aplicación de herbicidas.
- Se prohíbe arrojar basuras, material sobrante en zonas verdes, en la cobertura vegetal o cauce ubicado en el área de influencia de la obra.
- Se realizó la intervención únicamente en las áreas establecidas en los diseños técnicos. Están prohibidas la quema a cielo abierto y la aplicación de herbicidas.
- Se encuentra prohibido el uso de árboles o arbustos para disponer elementos (alambres, carteles, sogas, cables, ropa, etc.).
- Se prohíbe el uso o porte de armas de fuego.
- Se prohíbe la caza y compra de especies de fauna silvestre.
- Se prohíbe el tránsito de maquinaria fuera de los frentes de obra.





Señalización instalada en los frentes de obra

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	

LUGAR DE APLICACIÓN
FRENTE DE OBRA RIO DE ORO SECTOR CENTROABASTOS

CRONOGRAMA DE EJECUCION				
ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN			
	1	2	3	4
Manejos preventivos en la cobertura de vegetación natural				
Manejo de la vegetación que permanecerá				

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO CAUCE

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO

Por parte del Interventor Ambiental

Descripción del Indicador

- Aplicación de acciones para el manejo de la vegetación presente en el área de influencia del proyecto.
- % de especies identificadas para intervención

Indicador de calificación

- No. de acciones de Manejo implementadas/No. de acciones de manejo propuestas X 100.

$$\frac{8}{8} * 100 = 100\%$$

- Especie forestales intervenidas / especies forestales solicitadas *100

NO aplica en el periodo relacionado

Frecuencia de verificación

Mensual

Tipo de indicador

Cuantitativo.

Cronograma

Este programa se ejecutará durante el periodo de construcción de las obras de mitigación de la amenaza por inundación para la rehabilitación y recuperación de la margen derecha del río de oro en el sector centroabastos

3.8 PROGRAMA DE SEÑALIZACION

Programa de señalización								PASA-07
OBJETIVO								
Prevenir los impactos que se puedan generar por la no señalización de los sitios donde se realice intervención por el desarrollo de la obra; a fin de garantizar la seguridad de trabajadores y/o peatones								
TIPO DE MEDIDA								
Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación		
BENEFICIOS								
El adecuado manejo de tránsito evitará accidentes que se puedan generar en el periodo de ejecución del proyecto.								
ACCIONES A EJECUTAR								

CONSORCIO	CONSORCIO CAUCE CONTRATO No. 210-15410-6 **PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL**	CDMB

De acuerdo con las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2025, se ejecutaron las siguientes acciones para cumplir con el programa establecido:

- Se mantiene la señalización requerida en las áreas del frente de obra.
- La señalización instalada corresponde a las normativas de Seguridad y Salud en el Trabajo, evacuación, emergencias y Ambiental.





Señalización Ambiental





Señalización áreas de campamento

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	
LUGAR DE APLICACIÓN			
FRENTE DE OBRA RIO DE ORO SECTOR CENTROABASTOS			
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN			

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCION			
	1	2	3	4
Señalización frentes de Obras, sitios temporales de almacenamiento y señalización vial cuando la obra lo amerite natural				

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO CAUCE

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO

Por parte del Interventor Ambiental

Indicador

Cumplir con las medidas propuestas para la señalización adecuada del área de trabajo establecidas para las etapas de operación y desmantelamiento de las instalaciones temporales del proyecto.

Descripción del indicador

Numero de áreas señalizadas en el área de ejecución del proyecto.

Indicador de calificación

- # de áreas señalizadas /# de áreas necesarias a señalizar

$$\frac{2}{2} * 100 = 100\%$$

* corresponden al campamento y frente de obra*

- # De acopios en obra / # de puntos de acopio señalizados.

$$\frac{1}{1} * 100 = 100\%$$

Corresponde al acopio de RCD

Frecuencia de verificación

Mensual

Tipo de indicador

Cuantitativo.

Cronograma

Este programa se ejecutará durante el periodo de construcción de la obra

3.9 PROGRAMA DE ADECUACION DE CAMPAMENTOS.

PROGRAMA DE ADECUACION DE CAMPAMENTOS.							PASA-08
OBJETIVO							
Prevenir, minimizar y controlar los impactos generados por la operación de las instalaciones temporales para el almacenamiento de herramienta menor y maquinaria, y las instalaciones de infraestructura básica de saneamiento.							
TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación		Compensación	
BENEFICIOS							

- Pérdida de suelo
- Cambios en la calidad de los suelos
- Cambios en la calidad del aire
- Cambios en los niveles de ruido
- Alteración a las unidades de paisaje
- Cambios en la cobertura vegetal y alteración de hábitat
- Afectación de la fauna silvestre
- Generación de expectativas y conflictos
- Incomodidades a los residentes y establecimientos de la zona.

ACCIONES A EJECUTAR

Para dar cumplimiento al objetivo planteado en el periodo 01 al 30 de septiembre de 2025, se ejecutaron las siguientes actividades:

• - Se mantiene el área destinada al campamento temporal del frente de obra, la cual fue adecuada de acuerdo con las necesidades especificas del proyecto. Esta zona, ubicada dentro del área de influencia directa del mismo, no requirió intervenciones significativas en el suelo, lo que permitió minimizar el impacto ambiental asociado a su preparación. Las adecuaciones realizadas se enfocaron en garantizar la funcionalidad y seguridad del campamento, respetando las características del terreno y asegurando el cumplimiento de las normativas ambientales.

• El área de campamento y el frente de obra cuenta con los elementos básicos para la atención de emergencias (Botiquín, extintor, camilla, inmovilizador, listado de instituciones de apoyo extremo en caso de emergencia) y cuenta con la señalización informativa y preventiva requerida.

• Los residuos sólidos generados en las áreas de campamento, son separados, residuos orgánicos, reutilizables y/o reciclables (empaques, papeles y plásticos), de acuerdo con el "Programa de manejo de residuos sólidos" y posteriormente son entregados al operador del servicio de aseo del municipio.

• De igual forma en caso de ser necesario se realiza la utilización del área alterna al acampamento, que igualmente debe contar con la señalización pertinente





Áreas de campamentos

ETAPA

	CONSORCIO CAUCE CONTRATO No. 210-15410-6 PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL	

PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	X

LUGAR DE APLICACIÓN

FRENTE DE OBRA RIO DE ORO SECTOR CENTROABASTOS

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN			
	1	2	3	4
Instalación de infraestructura temporal				
Desmantelamiento de las instalaciones temporales				

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO CAUCE

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO

Indicador

Cumplir con las medidas propuestas para reducir el impacto generado por la instalación, operación y desmantelamiento de las instalaciones temporales del proyecto.

Descripción del indicador

- Número de sitios de uso temporal

Indicador de calificación

- Número sitios de uso temporal/Número de sitios desmantelados*100

No aplica para el periodo relacionado

- No de medidas ambientales ejecutadas / No de medias ambientales programadas*100

$$\frac{4}{4} * 100 = 100\%$$

Frecuencia de verificación

Mensual

Tipo de indicador

Cuantitativo.

Registro de cumplimiento

Informe mensual

Cronograma

Este programa se ejecutará durante el periodo de construcción de las obras de obras de mitigación de la amenaza por inundación para la rehabilitación y recuperación de la margen derecha del rio de oro en el sector centroabastos

3.10 PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL

3.10.1. Proyecto de atención a la Comunidad

1. Proyecto de Atención a la Comunidad								PGS-6.1-18
OBJETIVO DEL PROYECTO								
Establecer las acciones necesarias para recibir, atender y dar respuesta oportuna a las solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas por la comunidad o autoridades competentes sobre el desarrollo del proyecto.								
TIPO DE MEDIDA								
CONTROL	X	PREVENCION	X	MITIGACION	X	COMPENSACION		
IMPACTOS A MANEJAR								
• Compromisos con la comunidad • Incremento temporal en los niveles de empleo. • Expectativas de la comunidad del AID de la obra, respecto a la construcción a desarrollar.								
ACCIONES DESARROLLADAS								
• Instalación y funcionamiento de la oficina de información y atención a la comunidad El Consorcio Cauce, cuenta con valla informativa de la obra a desarrollar con los datos a lugar y volante de la Oficina de atención a la comunidad, con ubicación, número telefónico, correo electrónico, horarios de atención para las inquietudes e información requerida al Consorcio, durante el desarrollo de la obra. (ver registro fotográfico) La comunidad puede acceder a los formatos de recepción, registro y seguimiento a las PQRS, diligenciados por el profesional social, para conocer las manifestaciones de la comunidad, en temas de su interés. • Atención a la comunidad de PQRS. A la fecha de elaboración del informe, no se han presentado PQRS, objeto de atención por parte del Consorcio. (ver anexo de registro de PQRS)								
LUGAR DE APLICACIÓN								
Comunidad del área de influencia directa (AID) de la obra de "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"								
CRONOGRAMA DE EJECUCION								
ACTIVIDAD	Atención a la comunidad en temas de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias							
EJECUCION (MESES)	10	11	12	13	14			
ACTIVIDAD	X	X	X					
RESPONSABLE DE EJECUCION				Profesional Social				
SEGUIMIENTO Y MONITOREO								
Indicador:				Descripción del indicador:				
Número de peticiones recibidas / número de peticiones atendidas * 100				Atención a PQRS				
Número de peticiones atendidas 5 / número de peticiones cerradas 5 * 100 = 100%				Cierre a reclamaciones recibidas				
Tipo de indicador:	Cuantitativo.							

Periodicidad de evaluación:	Mensual
Registro de cumplimiento:	Formatos de registro, recepción y seguimiento de PQRS, e Informes mensuales.

3.10.2. Proyecto de Información y Divulgación

2. Proyecto de Información y Divulgación							**PGS-6.2-19**
OBJETIVO DEL PROYECTO							
Brindar información clara, veraz, oportuna y suficiente a la población que cubre las comunidades del área de influencia directa, a las autoridades locales, gremios, organizaciones, administración municipal, Concejo Municipal, Juntas de Acción Comunal y líderes comunitarios, vinculados con el desarrollo del proyecto. Mantener informada a la comunidad, Administración municipal, autoridades, entidades, sector comercial y comunidad del área de influencia directa del proyecto.							
TIPO DE MEDIDA							
CONTROL	X	PREVENCION	X	MITIGACION	X	COMPENSACION	
IMPACTOS A MANEJAR							
• Compromisos con la comunidad. • Incremento temporal en los niveles de empleo.							
ACCIONES DESARROLLADAS							
Reuniones Informativas ordinarias y extraordinarias que requiera el desarrollo de la obra. Cuando el desarrollo de la obra lo requiera, se realizarán reuniones informativas de obra, para conocimiento de todos los actores sociales interesados en el proyecto del Consorcio Cauce, para la construcción de obras de mitigación de la amenaza por inundación para la rehabilitación y recuperación de la margen derecha del Río de Oro en el sector de Centro Abastos, Bucaramanga. **Acciones de divulgación.** Acorde a lo establecido, en el campamento de la obra se entregan a quien lo requiera, el volante informativo de la oficina de atención a la comunidad, para conocimiento de todos los interesados, igualmente, en zona aferente a la obra y por medios masivos de comunicación - correo electrónico y redes sociales – se entrega la información a lugar. (ver anexo de volante informativo)							
LUGAR DE APLICACIÓN							
Comunidad del área de influencia directa (AID) de la obra de "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"							
CRONOGRAMA DE EJECUCION							
ACTIVIDAD 1	Realizar las reuniones informativas de inicio, de avance, de finalización de la obra y las extraordinarias que se requieran						
ACTIVIDAD 2	Invitar a las comunidades y actores sociales de la construcción de la obra						
ACTIVIDAD 3	Distribución de comunicaciones (volantes, cartas, llamadas telefónicas, mensajes) para las invitaciones a las reuniones informativas						
EJECUCION (MESES)	10	11	12	13	14		

ACTIVIDAD 1					
ACTIVIDAD 2					
ACTIVIDAD 3	X	X	X		

RESPONSABLE DE EJECUCION	Profesional Social
SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
Indicador:	Descripción del indicador:
Número de reuniones informativas programadas / número de reuniones realizadas * 100	Reuniones informativas efectuadas
Número de actores sociales invitados a las reuniones informativas / número de volantes, comunicaciones, mensajes entregados a los actores sociales * 100	Invitación a las reuniones informativas
Número de actores sociales asistentes a las reuniones informativas / número de actores sociales invitados * 100	Actores sociales presentes en las reuniones informativas
Tipo de indicador:	Cuantitativo
Periodicidad de evaluación:	Mensual
Registro de cumplimiento:	Actas de reuniones, listados de asistencia, registro fotográfico y comunicaciones de convocatoria, entre otros documentos.

3.10.3. Proyecto para el manejo de la Infraestructura de predios y Servicios Públicos

3. Proyecto para el manejo de la Infraestructura de predios y Servicios Públicos	**PGS-6.3-20**

OBJETIVO DEL PROYECTO

Registrar el estado físico de las construcciones e infraestructuras físicas que lo requieran, previo al inicio de las actividades constructivas a desarrollar.
Cumplir los compromisos establecidos con las comunidades del área de influencia directa del proyecto.

TIPO DE MEDIDA

CONTROL	X	PREVENCION	X	MITIGACION	X	COMPENSACION	

IMPACTOS A MANEJAR

- Compromisos con la comunidad.
- Conocimiento previo de los inmuebles que puedan ser objeto de intervención en la construcción de la obra.

ACCIONES DESARROLLADAS

Levantamiento de actas de vecindad: Conforme la obra lo reclamó, se efectuó el acta de vecindad de inicio al acceso a la obra, desde el Barrio José Antonio Galán, con el presidente de la Junta de Acción Comunal del sector, conforme en el presente periodo inició el ingreso de volquetas. (ver anexo de registro del acta de vecindad)

Manejo de la infraestructura de predios y servicios públicos

Inherente al estado físico de las áreas de predios y servicios públicos, una vez finalizada la construcción a desarrollar, se entregan a conformidad del responsable del predio o infraestructura.

Levantamiento de actas de compromiso: el martes 16 de septiembre se realizó acta de compromiso con el Señor Alfredo Castro Reyes, conforme reunión realizada el viernes 9 de mayo de 2025, para entregar ocho viajes de material, como pago único por el retiro de especies vegetales de su propiedad ubicadas en ronda de río. (ver anexo de registro fotográfico y acta)

Manejo de la infraestructura de predios y servicios públicos.
Durante el presente periodo no se presentaron actividades inherentes a este ítem.

LUGAR DE APLICACIÓN	
Comunidad del área de influencia directa (AID) de la obra de "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"	
CRONOGRAMA DE EJECUCION	
ACTIVIDAD 1	Realizar visitas domiciliarias para informar la elaboración de las actas de vecindad
ACTIVIDAD 2	Entrega de volantes informativos de la elaboración de actas de vecindad
ACTIVIDAD 3	Elaboración de actas de vecindad (iniciales, de seguimiento y cierre)

EJECUCION (MESES)	10	11	12	13	14
ACTIVIDAD 1					
ACTIVIDAD 2					
ACTIVIDAD 3					

RESPONSABLE DE EJECUCION	Profesional Social

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
Indicador:	Descripción del indicador:
Número de informaciones sobre la elaboración de actas de vecindad de inicio en el AID de la obra / número de actas de vecindad realizadas * 100	Informar la elaboración de actas de vecindad
Número de volantes de elaboración de actas de vecindad entregados / número de actas de vecindad realizadas * 100	Entrega de información sobre la elaboración de actas de vecindad
Número de actas de vecindad realizadas / número de actas de vecindad cerradas * 100	Cierre de actas de vecindad elaboradas
Atención de PQRS relacionadas con daño a infraestructura = (# De quejas atendidas por daño a la infraestructura de predios / # de quejas por daño a infraestructura de predios presentadas) *100	Atención a PQRS, inherentes a afectaciones de predios
Tipo de indicador:	Cuantitativo
Periodicidad de evaluación:	Mensual
Registro de cumplimiento:	Actas de vecindad elaboradas, formatos de entrega de volantes, fichas socioeconómicas elaboradas e Informes mensuales.

3.10.4. Proyecto de recuperación del Derecho de vía (No aplica)

4. Proyecto de recuperación del Derecho de la vía	**PGS-6.4-21**
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Recuperar el derecho de vía para la ejecución de las obras. Evitar conflictos con las comunidades. Conforme la obra a desarrollar no requiere de estas acciones, para el progreso de estas tareas, este proyecto no aplica para la obra de "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"	

3.10.5. Proyecto de cultura vial y participación comunitaria

5. Proyecto de Cultura vial y participación comunitaria							**PGS-6.5-22**
OBJETIVO DEL PROYECTO							
Generar estrategias de apropiación del proyecto a través de procesos de educación y sensibilización con los trabajadores, comunidades educativas, población en general y líderes del AID.							
TIPO DE MEDIDA							
CONTROL		PREVENCION	X	MITIGACION	X	COMPENSACION	
IMPACTOS A MANEJAR							
• Conflictos con la comunidad. • Incremento temporal en los niveles de empleo.							
ACCIONES DESARROLLADAS							
Desarrollo de talleres pedagógicos de sostenibilidad El Contratista durante el desarrollo del proyecto, realiza formación mensual inherente a educación vial con los colaboradores de la obra, en temas varios para mejorar como usuarios de la vía. **Diseño, elaboración y distribución de material informativo** El miércoles 10 de septiembre, se realizaron tareas formativas en temas de información y orientación sobre movilidad en condiciones seguras con los trabajadores de la obra, acorde al ítem anterior. (ver anexo de registro fotográfico y de asistencia)							
LUGAR DE APLICACIÓN							
Comunidad del área de influencia directa (AID) de la obra de "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"							
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN							
ACTIVIDAD	Formación mensual en temas de seguridad vial						
EJECUCION (MESES)	10	11	12	13	14		
ACTIVIDAD	X	X	X				
RESPONSABLE DE EJECUCION			Profesional Social				
SEGUIMIENTO Y MONITOREO							
Indicador:			Descripción del indicador:				
Número de informaciones elaboradas 1 / número de informaciones entregadas 1 * 100 = 100%			Actividad formativa con los colaboradores del Consorcio				

Tipo de indicador:	Cuantitativo.
Periodicidad de evaluación:	Mensual
Registro de cumplimiento:	Formatos de registro de asistencia a reuniones y formaciones en temas viales e Informes mensuales.

3.10.6. Proyecto de Contratación de mano de obra

6. Proyecto de Contratación de mano de obra							**PGS-6.6-23**
OBJETIVO DEL PROYECTO							
Generar ingresos en los hogares de las comunidades del AID Evitar la migración de población foránea al AID, en tareas de vincularse al proyecto. Respaldar los compromisos generados con la comunidad para la construcción de la obra. Apoyar la mano de obra disponible conforme la información de la Agencia Colombiana para la Reincorporación y Normalización.							
TIPO DE MEDIDA							
CONTROL		PREVENCION	X	MITIGACION	X	COMPENSACION	
IMPACTOS A MANEJAR							
• Compromisos con la comunidad del AID, para la construcción de la obra. • Incremento temporal en los niveles de empleo. • Apoyar población disponible en la Agencia Colombiana para la Reincorporación y Normalización.							
ACCIONES DESARROLLADAS							
Considerando que el CONSORCIO CAUCE cuenta con una planta de personal permanente de profesionales, operadores y conductores, para el ingreso a las áreas de intervención del proyecto, se tendrá en cuenta la mano de obra no calificada existente en el Municipio de Bucaramanga, área de influencia directa de la obra, preferiblemente. El Contratista realiza la gestión a lugar para conocer la mano de obra disponible en la zona y por la Agencia Colombiana para la Reincorporación y Normalización, de Personas y Grupos Alzados en Armas, en el momento requerido y durante el desarrollo de la obra de construcción. Cuando no exista personal con el perfil requerido y disponible en el área de influencia directa de la obra, el Contratista vincula contractualmente el personal necesario para el desarrollo de la obra constructiva. El área social, cuenta con la información atinente al número de personas contratadas para el desarrollo de la obra, residentes en el área local del municipio de Bucaramanga, una vez inicien las obras constructivas. **Proyecto de Contratación Mano de Obra** La mano de obra contratada y que resida en el área de influencia del proyecto, es objeto de reporte en los informes mensuales a entregar, al igual que el personal que aspire a ser contratado para realizar labores en el proyecto, conforme la base de datos a manejar por el área social del Contratista, con personas mayores de edad, documento de identidad, procedencia y otros datos de interés del programa de generación de empleo. **Capacitación del personal vinculado** Todas las personas vinculadas para laborar en el proyecto reciben la inducción en temas inherentes al trabajo a desarrollar, alcance de la obra, duración, misión, visión; protocolo durante los trabajos, diversos eventos a presentarse, temas ambientales y de SST (Seguridad y salud en el trabajo) y demás información general, inherente a las relaciones con la comunidad aledañas y del AID de la obra, en aras de no generar falsas expectativas en torno al Proyecto; el miércoles 10 de septiembre, recibieron información en temas de oficina de atención a la comunidad y fortalecimiento del valor de tomar decisiones, para mejorar como personas, miembros de una familia, de una comunidad y como trabajadores del Consorcio. (ver anexo de registro fotográfico y de asistencia)							
LUGAR DE APLICACIÓN							

CONSORCIO	CONSORCIO CAUCE CONTRATO No. 210-15410-6 **PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL**	CDMB

Comunidad del área de influencia directa (AID) de la obra de "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"	
CRONOGRAMA DE EJECUCION	
ACTIVIDAD 1	Gestión con la Agencia Colombiana para la Reintegración y Normalización, respecto a la mano de obra no calificada disponible para laborar en el proyecto
ACTIVIDAD 2	Informar en la reunión de inicio la vinculación de mano de obra no calificada del AID del proyecto
ACTIVIDAD 3	Recepción de hojas de vida para la vinculación de mano de obra no calificada al proyecto
ACTIVIDAD 4	Inducción en diversos temas del área social al personal vinculado para trabajar en la obra
ACTIVIDAD 5	Coordinación con la bolsa de empleo de la Alcaldía de Bucaramanga y Junta de Acción Comunal local, para la vinculación de mano de obra no calificada.

EJECUCION (MESES)	10	11	12	13	14
ACTIVIDAD 1					
ACTIVIDAD 2					
ACTIVIDAD 3					
ACTIVIDAD 4	X	X	X		
ACTIVIDAD 5					

RESPONSABLE DE EJECUCION	Profesional social
SEGUIMIENTO Y MONITOREO	

Indicador:	Descripción del indicador:
# De personas contratadas como mano de obra no calificada que residen en área de influencia 21 / # total de personas registradas como mano de obra no calificada 25 * 100 = 84 %	Mano de obra local contratada para el proyecto
Registros afiliación de mano de obra 21 / registro en planillas de pago de seguridad social 21 * 100 = 100%	Pago seguridad social de trabajadores locales contratados

Tipo de indicador:	Cuantitativo
Periodicidad de evaluación:	Mensual
Registro de cumplimiento:	Formatos de registro de mano de obra local, laborando en la obra

3.10.7. Proyectos productivos (No aplica)

7. Proyectos productivos	PGS-6.7-24
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Apoyar a las comunidades organizadas en el desarrollo de proyectos productivos que contribuyan al mejoramiento del entorno y calidad de vida de la comunidad. Conforme la obra a desarrollar no requiere de estas acciones, ni se hallan asignados recursos para el progreso de estas tareas, este proyecto no aplica para la obra de "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"	

3.10.8. Proyecto protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural (no aplica)

8. Proyecto de Protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural	PGS-6.8-25
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Proteger el Patrimonio Arqueológico y Cultural de la Nación. Atender los compromisos con la comunidad del Área de Influencia Directa del proyecto. Conforme la obra a desarrollar no requiere de estas acciones, este proyecto no aplica para la obra "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"	

3.10.9. Proyecto de Gestión socio predial (no aplica)

9. Proyecto de Gestión socio predial	PGS-6.9-26
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Mantener o mejorar las condiciones de vida, de las unidades sociales que deben ser trasladadas por la ejecución de las obras. Conforme la obra a desarrollar no requiere de estas acciones, este proyecto no aplica para la obra de "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"	

ANEXOS

ANEXO No 1. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

	REGISTRO DE MANEJO DE RESIDUOS	Código:	SST-F-98
		Fecha:	27/07/2021
		Versión:	1

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	TIPO DE RESIDUO :
LUGAR: frente de obra Consorcio Cauce	ORDINARIO X RECICLAJE

FECHA .	LIQUIDO	SÓLIDO	PESO (KG)	DESCRIPCIÓN DISPOSICIÓN FINAL
5/09/2025		X	2,2	Los residuos sólidos generados y acopiados en el punto ecológico son entregados a la empresa de aseo Veolia, de acuerdo con las rutas de recolección de aseo municipal.
12/09/2025		X	1,8	
19/09/2025		X	2,0	
26/09/2025		X	2,4	
TOTAL			8,4	

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	TIPO DE RESIDUO :
LUGAR: frente de obra Consorcio Box Belen	ORDINARIO RECICLAJE X

FECHA	LIQUIDO	SÓLIDO	PESO (KG)	DESCRIPCIÓN DISPOSICIÓN FINAL
26/09/2025		X	4,7	Los residuos Reciclables generados en el periodo son acopiados temporalmente, hasta tener un volumen considerable para ser entregados a un gestor autorizado para realizar su aprovechamiento.
TOTAL			4,7	

Revisó: Lissette Ximena Niño

Cargo: Ingeniera Ambiental

Firma:

ANEXO No 2. REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACION [X] CHARLA [ ]

OBRA Obra de mitigación por inundación del río de oro

TEMA DE CAPACITACIÓN Normativa legal Ambiental

LUGAR: Frente de obra FECHA 11-09-2025

CAPACITADOR Naggibe Pinilla DURACIÓN 30 min.

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Hurley prada lopez	1098822351	Maquinista P.	Hurley prada lopez
2	Juan Roman	1098745891	Cpo	
3	Luis Alberto Cano	1082475667	Operador Polf.	
4	Uriel Alonso Rivera.	1.102.383610	Operador	Uriel Rivera.
5	Jolman Ramirez C.C	1101019831	Ay PH Fabricas	Jolman C V
6	Sarmiento steven caicedo	1233841906	Ayudante Perforacion	estiven caicedo
7	Luis Fernando Jimenez	91703462	AMA	Luis Fernando Ji
8	Calvin Duran DIEGO	1098506084	AY	DIEGO
9	Juan Carlos Luna	6133303	AY	
10	Omar SILVA	6484816	AY	
11	Luis Leal	91352138	Ayudante	Luis Leal
12	Edgar Garcia	91410404	Oficial II	Edgar
13	Jorge Valbuena	91790566	Oficial II	Jorge valbuena
14	Mario Cordero	91.245902	Oficial	
15	Antonio Rodriguez	1095797433	Oficial	
16	Jacob Ospina	91355754	Ayudante	
17	Luis Alberto Ibarra Rueda	100.5244491	AY	
18	Raul Mejia alvarez	1006572279	AY	
19	DUBAN ANDRES JAIMES GONZALEZ	1095791990	Ayudante	
20	Luigi GARCIA	69990692	AYUDANTE	Luigi
21	Jorge Peña	1098771884		Jorge Peña
22		1003250714	AY	
23	Luis G Margarita	1545177	AY	
24	Roberto Sepulveda	91342187	Ayuda	
25	Uriel quintero.	12502797	contra maestro	
26	ALVARO AVILA	13.741746	AY	
27	Manuel Bermudez Flores	91248488	Ayudante	
28	Gerardo Ruiz	1098236799	AY	Gerardo Ruiz
29	Jesus Alberto Perdomo	1037477914	Operador	Jesus Alberto P.
30	VICTOR TRUJILLO	91250524	AYUDANTE	VICTOR TRUJILLO

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

Naggibe Pinilla

FIRMA

Powered by CamScanner

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO ☐ CAPACITACION ☒ CHARLA ☐

OBRA Obra de mitigación por inundación del río de oro

TEMA DE CAPACITACIÓN Normativa legal Ambiental

LUGAR: Frente de obra FECHA 11-09-2023

CAPACITADOR Nagibo Emilio. DURACIÓN 30 min

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Robinson Rueda	97582404	conductor	Robinson Rueda
2	Freddy Gelvez	1094940472	operador	Freddy Gelvez
3	Jonder Mendoza	91746167	oficial	Jonder Mendoza
4	Luis Ramirez	91299421	N/	Luis Ramirez
5	MAURICIO ABERRADO	1063662221	OPERADOR	
6	Oscar Beltran	97357094	oficio	
7	Freddy Tarazona Gil	1121324008	Almacenista	
8	Geraldine Patiño R	1098884437	Aux SST	Geraldine P.
9	Cristian Maldonado	1005448779	ayudante	Cristian M.
10	Enderli Salazar	2065068	oficial	Enderli
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

Nagibo

FIRMA

Powered by CamScanner

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO ☐ CAPACITACION ☒ CHARLA ☐

OBRA Obra de mitigación por inundación del río de oro.

TEMA DE CAPACITACIÓN Prevención de la Contaminación de cuerpos de Agua y Redes

LUGAR: Frente de Obra FECHA 18/09/23 Desarrollo Sostenible

CAPACITADOR Nagyibe Pmilly DURACIÓN 30 min.

N°	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Luis Alberto Cano	1082435667	operador Perf	
2	Uriel Alonso Rivera.	1.102.383.610	Operador	Uriel Rivera.
3	Harley prada lopez	1082822751	AYUDANTE P.	Harley prada lopez
4	Juan Roman	1098745891	operador	
5	Jairinson steven caicedo	1232891906	ayudante operador	estiven caicedo
6	TORRES TECNICOS C.V	1101019 914	AY PERFORACION	TORRES C.V
7	Luis Acosta R	91290926	AY	Luis A R
8	Isaias del Toro	7174319	OFICIAL	Isaias del Toro
9	VICTOR TRUJILLO	91250520	AYUDANTE	VICTOR TRUJILLO
10	Juan de Dios Soto	91079905	MAESTRO	Juan de Dios
11	Robinson Rueda Espinel	97594109	coordinador	Robinson rueda
12	Wilfredy Valencia	1005149583	oficial	
13	Hanuibar Flores	91248408	Ayudante	
14	ALVARO ANAYA	13.241.244	AX	
15	uriel QUINTERO	1150739X	contra escuadra	
16	Rubedo Sanabria	91347357	Ayu.	
17	Luis C Melgarejo	15457774	AY - F	
18	Jhonny Alexander Ardila	1003205314	AY	
19	Deivy Mateo elorza	1006572794	AY	
20	Dorian Andres Jaimes G	1095791990	Ayudante	
21	Jaime Olmos	9635529	Ayudante	
22	Luis Alberto Lora Ruiz	100.514.991	AY	
23	Antonio andres zamudio	80.759.797	OF	
24	LUIS SARCIA	6890697	AYUDANTE	Luis
25	Jorge Peña	1018371811		
26	Jorge Valbuena	91.540.166	OFICIAL	Jorge Valbuena
27	Mario Cuevas	91.245.998	Oficial	
28	Edgar Bolivar	5641404	OFICINA	
29	Francisco Becerra	1005522221	OPERADOR.	
30	Duvan Quiroga R	97187094	Operador	

OBSERVACIONES:

—

CAPACITADOR

Nagyibe

FIRMA

Powered by CamScanner

Hoja 2.

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO ☐ CAPACITACION ☒ CHARLA ☐

OBRA Obra de mitigación por inundación del río de oro

TEMA DE CAPACITACIÓN Prevención de la contaminación de cuerpos de Agua y redes de servicios públicos

LUGAR: Frente de obra FECHA 1/03/23 HORA 7:25

CAPACITADOR Nicolás Pinilla DURACIÓN 30 min.

No	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Freddi Cote	1049909151	ganado	Freddi Cote
2	Juan Carlos Luis	6133103	AY	Juan Luis
3	Edwin Duran DIEGO	1085606084	AY	DIEGO
4	Aman SILVA	64648616	AY	
5	Luis Leal S.	91352138	Ayudante	Luis Leal
6	MAURICIO A BECERRA O	1063562221	OPERADOR	
7	Freddy Tunja G.	91242108	Almacén	
8	Geraldine Patiño	1098939439	Aux SST	Geraldine
9	Enderlis salazar	26560468	oficial	Enderlis
10	Cristian. mallonado	1005448749	oficial	Cristian M
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR	
NAGGER PT	
FIRMA	

Powered by CamScanner

ANEXO No 3. DOCUMENTOS DE VOLQUETAS

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10017158711

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
TTW843	FOTON	BJ3122DEPFA-G2	2018

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
3.760	AZUL	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	6060

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
89951806	N	LVBDHPES4JN005111

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
LVBDHPES4JN005111	N	LVBDHPES4JN005111	N

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S — NIT 900845507

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 141

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT	PUERTA
352017000435854	I	18/10/2017	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO	FECHA VENCIMIENTO
02/11/2018	02/11/2018	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

DIR TTOYTTE FLORIDABLANCA



LT03002525739

MATRICULA: MAURICIO TAPIAS

SOAT

Póliza de seguro obligatorio de accidentes causados a las personas en accidentes de tránsito

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	HASTA
2024 10 22	2024 11 01	2025 10 31

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/CC/TONS	MODELO
9310009606002	TTW843	VOLQUETA	PÚBLICO	3760	2018

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	FOTON	13 - PLATON
	LÍNEA VEHÍCULO: BJ3122DEPFA-G2	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
89951806	LVBDHPES4JN005111	LVBDHPES4JN005111	6.05

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S	3102151720	NT	900849507	BUCARAMANGA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLASE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
45268	9310	45268	9310009606002	BOGOTA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FONYGA	TASA RUNT
320	$919,000.00	$477,800.00	$2,100.00

TOTAL A PAGAR
$1,398,900.00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] / 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 108, 116, 120, 140, 150, 152, 158, 172, 173, 175, 178, 180, 810, 909, 910.
Decreto 2644 de 1994.
[2]Para las demás tarifas no citadas en [1].

El SOAT digital, además de brindarle una **fácil portabilidad y usabilidad**, también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general para todas las personas.



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Recuerde portar siempre su SOAT. las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Este atento al momento en que debe renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la retención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:
- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a abogados.

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado o les aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 177552748

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA REVITEC LA ROSITA

NIT: 901229714

No. de Certificado de Acreditación: 19-OIN-044-001

Fecha de expedición: 2024/11/30

Fecha de vencimiento: 2025/11/30

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	TTW843	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	FOTON	**MODELO:**	2018
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	3760	**NRO. MOTOR:**	89951806
NRO. CHASIS:	LVBDHPES4JN005111	**VIN:**	LVBDHPES4JN005111
LÍNEA:	BJ3122DEPFA-G2		
COLOR:	AZUL		

NOMBRE PROPIETARIO: MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S

FIRMA DEL RESPONSABLE

RENSON RODRIGUEZ VILLAMIZAR



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10011843214

PLACA: NFD116	MARCA: FOTON	LÍNEA: BJ3122D8PFA-G3	MODELO: 2017
CILINDRADA CC: 3.760	COLOR: AZUL		SERVICIO: PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO: VOLQUETA	TIPO CARROCERÍA: PLATON	COMBUSTIBLE: DIESEL	CAPACIDAD PASAJEROS: 6060
NÚMERO DE MOTOR: 01806343			
NÚMERO DE SERIE: LVBDMPE53HN300060			

PROPIETARIO(S), DOMICILIO Y CIUDAD: MAQUINCRAS DE COLOMBIA S.A.S

IDENTIFICACIÓN: NIT



141

10/05/2016 2

23/05/2016 31/05/2016

ESTELA MICHAEL TICHTTE GIRON

LTD2003929786

SOAT

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 24:00 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA
2025	05	26	2025	05	01	2026	05	31

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/CC	MODELO
9310013958602	WFD114	VOLQUETA	PÚBLICO	3760	2017

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	FOTON	13 - PLATON

LÍNEA VEHÍCULO
BJ3122DEPFA-G2

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
89816243	LVBDHPES3HN005000	LVBDHPES3HN005000	6.05

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S	3102151720	NT	900849507	BUCARAMANGA

CÓDIGO DE AGENCIAMIENTO	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
45268	9310	45268	9310013958602	BOGOTA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FONYGA	TASA RUNT
320	$839,200.00	$436,300.00	$2,100.00

TOTAL A PAGAR

$1,277,600.00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] / 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1] Para las siguientes tarifas: 320, 330, 350, 360, 370, 380, 390, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600, 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690, 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 790, 800, 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890, 900, 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990, 1000, 1010, 1020, 1030, 1040, 1050, 1060, 1070, 1080, 1090, 1100, 1110, 1120, 1130, 1140, 1150, 1160, 1170, 1180, 1190, 1200, 1210, 1220, 1230, 1240, 1250, 1260, 1270, 1280, 1290, 1300, 1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 1370, 1380, 1390, 1400, 1410, 1420, 1430, 1440, 1450, 1460, 1470, 1480, 1490, 1500, 1510, 1520, 1530, 1540, 1550, 1560, 1570, 1580, 1590, 1600, 1610, 1620, 1630, 1640, 1650, 1660, 1670, 1680, 1690, 1700, 1710, 1720, 1730, 1740, 1750, 1760, 1770, 1780, 1790, 1800, 1810, 1820, 1830, 1840, 1850, 1860, 1870, 1880, 1890, 1900, 1910, 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, 2020, 2030, 2040, 2050, 2060, 2070, 2080, 2090, 2100, 2110, 2120, 2130, 2140, 2150, 2160, 2170, 2180, 2190, 2200, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270, 2280, 2290, 2300, 2310, 2320, 2330, 2340, 2350, 2360, 2370, 2380, 2390, 2400, 2410, 2420, 2430, 2440, 2450, 2460, 2470, 2480, 2490, 2500, 2510, 2520, 2530, 2540, 2550, 2560, 2570, 2580, 2590, 2600, 2610, 2620, 2630, 2640, 2650, 2660, 2670, 2680, 2690, 2700, 2710, 2720, 2730, 2740, 2750, 2760, 2770, 2780, 2790, 2800, 2810, 2820, 2830, 2840, 2850, 2860, 2870, 2880, 2890, 2900, 2910, 2920, 2930, 2940, 2950, 2960, 2970, 2980, 2990, 3000, 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3060, 3070, 3080, 3090, 3100, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3160, 3170, 3180, 3190, 3200, 3210, 3220, 3230, 3240, 3250, 3260, 3270, 3280, 3290, 3300, 3310, 3320, 3330, 3340, 3350, 3360, 3370, 3380, 3390, 3400, 3410, 3420, 3430, 3440, 3450, 3460, 3470, 3480, 3490, 3500, 3510, 3520, 3530, 3540, 3550, 3560, 3570, 3580, 3590, 3600, 3610, 3620, 3630, 3640, 3650, 3660, 3670, 3680, 3690, 3700, 3710, 3720, 3730, 3740, 3750, 3760, 3770, 3780, 3790, 3800, 3810, 3820, 3830, 3840, 3850, 3860, 3870, 3880, 3890, 3900, 3910, 3920, 3930, 3940, 3950, 3960, 3970, 3980, 3990, 4000, 4010, 4020, 4030, 4040, 4050, 4060, 4070, 4080, 4090, 4100, 4110, 4120, 4130, 4140, 4150, 4160, 4170, 4180, 4190, 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250, 4260, 4270, 4280, 4290, 4300, 4310, 4320, 4330, 4340, 4350, 4360, 4370, 4380, 4390, 4400, 4410, 4420, 4430, 4440, 4450, 4460, 4470, 4480, 4490, 4500, 4510, 4520, 4530, 4540, 4550, 4560, 4570, 4580, 4590, 4600, 4610, 4620, 4630, 4640, 4650, 4660, 4670, 4680, 4690, 4700, 4710, 4720, 4730, 4740, 4750, 4760, 4770, 4780, 4790, 4800, 4810, 4820, 4830, 4840, 4850, 4860, 4870, 4880, 4890, 4900, 4910, 4920, 4930, 4940, 4950, 4960, 4970, 4980, 4990, 5000, 5010, 5020, 5030, 5040, 5050, 5060, 5070, 5080, 5090, 5100, 5110, 5120, 5130, 5140, 5150, 5160, 5170, 5180, 5190, 5200, 5210, 5220, 5230, 5240, 5250, 5260, 5270, 5280, 5290, 5300, 5310, 5320, 5330, 5340, 5350, 5360, 5370, 5380, 5390, 5400, 5410, 5420, 5430, 5440, 5450, 5460, 5470, 5480, 5490, 5500, 5510, 5520, 5530, 5540, 5550, 5560, 5570, 5580, 5590, 5600, 5610, 5620, 5630, 5640, 5650, 5660, 5670, 5680, 5690, 5700, 5710, 5720, 5730, 5740, 5750, 5760, 5770, 5780, 5790, 5800, 5810, 5820, 5830, 5840, 5850, 5860, 5870, 5880, 5890, 5900, 5910, 5920, 5930, 5940, 5950, 5960, 5970, 5980, 5990, 6000, 6010, 6020, 6030, 6040, 6050, 6060, 6070, 6080, 6090, 6100, 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6200, 6210, 6220, 6230, 6240, 6250, 6260, 6270, 6280, 6290, 6300, 6310, 6320, 6330, 6340, 6350, 6360, 6370, 6380, 6390, 6400, 6410, 6420, 6430, 6440, 6450, 6460, 6470, 6480, 6490, 6500, 6510, 6520, 6530, 6540, 6550, 6560, 6570, 6580, 6590, 6600, 6610, 6620, 6630, 6640, 6650, 6660, 6670, 6680, 6690, 6700, 6710, 6720, 6730, 6740, 6750, 6760, 6770, 6780, 6790, 6800, 6810, 6820, 6830, 6840, 6850, 6860, 6870, 6880, 6890, 6900, 6910, 6920, 6930, 6940, 6950, 6960, 6970, 6980, 6990, 7000, 7010, 7020, 7030, 7040, 7050, 7060, 7070, 7080, 7090, 7100, 7110, 7120, 7130, 7140, 7150, 7160, 7170, 7180, 7190, 7200, 7210, 7220, 7230, 7240, 7250, 7260, 7270, 7280, 7290, 7300, 7310, 7320, 7330, 7340, 7350, 7360, 7370, 7380, 7390, 7400, 7410, 7420, 7430, 7440, 7450, 7460, 7470, 7480, 7490, 7500, 7510, 7520, 7530, 7540, 7550, 7560, 7570, 7580, 7590, 7600, 7610, 7620, 7630, 7640, 7650, 7660, 7670, 7680, 7690, 7700, 7710, 7720, 7730, 7740, 7750, 7760, 7770, 7780, 7790, 7800, 7810, 7820, 7830, 7840, 7850, 7860, 7870, 7880, 7890, 7900, 7910, 7920, 7930, 7940, 7950, 7960, 7970, 7980, 7990, 8000, 8010, 8020, 8030, 8040, 8050, 8060, 8070, 8080, 8090, 8100, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8170, 8180, 8190, 8200, 8210, 8220, 8230, 8240, 8250, 8260, 8270, 8280, 8290, 8300, 8310, 8320, 8330, 8340, 8350, 8360, 8370, 8380, 8390, 8400, 8410, 8420, 8430, 8440, 8450, 8460, 8470, 8480, 8490, 8500, 8510, 8520, 8530, 8540, 8550, 8560, 8570, 8580, 8590, 8600, 8610, 8620, 8630, 8640, 8650, 8660, 8670, 8680, 8690, 8700, 8710, 8720, 8730, 8740, 8750, 8760, 8770, 8780, 8790, 8800, 8810, 8820, 8830, 8840, 8850, 8860, 8870, 8880, 8890, 8900, 8910, 8920, 8930, 8940, 8950, 8960, 8970, 8980, 8990, 9000, 9010, 9020, 9030, 9040, 9050, 9060, 9070, 9080, 9090, 9100, 9110, 9120, 9130, 9140, 9150, 9160, 9170, 9180, 9190, 9200, 9210, 9220, 9230, 9240, 9250, 9260, 9270, 9280, 9290, 9300, 9310, 9320, 9330, 9340, 9350, 9360, 9370, 9380, 9390, 9400, 9410, 9420, 9430, 9440, 9450, 9460, 9470, 9480, 9490, 9500, 9510, 9520, 9530, 9540, 9550, 9560, 9570, 9580, 9590, 9600, 9610, 9620, 9630, 9640, 9650, 9660, 9670, 9680, 9690, 9700, 9710, 9720, 9730, 9740, 9750, 9760, 9770, 9780, 9790, 9800, 9810, 9820, 9830, 9840, 9850, 9860, 9870, 9880, 9890, 9900, 9910, 9920, 9930, 9940, 9950, 9960, 9970, 9980, 9990, 10000.
Decreto 2048 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

El SOAT digital, además de brindarle una fácil portabilidad y usabilidad, también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general para todas las personas.



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde valide que su póliza esté registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tenga SOAT vigente acarrea multas económicas, la retención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el asumirá por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:
- Si alguien resulta lesión, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 205 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fonyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a abogados.

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, suministre y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos, y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales recopilados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 183883996

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA SUPERCAR LA CENTRAL

NIT: 901171195

No. de Certificado de Acreditación: 20-OIN-011

Fecha de expedición: 2025/09/12

Fecha de vencimiento: 2026/09/12

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	WFD114	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	FOTON	**MODELO:**	2017
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	3760	**NRO. MOTOR:**	89806243
NRO. CHASIS:	LVBDHPES3HN005000	**VIN:**	LVBDHPES3HN005000
LÍNEA:	BJ3122DEPFA-G2		
COLOR:	AZUL		

NOMBRE PROPIETARIO: MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S

FIRMA DEL RESPONSABLE

SAUL BALLESTEROS BALLESTEROS

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10024978403

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
XMD821	HINO	FG1JGUE	2009

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
7.961	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	10360

NÚMERO DE MOTOR
J08CTT37855

RDS: N

VIN: 0000

NÚMERO DE SERIE
******

REG: N

NÚMERO DE CHASIS
9F3FG1JGU9XX10270

REG: N

PROPIETARIO, APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
INVERNOTA S.A.S.

IDENTIFICACIÓN
NIT 901178954

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
03209090108521

VE: I

FECHA IMPORT.: 11/02/2009

PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******



FECHA MATRÍCULA
31/07/2009

FECHA EXP. LIC. TTO.
05/01/2022

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
DIR TTOYTTE BUCARAMANGA

LT01008592063

SOAT

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

FECHA DE EXPEDICIÓN: 2024 11 14

VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL 2024 11 18

HASTA LAS 23:59 HORAS DEL 2025 11 17

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/CC/KG	MODELO
1530102642103	XMD821	VOLQUETA	PÚBLICO	7961	2009

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	HINO	13
	LÍNEA VEHÍCULO: FG1JGUE	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
J08CTT37855	9F3FG1JGU9XX10270	0000	10.36

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
INVERNOTA S.A.S	3102151720	NT	901178054	BUCARAMANGA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL ASEGURADORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
45268	9310	45268	1530102642103	BOGOTA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FONYGA	TASA RUNT
320	$919,000.00	$477,800.00	$2,100.00

TOTAL A PAGAR: $1,398,900.00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA

	VALOR	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] / 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 130, 150, 160, 170, 210, 212, 215, 222, 230, 232, 240, 242, 250, 252, 260, 262, 270, 272, 280, 282, 290, 292, 310, 312, 315, 322, 330, 332, 340, 342, 350, 352, 360, 362, 370, 372, 380, 382, 390, 392, 410, 412, 415, 422, 430, 432, 440, 442, 450, 452, 460, 462, 470, 472, 480, 482, 490, 492, 510, 512, 515, 522, 530, 532, 540, 542, 550, 552, 560, 562, 570, 572, 580, 582, 590, 592, 610, 612, 615, 622, 630, 632, 640, 642, 650, 652, 660, 662, 670, 672, 680, 682, 690, 692, 710, 712, 715, 722, 730, 732, 740, 742, 750, 752, 760, 762, 770, 772, 780, 782, 790, 792, 810, 812, 815, 822, 830, 832, 840, 842, 850, 852, 860, 862, 870, 872, 880, 882, 890, 892, 910, 912, 915, 922, 930, 932, 940, 942, 950, 952, 960, 962, 970, 972, 980, 982, 990, 992 Decreto 2044 de 2023.

[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

El SOAT digital, además de brindarle una Red portabilidad y usabilidad, también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general para todas las personas.



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza esta registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que debe renovar la póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 185 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, para en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 179940415

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA SUPERCAR LA CENTRAL

NIT: 901171195

No. de Certificado de Acreditación: 20-OIN-011

Fecha de expedición: 2025/03/03

Fecha de vencimiento: 2026/03/03

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	XMD821	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	HINO	**MODELO:**	2009
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	7961	**NRO. MOTOR:**	J08CTT37855
NRO. CHASIS:	9F3FG1JGU9XX10270	**VIN:**	0000
LÍNEA:	FG1JGUE		
COLOR:	BLANCO		

NOMBRE PROPIETARIO: INVERNOTA S.A.S

FIRMA DEL RESPONSABLE

SAUL BALLESTEROS BALLESTEROS

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10023905709

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
GQV575	FOTON	BJ3122DFPEA-01	2022

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
3.760	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	5140

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
76916246	N	LVBDFPEA3NN005099

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
LVBDFPEA3NN005099	N	LVBDFPEA3NN005099	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

SANABRIA HERNANDEZ DIANA CAROLINA — C.C. 63528529

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

CILINDRAJE: ****** POTENCIA HP: 141

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 352021000276550

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******

LIC | FECHA IMPORT. | PUERTAS

I | 30/07/2021 | 2



FECHA MATRÍCULA: 08/09/2021

FECHA EXP. LIC. TTO.: 08/09/2021

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA MCPAL TTDYTTE GIRON

LT02006677383

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			HASTA		
AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA
2025	8	21	2025	9	8	2026	9	7

ASEGURADORA

seguros mundial®

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
92605798 - 613027830	GQV575	CARGA O MIXTOS	PUBLICO	3760	2022

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	FOTON	PLATON
LÍNEA VEHÍCULO	BJ3122DFPEA01	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
76916246	LVBDFPEA3NN005099	LVBDFPEA3NN005099	5,14

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	LUGAR DE RESIDENCIA TOMADOR
DIANA SANABRIA HERNANDEZ	3188508329	CC	63528529	GIRON

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLASE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	LUGAR EXPEDICIÓN
1317	14	13153	92605798	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FONDO VÍAS	TASA RUNT
32	$ 839.200	$ 436.300	$ 2.400

TOTAL A PAGAR

$ 1.277.900

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VÍCTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[2] 701,68[3]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	8,77[1]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180[4]	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750[5]	



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?

Seguro Ter-cero



Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.

Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: www.seguroterceros.com

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.

•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.

•Evite asistir al momento en que deba renovar su póliza ya que SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.

•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.

•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.

•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el hospital debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.

•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

•Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT,

la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales, la cual puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/proteccion-de-datos/

Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y los mecanismos que tiene para ejercerlos. Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

Topes de cobertura gastos médicos

[1] El transporte y movilización de las víctimas a los establecimientos hospitalarios o clínicos se debe hacer preferiblemente en ambulancias o vehículos adecuadamente dotados para este tipo de servicio, garantizando la atención oportuna y efectiva de la víctima.

[2] Para las tarifas 100, 110, 120, 140, 156, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2497 de 2022.

[3] Para las demás tarifas no incluidas en el Decreto 2497 de 2022.

[4] Según numeral 1 del Art. 2.6.1.4.2.6 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.

[5] Según numeral 1 del Art. 2.6.1.4.2.11 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.08.21 18:12:49 -05:00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 183851576

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA SUPERCAR LA CENTRAL

NIT: 901171195

No. de Certificado de Acreditación: 20-OIN-011

Fecha de expedición: 2025/09/11

Fecha de vencimiento: 2026/09/11

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	GQV575	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	FOTON	**MODELO:**	2022
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	3760	**NRO. MOTOR:**	76916246
NRO. CHASIS:	LVBDFPEA3NN005099	**VIN:**	LVBDFPEA3NN005099
LÍNEA:	BJ3122DFPEA-01		
COLOR:	BLANCO		

NOMBRE PROPIETARIO: DIANA C. SANABRIA H.

FIRMA DEL RESPONSABLE

SAUL BALLESTEROS BALLESTEROS

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10030197028

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
BAK481	CHEVROLET	C 70 189	1989

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
6.200	AZUL CIELO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	7000

NÚMERO DE MOTOR
468TM2U426144

REG N

VIN ******

NÚMERO DE SERIE
CM910423

REG N

NÚMERO DE CHASIS
CM910423

REG N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
MEDINA ACERO NEYLA LIZETH Y OTRO(S)

IDENTIFICACIÓN
C.C. 1098698539

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE ******

POTENCIA HP 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
045185

ME I

FECHA IMPORT 14/09/1989

PUERTAS 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA
13/10/1989

FECHA EXP. LIC. TTO.
06/10/2023

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTOYMOV PIEDECUESTA/SANTANDER



LT03006356710

SOAT

PREVISORA SEGUROS

2025-06-09	2025-06-10	2026-06-09

33380058851430000	BAK481	CARGA O MIXTO	PARTICULAR	6200	1989

3	CHEVROLET	PLATON
	C 70 180	

468TM2UA26144	CM910423		7.00

MEDINA ACERO, NEYLA LIZETH	3209021809	CC	1080686539	GIRON

AT1324	33	14135	0	DUITAMA

320	$ 836200	$ 436300	$ 2100

$ 1277600

263,13[1]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
701,68[2]	
8,77	
180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2044 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 178767953

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA SUPERCAR LA CENTRAL

NIT: 901171195

No. de Certificado de Acreditación: 20-OIN-011

Fecha de expedición: 2025/01/15

Fecha de vencimiento: 2026/01/15

DATOS VEHÍCULO

PLACA: BAK481

CLASE: VOLQUETA

MARCA: CHEVROLET

MODELO: 1989

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 6200

NRO. MOTOR: 468TM2U426144

NRO. CHASIS: CM910423

VIN:

LÍNEA: C 70 189

COLOR: AZUL CIELO

NOMBRE PROPIETARIO: NEYLA L. MEDINA A. y otro(s)

FIRMA DEL RESPONSABLE

SAUL BALLESTEROS BALLESTEROS

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10032411673

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
TPJ349	FORD	F 600	1968

CILINDRADA	COLOR	SERVICIO
2.500	ROJO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	6000

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
52V313127	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	861DED41674	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
PACHECO ZAPARDIEL GLADYS MARIA Y OTRO(S)	C.C. 49695343

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ***-**

POTENCIA HP: 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 13583

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******

VE: I

FECHA IMPORT: C /07/1968

PUERTAS: 2



FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO	FECHA VENCIMIENTO
08/09/1968	02/08/2024	*** **

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEYTTO MCPAL AGUSTIN CODAZZI

LT07002186213

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No 180339220

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado:	CDA SUPERCAR LA CENTRAL		
NIT:	901171195	No. de Certificado de Acreditación:	20-CRN-011
Fecha de expedición:	2025/03/20	Fecha de vencimiento:	2026/03/20

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	TPJ349	CLASE:	VOLQUETA
MARCA:	FORD	MODELO:	1968
SERVICIO:	Particular	COMBUSTIBLE:	DIESEL
CILINDRAJE:	2500	NRO. MOTOR:	52V313127
NRO. CHASIS:	861DED41674	VIN:	
LÍNEA:	F 600		
COLOR:	ROJO		

NOMBRE PROPIETARIO: YESSICA T. ORTEGA B. y otro(s)

FIRMA DEL RESPONSABLE
SAUL BALLESTEROS BALLESTEROS

CDA
SUPERCAR LA CENTRAL
3182539342 - 3182539511
BARRIO A LA CENTRAL DE ABASTOS
BUCARAMANGA

Concesionario RUNT 2.0 SAS / Nit 901081827 8 / Colombia Línea de atención nacional 01 8000 930060 / www.runt.gov.co

SOAT

VIGENCIA DESDE			HASTA		
2025	01	14	2025	01	15

BOLÍVAR

No. DE POLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/CC/KG	MODELO
8001136189501	TPJ349	VOLQUETA	PARTICULAR	2500	1988

PASAJEROS	MARCA	CARROCERIA
2	FORD	13 - PLATON

LINEA VEHICULO: F600

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON
S2V313127	B61DED41674	B61DED41674	6

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELEFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
GLADYS MARIA PACHECO ZAPARDIEL	3156351707	CC	49695343	CODAZZI

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLASE PRODUCTOR	No. PODERDANTE	CIUDAD EXPEDICIÓN
44681	8901	44681	8001136189501	BOGOTA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FONDO	VALOR IVA
320	$839,200.00	$436,300.00	$2,100.00

TOTAL A PAGAR: $1,277,600.00

FIRMA AUTORIZADA

COBERTURAS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRASPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

Para los siguientes cultivos: [illegible]
Decreto 2544 de 2015.
Para los demás cultivos en cifradas en UVT.

El SOAT digital, [illegible] para todas las personas.



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- [illegible]
- Recuerde verificar que la placa esté registrada en el RUNT.
- [illegible]
- Recuerde que el SOAT no cubre daños a terceros en accidentes de tránsito, la atención de las víctimas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito se excluye con todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, [illegible] por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente aunque aquí tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 194 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, diríjase ante la aseguradora o al hospital a donde llevaron a la víctima para iniciar el proceso de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no es requisito acudir a abogado.

Texto habeas data

[illegible]

ANEXO No 4. MANTENIMIENTOS UNIDAD SANITARIA

RETCOR

EMPRESA COLOMBIANA RECOLECTORA Y TRANSPORTADORA DE RESIDUOS S.A.S. – RETCOR S.A.S.

CERTIFICA:

Que, desde el 01 de septiembre del 2025 al 15 de septiembre del 2025, se realizó la recolección y transporte de 40 galones de residuos generados por la limpieza de dos (2) unidades de baños portátiles, dicho servicio fue prestado realizando dos visitas de limpieza a la semana, servicio que se prestó el servicio al CONSORCIO CAUCE, ubicada en el centro industrial y logístico san Jorge bodega 16 en el municipio de Girón, para la obra localizada cerca a Centro abasto, municipio de Girón. Se realizó la disposición final en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR RIO FRIO del municipio de Floridablanca, a través del vínculo comercial que nuestra empresa tiene con EMPAS S.A. E.S.P, empresa aliada encargada del tratamiento de los residuos recolectados

Se expide la presente certificación en Bucaramanga, Santander a solicitud del interesado, a los nueve (09) días del mes de octubre del 2025.

ANDRES FELIPE ANAYA LOPEZ
Representante legal
RETCOR S.A.S.

PROYECTO: N.J.I.

REVISO: T.F.V.C

APROBO: A.F.A.L

RETCOR

EMPRESA COLOMBIANA RECOLECTORA Y TRANSPORTADORA DE RESIDUOS S.A.S. – RETCOR S.A.S.

CERTIFICA:

Que, desde el 01 de septiembre del 2025 al 15 de septiembre del 2025, se realizó la recolección y transporte de 20 galones de residuos generados por la limpieza de una (1) unidad de baño portátil, dicho servicio fue prestado realizando dos visitas de limpieza a la semana, servicio que se prestó el servicio al CONSORCIO CAUCE, ubicada en el centro industrial y logístico san Jorge bodega 16 en el municipio de Girón, para la obra localizada en el barrio Galán, municipio de Girón. Se realizó la disposición final en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR RIO FRIO del municipio de Floridablanca, a través del vinculo comercial que nuestra empresa tiene con EMPAS S.A. E.S.P, empresa aliada encargada del tratamiento de los residuos recolectados

Se expide la presente certificación en Bucaramanga, Santander a solicitud del interesado, a los nueve (09) días del mes de octubre del 2025.

ANDRES FELIPE ANAYA LOPEZ
Representante legal
RETCOR S.A.S.

PROYECTO: N.J.J.

REVISO: T.F.V.C

APROBO: A.F.A.L

Por medio del presente documento **MAS SOLUCIONES INTEGRALES DE COLOMBIA SAS,** representada por **MONICA ALEXANDRA SERRANO RUEDA,** identificada con **NIT 901.380.775-7,** se permite certificar que se ha prestado servicio de recolección de aguas residuales provenientes de tres (3) Baterías Sanitarias Portátiles de nuestra propiedad al servicio de la empresa **CONSORCIO CAUCE,** con **NIT 901.855.581-5,** ubicadas en Centro Abastos – Chimita, del municipio de Bucaramanga del departamento de Santander, en las fechas y cantidades relacionadas a continuación:

FECHAS	USP	GALONES
19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	3 USP	24 galones
23 DE SEPTIEMBRE DE 2025	3 USP	24 galones
26 DE SEPTIEMBRE DE 2025	3 USP	24 galones
30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	3 USP	24 galones

Y que estos han sido vertidos y tratados en la empresa **SOLUXIONAR S.A.S,** identificada con NIT 900.607.351-1. Con permiso de vertimiento de aguas residuales otorgado por la CAS, según resolución DGL N° 00000101 del 3 de febrero del 2014.

Expedida en Girón, a los cinco (05) días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco (2025) a solicitud del interesado.

Arq. MÓNICA A. SERRANO RUEDA
Gerente

ANEXO No 5. GESTIÓN SOCIAL

ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO



Valla informativa de la obra en proceso constructivo en la margen derecha del Río de Oro, sector Centro Abastos de Bucaramanga



Volante informativo de la oficina para la atención a la comunidad, ubicado en el campamento de la obra



Actividad formativa con los trabajadores del Consorcio Cauce, en temas varios de oficina de atención a la comunidad, seguridad vial y fortalecimiento de valores



Capacitación mensual con los colaboradores de la obra constructiva de Centro Abastos en diferentes temas de interés empresarial



Acta de compromiso realizada con el Señor Alfredo Castro Reyes, respecto a entrega de ocho viajes de material contemplados en acta de reunión del 9 de mayo de 2025

ANEXO 2. VOLANTE INFORMATIVO DE INFORMACIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Volante: 01

INFORMACIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

La Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y el Consorcio Cauce

Informa a los actores sociales, líderes, Alcaldía Municipal, Personería Municipal, sector comercial, financiero, comunidad y residentes del área de influencia directa de la obra de "**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)" DEL MUNICIPIO DE GIRÓN**, respecto a la oficina de atención a la comunidad, lo siguiente:

Dirección: Campamento de Obra en la Central de Abastos de Bucaramanga

Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12 m.

Número telefónico de contacto: 6076189848

En este correo electrónico, dirección y número telefónico, se atienden las peticiones, quejas, reclamos y/o sugerencias respecto a la obra constructiva del Consorcio Cauce.

MAYOR INFORMACIÓN

Contratista: CONSORCIO CAUCE

Profesional social: Tel: 6076189848 - 3115557726

Correo electrónico: consorciocauce@gmail.com

ANEXO 3. REGISTRO DE PQRS PRESENTADAS A LA FECHA DEL INFORME

REGISTRO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES PQRS

F-111

CONSORCIO CAUCE

Contrato No. 15410-06 - "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"

PROGRAMA DE GESTION SOCIAL

PROYECTO DE ATENCION A LA COMUNIDAD

REGISTRO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES

FECHA			RADICADO DE INGRESO	TIPO DE SOLICITUD				NOMBRE DEL SOLICITANTE	IDENTIFICACIÓN	MUNICIPIO	ASUNTO	MEDIO DE RECEPCIÓN					LUGAR ASIGNACIÓN	RECIBIDA POR	REMITIDO A	Anexos		RADICADO DE SALIDA	RESULTADO
DD	MM	AA		P	Q	R	S					P	T	CP	CE	CO	OFICINA DIRECTRIZ			#	C		
21	01	2022	21-01-2022			X		Tres personas (dirigida y Daniela Cortés Reyes y Daniel Sandoval Rincón)	[illegible] - 3142354 de Cortés - ctcortes1403@gmail.com	Bucaramanga	Solicitan compensación económica por los daños a raíz para la construcción de la obra de mitigación y encauzamiento				X		Cálculo	Consorcio Cauce	Consorcio Cauce	0		El viernes 11 de enero de 2022, se realiza reunión informativa de la obra con el Señor Alfredo Castro Reyes y el viernes 14 de febrero, se entrega por correo electrónico la visita realizada a PQRS No. 01	
28	01	2022	28-01-2022			X		Juan Pablo Gómez Gomez (Alcalde Almagrario) - Cuarto distrito	91.465.037 M. Bucaramanga - jhgomez@almagrario.gov	Bucaramanga	Informa que se viene una lluvia considerable en 5 meses por una parte que viene de aguas de Cascajal	X					Almagrario	Consorcio Cauce	Consorcio Cauce		X	El viernes 28 de enero se realiza el acuerdo a visitas a realizarse en la vía cuando se entregue el [illegible]	El viernes 28 de enero, se realiza el acuerdo a conformidad con el Señor Juan Pablo Gómez Gómez, Alcalde de Almagrario conforme la [illegible] radicada [illegible] electrónico por el Consorcio Cauce

SIGLAS


TIPO DE SOLICITUD: P-Petición, Q-Queja, R-Reclamo, S-Sugerencia

MEDIO DE RECEPCIÓN: P-Personal, T-Telefónico, B-Buzón, CE-Correo Electrónico, CO-Consignación/Factura

DIRIGIDO A: Gerente, C-Comité

REGISTRO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES PQRS

ORIGINAL			RADICACIÓN DE INGRESO	TIPO DE SOLICITUD				NOMBRE DEL SOLICITANTE	IDENTIFICACIÓN	MUNICIPIO	ASUNTO	MEDIOS DE RECEPCIÓN					CLASE RECEPTOR	RESPONSABLE	REMITIDA A	ESTADO		RADICADO DE SALIDA	RESULTADO
DD	MM	AA		P	Q	R	S					P	T	CP	DS	CO	OFICINA CAUCASIA			A	C		
22	10	2020	22-10-2020				X	Jhon Fredy Gomez Gomez (Oficio Zoosgenia – Centro abierto)	91.459.237 en Bucaramanga - jfgomez@zoosgenia.com	Bucaramanga	Informa que como consecuencia de la caída de una grúa que cayó el 2019 Cauce, se vuelve un vehículo de la entidad se utilizó separador con placas oficiales con fines oficiales de Dios	X					Amagrario	consorcio Cauce	Consorcio Cauce		X	Se radica por parte del Consorcio Cauce el radicado 0 entró a los de su parte del vehículo número	Amagrario, acorde a los oficios radicados el vehículo de la sociedad de activos especiales, recibió a conformidad la entidad se encuentra afectada por el Consorcio Cauce y como el requerimiento realizado el 6 de Dos Julio de 2020
28	03	2020	28-03-2020				X	Faber Díaz Rosero – conductor de vehículo de placas XLJ – 824	C.C. No 1.130.69.000 – Tel: 3154887762	Bucaramanga	Pedro con, como consecuencia de la caída de una grúa de la obra del Consorcio Cauce, esta con sobre el paradero de su vehículo de trabajo, Camión Furgón XLJ-824, solicita la reparación para el vehículo con deposito el Canto Rosero, como conductor	X					Parqueadero Camión Rosero	consorcio Cauce	consorcio Cauce		X	El Consorcio Cauce realiza el restablecimiento del vehículo de propiedad del señor Faber Díaz Rosero	El viernes 28 de marzo de 2020, el Señor Faber Díaz Rosero recibe a conformidad el vehículo matriculado por el Consorcio Cauce, el cual fue llevado al parqueadero ubicado a un lado del CAI de Centro Abastos de Bucaramanga

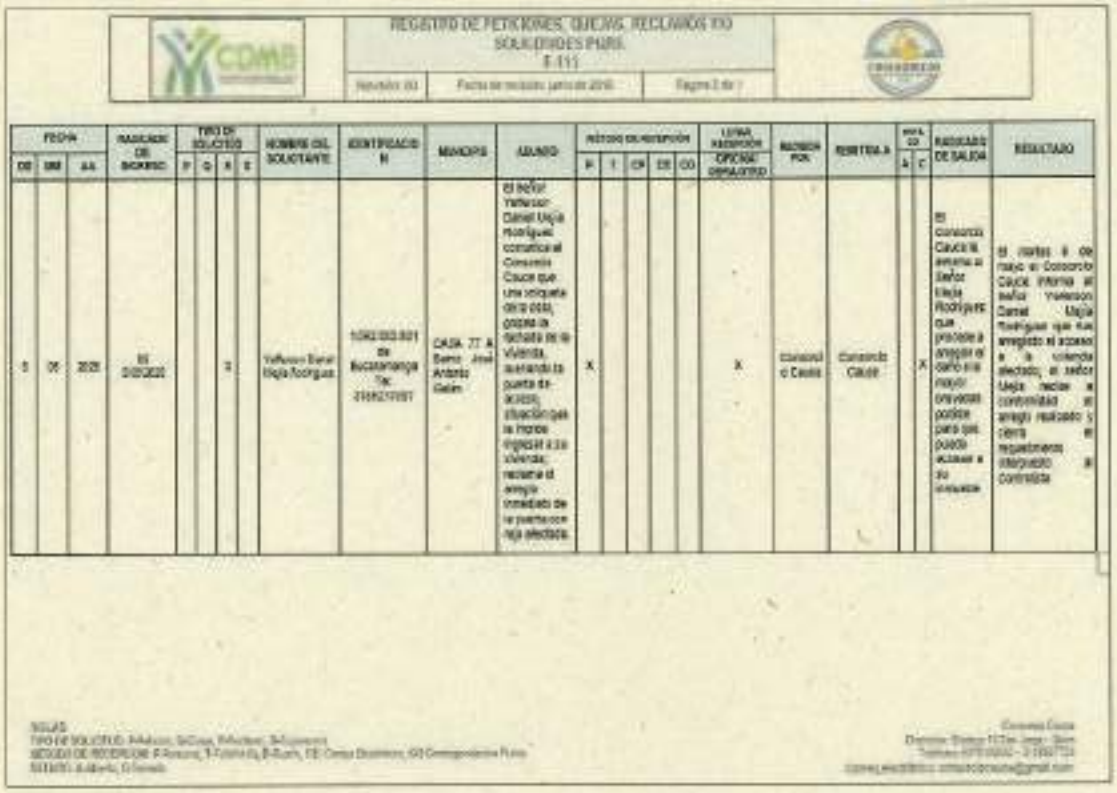

REGISTRO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES PQRS

F-111

FECHA			RADICADO DE ENTRADA	TIPO DE SOLICITUD				NOMBRE DEL SOLICITANTE	IDENTIFICACIÓN	MUNICIPIO	ASUNTO	MEDIOS DE RECEPCIÓN					LÍNEA RECEPCIÓN OFICINA OPERATIVO	RECIBIDO POR	REMITIDA A	ANEXA CD		RADICADO DE SALIDA	RESULTADO
DD	MM	AA		P	Q	R	S					PI	T	CW	EE	CO				A	C		
5	05	2020	05 05/2020			X		Yefferson Daniel Mejía Rodríguez	1042.053.821 de Bucaramanga Tel: 3165211097	CAUCA 77 A Barrio José Antonio Galán	El señor Yefferson Daniel Mejía rodríguez, comunica al Consorcio Cauce que una vecina de la casa, propia de fachada de la vivienda, aumenta la puerta de acceso, situación que le impide ingresar a la vivienda, reclama el arreglo inmediato de la puerta con reja electrica	X					X	consorcio Cauce	Consorcio Cauce		X	El consorcio Cauce le informa al Señor Mejía Rodríguez que procede a arreglar el daño en el mayor brevedad posible para que pueda acceder a su vivienda	El martes 9 de mayo el Consorcio Cauce informa al señor Yefferson Daniel Mejía Rodríguez que ya arreglaron el acceso a la vivienda afectado, el señor Mejía recibe a conformidad el arreglo realizado y cierra el requerimiento interpuesto al contratista

NOTAS:
TIPO DE SOLICITUD: P-Peticion, Q-Queja, R-Reclamo, S-Sugerencia
MEDIOS DE RECEPCIÓN: P-Personal, T-Telefónico, B-Buzón, CE- Correo Electrónico, CO-Correspondencia Física
ESTADO: A-Abierto, C-Cerrado

Consorcio Cauce
Dirección: Bodega 11 Cno. Jorge - Bosa
Teléfono: 6070000 – 3166677[illegible]
correo_electrónico: consorciocauce@gmail.com

ANEXO 4. RELACIÓN DE TRABAJADORES LOCALES VINCULADOS A LA OBRA CONSTRUCTIVA

CONSORCIO CAUCE

CONTRATO No. 210-15410-6

PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL

CONSORCIO CAUCE
Contrato No. 15410-06 "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"

No.	NOMBRE COMPLETO	C.C. No.	FECHA DE NACIMIENTO	LUGAR DE NACIMIENTO	DIRECCIÓN/ BARRIO	NÚMERO TELEFÓNICO	CARGO
1	FREDDY FUENTES GIL	91272408	12/05/1970	Bucaramanga - Santander	Barrio Campo Hermoso - Bucaramanga	3173032999	Almacenista
2	FREDDY GALVIS MUÑOZ	1095909154	30/12/1986	Bucaramanga - Santander	Barrio Rincón de la Paz - Bucaramanga	3163122078	Operador Retro
3	MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ ESCANDÓN	1098214445	20/1/1992	Agustín Codazzi - Cesar	Barrio Manuela Beltrán - Bucaramanga	3136405239	Operador
4	JUAN PABLO SUÁREZ MANRIQUE	13961583	19/07/1979	Bucaramanga - Santander	Barrio Esperanza I - Bucaramanga	3175571729	Oficial
5	JUNIOR ANTONIO GOMEZ QUINTERO	1005330486	7/02/2003	Bucaramanga - Santander	Barrio Transición V - Bucaramanga	3186026705	Ayudante de obra
6	ÁLVARO ANAYA	13741744	2/07/1971	Bucaramanga - Santander	Barrio José Antonio Galán - Bucaramanga	3174638306	Ayudante de obra
7	LUZ ADRIÁN REY PERERA	91296926	22/05/1974	Bucaramanga - Santander	Barrio Colorados - Bucaramanga	3188333916	Ayudante de obra
8	JORGE SUÁREZ VELÁSQUEZ	1058487	24/12/1972	Acagua - Venezuela	Barrio Nogal 1 - Bucaramanga	3028399227	Oficial
9	PEDRO SUÁREZ ORTEGA	13536935	7/12/1961	Lebrija - Santander	Barrio Colorados - Bucaramanga	3124140140	Oficial
10	JOHAN ANDRÉS MEJÍA CRISTANCHO	1098816942	26/04/1999	Bucaramanga - Santander	Barrio José Antonio Galán - Bucaramanga	3132780657	Ayudante de obra
11	JUAN CARLOS CARDOZO GÓMEZ	91075912	7/02/1976	San Gil - Santander	Barrio Nogal 1 - Bucaramanga	3118712046	Ayudante de obra
12	CARLOS HUMBERTO MEJÍA CRISTANCHO	91161080	11/07/1977	La Paz - Santander	Barrio José Antonio Galán - Bucaramanga	3136883729	Oficial
13	DIEGO HERNANDO CASTRO RÍOS	1095946840	29/09/1997	Girón - Santander	Barrio José Antonio Galán - Bucaramanga	3242431389	Ayudante de obra
14	DIEGO ARMANDO VILLAMIZAR RUEDA	1098748412	22/12/1993	Bucaramanga - Santander	Barrio José Antonio Galán - Bucaramanga	3214979188	Ayudante de obra
15	KEYNER DANIEL SÁNCHEZ JEREZ	1098656489	15/07/2008	Bucaramanga - Santander	Bavaria II - Bucaramanga	3025438007	Ayudante de obra
16	JHON CAMILO SÁNCHEZ DUARTE	1098635374	5/05/2005	Bucaramanga - Santander	Brisas del Prado - Bucaramanga	3185569755	Ayudante de obra
17	IVÁN RENÉ ROMÁN	1098745891	15/11/1993	San Alberto - Cesar	Bavaria II - Bucaramanga	3150473628	Ayudante de perforación
18	DUCAN BUITRAGO RAMÍREZ	91357094	3/11/1983	Bucaramanga - Santander	Porvenir - Bucaramanga	3132141556	Operador
19	YURLY EDUARDO AYALA PINEDA	1095959920	23/08/1999	Girón - Santander	José Antonio Galán - Bucaramanga	3157243099	Ayudante de obra
20	DUVÁN ANDRÉS JAIMES GONZÁLEZ	1095791450	30/09/2004	Floridablanca - Santander	Pablón - Bucaramanga	3153129461	Ayudante de obra
21	HÚBER DAVID RIVERA VILLALOBOS	1048271680	22/02/2006	Barranquilla - Atlántico	Bavaria II - Bucaramanga	3116597540	Ayudante de obra

	CONSORCIO CAUCE CONTRATO No. 210-15410-6 PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL	

ANEXO 5 REGISTRO DE CAPACITACIÓN MENSUAL CON LOS COLABORADORES DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	[illegible]
		Fecha	15/12/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO ☐ CAPACITACION X CHARLA ☐

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CON VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER-RACBPRAGE"

TEMA DE CAPACITACIÓN: Orientación sobre el manejo, transportación de escoria (demarcación vial) y advertencia vial

LUGAR: Campamento Obras en Cerro Alcalde — FECHA: 16/09/2025

CAPACITADOR: ANA LUCIA SANTOS RUEDA — DURACIÓN: 30 MINUTOS

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

FIRMA

ANEXO 6. REGISTRO DE ACTA DE VECINDAD ELABORADAS

CONSECUTIVO	RESPONSABLE DEL ACTA DE VECINDAD DE INICIO	DIRECCIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO TELEFÓNICO
1	LUIS ENRIQUE RIVAS VILAROT (presidente JAC del Barrio José Antonion Galán)	VÍA DE ACCESO AL BARRIO JOSÉ ANTONIO GALÁN	74849661	3115109792

ANEXO 6. ACTA DE COMPROMISO REALIZADA CON EL SEÑOR ALFREDO CASTRO REYES, ACORDE A COMPROMISO GENERADO EN EL ACTA DEL 9 DE MAYO DE 2025, DE ENTREGA DE MATERIAL COMO COMPENSACIÓN POR LOS ARBUSTOS AFECTADOS EN EL DESARROLLO DE LA OBRA

ACTA DE COMPROMISO
F-121

Versión: 03 | Fecha de revisión: 31 de 2021 | Página 1 de 2

CONSORCIO CAUCE - Contrato No. 15410-66
"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"

OBJETIVO	LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DEL ACTA DE COMPROMISO
REALIZAR ACTA DE COMPROMISO CONFORME REUNIÓN DE FECHA 9 DE MAYO DE 2025, DONDE EL CONSORCIO CAUCE GENERÓ COMPROMISO CON EL SEÑOR ALFREDO CASTRO REYES DE ENTREGAR OCHO VIAJES DE MATERIAL	Martes 16 de septiembre de 2025

EL CONSORCIO CAUCE ACORDÓ A COMPROMISO GENERADO CON EL SEÑOR ALFREDO CASTRO REYES, EN REUNIÓN DEL VIERNES 9 DE MAYO DE 2025, EN LA CUAL SE COMPENSA POR EL RETIRO DE ESPECIES VEGETALES UBICADAS EN ÁREAS DE RONDA DE RÍO UN UNICO PASO DE OCHO VIAJES DE MATERIAL, LOS CUALES A LA FECHA DE ELABORACIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO HAN SIDO ENTREGADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA, CONSORCIO CAUCE.

EL SEÑOR ALFREDO CASTRO REYES RECIBE A CONFORMIDAD LOS OCHO VIAJES DE MATERIAL (VER REGISTRO FOTOGRÁFICO) Y AGRADECE LA DILIGENCIA DEL CONSORCIO CAUCE EN LA ENTREGA ÚNICA DEL MATERIAL ACORDADO, COMO COMPENSACIÓN POR LAS ESPECIES VEGETALES RETIRADAS DE ÁREAS DE RONDA DE RÍO.

PARA CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVIENEN EN EL ACTA DE COMPROMISO

POR LA COMUNIDAD O ENTIDAD

Firma:

Nombre: ALFREDO CASTRO REYES
C.C. No. 91.176.856
Número telefónico: 3123970312
Dirección: Barrio José Antonio Galán
Cargo: Líder comunitario y Minero del barrio José Antonio Galán

POR EL CONSORCIO CAUCE

Firma:

Nombre: DIEGO ANTONIO LÓPEZ SANTAMARÍA
Cargo: Ingeniero Residente
C.C. No. 13.862.851

Firma:

Nombre: ALTA LUCIA SANTOS RUEDA
Cargo: Profesional Social
C.C. No. 63.302.990 de Bucaramanga
Número telefónico: 3115557728

ANEXO No. 6: INFORME SST.

CONSORCIO	INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CDMB

"CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION DE LA AMENAZA POR INUNDACION PARA LA REHABILITACION Y RECUPERACION DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR DE CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"

CONSORCIO
CAUCE

INFORME SST N° 13

CONTRATO 210.15410-6 DE 2024

ELABORADO POR:
PROFESIONAL SST

PERIODO DEL INFORME
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVOS DEL INFORME. 4
2.1 OBJETIVO GENERAL 4
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4
3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 5
4. RELACIÓN DE PERSONAL Y NOVEDADES. 6
4.1 PERSONAL 6
4.2 NOVEDADES DE INGRESO. 9
4.3 MAQUINARIA Y EQUIPOS. 6
5. PARTICIPACIÓN Y CONSULTA. 11
5.1 COMITÉ PARITARIO (COPASST) 6
5.2 COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 11
5.3 REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS. (RACI) 12
6. ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 12
7. PROCESOS DE FORMACIÓN. 12
8. INSPECCIONES DE SEGURIDAD 12
9. GESTIÓN DE LOS PELIGROS Y RIESGOS. 13
9.1 MEDIDAS PREVENTIVAS. 13
10. REPORTE DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO 13
11. CONCLUSIONES 11

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento describe la gestión en Seguridad y Salud en el trabajo del proyecto **"CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION DE LA AMENAZA POR INUNDACION PARA LA REHABILITACION Y RECUPERACION DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR DE CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"** en el periodo comprendido entre el **01 al 30 de septiembre de 2025;** en el mismo se reflejan y relacionan actividades ejecutadas, registros fotográficos y evidencias necesarias para respaldar la conformidad del sistema de Gestión SST en el marco de la prevención de riesgos, cumplimiento legal y contractual aplicables.

La estructura del informe esta direccionada desde un objetivo general y el cumplimiento de cada uno de los objetivos especificos descritos en el mismo, dentro de los cuales se podrá encontrar la relación del personal disponible para la ejecución del proyecto, rotación durante el periodo, conformación de los diferentes comités, mecanismos de participación y consulta dirigidos hacia la prevención de riesgos laborales, entre otros mecanismos necesarios para el eficaz desempeño de las actividades realizadas y registros de afiliación a seguridad social de la población trabajadora.

Comprometidos con el bienestar de la población trabajadora y la prevención continua de riesgos y accidentes laborales, presentamos este documento para que sea un soporte y ayuda para verificar el cumplimiento del plan de trabajo direccionado desde el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2. OBJETIVOS DEL INFORME.

2.1 OBJETIVO GENERAL

Soportar la ejecución de actividades y cumplimiento del plan de trabajo del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud el trabajo del proyecto **"CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION DE LA AMENAZA POR INUNDACION PARA LA REHABILITACION Y RECUPERACION DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR DE CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"** por medio de fotografías, actas, soportes y otros asociados al mejoramiento de la calidad de vida de la población trabajadora.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Presentar los soportes de inducción y/o re inducción, competencia de trabajo seguro en alturas y seguridad social vigente de toda la población trabajadora del proyecto.
- Describir las actividades desarrolladas en los diferentes comités y demás mecanismos de participación y consulta en materia de Seguridad y salud en el trabajo.
- Soportar la entrega de elementos de protección personal especifico y acordes a los factores de riesgos expuestos, suministrados a los trabajadores involucrados en el proyecto.
- Comunicar el avance y ejecución de las actividades del Sistema de seguridad y salud en el trabajo.
- Establecer medidas de control preventivas con el fin de mitigar y minimizar los riesgos potenciales que pueden generar accidentes de trabajo o enfermedades laborales a los trabajadores.
- Sensibilización a los trabajadores del contrato en mención la importancia de mantener ambientes y conductas de trabajo seguro.
- Establecer lineamientos técnicos para el desarrollo de las actividades y la correcta ejecución.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

NOMBRE DE LA EMPRESA	CONSORCIO CAUCE
NIT	901.855.851-1
REP. LEGAL	JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ
CONTRATO	No 210-15410-6
OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION DE LA AMENAZA POR INUNDACION PARA LA REHABILITACION Y RECUPERACION DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR DE CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"
DIRECCIÓN	Centro industrial logistico San Jorge Bodega 16
TELÉFONO	607-6159645
MUNICIPIO	GIRÓN
CLASE DE RIESGO	V
	Actividad económica: construcción de obras de ingeniería civil incluye solamente a empresas dedicadas a el montajo y/o reparación de oleoductos

4. RELACIÓN DE PERSONAL Y NOVEDADES.

En este numeral se presentan las relaciones del personal disponible, novedades de ingreso y retiro del personal dispuesto para la ejecución del proyecto en el periodo de tiempo descrito para el presente informe.

4.1 PERSONAL

A continuación, se presenta el personal disponible para la ejecución del proyecto

Tabla No. 1. Personal

PERSONAL CONTRACTUAL							
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025							
CONTRATISTA: CONSORCIO CAUCE							
NOMBRE COMPLETO	CC	CARGO	FECHA DE INGRESO	ARL	EPS	AFP	CCF
Julián Andrés Serrano Gómez	13870890	Director Obra	06/09/2024	Axa Colpatria	Sanitas	Colpensiones	Comfenalco
Victor Julio Gamboa	91265828	Profesional Hidráulico	02/01/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS	Colpensiones	Comfenalco
William Eduardo Cortes	91278912	Asesor Geotecnia	06/09/2024	Axa Colpatria	Sura	Porvenir	Comfenalco
Lissette Ximena Niño	63396720	Asesor Ambiental	06/09/2024	Axa Colpatria	Sura	Colpensiones	Comfenalco
Andrés Leonardo Lasso Aguirre	80187378	Implementación Programa De Gerencia De Proyectos	01/12/2024	Axa Colpatria	Sura	Colpensiones	Comfenalco
Mayra Alejandra Quintero	1095831315	Ing. residente Auxiliar	10/10/2024	Axa Colpatria	Sura	Porvenir	Comfenalco
Juan De Dios Garcia Sanabria	91079903	Maestro	02/10/2024	Axa Colpatria	Salud Total	Porvenir	Comfenalco
Victor Manuel Trujillo Arias	91250524	Ayudante	02/10/2024	Axa Colpatria	Salud Total	Colpensiones	Comfenalco
Freddy Fuentes Gil	91272408	Almacenista	06/09/2024	Axa Colpatria	Sanitas	N/A	Comfenalco
Luis Alberto Cano Paba	1082475667	Operador de perforación II	22/05/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS	Porvenir	Comfenalco
Iván René Román Carvajal	1098745891	Operador de perforación II	07/07/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS	Protección	Comfenalco
Baudilio Rivera Gómez	1093738325	Ayudante de obra	29/09/2025	Axa Colpatria	Salud total	Colpensiones	Comfenalco
TOTAL, TRABAJADORES					12		

CONTRATISTA: MAQUINOBRAS DE COLOMBIA							
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025							
NOMBRE COMPLETO	CC	CARGO	FECHA DE INGRESO	ARL	EPS	AFP	CCF
Diego Antonio López Santamaria	13982051	Residente Obra	02/01/2025	Axa Colpatria	Sanitas	Porvenir	Comfenalco
José Orlando Alba	91499520	Profesional SST	07/01/2025	Axa Colpatria	Coosalud	Protección	Comfenalco
Edgar Iván Palomino	1098636620	Topógrafo	06/09/2024	Axa Colpatria	Sura	Colfondos	Comfenalco
Freddy Alexander Galvis	1095909154	Operador	07/01/2025	Axa Colpatria	Salud Total	Porvenir	Comfenalco
Santiago Serrano Trujillo	109882260	Auxiliar De Ingeniería	05/11/2024	Axa Colpatria	Sanitas	Porvenir	Comfenalco
Mauricio Andrés Becerra Ortiz	1063562221	Operador	07/01/2025	Axa Colpatria	Sura	Protección	Comfenalco
Jesús Alberto Medrano	1037479814	Operador	07/01/2025	Axa Colpatria	Salud Total	Porvenir	Comfenalco
Uriel Alonso Rivera Barajas	1102383610	Ayudante	12/08/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS	Colpensiones	Comfenalco
TOTAL, TRABAJADORES					8		
SUBCONTRATISTA: LERMA CONSTRUCCIONES SAS							
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025							
NOMBRE COMPLETO	CC	CARGO	FECHA DE INGRESO	ARL	EPS	AFP	CCF
Uriel Quintero	12502397	Maestro	07/01/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS	Protección	Cajasan
Luis Adrián Rey Pereira	91298926	Ayudante	07/01/2025	Axa Colpatria	Salud Total	Protección	Cajasan
Álvaro Anaya	13741744	Ayudante	11/02/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS Movilidad	Colpensiones	Cajasan
Giovanny Rincón Jaimes	1095828352	Oficial	05/05/2025	Axa Colpatria	Salud Total	Porvenir	Cajasan
Luis Guillermo Melgarejo	15461774	Ayudante de obra	05/05/2025	Axa Colpatria	Salud Total	Protección	Cajasan
Delbys Gonzalo Echeverria	5073350	Gavionero	09/06/2025	Axa Colpatria	Coosalud movilidad	NA	Cajasan
Carlos Humberto Mejia	91181080	Gavionero	09/06/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS	Porvenir	Cajasan

Diego Armando Castro	1095949640	Gavionero	09/06/2025	Axa Colpatria	Sanitas	Porvenir	Cajasan
TOTAL, TRABAJADORES SUBCONTRATISTA					8		
SUBCONTRATISTA: PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCCIONES S.A.S							
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025							
NOMBRE COMPLETO	CC	CARGO	FECHA DE INGRESO	ARL	EPS	AFP	CCF
Geraldine Patiño	1098739437	SST	10/12/2024	Sura	Salud Total	Porvenir	Cajasan
Luis Fernando Jiménez	12502397	Maestro	07/01/2025	Sura	Salud Total	Porvenir	Cajasan
Duván Yesid Cárdenas Mantilla	1100896238	Oficial	07/01/2025	Sura	Nueva EPS	Porvenir	Cajasan
John Jairo Cárdenas Mantilla	1095936735	Oficial	07/01/2025	Sura	Salud Total	Porvenir	Cajasan
Diego Alejandro Galvis	1098506084	Ayudante	07/01/2025	Sura	Coosalud	Porvenir	Cajasan
Julio Erasmo Trejos	1087966614	Ayudante	08/01/2025	Sura	Salud Total	Porvenir	Cajasan
Johan Camilo Sánchez	1098635374	Ayudante	08/01/2025	Sura	Salud total	Porvenir	Cajasan
Kainer Daniel Sánchez Jarez	1098656489	Ayudante de obra	06/05/2025	Sura	Coosalud	Porvenir	Cajasan
Joam Camilo Cárdenas Vivas	1100888009	Oficial	13/05/2025	Sura	Salud Total	Porvenir	Cajasan
Cristian Fabián Maldonado Bohórquez	1005446149	Ayudante de obra	14/07/2025	Sura	Coosalud	Porvenir	Cajasan
Enderbi Alexander Salazar	5688268	Ayudante de obra	14/07/2025	Sura	Nueva EPS	Porvenir	Cajasan
Antonio González Ochoa	1096797433	Ayudante de obra	21/07/2025	Sura	Salud Total	Colfondos	Cajasan
Luis Alejandro Leal Sarabria	91352136	Ayudante de obra	03/07/2025	Sura	Nueva EPS	Porvenir	Cajasan
Jorge Alirio Peña Sánchez	1098771884	Ayudante de obra	03/07/2025	Sura	Nueva EPS	Porvenir	Cajasan
Juan Carlos León Aranguren	6133303	Ayudante de obra	31/07/2025	Sura	Nueva EPS	Protección	Cajasan
Omar Enrique Silva Balaza	6464816	Ayudante de obra	31/07/2025	Sura	Sura	Porvenir	Cajasan
Duván Andrés Jaimes González	1095791890	Ayudante de obra	29/07/2025	Sura	Salud Mía	Porvenir	Cajasan
Luis Alberto Luna Rueda	1005344971	Ayudante de obra	21/07/2025	Sura	Salud Total	Porvenir	Cajasan

Raúl Gabriel Melo Olaya	1006572279	Ayudante de construcción	04/08/2025	Sura	Sanitas	Porvenir	Cajasan
Huver David Rivera Villalobos	1048271660	Ayudante de construcción	14/08/2025	Sura	Nueva EPS	Porvenir	Cajasan
Héctor Manuel Raquejo Jiménez	1003668429	Auxiliar de construcción	24/09/2025	Sura	Nueva EPS	Porvenir	Cajasan
Yeysson Ferley Varón Parra	1106486177	Auxiliar de construcción	24/09/2025	Sura	Nueva EPS	Porvenir	Cajasan
Edwin Sarale Hernández	1124242078	Auxiliar de construcción	24/09/2025	Sura	Nueva EPS	Porvenir	Cajasan
Yerson Duván Alfonso Romero	1124244418	Auxiliar de construcción	24/09/2025	Sura	Nueva EPS	Porvenir	Cajasan
TOTAL, TRABAJADORES SUBCONTRATISTA					24		
TOTAL, TRABAJADORES EN OBRA					52		

Para la ejecución de la obra se cuenta con personal de mano de obra calificado y no calificado. Todos se encuentran afiliados a ARL, EPS, AFP, conforme a las disposiciones laborales aplicables.

Ver anexo N° 1. Afiliaciones y/o seguridad social.

4.2 NOVEDADES DE INGRESO.

A continuación, se relacionan las novedades de ingreso de personal durante el periodo:

Tabla No. 2. Novedades de ingreso de personal

NOVEDADES DE INGRESO			
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025			
CONTRATISTA: CONSORCIO CAUCE			
NOMBRE COMPLETO	NÚMERO DE IDENTIFICACION	CARGO	FECHA DE INGRESO
Baudilio Rivera Gómez	1093738325	Ayudante de obra	29/09/2025
CONTRATISTA: MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S.			
NA	NA	NA	NA
SUBCONTRATISTA: LERMA CONSTRUCCIONES S.A.S			
NA	NA	NA	NA
SUBCONTRATISTA: PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCCIONES S.A.S			
Héctor Manuel Raquejo Jiménez	1003668429	Auxiliar de construcción	24/09/2025
Yeysson Ferley Varón Parra	1106486177	Auxiliar de construcción	24/09/2025
Edwin Sarale Hernández	1124242078	Auxiliar de construcción	24/09/2025
Yerson Duván Alfonso Romero	1124244418	Auxiliar de construcción	24/09/2025

Ver anexo N° 2. Documentos de ingreso

4.3 NOVEDADES DE RETIRO

Durante el periodo del informe se presentaron las siguientes novedades de retiro:

NOVEDADES DE RETIRO		
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA: CONSORCIO CAUCE		
NOMBRE COMPLETO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA DE RETIRO
Mayra Alejandra Quintero	1095831315	30/09/2025
CONTRATISTA: MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S.		
NA	NA	NA
SUBCONTRATISTA: LERMA CONSTRUCCIONES S.A.S.		
Diego Armando Castro	1095949640	30/09/2025
SUBCONTRATISTA: PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCCIONES S.A.S		
Omar Enrique Silva Balaza	6484616	18/10/2025
Juan Carlos León Aranguren	6133303	20/10/2025
Johan Camilo Sánchez	1098635374	25/09/2025
Kelner Daniel Sánchez Jarez	1098656489	25/09/2025

Ver anexo N° 3. Documentos de retiro

4.4 NOVEDADES DE TRASLADO

Durante el periodo del informe no se presentaron novedades de traslado de personal.

NOVEDADES DE TRASLADO			
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025			
NOMBRE COMPLETO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FECHA DE TRASLADO
NA	NA	NA	NA

4.5 MAQUINARIA Y/O EQUIPOS

Para el desarrollo de las actividades ejecutadas durante este periodo se relaciona el equipo mínimo requerido:

Tabla No 3. Personal rotativo

PLACA	SOAT	FECHA VIGENTE DE SOAT	RTM	FECHA RTM	CONDUCTOR
TTW843	9310009608002	31/10/2025	177552748	30/11/2025	Eduardo Santos Useche

WFD114	9310013958601	31/05/2026	183883996	12/09/2026	Sergio Andrés Porras Villamizar
XMD621	1530102642103	17/11/2025	179940415	03/03/2026	Jonatan Ramiro Córdoba
GQV576	89134412	07/09/2026	175815676	11/09/2026	Jesús Arturo Álvarez
BAK481	3308005885143000	09/06/2026	178767953	15/01/2026	Bernabé Mantilla Dominguez
TPJ349	8901136189501	14/01/2026	180339220	20/03/2026	Rubén Darío Mantilla Aceros

Ver anexo N° 4. Documentos personal relativo

Tabla No. 4. Relación Maquinaria

PLACA	MARCA	MODELO	No SERIE	MOTOR	OPERADOR
RETROEXCAVADORA	DOOSAN	2019	DHKCEBAACCK 0022219	DB58TIS9 36644EN	Freddy Alexander Galvis
RETROEXCAVADORA	DOOSAN	2018	DHKCEBACAJ0 020617	DB58TIS8 31003EN	Mauricio Andrés Becerra
RETROEXCAVADORA	DOOSAN	2016	DHKCEBACPG0 019016	DB58TIS6 31003N	Oscar Julián Palomino Duarte
MINICARGADOR	BOBCAT	2016	AZNB11081	8GE4564	Uriel Alonso Rivera
RETROEXACAVADORA	CATERPILLAR	2016	CAT420FELBS0 0349	G4D56404	Jesús Alberto Medrano

Ver anexo N° 5. Documentos maquinaria

5. PARTICIPACIÓN Y CONSULTA.

Dentro de los mecanismos de participación y consulta se encuentra el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo COPASST o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, el comité de convivencia laboral CCL y mecanismos de notificación de riesgos por parte de la población trabajadora; en este numeral se describen las diferentes actividades desarrolladas.

5.1 COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO O VIGÍA SST.

Para el informe en mención y dando cumplimiento a la Resolución 2013 de 1986, modificada por el Decreto 1295 de 1994 y el Decreto 1072 de 2015, se realizó reunión del vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se adjunta acta realizada el día 30 de septiembre de 2025.

Ver anexo No 6. Acta vigía SST.

5.2 COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

En el presente informe se adjunta acta de reunión del comité de convivencia laboral, con fecha del 29 de septiembre de 2025 y de acuerdo a su frecuencia de reunión trimestral, la próxima reunión se encuentra programada para el mes de diciembre de 2025.

Ver anexo No 7. Acta CCL

5.3 REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS. (RACI)

Durante el periodo en reporte no se presentaron situaciones para reporte por parte de la población trabajadora los siguientes RACI.

6. ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

Es responsabilidad del empleador el suministro de los elementos de protección individual y dotación para la ejecución de las actividades de manera segura y de acuerdo a los perfiles del personal y las exigencias de las tareas a ejecutar; se realizó entrega de los elementos de protección de acuerdo a la vida útil del EPP y la necesidad del trabajador, a su vez se realizaron inspecciones periódicas de estos elementos con el fin de tener abastecido al personal.

Tabla 5. Entrega de dotación y EPP

ACTIVIDAD DESARROLLADA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Revisión de elementos de protección personal	De acuerdo a la necesidad y desgaste normal de los elementos de protección, se realizó reposición de los mismos.

Ver anexo No 8. Registros de entrega de elementos de protección personal

7. PROCESOS DE FORMACIÓN.

La formación es una estrategia indispensable para alcanzar los objetivos propuestos en el SGSST. Mediante estas se pretende lograr que todos los trabajadores involucrados en este proyecto, de todos los niveles, adquieran los conocimientos, actitudes y prácticas necesarios para generar ambientes de trabajos sanos, seguro y confortable.

Tabla N° 6. Capacitaciones SST en el periodo

CAPACITACIONES		
ITEM	FECHA	TEMA
1	10/09/2025	Peligros físicos
2	24/09/2025	Cuidado visual

Ver anexo No 9. Registro de asistencia a capacitaciones

8. INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Una de las herramientas más utilizadas para identificar peligros, para posteriormente ser evaluados, son las Inspecciones a sitios de trabajo, pues determinan el tipo de peligro al que está expuesto el trabajador en su área, constituye una prueba real de las condiciones laborales ya que se basa en la verificación de las diferentes zonas con las cuales tiene contacto el trabajador, además permite encontrar las fallas que pueden acarrear algún tipo de accidente y los posibles causales de enfermedad laboral.

Tabla 7. Inspecciones de seguridad realizadas en el periodo

INSPECCIÓN DESARROLLADA	FECHA DE INSPECCIÓN
Inspección de Elementos de Protección Personal	09/09/2025 25/09/2025
Inspección Locativa de Obra	17/09/2025
Inspección de botiquín y camilla	16/09/2025
Inspección de extintores	18/09/2025

Ver anexo N° 10. Registro de inspecciones

9. GESTIÓN DE LOS PELIGROS Y RIESGOS.

La gestión de los riesgos peligros prioritarios en el trabajo requiere mecanismos de prevención adicionales que permitan la gestión adecuada del riesgo, permitiendo ambientes de trabajo más seguros, en este numeral se relacionan las gestiones desarrolladas.

9.1 MEDIDAS PREVENTIVAS.

Tabla No. 8. Medidas preventivas adoptadas en el periodo

PELIGRO	GESTIÓN DE LOS PELIGROS	FECHA (S) DE REALIZACIÓN.
- Caídas, golpes, heridas.	- Inducción y/o reinducción en SST - Charlas de seguridad - Señalización y demarcación en áreas de trabajo	Del 01 al 30 de septiembre de 2025

Ver anexo N°11. Registro Fotográfico.

10. REPORTE DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO

Se hace relación al número de incidentes/accidentes/enfermedad laboral registrados en el espacio del informe que sea por causa u ocasión de las labores desempeñadas dentro del área de trabajo o encomendadas por personal supervisor o subcontratista. Dentro del presente informe se presenta la relación del número de eventos presentados, la gestión y plan de trabajo se anexará dentro de las investigaciones pertinentes.

Para el periodo que corresponde al presente informe no se presentaron eventos relacionados con accidentes de trabajo.

Tabla No. 10. Consolidado de incidentes y/o accidentes:

N°	MES	N° AT			N° TRABAJ	DIAS INCAPACIDAD	DIAS CARGADOS	TOTAL DIAS TRABAJADOS	TOTAL HORAS EXTRAS	HORAS HOMBRE TRABAJADAS	INDICES				
		IN	EP	TOTAL							MES	IF	IS	TASA	GI
1	sep-24	0	0	0	22	0	0	20	0	3520	sep-24	0,00	0,00	0,00	0,00
2	oct-24	0	0	0	14	0	0	22	0	2800	oct-24	0,00	0,00	0,00	0,00
3	nov-24	0	0	0	20	0	0	20	0	3800	nov-24	0,00	0,00	0,00	0,00
4	dic-24	0	0	0	30	0	0	19	0	4560	dic-24	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ene-25	0	0	0	43	0	0	23	0	5000	ene-25	0,00	0,00	0,00	0,00
6	feb-25	0	0	0	42	0	0	22	0	7700	feb-25	0,00	0,00	0,00	0,00
7	mar-25	0	1	1	42	3	0	24	0	8960	mar-25	2,23	4,26	2,23	0,11
8	abr-25	0	0	0	45	0	0	23	0	8280	abr-25	0,00	0,00	0,00	0,00
9	may-25	0	0	0	53	0	0	22	0	10304	may-25	0,00	0,00	0,00	0,00
10	jun-25	0	0	0	46	0	0	22	0	8096	jun-25	0,00	0,00	0,00	0,00
11	jul-25	0	0	0	55	0	0	24	0	11440	jul-25	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ago-25	0	0	0	59	0	0	23	0	12800	ago-25	0,00	0,00	0,00	0,00
13	sep-25	0	0	0	52	0	0	24	0	9984	sep-25	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0	1	1	37,9	2,6	0,0	301,0	0,0	97289,0	TOTAL	2,68	5,27	2,68	0,01

Imagen 1. Distribución del índice de frecuencia



Imagen 2. Tasa de accidentalidad



Imagen 3. Número de trabajadores mensual

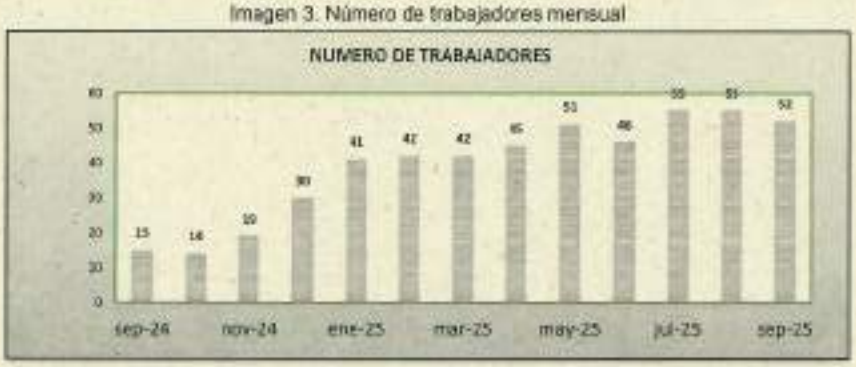


Imagen 4. Número de AT mensual



ANEXO N° 1
AFILIACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-06, 04:32:24 PM **Tipo Planilla:** I. PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1378129519

Periodo Cotización: septiembre de 2025 **Periodo Servicio:** septiembre de 2025

PAGADO 06/10/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ		
Documento	CC 13870699	Dirección	CR 35 #38 - 14 OFICINA 403
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	6914305
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	Departamento	SANTANDER
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Nombre o Razón Social	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante																			Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Clase	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte MEN	Total
CC 13870699	JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ	23	00																			COLPENSIONES	$ 6.197.000	$ 1.440.800	EPS SANITAS S.A.S	$ 6.197.000	$ 1.116.600	I	$ 6.197.000	$ 1.170.100	Ninguno	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.727.500

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes MEN	Cotizaciones Obligatorias a Fondo EPS	Cotizaciones AFP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL A PAGAR
$ 6.197.000	$ 6.197.000	$ 6.197.000	$ 0	$ 1.440.800	$ 1.116.600	$ 1.170.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.727.500	$ 0	$ 3.727.500

Líneas de Servicio PagoSIMPLE: Bogotá 601 4445534 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 3749989 - Bucaramanga: 607 6428000 - Cartagena: 605 6648444 - Pereira: 606 3482582 - Barranquilla: 605 3618818 - Resto del País: 018000 171 171 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de la SIMPLICIDAD!

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá



TOTAL PAGADO $ 554.000

Planilla Pagada

Planilla Pagada

Simple

PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-03, 11:18:38 AM Tipo Planilla: I PLANILLA INDEPENDIENTES Numero Planilla: 1070956298

Periodo Cotización: septiembre de 2025 Periodo Servicio: septiembre de 2025

PAGADO 26/09/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LISSETTH XIMENA NIÑO CARVAJAL		
Documento	CC53385720	Dirección	CR 28 #36 - 14
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	6914305
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	Departamento	SANTANDER
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
		13	13																																	

III. TOTALES

Líneas de Servicio PagoSIMPLE: Bogotá 601 4440434 - Cali: 602 3340577 - Medellín: 604 3146868 - Bucaramanga: 607 6438099 - Cartagena: 605 6606666 - Pereira: 606 3482582 - Barranquilla: 605 3616800 - Resto del País: 018000 471 911 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de la SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protegar el medio ambiente está en nuestras manos.

Simple

PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-06, 04:20:02 PM Tipo Planilla: Y PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS Número Planilla: 1076086404

Periodo Cotización: septiembre de 2025 Periodo Servicio: septiembre de 2025

PAGADO 06/10/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razon Social	CONSORCIO CAUCE		
Documento	N9021865681	Dirección	KM 7 #22 - 31 BODEGA 16
Tipo de Empresa	CONTRATANTE	Teléfono	3152345557
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	UNICO
Ciudad	GIRON	Departamento	SANTANDER
Representante Legal	SERRANO GOMEZ JULIAN ANDRES	Identificación	CC 13870660
Total Afiliados	3	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total

III. TOTALES

Líneas de Servicio PagoSIMPLE: Bogotá 601 6446644 - Cali: 601 8943077 - Medellín: 604 5146999 - Bucaramanga: 607 6439999 - Cartagena: 605 6943444 - Pereira: 606 3403340 - Barranquilla: 605 3611850 - Resto del País: 018000 471 871 - (Más que Fácil, SIMPLE!)

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protegar el medio ambiente está en nuestras manos.

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-06, 04:25:50 PM Tipo Planilla: E PLANILLA EMPLEADOS EMPREGAS Número Planilla: 1076172376

Periodo Cotización: septiembre de 2025 Periodo Servicio: octubre de 2025

PAGADO 06/10/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razon Social	CONSORCIO CAUCE		
Documento	N9001855581	Dirección	KM 7 #22 - 31 BODEGA 16
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3102949957
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	UNICO
Ciudad	GIRON	Departamento	SANTANDER
Representante Legal	SERRANO GOMEZ JULIAN ANDRES	Identificación	CC 13979980
Total Afiliados	6	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-02, 03:50:45 PM Tipo Planilla: E PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS Numero Planilla: 1076074149

Periodo Cotización: septiembre de 2025 Periodo Servicio: octubre de 2025

PAGADO 02/10/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razon Social	MAQUINOBRAS		
Documento	N900849507	Dirección	AV D #22 - 31 CENTRO IND SAN JORGE BD 16
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Telefono	6914005
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	Departamento	SANTANDER
Representante Legal	SERRANO GOMEZ JULIAN ANDREB	Identificación	CC 13870690
Total Afiliados	53	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | |

Pagado: 02/10/2025 | Empresa 830038037 MAQUINOBRAS | Planilla No: 1078074146 | Periodo Cotización: septiembre de 2025 | Periodo Servicio: octubre de 2025

II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | |

Pagado: 02/10/2025 Empresa 816008493ET MAQUIWORKS Planilla Nro: 1076874146 Periodo Cotización: septiembre de 2025 Periodo Servicio: octubre de 2025

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días Pensión	Días Salud	Días Riesgos	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC CCF	Aporte CCF	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte MEN	Total
[illegible]	[illegible]	01	00															30	30	30	[illegible]	$ 1.160.000	$ 185.600	[illegible]	$ 1.160.000	$ 139.200	0,522	$ 1.160.000	$ 6.055	[illegible]	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 34.800	$ 23.200	$ 0	$ 23.200	$ 453.455
[illegible]	[illegible]	01	01															30	30	30	[illegible]	$ 0	$ 0	[illegible]	$ 1.423.500	$ 170.820	0,522	$ 1.423.500	$ 7.431	[illegible]	$ 1.423.500	$ 56.940	$ 42.705	$ 28.470	$ 0	$ 28.470	$ 334.836
[illegible]	[illegible]	01	00															30	30	30	[illegible]	$ 1.423.500	$ 227.760	[illegible]	$ 1.423.500	$ 170.820	0,522	$ 1.423.500	$ 7.431	[illegible]	$ 1.423.500	$ 56.940	$ 42.705	$ 28.470	$ 0	$ 28.470	$ 562.596
[illegible]	[illegible]	01	00				1											30	30	30	[illegible]	$ 2.276.000	$ 363.960	[illegible]	$ 2.276.000	$ 273.120	0,522	$ 2.276.000	$ 11.881	[illegible]	$ 2.276.000	$ 91.040	$ 68.280	$ 45.520	$ 0	$ 45.520	$ 899.321
[illegible]	[illegible]	01	00															30	30	30	[illegible]	$ 1.160.000	$ 185.600	[illegible]	$ 1.160.000	$ 139.200	0,522	$ 1.160.000	$ 6.055	[illegible]	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 34.800	$ 23.200	$ 0	$ 23.200	$ 458.455
[illegible]	[illegible]	01	00				1											30	30	30	[illegible]	$ 1.160.000	$ 185.600	[illegible]	$ 1.160.000	$ 139.200	0,522	$ 1.160.000	$ 6.055	[illegible]	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 34.800	$ 23.200	$ 0	$ 23.200	$ 458.455

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	Vlr Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Fsist	Aportes ESAP	Aportes ESAP	Aportes SEN Educación	Incapacidades, Licencias, Ambos a Pensi	SENA	Incapacidades SENA	SUBTOTAL NO DEPENDIENTES DE NÓMINA	TOTAL DEPENDIENTES DE NÓMINA	TOTAL PARA...
$ 11.423.500,00	$ 11.423.500,00	$ 11.423.500,00	$ 11.423.500,00	$ 1.713.525,00	$ 1.713.525,00	$ 1.713.525,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.140.575,00	$ 0	$ 5.140.575,00

Líneas de Servicio PensiSIMPLE: Bogotá 601 4445634 - Cali: 602 3948577 - Medellín: 604 5108669 - Bucaramanga: 607 6439000 - Cartagena: 605 6648444 - Pereira: 606 3402982 - Barranquilla: 605 3616552 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protegar el medio ambiente está en nuestros manos.

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razón Social	Clase Aportante	Naturaleza Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Cotización CEDA a cargo
NIT 900[illegible]	7	LEMAS CONSTRUCCIONES S.A.S.	1 - APORTE DE LEY CONTRATO	MIXTA	CRA 5 No. 4[illegible] [illegible]	BUCARAMANGA/SANTANDER	6[illegible]	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION


Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-09	2025-10	[illegible]	[illegible]	E	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	$ [illegible]

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | |


aportes en línea

Planilla Integrada

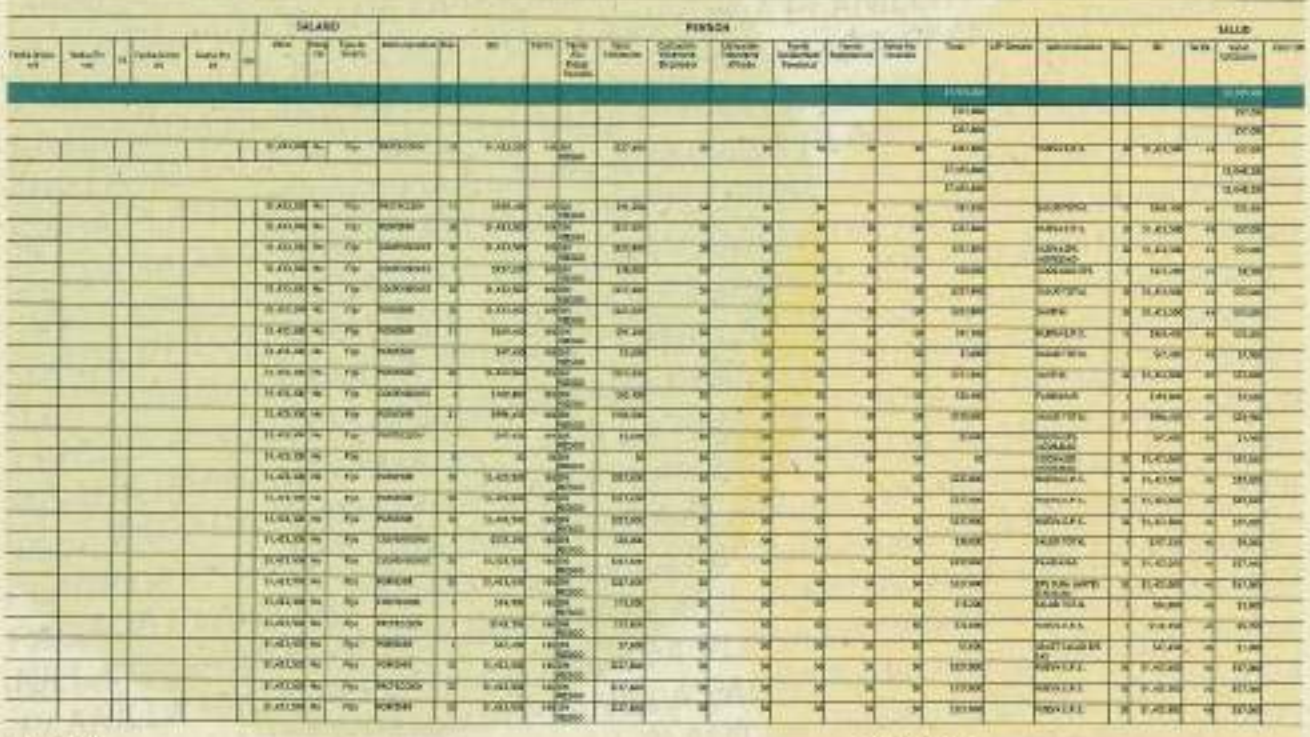


aportes en línea

Planilla Integrada

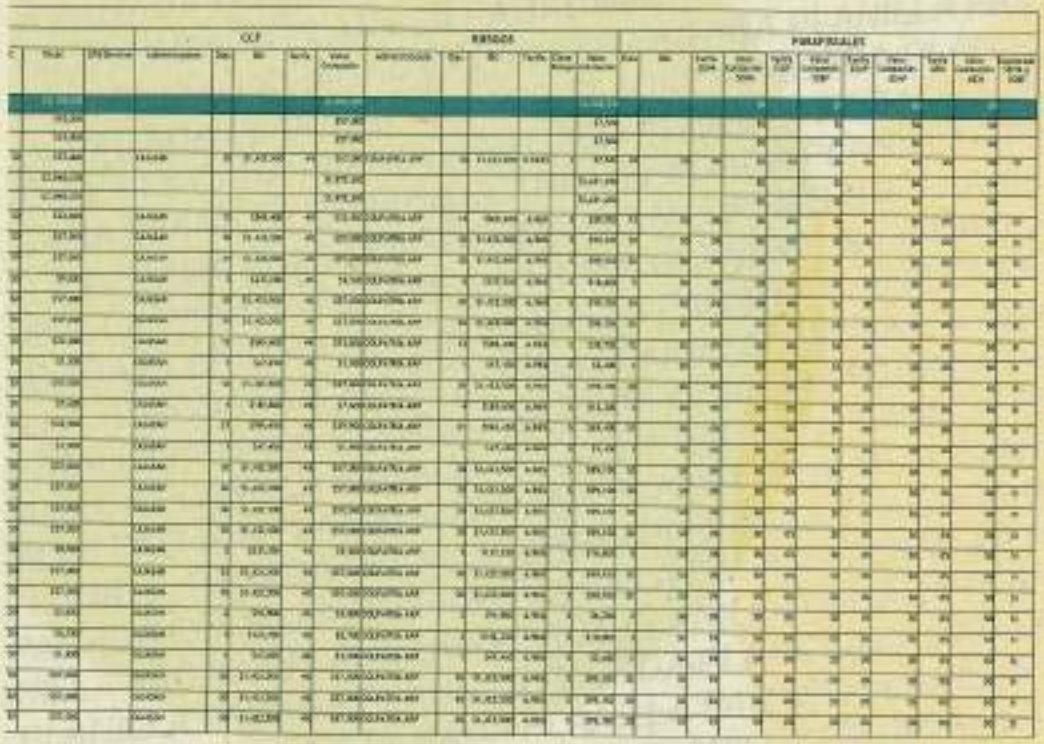

aportes en línea


Planilla Integrada

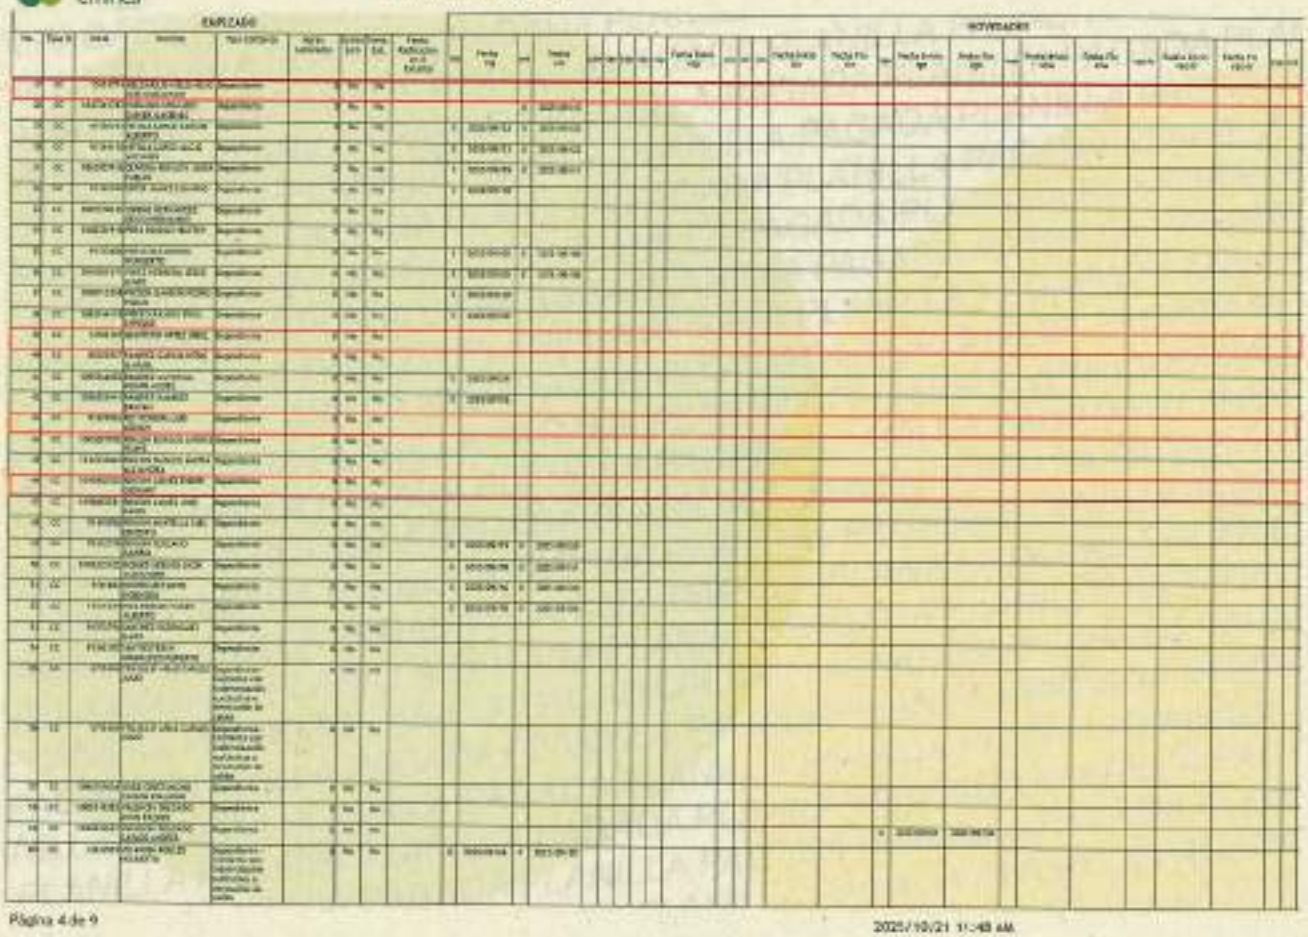

2025/10/21 11:48 AM

aportes en línea

Planilla Integrada

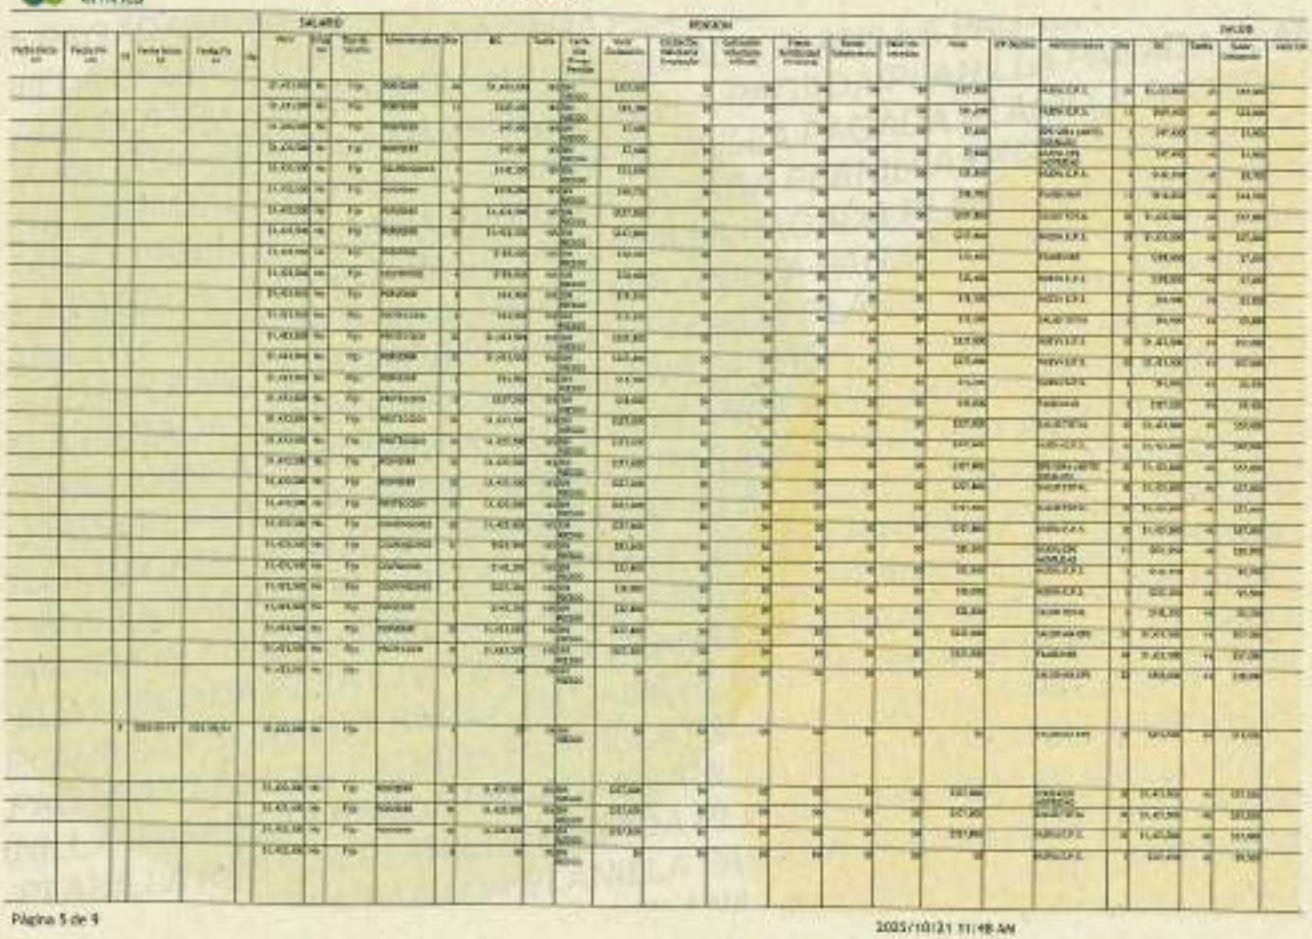

aportes en línea

Planilla Integrada

| | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

EMPLEADO

No.	Tipo Id.	No. Id.	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Dpto.	Mpio.	Días Cotizados a este Sistema
1	CC	[illegible]	[illegible]	Dependiente	0	76	001	1

Total Afiliados(01)

NOVEDADES

No.	Fecha Ing.	Ind.	Fecha Ret.	Ind.	VSP	Ind.	Sus. Temp.	Ind.	Inc. E.G.	Ind.	Lic. MP	Ind.	Vac.	Ind.	Var. Tr.	Ind.	Var. P.	Ind.	Fecha Inic. SLN	Fecha Fin SLN	Ind.	Fecha Inic. IGE	Fecha Fin IGE	Ind.	Fecha Inic. LMA	Fecha Fin LMA	Ind.	Fecha Inic. VAC	Fecha Fin VAC	AVP	VCT
1	[illegible]		[illegible]																											

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Suscrito a PILA o ECP
[illegible]	7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN


Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	E	[illegible]	[illegible]	BANCOLOMBIA	1	$15,503,900

RESUMEN DE PAGO

RUBRO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
APF (ADMINISTRADORAS: 4)				57	$7,695,600	$5,200	$0	$7,695,600
COLPENSIONES	31009	800,227,940	6	3	$58,400	$100	$0	$58,500
COLPENSIONES	31111	900,336,004	7	11	$1,330,800	$800	$0	$1,331,600
PORVENIR	33301	800,224,808	8	31	$4,493,800	$3,200	$0	$4,495,800
PROTECCION	33201	800,230,275	8	11	$1,769,400	$1,100	$0	$1,770,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				60	$3,438,700	$2,200	$0	$3,440,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	60	$3,438,700	$2,200	$0	$3,440,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				69	$3,831,300	$1,200	$0	$3,832,500
CAJASAI	CCF19	890,200,126	1	69	$3,831,300	$1,200	$0	$3,832,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				68	$3,785,300	$1,700	$0	$3,786,900
ANAS SALUD EPS SAS	EPS002	900,935,126	7	1	$7,900	$100	$0	$8,000
COOSALUD EPS	EPS041	900,226,715	3	1	$9,900	$100	$0	$10,000
COOSALUD NORTE/ÑO	EPS124	900,226,715	3	2	$116,000	$100	$0	$116,100
EPS SURA (ANTES SURAMIS)	EPS010	800,088,702	2	3	$115,900	$100	$0	$116,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$161,400	$100	$0	$161,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	28	$961,400	$600	$0	$962,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS044	900,156,264	2	4	$38,700	$100	$0	$38,800
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$114,800	$100	$0	$114,900
SALUD TOTAL	EPS008	800,130,907	4	11	$431,400	$100	$0	$431,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$114,800	$100	$0	$114,900
TOTAL				69	$15,493,300	$10,200	$0	$15,503,900

aportes en línea

Planilla Integrada

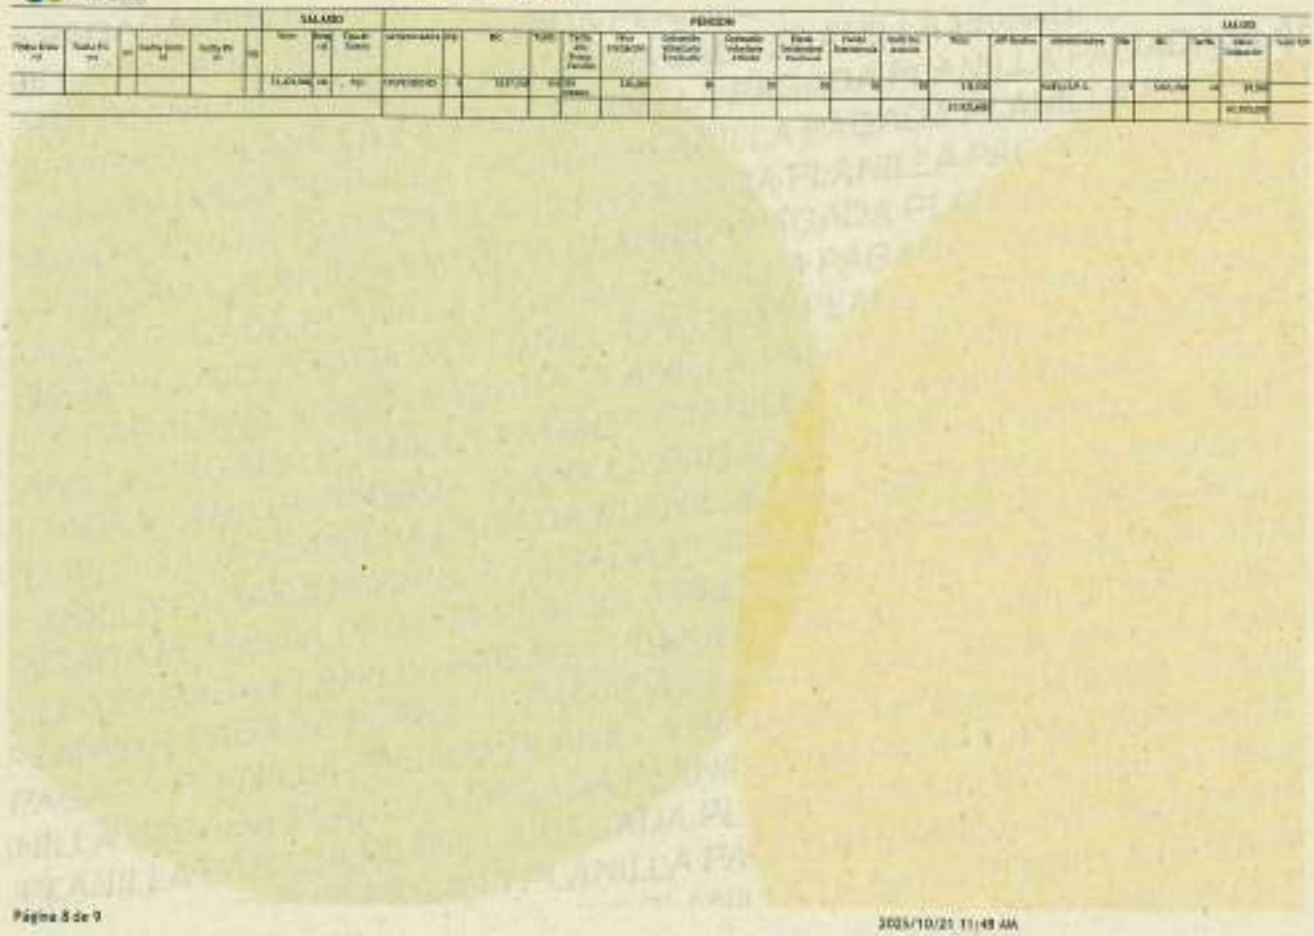

aportes en línea

Planilla Integrada



compensar miplanilla.com

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE RAZÓN SOCIAL		DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX
NI	901255263	PERAMANGA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS		calle 10c-12a-34 villas de alcalá 2	3164566699	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
S	E	GIRARDOTA CALICE	CALICE	SANTANDER	BUCARAMANGA	

DATOS DE LA PLANILLA								
PERIODO LIQUIDACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA MES AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CONSIGNADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SE NOTIFICA LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 E LEY 1607 DE 2012 EXENCIÓN DE APORTES
SALUD		PENSIÓN, RIESGOS LAB, CAJA, ESAL, ICBF						
MES	AÑO	MES	AÑO					
10	2025	9	2025	E	14 10 2025	00580500	SI	No

| CENTRO DE TRABAJO | Todos | | | | | | | |

compensar | miplanilla.com

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PAG. 2 de 2

No.	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUB CET	EST	COL EXT	Días	COD NOV	COD SUP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CPA	APO	ARL	CCF	Aportes EPS	IBC EPS	Aportes AFP	IBC AFP	Aportes ARL	IBC ARL	Aportes CCF	IBC CCF
34	CC 1124[illegible]4	[illegible]	1	0			30	000	00	X															7	7	7	7	EPS037	$302,100	23001	$302,100	14-11	$302,100	CCF09	$302,100
33	PT 9888369	SALAZAR FIGUR ENDERE ALEXANDER	1	0			30	001	00																30	30	30	30	EPS041	$1,422,000	23001	$1,422,000	14-11	$1,422,000	CCF09	$1,422,000
32	PT 9103360	LEON GRANGUREN JUAN CARLOS	1	0			30	001	00		X														18	18	18	18	EPS037	$851,580	23001	$851,580	14-11	$851,580	CCF09	$851,580
27	PT 9484018	SOSA BALAZA DIANA ENRIQUE	1	0			30	001	00		X														17	17	17	17	EPS010	$806,850	23001	$806,850	14-11	$806,850	CCF09	$806,850
	9484018	SOSA BALAZA DIANA ENRIQUE	1	0			02	001	00										X						1	1	1	1	EPS010	$47,460	23001	$47,460	14-11	$47,460	CCF09	$47,460
28	PT 9888992	GARCIA MORALES LUNA [illegible]	1	0			30	001	00																30	30	30	30	EPS037	$1,422,000	23001	$1,422,000	14-11	$1,422,000	CCF09	$1,422,000
26	CC 9113[illegible]3	JIMENEZ LUIS FERNANDO	1	0			30	004	00																30	30	30	30	EPS041	$1,422,000	23001	$1,422,000	14-11	$1,422,000	CCF09	$1,422,000
31	CC 9123[illegible]19	[illegible]	1	0			30	001	00																30	30	30	30	EPS037	$1,422,000	23001	$1,422,000	14-11	$1,422,000	CCF09	$1,422,000
30	CC 9[illegible]4	[illegible]	1	0			30	001	00																30	30	30	30	EPS041	$1,739,130	23001	$1,739,130	14-11	$1,739,130	CCF09	$1,739,130

PAGADO

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de información

ANEXO N° 2
DOCUMENTOS INGRESO PERSONAL

SAN DIEGO
SERVICIOS EN SALUD

CERTIFICADO MÉDICO DE PREINGRESO OCUPACIONAL

Fecha: 2025-09-23

1. INFORMACIÓN GENERAL

Empresa Usuaria:	CONSORCIO CAUCE	Actividad económica:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
Nombre:	BAUDILLO RIVERA GOMEZ	Documento:	CC 1093738325
Fecha de nacimiento:	1996-02-16	Lugar de nacimiento:	BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Edad:	39 años	Identidad de Género:	Masculino
Estado civil:	Union_libre	No. hijos vivos:	0
Dirección actual:	MANZ 8 CASA 15 CHACARITA ETAPA 1	Municipio:	PIEDECUESTA
Teléfono:	3183141088	Escolaridad:	Primaria_completa
Ocupación:	AYUDANTE DE OBRA.	EPS:	Salud Total
Responsable**:	ANGIE RUBIO (ESPOSA)	Teléfono:	3183141088
Acompañante:	El trabajador asiste a la evaluación sin acompañante.		



*** La información de responsable se encuentra actualizada de acuerdo a la última suministrada por el paciente en la historia para efectos de un contacto oportuno ante cualquier eventualidad.*

INMUNIZACIONES Relación de biológicos aplicados:

No presenta carnet de vacunación para revisión, no aporta

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Visiometría: Su capacidad visual es adecuada para la ocupación.
Audiometría: Su capacidad auditiva es adecuada para la ocupación.
Espirometría computarizada: NO APLICA.

CONCLUSIONES OCUPACIONALES

De acuerdo al examen ocupacional realizado a BAUDILLO RIVERA GOMEZ con documento de identificación No. 1093738325 se considera no presenta restricciones para desempeñar la ocupación de AYUDANTE DE OBRA del sector económico Construcción de otras obras de ingeniería civil.

CONDUCTAS OCUPACIONALES PREVENTIVAS

1. CLASIFICACIÓN OSTEOMUSCULAR: De acuerdo a la información disponible y el examen realizado se clasifica como NO CASO.
2. CLASIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA CARDIOVASCULAR OMS: No se calcula por ser menor de 40 años.

RECOMENDACIONES GENERALES (Para el manejo de enfermedades generales o comunes)

1. Solicitar en su entidad de salud valoración de su alteración metabólica de los carbohidratos.

CONCEPTO MEDICO DE APTITUD OCUPACIONAL

NO PRESENTA RESTRICCIONES


OBSERVACIONES FINALES

RESULTADO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO PARA SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA OCUPACIONAL: Los siguientes son los resultados de los exámenes de Laboratorio Clínico realizados: - Glucosa en suero: por fuera de valores límites normales; - Triglicéridos: Dentro de valores límites normales; - Colesterol total: Dentro de valores límites normales.

ENFASIS EN EL EXAMEN DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR: En el Examen Médico Ocupacional realizado se hizo una completa revisión de su sistema osteomuscular, extremidades y columna, buscando patologías o secuelas de estas que pudieran constituir un riesgo aumentado para la realización de las actividades de su trabajo habitual, o de aquellas que impliquen posturas forzadas o movimientos repetitivos. Cualquier alteración significativa encontrada se ampliará en el Certificado Médico, con el objeto de definir su estado, implicaciones ocupacionales o la necesidad de tratamiento.

Karen SAñez O

KAREN SOFIA AÑEZ OROZCO
Médico Cirujana
Universidad Libre
R.M. 20276/2009
Especialista en Salud Ocupacional y Riesgos Laborales
U. Manuela Beltrán UMB
Lic. S.O. 00-12012 de 11/08/17



Firma para identificación de usuario
BAUDILLO RIVERA GOMEZ
Documento: 1093738325

Indice der

Escanee el código si desea verificar datos

CONSIDERACIONES LEGALES RELATIVAS A LOS EXAMENES DE INGRESO: Las Resoluciones 2346 del 11 de julio de 2007 y 1918 de Junio 5 de 2009 del Ministerio de la Protección Social (actualmente Ministerios de Trabajo y de Salud y Protección Social) reglamentan la práctica y contenido de las evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, con el objeto de determinar la existencia de restricciones para el trabajo a desempeñar, acorde con los requerimientos definidos por el empleador en el perfil del cargo. También establece que la Empresa solo puede conocer el CERTIFICADO MÉDICO DE INGRESO del aspirante. Los documentos completos de la Historia Clinica Ocupacional están sometidos a reserva profesional y quedan bajo nuestra guarda y custodia, segun lo establecido en la Resolución 1918 de Junio 5 de 2009 y el trabajador puede obtener una copia de ellos cuando lo requiera, entendiendo que hacen parte integral de su historial médico.

Calle 50 No 28-25 - Piso 3 - Centro Empresarial Sotomayor PBX: 6351618
www.sandiegoses.com historiasclinicas@sandiegoses.com

Impreso por:
Fecha: 2025-09-24 Hora: 17:09

	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-02
CONSORCIO		Fecha	28/07/2025
		Versión	5

1. DATOS PERSONALES

NOMBRE: Paulo Ruan Gomez — DOCUMENTO: 1093738325

DIRECCIÓN: Calle 7# 2-14 la Cantera — TELÉFONO: 3183141083

CARGO: Ayudante de obra — PROYECTO: Consorcio cave

TIPO DE CONTRATO: FIJO — ARL: Axa Colpatria

JEFE INMEDIATO: Santiago Serrano — FECHA: 29/09/2025

ETAPA — INDUCCIÓN: ✓ — REINDUCCIÓN:

2. RESPONSABILIDADES EN EL SGSST



3. POLÍTICAS SIG









POLITICA DE USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



Política Ambiental





5. REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL



6. REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO




7. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST



RESPONSABILIDADES COPASST



8. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL - COCOLA

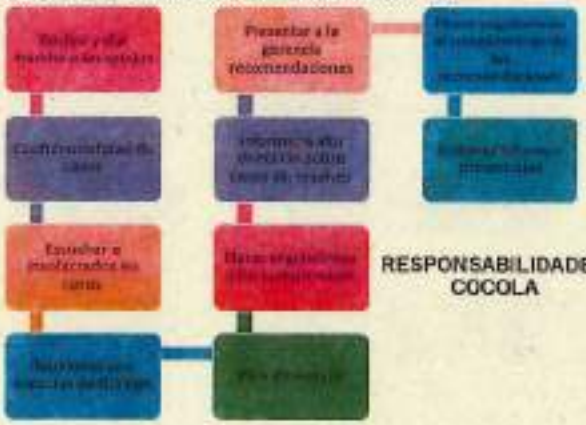

RESPONSABILIDADES COCOLA

Busca prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo, conforme lo establece la resolución 0652 del 30 de abril del año 2012.

Conformado por un Número Igual de Representantes del Empleador y de los Trabajadores con sus Respectivos Suplentes.


9. DEFINICIONES BÁSICAS















10. REPORTE DE INCIDENTES, ACCIENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES









11. PROGRAMAS AMBIENTALES









12. SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO



13. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS



14. ACOSO SEXUAL Y VIOLENCIA DE GENERO







15. MANUAL DE FUNCIONES



Documento que detalla las responsabilidades, tareas, y requisitos de cada puesto de trabajo dentro de una organización. Sirve como guía para los empleados, define perfiles laborales, y facilita la gestión del talento humano.

16. EMERGENCIAS









La señalización de emergencia y evacuación es crucial para guiar a las personas de forma segura hacia las salidas en caso de situaciones críticas como incendios o terremotos



He recibido a satisfacción la Induccion en Seguridad y Salud en el Trabajo y me comprometo a cumplir con los reglamentos y las normas de seguridad estipuladas por la empresa, así como, las establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo y en el Contrato de Trabajo.

Bernardo Riveros G
Firma del Trabajador

Firma de quien realiza la Inducción

	FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-03
		Fecha	28/07/2023
		Versión	5

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:	Baudilio Rivera Gómez	DOCUMENTO:	1013738325
CARGO:	Ayudante de obra	AREA DE TRABAJO:	Consorcio Cauce
TEMA:	INDUCCIÓN X REINDUCCIÓN	FECHA:	21/09/2023

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - AMBIENTAL

Lea atentamente las siguientes preguntas y marque con una X la(s) respuesta(s) que considere correctas

1. Entre las siguientes opciones, seleccione TODAS aquellas que correspondan a políticas de la empresa — Puntaje: 3

a. Política SST 

b. Política de Vacaciones 

c. Política de Seguridad Vial 

d. Política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas 

2. Seleccione TRES (03) peligros a los cuales está expuesto en el desarrollo de las actividades de su cargo — Puntaje: 3

a. Golpeados y mordeduras 

b. Fenómenos Naturales 

c. Mecánico 

d. Locativo 

e. Materiales radiactivos 

f. Eléctrico 

g. Tránsito 

h. Químico 

3. Seleccione UNA afirmación que describa por qué se debe implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa — Puntaje: 1

a. Para desmejorar las condiciones laborales de la empresa

b. Para que nos paguen mejor

c. Para evitar que se presenten accidentes de trabajo y enfermedades laborales

d. Todas las anteriores

4. Seleccione UNA afirmación que describa el Procedimiento a seguir para reportar un incidente o accidente de trabajo — Puntaje: 1

a. Informar al compañero de trabajo

b. Dirigirse a la clínica para recibir atención médica

c. Continuar laborando normalmente


d. Notificar al área SST o Jefe Inmediato, recibir atención de primeros auxilios y dirigirse a centro médico, si es necesario

Lea atentamente las siguientes preguntas y encierre en un círculo la(s) respuesta(s) que considere correctas

5. Encierre TODAS las buenas prácticas que estén relacionadas con el autocuidado — Puntaje: 3



6. Encierre TODOS los recursos que sean necesarios para atender una emergencia — Puntaje: 3



Lea atentamente la siguiente pregunta y una con una línea la(s) respuesta(s) que considere correctas

7. Una con una línea cada uno de los residuos con alguna de las tres canecas para disposición — Puntaje:

Residuos

Canecas



INDUCCIÓN AL CARGO

Lea atentamente las siguientes preguntas y marque con una X la(s) respuesta(s) que considere correctas

8. De los siguientes documentos, seleccione cuál es la norma reguladora de las relaciones internas entre la empresa y el trabajador, que sirve de guía y herramienta para mantener el orden de la empresa — Puntaje: 1

a. Manual de Urbanidad y Buenas Maneras 

b. Manual de Ingeniero de Mantenimiento 

c. Reglamento Interno de Trabajo 


9. De los siguientes documentos, seleccione en cuál de ellos se establecen la funciones y responsabilidades del cargo que va a desempeñar en la empresa: — Puntaje: 1

a. Manual de Funciones 

b. Manual de Calidad 

c. Manual Exotérico 

10. Seleccione opciones del ahorro de agua y energía. — Puntaje: 3



11. Según la ley 1565 de 2024, cuales son los derechos y las garantías para las víctimas :  — Puntaje: 1

a. Atención psicológica a través de la ARL y traslado de área, teletrabajo o terminación contractual sin penalización.

b. Confidencialidad y prohibición de confrontación con el agresor.

c. Protección contra represalias por denuncia (estabilidad laboral reforzada por 6 meses).

d. Todas las anteriores.

	FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-03
		Fecha	28/07/2025
		Versión	5

12. Los pictogramas en el SGA me permite verificar la peligrosidad de la sustancia o mezcla, encierro las que informen alto grado de toxicidad.	Puntaje: 1	13. ¿Cuál de los siguientes enunciados refleja un compromiso de la empresa según su Política Integrada?	Puntaje: 1
		a. Solo cumplir con los requisitos del cliente para evitar sanciones.	
		b. Ejecutar obras sin considerar el impacto ambiental para cumplir con los plazos.	
		c. Promover condiciones de trabajo seguras, proteger el medio ambiente y satisfacer al cliente.	
		d. Aplicar mejoras al sistema de gestión únicamente cuando lo exija una auditoría externa.	

14. ¿Sabes dónde encontrar los formatos, políticas y procedimientos del SIG?	Puntaje: 1	15. ¿Dónde puedo veo la organización de los procesos de la empresa?	Puntaje: 1
a. Worklaw	c. Trello	a. En el mapa de procesos del Sistema de Gestión Integrado (SIG), incluido en el manual de calidad.	c. Preguntando directamente a cualquier compañero de trabajo.
b. Buk-Iplan	d. copasst	b. En los estados financieros de la empresa.	d. En el cronograma de capacitaciones anuales.

Lea detenidamente la siguiente pregunta y encierre en un círculo la(s) respuesta(s) que considere correctas

16. Seleccione TODOS los aspectos que están establecidos en el Reglamento Interno de Trabajo	Puntaje: 5
 Permisos Horario de Trabajo Incapacidades Obligaciones, faltas y sanciones Proceso Disciplinario	

17. De las siguientes afirmaciones cuales corresponden a nuestra Política Ambiental	Puntaje: 1
a. Reducción de la contaminación y protección del medio ambiente	b. Cumplimiento de la normatividad ambiental
c. Minimización de la generación de residuos	d. Todas las anteriores

18. Selecciona los Programas Ambientales que hacen parte del Sistema de Gestión:	Puntaje: 1
a. Uso y Ahorro Eficiente de Energía y Agua	c. Gestión Integral de Residuos
b. Uso y Ahorro Eficiente de Papel	d. a,b y c son correctas

PUNTAJE TOTAL: 35/35	FIRMA DEL TRABAJADOR: Barbara Rivera	FIRMA DEL EVALUADOR:
OBSERVACIONES:		

	FORMATO NOTIFICACIÓN DE RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	SST-F-06
		VERSIÓN:	3
		FECHA:	2/01/2024
		PÁGINA	1 DE 1

A continuación, se describen los peligros asociados a la actividad a realizar y las recomendaciones a seguir para su mitigación

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS			RECOMENDACIONES
GRUPO	DESCRIPCIÓN	APLICA	
Biológico	Virus	✓	Inspección áreas, inspección y desinfección de elementos de trabajo (epp- dotación), lavado de manos e higiene personal), aplicación repelente, desinfección de áreas, uso de gel antibacterial- alcohol para desinfección. Uso obligatorio de EPP, informar diariamente sobre estado de salud, aplicar protocolo de limpieza y desinfección, vacunación
	Bacterias	✓	
	Hongos		
	Ricketsias		
	Picaduras	✓	
	Mordeduras	✓	
	Fluidos o excrementos		
Físico	Ruido		Uso adecuado de epp, dotación manga larga, uso de protector solar, hidratación constante, realizar pausas activas.
	Iluminación		
	Vibración		
	Temperaturas extremas		
	Presión atmosférica		
	Radiaciones no ionizantes	✓	
	Radiaciones ionizantes		
Químico	Polvos orgánicos e inorgánicos		Uso adecuado de epp, conocer hojas de seguridad, etiquetado de sustancias químicas, ventilación
	Fibras		
	Líquidos		
	Gases y vapores		
	Humos metálicos, no metálicos		
	Material particulado	✓	
Psicosocial	Gestión organizacional		Planeación de actividades, Realización de pausas activas, trabajo en equipo, comunicación asertiva.
	Características de la organización		
	Características del grupo social		
	Condiciones de la tarea	✓	
	Interfase persona - tarea		
	Jornada de trabajo		
Biomecánicos	Posturas	✓	Levantamiento y movimiento de cargas adecuado, realización de pausas activas y calistenia, mantener una buena higiene postural, no exceder pesos permitidos.
	Esfuerzo	✓	
	Movimiento repetitivo	✓	
	Manipulación de cargas	✓	
Condiciones de seguridad	Mecánico	✓	Realizar inspecciones a epp, herramientas, equipos, áreas de trabajo, autocuidado, atender a normas de tránsito, reportar estado de salud, reporte de actos y condiciones inseguras, atender a señalización, certificación de competencias (cuando se requiera)
	Eléctrico		
	Locativo	✓	
	Tecnológico		
	Accidentes de tránsito	✓	
	Públicos	✓	
	Trabajo en alturas		
	Espacios confinados		
Fenómenos naturales	Sismos	✓	Ubicación de señalización de emergencia, autocuidado, reconocimiento de brigada.
	Terremotos		
	Vendaval		
	Inundación		
	Derrumbe		
	Precipitaciones		

Yo, Bautista Rivera Gómez *identificado con documento* 1093738325

declaro que he sido notificado de los riesgos a los cuales estoy expuesto para el cargo de Ayudante de obra

que desempeño en la empresa/proyecto Consorcio Cacre *desde la fecha* 21/09/25

Bautista Rivera
Firma del trabajador

José Embuy
Firma de quien realiza la notificación

	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-02
		Fecha	28/07/2025
		Versión	5

1. DATOS PERSONALES

NOMBRE: Hector Manuel Paguay Jimenez — DOCUMENTO: 1003568421

DIRECCIÓN: Manz B casa A11 — TELÉFONO: No tiene

CARGO: Auxiliar de construcción — PROYECTO: Consorcio Cauce

TIPO DE CONTRATO: FIJO — ARL: ARL SURA

JEFE INMEDIATO: Marta Penagos B — FECHA: 24/09/2025

ETAPA: INDUCCIÓN [X] — REINDUCCIÓN [ ]

2. RESPONSABILIDADES EN EL SGSST



3. POLÍTICAS SIG









POLITICA DE USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



Política Ambiental





5. REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL



6. REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO




7. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST



RESPONSABILIDADES COPASST



8. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL - COCOLA

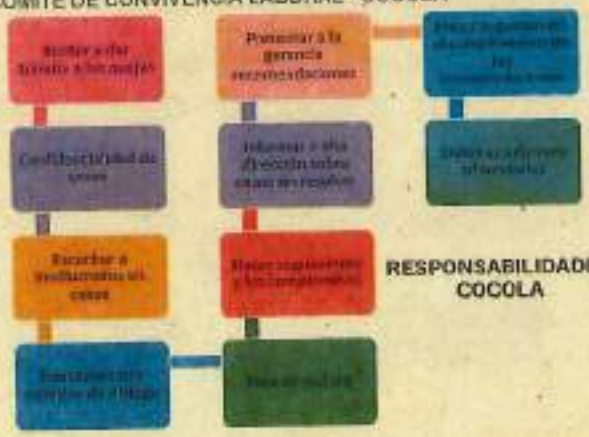

RESPONSABILIDADES COCOLA

Busca prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo, conforme lo establece la resolución 0652 del 30 de abril del año 2012.

Conformado por un Número Igual de Representantes del Empleador y de los Trabajadores con sus Respectivos Suplentes.


9. DEFINICIONES BÁSICAS















10. REPORTE DE INCIDENTES, ACCIENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES









11. PROGRAMAS AMBIENTALES



12. SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO

1. Pictograma
2. Palabra de advertencia
3. Frase de peligro



13. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS



14. ACOSO SEXUAL Y VIOLENCIA DE GENERO

Actualmente existen medidas integrales para prevenir, sancionar y erradicar el acoso sexual y violencia de género, en el ámbito laboral y educativo en Colombia.

Derechos y garantías Ley 3365 de 2026: Atención psicológica a través de la ARL, traslado de área, teletrabajo o terminación contractual sin penalización, confidencialidad y prohibición de confrontación con el agresor, entre otros.

Para investigados: Art 9:
Presunción de inocencia y derecho a conocer los cargos en 5 días hábiles





15. MANUAL DE FUNCIONES



Documento que detalla las responsabilidades, tareas, y requisitos de cada puesto de trabajo dentro de una organización. Sirve como guía para los empleados, define perfiles laborales, y facilita la gestión del talento humano.

16. EMERGENCIAS



RECURSOS INTERNOS PARA ATENDER EMERGENCIAS









La señalización de emergencia y evacuación es crucial para guiar a las personas de forma segura hacia las salidas en caso de situaciones críticas como incendios o terremotos

EMERGENCIAS POR DERRAME DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y/O COMBUSTIBLES



- Verificar la información sobre la sustancia derramada en la hoja de seguridad del producto
- Utilizar los elementos de protección personal
- Interrumpir la fuente del derrame para evitar que siga fluyendo el producto
- Contar el derrame utilizando redes flotantes o un dique con material absorbente
- Limpiar el derrame utilizando los paños absorbentes
- Disponer todos los residuos en los bolsos correspondientes.

He recibido a satisfacción la Induccion en Seguridad y Salud en el Trabajo y me comprometo a cumplir con los reglamentos y las normas de seguridad estipuladas por la empresa, así como, las establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo y en el Contrato de Trabajo

Hector Rayuso
Firma del Trabajador

José C Nav J.
Firma de quien realiza la inducción

	FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-03
		Fecha	28/07/2025
		Versión	5

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:	Hecta' M Paqueo Jimenez	DOCUMENTO:	1003568429
CARGO:	Auxiliar de construcción	ÁREA DE TRABAJO:	Consorcio Cauca
TEMA:	INDUCCIÓN X REINDUCCIÓN	FECHA:	24/09/2025

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - AMBIENTAL

Lea atentamente las siguientes preguntas y marque con una X la(s) respuesta(s) que considere correctas

1. Entre las siguientes opciones, seleccione TODAS aquellas que correspondan a políticas de la empresa — Puntaje: 10

a. Política SST 

b. Política de Vacaciones 

c. Política de Seguridad Vial 

d. Política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas 

2. Seleccione TRES (03) peligros a los cuales está expuesto en el desarrollo de las actividades de su cargo — Puntaje: 10

a. Picaduras y mordeduras 

b. Fenómenos Naturales 

c. Biomecánico 

d. Locativo 

e. Materiales radiactivos 

f. Eléctrico 

g. Tránsito 

h. Químico 

3. Seleccione UNA afirmación que describa por qué se debe implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa — Puntaje: 10

a. Para desmejorar las condiciones laborales de la empresa

b. Para que nos paguen mejor

c. Para evitar que se presenten accidentes de trabajo y enfermedades laborales

d. Todas las anteriores

4. Seleccione UNA afirmación que describa el Procedimiento a seguir para reportar un incidente o accidente de trabajo — Puntaje: 10

a. Informar al compañero de trabajo

b. Dirigirse a la clínica para recibir atención médica

c. Continuar laborando normalmente

d. Notificar al área SST o Jefe inmediato, recibir atención de primeros auxilios y dirigirse a centro médico, si es necesario

Lea atentamente las siguientes preguntas y enciérre en un círculo la(s) respuesta(s) que considere correctas

5. Encierre TODAS las fuentes prácticas que están relacionados con el autocuidado — Puntaje: 10



6. Encierre TODOS los recursos que sean necesarios para atender una emergencia — Puntaje: 10



Lea atentamente la siguiente pregunta y una con una línea la(s) respuesta(s) que considere correctas

7. Una con una línea cada uno de los residuos con alguna de las tres canecas para disposición — Puntaje: 10

Residuos



Canecas



INDUCCIÓN AL CARGO

Lea atentamente las siguientes preguntas y marque con una X la(s) respuesta(s) que considere correctas

8. De los siguientes documentos, seleccione cuál es la norma reguladora de las relaciones internas entre la empresa y el trabajador, que sirve de guía y herramienta para mantener el orden de la empresa — Puntaje: 10

a. Manual de Urbanidad y Buenas Maneras 

b. Manual de Ingeniero de Mantenimiento 

c. Reglamento Interno de Trabajo 


9. De los siguientes documentos, seleccione en cuál de ellos se establecen la funciones y responsabilidades del cargo que va a desempeñar en la empresa: — Puntaje: 10

a. Manual de Funciones 

b. Manual de Calidad 

c. Manual Eléctrico 

10. Seleccione opciones del ahorro de agua y energía. — Puntaje: 10



11. Según la ley 2365 de 2024, cuales son los derechos y las garantías para las víctimas:  — Puntaje: 10

a. Atención psicológica a través de la ARL y traslado de área, teletrabajo o terminación contractual sin penalización.

b. Confidencialidad y prohibición de confrontación con el agresor.

c. Protección contra represalias por denunciar (estabilidad laboral reforzada por 6 meses).

d. Todas las anteriores.

	FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-03
		Fecha	29/07/2025
		Versión	5

11. Los pictogramas es el SGA me permite verificar la peligrosidad de la sustancia o mezcla, enciarro las que informen alto grado de toxicidad.	Puntaje: 10	12. ¿Cuál de los siguientes enunciados refleja un compromiso de la empresa según su Política Integrada?	Puntaje: 10
		a. Solo cumplir con los requisitos del cliente para evitar sanciones.	
		b. Ejecutar obras sin considerar el impacto ambiental para cumplir con los plazos.	
		c. Promover condiciones de trabajo seguras, proteger el medio ambiente y satisfacer al cliente.	
		d. Aplicar mejoras al sistema de gestión únicamente cuando lo exija una auditoría externa.	
14. ¿Sabes dónde encontrar los formatos, políticas y procedimientos del SIG?	Puntaje: 10	13. ¿Dónde puedo ver la organización de los procesos de la empresa?	Puntaje: 10
a. Workflow	c. Trello	a. En el mapa de procesos del Sistema de Gestión Integrado (SGI), incluido en el manual de calidad.	c. Preguntando directamente a cualquier compañero de trabajo.
b. Buk-plan	d. copasst	b. En los estados financieros de la empresa.	d. En el cronograma de capacitaciones anuales.

Lea atentamente la siguiente pregunta y, enclave en un círculo la(s) respuesta(s) que considere correcta

16. Seleccione TODOS los aspectos que están establecidos en el Reglamento Interno de Trabajo	Puntaje: 10



17. De las siguientes afirmaciones cuales corresponden a nuestra Política Ambiental	Puntaje: 10
a. Reducción de la contaminación y protección del medio ambiente	b. Cumplimiento de la normatividad ambiental
c. Minimización de la generación de residuos	d. Todas las anteriores

18. Seleccione los Programas Ambientales que hacen parte del Sistema de Gestión:	Puntaje: 10
a. Uso y Ahorro Eficiente de Energía y Agua	c. Gestión integral de Residuos
b. Uso y Ahorro Eficiente de Papel	d. a, b y c. son correctas

PUNTAJE TOTAL: 100/100	FIRMA DEL TRABAJADOR: Hector Raguer	FIRMA DEL EVALUADOR: José Ospina
OBSERVACIONES:		

	FORMATO NOTIFICACIÓN DE RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	SST-F-06
CONSORCIO		VERSIÓN:	3
		FECHA:	2/01/2024
		PÁGINA	1 DE 1

A continuación, se describen los peligros asociados a la actividad a realizar y las recomendaciones a seguir para su mitigación

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS			RECOMENDACIONES
GRUPO	DESCRIPCIÓN	APLICA	
Biológico	Virus	✓	Inspección áreas, inspección y desinfección de elementos de trabajo (epp- dotación), lavado de manos e higiene personal), aplicación repelente, desinfección de áreas, uso de gel antibacterial- alcohol para desinfección. Uso obligatorio de EPP, informar diariamente sobre estado de salud, aplicar protocolo de limpieza y desinfección, vacunación
	Bacterias	✓	
	Hongos		
	Ricketsias		
	Picaduras	✓	
	Mordeduras		
	Fluidos o excrementos		
Físico	Ruido		Uso adecuado de epp, dotación manga larga, uso de protector solar, hidratación constante, realizar pausas activas.
	Iluminación		
	Vibración		
	Temperaturas extremas		
	Presión atmosférica		
	Radiaciones no ionizantes	✓	
	Radiaciones ionizantes		
Químico	Polvos orgánicos e inorgánicos		Uso adecuado de epp, conocer hojas de seguridad, etiquetado de sustancias químicas, ventilación
	Fibras		
	Líquidos		
	Gases y vapores		
	Humos metálicos, no metálicos	✓	
	Material particulado	✓	
Psicosocial	Gestión organizacional		Planeación de actividades, Realización de pausas activas, trabajo en equipo, comunicación asertiva.
	Características de la organización		
	Características del grupo social	✓	
	Condiciones de la tarea	✓	
	Interfase persona - tarea		
	Jornada de trabajo		
Biomecánicos	Posturas	✓	Levantamiento y movimiento de cargas adecuado, realización de pausas activas y calistenia, mantener una buena higiene postural, no exceder pesos permitidos.
	Esfuerzo	✓	
	Movimiento repetitivo	✓	
	Manipulación de cargas	✓	
Condiciones de seguridad	Mecánico	✓	Realizar inspecciones a epp, herramientas, equipos, áreas de trabajo, autocuidado, atender a normas de tránsito, reportar estado de salud, reporte de actos y condiciones inseguros, atender a señalización, certificación de competencias (cuando se requiera)
	Eléctrico		
	Locativo	✓	
	Tecnológico		
	Accidentes de tránsito	✓	
	Públicos	✓	
	Trabajo en alturas		
	Espacios confinados		
Fenómenos naturales	Sismos	✓	Ubicación de señalización de emergencia, autocuidado, reconocimiento de brigada.
	Terremotos		
	Vendaval		
	Inundación		
	Derrumbe		
	Precipitaciones		

Yo, Hector Manuel Raguejo Jimenez *identificado con documento* 1003 568921

declaro que he sido notificado de los riesgos a los cuales estoy expuesto para el cargo de Aux. de construcción

que desempeño en la empresa/proyecto Consorcio Cadce *desde la fecha* 21/09/25

Hector Raguejo
Firma del trabajador

José Nieto
Firma de quien realiza la notificación

Salud Ocupacional E.U.
Nit. 900.101.304-2

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

Código Prestador 6800103094



COD: F-PS-06

Versión: 5
Marzo 8 de 2019

EMPRESA CONTRATANTE PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS
EMPRESA EN MISIÓN PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS

TIPO CONSULTA: Ingreso
FECHA: 23/09/2025
NOMBRE: HECTOR MANUEL RAQUEJO JIMENEZ
CC: 1003568429 EDAD: 23 años
DIRECCIÓN: MAZ 12 CAS A 11
TELÉFONO: NO
CARGO: AYUDANTE DEGAVIONES
CIUDAD: Bucaramanga

A QUIEN SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES EXAMENES

EXAMEN MÉDICO CON ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR.

EXAMEN DE INGRESO

CONCEPTO: ***Cumple con el perfil del cargo***

CONDUCTA

OCUPACIONALES Control periódico ocupacional, Higiene Postural, Utilización de EPP,

Incluir en programas de vigilancia de acuerdo a los riesgos laborales prioritarios para el cargo definidos en la matriz de riesgos de la empresa

PP: Programa de promoción y prevención de la salud. Higiene oral semestral. Citología cervicovaginal anual. Control de testículo anual. Control de seno anual. Control de próstata anual

RECOMENDACIONES ESPECIFICAS

SE RECOMIENDA AUTOCUIDADO PERSONAL, SEGUIR PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO- MANEJO DE CARGAS Y POSTURAS

HE SIDO INFORMADO (A) DE LOS EXAMENES QUE VAN A REALIZARME Y DOY MI CONSENTIMIENTO PARA ELLO
CERTIFICO QUE NO HE OMITIDO INFORMACIÓN ACERCA DE MI ESTADO DE SALUD. TODO ES VERIDICO Y PUEDE SER CONFIRMADO

Dr. Javier Cáceres Báez
Salud Ocupacional
R.M. 02330 Lic. 04027

JAVIER CÁCERES BÁEZ - Esp. Salud Ocupacional -
R.M. 02330 - Licencia 04027

Firma del Trabajador C.C 1003568429

	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-02
CONSORCIO		Fecha	28/07/2025
		Versión	5

1. DATOS PERSONALES

NOMBRE: Yerisson Fabian Valdés Parra — DOCUMENTO: 1066880177

DIRECCIÓN: Altos del poblado — TELÉFONO: 3144856616

CARGO: Ayudante de Construcción — PROYECTO: Consorcio Cauce

TIPO DE CONTRATO: FIJO — ARL: Sura

JEFE INMEDIATO: Martin Peñaranda — FECHA: 24/09/2025

ETAPA — INDUCCIÓN: X — REINDUCCIÓN:

2. RESPONSABILIDADES EN EL SGSST



3. POLÍTICAS SIG









POLITICA DE USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



Política Ambiental





5. REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL



6. REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO



7. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST



RESPONSABILIDADES COPASST



8. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL - COCOLA



RESPONSABILIDADES COCOLA

Busca prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo, conforme lo establece la resolución 0652 del 30 de abril del año 2012.

Conformado por un Número Igual de Representantes del Empleador y de los Trabajadores con sus Respectivos Suplentes.


9. DEFINICIONES BÁSICAS











Todo debe ser reportado e investigado





10. REPORTE DE INCIDENTES, ACCIENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES









11. PROGRAMAS AMBIENTALES









12. SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO

1. Etiquetas
2. Etiquetas
3. Hojas de datos de seguridad



13. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS



14. ACOSO SEXUAL Y VIOLENCIA DE GENERO

Estrategias y medidas integrales para prevenir, proteger y atender el acoso sexual y violencia de género, en el ámbito laboral y educativo en Colombia.

Derechos y garantías Ley 2365 de 2024: Atención psicológica a través de la ARL, traslado de sitio, incapacidad o terminación contractual sin penalización, confidencialidad y prohibición de confrontación con el agresor, entre otros.

Para investigados, Art 6:
Presunción de inocencia y derecho a conocer los cargos en 3 días hábiles





15. MANUAL DE FUNCIONES



Documento que detalla las responsabilidades, tareas, y requisitos de cada puesto de trabajo dentro de una organización. Sirve como guía para los empleados, define perfiles laborales, y facilita la gestión del talento humano.

16. EMERGENCIAS

Eventos imprevistos que ponen en peligro la vida, integridad física de las personas y pueden generar daños materiales graves y afectar el funcionamiento normal de la empresa.

Emergencias

- INCENDIOS
- DESLIZAMIENTOS
- EXPLOSIONES
- INUNDACIONES
- ATENTADOS
- SISMOS



Contingencias adicionales

- INCENDIOS
- DERRAMES Y FUGAS
- DESLIZAMIENTOS



RECURSOS INTERNOS PARA ATENDER EMERGENCIAS

Camilla - Botiquín - Extintor - Equipo Personal Alarma - Equipo antiderrames



Rigalos





Uso de señalización segura y eficiente, un lugar seguro donde podrás manipular si se lo necesita a todo el personal, alumnado y el estado en que se encuentra el mismo.



La señalización de emergencia y evacuación es crucial para guiar a las personas de forma segura hacia las salidas en caso de situaciones críticas como incendios o terremotos

EMERGENCIAS POR DERRAME DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y/O COMBUSTIBLES



- Verificar la información sobre la cantidad derramada en la hoja de seguridad del producto
- Utilizar los elementos de protección personal
- Interrumpir la fuente del derrame para evitar que siga fluyendo el producto
- Contar el derrame utilizando estas formando un dique con material absorbente
- Limpiar el derrame utilizando los paños absorbentes
- Recoger todos los residuos en las bolsas correspondientes.

He recibido a satisfacción la Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo y me comprometo a cumplir con los reglamentos y las normas de seguridad estipuladas por la empresa, así como, las establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo y en el Contrato de Trabajo.

Yetson Varon
Firma del Trabajador

Firma de quien realiza la inducción

	FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-03
		Fecha	28/07/2025
		Versión	5

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:	Harrison Ferley Ulrán Parra	DOCUMENTO:	1106486177
CARGO:	Auxiliar de Construcción	AREA DE TRABAJO:	Comercio Calle
TEMA:	INDUCCIÓN X REINDUCCIÓN	FECHA:	24/09/2025

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - AMBIENTAL

Lea atentamente las siguientes preguntas y marque con una X la(s) respuesta(s) que considere correctas

1. Entre las siguientes opciones, seleccione TODAS aquellas que correspondan a políticas de la empresa — Puntaje: 10

a. Política SST 

b. Política de Vacaciones 

c. Política de Seguridad Vial 

d. Política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas 

2. Seleccione TRES (03) peligros a los cuales está expuesto en el desarrollo de las actividades de su cargo — Puntaje: 10

a. Picaduras y mordeduras 

b. Fenómenos Naturales 

c. Biomecánico 

d. Locativo 

e. Materiales radiactivos 

f. Eléctrico 

g. Triturado 

h. Químico 

3. Seleccione UNA afirmación que describa por qué se debe implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa — Puntaje: 10

a. Para desmejorar las condiciones laborales de la empresa

b. Para que nos paguen mejor

c. Para evitar que se presenten accidentes de trabajo y enfermedades laborales

d. Todas las anteriores

4. Seleccione UNA afirmación que describa el Procedimiento a seguir para reportar un incidente o accidente de trabajo — Puntaje: 10

a. Informar al compañero de trabajo

b. Dirigirse a la clínica para recibir atención médica

c. Continuar laborando normalmente

d. Notificar al área SST o Jefe inmediato, recibir atención de primeros auxilios y dirigirse a centro médico, si es necesario

Lea atentamente las siguientes preguntas y encierre en un círculo la(s) respuesta(s) que considere correctas

5. Encierre TODAS las buenas prácticas que estén relacionadas con el autocuidado — Puntaje: 10



6. Encierre TODOS los recursos que sean necesarios para atender una emergencia — Puntaje: 10



Lea atentamente la siguiente pregunta y una con una línea la(s) respuesta(s) que considere correctas

7. Una con una línea cada uno de los residuos con alguna de las tres canecas para disposición — Puntaje: 10

Residuos



Canecas



INDUCCIÓN AL CARGO

Lea atentamente las siguientes preguntas y marque con una X la(s) respuesta(s) que considere correctas

8. De los siguientes documentos, seleccione cuál es la norma reguladora de las relaciones internas entre la empresa y el trabajador, que sirve de guía y herramienta para mantener el orden de la empresa — Puntaje: 10

a. Manual de Urbanidad y Buenos Maneras 

b. Manual de Ingeniero de Mantenimiento 

c. Reglamento Interno de Trabajo 

9. De los siguientes documentos, seleccione es cuál de ellos se establecen la funciones y responsabilidades del cargo que va a desempeñar en la empresa: — Puntaje: 10

a. Manual de Funciones 

b. Manual de Calidad 

c. Manual Estético 

10. Seleccione opciones del ahorro de agua y energía. — Puntaje: 10



11. Según la ley 1565 de 2024, cuales son los derechos y las garantías para las víctimas:  — Puntaje: 10

a. Atención psicológica a través de la ARL y traslado de área, teletrabajo o terminación contractual sin penalización.

b. Confidencialidad y prohibición de confrontación con el agresor.

c. Protección contra represalias por denunciar (estabilidad laboral reforzada por 6 meses).

d. Todas las anteriores.

	FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-03
		Fecha	28/07/2025
		Versión	5

13. Los pictogramas de el SGA me permite verificar la peligrosidad de la sustancia o mezcla, encierre los que informen alto grado de toxicidad.	Puntaje: 10	12. ¿Cuál de los siguientes enunciados refleja un compromiso de la empresa según su Política Integrada?	Puntaje: 10
		a. Solo cumplir con los requisitos del cliente para evitar sanciones.	
		b. Ejecutar obras sin considerar el impacto ambiental para cumplir con los plazos.	
		c. Promover condiciones de trabajo seguras, proteger el medio ambiente y satisfacer al cliente.	
		d. Aplicar mejoras al sistema de gestión únicamente cuando lo exija una auditoría externa.	

14. ¿Sabes dónde encontrar los formatos, políticas y procedimientos del SIG?	Puntaje: 10	15. ¿Dónde puedo veo la organización de los procesos de la empresa?	Puntaje: 10
a. Workflow	c. Trello	a. En el mapa de procesos del Sistema de Gestión Integrado (SGI), incluido en el manual de calidad.	c. Preguntando directamente a cualquier compañero de trabajo.
b. Bukiplan	d. cupassi	b. En los estados financieros de la empresa.	d. En el cronograma de capacitaciones anuales.

Lea atentamente la siguiente pregunta y encierre en un círculo la(s) respuesta(s) que considere correctas

16. Seleccione TODOS los aspectos que están establecidos en el Reglamento Interno de Trabajo	Puntaje: 10



17. De las siguientes afirmaciones cuales corresponden a nuestra Política Ambiental	Puntaje: 10
a. Reducción de la contaminación y protección del medio ambiente	b. Cumplimiento de la normatividad ambiental
c. Minimización de la generación de residuos	d. Todas las anteriores

18. Seleccione los Programas Ambientales que hacen parte del Sistema de Gestión:	Puntaje: 10
a. Uso y Ahorro Eficiente de Energía y Agua	c. Gestión Integral de Residuos
b. Uso y Ahorro Eficiente de Papel	d. a, b y c son correctas

PUNTAJE TOTAL: 100/100	FIRMA DEL TRABAJADOR: Yeysson Lozano	FIRMA DEL EVALUADOR: Jhon Mejía
OBSERVACIONES:		

	FORMATO NOTIFICACIÓN DE RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	SST-F-06
		VERSIÓN:	3
		FECHA:	2/01/2024
		PÁGINA	1 DE 1

A continuación, se describen los peligros asociados a la actividad a realizar y las recomendaciones a seguir para su mitigación

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS			RECOMENDACIONES
GRUPO	DESCRIPCIÓN	APLICA	
Biológico	Virus	✓	Inspección áreas, inspección y desinfección de elementos de trabajo (epp- dotación), lavado de manos e higiene personal), aplicación repelente, desinfección de áreas, uso de gel antibacterial- alcohol para desinfección. Uso obligatorio de EPP, informar diariamente sobre estado de salud, aplicar protocolo de limpieza y desinfección, vacunación
	Bacterias	✓	
	Hongos		
	Ricketsias	✓	
	Picaduras	✓	
	Mordeduras		
	Fluidos o excrementos		
Físico	Ruido		Uso adecuado de epp, dotación manga larga, uso de protector solar, hidratación constante, realizar pausas activas.
	Iluminación		
	Vibración		
	Temperaturas extremas		
	Presión atmosférica		
	Radiaciones no ionizantes	✓	
	Radiaciones ionizantes		
Químico	Polvos orgánicos e inorgánicos		Uso adecuado de epp, conocer hojas de seguridad, etiquetado de sustancias químicas, ventilación
	Fibras		
	Líquidos		
	Gases y vapores		
	Humos metálicos, no metálicos		
	Material particulado	✓	
Psicosocial	Gestión organizacional		Planeación de actividades, Realización de pausas activas, trabajo en equipo, comunicación asertiva.
	Características de la organización		
	Características del grupo social		
	Condiciones de la tarea	✓	
	Interfase persona - tarea		
	Jornada de trabajo	✓	
Biomecánicos	Posturas	✓	Levantamiento y movimiento de cargas adecuado, realización de pausas activas y calistenia, mantener una buena higiene postural, no exceder pesos permitidos.
	Esfuerzo	✓	
	Movimiento repetitivo	✓	
	Manipulación de cargas	✓	
Condiciones de seguridad	Mecánico	✓	Realizar inspecciones a epp, herramientas, equipos, áreas de trabajo, autocuidado, atender a normas de tránsito, reportar estado de salud, reporte de actos y condiciones inseguras, atender a señalización, certificación de competencias (cuando se requiera)
	Eléctrico		
	Locativo	✓	
	Tecnológico		
	Accidentes de tránsito	✓	
	Públicos	✓	
	Trabajo en alturas		
	Espacios confinados		
Fenómenos naturales	Sismos	✓	Ubicación de señalización de emergencia, autocuidado, reconocimiento de brigada.
	Terremotos		
	Vendaval		
	Inundación		
	Derrumbe		
	Precipitaciones		

Yo, Yeyson Yerley Varón Parra identificado con documento 1106986177

declaro que he sido notificado de los riesgos a los cuales estoy expuesto para el cargo de Ayudeconstrucción

que desempeño en la empresa/proyecto consorcio cauce desde la fecha 29/09/25

Yeyson Varon
Firma del trabajador

Jair O Ballesteros
Firma de quien realiza la notificación

Salud Ocupacional E.U. Nit. 900.101.304-2	**CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL** Código Prestador 6800103094		COD: F-PS-06 Versión: 5 Marzo 8 de 2019

EMPRESA CONTRATANTE PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS
EMPRESA EN MISIÓN PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS

TIPO CONSULTA: Ingreso
NOMBRE: YEYSSON FERLEY VARON PARRA
DIRECCIÓN: ALTOS POBLADO
CARGO: AYUDANTE GAVIONES

FECHA: 23/09/2025
CC: 1106486177 EDAD: 29 años
TELÉFONO: 3144856816
CIUDAD: Bucaramanga

A QUIEN SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES EXAMENES

EXAMEN MÉDICO CON ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR.

EXAMEN DE INGRESO

CONCEPTO: ***Cumple con el perfil del cargo***

CONDUCTA

OCUPACIONALES Control periódico ocupacional, Higiene Postural, Utilización de EPP.

Incluir en programas de vigilancia de acuerdo a los riesgos laborales prioritarios para el cargo definidos en la matriz de riesgos de la empresa

PP: Programa de promoción y prevención de la salud. Higiene oral semestral. Citología cervicovaginal anual. Control de testículo anual. Control de seno anual. Control de próstata anual

RECOMENDACIONES ESPECIFICAS

SE RECOMIENDA AUTOCUIDADO PERSONAL, SEGUIR PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO- MANEJO DE CARGA SY POSTURAS

HE SIDO INFORMADO (A) DE LOS EXAMENES QUE VAN A REALIZARME Y DOY MI CONSENTIMIENTO PARA ELLO
CERTIFICO QUE NO HE OMITIDO INFORMACIÓN ACERCA DE MI ESTADO DE SALUD. TODO ES VERIDICO Y PUEDE SER CONFIRMADO

Dr. Javier Cáceres Báez
Salud Ocupacional
R.M. 02330 lic. 04027

JAVIER CACERES BAEZ - Esp. Salud Ocupacional -
R.M. 02330 - Licencia 04027

Firma del Trabajador C.C 1106486177

	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-02
CONSORCIO		Fecha	28/07/2025
		Versión	5

1. DATOS PERSONALES

NOMBRE: Edwin Sarcite Hernandez — DOCUMENTO: 1129242098

DIRECCIÓN: Altos del Potrero — TELÉFONO: 3112540814

CARGO: Auxiliar de construcción — PROYECTO: Consorcio Cauce

TIPO DE CONTRATO: FIJO — ARL: SURA

JEFE INMEDIATO: Martín Panadero — FECHA: 24/09/2025

ETAPA: INDUCCIÓN [X] — REINDUCCIÓN [ ]

2. RESPONSABILIDADES EN EL SGSST



3. POLÍTICAS SIG









POLITICA DE USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL




Política Ambiental





5. REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

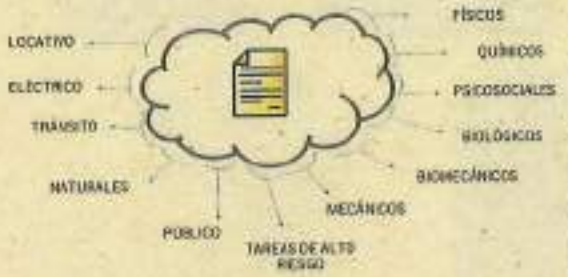

6. REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO



7. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST



RESPONSABILIDADES COPASST



8. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL - COCOLA



RESPONSABILIDADES COCOLA

Busca prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo, conforme lo establece la resolución 0652 del 30 de abril del año 2012.

Conformado por un Número Igual de Representantes del Empleador y de los Trabajadores con sus Respectivos Suplentes.


9. DEFINICIONES BÁSICAS















10. REPORTE DE INCIDENTES, ACCIENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES









11. PROGRAMAS AMBIENTALES









12. SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO



13. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS



14. ACOSO SEXUAL Y VIOLENCIA DE GENERO





15. MANUAL DE FUNCIONES



Documento que detalla las responsabilidades, tareas, y requisitos de cada puesto de trabajo dentro de una organización. Sirve como guía para los empleados, define perfiles laborales, y facilita la gestión del talento humano.

16. EMERGENCIAS



La señalización de emergencia y evacuación es crucial para guiar a las personas de forma segura hacia las salidas en caso de situaciones críticas como incendios o terremotos

He recibido a satisfacción la Induccion en Seguridad y Salud en el Trabajo y me comprometo a cumplir con los reglamentos y las normas de seguridad estipuladas por la empresa, así como, las establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo y en el Contrato de Trabajo.

Edwin Garcia
Firma del Trabajador

Firma de quien realiza la inducción

	FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-03
		Fecha	28/07/2025
		Versión	5

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:	Edwin Sabate Hernandez	DOCUMENTO:	1124292078
CARGO:	Auxiliar de Construcción	AREA DE TRABAJO:	Consorcio Cauce
TEMA:	INDUCCIÓN X REINDUCCIÓN	FECHA:	24/09/2025

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - AMBIENTAL

Lea atentamente las siguientes preguntas y marque con una X la(s) respuesta(s) que considere correctas

1. Entre las siguientes opciones, seleccione TODAS aquellas que correspondan a políticas de la empresa — Puntaje: 3

a. Política SST 

b. Política de Vacaciones 

c. Política de Seguridad Vial 

d. Política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas 

2. Seleccione TRES (03) peligros a los cuales está expuesto en el desarrollo de las actividades de su cargo — Puntaje: 10

a. Picaduras y mordeduras 

b. Fenómenos Naturales 

c. Biomecánico 

d. Locativo 

e. Materiales radiactivos 

f. Eléctrico 

g. Tránsito 

h. Químico 

3. Seleccione UNA afirmación que describa por qué se debe implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa — Puntaje: 10

a. Para desmejorar las condiciones laborales de la empresa

b. Para que nos paguen mejor

c. Para evitar que se presenten accidentes de trabajo y enfermedades laborales

d. Todas las anteriores

4. Seleccione UNA afirmación que describa el Procedimiento a seguir para reportar un incidente o accidente de trabajo — Puntaje: 10

a. Informar al compañero de trabajo

b. Dirigirse a la clínica para recibir atención médica

c. Continuar laborando normalmente

d. Notificar al área SST o Jefe Inmediato, recibir atención de primeros auxilios y dirigirse a centro médico, si es necesario

Lea atentamente las siguientes preguntas y enciérre en un círculo la(s) respuesta(s) que considere correctas

5. Encierre TODAS las buenas prácticas que están relacionadas con el autocuidado — Puntaje: 10



6. Encierre TODOS los recursos que sean necesarios para atender una emergencia — Puntaje: 10




Lea atentamente la siguiente pregunta y una con una línea la(s) respuesta(s) que considere correctas

7. Una con una línea cada uno de los residuos con alguna de las tres canecas para disposición — Puntaje: 10

Residuos

Canecas



INDUCCIÓN AL CARGO

Lea atentamente las siguientes preguntas y marque con una X la(s) respuesta(s) que considere correctas

8. De los siguientes documentos, seleccione cuál es la norma reguladora de las relaciones internas entre la empresa y el trabajador, que sirve de guía y herramienta para mantener el orden de la empresa — Puntaje: 10

a. Manual de Urbanidad y Buenas Maneras 

b. Manual de Ingeniero de Mantenimiento 

c. Reglamento Interno de Trabajo 


9. De los siguientes documentos, seleccione en cuál de ellos se establecen la funciones y responsabilidades del cargo que va a desempeñar en la empresa: — Puntaje: 10

a. Manual de Funciones 

b. Manual de Calidad 

c. Manual Escolar 

10. Seleccione opciones del ahorro de agua y energía. — Puntaje: 10



11. Según la ley 2365 de 2024, cuales son los derechos y las garantías para las víctimas :  — Puntaje: 10

a. Atención psicológica a través de la ARL y traslado de área, teletrabajo o terminación contractual sin penalización.

b. Confidencialidad y prohibición de confrontación con el agresor.

c. Protección contra represalias por denuncia (estabilidad laboral reforzada por 6 meses).

d. Todas las anteriores.

	FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-03
		Fecha	28/07/2025
		Versión	5

12. Los pictogramas en el SGA me permite verificar la peligrosidad de la sustancia o mezcla, escriba las que informen alto grado de toxicidad.	Puntaje: 10	13. ¿Cuál de los siguientes enunciados refleja un compromiso de la empresa según su Política Integrada?	Puntaje: 10
		a. Solo cumplir con los requisitos del cliente para evitar sanciones.	
		b. Ejecutar obras sin considerar el impacto ambiental para cumplir con los plazos.	
		c. Promover condiciones de trabajo seguras, proteger el medio ambiente y satisfacer al cliente.	
		d. Aplicar mejoras al sistema de gestión únicamente cuando lo exija una auditoría externa.	
14. ¿Sabes dónde encontrar los formatos, políticas y procedimientos del SIG?	Puntaje: 10	15. ¿Dónde puedo ver la organización de los procesos de la empresa?	Puntaje: 10
a. Workflow	c. Trello	a. En el mapa de procesos del Sistema de Gestión Integrado (SGI), incluido en el manual de calidad.	c. Preguntando directamente a cualquier compañero de trabajo.
b. Buk-plan	d. copass!	b. En los estados financieros de la empresa.	d. En el cronograma de capacitaciones anuales.

Lea atentamente la siguiente pregunta y encierre en un círculo la(s) respuesta(s) que considere correcta

16. Seleccione TODOS los aspectos que están establecidos en el Reglamento Interno de Trabajo	Puntaje: 10



17. De las siguientes afirmaciones cuales corresponden a nuestra Política Ambiental	Puntaje: 10
a. Reducción de la contaminación y protección del medio ambiente	b. Cumplimiento de la normatividad ambiental
c. Minimización de la generación de residuos	d. Todas las anteriores

18. Seleccione los Programas Ambientales que hacen parte del Sistema de Gestión:	Puntaje: 10
a. Uso y Ahorro Eficiente de Energía y Agua	c. Gestión Integral de Residuos
b. Uso y Ahorro Eficiente de Papel	d. a, b y c son correctas

PUNTAJE TOTAL: 100/100	FIRMA DEL TRABAJADOR: Edwin Sarute	FIRMA DEL EVALUADOR: José Astudillo
OBSERVACIONES:		

	FORMATO NOTIFICACIÓN DE RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	SST-F-06
		VERSIÓN:	3
		FECHA:	2/01/2024
		PÁGINA	1 DE 1

A continuación, se describen los peligros asociados a la actividad a realizar y las recomendaciones a seguir para su mitigación

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS			RECOMENDACIONES
GRUPO	DESCRIPCIÓN	APLICA	
Biológico	Virus	✓	Inspección áreas, inspección y desinfección de elementos de trabajo (epp- dotación), lavado de manos e higiene personal), aplicación repelente, desinfección de áreas, uso de gel antibacterial- alcohol para desinfección. Uso obligatorio de EPP, informar diariamente sobre estado de salud, aplicar protocolo de limpieza y desinfección, vacunación
	Bacterias	✓	
	Hongos		
	Ricketsias		
	Picaduras	✓	
	Mordeduras	✓	
	Fluidos o excrementos		
Físico	Ruido		Uso adecuado de epp, dotación manga larga, uso de protector solar, hidratación constante, realizar pausas activas.
	Iluminación		
	Vibración		
	Temperaturas extremas		
	Presión atmosférica	✓	
	Radiaciones no ionizantes		
	Radiaciones ionizantes		
Químico	Polvos orgánicos e inorgánicos		Uso adecuado de epp, conocer hojas de seguridad, etiquetado de sustancias químicas, ventilación
	Fibras		
	Líquidos		
	Gases y vapores		
	Humos metálicos, no metálicos		
	Material particulado	✓	
Psicosocial	Gestión organizacional		Planeación de actividades, Realización de pausas activas, trabajo en equipo, comunicación asertiva.
	Características de la organización		
	Características del grupo social		
	Condiciones de la tarea	✓	
	Interfase persona - tarea		
	Jornada de trabajo		
Biomecánicos	Posturas	✓	Levantamiento y movimiento de cargas adecuado, realización de pausas activas y calistenia, mantener una buena higiene postural, no exceder pesos permitidos.
	Esfuerzo	✓	
	Movimiento repetitivo	✓	
	Manipulación de cargas		
Condiciones de seguridad	Mecánico	✓	Realizar inspecciones a epp, herramientas, equipos, áreas de trabajo, autocuidado, atender a normas de tránsito, reportar estado de salud, reporte de actos y condiciones inseguras, atender a señalización, certificación de competencias (cuando se requiera)
	Eléctrico		
	Locativo	✓	
	Tecnológico		
	Accidentes de tránsito	✓	
	Públicos	✓	
	Trabajo en alturas		
	Espacios confinados		
Fenómenos naturales	Sismos	✓	Ubicación de señalización de emergencia, autocuidado, reconocimiento de brigada.
	Terremotos		
	Vendaval		
	Inundación		
	Derrumbe		
	Precipitaciones		

Yo, Edwin Zarate Hernandez identificado con documento 1124242098

declaro que he sido notificado de los riesgos a los cuales estoy expuesto para el cargo de Aux de construcción

que desempeño en la empresa/proyecto Consorcio Cauce desde la fecha 24/09/25

Edwin Zarate
Firma del trabajador

Firma de quien realiza la notificación

Salud Ocupacional E.U.	**CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL** Código Prestador 6800103094		COD: F-PS-06 Versión: 5 Marzo 8 de 2019

EMPRESA CONTRATANTE PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS
EMPRESA EN MISIÓN PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS

TIPO CONSULTA: Ingreso
FECHA: 23/09/2025
NOMBRE: EDWIN SARATE HERNANDEZ
CC: 1124242078 EDAD: 30 años
DIRECCIÓN: ALTOS POBLADO
TELÉFONO: 3112540814
CARGO: AYUDANTE DE GAVIONES
CIUDAD: Bucaramanga

A QUIEN SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES EXAMENES

EXAMEN MÉDICO CON ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR.

EXAMEN DE INGRESO

CONCEPTO: ***Cumple con el perfil del cargo***

CONDUCTA

OCUPACIONALES Control periódico ocupacional, Higiene Postural, Utilización de EPP,

Incluir en programas de vigilancia de acuerdo a los riesgos laborales prioritarios para el cargo definidos en la matriz de riesgos de la empresa

PP: Programa de promoción y prevención de la salud. Higiene oral semestral, Citología cervicovaginal anual, Control de testículo anual, Control de seno anual, Control de prostata anual

RECOMENDACIONES ESPECIFICAS

SE RECOMIENDA AUTOCUIDADO PERSONAL, SEGUIR PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO- MANEJO DE CARGA SY POSTURAS

HE SIDO INFORMADO (A) DE LOS EXAMENES QUE VAN A REALIZARME Y DOY MI CONSENTIMIENTO PARA ELLO
CERTIFICO QUE NO HE OMITIDO INFORMACIÓN ACERCA DE MI ESTADO DE SALUD. TODO ES VERIDICO Y PUEDE SER CONFIRMADO

Dr. Javier Cáceres Báez
Salud Ocupacional
R.M. 02330 Lic. 04027

JAVIER CÁCERES BÁEZ - Esp. Salud Ocupacional -
R.M. 02330 - Licencia 04027

Edwin Sarate

Firma del Trabajador C.C 1124242078

	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-02
		Fecha	28/07/2025
		Versión	5

1. DATOS PERSONALES

NOMBRE Yerson Duvan Alfonso Romero DOCUMENTO 1124244418

DIRECCIÓN Alto del Roble TELÉFONO 3215256491

CARGO Auxiliar de construcción PROYECTO Consorcio Cauca

TIPO DE CONTRATO FIJO ARL SURA

JEFE INMEDIATO Martin Arevalo FECHA 24/07/2025

ETAPA INDUCCIÓN X REINDUCCIÓN

2. RESPONSABILIDADES EN EL SGSST



3. POLÍTICAS SIG









POLITICA DE USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



Política Ambiental





5. REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL



6. REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO



7. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST



RESPONSABILIDADES COPASST



8. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL - COCOLA



RESPONSABILIDADES COCOLA

Busca prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo, conforme lo establece la resolución 0652 del 30 de abril del año 2012.

Conformado por un Número Igual de Representantes del Empleador y de los Trabajadores con sus Respectivos Suplentes.


9. DEFINICIONES BÁSICAS















10. REPORTE DE INCIDENTES, ACCIENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES









11. PROGRAMAS AMBIENTALES









12. SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO



13. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS



14. ACOSO SEXUAL Y VIOLENCIA DE GENERO

Establecer medidas tendientes para prevenir, proteger y atender el acoso sexual y violencia de género en el ámbito laboral y educativo en Colombia.

Derechos y garantías Ley 2365 de 2024: Atención psicológica a través de la EPS, cuidado de voz, alternativa o terminación consensual sin penalización, confidencialidad y protección de confrontación con el agresor, entre otros.

Para investigados: Art 6°
Presunción de inocencia y derecho a conocer los cargos en 5 días hábiles





15. MANUAL DE FUNCIONES



Documento que detalla las responsabilidades, tareas, y requisitos de cada puesto de trabajo dentro de una organización. Sirve como guía para los empleados, define perfiles laborales, y facilita la gestión del talento humano.

16. EMERGENCIAS



La señalización de emergencia y evacuación es crucial para guiar a las personas de forma segura hacia las salidas en caso de situaciones críticas como incendios o terremotos

He recibido a satisfacción la Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo y me comprometo a cumplir con los reglamentos y las normas de seguridad estipuladas por la empresa, así como, las establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo y en el Contrato de Trabajo.

Firma del Trabajador

Firma de quien realiza la inducción

	FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-03
		Fecha	29/07/2025
		Versión	5

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:	Yeison Dubain Alfonso R	DOCUMENTO:	1129 2411 18
CARGO:	Auxiliar de Construccion	AREA DE TRABAJO:	Consorcio Calle
TEMA:	INDUCCIÓN X REINDUCCIÓN	FECHA:	24/09/2025

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - AMBIENTAL

Lea atentamente las siguientes preguntas y marque con una X la(s) respuesta(s) que considere correctas

1. Entre las siguientes opciones, seleccione TODAS aquellas que correspondan a políticas de la empresa — Puntaje: 10

a. Política SST 

b. Política de Vacaciones 

c. Política de Seguridad Vial 

d. Política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas 

2. Seleccione TRES (03) peligros a los cuales está expuesto en el desarrollo de las actividades de su cargo — Puntaje: 10

a. Picaduras y mordeduras 

b. Fenómenos Naturales 

c. Biomecánico 

d. Locativo 

e. Materiales radiactivos 

f. Eléctrico 

g. Mecánico 

h. Químico 

3. Seleccione UNA afirmación que describa por qué se debe implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa — Puntaje: 10

a. Para disminuir las condiciones laborales de la empresa

b. Para que nos paguen mejor

c. Para evitar que se presenten accidentes de trabajo y enfermedades laborales

d. Todas las anteriores

4. Seleccione UNA afirmación que describa el Procedimiento a seguir para reportar un incidente o accidente de trabajo — Puntaje: 10

a. Informar al compañero de trabajo

b. Dirigirse a la clínica para recibir atención médica

c. Continuar laborando normalmente


d. Notificar al área SST o Jefe Inmediato, recibir atención de primeros auxilios y dirigirse a centro médico, si es necesario

Lea atentamente las siguientes preguntas y encierre en un círculo la(s) respuesta(s) que considere correctas

5. Encierre TODAS las buenas prácticas que estén relacionadas con el autocuidado — Puntaje: 10



6. Encierre TODOS los recursos que sean necesarios para atender una emergencia — Puntaje: 10



Lea atentamente la siguiente pregunta y una con una línea la(s) respuesta(s) que considere correctas

7. Una con una línea cada uno de los residuos con alguna de las tres canecas para disposición — Puntaje: 10

Residuos



Canecas



INDUCCIÓN AL CARGO

Lea atentamente las siguientes preguntas y marque con una X la(s) respuesta(s) que considere correctas

8. De los siguientes documentos, seleccione cuál es la norma reguladora de las relaciones internas entre la empresa y el trabajador, que sirve de guía y herramienta para mantener el orden de la empresa — Puntaje: 10

a. Manual de Urbanidad y Buenas Maneras 

b. Manual de Ingeniero de Mantenimiento 

c. Reglamento Interno de Trabajo 


9. De los siguientes documentos, seleccione en cual de ellos se establecen la funciones y responsabilidades del cargo que va a desempeñar en la empresa: — Puntaje: 10

a. Manual de Funciones 

b. Manual de Calidad 

c. Manual Estética 

10. Seleccione opciones del ahorro de agua y energía. — Puntaje: 10



11. Segun la ley 2365 de 2024, cuales son los derechos y las garantías para las víctimas :  — Puntaje: 10

a. Atención psicológica a través de la ARL y traslado de área, teletrabajo o terminación contractual sin penalización.

b. Confidencialidad y prohibición de confrontación con el agresor.

c. Protección contra represalias por denunciar (estabilidad laboral reforzada por 6 meses).

d. Todas las anteriores.

	FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-03
		Fecha	28/07/2025
		Versión	0

12. Los pictogramas en el SGA nos permite verificar la peligrosidad de la sustancia o mezcla, escierre las que informen alto grado de toxicidad.	Puntaje: 10	13. ¿Cual de los siguientes enunciados refleja un compromiso de la empresa según su Política Integrada?	Puntaje: 10
		a. Solo cumplir con los requisitos del cliente para evitar sanciones.	
		b. Ejecutar obras sin considerar el impacto ambiental para cumplir con los plazos.	
		c. Promover condiciones de trabajo seguras, proteger el medio ambiente y satisfacer al cliente.	
		d. Aplicar mejoras al sistema de gestión únicamente cuando lo exija una auditoría externa.	

14. ¿Sabes dónde encontrar los formatos, políticas y procedimientos del SIG?	Puntaje: 10	15. ¿Dónde puedo veo la organización de los procesos de la empresa?	Puntaje: 10
a. Workflow	c. Trello	a. En el mapa de procesos del Sistema de Gestión Integrado (SGI), incluido en el manual de calidad.	c. Preguntando directamente a cualquier compañero de trabajo.
b. Bus-plan	d. copasst	b. En los estados financieros de la empresa.	d. En el cronograma de capacitaciones anuales.

Lea atentamente la siguiente pregunta y encierre en un círculo la(s) respuesta(s) que considere correcta

16. Seleccione TODOS los aspectos que están establecidos en el Reglamento Interno de Trabajo					Puntaje: 10
 Permisos	 Horario de Trabajo	 Incapacidades	 Obligaciones, faltas y sanciones	 Proceso Disciplinario	

17. De las siguientes afirmaciones cuales corresponden a nuestra Política Ambiental:	Puntaje: 10
a. Reducción de la contaminación y protección del medio ambiente	b. Cumplimiento de la normatividad ambiental
c. Minimización de la generación de residuos	d. Todas las anteriores

18. Selecciona los Programas Ambientales que hacen parte del Sistema de Gestión:	Puntaje: 10
a. Uso y Ahorro Eficiente de Energía y Agua	c. Gestión Integral de Residuos
b. Uso y Ahorro Eficiente de Papel	d. a,b y c son correctas

PUNTAJE TOTAL: 100/100	FIRMA DEL TRABAJADOR:	FIRMA DEL EVALUADOR:
OBSERVACIONES:		

	FORMATO NOTIFICACION DE RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	SST-F-06
CONSORCIO		VERSIÓN:	3
		FECHA:	2/01/2024
		PÁGINA	1 DE 1

A continuación, se describen los peligros asociados a la actividad a realizar y las recomendaciones a seguir para su mitigación

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS			RECOMENDACIONES
GRUPO	DESCRIPCIÓN	APLICA	
Biológico	Virus	✓	Inspección áreas, inspección y desinfección de elementos de trabajo (epp- dotación), lavado de manos e higiene personal, aplicación repelente, desinfección de áreas, uso de gel antibacterial- alcohol para desinfección. Uso obligatorio de EPP, informar diariamente sobre estado de salud, aplicar protocolo de limpieza y desinfección, vacunación
	Bacterias	✓	
	Hongos		
	Ricketsias		
	Picaduras	✓	
	Mordeduras	✓	
	Fluidos o excrementos		
Físico	Ruido		Uso adecuado de epp, dotación manga larga, uso de protector solar, hidratación constante, realizar pausas activas.
	Iluminación		
	Vibración		
	Temperaturas extremas		
	Presión atmosférica		
	Radiaciones no ionizantes	✓	
	Radiaciones ionizantes		
Químico	Polvos orgánicos e inorgánicos		Uso adecuado de epp, conocer hojas de seguridad, etiquetado de sustancias químicas, ventilación
	Fibras		
	Líquidos		
	Gases y vapores		
	Humos metálicos, no metálicos	✓	
	Material particulado	✓	
Psicosocial	Gestión organizacional		Planeación de actividades, Realización de pausas activas, trabajo en equipo, comunicación asertiva.
	Características de la organización		
	Características del grupo social		
	Condiciones de la tarea	✓	
	Interfase persona - tarea		
	Jornada de trabajo	✓	
Biomecánicos	Posturas	✓	Levantamiento y movimiento de cargas adecuado, realización de pausas activas y calistenia, mantener una buena higiene postural, no exceder pesos permitidos.
	Esfuerzo	✓	
	Movimiento repetitivo	✓	
	Manipulación de cargas	✓	
Condiciones de seguridad	Mecánico	✓	Realizar inspecciones a epp, herramientas, equipos, áreas de trabajo, autocuidado, atender a normas de tránsito, reportar estado de salud, reporte de actos y condiciones inseguras, atender a señalización, certificación de competencias (cuando se requiera)
	Eléctrico	✓	
	Locativo		
	Tecnológico		
	Accidentes de tránsito	✓	
	Públicos	✓	
	Trabajo en alturas		
	Espacios confinados		
Fenómenos naturales	Sismos	✓	Ubicación de señalización de emergencia, autocuidado, reconocimiento de brigada.
	Terremotos		
	Vendaval		
	Inundación		
	Derrumbe		
	Precipitaciones		

Yo, Jesus Duvan Alfonso Romero identificado con documento 1124241118

declaro que he sido notificado de los riesgos a los cuales estoy expuesto para el cargo de Aux. de Construcción

que desempeño en la empresa/proyecto Consorcio Cauca desde la fecha 24/01/25

Firma del trabajador

José Olivera

Firma de quien realiza la notificación

Salud Ocupacional E.U.	**CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL** Código Prestador 6800103094		COD: F-PS-05 Versión: 5 Marzo 8 de 2019

EMPRESA CONTRATANTE PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS
EMPRESA EN MISIÓN PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS

TIPO CONSULTA: Ingreso
FECHA: 23/09/2025
NOMBRE: YERSON DUVAN ALFONSO ROMEROI
CC: 1124244418 EDAD: 28 años
DIRECCIÓN: ALTOS DE POBLADO
TELÉFONO: 3215256489
CARGO: AYUDANTE GAVIONES
CIUDAD: Bucaramanga

A QUIEN SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES EXAMENES

EXAMEN MÉDICO CON ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR.

EXAMEN DE INGRESO

CONCEPTO: ***Cumple con el perfil del cargo***

CONDUCTA

OCUPACIONALES Control periódico ocupacional, Higiene Postural, Utilización de EPP,

Incluir en programas de vigilancia de acuerdo a los riesgos laborales prioritarios para el cargo definidos en la matriz de riesgos de la empresa

PP: Programa de promoción y prevención de la salud: Higiene oral semestral; Citología cervicovaginal anual; Control de testículo anual; Control de seno anual; Control de prostata anual

RECOMENDACIONES ESPECIFICAS

SE RECOMIENDA AUTOCUIDADO PERSONAL, SEGUIR PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO- MANEJO DE CARGAS Y POSTURAS

HE SIDO INFORMADO (A) DE LOS EXAMENES QUE VAN A REALIZARME Y DOY MI CONSENTIMIENTO PARA ELLO
CERTIFICO QUE NO HE OMITIDO INFORMACIÓN ACERCA DE MI ESTADO DE SALUD, TODO ES VERIDICO Y PUEDE SER CONFIRMADO

Dr. Javier Cáceres Báez
Salud Ocupacional
R.M. 02330 lic. 04027

JAVIER CACERES BAEZ - Esp. Salud Ocupacional -
R.M. 02330 - Licencia 04027

Firma del Trabajador C.C 1124244418

ANEXO N° 3
DOCUMENTOS RETIRO DE PERSONAL

CONSORCIO CAUCE	**FORMATO ORDEN EXAMEN DE RETIRO OCUPACIONAL**	**Código** SST-F-37 **Fecha** 22/08/2022 **Versión** 2

Girón, 2025-09-30

Mayra Alejandra Quintero Delgado

Cédula de Ciudadanía No. **1.095.831.315**

Ingeniero Auxiliar

CONSORCIO CAUCE

Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, y en la Resolución 1443 de 2007, me permito notificarle que a partir de la fecha de terminación del vinculo laboral con **CONSORCIO CAUCE** dispone de 5 (cinco) días para presentarse a la práctica del correspondiente EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL DE RETIRO, en:


IPS: Dr. Sergio Serrano Gomez

Dirección: Centro Industrial San Jorge - Bodega 16 - Girón.

**Debe confirmar con el area de gestión humana previamente para asigar hora de la consulta.*

Finalizado tal tiempo sin que usted asista a la citación, se entenderá que renuncia a la práctica de tal, y la empresa no se hará responsable de las condiciones de salud que el trabajador reporte después del retiro.


La presente orden se expide digitalmente a los **2025-09-30.**



Jose Orlando Alba Jaimes

Coordinador SST

Contacto: sst@jsgingenieria.com.co



Proyectó:JOAJ Revisó: DPPR	Tel: (607)6139848 Centro Industrial y Logistico San Jorge - Bodega 16 Girón - Santander

CONSORCIO	**Preaviso Terminación del Contrato a Termino Fijo**	**Código** RH-F-18 **Fecha** 27/08/2024 **Versión** 3

Girón, 12-agosto-2025

Señor(a)

Mayra Alejandra Quintero Delgado

Cédula de Ciudadanía 1.095.831.315

Ingeniero Auxiliar

Asunto: Preaviso de terminación de contrato de trabajo a termino fijo.

Me permito comunicarle que en virtud a que el término de vigencia pactado en el contrato individual de trabajo suscrito con usted está próximo a vencerse, esta empresa ha decidido no darlo por prorrogado. Por lo anterior, le comunico que se ha decidido dar por terminado su contrato de trabajo, de conformidad con el artículo 61 numeral C del Código Sustantivo del Trabajo.

Le indicamos que la fecha de terminación de su contrato se hará efectiva a partir del día**30-septiembre-2025** Por lo tanto, terminada la jornada laboral debe contactarse con el área de gestión humana para iniciar el tramite para su liquidación de prestaciones sociales y salario adeudados conforme a lo enunciado en el Código Sustantivo del Trabajo. Adicional debe solicitar la orden para realizarse exámenes de egreso, para lo que tendrá 5 días siguientes a su retiro.

Es oportuno manifestarle nuestro agradecimiento por su labor prestada en la empresa, por lo que nos vemos en la obligación de resaltar y aplaudir su desempeño.

Atentamente,

Darly Paola Peñaranda Rodriguez

Coordinador de Gestión Humana

Contacto: gestion.humana@jsgingenieria.com.co

Recibí:

Proyectó: **DPPR** Revisó: **ASDB**	Tel: (607)6159848 Centro Industrial y Logistico San Jorge – Bodega 16 Girón – Santander

Firmado electrónicamente por:

Nombre	Mayra Alejandra Quintero Delgado
Número de Documento	1.095.831.315
Email	alejandra01quintero@gmail.com
Fecha	12/08/2025 a las 10:25
IP	181.48.103.202
Token	c26a58b467857e82d0b47aa6c6089e59

Verifique la validez de este documento escaneando el siguiente código

Bucaramanga, 30 de septiembre de 2025

Señores

LERMA CONSTRUCCIONES S.A.S

Ciudad

Ref: Renuncia Irrevocable

Por medio del presente escrito hago saber a usted que renuncio libre, voluntariamente e irrevocablemente al cargo que venía desempeñando como ayudante de Construcción. Laboro hasta el 30 de septiembre de 2025, lo anterior obedece a razones personales.

De antemano agradezco la colaboración prestada durante el tiempo que laboré en tan prestigiosa empresa.

Cordialmente;

Diego Armando C.R

DIEGO ARMANDO CASTRO RIO

C.C 1.095.949.640

NIT 901.050.177-7

LERMA
CONSTRUCCIONES S.A.S

ORDEN DE VALORACION MEDICA OCUPACIONAL

PROVEEDOR DEL SERVICIO:	**PROINSOCOL**	
DIRECCION:	CARRERA 34 46-119	6076960080
LUNES A VIERNES	LLAMAR A PROGRAMAR	
FECHA SOLICITUD:	30 DE SEPTIEMBRE 2025	
TIPO EXAMEN:	RETIRO	
CLIENTE:	LERMA CONSTRUCCIONES S.A.S	
NIT:	901.050.177-7	

NOMBRE	APELLIDOS	CC	TIPO DE EXAMEN
DIEGO ARMANDO	**CASTRO**	**1.095.949.640**	**RETIRO**

FIRMA EMPLEADO:

Diego Armando C R

C.C 1'095.949.640

PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS
NIT: 901.255.263

Girón, 03 de Octubre de 2025

Asunto: CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO

MARTIN PEÑARANDA BOTELLO; mayor de edad e identificado con la cedula de ciudadanía **N° 91.236.893** expedida en Bucaramanga, actuando en calidad de representante legal de representante legal de **PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES S.A.S** con **NIT: 901255263-3**, por medio de la presente, certifica que el señor **OMAR ENRIQUE SILVA BALAZA** identificado con cedula de ciudadanía **N° 6.484.816** con fecha de inicio de labores el 31 DE JULIO DE 2025 , con fecha de finalización 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025, quedando a paz y salvo salarialmente con la empresa por todos los conceptos derivados de la relación de trabajo que nos vinculó en la obra BARRANCABERMEJA , no presento en el tiempo de su permanencia accidentes laborales de igual manera se le informo oportunamente del requerimiento de realizarse exámenes de egreso los cuales se deben practicarse al momento de su retiro dentro de los 5 días siguientes con el fin de evaluar sus condiciones de salud.

Atentamente;

Martin Peñaranda Botello
C.C. 91.236.893 Bucaramanga
REPRESENTANTE LEGAL

OMAR ENRIQUE SILVA BALAZA
C.C 6.484.816
Constancia de recibido



HUELLA

PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS
NIT: 901.255.263

Girón, 07 de Octubre de 2025

Asunto: CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO

MARTIN PEÑARANDA BOTELLO; mayor de edad e identificado con la cedula de ciudadanía **N° 91.236.893** expedida en Bucaramanga, actuando en calidad de representante legal de representante legal de **PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES S.A.S** con **NIT: 901255263-3**, por medio de la presente, certifica que el señor **JUAN CARLOS LEON ARANGUREN** identificado con PPT **N° 6.133.303** con fecha de inicio de labores el 31 DE JULIO DE 2025 , con fecha de finalización 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025, quedando a paz y salvo salarialmente con la empresa por todos los conceptos derivados de la relación de trabajo que nos vinculó en la obra BARRANCABERMEJA , no presento en el tiempo de su permanencia accidentes laborales de igual manera se le informo oportunamente del requerimiento de realizarse exámenes de egreso los cuales se deben practicarse al momento de su retiro dentro de los 5 días siguientes con el fin de evaluar sus condiciones de salud.

Atentamente;

Martin Peñaranda Botello
C.C. 91.236.893 Bucaramanga
REPRESENTANTE LEGAL

JUAN CARLOS LEON ARANGUREN
PPT. 6.133.303
Constancia de recibido

HUELLA

PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS
NIT: 901.255.263

Girón, 27 de septiembre de 2025

Asunto: TERMINACION DE CONTRATO OBRA LABOR

MARTIN PEÑARANDA BOTELLO; mayor de edad identificado con la cedula de ciudadanía **N° 91.236.893** expedida en Bucaramanga, actuando en calidad de representante legal de representante legal de **PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES S.A.S** con **NIT: 901255263-3**, por medio de la presente, nos permitimos informarle al **Sr Johan Camilo Sánchez Duarte** identificado con cedula de ciudadanía **No 1.098.635.374** La culminación de su contrato laboral con **JUSTA CAUSA**, debido al incumplimiento del reglamento de trabajo **"ABANDONO DE PUESTO DE TRABAJO"** con fecha de finalización terminada la jornada del día 25 de septiembre de 2025 agradecemos los servicios prestados y le deseamos lo mejor en sus proyectos futuros

Atentamente;

Martin Peñaranda B

Camilo Sanchez

MARTIN PEÑARANDA BOTELLO
REPRESENTANTE LEGAL

PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS
NIT: 901.255.263

Girón, 27 de septiembre de 2025

Asunto: TERMINACION DE CONTRATO OBRA LABOR

MARTIN PEÑARANDA BOTELLO; mayor de edad identificado con la cedula de ciudadanía **N° 91.236.893** expedida en Bucaramanga, actuando en calidad de representante legal de representante legal de **PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES S.A.S** con **NIT: 901255263-3**, por medio de la presente, nos permitimos informarle al **Sr Keiner Daniel Sánchez Jerez** identificado con cedula de ciudadanía **No 1.098.656.489** La culminación de su contrato laboral con **JUSTA CAUSA**, debido al incumplimiento del reglamento de trabajo **"ABANDONO DE PUESTO DE TRABAJO"** con fecha de finalización terminada la jornada del día 25 de septiembre de 2025 agradecemos los servicios prestados y le deseamos lo mejor en sus proyectos futuros

Atentamente;

MARTIN PEÑARANDA BOTELLO
REPRESENTANTE LEGAL

Keiner Sanchez
Firma del Trabajador

ANEXO N° 4
DOCUMENTOS PERSONAL ROTATIVO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10017158711

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
TTW843	FOTON	BJ3122DEPFA-G2	2018

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
3.760	AZUL	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	6050

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
39951806	N	LVBDHPES4JN005111

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
LVBDHPES4JN005111	N	LVBDHPES4JN005111	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S — NIT 900849507

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	141

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	VR	FECHA IMPORT	PUERTAS
352017000435854	I	18/10/2017	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO	FECHA VENCIMIENTO
02/11/2018	02/11/2018	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

DIR TTOYTTE FLORIDABLANCA



LT03002525739

MATRICULA: MAURICIO TAPIAS

SOAT

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2024 10 22	2024 11 01	2025 10 31

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/WATIOS	MODELO
9310009606002	TTW843	VOLQUETA	PÚBLICO	3760	2018

PASAJEROS	MARCA	CHEROCERÍA
2	FOTON	13 - PLATON

LÍNEA VEHÍCULO	No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
BJ3122DEPFA-G2	89951806	LVBDHPES4JN005111	LVBDHPES4JN005111	6.05

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S	3102151720	NT	900849507	BUCARAMANGA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
45268	9310	45268	9310009606002	BOGOTA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
320	$919,000.00	$477,800.00	$2,100.00

TOTAL A PAGAR

$1,398,900.00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 820, 910.
Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

El SOAT digital, además de brindarle una **fácil portabilidad y usabilidad**, también ofrece varios beneficios para salud, el medio ambiente, las autoridades y en general **para todas las personas.**



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza esta registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o al Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras, o se les otorgaren en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro acepta en todas sus partes.
Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán mis datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información"

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 177552748

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA REVITEC LA ROSITA

NIT: 901229714

No. de Certificado de Acreditación: 19-OIN-044-001

Fecha de expedición: 2024/11/30

Fecha de vencimiento: 2025/11/30

DATOS VEHÍCULO

PLACA: TTW843

CLASE: VOLQUETA

MARCA: FOTON

MODELO: 2018

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 3760

NRO. MOTOR: 89951806

NRO. CHASIS: LVBDHPES4JN005111

VIN: LVBDHPES4JN005111

LÍNEA: BJ3122DEPFA-G2

COLOR: AZUL

NOMBRE PROPIETARIO: MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S

FIRMA DEL RESPONSABLE

RENSON RODRIGUEZ VILLAMIZAR



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10011843214

PLACA: WFQ114
MARCA: FOTON
LÍNEA: BJ3122DEPFA-G2
MODELO: 2017
CILINDRADA CC: 3.760
COLOR: AZUL
CLASE DE VEHÍCULO: VOLQUETA
TIPO CARROCERÍA: PLATON
COMBUSTIBLE: DIESEL
CAPACIDAD CARGA: 6030
NÚMERO DE MOTOR: 65900243
NÚMERO DE SERIE: LVBDNPE53HN005600
NÚMERO DE CHASIS: LVBDNPE53HN005600
PROPIETARIO: MAQUINORIAS DE COLOMBIA S.A.S
IDENTIFICACIÓN: NIT 830040567



DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 352016000148112
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
FECHA MATRÍCULA: 28/05/2016
FECHA EXP. LIC. TTO.: 31/05/2016
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA MCPAL TTO/TTE CIRON
[T9200392079

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO / MES / DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)	VIGENCIA HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)
2025 / 05 / 26	2025 / 06 / 01	2026 / 05 / 31

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/KMTOS.	MODELO
9310013958602	WFD114	VOLQUETA	PÚBLICO	3760	2017

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	FOTON	13 - PLATON

LÍNEA VEHÍCULO	No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
BJ3122DEPFA-G2	89806243	LVBDHPES3HN005000	LVBDHPES3HN005000	6.05

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S	3102151720	NT	900849507	BUCARAMANGA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
45268	9310	45268	9310013958602	BOGOTA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FONSAT	TASA RUNT
320	$839,200.00	$436,300.00	$2,100.00

TOTAL A PAGAR
$1,277,600.00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 103, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920.
Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

El SOAT digital, además de brindarle una **fácil portabilidad y usabilidad,** también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general **para todas las personas.**



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos para reales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 183863996

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA SUPERCAR LA CENTRAL

NIT: 901171195

No. de Certificado de Acreditación: 20-OIN-011

Fecha de expedición: 2025/09/12

Fecha de vencimiento: 2026/09/12

DATOS VEHÍCULO

PLACA: WFD114

CLASE: VOLQUETA

MARCA: FOTON

MODELO: 2017

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 3760

NRO. MOTOR: 89806243

NRO. CHASIS: LVBDHPES3HN005000

VIN: LVBDHPES3HN005000

LÍNEA: BJ3122DEPFA-G2

COLOR: AZUL

NOMBRE PROPIETARIO: MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S

FIRMA DEL RESPONSABLE

SAUL BALLESTEROS BALLESTEROS

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10024978403

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
XMD821	HINO	FG1JGUE	2009

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
7.961	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	10360

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
J08CTT37855	N	0000

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	9F3FG1JGU9XX10270	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

INVERNOTA S.A.S

IDENTIFICACIÓN

NIT 901178054

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 03200900108521

DE: I

FECHA IMPORT.: 11/02/2009

PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******.

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
31/07/2009	05/01/2022	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

DIR TTOYTTE BUCARAMANGA



LT01008592063

SOAT

HOJA DE SEGURO OBLIGATORIO DE GARANTÍAS CONTRA LOS DAÑOS CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA							
año	mes	día	DESDE LAS 00 HORAS DEL	año	mes	día	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	año	mes	día
2024	11	14		2024	11	18		2025	11	17

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/CC/TICS	MODELO
1530102642103	XMD821	VOLQUETA	PÚBLICO	7961	2009

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	HINO	13
	LÍNEA VEHÍCULO: FG1JGUE	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
J08CTT37855	9F3FG1JGU9XX10270	0000	10.36

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
INVERNOTA S.A.S	3102151720	NT	901178054	BUCARAMANGA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
45268	9310	45268	1530102642103	BOGOTA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
320	$919,000.00	$477,800.00	$2,100.00

TOTAL A PAGAR

$1,398,900.00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

*Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 910. Decreto 2644 de 2022.
*Para las demás tarifas en UVTas en UVT.

El SOAT digital, además de brindarle una **fácil portabilidad y usabilidad,** también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, los automotores y en general **para todas las personas.**



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Este atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el reintegro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga no debe realizar la radicación prestadores de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 179940415

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA SUPERCAR LA CENTRAL

NIT: 901171195

No. de Certificado de Acreditación: 20-OIN-011

Fecha de expedición: 2025/03/03

Fecha de vencimiento: 2026/03/03

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	XMD821	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	HINO	**MODELO:**	2009
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	7961	**NRO. MOTOR:**	J08CTT37855
NRO. CHASIS:	9F3FG1JGU9XX10270	**VIN:**	0000
LÍNEA:	FG1JGUE		
COLOR:	BLANCO		

NOMBRE PROPIETARIO: INVERNOTA S.A.S

FIRMA DEL RESPONSABLE

SAUL BALLESTEROS BALLESTEROS

Simple

PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-01, 03:08:43 PM Tipo Planilla: E PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS Número Planilla: 1076034148

Periodo Cotización: septiembre de 2025 Periodo Servicio: octubre de 2025

PAGADO 02/10/2025

OS DEL APORTANTE

Razón Social	MAQUINOSRAS		
Documento	N830084607	**Dirección**	AV 0 #22 - 31 CENTRO IND SAN JORGE BD 10
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6914305
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	UNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	SERRANO GOMEZ JULIAN ANDRES	**Identificación**	CC 13870690
Total Afiliados	53	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

L DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																								Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total

Pagado: 02/10/2025

Empresa 18900849507
MAQUINOBRAS

Planilla No: 1076074148

Periodo Cotización: septiembre de 2025

Periodo Servicio: octubre de 2025

II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | |

Pagado: 02/10/2025 Empresa 8909849507 MAQUINOBRAS Planilla Nro: 1076074146 Periodo Cotización: septiembre de 2025 Periodo Servicio: octubre de 2025

II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | |

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10023905709

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
GQV575	FOTON	BJ3122DFPEA-01	2022

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
3.760	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	5140

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
76916246	N	LVBDFPEA3NN005099

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
LVBDFPEA3NN005099	N	LVBDFPEA3NN005099	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
SANABRIA HERNANDEZ DIANA CAROLINA	C.C. 63528529

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	VE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
352021000276550	I	30/07/2021	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

NUMERO ****** POTENCIA HP 141

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
08/09/2021	08/09/2021	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA MCPAL TTOYTTE GIRON



LT02006677383

SOAT

POLIZA DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	HASTA
2025 8 21	2025 9 8	2026 9 7

No. DE POLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/POTENCIA	MODELO
92605798 - 613027830	GQV575	CARGA O MIXTOS	PUBLICO	3760	2022

PASAJEROS	MARCA	CARROCERIA
2	FOTON	PLATON

LÍNEA VEHÍCULO
BJ3122DFPEA01

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
76916246	LVBDFPEA3NN005099	LVBDFPEA3NN005099	5,14

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
DIANA SANABRIA HERNANDEZ	3188508329	CC	63528529	GIRON

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	13158	92605798	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FONYGA	TASA RUNT
32	$ 839.200	$ 436.300	$ 2.400

TOTAL A PAGAR

$ 1.277.900

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[2] 701,68[3]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77[1]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180[4]	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750[5]	



¡SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?



Seguro Ter-cero

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.

Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: www.segurotercero.com

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se la pueden solicitar en cualquier momento.

•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.

•Evite asumir el momento en que debe renovar su póliza No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.

•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.

•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.

•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosygalo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.

•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

•Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT,

la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales, la cual puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/proteccion-de-datos/

Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos. Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

Topes de cobertura gastos médicos

* El transporte y movilización de las víctimas a los establecimientos hospitalarios o clínicos se debe hacer preferiblemente en ambulancias o vehículos adecuadamente dotados para este tipo de servicios, garantizando la atención oportuna y efectiva de la víctima.

[1] Para las tarifas 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 930. Decreto 2497 de 2022.

[2] Para las demás tarifas no incluidas en el Decreto 2497 de 2022.

[3] Según numeral 1 del Art. 2.6.1.4.2.6 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.

[4] Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.11 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.08.21 16:12:49 -05:00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 183851576

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA SUPERCAR LA CENTRAL

NIT: 901171195

No. de Certificado de Acreditación: 20-OIN-011

Fecha de expedición: 2025/09/11

Fecha de vencimiento: 2026/09/11

DATOS VEHÍCULO

PLACA: GQV575

CLASE: VOLQUETA

MARCA: FOTON

MODELO: 2022

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 3760

NRO. MOTOR: 76916246

NRO. CHASIS: LVBDFPEA3NN005099

VIN: LVBDFPEA3NN005099

LÍNEA: BJ3122DFPEA-01

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: DIANA C. SANABRIA H.

FIRMA DEL RESPONSABLE

SAUL BALLESTEROS BALLESTEROS

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-06, 04:13:55 PM Tipo Planilla: E. PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS Nuevo Planilla: 1376023351

Periodo Cotización: septiembre de 2025 Periodo Servicio: octubre de 2025

PAGADO 06/10/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INVERNOTA SAS		
Documento	N8011780354	Dirección	CR 35 #39 - 14
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	6914356
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentacion	UNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	Departamento	SANTANDER
Representante Legal	SERRANO GOMEZ JULIAN ANDRES	Identificacion	CC 1387999
Total Afiliados	35	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total

Pagado: 06/10/2025 Empresa N901178054 INVERNOTA SAS Planilla Nro: 1076093351 Periodo Cotización: septiembre de 2025 Periodo Servicio: octubre de 2025

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10030197028

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
BAK431	CHEVROLET	C 70 189	1989

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
6.200	AZUL CIELO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	7000

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
468TM2U426144	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
CM910423	N	CM910423	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

MEDINA ACERO NEYLA LIZETH Y OTRO(S)

IDENTIFICACIÓN

C.C. 1098698539

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE	POTENCIA HP
******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

045185

I/E	FECHA IMPORT	PUERTAS
I	14/09/1989	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO	FECHA VENCIMIENTO
13/10/1989	06/10/2023	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYMOV PIEDECUESTA/SANTANDER



LT03006356710

SOAT

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN	INICIO	FINAL
2025-06-09	2025-06-10	2026-06-09

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	ELONGACIÓN MOTOR	MODELO
3380058885143000	BAK481	CARGA O MIXTO	PARTICULAR	6200	1989

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHÍCULO	CATEGORÍA
3	CHEVROLET	C 70 189	PLATON

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON
466TM2U426144	CM810423		7.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	No. DOCUMENTO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
MEDINA ACERO, NEYLA LIZETH	3209021606	CC	1098698539	GIRON

CÓDIGO DE AGENCIA/SUCURSAL	COD. SUCURSAL EXPEDITORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	33	14135	0	DUITAMA

DÍAS	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FONDO	TASA RUNT
320	$ 839200	$ 436300	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 1277600

	VALOR	
A. GASTOS MÉDICO QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 *	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	701,68 **	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	8,77	
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	180 750	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES

*Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

**Para las demás tarifas no citadas en (1).

ACCIDENTE SUB.

Si desea imprimir la póliza que se envía a su correo electrónico como respaldo o la información guardada en su teléfono usará esta con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta los siguientes recomendaciones

Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se la pueden solicitar en cualquier momento.

Recuerde validar que su póliza esté registrada en el RUNT.

Este puede el momento en que debe revisar su póliza, los tener SOAT vigente asumir multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente se tendrá a cubrir por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.

Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.

Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito cubiertos. (Ley Estatutaria Ley 1751 de 2015). En caso contrario denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.

Pasos a seguir:

Pida los datos básicos del conductor, placa del vehículo, aseguradora y el Tránsito de este modo la atención de servicios de salud.

Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Derechos de Consumidores de Pólizas

En cumplimiento con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. grabó de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza cuando el momento de vigencia se inicia en el RUNT, en consideración que existe una póliza vigente. En este caso, LA PREVISORA S.A. modificará la vigencia sin su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación será informada con la PREVISORA S.A. a través del correo

Señores Usted

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, recopile, suministre la información personal suministrada durante el proceso de compra de esta póliza, únicamente y por medio de terceros o diversa comunidad, para registrarme en sus bases de datos, información por medios escritos, como electrónicos, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto, por diferentes aplicaciones de mensajería instantánea, como su relacionado con la actividad, modificación, o evolución de todos procesos que he adquirido hasta la terminación con este contrato. Esta actividad comercial incluye no la conjunta de empresas, gestionar campañas de mercadeo, promociones relacionadas con [illegible] que ofrezcan, así como de otras como de seguros que ofrezcan LA [illegible] principios informativos derivados de todas las funciones que ofrezca [illegible] los casos otorgan o no las autorizaciones o no las otorgan en [illegible] condiciones, referencias y manejo de la póliza y demás [illegible] presente contrato se suministro y declaro aceptar el tratamiento [illegible] Declaro que se me he informado con claro. Tiene de informar [illegible] actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar [illegible] que me otorgan sobre su tratamiento, se informado sobre el uso [illegible] mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, [illegible] de solicitar la supresión de sus datos en los casos en que esto proceda [illegible] por forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré consultarlos en [illegible] BOTON en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3007508, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos se puede acceder a la Política de Tratamiento de información en el siguiente link [illegible]

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 178767953

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA SUPERCAR LA CENTRAL

NIT: 901171195

No. de Certificado de Acreditación: 20-OIN-011

Fecha de expedición: 2025/01/15

Fecha de vencimiento: 2026/01/15

DATOS VEHÍCULO

PLACA: BAK481

CLASE: VOLQUETA

MARCA: CHEVROLET

MODELO: 1989

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 6200

NRO. MOTOR: 468TM2U426144

NRO. CHASIS: CM910423

VIN:

LÍNEA: C 70 189

COLOR: AZUL CIELO

NOMBRE PROPIETARIO: NEYLA L. MEDINA A. y otro(s)

FIRMA DEL RESPONSABLE

SAUL BALLESTEROS BALLESTEROS

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10032411673

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
TPJ349	FORD	F 600	1968

CILINDRADA	COLOR	SERVICIO
2.500	ROJO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/P.S.
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	6000

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
52V313127	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	8410ED41674	N

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE — IDENTIFICACIÓN

PACHECO ZAPARDIEL GLADYS MARIA Y OTRO(S) C.C. 49695343

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ****-**

POTENCIA HP: 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 13593

FECHA IMPORT: I (/07/1968

PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******



FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO	FECHA VENCIMIENTO
08/09/1968	02/08/2024	*** **

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEYTTO MCPAL AGUSTIN CODAZZI

LT0700219621 3

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No 180336220

DATOS CENTRO DIAGNOSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA SUPERCAR LA CENTRAL

NIT: 901171195

No. de Certificado de Acreditación: 20-OIN-011

Fecha de expedición: 2025/01/20

Fecha de vencimiento: 2026/03/20

DATOS VEHÍCULO

PLACA: TPJ349

CLASE: VOLQUETA

MARCA: FORD

MODELO: 1968

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 2500

NRO. MOTOR: S2V313127

NRO. CHASIS: B61DED41674

VIN:

LÍNEA: F 600

COLOR: ROJO

NOMBRE PROPIETARIO: YESSICA T. ORTEGA B. y otro(s)

CDA

SUPERCAR LA CENTRAL

3182528362 - 3182528511
JUNTO A LA CENTRAL DE ABASTOS
BUCARAMANGA

FIRMA DEL RESPONSABLE

SAUL BALLESTEROS BALLESTEROS

SOAT

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

FECHA DE EXPEDICIÓN			INICIA LAS 24:00 HORAS DEL			VENCE LAS 23:59 HORAS DEL		
2025	01	14	2025	01	15	2026	01	14

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
8901138189501	TPJ349	VOLQUETA	PARTICULAR	2500	1968

PASAJEROS	MARCA	CHASIS/SERIE
2	FORD	13 - PLATON
	LÍNEA VEHÍCULO: F 600	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON
52VJ13127	B61DED41674	B61DED41674	6

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
GLADYS MARIA PACHECO ZAPARDIEL	3156351707	CC	49695343	CODAZZI

CÓDIGO DE HOMOLOGACIÓN	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
44681	8901	44681	8901138189501	BOGOTA

DÍAS	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FONDO	TASA RUNT
320	$839,200.00	$436,300.00	$2,100.00

TOTAL A PAGAR

$1,277,600.00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VÍCTIMA

	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] / 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1] Para los siguientes tarifas: 000, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 731, 732, 810, 910, 930.
Decreto 2345 de 2022.
[2] Para los demás tarifas vehículos no 10.

El SOAT digital, [illegible] **fácil portabilidad y usabilidad**, [illegible] **para todas las personas.**



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

En caso de accidente de tránsito:

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

Texto habeas data

[illegible]

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELEFONO	CORREO	
NI	805013467-4	NOMARA TATIANA ORTEGA BARON		CL 6 A SUR 21 27 BRR RIBERAS DEL RIO	3208267606	[illegible]	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMINA ESPECIAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO		
UNICA	A - Empresa con 500 o [illegible]			SANTANDER	[illegible]		N

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DAAAMMDD)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DAAAMMDD)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UNO
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	1
					TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	22/10/2025	99851990	$384.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830008504-7	77.000	0		0		0	1	600	0	77.600	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	154.000	0		0		0	1	600	0	154.600	2

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800144339-8	455.000	0	0	0	0	1	600	0	455.600	2

TOTALES RIESGOS LABORALES													
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Ajustes Otros Sistemas	Valor Base Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Recibido Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Interés Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	800251790-1	198.000				330.000	1	200	198.200			1.800	396.000	2

TOTALES CCF							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF80	Confamiliar Sumarnin	890206976-1	171.000	1	200	171.200	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	1
ICBF				
0	1	0	0	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR ADMINISTRADORA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor Aportes de CCF, ARL, IAP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	171.000	171.200
Pensión	1	455.000	455.600
Riesgos Laborales	1	198.000	198.200
CCF	1	171.000	171.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	995.000	996.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	[illegible]	YESSICA TATIANA ORTEGA SARDA		CL 4 A 55 25 37 BOD BURPAS DEL RIO	[illegible]	[illegible]	
FORMA PRESENTACIÓN	PLANILLA APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CAJA	[illegible]			SANTANDER	CIMITA		N

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ADICIONAL (presentación)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DD/MM/AAAA)	NÚMERO PLANILLA	TARIFAS	
					EMPLEADOS	UAF
					0	0
PERIODO SALUD	NÚMERO PERSONAS				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	21/10/2025	0001000	$564.500	

DETALLE POR COTIZANTE

| COTIZANTE OBLIGADO | | | | | | |

ANEXO N° 5
DOCUMENTOS MAQUINARIA



MARCA:
DOSSAN

TIPO:
EXCAVADORA
DX225LCA

SERIE:
DHKCEBAACCK0022219

MOTOR:
DB58TIS936644EN

MODELO:
2019

MQ-044
EXCAVADORA DX225LCA

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS

Cra 26# 36 -14
Edificio Fenix Business Center
Oficina 403
Bucaramanga

27/05/2019

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 58237

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC101917	DOOSAN	DX225LCA	2019

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	EXCAVADORA	DHKCEBACCK0022219

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
NARANJA	DB58TIS936644EN	ORUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
21500 Kg	2940 mm	2990 mm	9485 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S	NIT 900.849.507

Scanned by CamScanner

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN



LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
DIR TTOYTTE FLORIDABLANCA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
29-05-2019	29-05-2019	******
ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	352019000236032	22/05/2019

ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM01000002345

Scanned by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada **500**

1 Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4 Número de Formulario **352019000236032-1**

Importador

5 Número de Identificación Tributaria (NIT): 860047667 | 6 DV: 1 | 11 Apellidos y nombres o Razón Social: PRACO DIDACOL S A S

13 Dirección: CL 99 69 C 41 | 15 Teléfono: 4238300 | 16 Cód Admón: 35 | 17 Cód Dpto: 11 | 18 Cód Ciudad Municipio: 001

Declarante

24 Número de Identificación Tributaria (NIT): 860020382 | 25 DV: 4 | 26 Razón social del declarante autorizado: ALPOPULAR ALMACEN GENERAL DE DEPOSITOS S.A. | 27 Tipo usuario: 26 | 28 Cód usuario: 0095

29 Número documento de identificación: 16504199 | 30 Apellidos y nombres: CACERES ZORRILLA WALTER ALFONSO

31 Clase importador	32 Tipo declaración	33 Cod	34 No Formulario Anulado	35 Año - Mes - Día	36 Cod Admón	37 Declaración de Exportación	38 Año - Mes - Día	39 Cod Admón
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40 Cod lugar ingreso de las mercancías	41 Cod Depósito	42 Manifiesto de carga	43 Año - Mes - Día	44 Documento de transporte	45 Año - Mes - Día
BUN	907	No. 907008791	2019 - 05 - 22	No. HDSUKRC00285674	2019 - 03 - 31

46 Nombre importador o proveedor en el exterior	47 Ciudad	48 Cod País Exportación
DOOSAN INFRACORE CO. LTD	INCHEON	190

49 Dirección importador o proveedor en el exterior	50 Email
489, INJUG-GU-INCHEON KOREA 401-702	SANGHO1.JEONG@DOOSAN.COM

51 No. de factura	52 Año - Mes - Día	53 Cod país procedencia	54 Cod Modo Transporte	55 Codigo de Aduana	56 Cod Dpto Destino	57 Empresa transportadora	58 Tasa de cambio $ cop
HKB2019030461	2019 - 03 - 26	190	1	472	0	MULTIPORT E.U	3.290,27

59 Subpartida arancelaria	60 Cod. Complemento	61 Cod. Suplementario	62 Cod Modalidad	63 No cuotas pactadas	64 Valor cuota USD	65 Periodicidad del pago de la cuota	66 Cod país de origen	67 Cod Acuerdo
8429520030	XX	XX	C200	XX	XXXX	XX	190	XXX

68 Forma de pago de la importación	69 Tipo de importación	70 Cod país compra	71 Peso bruto kgs	72 Peso neto kgs	73 Código embalaje	74 No bultos	75 Subpartida	76 Cod unidad comercial	77 Cantidad items
02	01	190	322,500.00	322,500.00	YY	45	1	U	15.00

78 Valor FOB USD	79 Valor Fletes USD	80 Valor Seguros USD	81 Valor Otros Gastos USD	82 Subtotal de fletes, seguros y otros gastos USD	83 Ajuste valor USD	84 Valor aduana USD	85 Código régimen y Modalidad	86 Aforo
1,348,897.45	116,141.10	598.08	50.00	116,789.18	0.00	1,464,486.63	X	XXXXXXXXX

87 Cod oficina	88 Año	89 Programa No	90 Cod número del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0,00	4,818,556,424	0	0	0
IVA	19,00	4,818,556,424	915,526,000	0	0
Salvaguardia	0,00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0,00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0	0	0	0	0
Sanción	0	0	0	0	
Fiscalía	0	0	0	0	
		Total	915,526,000		0

91. Descripción de las mercancías (Prohibida la descripción de las mercancías a importar cuando señalada en el arancel de aduanas en la subpartida a aplicar - Indique marca, modelo y referencia) Continúa en observaciones, continúa al respaldo

DO 401190031002 UAP: 005 DECLARACION(1-1) OD: 10944, MERCANCIA NUEVA // PEDIDO: DO19016, DO19017, DO19018, DO19019, DO19020, DO19021, DO19022, DO19023, DO19024, DO19025, DO19026, DO19027, DO19028, DO19029, DO19030 // NACIONALIZACION: DO19016, DO19017, DO19018, DO19019, DO19020, DO19021, DO19022, DO19023, DO19024, DO19025, DO19026, DO19027, DO19028, DO19029, DO19030 // IMPORTACION PARA LA VENTA Y COMERCIALIZACION. PRODUCTO: EXCAVADORA, MARCA: DOOSAN, MODELO: DX225LCA, REFERENCIA: SIN REFERENCIA, USO O DESTINO: CONSTRUCCION, OBRAS CIVILES, CARRETERA Y MINERIA, SERIAL: DHKCEBACLK0022208, DHKCEBACVK0022190, DHKCEBACEK0022213, DHKCEBACAK0022174, DHKCEBACEK0022180, DHKCEBACVK0022187, DHKCEBACJK0022199, DHKCEBACKK0022203, DHKCEBACKK0022193, DHKCEBA(continúa al respaldo)

97. Valor pagos anteriores	98. Recibo oficial de pago anterior No.	99. Fecha
0	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX XX XX

100. Espacio reservado DIAN / Actuación aduanera	101. Espacio reservado para uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	102. No. Aceptación declaración
Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior		352019000236032 103. Fecha 2019 05 22

104. Levante No	105. Fecha	Firma funcionario responsable	106. Nombre / 107. C.C. No.
352019000173135	2019 - 05 - 22		Jeisson Camilo Torres Forero C.C. 1.015.998.237

Firma declarante	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario	998. Pago Total $ 0 999. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo) SYGA Autoadhesivo 92351910831377 Fecha presentación 2019-05-22 19:32:58 Valor pagado $0

Fecha de Impresión: 2019-05-22 19:34:18

20192349164931

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : **352019000236032-1**
Subpartida : **8429520000**

(05) Continuación descripción mercancías (Incluyendo marcas, modelos y otros)

CFN8022216, DHKCEBACCKD022219, DHKCEBACLK9022225, DHKCEBAGYH0022223, DHKCEBAGN90222230, DHKCEBACAK9022238, AÑO DE FABRICACION: 20
18/ SERIAL MOTOR: DB58TIS936680EN, DB58TIS936664EN, DB58TIS936683EN, DB58TIS936459EN, DB58TIS936505EN, DB58TIS936579EN, DB58TIS93
6636EN, DB58TIS936635EN, DB58TIS936628EN, DB58TIS936665EN, DB58TIS936644EN, DB58TIS936719EN, DB58TIS936727EN, DB58TIS936647EN, DB
58TIS936727EN, . COLOR: NARANJA. INCLUYE TODAS SUS PARTES Y ACCESORIOS PARA SU NORMAL INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO // DE
SCRIPCION SEGUN FACTURA: MODEL DX225LCA (EX50), EXCAVATOR MECHANICAL TIER-2 ENGINE (DOOSAN), 5.7M XD BOOM, 2.4M ARM 1.24 M3 H CLP
BS BHT A-NIT. // INFORMACION SEGUN INSPECCION PREVIA:DOOSAN INFRACORE CO, LTDA; CUCHARA MODELO PN220N1486, DOOSAN No. 230104-02267
0, CAPACIDAD M3/ YD3 1.08/1.41, WIDTH MM / INCH 1246.00 /49.06, WEIGHT KG/LB 939.00/2070.36; SERIAL CUCHARA: SS19B1822, SS19C1123
, SS19B2517, SS19B2811, SS19B2716, SS19B2111, SS19C0618, SS19C0467, SS19C0104, SS19B1509, SS19C1226, SS19C0514, SS18L0565, SS19C1
930, SS19CC619, CADA MAQUINA INCLUYE 2 CAJAS CON ACCESORIOS PARA SU INSTALACION Y NORMAL FUNCIONAMIENTO; PAIS ORIGEN: COREA DEL S
UR, REPUBLICA DE - 190. CANT (15) U //XXXX



MARCA:
DOOSAN

TIPO:
EXCAVADORA
DX225LCA

SERIE:
DHKCEBACAJ0020617

MOTOR:
DB58TIS631003EN

MODELO:
2018

MQ-035
EXCAVADORA
DX225LCA

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS

Cra 26# 36 -14
Edificio Fenix Business
Center
Oficina 403
Bucaramanga

19/04/2018

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 44404

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC074801	DOOSAN	DX225LCA	2018

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	EXCAVADORA	DHKCEBACJ0020617

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
NARANJA	D958TIS833472EN	ORUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
21500 Kg	3005 mm	2990 mm	9485 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACION
MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S	NIT 900.849.507

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S) — IDENTIFICACION

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR
DIR TTOYTTE BUCARAMANGA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICION	FECHA VENCIMIENTO
20-04-2018	20-04-2018	*****

ORIGEN	DEC. IMPORTACION	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	352018000156188	19/04/2018



ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM03000003261

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2018**

Espacio reservado para la DIAN (para ser diligenciado con posterioridad a la aceptación de la declaración)

4. Número de formulario

352018000158188-4

Importador

5. Número de identificación tributaria (NIT): 860047557 | 6. DV: 1 | 7. Apellidos y nombres o razón social: PRACO DIDACOL S A S

13. Dirección: CL 99 69 C 41 | 14. Teléfono: 4238380 | 15. Cód. Idioma: 35 | 16. Cód. País: 11 | 17. Cód. Ciudad / Municipio: 001

Declarante

20. Número de identificación tributaria (NIT): 900020582 | 21. DV: 4 | 22. Razón social o nombre completo: ALPOPULAR ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO | 37. Tipo usuario: 28 | 38. Cód. usuario: 0305

23. Número de identificación: 80747318 | 24. Apellidos y nombres: ESCOBAR ANDRADE CLAUDIA PATRICIA

25. Clase Importación	26. Tipo declaración	27. Cód.	28. No. de formulario Anterior	29. Año - Mes - Día	30. Cód. Aduana	31. Documento de Importación	32. Año - Mes - Día	33. Cód. Numer.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

34. Cód. Lugar arribo de las mercancías	35. Cód. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BUN	007	No. 907804228	2018 - 04 - 18	No. HDGLKRCO0238120	2018 - 02 - 20

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cód.País Exportador
DOOSAN INFRACORE CO. LTD	INCHEON	130

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: 459, INJUG-RO, DONG-GU, INCHEON | 50. E-mail: SANGHO1.JEONG@DOOSAN.COM

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cód. país procedencia	54. Cód. Modo Transporte	55. Código de Aduana	56. Cód. Dupla Modalidad	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio / vlr.
HDGB2018020318	2018 - 02 - 28	160	1	160	11	MULTIPORT E.U	2,710.03

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cód. Complementación	61. Cód. Subposición	62. Cód. Mercancía	63. No. bultos o marcas	64. Valor cuota USD	65. Forma pago de la cuota	66. Cód. país de origen	67. Cód. Arancel
	8429520000	00	XX	C200	XX	XXXX	XX	160	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cód. país compra	71. Peso bruto kgs.	72. Peso neto kgs.	73. Código condición	74. No. bultos	75. Subpartida	76. Cód. unidad comercial	77. Cantidad Mcia.
02	01	160	dcms. 89,000.00	dcms. 86,000.00	YY	12	1	U	4.00

78. Valor FOB USD	79. Valor flete USD	80. Valor seguro USD	81. Valor Otros Gastos USD	82. Deducciones USD	83. Ajuste valor USD	84. Valor aduana USD	85. Código régimen y Modalidad	86. Número
372,936.79	29,523.33	93.86	50.00	29,667.21	0.00	402,806.00	X	XXXXXXXXXX

87. Cód. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód.mismo con Producto
09	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Liquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	1,091,074,336	0	0	0
IVA	19.00	1,091,074,336	207,304,000	0	0
Salvaguarda	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0	0	0	0	0
Sanción	0	0	0	0	
Recargo	0	0	0	0	
		Total	207,304,000		0

91. Observaciones: DO 4011800352002 VAP: 005 DECLARACION(1-1) OD: 9979. PEDIDO: D018005, D018007, D018008, D018009. NACIONALIZACION: D018006, D01800 1, D018008, D018009. NOTOMAVE GLOVIS CONET. NOS ACOGEMOS AL DECRETO 372 DEL 13 DE FEBRERO DEL 2018.. PRODUCTO: EXCAVADORA. MARCA: DOOSAN. MODELO: DX225LCA. REFERENCIA: SIN REFERENCIA. USO O DESTINO: CONSTRUCCION, OBRAS CIVILES, CARRETERA Y MINERIA. IMPORTACI ON PARA LA VENTA Y COMERCIALIZACION. CON TODAS SUS PARTES Y ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO. CINT (4) UNIDADES O ARTICUL OS; INFORMACION DE LAS MAQUINAS ITEM 1, PEDIDO D018008, SERIAL NUMERO: DHKCEBACAJE020617, MOTOR: D03BT1803347ZEH, COLOR: NARANJA. DATOS EN PLACHETA: MARCA DOOSAN INFRACORE CO., LTD 459, INCHEON, KOREA. MODELO: DX225LCA, BRAND SERIECOMJ18 (continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Medio oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Autoridad aduanera: Retiro de bienes: Levante automático. No hay restricción para retirar	131. Espacio reservado con exclusividad Unidades de Fiscalización Diferencial	132. No. Aceptación de declaración: 3520180000158188. 133. Fecha: 2018 04 18

134. Levante No. 352018000124730	135. Fecha: 2018 - 04 - 18	136. Nombre, identificación y firma funcionario autorizado	137. Nombre, identificación y firma funcionario autorizado: Damian B. Prieto S. C.C. 16660613 - Buenaventura

Firma declarante

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES COMERCIO EXTERIOR 1

837. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

838. Pago Total $

0

839. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)

BOGOTA
Autoadhesivo 018610113724605
Fecha presentación 2018-04-18 09:20:00
Valor pagado $0

Fecha de impresión: 2018-04-18 09:42:41

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : **352018000158188-4**
Subpartida : **8429520000**

65. Continuación descripción mercancías (incluir marcas, número y otros)

3218; DOOSAN 230211-001620; 5.7H, HB, CUCHARA SS1680020452, DOOSAN 230204-002846, 2.4H, CUCHARA MODELO S2H22M1396, DOOSAN NO. 2301
04-022898, SERIAL NO. SS1680203, CAPACIDAD 1.24/1.62; WIDTH MM/INCH WEIGHT KG/LB 1011.00/2228.78. INFORMACION PLAQUETA MOTOR DOOS
AN EMISSION CONTROL INFORMATION, EC ENGINE FAMILY D08ETIS, EC TYPE CODE ECOEH. ITEM 2, MAQUINA PEDIDO D018007, SERIAL NUMERO: D0K
DEMACL30020614, MOTOR: D08ETI0033453EH, COLOR: NARANJA. DATOS EN PLAQUETA: MARCA DOOSAN INFRACORE CO., LTD 489, INCHEON, KOREA. M
ODELO: DX225LCA. BRAZO MJ18B225DM5G8YK DOOSAN 230211-001620; 5.7H, DOOSAN 230204-002846, 2.4H, CUCHARA SS1680020453 DOOSAN MODELO
S2H22M1396, DOOSAN NO. 230104-022898, SERIAL NO. SS1680204, CAPACIDAD 1.24/1.62; WIDTH MM 1396.00/54.96, WEIGHT KG/LB 1011.00/22
28.78. INFORMACION PLAQUETA MOTOR DOOSAN EMISSION CONTROL INFORMATION, EC ENGINE FAMILY D08ETIS, EC TYPE CODE ECOEH. ITEM 3, MAQU
INA PEDIDO D018008. SERIAL NUMERO: D0KCEBACPJ0320612, MOTOR: D08ETI0033451EH, COLOR: NARANJA. DATOS EN PLAQUETA: MARCA DOOSAN INF
RACORE CO., LTD 489, INCHEON, KOREA. MODELO: DX225LCA. BRAZO MJ18B225DM5G8LD; DOOSAN 230204-002846; 2.4H; DOOSAN 230211-001620;
5.7 HD, CUCHARA SS1680020452; DOOSAN MODELO S2H22M1396, DOOSAN NO. 230104-022898, SERIAL NO. SS1680201, CAPACIDAD 1.24/1.62; WIDTH
MM 1396.00/54.96, WEIGHT KG/LB 1011.00/2228.78. INFORMACION PLAQUETA MOTOR DOOSAN EMISSION CONTROL INFORMATION, EC ENGINE FAMILY
D08ETIS, EC TYPE CODE ECOEH. ITEM 4, MAQUINA PEDIDO D018009. SERIAL NUMERO: D0KCEBACPL3020618, MOTOR: D08ETI0033482EH, COLOR: NA
RANJA. DATOS EN PLAQUETA: MARCA DOOSAN INFRACORE CO., LTD 489, INCHEON, KOREA. MODELO: DX225LCA. BRAZO MJ18B214DM5G5IBJ DOOSAN 2
30211-001620; 5.7H; HD DOOSAN 230204-002846, 2.4H, CUCHARA MODELO S2H22M1396, DOOSAN NO. 230104-022898, SERIAL NO. SS1680202S5, C
APACIDAD 1.24/1.62; WIDTH MM / INCH 1396.00/54.96, WEIGHT KG/LB 1011.00/2228.78. INFORMACION PLAQUETA MOTOR DOOSAN EMISSION CONTR
OL INFORMATION, EC ENGINE FAMILY D08ETIS, EC TYPE CODE ECOEH. //XXXX



MARCA:
DOOSAN

TIPO:
EXCAVADORA
DX225LCA

SERIE:
DHKCEBACPG0019016

MOTOR:
DB58TIS631003EN

MODELO:
2016

MQ-026
EXCAVADORA DX225LCA

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS

Cra 26# 36 -14
Edificio Fenix Business
Center
Oficina 403
Bucaramanga

5706720117

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

Libertad y Orden

No. 76822

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC054622	DOOSAN	DX225LCA	2016

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	EXCAVADORA	DHKCEBACPG0019016

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
NARANJA	DB58TIS 631003EN	ORUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
21700 Kg	2975 mm	2990 mm	9500 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
SERRANO GOMEZ JULIAN ANDRES

IDENTIFICACIÓN
C.C. 13.870.690

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
DIR TTOYTTE BUCARAMANGA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
07-06-2017	29-12-2020	******

ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	352017M00000141	22/02/2017



ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM03000003899

DIAN

Declaración de Importación

5000

1. Año: 2017

4. Número de formulario: 5007380555542

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8600647857 | 6. DV: 1 | 11. Apellidos y nombres o razón social: PRACO DIDACOL S A S

13. Dirección: AVEL DORADO 78-20 | 15. Teléfono: 4238300 | 17. Cód. Dirección seccional: 35 | 16. Cód. Dpto: 11 | 17. Cód. Ciudad/Municipio: 0 0 1

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8350008588 | 25. DV: 7 | 26. Razón social/actividad económica: AGENCIA DE ADUANAS NHORA GARCIA DIAZGRANADOS SAS,NIVEL 2 | 27. Año Vigencia: 55 | 28. Cód. Usuario: 0470

32. Número documento de identificación: 66732569 | 30. Apellidos y nombres: MIRANDA MINOTA LIMBANIA

01. Clase documento	02. Tipo declaración	03. Cód.	04. No. Formulario anterior	05. Año	Idex	Sec	06. Cód. Dec. Anticipada	07. Dependencia de valoración	08. Año	Mes	Día	09. Cód. Dependencia
02	INICIAL	1	XXXXXXXXXXXXX	XXXX	000	000	XX	XXXXXXXXXX	XXXX	000	000	XX

10. Cód. Lugar operación	11. Cód. Depósito	12. Numeración de cargue	13. Año	Mes	Día	14. No. Documento de transporte	15. Año	Mes	Día
BUN	907	907001213	2017	02	15	HDCLKRCO0010070	2016	12	29

16. Nombre vendedor o proveedor en el exterior: DOOSAN INFRACORE CO, LTD | 17. Ciudad: INCHEON | 17. Cód. Departamento/Estado: 199

18. Dirección vendedor o proveedor en el exterior: 400, INJUNG-RO,DONG GU INCHEON,KOREA | 19. Email: yeeju.lee@doosan.com

20. No. de factura	21. Fecha	22. Cód. Moneda	23. Cód. País	24. Cód. Modo	25. Cód. Tipo	26. Cód. Oficina	27. Lugar de operación	28. Fecha de cambio $
1123-A01612-0274	2016 12 29	190	1	500	11	MULTIPORT E.U		2,975.00

29. Sistema de valoración	30. Cód. Compensación	31. Cód. Vinculación	32. Cód. Tasa/Valor	33. No. Cuota	34. Valor cuota USD	35. Forma de pago	36. Cód. Con. Pago	37. Cód. Ajuste
6420529000	XXXX	XXXX	C236	XX	XXXX	XX	190	XXX

38. Peso bruto (kg)	39. Peso neto (kg)	40. Código tasa global	41. No. Bultos	42. Subpartida	43. Cód. Mon. Subpartida	44. Cantidad
21,700.00	21,700.00	PC	3	1	0	1.00

45. Valor Aduana USD	46. Valor Aduana $	47. Valor Agregado USD	48. Valor Agregado $
21,153.62	7,230.12	24.21	0.00

49. Seguros USD	50. Fletes USD	51. Otros gastos USD	52. Deducciones USD
7,260.37	0.00		

53. Total a pagar	54. Cód. Forma de pago	55. No. Planilla
58,420.00	N	XXXXXXXXX

56. Cód. Cliente	57. No. Id.	58. Proyecto No.	59. Cód. Sistema Valoración
00	XXXX	XXXXXX	XXX

Concepto	%	Base $	Total liquidado $	Total a pagar con esta hoja $	Total liquidado sobre $
Arancel	0.00	269,024,426	0	0	0
I.V.A.	19.00	269,024,426	53,775,000	0	0
Antidumping	0.00	0	0	0	0
Derechos compensatorios	0.00	0	0	0	0
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
Sanción	0.00	0	0	0	
Intereses	0.00	0	0	0	
	TOTAL	0	53,775,000		0

60. Observaciones: 01,BAP,CIRUKO,000,DU 3915 17 PEDIDO, DU15901,OD 9214 VALAUTO BANNER,ARANGEL 0% DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 1625 DE AGOSTO 14 DE 2015 DE UNIDAD NO REQUIERE LICENCIA PREVIA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO 16 DEL DECRETO 723 DE ABRIL 30 DE 2014,EL CUAL MODIFICO EL ANEXO 1 DEL DECRETO 925 DE MAYO 5 DE 2013, MODIFICADO POR EL ANEXO 1 DE LA CIRCULAR 031 DE DIC. 29 DE 2016 DE MINCOMERCIO,INDUSTRIA Y TURISMO,MERCANCIA NUEVA PRODUCTO EXCAVADORA MARCA DOOSAN MODELO DX225LCA REFERENCIA SIN REFERENCIA, SIN MOTOR MARCA DOOSAN MODELO D06FTS, ROOM DE 0.9 M3 BRAZO DE 2.4M, CUCHARON DE 1.24 M3, ZAPATAS DE 600MM, AÑO DE FABRICACION 2016. | Continúa en Items...

127. Valor pagos por fuera	128. Recibo oficial de pago aduanero No.	129. Fecha
0	XXXXXXXXX	XXXX 000 000

130. Espacio reservado DIAN - Aclaraciones Aforador

131. Espacio reservado para uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores

132. No. Aprobación declaración: 3201711000441

133. Fecha: 2017 02 22

134. Usuario: | 135. Fecha: XXXX 02 22

Para uso exclusivo del banco

136. Nombre: Luz Maria Correa Restrepo

137. C.C. No: 31,940,986

Firma declarante

Agencia de Aduanas Nhora Garcia Diazgranados S.A.S. Nivel 2

NIT. 830.008.888-7

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad receptora

BANCO CORPBANCA BUENAVENTURA OF. 20 FEB 2017 RECIBIDO SIN PAGO

998. Pago total $: 0

999. Espacios exclusivos para uso de la entidad financiera

BANCO CORPBANCA 06567460 2

(415)7707212489953(8020)85308011345118

20126090055554

DIAN

Declaración de Importación

500

1. Año | 2 0 1 7

Espacio reservado para la DIAN

Hoja No. 2

4. Número de formulario 5007300555542

(415)7707212400864(8020) 5007300555542 3

31. Source para declaración de las mercancías o importe con la señalada en el artículo de selección de Clasificación arancelaria – Incluya, cantidad, precios y otros)

USO: PARA CONSTRUCCION, OBRAS CIVILES, CARRETERAS Y MINERIA DESTINO: IMPORTACION PARA LA VENTA Y COMERCIALIZACION CON TODAS SUS PARTES Y ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO.ITEM 01: PEDIDO DO15101, SERIAL NUMERO: DHKCEBACPG0015016, MOTOR NUMERO: D0507IS IG1003EN, COLOR NARANJA, DATOS EN ETIQUETA DEL MOTOR MARCA: DOOSAN,MODEL: D0507IS, SERIAL MOTOR NO. 531003, OPTION ECOER,DATOS EN PLAQUETA DE LA CUCHARA MARCA: DOOSAN,MODEL: R2H7PW1395,DOOSAN NO: 230104-002958,SERIAL CUCHARA No: SS16L1503, PART NO: 950209-04791,NUMERO GRABADO EN LA CUCHARA SERIAL No: SS16L150358,NUMERO GRABADO EN EL MECANISMO DEL BRAZO: DHKCEBACPG0015016 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

20126090055554



MARCA:
BOBCAT

TIPO:
MINICARGADOR S570

SERIE:
AZNB11081

MOTOR:
8GE4564

MODELO:
2016

MQ-025
MINICARGADOR S570

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS

Cra 26# 36-14
Edificio Fenix Business Center
Oficina 403
Bucaramanga

26/05/2017

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 76742

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC060611	BOBCAT	S570	2016

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	CARGADOR	AZNB11061

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
BLANCO NARANJA	8GE4564	NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
2900 Kg	1972 mm	1643 mm	3378 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
SERRANO GOMEZ JULIAN ANDRES

IDENTIFICACIÓN
C.C. 13.870.690

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACION

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
DIR TTOYTTE BUCARAMANGA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
12-06-2017	28-12-2020	******

ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	32016001243943	12/09/2016



ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM03000003896

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2016**

Espacio reservado para la DIAN (antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de Formulario

032016001243943-1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860003437 | 6. DV: 9 | 37. Apellidos y nombres o Razón Social: CENTRAL SAS

22. Dirección: AV AMERICAS 16 11 | 23. Teléfono: 3650508 | 24. Cód. Adicto: 00 | 25. Cód. Dpto: 11 | 26. Cód. Ciudad Municipio: 001

IMPORTADOR

28. Número de Identificación Tributaria (NIT): 830009079 | 29. DV: 6 | 30. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL S.A.S NIVEL 1 - SIAP | 31. Tipo usuario: 26 | 32. Cód. usuario: 0080

33. Número documento de identificación: 79848880 | 35. Apellidos y nombres: RODRIGUEZ MORTIGO JORGE ENRIQUE

DECLARANTE

36. Clase importador	37. Tipo declaración	38. Cód.	39. No. Formulario Anterior	40. Año - Mes - Día	41. Cód. Adicto	42. No. Declaración de Importación	43. Año - Mes - Día	44. Cód. Adicto
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

45. Cód. lugar ingreso de las mercancías	46. Cód. Depósito	47. Manifiesto de carga	48. Año - Mes - Día	49. Declaración de transporte	50. Año - Mes - Día
BOG	13001	No. 010251639d	2016 - 09 - 03	No. 2110-0454-607.011	2016 - 08 - 03

51. Nombre suministrador o proveedor en el exterior	52. Cód/País	53. Cód/País Suministro
DOOSAN INFRACORE BOBCAT KOREA CO LTD	SEOUL	190

54. Dirección suministrador o proveedor en el exterior	55. Email
36F, DOOSAN TOWER, 275 JANGCHUNGDAN-RO, JUNG-GU	82233982569

56. No. de Sumario	57. Año - Mes - Día	58. Cód. país procedencia	59. Cód. Modo Transporte	60. Código de Aduana	61. Cód. Depto Aduana	62. Nombre del transportador	63. Tasa de cambio $ x=x
6970001406	2016 - 07 - 22	023	1	169	11	TRANSPORTES SARVI LTDA	2,846.12

S	64. Subpartida arancelaria	65. Cód. Complementación	66. Cód. Suplementación	67. Cód. Modalidad	68. Fec. cambio a euros	69. Valor aseg. USD	70. Forma de pago	71. Cód. país de origen	72. Cód. Adicional
	8429510000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	644	XXX

73. Forma de pago de la importación	74. Tipo de importación	75. Cód. país origen	76. Peso bruto liq.	77. Peso neto liq.	78. Código aduanero	79. No. Bultos	80. Subpartida	81. Cód. unidad comercial	82. Cantidad unid.
01	00	190	dcm. 33,430.00	dcm. 13,430.00	PK	24	1	U	12.00

83. Valor FOB USD	84. Valor Flete USD	85. Valor Seguros USD	86. Valor Otros Gastos USD	87. Descuento de Zona, seguros y otros gastos USD	88. Ajuste valor USD	89. Valor aduana USD	90. Código régimen y financiación	91. Número
290,817.49	4,062.32	1,135.29	0.00	5,197.61	0.00	296,015.09	X	XXXXXXXXXX

92. Cód. vBolívar	93. Año	94. Originales No.	95. Cód Interno del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	842,497,428	0	0	0
I.V.A.	16.00	842,497,428	134,800,000	134,800,000	0
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0	0	0	0	0
Recargo	0	0	0	0	
Tasa	0	0	0	0	
		Total	134,800,000		0

97. Descripción de las mercancías (Clase de artículo, marca, modelo, tipo, grado, calidad, composición, características técnicas, componentes, accesorios, partes, uso o destino, nombre técnico o comercial y demás datos que permitan identificar la mercancía)

YR: 1. DO: BOGNMA030317; IMPORTACIÓN: BOGNMA030317-1; DECLARACIÓN: 1, (Boginqrid), **COD DAP 1501**, MERCANCIA NUEVA DE PRIMERA C
AZIONE. SIN REGISTRO DE IMPORTACION NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DE 2013, NOS ACOGEMOS AL DECRETO NÚMERO 1625 DE 2015, EL CUAL MO
DIFICA PARCIALMENTE EL ARANCEL DE ADUANAS. MERCANCIA UBICADA EN MADMUN ZONA FRANCA SA, MZ 10 BG 86. NC: CARGADOR; MARCA: BOBC
AT (R); MOD: S570; REF: SIN REFERENCIA; CANT: 1; UND: PRODUCTO: CARGADOR, MOTOR DIESEL, TRANSMISION HIDROSTATICA EN SUS 4 RUEDAS
CON CUCHARA CARGADORA; USO O DESTINO: APLICACION PARA CONSTRUCCION, AGRICULTURA Y AFINES; INFORMACION DEL MOTOR MARCA KUBOTA V260
7-T CODE NO. 1J711-60100 PAIS DE ORIGEN: JAPON; PO: 644, REPUBLICA CHECA; SERIAL: A2NB11077 MOTOR BGE4676 P(continúa al respaldo)

97. Valor pagos anticipados	98. Factura global de pago anticipado No.	99. Fecha
0	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX XX XX

100. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera	101. Espacio reservado con exclusividad Ministerio de Relaciones Exteriores	102. No. Asignación declaración
Sello de levante Leyenda automática		032016001243943
No hay declaración posterior		103. Fecha: 2016 09 12

104. Levante No. 032016000999406	105. Fecha: 2016 - 09 - 12	Firma funcionario responsable	106. Nombre / 107. C.C. No.

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

998. Pago Total $ 134,800,000

996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)

BOGOTA
Autoadhesivo 01165081717608
Fecha presentación 2016-09-12 19:10:00
Valor pagado $134,800,000

Fecha de Impresión: 2016-09-12 20:48:39

20163933032008

DIAN

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Declaración de Importación

Aceptación : **032016001243943-1**

Subpartida : **8429510000**

[18] Descripción de la(s) mercancía (incluya marca, modelo y serie)

IO: BCTA2NBGYGDA11037 CON CUCHARON //; COMPACT SKID STEER LOADER MODEL: S570, AÑO: 2016, INCLUYE CUCHARON 6731421.EA 188 CM L/P B
UCKET .37 CU M (13 CU FT) ISO STRUCK .50 CU M (17.6 CU FT) ISO HEAPED BUCKET WT 242 KG BOBCAT ATTACHMENT MFG IN EU. ___ NC: CARGA
DOR; MARCA: BOBCAT (R); MOD: S570; REF: SIN REFERENCIA; CANT: 1; UNDS: PRODUCTO: CARGADOR. MOTOR DIESEL, TRANSMISION HIDROSTATICA
EN SUS 4 RUEDAS CON CUCHARA CARGADORA; USO O DESTINO: APLICACION PARA CONSTRUCCION, AGRICULTURA Y AFINES; INFORMACION DEL MOTOR
MARCA KUBOTA V2607-T CODE NO. 1J711-00000 PAIS DE ORIGEN: JAPON; PO: 644, REPUBLICA CHECA; SERIAL: A2NB11078 MOTOR 8GE4578 PIN: B
CTA1NBGPGDA11078 CON CUCHARON //; COMPACT SKID STEER LOADER MODEL: S570, AÑO: 2016, INCLUYE CUCHARON 6731421.EA 188 CM L/P BUCKET
.37 CU M (13 CU FT) ISO STRUCK .50 CU M (17.6 CU FT) ISO HEAPED BUCKET WT 242 KG BOBCAT ATTACHMENT MFG IN EU. ___ NC: CARGADOR;
MARCA: BOBCAT (R); MOD: S570; REF: SIN REFERENCIA; CANT: 1; UND; PRODUCTO: CARGADOR. MOTOR DIESEL, TRANSMISION HIDROSTATICA EN SU
S 4 RUEDAS CON CUCHARA CARGADORA; USO O DESTINO: APLICACION PARA CONSTRUCCION, AGRICULTURA Y AFINES; INFORMACION DEL MOTOR MARCA
KUBOTA V2607-T CODE NO. 1J711-00000 PAIS DE ORIGEN: JAPON; PO: 644, REPUBLICA CHECA; SERIAL: A2NB11079 MOTOR 8GE4582 PIN: BCTA2NB
GPGDA11079 CON CUCHARON //; COMPACT SKID STEER LOADER MODEL: S570, AÑO: 2016, INCLUYE CUCHARON 6731421.EA 188 CM L/P BUCKET .37 C
U M (13 CU FT) ISO STRUCK .50 CU M (17.6 CU FT) ISO HEAPED BUCKET WT 242 KG BOBCAT ATTACHMENT MFG IN EU. ___ NC: CARGADOR; MARCA:
BOBCAT (R); MOD: S570; REF: SIN REFERENCIA; CANT: 1; UND; PRODUCTO: CARGADOR. MOTOR DIESEL, TRANSMISION HIDROSTATICA EN SUS 4 RU
EDAS CON CUCHARA CARGADORA; USO O DESTINO: APLICACION PARA CONSTRUCCION, AGRICULTURA Y AFINES; INFORMACION DEL MOTOR MARCA KUBOTA
V2607-T CODE NO. 1J711-00000 PAIS DE ORIGEN: JAPON; PO: 644, REPUBLICA CHECA; SERIAL: A2NB11081 MOTOR 8GE4564 PIN: BCTA2NBGPGDA1
1081 CON CUCHARON //; COMPACT SKID STEER LOADER MODEL: S570, AÑO: 2016, INCLUYE CUCHARON 6731421.EA 188 CM L/P BUCKET .37 CU M (1
3 CU FT) ISO STRUCK .50 CU M (17.6 CU FT) ISO HEAPED BUCKET WT 242 KG BOBCAT ATTACHMENT MFG IN EU. FACTURA: 6970001472; FECHA: 20
16/07/22. ___ NC: CARGADOR; MARCA: BOBCAT (R); MOD: S570; REF: SIN REFERENCIA; CANT: 1; UND; PRODUCTO: CARGADOR. MOTOR DIESEL, TR
ANSMISION HIDROSTATICA EN SUS 4 RUEDAS CON CUCHARA CARGADORA; USO O DESTINO: APLICACION PARA CONSTRUCCION, AGRICULTURA Y AFINES;
INFORMACION DEL MOTOR MARCA KUBOTA V2607-T CODE NO. 1J711-00000 PAIS DE ORIGEN: JAPON; PO: 644, REPUBLICA CHECA; SERIAL: A2NB1107
3 MOTOR 8GE0562 PIN: BCTA2NBGLGDA11073 CON CUCHARON //; COMPACT SKID STEER LOADER MODEL: S570, AÑO: 2016, INCLUYE CUCHARON 673142
1.EA 188 CM L/P BUCKET .37 CU M (13 CU FT) ISO STRUCK .50 CU M (17.6 CU FT) ISO HEAPED BUCKET WT 242 KG BOBCAT ATTACHMENT MFG IN
EU. ___ NC: CARGADOR; MARCA: BOBCAT (R); MOD: S570; REF: SIN REFERENCIA; CANT: 1; UND; PRODUCTO: CARGADOR. MOTOR DIESEL, TRANSMIS
ION HIDROSTATICA EN SUS 4 RUEDAS CON CUCHARA CARGADORA; USO O DESTINO: APLICACION PARA CONSTRUCCION, AGRICULTURA Y AFINES; INFORM
ACION DEL MOTOR MARCA KUBOTA V2607-T CODE NO. 1J711-00000 PAIS DE ORIGEN: JAPON; PO: 644, REPUBLICA CHECA; SERIAL: A2NB11076 MOTO
R 8GE5723 PIN: BCTA2NBGSGDA11074 CON CUCHARON //; COMPACT SKID STEER LOADER MODEL: S570, AÑO: 2016, INCLUYE CUCHARON 6731421.EA 1
88 CM L/P BUCKET .37 CU M (13 CU FT) ISO STRUCK .50 CU M (17.6 CU FT) ISO HEAPED BUCKET WT 242 KG BOBCAT ATTACHMENT MFG IN EU. __
NC: CARGADOR; MARCA: BOBCAT (R); MOD: S570; REF: SIN REFERENCIA; CANT: 1; UND; PRODUCTO: CARGADOR. MOTOR DIESEL, TRANSMISION HI
DROSTATICA EN SUS 4 RUEDAS CON CUCHARA CARGADORA; USO O DESTINO: APLICACION PARA CONSTRUCCION, AGRICULTURA Y AFINES; INFORMACION
DEL MOTOR MARCA KUBOTA V2607-T CODE NO. 1J711-00000 PAIS DE ORIGEN: JAPON; PO: 644, REPUBLICA CHECA; SERIAL: A2NB11076 MOTOR 8GE4
575 PIN: BCTA2NBGEGDA11076 CON CUCHARON //; COMPACT SKID STEER LOADER MODEL: S570, AÑO: 2016, INCLUYE CUCHARON 6731421.EA 188 CM
L/P BUCKET .37 CU M (13 CU FT) ISO STRUCK .50 CU M (17.6 CU FT) ISO HEAPED BUCKET WT 242 KG BOBCAT ATTACHMENT MFG IN EU. __ NC:
CARGADOR; MARCA: BOBCAT (R); MOD: S570; REF: SIN REFERENCIA; CANT: 1; UND; PRODUCTO: CARGADOR. MOTOR DIESEL, TRANSMISION HIDROSTA
TICA EN SUS 4 RUEDAS CON CUCHARA CARGADORA; USO O DESTINO: APLICACION PARA CONSTRUCCION, AGRICULTURA Y AFINES; INFORMACION DEL MO
TOR MARCA KUBOTA V2607-T CODE NO. 1J711-00000 PAIS DE ORIGEN: JAPON; PO: 644, REPUBLICA CHECA; SERIAL: A2NB11082 MOTOR 8GE4707 SI
N: BCTA2NBGKGDA11082 CON CUCHARON //; COMPACT SKID STEER LOADER MODEL: S570, AÑO: 2016, INCLUYE CUCHARON 6731421.EA 188 CM L/P BU
CKET .37 CU M (13 CU FT) ISO STRUCK .50 CU M (17.6 CU FT) ISO HEAPED BUCKET WT 242 KG BOBCAT ATTACHMENT MFG IN EU. FACTURA: 69700
31474; FECHA: 2016/07/22. ___ NC: CARGADOR; MARCA: BOBCAT (R); MOD: S570; REF: SIN REFERENCIA; CANT: 1; UND; PRODUCTO: CARGADOR.
MOTOR DIESEL, TRANSMISION HIDROSTATICA EN SUS 4 RUEDAS CON CUCHARA CARGADORA; USO O DESTINO: APLICACION PARA CONSTRUCCION, AGRICU
LTURA Y AFINES; INFORMACION DEL MOTOR MARCA KUBOTA V2607-T CODE NO. 1J711-00000 PAIS DE ORIGEN: JAPON; PO: 644, REPUBLICA CHECA;
SERIAL: A2NB11068 MOTOR 8GE0580 PIN: BCTA2NBGVGDA11068 CON CUCHARON //; COMPACT SKID STEER LOADER MODEL: S570, AÑO: 2016, INCLUYE
CUCHARON 6731421.EA 188 CM L/P BUCKET .37 CU M (13 CU FT) ISO STRUCK .50 CU M (17.6 CU FT) ISO HEAPED BUCKET WT 242 KG BOBCAT AT
TACHMENT MFG IN EU. ___ NC: CARGADOR; MARCA: BOBCAT (R); MOD: S570; REF: SIN REFERENCIA; CANT: 1; UND; PRODUCTO: CARGADOR. MOTOR
DIESEL, TRANSMISION HIDROSTATICA EN SUS 4 RUEDAS CON CUCHARA CARGADORA; USO O DESTINO: APLICACION PARA CONSTRUCCION, AGRICULTURA
Y AFINES; INFORMACION DEL MOTOR MARCA KUBOTA V2607-T CODE NO. 1J711-00000 PAIS DE ORIGEN: JAPON; PO: 644, REPUBLICA CHECA; SERIAL:
A2NB11070 MOTOR 8GE0368 PIN: BCTA2NBGOGDA11070 CON CUCHARON //; COMPACT SKID STEER LOADER MODEL: S570, AÑO: 2016, INCLUYE CUCHA
RON 6731421.EA 188 CM L/P BUCKET .37 CU M (13 CU FT) ISO STRUCK .50 CU M (17.6 CU FT) ISO HEAPED BUCKET WT 242 KG BOBCAT ATTACHME
NT MFG IN EU. ___ NC: CARGADOR; MARCA: BOBCAT (R); MOD: S570; REF: SIN REFERENCIA; CANT: 1; UND; PRODUCTO: CARGADOR. MOTOR DIESE
L, TRANSMISION HIDROSTATICA EN SUS 4 RUEDAS CON CUCHARA CARGADORA; USO O DESTINO: APLICACION PARA CONSTRUCCION, AGRICULTURA Y AFIN
ES; INFORMACION DEL MOTOR MARCA KUBOTA V2607-T CODE NO. 1J711-00000 PAIS DE ORIGEN: JAPON; PO: 644, REPUBLICA CHECA; SERIAL: A2NB
11071 MOTOR 8GE0272 PIN: BCTA2NBGVGDA11071 CON CUCHARON //; COMPACT SKID STEER LOADER MODEL: S570, AÑO: 2016, INCLUYE CUCHARON 67
31421.EA 188 CM L/P BUCKET .37 CU M (13 CU FT) ISO STRUCK .50 CU M (17.6 CU FT) ISO HEAPED BUCKET WT 242 KG BOBCAT ATTACHMENT MFG
IN EU. ___ NC: CARGADOR; MARCA: BOBCAT (R); MOD: S570; REF: SIN REFERENCIA; CANT: 1; UND; PRODUCTO: CARGADOR. MOTOR DIESEL, TRANS
MISION HIDROSTATICA EN SUS 4 RUEDAS CON CUCHARA CARGADORA; USO O DESTINO: APLICACION PARA CONSTRUCCION, AGRICULTURA Y AFINES; IN
FORMACION DEL MOTOR MARCA KUBOTA V2607-T CODE NO. 1J711-00000 PAIS DE ORIGEN: JAPON; PO: 644, REPUBLICA CHECA; SERIAL: A2NB11075
MOTOR 8GE4535 PIN: BCTA2NBGEGDA11075 CON CUCHARON //; COMPACT SKID STEER LOADER MODEL: S570, AÑO: 2016, INCLUYE CUCHARON 6731421.
EA 188 CM L/P BUCKET .37 CU M (13 CU FT) ISO STRUCK .50 CU M (17.6 CU FT) ISO HEAPED BUCKET WT 242 KG BOBCAT ATTACHMENT MFG IN EU

XXXX



MARCA:
CATERPILLAR

TIPO:
RETROEXCAVADORA
420F2

SERIE:
CAT420FELBS00349

MOTOR:
G4D56404

MODELO:
2016

MQ-009
RETROEXCAVADORA
420F2

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS

Cra 26# 36 -14
Edificio Fenix Business
Center
Oficina 403
Bucaramanga

1/12/2016

MAQUINOBRAS
DE COLOMBIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

Libertad y Orden

No. 72822

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC046937	CATERPILLAR	420F2	2016

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	RETROEXCAVADORA	CAT0420FELBS00349

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	G4D56404	NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
8000 Kg	2770 mm	2300 mm	7.430 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACION
MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S	NIT 900.849.507

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

—

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
DIR TTOYTTE BUCARAMANGA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICION	FECHA VENCIMIENTO
01-12-2016	10-09-2020	******

ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	482016000403095	15/09/2016



ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM03000003830

BB000038

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2016**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea instrucciones)

4. Número de formulario

4820160004030 95-1

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860002576 | 6. DV: 1 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S A GECOLSA

13. Dirección: AV AMERICAS 42 A 21 | 15. Teléfono: 4055544 | 43. Cód. Admón.: 48 | 16. Cód. Ciiu: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 802000764 | 25. DV: 8 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS LOPEZ HERMANOS S.A. NIVEL 1 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 0210

29. Número documento de identificación: 32897386 | 30. Apellidos y nombres: ADRIANA Y DE LA ROSA MUÑOZ

21. Clase importador	22. Tipo declaración	23. Cód.	24. No. Formulario Anterior	25. Año - Mes - Día	26. Cód. Admón.	27. Declaración de Importación	28. Año - Mes - Día	29. Cód. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cód. Lugar Ingreso de las mercancías	41. Cód. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de Transporte	45. Año - Mes - Día
CTG	13911	No. 918296579	2016 - 09 - 12	No. SUDU86ITJUC1098X	2016 - 08 - 11

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: CATERPILLAR AMERICAS S.A.R.L. | 47. Ciudad: GENEVA | 48. Cód. País Exportador: 767

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: BOITE POSTALE 6000 CH-1211 | 50. E-mail: akers_william_w@cat.com

51. No. de Levante	52. Año - Mes - Día	53. Cód. país procedencia	54. Cód. Modo Transporte	55. Código de Sección	56. Cód. Depósito Aduana	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ x/x.
CJGML117935	2016 - 08 - 03	018	1	590	25	EDUARDO L GERLEIN S A	2,846.12

S

59. Subpartida arancelaria	60. Cód. Complementario	61. Cód. Suplementario	62. Cód. Modalidad	63. No. cuotas o apoyo	64. Valor aduana USD	65. Periodicidad del pago de la renta	66. Cód. país de origen	67. Cód. Acuerdo
8429590000	XX	XX	C200	XX	XXXX	XX	105	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cód. país compra	71. Peso bruto kgs.	dcms.	72. Peso neto kgs.	dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cód. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
01	01	767	8,000.00		8,000.00		PK	9	1	U	1.00

78. Valor FOB USD	79. Valor flete USD	80. Valor seguros USD	81. Valor otros gastos USD	82. Guarderías de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD	84. Valor aduana USD	85. Código régimen y tratado	86. Mercancía
82,682.03	406.50	86.70	60.00	633.29	0.00	83,186.32	X	XXXXXXXXXX

87. Cód. Moneda	88. Año	89. Programa Aforo	90. Cód Externo del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	236,784,698	0	0	0
I.V.A.	16.00	236,784,698	37,886,000	0	0
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0	0	0	0	0
Sanción	0	0	0	0	
Renta	0	0	0	0	
		Total	37,886,000		0

91. Descripción de las mercancías (No repetir la descripción de las mercancías a legalizar cuando solicitud se el acceso de ahorro en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, modelos y otros) (En el campo no mecanizable, continúe el reverso de este formulario)

001 SUDU86ITJUC1098X 013 4PEQ 001/001 .NOS ACOGEMOS AL DTO. 925 DE 9 MAYO/2013. Nos acogemos al Dto. 723 de abril 10 de 2014. PRODUCTO:RETROEXCAVADORA CARGUERA, MARCA:CATERPILLAR, MODELO:420F2, USO O DESTINO: CONSTRUCCION Y MINERIA. MANIFIESTO DE CARGA: 116575007182897, FECHA: 2016-08-27 REFERENCIA: 448-4770, SERIAL PRINCIPAL: CAT0420PELA800345, SERIAL DEL MOTOR:G4056404, MODELO MOTOR:3054C, FORMULARIO DE INGRESO A ZONA FRANCA:918296049, FECHA:2016/09/05, NACIONALIZACION PARCIAL EL NUMERO:SUDU86ITJUC1098X, ORDEN NUMERO: BB000038, CANTIDAD: (00001). Or: BR. XXXXXXXXXXXXX

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-19
		Fecha	01/11/2022
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	MODELO	UBICACIÓN
Freddy Galvis	1064910401	73	140	Centro Occidente

INSPECCIÓN

ITEM	CRITERIO DE CONTROL	MES 1	2	3	4	AÑO 5	6	7
				9			2025	
1	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras y del seguimiento de la consola de control.							
2	Verificar estado de extintor de incendios.							
3	Verificar estado vidrio panorámico.							
4	Verificar estado de limpiaparabrisas (líquido, plumillas).							
5	Verificar estado de asientos.							
6	Verificar estado de los espejos.							
7	Verificar aire acondicionado.							
8	Verificar estado de palancas y pedales.							
9	Verificar escaleras y apoyos de accesos.							
10	Confirmar el correcto funcionamiento del cinturón de seguridad.							
11	Verificar pito-alarma de retroceso.							
12	Controlar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro).							
13	Verificar el manejo de estacionamiento (Freno de emergencia).							
14	Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.							
15	Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.							
16	Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidráulicos, refrigerante, horometro, corriente).							
17	Controlar el nivel de aceite del motor.							
18	Controlar el nivel de aceite hidráulico.							
19	Controlar el nivel de combustible.							
20	Controlar el prefiltro de combustible y el drenaje de agua, según sea necesario.							
21	Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.							
22	Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro.							
23	Verificar estado de mangueras.							
24	Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levanta del brazo.							
25	Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal.							
26	Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.							
27	Verificar el sistema de escape							
28	Engrasar el cojinete de Giro.							
29	Verificar estado de botiquín.							
30	Inspeccionar el ventilador del motor.							
31	Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta.							
32	Limpiar la malla antipolvo delante del refrigerante de aceite y el radiador intermedio.							
33	Verificar estado de baterías.							
34	Verificar estado de los cilindros.							
35	Controlar el nivel de aceite del motor de traslación.							
36	Verificar el estado general del balde (bujes, pasadores, dientes, esquineras).							
37	Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya piezas flojas, gastadas o dañadas (ventilos, zapatas, rodillos, guías).							

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

X Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	
Fecha	
Versión	
Página	

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Cyfro abastos
OPERADOR: Fiddel Galvis
PROYECTO: Consorcio Cauca

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	1	2	3	4	5	6	7
HOROMETRO	1678	1686	1694	1702	1700	1714	
COMBUSTIBLE	60	—	—	60	—	—	
ACEITE MOTOR	—	—	—				
ACEITE HIDRAULICO	—	—	—				
ACEITE TRANSMISION	—	—	—				
GRASA	✓	—	—				
REFRIGERANTE							
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Fiddel Galvis
FECHA	08 - 09 - 2025
FIRMA INSPECCION	
FECHA	

SELECTRONIC	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM.F.46
		Fecha	11/12/20
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Fredy Soto	1075910304	73	140	Cerromaton

INSPECCIÓN

ITEM	CRITERIO DE CONTROL	MES		09		AÑO	2025	
		8	9	10	11	12	13	14
1	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras y de seguimiento de la consola de control.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Verificar estado de extintor de incendios.		✓	✓	✓	✓	✓	
3	Verificar estado vidrio panoramico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	Verificar estado de limpiaparabrisas (liquido, plumillas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	Verificar estado de asientos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	Verificar estado de los espejos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	Verificar aire acondicionado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	Verificar estado de palancas y pedales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	Verificar escaleras y apoyos de accesos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	Confirmar el correcto funcionamiento del cinturon de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	Verificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	Controlar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	Verificar el mando de estacionamiento (Freno de emergencia).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidraulicos, refrigerante, horometro, corriente)	✓	—	✓	✓	✓	✓	
17	Controlar el nivel de aceite del motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	Controlar el nivel de aceite hidraulico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	Controlar el nivel de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	Controlar el prefiltro de combustible y el drenaje de agua, según sea necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	Verificar estado de mangueras.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante del brazo.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	Verificar el sistema de escape	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28	Engrasar el cojinete de Giro.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	Verificar estado de botiquin.							
30	Inspeccionar el ventilador del motor.							
31	Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta.							
32	Limpiar la malla antipolvo delante del refrigerante de aceite y el radiador intermedio.							
33	Verificar estado de baterías.							
34	Verificar estado de los cilindros.							
35	Controlar el nivel de aceite del motor de traslación.							
36	Verificar el estado general del balde (Bujes, pasadores, dientes, esquineros).							
37	Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya piezas flojas, gastadas o dañadas (varillas, zapatas, rodillos, guias).							

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación.

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones

OBSERVACIONES

DECOLOMBIA

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	
Fecha	
Versión	
Página	1 de 1

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Centro abastos
OPERADOR: Freddy Galvis
PROYECTO: Consorcio

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	8	9	10	11	12	13	14
HOROMETRO	1721	1729	1737	1745	1752	—	
COMBUSTIBLE	—	60	—	—	/	—	
ACEITE MOTOR	—	—	—	—	/	—	
ACEITE HIDRAULICO	—	—	—	—	/	—	
ACEITE TRANSMISION	—	—	—	—	—	—	
GRASA	✓	✓	/	✓	/	—	
REFRIGERANTE						—	
OTRO						—	

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Freddy Galvis
FECHA	8-09-2025
FIRMA INSPECCION	
FECHA	

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-09
		Fecha	11/10/2020
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	SERIE	LOCACIÓN
Freddy Cano	1095909454	73	140	Contratista

INSPECCIÓN

MES 09 AÑO 2025

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	15	16	17	18	19	20	21
1		Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras y de seguimiento de la consola de control.	✓						
2		Verificar estado de extintor de incendios.	✓						
3		Verificar estado vidrio panoramico.	✓						
4		Verificar estado de limpiaparabrisas (liquido, plumillas).	✓						
5		Verificar estado de asientos.	✓						
6		Verificar estado de los espejos.	✓						
7		Verificar aire acondicionado.	✓						
8		Verificar estado de palancas y pedales.	✓						
9		Verificar escaleras y apoyos de acceso.	✓						
10		Confirmar el correcto funcionamiento del cinturon de seguridad.	✓						
11		Verificar pito-alarma de retroceso.	✓						
12		Controlar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro).	✓						
13		Verificar el mando de estacionamiento (Freno de emergencia).	✓						
14		Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.	✓						
15		Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.	✓						
16		Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidraulicos, refrigerante, horometro, corriente).	✓						
17		Controlar el nivel de aceite del motor.	✓						
18		Controlar el nivel de aceite hidraulico.	✓						
19		Controlar el nivel de combustible.	✓						
20		Controlar el prefiltro de combustible y el drenaje de agua, segun sea necesario.	✓						
21		Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.	✓						
22		Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro.	✓						
23		Verificar estado de mangueras.	✓						
24		Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante del brazo.	✓						
25		Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal.	✓						
26		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓						
27		Verificar el sistema de escape	✓						
28		Engrasar el cojinete de Giro.	✓						
29		Verificar estado de botiquin.							
30		Inspeccionar el ventilador del motor.							
31		Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta.							
32		Limpiar la malla antipolvo delante del refrigerante de aceite y el radiador intermedio.							
33		Verificar estado de bateria.							
34		Verificar estado de los cilindros.							
35		Controlar el nivel de aceite del motor de traslación.							
36		Verificar el estado general del balde (bujes, pasadores, dientes, esquineras).							
37		Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya piezas flojas, ganadas o dañadas (varillas, zapatas, rodillos, guias).							

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código: GM-Ins Fecha: 111020 Versión: 1 Página: 1 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Centrobustos
OPERADOR: Freddy Calvo
PROYECTO: Concesión Cauca

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	15	16	17	18	19	20	21
HOROMETRO	1761	1770	1779	1787	1796	1801	
COMBUSTIBLE	60	—	—	60	—	—	
ACEITE MOTOR	—	—	—	—	—	—	
ACEITE HIDRAULICO	—	—	—	—	—	—	
ACEITE TRANSMISION	—	—	—	—	—	—	
GRASA	—	✓	—	✓	—	—	
REFRIGERANTE							
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Freddy Calvo
FECHA	15-09-2025.
FIRMA INSPECCION	
FECHA	

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	SM-F-26
		Fecha	11/2020
		Versión	1
		Página	1 de 1

TIPO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Freddy Cortes	1094907052	13	140	Cartagena

INSPECCIÓN

ITEM	CRITERIO DE CONTROL	MES				AÑO		
		22	23	24	25	26	27	20
1	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras y de seguimiento de la consola de control.	✓	✓	✓	✓			
2	Verificar estado de extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓			
3	Verificar estado vidrio panorámico.	✓	✓	✓	✓			
4	Verificar estado de limpiaparabrisas (líquido, plumillas).	✓	✓	✓	✓			
5	Verificar estado de asientos.	✓	✓	✓	✓			
6	Verificar estado de los espejos.	✓	✓	✓	✓			
7	Verificar aire acondicionado.	✓	✓	✓	✓			
8	Verificar estado de palancas y pedales.	✓	✓	✓	✓			
9	Verificar escaleras y apoyos de accesos.	✓	✓	✓	✓			
10	Confirmar el correcto funcionamiento del cinturón de seguridad.	✓	✓	✓	✓			
11	Verificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓	✓			
12	Controlar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro).	✓	✓	✓	✓			
13	Verificar el mando de estacionamiento (Freno de emergencia).	✓	✓	✓	✓			
14	Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.	✓	✓	✓	✓			
15	Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.	✓	✓	✓	✓			
16	Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidráulicos, refrigerante, horometro, combustible).	✓	✓	✓	✓			
17	Controlar el nivel de aceite del motor.	✓	✓	✓	✓			
18	Controlar el nivel de aceite hidráulico.	✓	✓	✓	✓			
19	Controlar el nivel de combustible.	✓	✓	✓	✓			
20	Controlar el prefiltro de combustible y el drenaje de agua, según sea necesario.	✓	✓	✓	✓			
21	Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.	✓	✓	✓	✓			
22	Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro.	✓	✓	✓	✓			
23	Verificar estado de mangueras.	✓	✓	✓	✓			
24	Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante del brazo.	✓	✓	✓	✓			
25	Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal.	✓	✓	✓	✓			
26	Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓	✓			
27	Verificar el sistema de escape.	✓	✓	✓	✓			
28	Engrasar el coyote de Giro.							
29	Verificar estado de botiquín.							
30	Inspeccionar el ventilador del motor.							
31	Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta.							
32	Limpiar la malla antipolvo delante del refrigerante de aceite y el radiador intermedio.							
33	Verificar estado de batería.							
34	Verificar estado de los cilindros.							
35	Controlar el nivel de aceite del motor de traslación.							
36	Verificar el estado general del balde (bujes, pasadores, dientes, esquineras).							
37	Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya piezas flojas, gastadas o dañadas (zapatas, rodillos, guías).							

REVISIÓN DIARIA

REVISIÓN SEMANAL

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	
		Fecha	111309
		Versión	1
		Página	1 de 1

INFORMACIÓN

UBICACION: ~~Medellín Cali~~ Centro abastos
OPERADOR: ~~Fredy Galvis~~
PROYECTO: Consorcio Cauca

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	22	23	24	25	26	27	28
HOROMETRO	1810	1819	1827	1836	1846	1850	
COMBUSTIBLE	60	—	—	60	—	—	
ACEITE MOTOR	—	—	—	—	—	—	
ACEITE HIDRAULICO	—	—	—	—	—	—	
ACEITE TRANSMISION	—	—	—	—	—	—	
GRASA	✓	—	—	✓	—	✓	
REFRIGERANTE							
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Fredy Galvis
FECHA	22-09-2023
FIRMA INSPECCION	
FECHA	

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código Fecha Versión Página

TIPO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CEDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Fredd Celis	1075270421	73	1110	Cantera Lata

INSPECCIÓN

ITEM	CRITERIO DE CONTROL	MES		09		AÑO	2025	
		29	30	1	2	3	4	5
1	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras y de seguimiento de la consola de control.							
2	Verificar estado de extintor de incendios.							
3	Verificar estado vidrio panoramico.							
4	Verificar estado de limpiaparabrisas (liquido, plumillas).							
5	Verificar estado de espejos.							
6	Verificar estado de los asientos.							
7	Verificar aire acondicionado.							
8	Verificar estado de palancas y pedales.							
9	Verificar escaleras y apoyos de accesos.							
10	Confirmar el correcto funcionamiento del cinturon de seguridad.							
11	Verificar pito-alarma de retrocesos.							
12	Controlar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro).							
13	Verificar el mando de estacionamiento (Freno de emergencia).							
14	Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.							
15	Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.							
16	Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidraulicos, refrigerante, horometro, corriente).							
17	Controlar el nivel de aceite del motor.							
18	Controlar el nivel de aceite hidraulico.							
19	Controlar el nivel de combustible.							
20	Controlar el prefiltro de combustible y el drenaje de agua, segun sea necesario.							
21	Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.							
22	Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro.							
23	Verificar estado de mangueras.							
24	Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante del brazo.							
25	Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal.							
26	Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.							
27	Verificar el sistema de escape							
28	Engrasar el cojinete de Giro.							
29	Verificar estado de botiquin.							
30	Inspeccionar el ventilador del motor.							
31	Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta.							
32	Limpiar la malla antipolvo delante del refrigerante de aceite y el radiador intermedio.							
33	Verificar estado de bateria.							
34	Verificar estado de los cilindros.							
35	Controlar el nivel de aceite del motor de oscilación.							
36	Verificar el estado general del cable (bujes, pasadores, dientes, esquineras).							
37	Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no hayo piezas flojas, pasadas o dañadas (varillas, zapatas, rodillos, guias).							

REVISIÓN DIARIA

REVISIÓN SEMANAL

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código | Fecha | Versión | Página

INFORMACIÓN

UBICACION: Centro Labores
OPERADOR: Fredd Gal...
PROYECTO: Consolici... Cruce

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	29	30	1	2	3	4	5
HOROMETRO	1859	1869	1878	1885	1895		
COMBUSTIBLE	GO	~	~	GO			
ACEITE MOTOR	~	~	~	~			
ACEITE HIDRAULICO	~	~	~	~			
ACEITE TRANSMISION	~	~	~	~			
GRASA	✓	✓	✓	✓			
REFRIGERANTE							
OTRO							

OBSERVACIONES

* pendiente mantenimiento preventivo con 80 horas pasadas
* los pasadores del valde tienen desgastes

FIRMA OPERADOR	Fredd Galvis
FECHA	29-09-2025
FIRMA INSPECCION	
FECHA	

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-08
		Fecha	1/11/2025
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Ducan Britango Ramirez	47357094	35	225	abastos

INSPECCION

ITEM	REVISIÓN DIARIA — CRITERIO DE CONTROL	MES	09			AÑO	2025
		01	02	03	04	05	06
1	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadores y de seguimiento de la consola de control.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Verificar estado de extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Verificar estado vidrio panoramico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Verificar estado de limpiaparabrisas (liquido, plumillas).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Verificar estado de asientos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Verificar estado de los espejos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Verificar aire acondicionado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Verificar estado de palancas y pedales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Verificar escaleras y apoyos de accesos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	Confirmar el correcto funcionamiento del cinturon de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	Verificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	Controlar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	Verificar el mando de estacionamiento (Freno de emergencia).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidraulicos, refrigerante, horometro, gorriente).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	Controlar el nivel de aceite del motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	Controlar el nivel de aceite hidráulico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	Controlar el nivel de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	Controlar el prefiltro de combustible y el drenaje de agua, según sea necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	Verificar estado de manguetas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levanta del brazo.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	Verificar el sistema de escape	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	Engrasar el cojinete de Giro.	✓		✓		✓	
29	**REVISIÓN SEMANAL** — Verificar estado de bolquín.						
30	Inspeccionar el ventilador del motor.						
31	Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta.						
32	Limpiar la malla antipolvo delante del refrigerante de aceite y el radiador intermedio.						
33	Verificar estado de bateria.						
34	Verificar estado de los cilindros.						
35	Controlar el nivel de aceite del motor de traslación.						
36	Verificar el estado general del balde (bujes, pasadores, dientes, esquineras).						
37	Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya piezas flojas, gastadas o dañadas (varillas, zapatas, rodillos, guias).						

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	
Fecha	
Versión	
Página	

INFORMACION

UBICACIÓN: [redacted] abastos

OPERADOR: Duvan Bustos Ramirez

PROYECTO: Cauce

REPORTE DE HOROMETROS Y CONSUMOS

FECHA	0907	0902	0903	0904	0905	0906	
HOROMETRO	74862	74870	74878	74888	74896	74905	
COMBUSTIBLE	bo	no	bo	no	no	no	
ACEITE MOTOR	no	no	no	no	no	no	
ACEITE HIDRAULICO	no	no	no	no	no	no	
ACEITE TRANSMISION	no	no	no	no	no	no	
GRASA	si	si	si	si	si	no	
REFRIGERANTE	no	no	no	no	no	no	
OTRO	no	no	no	no	no	no	

OBSERVACIONES

exta dañado unos carriles tiene fuga de itoblico por los yostin
Fugas por una botella tiene unos Zapatos Sueltos
tiene dañadas un guarda cadena le falta un guarda cadena
se dañó el bol de sepore martillo
se exto trabordo con el martillo

FIRMA OPERADOR	
FECHA	
FIRMA INSPECCION	
FECHA	

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	
		Fecha	
		Versión	
		Página	

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Dulon Bustrago Ramirez	9735094	35	225	obstos

INSPECCION

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES	09			AÑO	2025
			08	09	70	77	72	
1	REVISIÓN DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadores y de seguimiento de la consola de control.	✓	✓	✓	✓	✓	
2		Verificar estado de extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓	✓	
3		Verificar estado vidrio panoramico.	✓	✓	✓	✓	✓	
4		Verificar estado de limpiaparabrisas (liquido, plumillas).	✓	✓	✓	✓	✓	
5		Verificar estado de asientos.	✓	✓	✓	✓	✓	
6		Verificar estado de los espejos.	✓	✓	✓	✓	✓	
7		Verificar aire acondicionado.	✓	✓	✓	✓	✓	
8		Verificar estado de palancas y pedales.	✓	✓	✓	✓	✓	
9		Verificar escaleras y apoyos de accesos.	✓	✓	✓	✓	✓	
10		Confirmar el correcto funcionamiento del cinturon de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓	
11		Verificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓	✓	✓	
12		Controlar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro).	✓	✓	✓	✓	✓	
13		Verificar el mando de estacionamiento (Freno de emergencia).	✓	✓	✓	✓	✓	
14		Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.	✓	✓	✓	✓	✓	
15		Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.	✓	✓	✓	✓	✓	
16		Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidraulicos, refrigerante, horometro, corriente).	✓	✓	✓	✓	✓	
17		Controlar el nivel de aceite del motor.	✓	✓	✓	✓	✓	
18		Controlar el nivel de aceite hidraulico.	✓	✓	✓	✓	✓	
19		Controlar el nivel de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	
20		Controlar el prefiltro de combustible y el drenaje de agua, según sea necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	
21		Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	
22		Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro.	✓	✓	✓	✓	✓	
23		Verificar estado de mangueras.	✓	✓	✓	✓	✓	
24		Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante del brazo.	✓	✓	✓	✓	✓	
25		Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal.	✓	✓	✓	✓	✓	
26		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓	✓	✓	
27		Verificar el sistema de escape	✓	✓	✓	✓	✓	
28		Engrasar el cojinete de Giro.	✓					
29	REVISIÓN SEMANAL	Verificar estado de botiquín. -						
30		Inspeccionar el ventilador del motor.						
31		Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta.						
32		Limpiar la malla antipolvo celarde del refrigerante de aceite y el radiador intermedio.						
33		Verificar estado de bateria.						
34		Verificar estado de los cilindros.						
35		Controlar el nivel de aceite del motor de traslación.						
36		Verificar el estado general del balde (bujes, pasadores, dientes, esquineras).						
37		Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya placas flojas, gastadas o dañadas (varillas, zapatas, rodillos, guias).						

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	
		Fecha	
		Versión	1
		Página	1 de 1

INFORMACIÓN

UBICACIÓN:	abastos
OPERADOR:	Duvan Buitrago Ramirez
PROYECTO:	cauce

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	0908	0909	0910	0911	0912		
HOROMETRO	74905	74913	74921	74931	74940		
COMBUSTIBLE	bo	no	bo	no	bo		
ACEITE MOTOR	no	no	no	no	no		
ACEITE HIDRAULICO	no	no	no	no	no		
ACEITE TRANSMISION	no	no	no	no	no		
GRASA	si	si	si	si	si		
REFRIGERANTE	no	no	no	no	no		
OTRO	no	no	no	no	no		

OBSERVACIONES

tiene fugo de iteblico polos expunes delos yestin
i por un silindro del estel tiene dañados unos cortales
tiene unas tetas sueltas le faltan los guarda cadenes
tiene fuido en lo lamba iteblica

FIRMA OPERADOR	
FECHA	
FIRMA INSPECCION	
FECHA	

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	GM-F-08
Fecha	17/11/2020
Versión	1
Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Duvan Buitrago Ramirez	9735094	35	225	obastos

INSPECCION

ITEM	CRITERIO DE CONTROL	MES	09			AÑO	2025
		75	76	77	78	79	20
1	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras y de seguimiento de la consola de control.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Verificar estado de extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Verificar estado vidrio panoramico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Verificar estado de limpiaparabrisas (liquido, plumillas).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Verificar estado de asientos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Verificar estado de los espejos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Verificar aire acondicionado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Verificar estado de palancas y pedales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Verificar escaleras y apoyos de accesos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	Confirmar el correcto funcionamiento del cinturon de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	Verificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	Controlar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	Verificar el mando de estacionamiento (Freno de emergencia).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidraulicos, refrigerante, horometro, corriente).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	Controlar el nivel de aceite del motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	Controlar el nivel de aceite hidráulico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	Controlar el nivel de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	Controlar el prefiltro de combustible y el drenaje de agua, según sea necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	Verificar estado de mangueras.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante del brazo.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	Verificar el sistema de escape	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	Engrasar el cojinete de Giro.	✓		✓		✓	
29	Verificar estado de botiquin.						
30	Inspeccionar el ventilador del motor.						
31	Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta.						
32	Limpiar la malla antipolvo delante del refrigerante de aceite y el radiador intermedio.						
33	Verificar estado de bateria.						
34	Verificar estado de los cilindros.						
35	Controlar el nivel de aceite del motor de traslación.						
36	Verificar el estado general del balde (bujes, pasadores, dientes, esquineres).						
37	Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya piezas flojas, gastadas o dañadas (ventilas, zapatas, rodillos, guías).						

REVISIÓN DIARIA / REVISIÓN SEMANAL

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	
Fecha	
Versión	1
Página	1 de 1

INFORMACION

UBICACIÓN: abastos

OPERADOR: Dylan Buitrago Ramirez

PROYECTO: Cause

REPORTE DE HORIMETROS Y CONSUMOS

FECHA	0975	0976	0977	0978	0979	0920	
HOROMETRO	74947	74957	74967	74976	74985	74995	
COMBUSTIBLE	no	bo	bo	no	bo	no	
ACEITE MOTOR	no	no	no	no	no	no	
ACEITE HIDRAULICO	no	no	no	no	no	no	
ACEITE TRANSMISION	no	no	no	no	no	no	
GRASA	si	si	si	si	si	si	
REFRIGERANTE	no	no	no	no	no	no	
OTRO	no	no	no	no	no	no	

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	
FECHA	
FIRMA INSPECCION	
FECHA	

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	
Fecha	
Versión	1
Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	HORÓMETRO	UBICACIÓN
Duvan Bustillo Ramirez	97757094	15	225	Abastos

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES	09			AÑO	2025
			22	23	24	25	26	27
1	REVISIÓN DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras y de seguimiento de la consola de control.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2		Verificar estado de extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3		Verificar estado vidrio panoramico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4		Verificar estado de limpiaparabrisas (liquido, plumillas).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5		Verificar estado de asientos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6		Verificar estado de los espejos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7		Verificar aire acondicionado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8		Verificar estado de palancas y pedales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9		Verificar escaleras y apoyos de accesos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10		Confirmar el correcto funcionamiento del cinturon de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11		Verificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12		Controlar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13		Verificar el mando de estacionamiento (Freno de emergencia).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14		Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15		Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16		Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidraulicos, refrigerante, horometro, corriente).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17		Controlar el nivel de aceite del motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18		Controlar el nivel de aceite hidraulico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19		Controlar el nivel de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20		Controlar el prefiltro de combustible y el drenaje de agua, según sea necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21		Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22		Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23		Verificar estado de mangueras.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24		Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante del brazo.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25		Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27		Verificar el sistema de escape	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28		Engrasar el cojinete de Giro	✓		✓		✓	
29	REVISIÓN SEMANAL	Verificar estado de botiquin.						
30		Inspeccionar el ventilador del motor.						
31		Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta.						
32		Limpiar la malla antipolvo delante del refrigerante de aceite y el radiador intermedio.						
33		Verificar estado de bateria.						
34		Verificar estado de los cilindros.						
35		Controlar el nivel de aceite del motor de traslación.						
36		Verificar el estado general del balde (bujes, pasadores, dientes, esquineras).						
37		Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya piezas flojas, gastadas o dañadas (varillas, zapatas, rodillos, guias).						

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple llenar observaciones

OBSERVACIONES

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	
Fecha	
Versión	
Página	

INFORMACION

UBICACIÓN: Apostes

OPERADOR: Nelson Bonilla Ramirez

PROYECTO: Cauce

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	0922	0923	0924	0925	0926	0927	
HOROMETRO	75000	75006	75076	75025	75034	75044	
COMBUSTIBLE	bo	no	bo	no	bo	no	
ACEITE MOTOR	no	no	no	no	no	no	
ACEITE HIDRAULICO	no	no	no	no	no	no	
ACEITE TRANSMISION	no	no	no	no	no	no	
GRASA	si	si	si	si	si	si	
REFRIGERANTE	no	no	no	no	no	no	
OTRO	no	no	no	no	no	no	

OBSERVACIONES

Sele cambio unos pernos internos de las zapatas

FIRMA OPERADOR	
FECHA	
FIRMA INSPECCION	
FECHA	

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	SM-F-09
		Fecha	1/11/2020
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA | RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CEDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Duran Beltrago Ramirez	97157094	35	225	abastos

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES 09 / AÑO 2025						
			29	30	01	02	03		
1	REVISIÓN DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras y de seguimiento de la consola de control.	✓	✓	✓	✓	✓		
2		Verificar estado de extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓	✓		
3		Verificar estado vidrio panorámico.	✓	✓	✓	✓	✓		
4		Verificar estado de limpiaparabrisas (líquido, plumillas).	✓	✓	✓	✓	✓		
5		Verificar estado de asientos.	✓	✓	✓	✓	✓		
6		Verificar estado de los espejos.	✓	✓	✓	✓	✓		
7		Verificar aire acondicionado.	✓	✓	✓	✓	✓		
8		Verificar estado de palancas y pedales.	✓	✓	✓	✓	✓		
9		Verificar escaleras y apoyos de accesos.	✓	✓	✓	✓	✓		
10		Confirmar el correcto funcionamiento del cinturon de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓		
11		Verificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓	✓	✓		
12		Controlar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro).	✓	✓	✓	✓	✓		
13		Verificar el mando de estacionamiento (Freno de emergencia).	✓	✓	✓	✓	✓		
14		Inspeccionar si hay grietas o soldeduras defectuosas en la estructura.	✓	✓	✓	✓	✓		
15		Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.	✓	✓	✓	✓	✓		
16		Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidraulicos, refrigerante, horometro, corriente).	✓	✓	✓	✓	✓		
17		Controlar el nivel de aceite del motor.	✓	✓	✓	✓	✓		
18		Controlar el nivel de aceite hidráulico.	✓	✓	✓	✓	✓		
19		Controlar el nivel de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓		
20		Controlar el prefiltro de combustible y el drenaje de agua, según sea necesario.	✓	✓	✓	✓	✓		
21		Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.	✓	✓	✓	✓	✓		
22		Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro.	✓	✓	✓	✓	✓		
23		Verificar estado de mangueras.	✓	✓	✓	✓	✓		
24		Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante del brazo.	✓	✓	✓	✓	✓		
25		Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal.	✓	✓	✓	✓	✓		
26		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓	✓	✓		
27		Verificar el sistema de escape	✓	✓	✓		✓		
28		Engrasar el cojinete de Giro.	✓				✓		
29	REVISIÓN SEMANAL	Verificar estado de bolicuer.							
30		Inspeccionar el ventilador del motor.							
31		Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta.							
32		Limpiar la malla antipolvo delante del refrigerante de aceite y el radiador intermedio.							
33		Verificar estado de bateria.							
34		Verificar estado de los cilindros.							
35		Controlar el nivel de aceite del motor de traslación.							
36		Verificar el estado general del balde (bujes, pasadores, dientes, cuchillas).							
37		Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya piezas flojas, gastadas o dañadas (rieles, zapatas, rodillos, guías).							

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	GH-F-08
Fecha	1/1/2020
Versión	1
Página	1 de 1

INFORMACION

UBICACIÓN: 0605+65

OPERADOR: Duvan Buitrago Ramirez

PROYECTO: Cauce

REPORTE DE HOROMETROS Y CONSUMOS

FECHA	0929	0930	70/07	70/02	70/03		
HOROMETRO	75049	75060	75069	75077	75087		
COMBUSTIBLE	no	bo	bo	no	bo		
ACEITE MOTOR	no	no	no	no	no		
ACEITE HIDRAULICO	no	no	no	no	no		
ACEITE TRANSMISION	no	no	no	no	no		
GRASA	si	si	si	si	si		
REFRIGERANTE	no	no	no	no	no		
OTRO	no	no	no	no	no		

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	
FECHA	
FIRMA INSPECCION	
FECHA	

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-11
		Fecha	3/11/2020
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA RETROCARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Jesus Alexis Medrano		# 7	CAT 420 F2	

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES 1	2	3	4	AÑO 5	6
1	REVISIÓN DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas (delanteras, traseras, direccionales, stops)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2		Verificar estado extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3		Verificar estado de vidrio panoramico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4		Verificar estado de limpiaparabrisas (liquido, plumillas).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5		Verificar estado del asiento y cinturón de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6		Verificar escaleras y apoyos de accesos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7		Verificar estado de palancas y pedales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8		Verificar aire acondicionado.	✓	-	✓	✓	✓	✓
9		Verificar estado de espejos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10		Verificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11		Verificar funcionamiento de freno de mano.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12		Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13		Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14		Verificar el estado de todos los equipos eléctricos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15		Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidráulicos, refrigerante, horometro, corriente).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16		Verificar nivel de aceite del motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17		Verificar el nivel de aceite en sistema hidráulico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18		Controlar el nivel de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19		Limpiar y drenar separador de agua.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20		Verificar nivel de aceite de la servo transmisión.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21		Verificar estado y nivel de refrigerante.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22		Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante de brazo.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23		Lubricar dispositivo de enganche rápido de la excavadora y el brazo de la cargadora.	✓	✓	✓	✓	✓	
24		Verificar estado y funcionamiento del motor de arranque.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25		Lubrica pala de cachara.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26		Verificar estado de accionamiento del cierre de la pluma.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27		verificar estado de mangueras.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28		Verificar estado de las llantas (presiones de neumaticos, cortaduras, abultamientos).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	REVISIÓN SEMANAL	Verificar estado botiquín.						
30		Verificar estado de la pintura.						
31		Verificar puertas y ventanillas.						
32		Verificar estado de soportes de los estabilizadores y estado de cilindros (desplazamiento lateral).						
33		Verificar el estado de la bateria.						
34		Verificar estado general del balde y pala (bujes, pasadores, dientes, esquineras, cuchillas).						
35		Verificar estado del seguridad del par de apriete de las tuercas de ruedas.						
36		Verificar estado del sistema de escape.						
37		Verificar funcionamiento de arranque en punto muerto.						
38		Verificar estado de sistema de dirección de emergencia.						
39		Lubricar pivotes y varillajes del eje de la dirección.						
40		Verificar estado de la dirección y funcionamientofases.						

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación.

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

equipo frontal presenta fallas en el mando.

el equipo presenta falla en el encendido

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	SMF-11
Fecha	3/11/2023
Versión	1
Página	1 de 1

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: centro obras – Bucaramanga
OPERADOR: Jesus Alberto Hernandez Lanz
PROYECTO: CONSORCIO CAULE

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	01-9-25	2-9-25	3-09-25	04-9-25	05-09-25	06-9-25	07-09-25
HORÓMETRO	13753	13754	13761	0765	13766	13767	/
COMBUSTIBLE	/	/	/	/	/	30	/
ACEITE MOTOR	/	/	/	/	/	/	/
ACEITE HIDRÁULICO	/	/	/	/	/	/	/
ACEITE TRANSMISIÓN	/	/	/	/	/	/	/
GRASA	/	/	/	/	/	/	/
REFRIGERANTE	/	/	/	/	/	/	/
OTRO	/	/	/	/	/	/	/

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Jesus Alberto H.
FECHA	
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-11
		Fecha	3/11/2020
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA RETROCARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Jesus Alberto H.		H 09	CAT 420F	

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES	Septiembre			AÑO	2025
			08	9	10	11	12	
1	REVISIÓN DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas (delanteras, traseras, direccionales, stops).	✓	✓	✓	✓	✓	
2		Verificar estado extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓	✓	
3		Verificar estado de vidrio panorámico.	✓	✓	✓	✓	✓	
4		Verificar estado de limpiaparabrisas (líquido, plumillas).	✓	✓	✓	✓	✓	
5		Verificar estado del asiento y cinturón de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓	
6		Verificar escaleras y apoyos de accesos.	✓	✓	✓	✓	✓	
7		Verificar estado de palancas y pedales.	✓	✓	✓	✓	✓	
8		Verificar aire acondicionado.	✓	✓	✓	✓	✓	
9		Verificar estado de espejos.	✓	✓	✓	✓	✓	
10		Verificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓	✓	✓	
11		Verificar funcionamiento de freno de mano.	✓	✓	✓	✓	✓	
12		Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.	✓	✓	✓	✓	✓	
13		Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.	✓	✓	✓	✓	✓	
14		Verificar el estado de todos los equipos eléctricos.	✓	✓	✓	✓	✓	
15		Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidráulicos, refrigerante, horómetro, corriente).	✓	✓	✓	✓	✓	
16		Verificar nivel de aceite del motor.	✓	✓	✓	✓	✓	
17		Verificar el nivel de aceite en sistema hidráulico.	✓	✓	✓	✓	✓	
18		Controlar el nivel de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	
19		Limpiar y drenar separador de agua.	✓	✓	✓	✓	✓	
20		Verificar nivel de aceite de la servo transmisión.	✓	✓	✓	✓	✓	
21		Verificar estado y nivel de refrigerante.	✓	✓	✓	✓	✓	
22		Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante de brazo.	✓	✓	✓	✓	✓	
23		Lubricar dispositivo de anganche rápido de la excavadora y el brazo de la cargadora.	✓	✓	✓	✓	✓	
24		Verificar estado y funcionamiento del motor de arranque.	✓	✓	✓	✓	✓	
25		Lubrico pala de cuchara.	✓	✓	✓	✓	✓	
26		Verificar estado de accionamiento del cierre de la pluma.	✓	✓	✓	✓	✓	
27		verificar estado de mangueras.	✓	✓	✓	✓	✓	
28		Verificar estado de las llantas (presiones de neumáticos, cortaduras, abultamientos).	✓	✓	✓	✓	✓	
29	REVISIÓN SEMANAL	Verificar estado botiquín.						
30		Verificar estado de la pintura.						
31		Verificar puertas y ventanillas.						
32		Verificar estado de soportes de los estabilizadores y estado de cilindros desplazamiento lateral).						
33		Verificar el estado de la batería.						
34		Verificar estado general del balde y pala (bujes, pasadores, dientes, esquineras, cuchillas).						
35		Verificar estado del seguridad del par de apriete de las tuercas de ruedas.						
36		Verificar estado del sistema de escape.						
37		Verificar funcionamiento de arranque en punto muerto.						
38		Verificar estado de sistema de dirección de emergencia.						
39		Lubricar pivotes y varillajes del eje de la dirección.						
40		Verificar estado de la dirección y funcionamiento/fugas.						

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación.

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

Cucharon frontal presenta falla en el mando

Problemas de encendido

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-11
		Fecha	3/11/2023
		Versión	1
		Página	1 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Cerro Obsidiana Bucaramanga
OPERADOR: Jose Alberto Medina Luz
PROYECTO: Consorcio Cauce

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	8-09-25	9-09-25	10-09-25	11-09-25	12-09-25		
HORÓMETRO	13168	13170	13175	13180	13182		
COMBUSTIBLE	✓	✓					
ACEITE MOTOR	✓	✓	✓		✓		
ACEITE HIDRÁULICO	✓	✓	✓	✓	✓		
ACEITE TRANSMISIÓN	✓	✓	✓	✓	✓		
GRASA	✓	✓	✓	✓	✓		
REFRIGERANTE	✓	✓	✓	✓	✓		
OTRO	✓	✓	✓	✓	✓		

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Jose Alberto M
FECHA	
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-11
		Fecha	3/11/2020
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA: RETROCARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Jesus Alberto M.		# 09	CAT 420 F2	

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES	Septiembre			AÑO	2021
			15	16	17	13	13	20
1	REVISION DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas (delanteras, traseras, direccionales, stops).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2		Verificar estado extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3		Verificar estado de vidrio panoramico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4		Verificar estado de limpiaparabrisas (liquido, plumillas).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5		Verificar estado del asiento y cinturón de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6		Verificar escalerillas y apoyos de accesos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7		Verificar estado de palancas y pedales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8		Verificar aire acondicionado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9		Verificar estado de espejos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10		Verificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11		Verificar funcionamiento de freno de mano.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12		Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13		Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14		Verificar el estado de todos los equipos eléctricos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15		Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidráulicos, refrigerante, horómetro, corriente).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16		Verificar nivel de aceite del motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17		Verificar el nivel de aceite en sistema hidráulico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18		Controlar el nivel de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19		Limpiar y drenar separador de agua.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20		Verificar nivel de aceite de la servo transmisión.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21		Verificar estado y nivel de refrigerante.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22		Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante de brazo.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23		Lubricar dispositivo de enganche rápido de la excavadora y el brazo de la cargadora.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24		Verificar estado y funcionamiento del motor de arranque.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25		Lubrica pala de cuchara.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26		Verificar estado de accionamiento del cierre de la pluma.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27		verificar estado de mangueras.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28		Verificar estado de las llantas (presiones de neumaticos, cortaderas, abultamientos).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	REVISION SEMANAL	Verificar estado botiquin.						
30		Verificar estado de la pintura.						
31		Verificar puertas y ventanillas.						
32		Verificar estado de soportes de los estabilizadores y estado de cilindros (desplazamiento lateral).						
33		Verificar el estado de la bateria.						
34		Verificar estado general del balde y pala (bujes, pasadores, dientes, esquineros, cuchillas).						
35		Verificar estado del seguridad del par de apriete de las tuercas de ruedas.						
36		Verificar estado del sistema de escape.						
37		Verificar funcionamiento de arranque en punto muerto.						
38		Verificar estado de sistema de dirección de emergencia.						
39		Lubricar pivotes y varillajes del eje de la dirección.						
40		Verificar estado de la dirección y funcionamientoTaxes.						

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación.

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	OMP-11
		Fecha	3/10/2020
		Versión	1
		Página	2 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: centro abastos Bucaramanga
OPERADOR: Jesus Alberto Medrano Luz
PROYECTO: CONSORCIO CAUCE

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	15-09-20	16-09-20	17-09-20	18-09	19	20	
HORÓMETRO	13786	13793	13801	13810	13818	13822	
COMBUSTIBLE	/	/	35	/	/	/	
ACEITE MOTOR	/	/	/	/	/	/	
ACEITE HIDRÁULICO	/	/	/	/	/	/	
ACEITE TRANSMISIÓN	/	/	/	/	/		
GRASA	/	/	/	/	/	/	
REFRIGERANTE	/	/	/	/	/	/	
OTRO	/	/	/	/	/	/	

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Jesus Alberto M.
FECHA	
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	GM-F-11
Fecha	3/11/2020
Versión	1
Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA: RETROCARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Jesus Alberto M		119	CAT 420 F2	

INSPECCIÓN

MES: Septiembre AÑO: 2025

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	22	23	24	25	26	27
1	REVISIÓN DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas (delanteras, traseras, direccionales, stops).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2		Verificar estado extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3		Verificar estado de vidrio panorámico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4		Verificar estado de limpiaparabrisas (líquido, plumillas).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5		Verificar estado del asiento y cinturón de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6		Verificar escalenas y apoyos de acceso.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7		Verificar estado de palancas y pedales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8		Verificar aire acondicionado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9		Verificar estado de espejos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10		Verificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11		Verificar funcionamiento de freno de mano.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12		Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13		Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14		Verificar el estado de todos los equipos eléctricos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15		Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidráulicos, refrigerante, horómetro, corriente).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16		Verificar nivel de aceite del motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17		Verificar el nivel de aceite en sistema hidráulico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18		Controlar el nivel de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19		Limpiar y drenar separador de agua.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20		Verificar nivel de aceite de la servo transmisión.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21		Verificar estado y nivel de refrigerante.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22		Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levanta de brazo.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23		Lubricar dispositivo de enganche rápido de la excavadora y el brazo de la cargadora.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24		Verificar estado y funcionamiento del motor de arranque.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25		Lubrica pala de cuchara.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26		Verificar estado de accionamiento del cierre de la pluma.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27		verificar estado de mangueras.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28		Verificar estado de las llantas (presiones de neumáticos, cortaduras, abultamientos).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	REVISIÓN SEMANAL	Verificar estado botiquín.						✓
30		Verificar estado de la pintura.						✓
31		Verificar puertas y ventanillas.						✓
32		Verificar estado de soportes de los estabilizadores y estado de cilindros (desplazamiento lateral).						✓
33		Verificar el estado de la batería.						✓
34		Verificar estado general del balde y pala (tujas, pasadores, dientes, esquineras, cuchillas).						✓
35		Verificar estado del seguridad del par de apriete de las tuercas de ruedas.						✓
36		Verificar estado del sistema de escape.						✓
37		Verificar funcionamiento de arranque en punto muerto.						✓
38		Verificar estado de sistema de dirección de emergencia.						✓
39		Lubricar pivotes y varillajes del eje de la dirección.						✓
40		Verificar estado de la dirección y funcionamiento/fugas.						✓

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación.

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-11
		Fecha	3/11/2020
		Versión	1
		Página	2 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: centro abastos Bucaramanga

OPERADOR: JESUS ALBERTO MEDINA LUNA

PROYECTO: CONCESION COVER

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	22	23	24	25	26	27	
HORÓMETRO	13931	13940	13848	13855	13963	13867	
COMBUSTIBLE	/	/	30	/	/	30	
ACEITE MOTOR	/	/	/	/	/		
ACEITE HIDRÁULICO	/	/	/	/	/		
ACEITE TRANSMISIÓN	/	/	/	/	/		
GRASA	/	/	/	/	/		
REFRIGERANTE	/	/	/	/	/		
OTRO	/	/	/	/	/		

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	JESUS ALBERTO M.
FECHA	
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-11
		Fecha	3/11/2020
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA RETROCARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Jesus Alberto M		H 9	CAT 420F	

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES	OCTUBRE			AÑO	2023	
			29	30	1	2	3	4	5
1	REVISIÓN DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas (delanteras, traseras, direccionales, stops).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2		Verificar estado extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3		Verificar estado de vidrio panoramico.	✓	✓	✓	✓	✓		
4		Verificar estado de limpiaparabrisas (liquido, plumillas).	✓	✓	✓	✓	✓		
5		Verificar estado del asiento y cinturón de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6		Verificar escaleras y apoyos de accesos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7		Verificar estado de palancas y pedales.	✓	✓	✓	✓	✓		✓
8		Verificar aire acondicionado.	✓	✓	✓	✓	✓		✓
9		Verificar estado de espejos.	✓	✓	✓	✓	✓		✓
10		Verificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11		Verificar funcionamiento de freno de mano.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12		Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.	✓	✓	✓	✓	✓		
13		Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.	✓	✓	✓	✓	✓		
14		Verificar el estado de todos los equipos eléctricos.	✓	✓	✓	✓	✓		
15		Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidráulicos, refrigerante, horómetro, corriente).	✓	✓	✓	✓	✓	O	✓
16		Verificar nivel de aceite del motor.	✓	✓	✓	✓	✓		✓
17		Verificar el nivel de aceite en sistema hidráulico.	✓	✓	✓	✓	✓		
18		Controlar el nivel de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19		Limpiar y drenar separador de agua.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20		Verificar nivel de aceite de la servo transmisión.	✓	✓	✓	✓	✓		✓
21		Verificar estado y nivel de refrigerante.	✓	✓	✓	✓	✓		
22		Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante de brazo.	✓	✓	✓	✓	✓		
23		Lubricar dispositivo de enganche rápido de la excavadora y el brazo de la cargadora.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24		Verificar estado y funcionamiento del motor de arranque.	✓	✓	✓	✓	✓		
25		Lubrica pala de cuchara.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26		Verificar estado de accionamiento del cierre de la pluma.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27		verificar estado de mangueras.	✓	✓	✓	✓	✓		
28		Verificar estado de las llantas (presiones de neumaticos, cortaduras, abultamientos).	✓	✓	✓	✓	✓		
29	REVISIÓN SEMANAL	Verificar estado botiquín.							
30		Verificar estado de la pintura.							
31		Verificar puertas y ventanillas.							
32		Verificar estado de soportes de los estabilizadores y estado de cilindros (desplazamiento lateral).							✓
33		Verificar el estado de la bateria.							✓
34		Verificar estado general del balde y pala (bujes, pasadores, dientes, esquineros, cuchillas).							✓
35		Verificar estado del seguridad del par de apriete de las tuercas de ruedas.							
36		Verificar estado del sistema de escape.							
37		Verificar funcionamiento de arranque en punto muerto.							
38		Verificar estado de sistema de dirección de emergencia.							
39		Lubricar pivotes y vastagos del eje de la dirección.							
40		Verificar estado de la dirección y funcionamiento/fugas.							

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación.

X Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

Solicita revision Mando delantero por mal funcionamiento

encendido del equipo tardan fuera de lo normal

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-11
		Fecha	3/11/2020
		Versión	1
		Página	2 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Centro Abastos Bucaramanga
OPERADOR: Jesus Alberto Medina Luna
PROYECTO: CONSORCIO CUUCA

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	29	30	1	2	3	4	5
HORÓMETRO	13873	13883	13883	13898			
COMBUSTIBLE		/	/	30			
ACEITE MOTOR	/	/	/	/			
ACEITE HIDRÁULICO	/	/	/	/			
ACEITE TRANSMISIÓN	/	/	/	/			
GRASA	/	/	/	/			
REFRIGERANTE	/	/	/	/			
OTRO	/	/	/	/			

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Jesus Alberto M
FECHA	
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	
Fecha	
Versión	
Página	

TIPO DE MAQUINARIA MINICARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Mauricio Suarez P.	1005[illegible]3	47	SR 175	Bodega

INSPECCIÓN

MES Septiembre AÑO 2025

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	01	02	03	04	05	06
1	REVISION DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2		Verificar estado de extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3		Verificar estado de asientos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4		Verificar escaleras y apoyos accesos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5		Verificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6		Revisar cinturón de seguridad, retractores del cinturón de seguridad, barra de asiento y enclavamiento de control.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7		Verificar estado de espejos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8		Revisar freno de parqueo, pedales, controles manuales y palancas de dirección o palancas de mandos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9		Verificar freno de servicios.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10		Revisar el nivel de aceite de motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11		Limpiar filtro y sistema de aire del motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12		Revisar radiador y nivel del refrigerante.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13		Revisar filtro de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14		Limpiar y drenar separador de agua.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15		Lubricar los brazos elevadores, estabones de elevación, cilindros, enganche rapido, pines de pivote y cuñas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16		Verificar estado de las llantas (presiones de neumáticos, cortaduras, abultamientos).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17		Revisar mangueras y tuberías hidráulicas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18		Revisar niveles de fluido Hidraulico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	REVISION SEMANAL	Verificar estado de botiquín.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21		Verificar estado de la bateria.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22		Verificar estado de los cilindros.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23		Revisar tuercas de las ruedas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24		Revisar el nivel de la transmisión final.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25		Verificar estado general de la pala (bujes, pasadores, esquineras, cuchillas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26		Revisar motor/ correa de transmisión hidrostatica.	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

- ✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación
- X Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código GM-F-11 Fecha 1/11/2023 Versión 1 Página 2 de 2

INFORMACIÓN

UBICACION: Palacuesta
OPERADOR: Mauricio Suarez
PROYECTO: San cristobal

REPORTE DE HOROMETROS Y CONSUMOS

FECHA	07/09	02/09	03/09	04/09	05/09	06/09	
HOROMETRO	8207	8203	8207	8211	8217		
COMBUSTIBLE							
ACEITE MOTOR							
ACEITE HIDRÁULICO							
ACEITE TRANSMISIÓN							
GRASA							
REFRIGERANTE							
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	
FECHA	07-09-2025
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-13
		Fecha	5/1/2020
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA MINICARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Mauricio Suarez P.	1100842013	47	SR175	Pedregal

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES	Septiembre			AÑO	2025
			08	09	10	11	12	
1	REVISIÓN DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras.	✓	✓	✓	✓		
2		Verificar estado de extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓		
3		Verificar estado de asientos.	✓	✓	✓	✓		
4		Verificar escaleras y apoyos accesos.	✓	✓	✓	✓		
5		Verificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓	✓		
6		Revisar cinturón de seguridad, retractores del cinturón de seguridad, barra de asiento y enclavamiento de control.	✓	✓	✓	✓		
7		Verificar estado de espejos.	✓	✓	✓	✓		
8		Revisar freno de parqueo, pedales, controles manuales y palancas de dirección o palancas de mandos.	✓	✓	✓	✓		
9		Verificar freno de servicios.	✓	✓	✓	✓		
10		Revisar el nivel de aceite de motor.	✓	✓	✓	✓		
11		Limpiar filtro y sistema de aire del motor.	✓	✓	✓	✓		
12		Revisar radiador y nivel del refrigerante.	✓	✓	✓	✓		
13		Revisar filtro de combustible.	✓	✓	✓	✓		
14		Limpiar y drenar separador de agua.	✓	✓	✓	✓		
15		Lubricar los brazos elevadores, eslabones de elevación, cilindros, enganche rapido, pines de pivote y cuñas.	✓	✓	✓	✓		
16		Verificar estado de las llantas (presiones de neumaticos, cortaduras, abultamientos).	✓	✓	-	✓		
17		Revisar mangueras y tuberias hidráulicas.	✓	✓	✓	✓		
18		Revisar niveles de fluido Hidraulico.	✓	✓	✓	✓		
19		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓	-		
20	REVISIÓN SEMANAL	Verificar estado de bolsón.	✓	✓	✓	✓		
21		Verificar estado de la balería.	✓	✓	✓	✓		
22		Verificar estado de los cilindros.	✓	✓	✓	✓		
23		Revisar tuercas de las ruedas.	✓	✓	✓	✓		
24		Revisar el nivel de la transmisión final.	✓	✓	✓	✓		
25		Verificar estado general de la pala (bujes, pasadores, esquineras, cuchillas)	✓	✓	✓	✓		
26		Revisar motor correa de transmisión hidrostatica.	✓	✓	✓	✓		

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

X Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

Traslado

OBSERVACIONES

11-09-2025 Traslado San Cristobal asta La esmeralda

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-15
		Fecha	01/12/23
		Versión	1
		Página	2 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Piedecuesta
OPERADOR: Mauricio Suarez P
PROYECTO: San Cristobal

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	08/09	09/09	10/09	11/09	12/09		
HOROMETRO	8227	8232	8236				
COMBUSTIBLE							
ACEITE MOTOR							
ACEITE HIDRÁULICO							
ACEITE TRANSMISIÓN							
GRASA							
REFRIGERANTE							
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	
FECHA	08-09-2025
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-11
		Fecha	01/11/2023
		Versión	1
		Página	1 de 1

TIPO DE MAQUINARIA MINICARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Mauricio Suarez P	1166690B	47	SR 175	Girardota

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES	Septiembre			AÑO	2025
			15	16	17	18	19	20
1	REVISIÓN DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces exteriores, de la bocina y de las luces indicadoras.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2		Verificar estado de extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3		Verificar estado de asientos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4		Verificar escalones y apoyos accesos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5		Verificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6		Revisar cinturón de seguridad, retractores del cinturón de seguridad, barra de asiento y enclavamiento de control.	✓	X	X	X	X	X
7		Verificar estado de espejos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8		Revisar freno de parqueo, pedales, controles manuales y palancas de dirección o palancas de mandos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9		Verificar freno de servicios.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10		Revisar el nivel de aceite de motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11		Limpiar filtro y sistema de aire del motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12		Revisar radiador y nivel del refrigerante.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13		Revisar filtro de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14		Limpiar y drenar separador de agua.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15		Lubricar los brazos elevadores, estabones de elevación, cilindros, enganche rapido, pines de pivote y cuñas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16		Verificar estado de las llantas (presiones de neumáticos, rodaderas, abultamientos).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17		Revisar mangueras y tuberías hidráulicas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18		Revisar niveles de fluido Hidraulico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	REVISIÓN SEMANAL	Verificar estado de botiquín.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21		Verificar estado de la bateria.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22		Verificar estado de los cilindros.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23		Revisar tuercas de las ruedas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24		Revisar el nivel de la trasmisión final.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25		Verificar estado general de la pala (bujes, pasadores, soldaduras, cuchillas).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26		Revisar motor/ correo de transmisión hidrostatica.	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

X Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

Falla Cinturon de Seguridad

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-13
		Fecha	1/11/2023
		Versión	1
		Página	1 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Girón
OPERADOR: Mauricio Suarez P
PROYECTO: Esmeralda

REPORTE DE HOROMETROS Y CONSUMOS

FECHA	15/04	16/04	17/04	18/04	19/04	20/04	
HOROMETRO	8250	8252	8255	8258	8,258		
COMBUSTIBLE							
ACEITE MOTOR							
ACEITE HIDRÁULICO							
ACEITE TRANSMISIÓN							
GRASA							
REFRIGERANTE							
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	
FECHA	15-04-2025
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	GM-F-11
Fecha	1/11/2024
Versión	1
Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA: MINICARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Yaudis Suarez P.	1005801118	47	SR 775	Girón

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES	septiembre			AÑO	2025
			22	23	24	25	26	
1	REVISION DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras.	✓	✓	✓	✓	✓	
2		Verificar estado de extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓	✓	
3		Verificar estado de asientos.	✓	✓	✓	✓	✓	
4		Verificar escaleras y apoyos accesos.	✓	✓	✓	✓	✓	
5		Verificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓	✓	✓	
6		Revisar cinturón de seguridad, retractores del cinturón de seguridad, barra de asiento y enclavamiento de control.	✓	✓	✓	✓	✓	
7		Verificar estado de espejos.	✓	✓	✓	✓	✓	
8		Revisar freno de parqueo, pedales, controles manuales y palancas de dirección o palancas de mandos.	✓	✓	✓	✓	✓	
9		Verificar freno de servicios.	✓	✓	✓	✓	✓	
10		Revisar el nivel de aceite de motor.	✓	✓	✓	✓	✓	
11		Limpiar filtro y sistema de aire del motor.	✓	✓	✓	✓	✓	
12		Revisar radiador y nivel del refrigerante.	✓	✓	✓	✓	✓	
13		Revisar filtro de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	
14		Limpiar y drenar separador de agua.	✓	✓	✓	✓	✓	
15		Lubricar los brazos elevadores, eslabones de elevación, cilindros, enganche rapido, pines de pivote y cuñas.	✓	✓	✓	✓	✓	
16		Verificar estado de las llantas (presiones de neumaticos, cortaduras, abultamientos).	✓	✓	✓	✓	✓	
17		Revisar mangueras y tuberias hidraulicas.	✓	✓	✓	✓	✓	
18		Revisar niveles de fluido Hidraulico.	✓	✓	✓	✓	✓	
19		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓	✓	✓	
20	REVISION SEMANAL	Verificar estado de bolquin.	✓	✓	✓	✓	✓	
21		Verificar estado de la bateria.	✓	✓	✓	✓	✓	
22		Verificar estado de los cilindros.	✓	✓	✓	✓	✓	
23		Revisar tuercas de las ruedas.	✓	✓	✓	✓	✓	
24		Revisar el nivel de la transmisión final.	✓	✓	✓	✓	✓	
25		Verificar estado general de la pala (bujes, pasadores, esquineras, cuchillas).	✓	✓	✓	✓	✓	
26		Revisar motor/ correa de transmisión hidrostatica.	✓	✓	✓	✓	✓	

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

- ✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación
- ✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

Falla en el cinturon mantenimiento

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	GM-F-11
Fecha	5/11/2024
Versión	1
Página	2 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Giron
OPERADOR: Mauricio Suarez P
PROYECTO: Esmeralda

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	22/09	23/09	24/09	25/09	26/09		
HORÓMETRO	8260	8260	8260	8266	9273		
COMBUSTIBLE				75/gl			
ACEITE MOTOR							
ACEITE HIDRÁULICO							
ACEITE TRANSMISIÓN							
GRASA							
REFRIGERANTE							
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	
FECHA	22-09-2025
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GH-F-13
		Fecha	3/11/2025
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA MINICARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Mauricio Suarez P	1100840113	47	SR77.5	

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES	Septiembre			AÑO	2025	
			29	30	01	02	03	04	
1	REVISIÓN DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2		Verificar estado de extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3		Verificar estado de asientos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4		Verificar escaleras y apoyos accesos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5		Verificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6		Revisar cinturón de seguridad, retractores del cinturón de seguridad, barra de asiento y enclavamiento de control.	X	X	X	X	X	X	
7		Verificar estado de espejos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8		Revisar freno de parqueo, pedales, controles manuales y palancas de dirección o palancas de mandos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9		Verificar freno de servicios.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10		Revisar el nivel de aceite de motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11		Limpiar filtro y sistema de aire del motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12		Revisar radiador y nivel del refrigerante.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13		Revisar filtro de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14		Limpiar y drenar separador de agua.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15		Lubricar los brazos elevadores, eslabones de elevación, cilindros, enganche rapido, pines de pivote y cuñas.	✓	✓	✓		✓	✓	
16		Verificar estado de las llantas (presiones de neumáticos, cortaduras, abultamientos).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17		Revisar mangueras y tuberías hidráulicas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18		Revisar niveles de fluido Hidraulico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	REVISIÓN SEMANAL	Verificar estado de botiquin.	✓	✓					✓
21		Verificar estado de la bateria.	✓	✓					✓
22		Verificar estado de los cilindros.	✓	✓					✓
23		Revisar tuercas de las ruedas.	✓	✓					✓
24		Revisar el nivel de la transmisión final.	✓	✓					✓
25		Verificar estado general de la pala (bujes, pasadores, esquineras, cuchillas).	✓	✓					✓
26		Revisar motor correa de transmisión hidrostatica.	✓	✓					✓

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

- ✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación
- X Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

Cambiar el cinturon de Seguridad

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	GM-F-10
Fecha	1/11/2022
Versión	1
Página	2 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN:

OPERADOR: Mauricio Suarez P

PROYECTO:

REPORTE DE HOROMETROS Y CONSUMOS

FECHA	29/09	30/09	01/10	02/10	03/10	04/10	
HOROMETRO	8280	8284	8291	8293	8299	8301	
COMBUSTIBLE	18/gl		15 gl			12/gl	
ACEITE MOTOR							
ACEITE HIDRÁULICO							
ACEITE TRANSMISIÓN							
GRASA				1/4 gl			
REFRIGERANTE							
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	
FECHA	29-09-2025
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	
Fecha	
Versión	
Página	1 de 1

TIPO DE MAQUINARIA — RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CEDULA	N. INTERNO	MARCA	UBICACIÓN
MAURICIO A BECERRA O	1065622291	74	DX 140	CAMBIOS

INSPECCIÓN

ITEM	CRITERIO DE CONTROL	MES: SEPTIEMBRE 2025 — 1	2	3	4	5	6
1	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras y de seguimiento de la consola de control	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Verificar estado de extintor de incendios	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Verificar estado vidrio panoramico	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Verificar estado de limpiaparabrisas (liquido, plumillas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Verificar estado de asientos	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Verificar estado de los espejos	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Verificar aire acondicionado	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Verificar estado de palancas y pedales	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Verificar escaleras y apoyos de acceso	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	Confirmar el correcto funcionamiento del cinturon de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	Verificar pito/alarma de retroceso	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	Controlar el sistema de admision de aire (Limpiar filtro)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	Verificar el manejo de estacionamiento (Freno de emergencia)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	Verificar el funcionamiento de todos los interruptores	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidraulico, refrigerante, horometro, combustible)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	Controlar el nivel de aceite del motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	Controlar el nivel de aceite hidráulico	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	Controlar el nivel de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	Controlar el prefiltro de combustible y el drenaje de agua, segun sea necesario	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	Verificar estado de mangueras	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y avance del brazo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	Verificar el sistema de escape	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	Engrasar el rodamiento de Giro	✓		✓		✓	
29	Verificar estado de botiquin						
30	Inspeccionar el ventilador del motor						
31	Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta						
32	Limpiar la malla antipolvo delante del refrigerante de aceite y el radiador intermedio						
33	Verificar estado de bateria						
34	Verificar estado de los cilindros						
35	Controlar el nivel de aceite del motor de traslación						
36	Verificar el estado general del tren (bujes, pasadores, dientes, esquineras)						
37	Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya piezas flojas, gastadas o dañadas (zapatillas, zapatillas, rodillos, guias)						

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple llenar observaciones

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	
Fecha	
Versión	
Página	

INFORMACIÓN

UBICACIÓN	CENTRO ABASTOS
OPERADOR	MANUEL A BECERRA O
PROYECTO	CONCENTRO CAUCE

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	1	2	3	4	5	6	
HOROMETRO	1658.1	1667.5	1675	1681.7	1689.2	1699.0	
COMBUSTIBLE	60	✓	✓	55	✓	✓	
ACEITE MOTOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ACEITE HIDRAULICO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ACEITE TRANSMISION	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GRASA	✓	✓	✓ 1CARGA	1CARGA	1CARGA	1CARGA	
REFRIGERANTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	
FECHA	1-SEP-2025
FIRMA INSPECCION	
FECHA	

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	
Fecha	
Versión	
Página	

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	# INTERNO	MARCA	UBICACIÓN
MAURICIO A BECERRA O	1069422721	74	DX 140	C. ABASTOS

INSPECCIÓN

	CRITERIO DE CONTROL	MES: 8	SEPTIEMBRE 9	10	11	12	2025
1	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras y de seguimiento de la consola de control	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Verificar estado de espejos retrovisores	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Verificar estado vidrio panorámico	✓	✓	✓	✓	✓	
4	Verificar estado de limpiaparabrisas (Plumillas, guardillas)	✓	✓	✓	✓	✓	
5	Verificar estado de asientos	✓	✓	✓	✓	✓	
6	Verificar estado de los espejos	✓	✓	✓	✓	✓	
7	Verificar aire acondicionado	✓	✓	✓	✓	✓	
8	Verificar estado de palancas y pedales	✓	✓	✓	✓	✓	
9	Verificar escaleras y agarre de acceso	✓	✓	✓	✓	✓	
10	Confirmar el correcto funcionamiento del cinturón de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	
11	Verificar pito/alarma de retroceso	✓	✓	✓	✓	✓	
12	Controlar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro)	✓	✓	✓	✓	✓	
13	Verificar el manejo de estacionamiento (Freno de emergencia)	✓	✓	✓	✓	✓	
14	Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura	✓	✓	✓	✓	✓	
15	Verificar el funcionamiento de todos los interruptores	✓	✓	✓	✓	✓	
16	Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidráulico, refrigerante, horómetro corriente)	✓	✓	✓	✓	✓	
17	Controlar el nivel de aceite del motor	✓	✓	✓	✓	✓	
18	Controlar el nivel de aceite hidráulico	✓	✓	✓	✓	✓	
19	Controlar el nivel de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	
20	Controlar el prefiltro de combustible y el drenaje de agua, según sea necesario	✓	✓	✓	✓	✓	
21	Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario	✓	✓	✓	✓	✓	
22	Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro	✓	✓	✓	✓	✓	
23	Verificar estado de mangueras	✓	✓	✓	✓	✓	
24	Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante del brazo	✓	✓	✓	✓	✓	
25	Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal	✓	✓	✓	✓	✓	
26	Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓	✓	✓	
27	Verificar el sistema de escape	✓	✓	✓	✓	✓	
28	Engrasar el corredor de Giro	✓		✓		✓	
29	Verificar estado de baterías						
30	Inspeccionar el ventilador del motor						
31	Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta						
32	Limpiar la malla antipolvo (delante del refrigerante de aceite y el radiador intermedio)						
33	Verificar estado de batería						
34	Verificar estado de los cilindros						
35	Controlar el nivel de aceite del motor de traslación						
36	Verificar el estado general del bastis (bujes, pasadores, dientes, esquineras)						
37	Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya placas flojas, gastadas o faltantes (ventilas, zapatas, rodillos, guías)						

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple llenar observaciones

OBSERVACIONES

EL DIA 10-SEP- SE MANDA EL AIRE ACONDICIONADO Y SE CAMBIAN LOS DIENTES.

-BUJES Y PASADORES DEL BASE DESGASTADOS POR LA ARENA EN LAS EXCAVACIONES.

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	
Fecha	
Versión	
Página	

INFORMACIÓN

UBICACIÓN	CENTRO ABASTOS
OPERADOR	MAURICIO A BECERRA O
PROYECTO	CONSORCIO CAXE

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	8	9	10	11	12		
HOROMETRO	1702.7	17094	1716.4	17215	17309		
COMBUSTIBLE	✓	GO	✓	✓	✓		
ACEITE MOTOR	✓	✓	✓	✓	✓		
ACEITE HIDRAULICO	✓	✓	✓	✓	✓		
ACEITE TRANSMISION	✓	✓	✓	✓	✓		
GRASA	LCARGA	LCARGA	LCARGA	LCARGA	LCARGA		
REFRIGERANTE	✓	✓	✓	✓	✓		
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	
FECHA	8-SEP-2025
FIRMA INSPECCION	
FECHA	

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	
Fecha	
Versión	
Página	

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CEDULA	# INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
MANUEL J. BECERRA O.	1065[illegible]21	74	DX 140	C. ABASTOS

INSPECCION

ITEM	CRITERIO DE CONTROL	MES	SEPTIEMBRE				2025
		DIA	16	17	18	19	20
1	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras y de seguimiento de la cámara de cierre	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Verificar estado de espejos retrovisores	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Verificar estado cinturón de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Verificar estado de limpiaparabrisas (agua, plumillas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Verificar estado de asiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Verificar estado de los pedales	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Verificar aire acondicionado	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Verificar estado de palancas y pedales	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Verificar extintores y estado de la carga	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	Confirmar el correcto funcionamiento del cinturón de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	Verificar presión de neumáticos	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	Confirmar el cierre de admisión de aire (Limpiar filtro)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	Verificar el manejo de estacionamiento (Freno de emergencia)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	Inspeccionar si hay grietas y soldaduras defectuosas en la estructura	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	Verificar el funcionamiento de todas las maniobras	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidráulico, refrigerante, horómetro, otros)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	Confirmar el nivel de aceite del motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	Confirmar el nivel de aceite hidráulico	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	Verificar el nivel de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	Confirmar el prefiltro de combustible y el drenaje de agua, según sea necesario	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	Confirmar el líquido refrigerante y rellenar si es necesario	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	Verificar estado de mangueras	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y pasante del brazo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	Arranque el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	Verificar el sistema de escape	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	Engrasar el cojinete de giro	✓		✓		✓	
29	Verificar estado de fusibles						
30	Inspeccionar el ventilador del motor						
31	Revisar si el correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta						
32	Limpiar el núcleo enfriador (radiador del refrigerante de aceite y el radiador intermedio)						
33	Verificar estado de batería						
34	Verificar estado de los cilindros						
35	Confirmar el nivel de aceite del motor de traslación						
36	Verificar el estado general de todos (tuercas, pasadores, dientes, seguridad)						
37	Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta y que no haya piezas flojas, grietas o faltantes (orillas, zapatas, rodillos, guías)						

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

X Se ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple llenar observaciones

OBSERVACIONES

- BUJES Y PLANCHES DEL BALDE RESGASTADOS POR LA ARENA EN LAS EXCAVACIONES

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	
Fecha	
Versión	
Página	

INFORMACIÓN

UBICACIÓN	CENTRO ABASTOS
OPERADOR	MANUEL A ESCORIA O
PROYECTO	CONSORCIO CAUCE

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	15	16	17	18	19	20	
HOROMETRO	1738.0	1747.1	1757.1	1766.8	1775.3	1787.0	
COMBUSTIBLE	60	✓	✓	60	✓	✓	
ACEITE MOTOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ACEITE HIDRAULICO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ACEITE TRANSMISION	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GRASA	LCARCA	LCARCA	LCARCA	LCARCA	LCARCA	LCARCA	
REFRIGERANTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	
FECHA	15-SEP-2025
FIRMA INSPECCION	
FECHA	

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	
Fecha	
Versión	1
Página	1 de 1

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CEDULA	# INTERNO	MARCA	UBICACIÓN
IGNACIO A BECERRA O	1053822221	71	DI 140	CABOTOS

INSPECCION

	CRITERIO DE CONTROL	MES: 22	SEMANA: 23	24	25	26	2023
1	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras y de seguimiento de la correcta de control	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Verificar estado del extintor de incendios	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Verificar espejo retrovisor panorámico	✓	✓	✓	✓	✓	
4	Verificar estado de limpiaparabrisas (líquido, plumillas)	✓	✓	✓	✓	✓	
5	Verificar estado de asientos	✓	✓	✓	✓	✓	
6	Verificar estado de los espejos	✓	✓	✓	✓	✓	
7	Verificar aire acondicionado	✓	✓	✓	✓	✓	
8	Verificar estado de palancas y pedales	✓	✓	✓	✓	✓	
9	Verificar escalones y agarre de acceso	✓	✓	✓	✓	✓	
10	Confirmar el correcto funcionamiento del sistema de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	
11	Verificar pito-alarma de retroceso	✓	✓	✓	✓	✓	
12	Controlar el sistema de activación de aire (Limpiar filtro)	✓	✓	✓	✓	✓	
13	Verificar el manejo de estacionamiento (Freno de emergencia)	✓	✓	✓	✓	✓	
14	Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura	✓	✓	✓	✓	✓	
15	Verificar el funcionamiento de todos los interruptores	✓	✓	✓	✓	✓	
16	Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidráulicos, refrigerante, horómetro combustible)	✓	✓	✓	✓	✓	
17	Controlar el nivel de aceite del motor	✓	✓	✓	✓	✓	
18	Controlar el nivel de aceite hidráulico	✓	✓	✓	✓	✓	
19	Controlar el nivel de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	
20	Controlar el prefiltro de combustible y el drenaje de agua, según sea necesario	✓	✓	✓	✓	✓	
21	Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario	✓	✓	✓	✓	✓	
22	Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro	✓	✓	✓	✓	✓	
23	Verificar estado de mangueras	✓	✓	✓	✓	✓	
24	Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante del MAZO	✓	✓	✓	✓	✓	
25	Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal	✓	✓	✓	✓	✓	
26	Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓	✓	✓	
27	Verificar el sistema de escape	✓	✓	✓	✓	✓	
28	Engrasar el chicharo de Giro	✓		✓		✓	
29	Verificar estado de faldones						
30	Inspeccionar el ventilador del motor						
31	Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta						
32	Limpiar la malla antipolvo externa del refrigerante de aceite y el radiador intermedio						
33	Verificar estado de batería						
34	Verificar estado de los cilindros						
35	Controlar el nivel de aceite del motor de traslación						
36	Verificar el estado general del tanque (tuyos, pasadores, dientes, empuñetes)						
37	Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta y que no haya piezas flojas, partidas o faltantes (cerillas, tapetas, rodillos, guías)						

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple llenar observaciones

OBSERVACIONES

- DESAPONES Y PUJES DEL BALDE OCASIONADOS POR LA ARENA EN LAS EXCAVACIONES.

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha	
Versión	1
Página	1 de 1

INFORMACIÓN

UBICACIÓN	CENTRO ABASTOS
OPERADOR	MARCO A BECERRA O
PROYECTO	CONSORCIO CAXCÉ

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	22	23	24	25	26		
HOROMETRO	17899	12005	1511.3	19206	18301		
COMBUSTIBLE	60	✓	✓	60	✓		
ACEITE MOTOR	✓	✓	✓	✓	✓		
ACEITE HIDRAULICO	✓	✓	✓	✓	✓		
ACEITE TRANSMISION	✓	✓	✓	✓	✓		
GRASA	L CARGA	L CARGA	L CARGA	L CARGA	L CARGA		
REFRIGERANTE	✓	✓	✓	✓	✓		
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	
FECHA	22-SEP-2025
FIRMA INSPECCION	
FECHA	

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	
Fecha	
Revisión	
Página	

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CEDULA	ESTATURA	EDAD	UBICACIÓN
MANUEL A BECERRA O	1069362221	74	DX 140	C. ASBESTOS

INSPECCION

	CRITERIO DE CONTROL	MES: 29	SEPTIEMBRE 30				AÑO: 2025
1	Verificar el funcionamiento de todas las luces exteriores de la cabina y de las luces indicadoras y de seguimiento de la consola de control	✓	✓				
2	Verificar estado del extintor de incendios	✓	✓				
3	Verificar estado cinto pantalonero	✓	✓				
4	Verificar estado de limpiaparabrisas (fluido, plumillas)	✓	✓				
5	Verificar estado de espejos	✓	✓				
6	Verificar estado de los espejos	✓	✓				
7	Verificar aire acondicionado	✓	✓				
8	Verificar estado de palancas y pedales	✓	✓				
9	Verificar estabilizadores y apoyos de cuchara	✓	✓				
10	Confirmar el correcto funcionamiento del cinturon de seguridad	✓	✓				
11	Verificar pico-alarma de retroceso	✓	✓				
12	Comprobar el sistema de activación de aire (Limpiar filtro)	✓	✓				
13	Verificar el mando de estacionamiento (Freno de emergencia)	✓	✓				
14	Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura	✓	✓				
15	Verificar el funcionamiento de todos los interruptores	✓	✓				
16	Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidraulicos refrigerantes, combustible)	✓	✓				
17	Controlar el nivel de aceite del motor	✓	✓				
18	Controlar el nivel de aceite hidraulico	✓	✓				
19	Controlar el nivel de combustible	✓	✓				
20	Controlar el prefiltro de combustible y el drenaje de agua, segun sea necesario	✓	✓				
21	Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario	✓	✓				
22	Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro	✓	✓				
23	Verificar estado de mangueras	✓	✓				
24	Verificar el funcionamiento de todos los mandos de arranque y levante del brazo	✓	✓				
25	Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal	✓	✓				
26	Arranque el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales	✓	✓				
27	Verificar el sistema de escape	✓	✓				
28	Engrasar el cojinete de Giro	✓					
29	Verificar estado de bombas						
30	Inspeccionar el ventilador del motor						
31	Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta						
32	Limpiar la malla antipolvo delante del refrigerante de aceite y el radiador intermedio						
33	Verificar estado de baterías						
34	Verificar estado de los cilindros						
35	Controlar el nivel de aceite del motor de traslación						
36	Verificar el estado general del balde (bujes, pasadores, dientes, esquineros)						
37	Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya piezas flojas, partidas o faltantes (tornillos, tapones, motillos, guias)						

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple llenar observaciones

OBSERVACIONES

PASADORES Y BUJES DEL BALDE DESGASTADOS POR LA ARENA.

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	
Fecha	
Versión	
Página	

INFORMACIÓN

UBICACIÓN	CENTRO ABASTOS
OPERACIÓN	MUNICIO A BECERRA O
PROYECTO	CONSORCIO CAUCE

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	29	30					
HOROMETRO	1228.0	1246.6					
COMBUSTIBLE	✓	60					
ACEITE MOTOR	✓	✓					
ACEITE HIDRAULICO	✓	✓					
ACEITE TRANSMISION	✓	✓					
GRASA	1 CARGA	1 CARGA					
REFRIGERANTE	✓	✓					
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	
FECHA	29-SEP-2023
FIRMA INSPECCION	
FECHA	

Scanned with CamScanner

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-02, 08:58:45 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 1076074146

Periodo Cotización: septiembre de 2025 **Periodo Servicio:** octubre de 2025

PAGADO 02/10/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MAQUINOBRAS		
Documento	NI900649507	**Dirección**	AV 0 #22 - 31 CENTRO IND SAN JORGE BD 16
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6914305
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	SERRANO GOMEZ JULIAN ANDRES	**Identificación**	CC 13870590
Total Afiliados	53	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	Ing	RET	INT E	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	DIF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Días ESS	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Adicional	Total
CC 1002208676	LUCIA FERNANDA ARCHILA PULIDO	01	00																		0	30	30	30	30	(23301) FORVENIR	$ 2.100.000	$ 336.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.100.000	$ 88.400	0,000	$ 2.100.000	$ 159.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.100.000	$ 80.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 668.400
CC 1007478814	JESSA ALBERTH HERRAN LANZ	01	00											X							0	30	30	30	30	(23301) FORVENIR	$ 2.826.383	$ 452.300	(EPS037) SALUD TOTAL EPS	$ 2.826.383	$ 118.700	0,060	$ 2.826.383	$ 169.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.826.383	$ 113.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 674.300
CC 1005954231	WALESKA XIMENA BECERRA ORTIZ	01	00											X							0	30	30	30	30	(23301) PROTECCION	$ 2.940.450	$ 411.600	(EPS041) EPS SURA	$ 2.940.450	$ 176.400	0,060	$ 2.940.450	$ 205.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.940.450	$ 176.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 970.200
CC 1005955249	ADRIAN JOSE SOLANO FORAS	01	00											X							0	30	30	30	30	(23301) FORVENIR	$ 3.000.000	$ 504.000	(EPS037) EPS SANITAS	$ 3.000.000	$ 84.000	0,000	$ 3.000.000	$ 180.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.000.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 828.000
CC 1005964681	JENNIFER PAOLA CARDENAS GUTIERREZ	01	00																		0	30	30	30	30	(23301) FORVENIR	$ 1.800.000	$ 302.400	(EPS010) EPS SURA	$ 1.800.000	$ 76.500	0,000	$ 1.800.000	$ 108.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.800.000	$ 54.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 540.900
CC 1005947139	MILTON JOSE DIAZ RIBON	01	00											X							0	30	30	30	30	(23301) PROTECCION	$ 2.423.451	$ 347.979	(EPS034) SALUDCOOP EPS	$ 2.423.451	$ 130.000	0,000	$ 2.423.451	$ 229.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.423.451	$ 130.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.005.979
CC 1005947139	MILTON JOSE DIAZ RIBON	01	00															X			0	4	4	4	4	(23301) PROTECCION	$ 388.342	$ 62.100	(EPS034) SALUDCOOP EPS	$ 388.342	$ 10.000	0,000	$ 388.342	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 388.342	$ 15.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 87.600
CC 1005159179	OSCAR JULIAN PALOMINO DUARTE	01	00																		0	30	30	30	30	(23301) FORVENIR	$ 2.464.400	$ 386.300	(EPS010) EPS SURA	$ 2.464.400	$ 105.000	0,060	$ 2.464.400	$ 172.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.464.400	$ 73.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 737.200
CC 1007748688	SERGIO ANDRES ORDOÑEZ ARDILA	04	00																		0	30	30	30	30	(23301) FORVENIR	$ 1.740.000	$ 276.400	(EPS040) EPS SURA	$ 1.740.000	$ 60.000	0,060	$ 1.740.000	$ 121.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.740.000	$ 52.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 510.400
CC 1007748688	SERGIO ANDRES ORDOÑEZ ARDILA	04	00															X			0	1	1	1	1	(23301) FORVENIR	$ 60.000	$ 9.600	(EPS040) EPS SURA	$ 60.000	$ 2.400	0,060	$ 60.000	$ 4.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 60.000	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.400
CC 1005563170	SERGIO ANDRES FORERO MELANDAB	04	00											X							0	30	30	30	30	(21304) COLFONDOS	$ 3.442.230	$ 550.800	(EPS017) THEMEDAR EPS	$ 3.442.230	$ 137.700	0,060	$ 3.442.230	$ 239.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.442.230	$ 137.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.065.300
CC 1090914605	ROGER DARIO BRUTTER CONTRERAS	04	00																		0	30	30	30	30	(23301) PROTECCION	$ 1.761.304	$ 286.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.761.304	$ 70.400	0,060	$ 1.761.304	$ 104.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.761.304	$ 70.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 632.500
CC 1090914605	ROGER DARIO BRUTTER CONTRERAS	04	00													X					0	1	1	1	1	(23301) PROTECCION	$ 51.711	$ 8.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 51.711	$ 2.100	0,060	$ 51.711	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 51.711	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.400
CC 1090908304	DEIVER FABIAN LOPEZ PADILLA	01	00											X							0	30	30	30	30	(23301) PROTECCION	$ 3.099.481	$ 372.200	(EPS041) FAMISANAR EPS	$ 3.099.481	$ 142.600	0,060	$ 3.099.481	$ 221.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.099.481	$ 185.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.121.700
CC 1090855134	FREDDY ALEXANDER SALITE MUÑOZ	01	00											X							0	30	30	30	30	(23301) FORVENIR	$ 3.780.000	$ 645.300	(EPS037) SALUD TOTAL EPS	$ 3.780.000	$ 111.300	0,060	$ 3.780.000	$ 183.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.780.000	$ 113.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 852.600
CC 1005849538	LUZETH YOLANDA PEREZ PRADO	01	00																		0	30	30	30	30	(23301) FORVENIR	$ 1.425.000	$ 227.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.425.000	$ 57.000	0,031	$ 1.425.000	$ 93.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.425.000	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 346.200
CC 1090714445	MIGUEL ANGEL ALVAREZ ESCRIBACH	01	00											X							0	30	30	30	30	(23301) FORVENIR	$ 3.386.341	$ 581.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 3.386.341	$ 169.300	0,060	$ 3.386.341	$ 220.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.386.341	$ 203.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.173.600
CC 1005830603	EDGAR RAFAEL DIAZ HOLGUIN	01	00																		0	30	30	30	30	(23101) COLFONDOS	$ 3.094.945	$ 530.900	(EPS010) EPS SURA	$ 3.094.945	$ 92.800	0,060	$ 3.094.945	$ 140.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.094.945	$ 92.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 856.700
CC 1005830603	EDGAR RAFAEL DIAZ HOLGUIN	01	00															X			0	1	1	1	1	(23101) COLFONDOS	$ 637.500	$ 102.000	(EPS010) EPS SURA	$ 637.500	$ 20.000	0,060	$ 637.500	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 637.500	$ 25.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 150.000

Líneas de Servicio ForoSIMPLE: Bogotá 601 6486656 - Cali: 602 6560577 - Medellín: 604 5148059 - Bucaramanga: 607 6439088 - Cartagena: 605 6645444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618858 - Resto del País: 018000 571 571 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 02/10/2025

Empresa NI900849507
MAQUINOBRAS

Planilla Nro: 1076074146

Periodo Cotización: septiembre de 2025

Periodo Servicio: octubre de 2025

II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | |

Pagado: 02/10/2025 | Empresa Nit900849507 MAQUINOBRAS | Planilla Nro: 1076074146 | Periodo Cotización: septiembre de 2025 | Periodo Servicio: octubre de 2025

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante																							Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte ESAP	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1051614336	ADRIANA XIMENA SERRANO ARANGO	01	00																							[illegible]	$ 11.600.000	$ 1.276.000	[illegible]	$ 11.600.000	$ 1.392.000	0,522	1 $ 1.566.000	$ 8.176.200	[illegible]	$ 11.600.000	$ 1.276.000	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 2.568.000
CC 91271561	LUIS ANTONIO SANABRIA RIV	01	01																							[illegible]	$ 0,0	$ 0,0	[illegible]	$ 1.423.000	$ 57.000	0,522	$ 1.423.000	$ 86.100	[illegible]	$ 1.423.000	$ 157.000	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 243.100
CC 91356888	VICTOR JULIO ORDEDA CAMEDDO	01	00																							[illegible]	$ 1.423.000	$ 227.000	[illegible]	$ 1.423.000	$ 57.000	0,522	$ 1.423.000	$ 86.100	[illegible]	$ 1.423.000	$ 157.000	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 440.000
CC 91274768	EDUARDO SANTOS URIBE CHI	01	00																							[illegible]	$ 2.369.000	$ 369.000	[illegible]	$ 2.369.000	$ 95.000	0,522	$ 2.369.000	$ 143.300	[illegible]	$ 2.369.000	$ 262.000	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 732.300
CC 91149690	JOSE ORLANDO ALBA JIMENEZ	01	00																							[illegible]	$ 4.760.940	$ 760.700	[illegible]	$ 4.760.940	$ 190.000	0,522	$ 4.760.940	$ 287.900	[illegible]	$ 4.760.940	$ 526.000	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 1.473.000
CE 138469	JUAN LUIS BRICEÑO HERNANDEZ	01	00																							[illegible]	$ 3.134.300	$ 341.000	[illegible]	$ 3.134.300	$ 85.400	0,522	$ 3.134.300	$ 189.500	[illegible]	$ 3.134.300	$ 346.800	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 969.800

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 151.856.274	$ 155.276.774	$ 153.276.774	$ 153.276.774	$ 24.544.900	$ 6.134.000	$ 9.963.900	$ 6.036.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.742.100	$ 0	$ 46.742.100

Líneas de Servicio PensSIMPLE: Bogotá 601 4666634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438600 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 1818650 - Resto del País: 018000 971 671 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ANEXO N° 6
ACTA MENSUAL VIGÍA SST

CONSORCIO	INFORME VIGÍA SST	Código	SST-F-27
		Fecha	08/06/2020
		Versión	2
		Página 1 de 2	

FECHA			LUGAR	HORA INICIO	HORA FIN	INFORME NO.	TIPO REUNIÓN
DD	MM	AA					Mensual X
30	09	25	Campamento	01:15 p.m.	02:38 p.m.	11	Extraordinaria

De acuerdo con la Resolución 2013 de 1986 y Decreto 1072 de 2015, se realiza presentación de las actividades desarrolladas en función del Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.

INFORME VIGÍA SST
1.Verificacion de Quorum 2. Revisión de acta anterior de conformación 3. incidentes, accidentes de trabajo, acoso laboral, eventos que involucran en el comité. 4.Ausentismo. 5.Inspecciones y actividades desarrolladas. 6.Proposiciones.

Asistentes a Comité	Firmas
José Orlando alba	José O Alba James
Juan de Dios García	Juan de Dios García
Invitados	

TEMAS TRATADOS
1.Inspecciones de seguridad: En el mes de septiembre de 2025 se realizó inspección de botiquín y camilla, extintores, EPP y locativa de obra, en donde no se identificaron novedades o hallazgos. 2. Incidentes y accidentes de trabajo presentados: Durante lo transcurrido en el mes de septiembre de 2025 no se presentaron accidentes ni incidentes de trabajo. 3.Ausentismo Laboral En lo transcurrido del mes de septiembre de 2025 no se presentó ausentismo laboral. 4.Actividades desarrolladas: Se evidencia que la empresa realiza entrega EPP de acuerdo a la matriz de EPP y según necesidad de reposición. Se realizaron las siguientes actividades según el plan de capacitación 2025:

- Peligros físicos
- Cuidado visual

5.Cumplimiento y compromisos anteriores
Se realiza la revisión del acta anterior y se verifica el cumplimiento de los compromisos pactados.

6.Otras Actividades
Se realiza seguimiento al plan de trabajo y plan de capacitaciones para la vigencia 2025

Fecha próxima reunión: octubre de 2025

Juan de Dios García
VIGIA SST

ANEXO N° 7
ACTA TRIMESTRAL CCL

	ACTA DE REUNIÓN COMITÉS	Código	SST-F-28
		Fecha	12/07/2021
		Versión	3
		Página 1 de 2	

FECHA			LUGAR	HORA INICIO	HORA FIN	ACTA NO.	TIPO REUNIÓN	
DD	MM	AA					Mensual	
29	09	2025	Campamento	02:16 pm	03:13 pm	05	Trimestral	X
							Extraordinaria	

Señalar con X el Comité a realizar:

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		COMITÉ CONVIVENCIA LABORAL	X	Otro: _____	

En las instalaciones de la empresa, se reunieron los integrantes del Comité para tratar los siguientes temas:

ORDEN DEL DIA
1. Verificación del quórum 2. Revisión de Acta anterior 3. Incidentes y accidentes de trabajo / Quejas de acoso Laboral / Eventos que involucran el comité 4. Otros 5. Compromisos

Asistentes Comité	Firmas
José Orlando Alba Jaimes	José O Alba J.
Juan de Dios García	Juan de Dios García
Freddy Fuentes Gil	
Invitados	**Firmas**

TEMAS TRATADOS
1. Verificación del quórum Se procede a tomar asistencia para verificar Quorum y se da inicio a la reunión. 2. Revisión de acta anterior Se realiza la revisión del acta anterior para hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos pactados. 3. Quejas de acoso Laboral:

Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre de 2025, no se evidencian reportes de acoso laboral ni quejas de convivencia.

4. Otros

Siguiendo el cronograma de capacitación, se capacitó a los miembros del COCOLA y a todo el personal. Se observa la realización de comités trimestrales en los cual se discuten temas laborales y de convivencia, garantizando la comunicación y resolución de conflictos.

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Dar cumplimiento y acompañamiento a las actividades programadas	COCOLA	Diciembre de 2025

Fecha próxima reunión: diciembre de 2025

Juan de Dios

Firma presidente

Firma secretario

ANEXO N° 8
REGISTRO DE ENTREGA DE EPP Y DOTACIÓN

FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Código	SST-F-17
Fecha	23/07/2025
Versión	2
Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Baudilio Rivas Gomez	ID	1093738325	CARGO	Ayudante
PROYECTO	Consorcio Cauce				

II. INSTRUCCIONES/COMPROMISOS

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con CONSORCIO CAUCE
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempañada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA Y REPOSICIÓN

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Tapabocas	1	29	09	25		
Guantes Vaqueta	1	29	09	25		
Gafas Oscuras	1	29	09	25		

Powered by CamScanner

Camisa → M Pantalon → 30 Botas 01-10-24
Pantalon → 40

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	9/10/2020
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Victor Manuel Trujillo	CÉDULA	91'290524	CARGO	Ayudante
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Consorcio Cauce

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada represerta un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Guantes Vaqueta	1	01	11	24	Victor Trujillo	
Gafas Oscuras	1	01	11	24	Victor Trujillo	
Casco seguridad	1	05	11	24	Victor Trujillo	
Botas Pantaneras	1	14	11	24	Victor Trujillo	
Guantes plasticos	1	15	01	25	Victor Trujillo	
Guantes Vaqueta	1	29	02	25	Victor Trujillo	
Botas Pantaneras	1	14	03	25	Victor Trujillo	
Pantalon Talla 30	1	14	03	25	Victor Trujillo	
Camisa Talla M	2	14	03	25	Victor Trujillo	
Guantes Vaqueta	1	01	09	25	Victor Trujillo	
Guantes Vaqueta	1	16	01	25	Victor Trujillo	
Guantes Vaqueta	1	16	09	25	Victor Trujillo	

Powered by CamScanner

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	9/10/2020
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Luis Alberto Cano	CEDULA	1082475667	CARGO	operador Perforadora
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Consorcio Civil

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad
4. NO utilizar los EPP´s en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario
5. En caso de presentar perdida o daño favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA DIA	MES	AÑO	FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
Guantes Vaqueta	1	21	09	19		
Gafas Oscuras	1	27	09	19		
Guantes Vaqueta	1	04	09	19		
Botas Caucho	1	07	06	19		
Guantes Vaqueta	1	02	07	19		
Tapaoidos de Copa	1	17	07	19		
Tapabocas	1	18	01	19		
Guantes Vaqueta	1	23	01	19		
Tapabocas	1	25	01	19		
Tapabocas	1	28	01	19		
Gafas Oscuras	1	30	01	19		
Tapabocas	1	30	01	19		
Guantes Vaqueta	1	04	09	19		
Tapabocas	1	01	04	19		
Guantes Vaqueta	1	02	04	19		
Guantes Vaqueta	1	09	09	19		
Gafas Oscuras	1	10	09	19		
Tapabocas	1	15	01	19		
Tapabocas	1	22	09	19		
Tapabocas	1	23	09	19		

Powered by CamScanner

Pantalon → 34 Zapatos → 42
Camisa → L

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
CONSORCIO		Fecha	9/10/2020
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Mauricio Becerra	CÉDULA	1063562221	CARGO	Operador Retro
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Consorcio Cauca

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso esclusivo de su labor con MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Guantes Vaqueta	1	06	12	20		
Guantes Vaqueta	1	19	05	25		
Tapaoidos	1	05	09	25		

Powered by CamScanner

Camisa → M Zapatos → 40
Pantalón → 34

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	9/10/2020
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Freddy Galviz	CÉDULA		CARGO	Operador Relleno
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Consorcio Cauce

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Guantes Carnaza	1	7	11	24	Freddy Galviz	
Guantes Carnaza	1	9	12	24	Freddy Galviz	
Guantes Vaqueta	1	18	09	25	Freddy Galviz	
Guantes Vaqueta	1	22	09	25	Freddy Galviz	

Powered by CamScanner

LERMA CONSTRUCCIONES S.A.S

FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Código	SST-F-25
Fecha	2/09/2022
Versión	1
Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Jhon Valencia	CÉDULA	1005149283	CARGO	Ayudante.

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor en LERMA CONSTRUCCIONES SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP 's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Botas Caucho	1	18	11	24	Jhon Fredy	
Camisa	1	21	11	24	Jhon Fredy	
Pantalon	1	21	11	24	Jhon Fredy	
Guantes	1	21	11	24	Jhon Fredy	
Guantes	1	13	01	25		
Guantes	1	20	01	25		
Gafas	1	20	01	25		
Gafas	1	25	01	25		
Tapabocas	1	25	01	25		
Tapabocas	1	27	01	25		
Guantes	1	03	02	25		
Guantes	1	02	04	25	Jhon Fredy	
Guantes	1	08	04	25	Jhon Fredy	
Guantes	1	14	05	25		
Guantes	1	17	06	25		
Guantes	1	22	07	25		
Guantes	1	5	08	25		
Guantes	1	12	08	25		
Gafas	1	12	08	25		
Guantes	1	15	09	25		
Pantalon	1	29	09	25		
Gafas	1	29	09	25		
Botas caucho	1	29	09	25		
Guantes	1	27	10	25		
Camisa	1	27	10	25		

LERMA CONSTRUCCIONES S.A.S

FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Código	SST-F-25
Fecha	2/09/2022
Versión	1
Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Uriel Quintero	CÉDULA	12502397	CARGO	Oficial

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor en LERMA CONSTRUCCIONES SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreara un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Botas caucho	1	21	11	24		
(Camisa) Pantalon.	1	21	11	24		
Guantes	1	21	11	24		
Gafas	1	21	11	24		
Guantes	1	14	01	25		
Guantes	1	11	02	25		
Guantes	1	10	03	25		
Guantes	1	25	03	25		
Guantes	1	08	04	25		
Guantes	1	22	04	25		
Guantes	1	14	05	25		
Guantes	1	08	06	25		
Botas (caucho	1	08	06	25		
Botas cuero	1	08	07	25		
Guantes	1	21	07	25		
Guantes	1	04	08	25		

FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Código	SST-F-25
Fecha	2/09/2022
Versión	1
Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Luis Adrian Rey.	CÉDULA	91298926	CARGO	Ayudante.

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor en LERMA CONSTRUCCIONES SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Camisa	1	26	11	24	Luis Rey	
Pantalon	1	26	11	24	Luis Rey	
Casco	1	26	11	24	Luis Rey	
Mariachi	1	26	11	24	Luis Rey	
Guantes	1	26	11	24	Luis Rey	
Botas caucho	1	29	11	24	Luis Rey	
Gafas	1	03	12	24	Luis Rey	
Guantes	1	03	02	25	Luis Rey	
Guantes	1	10	03	25	Luis Rey	
Guantes	1	25	03	25	Luis Rey	
Guantes	1	10	04	25	Luis Rey	
Guantes	1	14	05	25	Luis Rey	
Guantes	1	08	06	25	Luis Rey	
Gafas	1	08	06	25	Luis Rey	
Camisa	1	08	06	25	Luis Rey	
Pantalon	1	08	06	25	Luis Rey	
Camisa	1	25	06	25	Luis Rey	
Guantes	1	08	07	25	Luis Rey	
Guantes	1	21	07	25	Luis Rey	
Guantes	1	01	08	25	Luis Rey	
Pantalon	1	29	09	25	Luis Rey	
Camisa	1	29	09	25	Luis Rey	

SST-F-25

FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Fecha	2/09/2022
Versión	1
Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Guillermo Melgarejo	CÉDULA	1545177	CARGO	Ayudante.

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor en LERMA CONSTRUCCIONES SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Casco	1	13	02	25		
Camisa	2	13	02	25		
Pantalon	1	13	02	25		
Botas caucho	1	13	02	25		
Guantes	1	13	02	25		
Guantes	1	07	04	25		
Guantes	1	14	05	25		
Guantes	1	08	06	25		
Camisa	1	25	06	25		
Pantalon	1	25	06	25		
Guantes	1	8	07	25		
Guantes	1	22	07	25		
Guantes	1	04	08	25		
Guantes	1	02	09	25		
Camisa	1	29	09	25		
Pantalon	1	29	09	25		

LERMA	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-25
		Fecha	2/09/2022
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Giovany Rincon	CÉDULA	1095818352	CARGO	Oficial

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor en LERMA CONSTRUCCIONES SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP´s en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Camisa	1	19	11	24		
Pantalon	1	19	11	24		
Guantes	1	19	11	24		
Gafas	1	19	11	24		
Arnichi	1	19	11	24	Giovany Rincon	
Pantalon	1	21	11	24	Giovany Rincon	
Guantes	1	29	11	24	Giovany Rincon	
Guantes	1	12	12	24	Giovany Rincon	
Guantes	1	07	01	25	Giovany Rincon	
Guantes	1	13	01	25	Giovany Rincon	
Gafas	1	20	01	25	Giovany Rincon	
Guantes	1	03	02	25	Giovany Rincon	
Guantes	1	19	02	25	Giovany Rincon	
Guantes	1	17	03	25	Giovany Rincon	
Guantes	1	16	04	25	Giovany Rincon	
Guantes	1	14	05	25	Giovany Rincon	
Guantes	1	08	06	25	Giovany Rincon	
Gafas	1	08	06	25	Giovany Rincon	
Pantalon	1	25	06	25	Giovany Rincon	
Camisa	1	25	06	25	Giovany Rincon	
Guantes	1	8	07	25	Giovany Rincon	
Guantes	1	21	07	25	Giovany Rincon	
Guantes	1	04	08	25	Giovany Rincon	
Guantes	1	02	09	25	Giovany Rincon	
Camisa	1	29	09	25	Giovany Rincon	
Pantalon	1	29	09	25	Giovany Rincon	
Gafas	1	29	09	25	Giovany Rincon	

LERMA CONSTRUCCIONES S.A.S

FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Código	SST-F-25
Fecha	2/09/2022
Versión	1
Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Deibys Echeverria	CÉDULA	5873350	CARGO	Oficial.

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor en LERMA CONSTRUCCIONES SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Casco	1	13	1	25		
Guantes	1	13	1	25		
Gafas	1	13	1	25		
Camisa	1	13	1	25		
Pantalon	1	13	1	25		
Botas.	1	13	1	25		
Guantes	1	11	02	25		
Gafas	1	25	02	25		
Guantes	1	10	03	25		
Guantes	1	25	03	25		
Guantes	1	16	04	25		
Camisa	1	08	06	25		
Guantes	1	08	06	25		
Pantalon	1	25	06	25		
Guantes	1	09	07	25		
Guantes	1	21	07	25		
Guantes	1	14	08	25		
Guantes	1	01	09	25		
Camisa	1					
Pantalon	1	29	09	25		
Guantes	1					

LERMA

FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Código	SST-F-25
Fecha	2/09/2022
Versión	1
Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Carlos Mejia	CÉDULA	91181080	CARGO	Oficial

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor en LERMA CONSTRUCCIONES SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempañada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

II. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Camisa	1			25	carlos H mejia	
Pantalon	1			25	carlos H mejia	
Casco	1		04		carlos H mejia	
Guantes	1				carlos H mejia	
Botas	1	04			carlos H mejia	
Guantes	1	10	03	25	carlos H mejia	
Guantes	1	25	03	25	carlos H mejia	
Guantes	1	08	04	25	carlos H mejia	
Guantes	1	22	04	25	carlos H mejia	
Camisa	1	08	06	25	carlos H mejia	
Guantes	1	08	06	25	carlos H mejia	
Botas caucho	1	16	06	25	carlos H mejia	
Pantalon	1	25	06	25	carlos H mejia	
Guantes	1	08	07	25	carlos H mejia	
Guantes	1	21	07	25	carlos H mejia	
Guantes	1	06	08	25	carlos H mejia	
Guantes	1	01	09	25	carlos H mejia	
Botas caucho	1	29	09	25	carlos H mejia	
Camisa	1			25	carlos H mejia	
Pantalon	1	29	09	25	carlos H mejia	
Guantes					carlos H mejia	

FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Código	SST-F-25
Fecha	2/09/2022
Versión	1
Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Alvaro Anaya	CÉDULA	13741744	CARGO	Ayudante

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor en LERMA CONSTRUCCIONES SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Camisa	2	11	02	25		
Pantalon	2					
casco	1					
Botas caucho	1	11	02	25	Alvaro	
Gafas	1					
Guantes	1	11	02	25	Alvaro	
Guantes	1	10	03	25	Alvaro	
Guantes	1	25	03	25	Alvaro	
Guantes	1	08	04	25	Alvaro	
Guantes	1	22	04	25	Alvaro	
Guantes	1	08	06	25	Alvaro	
Camisa	1	25	06	25	Alvaro	
Pantalon	1	25	06	25	Alvaro	
Guantes	1	08	07	25	Alvaro	
Guantes	1	21	07	25	Alvaro	
Guantes	1	04	08	25	Alvaro	
Guantes	1	02	09	25	Alvaro	
Camisa Polo	1	29	09	25	Alvaro	
Pantalon	1	29	09	25	Alvaro	

Camisa = M Zapatos = 39
Pantalon = 30

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	9/10/2020
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Juan Ramp Roman Cuaga	CÉDULA	1098745891	CARGO	Ayudante
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Consorcio Cauca

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con MAQUINCBRAS DE COLOMBIA SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Guantes Vaqueta	1	07	07	25		
Gafas Oscuras	1	07	07	25		
Tapabocas	1	08	07	25		
Guantes Vaqueta	1	14	07	25		
Tapabocas	1	16	07	25		
Tapados Copa	1	17	07	25		
Gafas Oscuras	1	25	07	25		
Tapabocas	1	25	07	25		
Guantes Vaqueta	1	28	07	25		
Gafas Oscuras	1	16	09	25		

Powered by CamScanner

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	1/06/2025
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Julio Trejos	CÉDULA	1087986614	CARGO	Ayudante
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Cauce

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Guantes de Carnaza	1	11	9	25	Julio Trejos	Geraldin P
Guantes de Carnaza	1	9	10	25	Julio Trejos	Geraldin P

Powered by CamScanner

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	1/06/2025
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Yeison Varon Rojas	CÉDULA	1106486177	CARGO	
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Cauce

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

II. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Camisa manga larga	1	24	9	25		Geraldin P
Pantalon	1	24	9	25		Geraldin P
botas de seguridad	1	24	9	25		Geraldin P
Guantes de Carnaza	1	24	9	25		Geraldin P
Casco	1	24	9	25		Geraldin P
Guantes de Carnaza	1	7	10	25		Geraldin P
Guantes de Carnaza	1	14	10	25		Geraldin P

Powered by CamScanner

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	1/08/2025
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Yerson Alfonzo Romero	CÉDULA	1124244418	CARGO	
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Cauce

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

II. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Camisa manga larga	1	24	9	25		Geraldin P
Pantalon	1	24	9	25		Geraldin P
botas de Seguridad	1	24	9	25		Geraldin P
Guantes de Carnaza	1	24	9	25		Geraldin P
Casco	1	24	9	25		Geraldin P
Guantes de Carnaza	1					Geraldin P
Guantes de Carnaza	1	7	10	25		Geraldin P
Guantes de Carnaza	1	14	10	25		Geraldin P

Powered by CamScanner

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	1/06/2021
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Edwin Saiate H.	CÉDULA	1124242098	CARGO	Cavionador
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Cauce

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Camisa manga larga	1	24	9	25	Edwin Saiate	Geraldin P
Pantalon	1	24	9	25	Edwin Saiate	Geraldin P
botas de Sebaxida	1	24	9	25	Edwin Saiate	Geraldin P
Guantes de Carroza	1	24	9	25	Edwin Saiate	Geraldin P
Casco	1	24	9	25	Edwin Saiate	Geraldin P.
Guantes de Carroza	1	7	10	25	Edwin Saiate	Geraldin P

Powered by CamScanner

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	1/08/2025
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Hector Raquejo J.	CÉDULA	1003668429	CARGO	Ayudante
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Cauce

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Camisa manga larga	1	24	9	25	Hector R.	Geraldin P
Pantalon	1	24	9	25	Hector R	Geraldin P
Guantes de Carnaza	1	24	9	25	Hector R	Geraldin P
botas de Sobaricla	1	24	9	25	Hector R	Geraldin P
Casco	1	24	9	25	Hector R	Geraldin P.
Guantes de carnaza	1	7	10	25	Hector R.	Geraldin P.
Guantes de Carnaza	1	9	10	25	Hector R	Geraldin P
Guantes de Carnaza	1	14	10	25	Hector R	Geraldin P
Guantes de Carnaza	1	23	10	25	Hector R	Geraldin P.

Powered by CamScanner

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	1/06/2025
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Jorge Alirio Peña Sanchez	CÉDULA	1098971884	CARGO	Ayudante.
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Cauce.

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Pantalon Jean	1	21	8	25	Peña	Geraldin P.
Camisa manga larga	1	21	8	25	Peña	Geraldin P.
Guantes de Carnaza	1	12	9	25	Peña	Geraldin P
Botas de Seguridad	1	22	9	25	Peña	Geraldin P

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	1/09/2025
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Javier orlando	CÉDULA	91355759	CARGO	Ayudante
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Cauce.

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar pérdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Guantes de Carnaza	1	11	9	25	Javier orlando	Geraldin P
Guantes de Carnaza	1	11	10	25	Javier L.	Geraldin P
Guantes de Carnaza	1	23	10	25	Javier R.	Geraldin P.
Botas de Seguridad	1	23	10	25	Javier R.	Geraldin P

Powered by CamScanner

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	1/08/2025
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Joan Camilo Cardenas	CÉDULA	1100888009	CARGO	oficial
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Cauce.

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Guantes de carnaza	1	21	8	25	camilo cardenas	Geraldin P
Gafas oscuras	1	21	8	25	camilo cardenas	Geraldin P
Camisa manga larga	1	21	8	25	camilo cardenas	Geraldin P.
Botas de Seguridad	1	27	8	25	camilo cardenas	Geraldin P
Guantes de carnaza	1	1	9	25	camilo cardenas	Geraldin P

Powered by CamScanner

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	1/09/2025
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Omar Silva Palaza	CÉDULA	6484816	CARGO	Ayudante
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Cauce

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DIA	MES	AÑO		
Casco	1	31	7	25		Geraldin P.
Guantes de Carnaza	1	31	7	25		Geraldin P.
Camisa manga larga	1	31	7	25		Geraldin P.
Pantalon Jean	1	31	7	25		Geraldin P.
gafas	1	31	7	25		Geraldin P.
bata de Pvc	1	31	7	25		Geraldin P.
Guantes de Carnaza	1	21	8	25		Geraldin P.
Tapa Oidos inserción	1	21	8	25		Geraldin P.
Camisa manga larga	1	26	8	25		Geraldin P.
Guantes de Carnaza	1	8	9	25		Geraldin P.

Powered by CamScanner

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST.F.17
		Fecha	1/06/2026
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Antonio Gonzalez	CÉDULA	1095797433	CARGO	Maestro
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Cauce

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted; siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las Instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Guantes de Carnaza	1	21	8	25	Antonio Gonz	Geraldin P
Tapa oidos insercion	1	21	8	25	Antonio Gonz	Geraldin P
Gafas	1	21	8	25	Antonio Gonz	Geraldin P.
Guantes de carnaza	1	12	9	25	Antonio Gonz	Geraldin P

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	1/06/2025
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Luis A. leal Sanabria	CÉDULA	91352138	CARGO	Ayudante
EQUIPO		CODIGO DE EQUPO		PROYECTO	Cauce

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Guantes de Carnaza	1	22	7	25	Luis Leal	Geraldin P
Guantes de Carnaza	1	21	8	25	Luis Leal	Geraldin P
Gafas	1	21	8	25	Luis Leal	Geraldin P.
Camisa manga larga	1	26	8	25	Luis Leal	Geraldin P.
Guantes de Carnaza	1	2	9	25	Luis Leal	Geraldin P.
Guantes de Carnaza	1	12	9	25	Luis Leal	Geraldin P
Botas de Seguridad	1	22	9	25	Luis Leal	Geraldin P
Guantes de Carnaza	1	24	9	25	Luis Leal	Geraldin P
Guantes de Carnaza	1	15	10	25	Luis Leal	Geraldin P.

Powered by CamScanner

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	1/09/2025
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Luis A. Luna Rueda	CÉDULA	1005344971	CARGO	Ayudante
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Cauce

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Guantes de carnaza	1	21	8	25		Geraldin P.
Gafas	1	21	8	25		Geraldin P.
Tapa oidos inserción	1	21	8	25		Geraldin P.
Guantes de carnaza	1	23	10	25		Geraldin P
Camisa manga larga	1	23	10	25		Geraldin P

Powered by CamScanner

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	1/06/2025
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Raul Melo Olaya	CÉDULA	1086572274	CARGO	Ayudante
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Cauce

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor.
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Casco	1	4	8	25		Geraldin P
Guantes de cabraza	1	4	8	25		Geraldin P
Camisa manga larga	1	4	8	25		Geraldin P
Pantalon Jean	1	4	8	25		Geraldin P
gafas	1	4	8	25		Geraldin P.
botas Pvc	1	4	8	25		Geraldin P
Guantes de cabraza	1	21	8	25		Geraldin P
Camisa manga larga	1	26	8	25		Geraldin P.
Guantes de cabraza	1	18	9	25		Geraldin P

Powered by CamScanner

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	1/08/2025
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Johan Camilo Sanchez	CÉDULA	1098635374	CARGO	Ayudante
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Cauce

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor.
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Guantes de carnaza	1	21	8	25	Camilo Sanchez	Geraldin P
Gafas oscuras	1	21	8	25	camilo sanchez	Geraldin P.
Guantes de carnaza	1	2	9	25	camilo sanchez	Geraldin P
Guantes de carnaza	1	11	9	25	camilo sanchez	Geraldin P
botas de seguridad	1	22	9	25	Camilo Sanchez	Geraldin P

Powered by CamScanner

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	10/02/2025
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Keiner Daniel Sanchez Jerez	CÉDULA	1098656489	CARGO	Ayudante
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Cauce.

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Guantes de Carnaza	1	21	8	25	Keiner Sanchez	Geraldin P.
Gafas	1	21	8	25	Keiner Sanchez	Geraldin P
Guantes de Carnaza	1	30	8	25	Keiner Sanchez	Geraldin P
botas de PVC	1	2	9	25	Keiner Sanchez	Geraldin P
Guantes de Carnaza	1	11	9	25	Keiner Sanchez	Geraldin P.

Powered by CamScanner

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	6/1/2026
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Huver David Rivera	CÉDULA	1048271660	CARGO	Ayudante
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Cauce.

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Camisa manga larga	1	14	8	25	Huver Rivera	Geraldin P.
Pantalon	1	14	8	25	Huver Rivera	Geraldin P.
Guantes	1	14	8	25	Huver Rivera	Geraldin P.
botas de PVC	1	21	8	25	Huver Rivera	Geraldin P.
Guantes de carnaza	1	24	9	25	Huver Rivera	Geraldin P

Powered by CamScanner

ANEXO N° 9
CAPACITACIONES SST

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACION [X] CHARLA [ ]

OBRA Consorcio Cauce

TEMA DE CAPACITACIÓN Peligros físicos

LUGAR: campamento FECHA 10/04/2025

CAPACITADOR José Orlando Alba DURACIÓN 40 minutos

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Luis Alberto [illegible]	1082475667	operador prof.	[signature]
2	[illegible]	[illegible]	operador	[signature]
3	Harley Pranda	1098822751	AYUDANTE P.	[signature]
4	Uriel Rivera	7.702.383610	Operador	Uriel Rivera
5	Isaías García	1101596200	Operador	[signature]
6	Tolmantelemmos Pabello	1101019875	Y Perforación	[signature]
7	Jarrinson steven caicedo	1232891906	ayudante perforacion	[signature]
8	Victor Trujillo	91250524	Ayudante	Victor Trujillo
9	Olga [illegible]	1098640002	operador	[signature]
10	Luis Edgar [illegible]	1545177[illegible]	Ayudante	[signature]
11	[illegible]	91356[illegible]	op	[signature]
12	Rubeiro [illegible]	9139[illegible]	[illegible]	[signature]
13	Alvaro	13.241[illegible]	Ax	[signature]
14	Juan de Dios García	91079907	Maestro	Juan de Dios
15	Daisfernanda Jimenez	97103462	Maestra	Daisfernanda Jimenez
16	Uriel Bairtero	12.502397	contramaestro	[signature]
17	[illegible]	1007769[illegible]	AY	[signature]
18	Julio Tapias	10879866[illegible]	AY	Julio Tapias
19	[illegible] Peña	1098771881	[illegible]	[signature] Peña
20	Edgar García	5641464	OPERADOR	[signature]
21	Edwin David Blanco Flores	1009731661	Soldador	[signature]
22	[illegible]	1003205234	A-7	[signature]
23	Duban A Tamas G.	1095791990	Ayudante	Duban
24	Alvaro Alvato	13.241[illegible]	AX	[signature]
25	Luis Adrian [illegible]	9129992	Ay	Luis [illegible]
26	Erdel Giovanny Rincon	1095 818 32[illegible]	Oficial	Giovanny Rincon
27	[illegible]	[illegible]	Ofy	[signature]
28	Antonio [illegible]	1095747433	Of	[signature]
29	Manfredy Valencia	1005749389	Of	[signature]
30	Raul Melo Olivera	1006572279	AY	[signature]

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

José O Alba

FIRMA

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACION [X] CHARLA [ ]

OBRA Consorcio cauce

TEMA DE CAPACITACIÓN Peligros físicos

LUGAR: Campamento FECHA 10/09/2025

CAPACITADOR José Orlando Alba DURACIÓN 40 minutos

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Freddy Fuentes G.	8127408	Almacenista	
2	Jairo alonso	9.235.750		
3	Cristian Maldonado	1005448949	Ayudante	Cristian M
4	Alexander Salazar			Alexander Salazar
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

José Alba

FIRMA

CONSORCIO	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO ☐ CAPACITACION ☒ CHARLA ☐

OBRA: Consorcio Cauca

TEMA DE CAPACITACIÓN: Cuidado Usual

LUGAR: Campamento FECHA: 24/09/2025

CAPACITADOR: José Orlando Alba DURACIÓN: 40 minutos

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Uriel Quintero	12502397	comprapiedra	
2	Carlos Julio Zuñiga	5775284	OPG	
3	Omar E. SILVA B	6484616	AYUDANTE	
4	RAUL R. Melo Olaya	1006572279	AYUDANTE	
5	Simón Peña	12655732	AY	
6	Mauricio Suarez P	1000890118	OP	
7	Dorian Arango	1047341262	ayudante	
8	Oiban Andres Jaimes Gonzalez	1095791490	Ayudante	
9	Jair E Peña	1098771884	Perforista	Jair Peña
10	Edgar Garcia	5641404	oficial	
11	Juan Carlos Luna	6133303	Ay	
12	Antonio A Gonzalez	1095791433	OF	
13	Yesid Ramos	1.090791031	AY	
14	Raul Garcia Amaris	1.007.514009	OF	
15	Luis Ruiz	91298926	AY	
16	Roberto Santisteban	91342187	Ayudante	
17	Frank Anaya	1007396991	AYU	
18	Jose Miguel Hernandez	1007205234	AY	
19	Luis Guillermo	16451774	Ayudante	
20	IVERIS	85202937	AY	IVERIS
21	Edinson Leon	1007814689	Ayudante	
22	Jhon Freddy Valencia	1005149383	OF.	
23	Alvaro Anaya	13.241714		
24	Felix caballero V	91556619	OF	
25	FIORENTINO	1095902356	OF	
26	Freddy Cubides	1075260134	Operador	Freddy Cubides
27	Carlos Humberto Medina	91181080	OF	
28	Alejandra Pinedo Barros	1234336042	SST	
29	Jesus Alberto Hernandez	1037879814	Operador	Jesus Alberto H.
30	Juan Carlos Cardozo Gomez	91.075912..	Ayudante	Juan Carlos C.

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

José O Alba

FIRMA

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACION [X] CHARLA [ ]

OBRA Consorcio Cauce

TEMA DE CAPACITACIÓN Cuidado Visual

LUGAR: Campamento FECHA 24/09/2025

CAPACITADOR José Orlando Alba DURACIÓN 40 minutos

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Deibys Echeverria	5873350	OF	
2	ALVARO ANAYA	13.741.794	—	—
3	DIEGO Armando CASTRO	1095949646	OF	Diego A Castro
4	Jordan Mendoza Y	1002329609	OF	
5	Diego Armando Wilches	1098749812	OF	Diego Armando
6	Giacomo Rincon	1045878351	OFicial	
7	FABIO MARIN	1003097037	AY	FABIO MARIN
8	JULIO TIRADO	1098986614	AX	JULIO TIRADO
9	David orlando Ra	91355759	AY	
10	Luis Fernando Jimenez	91703462	AYA	Luis Fernando Jimenez
11	Enderli salazar	1065076868	OF	Enderli
12	Kemar Daniel Sanchez	1098656489	oficial	kemar Sanchez
13	Johan camilo Sanchez	1098635374	oficial	Camilo Sanchez
14	Sandra Cardenas Rivas	1100888009	oficial	sandra cardenas
15	Yulian Calderon	1100896239	oficial	
16	John Jairo Cardenas	1095956935	oficial	
17	Anderson Saboredamo	1095924655	Ayudante	
18	Cristian maldonado	1005448741	oficial	Cristian M
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

José Orlando Alba

FIRMA

ANEXO N° 10
INSPECCIONES DE SEGURIDAD

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Código	SST-F-26
Fecha	4/06/2021
Versión	2
Pagina	1 de 2

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: José Orlando Alba James Firma: José Alba J CARGO: Profesional SST

FRENTE DE OBRA Y/O PROYECTO: Consorcio Cauce

Vo Bo COPASST (Nombre y firma): Juan de Dios García CARGO: Maestro.

Tenga en cuenta que:

U: Uso y se califica con SI ó NO.

E: Estado y se califica como Excelente, Bueno, Regular ó Malo. (unicamente las letras iniciales)

Nota: La calificación se sujeta al momento de la observación

DATOS BÁSICOS		FECHA	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL																				OBSERVACIONES
			Casco		Protector Auditivo		Perforación Facial		Protector Respiratorio		Calzado		Guantes		Gafas		Reflectivo		Overol		Botas		
NOMBRE	CARGO		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	
Diego A Galvis	Ayudante	04/04/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Juan C. León A	Ayudante	04/04/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Jhon Jairo Cardenas	oficial	04/04/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Alvaro Araya	Ayudante	04/04/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Victor Trujillo	Ayudante	04/04/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Juan de Dios Garcia	Maestro	04/04/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Jinel Quintero	Maestro	04/04/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Giovanny Rincón	oficial	04/04/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Luis Melgarejo	Ayudante	04/04/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Juan R. Roman	operador perf	04/04/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Freddy Fuentes	Almacenista	04/04/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Luis Adrian Rey	Ayudante	04/04/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Carlos Mejia	Cavanero	04/04/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							

	INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-26
		Fecha	4/06/2021
		Versión	2
		Pagina 2 de 2	

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: José Orlando Alba Jaimes Firma: CARGO: profesional SST

FRENTE DE OBRA Y/O PROYECTO: Consorcio Cauce

Vo Bo COPASST (Nombre y firma): Juan de Dios Bayona CARGO: Maestro

Tenga en cuenta que:

U: Uso y se califica con SI ó NO.

E: Estado y se califica como Excelente, Bueno, Regular ó Malo. (unicamente las letras iniciales)

Nota: La calificación se sujeta al momento de la observación

DATOS BÁSICOS		FECHA	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL																		OBSERVACIONES
			Casco		Protector Auditivo		Elementos visual		Protector Respiratorio		Overol/dril		Guantes		Botas		Barbiquejo		Otro		Otro	
NOMBRE	CARGO		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	
Deibys Echeverria	Cavanero	04/09/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	B	B							
Luis A. Carapaba	operador retro	04/09/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	B	B	SI	B							
Gustavo Jimenez	Maestro	04/09/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Juan Camilo Sanchez	Ayudante	04/09/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Julio Erasmo Trejos	Ayudante	04/09/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Cristian Maldonado	Ayudante	04/09/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Luis Alberto Luna R	Ayudante	04/09/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Duvan Jaimes	Ayudante	04/09/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Raul Melo	Ayudante	04/09/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Hover Rivera	Ayudante	04/09/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Jorge Pena	Ayudante	04/09/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Enderbi Salazar	Ayudante	04/09/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Kener Sanchez	Ayudante	04/09/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							

	INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-26
		Fecha	4/06/2021
		Versión	2
		Página	1 de 2

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: José Orlando Alba — Firma: José O Alba — CARGO: profesional SST

FRENTE DE OBRA Y/O PROYECTO: Consorcio Cauca

Vo Bo COPASST (Nombre y firma): Juan de Dios Garcia — CARGO: Maestro

Tenga en cuenta que:

U: Uso y se califica con SI ó NO.

E: Estado y se califica como Excelente, Bueno, Regular ó Malo. (unicamente las letras iniciales)

Nota: La calificación se sujeta al momento de la observación

DATOS BÁSICOS		FECHA	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL																				OBSERVACIONES
			Casco		Protector Auditivo		Pantallas ocular		Protector Respiratorio		Dotación		Guantes		Botas		Reflectivo		Otro		Otro		
NOMBRE	CARGO		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	
Antonio Gonzalez	Ayudante	24/9/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Duvan James	Ayudante	24/09/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Julio Trejos	Ayudante	24/09/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Alvaro Anaya	Ayudante	24/09/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Luis Adrián Rey	Ayudante	24/09/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Juan de Dios Garcia	Maestro	24/09/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Uriel Quintero	Maestro	24/09/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Braulio Rivera	Ayudante	24/09/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Pedro Gonzalo	Gavionero	24/09/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Carlos Mejia	Gavionero	24/9/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Luis Adrián Rey	Ayudante	24/09/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Luis Melgarejo	Ayudante	24/09/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Keiner Sanchez	Ayudante	24/09/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							

CONSORCIO	INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-26
		Fecha	4/05/2021
		Versión	2
		Pagina 2 de 2	

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: Jose Athy — Firma: José Athy — CARGO: Profesional SST

FRENTE DE OBRA Y/O PROYECTO: Consorcio Cauce — CARGO: Maestro

Vo Bo COPASST (Nombre y firma): Juan de Dios García

Tenga en cuenta que:

U: Uso y se califica con SI ó NO.

E: Estado y se califica como Excelente, Bueno, Regular ó Malo. (unicamente las letras iniciales)

Nota: La calificación se sujeta al momento de la observación

DATOS BÁSICOS		FECHA	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL																				OBSERVACIONES
			Casco		Protector Auditivo		Protección Ocular		Protector Respiratorio		Botas de		Guantes		Gafas		Barbuquejo		Otro		Otro		
NOMBRE	CARGO		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	
Luis F. Jimenez	Maestro	24/9/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Duvan Cárdenas	oficial	24/09/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Cristian Maldonado	Ayudante	24/9/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Iwan René Román	operador pat	24/9/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Diego Galvis	Ayudante	24/9/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Antonio Gonzalez	Ayudante	24/9/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Huver Rivera	Ayudante	24/9/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Raul Melo	Ayudante	24/9/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Jorge Peña	Ayudante	24/9/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Luis A. Cano	operador	24/9/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Joam Cárdenas	Oficial	24/9/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Enderbi Salazar	Ayudante	24/9/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Luis Leal Sanabria	Ayudante	24/9/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							

INSPECCIÓN LOCATIVA DE OBRA

Código	SST-F-18
Fecha	15/08/2023
Versión	3
Página 1 de 2	

Frente de Obra	Consorcio Cauce	Fecha:	17/09/2025
Área Inspeccionada :	Campamento – Almacen – Baños	V.B. Copasst:	Juan de Dios Garcia

Marque según criterio:	B= Bueno R= Regular M= Malo NA= No aplica		
BUENO	REGULAR	MALO	NO APLICA
Cuando el item a revisar NO presenta algún daño, avería, riesgo (salud ocupacional, ambiental) y esta todo en perfecto orden.	Cuando alguno de los items inspeccionados presenta daño, avería, riesgo (salud ocupacional, ambiental) o no esta en orden y aseo.	Cuando la mayoría de los items inspeccionados presenta un daño, avería, riesgos y esta todo en desorden y desaseo.	No es utilizado en alguna de las sedes.

[illegible]									
[illegible]									
Las areas de almacenamiento estan señalizadas y demarcadas adecuadamente	✓								
Se tienen TODAS las hojas de seguridad de las sustancias químicas presentes en el área.	✓								
El almacenamiento de sustancias químicas esta acorde a las recomendaciones dadas en las hojas de seguridad o fichas tecnicas.	✓								
El arrume de productos es el recomendado	✓								
[illegible]									
Los pisos tienen superficies seguras y adecuadas para el trabajo	✓								
Los pisos estan limpios, secos, sin desperdicios	✓								
Los pisos estan libres de obstaculos	✓								
Las areas de trabajo estan debidamente señalizadas y demarcadas	✓								
Los senderos son seguros y libres de obstaculos	✓								
Las vias de circulacion estan debidamente demarcadas	✓								
Los recipientes se encuentran debidamente rotulados o marcados con el contenido	✓								
En las instalaciones se cuenta con baterias sanitarias	✓								
Las áreas se encuentran libres o aseguradas de elementos que cuenten con	✓								
[illegible]									
La maquinaria y/o equipo estan debidamente protegidos	✓								
Las herramientas, maquinaria y equipos estan operativos para su uso	✓								
Los equipos y/o maquinaria se encuentran libres de fugas	✓								
El cable de alimentación de la herramienta y/o equipo está en buen estado? (libre de cortes)	✓								
[illegible]									

INSPECCIÓN LOCATIVA DE OBRA

Código	SST-F-38
Fecha	15/08/2023
Versión	3
Página 2 de 2	

Frente de Obra	Consorcio Cauce							Fecha:	21/09/2023			
Área Inspeccionada:	Baños, Campamento, Almacen							V.B. Copaset:				
El área y todas sus zonas se encuentran libres de objetos fuera de uso o que no pertenecen a este lugar.	✓											
En la áreas se cuenta con puntos ecologicos para la clasificación y disposición de los residuos	✓											
Se mantienen avisos alusivos al orden y aseo en lugares apropiados y se dictan charlas de sensibilización periódicas al personal sobre el orden y aseo.	✓	✓										
Se aplica un programa de reciclaje y proteccion al medio ambiente	✓											
El sitio para el almacenamiento de residuos es el adecuado y esta ordenado	✓	✓										
Los recipientes donde se disponen los residuos son adecuados en tamaño y número	✓											
Las baterías sanitarias se encuentran en condiciones adecuadas de orden y aseo	✓											
Aspectos de preparación												
En el área hay disponibilidad de recursos para la atención de emergencias (botiquín, camilla, extintor)	✓											
Se organizaron y asignaron las responsabilidades de las brigadas de emergencias	✓											
Se encuentran definidas y señalizadas las rutas de evacuación y punto de encuentro	✓											
Se encuentran definidas y señalizadas las salidas de emergencia	✓											
Se encuentra establecido y en funcionamiento un sistema de comunicación oportuno en caso de emergencia	✓											
Se cuenta con MEDEVAC	✓											
Los extintores se encuentran recargados, señalizados y funcionales	✓											
Aspectos de atención												
El botiquín de primeros auxilios se encuentra dotado y es de fácil acceso	✓											
Se cuenta con camilla en el área	✓											
Se realiza control de los insumos que se utilizan para la atención de emergencias con el fin de realizar la reposición oportuna de los mismos	✓											

OBSERVACIONES

Responsable de la Inspección: Jose Albu

Cargo: profesional SST.

CONSORCIO	INSPECCIÓN DE BOTIQUINES Y CAMILLAS	Código	SST-F-14
		Fecha	16/05/2025
		Versión	4
		Página 1 de 1	

Inspección realizada por

Nombre: José orlando Alba	Fecha inspección: 16/09/2025	Próxima inspección: 16/12/2025
Cargo: Profesional SST	Lugar: Consorcio cauce	Firma: José Alba
Ubicación del botiquín: Campamento	Ubicación de la camilla: Campamento	
V.B. Copasst: Juan de Dios Bedoya	V.B. Brigadas de emergencia: Freddy Fuentes	

Elementos	Parámetros a revisar								Plan de acción			
	Medida	Cantidad Stock	Cantidad Solicitada	Fecha vencimiento	Integridad empaque B	R	M	NA	Acción Correctiva Propuesta	Fecha Propuesta	Fecha Ejecución	Responsable
Alcohol Antiséptico	Frasco	1	1	08/2027	✓							
Termómetro Digital	Unidad	1	1	NA	✓							
Algodón	Paquete	1	1	06/2028	✓							
Gasa Estéril	Paquete	8	12	01/31/24	✓							
Gasa Limpia	Unidad	20										
Aplicadores y/o copitos	Unidad	10	10	09/10/26	✓							
Esparadrapo de tela	Unidad	1	1	11/2026	✓							
Esparadrapo microporo	Unidad	1	1	01/01/27	✓							
Apósito ocular	Unidad	4	4	03/2029	✓							
Bajalenguas	Unidad	10	20	20/8/26	✓							
Yodopovidona Espuma	Frasco	1	1	09/2026	✓							
Clorhexidina (Jabón Quirúrgico)	Frasco	1	1	10/17/26	✓							
Linterna con pilas	Unidad	1	1	NA	✓							
Inmovilizador Miembros superiores	Unidad	1	1	NA	✓							
Inmovilizador Cervical	Unidad	1	1	NA	✓							
Inmovilizador miebros inferiores	Unidad	1	1	NA	✓							
Solución salina 250 ml ó 500 ml	Bolsa	2	1	09/2026	✓							
Silbato de emergencias	Unidad	1	1	NA	✓							
Tijeras	Unidad	1	1	NA	✓							
Curitas	Unidad	10	10	11/2026	✓							
Sales de Rehidratación Oral	Sobre	2	2	08/2026	✓							
Tapabocas desechable	Unidad	10	10	04/2026	✓							
Compresas Estériles	Unidad	5	5	05/2028	✓							
Guantes de nitrilo / latex	Unidad	20	20	01/04/2028	✓							
Venda de algodón 3"X5 yardas	Unidad	1	1	10/2026	✓							
Vendas elástica 2"X5 yardas	Unidad	1	1	04/2028	✓							
Vendas elástica 3"X5 yardas	Unidad	1	1	07/2027	✓							
Vendas elástica 5"X5 yardas	Unidad	1	1	07/2028	✓							
Mascarilla o Protector facial RCP	Unidad	1	1	NA	✓							
Manual primeros auxilios	Unidad	1	1	NA	✓							

INSPECCIÓN DE CAMILLA

La camilla debe ser rígida y en polietileno de alta densidad, impermeable a ácidos (no flexible, de fácil limpieza, con ayuda tipo asilla con reflectivos

Descripción	Estado B	R	M	NA	Observaciones
Instalación (Sitio de ubicación con fácil acceso)	✓				
Se encuentra señalizado	✓				
Estado del soporte	✓				
Estado de las correas de seguridad	✓				
Estado general (sin fisuras o fracturas, limpio y libre de polvo)	✓				
Juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior	✓				

Conclusiones y Sugerencias:

	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código	SST-F-15
		Fecha	15/08/2023
		Versión	3
		Pagina 1 de 1	

FECHA: 16 September 2025 PROYECTO: Consorcio Cauca

INSPECCIÓN REALIZADA POR: José O. Alba Jaimes

V.B. BRIGADAS DE EMERGENCIA: Freddy Fuentes

V.B. COPASST: Juan de Dios Garcia

1	PQS ABC	Campamento Frente 1	10 Lbs	08/2025	08/2026	B	B	B	B	B	B	B	/	B	B	B	B	
2	PQS ABC	Retroex #4	10 Lbs	06/2025	06/2026	B	B	B	B	B	B	B	/	B	B	B	B	
3	PQS ABC	Retroexc #73	10 Lbs	11/2024	11/2025	B	B	B	B	B	B	B	/	B	B	B	B	
4	PQS ABC	Retroexc #74	10 Lbs	06/2025	06/2026	B	B	B	B	B	B	B	/	B	B	B	B	
5	PQS ABC	Retroexc #35	10 Lbs	08/2025	08/2026	B	B	B	B	B	B	B	/	B	B	B	B	

OBSERVACIONES:

Nota: Para el diligenciamiento del estado de los extintores colocar B (Bueno), R (Regular) o M (Malo), según lo considere en la inspección.

ANEXO N° 11
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONSORCIO	INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CDMB

CHARLAS Y CAPACITACIONES DE SEGURIDAD





SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN





SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES





ANEXO No. 7: ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.

ESTADO DEL TIEMPO EN LA JORNADA LABORAL
(CONSORCIO CAUCE)

CONTRATO: 210-15410-6

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)

MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2025


CONDICIONES CLIMATICAS EN LA JORNADA LABORAL

SOLEADO	1	NUBLADO	2	LLUVIOSO	3	TORMENTA	4	AUMENTO NIVEL DEL RÍO	5

HORAS	MES: SEPTIEMBRE																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	
6:00 a 7:00																															
7:00 a 8:00		3	5	2	2	5		2	1	2	3	2	2		1	2	2	1	1	1		2	2	1	1	2	2		1	2	
8:00 a 9:00		5	5	2	2	5		2	1	2	5	2	2		1	1	2	1	1	1		2	2	1	1	1	2		1	1	
9:00 a 10:00		5	5	1	3	5		2	1	3	5	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	2		1	1	
10:00 a 11:00	3	3	5	1	3	2		2	2	3	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	2		1	1	
11:00 a 12:00	3	3	1	1	3	2		2	2	3	1	1	1		1	1	1	1	2	1		1	1	1	1	1	1		1	1	
12:00 a 13:00	3	3	2	1	3			1	1	3	1	1			1	1	1	1	2			2	1	1	1	1			1	2	
13:00 a 14:00		3	2	1	3			1	1	3	1	2			1	1	1	1	2			1	1	1	1	1			1	2	
14:00 a 15:00	3		1	1	3			2	1	5	1	2			1	1	1	2	1			1	1	1	1	1			1	2	
15:00 a 16:00		3	1	1	3			1	1	5	1	2			1	1	2	2	1			1	1	1	2	1			1	2	
16:00 a 17:00		3	2	1	3			1	1		1	1			2	1	1	2	1			2	1	2	2	1			1	2	
17:00 a 18:00																															
HORAS NO LABORADAS	10	10	4	0	8	3	0	0	0	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46

RESUMEN	
SECO	57,08%
NUBOSIDAD	23,75%
LLUVIA MODERADA	9,58%
LLUVIA INTENSA	3,33%
AUMENTO NIVEL RIO	6,25%

ESTADO DEL TIEMPO SEPTIEMBRE 2025

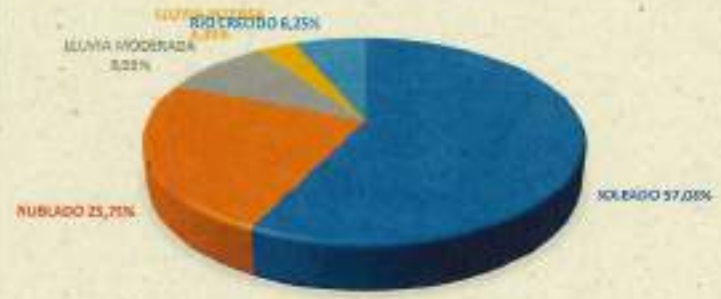

TOTAL HORAS LABORABLES DEL MES	
TOTAL HORAS NO LABORADAS POR LLUVIA	46
PORCENTAJE NO LABORADO POR LLUVIA	19,17%

ANEXO No. 8: ENSAYOS DE LABORATORIO.

HSC HIDROSUELOS DE COLOMBIA	FORMATO DE GESTIÓN DE LABORATORIO	CÓDIGO	FT-GL-043
	INFORME DE ENSAYO DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DE MORTEROS DE CEMENTO HIDRÁULICO A LA COMPRESIÓN, USANDO CUBOS DE 50 MM O 2 PULGADAS DE LADO. NTC 226-2022	FECHA	9/06/2025
		VERSIÓN	3
		Página 1 de 2	

LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S
CENTRO INDUSTRIAL Y LOGISTICO SAN JORGE KM 7 + 400 M ANILLO VIAL PALENQUE - FLORIDABLANCA N° 22-31. BODEGA 16 - PISO 1, GIRON, SANTANDER, COLOMBIA.

FECHA DE INFORME	N° DE INFORME	FECHA DE INGRESO DE LA MUESTRA	N° DE ORDEN DE SERVICIO	FRENTE DE OBRA	INFORMACION DEL CLIENTE
12/09/2025	1	15/08/2025	126-25	CAUCE	CONSORCIO CAUCE veroorcaauce@gmail.com

N° ID DEL CUBO	FECHA DE TOMA*	FECHA DE ENSAYO	EDAD	IDENTIFICACIÓN DEL CUBO	LARGO	ANCHO	ÁREA	ALTURA	PESO	DENSIDAD	CARGA MÁXIMA	RESISTENCIA ESPECIFICADA	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			% RESISTENCIA
					(mm)	(mm)	(mm²)	(mm)	(g)	(g/mm³)	(N)	(Mpa)	(MPa)	(PSI)	(kg/cm²)	ESPECIFICADA
1	13/08/2025	20/08/2025	7	LLENADO DE ANCLAJES	52,02	53,87	2802	52,39	276,0	1,985	55630	20,7	24,0	3552	249,7	116%
1,1	13/08/2025	27/08/2025	14		52,73	52,98	2793	53,32	280,0	1,880	70910	20,7	25,4	3683	258,9	123%
1,2	13/08/2025	10/09/2025	28		52,6	51,58	2715	52,14	259,0	1,930	82160	20,7	30,3	4390	308,6	146%
2	14/08/2025	21/08/2025	7	LLENADO DE ANCLAJES	51,33	51,42	2639	51,21	267,8	1,900	46700	20,7	16,5	2578	186,2	80%
2,1	14/08/2025	28/08/2025	14		52,51	51,29	2693	52,14	257,0	1,831	52390	20,7	19,5	2822	198,4	94%
2,2	14/08/2025	11/09/2025	28		52,19	52,89	2760	52,72	276,0	1,913	78500	20,7	28,4	4125	290,0	137%
3	15/08/2025	22/08/2025	7	LLENADO DE ANCLAJES	52,37	51,06	2674	51,55	263,8	1,914	49660	20,7	18,6	2694	189,4	90%
3,1	15/08/2025	29/08/2025	14		52,11	49,88	2600	52,08	249,0	1,839	54190	20,7	20,8	3022	212,4	101%
3,2	15/08/2025	12/09/2025	28		52,75	50,97	2689	54,39	268,0	1,764	68410	20,7	25,4	3680	259,2	123%

OBSERVACIONES:

- ESTE ENSAYO FUE REALIZADO EN LAS INTALACIONES DEL LABORATORIO.
- LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
-LOS DATOS DE FECHA DE TOMA, INFORMACIÓN DEL CONCRETO, ELEMENTO Y RESISTENCIA ESPERADA CORRESPONDEN A INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE. CUALQUIER OTRO DATO SUMINISTRADO POR ESTE SE INCLUIRÁ Y SE IDENTIFICARÁ CON EL CARÁCTER (*). HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S. NO SE RESPONSABILIZA POR LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE INCLUIDA EN ESTE INFORME Y QUE PUEDA AFECTAR LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.

REVISÓ		APROBÓ	
			
NOMBRE	WILLIAM EDUARDO CORTES	NOMBRE:	MARTHA LILIANA BATONA
CARGO	COORDINADOR DE LABORATORIO	CARGO:	GERENTE

Queda totalmente prohibida la reproducción parcial de este informe sin la previa autorización de HIDROSUELOS DE COLOMBIA SAS

Este documento es valido cuando lleve la firma de quien lo revisa y lo aprobó.

FIN DEL INFORME


HSC	FORMATO DE GESTIÓN DE LABORATORIO	CÓDIGO	FT-GL-045
	INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV E - 410 - 13	FECHA	30/07/2025
		VERSIÓN	0
			Página 1 de 1

LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S

CENTRO INDUSTRIAL Y LOGISTICO SAN JORGE KM 7 + 400 M ANILLO VIAL PALENQUE, DIAGONAL FLORIDABLANCA VIA N° 23-21, BODEGA 19 - PISO 1, GIRON, SANTANDER, COLOMBIA.

FECHA DE INFORME	Nº DE INFORME	FECHA DE INGRESO DE LA MUESTRA	Nº DE ORDEN DE SERVICIO	FRENTE DE OBRA	INFORMACIÓN DEL CLIENTE
30/07/2025	1	19/07/2025	11359	GALPÓN	CONSORCIO CALICE cimarcocalice@gmail.com

Nº DEL CILINDRO	FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYO	EDAD	ELEMENTO	DIÁMETRO (mm)			LONGITUD (mm)				ÁREA	RELACIÓN LONGITUD / DIÁMETRO	FACTOR DE CORRECCIÓN	DEFECTOS EN EL ESPECIMEN	PESO	DENSIDAD	CARGA MÁXIMA	RESISTENCIA ESPERADA POR EL CLIENTE	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			PATRÓN DE FRACTURA
			(DÍAS)		Diámetro 1	Diámetro 2	Promedio	Longitud 1	Longitud 2	Longitud 3	Promedio	(mm²)				(g)	(kg/m³)	(kN)	(MPa)	(MPa)	(kg/cm²)	(PSI)	
1	23/07/2025	30/07/2025	7	SOLADO	150,44	151,80	151,12	304	304	303	303	17938	2,0	1,00	NO PRESENTA	12178	2346	175,52	13,3	10,8	102	1483	4
1,1	23/07/2025	11/08/2025	14		151,88	150,88	151,12	304	303	304	304	17936	2,0	1,00	NO PRESENTA	12213	2368	216,87	13,3	12,9	123	1746	4
1,2	23/07/2025	25/08/2025	28		149,07	150,31	150,78	301	301	302	302	17859	2,0	1,00	NO PRESENTA	12309	2388	256,00	13,3	15,8	142	2022	4
1,3	23/07/2025	22/09/2025	60		150,57	150,69	150,63	303	302	301	302	17891	2,0	1,00	NO PRESENTA	12369	2218	271,24	13,3	15,8	161	2289	4
2	30/07/2025	06/08/2025	7	DESTELLON PTA SALAN	150,89	149,80	150,35	303	302	303	302	17773	2,0	1,00	NO PRESENTA	12256	2303	192,16	28,1	10,8	111	1577	4
2,1	30/07/2025	13/08/2025	14		151,12	149,22	150,17	302	302	303	302	17733	2,0	1,00	NO PRESENTA	12227	2301	213,00	28,1	12,1	122	1736	4
2,2	30/07/2025	27/08/2025	28		150,06	151,80	150,93	303	302	302	302	17804	2,0	1,00	NO PRESENTA	12347	2350	250,20	28,1	15,0	155	2208	4
2,3	30/07/2025	24/09/2025	56		149,72	151,56	150,65	301	303	303	301	17810	2,0	1,00	NO PRESENTA	12310	2300	275,41	28,1	16,0	212	3038	4



Tipo 1
Dance generalmente bien formados en ambos extremos

Tipo 2
Cono bien formado en un extremo pero no en el otro. Bolitas verticales que llegan a los extremos.

Tipo 3
Agrietamiento vertical columnar que atraviesa ambos extremos. No hay cono bien formados.

Tipo 4
Fractura diagonal sin grietas a través de los extremos (si estas grietas verticales para distinguirlo del tipo 1).

Tipo 5
Fracturas en los cuatros (usualmente debido a falta de refrentado).

Tipo 6
Similar al tipo 5, pero las grietas laterales ocurren en la superficie del cilindro.

OBSERVACIONES

- ESTE ENSAYO FUE REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO.
- INFORMACIÓN DEL CONCRETO: EL CLIENTE NO SUMINISTRÓ ESTA INFORMACIÓN.
- LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME CORRESPONDEN ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
- LOS DATOS DE FECHA DE TOMA, INFORMACIÓN DEL CONCRETO, ELEMENTO Y RESISTENCIA ESPERADA CORRESPONDEN A INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE. CUALQUIER OTRO DATO SUMINISTRADO POR ESTE SE INCLUIRÁ Y SE IDENTIFICARÁ EN EL INFORME CON EL CARÁCTER (*). HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S. NO SE RESPONSABILIZA POR LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE INCLUIDA EN ESTE INFORME Y QUE PUEDA AFECTAR LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.

REVISÓ		APROBÓ	
NOMBRE	WILLIAM EDUARDO FORTES	NOMBRE	MARTHA LILIANA BATONA ORTIZ
CARGO	COORDINADOR DE LABORATORIO	CARGO	GERENTE

Queda totalmente prohibida la reproducción parcial de este informe sin la previa autorización de HIDROSUELOS DE COLOMBIA SAS.
Este documento se valida cuando lleve la firma de quien la revisó y/o aprobó.


FIN DEL INFORME

HSC	FORMATO DE GESTIÓN DE LABORATORIO	CÓDIGO	FT-GLAB4
	INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV E - 410 - 13	FECHA	9/08/2023
		VERSIÓN	0
		Página 1 de 1	


LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S
CENTRO INDUSTRIAL Y LOGISTICO SAN JORGE KM 7 - 400 M ANILLO VIAL PALENQUE, DIAGONAL FLORIDABLANCA N° 23-31, BODEGA 19 - PISO 1, GIRON, SANTANDER, COLOMBIA.

FECHA DE INFORME	Nº DE INFORME	FECHA DE INGRESO DE LA MUESTRA	Nº DE ORDEN DE SERVICIO	PUNTO DE OBRA	INFORMACIÓN DEL CLIENTE
9/08/2023	1	28/07/2023	13723	GAVIÉ	CONSORCIO CIVILOS consorciocivilos@gmail.com

NÚMERO CILINDRO	FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYE	EDAD	ELEMENTO	DIÁMETRO (mm)			LONGITUD (mm)				ÁREA	RELACIÓN LONGITUD / DIÁMETRO	FACTOR DE CORRECCIÓN	DEFECTOS EN EL ESPÉCIMEN	PESO	DENSIDAD	CARGA MÁXIMA	RESISTENCIA ESPERADA POR EL CLIENTE	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			PATRÓN DE FRACTURA
			(DÍAS)		Diámetro 1	Diámetro 2	Promedio	Longitud 1	Longitud 2	Longitud 3	Promedio	(cm²)				(kg)	(kg/m³)	(kN)	(MPa)	(MPa)	(kg/cm²)	(PSI)	
1	22/07/2023	29/07/2023	7	DINTEL LÓN GALAN	152,51	151,85	152,21	301	302	303	302	18189	2,0	1,00	NO PRESENTA	12475	2270	230,26	20,7	12,9	132	1877	4
1.1	22/07/2023	30/08/2023	14		152,38	149,98	150,91	302	303	303	302	17881	2,0	1,00	NO PRESENTA	12405	2260	280,84	20,7	15,0	153	2326	4
1.2	22/07/2023	19/08/2023	28		153,02	151,38	152,20	302	302	303	302	18218	2,0	1,00	NO PRESENTA	12516	2270	297,89	20,7	21,1	223	3166	4
1.3	22/07/2023	19/09/2023	59		151,26	152,41	151,84	302	301	301	302	18109	2,0	1,00	NO PRESENTA	12389	2260	383,63	20,7	21,6	220	3152	4
2	24/07/2023	31/07/2023	7	DINTEL LÓN GALAN	152,28	152,47	152,41	300	301	301	301	18244	2,0	1,00	NO PRESENTA	12293	2240	237,44	20,7	11,8	119	1643	4
2.1	24/07/2023	7/08/2023	14		151,90	151,40	151,74	301	300	301	301	18094	2,0	1,00	NO PRESENTA	12248	2270	284,09	20,7	15,8	159	2241	4
2.2	24/07/2023	21/08/2023	28		150,72	151,20	151,03	301	301	301	301	17914	2,0	1,00	NO PRESENTA	12018	2268	372,58	20,7	20,7	211	2924	4
2.3	24/07/2023	18/09/2023	56		150,78	151,10	150,93	300	304		302	17934	2,0	1,00	NO PRESENTA	12209	2280	395,03	20,7	21,7	221	3140	4



Tipo 1
Cones essentially vertical fractures on both bases




Tipo 2
Cones like Tipo 1 bonded on a base but one or more vertical splitting cracks



Tipo 3
Agreeable vertical columnar fracture



Tipo 4
Fracture diagonal or girder



Tipo 5
Fracture on the sample (usually on cylinders without cover)



Tipo 6
Similar to Tipo 5, but the plane contains cracks on the specific test

OBSERVACIONES

- ESTE ENSAYO FUE REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO.
- INFORMACIÓN DEL CONCRETO: EL CLIENTE NO SUMINISTRÓ ESTA INFORMACIÓN.
- LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
- LOS DATOS DE FECHA DE TOMA, INFORMACIÓN DEL CONCRETO, ELEMENTO Y RESISTENCIA ESPERADA CORRESPONDEN A INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE. CUALQUIER OTRO DATO SUMINISTRADO POR ESTE SE INCLUIRÁ Y SE IDENTIFICARÁ EN EL INFORME CON EL CARACTER (*). HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S. NO SE RESPONSABILIZA POR LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE INCLUIDA EN ESTE INFORME Y QUE PUEDA AFECTAR LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.

REVISÓ		APROBÓ	
NOMBRE	WILLIAM EDUARDO CORTES	NOMBRE	CRISTINA LILIANA CASTAÑEDA CORTES
CARGO	COORDINADOR DE LABORATORIO	CARGO	GERENTE

Queda totalmente prohibida la reproducción parcial de este informe sin la previa autorización de HIDROSUELOS DE COLOMBIA SAS.
Este documento es válido cuando muestra firma de quien lo revisó y la aprobó.

FIN DEL INFORME

HSC	FORMATO DE GESTIÓN DE LABORATORIO	CÓDIGO	FT-GLAB4
	INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV E - 410 - 13	FECHA	30/06/2023
		VERSIÓN	5
		Página 1 de 1	

LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S

CENTRO INDUSTRIAL Y LOGISTICO SAN JORGE KM 7 – 400 M ANILLO VIAL PALENQUE, DIAGONAL FLORIDABLANCA Nº 20-31, BODEGA 10 - PISO 1, GIRON, SANTANDER, COLOMBIA.

FECHA DE INFORME	Nº DE INFORME	FECHA DE INGRESO DE LA MUESTRA	Nº DE ORDEN DE SERVICIO	FRENTE DE OBRA	INFORMACIÓN DEL CLIENTE
30/06/2023	1	13/06/2023	28133	CALICE	CONSORCIO CHUQUE constructorachuque@gmail.com

Nº DEL CILINDRO	FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYO	EDAD (DÍAS)	ELEMENTO	DIÁMETRO (mm)			LONGITUD (mm)				ÁREA (mm²)	RELACIÓN LONGITUD / DIÁMETRO	FACTOR DE CORRECCIÓN	DEFECTOS EN EL ESPÉCIMEN	PESO (g)	DENSIDAD (kg/m³)	CARGA MÁXIMA (kN)	RESISTENCIA ESPERADA POR EL CLIENTE (MPa)	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			PATRÓN DE FRACTURA
					Diámetro 1	Diámetro 2	Promedio	longitud 1	longitud 2	longitud 3	Promedio									(MPa)	(kg/cm²)	(PSI)	
1	9/07/2023	16/07/2023	7	DISTRIBUCION PTA CALAN	150,68	151,09	150,79	301	300	303	301	17856	2,0	1,00	NO PRESENTA	12760	2372	368,39	28,7	21,2	216	3076	4
1,1	9/07/2023	23/07/2023	14		150,07	149,89	150,0	299	300	301	300	17694	2,0	1,00	NO PRESENTA	12700	2409	491,90	28,7	25,8	263	3744	4
1,2	9/07/2023	6/08/2023	28		150,08	150,34	150,2	301	300	301	301	17963	2,0	1,00	NO PRESENTA	12868	2342	537,09	28,7	29,0	307	4375	4
1,3	9/07/2023	6/08/2023	28		150,29	151,70	151,00	303	300	302	302	17910	2,0	1,00	NO PRESENTA	12760	2358	618,90	28,7	33,9	358	5095	3



Tipo 1
Casos anteriormente bien formados en ambos extremos

Tipo 2
Casos bien formados en un extremo pero no en el otro. Grietas verticales que llegan a los extremos

Tipo 3
Agrietamiento vertical columnar (por dentro de los extremos). No hay casos bien formados

Tipo 4
Fractura diagonal sin grietas a través de los extremos (se debe golpear con martillo para distinguirla del tipo 1)

Tipo 5
Fracturas en las esquinas (usualmente en cilindros sin refrentado)

Tipo 6
Similar al tipo 5, pero las grietas también se ubican en la superficie del cilindro

OBSERVACIONES

- ESTE ENSAYO FUE REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO.
- INFORMACIÓN DEL CONCRETO: EL CLIENTE NO SUMINISTRÓ ESTA INFORMACIÓN.
- LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME CORRESPONDEN ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
- LOS DATOS DE FECHA DE TOMA, INFORMACIÓN DEL CONCRETO, ELEMENTO Y RESISTENCIA ESPERADA CORRESPONDEN A INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE. CUALQUIER OTRO DATO SUMINISTRADO POR ESTE SE INCLUIRÁ Y SE IDENTIFICARÁ EN EL INFORME CON EL CARÁCTER (*). HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S. NO SE RESPONSABILIZA POR LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE INCLUIDA EN ESTE INFORME Y QUE PUEDA AFECTAR LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.

REVISÓ		APROBÓ	
NOMBRE	WILLIAM EDUARDO CORTES	NOMBRE	MARTHA LILIANA ESPINOSA DIAZ
CARGO	COORDINADOR DE LABORATORIO	CARGO	GERENTE

Queda estrictamente prohibido la reproducción parcial de este informe sin la previa autorización de HIDROSUELOS DE COLOMBIA SAS
Este documento es valido cuando tiene la firma de quien lo revisó y lo aprobó.

FIN DEL INFORME


ANEXO No. 9: CONTROL DE PERFORACIÓN.

CONTROL DE PERFORACION EN CAMPO

CODIGO	OB-F-38
FECHA	13/09/2022
VERSION	1
Página 1 de 1	

CONTRATO	210-15410-06	PERFORADOR	LUIS ALBERTO CANO
LOCALIZACION OBRA	CENTRO ABASTOS		







ITEM	FECHA PERFORACION	ANCLAJE Nº	EQUIPO #	ELEMENTO	PERFORACION Ø	TIPO DE PERFORACION				FECHA INSTALACION ANCLAJE	Ø TORON	CANTIDAD TORONES	LONGITUD BULBO (ML)	LONGITUD LIBRE (ML)	LONGITUD ANCLAJE (ML)	ENCAMISADO LONGITUD (ML)
						PASIVO	ACTIVO	MIXTO	OREN							
21	2/09/2025	54	Und #17	ULTIMA SECCIÓN DE GAVIÓN FRENTE CENTRO ABASTOS	3 1/2"		ACTIVO			2/09/2025	1/2"	3,00	8,00	12,00	20,00	20,09
22	4/09/2025	55	Und #17	ULTIMA SECCIÓN DE GAVIÓN FRENTE CENTRO ABASTOS	3 1/2"		ACTIVO			4/09/2025	1/2"	3,00	8,00	12,00	20,00	20,09
23	6/09/2025	56	Und #17	ULTIMA SECCIÓN DE GAVIÓN FRENTE CENTRO ABASTOS	3 1/2"		ACTIVO			6/09/2025	1/2"	3,00	8,00	12,00	20,00	20,09
24	8/09/2025	57	Und #17	ULTIMA SECCIÓN DE GAVIÓN FRENTE CENTRO ABASTOS	3 1/2"		ACTIVO			8/09/2025	1/2"	3,00	8,00	12,00	20,00	20,09
25	10/09/2025	58	Und #17	ULTIMA SECCIÓN DE GAVIÓN FRENTE CENTRO ABASTOS	3 1/2"		ACTIVO			10/09/2025	1/2"	3,00	8,00	12,00	20,00	20,09
26	12/09/2025	59	Und #17	ULTIMA SECCIÓN DE GAVIÓN FRENTE CENTRO ABASTOS	3 1/2"		ACTIVO			12/09/2025	1/2"	3,00	8,00	12,00	20,00	20,09
27	15/09/2025	60	Und #17	ULTIMA SECCIÓN DE GAVIÓN FRENTE CENTRO ABASTOS	3 1/2"		ACTIVO			15/09/2025	1/2"	3,00	8,00	12,00	20,00	20,09
28	17/09/2025	61	Und #17	ULTIMA SECCIÓN DE GAVIÓN FRENTE CENTRO ABASTOS	3 1/2"		ACTIVO			17/09/2025	1/2"	3,00	8,00	12,00	20,00	20,09
29	19/09/2025	62	Und #17	ULTIMA SECCIÓN DE GAVIÓN FRENTE CENTRO ABASTOS	3 1/2"		ACTIVO			19/09/2025	1/2"	3,00	8,00	12,00	20,00	20,09
30	22/09/2025	63	Und #17	ULTIMA SECCIÓN DE GAVIÓN FRENTE CENTRO ABASTOS	3 1/2"		ACTIVO			22/09/2025	1/2"	3,00	8,00	12,00	20,00	20,09

OBSERVACIONES GENERALES :

	INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA
FIRMA		
NOMBRE	DIEGO ANTONIO LÓPEZ SANTAMARIA	LEIDOING VERA
FECHA	30/09/2025	30/09/2025

	CONTROL INYECCION DE ANCLAJES	CODIGO	OB-F-39
		FECHA	13/09/2022
		VERSIÓN	1
		Página 1 de 1	

CONTRATO:	210-15410-06	DIAMETRO PERFORACION	3 1/2"
LOCALIZACION OBRA:	CENTRO ABASTOS	MANOMETRO:	DE GLICERINA DE 0-1000

ELEMENTO	ANCLAJE N°	LLENADO			Ø REFUERZO	LONGITUD (MTS)	INYECCION				OBSERVACIONES
		CEMENTO MARCA	RELACION A/C	FECHA			SI	NO	FECHA	PRESIÓN (PSI)	
ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	54	CEMEX	0,45	4/09/2025	1/2"	20	X		8/09/2025	200	
ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	55	CEMEX	0,45	4/09/2025	1/2"	20	X		8/09/2025	200	
ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	56	CEMEX	0,45	8/09/2025	1/2"	20	X		12/09/2025	200	
ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	57	CEMEX	0,45	8/09/2025	1/2"	20	X		12/09/2025	200	
ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	58	CEMEX	0,45	12/09/2025	1/2"	20	X		19/09/2025	200	
ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	59	CEMEX	0,45	12/09/2025	1/2"	20	X		19/09/2025	200	
ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	60	CEMEX	0,45	19/09/2025	1/2"	20	X		22/09/2025	200	
ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	61	CEMEX	0,45	19/09/2025	1/2"	20	X		22/09/2025	200	
ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	62	CEMEX	0,45	19/09/2025	1/2"	20	X		22/09/2025	200	
ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	63	CEMEX	0,45	22/09/2025	1/2"	20	X		25/09/2025	200	

OBSERVACIONES GENERALES :

	INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA
FIRMA		
NOMBRE	DIEGO ANTONIO LÓPEZ SANTAMARIA	LEIDDING VERA
FECHA	30/09/2025	30/09/2025
