Interventoria y Proyectos de Ingenieria Electrica
Nit. 900764490-9

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROCESO: Implementación de Politicas, Programas y Proyectos

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

FECHA DE INFORME:	13/10/2025	INFORME N°:	5	PERÍODO DEL	6/10/2025
		ETAPA:	DIAGNOSTICOS Y CONSULTORIA	AL	12/10/2025
INTERVENTORIA	INTERVENTORIA Y PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA "INTPROINGE" SAS	CONTRATO DE OBRA	024 DE 2025		
DEPARTAMENTO:	BOYACA	MUNICIPIO:	TUNJA		

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE APANTALLAMIENTO DE LAS SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	DEPARTAMENTO DE BOYACA, MUNICIPIOS DE TUNJA, DUITAMA, SANTA ROSA DE VITERBO, CHIQUINQUIRA, GARAGOA, RAMIRIQUI	No. Beneficiarios	6 SEDES JUDICIALES

PROYECTO DE INTERVENTORÍA (PI)				CONTRATO DE OBRA			
N° Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	Nº 044 DE 2025 DEL 20 DE AGOSTO DEL 2025			N° Y AÑO DE CONTRATO:	024 DE 2025 DEL 5 DE JUNIO DEL 2025		
CONTRATANTE:	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL TUNJA - BOYACA			CONTRATANTE:	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL TUNJA - BOYACA		
INTERVENTOR:	NTERVENTORIA Y PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA "INTPROINGE" SAS			CONTRATISTA:	G&L INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A.S.		
PLAZO INTERVENTORIA:	2 MESES			PLAZO CONSTRUCCIÓN:	2 MESES		
PLAZO TOTAL INICIAL:	2 MESES			PLAZO TOTAL INICIAL:	2 MESES		
FECHA DE INICIO:	8/09/2025			FECHA DE INICIO:	8/09/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN:	7/11/2025			FECHA DE TERMINACIÓN:	7/11/2025		
PLAZO ACTUALIZADO:	2	MESES		PLAZO ACTUALIZADO:	2 MESES		
PLAZO TRANSCURRIDO:	1,13	EQUIVALE AL	56,67%	PLAZO TRANSCURRIDO:	1,13	EQUIVALE AL	56,7%
VALOR INICIAL :	$ 19.125.080,00			VALOR INICIAL :	$ 138.895.013,62		
*VALOR ADICIÓN N° :	$ -			*VALOR ADICIÓN N° :			
VALOR ACTUALIZADO:	$ 19.125.080,00			VALOR ACTUALIZADO:	$ 138.895.013,62		
PORCENTAJE DE EJECUCION	19,91%			PORCENTAJE DE EJECUCION	19,91%		
VALOR EJECUTADO	$ 3.807.803,43			VALOR EJECUTADO:	$ 27.653.997,21		
PORCENTAJE DE PAGO	0%			PORCENTAJE DE PAGO	0,00%		
VALOR PAGADO:	$ -			VALOR PAGADO:			
VALOR POR EJECUTAR:	$ 15.317.276,57			VALOR POR EJECUTAR:	$ 111.241.016,41		
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	SILVIA GAMBOA			SUPERVISOR CONTRATO DE OBRA:	SILVIA GAMBOA		

2. PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	Planeado	Ejecutado	Avance
2.1 AVANCE FÍSICO (%)	35,3%	19,9%	0,56%
2.2 AVANCE - EJECUCIÓN PRESUPUESTO ($)	47.943.761	27.056.697	
DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO (en $)	- 20.887.064		

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

3.1. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS (ECONÓMICOS, PERSONAL, EQUIPOS, ETC) AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL
G&L INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A.S. cuenta con el personal administrativo, personal tecnico en campo y la logistica para el desarrollo de las actividades

3.2. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO
Aun no se presenta Actas parciales en la ejecución del contrato

4.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS
Documentos
Diagnostico y Planos en la Sede Judicial de Tunja

4.5. MANEJO AMBIENTAL
Aun No se ha iniciado Obra, por tal razon N/A

4.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL
Aun No se ha iniciado Obra, por tal razon N/A

4.7 SALUD OCUPACIONAL
El personal de obra cuenta con sus respectiva seguridad social y sus epp

4.8 ASPECTOS SOCIALES
no hay PQR por parte de la comunidad

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA


ID ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ESTADO	NOMBRE Y CARGO RESPONSABLE	FECHA INICIO PROGRAMADA	FECHA FIN PROGRAMADA


5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Se realizaron los respectivos diagnostico, se visito nuevamente la sede de Tunja para realizar los planos del SIPRA en la sede de Tunja.

7. ANEXOS Y FOTOGRAFIAS

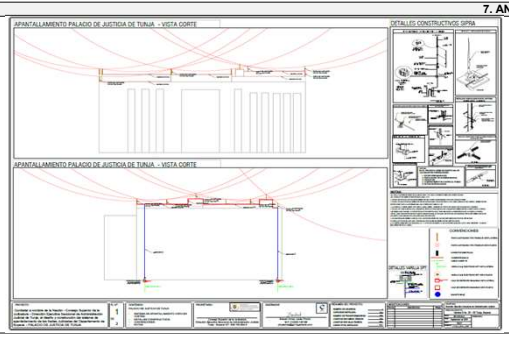

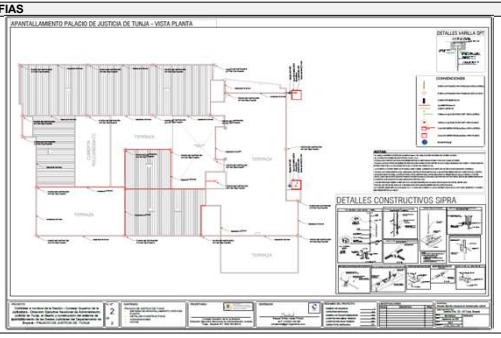

FIRMA:_____
INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA)
JAIDER DEL CARMEN PINTO OSPINA
