Interventoria y Proyectos de Ingenieria Electrica Nit. 900764490-9	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

FECHA DE INFORME:	20/10/2025	INFORME Nº:	6	PERÍODO DEL	13/10/2025
		ETAPA:	OBRA ELECTRICA	AL	19/10/2025
INTERVENTORIA	INTERVENTORIA Y PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA "INTPROINGE" SAS	CONTRATO DE OBRA	024 DE 2025		
DEPARTAMENTO:	BOYACA	MUNICIPIO:	TUNJA		

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE APANTALLAMIENTO DE LAS SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	DEPARTAMENTO DE BOYACA, MUNICIPIOS DE TUNJA, DUITAMA, SANTA ROSA DE VITERBO, CHIQUINQUIRA, GARAGOA, RAMIRIQUI	No. Beneficiarios	6 SEDES JUDICIALES

PROYECTO DE INTERVENTORÍA (PI)		CONTRATO DE OBRA	
N° Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	Nº 044 DE 2025 DEL 20 DE AGOSTO DEL 2025	N° Y AÑO DE CONTRATO:	024 DE 2025 DEL 5 DE JUNIO DEL 2025
CONTRATANTE:	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL TUNJA - BOYACA	CONTRATANTE:	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL TUNJA - BOYACA
INTERVENTOR:	NTERVENTORIA Y PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA "INTPROINGE" SAS	CONTRATISTA:	G&L INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A.S.
PLAZO INTERVENTORIA:	2 MESES	PLAZO CONSTRUCCIÓN:	2 MESES
PLAZO TOTAL INICIAL:	2 MESES	PLAZO TOTAL INICIAL:	2 MESES
FECHA DE INICIO:	8/09/2025	FECHA DE INICIO:	8/09/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	7/11/2025	FECHA DE TERMINACIÓN:	7/11/2025
PLAZO ACTUALIZADO:	2 MESES	PLAZO ACTUALIZADO:	2 MESES
PLAZO TRANSCURRIDO:	1,37 EQUIVALE AL 68,33%	PLAZO TRANSCURRIDO:	1,37 EQUIVALE AL 68,3%
VALOR INICIAL :	$ 19.125.080,00	VALOR INICIAL :	$ 138.895.013,62
"VALOR ADICIÓN N° :	$ -	"VALOR ADICIÓN N° :	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 19.125.080,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 138.895.013,62
PORCENTAJE DE EJECUCION	35,28%	PORCENTAJE DE EJECUCION	35,28%
VALOR EJECUTADO	$ 6.747.328,22	VALOR EJECUTADO:	$ 49.002.160,81
PORCENTAJE DE PAGO	0%	PORCENTAJE DE PAGO	0,00%
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	
VALOR POR EJECUTAR:	$ 12.377.751,78	VALOR POR EJECUTAR:	$ 89.892.852,81
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	SILVIA GAMBOA	SUPERVISOR CONTRATO DE OBRA:	SILVIA GAMBOA

2. PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	Planeado	Ejecutado	Avance
2.1 AVANCE FÍSICO (%)	62,9%	35,3%	0,56%
2.2 AVANCE - EJECUCIÓN PRESUPUESTO ($)	85.464.374	47.943.761	
DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO (en $)	- 37.520.613		

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

3.1. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS (ECONÓMICOS, PERSONAL, EQUIPOS, ETC) AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL
G&L INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A.S. cuenta con el personal administrativo, personal tecnico en campo y la logistica para el desarrollo de las actividades

3.2. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO
Aun no se presenta Actas parciales en la ejecución del contrato

4.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS
Documentos
Analisis de Trabajo Seguro, permisos de Trabajo en Altura, Check list de la revisión de arnes y EPP

4.5. MANEJO AMBIENTAL
Todos los residos que quedan en la obra son retirados y se llevan a una disposición final, residos como cartones, papel, cintas.

4.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL
Se tiene en sitio botiquin, camillas y se cuenta con todos los EPP para la labor, Cuerdas de Vida, Arnes, escaleras para la labor

4.7 SALUD OCUPACIONAL
El personal de obra cuenta con su respectiva seguridad social y sus epp

4.8 ASPECTOS SOCIALES
no hay PQR por parte de la comunidad

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ID ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ESTADO	NOMBRE Y CARGO RESPONSABLE	FECHA INICIO PROGRAMADA	FECHA FIN PROGRAMADA

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR


Se realizó la ejecución de la Obra que comprende la Instalación del Sistema de Apantallimiento, que incluye sus bajantes y los SPT del mismo sistema, de acuerdo a los diseños realizados por el Contratista de Obra Ingeniería y Desarrollo SAS.

7. ANEXOS Y FOTOGRAFIAS







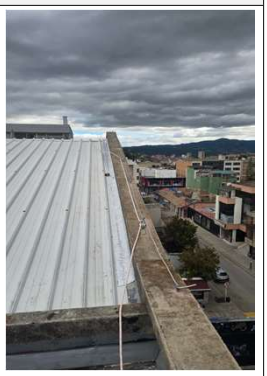

FIRMA:_____
INTERVENTOR (RESIDENTE DE INTERVENTORÍA)
VICTOR MANUEL SALAZAR ROJAS
