
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. **CIHCM411** de **2023**

INFORME DE INTERVENTORIA No. 5 (MES AGOSTO 2024)

MENSUAL [X] FINAL [ ]

Objeto Contrato:_ INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA VEREDA LAS AGUILAS Y VEREDA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - DEPARTAMENTO DEL HUILA.

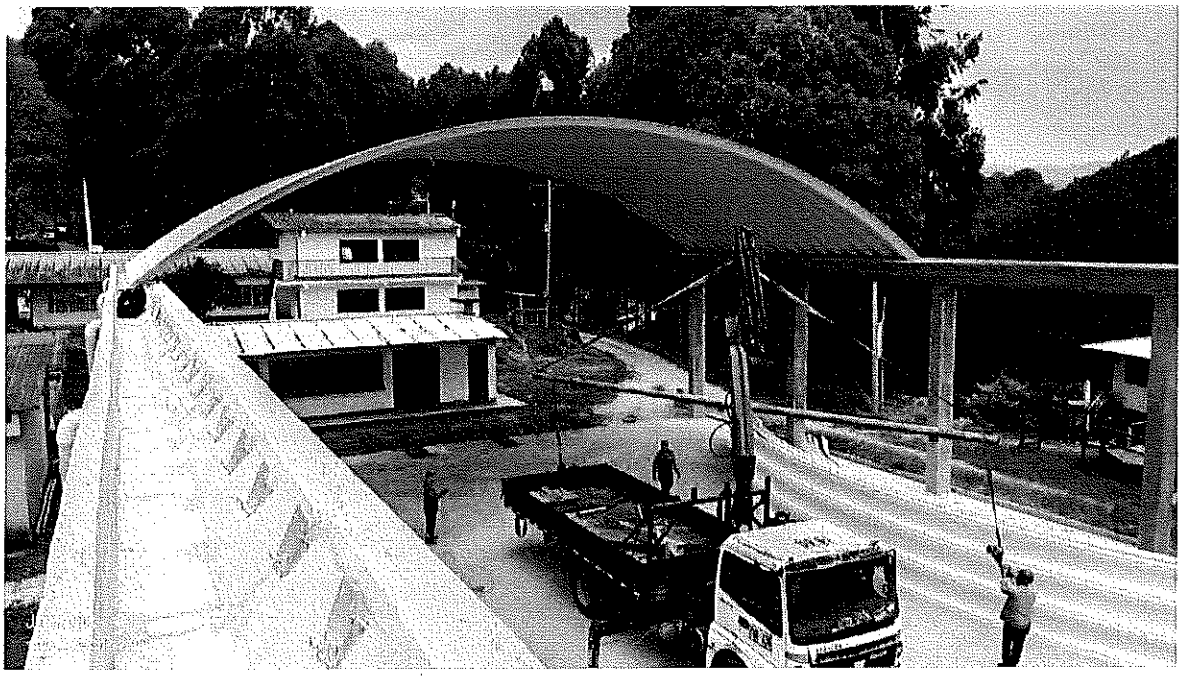

MUNICIPIO: LA ARGENTINA.

DEPARTAMENTO: HUILA

CONTRATO DE (INTERVENTORIA) No. CIHCM411 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y LA SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

APOYO A LA SUPERVISIÓN	ING. Daniel Felipe Molina Tafur.	ENTIDAD	INDERHUILA

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	CIHCM411 DE 2023		
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA VEREDA LAS AGUI LAS Y VEREDA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO DEL INFORME	Entre 01 de agosto al 08 de agosto de 2024.
CONTRATISTA	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	NIT:	891.101.100-5
REPRESENTANTE LEGAL:	JAVIER BARRERO MOSSOS	C.C:	7685694

FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	01 / NOVIEMBRE / 2023
FECHA DE INICIO (D/M/A):	09 / NOVIEMBRE / 2023
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TODO CASO SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.
PLAZO ADICIONAL (No.1) (D/M/A):	Prorrogar por tres (03) meses y diez (10) días al plazo contractual
PLAZO TOTAL:	SEIS (6) MESES Y 10 DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TODO CASO SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.
VALOR INICIAL:	OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTI Y UN PESOS ($85.798.121) M/CTE
VALOR ADICIONAL (SI APLICA):	N/A.
VALOR TOTAL:	OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTI Y UN PESOS ($85.798.121) M/CTE


2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No.	CLPIH393 DE 2023.		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LAS AGUILAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA .		
CONTRATISTA	CONSORCIO TABOR 91.	NIT:	901.766.534-7
REPRESENTANTE LEGAL:	CLAUDIO CESAR MEJIA GUTIERREZ	C.C:	12.138.187

FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	26 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIO (D/M/A):	09 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL	03 MESES
PLAZO ADICIONAL (No.1) (D/M/A):	01 MES – 08 DE JULIO DE 2024
PLAZO TOTAL:	04 MESES.
VALOR INICIAL:	QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTI UN MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 535.121. 400.oo).
VALOR ADICIONAL (SI APLICA):	N/A.

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO


El proyecto se ubica en la vereda Las Águilas municipio de La Argentina Huila. A 34.7km de La Plata -Huila.

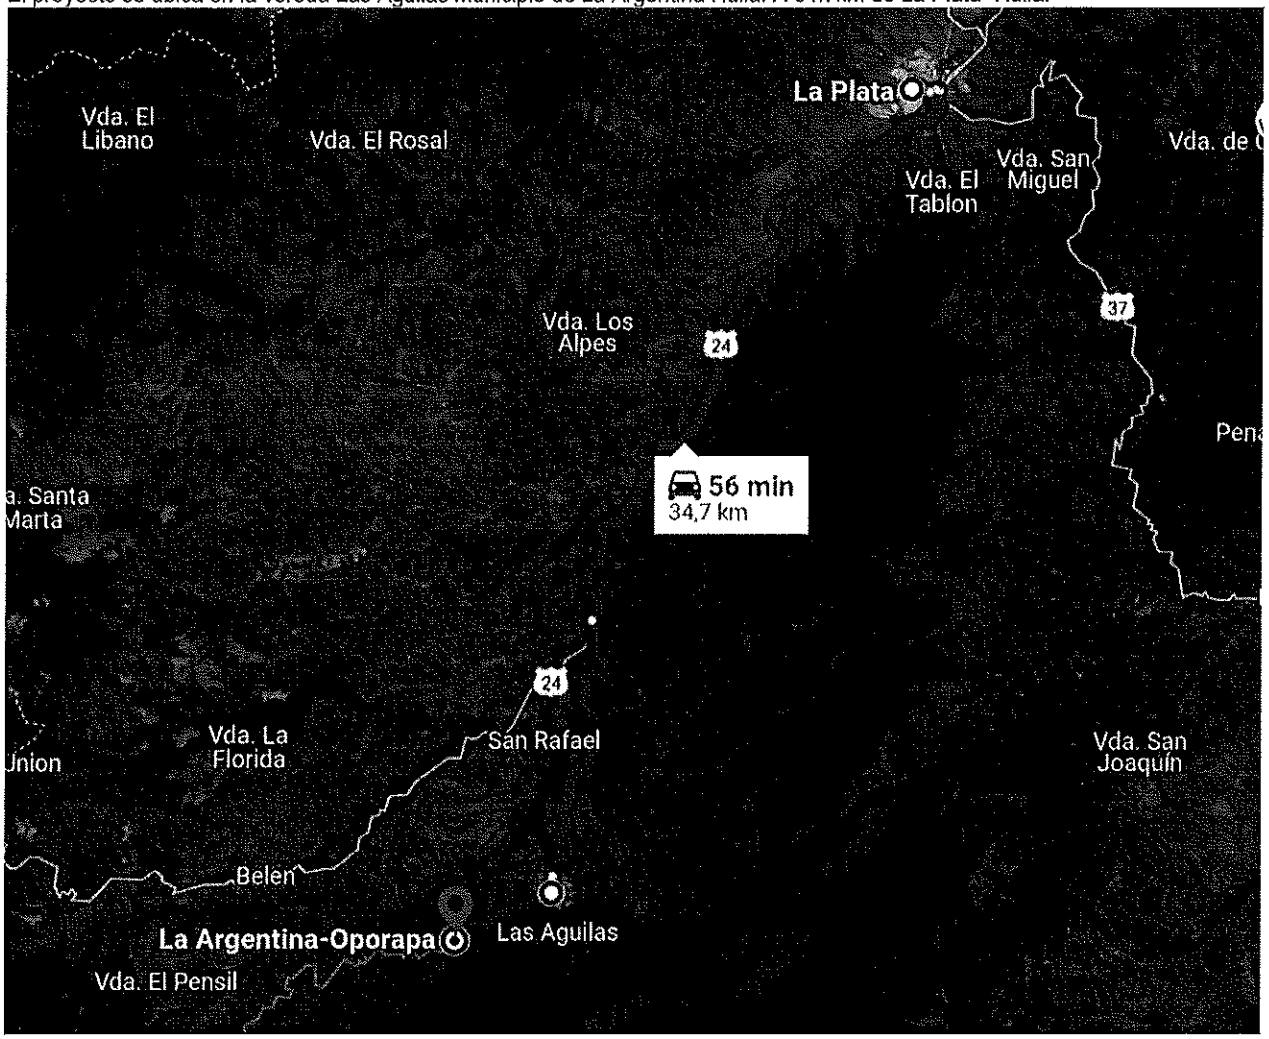

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto surge de una necesidad visible en el departamento del Huila y es el de mejorar los espacios de recreación de las comunidades, que permitan promover la práctica del deporte entre los jóvenes y adultos ya que esta, es una de las herramientas más eficaces para mejorar las problemáticas sociales que vivimos en nuestro entorno. Necesidad que fue plasmada en el plan de desarrollo Huila CRECE 2020-2023 en el programa 4301 "Mejorando la creación y el rendimiento deportivo de los atletas Huilenses, a través de la recuperación, mejoramiento y construcción de escenarios deportivos." Producto canchas construidas y dotadas.

La cubierta será con sistema auto portante, sostenida con columnas vigas aéreas en concreto reforzado de 3000 PSI y una cimentación tipo zapata, vigas de cimentación y viga canal, placa de contrapiso en concreto reforzado de 3000 PSI Todas las obras deberán atender lo establecido en la NORMA SISMORESITENTE de 2010 - NSR-10.

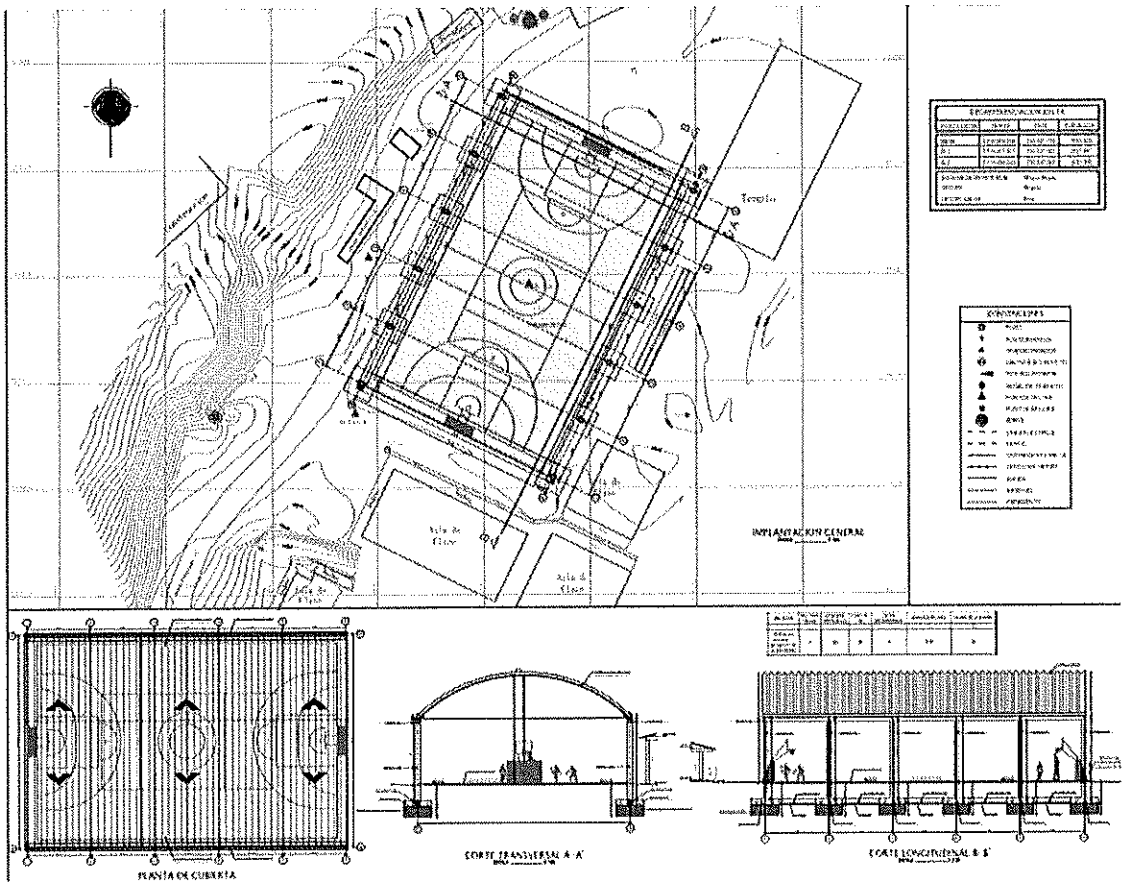

5. DESCRIPCION DEL AVANCE MENSUAL DE OBRA

En el presente periodo del mes de agosto 2024, continúan actividades de obra. Se terminan cajillas de aguas lluvias y se instala la totalidad de la cubierta autoportante de calibre 22. Se suspende de nuevo el contrato por intensas lluvias.

6. HISTORIA CRONOLOGICA DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION (dd/mm/aaaa)
Iniciación	09/11/2023			09/02/2024
Suspensión No. 1	28/12/2023	49		
Reiniciación No. 1	30/05/2024		154	09/08/2023
Suspensión No. 2	08/08/2024	70		
TERMINACIÓN Cto.				
TOTAL DIAS		119	154	

7. ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de Inicio, acta de Suspensión, acta de Reinicio, actas de Modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No.	Fecha
ACTA DE INICIO DE INTERVENTORIA	01	09 DE NOVIEMBRE DE 2023
ACTA DE INICIO DE OBRA	01	09 DE NOVIEMBRE DE 2023
ACTA DE JUSTIFICACION SUSPENSION	01	28 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE SUSPENSION	01	28 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE REINICIO	01	30 DE MAYO DE 2024
ACTA ACLARATORIA DE INCIO	01	05 DE JULIO DE 2024
ACTA JUSTIFICACION PARA PRORROGA	01	08 DE JULIO DE 2024
ACTA JUSTIFICACION PARA SUSPENSION 2	01	08 DE AGOSTO DE 2024
ACTA SUSPENSION 2	01	08 DE AGOSTO DE 2024

8. ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PARA EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA DURANTE EL PERIODO


(Cumplimiento Obligaciones del contrato).

a). Obligaciones de Carácter General.	*Interventoria verifico y superviso actividades ejecutadas en el presente periodo.
b). Actividades Administrativas.	*Se realizo y se firmó acta suspensión 2, justificación para suspensión 2. CUBIERTA - Suministro, fabricación e instalación de cubierta auto soportante a base de lámina de acero cal. 22, en paneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliéster estándar,

	fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.: Se hace la instalación de la cubierta de acuerdo a las especificaciones establecidas en los planos de referencia. La cantidad ejecutada en esta actividad no presentó variación respecto a las condiciones contractuales. *INSTALACIONES HIDROSANTARIAS* - Caja de inspección en concreto de F´c=2500 PSI, de sección 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts. según diseño.: Se ejecuta la totalidad del ítem, sin que se presenten variaciones en las condiciones contractuales.
c). Actividades Operativas.	***Se verifico y aprobó de acuerdo planos estructurales y arquitectónicos la calidad y cantidad de cubierta autoportante calibre 22.** ***Se verifico resistencias a la compresión de concretos fundidos y control de relación A/C en las cajillas aguas lluvias.**
d). Actividades Logísticos.	***Traslado personal residente interventoria.**
e). Obligaciones de Carácter Ambiental.	***Continua cumplimiento del contratista los permisos ambientales de la fuente de material a utilizar en obra como recebos y materiales pétreos para concreto. También permiso para la disposición de escombros.**
f). Actividades Financieras.	***Seguimiento a la inversión pago anticipo del 30% del 14 junio 2024.**
g). Actividades Jurídicos.	***Seguimiento pólizas de cumplimiento del contrato de obra de acuerdo acta de reinicio.**

9. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO

Durante los días de ejecución del mes de Agosto se presentaron lluvias de diferentes intensidades, que generaron algunas dificultades en la ejecución de las actividades del período, la cual llevo a suspender de nuevo las actividades.

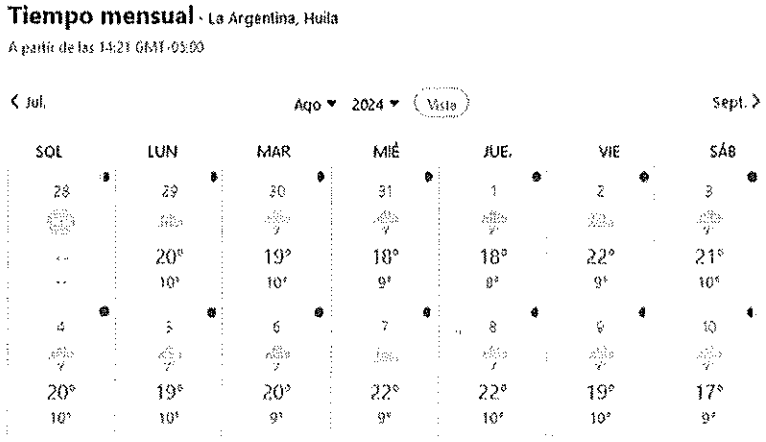

10. CONTROL DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Tipo Prueba de Laboratorio	Resistencia concreto	Relación volumétrica concreto
Diseños de mezcla para los concretos.	3.000 PSI	1:5
Diseños de mezcla para base.	*N.A.*	N.A.
Compresión simple al concreto.	3.000 PSI	N.A.
Ensayo de compactación de campo	*90%*	N.A.

NOTA: *Las obras de concreto ejecutadas se le realiza prueba a la compresión simple, Norma Articulo 630-07 ensayo E-410, cumpliendo con las resistencias exigidas.*

Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio realizados por la INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN (Zapata, Viga Cimentación, Columna, Viga canal, Placa, Anden, Muro concreto ciclópeo, Cuneta)	FECHA TOMA DE MUESTRA (dd/mm/aaaa)	FECHA ROTURA (dd/mm/aaaa)	EDAD DEL ENSAYO			RESISTENCIA REQUERIDA	RESISTENCIA FINAL OBTENIDA	CUMPLE/ NO CUMPLE
N/A	N/A	N/A	7	14	28	N/A	N/A	N/A
Concreto Ciclópeo	11/12/2023	18/12/2023	X			2500 psi	2266psi	si
	11/12/2023	10/01/2024			X	2500 psi	2549psi	si
ZAPATAS	17/06/2024	24/06/2024	X			3.000	2591,5	CUMPLE
VIGAS DE CIMENTACIÓN	17/06/2024	15/07/2024			X	3.000	3223,1	CUMPLE
COLUMNAS	09/07/2024	16/07/2024	X			3.000	4447,9	CUMPLE
		06/08/24			X	3.000	5094	
PLACA	28/06/2024	05/07/2024	X			3.000	2527,8	CUMPLE
		26/07/2024			X	3.000	3015,4	CUMPLE
VIGA CANAL	26/07/2024	02/08/2024	X			3.000	4775,7	CUMPLE

		23/08/2024			X	3.000	5086	CUMPLE

Control Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio realizados por el CONTRATISTA

DESCRIPCIÓN (Zapata, Viga Cimentación, Columna, Viga canal, Placa, Anden, Muro concreto ciclópeo, Cuneta)	FECHA TOMA DE MUESTRA (dd/mm/aaaa)	FECHA ROTURA (dd/mm/aaaa)	EDAD DEL ENSAYO			RESISTENCIA REQUERIDA	RESISTENCIA FINAL OBTENIDA	CUMPLE/ NO CUMPLE
			7	14	28			
ZAPATAS VIGAS DE CIMENTACIÓN	14/06/204	12/07/2024			X	3.000	3.106	CUMPLE
		12/07/2024			X	3.000	3.057	CUMPLE
ZAPATAS VIGAS DE CIMENTACIÓN	17/06/2024	24/06/2024	X			NA	2.672	
		15/07/2024			X	3.000	3.356	CUMPLE
COLUMNAS	21/06/2024	12/07/2024		21	28	NA	2.965	
				X				
		19/07/2024			X	3.000	3.057	CUMPLE
PLACA	28/06/2024	12/07/2024		X		NA	2.721	
		26/07/2024			X	3.000	3.207	CUMPLE
CUNETA	04/07/2024	18/07/2024		X		NA	2.627	
		01/08/2024			X			
COLUMNAS	09/07/2024	23/07/2024		X		NA	2.686	
		06/08/24			X			

COLUMNAS	16/07/2024	06/08/2024						
		13/08/2024						
VIGAS CANAL Y CUNETA	26/07/2024	16/08/2024						
		23/08/2024						

11. CONTROL DE ANTICIPO

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha (dd/mm/aaaa)	Valor Acta	Amortización	Valor pagado
Valor Anticipo (30%)	14/06/2024	N/A	N/A	$ 133.780.350
Acta Parcial No. 1	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta Parcial No. 2	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta Parcial No. 3	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta Recibo Final No.4	N/A	N/A	N/A	N/A
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$ 535.121.400,00	$0,00	$ 535.121.400,00		

12. COMITES DE OBRA

Fecha de Realización (dd/mm/aaaa)	Lugar	Resultado del Comité (Describir)
5/08/2024	**OFICINA INTERVENTORIA.**	Se evalúa el avance de obra y conformación de acta de suspensión 2.

13. RELACIÓN DE DOCUMENTOS YA ENTREGADOS

TIPO DOCUMENTO	FECHA DE ENTREGA A LA ENTIDAD (dd/mm/aaaa)	No. RADICADO (Emitido por INDERHUILA)	FORMATO (Físico/Digital)
Pólizas de cumplimiento (Endoso 5 (No. 61-44-101051738))	**19 JULIO 2024**	**N/A**	**Físico.**
Pólizas R.C (Endoso 5 (No. 61-40-101018843))	**19 JULIO 2024**	**N/A**	**Físico**

Copias de Bitácora de Obra (periodo del (01/agosto/2024) al (08/agosto/2024)	N/A	N/A	N/A
Informe HSEQ (periodo del (01/agosto/2024) al (08/agosto/2024)	N/A	N/A	N/A
Actas de socialización e inicio de obra	01 diciembre 2023	N/A	N/A
Actas de conformación de veeduría ciudadana	01 diciembre 2023	N/A	N/A
Acta de vecindad	N/A	N/A	N/A
Actas de comités (periodo del (01/agosto/2024) al (08/agosto/2024)	05/08/2024	N/A	Digital.
Rregistros de ensayos de laboratorio (periodo del (01/agosto/2024) al (08/agosto/2024)	N/A	N/A	N/A
Registros de ensayos de calidad (periodo del (01/agosto/2024) al (08/agosto/2024)	N/A	N/A	N/A
Copia bitácora de obra (periodo del ((01/agosto/2024) al (08/agosto/2024)	N/A	N/A	N/A
Planillas de aportes a seguridad social integral (EPS-ARP-AFP) (periodo del (01/agosto/2024) al (08/agosto/2024)		N/A	Digital

Correspondencia (periodo del (01/agosto/2024) al (08/agosto/2024)	08/08/2024	28/12/2023	Correo electrónico
Registro fotográfico de valla	26/11/2023	2611/2023	Digital.
Registro fotográfico (Dotación, PAPSO, PGIO) (01/agosto/2024) al (08/agosto/2024)	N/A	N/A	N/A

14. RELACION DE PERSONAL (Profesional Interventoría)

NOMBRE YAPELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	MODALIDAD DE CONTRATACION
Cesar Augusto González Rodriguez	19055598	Director interventoria	Indefinido.
Dalmiro Gamez Barrero	12120545	Residente Interventoria	Obra y labor.

15. RELACIÓN DE PAGOS

TIPO DE PAGO (Anticipo / Acta No.)	No. COMPROBANTE	FECHA
1	N/A	14/junio/2024
N/A	N/A	N/A

16. RELACIÓN DE PAGOS DURANTE EL PERIODO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

(FALTA INGRESAR VALORES)

PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALES	N° PLANILLA
Cesar Augusto González Rodríguez	$ 208.000	$ 162.500	$ 90.500	$	$	31104348
Dalmiro Gamez Barrero	$	$ 52.000	$ 90.500	$ 52.000	EXONERADO	30819873

17. RELACIÓN DE POLIZAS DE GARANTIA

POLIZA LEGALIZACION DEL CONTRATO Y ACTA DE INICIO – ENDOZO 1 Y ENDOZO 2

Póliza legalización del CONTRATO:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Perfeccionamiento contrato)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101051738	0	07 NOVIEMBRE 2023	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	01/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/11/2023	01/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	01/02/2024	01/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Perfeccionamiento contrato)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-101018843	0	07 NOVIEMBRE 2023	01/11/2023	01/02/2024

Póliza actualizada x ACTA DE INICIO:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101051738	1 y 2	01/01/ 2024	Cumplimiento del contrato	09/11/2023	09/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09/11/2023	09/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	09/02/2024	09/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-101018843	1 y 2	01/01/2024	09/11/2023	09/02/2024

Poliza actualizada x ACTA DE SUSPENSION No. 1

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101051738	3	01/01/2024	Cumplimiento del contrato	09/11/2023	09/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09/11/2023	09/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	09/02/2024	09/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-101018843	3	01/01/2024	09/11/2023	09/02/2024

Póliza actualizada x ACTA DE REINICIO No. 1

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101051738	4	05/07/2024	Cumplimiento del contrato	09/11/2023	10/01/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09/11/2023	13/07/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	09/02/2024	09/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-101018843	4	05/07/204	09/11/2023	12/07/2024

Póliza actualizada x PRORROGA No. 1 (OTRO SÍ No. 2)

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101051738	5	19/07/2024	Cumplimiento del contrato	09/11/2023	20/04/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09/11/2023	23/10/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	09/02/2024	09/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-101018843	5	19/07/2024	09/11/2023	22/10/2024


POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-101018843	7	19/07/2024	09/11/2023	22/10/2024


18. PLANO y/o ESQUEMAS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

(Describir el contenido del plano)

Suministro, fabricación e instalación de cubierta auto soportante a base de lámina de acero cal. 22, en paneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.

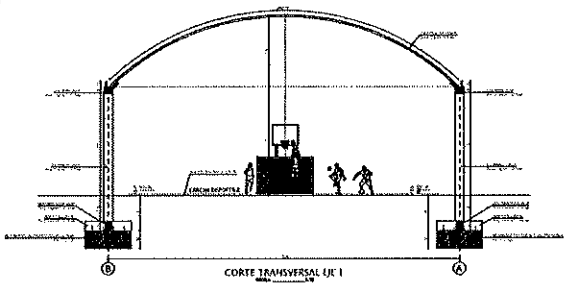

Caja de inspección en concreto de F´c=2500 PSI, de sección 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms, con espesores de paredes de 0.10 mts. según diseño







DETALLE CAJA DE INSPECCION

SEGUIMIENTO DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS											
CONDICIONES CONTRACTUALES						EJECUCIÓN DE OBRA			EJECUCIÓN DE OBRA ACUMULADA		
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR/UNITARIO	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	% EJECUCION	CANT	% EJECUCION	
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES										
1.01	Localización y replanteo.	M2	736,76	$ 4.475	$ 3.297.001			0,00%	736,76	100,00%	
1.02	Corte de placa de concreto e= 0.10 mts	ML	35,23	$ 13.550	$ 477.367			0,00%	35,23	100,00%	
1.03	Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.	M2	19,75	$ 33.088	$ 653.478			0,00%	19,75	100,00%	
1.04	Desmonte marcos canchas existentes.	UND	2,00	$ 146.950	$ 293.900			0,00%	2,00	100,00%	
1.05	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	279,25	$ 57.913	$ 16.172.066			0,00%	279,25	100,00%	
1.06	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecanicamente.	M3	128,41	$ 105.563	$ 13.555.281			0,00%	128,41	100,00%	
Subtotal					**$ 34.449.093**		$ -				
2	**CIMENTACIÓN**										
2,01	Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts	M2	17,40	$ 42.825	$ 745.155			0,00%	13,92	80,00%	
2,02	Concreto ciclópeo - 2500 PSI (140 KG/CM2) 60% Concreto 2.000 PSI + 40% Piedra media zoga	M3	77,04	$ 453.225	$ 34.916.454			0,00%	77,04	100,00%	
2,03	Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño.	M3	42,37	$ 779.363	$ 33.021.589			0,00%	42,37	100,00%	
2,04	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas	KG	3.057,00	$ 8.963	$ 27.398.363			0,00%	3.051,03	99,80%	
2,05	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño	M3	6,96	$ 934.188	$ 6.501.945			0,00%	6,96	100,00%	
2,06	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación	KG	1.399,00	$ 8.963	$ 12.538.538			0,00%	1.214,56	86,82%	
Subtotal					**$ 115.122.044**		$ -				
3	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**										
3.01	Construcción en columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI.	M3	17,00	$ 1.159.275	$ 19.707.675			0,00%	17,00	100,00%	
3.02	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas	KG	4.465,00	$ 8.963	$ 40.017.563			0,00%	4.464,73	99,99%	
3.03	Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Incluye impermeabilización.	M3	17,00	$ 1.265.088	$ 21.506.488			0,00%	15,69	92,29%	
3.04	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal	KG	1.988,00	$ 8.963	$ 17.817.450			0,00%	1.988,00	100,00%	
Subtotal					**$ 99.049.176**		$ -				
4	**CUBIERTA**										

SEGUIMIENTO DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS										
CONDICIONES CONTRACTUALES						EJECUCIÓN DE OBRA			EJECUCIÓN DE OBRA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR/UNITARIO	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	% EJECUCION	CANT	% EJECUCION
4.1	Suministro, fabricación e instalación de cubierta auto soportante a base de lámina de acero cal. 22, en páneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.	M2	670,93	$ 266.338	$ 178.693.819	670,93	$ 178.693.819	100,00%	670,93	100,00%
Subtotal					**$ 178.693.819**		**$ 178.693.819**			
5	**ACABADOS - PLACAS EN CONCRETO**									
5.03	Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm.	M2	19,75	$ 106.675	$ 2.106.831			0,00%	19,75	100,00%
5.04	Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño.	ML	60,80	$ 105.563	$ 6.418.200			0,00%	60,80	100,00%
Subtotal					**$ 8.525.031**		**$ -**			
6	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**									
6.01	Bajantes en tuberia PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagues y bajantes de aguas lluvias.	ML	51,04	$ 100.900	$ 5.149.936			0,00%	51,04	100,00%
6.02	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagues.	ML	21,60	$ 134.825	$ 2.912.220			0,00%	21,60	100,00%
6.03	Caja de inspeccion en concreto de F´c=2500 PSI, de seccion 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño	UND	2,00	$ 440.613	$ 881.225	2,00	$ 881.225	100,00%	2,00	100,00%
Subtotal					**$ 8.943.381**		**$ 881.225**			
7	INSTALACIONES ELÉCTRICAS									
7.01	Desmonte de Postes de iluminación; Incl. Retiro de luminarias, clabeado y demolición de machón en concreto.	UND	4,00	$ 369.312	$ 1.477.248			0,00%	4,00	100,00%
Subtotal					**$ 1.477.248**		**$ -**			
8	**TRANSPORTE**									
8.01	Transporte de materiales petreos	M3-Km	15.428,44	$ 1.388	$ 21.406.961			0,00%	14.451,84	93,67%
Subtotal					**$ 21.406.961**		**$ -**			
% AVANCE DE OBRA								**33,56%**		**86,48%**

1. REGISTRO FOTOGRAFICO

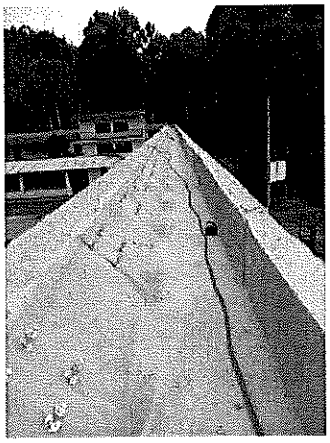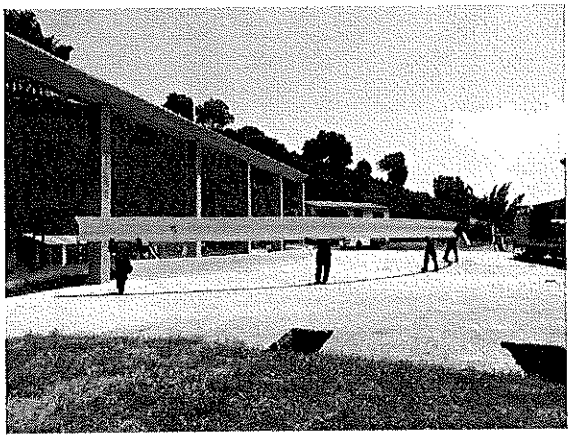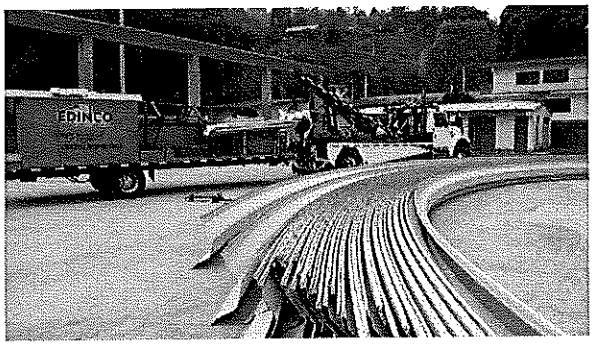

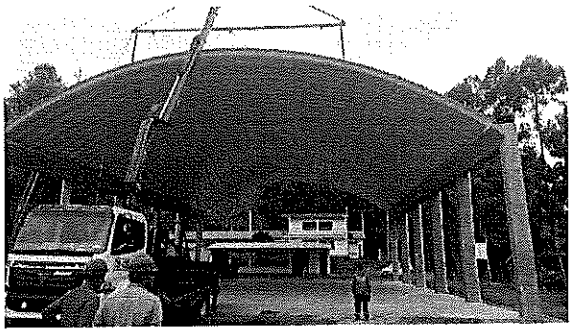Suministro e instalación cubierta autoportante calibre 22 - 02 agosto 2024 al 07 agosto 2024




Fundición de cajillas aguas lluvias – 01 agosto 2024.

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en el presente informe, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

ING. **ANGELICA MARÍA ALVIRA MARTÍNEZ**
DIRECTOR DE OBRA

ING. **CESAR AUGUSTO GONZÁLES RODRIGUEZ**
DIERCTOR DE INTERVENTORIA

Para el presente periodo del 01 agosto 2024 al 08 agosto 2024, el contratista de obra junto interventoría, avanzo actividades de obra. Avanzo 86,48% contra 100% programado.

Para el presente periodo hay un atraso del +13,52%

2. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

- Se instala sistema de cubierta autoportante calibre 22.
- Se complementa sistema desagüe aguas lluvias, con la construcción de cajillas.
- Se suspende de nuevo actividades en obra por fuertes lluvias.

3. ANEXOS

- ACTAS CONFORMACION DE VEEDURIAS CIUDADANA - FORMATO PM-GID-F04.
- ACTAS DE CIERRE DE VEEDURIA CIUDADANA - FORMATO - PM-GID-F05.
- ACTA DE SOCIALIZACION.
- ACTAS DE COMITÉS.
- RESULTADO DE ENSAYOS Y PRUEBA DE LABORATORIO DEL CONTRATISTA DE OBRA Y D ELA INTERVENTORIA.
- CERTIFICADO CALIDAD MATERIALES.
- MEMORIAS DE CALCULO.
- BITACORA DE OBRA.
- SOPORTES DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (EPS-ARP-AFP) INTERVENTORIA.
- CERTIFICADO VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA INTERVENTORIA REALIZADO POR EL APOYO A AL SUPERVISION (Vo.Bo. Apoyo Supervisión).
- CORRESPONDENCIA GENERADA DURANTE EL PERIODO.
- ENTREGAR UN CD CON LA COPIA DIGITALIZADA DE TODO EL INFORME Y SUS ANEXOS.
- (Todos los documentos generados en el mes)

ING. César Augusto González Rodriguez	(10/agosto/2024)	ING. Daniel Felipe Molina Tafur.
FIRMA ORIGINAL **DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**FECHA DE ENTREGA**	FIRMA ORIGINAL **Vo.Bo APOYO SUPERVISION**

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Identificación NI - 891101100
Sucursal 068
Período Pensión 2024-08
Período Salud 2024-09
Fecha Pago Planilla 2024-09-27

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	19055598
Nombre	DALMIRO GAMEZ BARRERO
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	Sin AFP
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	90819873
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2024-08
Periodo Salud	2024-09
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	Dependiente pensionado por vejez, jubilacinn o invalidez activo

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1,300,000	0,0400000	$ 52,000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
0	0	0,0000000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1,300,000	0,0696000	$ 90,500	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1,300,000	0,0400000	$ 52,000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Identificación NI - 891101100
Sucursal 014
Período Pensión 2024-08
Periodo Salud 2024-08
Fecha Pago Planilla 2024-09-27

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	12120545
Nombre	CESAR AUGUSTO GONZALEZ RODRIGUEZ
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. EPSS
AFP	PROTECCION (ING+PROTECCION)
Caja de compensación	Sin CCF
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	91104348
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	Y
Periodo Pensión	2024-08
Periodo Salud	2024-08
Tipo Cotizante	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.300.000	0,1250000	$ 162.500	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.300.000	0,1600000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.300.000	0,0696000	$ 90.500	5742101

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligation	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
0	0	0,0000000	$ 0	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0


	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código: [illegible]
			Versión: 1
			Fecha de Aprobación:
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		17/08/2023

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LAS AGUILAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA"		No. CONTRATO:	CLPIH 393 DE 2023	
LOCALIZACION:	Vereda Las Aguilas - Municipio de La Argentina		PERIODO COMPRENDIDO:	Memorias de CALCULO Informe Mensual	
CONTRATISTA:	CONSORCIO TABOR 91		Desde:	1/08/2024	No. 5
INTERVENTOR:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA		Hasta:	7/08/2024	
CAPÍTULO:	4	CUBIERTA		UNIDAD:	M2
ITEM:	4,1	Suministro, fabricación e instalación de cubierta auto soportante a base de lámina de acero cal. 22, en páneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.			

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total
Cubierta Auto soportante		30,40	22,07		1,00	670,93
TOTAL						670,93

ESQUEMAS:

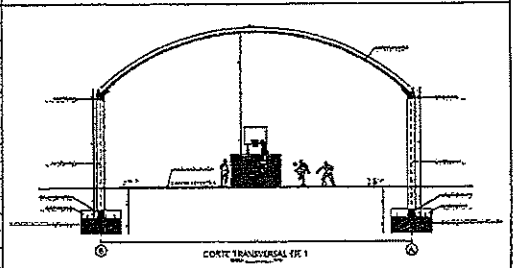

Observaciones:	Se hace la instalación de la cubierta de acuerdo a las especificaciones establecidas en los planos de referencia. La cantidad ejecutada en esta actividad no presentó variación respecto a las condiciones contractuales

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

V0.Bo. CLAUDIO CESAR MEJIA GUTIERREZ
RESIDENTE DE OBRA

V0.Bo. DALMIRO GAMEZ BARRERO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ANGÉLICA MARÍA ÁLVIRA MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRA


CESAR AUGUSTO GONZALEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código:	[illegible]
			Versión:	-
			Fecha de aprobación:	[illegible]
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Páginas:	[illegible]


OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LAS AGUILAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA"	No. CONTRATO:	CLPIH 393 DE 2023	
LOCALIZACION:	Vereda Las Aguilas - Municipio de La Argentina	PERIODO COMPRENDIDO:		Memorias de CALCULO Informe Mensual
CONTRATISTA:	CONSORCIO TABOR 91	Desde:	1/08/2024	No. 5
INTERVENTOR:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	Hasta:	7/08/2024	


CAPÍTULO:	4	CUBIERTA	UNIDAD:	M2
ITEM:	4,1	Suministro, fabricación e instalación de cubierta auto soportante a base de lámina de acero cal. 22, en páneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.		

REGISTRO FOTOGRAFICO

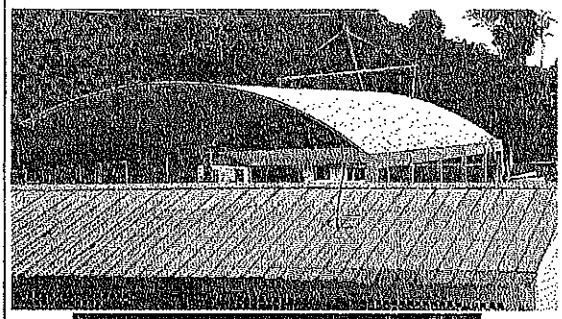

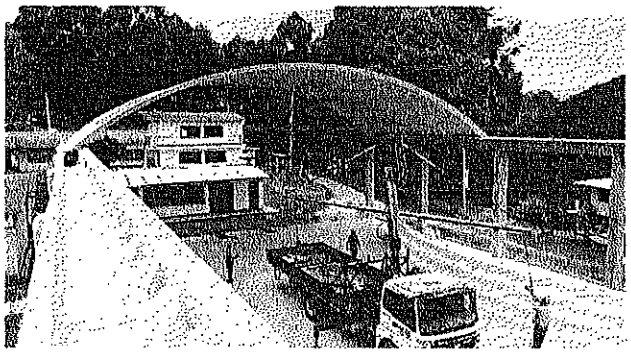

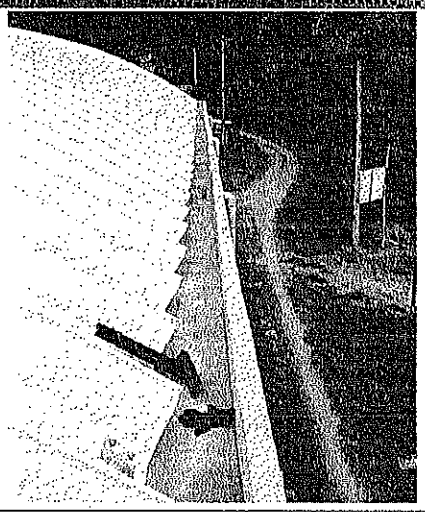

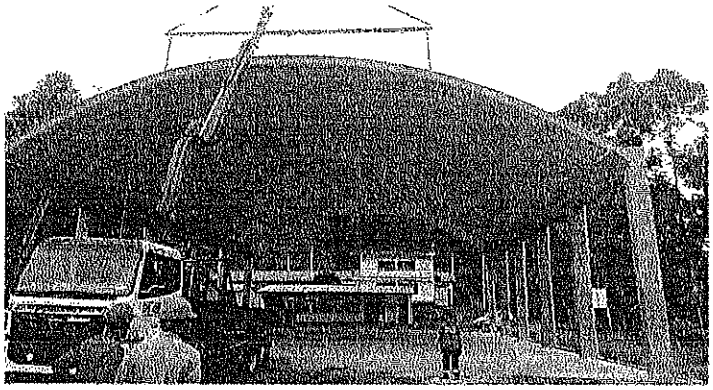

Observaciones:	

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Vo.Bo. CLAUDIO CESAR MEJIA GUTIERREZ
RESIDENTE DE OBRA

Vo.Bo. DAMARO GAMEZ BARRERO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ANGÉLICA MARÍA ALVIRA MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRA

CESAR AUGUSTO GONZALEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código: DIS-GMD-F-95
			Versión: 1
			Fecha de Aprobación:
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		10/08/2023


OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LAS AGUILAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA"	No. CONTRATO:	CLPIH 393 DE 2023
LOCALIZACION:	Vereda Las Aguilas - Municipio de La Argentina	PERIODO COMPRENDIDO:	Memorias de CALCULO Informe Mensual
CONTRATISTA:	CONSORCIO TABOR 91	Desde: 1/08/2024	No. 5
INTERVENTOR:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	Hasta: 7/08/2024	

CAPÍTULO:	6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	UNIDAD:	UND
ITEM:	6,03	Caja de inspeccion en concreto de F'c=2500 PSI, de seccion 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total
Caja de Inspección					2,00	2,00
TOTAL						2,00

ESQUEMAS:



PLANTA CORTE

DETALLE CAJA DE INSPECCION

Observaciones:	Se ejecuta la totalidad del Item, sin que se presenten variaciones en las condiciones contractuales.

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Vo.Bo. CLAUDIO CESAR MEJIA GUTIERREZ
RESIDENTE DE OBRA

Vo.Bo. DALMIRO GAMEZ BARRERO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ANGÉLICA MARÍA ALVIRA MARTINEZ
DIRECTOR DE OBRA


CESAR AUGUSTO GONZALEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código: [illegible]
			Versión: -
			Fecha de aprobación: [illegible]
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LAS AGUILAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA"	No. CONTRATO:	CLPIH 393 DE 2023	
LOCALIZACION:	Vereda Las Aguilas - Municipio de La Argentina	PERIODO COMPRENDIDO:		Memorias de CALCULO Informe Mensual
CONTRATISTA:	CONSORCIO TABOR 91	Desde:	1/08/2024	No. 5
INTERVENTOR:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	Hasta:	7/08/2024	

CAPÍTULO:	6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	UNIDAD:	UND
ITEM:	6,03	Caja de inspeccion en concreto de F'c=2500 PSI, de seccion 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño		

REGISTRO FOTOGRAFICO

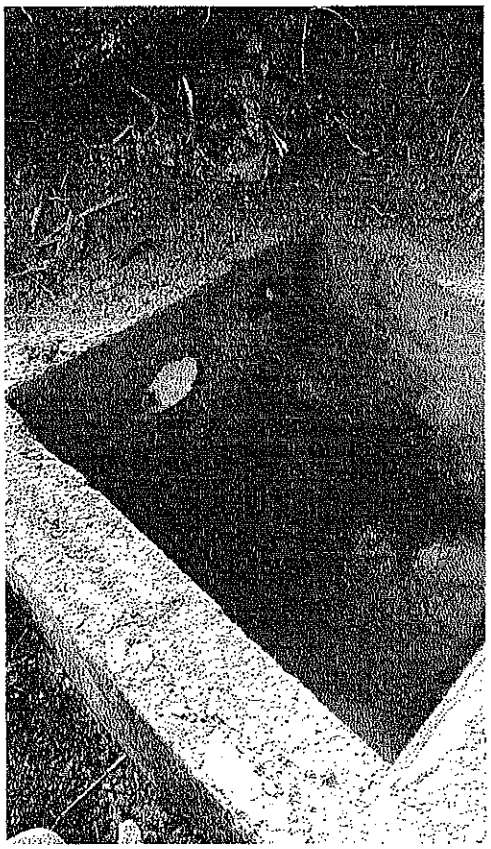

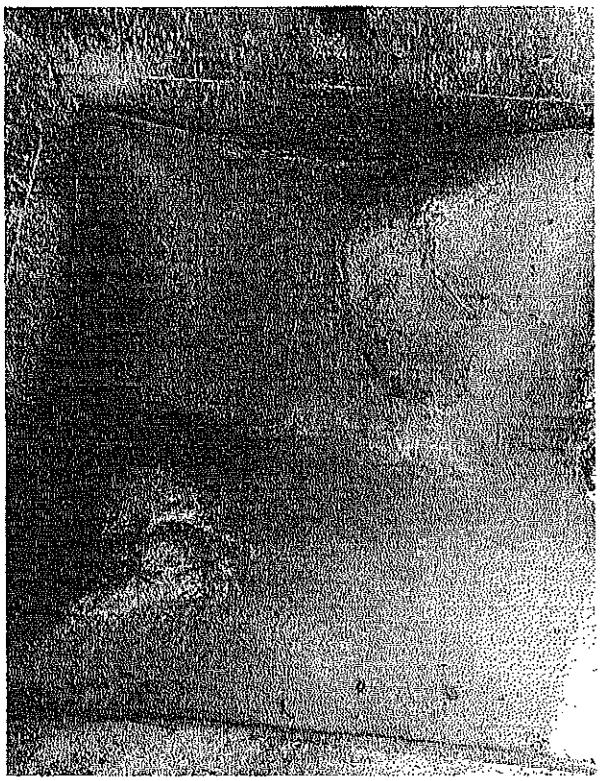

Observaciones:	

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Vo.Bo. CLAUDIO CESAR MEJIA GUTIERREZ
RESIDENTE DE OBRA

Vo.Bo. DAMIRO GAMEZ BARRERO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ANGÉLICA MARÍA ALVIRA MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRA

[illegible] GONZALEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DIH-CGID-F02
Fecha Aprobación: 13/02/2023	ACTA COMITÉ DE OBRA	Versión: 2
		Página 1 de 2

Nombre Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LAS AGUILAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA"			**Acta No.**	05
No. De Contrato obra	CLPIH393 DE 2023	**Lugar:**	Empresa Sociedad Técnica Sota Ltda.		
No. De Contrato Interventoría	CIHCM411 DE 2023				
Fecha	AGOSTO 04 DE 2024	**Hora Inicio**	8:00 a.m	**Hora Final**	8:30 a.m.

OBJETO DE LA REUNION

REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE OBRA DEL PERÍODO SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

AGENDA

1	Revisión del Avance de Obra
2	Suspensión del Contrato

DESARROLLO

Siendo las 8:00 a.m. del día 04 de agsto de 2024, se reúnen en las instalaciones de la empresa Sociedad Técnica Sota Ltda, por parte del Contratista Consorcio Tabor 91, el ingeniero Claudio César Mejía Gutiérrez, en su calidad de Representante Legal y residente de obra y la ingeniera Angélica María Alvira Martínez, en su condición de directora de obra, por parte de la Interventoría Sociedad Técnica Sota Ltda., el ingeniero Javier Barrero Mossos, en su calidad de representante legal y el ingeniero César Augusto González R. en su condición de director de obra,, con el fin de realizar la revisión y verificación del avance de obra a la fecha, y analizar la solicitud del contratista de realizar la suspensión de la obra, en el desarrollo del contrato de obra No. CLPIH393 DE 2023.

1. Se da inicio a la revisión del avance de la obra a la fecha.

De acuerdo a lo ejecutado en obra se verifica que se han realizado las siguientes actividades:

CUBIERTA

- Suministro, fabricación e instalación de cubierta auto soportante a base de lámina de acero cal. 22, en paneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliéster estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.: Se hace la instalación de la cubierta de acuerdo a las especificaciones establecidas en los planos de referencia. La cantidad ejecutada en esta actividad no presentó variación respecto a las condiciones contractuales.

INSTALACIONES HIDROSANTARIAS

- Caja de inspección en concreto de F´c=2500 PSI, de sección 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts. según diseño.: Se ejecuta la totalidad del ítem, sin que se presenten variaciones en las condiciones contractuales.

AGENDA

Hasta el momento, el valor inicialmente contratado, no se ve afectado en su valor, por las cantidades ejecutadas en el período.

Se verifica que el avance de obra del período alcanza, el 33.56 %, para un avance de obra acumulado de 89.88%.

2. Suspensión de Obra

El contratista manifiesta que, que el proveedor de los insumos eléctricos, les ha expresado su dificultad para el despacho de los materiales requeridos, ya que no cuentan con la existencia de algunos de los productos solicitados, de igual manera, los brazos para las lámparas se fabrican con tubos galvanizados de 2" el cual no hay disponibilidad en el momento en el mercado y se hace necesario realizar la respectiva importación. Así mismo, el suministro de los tableros para las canchas su fabricación tiene un tiempo estimado de 15 días hábiles, los cuales incluyen el tiempo de envío desde la ciudad de Bogotá ya que no hay empresas que los fabriquen en la ciudad de Neiva.

Por la anteriormente expuesto, la interventoría ve viable la solicitud del contratista, y pide al contratista que realice el respectivo requerimiento, para efectuar las gestiones correspondientes ante la entidad, a través del apoyo a la supervisión.

Se finaliza el presente comité, siendo las 8:30 a.m.

EN CONSTANCIA FIRMAN EL ACTA

NOMBRE	CARGO	FIRMA
CLAUDIO CESAR MEJÍA G.	R.L. CONSORCIO TABOR 91 - Contratista	
ANGÉLCIA MARÍA ALVIRA M.	DIRECTORA DE OBRA	
JAVIER BARRERO MOSSOS.	R.L. SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA. – Interventoría	
CESAR AUGUSTO GONZALEZ R.	DIRECTOR INTERVENTORIA – Interventoría	

SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA

Interventor Contrato de Obra No. CLPIH 393 DE 2023

HACE CONSTAR:

La Interventoría, certifica que el informe presentado por el ejecutor del contrato No. CLPIH393 DE 2023, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LAS AGUILAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA", cumple con los requisitos establecidos en las obligaciones contractuales del contrato, de acuerdo a la información suministrada por el CONTRATISTA DE OBRA, en donde fue revisada y avalada por la interventoría; así mismo se certifica que la interventoría revisó y verifico las planillas de seguridad social del contratista de obra.

JAVIER BARRERO MOSSOS
REPRESENTANTE LEGAL
SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.





SAEN LTDA.	REPORTE DE ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V. E-410	CÓDIGO	FOR-T-089
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	1/10/2019

OBRA: POLIDEPORTIVO LA ARGENTINA


LOCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - DEPARTAMENTO DEL HUILA

PETICIONARIO: CONSORCIO TABOR 81

FECHA DEL INFORME: AGOSTO 08 DE 2024

N° MUESTRA	N° CILINDRO	ELEMENTOS FUNDIDOS Y OBSERVACIONES	FECHA DE FUNDICIÓN	ASENT. (cm)	RESIST. ESPERADA σ(PSI)	FECHA DE ROTURA	EDAD (días)	DIÁM. (cm)	ALT. (cm)	ÁREA (cm²)	PESO (g)	DENSIDAD (g/cm³)	FUERZA DE ROTURA (kN)	TIPO DE ROTURA	RESIST. OBTENIDA σ(kg/cm²)	RESIST. OBTENIDA σ(MPa)	RESIST. OBTENIDA σ(PSI)	RESIST. PROMEDIO σ(PSI)	% RESIST. OBTENIDA	GRÁFICA RESISTENCIA vs. EDAD
5	5	CUNETA CONCRETO CONVENCIONAL PREPARADO EN OBRA	04/07/24		3.000	18/07/24	14	15,2	30,0	181,5	12.579	2,31	327,3	5	183,9	18,0	2.627	2.627	87,6%	
	5					01/08/24	28	15,2	30,0	181,5	12.614	2,32	399,6	5	224,5	22,0	3.208	3.208	106,9%	
6	6	COLUMNAS CONCRETO CONVENCIONAL PREPARADO EN OBRA	09/07/24		3.000	23/07/24	14	15,2	30,0	181,5	12.665	2,33	334,6	3	188,0	18,4	2.686	2.686	89,5%	
	6					06/08/24	28	15,2	30,0	181,5	12.547	2,30	379,6	4	213,3	20,9	3.047	3.047	101,6%	
7	7	COLUMNAS CONCRETO CONVENCIONAL PREPARADO EN OBRA	16/07/24		3.000	06/08/24	21	15,2	30,0	181,5	12.166	2,23	364,6	5	204,9	20,1	2.927	2.927	97,6%	
	7					13/08/24	28													
8	8	VIGA CANAL Y CUNETA CONCRETO CONVENCIONAL PREPARADO EN OBRA	25/07/24		3.000	16/08/24	21													
	8					23/08/24	28													

TIPOS DE FALLA O ROTURA:



OBSERVACIONES GENERALES

Máquina de Ensayo a Compresión Marca Pinzuar, Modelo Matrix, Serie CS181011.

Muestras Tomadas y referenciadas por el cliente.

LABORATORISTA

INGENIERO

CONSORCIO TABOR 91

Nit. 901.766.534-7

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

PERÍODO MES JULIO 2023

FECHA	No. DOCUMENTO	DESTINATARIO	REMITENTE	ASUNTO	FORMATO (Físico/Digital)
5-ago-24	CT91-CTO393-23-017	Sociedad Técnica Sota Ltda.	Consorcio Tabor 91	Solicitud suspensión de obra	Digital
6-ago-24	IntInder021-012	INDERHUILA	Sociedad Técnica Sota Ltda.	Aprobación Suspensión Contrato	

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S.
NIT 901 329 729 – 2


COMPRESION SIMPLE AL CONCRETO

CLIENTE: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
OBRA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA VEREDA AGUILAS Y VEREDA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - DEPARTAMENTE DEL HUILA.
LOCALIZACIÓN: LA ARGENTINA - HUILA

FECHA: 24-ago-24
NORMA: Art. 630
ENSAYO: E-410

CILINDRO No.	ELEMENTO FUNDIDO Y OBSERVACIONES	FECHA FUNDIDA	EDAD DE ROTURA (Dias)		FECHA ROTURA	RESISTENCIA OBTENIDA KN	DIAMETRO	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA Kg/cm²	% OBTENIDO	RESISTENCIA ESPECIFICADA	OBSERVACIONES
7	VIGA CANAL Y CUNETA CONCRETO CONVENCIONAL PREPARADO EN OBRA	26/07/2024	7		2-ago-24	359,9	10,1	6515	4775,7	217,2	3000	
8		26/07/2024		28	23-ago-24	379,5	10,1	6939	5085,0	231,3	3000	

GRAFICA PORCENTAJES



CONCRETOS %	
EDAD (DIAS)	PORCENTAJE
7	50-70%
14	80%
21	90%
28	100%

OBSERVACIONES: LAS MUESTRAS SE RECIBIERON EN BUEN ESTADO - ENVIADAS POR EL CLIENTE

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S.

NATALIA OVIEDO VARGAS
INGENIERA CIVIL

Calle 25N No. 9BW - 08 Barrio Villa del Rio - Telefax 8730486 Celular : 315-3622889
NEIVA - HUILA

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S.
NIT 901 329 729 – 2


COMPRESION SIMPLE AL CONCRETO

CLIENTE: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
OBRA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA VEREDA AGUILAS Y VEREDA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - DEPARTAMENTE DEL HUILA.
LOCALIZACIÓN: LA ARGENTINA - HUILA

FECHA: 16-jul-24
NORMA: Art. 630
ENSAYO: E-410

CILINDRO No.	ELEMENTO FUNDIDO Y OBSERVACIONES	FECHA FUNDIDA	EDAD DE ROTURA (Dias)		FECHA ROTURA	RESISTENCIA OBTENIDA KN	DIAMETRO	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA Kg/cm²	% OBTENIDO	RESISTENCIA ESPECIFICADA	OBSERVACIONES
1	ZAPATAS VIGAS DE CIMENTACIÓN CONCRETO CONVENCIONAL PREPARADO EN OBRA	17/06/2024	7		24-jun-24	195,3	10,1	3535	2591,5	117,8	3000	
2		17/06/2024		28	15-jul-24	240,5	10,1	4397	3223,1	146,6	3000	

GRAFICA PORCENTAJES



CONCRETOS %	
EDAD (DIAS)	PORCENTAJE
7	50-70%
14	80%
21	90%
28	100%

OBSERVACIONES: LAS MUESTRAS SE RECIBIERON EN BUEN ESTADO - ENVIADAS POR EL CLIENTE

NATALIA OVIEDO VARGAS
INGENIERA CIVIL

Calle 25N No. 9BW - 08 Barrio Villa del Rio - Telefax 8730486 Celular : 315-3622889
NEIVA - HUILA

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S.
NIT 901 329 729 – 2


COMPRESION SIMPLE AL CONCRETO

CLIENTE: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
OBRA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA VEREDA AGUILAS Y VEREDA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - DEPARTAMENTE DEL HUILA.
LOCALIZACIÓN: LA ARGENTINA - HUILA

FECHA: 7-ago-24
NORMA: Art. 630
ENSAYO: E-410

CILINDRO No.	ELEMENTO FUNDIDO Y OBSERVACIONES	FECHA FUNDIDA	EDAD DE ROTURA (Dias)		FECHA ROTURA	RESISTENCIA OBTENIDA KN	DIAMETRO	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA Kg/cm²	% OBTENIDO	RESISTENCIA ESPECIFICADA	OBSERVACIONES
5	COLUMNAS CONCRETO CONVENCIONAL PREPARADO EN OBRA	09/07/2024	7		16-jul-24	335,2	10,1	6068	4447,9	202,3	3000	
6		09/07/2024		28	6-ago-24	380,1	10,1	6950	5094,0	231,7	3000	

GRAFICA PORCENTAJES



CONCRETOS %	
EDAD (DIAS)	PORCENTAJE
7	50-70%
14	80%
21	90%
28	100%

OBSERVACIONES: LAS MUESTRAS SE RECIBIERON EN BUEN ESTADO - ENVIADAS POR EL CLIENTE

NATALIA OVIEDO VARGAS
INGENIERA CIVIL

Calle 25N No. 9BW - 08 Barrio Villa del Rio - Telefax 8730486 Celular : 315-3622889
NEIVA - HUILA

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S.
NIT 901 329 729 – 2
LABORATORIO


COMPRESION SIMPLE AL CONCRETO

CLIENTE: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
OBRA: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA VEREDA AGUILAS Y VEREDA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - DEPARTAMENTE DEL HUILA.
LOCALIZACIÓN: LA ARGENTINA - HUILA

FECHA: 27-jul-24
NORMA: Art. 630
ENSAYO: E-410

CILINDRO No.	ELEMENTO FUNDIDO Y OBSERVACIONES	FECHA FUNDIDA	EDAD DE ROTURA (Dias)		FECHA ROTURA	RESISTENCIA OBTENIDA KN	DIAMETRO	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA Kg/cm²	% OBTENIDO	RESISTENCIA ESPECIFICADA	OBSERVACIONES
3	PLACA CONCRETO CONVENCIONAL PREPARADO EN OBRA	28/06/2024	7		5-jul-24	190,5	10,1	3449	2527,8	115,0	3000	
4		28/06/2024		28	26-jul-24	225,0	10,1	4114	3015,4	137,1	3000	

GRAFICA PORCENTAJES



CONCRETOS %	
EDAD (DIAS)	PORCENTAJE
7	50-70%
14	80%
21	90%
28	100%

OBSERVACIONES: LAS MUESTRAS SE RECIBIERON EN BUEN ESTADO - ENVIADAS POR EL CLIENTE

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S.

NATALIA OVIEDO VARGAS
INGENIERA CIVIL

Calle 25N No. 9BW - 08 Barrio Villa del Rio - Telefax 8730486 Celular : 315-3622889
NEIVA - HUILA

Jul 31/14

·Clima: Lloviznas.
·Equipo: Herramienta menor.

Se trabaja en la instalación de la bajante de aguas lluvias, terminando completamente esta actividad.
Se recibe en obra el suministro de la cubierta, la cual se dará inicio el día de mañana.
También llega la grua a la obra y todo el equipo necesario para dicha instalación

Interventoria

Contratista.

Agosto 01/14

·Clima: Lluvias Suaves
·Equipo: Herramienta menor, grua.

Se organiza en la obra toda la logistica para la instalacion de la cubierta.
Se realizan trabajos de nivelacion de la losa donde se construiran las cajillas de Inspeccion

Interventoria

Contratista.

(61)

Agosto 02/24

·Clima: Soleado
·Equipo: Herramienta menor, grúa

Se da inicio a la instalación de la cubierta acústica, iniciando en los columnas C1 y C7, de acuerdo a los planos de diseño, alcanzando un 25% de avance.

Interventoría

Contratista.

Angelica Maria Cabrera

Agosto 03/24

·Clima: Horizontes suaves.
·Equipo: Herramienta menor, grúa.

Se continua con la instalación de la cubierta alcanzando cubrir un 50% del area.
Se realiza el armado de las formaletas para la fundición de las cajillas de inspección.

Interventoría

Contratista.

Agosto 04/24

-Clima: Soleado.

NO LABORAL - DOMINGO

Agosto 05/24

- Clima: Ventoso.
- Herramienta menor, grua, mezcladora.

Se continua trabajando en la instalacion de la cubierta, alcanzando una cobertura total de 75% aprox del area.
Se realiza la fundicion de las 2 cajillas de inspeccion.

Interventoria _____ Contratista.

Agosto 06/24

- Clima: Ventoso.
- Equipo: Herramienta menor.

Se finaliza la instalacion de la cubierta alcanzando el 100% del area.

Interventoria Contratista.

Agosto 07/24 NO LABORAL - FESTIVO.

Agosto 08/24 SUSPENSION DE LA OBRA

Se lleva a cabo la suspension de las labores en obra, y se suscribe la respectiva acta.

Interventoría

Contratista.
