BOGOTÁ Secretaría de Educación	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.1577734** SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL **FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA** INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	**Versión: 1** **CÓDIGO:** ATC-FR-002 Página 1 de 2

SEMANA N°:	1	**TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONTRATO DE OBRA:**	**PLAZO TOTAL:**	6 meses

INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL (25) DE (08) DE(20) AL (03) DE (09) DE (20)

CINCO Compañía de Interventoría y Consultoría S.A.S.

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO No.CO1.PCCNTR.1679753

SUSCRITO ENTRE SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL Y COMPAÑÍA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA SAS

Valor del Contrato: $ 186.472.567

Nombre del Gestor Territorial: Ing. Jairo Corrales — Nombre del Director de Interventoría: Ing. Carlos Bolaños Gonzalez

Plazo de Ejecución: 184 días — Fecha de Inicio: 25/08/2020 — Fecha de Terminación: 24/02/2021

2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

OBJETO: **"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO GRUPO 3"**

Informe N° 1 — Fecha de informe: Del 25/08/2020 HASTA 03/09/2020

INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN	
JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ	
Valor Contrato obra:	$ 1.212.305.529
Valor Adicional:	$ -
Valor Total:	**$ 1.212.305.529**
Fecha de Inicio	**25/08/2020**
Suspensión N°	**N/A**
Reinicio:	**N/A**
Prórroga N° :	**N/A**
Plazo actualizado:	**184 dias**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	
CINCO SAS	
Valor Contrato:	$ 186.472.567
Valor Adicional:	$ -
Valor Total:	**$ 186.472.567,00**
Fecha de Inicio	**19/08/2020**
Suspensión N°	**N/A**
Reinicio:	**N/A**
Prórroga N° :	**N/A**
Plazo actualizado:	

SEGUIMIENTO DE OBRA

AVANCE FÍSICO (%)

Avance	Acum. Anterior	Semana N°	Acum. semana	En días
% Programado	0,00%	0,00%	0,00%	
% Ejecutado	0,00%	2,39%	2,39%	#¡DIV/0!
Diferencia	0,00%	2,39%	2,39%	#¡DIV/0!

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos) — En %

Programado(%)	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
Ejecutado (%)	$ 0,00	$ 28.969.456,77	$ 28.969.456,77	2,39%
Diferencia	$ 0,00	$ 28.969.456,77	$ 28.969.456,77	2,39%

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Interventoría:	1 ing residente, 2 inspectores
Contratista:	2 residentes, 1 oficial, 6 ayudantes, 1 operador de minicargador

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Herraminetas menores, 1 minicargador CAT

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	**VERIFICADO POR**	**S/N/NA**
Aportes a seguridad Social y parafiscales	**INTERVENTORIA**	**S**
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	**INTERVENTORIA**	**S**
Normas ambientales	INTERVENTORIA	**S**

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1: Implementación Protocolo de Bioseguridad - Instituto Internacional de Fontibón



Foto 2: Bodega existente en mal estado - Instituto Internacional de Fontibón



Foto 3: Desmonte de manto asfaltico existente - Instituto Internacional de Fontibón

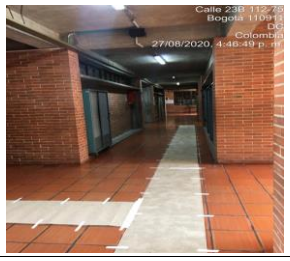


Foto 4: Circulación - Intituto Internacional de Fontibón



Foto 5: Limpieza de area - Instituto Internacional de Fontibón



Foto 6: Material de desecho - Iinstituto Internacional de Fontibón



Foto 7: Humedad en cubierta del bloque C - Instituto Internacional de Fontibón



Foto 8:Retiro de manto asfaltico - Instituto Internacional de Fontibón



Foto 9:Imprimación con emulsión asfaltica - Instituto Internacional de Fontibón



Foto 10: Implementación Protocolo de bioseguridad - Colegio Villemar Sede C



Foto 11: Perforaciones para construcción de cerramiento preliminar - Colegio Villemar Sede C

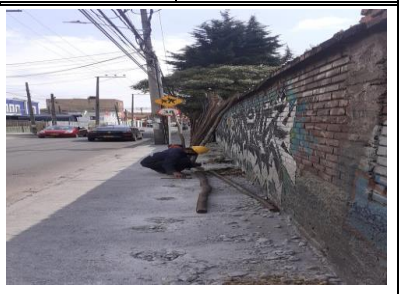


Foto 12: Perforaciones para construcción de cerramiento preliminar - Colegio Villemar Sede C



Foto 13: Estabilización de muro - Colegio Villemar Sede C

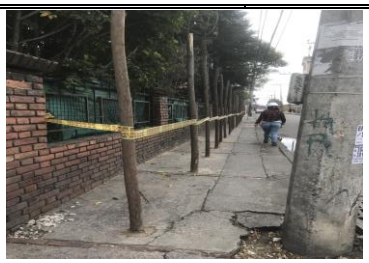


Foto 14: Inicio contrsucción de cerramiento provisional - Colegio Villemar Sede C



Foto 15: Inicio contrsucción de cerramiento provisional - Colegio Villemar Sede C



Foto 16: contrsucción de cerramiento provisional - Colegio Villemar Sede C



Foto 17: contrsucción de cerramiento provisional - Colegio Villemar Sede C



Foto 18: Charlas plan sst - Colegio Silveria Espinosa



Foto 19: Seguimiento al protocolo de bioseguridad - Colegio Silveria Espinosa



Foto 20: Entrega de EPP - Colegio Silveria Espinosa



Foto 21: Desmonte de cielo raso en machimbre- Colegio Silveria Espinosa



Foto 22: Desmonte de cielo raso en machimbre de 1 aula- Colegio Silveria Espinosa



Foto 23: Desmonte de cielo raso en machimbre de 1 aula- Colegio Silveria Espinosa



Foto 24: Retiro de escombros producto de cielo raso en machimbre de 1 aula- Colegio Silveria Espinosa



Foto 25: Demolición de cancha existente, capa superficial en asfalto- Colegio Villemar Sede B



Foto 26: Demolición de cancha existente, capa superficial en asfalto- Colegio Villemar Sede B



Foto 27: Retiro de escombros- Colegio Villemar Sede B

COLEGIO 1: INSTITUTO INTERNACIONAL DE FONTIBON

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR
DESMONTE AFINADO DE PISO E=5CM (INCLUYE CARGUE,RETIRO, DISPOSICION DE ESCOMBROS)	RETIRO DE MANTO ASFALTICO, BLOUE ADMINISTRATIVO
RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DIST. DE 0-100M	DESMONTE DE TEJA ACRILICA
AFINADO TERRAZAS MORTERO 1:4 H=8CM	
RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL TOXICO (ASBESTO CEMENTO)	

IMPRIMANTE EMULSION ASFALTICA TIPO SIKA O SIMILAR	
COLEGIO 2: VILLEMAR EL CARMEN, SEDE C	
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	**ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR**
Cerramiento provisional en madera vara de clavo y lamina ondulada de zinctipo asesco	Retiro sobrantes cargue transporte y disposicion final de escombros a sitios autorizados
Demolicion de construcciones existentes (incl retiro de escombros)	Localizacion y replanteo topografico
	excavacion mecanica (cargue, transporte y disposicion final)
COLEGIO 3: VILLEMAR DEL CARMEN, SEDE B	
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO INC. RETIRO DE SOBRANTES	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO
	EXCAVACION MECANICA
	DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO UTORIZADO
COLEGIO 4: COLEGIO SILVERIA ESPINOOSA	
DEMOLICION DE CIELO RASO FALSO (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	DESMONTE DE LAMPARAS 2X32, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE
	RETIRO DE SOBRANTES (CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)
	ANTICORROSIVO/LAMINA LINEAL
	ESMALTE S/ LAMINA LINEAL

LOGROS Y/O DIFICULTADES

1. Cronograma:

2. Disponibilidad de Recursos: EL contratsita cuenta con las herramientas y materiales necesarios para realizar las actividades programadas

3. Ejecución Financiera:

4. Calidad de los trabajos:

5. Manejo Ambiental: Disposición final de ressiduos

6. Seguridad Industrial: Cumplen con el uso de sus epp, en cada colegio se ceunta con un kit de bioseguridad dada por el contratista para el cumplimeinto al protocolo de bioseguridad

7. Programa salud ocupacional (si aplica): E el periodo se han realizado 2 capacitaciones o charlas de seguridad

8. Aspectos sociales:

OBSERVACIONES

LOS PRESUPUESTOS OFICIALES SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN Y SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA, DE IGUAL MANERA LAS PROGRAMACIONES, SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA LA APERTURA DE UN NUEVO FRENTE DE OBRA, SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA EL CERTIFICADO DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

ELABORO:	REVISO:	APROBO:
NOMBRE: CANDELARIA MENDOZA OVIEDO	**NOMBRE: CARLOS ALBERTO BOLAÑOS**	**JAIRO CORRALES**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	GESTOR TERRITORIAL OCCIDENTE
