sgeneral sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>

DOCUMENTOS ACTA 04 CONT 053-25 CONSROCIO 4KED 2025

1 mensaje

dolly camacho <dolly.camacho@ibal.gov.co> 18 de noviembre de 2025, 11:02 a.m.
Para: SGENERAL@ibal.gov.co

ADJUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE

DOCUMENTOS ACTA 04 CONT 053-25 CONSROCIO 4KED 2025.pdf
12192K

IBAL SIG	**SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CÓDIGO:** GJ-R-050 **FECHA VIGENCIA:** 2016-10-12 **VERSIÓN: 02** **Página 1 de 1**

Ibagué, Noviembre 13 de 2025

14-11-25 10:25 Rad: 20250 0614

Doctora
GERMAN DARIO FONSECA SALCEDO
SECRETARIO GENERAL
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
La Ciudad

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA ACTA PARCIAL 04 DEL CONTRATO N° 053 DEL 03 DE ABRIL DE 2025.

Cordial Saludo:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestión de la secretaria general, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo tramite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

DOCUMENTOS ACTA PARCIAL N° 04.

- Soportes Documentales para Tramites de Cuenta – original
- Acta Modificatoria No. 04 – Original
- Acta Parcial No. 04 – Original (2 Copias)
- Preacta de Obra – Original
- Certificación Paz y Salvo Seguridad Social Expedida por el Supervisor – Original (1 Ejemplares)
- Ficha Técnica de Evaluación y Reevaluación de Proveedores – Original
- Factura Electrónica Original - (3 Ejemplares)
- Informe de Ejecución de Actividades – Original (1 Ejemplar)

Atentamente,

HOMAR DAVID CALDERON
UPERVISOR CONTRATO 053

IBAL SIG	ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES E INCORPORACION DE ITEMS NO PREVISTOS N°. 04 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GI-R-007 FECHA VIGENCIA: 2021-07-15 VERSIÓN: 02 Pagina 1 de 2

CONTRATO DE OBRA N°. 053 DEL 03 DE ABRIL DE 2025
OBJETO: "CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA PARA AFECTACIÓN DE REMOCIÓN EN MASA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "PIEDRA PINTADA" PROPIEDAD DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL", IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"
CONTRATISTA: CONSORCIO 4KED-2025 - Representante Legal ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ
SUPERVISORES: CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA
HOMAR DAVID CALDERON

Valor Contrato:	$ 1.977.887.179,00
Plazo:	Tres (03) Meses
Fecha de Iniciacion:	09 de Mayo de 2025
Prorroga 1:	Cuarenta y Cinco (45) dias
Prorroga 2:	Cuarenta y Cinco (45) dias
Prorroga 3:	Noventa (90) dias
Fecha de Terminacion:	04 de Febrero de 2026
Fecha Presente Acta:	13 de Noviembre de 2025

		CONDICIONES CONTRACTUALES Y/O ACTUALIZADAS				MODIFICACION N°. 04			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	ACTIVIDADES	UND	CANT	VR/ UNIT	VR/ TOTAL	(+/-)	CANT	VALOR	CANT	VR/TOTAL
1,0	PRELIMINARES									
1,1	Localización y replanteo con Aparato Topográfico	m²	1.413,44	$ 7.592,00	$ 10.730.836,00	(-)	2,18	$ 16.551,00	1.411,26	$ 10.714.286,00
1,2	Señalización en guadua C/3 mts y Polisombra de h=2mts	m	157,49	$ 20.089,00	$ 3.163.817,00	(=)	0,00	$ -	157,49	$ 3.163.817,00
1,3	Descapote a máquina en material común (E=0.1)	m²	827,62	$ 11.206,00	$ 9.274.310,00	(=)	0,00	$ -	827,62	$ 9.274.310,00
		SUBTOTAL: CAPITULO 1-PRELIMINARES			$ 23.168.963,00			$ 16.551,00		$ 23.152.413,00
2,0	EXCAVACIONES									
2,1	Excavaciones en material común	m³	370,00	$ 36.618,00	$ 13.548.660,00	(+)	1.160,05	$ 42.478.711,00	1.530,05	$ 56.027.371,00
2,2	Acarreo interno en obra en via peatonal o tramos superiores a 80m	m³	1.850,00	$ 19.117,00	$ 35.366.450,00	(+)	626,24	$ 11.971.830,00	2.476,24	$ 47.338.280,00
2,3	Cargue y Retiro de sobrantes hasta 24 Kmts a Maquina	m³	480,00	$ 47.480,00	$ 22.790.400,00	(+)	1.146,00	$ 54.412.080,00	1.626,00	$ 77.202.480,00
2,4	Gaviones, triple torsion,cal 12, suministro e instalacion	m³	163,00	$ 371.643,00	$ 60.577.809,00	(-)	0,94	$ 349.344,00	162,06	$ 60.228.465,00
2,5	Suministro de Recebo en zanja compactado c/ 15 Cms. Medio mecánico, incluye transporte a cualquier sitio del area Urbana	m³	550,00	$ 64.075,00	$ 35.241.250,00	(+)	750,56	$ 48.092.169,00	1.300,56	$ 83.333.419,00
2,6	Disipador de energia en concreto de 4000 psi (incluye acero de refuerzo, formaleta, curado e impermeabilización de la placa fondo y mortero de nivelacion) (Zona 1)	ml	0,00	$ 550.826,00	$ -	(=)	0,00	$ -	0,00	$ -
2,7	Canal sin filtro (0.35 x 0.35). (Incluye construcción de placa de fondo en concreto impermeabilizado, medias-añas,mortero de nivelacion y angulos metalicos). (Zona 1)	ml	30,00	$ 213.578,00	$ 6.407.340,00	(-)	9,23	$ 1.971.325,00	20,77	$ 4.436.015,00
2,8	Caja de entrega de 1.0x1.0x1,0m, en bloque recocido con recubrimiento en mortero 1:4 e=5cm fundido en sitio. (Incluye construccion de tapa tipo vehicular en concreto de 3000 psi reforzado y placa fondo en concreto impermeabilizado con mortero de nivelacion) (Zona 1)	und	1,00	$ 882.099,00	$ 882.099,00	(=)	0,00	$ -	1,00	$ 882.099,00
2,9	Concreto de 13,8 Mpa (2.000 PSI) Para Solado	m³	46,00	$ 529.114,00	$ 24.339.244,00	(-)	16,58	$ 8.772.710,00	29,42	$ 15.566.534,00
2,10	Mortero 1:3	m³	0,00	$ 551.719,00	$ -	(=)	0,00	$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL: CAPITULO 2-EXCAVACIONES			$ 199.153.252,00			$ 168.048.169,00		$ 345.014.663,00
3,0	MEDIDAS DE MITIGACION									
3,1	Viga cabezal sobre pilotes y/o columnas en concreto premezclado de 3500PSI (24.5MPa) (Incluye suministro, formaleteo en madera, colocación y curado. No incluye refuerzo) (Fila pilotes 1)	m³	17,43	$ 1.371.786,00	$ 23.910.230,00	(=)	0,00	$ -	17,43	$ 23.910.230,00
3,2	Viga cabezal sobre pilotes y/o columnas en concreto premezclado de 35000PSI (24.5MPa) (Incluye suministro, formaleteo en madera, colocación y curado. No incluye refuerzo) (Fila pilotes 2)	m³	0,00	$ 1.371.786,00	$ -	(+)	5,88	$ 8.066.102,00	5,88	$ 8.066.102,00
3,3	Pilotes en Concreto de 3500 PSI tipo Tremie, de 0.4 m de diámetro (incluye excavación manual, Descabece de pilote, suministro de concreto premezclado, curado). (Fila pilote 1)	ml	437,10	$ 1.285.348,00	$ 561.825.611,00	(-)	437,10	$ 561.825.611,00	0,00	$ -
3,4	Pilotes en Concreto de 3500 PSI tipo Tremie, de 0.4 m de diámetro (incluye excavación manual, Descabece de pilote, suministro de concreto premezclado, curado, incluye refuerzo) (Fila pilotes 2).	ml	163,89	$ 1.285.348,00	$ 210.651.090,00	(-)	1,14	$ 1.465.297,00	162,75	$ 209.185.793,00
3,5	Acero de refuerzo fy=60000 PSI (Se incluye el acero de refurzo para todas las obras proyectadas); Suministro e instalación de acuerdo a lo estipulado por la NSR-10, norma ASTM A-706, ICONTEC 2289 para el acero PDR-60. Incluye todos los costos de suministro de materiales (refuerzo (G60) figurado, corrugado, incluye el alambre de amarre), equipos, transportes, manejo, almacenamiento, desperdicios y mano de obra. (Fila pilote 1)	kg	5.495,00	$ 8.219,00	$ 45.163.405,00	(+)	991,88	$ 8.152.262,00	6.486,88	$ 53.315.667,00
3,6	Acero de refuerzo fy=60000 PSI (Se incluye el acero de refurzo para todas las obras proyectadas); Suministro e instalacion de acuerdo a lo estipulado por la NSR-10, norma ASTM A-706, ICONTEC 2289 para el acero PDR-60. Incluye todos los costos de suministro de materiales (refuerzo (G60) figurado, corrugado, incluye el alambre de amarre), equipos, transportes, manejo, almacenamiento, desperdicios y mano de obra. (Fila pilote 2)	kg	0,00	$ 8.219,00	$ -	(+)	1.730,00	$ 14.218.870,00	1.730,00	$ 14.218.870,00
		SUBTOTAL: CAPITULO 3-MEDIDAS DE MITIGACION			$ 841.550.336,00			$ 593.728.142,00		$ 308.696.662,00

CONTRATO DE OBRA N°. 053 DEL 03 DE ABRIL DE 2025
OBJETO: "CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA PARA AFECTACIÓN DE REMOCIÓN EN MASA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "PIEDRA PINTADA" PROPIEDAD DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL". IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"
CONTRATISTA: CONSORCIO 4KED-2025 - Representante Legal ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ
SUPERVISORES: CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA
HOMAR DAVID CALDERON

Valor Contrato:	$ 1.977.887.179,00
Plazo:	Tres (03) Meses
Fecha de Iniciacion:	09 de Mayo de 2025
Prorroga 1:	Cuarenta y Cinco (45) dias
Prorroga 2:	Cuarenta y Cinco (45) dias
Prorroga 3:	Noventa (90) dias
Fecha de Terminacion:	04 de Febrero de 2026
Fecha Presente Acta:	13 de Noviembre de 2025

CONDICIONES CONTRACTUALES Y/O ACTUALIZADAS						MODIFICACION N°. 04			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	ACTIVIDADES	UND	CANT	VR/ UNIT	VR/ TOTAL	(+/-)	CANT	VALOR	CANT	VR/TOTAL
N.P	ITEM NO PREVISTOS									
N.P 1	Demolición de cimientos y/o muros en concreto reforzado, en terreno (confinado - ladera- pendiente pronunciada entre el 60 % y el 70 %) profundidad prom h: 0,0 mts hasta 1,50 mts (no incluye acarreo interno, ni cargue y retiro de sobrantes)	m³	27,03	$ 1.003.225,00	$ 27.120.181,00	(=)	0,00	$ -	27,03	$ 27.120.181,00
N.P 2	Tratamiento silvicultural individuo arbóreo - poda de árboles de 10m. a 15m	und	14,00	$ 247.092,00	$ 3.459.288,00	(=)	0,00	$ -	14,00	$ 3.459.288,00
N.P 3	Rocería y limpieza de vegetación	m²	1.594,04	$ 2.158,00	$ 3.439.938,00	(=)	0,00	$ -	1.594,04	$ 3.439.938,00
N-P 4	Perforación en roca espacio confinado con equipo roto percutor hasta h= 2,0 mts hasta d=1,50 mts (incluye el uso de concreto expansivo)	und	0,00	$ 148.145,00	$ -	(=)	0,00	$ -	0,00	$ -
N-P 5	Suministro e instalacion Disipador de energia tipo 2 seccion transversal hasta h=1,50 mts b= 0,70mts e= 0,15 mts en concreto de 4000 psi (incluye placa de fondo en concreto, formaleta, curado). No incluye: acero de refuerzo, ni concreto pobre.	ml	26,30	$ 1.995.507,00	$ 52.481.834,00	(-)	0,17	$ 339.236,00	26,13	$ 52.142.598,00
N-P 6	Suministro e instalacion Disipador de energia tipo A seccion transversal hasta h=1,25 mts b= 0,70mts e= 0,15mts en concreto de 4000 psi (incluye placa de fondo en concreto,formaleta, curado). No incluye: acero de refuerzo, ni concreto pobre.	ml	10,43	$ 1.679.403,00	$ 17.516.173,00	(=)	0,00	$ -	10,43	$ 17.516.173,00
N-P 7	Suministro e instalacion Disipador seccion transversal tipo B h= 2,40mts b= 0,70 mts e= 0,15mts (incluye placa de fondo en concreto de 4000 psi , formaleta, curado). No incluye: acero de refuerzo, ni concreto pobre.	ml	4,98	$ 2.356.842,00	$ 11.737.073,00	(=)	0,00	$ -	4,98	$ 11.737.073,00
N-P 8	Suministro e instalacion Disipador seccion transversal tipo C h= 1,20 mts b= 0,70 mts e= 0,15mts (incluye placa de fondo en concreto de 4000 psi , formaleta, curado). No incluye: acero de refuerzo, ni concreto pobre.	ml	12,48	$ 1.259.950,00	$ 15.724.176,00	(-)	5,00	$ 6.299.750,00	7,48	$ 9.424.426,00
N-P 9	Suministro e instalacion canal 10 seccion transversal hasta h= 0,85 mts b= 0,60 mts e= 0,12mts (incluye placa de fondo en concreto de 3000 psi , formaleta, curado). No incluye: acero de refuerzo, ni concreto pobre.	ml	20,67	$ 708.953,00	$ 14.654.059,00	(+)	3,30	$ 2.339.545,00	23,97	$ 16.993.603,00
N-P 10	Pilotes en Concreto de 3500 PSI tipo Tremie de 0.41m hasta 0,50m de diámetro (incluye excavación manual, Descabece de pilote, curado) No incluye: acero de refuerzo (Fila pilotes 1 Y 2).	ml	210,20	$ 1.481.667,00	$ 311.446.403,00	(+)	264,10	$ 391.308.255,00	474,30	$ 702.754.658,00
		SUBTOTAL: N.P - ITEM NO PREVISTOS			$ 457.579.125,00			$ 400.286.786,00		$ 844.587.938,00
SUBTOTAL OBRAS (A)					$ 1.521.451.676,00			$ 1.162.079.648,00		$ 1.521.451.676,00
ADMINISTRACION 20% (1)					$ 304.290.335,00			$ 232.415.930,00		$ 304.290.335,00
IMPREVISTOS 5% (2)					$ 76.072.584,00			$ 58.103.982,00		$ 76.072.584,00
UTILIDAD 5% (3)					$ 76.072.584,00			$ 58.103.982,00		$ 76.072.584,00
COSTOS A.I.U. 30% (1+2+3) = (B)					$ 456.435.503,00			$ 348.623.894,00		$ 456.435.503,00
TOTAL OBRAS (A) + (B)					$ 1.977.887.179,00			$ 1.510.703.542,00		$ 1.977.887.179,00

ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ
R.L. CONSORCIO 4KED-2025
CONTRATISTA

HOMAR DAVID CALDERON
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
SUPERVISOR

CONTRATO DE OBRA N° 053 DEL 03 DE ABRIL DE 2025	
CONTRATANTE:	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
CONTRATISTA:	CONSORCIO 4KED-2025
OBJETO	CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA PARA AFECTACIÓN DE REMOCIÓN EN MASA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "PIEDRA PINTADA" PROPIEDAD DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL
VALOR:	MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS ($ 1.977.887.179) M/cte.
ANTICIPO	QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($ 593.366.154) MCTE
PLAZO:	TRES (03) MESES
SUPERVISORES:	CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA
	HOMAR DAVID CALDERON
FECHA DE INICIO:	09 DE MAYO DE 2025
PRORROGA No.1	45 días
PRORROGA No.2	45 días
PRORROGA No.3	90 días
FECHA DE TERMINACIÓN:	04 DE FEBRERO DE 2025

El 13 de Noviembre de 2025, se reunieron en la ciudad de Ibagué, los suscritos, a saber: **Ing. HOMAR DAVID CALDERON**, en su condición de Supervisor del Contrato, en nombre y representación de la **EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL**, identificada con NIT 800.089.809-6, de una parte; y por la otra, **ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ** identificada con Cédula de Ciudadanía N°. 52.020.033 de Bogotá, en su calidad de Representante Legal del Consorcio **4KED-2025**, identificada con NIT N°. 901.931.668-2, con el fin de modificar, revisar e incorporar las cantidades.

Se presentaron condiciones técnicas y operativas que hicieron necesario ejecutar mayores cantidades de obra respecto a las inicialmente previstas en el presupuesto oficial y en el plan de trabajo.

Estas variaciones fueron originadas por condiciones reales identificadas en campo, las cuales no podían ser determinadas con exactitud en la etapa de diseño o estructuración del contrato.

Los ítems que se describen a continuación son de carácter obligatorio para la ejecución de las diferentes actividades desarrolladas en la obra del Tanque de Piedra Pintada.

ITEM	ACTIVIDADES	UND	(+/-)	CANT	VALOR
1,0	**PRELIMINARES**				
1,1	Localización y replanteo con Aparato Topográfico	m²	(-)	2,18	$ 16.551,00
1,2	Señalización en guadua C/3 mts y Polisombra de h=2mts	m	(=)	0,00	$ -
1,3	Descapote a máquina en material común (E=0.1)	m²	(=)	0,00	$ -
2,0	**EXCAVACIONES**				
2,1	Excavaciones en material común	m³	(+)	1.160,05	$ 42.478.711,00
2,2	Acarreo interno en obra en via peatonal o tramos superiores a 80m	m³	(+)	626,24	$ 11.971.830,00
2,3	Cargue y Retiro de sobrantes hasta 24 Kmts a Maquina	m³	(+)	1.146,00	$ 54.412.080,00
2,4	Gaviones, triple torsion,cal 12, suministro e instalacion	m³	(-)	0,94	$ 349.344,00
2,5	Suministro de Recebo en zanja compactado c/ 15 Cms. Medio mecánico, Incluye transporte a cualquier sitio del area Urbana	m³	(+)	750,56	$ 48.092.169,00
2,6	Disipador de energia en concreto de 4000 psi (incluye acero de refuerzo, formaleta, curado e impermeabilización de la placa fondo y mortero de nivelacion) (Zona 1)	ml	(=)	0,00	$ -
2,7	Canal sin filtro (0.35 x 0.35). (Incluye construcción de placa de fondo en concreto impermeabilizado, mediacañas,mortero de nivelacion y angulos metalicos). (Zona 1)	ml	(-)	9,23	$ 1.971.325,00

2,8	Caja de entrega de 1.0x1.0x1,0m, en bloque recocido con recubrimiento en mortero 1:4 e=5cm fundido en sitio. (Incluye construccion de tapa tipo vehicular en concreto de 3000 psi reforzado y placa fondo en concreto impermeabilizado con mortero de nivelacion) (Zona 1)	und	(=)	0,00	$ -
2,9	Concreto de 13,8 Mpa (2.000 PSI) Para Solado	m^3	(-)	16,58	$ 8.772.710,00
2,10	Mortero 1:3	m^3	(=)	0,00	$ -
3,0	**MEDIDAS DE MITIGACION**				
3,1	Viga cabezal sobre pilotes y/o columnas en concreto premezclado de 3500PSI (24.5MPa) (Incluye suministro, formaleteo en madera, colocación y curado. No incluye refuerzo) (Fila pilotes 1)	m^3	(=)	0,00	$ -
3,2	Viga cabezal sobre pilotes y/o columnas en concreto premezclado de 35000PSI (24.5MPa) (Incluye suministro, formaleteo en madera, colocación y curado. No incluye refuerzo) (Fila pilotes 2)	m^3	(+)	5,88	$ 8.066.102,00
3,3	Pilotes en Concreto de 3500 PSI tipo Tremie, de 0.4 m de diámetro (incluye excavación manual, Descabece de pilote, suministro de concreto premezclado, curado). (Fila pilote 1)	ml	(-)	437,10	$ 561.825.611,00
3,4	Pilotes en Concreto de 3500 PSI tipo Tremie, de 0.4 m de diámetro (incluye excavación manual, Descabece de pilote, suministro de concreto premezclado, curado, incluye refuerzo) (Fila pilotes 2).	ml	(-)	1,14	$ 1.465.297,00
3,5	Acero de refuerzo fy=60000 PSI (Se incluye el acero de refurzo para todas las obras proyectadas); Suminsitro e instalación de acuerdo a lo estipulado por la NSR-10, norma ASTM A-706, ICONTEC 2289 para el acero PDR-60. Incluye todos los costos de suminsitro de materiales (refuerzo (G60) figurado, corrugado, incluye el alambre de amarre), equipos, transportes, manejo, almacenamiento, desperdicios y mano de obra. (Fila pilote 1)	kg	(+)	991,88	$ 8.152.262,00

3,6	Acero de refuerzo fy=60000 PSI (Se incluye el acero de refurzo para todas las obras proyectadas); Suminsitro e instalación de acuerdo a lo estipulado por la NSR-10, norma ASTM A-706, ICONTEC 2289 para el acero PDR-60. Incluye todos los costos de suminsitro de materiales (refuerzo (G60) figurado, corrugado, incluye el alambre de amarre), equipos, transportes, manejo, almacenamiento, desperdicios y mano de obra. (Fila pilote 2)	kg	(+)	1.730,00	$ 14.218.870,00
N.P	**ITEM NO PREVISTOS**				
N.P 1	Demolición de cimientos y/o muros en concreto reforzado, en terreno (confinado - ladera-pendiente pronunciada entre el 60 % y el 70 %) profundidad prom h: 0,0 mts hasta 1,50 mts (no incluye acarreo interno, ni cargue y retiro de sobrantes)	m^3	(=)	0,00	$ -
N.P 2	Tratamiento silvicultural individuo arbóreo - poda de árboles de 10m. a 15m	und	(=)	0,00	$ -
N.P 3	Rocería y limpieza de vegetación	m^2	(=)	0,00	$ -
N-P 4	Perforación en roca espacio confinado con equipo roto percutor hasta h= 2,0 mts hasta d=1,50 mts (incluye el uso de concreto expansivo)	und	(=)	0,00	$ -
N-P 5	Suministro e instalacion Disipador de energia tipo 2 seccion transversal hasta h=1,50 mts b= 0,70mts e= 0,15 mts en concreto de 4000 psi (incluye placa de fondo en concreto, formaleta, curado). No incluye: acero de refuerzo, ni concreto pobre.	ml	(-)	0,17	$ 339.236,00
N-P 6	Suministro e instalacion Disipador de energia tipo A seccion transversal hasta h=1,25 mts b= 0,70mts e= 0,15mts en concreto de 4000 psi (incluye placa de fondo en concreto,formaleta, curado). No incluye: acero de refuerzo, ni concreto pobre.	ml	(=)	0,00	$ -
N-P 7	Suministro e instalacion Disipador seccion transversal tipo B h= 2,40mts b= 0,70 mts e= 0,15mts (Incluye placa de fondo en concreto de 4000 psi , formaleta, curado). No incluye: acero de refuerzo, ni concreto pobre.	ml	(=)	0,00	$ -
N-P 8	Suministro e instalacion Disipador seccion transversal tipo C h= 1,20 mts b= 0,70 mts e= 0,15mts (Incluye placa de fondo en concreto de 4000 psi , formaleta, curado). No incluye: acero de refuerzo, ni concreto pobre.	ml	(-)	5,00	$ 6.299.750,00

N-P 9	Suministro e instalacion canal 10 seccion transversal hasta h= 0,85 mts b= 0,60 mts e= 0,12mts (Incluye placa de fondo en concreto de 3000 psi , formaleta, curado). No incluye: acero de refuerzo, ni concreto pobre.	ml	(+)	3,30	$ 2.339.545,00
N-P 10	Pilotes en Concreto de 3500 PSI tipo Tremie de 0.41m hasta 0,50m de diámetro (incluye excavación manual, Descabece de pilote, curado) No incluye: acero de refuerzo (Fila pilotes 1 Y 2).	ml	(+)	264,10	$ 391.308.255,00

Analizando lo anterior, se determinó que, es necesaria La identificación de estas variaciones posibilita ajustar los pagos, anticipar sobrecostos o aplicar deducciones cuando corresponda, garantizando así el uso adecuado y eficiente de los recursos económicos asignados a la obra, por lo tanto, las partes acuerdan:

1. Actualizar las cantidades que se requieren para cumplir a cabalidad con la ejecución de este.

2. El contratista se compromete a ejecutar las cantidades anteriormente descritos a los precios aquí descritos.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron,

ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ
R.L CONSORCIO 4KED-2025
CONTRATISTA


HOMAR DAVID CALDERON
SUPERVISOR IBAL

IBAL S.A E.S.P
MEMORIA DE CANTIDADES

ACTA PARCIAL	4	CONTRATO No.	053 DEL 03 DE ABRIL DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO	" CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA PARA AFECTACIÓN DE REMOCIÓN EN MASA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "PIEDRA PINTADA" PROPIEDAD DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL". IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"		
CONTRATISTA	CONSORCIO 4KED-2025	R.L.	ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ
SUPERVISIÓN	IBAL S.A. ESP OFICIAL		CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA HOMAR DAVID CALDERON

CAPÍTULO	1	ITEM	1.1	DESCRIPCION ITEM	PRELIMINARES Localización y replanteo con Aparato Topográfico	UNID.	m2	OBRA: Tanque Piedra Pintada



BARRIO PIEDRA PINTADA

UBICACIÓN Y/O DESCRIPCION	Dimensiones			Medida Total
	largo	ancho	alto	
CANAL 10 (DESPUES DE CAJA)				
	3,30	0,80		2,64
TOTAL				2,64
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA				2,64
CANTIDAD EJECUTADA ACTAS ANTERIORES				1.408,62
CANTIDAD ACUMULADA				1.411,26

OBSERVACIONES:

CONSORCIO 4KED-2025
ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ
CONTRATISTA


IBAL S.A. ESP OFICIAL
HOMAR DAVID CALDERON
SUPERVISOR

IBAL S.A E.S.P
MEMORIA DE CANTIDADES

ACTA PARCIAL	4	CONTRATO No.	053 DEL 03 DE ABRIL DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO	" CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA PARA AFECTACIÓN DE REMOCIÓN EN MASA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "PIEDRA PINTADA" PROPIEDAD DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL". IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"		
CONTRATISTA	CONSORCIO 4KED-2025	R.L.	ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ
SUPERVISIÓN	IBAL S.A. ESP OFICIAL		CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA
			HOMAR DAVID CALDERON

CAPÍTULO	2	EXCAVACIONES							
ITEM	2.1	DESCRIPCION ITEM	Excavaciones en material común	UNID.	m3	OBRA	Tanque Piedra Pintada		

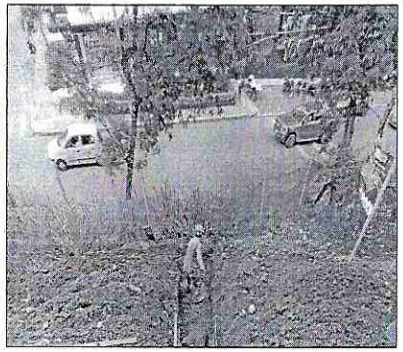

BARRIO PIEDRA PINTADA

UBICACIÓN Y/O DESCRIPCION	Dimensiones			Medida Total
	largo	ancho	alto	
CANAL 10 (DESPUES DE CAJA)				
ESCALON 1	1,10	0,8	0,95	0,84
ESCALON 2	1,00	0,8	1,06	0,85
ESCALON 3	1,20	0,8	0,47	0,45
TOTAL				2,14
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA				2,14
CANTIDAD EJECUTADA ACTAS ANTERIORES				317,91
CANTIDAD ACUMULADA				320,05

OBSERVACIONES:

CONSORCIO 4KED-2025
ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ
CONTRATISTA

IBAL S.A. ESP OFICIAL
HOMAR DAVID CALDERON
SUPERVISOR


IBAL S.A E.S.P
MEMORIA DE CANTIDADES

ACTA PARCIAL	4	CONTRATO No.	053 DEL 03 DE ABRIL DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO	" CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA PARA AFECTACIÓN DE REMOCIÓN EN MASA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "PIEDRA PINTADA" PROPIEDAD DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL". IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"		
CONTRATISTA	CONSORCIO 4KED-2025	R.L.	ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ
SUPERVISIÓN	IBAL S.A. ESP OFICIAL		CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA HOMAR DAVID CALDERON

CAPÍTULO	2	ITEM	2.2	DESCRIPCION ITEM	EXCAVACIONES Acarreo interno en obra en via peatonal o tramos superiores a 80m	UNID.	m3	OBRA	Tanque Piedra Pintada



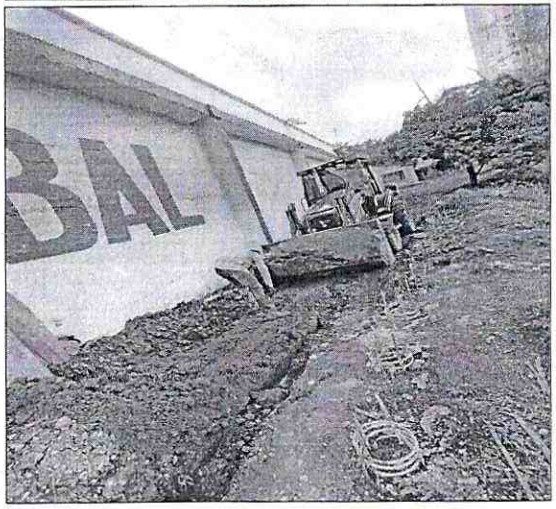

BARRIO PIEDRA PINTADA

UBICACIÓN Y/O DESCRIPCION	Dimensiones			cantidad	Medida Total
	largo	ancho	alto		
EXCAVACIONES					
CANAL 10 (DESPUES DE CAJA)					
ESCALON 1	1,10	0,8	0,95		0,84
ESCALON 2	1,00	0,8	1,06		0,85
ESCALON 3	1,20	0,8	0,47		0,45
SOLADOS DE LIMPIEZA					
CANAL 10 (DESPUES DE CAJA)					
ESCALON 1	1,10	0,8	0,05		0,04
ESCALON 2	1,00	0,8	0,05		0,05
ESCALON 3	1,20	0,8	0,05		0,05
CONCRETOS					
DISIPADOR 2 ESCALON 13					
PISOS	1,83	0,7	0,15		0,19
MUROS	1,83	1	0,15	2	0,55
CAIDAS	1,00	0,7	0,15		0,11
CANAL 10 (ALEDAÑA A DISIPADOR 2)					
PISOS	4,65	0,6	0,1		0,28
MUROS	4,65	0,85	0,12	2	0,95
CANAL 10 (DESPUES DE CAJA)					
PISOS	3,30	0,6	0,1		0,20
MUROS	1,21	1,01	0,12	2	0,29
CAIDAS	0,57	0,35	0,1	2	0,04
CAJA DE INSPECCION					
				0,81	0,81
TRASIEGO DE RECEBO					
PILOTES					12,11
DISIPADOR 2					11,76
PILOTES FILA 1 EXCAVACIONES					
PILOTE 28				0,69	0,69
PILOTE 29				0,68	0,68
PILOTE 30				0,72	0,72
PILOTE 31				0,72	0,72
PILOTE 32				0,68	0,68
PILOTE 33				0,68	0,68
PILOTE 34				0,69	0,69
PILOTE 35				0,70	0,70
PILOTE 36				0,70	0,70
PILOTE 37				0,70	0,70
PILOTE 38				0,70	0,70
PILOTE 39				0,69	0,69
PILOTE 40				0,70	0,70
PILOTE 41				0,71	0,71
PILOTE 42				0,71	0,71
PILOTE 43				0,74	0,74
PILOTE 44				0,74	0,74
PILOTE 45				0,74	0,74
PILOTE 46				0,75	0,75

IBAL S.A E.S.P
MEMORIA DE CANTIDADES

ACTA PARCIAL	4	CONTRATO No.	053 DEL 03 DE ABRIL DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO	" CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA PARA AFECTACIÓN DE REMOCIÓN EN MASA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "PIEDRA PINTADA" PROPIEDAD DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL", IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"		
CONTRATISTA	CONSORCIO 4KED-2025	R.L.	ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ
SUPERVISIÓN	IBAL S.A. ESP OFICIAL		CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA HOMAR DAVID CALDERON

CAPÍTULO	2	ITEM	2.2	DESCRIPCION ITEM	EXCAVACIONES Acarreo interno en obra en via peatonal o tramos superiores a 80m	UNID.	m3	OBRA	Tanque Piedra Pintada





PILOTE 47				0,73	0,73
PILOTE 48				0,73	0,73
PILOTE 49				0,73	0,73
PILOTE 50				0,72	0,72
PILOTE 51				0,71	0,71
PILOTE 52				0,70	0,70
PILOTE 53				0,69	0,69
PILOTE 54				0,65	0,65
PILOTE 55				0,72	0,72
PILOTE 56				0,65	0,65
PILOTE 57				0,64	0,64
PILOTE 61				0,66	0,66
PILOTE 62				0,64	0,64
PILOTE 63				0,65	0,65
PILOTE 64				0,65	0,65
PILOTE 65				0,65	0,65
PILOTE 66				0,65	0,65
PILOTE 67				0,72	0,72
PILOTE 68				0,65	0,65
PILOTE 69				0,72	0,72
PILOTE 70				0,65	0,65
PILOTE 71				0,71	0,71
PILOTE 72				0,65	0,65
PILOTE 73				0,64	0,64
PILOTE 74				0,65	0,65
PILOTE 75				0,66	0,66
PILOTE 76				0,66	0,66
PILOTE 77				0,66	0,66
PILOTE 78				0,66	0,66
PILOTE 79				0,66	0,66
PILOTE 80				0,66	0,66
PILOTE 81				0,66	0,66
PILOTE 82				0,66	0,66
PILOTE 83				0,66	0,66
PILOTE 85				0,66	0,66
TOTAL					66,53
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA					66,53
CANTIDAD EJECUTADA ACTAS ANTERIORES					654,54
CANTIDAD ACUMULADA					721,08

OBSERVACIONES:

ANA GLADYS CHUCHOQUE

CONSORCIO 4KED-2025
ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ
CONTRATISTA


IBAL S.A. ESP OFICIAL
HOMAR DAVID CALDERON
SUPERVISOR


IBAL S.A E.S.P
MEMORIA DE CANTIDADES

ACTA PARCIAL	4	CONTRATO No.	053 DEL 03 DE ABRIL DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO	" CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA PARA AFECTACIÓN DE REMOCIÓN EN MASA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "PIEDRA PINTADA" PROPIEDAD DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL". IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"		
CONTRATISTA	CONSORCIO 4KED-2025	R.L.	ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ
SUPERVISIÓN	IBAL S.A. ESP OFICIAL		CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA
			HOMAR DAVID CALDERON

CAPÍTULO	EXCAVACIONES							
	2	ITEM	2.3	DESCRIPCION ITEM	Cargue y Retiro de sobrantes hasta 24 Kmts a Maquina	UNID.	m3	OBRA	Tanque Piedra Pintada

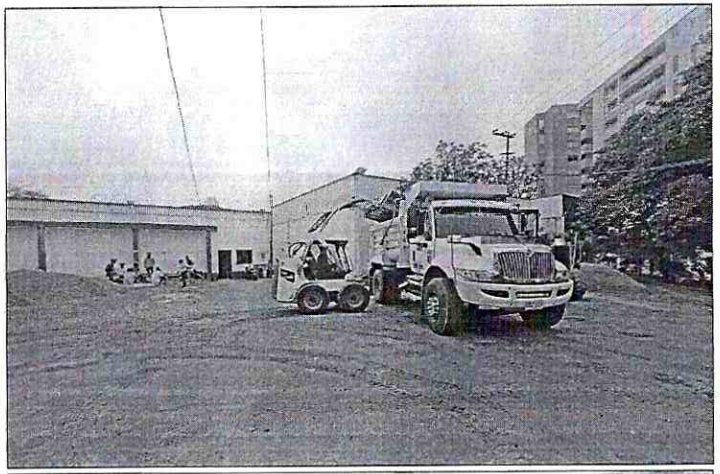

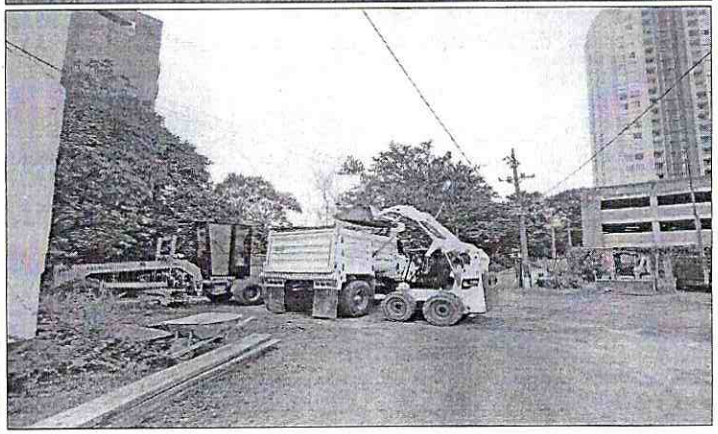

BARRIO PIEDRA PINTADA

UBICACIÓN Y/O DESCRIPCION	Dimensiones			Medida Total
	largo	ancho	alto	
EXCAVACIÓN				
CANAL 10 (DESPUES DE CAJA)				
ESCALON 1	1,10	0,8	0,95	0,84
ESCALON 2	1,00	0,8	1,06	0,85
ESCALON 3	1,20	0,8	0,47	0,45
PILOTES FILA 1 EXCAVACIONES				
PILOTE 28			0,69	0,69
PILOTE 29			0,68	0,68
PILOTE 30			0,72	0,72
PILOTE 31			0,72	0,72
PILOTE 32			0,68	0,68
PILOTE 33			0,68	0,68
PILOTE 34			0,69	0,69
PILOTE 35			0,70	0,70
PILOTE 36			0,70	0,70
PILOTE 37			0,70	0,70
PILOTE 38			0,70	0,70
PILOTE 39			0,69	0,69
PILOTE 40			0,70	0,70
PILOTE 41			0,71	0,71
PILOTE 42			0,71	0,71
PILOTE 43			0,74	0,74
PILOTE 44			0,74	0,74
PILOTE 45			0,74	0,74
PILOTE 46			0,75	0,75
PILOTE 47			0,73	0,73
PILOTE 48			0,73	0,73
PILOTE 49			0,73	0,73
PILOTE 50			0,72	0,72
PILOTE 51			0,71	0,71
PILOTE 52			0,70	0,70
PILOTE 53			0,69	0,69
PILOTE 54			0,65	0,65
PILOTE 55			0,72	0,72
PILOTE 56			0,65	0,65
PILOTE 57			0,64	0,64
PILOTE 61			0,66	0,66
PILOTE 62			0,64	0,64

IBAL S.A E.S.P
MEMORIA DE CANTIDADES

ACTA PARCIAL	4	CONTRATO No.	053 DEL 03 DE ABRIL DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO	" CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA PARA AFECTACIÓN DE REMOCIÓN EN MASA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "PIEDRA PINTADA" PROPIEDAD DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL". IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"		
CONTRATISTA	CONSORCIO 4KED-2025	R.L.	ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ
SUPERVISIÓN	IBAL S.A. ESP OFICIAL		CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA
			HOMAR DAVID CALDERON

CAPÍTULO	2	ITEM	2.3	DESCRIPCION ITEM	EXCAVACIONES Cargue y Retiro de sobrantes hasta 24 Kmts a Maquina	UNID.	m3	OBRA	Tanque Piedra Pintada



PILOTE 63			0,65	0,65
PILOTE 64			0,65	0,65
PILOTE 65			0,65	0,65
PILOTE 66			0,65	0,65
PILOTE 67			0,72	0,72
PILOTE 68			0,65	0,65
PILOTE 69			0,72	0,72
PILOTE 70			0,65	0,65
PILOTE 71			0,71	0,71
PILOTE 72			0,65	0,65
PILOTE 73			0,64	0,64
PILOTE 74			0,65	0,65
PILOTE 75			0,66	0,66
PILOTE 76			0,66	0,66
PILOTE 77			0,66	0,66
PILOTE 78			0,66	0,66
PILOTE 79			0,66	0,66
PILOTE 80			0,66	0,66
PILOTE 81			0,66	0,66
PILOTE 82			0,66	0,66
PILOTE 83			0,66	0,66
PILOTE 85			0,66	0,66
TOTAL				39,11
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA				39,11
CANTIDAD EJECUTADA ACTAS ANTERIORES				400,56
CANTIDAD ACUMULADA				439,67

OBSERVACIONES:

ANA GLADYS CHUCHOQUE R

CONSORCIO 4KED-2025
ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ
CONTRATISTA

IBAL S.A. ESP OFICIAL
HOMAR DAVID CALDERON
SUPERVISOR

IBAL S.A E.S.P
MEMORIA DE CANTIDADES

ACTA PARCIAL	4	CONTRATO No.	053 DEL 03 DE ABRIL DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO	" CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA PARA AFECTACIÓN DE REMOCIÓN EN MASA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "PIEDRA PINTADA" PROPIEDAD DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL". IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"		
CONTRATISTA	CONSORCIO 4KED-2025	R.L.	ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ
SUPERVISIÓN	IBAL S.A. ESP OFICIAL		CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA HOMAR DAVID CALDERON

EXCAVACIONES

CAPÍTULO	2	ITEM	2.5	DESCRIPCION ITEM	Suministro de Recebo en zanja compactado c/ 15 Cms. Medio mecánico, Incluye transporte a cualquier sitio del area Urbana	UNID.	m3	OBRA	Tanque Piedra Pintada





BARRIO PIEDRA PINTADA

UBICACIÓN Y/O DESCRIPCION	Dimensiones			Medida Total
	largo	ancho	alto	
TRINCHOS EN RECEBO				
PILOTES 28 - 29	2,50	1,3	0,8	2,60
PILOTES 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36	4,80	1,5	0,8	5,76
PILOTES 36 - 37 - 38 - 39 - 40	3,00	0,5	0,4	0,60
PILOTES 57 - 58 - 59 - 60	3,00	1,5	0,7	3,15
DISIPADOR 2				
LLENO DE COSTADOS	26,13	0,45	1	11,76

OBSERVACIONES: PARA PODER EXCAVAR LOS PILOTES DE LA FILA 1, YA QUE SE ENCONTRABA SOBRE LA LADERA.

TOTAL	23,87
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA	23,87
CANTIDAD EJECUTADA ACTAS ANTERIORES	32,43
CANTIDAD ACUMULADA	56,30

ANA GLADYS CHUCHOQUE

CONSORCIO 4KED-2025
ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ
CONTRATISTA

IBAL S.A. ESP OFICIAL
HOMAR DAVID CALDERON
SUPERVISOR

IBAL S.A E.S.P
MEMORIA DE CANTIDADES

ACTA PARCIAL	4	CONTRATO No.		053 DEL 03 DE ABRIL DE 2025	
OBJETO DEL CONTRATO	" CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA PARA AFECTACIÓN DE REMOCIÓN EN MASA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "PIEDRA PINTADA" PROPIEDAD DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL". IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"				
CONTRATISTA	CONSORCIO 4KED-2025	R.L.	ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ		
SUPERVISIÓN	IBAL S.A. ESP OFICIAL		CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA HOMAR DAVID CALDERON		

CAPÍTULO	2	ITEM	2.9	DESCRIPCION ITEM	EXCAVACIONES Concreto de 13,8 Mpa (2.000 PSI) Para Solado	UNID.	m3	OBRA	Tanque Piedra Pintada



BARRIO PIEDRA PINTADA

UBICACIÓN Y/O DESCRIPCION	Dimensiones			Medida Total
	largo	ancho	alto	
CANAL 10 (DESPUES DE CAJA)				
ESCALON 1	1,10	0,8	0,05	0,04
ESCALON 2	1,00	0,8	0,05	0,04
ESCALON 3	1,20	0,8	0,05	0,05
TOTAL				0,13
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA				0,13
CANTIDAD EJECUTADA ACTAS ANTERIORES				24,90
CANTIDAD ACUMULADA				25,03

OBSERVACIONES:

Ana Gladys Chuchoque R

CONSORCIO 4KED-2025
ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ
CONTRATISTA


IBAL S.A. ESP OFICIAL
HOMAR DAVID CALDERON
SUPERVISOR

IBAL S.A E.S.P
MEMORIA DE CANTIDADES

ACTA PARCIAL	4	CONTRATO No.	053 DEL 03 DE ABRIL DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO	" CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA PARA AFECTACIÓN DE REMOCIÓN EN MASA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "PIEDRA PINTADA" PROPIEDAD DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL". IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"		
CONTRATISTA	CONSORCIO 4KED-2025	R.L.	ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ
SUPERVISIÓN	IBAL S.A. ESP OFICIAL		CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA HOMAR DAVID CALDERON

CAPÍTULO	3	ITEM	3.5	DESCRIPCION ITEM	MEDIDAS DE MITIGACION Acero de refuerzo fy=60000 PSI (Se incluye el acero de refurzo para todas las obras proyectadas); Suminsitro e instalación de acuerdo a lo estipulado por la NSR-10, norma ASTM A-706, ICONTEC 2289 para el acero PDR-60. Incluye todos los costos de suminsitro de materiales (refuerzo (G60) figurado, corrugado, incluye el alambre de amarre), equipos, transportes, manejo, almacenamiento, desperdicios y mano de obra. (Fila pilote 1)	UMD.	kg	OBRA	Tanque Piedra Pintada

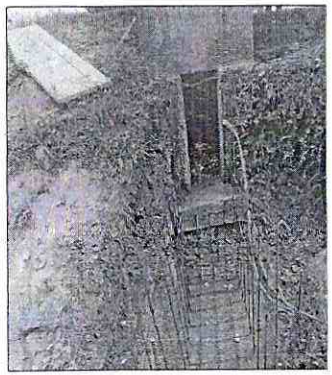

BARRIO PIEDRA PINTADA

UBICACIÓN Y/O DESCRIPCION	Dimensiones CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD VARILLAS POR	CANTIDAD TOTAL	# BARRA	LONGITUD CORTE (M)	LONGITUD TOTAL (M)	Medida Total (KG)
CANAL 10 (DESPUES DE CAJA)							
ESCALON 1							
LAS (U)	1	6	6,00	3	2,24	13,44	7,53
PISO	1	4	4,00	3	1,88	7,52	4,21
MUROS LATERALES	2	2	4,00	3	1,21	4,84	2,71
CAIDAS	1	4	4,00	3	8,50	34,00	19,04
ESCALON 2							
LAS (U)	1	2	2,00	3	3,90	7,80	4,37
	1	4	4,00	3	2,30	9,20	5,15
PISO	1	4	4,00	3	2,00	8,00	4,48
MUROS LATERALES	2	2	4,00	3	1,27	5,08	2,84
CAIDAS	1	3	3,00	3	8,50	25,50	14,28
ESCALON 3							
LAS (U)	1	3	3,00	3	3,30	9,90	5,54
	1	4	4,00	3	1,48	5,92	3,32
	1	1	1,00	3	0,84	0,84	0,47
PISO	1	4	4,00	3	1,70	6,80	3,81
MUROS LATERALES	1	2	2,00	3	1,00	2,00	1,12
TOTAL							78,87
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA							78,87
CANTIDAD EJECUTADA ACTAS ANTERIORES							5.159,99
CANTIDAD ACUMULADA							5.238,86

OBSERVACIONES:

CONSORCIO 4KED-2025
ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ
CONTRATISTA

IBAL S.A. ESP OFICIAL
HOMAR DAVID CALDERON
SUPERVISOR


IBAL S.A E.S.P
MEMORIA DE CANTIDADES

ACTA PARCIAL	4	CONTRATO No.	053 DEL 09 DE MAYO DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO	" CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA PARA AFECTACIÓN DE REMOCIÓN EN MASA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "PIEDRA PINTADA" PROPIEDAD DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL". IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"		
CONTRATISTA	CONSORCIO 4KED-2025	R.L.	ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ
SUPERVISIÓN	IBAL S.A. ESP OFICIAL		CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA HOMAR DAVID CALDERON

ITEM NO PREVISTOS

CAPÍTULO	N.P	ITEM	N.P 9	DESCRIPCION ITEM		UNID.	ml	OBRA	Tanque Piedra Pintada
					Suministro e instalacion canal 10 seccion transversal hasta h= 0,85 mts b= 0,60 mts e= 0,12mts (Incluye placa de fondo en concreto de 3000 psi , formaleta, curado). No incluye: acero de refuerzo, ni concreto pobre.				

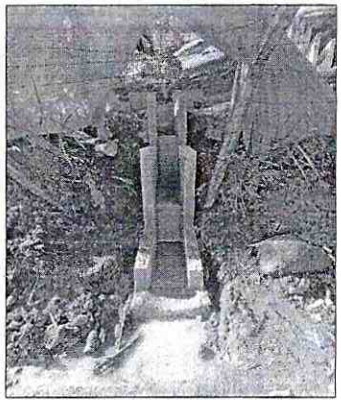

BARRIO PIEDRA PINTADA

UBICACIÓN Y/O DESCRIPCION	Dimensiones			Medida Total
	largo	ancho	alto	
CANAL 10 (DESPUES DE CAJA)				
	3,30			3,30

TOTAL	3,30
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA	3,30
CANTIDAD EJECUTADA ACTAS ANTERIORES	20,67
CANTIDAD ACUMULADA	23,97

OBSERVACIONES:

ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ
CONSORCIO 4KED-2025
ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ
CONTRATISTA

IBAL S.A. ESP OFICIAL
HOMAR DAVID CALDERON
SUPERVISOR


IBAL S.A E.S.P
MEMORIA DE CANTIDADES

ACTA PARCIAL	4	CONTRATO No.	053 DEL 09 DE MAYO DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO	" CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA PARA AFECTACIÓN DE REMOCIÓN EN MASA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "PIEDRA PINTADA" PROPIEDAD DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL". IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"		
CONTRATISTA	CONSORCIO 4KED-2025	R.L.	ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ
SUPERVISIÓN	IBAL S.A. ESP OFICIAL		CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA HOMAR DAVID CALDERON

CAPÍTULO	N.P	ITEM	N.P 10	DESCRIPCION ITEM		UNID.		OBRA	
	ITEM NO PREVISTOS				Pilotes en Concreto de 3500 PSI tipo Tremie de 0.41m hasta 0,50m de diámetro (incluye excavación manual, Descabece de pilote, curado) No incluye: acero de refuerzo (Fila pilotes 1 Y 2).		ml		Tanque Piedra Pintada



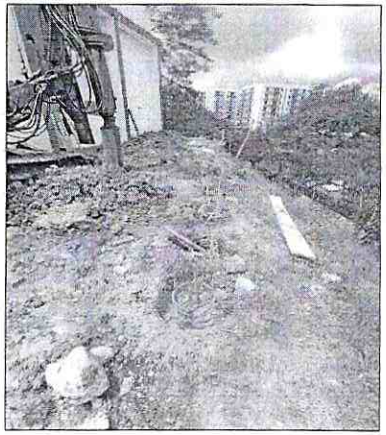

BARRIO PIEDRA PINTADA

UBICACIÓN Y/O DESCRIPCION	Dimensiones			Medida Total
	largo	ancho	alto	
PILOTE 28			4,65	4,65
PILOTE 29			4,65	4,65
PILOTE 30			4,65	4,65
PILOTE 31			4,65	4,65
PILOTE 32			4,65	4,65
PILOTE 33			4,65	4,65
PILOTE 34			4,65	4,65
PILOTE 35			4,65	4,65
PILOTE 36			4,65	4,65
PILOTE 37			4,65	4,65
PILOTE 38			4,65	4,65
PILOTE 39			4,65	4,65
PILOTE 40			4,65	4,65
PILOTE 41			4,65	4,65
PILOTE 42			4,65	4,65
PILOTE 43			4,65	4,65
PILOTE 44			4,65	4,65
PILOTE 45			4,65	4,65
PILOTE 46			4,65	4,65
PILOTE 47			4,65	4,65
PILOTE 48			4,65	4,65
PILOTE 49			4,65	4,65
PILOTE 50			4,65	4,65
PILOTE 51			4,65	4,65
PILOTE 52			4,65	4,65
PILOTE 53			4,65	4,65
PILOTE 54			4,65	4,65
PILOTE 55			4,65	4,65
PILOTE 56			4,65	4,65
PILOTE 57			4,65	4,65
PILOTE 61			4,65	4,65
PILOTE 62			4,65	4,65
PILOTE 63			4,65	4,65
PILOTE 64			4,65	4,65
PILOTE 65			4,65	4,65
PILOTE 66			4,65	4,65
PILOTE 67			4,65	4,65

IBAL S.A E.S.P
MEMORIA DE CANTIDADES

ACTA PARCIAL	4	CONTRATO No.	053 DEL 09 DE MAYO DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO	" CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA PARA AFECTACIÓN DE REMOCIÓN EN MASA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "PIEDRA PINTADA" PROPIEDAD DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL". IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"		
CONTRATISTA	CONSORCIO 4KED-2025	R.L.	ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ
SUPERVISIÓN	IBAL S.A. ESP OFICIAL		CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA HOMAR DAVID CALDERON

ITEM NO PREVISTOS

CAPÍTULO	N.P	ITEM	N.P 10	DESCRIPCION ITEM	Pilotes en Concreto de 3500 PSI tipo Tremie de 0.41m hasta 0,50m de diámetro (incluye excavación manual, Descabece de pilote, curado) No incluye: acero de refuerzo (Fila pilotes 1 Y 2).	UNID.	ml	OBRA	Tanque Piedra Pintada



PILOTE 68			4,65	4,65
PILOTE 69			4,65	4,65
PILOTE 70			4,65	4,65
PILOTE 71			4,65	4,65
PILOTE 72			4,65	4,65
PILOTE 73			4,65	4,65
PILOTE 74			4,65	4,65
PILOTE 75			4,65	4,65
PILOTE 76			4,65	4,65
PILOTE 77			4,65	4,65
PILOTE 78			4,65	4,65
PILOTE 79			4,65	4,65
PILOTE 80			4,65	4,65
PILOTE 81			4,65	4,65
PILOTE 82			4,65	4,65
PILOTE 83			4,65	4,65
PILOTE 85			4,65	4,65
TOTAL				251,10
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA				251,10
CANTIDAD EJECUTADA ACTAS ANTERIORES				209,25
CANTIDAD ACUMULADA				460,35

OBSERVACIONES:

ANA GLADYS CHUCHOQUE R.
CONSORCIO 4KED-2025
ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ
CONTRATISTA

IBAL S.A. ESP OFICIAL
HOMAR DAVID CALDERON
SUPERVISOR

CONTRATO DE OBRA No. : 053 DEL 03 DE ABRIL DE 2025
OBJETO : " CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA PARA AFECTACIÓN DE REMOCIÓN EN MASA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO " PIEDRA PINTADA" PROPIEDAD DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL". IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CONTRATISTA: CONSORCIO 4KED-2025
REPRESENTANTE LEGAL: ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ
SUPERVISORES: CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA, HOMAR DAVID CALDERON

VALOR CONTRATO : $ 1.977.887.179,00
PLAZO : Tres (03) Meses
VALOR ANTICIPO : $ 593.366.154,00
FECHA DE INICIACION : 9/05/2025
PRORROGA 1: CUATENTA Y CINCO DIAS
PRORROGA 2: CUATENTA Y CINCO DIAS
PRORROGA 3: NOVENTA DIAS
FECHA DE TERMINACION : 4/02/2026
FECHA DE ELABORACION PRESENTE ACTA : 13/11/2025
FECHA PERIODO DE EJECUCION PRESENTE ACTA : 05/10/2025 a 01/11/2025
VALOR PRESENTE ACTA : $ 493.818.676,00

ITEM	DETALLE	UND	CPC CÓDIGO	CPC DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES Y/O ACTUALIZADAS CANT.	V/UNIT	V/ TOTAL	ACUMULADO ACTAS PARCIALES CANT.	V/ TOTAL	PRESENTE ACTA CANT.	VALOR	ACUMULADO TOTAL CANT.	V/TOTAL
1,0	PRELIMINARES												
1,1	Localización y replanteo con Aparato Topográfico	m2	53290	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTROS DE	1.411,26	$ 7.592,00	$ 10.714.286,00	1408,62	$ 10.694.273,00	2,64	$ 20.043,00	1.411,26	$ 10.714.316,00
1,2	Señalización en guadua C/3 mts y Polisombra de h=2mts	m			157,49	$ 20.089,00	$ 3.163.817,00	157,49	$ 3.163.817,00	0,00	$ -	157,49	$ 3.163.817,00
1,3	Descapote a máquina en material común (E=0.1)	m2			827,62	$ 11.206,00	$ 9.274.310,00	203,02	$ 2.275.020,00	0,00	$ -	203,02	$ 2.275.020,00
				SUBTOTAL: CAPITULO 1-PRELIMINARES			$ 23.152.413,00				$ 20.043,00		$ 16.153.153,00
2,0	EXCAVACIONES												
2,1	Excavaciones en material común	m3			1.530,05	$ 36.618,00	$ 56.027.371,00	317,91	$ 11.641.223,00	2,14	$ 78.187,00	320,05	$ 11.719.410,00
2,2	Acarreo interno en obra en via peatonal o tramos superiores a 80m	m3			2.476,24	$ 19.117,00	$ 47.338.280,00	654,54	$ 12.512.908,00	66,53	$ 1.271.903,00	721,08	$ 13.784.811,00
2,3	Cargue y Retiro de sobrantes hasta 24 Kmts a Maquina	m3			1.626,00	$ 47.480,00	$ 77.202.480,00	400,56	$ 19.018.784,00	39,11	$ 1.856.805,00	439,67	$ 20.875.589,00
2,4	Gaviones, triple torsion,cal 12, suministro e instalacion	m3			162,06	$ 371.643,00	$ 60.228.465,00	162,06	$ 60.228.465,00		$ -	162,06	$ 60.228.465,00
2,5	Suministro de Recebo en zanja compactado c/ 15 Cms. Medio mecánico, Incluye transporte a cualquier sitio del area Urbana	m3			1.300,56	$ 64.075,00	$ 83.333.419,00	32,43	$ 2.078.189,00	23,87	$ 1.529.374,00	56,30	$ 3.607.563,00
2,6	Disipador de energia en concreto de 4000 psi (Incluye acero de refuerzo, formaleta, curado e impermeabilización de la placa fondo y mortero de nivelacion) (Zona 1)	ml	53290	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTROS DE AGUAS, EXCEPTO GASODUCTOS-RECURSOS PROPIOS	0,00	$ 550.826,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,7	Canal sin filtro (0.35 x 0.35). (Incluye construcción de placa de fondo en concreto impermeabilizado, mediacañas,mortero de nivelacion y angulos metalicos). (Zona 1)	ml			20,77	$ 213.578,00	$ 4.436.015,00	20,77	$ 4.436.015,00	0,00	$ -	20,77	$ 4.436.015,00
2,8	Caja de entrega de 1.0x1.0x1,0m, en bloque recocido con recubrimiento en mortero 1:4 e=5cm fundido en sitio. (Incluye construccion de tapa tipo vehicular en concreto de 3000 psi reforzado y placa fondo en concreto impermeabilizado con mortero de nivelacion) (Zona 1)	und			1,00	$ 882.099,00	$ 882.099,00	1,00	$ 882.099,00	0,00	$ -	1,00	$ 882.099,00
2,9	Concreto de 13,8 Mpa (2.000 PSI) Para Solado	m3			29,42	$ 529.114,00	$ 15.566.534,00	24,90	$ 13.174.859,00	0,13	$ 69.843,00	25,03	$ 13.244.702,00
2,10	Mortero 1:3	m3			0,00	$ 551.719,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
				SUBTOTAL: CAPITULO 2-EXCAVACIONES			$ 345.014.663,00				$ 4.806.112,00		$ 128.778.654,00
3,0	MEDIDAS DE MITIGACION												
3,1	Viga cabezal sobre pilotes y/o columnas en concreto premezclado de 3500PSI (24.5MPa) (Incluye suministro, formaleteo en madera, colocación y curado. No incluye refuerzo) (Fila pilotes 1)	m^3	53290	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTROS DE AGUAS, EXCEPTO GASODUCTOS-RECURSOS PROPIOS	17,43	$ 1.371.786,00	$ 23.910.230,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,2	Viga cabezal sobre pilotes y/o columnas en concreto premezclado de 35000PSI (24.5MPa) (Incluye suministro, formaleteo en madera, colocación y curado. No incluye refuerzo) (Fila pilotes 2)	m^3			5,88	$ 1.371.786,00	$ 8.066.102,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,3	Pilotes en Concreto de 3500 PSI tipo Tremie, de 0.4 m de diámetro (Incluye excavación manual, Descabece de pilote, suministro de concreto premezclado, curado). (Fila pilote 1)	ml			0,00	$ 1.285.348,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,4	Pilotes en Concreto de 3500 PSI tipo Tremie, de 0.4 m de diámetro (Incluye excavación manual, Descabece de pilote, suministro de concreto premezclado, curado, incluye refuerzo) (Fila pilotes 2).	ml			162,75	$ 1.285.348,00	$ 209.185.793,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,5	Acero de refuerzo fy=60000 PSI (Se incluye el acero de refurzo para todas las obras proyectadas); Suminsitro e instalación de acuerdo a lo estipulado por la NSR-10, norma ASTM A-706, ICONTEC 2289 para el acero PDR-60. Incluye todos los costos de suminsitro de materiales (refuerzo (G60) figurado, corrugado, incluye el alambre de amarre), equipos, transportes, manejo, almacenamiento, desperdicios y mano de obra. (Fila pilote 1)	kg			6.486,88	$ 8.219,00	$ 53.315.667,00	5159,99	$ 42.409.985,00	78,87	$ 648.236,00	5.238,86	$ 43.058.221,00
3,6	Acero de refuerzo fy=60000 PSI (Se incluye el acero de refurzo para todas las obras proyectadas); Suminsitro e instalación de acuerdo a lo estipulado por la NSR-10, norma ASTM A-706, ICONTEC 2289 para el acero PDR-60. Incluye todos los costos de suminsitro de materiales (refuerzo (G60) figurado, corrugado, incluye el alambre de amarre), equipos, transportes, manejo, almacenamiento, desperdicios y mano de obra. (Fila pilote 2)	kg			1.730,00	$ 8.219,00	$ 14.218.870,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
				SUBTOTAL: CAPITULO 3-MEDIDAS DE MITIGACION			$ 308.696.662,00				$ 648.236,00		$ 43.058.221,00
N.P	ITEM NO PREVISTOS												
N.P 1	Demolición de cimientes y/o muros en concreto reforzado, en terreno (confinado - ladera- pendiente pronunciada entre el 60 % y el 70 %) profundidad prom h: 0,0 mts hasta 1,50 mts (no incluye acarreo interno, ni cargue y retiro de sobrantes)	m^3			27,03	$ 1.003.225,00	$ 27.120.181,00	27,03	$ 27.120.181,00	0,00	$ -	27,03	$ 27.120.181,00
N.P 2	Tratamiento silvicultural individuo arbóreo - poda de árboles de 10m. a 15m	und			14,00	$ 247.092,00	$ 3.459.288,00	14,00	$ 3.459.288,00	0,00	$ -	14,00	$ 3.459.288,00
N.P 3	Roceria y limpieza de vegetación	m^2			1.594,04	$ 2.158,00	$ 3.439.938,00	1594,04	$ 3.439.938,00	0,00	$ -	1.594,04	$ 3.439.938,00

CONTRATO DE OBRA No. : 053 DEL 03 DE ABRIL DE 2025
OBJETO : " CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA PARA AFECTACIÓN DE REMOCIÓN EN MASA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "PIEDRA PINTADA" PROPIEDAD DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL". IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CONTRATISTA: CONSORCIO 4KED-2025
REPRESENTANTE LEGAL: ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ
SUPERVISORES CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA
HOMAR DAVID CALDERON

VALOR CONTRATO :	$ 1.977.887.179,00
PLAZO :	Tres (03) Meses
VALOR ANTICIPO :	$ 593.366.154,00
FECHA DE INICIACION :	9/05/2025
PRORROGA 1:	CUATENTA Y CINCO DIAS
PRORROGA 2:	CUATENTA Y CINCO DIAS
PRORROGA 3:	NOVENTA DIAS
FECHA DE TERMINACION :	4/02/2026
FECHA DE ELABORACION PRESENTE ACTA :	13/11/2025
FECHA PERIODO DE EJECUCION PRESENTE ACTA :	05/10/2025 a 01/11/2025
VALOR PRESENTE ACTA :	$ 493.818.676,00

CONDICIONES CONTRACTUALES Y/O ACTUALIZADAS								ACUMULADO ACTAS PARCIALES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
ITEM	DETALLE	UND	CPC CÓDIGO	CPC DESCRIPCIÓN	CANT.	V/UNIT	V/ TOTAL	CANT.	V/ TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	V/TOTAL
N-P 4	Perforación en roca espacio confinado con equipo roto percutor hasta h= 2,0 mts hasta d=1,50 mts (incluye el uso de concreto expansivo)	und	53290	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTROS DE AGUAS, EXCEPTO GASODUCTOS-RECURSOS PROPIOS	0,00	$ 148.145,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
N-P 5	Suministro e instalacion Disipador de energia tipo 2 seccion transversal hasta h=1,50 mts b= 0,70mts e= 0,15 mts en concreto de 4000 psi (incluye placa de fondo en concreto, formaleta, curado). No incluye: acero de refuerzo, ni concreto pobre.	ml			26,13	$ 1.995.507,00	$ 52.142.598,00	26,13	$ 52.142.598,00	0,00	$ -	26,13	$ 52.142.598,00
N-P 6	Suministro e instalacion Disipador de energia tipo A seccion transversal hasta h=1,25 mts b= 0,70mts e= 0,15mts en concreto de 4000 psi (incluye placa de fondo en concreto,formaleta, curado). No incluye: acero de refuerzo, ni concreto pobre.	ml			10,43	$ 1.679.403,00	$ 17.516.173,00	10,43	$ 17.516.173,00	0,00	$ -	10,43	$ 17.516.173,00
N-P 7	Suministro e instalacion Disipador seccion transversal tipo B h= 2,40mts b= 0,70 mts e= 0,15mts (Incluye placa de fondo en concreto de 4000 psi , formaleta, curado). No incluye: acero de refuerzo, ni concreto pobre.	ml			4,98	$ 2.356.842,00	$ 11.737.073,00	4,98	$ 11.737.073,00	0,00	$ -	4,98	$ 11.737.073,00
N-P 8	Suministro e instalacion Disipador seccion transversal tipo C h= 1,20 mts b= 0,70 mts e= 0,15mts (Incluye placa de fondo en concreto de 4000 psi , formaleta, curado). No incluye: acero de refuerzo, ni concreto pobre.	ml			7,48	$ 1.259.950,00	$ 9.424.426,00	7,48	$ 9.424.426,00	0,00	$ -	7,48	$ 9.424.426,00
N-P 9	Suministro e instalacion canal 10 seccion transversal hasta h= 0,85 mts b= 0,60 mts e= 0,12mts (Incluye placa de fondo en concreto de 3000 psi , formaleta, curado). No incluye: acero de refuerzo, ni concreto pobre.	ml			23,97	$ 708.953,00	$ 16.993.603,00	20,67	$ 14.654.059,00	3,30	$ 2.339.545,00	23,97	$ 16.993.604,00
N-P 10	Pilotes en Concreto de 3500 PSI tipo Tremie de 0.41m hasta 0,50m de diámetro (incluye excavación manual, Descabece de pilote, curado) No incluye: acero de refuerzo (Fila pilotes 1 Y 2).	ml			474,30	$ 1.481.667,00	$ 702.754.658,00	209,25	$ 310.038.820,00	251,10	$ 372.046.584,00	460,35	$ 682.085.404,00
				SUBTOTAL: N.P - ITEM NO PREVISTOS.			$ 844.587.938,00		$ 449.532.556,00		$ 374.386.129,00		$ 823.918.685,00
	SUBTOTAL OBRAS (A)						$ 1.521.451.676,00		$ 632.048.193,00		$ 379.860.520,00		$ 1.011.908.713,00
	ADMINISTRACION 20% (1)						$ 304.290.335,00		$ 126.409.639,00		$ 75.972.104,00		$ 202.381.743,00
	IMPREVISTOS 5% (2)						$ 76.072.584,00		$ 31.602.410,00		$ 18.993.026,00		$ 50.595.436,00
	UTILIDAD 5% (3)						$ 76.072.584,00		$ 31.602.410,00		$ 18.993.026,00		$ 50.595.436,00
	COSTOS A.I.U. 30% (1+2+3) = (B)						$ 456.435.503,00		$ 189.614.459,00		$ 113.958.156,00		$ 303.572.615,00
	TOTAL OBRAS (A) + (B)						$ 1.977.887.179,00		$ 821.662.652,00		$ 493.818.676,00		$ 1.315.481.328,00

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.977.887.179,00	
VALOR ACTA PARCIAL N°. 1		$ 136.600.491,00
VALOR ACTA PARCIAL N°. 2		$ 334.418.544,00
VALOR ACTA PARCIAL N°. 3		$ 350.643.617,00
VALOR ACTA PARCIAL N°. 4		$ 493.818.676,00
VALOR POR EJECUTAR		$ 662.405.851,00
SUMAS IGUALES	$ 1.977.887.179,00	$ 1.977.887.179,00

BALANCE DEL ANTICIPO		
VALOR DEL ANTICIPO	$ 593.366.154,00	
VALOR AMORTIZADO ACTA 1		$ 40.980.147,30
VALOR AMORTIZADO ACTA 2		$ 100.325.563,20
VALOR AMORTIZADO ACTA 3		$ 105.193.085,10
VALOR AMORTIZADO ACTA 4		$ 148.145.602,80
SALDO POR AMORTIZAR		$ 198.721.755,60
SUMAS IGUALES	$ 593.366.154,00	$ 593.366.154,00

BALANCE PRESENTE ACTA	
VALOR PRESENTE ACTA	$ 493.818.676,00
(-) AMORTIZACION ANTICIPO	$ 148.145.602,80
VALOR NETO A CANCELAR EN ESTA ACTA	$ 345.673.073,20

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETENTA Y TRES PESOS Y VEINTE CENTAVOS M/CTE

EL SUSCRTIO INTERVENTOR Y/O SUPERVISORES DEL CONTRATO DE OBRA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA PAZ Y SALVO CON LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE EL Y DE SUS TRABAJADORES

ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ
R.L. CONSORCIO 4KED-2025
CONTRATISTA

HOMAR DAVID CALDERON
SUPERVISOR

CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO
V° B° PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL

ALEXI LILIANA BUITRAGO CAYCEDO
V° B° PROFESIONAL ESPECIALIZADO II

INFORME ACTA PARCIAL 4

CONTRATO DE NO. 053 DEL 03 DE ABRIL 2025

" CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA PARA AFECTACIÓN DE REMOCIÓN EN MASA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "PIEDRA PINTADA" PROPIEDAD DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL".

CONSORCIO 4KED-2025
R.L. ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ
CONTRATISTA

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL SA ESP

2025

Cra. 8D No. 189 – 50 OFC 501 Bogotá Teléfono 60 1 4765991 Celular 3112109143
Correo 4kconstructora@gmail.com

CONTENIDO

1. RESUMEN EJECUTIVO 3
2. ACTIVIDADES REALIZADAS 4
3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES 4
3.1.1. ACTOS ADMINISTRATIVOS 4
3.1.2. AVANCE DE TIEMPO 7
4. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS 7
5. PRESUPUESTO DE OBRA EJECUTADO 10
6. BALANCE DEL CONTRATO 13
7. SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 14
8. PLAN DE GESTION SOCIAL 14
9. CONTROL DE CALIDAD 14
10. REGISTRÓ FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 15
11. PERSONAL UTILIZADO 17

1. RESUMEN EJECUTIVO:

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO

OBJETO	: "CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA PARA AFECTACIÓN DE REMOCIÓN EN MASA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "PIEDRA PINTADA" PROPIEDAD DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL".
VALOR CONTRATO	$ 1.977.887.179
ANTICIPO	$ 593.366.154 MCTE
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIACION	09 DE MAYO DE 2025
FECHA PRORROGA 1	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
FECHA PRORROGA 2	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
FECHA PRORROGA 3	NOVENTA (90) DIAS
PLAZO DE TERMINACION	NUEVO (9) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	02 DE FEBRERO DE 2025
SUPERVISORES IBAL	ING. CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA ING. HOMAR DAVID CALDERON
INTERVENTORIA	N/A
CONTRATISTA	CONSORCIO 4KED-2025 R.L. ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ
CONTRATANTE	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el mes de Octubre de 2025, se llevaron a cabo las siguientes actividades en el marco del proyecto, las cuales se describen a continuación junto con su respectivo registro:

PILOTAJE – FILAS 1:

Se continua con las excavaciones correspondientes a los pilotes de la fila 1. A la fecha, se tiene un total de 99 pilotes fundidos correspondientes a la fila 1. A los cuales se realizaron las respectivas tomas de cilindros de muestra de concreto para su ensayo de resistencia.

GAVIONES

Está prevista la ampliación del área de gaviones en el costado norte-oriente, con el propósito de contribuir a la estabilización integral del talud. La intervención se complementará con la ejecución de la fila de pilotes No. 2, garantizando la continuidad estructural y la estabilidad del sistema de contención.

DISIPADOR 2

Se continua con los llenos con recebo y posterior la compactación de estos, para los vacíos que quedaron a la hora de realizar las excavaciones de dicho disipador.

CANAL 10 (DESPUES DE CAJA DE INSPECCION)

Se finalizó con la construcción de dicha canal, la cual va conectada a la caja de entrega. Se realizaron las respectivas tomas de cilindros de muestra de concreto para su ensayo de resistencia.

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

3.1.1. ACTOS ADMINISTRATIVOS

a. Acta de inicio

Suscrita el día 09 de Mayo de 2025 y con fecha de terminación el día 08 de Agosto del 2025.

b. Prorroga

Suscrita el día 04 de Agosto de 2025 y con fecha de terminación el día 22 de Septiembre del 2025.

c. Control de Pólizas

A continuación, se relacionan las pólizas que amparan el contrato de obra No. 053 de fecha 09 de Mayo de 2025, suscrito con la Compañía Aseguradora Seguros Mundial S.A.

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. I – 100042898

CONCEPTO	VIGENTE (FECHAS)		VALOR	
	DESDE	HASTA		
Amparo básico-predios	09/05/2025	08/08/2026	$	593.366.153,00
patronal	09/05/2025	08/08/2026	$	593.366.153,00
Contratista y subcontratista	09/05/2025	08/08/2026	$	593.366.153,00
Vehículos propios y no propios	09/05/2025	08/08/2026	$	593.366.153,00

Póliza de Cumplimiento General No I – 100042898

CONCEPTO	VIGENTE (FECHAS)		VALOR	
	DESDE	HASTA		
Cumplimiento	03/04/2025	03/01/2026	$	395.577.435,80
Buen Manejo del Anticipo	03/04/2025	03/07/2025	$	593.366.153,70
Prestaciones de servicio	03/04/2025	03/07/2028	$	395.577.435,80
Calidad del Servicio	03/07/2025	03/07/2030	$	395.577.435,80
Estabilidad de la Obra	03/04/2025	03/07/2026	$	395.577.435,80

Se realiza actualización de vigencias de las pólizas debido al Acta de Inicio del contrato de Obra.

CONCEPTO	VIGENTE (FECHAS)		VALOR	
	DESDE	HASTA		
Cumplimiento	09/05/2025	08/02/2026	$	395.577.435,80
Buen Manejo del Anticipo	09/05/2025	08/08/2025	$	593.366.153,70
Prestaciones de servicio	09/05/2025	08/08/2028	$	395.577.435,80
Calidad del Servicio	08/08/2025	08/08/2030	$	395.577.435,80
Estabilidad de la Obra	09/05/2025	08/08/2026	$	395.577.435,80

Se realiza actualización de vigencias de las pólizas debido a la Prórroga del contrato de Obra, la cual es de 45 días calendario.

Póliza de Cumplimiento General No I – 100042898
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. I – 100010737

CONCEPTO	VIGENTE (FECHAS)		VALOR	
	DESDE	HASTA		
Cumplimiento	09/05/2025	23/03/2026	$	395.577.435,80
Buen Manejo del Anticipo	09/05/2025	23/09/2025	$	593.366.153,70
Prestaciones de servicio	09/05/2025	23/09/2028	$	395.577.435,80
Calidad del Servicio	23/09/2025	23/09/2030	$	395.577.435,80
Estabilidad de la Obra	09/05/2025	23/09/2026	$	395.577.435,80

CONCEPTO	VIGENTE (FECHAS)		VALOR	
	DESDE	HASTA		
Amparo básico-predios	09/05/2025	23/09/2026	$	593.366.153,00
patronal	09/05/2025	23/09/2026	$	593.366.153,00
Contratista y subcontratista	09/05/2025	23/09/2026	$	593.366.153,00
Vehículos propios y no propios	09/05/2025	23/09/2026	$	593.366.153,00

Se realiza actualización de vigencias de las pólizas debido a la Prórroga 2 del contrato de Obra, la cual es de 45 dias calendario.

Póliza de Cumplimiento General No I – 100042898

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. I – 100010737

CONCEPTO	VIGENTE (FECHAS)		VALOR	
	DESDE	HASTA		
Cumplimiento	09/05/2025	07/05/2026	$	395.577.435,80
Buen Manejo del Anticipo	09/05/2025	07/11/2025	$	593.366.153,70
Prestaciones de servicio	09/05/2025	07/11/2028	$	395.577.435,80
Calidad del Servicio	07/11/2025	07/11/2030	$	395.577.435,80
Estabilidad de la Obra	09/05/2025	07/11/2026	$	395.577.435,80

CONCEPTO	VIGENTE (FECHAS)		VALOR	
	DESDE	HASTA		
Amparo básico-predios	09/05/2025	07/11/2026	$	593.366.154,00
patronal	09/05/2025	07/11/2026	$	593.366.153,00
Contratista y subcontratista	09/05/2025	07/11/2026	$	593.366.153,00
Vehículos propios y no propios	09/05/2025	07/11/2026	$	593.366.153,00

Se realiza actualización de vigencias de las pólizas debido a la Prórroga 3 del contrato de Obra, la cual es de 90 días calendario.

Póliza de Cumplimiento General No I – 100042898

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. I – 100010737

CONCEPTO	VIGENTE (FECHAS)		VALOR	
	DESDE	HASTA		
Cumplimiento	09/05/2025	07/08/2026	$	395.577.435,80
Buen Manejo del Anticipo	09/05/2025	07/02/2026	$	593.366.153,70
Prestaciones de servicio	09/05/2025	07/02/2029	$	395.577.435,80
Calidad del Servicio	07/02/2026	07/02/2031	$	395.577.435,80
Estabilidad de la Obra	09/05/2025	07/02/2027	$	395.577.435,80

CONCEPTO	VIGENTE (FECHAS)		VALOR	
	DESDE	HASTA		
Amparo básico-predios	09/05/2025	07/02/2027	$	593.366.154,00
patronal	09/05/2025	07/02/2027	$	593.366.153,00
Contratista y subcontratista	09/05/2025	07/02/2027	$	593.366.153,00
Vehículos propios y no propios	09/05/2025	07/02/2027	$	593.366.153,00

3.1.2. AVANCE DE TIEMPO

El tiempo acumulado de ejecución es de ciento setenta y seis (176) días, comprendido entre el 09 de mayo de 2025 y el 01 de Noviembre de 2025, lo que representa un 65% de avance en tiempo con respecto al plazo inicial establecido en cada contrato, considerando únicamente los días en los que el proyecto se mantuvo vigente.

PLAZO INICIAL (Días):	270		
PLAZO TRANSCURRIDO (Días):	176	EQUIVALE AL	65%
SUPERVISOR:	ING. CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA ING. HOMAR DAVID CALDERON		

4. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS

ITEM No.	ACTIVIDAD	UND	CANT.
1	**PRELIMINARES**		
1.1	Localización y replanteo con Aparato Topográfico	m2	2,64
1,2	Señalización en guadua C/3 mts y Polisombra de h=2mts	m	0,00
1,3	Descapote a máquina en material común (E=0.1)	m2	0,00
2	**EXCAVACIONES**		

Cra. 8D No. 189 – 50 OFC 501 Bogotá Teléfono 60 1 4765991 Celular 3112109143
Correo 4kconstructora@gmail.com

2,1	Excavaciones en material común	m3	2,14
2,2	Acarreo interno en obra en via peatonal o tramos superiores a 80m	m3	66,53
2,3	Cargue y Retiro de sobrantes hasta 24 Kmts a Maquina	m3	39,11
2,4	Gaviones, triple torsion,cal 12, suministro e instalacion	m3	0,00
2,5	Suministro de Recebo en zanja compactado c/ 15 Cms. Medio mecánico, Incluye transporte a cualquier sitio del area Urbana	m3	23,87
2,6	Disipador de energia en concreto de 4000 psi (incluye acero de refuerzo, formaleta, curado e impermeabilización de la placa fondo y mortero de nivelacion) (Zona 1)	ml	0,00
2,7	Canal sin filtro (0.35 x 0.35). (Incluye construcción de placa de fondo en concreto impermeabilizado, mediacañas,mortero de nivelacion y angulos metalicos). (Zona 1)	ml	0,00
2,8	Caja de entrega de 1.0x1.0x1,0m, en bloque recocido con recubrimiento en mortero 1:4 e=5cm fundido en sitio. (Incluye construccion de tapa tipo vehicular en concreto de 3000 psi reforzado y placa fondo en concreto impermeabilizado con mortero de nivelacion) (Zona 1)	und	0,00
2,9	Concreto de 13,8 Mpa (2.000 PSI) Para Solado	m3	0,13
2,1	Mortero 1:3	m3	0,00
3	**MEDIDAS DE MITIGACION**		
3,1	Viga cabezal sobre pilotes y/o columnas en concreto premezclado de 3500PSI (24.5MPa) (Incluye suministro, formaleteo en madera, colocación y curado. No incluye refuerzo) (Fila pilotes 1)	m^3	0,00
3,2	Viga cabezal sobre pilotes y/o columnas en concreto premezclado de 35000PSI (24.5MPa) (Incluye suministro, formaleteo en madera, colocación y curado. No incluye refuerzo) (Fila pilotes 2)	m^3	0,00
3,3	Pilotes en Concreto de 3500 PSI tipo Tremie, de 0.4 m de diámetro (incluye excavación manual, Descabece de pilote, suministro de concreto premezclado, curado). (Fila pilote 1)	ml	0,00
3,4	Pilotes en Concreto de 3500 PSI tipo Tremie, de 0.4 m de diámetro (incluye excavación manual, Descabece de pilote, suministro de concreto premezclado, curado, incluye refuerzo) (Fila pilotes 2).	ml	0,00
3,5	Acero de refuerzo fy=60000 PSI (Se incluye el acero de refurzo para todas las obras proyectadas); Suminsitro e instalación de acuerdo a lo estipulado por la NSR-10, norma ASTM A-706, ICONTEC 2289 para el acero PDR-60. Incluye todos los costos de suminsitro de materiales (refuerzo (G60) figurado, corrugado, incluye el alambre de amarre), equipos, transportes, manejo, almacenamiento, desperdicios y mano de obra. (Fila pilote 1)	kg	78,87

Cra. 8D No. 189 – 50 OFC 501 Bogotá Teléfono 60 1 4765991 Celular 3112109143
Correo 4kconstructora@gmail.com

3,6	Acero de refuerzo fy=60000 PSI (Se incluye el acero de refurzo para todas las obras proyectadas); Suminsitro e instalación de acuerdo a lo estipulado por la NSR-10, norma ASTM A-706, ICONTEC 2289 para el acero PDR-60. Incluye todos los costos de suminsitro de materiales (refuerzo (G60) figurado, corrugado, incluye el alambre de amarre), equipos, transportes, manejo, almacenamiento, desperdicios y mano de obra. (Fila pilote 2)	kg	0,00
N.P	**ITEM NO PREVISTOS**		
N.P 1	Demolición de cimientos y/o muros en concreto reforzado, en terreno (confinado - ladera- pendiente pronunciada entre el 60 % y el 70 %) profundidad prom h: 0,0 mts hasta 1,50 mts (no incluye acarreo interno, ni cargue y retiro de sobrantes)	m^3	0,00
N.P 2	Tratamiento silvicultural individuo arbóreo - poda de árboles de 10m. a 15m	und	0,00
N.P 3	Rocería y limpieza de vegetación	m^2	0,00
N-P 4	Perforación en roca espacio confinado con equipo roto percutor hasta h= 2,0 mts hasta d=1,50 mts (incluye el uso de concreto expansivo)	und	0,00
N-P 5	Suministro e instalacion Disipador de energia tipo 2 seccion transversal hasta h=1,50 mts b= 0,70mts e= 0,15 mts en concreto de 4000 psi (incluye placa de fondo en concreto, formaleta, curado). No incluye: acero de refuerzo, ni concreto pobre.	ml	0,00
N-P 6	Suministro e instalacion Disipador de energia tipo A seccion transversal hasta h=1,25 mts b= 0,70mts e= 0,15mts en concreto de 4000 psi (incluye placa de fondo en concreto,formaleta, curado). No incluye: acero de refuerzo, ni concreto pobre.	ml	0,00
N-P 7	Suministro e instalacion Disipador seccion transversal tipo B h= 2,40mts b= 0,70 mts e= 0,15mts (Incluye placa de fondo en concreto de 4000 psi , formaleta, curado). No incluye: acero de refuerzo, ni concreto pobre.	ml	0,00
N-P 8	Suministro e instalacion Disipador seccion transversal tipo C h= 1,20 mts b= 0,70 mts e= 0,15mts (Incluye placa de fondo en concreto de 4000 psi , formaleta, curado). No incluye: acero de refuerzo, ni concreto pobre.	ml	0,00
N-P 9	Suministro e instalacion canal 10 seccion transversal hasta h= 0,85 mts b= 0,60 mts e= 0,12mts (Incluye placa de fondo en concreto de 3000 psi , formaleta, curado). No incluye: acero de refuerzo, ni concreto pobre.	ml	3,30
N-P 10	Pilotes en Concreto de 3500 PSI tipo Tremie de 0.41m hasta 0,50m de diámetro (incluye excavación manual, Descabece de pilote, curado) No incluye: acero de refuerzo (Fila pilotes 1 Y 2).	ml	251,10

5. PRESUPUESTO DE OBRA EJECUTADO

ITEM No.	ACTIVIDAD	UND	V/TOTAL
1	**PRELIMINARES**		
1.1	Localización y replanteo con Aparato Topográfico	m2	$ 20.043,00
1,2	Señalización en guadua C/3 mts y Polisombra de h=2mts	m	$ -
1,3	Descapote a máquina en material común (E=0.1)	m2	$ -
2	**EXCAVACIONES**		
2,1	Excavaciones en material común	m3	$ 78.187,00
2,2	Acarreo interno en obra en via peatonal o tramos superiores a 80m	m3	$ 1.271.903,00
2,3	Cargue y Retiro de sobrantes hasta 24 Kmts a Maquina	m3	$ 1.856.805,00
2,4	Gaviones, triple torsion,cal 12, suministro e instalacion	m3	$ -
2,5	Suministro de Recebo en zanja compactado c/ 15 Cms. Medio mecánico, Incluye transporte a cualquier sitio del area Urbana	m3	$ 1.529.374,00
2,6	Disipador de energia en concreto de 4000 psi (incluye acero de refuerzo, formaleta, curado e impermeabilización de la placa fondo y mortero de nivelacion) (Zona 1)	ml	$ -
2,7	Canal sin filtro (0.35 x 0.35). (Incluye construcción de placa de fondo en concreto impermeabilizado, mediacañas,mortero de nivelacion y angulos metalicos). (Zona 1)	ml	$ -
2,8	Caja de entrega de 1.0x1.0x1,0m, en bloque recocido con recubrimiento en mortero 1:4 e=5cm fundido en sitio. (Incluye construccion de tapa tipo vehicular en concreto de 3000 psi reforzado y placa fondo en concreto impermeabilizado con mortero de nivelacion) (Zona 1)	und	$ -
2,9	Concreto de 13,8 Mpa (2.000 PSI) Para Solado	m3	$ 69.843,00
2,1	Mortero 1:3	m3	$ -
3	**MEDIDAS DE MITIGACION**		

Cra. 8D No. 189 – 50 OFC 501 Bogotá Teléfono 60 1 4765991 Celular 3112109143
Correo 4kconstructora@gmail.com

3,1	Viga cabezal sobre pilotes y/o columnas en concreto premezclado de 3500PSI (24.5MPa) (Incluye suministro, formaleteo en madera, colocación y curado. No incluye refuerzo) (Fila pilotes 1)	m^3	$ -
3,2	Viga cabezal sobre pilotes y/o columnas en concreto premezclado de 35000PSI (24.5MPa) (Incluye suministro, formaleteo en madera, colocación y curado. No incluye refuerzo) (Fila pilotes 2)	m^3	$ -
3,3	Pilotes en Concreto de 3500 PSI tipo Tremie, de 0.4 m de diámetro (incluye excavación manual, Descabece de pilote, suministro de concreto premezclado, curado). (Fila pilote 1)	ml	$ -
3,4	Pilotes en Concreto de 3500 PSI tipo Tremie, de 0.4 m de diámetro (incluye excavación manual, Descabece de pilote, suministro de concreto premezclado, curado, incluye refuerzo) (Fila pilotes 2).	ml	$ -
3,5	Acero de refuerzo fy=60000 PSI (Se incluye el acero de refurzo para todas las obras proyectadas); Suminsitro e instalación de acuerdo a lo estipulado por la NSR-10, norma ASTM A-706, ICONTEC 2289 para el acero PDR-60. Incluye todos los costos de suminsitro de materiales (refuerzo (G60) figurado, corrugado, incluye el alambre de amarre), equipos, transportes, manejo, almacenamiento, desperdicios y mano de obra. (Fila pilote 1)	kg	$ 648.236,00
3,6	Acero de refuerzo fy=60000 PSI (Se incluye el acero de refurzo para todas las obras proyectadas); Suminsitro e instalación de acuerdo a lo estipulado por la NSR-10, norma ASTM A-706, ICONTEC 2289 para el acero PDR-60. Incluye todos los costos de suminsitro de materiales (refuerzo (G60) figurado, corrugado, incluye el alambre de amarre), equipos, transportes, manejo, almacenamiento, desperdicios y mano de obra. (Fila pilote 2)	kg	$ -
N.P	**ITEM NO PREVISTOS**		
N.P 1	Demolición de cimientos y/o muros en concreto reforzado, en terreno (confinado - ladera- pendiente pronunciada entre el 60 % y el 70 %) profundidad prom h: 0,0 mts hasta 1,50 mts (no incluye acarreo interno, ni cargue y retiro de sobrantes)	m^3	$ -


Cra. 8D No. 189 – 50 OFC 501 Bogotá Teléfono 60 1 4765991 Celular 3112109143
Correo 4kconstructora@gmail.com

N.P 2	Tratamiento silvicultural individuo arbóreo - poda de árboles de 10m. a 15m	und		$ -
N.P 3	Rocería y limpieza de vegetación	m^2		$ -
N-P 4	Perforación en roca espacio confinado con equipo roto percutor hasta h= 2,0 mts hasta d=1,50 mts (incluye el uso de concreto expansivo)	und		$ -
N-P 5	Suministro e instalacion Disipador de energia tipo 2 seccion transversal hasta h=1,50 mts b= 0,70mts e= 0,15 mts en concreto de 4000 psi (incluye placa de fondo en concreto, formaleta, curado). No incluye: acero de refuerzo, ni concreto pobre.	ml		$ -
N-P 6	Suministro e instalacion Disipador de energia tipo A seccion transversal hasta h=1,25 mts b= 0,70mts e= 0,15mts en concreto de 4000 psi (incluye placa de fondo en concreto,formaleta, curado). No incluye: acero de refuerzo, ni concreto pobre.	ml		$ -
N-P 7	Suministro e instalacion Disipador seccion transversal tipo B h= 2,40mts b= 0,70 mts e= 0,15mts (Incluye placa de fondo en concreto de 4000 psi , formaleta, curado). No incluye: acero de refuerzo, ni concreto pobre.	ml		$ -
N-P 8	Suministro e instalacion Disipador seccion transversal tipo C h= 1,20 mts b= 0,70 mts e= 0,15mts (Incluye placa de fondo en concreto de 4000 psi , formaleta, curado). No incluye: acero de refuerzo, ni concreto pobre.	ml		$ -
N-P 9	Suministro e instalacion canal 10 seccion transversal hasta h= 0,85 mts b= 0,60 mts e= 0,12mts (Incluye placa de fondo en concreto de 3000 psi , formaleta, curado). No incluye: acero de refuerzo, ni concreto pobre.	ml		$ 2.339.545,00
N-P 10	Pilotes en Concreto de 3500 PSI tipo Tremie de 0.41m hasta 0,50m de diámetro (incluye excavación manual, Descabece de pilote, curado) No incluye: acero de refuerzo (Fila pilotes 1 Y 2).	ml		$ 372.046.584,00
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO			**$**	**379.860.520,00**
A.I.U 30%			**$**	**113.958.156,00**
TOTAL			**$**	**493.818.676,00**


Cra. 8D No. 189 – 50 OFC 501 Bogotá Teléfono 60 1 4765991 Celular 3112109143
Correo 4kconstructora@gmail.com

6. BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE DEL CONTRATO			
VALOR CONTRATO	$ 1.977.887.179,00	100%	
VALOR EJECUTADO ACTA 1		$ 136.600.491,00	6,91%
VALOR EJECUTADO ACTA 2		$ 334.418.544,00	16,91%
VALOR EJECUTADO ACTA 3		$ 350.643.617,00	17,73%
VALOR EJECUTADO ACTA 4		$ 493.818.676,00	24,97%
VALOR EJECUTADO ACUMULADO		$ 1.315.481.328,00	66,51%
VALOR POR EJECUTAR		$ 662.405.851,00	33,49%
SUMAS IGUALES	$ 1.977.887.179,00	$ 1.977.887.179,00	100%

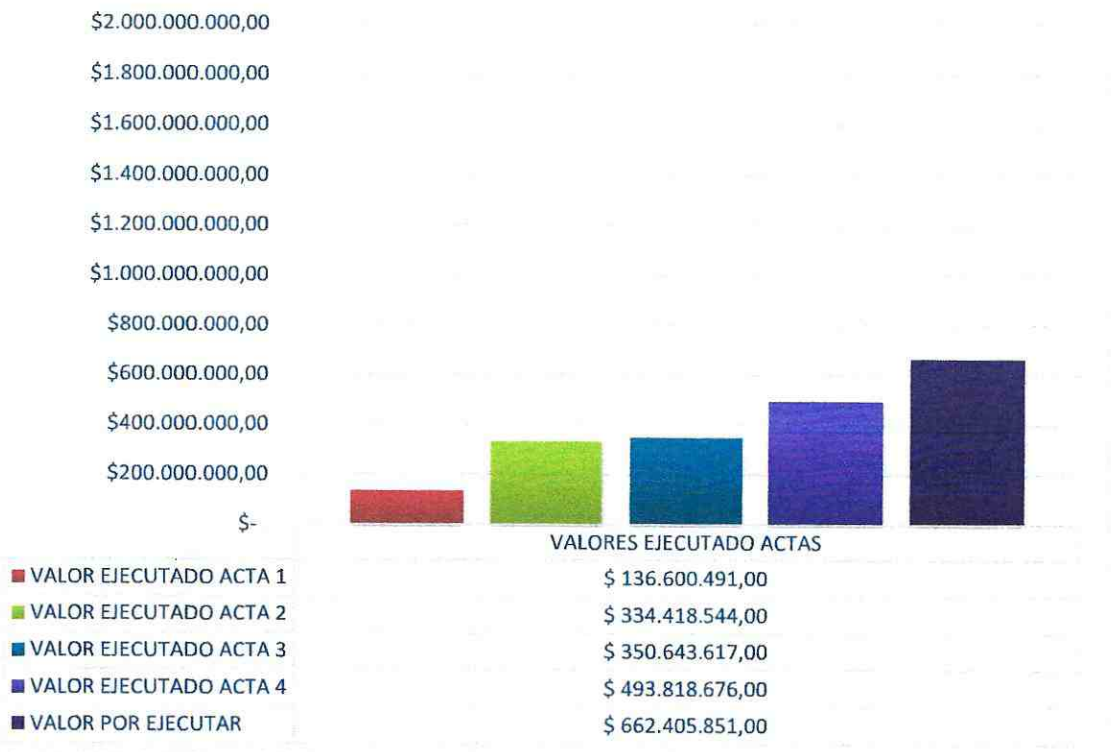

Cra. 8D No. 189 – 50 OFC 501 Bogotá Teléfono 60 1 4765991 Celular 3112109143
Correo 4kconstructora@gmail.com

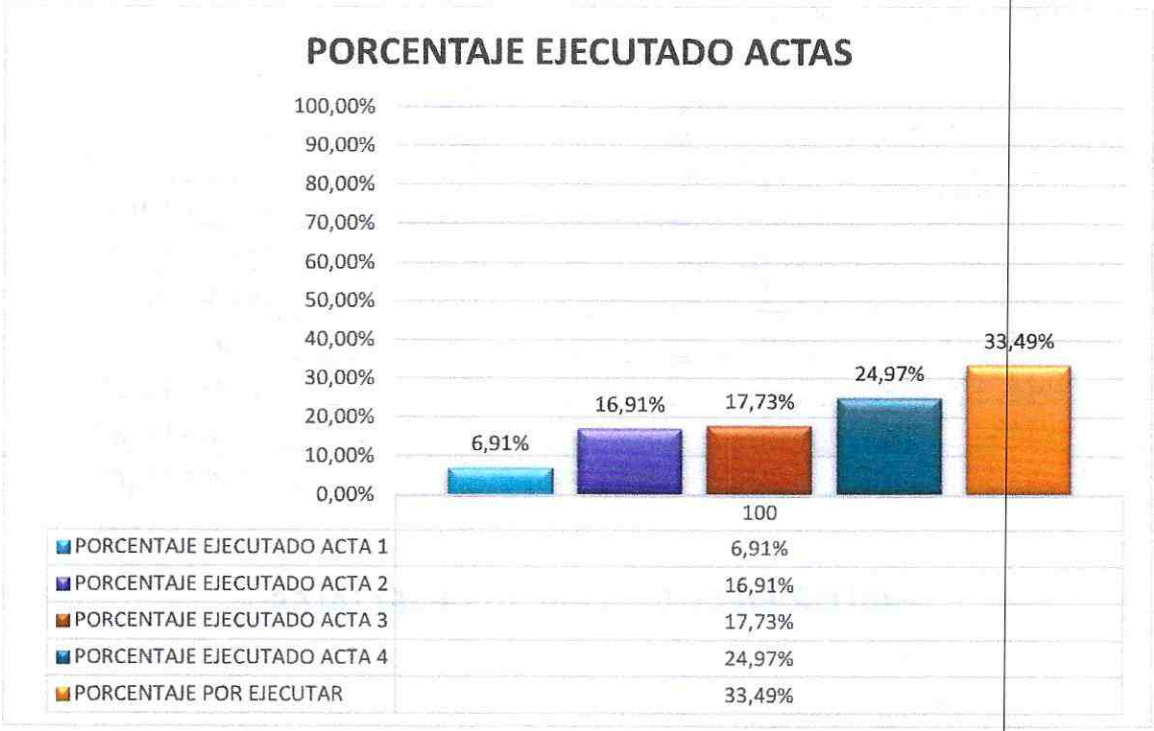

7. SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En cumplimiento de los requerimientos del Ministerio de Trabajo, el contratista implementa en obra el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo y acata lo consagrado en la ley 100, (Afiliación a ARP, EPS, Pensión, Caja de compensación, Sena e ICBF).

El contratista en cumplimiento de sus obligaciones laborales, salud ocupacional y de seguridad industrial, entregó y dotó a todo el personal bajo su cargo, de los elementos de protección personal necesarios para la actividad de construcción.

8. PLAN DE GESTION SOCIAL

El día 05-08-2025, se realizó la socialización en compañía de los supervisores del contrato, la comunidad y personal del contratista, dentro de las instalaciones del tanque de piedra pintada.

9. CONTROL DE CALIDAD

Se realiza control de calidad de todos los materiales, se presentan certificados de calidad de todos los materiales, lo que garantiza que la construcción se está ejecutando de acuerdo con las especificaciones técnicas y las recomendaciones de la supervisión. Se implementan formatos de calidad suministrados por la caja de compensación familiar del Tolima para el seguimiento continuo.

Cra. 8D No. 189 – 50 OFC 501 Bogotá Teléfono 60 1 4765991 Celular 3112109143
Correo 4kconstructora@gmail.com

10. REGISTRÓ FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

- **LLENO DE VACIOS CON RECEBO DEL DISIPADOR 2**



- **TOMA DE CILINDROS**



- **FILA DE PILOTES 1**



Cra. 8D No. 189 – 50 OFC 501 Bogotá Teléfono 60 1 4765991 Celular 3112109143
Correo 4kconstructora@gmail.com



- **CANAL 10 DESPUES DE CAJA DE INSPECCION**



- **LIMPIEZA Y ACARREO DEL AREA**



Cra. 8D No. 189 – 50 OFC 501 Bogotá Teléfono 60 1 4765991 Celular 3112109143
Correo 4kconstructora@gmail.com

11. PERSONAL UTILIZADO

PERSONAL - INTERNO
PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL
MAESTRO GENERAL
AYUDANTES
ING. RESIDENTE
OPERARIOS PILOTEADORA
TOPOGRAFO

12. EQUIPO UTILIZADO

EQUIPO		CANTIDAD
VOLQUETAS SENCILLAS		2
PILOTEADORA KELLY		1
HERRAMIENTA MENOR		1
MEZCLADORAS		2
RETROEXACAVORA		1

Cra. 8D No. 189 – 50 OFC 501 Bogotá Teléfono 60 1 4765991 Celular 3112109143
Correo 4kconstructora@gmail.com

CONTRATO DE OBRA N° 053 DEL 03 DE ABRIL DE 2025	
CONTRATANTE	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
CONTRATISTA	CONSORCIO 4KED-2025 – RL ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ

OBJETO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA PARA AFECTACIÓN DE REMOCIÓN EN MASA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "PIEDRA PINTADA" PROPIEDAD DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL". IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIO	MAYO 09 DE 2025
PRORROGA 1	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
PRORROGA 2	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
PRORROGA 3	NOVENTA (90) DIAS
PLAZO TOTAL	NUEVE (9) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	FEBRERO 04 DE 2025
VALOR TOTAL	$ 1'977.887.179
VALOR ANTICIPO	$ 593.366.154
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISORES	ING. HOMAR DAVID CALDERON

Los suscritos Ing. **HOMAR DAVID CALDERON** – Supervisor del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, en su calidad de Supervisores del contrato en mención:

CERTIFICA:

Contratista persona natural ☐	Contratista persona jurídica X
2. El contratista presentó la planilla número 34894713-34895189-34806236 del 09-2025, 35220614-35247894-35247135-35248741 del 10-2025, en la que consta que ha efectuado el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión, y riesgos laborales, de él y del personal a cargo, para el período de Septiembre y Octubre. Verificado el monto de cada uno de los aportes en la planilla, se constató que se ajusta a la base de liquidación que aplica para este tipo de contratos.	2. El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.

Se expide la presente constancia para efectos del respectivo pago en la ciudad de Ibagué, a los 13 días del mes de Noviembre del año 2025.

ING. HOMAR DAVID CALDERON
SUPERVISOR DEL CONTRATO

CONSORCIO 4KED-2025

MODELO CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 – PERSONAS JURÍDICAS.

Bogotá, 13 Noviembre de 2025

Señores
IBAL SA ESP OFICIAL
Atte. HOMAR DAVID CALDERON
Atte. CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA
Supervisores Contrato. No. 053-2025
Ciudad

Respetados señores:

Yo, **ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ,** identificada con cedula de ciudadanía No. **52.020.033 de Bogotá**, en mi condición de Representante Legal del CONSORCIO 4KED-2025, identificado con Nit. 901.931.668-2 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos 6 meses contados a partir de la expedición de este certificado, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota 1: *Las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, están exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, del ICBF y al sistema de salud, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2027.*

Nota 2: *Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 Artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005*

Dada en Bogotá, al 13 Noviembre de 2025

ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ
C.C. 52.020.033 de Bogotá
R/L CONSORCIO 4KED-2025

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901931668	2	CONSORCIO 4 KED 2025	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	CRA 8 D 189 50 OF 501		3112109143			4KCONSTRUCTORA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-10	34894713	E	2025-10-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.043.400	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	34894713	2025-10-16	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 65779213	MONTES LEON ANGELICA	2.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	2.000.000	320.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.000.000	80.000	COMFATOLIMA-CCF48	2.000.000	80.000	2.000.000	139.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	619.200	S	5711001
2	CC 93363480	CARDOSO MELO RODRIGO	2.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	2.000.000	320.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.000.000	80.000	COMFATOLIMA-CCF48	2.000.000	80.000	2.000.000	139.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	619.200	S	5711001
3	CC 1110562499	CARDENAS GARCIA MAYRA ALEJANDRA	2.600.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.600.000	416.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.600.000	104.000	COMFATOLIMA-CCF48	2.600.000	104.000	2.600.000	181.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	805.000	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901931668	2	CONSORCIO 4 KED 2025	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	CRA 8 D 189 50 OF 501		3112109143			4KCONSTRUCTORA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-10	34894713	E	2025-10-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.043.400	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	34894713	2025-10-16	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				3	1.056.000	0	0	0	1.056.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	640.000	0	0	0	640.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	416.000	0	0	0	416.000
EPS(Administradoras: 2)				3	264.000	0	0	0	264.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	160.000	0	0	0	160.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	104.000	0	0	0	104.000
ARP(Administradoras: 1)				3	459.400	0	0	0	459.400

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
POSITIVA	14-23	860011153	6	3	459.400	0	0	0	459.400
CCF(Administradoras: 1)				3	264.000	0	0	0	264.000
COMFATOLIMA	CCF48	800211025	1	3	264.000	0	0	0	264.000
Gran Total					2.043.400	0	0	0	2.043.400

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901931668	2	CONSORCIO 4 KED 2025	B	03	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	CRA 8 D 189 50 OF 501		3112109143			4KCONSTRUCTORA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-10	34895189	E	2025-10-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.013.600	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
12	34895189	2025-10-16	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 5937987	CHAVES LOAIZA JOSE URIEL	1.423.500	F	X															0			13	13	13	13	PROTECCION -230201	616.850	98.700	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	616.850	24.700	COMFATOLIMA-CCF48	616.850	24.700	616.850	43.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	191.100	S	5711001
2	CC 6013937	VERA GUTIERREZ JOSE ORLANDO	1.423.500	F		X														0			20	20	20	20	PROTECCION -230201	949.000	151.900	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	949.000	38.000	COMFATOLIMA-CCF48	949.000	38.000	949.000	66.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	294.000	S	5711001
3	CC 14297344	TORRES CALDAS DIEGO MAURICIO	1.423.500	F		X														0			6	6	6	6	PORVENIR-230301	284.700	45.600	0	0	SANITAS-EPS005	284.700	11.400	COMFATOLIMA-CCF48	284.700	11.400	284.700	19.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	88.300	S	5711001
4	CC 1030280009	RAMOS ROMERO YEFERSON	1.423.500	F	X															0			21	21	21	21	PORVENIR-230301	996.450	159.500	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	996.450	39.900	COMFATOLIMA-CCF48	996.450	39.900	996.450	69.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	308.700	S	5711001
5	CC 1093780991	RUEDA TRUJILLO JOHN ALEXANDER	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFATOLIMA-CCF48	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5711001
6	CC 1105334016	RAMIREZ PERDOMO ESMERALDA	1.423.500	F		X														0			6	6	6	6	PROTECCION -230201	284.700	45.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	284.700	11.400	COMFATOLIMA-CCF48	284.700	11.400	284.700	19.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	88.300	S	5711001
7	CC 1105783074	SALAZAR RESTREPO VIANEY DE JESUS	1.423.500	F		X														0			11	11	11	11	PORVENIR-230301	521.950	83.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	521.950	20.900	COMFATOLIMA-CCF48	521.950	20.900	521.950	36.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	161.800	S	5711001
8	CC 1110458069	RAMIREZ PINZON LUIS ALEJANDRO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.423.500	57.000	COMFATOLIMA-CCF48	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5711001
9	CC 1110470868	CASTRO ENCISO JHONATAN JAVIER	1.423.500	F		X														0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	1.376.050	220.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.376.050	55.100	COMFATOLIMA-CCF48	1.376.050	55.100	1.376.050	95.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	426.200	S	5711001
10	CC 1110509122	CASTRO ENCISO JAIME ANDRES	1.423.500	F		X														0			6	6	6	6	COLPENSION ES-25-14	284.700	45.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	284.700	11.400	COMFATOLIMA-CCF48	284.700	11.400	284.700	19.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	88.300	S	5711001
11	CC 1110552548	ARAMENDIZ REY YEISON ALIRIO	1.423.500	F		X														0			27	27	27	27	PORVENIR-230301	1.281.150	205.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.281.150	51.300	COMFATOLIMA-CCF48	1.281.150	51.300	1.281.150	89.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	396.800	S	5711001
12	PT 6992974	URDANETA ORTIZ BRAYAN ARMANDO	1.423.500	F		X														0			6	6	6	6	COLPENSION ES-25-14	284.700	45.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	284.700	11.400	COMFATOLIMA-CCF48	284.700	11.400	284.700	19.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	88.300	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901931668	2	CONSORCIO 4 KED 2025	B	03	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	CRA 8 D 189 50 OF 501		3112109143			4KCONSTRUCTORA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-10	34895189	E	2025-10-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.013.600	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
12	34895189	2025-10-16	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
9.727.250	9.727.250	9.727.250	9.727.250	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				12	1.556.900	0	0	0	1.556.900
PORVENIR	230301	800224808	8	6	941.700	0	0	0	941.700
PROTECCION	230201	800229739	0	3	296.200	0	0	0	296.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	319.000	0	0	0	319.000
EPS(Administradoras: 4)				12	389.500	0	0	0	389.500
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	144.400	0	0	0	144.400
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	11.400	0	0	0	11.400
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	5	165.300	0	0	0	165.300
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	2	68.400	0	0	0	68.400
ARP(Administradoras: 1)				12	677.700	0	0	0	677.700
POSITIVA	14-23	860011153	6	12	677.700	0	0	0	677.700
CCF(Administradoras: 1)				12	389.500	0	0	0	389.500
COMFATOLIMA	CCF48	800211025	1	12	389.500	0	0	0	389.500
Gran Total					3.013.600	0	0	0	3.013.600

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901931668	2	CONSORCIO 4 KED 2025	B	05	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	CRA 8 D 189 50 OF 501		3112109143			4KCONSTRUCTORA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-10	35128784	E	2025-10-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	30.200	600	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	35128784	2025-10-16	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 6031278	GARZON MARTINEZ OBEIMAR	1.423.500	F	X															0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	47.450	7.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	47.450	1.900	COMFATOLIMA-CCF48	47.450	1.900	47.450	3.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	14.800	S	5711001
2	CC 80416073	CARDOZO CHAPARRO JOSE ORLANDO	1.423.500	F	X															0			1	1	1	1	PROTECCION-230201	47.450	7.600	0	0	EPS-S CAPITAL-EPSC34	47.450	1.900	COMFATOLIMA-CCF48	47.450	1.900	47.450	3.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	14.800	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901931668	2	CONSORCIO 4 KED 2025	B	05	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	CRA 8 D 189 50 OF 501		3112109143			4KCONSTRUCTORA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-10	35128784	E	2025-10-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	30.200	600	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	35128784	2025-10-16	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
94.900	94.900	94.900	94.900	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				2	15.200	0	200	0	15.400
PROTECCION	230201	800229739	0	1	7.600	0	100	0	7.700
PORVENIR	230301	800224808	8	1	7.600	0	100	0	7.700
EPS(Administradoras: 2)				2	3.800	0	200	0	4.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	1.900	0	100	0	2.000
EPS-S CAPITAL	EPSC34	900298372	9	1	1.900	0	100	0	2.000
ARP(Administradoras: 1)				2	6.800	0	100	0	6.900
POSITIVA	14-23	860011153	6	2	6.800	0	100	0	6.900
CCF(Administradoras: 1)				2	3.800	0	100	0	3.900

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
COMFATOLIMA	CCF48	800211025	1	2	3.800	0	100	0	3.900
Gran Total					29.600	0	600	0	30.200

PAGOS s.a.
PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901931668	2	CONSORCIO 4 KED 2025	B	04	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	CRA 8 D 189 50 OF 501		3112109143			4KCONSTRUCTORA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-10	34806236	E	2025-10-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.029.100	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	34806236	2025-10-16	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 79543035	CORTES VELANDIA ELKIN AZAEL	1.423.500	F	X															0			15	15	15	15	COLPENSION ES-25-14	711.750	113.900	0	0	SANITAS-EPS005	711.750	28.500	COMFATOLIMA-CCF48	711.750	28.500	711.750	49.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	220.500	S	5711001
2	CC 1020827079	CORTES RUIZ ELKIN FELIPE	1.423.500	F	X															0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	711.750	113.900	0	0	SANITAS-EPS005	711.750	28.500	COMFATOLIMA-CCF48	711.750	28.500	711.750	49.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	220.500	S	5711001
3	CC 1024539611	VELA JONATHAN ARLEY	1.423.500	F	X															0			10	10	10	10	PORVENIR-230301	474.500	76.000	0	0	SANITAS-EPS005	474.500	19.000	COMFATOLIMA-CCF48	474.500	19.000	474.500	33.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	147.100	S	5711001
4	CC 1033741867	CASTAÑEDA URITICA JOSE ANDRES	1.423.500	F	X															0			15	15	15	15	COLFONDOS-231001	711.750	113.900	0	0	FAMISANAR-EPS017	711.750	28.500	COMFATOLIMA-CCF48	711.750	28.500	711.750	49.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	220.500	S	5711001
5	PT 2374375	GARCIA GARCIA PETTER JESUS	1.423.500	F	X															0			15	15	15	15	COLPENSION ES-25-14	711.750	113.900	0	0	SANITAS-EPS005	711.750	28.500	COMFATOLIMA-CCF48	711.750	28.500	711.750	49.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	220.500	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901931668	2	CONSORCIO 4 KED 2025	B	04	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	CRA 8 D 189 50 OF 501		3112109143			4KCONSTRUCTORA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-10	34806236	E	2025-10-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.029.100	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	34806236	2025-10-16	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.321.500	3.321.500	3.321.500	3.321.500	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				5	531.600	0	0	0	531.600
PORVENIR	230301	800224808	8	2	189.900	0	0	0	189.900
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	227.800	0	0	0	227.800
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	113.900	0	0	0	113.900
EPS(Administradoras: 2)				5	133.000	0	0	0	133.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	4	104.500	0	0	0	104.500

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	28.500	0	0	0	28.500
ARP(Administradoras: 1)				5	231.500	0	0	0	231.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	5	231.500	0	0	0	231.500
CCF(Administradoras: 1)				5	133.000	0	0	0	133.000
COMFATOLIMA	CCF48	800211025	1	5	133.000	0	0	0	133.000
Gran Total					1.029.100	0	0	0	1.029.100

PAGOS s.a.
PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901931668	2	CONSORCIO 4 KED 2025	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	CRA 8 D 189 50 OF 501		3112109143			4KCONSTRUCTORA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÈS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35220614	E	2025-11-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.043.400	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	35220614	2025-11-19	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 65779213	MONTES LEON ANGELICA	2.000.000	F		X													0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	2.000.000	320.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.000.000	80.000	COMFATOLIMA-CCF48	2.000.000	80.000	2.000.000	139.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	619.200	S	5711001
2	CC 93363480	CARDOSO MELO RODRIGO	2.000.000	F															0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	2.000.000	320.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.000.000	80.000	COMFATOLIMA-CCF48	2.000.000	80.000	2.000.000	139.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	619.200	S	5711001
3	CC 1110562499	CARDENAS GARCIA MAYRA ALEJANDRA	2.600.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.600.000	416.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.600.000	104.000	COMFATOLIMA-CCF48	2.600.000	104.000	2.600.000	181.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	805.000	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901931668	2	CONSORCIO 4 KED 2025	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	CRA 8 D 189 50 OF 501		3112109143			4KCONSTRUCTORA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÈS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35220614	E	2025-11-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.043.400	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	35220614	2025-11-19	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				3	1.056.000	0	0	0	1.056.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	416.000	0	0	0	416.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	640.000	0	0	0	640.000
EPS(Administradoras: 2)				3	264.000	0	0	0	264.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	160.000	0	0	0	160.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	104.000	0	0	0	104.000
ARP(Administradoras: 1)				3	459.400	0	0	0	459.400

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
POSITIVA	14-23	860011153	6	3	459.400	0	0	0	459.400
CCF(Administradoras: 1)				3	264.000	0	0	0	264.000
COMFATOLIMA	CCF48	800211025	1	3	264.000	0	0	0	264.000
Gran Total					2.043.400	0	0	0	2.043.400

PAGOS s.a.
PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901931668	2	CONSORCIO 4 KED 2025	B	05	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	CRA 8 D 189 50 OF 501		3112109143			4KCONSTRUCTORA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35247135	E	2025-11-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	470.400	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	35247135	2025-11-19	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 6031278	GARZON MARTINEZ OBEIMAR	1.423.500	F		X														0			16	16	16	16	PORVENIR-230301	759.200	121.500	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	759.200	30.400	COMFATOLIMA-CCF48	759.200	30.400	759.200	52.900	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	235.200	S	5711001
2	CC 80416073	CARDOZO CHAPARRO JOSE ORLANDO	1.423.500	F		X														0			16	16	16	16	PROTECCION-230201	759.200	121.500	0	0	EPS-S CAPITAL-EPSC34	759.200	30.400	COMFATOLIMA-CCF48	759.200	30.400	759.200	52.900	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	235.200	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901931668	2	CONSORCIO 4 KED 2025	B	05	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	CRA 8 D 189 50 OF 501		3112109143			4KCONSTRUCTORA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35247135	E	2025-11-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	470.400	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	35247135	2025-11-19	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.518.400	1.518.400	1.518.400	1.518.400	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				2	243.000	0	0	0	243.000
PROTECCION	230201	800229739	0	1	121.500	0	0	0	121.500
PORVENIR	230301	800224808	8	1	121.500	0	0	0	121.500
EPS(Administradoras: 2)				2	60.800	0	0	0	60.800
EPS-S CAPITAL	EPSC34	900298372	9	1	30.400	0	0	0	30.400
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	30.400	0	0	0	30.400
ARP(Administradoras: 1)				2	105.800	0	0	0	105.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	2	105.800	0	0	0	105.800
CCF(Administradoras: 1)				2	60.800	0	0	0	60.800

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
COMFATOLIMA	CCF48	800211025	1	2	60.800	0	0	0	60.800
Gran Total					470.400	0	0	0	470.400

ACH PAGOS s.a.
PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901931668	2	CONSORCIO 4 KED 2025	B	06	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	CRA 8 D 189 50 OF 501		3112109143			4KCONSTRUCTORA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35247894	E	2025-11-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	779.100	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	35247894	2025-11-19	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 1079097033	MOSQUERA MARTINEZ YONIER	1.423.500	F	X														0			25	25	25	25	COLPENSION ES-25-14	1.186.250	189.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.186.250	47.500	COMFATOLIMA-CCF48	1.186.250	47.500	1.186.250	82.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	367.400	S	5711001
2	CC 1108828410	AROCA VARGAS MAICOL STIVEN	1.423.500	F	X														0			17	17	17	17	PROTECCION -230201	806.650	129.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	806.650	32.300	COMFATOLIMA-CCF48	806.650	32.300	806.650	56.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	249.900	S	5711001
3	CC 1110458069	RAMIREZ PINZON LUIS ALEJANDRO	1.423.500	F		X													0			11	11	11	11	COLPENSION ES-25-14	521.950	83.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	521.950	20.900	COMFATOLIMA-CCF48	521.950	20.900	521.950	36.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	161.800	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901931668	2	CONSORCIO 4 KED 2025	B	06	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	CRA 8 D 189 50 OF 501		3112109143			4KCONSTRUCTORA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35247894	E	2025-11-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	779.100	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	35247894	2025-11-19	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.514.850	2.514.850	2.514.850	2.514.850	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				3	402.500	0	0	0	402.500
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	273.400	0	0	0	273.400
PROTECCION	230201	800229739	0	1	129.100	0	0	0	129.100
EPS(Administradoras: 2)				3	100.700	0	0	0	100.700
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	2	53.200	0	0	0	53.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	47.500	0	0	0	47.500
ARP(Administradoras: 1)				3	175.200	0	0	0	175.200

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
POSITIVA	14-23	860011153	6	3	175.200	0	0	0	175.200
CCF(Administradoras: 1)				3	100.700	0	0	0	100.700
COMFATOLIMA	CCF48	800211025	1	3	100.700	0	0	0	100.700
Gran Total					779.100	0	0	0	779.100

PAGOS s.a.
PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901931668	2	CONSORCIO 4 KED 2025	B	03	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	CRA 8 D 189 50 OF 501		3112109143		4KCONSTRUCTORA@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35248741	E	2025-11-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	852.600	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	35248741	2025-11-19	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 5937987	CHAVES LOAIZA JOSE URIEL	1.423.500	F	X															0			7	7	7	7	PROTECCION -230201	332.150	53.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	332.150	13.300	COMFATOLIMA-CCF48	332.150	13.300	332.150	23.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	103.000	S	5711001
2	CC 1030280009	RAMOS ROMERO YEFERSON	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	COMFATOLIMA-CCF48	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5711001
3	CC 1093780991	RUEDA TRUJILLO JOHN ALEXANDER	1.423.500	F	X															0			21	21	21	21	PORVENIR-230301	996.450	159.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	996.450	39.900	COMFATOLIMA-CCF48	996.450	39.900	996.450	69.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	308.700	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901931668	2	CONSORCIO 4 KED 2025	B	03	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	CRA 8 D 189 50 OF 501		3112109143		4KCONSTRUCTORA@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35248741	E	2025-11-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	852.600	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	35248741	2025-11-19	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.752.100	2.752.100	2.752.100	2.752.100	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				3	440.500	0	0	0	440.500
PROTECCION	230201	800229739	0	1	53.200	0	0	0	53.200
PORVENIR	230301	800224808	8	2	387.300	0	0	0	387.300
EPS(Administradoras: 2)				3	110.200	0	0	0	110.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	39.900	0	0	0	39.900
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	70.300	0	0	0	70.300
ARP(Administradoras: 1)				3	191.700	0	0	0	191.700

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
POSITIVA	14-23	860011153	6	3	191.700	0	0	0	191.700
CCF(Administradoras: 1)				3	110.200	0	0	0	110.200
COMFATOLIMA	CCF48	800211025	1	3	110.200	0	0	0	110.200
Gran Total					852.600	0	0	0	852.600

PAGOS s.a.
PAGADO

IBAL SIG	FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-056 FECHA VIGENCIA: 2025/03/28 VERSIÓN: 02 Página 1 de 2

Evaluación: [X] Fecha evaluación 13/11/2025 Reevaluación: [ ] Fecha reevaluación: _____

Acta Parcial N° ___04____ Acta Final _____

INFORMACION DEL CONTRATO			
NUMERO Y FECHA: 053 DEL 03 DE ABRIL DE 2025			
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:	CONSORCIO 4KED-2025	NIT: 901931668-2	
FECHA DE INICIO: MAYO 09 DE 2025		FECHA DE TERMINACION: FEBRERO 04 DE 2025	
OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA PARA AFECTACIÓN DE REMOCIÓN EN MASA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "PIEDRA PINTADA" PROPIEDAD DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL". IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".			

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION	
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA	
	5. SERVICIO	
	6. SEGUROS	
	7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS	
	8. OBRA PUBLICA	X

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE	2= MALO	3= REGULAR	4= BUENO	5= EXCELENTE

8. OBRA PUBLICA

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS	4,5	CUMPLIMIENTO CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS	3,8
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS	4,5	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL CONTRATADO.	4,5
CUMPLIMIENTO EN LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PRODUCTOS	4,7	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	4,8
CUMPLIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PROPUESTO	4,6	ELABORACION OPORTUNA DE LAS DIFERENTES ACTAS	4,3
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4,8	ASISTENCIA A LAS REUNIONES O VISITAS TECNICAS PROGRAMADAS	4,5
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	4,7	CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON EL AREA DE SALUD OCUPACIONAL Y GESTION AMBIENTAL	4,7
CUMPLIMIENTO Y ENTREGA OPORTUNA DEL PEGMA	4	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	4,8
		PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4,9
		ATENCION DE REQUERIMIENTOS	4,5
TOTAL PROMEDIO	4,5	TOTAL PROMEDIO	4,5

CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE		
COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD	4,3		
CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y LEGAL	4,5		
CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS	4,5		
CALIDAD EN LA MANO DE OBRA	4,5	EVALUACION TOTAL	4,5
CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS	4,6		
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS	4,5		
ENTREGA OPORTUNA DE LOS PLANOS RECORD, MANUALES Y DEMAS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL CONTRATO	4,5		
TOTAL PROMEDIO	4,49		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION __X__ REEVALUACION _____ POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades): A LA FECHA EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESTANDARES GENERADOS POR IBAL SA ESP OFICIAL Y LA NORMATIVA VIGENTE PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS OBRAS.

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION __X__ REEVALUACION _____ POR PARTE DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION __X__ REEVALUACION _____ POR PARTE DEL PROFESIONAL DE SALUD OCUPACIONAL:

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION __X__ REEVALUACION _____ POR PARTE DEL PROFESIONAL ESPECIALIZADO II DE GESTION AMBIENTAL:

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION	SI		NO	X
INTERPONE RECURSO DE APELACION	SI		NO	X

NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el articulo 7 de la resolucion que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificacion de la reevaluación de proveedores, tendra los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consorcio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual termino a cada uno de los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripcion.	SI		NO	X

HOMAR DAVID CALDERON
SUPERVISOR

Ana Gladys Chuchoque R.

FIRMA DEL CONTRATISTA
CONSORCIO 4KED-2025
R.L. ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ

V° B° PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL IBAL

V° B° PROFESIONAL ESPECIALIZADO II GESTION AMBIENTAL IBAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
IBAL4
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria
Fecha generación: 12/11/2025 13:58:00
Fecha expedición: 12/11/2025 13:58:01

CONSORCIO 4KED -2025
NIT: 901931668-2
CR 8 D # 189 - 50 OF 501
BOGOTÁ. D.C. (DC) Colombia
TEL: 3112109143
4kconstructora@gmail.com

FACTURADO A

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL
NIT 800089809-6
CRA 3 N 1-04 BOGOTÁ. D.C. (DC)
ventanilla.unica@ibal.gov.co
Principal

CUFE: e213971ab6d00a43b5c25bdce15616f8c0892379d07ebd6b24b4f989726356f2db876edb955cdfbc6d47c4b104dc3667

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	**Cód.: 010** CONTRATO DE OBRA COSTO DIRECTO	1	$ 379.860.520,00		$ 379.860.520,00
2	**Cód.: 011** AIU 30%	1	$ 113.958.156,00		$ 113.958.156,00

Total cantidad : 2
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

SUBTOTAL	$ 493.818.676,00
TOTAL NETO	**$ 493.818.676,00**

ACTA N° 4 CONTRATO DE OBRA No : 053 DEL 03 DE ABRIL DE 2025 - TIENE POR OBJETO; CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA PARA AFECTACIÓN DE REMOCIÓN EN MASA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO PIEDRA PINTADA PROPIEDAD DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL. IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CONSORCIADOS; % PARTICIPACION:
CONSTRUCTORA 4K SAS NIT. 901.232.551-0 (50%)
J.R. CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA S.A.S NIT. 901.722.160-7 (25%)
EVER LEONARDO RAMIREZ ARIAS C.C 88.283.109 (25%)

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764093486535 vigencia de 23/05/2025 al 23/05/2027 rango del 1 al 100 prefijo IBAL. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com
