FECHA (D/M/A): (4) Septiembre 02/2025	BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Bachas		
RANGO:	0	CANTIDAD:	4.83 Ton
ZONA	5	FRENTE DE TRABAJO:	2
COMUNA	14		
BARRIO	La Florida		

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES: INICIO: 7:00 Am	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
TERMINACIÓN: 4:00 Pm	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA	Soleado
TARDE	Soleado

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Identificación de las áreas que van hacer intervenidas.
- Instalación de la señalización, según PMT.
- Demarcación demolición y retiro del pavimento existente
- Compactación de la base granular, para observar su estado.
- Imprimación con emulsión asfáltica en frio.
- Aplicación y compactación de la mezcla asfaltica MDC 19 con RAP TIBIA, proveniente de la planta PROCOPAL.
- Recogida de los escombros en la volqueta.
- Limpieza y aseo del área de trabajo
- Retiro de la señalización PMT.

Observaciones: Se realizan mitigaciones sobre la CL 10 CR 32B y 30A.
- Restaura 1 texto PARE en el bache 5. CRSA CR 39 - 170
- Se reparancia el bache Nº 3 para realizar nucleo CL 5A CR 39 + 12m.
- Se realiza la limpieza de 1 sumidero CL 5A

5. VISITANTES

Jorge Monsalve

6. FIRMAS

NOMBRE: Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Henry Lopera. Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA 224	FIRMA (Python). Cortés A
NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): Sept 02 / 2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Sí	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Jaima Vara	X	—	Vialmad
2	Encargado	—	—	—	—
3	Liguero	Laivar Enrique Padilla	X	—	E Y P
4	Rastrillero	Javier Montal Solo	X	—	E Y P
5	Rastrillero	—	—	—	—
6	Ayudante	Simon Uran Jaramillo	X	—	E Y P
7	Ayudante	Cristian Alejandro Martinez	X	—	E Y P
8	Ayudante	Alvaro Antonio Mora.	X	—	E Y P
9	Ayudante	Jaima Ernay Carmona	X	—	E Y P
10	Ayudante	Luis Felipe Arbolada.	X	—	E Y P
11	Ayudante	Hugo Rios	—	—	
12	Ayudante		—	—	
13	Ayudante		—	—	
14	Ayudante		—	—	
15	Ayudante		—	—	
16	Operador Rodillo manual	Alvaro Antonio Mora.	X	—	E Y P
17	Operador compresor	Misael Olaya.	X	—	J Y H
18	Operador fresadora		—	—	
19	Operador finisher		—	—	
20	Operador Retroexcavadora		—	—	
21	Operador Vibrocompactador		—	—	
22	Operador Compactador llantas		—	—	
23	Operador Cortador Asfalto		—	—	
24	Operador Equipo Imprimación	Laivar Enrique Padilla	X	—	E Y P
25	Operador Mini cargador		—	—	
26	Operador Barredora		—	—	
27	Coductor Carrotanque		—	—	
28	Conductor Camión	William Colorado	X	—	Josa Homid.
29	Conductor Volqueta(s)	Mateo Arango.	X	—	E Y P
30	Controladora vial	Ana Yardanis Aguirre	X	—	E Y P
			—	—	
			—	—	
			—	—	
			—	—	

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Sí	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	Ecorodd EC 770	X	—	
2	Compresor	Ingersoll Rond.	X	—	
3	Fresadora		—	—	
4	Finisher		—	—	
5	Retroexcavadora		—	—	
6	Vibrocompactador		—	—	
7	Compactador llantas		—	—	
8	Cortador Asfalto		—	—	
9	Equipo Imprimación	Marmita	X	—	
10	Placa vibratoria	Honda FC 30	X	—	
11	Soplador		—	—	
12	Mini cargador		—	—	
13	Barredora		—	—	
14	Carrotanque		—	—	
15	Camión	12050 SZP 329	X	—	
16	Volqueta(s)	Internacional SMV 676	X	—	
17	Baño Movil	S Y E	X	—	
			—	—	
			—	—	

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): Sept 02/2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	A (m)	e (m)	Área (m2)	Vol (m3)	Ton
5003643	160437	1	CL 5A CR 39 - 62	1.38	1.10	0.10	1.52	0.15	0.36
5003643	160438	2	CR 5A CR 39 - 62 +7m	2.66	0.80	0.23	2.13	0.49	1.17
500643	155559	3	CL 5A CR 39 - 62 +12m	2.65	1.57	0.12	4.16	0.50	1.20
5003642	160422	4	CL 5A CR 39 - 131	2.07	1.70	0.11	3.52	0.39	0.93
5003642	160421	5A	CL 5A CR 39 - 170	1.64	0.75	0.12	1.23	0.15	0.35
5003642	160421	5B	CL 5A CR 39 - 170	1.00	1.66	0.12	1.66	0.20	0.48
5003642	158023	6	CL 5A CR 39 - 194	0.62	0.42	0.12	0.26	003	0.07
5003865	160439	7	CL 10 CR 32B	1.10	0.60	0.04	0.66	0.03	006
5003865	160440	8A	CL 10 CR 32B +5m	0.60	0.80	004	048	002	005
5003865	160440	8B	CL 10 CR 32B +5m	1.20	0.37	0.04	0.44	002	004
5003865	160441	9	CL 10 CR 32B +6m	0.80	0.60	0.05	0.48	0.02	0.06
4001474	160442	10	CL 10 CR 30A - 71	0.70	0.70	0.05	0.49	002	006
TOTALES							1703	2.02	4.83

MEZCLA ASFALTICA

REMISIoN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
233664	SMV 676	4.83	—	140


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICION
23753	SMV 676	Sencillo	1	Procopal

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): Sept 2 /2025

10. ESQUEMAS

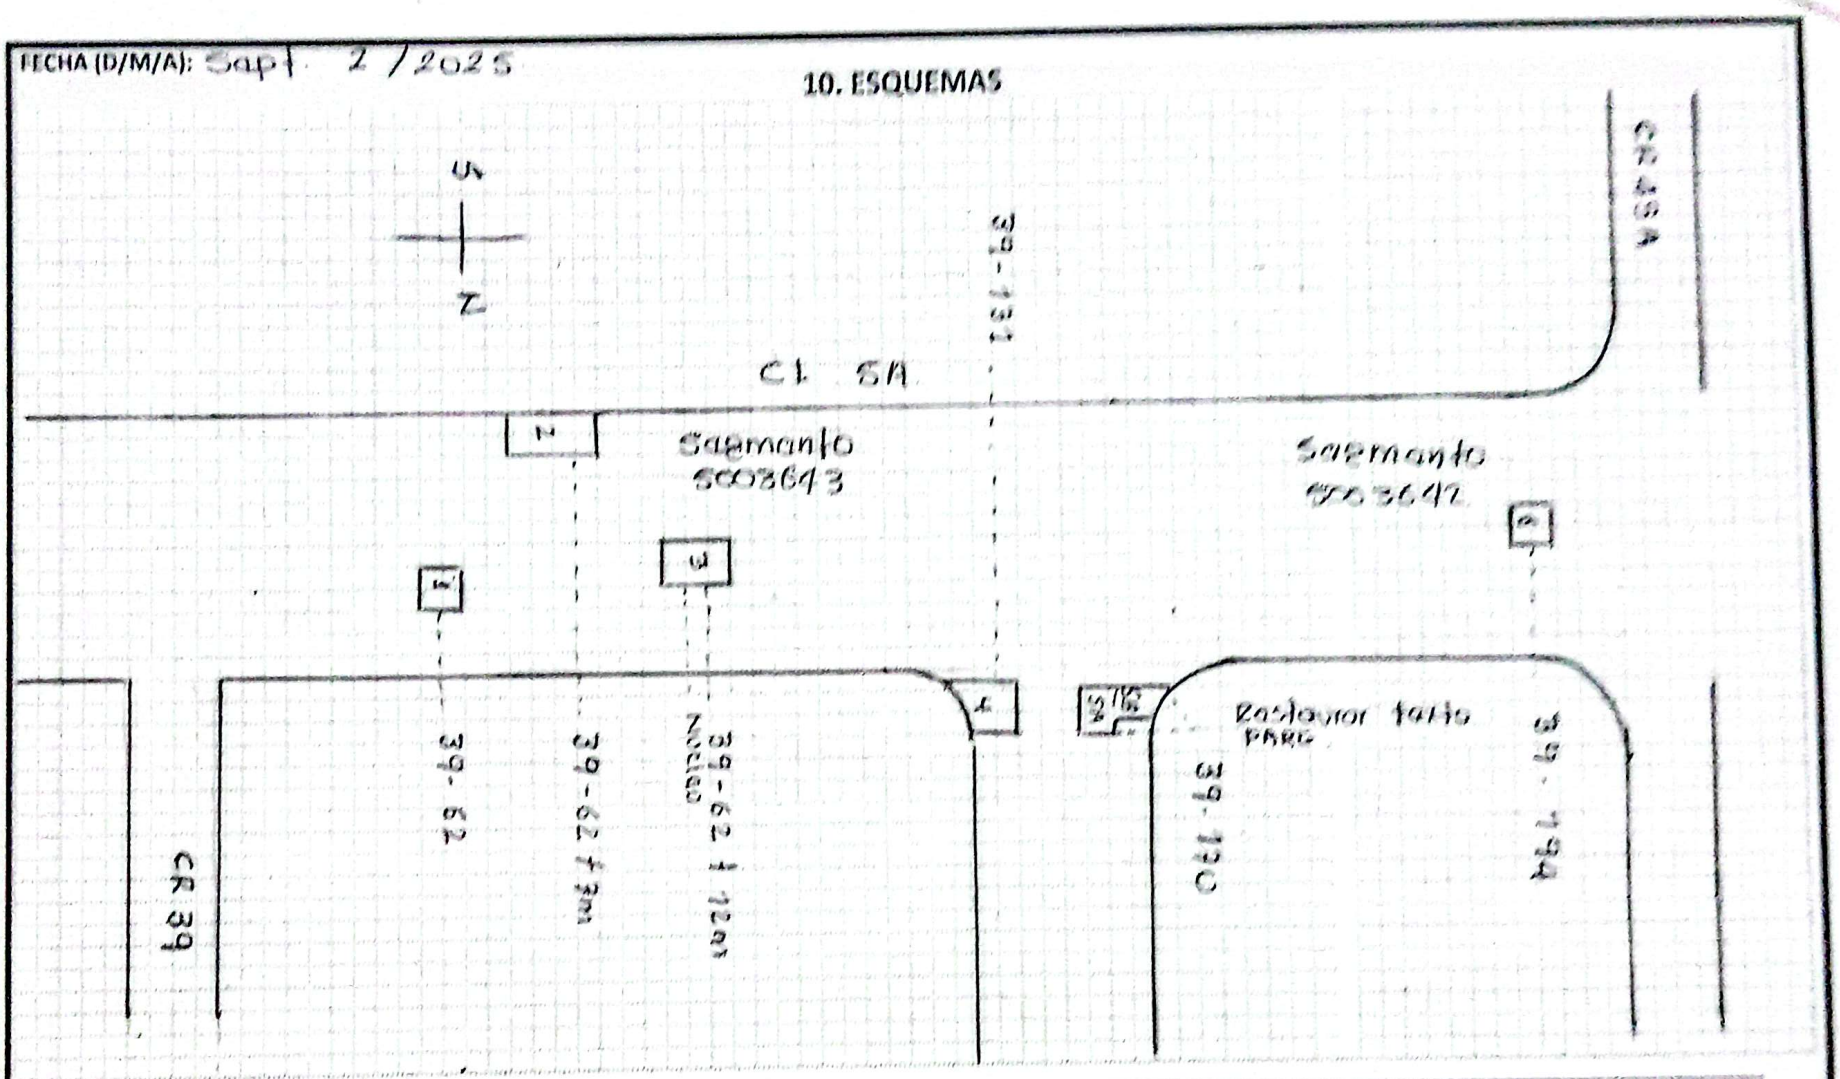


TIPO DE INTERVENCIÓN:	Bachas	FRENTE	2
RANGO:	0	CANTIDAD:	4.83 TON
BARRIO	La Florida	DIRECCIÓN	CL SN CR 39

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A):


10. ESQUEMAS

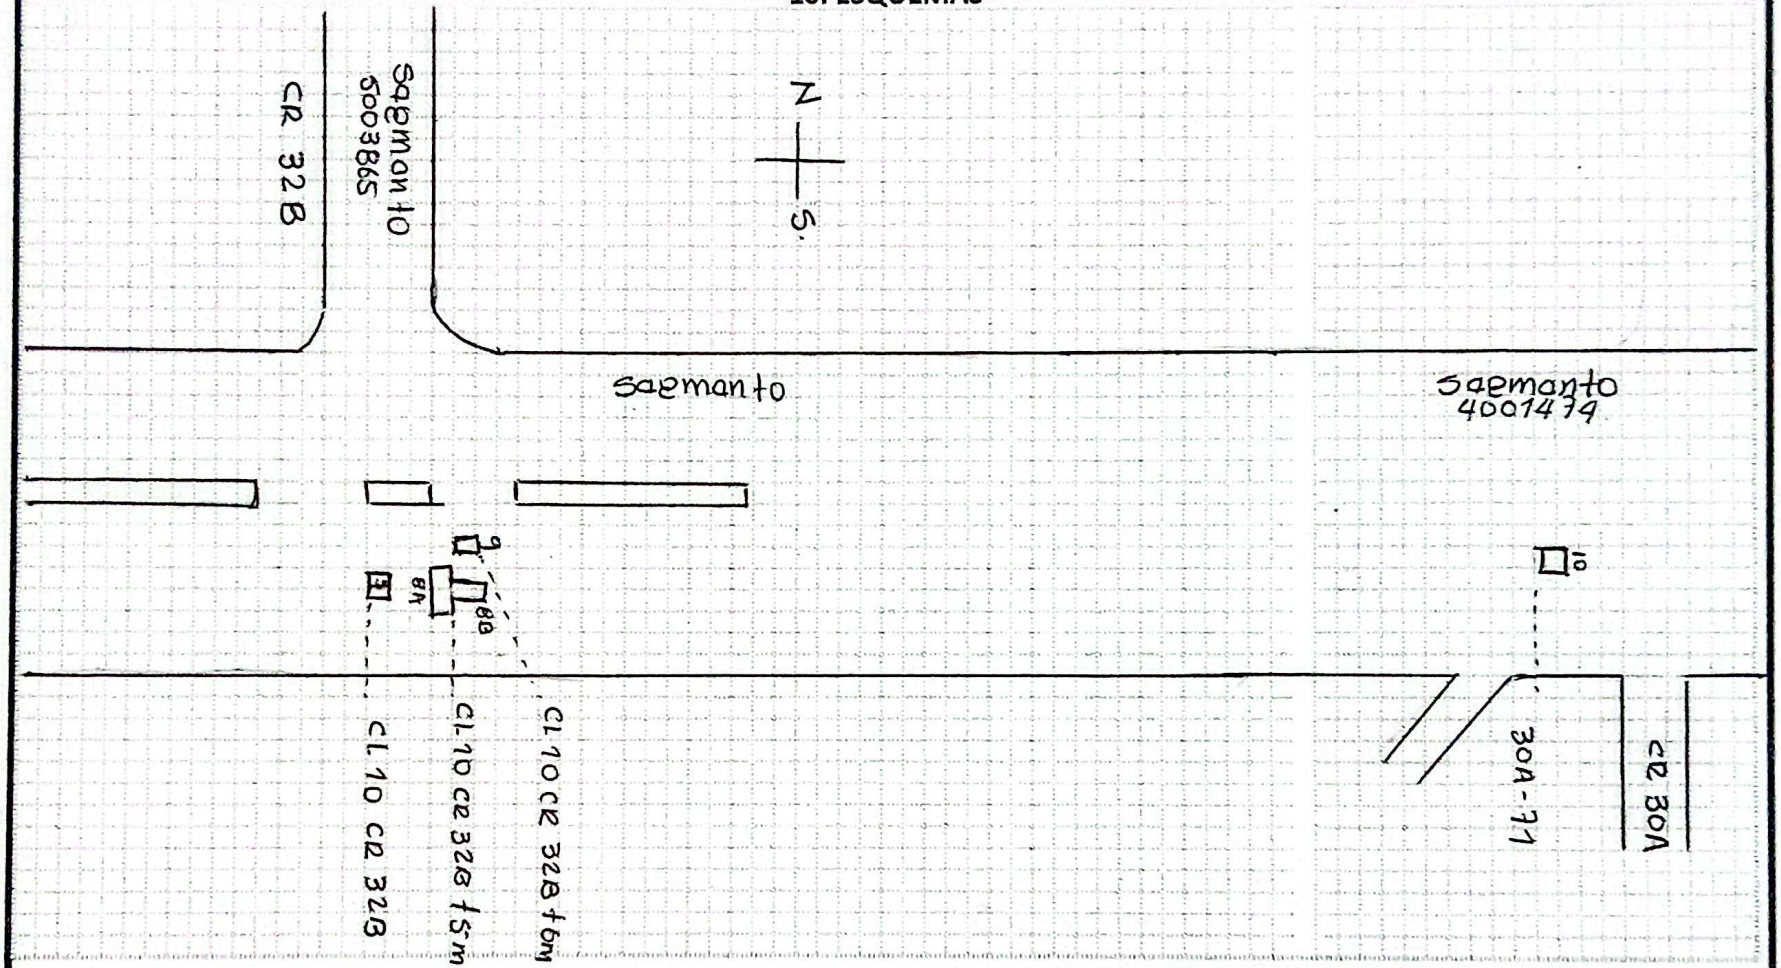

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Bachas	FRENTE	2
RANGO:	O	CANTIDAD:	4.83 Ton
BARRIO	Las Lomas Nº 1	DIRECCIÓN	CL 10 CR 32B

Powered by CamScanner

PROCOPAL S.A.

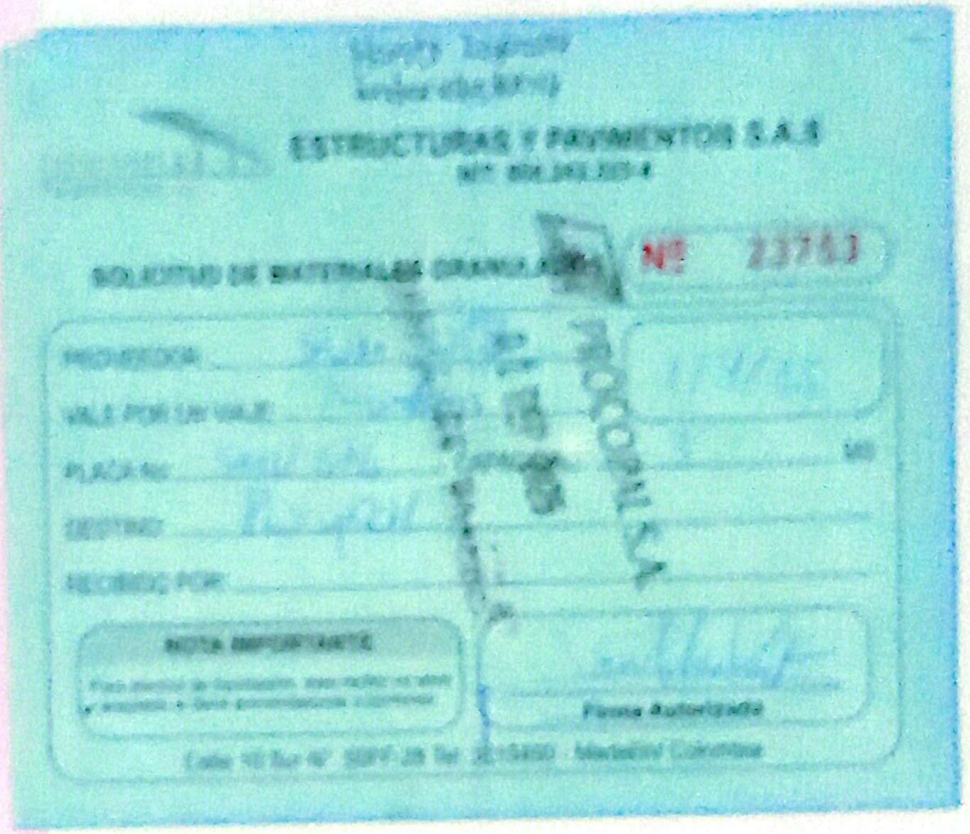

Henry Lopez
Interventor
