FECHA (D/M/A): Septiembre 05 / 2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Bachas

RANGO: 0

CANTIDAD: 4.83 Ton.

ZONA: 4

COMUNA: 77

BARRIO: Florida Nueva

FRENTE DE TRABAJO: 2

Alcaldia de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 7:00 Am

TERMINACIÓN: 6:30 Pm

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: Desplazamiento a varias diracciones, esto retrazo las actividades.

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleada

TARDE: Soleada

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Identificación de los bachas que se van a intervenir.
- Instalación de la señalización segun PMT
- Demarcación, demolición y retiro del pavimento existente.
- compactación de la base granular, para observar su estado.
- Aplicación de emulsion asfaltico en FRIO.
- Aplicación y compactación de la mezcla asfaltico MDC 19 con RAP TIBIA, proveniente de la planta PROCOPAL
- Recogido de los escombros en la volqueta.
- Limpieza y aseo del area de trabajo.
- Retiro de la señalización PMT.

Observaciones: Se inician actividades a las 10:00Am por combio de direccion de CR 80 CL 75 a la CR 74 CL 44 y luego se traslada la cuadrilla para la TV superior CR 25 CL 16 para atender un bache mediatico, estos traslados retrazan las actividades de la jornada.

- Restaura pintura - horizontal D628 CL 16 - 107 linea 040 achurado
- Se referencia la intervención # 1 para realizar nucleo CR 74 CL 44-03, restaurar Lineas de 040 cruce Peatonal.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Vo. Bo TECNOLOGO CONTRATISTA	Henry Lopera. Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Vo. Bo INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): Sept 05/2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA SI	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Jaime Vera	X	—	Vialmad
2	Encargado	—	—	—	—
3	Liguero	Laiver Enrique Padilla	X	—	EYP
4	Rastrillero	Javier Manuel Soto	X	—	EYP
5	Rastrillero	—	—	—	—
6	Ayudante	Simon Uran Jaramillo	X	—	EYP
7	Ayudante	Cristian Alejandro Jimenez	X	—	EYP
8	Ayudante	Alvaro Antonio Mora	X	—	EYP
9	Ayudante	Jaime Ernay Carmona	X	—	EYP
10	Ayudante	Luis Felipe Arbolado	X	—	EYP
11	Ayudante	Hugo Rios	X	—	EYP
12	Ayudante		—	—	
13	Ayudante		—	—	
14	Ayudante		—	—	
15	Ayudante		—	—	
16	Operador Rodillo manual	Alvaro Antonio Mora	X	—	EYP
17	Operador compresor	Misael Ortega	X	—	HYH
18	Operador fresadora		—	—	
19	Operador finisher		—	—	
20	Operador Retroexcavadora		—	—	
21	Operador Vibrocompactador		—	—	
22	Operador Compactador llantas		—	—	
23	Operador Cortador Asfalto		—	—	
24	Operador Equipo Imprimación	Laiver Enrique Padilla	X	—	EYP
25	Operador Mini cargador		—	—	
26	Operador Barredora		—	—	
27	Coductor Carrotanque		—	—	
28	Conductor Camión	William Colorado	—	—	Jose Hamid
29	Conductor Volqueta(s)				EYP
30	Controladora vial	Ana Yordanis Aguirre			EYP

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN SI	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	Ecoroad EC 770	X	—	
2	Compresor	Ingersoll Rand	X	—	
3	Fresadora		—	—	
4	Finisher		—	—	
5	Retroexcavadora		—	—	
6	Vibrocompactador		—	—	
7	Compactador llantas		—	—	
8	Cortador Asfalto		—	—	
9	Equipo Imprimación	Mamito	X	—	
10	Placa vibratoria	Honda Fc 30	X	—	
11	Soplador		—	—	
12	Mini cargador		—	—	
13	Barredora		—	—	
14	Carrotanque		—	—	
15	Camión	Isuzu SZP 329	X	—	
16	Volqueta(s)	Internacional SMV 676	X	—	
17	Baño Movil	S Y E	X	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): Septiembre 05/2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4002721	157489	1	CR 74 CL 44-03	1.56	3.75	0.12	5.85	0.70	1.68
4002721	160601	2	CL 44 CR 74-01	1.30	1.13	0.12	1.47	0.18	0.42
4004621	140588	3	DG 28 CL 16-107	2.40	3.05	0.10	7.32	0.73	1.76
4004660	160622	4	CR 25 CL 16 150m	2.14	1.57	0.12	3.36	0.40	0.97
TOTALES							18.00	2.01	4.83

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
233762	SMV 677	4.83	—	140


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
23756	SMV 677	Sencilla	1	Procopal

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A):

10. ESQUEMAS

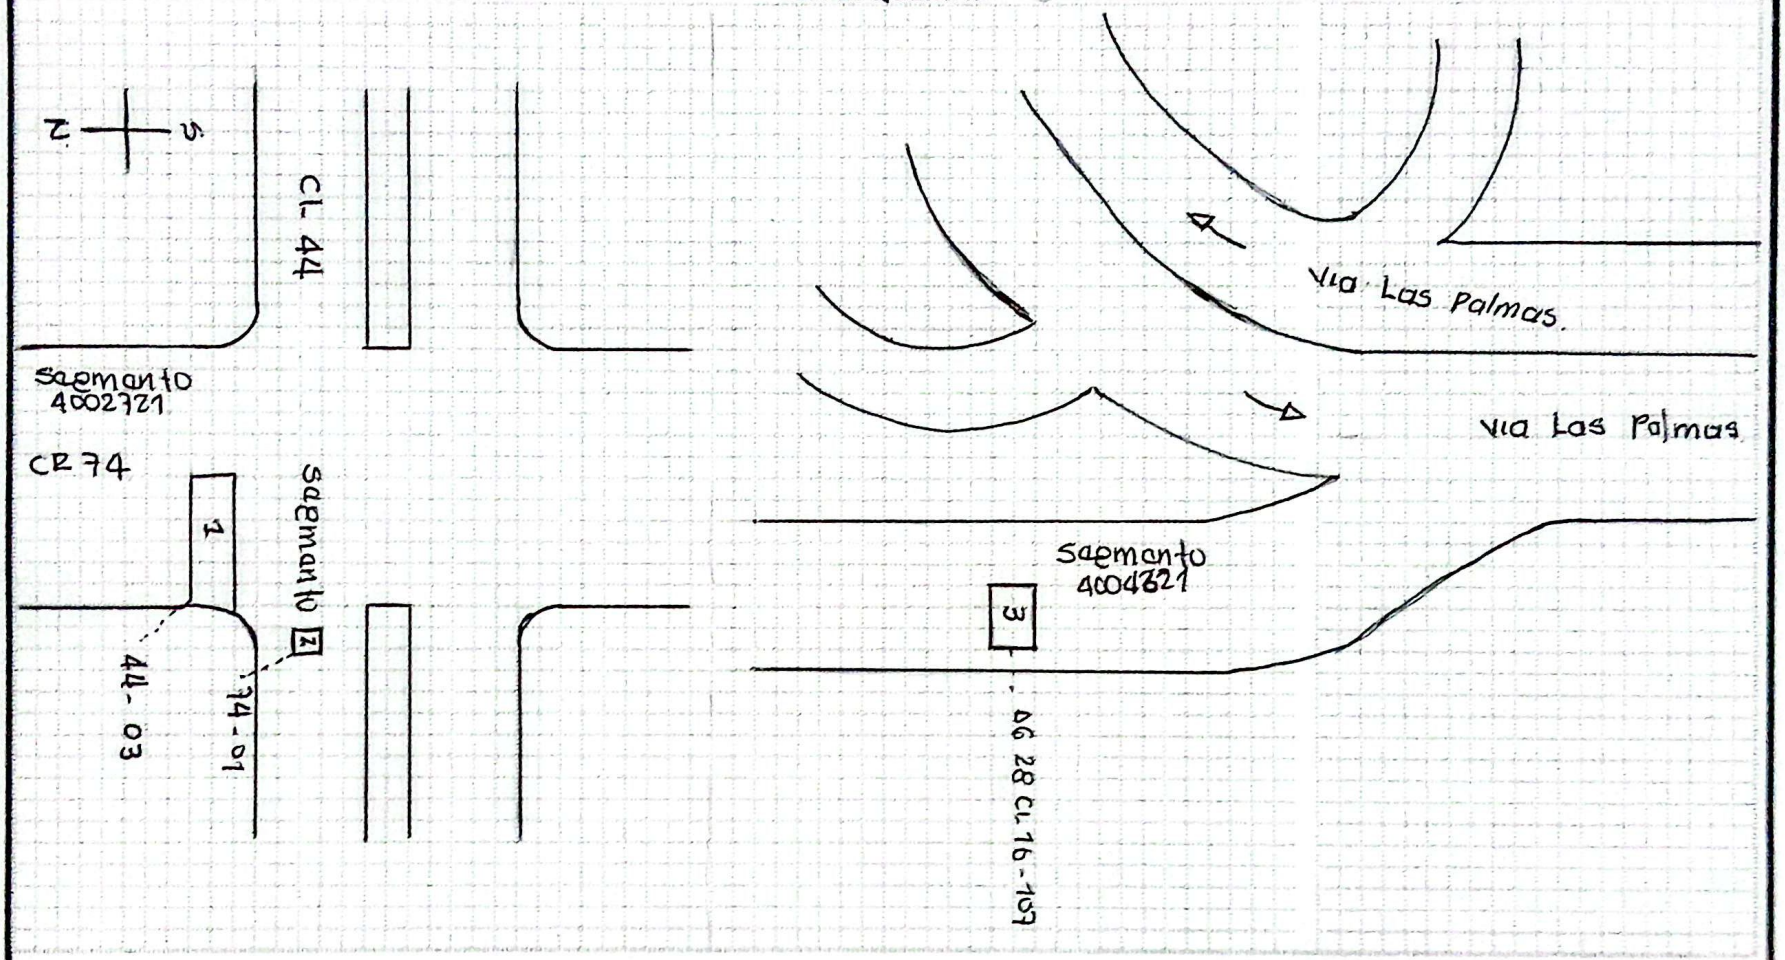


TIPO DE INTERVENCIÓN:	Bachas	FRENTE	2
RANGO:	O	CANTIDAD:	4.83 Ton
BARRIO	Florida Nueva	DIRECCIÓN	CR 74 CL 44

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A):

10. ESQUEMAS

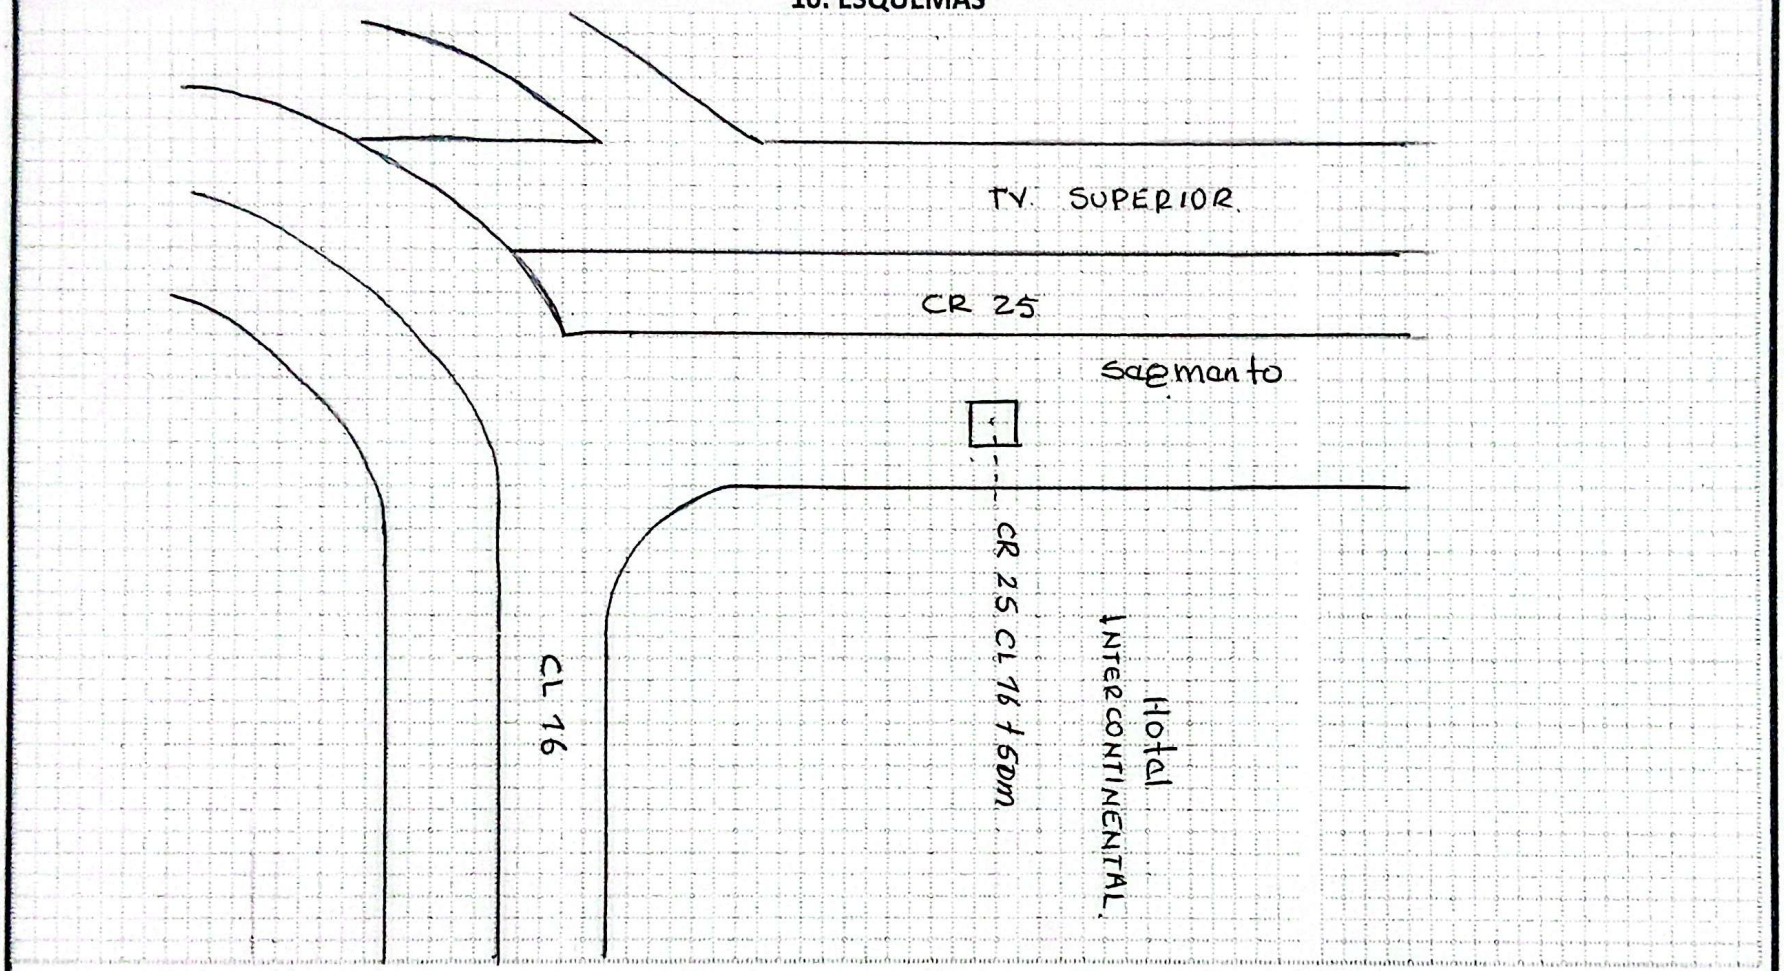

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Baches	FRENTE	2
RANGO:	0	CANTIDAD:	4.83 Ton ✓
BARRIO	Altos del Poblado	DIRECCIÓN	

Powered by CamScanner

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-RASCULA

TIQUETE DE BASCULA: 23762

FECHA: 05/09/2025

HORA: 8:43:03 AM

CONDUCTOR: ELKIN RUIZ

PLACA: SMV677

OBRA: 2207

CONCRETO: MEZ 45F, ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890704308

PESO BRUTO: 12.19 Toneladas

PESO TARA: 7.35 Toneladas

PESO NETO: 4.83 Toneladas

PRODUCTO: 112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MUNIP

TEMPERATURA: 140°C

VIAJE NUMERO: 1

TOTAL DESPACHADO: 4.83 Toneladas

Henry Lopera
Interventoria

Henry Lopera
Interventoria

Estructuras y Pavimentos

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 23756

PROCOPAL S.A.

PROVEEDOR: SUM 700 SAS

VALE POR UN VIAJE: RECIBIDO 05 SEP 2025

PLACA No: SMV 677 CAPACIDAD: 3 M3

DESTINO: Procopal

RECIBIDO POR:

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner
