FECHA (D/M/A): Septiembre 09 / 2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Bachas.

RANGO: 0

CANTIDAD: 4.83 Ton

ZONA: 6

COMUNA: 76

BARRIO: La Gloria

FRENTE DE TRABAJO: 2

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

"REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 7:00Am

TERMINACIÓN: 4:00 Pm

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: —

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleada

TARDE: Soleada

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Identificación de los baches que se van a intervenir.
- Instalación de la señalización segun PMT.
- Demarcación, demolición y retiro del pavimento existente
- Compactación de la base granular, para observar su estado
- Imprimación con emulsion asfaltica en frio.
- Aplicación y compactación de la mezcla asfáltica MDC 19 con RAP TIBIA, proveniente de la planta PROCOPAL.
- Recogida de los escombros en la volqueta.
- Limpieza y aseo del area de trabajo
- Retiro de la señalización PMT.

Observaciones: Restauración de señalización horizontal en CL 77 CR 82C - 04: Texto PARE, Linea de detención y Linea 0.12 central amarilla.

Se reparancio la intervención #1 para realizar nucleo CL 77 CR 82C 04. La Gloria.

- Se intervienen 4 puntos mediaticos.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Henry Lopera. Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): Sept 09/2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Jaime Vera	X	—	Vialmad
2	Encargado	—	—	—	—
3	Liguero	Laivar Enrique Padilla	X	—	EYP
4	Rastrillero	Javier Mandal Soto	X	—	EYP
5	Rastrillero	—	—	—	—
6	Ayudante	Simon Uran Jaramillo	X	—	EYP
7	Ayudante	Cristian Alejandro Jimenez	X	—	EYP
8	Ayudante	Alvaro Antonio Mora.	X	—	EYP
9	Ayudante	Jaime Ernay Carmona.	X	—	EYP
10	Ayudante	Luis Felipe Arboleda.	X	—	EYP
11	Ayudante	Hugo Rios	X	—	EYP
12	Ayudante		—	—	
13	Ayudante		—	—	
14	Ayudante		—	—	
15	Ayudante		—	—	
16	Operador Rodillo manual	Alvaro Antonio Mora	X	—	EYP
17	Operador compresor	Misael Ortega	X	—	JYH
18	Operador fresadora		—	—	
19	Operador finisher		—	—	
20	Operador Retroexcavadora		—	—	
21	Operador Vibrocompactador		—	—	
22	Operador Compactador llantas		—	—	
23	Operador Cortador Asfalto		—	—	
24	Operador Equipo Imprimación	Laivar Enrique Padilla	X	—	EYP
25	Operador Mini cargador		—	—	
26	Operador Barredora		—	—	
27	Coductor Carrotanque		—	—	
28	Conductor Camión	William Colorado	X	—	Josa Hamid
29	Conductor Volqueta(s)	Elkin Ruiz.	X	—	EYP
30	Controladora vial	Ana Yordanis Aguirre	X	—	EYD
			—	—	
			—	—	
			—	—	
			—	—	

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	Ecoroad EC 770	X	—	
2	Compresor	Ingarsoll Rand	X	—	
3	Fresadora		—	—	
4	Finisher		—	—	
5	Retroexcavadora		—	—	
6	Vibrocompactador		—	—	
7	Compactador llantas		—	—	
8	Cortador Asfalto		—	—	
9	Equipo Imprimación	Mormita	X	—	
10	Placa vibratoria	Honda FC30	X	—	
11	Soplador		—	—	
12	Mini cargador		—	—	
13	Barredora		—	—	
14	Carrotanque		—	—	
15	Camión	Isuzu SZP 329	X		
16	Volqueta(s)	Infamacional SMV 677	X	—	
17	Baño Movil	S y E	X	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): Sept. 09 / 2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5009180	159425	1	CL 17 CR 82C - 04	5.05	2.20	0.10	11.11	1.11	2.67
4004900	159373	2	CL 8 CR 84F - 346	2.35	1.63	0.10	3.83	0.38	0.92
2002210	159241	3	CR 81 CL 46 - 35	1.90	1.22	0.10	2.32	0.23	0.56
2002470	159240	4	CR 81 CL 46 - 65	2.85	0.90	0.11	2.57	0.28	0.68
TOTALES							19.83	2.00	4.83

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
233830	SMV 677	4.83	—	140


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
23758	SMV 677	Sencilla	1	Procopal

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): Sept. 09/2025

10. ESQUEMAS

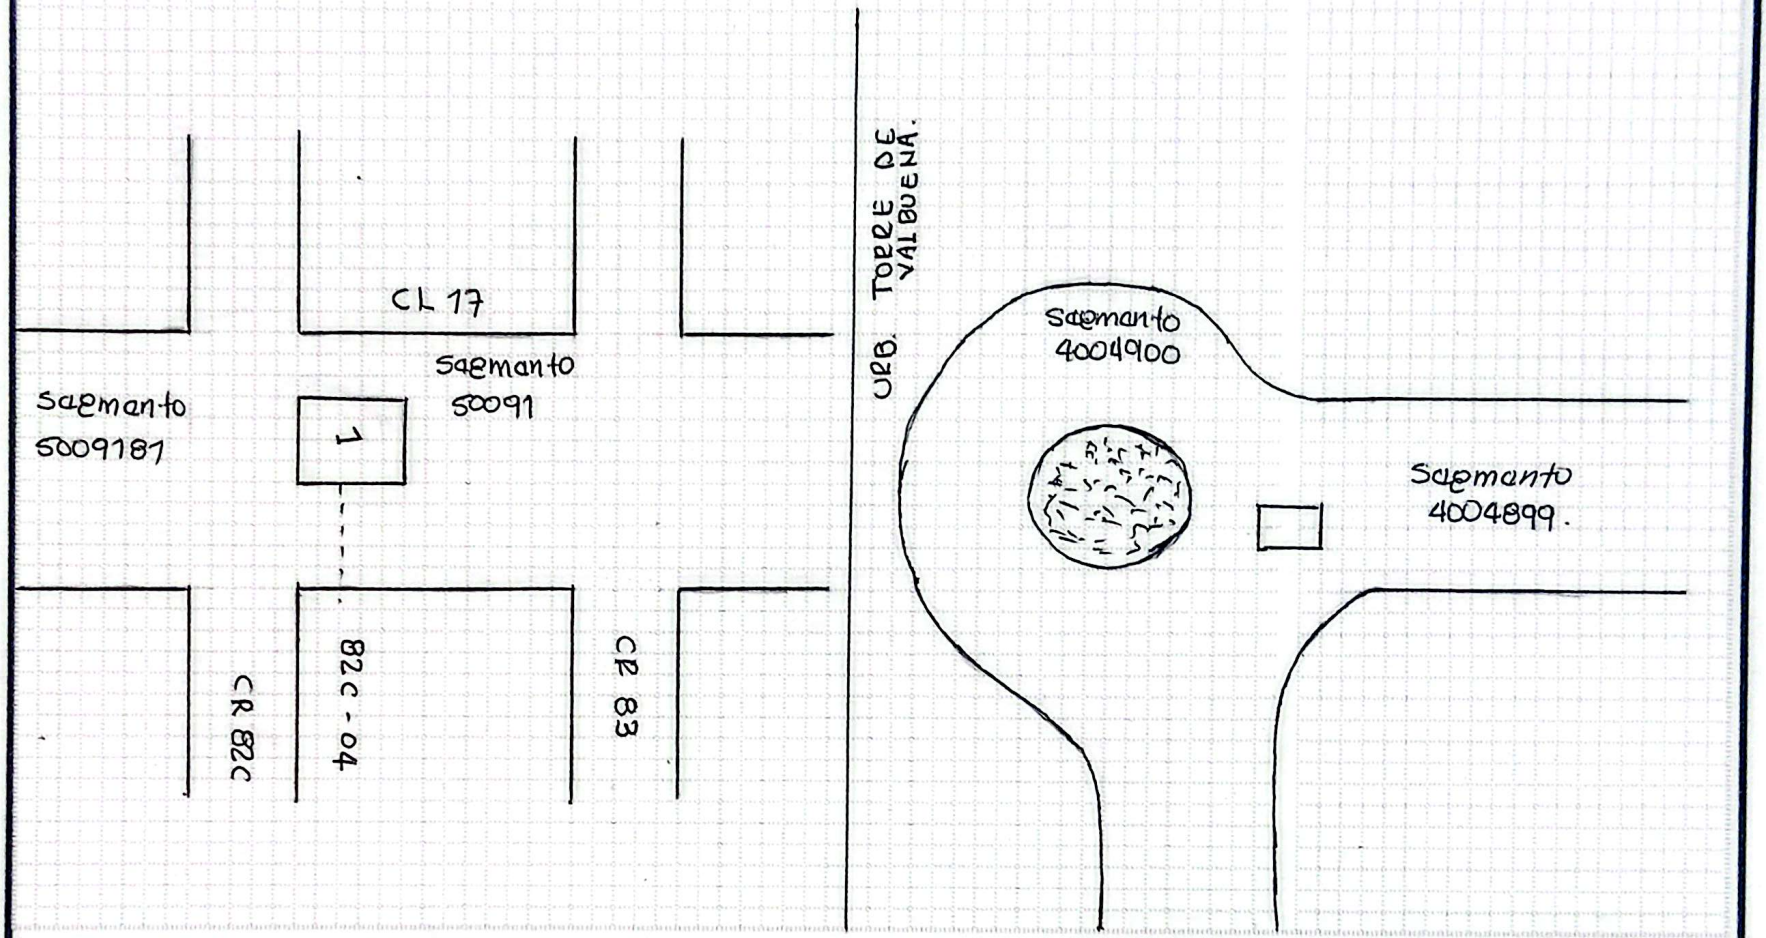


TIPO DE INTERVENCIÓN:	Bachas	FRENTE	2
RANGO:	0	CANTIDAD:	4.83
BARRIO	La Gloria	DIRECCIÓN	CL 17 CR 82C.

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): Sept. 11/2025

10. ESQUEMAS

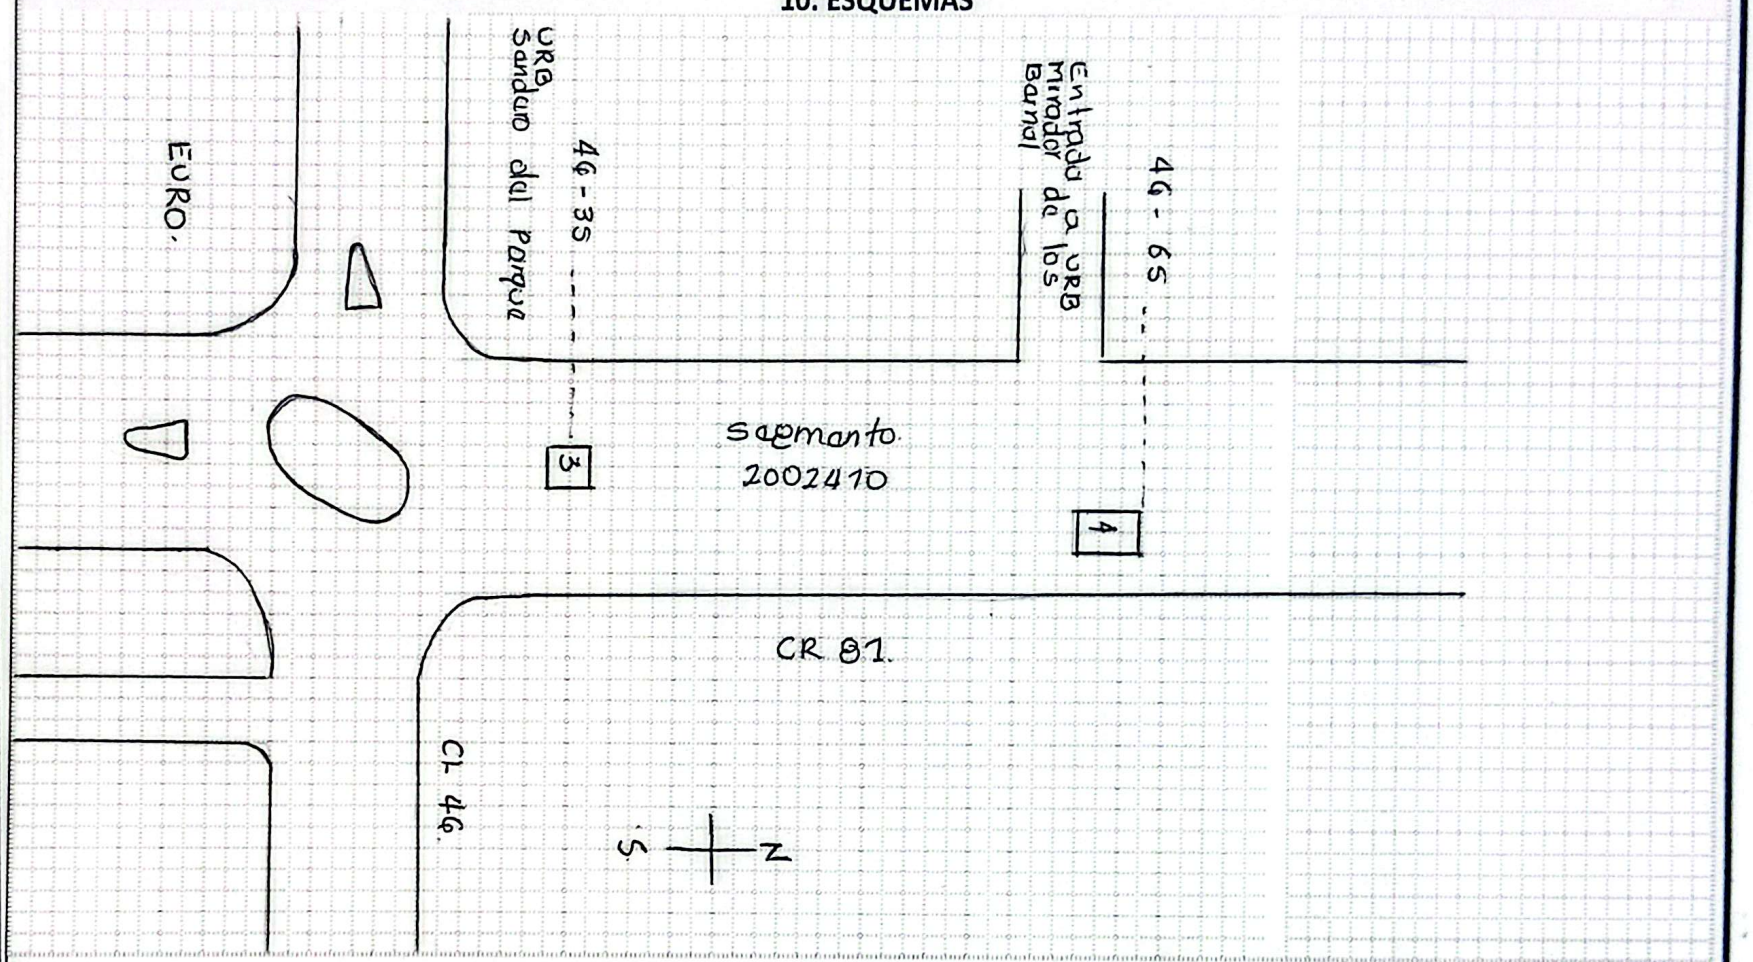

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Bachas	FRENTE	2
RANGO:	0	CANTIDAD:	4.83 Ton
BARRIO	La Gloria	DIRECCIÓN	CL 17 CR 82c

Powered by CamScanner

ESTRUCTURAS PAVIMENTOS

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

TIQUETE DE BASCULA: 233030

FECHA: 09/09/2025

HORA: 10:15:23 AM

CONDUCTOR: ELKIN RUIZ

PLACA: SMV677

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906398

PESO BRUTO: 12.21 Tonnes

PESO TARA: 7.38 Tonnes

PESO NETO: 4.83 Tonnes

PRODUCTO: 11

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 140°

VIAJE NUMERO: 1

TOTAL DESPACHADA: 4.83 Tonnes

Henry Lopera
Interventoria

Henry Lopera
Interventoria

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 23758

PROVEEDOR: SUM 2603

VALE POR UN VIAJE: 9/9/25

PLACA No: SMV 677 CAPACIDAD: 3 M3

DESTINO: Procopal

RECIBIDO POR:

PROCOPAL S.A. 9 SEP 2025 DESPACHOS - BASCULA

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner
