INFORME No. 04

CONTRATO:	345	**DEL AÑO:**	**2025**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO TERMINACION UMI**	**NIT No.:**	**901.919.277-7**
OBJETO:	**CONSTRUCCION PARA LA TERMINACION DE LA REMODELACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL** DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
PERIODO DEL INFORME:	**AGOSTO DE 2025.**		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE INFORME	SALDO	FACTURA
6.167.353.887,00	416.317.801,00	JUNIO DE 2025	5.751.036.086,00	FV-1
	444.278.554,00	JULIO DE 2025	5.306.757.532,00	FV-2
ADICION	3.083.611.678,00	JULIO DE 2025	8.390.369.210,00	N/A
	1.416.257.582,00	AGOSTO DE 2025	6.974.111.628,00	FV-3
	1.480.218.726,00	OCTUBRE DE 2025	5.493.892.902,00	FV-5

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 345 DE 2025

HACE CONSTAR:

Que: el **CONSORCIO TERMINACION UMI,** DURANTE EL MES DE **AGOSTO DE 2025,** HA VENIDO REALIZANDO LA **CONSTRUCCION PARA LA TERMINACION DE LA REMODELACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE** LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA.

El supervisor del contrato se permite certificar que el contratista cumplió con el objeto del contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas por el Hospital, tal como lo indican en certificación el Arquitecto **ALEXIS FABIAN MORENO GONZALEZ,** y la Arquitecta **MELISSA BERMUDEZ GUARIN,** en su condición de Apoyo a la Supervisión del Contrato por parte del Hospital, el Acta Parcial No. 4, la Sábana de Cuadro de Cantidades Contratadas y Ejecutadas, las Cantidades de Obra Acumulada, la Certificación de Interventoría de pago de Aportes a Seguridad Social y Parafiscales por parte del Contratista, Certificación de Interventoría de Cumplimiento con Requisitos Ambientales y Seguridad en el Trabajo por parte del Contratista, Certificación de Interventoría de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas de Materiales y Procesos Constructivos por parte del Contratista, Certificación de Interventoría de Revisión y Verificación de Planillas de Pago de Seguridad Social de los empleados por parte del Contratista, Informe de Interventoría del mes **de AGOSTO** de 2025, y Bitácora de Obra, los que hacen parte integral del presente, y sobre los cuales se basa la supervisión para la elaboración de este informe. (Se anexa CD con Acta Parcial No. 4. La cual contiene Sábana de Cantidades de Obra Ejecutada e Informe del mes de **AGOSTO DE 2025** con todos sus soportes).

PERSONA NATURAL			PERSONA JURÍDICA		
DOCUMENTO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**DOCUMENTO**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
PAGO INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL	X		FACTURA	**X**	
CUENTA DE COBRO			CERTIFICACIÓN DE ÁREA TÉCNICA	**X**	
INFORME DE ACTIVIDADES			CERTIFICACIÓN DE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL SOBRE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	**X**	
			INFORME DE ACTIVIDADES	**X**	

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

En consecuencia, el valor a pagar al contratista es de: **MIL CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS ($ 1.480.218.726.00) M/CTE.**

Se deja constancia que lo anterior no exime de futuros requerimientos por responsabilidad del orden legal, fiscal, penal etc. derivados de actuaciones en este contrato.

En constancia, se firma para efectos de pago. Tunja, octubre de dos mil veinticinco (2025).

VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
Supervisor Contrato.

Revisó: ARQ. **ALEXIS FABIAN MORENO GONZALEZ**. Apoyo Supervisión Contrato No. 345 de 2025.
ARQ. **IVON MELISSA BERMUDEZ GUARIN.** Apoyo Supervisión Contrato No. 345 de 2025.

C.C. Carpeta del Contrato.

Elaboró: Dora v. Secretaria Técnica Subgerencia Administrativa y Financiera.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD

LOS ARQUITECTOS DE APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No 345-2025 DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

CERTIFICA:

Que el: **CONSORCIO TERMINACIÓN UMI**, identificado con Nit. 901.919.277-7, presentó acta parcial de obra No 4, correspondiente al periodo de ejecución de obra del 01 de agosto al 31 de agosto del 2025, de acuerdo con las obligaciones derivadas del contrato 345 de 2025.

La siguiente es la relación de documentos a los cuales se les realizo la revisión, y que hacen parte del acta No 4. Aprobada por la interventoría.

1. Formato de ACTA PARCIAL, de la entidad, firmada por los representantes legales de contratista de obra e interventoría. (1 folio).

2. SABANA- CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS, con cantidades de obra contractuales, Balance de obra, condiciones actualizadas, cantidades de obra ejecutada en la presente acta, cantidades de obra acumuladas en acta anterior, Cantidades de obra acumulada. con valor total a pagar en la presente acta de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS, ($1.480.218.726,00) mtc moneda legal y corriente (3 folios).

3. Factura electrónica de venta No FV 5, emitida por el CONSORCIO TERMINACIÓN UMI. por valor ($1.480.218.726,00). (1 folio).

4. CERTIFICACION BANCARIA de la empresa CONSORCIO TERMINACIÓN UMI, con NIT. 901.919.277-7 expedida por el banco DAVIVIENDA el producto cuenta de Ahorros Ahorro No 0371 0009 3436 Aperturada el 05 DE JUNIO DE 2025. (1 folio).

5. CERTIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, emitida por la representante legal, ING. ESTEFANÍA CARVAJAL HENAO, firmada la BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO. (1 folio). Con fecha del 07 de octubre del 2025.

6. CERTIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES, por parte de contador de la empresa o CONSORCIO TERMINACIÓN UMI firmada bajo la gravedad de juramento y emitida por Contador público ELIZABETH JEIN ARIAS SOTO, con C.C. No 44.008.013 y tarjeta profesional No. 207538-T de la Junta Central de Contadores de Colombia. ANEXA fotocopia de cedula de ciudadanía, tarjeta profesional de contador público y certificación de vigencia emitida por la junta central de contadores. (4 folios).

7. Certificación firmada por la representante legal del CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025, certificando el Acta Parcial No 4 del contrato de obra, en cuanto al cumplimiento: Técnico, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo. (2 folios).

8. Certificación firmada por la representante legal del CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025, certificando al contratista en el CUMPLIMIENTO DE OBRA AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. (1 folio).

9. Certificación emitida por el representante legal del CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025, certificando al contratista en el CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS. (1 folio).

10. Certificación firmada por el representante legal del CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025, certificando al contratista en el CUMPLIMIENTO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.
    ANEXA:
    - Planillas de seguridad social No 79806242, (3) folios mes de agosto 2025 paga.
    - Planillas de seguridad social No 34458551, (4) folios mes de agosto 2025 paga.

11. Los profesionales de Apoyo a la supervisión anexan a esta certificación la siguiente documentación:
    - Informe No. 4 de supervisión a la interventoría contrato No.352 de 2025 correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de agosto de 2025. (8) folios.
    - Certificación de adherencia ISO 14001 DE 2015 Sistema de Gestión Ambiental mes de agosto 2025 (4) folios.
    - Certificación de adherencia en Seguridad y Salud en el trabajo mes de agosto 2025. (2) folios.

Razón por la cual, y considerando las revisiones, avales o aprobaciones de cantidades por parte de la interventoría función específica de la misma, vemos procedente realizar el pago correspondiente al acta parcial de obra No 4, por la suma total de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS, ($1.480.218.726,00) mtc moneda legal y corriente. Correspondiente al periodo del 01 de agosto al 31 de agosto del 2025.

Dada en Tunja a los 14 días del mes de octubre de 2025.

Anexo CD:
- Acta parcial de obra No 4 de fecha 07 octubre del 2025. Incluye certificaciones y memorias de cantidades firmadas por representantes de obra e interventoría.
- Informe de obra de interventoría del mes de agosto 2025.
- Informe No. 4 de supervisión a la interventoría contrato No.352 de 2025 correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de agosto de 2025. (8) folios.
- Certificación de adherencia ISO 14001 DE 2015 Sistema de Gestión Ambiental mes de agosto 2025 (4) folios.
- Certificación de adherencia en Seguridad y Salud en el trabajo mes de agosto 2025. (2) folios.

Cordialmente;

Revisó: **ALEXIS FABIAN MORENO GONZALEZ**
Profesional universitario arquitecto
Apoyo supervisión contrato No 345/2025

Elaboró: **MELISSA BERMÚDEZ GUARIN**
Profesional universitario arquitecta
Apoyo supervisión contrato No 345/2025

CONSORCIO TERMINACION UMI
NIT 901.919.277-7
Diagonal 74D 32BB 25
Tel: (604) 4883991
Medellín - Colombia
retencionesdelafuente@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 5

Señores	ESE Hospital Universitarios San Rafael de Tunja		
NIT	891.800.231-0	**Teléfono**	(608) 7405030 - Ext. 000
Dirección	Carrera 11 27 27	**Ciudad**	Tunja - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	14/10/2025, 09:13
Expedición	14/10/2025, 09:13
Vencimiento	21/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CONTRATO 345 DE 2025	1.00	1,138,629,789.00
2	AIU	1.00	341,588,937.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Mil cuatrocientos ochenta millones doscientos dieciocho mil setecientos veintiseis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-21 por $ 1,480,218,726.00

Total Bruto	1,480,218,726.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,480,218,726.00

Observaciones:
Valor total ejecutado presente acta parcial #4 (1 de Agosto 2025 a 31 de Agosto 2025)
$ 1.480.218.726

Favor consignar en la cuenta de Ahorros DAVIVIENDA No 0371 0009 3436 a nombre de CONSORCIO TERMINACION UMI Nit. 901.919.277-7

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764090657101 aprobado en 20250318 prefijo FV desde el número 1 al**

100 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4112 Construcción de edificios no residenciales Tarifa
CUFE: 7564bb4524ded17054443c27cf9ce34c776dd18d745cda5d379686c3bef0387a3e9426d841cb28680f38406a601a814d

Facturado Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica, ver en el XML

Código: C-F-45	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	
Versión: 01	FORMATO ACTA PARCIAL	Fecha: 24/03/2023
ACTA PARCIAL		FECHA: 07 DE OCTUBRE DE 2025

ACTA PARCIAL	No 4	
FECHA PRESENTE ACTA	07 DE OCTUBRE DE 2025	
CONTRATO __X__ CONVENIO _____	CONTRATO DE OBRA 345 DE 2025	DE FECHA: 08 DE MARZO DE 2025
OBJETO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	
CONTRATISTA	CONSORCIO TERMINACIÓN UMI	NIT: 901.919.277-7
	R.L. ING. ESTEFANÍA CARVJAL HENAO	C.C: 1.037.630.191
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025	NIT: 901.928.027-0
	R.L. BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO	C.C: 1.123.628.511
VALOR DEL CONTRATO:	VALOR INICIAL : $ 6.167.353.887,00	
ADICIONAL N° 1	VALOR $ 3.083.611.678,00	
ADICIONAL N° _____	VALOR $ 0,00	
VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 9.250.965.565,00	
PLAZO INICIAL	10 meses	
PRORROGA N° _____	Tiempo: De Fecha:	
PRORROGA N° _____	Tiempo: De Fecha:	
PLAZO TOTAL	10 meses	
FECHA DE INICIACIÓN	21/03/2025	
ACTA DE SUSPENSIÓN N° _____	De Fecha:	
ACTA DE REINICIACIÓN N° _____	De Fecha:	
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	31/12/2025	
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	Del 01/08/2025 al 31/08/2025	
RBPP N°	23201010010208	

No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No: 232010100102080808

En las oficinas de la obra en la Avenida universitaria 51 - 60 se reunieron los señores, BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO Interventora y la señora ING.ESTEFANÍA CARVAJAL HENAO como representante legal o contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato y registradas en los informes, por tanto el suscrito interventor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales de acuerdo a la(s) planilla (s) N° 79806242, 34458551 de Agosto 2025 de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$ 0,00
Sumatoria Amotizaciones	$ 0,00
Saldo por Amortizar	$ 0,00

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiacion, segun hoja anexa de fuentes de financiacion (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	9.250.965.565,00	
Amortización Anticipo		-
Valor a pagar de la presente acta		1.480.218.726,00
Valor Total actas pagadas		2.276.853.937,00
Saldo por ejecutar		5.493.892.902,00
Sumas iguales	9.250.965.565,00	9.250.965.565,00

**Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el balance por cada fuente segun hoja anexa (fuentes de financiacion- Balance) , diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No. CUENTA: 0371 0009 3436	BANCO: DAVIVIENDA	AHORROS: X	CORRIENTE:

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____
Nombre: ING. ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Contratista
CONSORCIO TERMINACIÓN UMI

Firma: _____
Nombre: BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE
ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-028
SABANA - CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS		FECHA: 24/Jul/2019

FECHA:	26/09/2025

CONTRATO:	345 DE 2025
OBJETO:	CONSTRUCCION PARA LA TERMINACION DE LA REMODELACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TERMIMACION UMI
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERHOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA
V. INICIAL	$ 6,167,353,887.00
V. ADICIONAL	$ 3,083,611,678.00
VALOR TOTAL	$ 9,250,965,565.00

FECHA DE INICIACIÓN REAL	21/03/2025	ACTA PARCIAL	x	
FECHA TERMINACIÓN S/ CONTRATO:	31/12/2025	ACTA FINAL		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	31/12/2025	ACTA No.	4	
		FECHA:	26 de septiembre de 2025	
		MES:	Agosto de 2025	

% OBRA EJECT.	40.6%	% TIEMPO	57.2%

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA					
						PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
No.	Descripción	Un	Cant.	Valor. Unit.	Valor. Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA**				**$ 524,036,456.00**		**$ 131,081,804.00**		**$ 147,437,638.00**		**$ 278,519,442.00**
1.01	ESTUCO MUROS	Metro Cuadrado	14,113.09	$ 10,154.00	$ 143,304,316.00	1,866.95	$ 18,957,016.39	7,432.19	$ 75,466,454.21	9,299.14	$ 94,423,470.61
1.02	ESTUCO MUROS ANCHOS MENORES DE 0,6 M	Metro lineal	1,071.86	$ 7,114.00	$ 7,625,212.00	23.11	$ 164,404.54	3,302.26	$ 23,492,277.64	3,325.37	$ 23,656,682.18
1.03	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	Metro lineal	3,721.31	$ 8,502.00	$ 31,638,578.00		$ -	4,590.88	$ 39,031,636.25	4,590.88	$ 39,031,636.25
1.04	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	Metro Cuadrado	8,099.70	$ 10,307.00	$ 83,483,608.00		$ -	-	$ -	-	$ -
1.05	PINTURA ANTIBACTERIAL PARA MUROS	Metro Cuadrado	6,013.39	$ 27,886.00	$ 167,689,394.00	3,218.46	$ 89,750,036.32	-	$ -	3,218.46	$ 89,750,036.32
1.06	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	Metro Cuadrado	2,463.10	$ 17,574.00	$ 43,286,519.00	849.12	$ 14,922,352.63	400.95	$ 7,046,308.04	1,250.07	$ 21,968,660.67
1.07	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES ANCHOS MENORES DE 0,6 M	Metro lineal	3,495.86	$ 13,447.00	$ 47,008,829.00	541.98	$ 7,287,994.30	178.55	$ 2,400,961.85	720.53	$ 9,688,956.15
2	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPES**				**$ 228,448,060.00**		**$ 73,765,070.00**		**$ 34,323,322.00**		**$ 108,088,392.00**
2.01	ENCHAPE CERÁMICA BLANCA 30X60CM	Metro Cuadrado	1,708.98	$ 113,392.00	$ 193,784,660.00	619.74	$ 70,273,138.53	286.14	$ 32,446,270.36	905.88	$ 102,719,408.89
2.02	REMATES BOCEL ALUMINIO "WINGS"	Metro lineal	1,200.00	$ 11,374.00	$ 13,648,800.00	307.01	$ 3,491,931.74	165.03	$ 1,877,051.22	472.04	$ 5,368,982.96
2.03	DILATACION BRONCE	Metro lineal	980.25	$ 21,438.00	$ 21,014,600.00		$ -	-	$ -	-	$ -
3	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS - BASES - ACABADOS**				**$ 843,775,523.00**		**$ 112,506,334.00**		**$ 165,220,886.00**		**$ 277,727,220.00**
3.01	MORTERO AUTONIVELANTE	Metro Cuadrado	938.24	$ 88,507.00	$ 83,040,808.00		$ -	-	$ -	-	$ -
3.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO	Metro lineal	2,360.65	$ 85,963.00	$ 202,928,556.00	677.81	$ 58,266,348.93	1,922.00	$ 165,220,886.00	2,599.81	$ 223,487,234.93
3.03	BOCA PUERTA EN GRANITO PULIDO (NO INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE)	Metro lineal	347.31	$ 74,452.00	$ 25,857,924.00	61.45	$ 4,575,298.76	-	$ -	61.45	$ 4,575,298.76
3.04	PULIDA Y DESTRONADO DE PISO EN BALDOSIN DE GRANITO	Metro Cuadrado	4,184.07	$ 41,392.00	$ 173,187,025.00	1,199.86	$ 49,664,686.66	-	$ -	1,199.86	$ 49,664,686.66
3.05	BANDAS ANTIDESLIZANTES	Metro lineal	168.75	$ 24,828.00	$ 4,189,725.00		$ -	-	$ -	-	$ -
3.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINÍLICO CONDUCTIVO (NO INCLUYE MEDIA CAÑA EN PVC)	Metro Cuadrado	100.76	$ 334,385.00	$ 33,692,633.00		$ -	-	$ -	-	$ -
3.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINÍLICO ANTIBACTERIAL (NO INCLUYE MEDIA CAÑA EN PVC)	Metro Cuadrado	838.16	$ 252,917.00	$ 211,984,913.00		$ -	-	$ -	-	$ -
3.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFIL MEDIACAÑA CURVO EN PVC	Metro lineal	2,060.98	$ 52,836.00	$ 108,893,939.00		$ -	-	$ -	-	$ -
4	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA**				**$ 955,798,285.00**		**$ 119,672,869.00**		**$ -**		**$ 119,672,869.00**
4.01	DIVISIÓN PARA BATERIA SANITARIA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 REF. 304 SATINADO	Metro Cuadrado	72.35	$ 717,097.00	$ 51,881,968.00		$ -	-	$ -	-	$ -
4.02	ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN ACERO INOXIDABLE	Metro lineal	50.09	$ 700,171.00	$ 35,071,565.00		$ -	-	$ -	-	$ -
4.03	PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO PINTURA BLANCA HOSPITALARIA.	Metro Cuadrado	591.07	$ 455,000.00	$ 268,936,850.00		$ -	-	$ -	-	$ -
4.04	VENTANA EN ALUMINIO PINTURA BLANCA HOSPITALARIA. NO INCLUYE VIDRIO, ESTE SE PAGA POR SU RESPECTIVO ITEM	Metro Cuadrado	644.94	$ 346,624.00	$ 223,551,683.00	147.57	$ 51,150,463.46	-	$ -	147.57	$ 51,150,463.46
4.05	MANTENIMIENTO PUERTA EXISTENTE EN PVC	Metro Cuadrado	380.73	$ 204,833.00	$ 77,986,068.00		$ -	-	$ -	-	$ -
4.06	MANTENIMIENTO VENTANA EXISTENTE EN PVC	Metro Cuadrado	160.76	$ 177,662.00	$ 28,560,943.00	69.91	$ 12,419,938.24	-	$ -	69.91	$ 12,419,938.24
4.07	VIDRIO 4 MM	Metro Cuadrado	31.14	$ 64,603.00	$ 2,011,737.00		$ -	-	$ -	-	$ -
4.08	VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD ESPESOR 3+3 MM	Metro Cuadrado	627.29	$ 252,578.00	$ 158,439,654.00	222.12	$ 56,102,466.99	-	$ -	222.12	$ 56,102,466.99
4.09	CERRADURA ALCOBA	Unidad	455.00	$ 57,038.00	$ 25,952,290.00		$ -	-	$ -	-	$ -
4.1	CERRADURA BAÑO	Unidad	50.00	$ 62,298.00	$ 3,114,900.00		$ -	-	$ -	-	$ -
4.11	CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO	Unidad	30.00	$ 136,131.00	$ 4,083,930.00		$ -	-	$ -	-	$ -
4.12	SELLADO DEL MARCOS VENTANERÍA CON FONDO DE JUNTA CON ESPUMA Y ACABADO DE JUNTA CON MASILLA ELÁSTICA DE POLIURETANO	Metro lineal	1,354.76	$ 28,460.00	$ 38,556,470.00		$ -	-	$ -	-	$ -
4.13	SUMINISTRO GUARDA CAMILLA PLÁSTICO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO INCLUYE PUNTERA DE REMATE	Metro lineal	204.80	$ 183,839.00	$ 37,650,227.00		$ -	-	$ -	-	$ -
5	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS**				**$ 270,163,748.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
5.01	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE FLUXOMETRO	Unidad	112.00	$ 1,975,246.00	$ 221,227,552.00		$ -	-	$ -	-	$ -
5.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS SOBREPONER ENNA COLOR BLANCO INC. GRIFERIA	Unidad	144.00	$ 294,224.00	$ 42,368,256.00		$ -	-	$ -	-	$ -
5.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO. GRIF TRADICIONAL CROMO	Unidad	5.00	$ 1,313,588.00	$ 6,567,940.00		$ -	-	$ -	-	$ -
6	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE DETECCIÓN**				**$ 330,884,334.00**		**$ 101,353,120.00**		**$ 108,948,669.00**		**$ 210,301,789.00**
6.01	TUBERIA EMT 3/4" (INCLUYE CONECTORES, SOPORTES, ETC)	Metro lineal	2,586.00	$ 29,662.00	$ 76,705,932.00		$ -	2,107.81	$ 62,521,860.22	2,107.81	$ 62,521,860.22
6.02	SALIDA APARATO DE DETECCIÓN	Unidad	432.00	$ 115,203.00	$ 49,767,696.00		$ -	403.00	$ 46,426,809.00	403.00	$ 46,426,809.00
6.03	CABLE FPLP	Metro lineal	5,339.00	$ 10,040.00	$ 53,603,560.00	1,969.56	$ 19,774,382.40	-	$ -	1,969.56	$ 19,774,382.40
6.04	BOCINA CON ESTROBO	Unidad	24.00	$ 409,105.00	$ 9,818,520.00	12.00	$ 4,909,260.00	-	$ -	12.00	$ 4,909,260.00
6.05	DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO	Unidad	350.00	$ 326,419.00	$ 114,246,650.00	176.50	$ 57,612,953.50	-	$ -	176.50	$ 57,612,953.50
6.06	DETECTOR TERMICO	Unidad	4.00	$ 298,604.00	$ 1,194,416.00	2.00	$ 597,208.00	-	$ -	2.00	$ 597,208.00
6.07	ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA	Unidad	24.00	$ 295,007.00	$ 7,080,168.00	12.00	$ 3,540,084.00	-	$ -	12.00	$ 3,540,084.00
6.08	MODULO DE MONITOREO	Unidad	30.00	$ 236,544.00	$ 7,096,320.00	15.00	$ 3,548,160.00	-	$ -	15.00	$ 3,548,160.00
6.09	PANEL DE CONTROL	Unidad	1.00	$ 11,371,072.00	$ 11,371,072.00	1.00	$ 11,371,072.00	-	$ -	1.00	$ 11,371,072.00
7	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES**				**$ 1,136,646,818.00**		**$ 157,981,154.00**		**$ 392,299,390.00**		**$ 550,280,545.00**
7.01	TUBERÍA DE COBRE TIPO L. DÍAM: 1/2". INCLUYE ACCESORIOS.	Metro lineal	1,100.00	$ 105,442.00	$ 115,986,200.00	614.01	$ 64,742,442.42	886.27	$ 93,450,081.34	1,500.28	$ 158,192,523.76
7.02	TUBERÍA DE COBRE TIPO L. DÍAM: 3/4". INCLUYE ACCESORIOS.	Metro lineal	1,500.00	$ 140,667.00	$ 211,000,500.00	485.51	$ 68,295,235.17	1,119.97	$ 157,542,819.99	1,605.48	$ 225,838,055.16
7.03	TUBERÍA DE COBRE TIPO L. DÍAM: 1". INCLUYE ACCESORIOS.	Metro lineal	174.00	$ 237,492.00	$ 41,323,608.00	16.75	$ 3,977,991.00	423.64	$ 100,611,110.88	440.39	$ 104,589,101.88
7.04	TUBERÍA DE COBRE TIPO L. DÍAM: 1-1/2". INCLUYE ACCESORIOS.	Metro lineal	90.00	$ 286,930.00	$ 25,823,700.00	21.79	$ 6,252,204.70	101.40	$ 29,094,702.00	123.19	$ 35,346,906.70
7.05	GENTEC CHEM WALL OUTLET - 1/2" - O2	Unidad	122.00	$ 543,829.00	$ 66,347,138.00	21.00	$ 11,420,409.00	-	$ -	21.00	$ 11,420,409.00
7.06	GENTEC CHEM WALL OUTLET - 1/2" - VAC	Unidad	140.00	$ 543,829.00	$ 76,136,060.00	11.00	$ 5,982,119.00	-	$ -	11.00	$ 5,982,119.00
7.07	GENTEC CHEM WALL OUTLET - 1/2" - AIR	Unidad	112.00	$ 543,829.00	$ 60,908,848.00	1.00	$ 543,829.00	-	$ -	1.00	$ 543,829.00
7.08	ALARMA DE ÁREA DE FABRICACIÓN NACIONAL TOUCH SCREEN PARA 1 GAS INCLUYE INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA DE 1/4" X SEÑAL, PANEL Y LOS SENSORES, INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA INTERNA DE LOS MÓDULOS, CONFIGURACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. (CABLEADO A CERO METROS).	Unidad	6.00	$ 9,221,997.00	$ 55,331,982.00		$ -	-	$ -	-	$ -
7.09	ALARMA DE ÁREA DE FABRICACIÓN NACIONAL TOUCH SCREEN PARA 3 GASES INCLUYE INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA DE 1/4" X SEÑAL, PANEL Y LOS SENSORES, INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA INTERNA DE LOS MÓDULOS, CONFIGURACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. (CABLEADO A CERO METROS).	Unidad	14.00	$ 10,460,643.00	$ 146,449,002.00		$ -	-	$ -	-	$ -
7.1	ALARMA DE ÁREA DE FABRICACIÓN NACIONAL TOUCH SCREEN PARA 6 GASES INCLUYE INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA DE 1/4" X SEÑAL, PANEL Y LOS SENSORES, INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA INTERNA DE LOS MÓDULOS, CONFIGURACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. (CABLEADO A CERO METROS).	Unidad	3.00	$ 11,855,110.00	$ 35,565,330.00		$ -	-	$ -	-	$ -
7.11	CAJA DE VÁLVULAS CON VÁLVULA TIPO 4 TORNILLOS 600 WOG. DÍAM: 1". FABRICACIÓN NACIONAL. INCLUYE INSTALACIÓN	Unidad	6.00	$ 2,395,849.00	$ 14,375,094.00		$ -	-	$ -	-	$ -

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA					
						PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
No.	Descripción	Un	Cant.	Valor. Unit.	Valor. Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
7.12	CAJA DE VÁLVULAS CON VÁLVULAS EN SS TIPO 4 TORNILLOS 600 WOG. DÍAM: 1/2"-1/2"-1/2"-1/2"-1/2"-3/4". FABRICACIÓN NACIONAL. INCLUYE INSTALACIÓN	Unidad	3.00	$ 2,650,117.00	$ 7,950,351.00		$ -	-	$ -	-	$ -
7.13	CAJA DE VÁLVULAS CON VÁLVULAS TIPO 4 TORNILLOS 600 WOG. DÍAM: 1/2"- 1/2"-1". FABRICACIÓN NACIONAL. INCLUYE INSTALACIÓN	Unidad	14.00	$ 2,091,900.00	$ 29,286,600.00		$ -	4.00	$ 8,367,600.00	4.00	$ 8,367,600.00
7.14	CONTROL DE REGULACIÓN TIPO 1 PARA CO2 Y N2O (DOS REGULADORES DE ALTA CONCOA 6788 Y UN REGULADOR DE LINEA CONCOA 6798 CON BY-PASS)	Unidad	1.00	$ 7,255,897.00	$ 7,255,897.00		$ -	-	$ -	-	$ -
7.15	CONTROL DE REGULACIÓN TIPO 1 PARA O2 Y AIRE DE ALTO FLUJO >45 NM3/HR (DOS REGULADORES DE ALTA CONCOA 6716 Y UN REGULADOR DE LÍNEA CONCOA 6794 Ó REGO 1784 CON BY-PASS)	Unidad	1.00	$ 8,650,025.00	$ 8,650,025.00		$ -	-	$ -	-	$ -
7.16	ESTRUCTURA PARA MANIFOLD 2X2 CON SOPORTES, VÁLVULAS DE CORTE DE ALTA PRESIÓN POR CILINDRO Y MANGUERAS IMPORTADAS. PARA INSTALAR A MURO.	Unidad	2.00	$ 10,180,069.00	$ 20,360,138.00		$ -	-	$ -	-	$ -
7.17	RACOR DISS PARA QUIROFANO PISO 2	Unidad	18.00	$ 48,787.00	$ 878,166.00		$ -	-	$ -	-	$ -
7.18	RACOR DISS PARA UCI PISO 2	Unidad	186.00	$ 48,787.00	$ 9,074,382.00		$ -	-	$ -	-	$ -
7.19	SISTEMA DE EVACUACIÓN DE GASES ANESTÉSICOS GENTEC 3816E- AGS, INCLUYE CAJA EN A. INOX. PARA MONTAJE EN PARED	Unidad	3.00	$ 9,344,441.00	$ 28,033,323.00		$ -	-	$ -	-	$ -
7.2	SISTEMA PULMÓN MEDICINAL (INTERCONEXIÓN SISTEMA PRINCIPAL Y SISTEMA BACKUP) - PLANO DAE-1154. INCLUYE INSTALACIÓN	Unidad	3.00	$ 7,391,525.00	$ 22,174,575.00		$ -	-	$ -	-	$ -
7.21	TOMA PANEL CONNECT II SERIE 400 VACÍO	Unidad	18.00	$ 545,385.00	$ 9,816,930.00		$ -	-	$ -	-	$ -
7.22	UNIDAD DE REGULACIÓN DOBLE EN COBRE DE 3/4" PARA TANQUE, TERMO O SISTEMA DE AIRE MEDICINAL SAM CON FILTROS EN Y Y REGULADORES REGO ALTO FLUJO	Unidad	3.00	$ 23,710,583.00	$ 71,131,749.00		$ -	-	$ -	-	$ -
7.23	VÁLVULA DE CORTE EN BRONCE, MARCA CIM O SIMILAR (NO PROCEDENCIA ASIÁTICA) DÍAM: 1". INCLUYE ADAPTADORES DE BRONCE. TODO COSTO	Unidad	4.00	$ 376,256.00	$ 1,505,024.00	-3.00	$ (1,128,768.00)	3.00	$ 1,128,768.00	-	$ -
7.24	VÁLVULA DE CORTE EN BRONCE, MARCA CIM O SIMILAR (NO PROCEDENCIA ASIÁTICA) DÍAM: 1/2". INCLUYE ADAPTADORES DE BRONCE. TODO COSTO	Unidad	191.00	$ 209,028.00	$ 39,924,348.00	-5.00	$ (1,045,140.00)	5.00	$ 1,045,140.00	-	$ -
7.25	VÁLVULA DE CORTE EN BRONCE, MARCA CIM O SIMILAR (NO PROCEDENCIA ASIÁTICA) DÍAM: 1-1/2". INCLUYE ADAPTADORES DE BRONCE. TODO COSTO	Unidad	2.00	$ 585,780.00	$ 1,171,560.00		$ -	-	$ -	-	$ -
7.26	VÁLVULA DE CORTE EN BRONCE, MARCA CIM O SIMILAR (NO PROCEDENCIA ASIÁTICA) DÍAM: 3/4". INCLUYE ADAPTADORES DE BRONCE. TODO COSTO	Unidad	114.00	$ 264,792.00	$ 30,186,288.00	-4.00	$ (1,059,168.00)	4.00	$ 1,059,168.00	-	$ -
8	**TANQUE DE ALMACENAMIENTO**				**$ 165,839,838.00**		**$ 146,185,870.00**		**$ 80,539,456.00**		**$ 226,725,326.00**
8.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA	Metro Cuadrado	120.00	$ 6,371.00	$ 764,520.00	1,478.00	$ 9,416,338.00	75.24	$ 479,354.04	1,553.24	$ 9,895,692.04
8.02	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	Metro Cúbico	236.54	$ 25,449.00	$ 6,019,706.00		$ -	341.62	$ 8,693,995.54	341.62	$ 8,693,995.54
8.03	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	Metro Cúbico	55.83	$ 64,534.00	$ 3,602,933.00	100.61	$ 6,492,636.67	27.33	$ 1,763,710.35	127.94	$ 8,256,347.02
8.04	RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	Metro Cúbico	17.79	$ 95,421.00	$ 1,697,540.00		$ -	13.66	$ 1,303,925.10	13.66	$ 1,303,925.10
8.05	TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO	M3-Km	1,004.27	$ 1,850.00	$ 1,857,900.00	32,369.51	$ 59,883,588.14	-	$ -	32,369.51	$ 59,883,588.14
8.06	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-Km	4,571.62	$ 2,312.00	$ 10,569,585.00	8,238.21	$ 19,046,748.25	-	$ -	8,238.21	$ 19,046,748.25
8.07	ENTIBADOS EN MADERA TIPO 2 PARA EXCAVACIONES 1 A 7 USOS	Metro Cuadrado	109.76	$ 74,859.00	$ 8,216,524.00	95.03	$ 7,113,476.48	-	$ -	95.03	$ 7,113,476.48
8.08	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.07MTS 14MPA (2000PSI)	Metro Cuadrado	84.48	$ 44,574.00	$ 3,765,612.00	141.94	$ 6,326,690.92	-	$ -	141.94	$ 6,326,690.92
8.09	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	Metro Cúbico	19.36	$ 1,060,141.00	$ 20,524,330.00		$ -	25.97	$ 27,532,063.20	25.97	$ 27,532,063.20
8.1	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	Metro Cúbico	18.30	$ 1,102,801.00	$ 20,181,258.00	2.71	$ 2,987,487.91	12.69	$ 13,994,544.69	15.40	$ 16,982,032.60
8.11	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPA	kilogramo	8,168.20	$ 7,002.00	$ 57,193,736.00	4,986.99	$ 34,918,903.60	3,516.98	$ 24,625,858.95	8,503.96	$ 59,544,762.55
8.12	CINTA SIKA PVC. V=0.22	Metro lineal	70.40	$ 76,643.00	$ 5,395,667.00		$ -	28.00	$ 2,146,004.00	28.00	$ 2,146,004.00
8.13	IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUES Y OBRAS HIDRAHULICAS TIPO SIKATOP SEAL 107 O SIMILAR.	Metro Cuadrado	102.96	$ 253,016.00	$ 26,050,527.00		$ -	-	$ -	-	$ -
9	**CONSTRUCCIÓN DE URBANISMO**				**$ 288,525,312.00**		**$ 2,473,614.00**		**$ 87,884,859.00**		**$ 90,358,474.00**
9.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	metro cubico	69.45	$ 64,534.00	$ 4,481,886.00	38.33	$ 2,473,614.27	803.41	$ 51,847,415.49	841.74	$ 54,321,029.77
9.02	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR	metro cubico	65.89	$ 90,646.00	$ 5,972,665.00		$ -	397.56	$ 36,037,443.77	397.56	$ 36,037,443.77
9.03	ANDEN ADOQUIN DE GRES	Metro Cuadrado	350.00	$ 133,668.00	$ 46,783,800.00		$ -	-	$ -	-	$ -
9.04	ASEO GENERAL ENTREGA	Metro Cuadrado	7,375.82	$ 7,139.00	$ 52,655,979.00		$ -	-	$ -	-	$ -
9.05	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPA - (2500 PSI)	Metro Cuadrado	120.00	$ 130,054.00	$ 15,606,480.00		$ -	-	$ -	-	$ -
9.06	PISO EN GRAMA INCL. TIERRA NEGRA	Metro Cuadrado	2,000.00	$ 30,843.00	$ 61,686,000.00		$ -	-	$ -	-	$ -
9.07	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.40 MTS - A=0.20 MTS, CONCRETO DE 2500 PSI	Metro lineal	120.00	$ 58,919.00	$ 7,070,280.00		$ -	-	$ -	-	$ -
9.08	BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70	Metro lineal	50.00	$ 97,011.00	$ 4,850,550.00		$ -	-	$ -	-	$ -
9.09	CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A - A120	Metro lineal	20.00	$ 61,090.00	$ 1,221,800.00		$ -	-	$ -	-	$ -
9.1	CERRAMIENTO METALICO	Metro Cuadrado	228.00	$ 386,824.00	$ 88,195,872.00		$ -	-	$ -	-	$ -
10	**ITEMS NO PREVISTOS**						**$ 293,609,954.00**		**$ 734,771,885.00**		**$ 1,028,381,838.00**
NP 1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CERÁMICA ANTIDESLIZANTE	Metro Cuadrado		$ 87,716.00		163.81	$ 14,368,407.10	-	$ -	163.81	$ 14,368,407.10
NP 2	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM.	Metro Cuadrado		$ 33,165.57			$ -	180.96	$ 6,001,641.55	180.96	$ 6,001,641.55
NP 3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSÍN DE GRANITO No. 5 (30 X 30 X 1.7 CM.)	Metro Cuadrado		$ 132,446.27			$ -	793.42	$ 105,085,519.54	793.42	$ 105,085,519.54
NP 4	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE FLUXOMETRO MOVILIDAD REDUCIDA	Unidad		$ 1,946,254.00			$ -	-	$ -	-	$ -
NP 5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE BAJOPONER COLOR BLANCO	Unidad		$ 332,271.20			$ -	-	$ -	-	$ -
NP 6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SEMIPEDESTAL	Unidad		$ 263,535.00			$ -	-	$ -	-	$ -
NP 7	SUMINISRTO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE TIPO PUSH	Unidad		$ 359,623.11			$ -	-	$ -	-	$ -
NP 8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE INCRUSTACIONES DE 3 PIEZAS PARA BAÑO (PORTAPAPEL, PORTAJABÓN, TOALLERO) EN ACERO INOXIDABLE	Unidad		$ 89,532.50			$ -	-	$ -	-	$ -
NP 9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"	Metro lineal		$ 73,154.27			$ -	-	$ -	-	$ -
NP 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8"	Metro lineal		$ 101,192.80		43.72	$ 4,424,149.22	4.00	$ 404,771.20	47.72	$ 4,828,920.42
NP 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"	Metro lineal		$ 212,563.05		12.10	$ 2,572,012.91	102.00	$ 21,681,431.10	114.10	$ 24,253,444.01
NP 12	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M. (NO INCLUYE TAPA).	Unidad		$ 737,541.36			$ -	-	$ -	-	$ -
NP 13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARO Y TAPA EN EN CONCRETO PREFABRICADO PARA POZO DE INSPECCIÓN. (D = 1.00 M.)	Unidad		$ 1,203,760.30			$ -	-	$ -	-	$ -
NP 14	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M. (2.00 M. < H < 2.50 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA).	Unidad		$ 2,608,699.27			$ -	-	$ -	-	$ -
NP 15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1600 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	Metro cuadrado		$ 7,326.84			$ -	81.22	$ 595,085.94	81.22	$ 595,085.94
NP 16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAVAS PARA LECHO FILTRANTE (16- 25 MM) DE CANTO RODADO.	Metro cubico		$ 157,693.66			$ -	60.37	$ 9,520,123.95	60.37	$ 9,520,123.95
NP 17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D = 4" PARA DRENAJE SIN FILTRO	Metro lineal		$ 33,484.59			$ -	26.20	$ 877,296.26	26.20	$ 877,296.26
NP 18	CONCRETO CICLÓPEO DE 21 MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P	Metro cubico		$ 588,756.71			$ -	36.77	$ 21,647,830.62	36.77	$ 21,647,830.62
NP 19	PASO PARA ESCALERA EN GRANITO PULIDO	Metro lineal		$ 161,374.53			$ -	-	$ -	-	$ -
NP 20	REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA DE LADRILLO O DE BLOQUE	Metro lineal		$ 2,696.49		145.61	$ 392,635.91	379.62	$ 1,023,641.53	525.23	$ 1,416,277.44
NP 21	CORTE Y DEMOLICION MURO Y/O PISO EN BALDOSA DE GRANO PARA LA INSTALACION DE MEDIA CAÑA	Metro lineal		$ 2,891.00		6,134.30	$ 17,734,267.08	-	$ -	6,134.30	$ 17,734,267.08
NP 22	CERRAMIENTO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DE 6 MM.	Metro cuadrado		$ 85,928.00			$ -	228.73	$ 19,653,933.36	228.73	$ 19,653,933.36
NP 23	FAJA EN MURO UNA CARA DE E = 0.08 M., EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DE 8 MM.	Metro lineal		$ 67,478.00		104.92	$ 7,079,791.76	-	$ -	104.92	$ 7,079,791.76
NP 24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO).	Kilogramo		$ 4,177.57			$ -	-	$ -	-	$ -
NP 25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CON VENA PARA PAÑETAR.	Metro cuadrado		$ 23,401.47			$ -	252.15	$ 5,900,750.86	252.15	$ 5,900,750.86
NP 26	PAÑETE LISO BAJO MALLA 1:4	Metro cuadrado		$ 39,441.07			$ -	471.37	$ 18,591,494.93	471.37	$ 18,591,494.93
NP 27	FAJA PAÑETE LISO MUROS 1:4	Metro lineal		$ 21,550.00		314.71	$ 6,782,000.50	623.45	$ 13,435,347.50	938.16	$ 20,217,348.00
NP 28	DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS.	Metro cuadrado		$ 31,209.12		81.84	$ 2,554,154.38	240.77	$ 7,514,063.78	322.61	$ 10,068,218.16
NP 29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO L. DÍAM: 2". INCLUYE ACCESORIOS.	Metro lineal		$ 349,372.00		9.86	$ 3,444,807.92	81.73	$ 28,554,173.56	91.59	$ 31,998,981.48
NP 30	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA DE ÁREA DOBLE DIGITAL GASES MEDICINALES	Unidad		$ 8,709,168.00			$ -	-	$ -	-	$ -
NP 31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE CORTE TIPO BOLA 4 TORNILLOS EN BRONCE DIAM 2"	Unidad		$ 738,206.00		1.00	$ 738,206.00	1.00	$ 738,206.00	2.00	$ 1,476,412.00
NP 32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE CORTE 2G 1/2"-1/2" EN BRONCE	Unidad		$ 1,267,835.00			$ -	-	$ -	-	$ -
NP 33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE 3/8 "L"	Metro lineal		$ 102,758.00			$ -	-	$ -	-	$ -
NP 34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE 5/8 "L"	Metro lineal		$ 175,155.00			$ -	-	$ -	-	$ -

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA					
						PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
No.	Descripción	Un	Cant.	Valor. Unit.	Valor. Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
NP 35	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE Y DIMENSIONES SEGUN DISEÑO. INCLUYE: SOPORTERIA (TIPO MÉNSULA, CUELGA, CORREA, VARILLA, O CUALQUIER OTRO REQUERIDO), ELEMENTOS DE SUJECIÓN, ANCLAJES, SELLANTE, ESQUINEROS, TORNILLERÍA Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	Kilogramo		$ 53,061.00		4,212.42	$ 223,514,958.34	8,924.57	$ 473,546,573.20	13,136.98	$ 697,061,531.53
NP 36	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOS EN LÁMINA RÍGIDA DE POLIISOCIANURATO DE 20 MM DE ESPESOR, REVESTIDO POR AMBAS CARAS CON UNA LÁMINA DE ALUMINIO GOFRADO DE 60 MICRAS DE ESPESOR. INCLUYE: ELEMENTOS DE SUJECIÓN, ANCLAJES, SELLANTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	Metro cuadrado		$ 179,927.00			$ -	-	$ -	-	$ -
NP 37	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VÍAS DE 6" X 6" , TIPO ALETA FIJA IGUALES O SIMILARES A LA REFERENCIA L-JS DE LAMINAIRE CON CONTROL DE VOLUMEN DE HOJAS MÚLTIPLES OPUESTAS OPERADAS POR UN SISTEMA DE PIÑÓN. INCLUYE: ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	Unidad		$ 190,111.00			$ -	-	$ -	-	$ -
NP 38	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VÍAS DE 8" X 8" , TIPO ALETA FIJA IGUALES O SIMILARES A LA REFERENCIA L-JS DE LAMINAIRE CON CONTROL DE VOLUMEN DE HOJAS MÚLTIPLES OPUESTAS OPERADAS POR UN SISTEMA DE PIÑÓN. INCLUYE: ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	Unidad		$ 222,511.00		3.50	$ 778,788.50	-	$ -	3.50	$ 778,788.50
NP 39	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VÍAS DE 9" X 9" , TIPO ALETA FIJA IGUALES O SIMILARES A LA REFERENCIA L-JS DE LAMINAIRE CON CONTROL DE VOLUMEN DE HOJAS MÚLTIPLES OPUESTAS OPERADAS POR UN SISTEMA DE PIÑÓN. INCLUYE: ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	Unidad		$ 268,111.00		28.50	$ 7,641,163.50	-	$ -	28.50	$ 7,641,163.50
NP 40	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VÍAS DE 12" X 12" , TIPO ALETA FIJA IGUALES O SIMILARES A LA REFERENCIA L-JS DE LAMINAIRE CON CONTROL DE VOLUMEN DE HOJAS MÚLTIPLES OPUESTAS OPERADAS POR UN SISTEMA DE PIÑÓN. INCLUYE: ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	Unidad		$ 288,111.00		5.50	$ 1,584,610.50	-	$ -	5.50	$ 1,584,610.50
NP 41	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 6x6 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER). INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	Unidad		$ 164,313.00			$ -	-	$ -	-	$ -
NP 42	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 8x6 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER). INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	Unidad		$ 281,182.00			$ -	-	$ -	-	$ -
NP 43	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 8x8 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER). INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	Unidad		$ 215,463.00			$ -	-	$ -	-	$ -
NP 44	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 10X6 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER). INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	Unidad		$ 281,182.00			$ -	-	$ -	-	$ -
NP 45	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 10x8 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER). INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	Unidad		$ 303,782.00			$ -	-	$ -	-	$ -
NP 46	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 12x6 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER). INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	Unidad		$ 342,917.00			$ -	-	$ -	-	$ -
NP 47	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 12X8 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER). INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	Unidad		$ 380,567.00			$ -	-	$ -	-	$ -
NP 48	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 12x12 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER). INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	Unidad		$ 418,117.00			$ -	-	$ -	-	$ -
NP 49	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 14x8 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER). INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	Unidad		$ 446,356.00			$ -	-	$ -	-	$ -
NP 50	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 18x8 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER). INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	Unidad		$ 495,741.00			$ -	-	$ -	-	$ -
NP 51	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 18x18 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER). INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	Unidad		$ 524,141.00			$ -	-	$ -	-	$ -
NP 52	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 20x16 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER). INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	Unidad		$ 717,925.00			$ -	-	$ -	-	$ -
NP 53	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR FLUJO LAMINAR QUIROFANO CON PORTA FILTROTERMINAL DE 24"X24"	unidad		$ 2,886,975.00			$ -	-	$ -	-	$ -
NP 54	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS HEPA TERMINALES 24" X 24" DE 3" DE ESPESOR	Unidad		$ 1,591,000.00			$ -	-	$ -	-	$ -
NP 55	BALANCEAMIENTO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE, VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE: BARÓMETRO O ANEMÓMETRO, TOMA DE MEDIDAS, SUPERVISIÓN E INFORME.	Unidad		$ 1,227,437.00			$ -	-	$ -	-	$ -
	COSTOS DIRECTOS				**$ 4,744,118,374.00**		**$ 1,138,629,789.00**		**$ 1,751,426,105.00**		**$ 2,890,055,895.00**
	A.I.U. __%				$ 1,423,235,513.00		$ 341,588,937.00		$ 525,427,832.00		$ 867,016,769.00
	COSTO TOTAL				**$ 6,167,353,887.00**		**$ 1,480,218,726.00**		**$ 2,276,853,937.00**		**$ 3,757,072,664.00**

VALOR OBRAS EJECUTADAS	**$ 1,480,218,726.00**
AMORTIZACIÓN ANTICIPO __%	$ -
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 1,480,218,726.00**

SON: MIL CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS ML

Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado
Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	1.01	ESTUCO MUROS	CAP	1.00
Registro fotográfico				









SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA	UNIDAD	Metro Cuadrado			UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL
Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
SOTANO						
19.00	2.54	N/A	1	100%	48.26	LAVANDERIA
1.50	2.10	N/A	-1	100%	-3.15	DESCUENTO PUERTA EN LAVANDERIA
27.90	2.70	N/A	1	100%	75.33	PARQUEADERO SOTANO
23.15	2.80	N/A	1	100%	64.82	PARQUEADERO SOTANO
1.00	2.10	N/A	-5	100%	-10.50	DESUENTO PUERTA AREA PARQUEADERO
1.50	2.10	N/A	-1	100%	-3.15	DESUENTO PUERTA AREA PARQUEADERO
0.70	2.10	N/A	-1	100%	-1.47	DESUENTO PUERTA AREA PARQUEADERO
0.40	2.00	N/A	-1	100%	-0.80	DESCUENTO VENTANA AREA DE PARQUEADERO
1.20	2.10	N/A	-5	100%	-12.60	DESUENTO PUERTA AREA PARQUEADERO
1.00	1.10	N/A	-1	100%	-1.10	DESCUENTO VENTANA AREA DE PARQUEADERO
14.00	2.45	N/A	1	100%	34.30	CONSULTORIO DE DIETAS
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO PUERTA CONSULTORIO DE DIETAS
16.66	2.45	N/A	1	100%	40.82	ROPA LIMPIA
1.40	2.10	N/A	-1	100%	-2.94	DESCUENTO PUERTA ROPA LIMPIA
9.38	2.50	N/A	1	100%	23.45	ROPA SUCIA
0.70	2.10	N/A	-1	100%	-1.47	DESCUENTO PUERTA ROPA SUCIA
48.88	2.55	N/A	1	100%	124.64	BODEGA FARMACIA
0.40	2.00	N/A	-1	100%	-0.80	DESCUENTO VENTANA BODEGA FARMACIA
0.80	2.10	N/A	-2	100%	-3.36	DESCUENTO DE PUERTA BODEGA FARMACIA
1.21	2.10	N/A	-1	100%	-2.54	DESCUENTO DE PUERTA BODEGA FARMACIA
38.10	2.52	N/A	1	100%	96.01	ARCHIVO
1.21	2.10	N/A	-1	100%	-2.54	DESCUENTO DE PUERTA ARCHIVO
0.40	1.20	N/A	-1	100%	-0.48	DESCUENTO VENTANA BODEGA FARMACIA
0.40	2.00	N/A	-1	100%	-0.80	DESCUENTO VENTANA BODEGA FARMACIA
20.21	2.45	N/A	1	100%	49.51	CIRCULACION DE ARCHIVO A DESPACHO DE DIETAS
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTA EN CICULACION
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO PUERTA EN CICULACION
1.40	2.10	N/A	-1	100%	-2.94	DESCUENTO PUERTA EN CICULACION
15.10	2.53	N/A	1	100%	38.20	CIRCULACION DE ROPA SUCIA A DEPOSITO DE CADAVERES
1.32	2.10	N/A	-1	100%	-2.77	DESCUENTO PUERTA EN CICULACION
0.70	2.10	N/A	-1	100%	-1.47	DESCUENTO PUERTA EN CICULACION
1.40	2.10	N/A	-1	100%	-2.94	DESCUENTO PUERTA EN CICULACION
14.82	2.50	N/A	1	100%	37.05	DEP. CADAVERES
1.40	2.10	N/A	-1	100%	-2.94	DESCUENTO PIUERTA EN DEP DE CADAVERES
11.21	2.40	N/A	1	100%	26.90	CIRCULACION ENTRE ROPA LIMPIA A PARQUEADERO
2.20	2.20	N/A	1	100%	4.84	CIRCULACION ENTRE ROPA LIMPIA A PARQUEADERO
1.40	1.50	N/A	1	100%	2.10	CIRCULACION ENTRE ROPA LIMPIA A PARQUEADERO
1.40	2.10	N/A	-1	100%	-2.94	DESCUENTO PUERTA EN CIRCULACION
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTA EN CIRCULACION
0.55	1.00	N/A	-1	100%	-0.55	DESCUENTO VENTANA EN CICULACION
14.06	2.50	N/A	1	100%	35.15	CIRCULACION SALA DE STAR
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO PUERTA EN CIRCULACION
0.70	2.10	N/A	-1	100%	-1.47	DESCUENTO PUERTA EN CIRCULACION
1.40	2.10	N/A	-1	100%	-2.94	DESCUENTO PUERTA EN CIRCULACION
0.33	0.73	N/A	-1	100%	-0.24	DESCUENTO VENTANA EN CIRCULACION
17.25	2.52	N/A	1	100%	43.47	DEPOSITO ALMACEN
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTA EN DEPOSITO ALMACEN
0.55	1.00	N/A	-1	100%	-0.55	DESCUENTO VENTANA EN DEPOSITO ALMACEN
2.00	0.40	N/A	-1	100%	-0.80	DESCUENTO VENTANA EN DEPOSITO ALMACEN
14.25	2.70	N/A	1	100%	38.48	ASEO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO PUERTA
0.40	0.67	N/A	-1	100%	-0.27	DESCUENTO VENTANA
PISO 1						
17.53	2.60	N/A	1	100%	45.58	LOBORATORIO
2.93	1.10	N/A	1	100%	3.22	MURO INTERMEDIO -LABORATORIO
0.97	2.09	N/A	1	100%	2.03	MURO INERMEDIO LAVA OJOS
4.64	2.60	N/A	1	100%	12.06	CUARTO LABORATORIO
0.80	2.10	N/A	-3	100%	-5.04	DESCUENTO PUERTA
1.30	1.30	N/A	-4	100%	-6.76	DESCUENTO VENTANA
10.24	0.99	N/A	1	100%	10.14	LABARORATORIO INYECTOLOGIA
2.74	1.20	N/A	1	100%	3.29	LABARORATORIO INYECTOLOGIA
1.64	1.12	N/A	1	100%	1.84	LABARORATORIO INYECTOLOGIA
30.76	2.50	N/A	1	100%	76.90	LABORATO IYECTOLOGIA
0.97	2.10	N/A	-1	100%	-2.04	DESCUENTO PUERTA
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTA PUERTA
0.94	1.10	N/A	-1	100%	-1.03	DESCUENTA VENTANA
0.71	2.10	N/A	-1	100%	-1.49	DESCUENTA PUERTA
1.30	0.65	N/A	-1	100%	-0.85	DESCUENTA VENTANA
3.60	2.50	N/A	1	100%	9.00	CUARO RESIDUOS RESICLABLES ORDINARIOS
0.79	2.10	N/A	-1	100%	-1.66	DESCUENTO PUERTA
0.49	1.30	N/A	-1	100%	-0.64	DESCUENTO VENTANA
0.86	0.86	N/A	-1	100%	-0.74	DESCUENTO VENTANA
3.91	2.60	N/A	1	100%	10.17	CUARTO NEVERA
0.99	2.10	N/A	-1	100%	-2.08	DESCUENTO PUERTA
10.92	2.60	N/A	1	100%	28.39	CUARTO TRANFUCIONAL
0.97	2.10	N/A	-1	100%	-2.04	DESCUENTO DE PUERTA
0.94	1.10	N/A	-1	100%	-1.03	DESCUENTO DE VENTANA
0.95	1.00	N/A	-1	100%	-0.95	DESCUENTO DE VENTANA
5.46	2.60	N/A	1	100%	14.20	CUARTO NEVERA MURO
3.71	2.60	N/A	1	100%	9.65	HALL CIRCULACION
1.21	0.61	N/A	1	100%	0.74	CIRCULACION HALL
4.06	2.60	N/A	1	100%	10.56	MURO HALL ENTRADA LABORATORIO
3.70	2.60	N/A	1	100%	9.62	MURO TOMA DE MUESTRAS
2.86	2.60	N/A	1	100%	7.44	MURO TOMA DE MUESTRAS
2.82	2.60	N/A	1	100%	7.33	MURO TOMA DE MUESTRAS
1.64	2.60	N/A	1	100%	4.26	TOMA DE MUESTRAS
3.64	2.60	N/A	1	100%	9.46	TOMA DE MUESTRAS GINECOLOGICAS
1.47	2.60	N/A	1	100%	3.82	TOMA DE MUESTRAS GINECOLOGICAS
1.67	2.60	N/A	1	100%	4.34	TOMA DE MUESTRAS GINECOLOGICAS
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO DE PUERTA GINECOLOGICA
2.06	2.60	N/A	1	100%	5.36	TOMA DE MUESTRA GINECOLOGICA
2.06	2.60	N/A	1	100%	5.36	TOMA DE MUESTRA GINECOLOGICA
1.30	1.30	N/A	-1	100%	-1.69	DESCUENTO VENTANA
3.91	2.60	N/A	1	100%	10.17	ENTREGA DE MUESTRAS
8.29	2.60	N/A	1	100%	21.55	MURO FRENTE A FARMACIA
0.99	0.65	N/A	-1	100%	-0.64	DESCUENTO VENTANA
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTA
6.81	2.60	N/A	1	100%	17.71	MURO EXTERIOR FARMACIA
0.99	3.00	N/A	-1	100%	-2.97	DESCUENTO VENTANA
4.25	2.53	N/A	1	100%	10.75	MURO INTERNO FARMACIA
0.99	3.00	N/A	-1	100%	-2.97	DESCUENTO
2.92	2.53	N/A	1	100%	7.39	MURO INTERNO FARMACIA
4.55	2.53	N/A	1	100%	11.51	MURO INTERNO FARMACIA
0.83	1.05	N/A	1	100%	0.87	MURO INTERNO FARMACIA
0.94	2.53	N/A	1	100%	2.38	MURO ENTREGA FARMACIA
3.46	2.60	N/A	1	100%	9.00	AREA ENTREGA DE FARNACIA
3.77	2.60	N/A	1	100%	9.80	AREA ENTREGA DE FARMACIA
0.50	0.64	N/A	-1	100%	-0.32	DESCUENTA VENTANA
7.94	2.60	N/A	1	100%	20.64	AREA ADMINISTRATIVA FARMACIA
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTA
0.70	2.10	N/A	-1	100%	-1.47	DESCUENTO PUERTA
0.50	0.65	N/A	-1	100%	-0.33	DESCUENTO VENTANA
3.88	2.60	N/A	1	100%	10.09	MURO CIRCULACION A FARMACIA
1.36	2.60	N/A	1	100%	3.54	MURO HALL AL LADO DE ADMICIONES
1.10	2.10	N/A	-1	100%	-2.31	DESCUENTO DE PUERTA
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO DE PUERTA
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO DE PUERTA
1.29	2.10	N/A	-1	100%	-2.71	DESCUENTO DE PUERTA
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO DE PUERTA
8.82	2.60	N/A	1	100%	22.93	PROCEDIMIENTOS
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTA
1.10	2.10	N/A	-1	100%	-2.31	DESCUENTO PUERTA











0.40	1.00	N/A	-1	100%	-0.40	DESCUENTO VENTANA
7.96	2.60	N/A	1	100%	20.70	SALA DE IGEMATOLOGIA
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO DE PUERTA
17.49	2.60	N/A	1	100%	45.47	ADMICIONES
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO PUERTA
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO PUERTA
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO PUERTA
1.29	2.10	N/A	-1	100%	-2.71	DESCUENTO PUERTA
14.80	2.60	N/A	1	100%	38.48	PROCEDIMIENTOS
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTA
1.10	2.10	N/A	-1	100%	-2.31	DESCUENTO PUERTA
0.90	1.30	N/A	-1	100%	-1.17	DESCUENTO VENTANA
1.30	1.30	N/A	-1	100%	-1.69	DESCUENTO VENTANA
6.16	2.60	N/A	1	100%	16.02	TRABAJO SUCIO
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTA
12.67	2.60	N/A	1	100%	32.94	COLSULTORIO DE CARDILOGO
14.25	2.60	N/A	1	100%	37.05	MUROS CIRCULACION
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO PUERTA
2.30	2.10	N/A	-1	100%	-4.83	DESCUENTO PUERTA
1.34	1.99	N/A	-1	100%	-2.67	DESCUENTO ACENSOR
9.10	2.60	N/A	1	100%	23.66	OFICINA RADIOLOGIA
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO PUERTA
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTA
0.85	1.20	N/A	-1	100%	-1.02	DESCUENTO VENTANA
7.07	2.60	N/A	1	100%	18.38	INSUMOS
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	INSUMOS
10.03	2.60	N/A	1	100%	26.08	SALA DE ESPERA
1.10	2.10	N/A	-2	100%	-4.62	DESCANSO DE PUERTA
1.00	0.40	N/A	-1	100%	-0.40	DESCANSO DE VENTANA
21.59	2.60	N/A	1	100%	56.13	SERVICIO DE IMAGEONOLOGIA
1.10	2.10	N/A	-1	100%	-2.31	SERVICIO DE IMAGEONOLOGIA
1.30	1.30	N/A	-1	100%	-1.69	SERVICIO DE IMAGEONOLOGIA
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	SERVICIO DE IMAGEONOLOGIA
16.04	2.60	N/A	1	100%	41.70	CONSULTORIO DISPONIBLE PARA ECOGRAFO
0.90	1.30	N/A	-1	100%	-1.17	DESCUENTO
1.10	2.10	N/A	-1	100%	-2.31	DESCUENTO
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO
30.52	2.42	N/A	1	100%	73.86	HALL DE CIRCULACION
10.38	2.10	N/A	-1	100%	-21.80	DESCUENTO DE PUERTAS
1.00	1.10	N/A	-1	100%	-1.10	DESCUENTO VENTANA
32.20	2.42	N/A	1	100%	77.92	HALL CIRCULACION
11.47	2.10	N/A	-1	100%	-24.09	DESCUENTO PUERTAS
1.00	1.00	N/A	-4	100%	-4.00	DESCUENTO VENTANAS
1.00	1.40	N/A	-1	100%	-1.40	DESCUENTO VENTANAS
17.34	2.54	N/A	1	100%	44.04	COLSULTORIO 3
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO PUERTA
1.80	2.54	N/A	-1	100%	-4.57	DESCUENTO PUERTA
16.71	2.10	N/A	1	100%	35.09	CONSULTORIO 4
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO PUERTA
1.00	1.00	N/A	-1	100%	-1.00	DESCUENTA VENTANA
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTA
11.18	2.42	N/A	1	100%	27.06	MONITEREO GINECOSTRETICO
1.73	2.10	N/A	-2	100%	-7.27	DESCUENTO PUERTA
18.67	2.60	N/A	1	100%	48.54	REANIMACION
1.30	1.30	N/A	-2	100%	-3.38	DESCUENTO VENTANA
1.70	2.10	N/A	-1	100%	-3.57	DESCUENTA PUERTA
18.96	2.60	N/A	1	100%	49.30	AUDITORIO
1.30	2.10	N/A	-1	100%	-2.73	DESCUENTO PUERTA
14.14	2.70	N/A	1	100%	38.18	CIRCULACION SALA DE ESPERA HALL
0.40	0.80	N/A	-1	100%	-0.32	DESCUENTO VENTANA
2.00	0.40	N/A	-1	100%	-0.80	DESCUENTO VENTANA
2.00	0.40	N/A	-1	100%	-0.80	DESCUENTO VENTANA
1.00	2.10	N/A	-1	100%	-2.10	DESCUENTO VENTANA
8.95	2.70	N/A	1	100%	24.17	CIRCULACION HALL
0.40	0.80	N/A	-1	100%	-0.32	CIRCULACION SALA DE ESPERA HALL
1.98	2.70	N/A	2	100%	10.69	MURO
1.70	1.10	N/A	-2	100%	-3.74	DESCUENTO PUERTA
3.00	2.70	N/A	1	100%	8.10	BÑO DISCAPACITADOS Y PRIMER PISO
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTA
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO PUERTA
1.34	2.70	N/A	1	100%	3.62	BAÑO MUJERES
18.59	2.70	N/A	1	100%	50.19	CUARTO PERSONAL ASISTENCIAL
1.00	2.10	N/A	-1	100%	-2.10	DESCUENTO PERTA
0.80	0.40	N/A	-1	100%	-0.32	DESCUENTO VENTANA
2.00	0.40	N/A	-1	100%	-0.80	DESCUENTO VENTANA
4.65	2.70	N/A	1	100%	12.56	AUTORIZACIONES
1.00	1.00	N/A	-1	100%	-1.00	DESCUENTO DE VENTANA
4.41	2.70	N/A	1	100%	11.91	HALL PRINCIPAL
10.00	2.30	N/A	1	100%	23.00	COCINETA
1.00	1.90	N/A	1	100%	1.90	DESCUENTO PUERTA
21.86	2.30	N/A	1	100%	50.28	COCINETA INTERNA
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO BAÑOS
-1.00	2.10	N/A	-1	100%	2.10	DESCUENTO PUERTA
11.37	2.55	N/A	1	100%	28.99	CAFETERIA
0.90	2.10	N/A	-2	100%	-3.78	DESCUENTO PUERTA
1.30	2.10	N/A	-1	100%	-2.73	DESCUENTO PUERTA
10.26	2.38	N/A	1	100%	24.42	MANOGRAFO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO PUERTA
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTA
5.11	2.38	N/A	1	100%	12.16	VESTIER CONTINUO A MANOGRAFO
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTA
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTA
5.43	2.48	N/A	1	100%	13.47	CIRCULACION CENTRAL DE EMFERMERIA
6.71	2.48	N/A	1	100%	16.64	CIRCULACION CENTRAL DE EMFERMERIA
1.70	2.10	N/A	-1	100%	-3.57	DESCUENTO PUERTA TAC
0.89	2.10	N/A	-1	100%	-1.87	DESCUENTO PUERTA TAC
0.89	2.10	N/A	-1	100%	-1.87	DESCUENTO PUERTA ASEO
2.00	2.40	N/A	2	100%	9.60	PUERTA ENTRE CENTRAL DE EMFERMERIA Y TAC
2.00	1.98	N/A	-2	100%	-7.92	DESCUENTO PUERTA
18.52	2.37	N/A	1	100%	43.89	TAC
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTA
0.70	2.10	N/A	-1	100%	-1.47	DESCUENTO PUERTA
0.60	0.90	N/A	-1	100%	-0.54	DESCUENTO VENTANA
6.94	2.37	N/A	1	100%	16.45	CUARTO DISPARO
0.60	0.90	N/A	-1	100%	-0.54	DESCUENTO PUERTA
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO VENTANA
4.58	2.45	N/A	1	100%	11.22	OBSERVACION GINECOSTETRICA
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTA T LIMPIO
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTA T SUCIO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO PUERTA T SUCIO
31.39	2.45	N/A	1	100%	76.91	OBSERVACION PEDIATRA
0.90	2.10	N/A	-2	100%	-3.78	DESCUENTO PUERTA
6.67	0.80	N/A	2	100%	10.67	CENTRAL DE EMFERMERIA
4.82	2.52	N/A	1	100%	12.15	RESIDUOS ORDINARIOS
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTA
4.27	2.52	N/A	1	100%	10.76	RESIDUOS PELIGROSOS
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO
11.48	2.32	N/A	1	100%	26.63	DIR URGENSIAS
1.00	1.00	N/A	-1	100%	-1.00	DESCUENTO VENTANA
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTA
10.61	2.43	N/A	1	100%	25.78	PROCEDIMIENTOS ASEPTICOS
1.65	2.10	N/A	-1	100%	-3.47	DESCUENTO PUERTA
12.13	2.40	N/A	1	100%	29.11	SALA DE YESOS
0.94	1.00	N/A	-1	100%	-0.94	DESCUENTO VENTANA
1.70	2.10	N/A	-1	100%	-3.57	DESCUENTO PUERTA
15.60	2.53	N/A	1	100%	39.47	DIGITACION
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO PUERTA
1.29	1.00	N/A	-1	100%	-1.29	DESCUENTO VENTANA
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTA
14.90	2.50	N/A	1	100%	37.25	SALA ERA
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO PUERTA
1.00	1.30	N/A	-1	100%	-1.30	DESCUENTO VENTANA
14.37	2.50	N/A	1	100%	35.93	CONSULTORIO 3
1.30	2.10	N/A	-1	100%	-2.73	DESCUENTO PUERTA
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO PUERTA









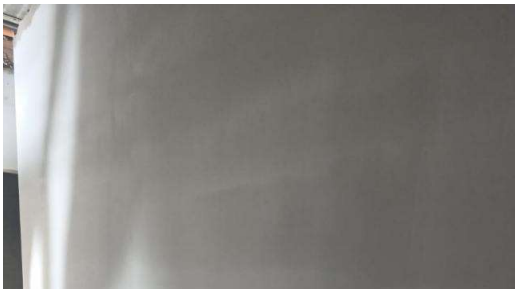

1.41	1.00	N/A	-1	100%	-1.41	DESCUENTO VENTANA
16.26	2.50	N/A	1	100%	40.65	CONSULTORIO 2
1.50	1.30	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO VENTANA
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO PUERTA
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO PUERTA
15.88	2.48	N/A	1	100%	39.38	CONSULTORIO 1
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO PUERTA
1.00	2.10	N/A	-1	100%	-2.10	DESCUENTO PUERTA
0.92	0.86	N/A	-1	100%	-0.79	DESCUENTO VENTANA
13.40	2.52	N/A	1	100%	33.77	ADMISIONES URGENSIAS
0.94	2.10	N/A	-1	100%	-1.97	DESCUENTO PUERTA
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTA
1.20	1.40	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO VENTANA
2.00	1.40	N/A	-1	100%	-2.80	DESCUENTO VENTANA
8.71	2.52	N/A	1	100%	21.95	REF Y CONTRA REF
1.00	2.10	N/A	-1	100%	-2.10	DESCUEBTO PUERTA
11.20	2.53	N/A	1	100%	28.34	SALA ESPERA URGENCIAS
1.40	0.93	N/A	-1	100%	-1.30	DESCUENTO VENTANA
1.40	0.93	N/A	-1	100%	-1.30	DESCUENTO VENTANA
0.40	1.00	N/A	-1	100%	-0.40	DESCUENTO VENTANA
7.51	2.53	N/A	1	100%	19.00	ACCESO URGENCIAS
2.00	2.10	N/A	-1	100%	-4.20	DESCUENTO PUERA ACCESO URGENCIAS
0.70	1.00	N/A	-1	100%	-0.70	DESCUENTO VENTANA
6.35	2.53	N/A	1	100%	16.07	SALA ESPERA ADULTOS
1.20	1.75	N/A	-1	100%	-2.10	DESCUENTO VENTANA
1.13	1.73	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO VENTANA
6.37	0.75	N/A	1	100%	4.78	ANTEPECHO SALA DE ESPERA
16.18	2.52	N/A	1	100%	40.77	DESCUENTO VENTANA
0.97	0.97	N/A	-1	100%	-0.94	DESCUENTO VENTANA
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTA
15.31	2.52	N/A	1	100%	38.58	CUARTO DE EQUIPOS
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO PUERTA
0.40	0.50	N/A	-1	100%	-0.20	DESCUENTO VENTA
13.60	2.50	N/A	1	100%	34.00	RAYOS X
0.80	2.10	N/A	-2	100%	-3.36	DESCUENTO PUERTA
14.90	2.54	N/A	1	100%	37.85	SALA ESPERA (HALL), PASILLO HACIA FARMACIA Y MUROS EXTERIOR Y POSTERIOR DE CONTROL IMAGENOLIGÍA: CARDIO
1.84	1.58	N/A	-1	100%	-2.91	DESCUENTO: VENTALA PASILLO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO: PUERTA CONTROL IMAGENOLOGÍA
3.51	1.00	N/A	2	100%	7.02	CONTROL IMAGENOLIGÍA: CARDIO - RECEPCIÓN (ANTEPECHO)
2.50	1.00	N/A	2	100%	5.00	SALA ESPERA (HALL) - RECPCIÓN (ANTEPECHO)
1.25	2.54	N/A	1	100%	3.18	SALA ESPERA (HALL) - RECPCIÓN (MURO CORTO LATERAL DERECH)
6.86	2.64	N/A	1	100%	18.11	CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS (ACCESO A URG) Y ACCESO A TRIAGES
0.70	2.64	N/A	1	100%	1.85	
1.16	1.75	N/A	-1	100%	-2.03	DESCUENTO: VENTANA EXTERIOR
1.00	2.10	N/A	-1	100%	-2.10	DESCUENTO: PUERTA TRIAGE 1
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO: PUERTA TRIAGE 2
4.40	2.50	N/A	1	100%	11.00	ACCESO A LAVADO DE PACIENTES
2.00	2.10	N/A	-1	100%	-4.20	DESCUENTO: PUERTA PASILLO
20.55	2.54	N/A	1	100%	52.20	MONITOREO GINESCOBTETRICIA
0.70	2.10	N/A	-1	100%	-1.47	DESCUENTO: PUERTA CUARTO LIBRE
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO: PUERTA BAÑO
1.71	2.10	N/A	-1	100%	-3.59	DESCUENTO: PUERTA PRINCIPAL
15.29	2.63	N/A	1	100%	40.21	SALA EDA
0.95	0.95	N/A	-1	100%	-0.90	DESCUENTO: VENTANA EXTERIOR
1.07	1.00	N/A	-1	100%	-1.07	DESCUENTO: VENTANA PASILLO
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO: PUERTA BAÑO
1.00	2.10	N/A	-1	100%	-2.10	DESCUENTO: PUERTA PRINCIPAL
4.37	2.66	N/A	1	100%	11.62	AUDITORIO (MURO ORIENTAL)
1.13	1.72	N/A	-1	100%	-1.94	DESCUENTO: VENTANA EXTERIOR
5.50	2.50	N/A	1	100%	13.75	INSUMOS DISPOSITIVOS FARMACIA: DIGITACIÓN
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO: PUERTA
4.60	2.50	N/A	1	100%	11.50	ROPA LIMPIA: DIGITACIÓN
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO: PUERTA
4.01	2.50	N/A	1	100%	10.03	ROPA SUCIA: DIGITACIÓN
2.95	2.50	N/A	1	100%	7.38	FACTURACIÓN, AUTORIZACIÓN Y ADMISIÓN (MURO SUR)
5.77	2.4	N/A	1	100%	13.85	TRIAGE 2
2.53	2.4	N/A	1	100%	6.07	
0.81	1.5	N/A	-1	100%	-1.22	DESCUENTO VENTANA
2.10	2.2	N/A	1	100%	4.62	SALA ESPERA ADULTO
1.14	2.4	N/A	1	100%	2.74	AUDITORIO
1.70	2.4	N/A	1	100%	4.08	
3.16	2.4	N/A	2	100%	15.17	DESCANSO URGENCIAS
3.15	2.4	N/A	1	100%	7.56	
0.80	2.1	N/A	-2	100%	-3.36	DESCUENTO PUERTA
1.63	2.4	N/A	1	100%	3.91	DESCANSO URGENCIAS
1.70	2.34	N/A	1	100%	3.98	OBSERVACION GINECOOBSTETRICIA
1.40	1.1	N/A	1	100%	1.54	
4.40	1.33	N/A	1	100%	5.85	CUARTO ASEO URGENCIAS
2.28	1	N/A	1	100%	2.28	SALA ERA
5.85	2.4	N/A	1	100%	14.04	CUARTO EQUIPO URG
0.90	2.07	N/A	-1	100%	-1.86	DESCUENTO PUERTA
0.80	0.9	N/A	1	100%	0.72	SALA YESO
1.60	0.7	N/A	1	100%	1.12	
1.50	1.07	N/A	1	100%	1.61	PASILLO URGENCIAS - TABLERO GASES
0.26	0.42	N/A	-1	100%	-0.11	PASILLO URGENCIAS - TABLERO
1.50	1.2	N/A	1	100%	1.80	PROCEDIMIENTO
2.40	0.9	N/A	1	100%	2.16	
2.00	0.8	N/A	1	100%	1.60	RESIDUOS PELIGROS
1.30	1	N/A	1	100%	1.30	RESIDUOS RESICLABLE
2.82	0.9	N/A	1	100%	2.54	OBSERVACION PEDIATRIA - TOMAS Y GASES
2.60	1.1	N/A	1	100%	2.86	
1.40	2.6	N/A	1	100%	3.64	
4.20	0.76	N/A	1	100%	3.19	CENTRAL DE ENFERMERIA
6.46	1.6	N/A	2	100%	20.67	TRABAJO LIMPIO - TRABAJO SUCIO
0.80	2.1	N/A	-2	100%	-3.36	DESCUENTO PUERTAS
5.30	1.34	N/A	1	100%	7.10	CIRCULACION - CUARTO DE ASEO
1.30	1.02	N/A	1	100%	1.33	CUARO DE ASEO RX
0.60	2.4	N/A	1	100%	1.44	TOMA DE MUESTRA
1.62	2.4	N/A	1	100%	3.89	RESIDUOS PELIGROSOS LABORATORIO
2.63	1.1	N/A	1	100%	2.89	FARMACIA AREA ENTREGA
4.94	1.1	N/A	1	100%	5.43	
2.40	0.8	N/A	1	100%	1.92	FACTURACION ADMISION
1.40	1.10	N/A	1	100%	1.54	PROCEDIMIENTO ACEPTICOS
1.27	2.40	N/A	1	100%	3.05	PROCEDIMIENTO ACEPTICOS
5.55	2.40	N/A	1	100%	13.32	T LIMPIO EN OBSERVACION PEDIATRA
0.79	2.06	N/A	-1	100%	-1.63	DESCUENTO DE PUERTA
6.63	2.40	N/A	1	100%	15.91	T SUCIO EN OBSERVACION
0.79	2.06	N/A	-1	100%	-1.63	DESCUENTO DE PUERTA
7.34	2.40	N/A	1	100%	17.62	INSUMOS AL LADO DE PROCEDIMIENTOS
0.80	2.06	N/A	-1	100%	-1.65	DESCUENTO DE PUERTA
		PISO 2				
37.05	2.50	N/A	1	100%	92.63	PASILLO RECUPERACION
8.25	2.10	N/A	-1	100%	-17.33	DESCUENTO PUERTAS
17.52	2.40	N/A	1	100%	42.05	PREPARACION PASIENTES
3.70	2.10	N/A	-1	100%	-7.77	DESCUENTO PUERTAS
39.12	2.55	N/A	1	100%	99.76	RECUPERACION QUIRURGICA
5.11	2.10	N/A	-1	100%	-10.73	DESCUENTO PUERTAS
13.37	0.70	N/A	-1	100%	-9.36	DESCUENTO VENTANAS
11.97	0.79	N/A	1	100%	9.46	CENTRAL EMFERMERIA
27.31	2.50	N/A	1	100%	68.28	CENTRAL ESTERILIZACION
1.90	2.10	N/A	-1	100%	-3.99	DESCUENTO PUERTAS
1.48	1.00	N/A	-1	100%	-1.48	DESCUENTO VENTANAS
1.00	0.70	N/A	-1	100%	-0.70	DESCUENTO VENTANAS
0.84	1.46	N/A	-1	100%	-1.23	DESCUENTO VENTANAS
11.39	2.50	N/A	1	100%	28.48	INGRESO AUTO CLAVE
2.10	2.10	N/A	-1	100%	-4.41	DESCUENTO PUERTAS
0.81	1.00	N/A	-1	100%	-0.81	DESCUENTO VENTANAS
61.80	2.50	N/A	1	100%	154.50	CICULACION DE QUIRURGICOS A SALA DE PARTOS
18.61	2.10	N/A	-1	100%	-39.08	DESCUENTO PUERTAS











1.50	1.26	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO VENTANAS
2.15	0.90	N/A	-1	100%	-1.94	DESCUENTO VENTANAS
1.00	1.00	N/A	-2	100%	-2.00	DESCUENTO VENTANAS
1.00	1.50	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO VENTANAS
2.00	2.50	N/A	-1	100%	-5.00	DESCUENTO ENTRADA A PASILLO
16.11	2.60	N/A	1	100%	41.89	SALA DE PARTOS #1
1.70	2.10	N/A	-1	100%	-3.57	DESCUENTO PUERTAS
0.95	0.95	N/A	-1	100%	-0.90	DESCUENTO VENTANAS
16.82	2.60	N/A	1	100%	43.73	SALA DE PARTOS #2
1.70	2.10	N/A	-1	100%	-3.57	DESCUENTO PUERTAS
4.12	0.50	N/A	-1	100%	-2.06	DESCUENTO VENTANAS
11.67	2.50	N/A	1	100%	29.18	CUARTO DE EQUIPOS
1.00	2.10	N/A	-1	100%	-2.10	DESCUENTO PUERTAS
21.53	2.50	N/A	1	100%	53.83	DESCANSO QUIROFANOS
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTAS
0.90	2.10	N/A	-2	100%	-3.78	DESCUENTO PUERTAS
3.21	0.50	N/A	-1	100%	-1.61	DESCUENTO VENTANAS
18.07	2.60	N/A	1	100%	46.98	QUIROFANO #1
1.70	2.10	N/A	-1	100%	-3.57	DESCUENTO PUERTAS
18.17	2.60	N/A	1	100%	47.24	QUIROFANO #2
1.70	2.10	N/A	-1	100%	-3.57	DESCUENTO PUERTAS
18.10	2.60	N/A	1	100%	47.06	QUIROFANO #3
1.70	2.10	N/A	-1	100%	-3.57	DESCUENTO PUERTAS
2.42	2.60	N/A	1	100%	6.29	TRABAJO SUCIO
3.50	2.10	N/A	-1	100%	-7.35	DESCUENTO PUERTAS
2.00	0.37	N/A	-1	100%	-0.74	DESCUENTO PUERTAS
1.00	0.70	N/A	-1	100%	-0.70	DESCUENTO VENTANAS
12.91	2.50	N/A	1	100%	32.28	FARMACIA
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTAS
1.00	1.00	N/A	-3	100%	-3.00	DESCUENTO VENTANAS
0.37	2.00	N/A	-1	100%	-0.74	DESCUENTO VENTANAS
5.95	2.50	N/A	1	100%	14.88	BODEGA
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTAS
13.66	2.50	N/A	1	100%	34.15	DESCANSO
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTAS
0.60	2.10	N/A	-1	100%	-1.26	DESCUENTO PUERTAS
1.00	1.00	N/A	-1	100%	-1.00	DESCUENTO VENTANAS
8.82	2.50	N/A	1	100%	22.05	PASILLO VESTIER
0.80	2.10	N/A	-3	100%	-5.04	DESCUENTO PUERTAS
20.57	2.40	N/A	1	100%	49.37	VESTIER MUJERES
0.80	2.10	N/A	-2	100%	-3.36	DESCUENTO PUERTAS
0.70	2.10	N/A	-3	100%	-4.41	DESCUENTO VENTANAS
20.70	2.40	N/A	1	100%	49.68	VESTIER HOMBRES
0.80	2.10	N/A	2	100%	3.36	DESCUENTO PUERTAS
0.70	2.10	N/A	2	100%	2.94	DESCUENTO VENTANAS
83.30	2.45	N/A	1	100%	204.09	PASILLO PRINCIPAL A UCI
1.40	2.10	N/A	-1	100%	-2.94	DESCUENTO PUERTAS
1.00	0.70	N/A	-1	100%	-0.70	DESCUENTO VENTANAS
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO VENTANAS
2.00	2.45	N/A	-1	100%	-4.90	DESCUENTO VENTANAS
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO VENTANAS
1.00	1.50	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO VENTANAS
1.96	2.10	N/A	-1	100%	-4.12	DESCUENTO VENTANAS
1.00	2.10	N/A	-1	100%	-2.10	DESCUENTO PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTAS
0.76	2.10	N/A	-1	100%	-1.60	DESCUENTO PUERTAS
1.70	2.10	N/A	-1	100%	-3.57	DESCUENTO PUERTAS
1.00	2.10	N/A	-1	100%	-2.10	DESCUENTO PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTAS
0.60	2.10	N/A	-1	100%	-1.26	DESCUENTO PUERTAS
0.70	2.10	N/A	-1	100%	-1.47	DESCUENTO PUERTAS
2.00	2.10	N/A	-1	100%	-4.20	DESCUENTO PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTAS
1.10	2.45	N/A	-1	100%	-2.70	DESCUENTO PUERTAS
1.70	2.10	N/A	-2	100%	-7.14	DESCUENTO PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTAS
1.00	2.10	N/A	-1	100%	-2.10	DESCUENTO PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTAS
3.88	0.98	N/A	1	100%	3.80	RESECION
34.33	0.50	N/A	1	100%	17.17	TRABAJO DE PARTO
1.67	2.10	N/A	-1	100%	-3.51	DESCUENTO PUERTAS
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO PUERTAS
0.70	2.10	N/A	-1	100%	-1.47	DESCUENTO PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTAS
2.13	0.90	N/A	-1	100%	-1.92	DESCUENTO PUERTAS
1.50	1.30	N/A	-3	100%	-5.85	DESCUENTO PUERTAS
4.90	0.85	N/A	1	100%	4.17	CENTRAL DE EMFERMERIA
38.26	2.50	N/A	1	100%	95.65	RECUPERACION DE PARTOS
0.95	2.10	N/A	-1	100%	-2.00	DESCUNTO DE PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUNTO DE PUERTAS
1.00	2.10	N/A	-1	100%	-2.10	DESCUNTO DE PUERTAS
1.50	1.30	N/A	-2	100%	-3.90	DESCUNTO DE VENTANA
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUNTO DE PUERTAS
2.00	2.10	N/A	-1	100%	-4.20	DESCUNTO DE PUERTAS
5.22	0.77	N/A	1	100%	4.02	CENTRAL DE EMFERMERIA
5.95	2.50	N/A	1	100%	14.88	ROPA LIMPIA
0.95	2.10	N/A	-1	100%	-2.00	DESCUNTO DE PUERTAS
19.11	2.50	N/A	1	100%	47.78	VESTIER PARTOS
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUNTO DE PUERTAS
1.00	2.10	N/A	-1	100%	-2.10	DESCUNTO DE PUERTAS
96.00	2.50	N/A	1	100%	240.00	UCI ADULTOS
1.96	2.10	N/A	-1	100%	-4.12	DESCUNTO DE PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUNTO DE PUERTAS
0.70	2.10	N/A	-1	100%	-1.47	DESCUNTO DE PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUNTO DE PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-2	100%	-3.36	DESCUNTO DE PUERTAS
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUNTO DE PUERTAS
1.60	2.10	N/A	-2	100%	-6.72	DESCUNTO DE PUERTAS
1.50	1.30	N/A	-4	100%	-7.80	DESCUNTO DE VENTANA
0.95	0.95	N/A	-2	100%	-1.81	DESCUNTO DE VENTANA
1.10	2.10	N/A	-2	100%	-4.62	DESCUNTO DE PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-4	100%	-6.72	DESCUNTO DE PUERTAS
1.30	0.92	N/A	-1	100%	-1.20	DESCUNTO DE VENTANA
1.30	1.30	N/A	-1	100%	-1.69	DESCUNTO DE VENTANA
1.25	0.80	N/A	-2	100%	-2.00	DESCUNTO DE VENTANA
0.95	0.95	N/A	-1	100%	-0.90	DESCUNTO DE VENTANA
1.20	1.30	N/A	-1	100%	-1.56	DESCUNTO DE VENTANA
5.19	0.85	N/A	1	100%	4.41	CENTRAL DE EMFERMERIA FRENTE A UCI ADULTOS
7.28	0.78	N/A	1	100%	5.68	CENTRAL DE EMFERMERIA FRENTE A UCI ADULTOS
7.65	2.50	N/A	1	100%	19.13	FILTRO ACCESO FAMILIARES
0.80	2.10	N/A	-2	100%	-3.36	DESCUNTO DE PUERTAS
6.20	2.50	N/A	1	100%	15.50	IMFORMACION FAMILIARES
0.70	2.10	N/A	-1	100%	-1.47	DESCUNTO DE PUERTAS
19.41	2.50	N/A	1	100%	48.53	FILTRO ACCESO PERSONAL
0.80	2.10	N/A	-3	100%	-5.04	DESCUNTO DE PUERTAS
0.70	2.10	N/A	-2	100%	-2.94	DESCUNTO DE PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUNTO DE PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUNTO DE PUERTAS
9.50	2.50	N/A	1	100%	23.75	DESCANSO
1.00	2.10	N/A	-1	100%	-2.10	DESCUNTO DE PUERTAS
1.50	1.00	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUNTO DE PUERTAS
12.10	2.50	N/A	1	100%	30.25	EXTRACION
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUNTO DE PUERTAS
9.81	2.50	N/A	1	100%	24.53	FILTRO
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUNTO DE PUERTAS
0.70	2.10	N/A	-1	100%	-1.47	DESCUNTO DE PUERTAS
11.51	2.50	N/A	1	100%	28.78	PASILLO ACCESO UCI
2.00	2.10	N/A	-2	100%	-8.40	DESCUNTO DE VENTANA
0.85	3.10	N/A	-1	100%	-2.64	DESCUNTO DE VENTANA
1.00	2.10	N/A	-1	100%	-2.10	DESCUNTO DE PUERTAS
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUNTO DE PUERTAS
0.66	2.10	N/A	-1	100%	-1.39	DESCUNTO DE PUERTAS
17.21	2.50	N/A	1	100%	43.03	LACTARIO
1.00	2.10	N/A	-1	100%	-2.10	DESCUNTO DE PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-2	100%	-3.36	DESCUNTO DE PUERTAS











11.91	2.40	N/A	1	100%	28.58	AMBIENTE TRABAJO ESTERIL
0.80	2.10	N/A	-3	100%	-5.04	DESCUNTO DE PUERTAS
0.70	1.00	N/A	-1	100%	-0.70	DESCUNTO DE VENTANA
96.38	2.50	N/A	1	100%	240.95	UCI NEONATAL
2.00	2.10	N/A	-1	100%	-4.20	DESCUNTO DE PUERTAS
1.35	2.10	N/A	-1	100%	-2.84	DESCUNTO DE PUERTAS
0.90	1.30	N/A	-1	100%	-1.17	DESCUNTO DE VENTANA
1.30	1.30	N/A	-6	100%	-10.14	DESCUNTO DE VENTANA
1.30	1.05	N/A	-1	100%	-1.37	DESCUNTO DE VENTANA
0.70	1.00	N/A	-1	100%	-0.70	DESCUNTO DE VENTANA
0.70	1.20	N/A	-2	100%	-1.68	DESCUNTO DE VENTANA
0.90	1.30	N/A	-1	100%	-1.17	DESCUNTO DE VENTANA
1.00	2.10	N/A	-1	100%	-2.10	DESCUNTO DE VENTANA
0.70	2.10	N/A	-1	100%	-1.47	DESCUNTO DE VENTANA
0.90	2.50	N/A	-1	100%	-2.25	DESCUNTO DE VENTANA
1.35	2.10	N/A	-1	100%	-2.84	DESCUNTO DE PUERTAS
0.70	2.10	N/A	-1	100%	-1.47	DESCUNTO DE PUERTAS
0.75	2.10	N/A	-1	100%	-1.58	DESCUNTO DE PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUNTO DE PUERTAS
15.00	0.66	N/A	1	100%	9.90	UCI AISLADO
12.79	0.66	N/A	1	100%	8.44	UCI AISLADO
4.68	0.82	N/A	4	100%	15.35	CENTRAL DE EMFERMERIA
10.64	0.82	N/A	1	100%	8.72	CENTRAL DE EMFERMERIA
11.41	2.50	N/A	1	100%	28.53	PASILLO DESCANSO
0.80	2.10	N/A	-4	100%	-6.72	DESCUNTO DE PUERTAS
20.32	2.50	N/A	1	100%	50.80	DESCUNTO DE PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-3	100%	-5.04	DESCUNTO DE VENTANA
1.90	1.30	N/A	-1	100%	-2.47	DESCUNTO DE VENTANA
1.30	1.30	N/A	-1	100%	-1.69	DESCUNTO DE VENTANA
0.90	1.30	N/A	-1	100%	-1.17	DESCUNTO DE VENTANA
11.78	2.50	N/A	1	100%	29.45	PASILLO ASEO Y LAVADO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUNTO DE PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUNTO DE PUERTAS
17.56	2.50	N/A	1	100%	43.90	PASILLO ASESO ASISTENCIAL
1.80	2.10	N/A	-1	100%	-3.78	DESCUNTO DE PUERTAS
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUNTO DE PUERTAS
0.75	2.10	N/A	-1	100%	-1.58	DESCUNTO DE PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-3	100%	-5.04	DESCUNTO DE PUERTAS
1.73	2.10	N/A	-1	100%	-3.63	DESCUNTO DE PUERTAS
2.67	2.30	N/A	1	100%	6.14	ROPA LIMPIA
2.90	2.30	N/A	1	100%	6.67	ROPA SUCIA
13.60	2.60	N/A	1	100%	35.36	VESTIER ASISTENCIAL
0.80	2.10	N/A	-2	100%	-3.36	DESCUNTO DE PUERTAS
0.70	2.10	N/A	-1	100%	-1.47	DESCUNTO DE PUERTAS
0.70	3.60	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUNTO DE PUERTAS
9.21	2.40	N/A	1	100%	22.10	COORDINACION
1.80	2.10	N/A	-1	100%	-3.78	DESCUNTO DE PUERTAS
4.29	0.70	N/A	-1	100%	-3.00	DESCUNTO DE VENTANA
23.88	2.50	N/A	1	100%	59.70	HALL PRINCIPAL
1.90	2.10	N/A	-1	100%	-3.99	DESCUNTO DE PUERTAS
0.70	2.10	N/A	-1	100%	-1.47	DESCUNTO DE PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-2	100%	-3.36	DESCUNTO DE PUERTAS
2.20	2.10	N/A	-1	100%	-4.62	DESCUNTO DE PUERTAS
5.56	2.40	N/A	1	100%	13.34	T LIMPIO CUIDADOS INTERMEDIOS
0.70	2.06	N/A	-1	100%	-1.44	DESCUENTO PUERTA
7.46	2.40	N/A	1	100%	17.90	T LIMPIO CUIDADOS INTENSIVOS
0.90	2.06	N/A	-1	100%	-1.85	DESCUENTO PUERTA
7.00	2.40	N/A	1	100%	16.80	T LIMPIO RECUPERACION SALA DE PARTOS
0.80	2.06	N/A	-1	100%	-1.65	DESCUENTO PUERTA
0.90	0.95	N/A	-1	100%	-0.86	DESCUENTO PUERTA
6.20	2.40	N/A	1	100%	14.88	T SUCIO RECUPERACION SALA DE PARTOS
0.80	2.06	N/A	-1	100%	-1.65	DESCUENTO PUERTA
9.80	2.40	N/A	1	100%	23.52	T LIMPIO RECUPERACION SALA DE PARTOS
0.70	2.06	N/A	-1	100%	-1.44	DESCUENTO PUERTAS
		PISO 3				
2.28	2.80	N/A	1	100%	6.38	LUDOTECA
1.55	2.80	N/A	1	100%	4.34	LUDOTECA
1.57	2.80	N/A	1	100%	4.40	LUDOTECA
1.55	2.80	N/A	1	100%	4.34	LUDOTECA
2.57	2.80	N/A	1	100%	7.20	LUDOTECA
6.68	2.80	N/A	1	100%	18.70	LUDOTECA
4.78	2.80	N/A	1	100%	13.38	LUDOTECA
4.78	2.80	N/A	1	100%	13.38	LUDOTECA
5.01	2.80	N/A	1	100%	14.03	LUDOTECA
4.80	2.80	N/A	1	100%	13.44	LUDOTECA
3.35	2.80	N/A	1	100%	9.38	LUDOTECA
4.91	2.80	N/A	1	100%	13.75	LUDOTECA
2.13	2.80	N/A	1	100%	5.96	LUDOTECA
1.93	2.80	N/A	1	100%	5.40	LUDOTECA
1.93	2.80	N/A	1	100%	5.40	LUDOTECA
2.23	2.80	N/A	1	100%	6.24	LUDOTECA
3.46	2.80	N/A	1	100%	9.69	LUDOTECA
7.90	2.80	N/A	1	100%	22.12	LUDOTECA
4.76	2.80	N/A	1	100%	13.33	LUDOTECA
4.17	2.80	N/A	1	100%	11.68	LUDOTECA
1.93	2.80	N/A	1	100%	5.40	LUDOTECA
1.10	2.80	N/A	1	100%	3.08	LUDOTECA
2.53	2.80	N/A	1	100%	7.08	LUDOTECA
0.93	2.80	N/A	1	100%	2.60	LUDOTECA
1.76	2.80	N/A	1	100%	4.93	LUDOTECA
1.93	2.80	N/A	1	100%	5.40	LUDOTECA
1.50	1.00	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO VENTANA AREA LUDOTECA
1.20	1.80	N/A	-1	100%	-2.16	DESCUENTO VENTANA AREA LUDOTECA
1.20	2.00	N/A	-1	100%	-2.40	DESCUENTO VENTANA AREA LUDOTECA
2.24	4.78	N/A	-1	100%	-10.71	DESCUENTO VENTANA AREA LUDOTECA
2.25	2.30	N/A	-1	100%	-5.18	DESCUENTO VENTANA AREA LUDOTECA
1.35	4.80	N/A	-1	100%	-6.48	DESCUENTO VENTANA AREA LUDOTECA
1.35	3.35	N/A	-1	100%	-4.52	DESCUENTO VENTANA AREA LUDOTECA
0.90	2.16	N/A	-1	100%	-1.94	DESCUENTO VENTANA AREA LUDOTECA
0.80	2.16	N/A	-2	100%	-3.46	DESCUENTO PUERTA AREA LUDOTECA
0.90	2.16	N/A	-1	100%	-1.94	DESCUENTO PUERTA AREA LUDOTECA
11.87	2.55	N/A	1	100%	30.27	EXTRACION DE LECHE MATERIAL
0.90	2.16	N/A	-1	100%	-1.94	DESCUENTO PUERTA LECHE MATERIAL
7.28	2.60	N/A	1	100%	18.93	DEPOSITO DE INSUMOS
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTA AREA DEPOSITO
5.92	2.60	N/A	1	100%	15.39	FILTRO INGRESO
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	PREPARACION DE FORMULAS
15.02	2.60	N/A	1	100%	39.05	PREPARACION DE FORMULAS
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	PREPARACION DE FORMULAS
1.96	1.25	N/A	-1	100%	-2.45	PREPARACION DE FORMULAS
1.55	1.05	N/A	-1	100%	-1.63	PREPARACION DE FORMULAS
11.50	2.60	N/A	1	100%	29.90	IMFORMACION FAMILIARES
0.90	2.80	N/A	-1	100%	-2.52	IMFORMACION FAMILIARES
13.17	2.70	N/A	1	100%	35.56	COORDINACIÓN PEDIATRA
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	COORDINACIÓN PEDIATRA
32.31	2.54	N/A	1	100%	82.07	CIRCULACION
0.90	2.10	N/A	-5	100%	-9.45	CIRCULACION
0.70	2.10	N/A	-2	100%	-2.94	CIRCULACION
13.30	2.70	N/A	1	100%	35.91	DESCANSO DE MEDICO
0.70	2.50	N/A	-1	100%	-1.75	DESCANSO DE MEDICO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCANSO DE MEDICO
10.10	2.70	N/A	1	100%	27.27	DESCANSO EMFERMERIA
0.70	2.50	N/A	-1	100%	-1.75	DESCANSO EMFERMERIA
4.05	2.55	N/A	1	100%	10.33	ESTACION DE CAFÉ
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	ESTACION DE CAFÉ
15.45	2.80	N/A	1	100%	43.26	COORDINACION UCI PEDIATRICA
1.90	1.36	N/A	-1	100%	-2.58	COORDINACION UCI PEDIATRICA
1.30	1.36	N/A	-1	100%	-1.77	COORDINACION UCI PEDIATRICA
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	COORDINACION UCI PEDIATRICA
4.04	2.70	N/A	1	100%	10.91	TRANFERENCIA MEDICAMENTOS
9.35	2.70	N/A	1	100%	25.25	ASISTENCIAL
0.70	0.80	N/A	-1	100%	-0.56	ASISTENCIAL
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	ASISTENCIAL










8.18	2.60	N/A	1	100%	21.27	ROPA LIMPIA
0.70	1.14	N/A	-1	100%	-0.80	ROPA LIMPIA
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	ROPA LIMPIA
8.40	2.60	N/A	1	100%	21.84	CUARTO STERIL DEPOSITO DE INSUMOS
0.70	0.80	N/A	-1	100%	-0.56	CUARTO STERIL DEPOSITO DE INSUMOS
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	CUARTO STERIL DEPOSITO DE INSUMOS
9.13	2.60	N/A	1	100%	23.74	CUARTO EQUIPOS
0.80	2.10	N/A	1	100%	1.68	CUARTO EQUIPOS
0.70	0.80	N/A	1	100%	0.56	CUARTO EQUIPOS
32.02	2.73	N/A	1	100%	87.41	CIRCULACION
0.80	2.10	N/A	-7	100%	-11.76	CIRCULACION
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	CIRCULACION
23.24	2.80	N/A	1	100%	65.07	CIRCULACION IMFORMACION FAMILIAR
2.00	0.73	N/A	6	100%	8.76	CIRCULACION IMFORMACION FAMILIAR
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	CIRCULACION IMFORMACION FAMILIAR
0.20	2.10	N/A	-1	100%	-0.42	CIRCULACION IMFORMACION FAMILIAR
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	CIRCULACION IMFORMACION FAMILIAR
14.64	2.57	N/A	1	100%	37.62	ORATORIO
2.30	2.10	N/A	-1	100%	-4.83	ORATORIO
2.45	2.10	N/A	-2	100%	-10.29	ORATORIO
17.80	2.55	N/A	1	100%	45.39	SALA DE ESPERA
2.32	2.12	N/A	-1	100%	-4.92	SALA DE ESPERA
2.10	2.10	N/A	-1	100%	-4.41	SALA DE ESPERA
0.80	2.10	N/A	-3	100%	-5.04	SALA DE ESPERA
2.00	2.10	N/A	-1	100%	-4.20	SALA DE ESPERA
11.48	2.75	N/A	1	100%	31.57	U.C.I. 1
0.90	1.50	N/A	-1	100%	-1.35	U.C.I. 1 DESCUENTO
11.83	2.70	N/A	1	100%	31.94	U.C.I. 3
0.90	1.50	N/A	-1	100%	-1.35	U.C.I. 3 DESCUENTO
2.50	0.60	N/A	-1	100%	-1.50	U.C.I. 3 DESCUENTO
1.12	0.40	N/A	-1	100%	-0.45	U.C.I. 3 DESCUENTO
11.34	2.70	N/A	1	100%	30.62	U.C.I. 5
0.90	1.50	N/A	-1	100%	-1.35	U.C.I. 5 DESCUENTO
0.70	2.50	N/A	-1	100%	-1.75	U.C.I. 5 DESCUENTO
1.10	0.16	N/A	-1	100%	-0.18	U.C.I. 5 DESCUENTO
11.92	2.70	N/A	1	100%	32.18	U.C.I. 7
0.90	1.50	N/A	-1	100%	-1.35	U.C.I. 7 DESCUENTO
0.70	2.50	N/A	-1	100%	-1.75	U.C.I. 7 DESCUENTO
1.10	0.16	N/A	-1	100%	-0.18	U.C.I. 7 DESCUENTO
11.51	2.70	N/A	1	100%	31.08	U.C.I. 9
0.90	1.50	N/A	-1	100%	-1.35	U.C.I. 9 DESCUENTO
2.50	2.50	N/A	-1	100%	-6.25	U.C.I. 9 DESCUENTO
1.10	0.16	N/A	-1	100%	-0.18	U.C.I. 9 DESCUENTO
13.81	2.75	N/A	1	100%	37.98	U.C.I. 11
0.90	1.50	N/A	-1	100%	-1.35	U.C.I. 11 DESCUENTO
2.50	2.50	N/A	-1	100%	-6.25	U.C.I. 11 DESCUENTO
1.10	0.16	N/A	-1	100%	-0.18	U.C.I. 11 DESCUENTO
13.50	2.70	N/A	1	100%	36.45	U.C.I. 12
0.90	2.15	N/A	-1	100%	-1.94	U.C.I. 12 DESCUENTO
0.90	1.50	N/A	-1	100%	-1.35	U.C.I. 12 DESCUENTO
1.00	1.00	N/A	-1	100%	-1.00	U.C.I. 12 DESCUENTO
1.10	0.16	N/A	-1	100%	-0.18	U.C.I. 12 DESCUENTO
0.23	2.70	N/A	-1	100%	-0.62	U.C.I. 12 DESCUENTO
9.62	2.70	N/A	1	100%	25.97	U.C.I. 10
1.50	0.90	N/A	-1	100%	-1.35	U.C.I. 10 DESCUENTO
0.70	2.50	N/A	-1	100%	-1.75	U.C.I. 10 DESCUENTO
1.10	0.16	N/A	-1	100%	-0.18	U.C.I. 10 DESCUENTO
10.40	2.70	N/A	1	100%	28.08	U.C.I. 8
0.90	2.70	N/A	-1	100%	-2.43	U.C.I. 8 DESCUENTO
0.70	3.05	N/A	-1	100%	-2.14	U.C.I. 8 DESCUENTO
1.10	0.16	N/A	-1	100%	-0.18	U.C.I. 8 DESCUENTO
10.00	2.70	N/A	1	100%	27.00	U.C.I.
0.90	1.50	N/A	-1	100%	-1.35	U.C.I. 6 DESCUENTO
0.70	3.00	N/A	-1	100%	-2.10	U.C.I. 6 DESCUENTO
1.10	0.16	N/A	-1	100%	-0.18	U.C.I. 6 DESCUENTO
7.00	2.70	N/A	1	100%	18.90	U.C.I. 4
3.00	0.70	N/A	-1	100%	-2.10	U.C.I. 4 DESCUENTO
6.70	2.70	N/A	1	100%	18.09	U.C.I. 2
3.00	0.70	N/A	-1	100%	-2.10	U.C.I. 2 DESCUENTO
2.80	2.70	N/A	1	100%	7.56	CIRCULACION
0.80	2.10	N/A	-2	100%	-3.36	CIRCULACION
17.84	2.40	N/A	1	100%	42.82	HABITACIÓN 301
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
1.00	1.45	N/A	-1	100%	-1.45	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO
1.94	2.10	N/A	1	100%	4.07	HABITACIÓN 301 - CLOSET
18.17	2.40	N/A	1	100%	43.61	HABITACIÓN 302
1.90	2.10	N/A	1	100%	3.99	HABITACIÓN 302 - CLOSET
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
0.95	0.95	N/A	-1	100%	-0.90	DESCUENTO
18.43	2.40	N/A	1	100%	44.23	HABITACIÓN 303
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACIÓN 303 - CLOSET
0.75	2.00	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO
26.42	2.40	N/A	1	100%	63.41	HABITACIÓN 304
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACIÓN 304 - CLOSET
0.75	2.00	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO
18.61	2.40	N/A	1	100%	44.66	HABITACIÓN 305
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACIÓN 305 - CLOSET
0.75	2.00	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO
27.02	2.40	N/A	1	100%	64.85	HABITACIÓN 306
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACIÓN 306 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
18.49	2.40	N/A	1	100%	44.38	HABITACIÓN 307
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACIÓN 307 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
23.62	2.40	N/A	1	100%	56.69	HABITACIÓN 308
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACIÓN 308 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
7.33	2.40	N/A	1	100%	17.59	CUARTO DE EQUIPOS
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO
18.20	2.40	N/A	1	100%	43.68	HABITACIÓN 309
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACIÓN 309 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
18.15	2.40	N/A	1	100%	43.56	HABITACIÓN 310
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACIÓN 310 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
17.95	2.40	N/A	1	100%	43.08	HABITACIÓN 311
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACIÓN 311 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO








0.75	2.00	N/A	-1	100%	**-1.50**	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	**-1.89**	DESCUENTO
18.78	2.10	N/A	1	100%	**39.44**	HABITACIÓN 312
1.95	2.10	N/A	1	100%	**4.10**	HABITACIÓN 312 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	100%	**-1.95**	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	100%	**-1.50**	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	**-1.89**	DESCUENTO
21.42	2.40	N/A	1	100%	**51.41**	HABITACIÓN 313
1.95	2.10	N/A	1	100%	**4.10**	HABITACIÓN 313 - CLOSET
1.20	1.50	N/A	-1	100%	**-1.80**	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	100%	**-1.50**	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	**-2.52**	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	**-1.89**	DESCUENTO
18.33	2.40	N/A	1	100%	**43.99**	HABITACIÓN 314
1.95	2.10	N/A	1	100%	**4.10**	HABITACIÓN 314 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	100%	**-1.95**	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	**-2.52**	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	100%	**-1.50**	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	**-1.89**	DESCUENTO
18.42	2.40	N/A	1	100%	**44.21**	HABITACIÓN 315
1.95	2.10	N/A	1	100%	**4.10**	HABITACIÓN 315 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	100%	**-1.95**	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	**-2.52**	DESCUENTO
0.45	2.00	N/A	-1	100%	**-0.90**	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	**-1.89**	DESCUENTO
18.02	2.40	N/A	1	100%	**43.25**	HABITACIÓN 316
1.95	2.10	N/A	1	100%	**4.10**	HABITACIÓN 316 - CLOSET
1.20	2.10	N/A	-1	100%	**-2.52**	DESCUENTO
0.95	1.45	N/A	-1	100%	**-1.38**	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	100%	**-1.50**	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	**-1.89**	DESCUENTO
18.37	2.40	N/A	1	100%	**44.09**	HABITACIÓN 317
1.95	2.10	N/A	1	100%	**4.10**	HABITACIÓN 317 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	100%	**-1.95**	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	**-2.52**	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	100%	**-1.50**	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	**-1.89**	DESCUENTO
18.28	2.40	N/A	1	100%	**43.87**	HABITACIÓN 318
1.95	2.10	N/A	1	100%	**4.10**	HABITACIÓN 318 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	100%	**-1.95**	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	**-2.52**	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	100%	**-1.50**	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	**-1.89**	DESCUENTO
18.35	2.40	N/A	1	100%	**44.04**	HABITACIÓN 319
1.95	2.10	N/A	1	100%	**4.10**	HABITACIÓN 319 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	100%	**-1.95**	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	**-2.52**	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	100%	**-1.50**	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	**-1.89**	DESCUENTO
18.38	2.40	N/A	1	100%	**44.11**	HABITACIÓN 320
1.95	2.10	N/A	1	100%	**4.10**	HABITACIÓN 320 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	100%	**-1.95**	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	**-2.52**	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	100%	**-1.50**	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	**-1.89**	DESCUENTO
18.21	2.40	N/A	1	100%	**43.70**	HABITACIÓN 321
1.95	2.10	N/A	1	100%	**4.10**	HABITACIÓN 321 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	100%	**-1.95**	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	**-2.52**	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	100%	**-1.50**	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	**-1.89**	DESCUENTO
17.96	2.40	N/A	1	100%	**43.10**	HABITACIÓN 322
1.95	2.10	N/A	1	100%	**4.10**	HABITACIÓN 322 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	100%	**-1.95**	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	**-2.52**	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	100%	**-1.50**	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	**-1.89**	DESCUENTO
18.48	2.40	N/A	1	100%	**44.35**	HABITACIÓN 323
1.95	2.10	N/A	1	100%	**4.10**	HABITACIÓN 323 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	100%	**-1.95**	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	**-2.52**	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	100%	**-1.50**	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	**-1.89**	DESCUENTO
18.01	2.40	N/A	1	100%	**43.22**	HABITACIÓN 324
1.95	2.10	N/A	1	100%	**4.10**	HABITACIÓN 324 - CLOSET
0.95	0.90	N/A	-1	100%	**-0.86**	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	**-2.52**	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	100%	**-1.50**	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	**-1.89**	DESCUENTO
18.18	2.40	N/A	1	100%	**43.63**	HABITACIÓN 325
1.95	2.10	N/A	1	100%	**4.10**	HABITACIÓN 325 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	100%	**-1.95**	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	100%	**-1.50**	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	**-2.52**	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	**-1.89**	DESCUENTO
5.10	2.40	N/A	1	100%	**12.24**	ZONA TRABAJO NORTE
7.91	0.85	N/A	1	100%	**6.72**	
83.05	2.40	N/A	1	100%	**199.32**	CIRCULACIÓN HABITACIONES
1.20	2.10	N/A	-25	100%	**-63.00**	DESCUENTO
0.80	2.10	N/A	-1	100%	**-1.68**	DESCUENTO
0.80	0.80	N/A	-3	100%	**-1.92**	DESCUENTO GABINETE
0.33	0.25	N/A	-2	100%	**-0.17**	DESCUENTO CAJA CORTE GASES
13.90	1.05	N/A	1	100%	**14.60**	CENTRAL ENFERMERIA
5.14	2.40	N/A	1	100%	**12.34**	
0.80	2.10	N/A	-1	100%	**-1.68**	DESCUENTO
8.78	2.40	N/A	1	100%	**21.07**	TRABAJO LIMPIO
0.80	2.10	N/A	-1	100%	**-1.68**	DESCUENTO
3.41	2.40	N/A	1	100%	**8.18**	ROPA LIMPIA
0.70	2.10	N/A	-1	100%	**-1.47**	DESCUENTO
5.86	2.40	N/A	1	100%	**14.06**	TRABAJO SUCIO
0.80	2.10	N/A	-1	100%	**-1.68**	DESCUENTO
11.69	2.40	N/A	1	100%	**28.06**	PROCEDIMIENTOS
1.40	2.10	N/A	-1	100%	**-2.94**	DESCUENTO
11.28	2.40	N/A	1	100%	**27.07**	DESCANSO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	**-1.89**	DESCUENTO
1.30	1.50	N/A	-1	100%	**-1.95**	DESCUENTO
27.87	2.40	N/A	1	100%	**66.89**	CIRCULACIÓN RESTRINGIDA
1.20	1.50	N/A	-1	100%	**-1.80**	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	**-1.89**	DESCUENTO
1.30	2.10	N/A	-1	100%	**-2.73**	DESCUENTO
0.80	2.10	N/A	-1	100%	**-1.68**	DESCUENTO
1.40	2.10	N/A	-1	100%	**-2.94**	DESCUENTO
0.83	0.83	N/A	-1	100%	**-0.69**	DESCUENTO GABINTE
0.80	2.10	N/A	-1	100%	**-1.68**	DESCUENTO
4.58	2.60	N/A	1	100%	**11.91**	SALIDA BALCON SUR
6.28	0.85	N/A	1	100%	**5.34**	BALCON SUR
2.10	2.40	N/A	1	100%	**5.04**	ROPA LIMPIA
4.68	2.40	N/A	1	100%	**11.23**	RESIDUOS ORDINARIOS
0.75	2.10	N/A	-1	100%	**-1.58**	DESCUENTO
4.02	2.40	N/A	1	100%	**9.65**	RESIDUOS PELIGROSOS
0.75	2.10	N/A	-1	100%	**-1.58**	DESCUENTO
14.35	2.40	N/A	1	100%	**34.44**	PASILLO ACCESO
0.75	2.10	N/A	-2	100%	**-3.15**	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-3	100%	**-5.67**	DESCUENTO
0.75	2.40	N/A	-1	100%	**-1.80**	DESCUENTO
23.10	2.40	N/A	1	100%	**55.44**	HALL
6.35	1.45	N/A	-1	100%	**-9.21**	DESCUENTO
3.45	1.45	N/A	-1	100%	**-5.00**	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	**-2.52**	DESCUENTO
1.05	1.66	N/A	-1	100%	**-1.74**	DESCUENTO
1.00	2.10	N/A	-1	100%	**-2.10**	DESCUENTO
12.36	2.40	N/A	1	100%	**29.66**	COORDINACIÓN
1.05	2.66	N/A	-1	100%	**-2.79**	DESCUENTO
1.00	2.10	N/A	-1	100%	**-2.10**	DESCUENTO
1.66	1.47	N/A	-1	100%	**-2.44**	DESCUENTO



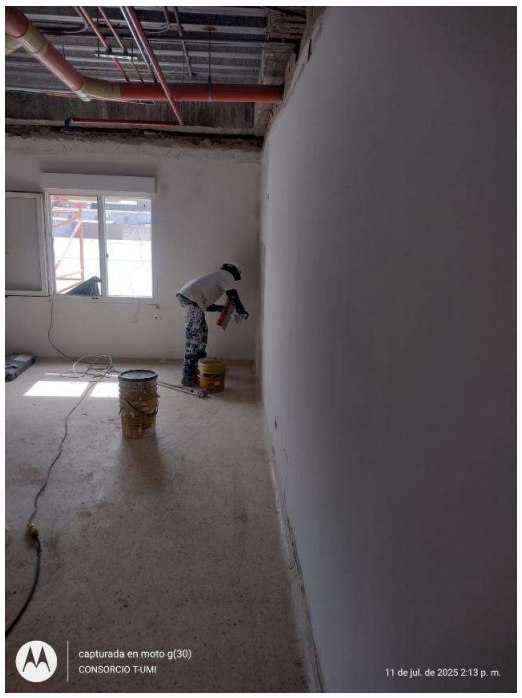





0.78	1.47	N/A	-1	100%	-1.15	DESCUENTO
		PISO 4				
17.84	2.40	N/A	1	100%	42.82	HABITACIÓN 401
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
1.00	1.45	N/A	-1	100%	-1.45	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO
1.94	2.10	N/A	1	100%	4.07	HABITACIÓN 401 - CLOSET
18.17	2.40	N/A	1	100%	43.61	HABITACIÓN 402
1.90	2.10	N/A	1	100%	3.99	HABITACIÓN 402 - CLOSET
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
0.95	0.95	N/A	-1	100%	-0.90	DESCUENTO
18.43	2.40	N/A	1	100%	44.23	HABITACIÓN 403
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACIÓN 403 - CLOSET
0.75	2.00	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO
26.42	2.40	N/A	1	100%	63.41	HABITACIÓN 404
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACIÓN 404 - CLOSET
0.75	2.00	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO
18.61	2.40	N/A	1	100%	44.66	HABITACIÓN 405
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACIÓN 405 - CLOSET
0.75	2.00	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO
27.02	2.40	N/A	1	100%	64.85	HABITACIÓN 406
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACIÓN 406 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
18.49	2.40	N/A	1	100%	44.38	HABITACIÓN 407
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACIÓN 407 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
23.62	2.40	N/A	1	100%	56.69	HABITACIÓN 408
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACIÓN 408 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
7.33	2.40	N/A	1	100%	17.59	CUARTO DE EQUIPOS
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO
18.20	2.40	N/A	1	100%	43.68	HABITACIÓN 409
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACIÓN 409 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
18.15	2.40	N/A	1	100%	43.56	HABITACIÓN 410
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACIÓN 410 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
17.95	2.40	N/A	1	100%	43.08	HABITACIÓN 411
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACIÓN 411 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
18.78	2.10	N/A	1	100%	39.44	HABITACIÓN 412
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACIÓN 412 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
21.42	2.40	N/A	1	100%	51.41	HABITACIÓN 413
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACIÓN 413 - CLOSET
1.20	1.50	N/A	-1	100%	-1.80	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
18.33	2.40	N/A	1	100%	43.99	HABITACIÓN 414
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACIÓN 414 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
18.42	2.40	N/A	1	100%	44.21	HABITACIÓN 415
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACIÓN 415 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO
0.45	2.00	N/A	-1	100%	-0.90	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
18.02	2.40	N/A	1	100%	43.25	HABITACIÓN 416
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACIÓN 416 - CLOSET
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO
0.95	1.45	N/A	-1	100%	-1.38	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
18.37	2.40	N/A	1	100%	44.09	HABITACIÓN 417
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACIÓN 417 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
18.28	2.40	N/A	1	100%	43.87	HABITACIÓN 418
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACIÓN 418 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
18.35	2.40	N/A	1	100%	44.04	HABITACIÓN 419
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACIÓN 419 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
18.38	2.40	N/A	1	100%	44.11	HABITACIÓN 420
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACIÓN 420 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
18.21	2.40	N/A	1	100%	43.70	HABITACIÓN 421
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACIÓN 421 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
17.96	2.40	N/A	1	100%	43.10	HABITACIÓN 422
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACIÓN 422 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
18.48	2.40	N/A	1	100%	44.35	HABITACIÓN 423







1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACIÓN 423 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
18.01	2.40	N/A	1	100%	43.22	HABITACIÓN 424
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACIÓN 424 - CLOSET
0.95	0.90	N/A	-1	100%	-0.86	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
18.18	2.40	N/A	1	100%	43.63	HABITACIÓN 425
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACIÓN 425 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
5.10	2.40	N/A	1	100%	12.24	ZONA TRABAJO NORTE
7.91	0.85	N/A	1	100%	6.72	
83.05	2.40	N/A	1	100%	199.32	CIRCULACIÓN HABITACIONES
1.20	2.10	N/A	-25	100%	-63.00	DESCUENTO
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO
0.80	0.80	N/A	-3	100%	-1.92	DESCUENTO GABINETE
0.33	0.25	N/A	-2	100%	-0.17	DESCUENTO CAJA CORTE GASES
13.90	1.05	N/A	1	100%	14.60	CENTRAL ENFERMERIA
5.14	2.40	N/A	1	100%	12.34	
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO
8.78	2.40	N/A	1	100%	21.07	TRABAJO LIMPIO
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO
3.41	2.40	N/A	1	100%	8.18	ROPA LIMPIA
0.70	2.10	N/A	-1	100%	-1.47	DESCUENTO
5.86	2.40	N/A	1	100%	14.06	TRABAJO SUCIO
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO
11.69	2.40	N/A	1	100%	28.06	PROCEDIMIENTOS
1.40	2.10	N/A	-1	100%	-2.94	DESCUENTO
11.28	2.40	N/A	1	100%	27.07	DESCANSO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO
27.87	2.40	N/A	1	100%	66.89	CIRCULACIÓN RESTRINGIDA
1.20	1.50	N/A	-1	100%	-1.80	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
1.30	2.10	N/A	-1	100%	-2.73	DESCUENTO
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO
1.40	2.10	N/A	-1	100%	-2.94	DESCUENTO
0.83	0.83	N/A	-1	100%	-0.69	DESCUENTO GABINTE
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO
4.58	2.60	N/A	1	100%	11.91	SALIDA BALCON SUR
6.28	0.85	N/A	1	100%	5.34	BALCON SUR
2.10	2.40	N/A	1	100%	5.04	ROPA LIMPIA
4.68	2.40	N/A	1	100%	11.23	RESIDUOS ORDINARIOS
0.75	2.10	N/A	-1	100%	-1.58	DESCUENTO
4.02	2.40	N/A	1	100%	9.65	RESIDUOS PELIGROSOS
0.75	2.10	N/A	-1	100%	-1.58	DESCUENTO
14.35	2.40	N/A	1	100%	34.44	PASILLO ACCESO
0.75	2.10	N/A	-2	100%	-3.15	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-3	100%	-5.67	DESCUENTO
0.75	2.40	N/A	-1	100%	-1.80	DESCUENTO
23.10	2.40	N/A	1	100%	55.44	HALL
6.35	1.45	N/A	-1	100%	-9.21	DESCUENTO
3.45	1.45	N/A	-1	100%	-5.00	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO
1.05	1.66	N/A	-1	100%	-1.74	DESCUENTO
1.00	2.10	N/A	-1	100%	-2.10	DESCUENTO
12.36	2.40	N/A	1	100%	29.66	COORDINACIÓN
1.05	2.66	N/A	-1	100%	-2.79	DESCUENTO
1.00	2.10	N/A	-1	100%	-2.10	DESCUENTO
1.66	1.47	N/A	-1	100%	-2.44	DESCUENTO
0.78	1.47	N/A	-1	100%	-1.15	DESCUENTO
2.30	1.2	N/A	1	100%	2.76	HAB 401
1.70	2.4	N/A	1	100%	4.08	PASILLO HAB 401 GABINETE
0.81	0.81	N/A	-1	100%	-0.66	DESCUENTO GABINETE
3.20	2.4	N/A	1	100%	7.68	HAB 403
1.00	1.5	N/A	1	100%	1.50	HAB 405
2.40	2.4	N/A	1	100%	5.76	HAB 407
0.94	2.4	N/A	1	100%	2.26	HAB 406
1.20	2.4	N/A	1	100%	2.88	HAB 409
3.14	2.4	N/A	1	100%	7.54	HAB 410
1.00	1.5	N/A	1	100%	1.50	HAB 411
2.30	2.4	N/A	1	100%	5.52	HAB 412
1.70	2.4	N/A	1	100%	4.08	PASILLO HAB 417
0.81	0.81	N/A	-1	100%	-0.66	PASILLO HAB 418
1.20	1.5	N/A	1	100%	1.80	HAB 414
1.20	1.5	N/A	1	100%	1.80	HAB 415
2.04	2.4	N/A	1	100%	4.90	HAB 416
2.10	1.4	N/A	1	100%	2.94	HAB 417
1.00	1.6	N/A	1	100%	1.60	HAB 418
3.08	2.4	N/A	1	100%	7.39	HAB 419
1.80	1.5	N/A	1	100%	2.70	HAB 420
1.30	1.7	N/A	1	100%	2.21	HAB 421
1.30	1.5	N/A	1	100%	1.95	HAB 422
1.20	1.5	N/A	1	100%	1.80	HAB 423
1.20	1.5	N/A	1	100%	1.80	HAB 424
1.60	2.4	N/A	1	100%	3.84	PASILLO GABINETE
0.80	0.8	N/A	-1	100%	-0.64	GABINETE

OBSERVACIONES:

TOTAL	**9,299.14**	**Metro Cuadrado**
ACUMULADO ANTERIOR	**7,432.19**	**Metro Cuadrado**
PRESENTE ACTA	**1,866.95**	**Metro Cuadrado**

Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:


PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	1.02	ESTUCO MUROS ANCHOS MENORES DE 0,6 M	CAP	1.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA	UNIDAD	Metro lineal	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico





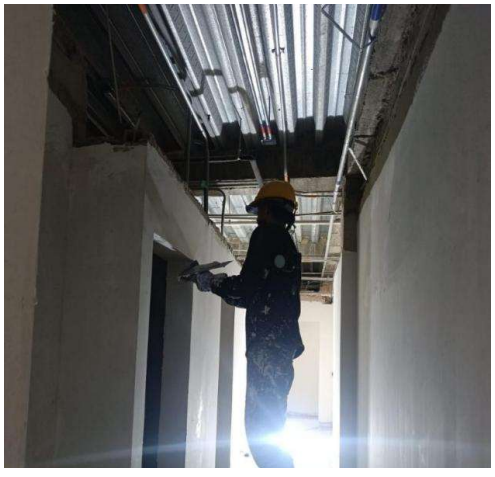

Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
SOTANO						
2.55	N/A	N/A	12	100%	**30.60**	BODEGA FARMACIA
2.52	N/A	N/A	11	100%	**27.72**	ARCHIVO
2.10	N/A	N/A	5	100%	**10.50**	CIRCULACION DE ARCHIVO A DESPACHO DE DIETAS
0.80	N/A	N/A	1	100%	**0.80**	CIRCULACION DE ARCHIVO A DESPACHO DE DIETAS
0.90	N/A	N/A	1	100%	**0.90**	CIRCULACION DE ARCHIVO A DESPACHO DE DIETAS
1.40	N/A	N/A	1	100%	**1.40**	CIRCULACION DE ARCHIVO A DESPACHO DE DIETAS
2.10	N/A	N/A	3	100%	**6.30**	CIRCULACION DE ROPA SUCIA A DEPOSITO DE CADAVERES
2.53	N/A	N/A	3	100%	**7.59**	CIRCULACION DE ROPA SUCIA A DEPOSITO DE CADAVERES
1.30	N/A	N/A	1	100%	**1.30**	CIRCULACION DE ROPA SUCIA A DEPOSITO DE CADAVERES
1.40	N/A	N/A	1	100%	**1.40**	CIRCULACION DE ROPA SUCIA A DEPOSITO DE CADAVERES
2.50	N/A	N/A	3	100%	**7.50**	DEP. CADAVERES
2.10	N/A	N/A	8	100%	**16.80**	CIRCULACION ENTRE ROPA LIMPIA A PARQUEADERO
2.00	N/A	N/A	2	100%	**4.00**	CIRCULACION ENTRE ROPA LIMPIA A PARQUEADERO
1.40	N/A	N/A	1	100%	**1.40**	CIRCULACION ENTRE ROPA LIMPIA A PARQUEADERO
0.80	N/A	N/A	1	100%	**0.80**	CIRCULACION ENTRE ROPA LIMPIA A PARQUEADERO
2.10	N/A	N/A	3	100%	**6.30**	CIRCULACION SALA DE STAR
0.90	N/A	N/A	1	100%	**0.90**	CIRCULACION SALA DE STAR
0.70	N/A	N/A	1	100%	**0.70**	CIRCULACION SALA DE STAR
2.52	N/A	N/A	5	100%	**12.60**	DEPOSITO ALMACEN
2.50	N/A	N/A	5	100%	**12.50**	LAVANDERIA
2.70	N/A	N/A	1	100%	**2.70**	PARQUEADERO SOTANO
2.80	N/A	N/A	3	100%	**8.40**	PARQUEADERO SOTANO
PISO 1						
4.02	N/A	N/A	1	100%	**4.02**	LAVADO DE OJOS
2.90	N/A	N/A	1	100%	**2.90**	LAVADO DE OJOS
0.96	N/A	N/A	1	100%	**0.96**	LAVADO DE OJOS
1.30	N/A	N/A	15	100%	**19.50**	LABORATORIO
2.20	N/A	N/A	2	100%	**4.40**	LABORATORIO
0.80	N/A	N/A	2	100%	**1.60**	LABORATORIO
1.60	N/A	N/A	1	100%	**1.60**	INYECTOLOGIA
2.28	N/A	N/A	1	100%	**2.28**	INYECTOLOGIA
4.37	N/A	N/A	1	100%	**4.37**	INYECTOLOGIA
2.60	N/A	N/A	1	100%	**2.60**	INYECTOLOGIA
1.70	N/A	N/A	1	100%	**1.70**	INYECTOLOGIA
3.86	N/A	N/A	1	100%	**3.86**	INYECTOLOGIA
2.76	N/A	N/A	1	100%	**2.76**	INYECTOLOGIA
2.02	N/A	N/A	1	100%	**2.02**	RESIDUOS
0.80	N/A	N/A	1	100%	**0.80**	RESIDUOS
0.64	N/A	N/A	2	100%	**1.28**	RESIDUOS
1.30	N/A	N/A	1	100%	**1.30**	RESIDUOS
0.47	N/A	N/A	1	100%	**0.47**	RESIDUOS
1.30	N/A	N/A	1	100%	**1.30**	RESIDUOS
2.60	N/A	N/A	3	100%	**7.80**	INYECTOLOGIA
1.08	N/A	N/A	1	100%	**1.08**	AREA NEVERA
2.02	N/A	N/A	2	100%	**4.04**	PRETRASFUCIONAL
1.10	N/A	N/A	1	100%	**1.10**	PRETRASFUCIONAL
0.96	N/A	N/A	2	100%	**1.92**	PRETRASFUCIONAL
2.60	N/A	N/A	3	100%	**7.80**	PRETRASFUCIONAL
0.65	N/A	N/A	2	100%	**1.30**	PRETRASFUCIONAL
1.00	N/A	N/A	1	100%	**1.00**	PRETRASFUCIONAL
2.10	N/A	N/A	2	100%	**4.20**	BAÑO URGENCIAS
0.80	N/A	N/A	1	100%	**0.80**	MUESTRAS GINECO
1.30	N/A	N/A	4	100%	**5.20**	MUESTRAS GINECO
1.07	N/A	N/A	3	100%	**3.21**	MUESTRAS GINECO
2.60	N/A	N/A	2	100%	**5.20**	TOMA DE MUESTRAS
1.21	N/A	N/A	2	100%	**2.42**	ENTRADA INSPECION HOSPITALARIA
1.10	N/A	N/A	1	100%	**1.10**	ENTRADA INSPECION HOSPITALARIA
2.60	N/A	N/A	14	100%	**36.40**	FARMACIA
2.10	N/A	N/A	1	100%	**2.10**	FARMACIA
3.00	N/A	N/A	2	100%	**6.00**	FARMACIA
1.50	N/A	N/A	6	100%	**9.00**	FARMACIA
1.64	N/A	N/A	1	100%	**1.64**	FARMACIA
2.10	N/A	N/A	6	100%	**12.60**	FARMACIA
2.60	N/A	N/A	4	100%	**10.40**	FARMACIA
1.00	N/A	N/A	1	100%	**1.00**	CICULACION HALL
0.90	N/A	N/A	1	100%	**0.90**	CICULACION HALL
1.29	N/A	N/A	1	100%	**1.29**	CICULACION HALL
1.20	N/A	N/A	1	100%	**1.20**	CICULACION HALL
2.10	N/A	N/A	3	100%	**6.30**	ADMISIONES
0.80	N/A	N/A	1	100%	**0.80**	MANOGRAFO
1.10	N/A	N/A	1	100%	**1.10**	IMAGENOLOGIA
1.00	N/A	N/A	1	100%	**1.00**	IMAGENOLOGIA
0.40	N/A	N/A	2	100%	**0.80**	IMAGENOLOGIA
2.60	N/A	N/A	1	100%	**2.60**	ADMISIONES
2.10	N/A	N/A	5	100%	**10.50**	ADMISIONES
1.10	N/A	N/A	1	100%	**1.10**	ADMISIONES
0.90	N/A	N/A	2	100%	**1.80**	ADMISIONES
2.60	N/A	N/A	1	100%	**2.60**	PROCEDIMIENTOS
2.10	N/A	N/A	2	100%	**4.20**	PROCEDIMIENTOS
0.90	N/A	N/A	1	100%	**0.90**	PROCEDIMIENTOS
2.60	N/A	N/A	2	100%	**5.20**	COSULTORIO CARDIOLOGIA
0.70	N/A	N/A	1	100%	**0.70**	CICULACION HALL A ASECIA
2.10	N/A	N/A	2	100%	**4.20**	CICULACION HALL A ASECIA
0.90	N/A	N/A	1	100%	**0.90**	CICULACION HALL A ASECIA
2.60	N/A	N/A	1	100%	**2.60**	OFICINA RADIOLOGIA
2.60	N/A	N/A	1	100%	**2.60**	INSUMOS
0.90	N/A	N/A	1	100%	**0.90**	INSUMOS
2.10	N/A	N/A	1	100%	**2.10**	INSUMOS
2.60	N/A	N/A	4	100%	**10.40**	SALA DE ESEPRA CONSULTORIO ECOGRAFO
2.10	N/A	N/A	2	100%	**4.20**	SALA DE ESEPRA CONSULTORIO ECOGRAFO
1.10	N/A	N/A	2	100%	**2.20**	SALA DE ESEPRA CONSULTORIO ECOGRAFO
1.00	N/A	N/A	2	100%	**2.00**	SALA DE ESEPRA CONSULTORIO ECOGRAFO
0.40	N/A	N/A	2	100%	**0.80**	SALA DE ESEPRA CONSULTORIO ECOGRAFO
2.10	N/A	N/A	2	100%	**4.20**	ECOGRAFIA
1.20	N/A	N/A	1	100%	**1.20**	ECOGRAFIA
2.10	N/A	N/A	2	100%	**4.20**	ECOGRAFIA
0.80	N/A	N/A	1	100%	**0.80**	ECOGRAFIA
2.60	N/A	N/A	3	100%	**7.80**	CONSULTORIO ECOGRAFIA
2.10	N/A	N/A	2	100%	**4.20**	CONSULTORIO ECOGRAFIA
0.80	N/A	N/A	1	100%	**0.80**	CONSULTORIO ECOGRAFIA
2.10	N/A	N/A	9	100%	**18.90**	CIRCULACION ACESO URGENCIAS
11.47	N/A	N/A	1	100%	**11.47**	FAJAS DINTE CONSULTORIO 3
4.00	N/A	N/A	4	100%	**16.00**	FAJAS DINTE CONSULTORIO 3
1.40	N/A	N/A	2	100%	**2.80**	CONSULTORIO 4
1.00	N/A	N/A	4	100%	**4.00**	CONSULTORIO 4
2.10	N/A	N/A	2	100%	**4.20**	CONSULTORIO 4
0.80	N/A	N/A	1	100%	**0.80**	MONITOREO GINECOSTETRIA
1.73	N/A	N/A	1	100%	**1.73**	REANIMACION
1.30	N/A	N/A	8	100%	**10.40**	REANIMACION
2.10	N/A	N/A	2	100%	**4.20**	REANIMACION
2.16	N/A	N/A	1	100%	**2.16**	CIRCULACION SALA DE ESPERA HALL
2.10	N/A	N/A	6	100%	**12.60**	CIRCULACION SALA DE ESPERA HALL
1.00	N/A	N/A	1	100%	**1.00**	CIRCULACION SALA DE ESPERA HALL
2.70	N/A	N/A	1	100%	**2.70**	CIRCULACION SALA DE ESPERA HALL
1.70	N/A	N/A	1	100%	**1.70**	CIRCULACION SALA DE ESPERA HALL
1.00	N/A	N/A	1	100%	**1.00**	CIRCULACION SALA DE ESPERA HALL
0.80	N/A	N/A	1	100%	**0.80**	CIRCULACION SALA DE ESPERA HALL
0.80	N/A	N/A	4	100%	**3.20**	CIRCULACION SALA DE ESPERA HALL
2.00	N/A	N/A	4	100%	**8.00**	CIRCULACION SALA DE ESPERA HALL
0.40	N/A	N/A	8	100%	**3.20**	CIRCULACION SALA DE ESPERA HALL
0.80	N/A	N/A	2	100%	**1.60**	CUARTO PERSONAL ASISTENCIAL
2.00	N/A	N/A	2	100%	**4.00**	CUARTO PERSONAL ASISTENCIAL










0.40	N/A	N/A	4	100%	1.60	CUARTO PERSONAL ASISTENCIAL
2.70	N/A	N/A	6	100%	16.20	FACTURACION
1.00	N/A	N/A	4	100%	4.00	FACTURACION
2.70	N/A	N/A	6	100%	16.20	HALL GENERAL
2.30	N/A	N/A	4	100%	9.20	COCINETA
1.90	N/A	N/A	1	100%	1.90	COCINETA
2.10	N/A	N/A	3	100%	6.30	CAFETERIA
0.90	N/A	N/A	2	100%	1.80	CAFETERIA
1.30	N/A	N/A	1	100%	1.30	CAFETERIA
2.10	N/A	N/A	1	100%	2.10	PUERTA MANOGRAFO
0.50	N/A	N/A	1	100%	0.50	PUERTA DINTEL
1.70	N/A	N/A	1	100%	1.70	TAC
2.10	N/A	N/A	1	100%	2.10	TAC
0.80	N/A	N/A	3	100%	2.40	TAC
1.70	N/A	N/A	2	100%	3.40	DISPARO
2.38	N/A	N/A	3	100%	7.14	DISPARO
2.10	N/A	N/A	2	100%	4.20	DISPARO
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	DISPARO
2.45	N/A	N/A	6	100%	14.70	OBSERVACION GINECOSTETRICA
2.10	N/A	N/A	6	100%	12.60	OBSERVACION GINECOSTETRICA
0.80	N/A	N/A	2	100%	1.60	OBSERVACION GINECOSTETRICA
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	OBSERVACION GINECOSTETRICA
2.73	N/A	N/A	3	100%	8.19	OBSERVACION PEDIATRA
0.79	N/A	N/A	3	100%	2.37	OBSERVACION PEDIATRA
0.51	N/A	N/A	2	100%	1.02	OBSERVACION PEDIATRA
2.45	N/A	N/A	11	100%	26.95	OBSERVACION PEDIATRA
2.10	N/A	N/A	3	100%	6.30	OBSERVACION PEDIATRA
6.67	N/A	N/A	1	100%	6.67	CENTRAL DE EMFERMERIA
0.80	N/A	N/A	2	100%	1.60	CENTRAL DE EMFERMERIA
1.00	N/A	N/A	3	100%	3.00	DIR URGENCIAS
2.42	N/A	N/A	3	100%	7.26	PROCEDIMIRNTOD ASCEPTICOS
0.90	N/A	N/A	2	100%	1.80	DIGITACION
2.10	N/A	N/A	4	100%	8.40	DIGITACION
1.00	N/A	N/A	2	100%	2.00	DIGITACION
1.30	N/A	N/A	2	100%	2.60	DIGITACION
2.50	N/A	N/A	3	100%	7.50	SALA ERA
2.10	N/A	N/A	3	100%	6.30	SALA ERA
1.30	N/A	N/A	2	100%	2.60	SALA ERA
1.00	N/A	N/A	2	100%	2.00	SALA ERA
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	SALA ERA
2.50	N/A	N/A	4	100%	10.00	CONSULTORIO 3
2.10	N/A	N/A	1	100%	2.10	CONSULTORIO 3
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	CONSULTORIO 3
1.00	N/A	N/A	2	100%	2.00	CONSULTORIO 3
1.40	N/A	N/A	2	100%	2.80	CONSULTORIO 3
2.50	N/A	N/A	2	100%	5.00	CONSULTORIO 2
2.10	N/A	N/A	1	100%	2.10	CONSULTORIO 2
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	CONSULTORIO 2
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	CONSULTORIO 2
1.30	N/A	N/A	2	100%	2.60	CONSULTORIO 2
1.50	N/A	N/A	2	100%	3.00	CONSULTORIO 2
2.50	N/A	N/A	2	100%	5.00	CONSULTORIO 1
2.10	N/A	N/A	1	100%	2.10	CONSULTORIO 1
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	CONSULTORIO 1
0.93	N/A	N/A	2	100%	1.86	CONSULTORIO 1
0.92	N/A	N/A	2	100%	1.84	CONSULTORIO 1
2.50	N/A	N/A	3	100%	7.50	ADMISIONES
2.10	N/A	N/A	2	100%	4.20	REF Y CONTRA REF
2.52	N/A	N/A	4	100%	10.08	SALA ESEPRA URGENCIAS
1.40	N/A	N/A	4	100%	5.60	SALA ESEPRA URGENCIAS
2.10	N/A	N/A	2	100%	4.20	SALA ESEPRA URGENCIAS
2.52	N/A	N/A	2	100%	5.04	SALA ESEPRA URGENCIAS
1.20	N/A	N/A	2	100%	2.40	SALA ESEPRA URGENCIAS
1.70	N/A	N/A	1	100%	1.70	SALA ESEPRA URGENCIAS
0.75	N/A	N/A	2	100%	1.50	ANTEPECHO SALA DE ESPERA
2.52	N/A	N/A	1	100%	2.52	DESCANSO INTERNOS
2.10	N/A	N/A	1	100%	2.10	DESCANSO INTERNOS
0.80	N/A	N/A	1	100%	0.80	DESCANSO INTERNOS
2.52	N/A	N/A	5	100%	12.60	EQUIPOS
2.10	N/A	N/A	1	100%	2.10	EQUIPOS
0.80	N/A	N/A	1	100%	0.80	EQUIPOS
2.54	N/A	N/A	4	100%	10.16	PASILLO - SALA ESPERA A FARMACIA: COLUMAS
1.84	N/A	N/A	1	100%	1.84	PASILLO - SALA ESPERA A FARMACIA: VENTANA
2.10	N/A	N/A	1	100%	2.10	CONTROL IMGENOLOGÍA - CARDIOLOGÍA: VANO PUERTA (ALTO)
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	CONTROL IMGENOLOGÍA - CARDIOLOGÍA: VANO PUERTA (ANCHO)
2.50	N/A	N/A	1	100%	2.50	SALA ESPERA - RECEPCIÓN: ANTEPECHO (LARGO)
1.00	N/A	N/A	1	100%	1.00	SALA ESPERA - RECEPCIÓN: ANTEPECHO (ALTO)
3.51	N/A	N/A	1	100%	3.51	CONTROL IMAGENOLOGÍA - CARDIO: ANTEPECHO
1.50	N/A	N/A	1	100%	1.50	CONTROL IMAGENOLOGÍA - CARDIO:COLUMNETA
2.50	N/A	N/A	1	100%	2.50	SALA ESPERA - RECEPCIÓN: MURO CORTO LATERAL DERECHO
2.64	N/A	N/A	2	100%	5.28	CAMILLA Y SILLAS RUEDAS: COLUMNA
2.00	N/A	N/A	1	100%	2.00	DE ACCESO URG A PASILLO HACIA CENTRAL DE ENFERMERIA: PUERTA ACCESO (ANCHO)
2.10	N/A	N/A	1	100%	2.10	DE ACCESO URG A PASILLO HACIA CENTRAL DE ENFERMERIA: PUERTA ACCESO (ALTO)
2.54	N/A	N/A	5	100%	12.70	MONITOREO GINESCOBTETRIA: COLUMNAS
2.10	N/A	N/A	3	100%	6.30	MONITOREO GINESCOBTETRIA: PUERTAS (ALTOS)
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	MONITOREO GINESCOBTETRIA: PUERTA BAÑO (ANCHO)
0.70	N/A	N/A	1	100%	0.70	MONITOREO GINESCOBTETRIA: PUERTA CUARTO LIBRE (ANCHO)
1.71	N/A	N/A	1	100%	1.71	MONITOREO GINESCOBTETRIA: PUERTA PRINCIPAL (ANCHO)
0.95	N/A	N/A	4	100%	3.80	SALA EDA: VENTANA EXTERIOR
1.00	N/A	N/A	2	100%	2.00	SALA EDA: VENTANA PASILLO (ANCHO)
1.07	N/A	N/A	2	100%	2.14	SALA EDA: VENTANA PASILLO (ALTO)
2.10	N/A	N/A	4	100%	8.40	SALA EDA: PUERTAS (ALTOS)
0.80	N/A	N/A	1	100%	0.80	SALA EDA: PUERTA BAÑO (ANCHO)
1.00	N/A	N/A	1	100%	1.00	SALA EDA: PUERTA PRINCIPAL (ANCHO)
2.63	N/A	N/A	4	100%	10.52	SALA EDA: COLUMNAS
1.13	N/A	N/A	2	100%	2.26	AUDITORIO (MURO ORIENTAL): VENTANA (ANCHO)
1.72	N/A	N/A	1	100%	1.72	AUDITORIO (MURO ORIANTAL): VENTANA (ALTO)
2.62	N/A	N/A	1	100%	2.62	AUDITORIO (MURO ORIENTAL): COLUMNA
3.80	N/A	N/A	4	100%	15.20	AUDITORIO (MURO NORTE): VENTANA
2.37	N/A	N/A	1	100%	2.37	
2.62	N/A	N/A	1	100%	2.62	
2.66	N/A	N/A	5	100%	13.30	AUDITORIO (MURO NORTE): COLUMNAS
3.89	N/A	N/A	2	100%	7.78	SALA ESPERA ADULTO: VENTANA (ANCHO)
2.60	N/A	N/A	1	100%	2.60	SALA ESPERA ADULTO: VENTANA (ALTO)
2.60	N/A	N/A	6	100%	15.60	SALA ESPERA ADULTO: COLUMNAS
2.10	N/A	N/A	1	100%	2.10	INSUMOS DISPOSITIVOS FARMACIA (DIGITACIÓN): PUERTA (ALTO)
0.70	N/A	N/A	1	100%	0.70	INSUMOS DISPOSITIVOS FARMACIA (DIGITACIÓN): PUERTA (ANCHO)
2.10	N/A	N/A	2	100%	4.20	ROPA LIMPIA (DIGITACIÓN): PUERTA (ALTO)
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	ROPA LIMPIA (DIGITACIÓN): PUERTA (ANCHO)
2.10	N/A	N/A	1	100%	2.10	ROPA SUCIA (DIGITACIÓN): PUERTA (ALTO)
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	ROPA SUCIA (DIGITACIÓN): PUERTA (ANCHO)
2.53	N/A	N/A	2	100%	5.06	REANIMACIÓN: COLUMNA
2.57	N/A	N/A	4	100%	10.28	DIGITACIÓN: COLUMNA
2.60	N/A	N/A	3	100%	7.80	OBS. GINESCOTETRICA
2.55	N/A	N/A	2	100%	5.10	PROCEDIMIENTOS: COLUMNAS
2.52	N/A	N/A	2	100%	5.04	SALA DE LECTURA DE IMAGENOLOGÍCA: COLUMNAS
2.50	N/A	N/A	5	100%	12.50	RX: COLUMNAS
2.56	N/A	N/A	2	100%	5.12	TOMA DE MUESTRAS GINECOLOGÍCA: COLUMNA
2.56	N/A	N/A	2	100%	5.12	RESIDUOS RECICLABLES ORDINARIOS: COLUMNAS
2.60	N/A	N/A	8	100%	20.80	COCINA: COLUMNAS
2.60	N/A	N/A	2	100%	5.20	CAFETERIA: COLUMNAS
2.10	N/A	N/A	1	100%	2.10	INSUMOS DISPOSITIVOS FARMACIA (DIGITACIÓN): PUERTA
0.70	N/A	N/A	1	100%	0.70	
2.10	N/A	N/A	2	100%	4.20	ROPA LIMPIA (DIGITACIÓN): PUERTA
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	
2.10	N/A	N/A	1	100%	2.10	ROPA SUCIA (DIGITACIÓN): PUERTA
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	
1.30	N/A	N/A	2	100%	2.60	CONSULTORIO # 2













2.17	N/A	N/A	1	100%	2.17	CONSULTORIO # 2
1.20	N/A	N/A	5	100%	6.00	OBSERVACION GINECOSTETRICA
1.20	N/A	N/A	8	100%	9.60	OBSERVACION PEDIATRIA
1.50	N/A	N/A	1	100%	1.50	CIRCULACION A LADO GABINETE
1.24	N/A	N/A	1	100%	1.24	SALA PROCEDIMIENTOS IMAGENOLOGIA
		PISO 2				
8.95	N/A	N/A	1	100%	8.95	PASILLO RECUPERACION QUIRURGICA
2.10	N/A	N/A	8	100%	16.80	PASILLO RECUPERACION QUIRURGICA
2.50	N/A	N/A	3	100%	7.50	PASILLO RECUPERACION QUIRURGICA
3.70	N/A	N/A	1	100%	3.70	PREPARACION PACIENTES
2.10	N/A	N/A	4	100%	8.40	PREPARACION PACIENTES
2.40	N/A	N/A	2	100%	4.80	PREPARACION PACIENTES
3.11	N/A	N/A	1	100%	3.11	RECUPERACION QUIRURGICA
2.10	N/A	N/A	3	100%	6.30	PACIENTES
2.55	N/A	N/A	7	100%	17.85	FAJAS ESQUINERAS
1.70	N/A	N/A	1	100%	1.70	COLUMNA
8.47	N/A	N/A	1	100%	8.47	CENTRAL DE ENFERMERIA
1.48	N/A	N/A	2	100%	2.96	FAJAS VENTANAS
1.00	N/A	N/A	2	100%	2.00	FAJAS VENTANAS
2.50	N/A	N/A	6	100%	15.00	CENRAL DE ESTERILIZACIÓN
2.50	N/A	N/A	2	100%	5.00	INGRESO AUTOCLAVE
18.61	N/A	N/A	1	100%	18.61	CIRCULACIÓN QUIROFANOS
2.10	N/A	N/A	21	100%	44.10	CIRCULACIÓN QUIROFANOS
1.00	N/A	N/A	10	100%	10.00	CIRCULACIÓN QUIROFANOS
1.50	N/A	N/A	2	100%	3.00	CIRCULACIÓN QUIROFANOS
0.90	N/A	N/A	2	100%	1.80	CIRCULACIÓN QUIROFANOS
2.15	N/A	N/A	2	100%	4.30	CIRCULACIÓN QUIROFANOS
2.50	N/A	N/A	5	100%	12.50	SALA DE PARTOS 1
0.95	N/A	N/A	4	100%	3.80	SALA DE PARTOS 1
2.60	N/A	N/A	2	100%	5.20	SALA DE PARTOS 2
0.50	N/A	N/A	2	100%	1.00	VENTANA
4.12	N/A	N/A	2	100%	8.24	VENTANA
3.21	N/A	N/A	2	100%	6.42	DESCANSO QUIROFANOS
0.50	N/A	N/A	2	100%	1.00	VENTANAÇPUERTA COLUMNA
2.10	N/A	N/A	1	100%	2.10	QUIROFANO 1
2.50	N/A	N/A	2	100%	5.00	QUIROFANO 2
2.60	N/A	N/A	2	100%	5.20	QUIROFANO 3
2.60	N/A	N/A	3	100%	7.80	PASILLO TRABAJO SUCIO
0.80	N/A	N/A	2	100%	1.60	PASILLO TRABAJO SUCIO
2.10	N/A	N/A	2	100%	4.20	PASILLO TRABAJO SUCIO
1.00	N/A	N/A	1	100%	1.00	PASILLO TRABAJO SUCIO
0.37	N/A	N/A	2	100%	0.74	PASILLO TRABAJO SUCIO
2.00	N/A	N/A	2	100%	4.00	FARMACIA
0.37	N/A	N/A	2	100%	0.74	FARMACIA
2.00	N/A	N/A	2	100%	4.00	FARMACIA
2.50	N/A	N/A	5	100%	12.50	FARMACIA
2.10	N/A	N/A	1	100%	2.10	FARMACIA
0.80	N/A	N/A	1	100%	0.80	FARMACIA
2.10	N/A	N/A	1	100%	2.10	BODEGA
0.80	N/A	N/A	1	100%	0.80	BODEGA
2.10	N/A	N/A	3	100%	6.30	DESCANSO
0.80	N/A	N/A	1	100%	0.80	DESCANSO
1.00	N/A	N/A	4	100%	4.00	DESCANSO
0.60	N/A	N/A	1	100%	0.60	DESCANSO
2.50	N/A	N/A	9	100%	22.50	DESCANSO
2.10	N/A	N/A	7	100%	14.70	VESTIER MUJERES
0.80	N/A	N/A	2	100%	1.60	VESTIER MUJERES
0.70	N/A	N/A	3	100%	2.10	VESTIER MUJERES
2.40	N/A	N/A	1	100%	2.40	VESTIER MUJERES
2.10	N/A	N/A	4	100%	8.40	VESTIER HOMBRES
0.80	N/A	N/A	2	100%	1.60	VESTIER HOMBRES
0.70	N/A	N/A	2	100%	1.40	VESTIER HOMBRES
2.40	N/A	N/A	3	100%	7.20	VESTIER HOMBRES
2.10	N/A	N/A	23	100%	48.30	PASILLO PRINCIPAL UCI
15.60	N/A	N/A	1	100%	15.60	PUERTA DINTEL
2.45	N/A	N/A	5	100%	12.25	ESQUINERO
3.00	N/A	N/A	1	100%	3.00	RECEPCION
2.10	N/A	N/A	3	100%	6.30	TRABAJO DE PARTOS
0.70	N/A	N/A	1	100%	0.70	TRABAJO DE PARTOS
0.80	N/A	N/A	1	100%	0.80	TRABAJO DE PARTOS
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	TRABAJO DE PARTOS
2.50	N/A	N/A	8	100%	20.00	TRABAJO DE PARTOS
4.69	N/A	N/A	1	100%	4.69	CENTRAL DE ENFERMERIA
2.10	N/A	N/A	4	100%	8.40	RECUPERACIÓN PARTOS
0.95	N/A	N/A	1	100%	0.95	RECUPERACIÓN PARTOS
0.80	N/A	N/A	1	100%	0.80	RECUPERACIÓN PARTOS
1.00	N/A	N/A	1	100%	1.00	RECUPERACIÓN PARTOS
0.80	N/A	N/A	1	100%	0.80	RECUPERACIÓN PARTOS
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	RECUPERACIÓN PARTOS
2.50	N/A	N/A	20	100%	50.00	RECUPERACIÓN PARTOS
5.31	N/A	N/A	1	100%	5.31	CENTRAL DE ENFERMERIA
2.50	N/A	N/A	2	100%	5.00	ROPA LIMPIA
2.50	N/A	N/A	2	100%	5.00	FAJA VESTIER PARTOS
2.10	N/A	N/A	12	100%	25.20	UCI ADULTOS (UARO)
0.80	N/A	N/A	4	100%	3.20	UCI ADULTOS (UARO)
1.10	N/A	N/A	2	100%	2.20	UCI ADULTOS (UARO)
1.30	N/A	N/A	3	100%	3.90	UCI ADULTOS (UARO)
1.30	N/A	N/A	2	100%	2.60	UCI ADULTOS (UARO)
0.92	N/A	N/A	2	100%	1.84	UCI ADULTOS (UARO)
0.25	N/A	N/A	4	100%	1.00	UCI ADULTOS (UARO)
0.80	N/A	N/A	2	100%	1.60	UCI ADULTOS (UARO)
0.95	N/A	N/A	4	100%	3.80	UCI ADULTOS (UARO)
1.30	N/A	N/A	1	100%	1.30	UCI ADULTOS (UARO)
1.20	N/A	N/A	2	100%	2.40	UCI ADULTOS (UARO)
0.60	N/A	N/A	1	100%	0.60	UCI ADULTOS (UARO)
2.35	N/A	N/A	2	100%	4.70	UCI ADULTOS (UARO)
0.95	N/A	N/A	4	100%	3.80	UCI ADULTOS (UARO)
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	UCI ADULTOS (UARO)
0.80	N/A	N/A	3	100%	2.40	UCI ADULTOS (UARO)
0.70	N/A	N/A	1	100%	0.70	UCI ADULTOS (UARO)
0.80	N/A	N/A	1	100%	0.80	UCI ADULTOS (UARO)
2.50	N/A	N/A	47	100%	117.50	UCI ADULTOS (UARO)
12.00	N/A	N/A	2	100%	24.00	MUR DIVISORIO UCI 1 Y UCI 2
11.72	N/A	N/A	2	100%	23.44	MUR DIVISORIO UCI 2 Y UCI 3
12.56	N/A	N/A	2	100%	25.12	MUR DIVISORIO UCI 3 Y UCI 4
11.72	N/A	N/A	2	100%	23.44	MUR DIVISORIO UCI 4 Y UCI 5
11.75	N/A	N/A	2	100%	23.50	MUR DIVISORIO UCI 5 Y UCI 6
13.31	N/A	N/A	2	100%	26.62	MUR DIVISORIO UCI 7 Y UCI 8
12.74	N/A	N/A	2	100%	25.48	MURO DIVISORIO UCI 8 Y UCI 9
3.77	N/A	N/A	1	100%	3.77	CENTRAL DE ENFERMERIA UCI 8 Y 9
4.54	N/A	N/A	1	100%	4.54	CENTRAL DE ENFERMERIA UCI 1 A 6
0.80	N/A	N/A	4	100%	3.20	DESCANSO
2.10	N/A	N/A	4	100%	8.40	DESCANSO
2.50	N/A	N/A	1	100%	2.50	DESCANSO
1.50	N/A	N/A	2	100%	3.00	FILTRO
1.00	N/A	N/A	2	100%	2.00	FILTRO
2.50	N/A	N/A	2	100%	5.00	ACCESO UCI NEONATAL
2.50	N/A	N/A	3	100%	7.50	LACTARIO
2.50	N/A	N/A	1	100%	2.50	LACTARIO
2.40	N/A	N/A	4	100%	9.60	LACTARIO
0.80	N/A	N/A	1	100%	0.80	AMBIENTE DE TRABAJO ESTERIL
1.00	N/A	N/A	1	100%	1.00	AMBIENTE DE TRABAJO ESTERIL
2.10	N/A	N/A	4	100%	8.40	AMBIENTE DE TRABAJO ESTERIL
0.80	N/A	N/A	2	100%	1.60	AMBIENTE DE TRABAJO ESTERIL
2.40	N/A	N/A	1	100%	2.40	UCI NEONATAL
0.70	N/A	N/A	2	100%	1.40	UCI NEONATAL
0.90	N/A	N/A	2	100%	1.80	UCI NEONATAL
1.30	N/A	N/A	28	100%	36.40	UCI NEONATAL
0.30	N/A	N/A	2	100%	0.60	UCI NEONATAL
0.90	N/A	N/A	2	100%	1.80	UCI NEONATAL
1.05	N/A	N/A	2	100%	2.10	UCI NEONATAL
1.00	N/A	N/A	2	100%	2.00	UCI NEONATAL
0.70	N/A	N/A	6	100%	4.20	UCI NEONATAL
0.90	N/A	N/A	4	100%	3.60	UCI NEONATAL
1.00	N/A	N/A	1	100%	1.00	UCI NEONATAL
0.70	N/A	N/A	1	100%	0.70	UCI NEONATAL



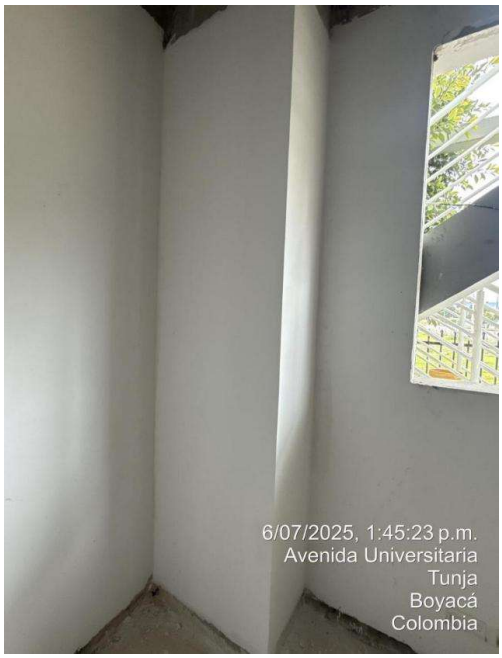

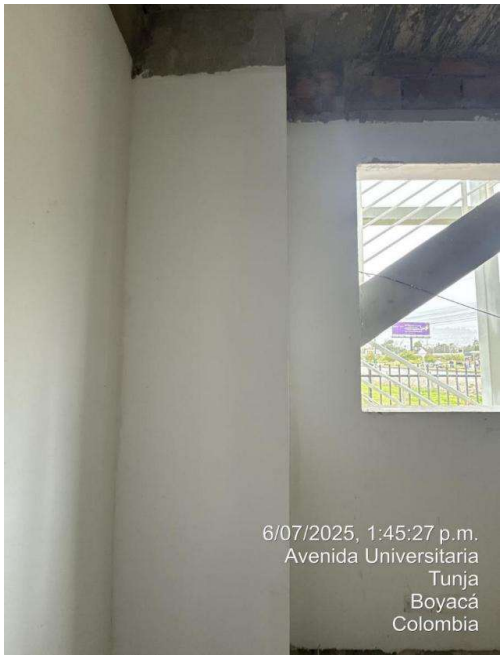

1.35	N/A	N/A	1	**100%**	**1.35**	UCI NEONATAL
0.70	N/A	N/A	1	**100%**	**0.70**	UCI NEONATAL
2.50	N/A	N/A	36	**100%**	**90.00**	UCI NEONATAL
9.71	N/A	N/A	1	**100%**	**9.71**	AISALADO INTENSIVO
8.67	N/A	N/A	1	**100%**	**8.67**	AISALADO INTENSIVO
4.66	N/A	N/A	4	**100%**	**18.64**	CENTRALES SATELITE
7.69	N/A	N/A	1	**100%**	**7.69**	CENTRAL DE ENFERMERIA
0.80	N/A	N/A	4	**100%**	**3.20**	PASILLO DESCANSO
2.10	N/A	N/A	3	**100%**	**6.30**	PASILLO DESCANSO
0.80	N/A	N/A	1	**100%**	**0.80**	DESCANSO
2.10	N/A	N/A	1	**100%**	**2.10**	DESCANSO
1.30	N/A	N/A	4	**100%**	**5.20**	DESCANSO
1.90	N/A	N/A	1	**100%**	**1.90**	DESCANSO
0.90	N/A	N/A	1	**100%**	**0.90**	DESCANSO
0.80	N/A	N/A	1	**100%**	**0.80**	PASILLODESCANSO
1.20	N/A	N/A	1	**100%**	**1.20**	PASILLODESCANSO
2.10	N/A	N/A	2	**100%**	**4.20**	PASILLODESCANSO
2.10	N/A	N/A	3	**100%**	**6.30**	PASILLO ACCESO ASISTENCIAL
0.90	N/A	N/A	1	**100%**	**0.90**	PASILLO ACCESO ASISTENCIAL
0.75	N/A	N/A	1	**100%**	**0.75**	PASILLO ACCESO ASISTENCIAL
0.80	N/A	N/A	1	**100%**	**0.80**	PASILLO ACCESO ASISTENCIAL
1.50	N/A	N/A	1	**100%**	**1.50**	ROPA LIMPIA
1.73	N/A	N/A	1	**100%**	**1.73**	ROPA SUCIA
2.10	N/A	N/A	4	**100%**	**8.40**	VESTIER
0.80	N/A	N/A	4	**100%**	**3.20**	VESTIER
0.70	N/A	N/A	1	**100%**	**0.70**	VESTIER
3.60	N/A	N/A	2	**100%**	**7.20**	VESTIER
2.10	N/A	N/A	2	**100%**	**4.20**	COORDINACION
1.80	N/A	N/A	1	**100%**	**1.80**	COORDINACION
4.30	N/A	N/A	2	**100%**	**8.60**	COORDINACION
2.50	N/A	N/A	3	**100%**	**7.50**	HALL
		PISO 3				
2.10	N/A	N/A	2	**100%**	**4.20**	
0.90	N/A	N/A	1	**100%**	**0.90**	
2.10	N/A	N/A	1	**100%**	**2.10**	
0.80	N/A	N/A	1	**100%**	**0.80**	
2.10	N/A	N/A	2	**100%**	**4.20**	
0.80	N/A	N/A	2	**100%**	**1.60**	
2.60	N/A	N/A	1	**100%**	**2.60**	
2.10	N/A	N/A	2	**100%**	**4.20**	
1.80	N/A	N/A	1	**100%**	**1.80**	
1.50	N/A	N/A	2	**100%**	**3.00**	
1.05	N/A	N/A	1	**100%**	**1.05**	
2.10	N/A	N/A	1	**100%**	**2.10**	
0.90	N/A	N/A	1	**100%**	**0.90**	
2.10	N/A	N/A	1	**100%**	**2.10**	
0.90	N/A	N/A	1	**100%**	**0.90**	
2.52	N/A	N/A	6	**100%**	**15.12**	
0.90	N/A	N/A	5	**100%**	**4.50**	
2.10	N/A	N/A	14	**100%**	**29.40**	
0.70	N/A	N/A	2	**100%**	**1.40**	
5.10	N/A	N/A	1	**100%**	**5.10**	
6.40	N/A	N/A	1	**100%**	**6.40**	LUDOTECA Y ZONA ADMINISTRATIVA
5.70	N/A	N/A	1	**100%**	**5.70**	
3.00	N/A	N/A	1	**100%**	**3.00**	
2.50	N/A	N/A	1	**100%**	**2.50**	
2.10	N/A	N/A	2	**100%**	**4.20**	
0.90	N/A	N/A	1	**100%**	**0.90**	
2.10	N/A	N/A	1	**100%**	**2.10**	
0.83	N/A	N/A	2	**100%**	**1.66**	
0.92	N/A	N/A	2	**100%**	**1.84**	
2.10	N/A	N/A	2	**100%**	**4.20**	
0.80	N/A	N/A	2	**100%**	**1.60**	
2.10	N/A	N/A	9	**100%**	**18.90**	
0.80	N/A	N/A	7	**100%**	**5.60**	
0.90	N/A	N/A	1	**100%**	**0.90**	
2.00	N/A	N/A	3	**100%**	**6.00**	
2.80	N/A	N/A	1	**100%**	**2.80**	
2.12	N/A	N/A	1	**100%**	**2.12**	
2.45	N/A	N/A	2	**100%**	**4.90**	
2.55	N/A	N/A	2	**100%**	**5.10**	
1.18	N/A	N/A	1	**100%**	**1.18**	
2.70	N/A	N/A	2	**100%**	**5.40**	UCI # 1
0.90	N/A	N/A	2	**100%**	**1.80**	UCI # 1
1.50	N/A	N/A	2	**100%**	**3.00**	UCI # 1
0.70	N/A	N/A	2	**100%**	**1.40**	UCI # 1
0.90	N/A	N/A	2	**100%**	**1.80**	UCI # 3
1.50	N/A	N/A	2	**100%**	**3.00**	UCI # 3
2.70	N/A	N/A	1	**100%**	**2.70**	UCI # 3
0.70	N/A	N/A	2	**100%**	**1.40**	UCI # 3
2.50	N/A	N/A	2	**100%**	**5.00**	UCI # 3
0.90	N/A	N/A	2	**100%**	**1.80**	UCI # 5
1.50	N/A	N/A	2	**100%**	**3.00**	UCI # 5
1.70	N/A	N/A	1	**100%**	**1.70**	UCI # 5
0.70	N/A	N/A	2	**100%**	**1.40**	UCI # 5
2.50	N/A	N/A	2	**100%**	**5.00**	UCI # 5
2.50	N/A	N/A	2	**100%**	**5.00**	UCI # 7
0.70	N/A	N/A	2	**100%**	**1.40**	UCI # 7
2.70	N/A	N/A	1	**100%**	**2.70**	UCI # 7
2.70	N/A	N/A	2	**100%**	**5.40**	UCI # 9
0.90	N/A	N/A	2	**100%**	**1.80**	UCI # 9
1.50	N/A	N/A	2	**100%**	**3.00**	UCI # 9
1.70	N/A	N/A	1	**100%**	**1.70**	UCI # 9
0.90	N/A	N/A	2	**100%**	**1.80**	UCI # 11
2.50	N/A	N/A	2	**100%**	**5.00**	UCI # 11
0.70	N/A	N/A	2	**100%**	**1.40**	UCI # 11
1.70	N/A	N/A	1	**100%**	**1.70**	UCI # 11
2.10	N/A	N/A	2	**100%**	**4.20**	UCI # 12
0.90	N/A	N/A	1	**100%**	**0.90**	UCI # 12
1.00	N/A	N/A	4	**100%**	**4.00**	UCI # 12
1.70	N/A	N/A	1	**100%**	**1.70**	UCI # 12
0.90	N/A	N/A	2	**100%**	**1.80**	UCI # 12
1.50	N/A	N/A	2	**100%**	**3.00**	UCI # 12
2.50	N/A	N/A	2	**100%**	**5.00**	UCI # 10
0.70	N/A	N/A	2	**100%**	**1.40**	UCI # 10
1.70	N/A	N/A	1	**100%**	**1.70**	UCI # 10
3.05	N/A	N/A	2	**100%**	**6.10**	UCI # 8
0.70	N/A	N/A	2	**100%**	**1.40**	UCI # 8
1.50	N/A	N/A	2	**100%**	**3.00**	UCI # 8
0.90	N/A	N/A	2	**100%**	**1.80**	UCI # 8
1.65	N/A	N/A	1	**100%**	**1.65**	UCI # 8
3.00	N/A	N/A	2	**100%**	**6.00**	UCI # 6
0.70	N/A	N/A	2	**100%**	**1.40**	UCI # 6
2.70	N/A	N/A	1	**100%**	**2.70**	UCI # 6
3.00	N/A	N/A	2	**100%**	**6.00**	UCI # 4
0.70	N/A	N/A	2	**100%**	**1.40**	UCI # 4
2.70	N/A	N/A	2	**100%**	**5.40**	UCI # 2
3.00	N/A	N/A	2	**100%**	**6.00**	UCI # 2
0.70	N/A	N/A	2	**100%**	**1.40**	UCI # 2
2.10	N/A	N/A	2	**100%**	**4.20**	CIRCULACION
0.80	N/A	N/A	2	**100%**	**1.60**	CIRCULACION
2.70	N/A	N/A	1	**100%**	**2.70**	CIRCULACION
		PISO 4				
2.30	N/A	N/A	3	**100%**	**6.90**	HABITACION 425
0.90	N/A	N/A	1	**100%**	**0.90**	HABITACION 425
1.96	N/A	N/A	4	**100%**	**7.84**	HABITACION 425
1.20	N/A	N/A	1	**100%**	**1.20**	HABITACION 425
0.77	N/A	N/A	1	**100%**	**0.77**	HABITACION 425
2.30	N/A	N/A	5	**100%**	**11.50**	HABITACION 424
0.90	N/A	N/A	1	**100%**	**0.90**	HABITACION 424
1.96	N/A	N/A	4	**100%**	**7.84**	HABITACION 424
1.20	N/A	N/A	1	**100%**	**1.20**	HABITACION 424
0.77	N/A	N/A	1	**100%**	**0.77**	HABITACION 424
2.30	N/A	N/A	3	**100%**	**6.90**	HABITACION 423
0.90	N/A	N/A	1	**100%**	**0.90**	HABITACION 423
1.96	N/A	N/A	4	**100%**	**7.84**	HABITACION 423







1.20	N/A	N/A	1	**100%**	**1.20**	HABITACION 423
0.77	N/A	N/A	1	**100%**	**0.77**	HABITACION 423
2.30	N/A	N/A	5	**100%**	**11.50**	HABITACION 422
0.90	N/A	N/A	1	**100%**	**0.90**	HABITACION 422
1.96	N/A	N/A	2	**100%**	**3.92**	HABITACION 422
1.20	N/A	N/A	1	**100%**	**1.20**	HABITACION 422
0.77	N/A	N/A	1	**100%**	**0.77**	HABITACION 422
2.30	N/A	N/A	3	**100%**	**6.90**	HABITACION 421
0.90	N/A	N/A	1	**100%**	**0.90**	HABITACION 421
1.96	N/A	N/A	3	**100%**	**5.88**	HABITACION 421
1.20	N/A	N/A	1	**100%**	**1.20**	HABITACION 421
0.77	N/A	N/A	1	**100%**	**0.77**	HABITACION 421
2.30	N/A	N/A	3	**100%**	**6.90**	HABITACION 420
0.90	N/A	N/A	1	**100%**	**0.90**	HABITACION 420
1.96	N/A	N/A	4	**100%**	**7.84**	HABITACION 420
1.20	N/A	N/A	1	**100%**	**1.20**	HABITACION 420
0.77	N/A	N/A	1	**100%**	**0.77**	HABITACION 420
2.30	N/A	N/A	3	**100%**	**6.90**	HABITACION 419
0.90	N/A	N/A	1	**100%**	**0.90**	HABITACION 419
1.96	N/A	N/A	2	**100%**	**3.92**	HABITACION 419
1.20	N/A	N/A	1	**100%**	**1.20**	HABITACION 419
0.77	N/A	N/A	1	**100%**	**0.77**	HABITACION 419
2.30	N/A	N/A	1	**100%**	**2.30**	HABITACION 418
0.90	N/A	N/A	1	**100%**	**0.90**	HABITACION 418
1.96	N/A	N/A	6	**100%**	**11.76**	HABITACION 418
1.20	N/A	N/A	1	**100%**	**1.20**	HABITACION 418
0.76	N/A	N/A	1	**100%**	**0.76**	HABITACION 418
2.30	N/A	N/A	3	**100%**	**6.90**	HABITACION 417
0.90	N/A	N/A	1	**100%**	**0.90**	HABITACION 417
1.96	N/A	N/A	3	**100%**	**5.88**	HABITACION 417
1.20	N/A	N/A	1	**100%**	**1.20**	HABITACION 417
0.77	N/A	N/A	1	**100%**	**0.77**	HABITACION 417
2.30	N/A	N/A	3	**100%**	**6.90**	HABITACION 416
0.90	N/A	N/A	1	**100%**	**0.90**	HABITACION 416
1.96	N/A	N/A	4	**100%**	**7.84**	HABITACION 416
1.20	N/A	N/A	1	**100%**	**1.20**	HABITACION 416
0.77	N/A	N/A	1	**100%**	**0.77**	HABITACION 416
2.30	N/A	N/A	3	**100%**	**6.90**	HABITACION 415
0.90	N/A	N/A	1	**100%**	**0.90**	HABITACION 415
1.96	N/A	N/A	3	**100%**	**5.88**	HABITACION 415
1.20	N/A	N/A	1	**100%**	**1.20**	HABITACION 415
0.77	N/A	N/A	1	**100%**	**0.77**	HABITACION 415
2.30	N/A	N/A	3	**100%**	**6.90**	HABITACION 414
0.90	N/A	N/A	1	**100%**	**0.90**	HABITACION 414
1.96	N/A	N/A	3	**100%**	**5.88**	HABITACION 414
1.20	N/A	N/A	1	**100%**	**1.20**	HABITACION 414
0.77	N/A	N/A	1	**100%**	**0.77**	HABITACION 414
2.30	N/A	N/A	1	**100%**	**2.30**	HABITACION 413
0.90	N/A	N/A	1	**100%**	**0.90**	HABITACION 413
1.96	N/A	N/A	3	**100%**	**5.88**	HABITACION 413
1.20	N/A	N/A	1	**100%**	**1.20**	HABITACION 413
0.77	N/A	N/A	1	**100%**	**0.77**	HABITACION 413
2.30	N/A	N/A	3	**100%**	**6.90**	HABITACION 412
0.90	N/A	N/A	1	**100%**	**0.90**	HABITACION 412
1.96	N/A	N/A	4	**100%**	**7.84**	HABITACION 412
1.20	N/A	N/A	1	**100%**	**1.20**	HABITACION 412
0.76	N/A	N/A	2	**100%**	**1.52**	HABITACION 412
2.30	N/A	N/A	3	**100%**	**6.90**	HABITACION 411
0.90	N/A	N/A	1	**100%**	**0.90**	HABITACION 411
1.96	N/A	N/A	4	**100%**	**7.84**	HABITACION 411
1.20	N/A	N/A	1	**100%**	**1.20**	HABITACION 411
0.77	N/A	N/A	2	**100%**	**1.54**	HABITACION 411
2.30	N/A	N/A	3	**100%**	**6.90**	HABITACION 410
0.90	N/A	N/A	1	**100%**	**0.90**	HABITACION 410
1.96	N/A	N/A	4	**100%**	**7.84**	HABITACION 410
1.20	N/A	N/A	1	**100%**	**1.20**	HABITACION 410
0.77	N/A	N/A	2	**100%**	**1.54**	HABITACION 410
2.30	N/A	N/A	3	**100%**	**6.90**	HABITACION 409
0.90	N/A	N/A	1	**100%**	**0.90**	HABITACION 409
1.96	N/A	N/A	4	**100%**	**7.84**	HABITACION 409
1.20	N/A	N/A	1	**100%**	**1.20**	HABITACION 409
0.77	N/A	N/A	2	**100%**	**1.54**	HABITACION 409
2.30	N/A	N/A	3	**100%**	**6.90**	HABITACION 408
0.90	N/A	N/A	1	**100%**	**0.90**	HABITACION 408
1.96	N/A	N/A	4	**100%**	**7.84**	HABITACION 408
1.20	N/A	N/A	1	**100%**	**1.20**	HABITACION 408
0.77	N/A	N/A	2	**100%**	**1.54**	HABITACION 408
2.30	N/A	N/A	1	**100%**	**2.30**	HABITACION 407
0.90	N/A	N/A	1	**100%**	**0.90**	HABITACION 407
1.96	N/A	N/A	4	**100%**	**7.84**	HABITACION 407
1.20	N/A	N/A	1	**100%**	**1.20**	HABITACION 407
0.77	N/A	N/A	2	**100%**	**1.54**	HABITACION 407
2.30	N/A	N/A	3	**100%**	**6.90**	HABITACION 406
0.90	N/A	N/A	1	**100%**	**0.90**	HABITACION 406
1.96	N/A	N/A	4	**100%**	**7.84**	HABITACION 406
1.20	N/A	N/A	1	**100%**	**1.20**	HABITACION 406
0.77	N/A	N/A	2	**100%**	**1.54**	HABITACION 406
2.30	N/A	N/A	5	**100%**	**11.50**	HABITACION 405
0.90	N/A	N/A	1	**100%**	**0.90**	HABITACION 405
1.96	N/A	N/A	3	**100%**	**5.88**	HABITACION 405
1.20	N/A	N/A	1	**100%**	**1.20**	HABITACION 405
0.77	N/A	N/A	2	**100%**	**1.54**	HABITACION 405
2.30	N/A	N/A	2	**100%**	**4.60**	HABITACION 404
0.90	N/A	N/A	1	**100%**	**0.90**	HABITACION 404
1.96	N/A	N/A	4	**100%**	**7.84**	HABITACION 404
1.20	N/A	N/A	1	**100%**	**1.20**	HABITACION 404
0.77	N/A	N/A	2	**100%**	**1.54**	HABITACION 404
2.30	N/A	N/A	11	**100%**	**25.30**	HABITACION 403
0.90	N/A	N/A	1	**100%**	**0.90**	HABITACION 403
1.96	N/A	N/A	3	**100%**	**5.88**	HABITACION 403
1.20	N/A	N/A	1	**100%**	**1.20**	HABITACION 403
0.77	N/A	N/A	2	**100%**	**1.54**	HABITACION 403
2.30	N/A	N/A	3	**100%**	**6.90**	HABITACION 402
0.90	N/A	N/A	1	**100%**	**0.90**	HABITACION 402
1.96	N/A	N/A	3	**100%**	**5.88**	HABITACION 402
1.20	N/A	N/A	1	**100%**	**1.20**	HABITACION 402
0.77	N/A	N/A	2	**100%**	**1.54**	HABITACION 402
2.30	N/A	N/A	3	**100%**	**6.90**	HABITACION 401
0.90	N/A	N/A	1	**100%**	**0.90**	HABITACION 401
1.96	N/A	N/A	4	**100%**	**7.84**	HABITACION 401
1.20	N/A	N/A	1	**100%**	**1.20**	HABITACION 401
0.77	N/A	N/A	2	**100%**	**1.54**	HABITACION 401
7.64	N/A	N/A	1	**100%**	**7.64**	CENTRAL DE ENFERMETRIA
1.96	N/A	N/A	1	**100%**	**1.96**	TRABAJO LIMPIO
0.90	N/A	N/A	1	**100%**	**0.90**	TRABAJO LIMPIO
0.80	N/A	N/A	1	**100%**	**0.80**	TRABAJO SUCIO
1.96	N/A	N/A	1	**100%**	**1.96**	TRABAJO SUCIO
1.96	N/A	N/A	1	**100%**	**1.96**	PROCEDIMIENTO
1.40	N/A	N/A	1	**100%**	**1.40**	PROCEDIMIENTO
2.40	N/A	N/A	4	**100%**	**9.60**	PROCEDIMIENTO
0.80	N/A	N/A	1	**100%**	**0.80**	CUARTO DE ASEO
0.96	N/A	N/A	1	**100%**	**0.96**	CUARTO DE ASEO
2.40	N/A	N/A	2	**100%**	**4.80**	DESCANSO VESTIER
1.96	N/A	N/A	4	**100%**	**7.84**	DESCANSO VESTIER
1.90	N/A	N/A	2	**100%**	**3.80**	DESCANSO VESTIER
2.40	N/A	N/A	9	**100%**	**21.60**	CIRCULACION RESTRINGIDA
1.96	N/A	N/A	2	**100%**	**3.92**	CIRCULACION RESTRINGIDA
1.30	N/A	N/A	1	**100%**	**1.30**	CIRCULACION RESTRINGIDA
2.40	N/A	N/A	1	**100%**	**2.40**	RESIDUOS ORDINARIOS
1.96	N/A	N/A	1	**100%**	**1.96**	RESIDUOS ORDINARIOS
0.80	N/A	N/A	1	**100%**	**0.80**	RESIDUOS ORDINARIOS
1.96	N/A	N/A	1	**100%**	**1.96**	RESIDUOS PELIGROSO
1.96	N/A	N/A	4	**100%**	**7.84**	BAÑOS
0.86	N/A	N/A	2	**100%**	**1.72**	BAÑOS
0.93	N/A	N/A	1	**100%**	**0.93**	BAÑOS
1.96	N/A	N/A	1	**100%**	**1.96**	COORDINACION
2.63	N/A	N/A	1	**100%**	**2.63**	COORDINACION
1.05	N/A	N/A	1	**100%**	**1.05**	COORDINACION



2.74	N/A	N/A	1	**100%**	**2.74**	COORDINACION
2.40	N/A	N/A	3	**100%**	**7.20**	COORDINACION
4.79	N/A	N/A	1	**100%**	**4.79**	COORDINACION
0.78	N/A	N/A	2	**100%**	**1.56**	COORDINACION
6.75	N/A	N/A	3	**100%**	**20.25**	SALA DE ESPERA
3.43	N/A	N/A	3	**100%**	**10.29**	SALA DE ESPERA
2.40	N/A	N/A	5	**100%**	**12.00**	SALA DE ESPERA
5.50	N/A	N/A	1	**100%**	**5.50**	SALA DE ESPERA

OBSERVACIONES:

TOTAL	**3,325.37**	**Metro lineal**
ACUMULADO ANTERIOR	**3,302.26**	**Metro lineal**
PRESENTE ACTA	**23.11**	**Metro lineal**

Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	1.05	PINTURA ANTIBACTERIAL PARA MUROS	CAP	1.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA	UNIDAD	Metro Cuadrado	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico







Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
SOTANO						
19.00	2.54	N/A	1	33%	15.93	LAVANDERIA
1.50	2.10	N/A	-1	33%	-1.04	DESCUENTO PUERTA EN LAVANDERIA
27.90	2.70	N/A	1	33%	24.86	PARQUEADERO SOTANO
23.15	2.80	N/A	1	33%	21.39	PARQUEADERO SOTANO
1.00	2.10	N/A	-5	33%	-3.47	DESUENTO PUERTA AREA PARQUEADERO
1.50	2.10	N/A	-1	33%	-1.04	DESUENTO PUERTA AREA PARQUEADERO
0.70	2.10	N/A	-1	33%	-0.49	DESUENTO PUERTA AREA PARQUEADERO
0.40	2.00	N/A	-1	33%	-0.26	DESCUENTO VENTANA AREA DE PARQUEADERO
1.20	2.10	N/A	-5	33%	-4.16	DESUENTO PUERTA AREA PARQUEADERO
1.00	1.10	N/A	-1	33%	-0.36	DESCUENTO VENTANA AREA DE PARQUEADERO
14.00	2.45	N/A	1	33%	11.32	CONSULTORIO DE DIETAS
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO PUERTA CONSULTORIO DE DIETAS
16.66	2.45	N/A	1	33%	13.47	ROPA LIMPIA
1.40	2.10	N/A	-1	33%	-0.97	DESCUENTO PUERTA ROPA LIMPIA
9.38	2.50	N/A	1	33%	7.74	ROPA SUCIA
0.70	2.10	N/A	-1	33%	-0.49	DESCUENTO PUERTA ROPA SUCIA
48.88	2.55	N/A	1	33%	41.13	BODEGA FARMACIA
0.40	2.00	N/A	-1	33%	-0.26	DESCUENTO VENTANA BODEGA FARMACIA
0.80	2.10	N/A	-2	33%	-1.11	DESCUENTO DE PUERTA BODEGA FARMACIA
1.21	2.10	N/A	-1	33%	-0.84	DESCUENTO DE PUERTA BODEGA FARMACIA
38.10	2.52	N/A	1	33%	31.68	ARCHIVO
1.21	2.10	N/A	-1	33%	-0.84	DESCUENTO DE PUERTA ARCHIVO
0.40	1.20	N/A	-1	33%	-0.16	DESCUENTO VENTANA BODEGA FARMACIA
0.40	2.00	N/A	-1	33%	-0.26	DESCUENTO VENTANA BODEGA FARMACIA
20.21	2.45	N/A	1	33%	16.34	CIRCULACION DE ARCHIVO A DESPACHO DE DIETAS
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO PUERTA EN CICULACION
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO PUERTA EN CICULACION
1.40	2.10	N/A	-1	33%	-0.97	DESCUENTO PUERTA EN CICULACION
15.10	2.53	N/A	1	33%	12.61	CIRCULACION DE ROPA SUCIA A DEPOSITO DE CADAVERES
1.32	2.10	N/A	-1	33%	-0.91	DESCUENTO PUERTA EN CICULACION
0.70	2.10	N/A	-1	33%	-0.49	DESCUENTO PUERTA EN CICULACION
1.40	2.10	N/A	-1	33%	-0.97	DESCUENTO PUERTA EN CICULACION
14.82	2.50	N/A	1	33%	12.23	DEP. CADAVERES
1.40	2.10	N/A	-1	33%	-0.97	DESCUENTO PIUERTA EN DEP DE CADAVERES
11.21	2.40	N/A	1	33%	8.88	CIRCULACION ENTRE ROPA LIMPIA A PARQUEADERO
2.20	2.20	N/A	1	33%	1.60	CIRCULACION ENTRE ROPA LIMPIA A PARQUEADERO
1.40	1.50	N/A	1	33%	0.69	CIRCULACION ENTRE ROPA LIMPIA A PARQUEADERO
1.40	2.10	N/A	-1	33%	-0.97	DESCUENTO PUERTA EN CIRCULACION
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO PUERTA EN CIRCULACION
0.55	1.00	N/A	-1	33%	-0.18	DESCUENTO VENTANA EN CICULACION
14.06	2.50	N/A	1	33%	11.60	CIRCULACION SALA DE STAR
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO PUERTA EN CIRCULACION
0.70	2.10	N/A	-1	33%	-0.49	DESCUENTO PUERTA EN CIRCULACION
1.40	2.10	N/A	-1	33%	-0.97	DESCUENTO PUERTA EN CIRCULACION
0.33	0.73	N/A	-1	33%	-0.08	DESCUENTO VENTANA EN CIRCULACION
17.25	2.52	N/A	1	33%	14.35	DEPOSITO ALMACEN
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO PUERTA EN DEPOSITO ALMACEN
0.55	1.00	N/A	-1	33%	-0.18	DESCUENTO VENTANA EN DEPOSITO ALMACEN
2.00	0.40	N/A	-1	33%	-0.26	DESCUENTO VENTANA EN DEPOSITO ALMACEN
14.25	2.70	N/A	1	33%	12.70	ASEO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	-0.83	DESCUENTO PUERTA
0.40	0.67	N/A	-1	33%	-0.09	DESCUENTO VENTANA
PISO 1						
17.53	2.60	N/A	1	66%	30.08	LOBORATORIO
2.93	1.10	N/A	1	66%	2.13	MURO INTERMEDIO -LABORATORIO
0.97	2.09	N/A	1	66%	1.34	MURO INERMEDIO LAVA OJOS
4.64	2.60	N/A	1	66%	7.96	CUARTO LABORATORIO
0.80	2.10	N/A	-3	66%	-3.33	DESCUENTO PUERTA
1.30	1.30	N/A	-4	66%	-4.46	DESCUENTO VENTANA
10.24	0.99	N/A	1	66%	6.69	LABARORATORIO INYECTOLOGIA
2.74	1.20	N/A	1	66%	2.17	LABARORATORIO INYECTOLOGIA
1.64	1.12	N/A	1	66%	1.21	LABARORATORIO INYECTOLOGIA
30.76	2.50	N/A	1	66%	50.75	LABORATO IYECTOLOGIA
0.97	2.10	N/A	-1	66%	-1.34	DESCUENTO PUERTA
0.90	2.10	N/A	-1	66%	-1.25	DESCUENTA PUERTA
0.94	1.10	N/A	-1	66%	-0.68	DESCUENTA VENTANA
0.71	2.10	N/A	-1	66%	-0.98	DESCUENTA PUERTA
1.30	0.65	N/A	-1	66%	-0.56	DESCUENTA VENTANA
3.60	2.50	N/A	1	66%	5.94	CUARO RESIDUOS RESICLABLES ORDINARIOS
0.79	2.10	N/A	-1	66%	-1.09	DESCUENTO PUERTA
0.49	1.30	N/A	-1	66%	-0.42	DESCUENTO VENTANA
0.86	0.86	N/A	-1	66%	-0.49	DESCUENTO VENTANA
3.91	2.60	N/A	1	66%	6.71	CUARTO NEVERA
0.99	2.10	N/A	-1	66%	-1.37	DESCUENTO PUERTA
10.92	2.60	N/A	1	66%	18.74	CUARTO TRANFUCIONAL
0.97	2.10	N/A	-1	66%	-1.34	DESCUENTO DE PUERTA
0.94	1.10	N/A	-1	66%	-0.68	DESCUENTO DE VENTANA
0.95	1.00	N/A	-1	66%	-0.63	DESCUENTO DE VENTANA
5.46	2.60	N/A	1	66%	9.37	CUARTO NEVERA MURO
3.71	2.60	N/A	1	66%	6.37	HALL CIRCULACION
1.21	0.61	N/A	1	66%	0.49	CIRCULACION HALL
4.06	2.60	N/A	1	66%	6.97	MURO HALL ENTRADA LABORATORIO
3.70	2.60	N/A	1	66%	6.35	MURO TOMA DE MUESTRAS
2.86	2.60	N/A	1	66%	4.91	MURO TOMA DE MUESTRAS
2.82	2.60	N/A	1	66%	4.84	MURO TOMA DE MUESTRAS
1.64	2.60	N/A	1	66%	2.81	TOMA DE MUESTRAS
3.64	2.60	N/A	1	66%	6.25	TOMA DE MUESTRAS GINECOLOGICAS
1.47	2.60	N/A	1	66%	2.52	TOMA DE MUESTRAS GINECOLOGICAS
1.67	2.60	N/A	1	66%	2.87	TOMA DE MUESTRAS GINECOLOGICAS
0.80	2.10	N/A	-1	66%	-1.11	DESCUENTO DE PUERTA GINECOLOGICA
2.06	2.60	N/A	1	66%	3.53	TOMA DE MUESTRA GINECOLOGICA
2.06	2.60	N/A	1	66%	3.53	TOMA DE MUESTRA GINECOLOGICA
1.30	1.30	N/A	-1	66%	-1.12	DESCUENTO VENTANA
3.91	2.60	N/A	1	66%	6.71	ENTREGA DE MUESTRAS
8.29	2.60	N/A	1	66%	14.23	MURO FRENTE A FARMACIA
0.99	0.65	N/A	-1	66%	-0.42	DESCUENTO VENTANA
0.80	2.10	N/A	-1	66%	-1.11	DESCUENTO PUERTA
6.81	2.60	N/A	1	66%	11.69	MURO EXTERIOR FARMACIA
0.99	3.00	N/A	-1	66%	-1.96	DESCUENTO VENTANA
4.25	2.53	N/A	1	66%	7.10	MURO INTERNO FARMACIA
0.99	3.00	N/A	-1	66%	-1.96	DESCUENTO
2.92	2.53	N/A	1	66%	4.88	MURO INTERNO FARMACIA
4.55	2.53	N/A	1	66%	7.60	MURO INTERNO FARMACIA
0.83	1.05	N/A	1	66%	0.58	MURO INTERNO FARMACIA
0.94	2.53	N/A	1	66%	1.57	MURO ENTREGA FARMACIA
3.46	2.60	N/A	1	66%	5.94	AREA ENTREGA DE FARNACIA
3.77	2.60	N/A	1	66%	6.47	AREA ENTREGA DE FARMACIA
0.50	0.64	N/A	-1	66%	-0.21	DESCUENTA VENTANA
7.94	2.60	N/A	1	66%	13.63	AREA ADMINISTRATIVA FARMACIA
0.80	2.10	N/A	-1	66%	-1.11	DESCUENTO PUERTA
0.70	2.10	N/A	-1	66%	-0.97	DESCUENTO PUERTA
0.50	0.65	N/A	-1	66%	-0.21	DESCUENTO VENTANA
3.88	2.60	N/A	1	33%	3.33	MURO CIRCULACION A FARMACIA
1.36	2.60	N/A	1	33%	1.17	MURO HALL AL LADO DE ADMICIONES
1.10	2.10	N/A	-1	33%	-0.76	DESCUENTO DE PUERTA
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO DE PUERTA
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO DE PUERTA
1.29	2.10	N/A	-1	33%	-0.89	DESCUENTO DE PUERTA
1.20	2.10	N/A	-1	33%	-0.83	DESCUENTO DE PUERTA
8.82	2.60	N/A	1	33%	7.57	PROCEDIMIENTOS
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO PUERTA
1.10	2.10	N/A	-1	33%	-0.76	DESCUENTO PUERTA
0.40	1.00	N/A	-1	33%	-0.13	DESCUENTO VENTANA
7.96	2.60	N/A	1	33%	6.83	SALA DE IGEMATOLOGIA
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO DE PUERTA
17.49	2.60	N/A	1	33%	15.01	ADMICIONES
1.20	2.10	N/A	-1	33%	-0.83	DESCUENTO PUERTA
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO PUERTA
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO PUERTA











1.29	2.10	N/A	-1	33%	**-0.89**	DESCUENTO PUERTA
14.80	2.60	N/A	1	33%	**12.70**	PROCEDIMIENTOS
0.80	2.10	N/A	-1	33%	**-0.55**	DESCUENTO PUERTA
1.10	2.10	N/A	-1	33%	**-0.76**	DESCUENTO PUERTA
0.90	1.30	N/A	-1	33%	**-0.39**	DESCUENTO VENTANA
1.30	1.30	N/A	-1	33%	**-0.56**	DESCUENTO VENTANA
6.16	2.60	N/A	1	33%	**5.29**	TRABAJO SUCIO
0.80	2.10	N/A	-1	33%	**-0.55**	DESCUENTO PUERTA
12.67	2.60	N/A	1	33%	**10.87**	COLSULTORIO DE CARDILOGO
14.25	2.60	N/A	1	33%	**12.23**	MUROS CIRCULACION
0.90	2.10	N/A	-1	33%	**-0.62**	DESCUENTO PUERTA
2.30	2.10	N/A	-1	33%	**-1.59**	DESCUENTO PUERTA
1.34	1.99	N/A	-1	33%	**-0.88**	DESCUENTO ACENSOR
9.10	2.60	N/A	1	33%	**7.81**	OFICINA RADIOLOGIA
0.90	2.10	N/A	-1	33%	**-0.62**	DESCUENTO PUERTA
0.80	2.10	N/A	-1	33%	**-0.55**	DESCUENTO PUERTA
0.85	1.20	N/A	-1	33%	**-0.34**	DESCUENTO VENTANA
7.07	2.60	N/A	1	33%	**6.07**	INSUMOS
0.80	2.10	N/A	-1	33%	**-0.55**	INSUMOS
10.03	2.60	N/A	1	33%	**8.61**	SALA DE ESPERA
1.10	2.10	N/A	-2	33%	**-1.52**	DESCANSO DE PUERTA
1.00	0.40	N/A	-1	33%	**-0.13**	DESCANSO DE VENTANA
21.59	2.60	N/A	1	33%	**18.52**	SERVICIO DE IMAGEONOLOGIA
1.10	2.10	N/A	-1	33%	**-0.76**	SERVICIO DE IMAGEONOLOGIA
1.30	1.30	N/A	-1	33%	**-0.56**	SERVICIO DE IMAGEONOLOGIA
1.20	2.10	N/A	-1	33%	**-0.83**	SERVICIO DE IMAGEONOLOGIA
16.04	2.60	N/A	1	33%	**13.76**	CONSULTORIO DISPONIBLE PARA ECOGRAFO
0.90	1.30	N/A	-1	33%	**-0.39**	DESCUENTO
1.10	2.10	N/A	-1	33%	**-0.76**	DESCUENTO
0.80	2.10	N/A	-1	33%	**-0.55**	DESCUENTO
30.52	2.42	N/A	1	33%	**24.37**	HALL DE CIRCULACION
10.38	2.10	N/A	-1	33%	**-7.19**	DESCUENTO DE PUERTAS
1.00	1.10	N/A	-1	33%	**-0.36**	DESCUENTO VENTANA
32.20	2.42	N/A	1	33%	**25.71**	HALL CIRCULACION
11.47	2.10	N/A	-1	33%	**-7.95**	DESCUENTO PUERTAS
1.00	1.00	N/A	-4	33%	**-1.32**	DESCUENTO VENTANAS
1.00	1.40	N/A	-1	33%	**-0.46**	DESCUENTO VENTANAS
17.34	2.54	N/A	1	33%	**14.53**	COLSULTORIO 3
1.20	2.10	N/A	-1	33%	**-0.83**	DESCUENTO PUERTA
1.80	2.54	N/A	-1	33%	**-1.51**	DESCUENTO PUERTA
16.71	2.10	N/A	1	33%	**11.58**	CONSULTORIO 4
1.20	2.10	N/A	-1	33%	**-0.83**	DESCUENTO PUERTA
1.00	1.00	N/A	-1	33%	**-0.33**	DESCUENTA VENTANA
0.80	2.10	N/A	-1	33%	**-0.55**	DESCUENTO PUERTA
11.18	2.42	N/A	1	33%	**8.93**	MONITEREO GINECOSTRETICO
1.73	2.10	N/A	-2	33%	**-2.40**	DESCUENTO PUERTA
18.96	2.60	N/A	1	100%	**49.30**	AUDITORIO
1.30	2.10	N/A	-1	100%	**-2.73**	DESCUENTO PUERTA
14.14	2.70	N/A	1	100%	**38.18**	CIRCULACION SALA DE ESPERA HALL
0.40	0.80	N/A	-1	100%	**-0.32**	DESCUENTO VENTANA
2.00	0.40	N/A	-1	100%	**-0.80**	DESCUENTO VENTANA
2.00	0.40	N/A	-1	100%	**-0.80**	DESCUENTO VENTANA
1.00	2.10	N/A	-1	100%	**-2.10**	DESCUENTO VENTANA
8.95	2.70	N/A	1	33%	**7.97**	CIRCULACION HALL
0.40	0.80	N/A	-1	33%	**-0.11**	CIRCULACION SALA DE ESPERA HALL
1.98	2.70	N/A	2	33%	**3.53**	MURO
1.70	1.10	N/A	-2	33%	**-1.23**	DESCUENTO PUERTA
3.00	2.70	N/A	1	33%	**2.67**	BÑO DISCAPACITADOS Y PRIMER PISO
0.80	2.10	N/A	-1	33%	**-0.55**	DESCUENTO PUERTA
0.90	2.10	N/A	-1	33%	**-0.62**	DESCUENTO PUERTA
1.34	2.70	N/A	1	33%	**1.19**	BAÑO MUJERES
18.59	2.70	N/A	1	33%	**16.56**	CUARTO PERSONAL ASISTENCIAL
1.00	2.10	N/A	-1	33%	**-0.69**	DESCUENTO PERTA
0.80	0.40	N/A	-1	33%	**-0.11**	DESCUENTO VENTANA
2.00	0.40	N/A	-1	33%	**-0.26**	DESCUENTO VENTANA
4.65	2.70	N/A	1	33%	**4.14**	AUTORIZACIONES
1.00	1.00	N/A	-1	33%	**-0.33**	DESCUENTO DE VENTANA
4.41	2.70	N/A	1	33%	**3.93**	HALL PRINCIPAL
10.00	2.30	N/A	1	100%	**23.00**	COCINETA
1.00	1.90	N/A	1	100%	**1.90**	DESCUENTO PUERTA
21.86	2.30	N/A	1	100%	**50.28**	COCINETA INTERNA
0.80	2.10	N/A	-1	100%	**-1.68**	DESCUENTO BAÑOS
-1.00	2.10	N/A	-1	100%	**2.10**	DESCUENTO PUERTA
11.37	2.55	N/A	1	100%	**28.99**	CAFETERIA
0.90	2.10	N/A	-2	100%	**-3.78**	DESCUENTO PUERTA
1.30	2.10	N/A	-1	100%	**-2.73**	DESCUENTO PUERTA
10.26	2.38	N/A	1	33%	**8.06**	MAMOGRAFO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	**-0.83**	DESCUENTO PUERTA
0.80	2.10	N/A	-1	33%	**-0.55**	DESCUENTO PUERTA
5.11	2.38	N/A	1	33%	**4.01**	VESTIER CONTINUO A MANOGRAFO
0.80	2.10	N/A	-1	33%	**-0.55**	DESCUENTO PUERTA
0.80	2.10	N/A	-1	33%	**-0.55**	DESCUENTO PUERTA
5.43	2.48	N/A	1	33%	**4.44**	CIRCULACION CENTRAL DE EMFERMERIA
6.71	2.48	N/A	1	33%	**5.49**	CIRCULACION CENTRAL DE EMFERMERIA
1.70	2.10	N/A	-1	33%	**-1.18**	DESCUENTO PUERTA TAC
0.89	2.10	N/A	-1	33%	**-0.62**	DESCUENTO PUERTA TAC
0.89	2.10	N/A	-1	33%	**-0.62**	DESCUENTO PUERTA ASEO
2.00	2.40	N/A	2	33%	**3.17**	PUERTA ENTRE CENTRAL DE EMFERMERIA Y TAC
2.00	1.98	N/A	-2	33%	**-2.61**	DESCUENTO PUERTA
18.52	2.37	N/A	1	33%	**14.48**	TAC
0.80	2.10	N/A	-1	33%	**-0.55**	DESCUENTO PUERTA
0.70	2.10	N/A	-1	33%	**-0.49**	DESCUENTO PUERTA
0.60	0.90	N/A	-1	33%	**-0.18**	DESCUENTO VENTANA
6.94	2.37	N/A	1	33%	**5.43**	CUARTO DISPARO
0.60	0.90	N/A	-1	33%	**-0.18**	DESCUENTO PUERTA
0.90	2.10	N/A	-1	33%	**-0.62**	DESCUENTO VENTANA
4.58	2.45	N/A	1	33%	**3.70**	OBSERVACION GINECOSTETRICA
0.80	2.10	N/A	-1	33%	**-0.55**	DESCUENTO PUERTA T LIMPIO
0.80	2.10	N/A	-1	33%	**-0.55**	DESCUENTO PUERTA T SUCIO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	**-0.62**	DESCUENTO PUERTA T SUCIO
31.39	2.45	N/A	1	33%	**25.38**	OBSERVACION PEDIATRA
0.90	2.10	N/A	-2	33%	**-1.25**	DESCUENTO PUERTA
6.67	0.80	N/A	2	33%	**3.52**	CENTRAL DE EMFERMERIA
4.82	2.52	N/A	1	33%	**4.01**	RESIDUOS ORDINARIOS
0.80	2.10	N/A	-1	33%	**-0.55**	DESCUENTO PUERTA
4.27	2.52	N/A	1	33%	**3.55**	RESIDUOS PELIGROSOS
0.80	2.10	N/A	-1	33%	**-0.55**	DESCUENTO
11.48	2.32	N/A	1	33%	**8.79**	DIR URGENSIAS
1.00	1.00	N/A	-1	33%	**-0.33**	DESCUENTO VENTANA
0.80	2.10	N/A	-1	33%	**-0.55**	DESCUENTO PUERTA
10.61	2.43	N/A	1	33%	**8.51**	PROCEDIMIENTOS ASEPTICOS
1.65	2.10	N/A	-1	33%	**-1.14**	DESCUENTO PUERTA
12.13	2.40	N/A	1	33%	**9.61**	SALA DE YESOS
0.94	1.00	N/A	-1	33%	**-0.31**	DESCUENTO VENTANA
1.70	2.10	N/A	-1	33%	**-1.18**	DESCUENTO PUERTA
15.60	2.53	N/A	1	33%	**13.02**	DIGITACION
0.90	2.10	N/A	-1	33%	**-0.62**	DESCUENTO PUERTA
1.29	1.00	N/A	-1	33%	**-0.43**	DESCUENTO VENTANA
0.80	2.10	N/A	-1	33%	**-0.55**	DESCUENTO PUERTA
14.90	2.50	N/A	1	33%	**12.29**	SALA ERA
0.90	2.10	N/A	-1	33%	**-0.62**	DESCUENTO PUERTA
1.00	1.30	N/A	-1	33%	**-0.43**	DESCUENTO VENTANA
14.37	2.50	N/A	1	33%	**11.86**	CONSULTORIO 3
1.30	2.10	N/A	-1	33%	**-0.90**	DESCUENTO PUERTA
0.90	2.10	N/A	-1	33%	**-0.62**	DESCUENTO PUERTA
1.41	1.00	N/A	-1	33%	**-0.47**	DESCUENTO VENTANA
16.26	2.50	N/A	1	33%	**13.41**	CONSULTORIO 2
1.50	1.30	N/A	-1	33%	**-0.64**	DESCUENTO VENTANA
1.20	2.10	N/A	-1	33%	**-0.83**	DESCUENTO PUERTA
0.90	2.10	N/A	-1	33%	**-0.62**	DESCUENTO PUERTA
15.88	2.48	N/A	1	33%	**13.00**	CONSULTORIO 1
1.20	2.10	N/A	-1	33%	**-0.83**	DESCUENTO PUERTA
1.00	2.10	N/A	-1	33%	**-0.69**	DESCUENTO PUERTA
0.92	0.86	N/A	-1	33%	**-0.26**	DESCUENTO VENTANA
13.40	2.52	N/A	1	33%	**11.14**	ADMISIONES URGENSIAS
0.94	2.10	N/A	-1	33%	**-0.65**	DESCUENTO PUERTA
0.80	2.10	N/A	-1	33%	**-0.55**	DESCUENTO PUERTA
1.20	1.40	N/A	-1	33%	**-0.55**	DESCUENTO VENTANA
2.00	1.40	N/A	-1	33%	**-0.92**	DESCUENTO VENTANA
8.71	2.52	N/A	1	33%	**7.24**	REF Y CONTRA REF
1.00	2.10	N/A	-1	33%	**-0.69**	DESCUEBTO PUERTA
11.20	2.53	N/A	1	33%	**9.35**	SALA ESPERA URGENCIAS









1.40	0.93	N/A	-1	33%	-0.43	DESCUENTO VENTANA
1.40	0.93	N/A	-1	33%	-0.43	DESCUENTO VENTANA
0.40	1.00	N/A	-1	33%	-0.13	DESCUENTO VENTANA
7.51	2.53	N/A	1	33%	6.27	ACCESO URGENCIAS
2.00	2.10	N/A	-1	33%	-1.39	DESCUENTO PUERA ACCESO URGENCIAS
0.70	1.00	N/A	-1	33%	-0.23	DESCUENTO VENTANA
6.35	2.53	N/A	1	33%	5.30	SALA ESPERA ADULTOS
1.20	1.75	N/A	-1	33%	-0.69	DESCUENTO VENTANA
1.13	1.73	N/A	-1	33%	-0.65	DESCUENTO VENTANA
6.37	0.75	N/A	1	33%	1.58	ANTEPECHO SALA DE ESPERA
16.18	2.52	N/A	1	33%	13.46	DESCUENTO VENTANA
0.97	0.97	N/A	-1	33%	-0.31	DESCUENTO VENTANA
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO PUERTA
15.31	2.52	N/A	1	33%	12.73	CUARTO DE EQUIPOS
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO PUERTA
0.40	0.50	N/A	-1	33%	-0.07	DESCUENTO VENTA
13.60	2.50	N/A	1	33%	11.22	RAYOS X
0.80	2.10	N/A	-2	33%	-1.11	DESCUENTO PUERTA
14.90	2.54	N/A	1	33%	12.49	SALA ESPERA (HALL), PASILLO HACIA FARMACIA Y MUROS EXTERIOR Y POSTERIOR DE CONTROL IMAGENOLIGÍA: CARDIO
1.84	1.58	N/A	-1	33%	-0.96	DESCUENTO: VENTALA PASILLO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO: PUERTA CONTROL IMAGENOLOGÍA
3.51	1.00	N/A	2	33%	2.32	CONTROL IMAGENOLIGÍA: CARDIO - RECEPCIÓN (ANTEPECHO)
2.50	1.00	N/A	2	33%	1.65	SALA ESPERA (HALL) - RECPCIÓN (ANTEPECHO)
1.25	2.54	N/A	1	33%	1.05	SALA ESPERA (HALL) - RECPCIÓN (MURO CORTO LATERAL DERECH)
6.86	2.64	N/A	1	33%	5.98	CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS (ACCESO A URG) Y ACCESO A TRIAGES
0.70	2.64	N/A	1	33%	0.61	
1.16	1.75	N/A	-1	33%	-0.67	DESCUENTO: VENTANA EXTERIOR
1.00	2.10	N/A	-1	33%	-0.69	DESCUENTO: PUERTA TRIAGE 1
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO: PUERTA TRIAGE 2
4.40	2.50	N/A	1	33%	3.63	ACCESO A LAVADO DE PACIENTES
2.00	2.10	N/A	-1	33%	-1.39	DESCUENTO: PUERTA PASILLO
20.55	2.54	N/A	1	33%	17.23	MONITOREO GINESCOBTETRICIA
0.70	2.10	N/A	-1	33%	-0.49	DESCUENTO: PUERTA CUARTO LIBRE
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO: PUERTA BAÑO
1.71	2.10	N/A	-1	33%	-1.19	DESCUENTO: PUERTA PRINCIPAL
15.29	2.63	N/A	1	33%	13.27	SALA EDA
0.95	0.95	N/A	-1	33%	-0.30	DESCUENTO: VENTANA EXTERIOR
1.07	1.00	N/A	-1	33%	-0.35	DESCUENTO: VENTANA PASILLO
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO: PUERTA BAÑO
1.00	2.10	N/A	-1	33%	-0.69	DESCUENTO: PUERTA PRINCIPAL
4.37	2.66	N/A	1	33%	3.84	AUDITORIO (MURO ORIENTAL)
1.13	1.72	N/A	-1	33%	-0.64	DESCUENTO: VENTANA EXTERIOR
5.50	2.50	N/A	1	33%	4.54	INSUMOS DISPOSITIVOS FARMACIA: DIGITACIÓN
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO: PUERTA
4.60	2.50	N/A	1	33%	3.80	ROPA LIMPIA: DIGITACIÓN
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO: PUERTA
4.01	2.50	N/A	1	33%	3.31	ROPA SUCIA: DIGITACIÓN
2.95	2.50	N/A	1	33%	2.43	FACTURACIÓN, AUTORIZACIÓN Y ADMISIÓN (MURO SUR)
5.77	2.4	N/A	1	33%	4.57	TRIAGE 2
2.53	2.4	N/A	1	33%	2.00	
0.81	1.5	N/A	-1	33%	-0.40	DESCUENTO VENTANA
2.10	2.2	N/A	1	33%	1.52	SALA ESPERA ADULTO
1.14	2.4	N/A	1	100%	2.74	AUDITORIO
1.70	2.4	N/A	1	100%	4.08	
3.16	2.4	N/A	2	33%	5.01	DESCANSO URGENCIAS
3.15	2.4	N/A	1	33%	2.49	
0.80	2.1	N/A	-2	33%	-1.11	DESCUENTO PUERTA
1.63	2.4	N/A	1	33%	1.29	DESCANSO URGENCIAS
1.70	2.34	N/A	1	33%	1.31	OBSERVACION GINECOOBSTETRICIA
1.40	1.1	N/A	1	33%	0.51	
4.40	1.33	N/A	1	33%	1.93	CUARTO ASEO URGENCIAS
2.28	1	N/A	1	33%	0.75	SALA ERA
5.85	2.4	N/A	1	33%	4.63	CUARTO EQUIPO URG
0.90	2.07	N/A	-1	33%	-0.61	DESCUENTO PUERTA
0.80	0.9	N/A	1	33%	0.24	SALA YESO
1.60	0.7	N/A	1	33%	0.37	
1.50	1.07	N/A	1	33%	0.53	PASILLO URGENCIAS - TABLERO GASES
0.26	0.42	N/A	-1	33%	-0.04	PASILLO URGENCIAS - TABLERO
1.50	1.2	N/A	1	33%	0.59	PROCEDIMIENTO
2.40	0.9	N/A	1	33%	0.71	
2.00	0.8	N/A	1	33%	0.53	RESIDUOS PELIGROS
1.30	1	N/A	1	33%	0.43	RESIDUOS RESICLABLE
2.82	0.9	N/A	1	33%	0.84	
2.60	1.1	N/A	1	33%	0.94	OBSERVACION PEDIATRIA - TOMAS Y GASES
1.40	2.6	N/A	1	33%	1.20	
4.20	0.76	N/A	1	33%	1.05	CENTRAL DE ENFERMERIA
6.46	1.6	N/A	2	33%	6.82	TRABAJO LIMPIO - TRABAJO SUCIO
0.80	2.1	N/A	-2	33%	-1.11	DESCUENTO PUERTAS
5.30	1.34	N/A	1	33%	2.34	CIRCULACION - CUARTO DE ASEO
1.30	1.02	N/A	1	33%	0.44	CUARO DE ASEO RX
0.60	2.4	N/A	1	33%	0.48	TOMA DE MUESTRA
1.62	2.4	N/A	1	33%	1.28	RESIDUOS PELIGROSOS LABORATORIO
2.63	1.1	N/A	1	33%	0.95	FARMACIA AREA ENTREGA
4.94	1.1	N/A	1	33%	1.79	
2.40	0.8	N/A	1	33%	0.63	FACTURACION ADMISION
1.40	1.10	N/A	1	33%	0.51	PROCEDIMIENTO ASEPTICOS
1.27	2.40	N/A	1	33%	1.01	PROCEDIMIENTO ASEPTICOS
5.55	2.40	N/A	1	33%	4.40	T LIMPIO EN OBSERVACION PEDIATRA
0.79	2.06	N/A	-1	33%	-0.54	DESCUENTO DE PUERTA
6.63	2.40	N/A	1	33%	5.25	T SUCIO EN OBSERVACION
0.79	2.06	N/A	-1	33%	-0.54	DESCUENTO DE PUERTA
7.34	2.40	N/A	1	33%	5.81	INSUMOS AL LADO DE PROCEDIMIENTOS
0.80	2.06	N/A	-1	33%	-0.54	DESCUENTO DE PUERTA
		PISO 2				
37.05	2.50	N/A	1	33%	30.57	PASILLO RECUPERACION
8.25	2.10	N/A	-1	33%	-5.72	DESCUENTO PUERTAS
17.52	2.40	N/A	1	33%	13.88	PREPARACION PASIENTES
3.70	2.10	N/A	-1	33%	-2.56	DESCUENTO PUERTAS
39.12	2.55	N/A	1	33%	32.92	RECUPERACION QUIRURGICA
5.11	2.10	N/A	-1	33%	-3.54	DESCUENTO PUERTAS
13.37	0.70	N/A	-1	33%	-3.09	DESCUENTO VENTANAS
11.97	0.79	N/A	1	33%	3.12	CENTRAL EMFERMERIA
27.31	2.50	N/A	1	33%	22.53	CENTRAL ESTERILIZACION
1.90	2.10	N/A	-1	33%	-1.32	DESCUENTO PUERTAS
1.48	1.00	N/A	-1	33%	-0.49	DESCUENTO VENTANAS
1.00	0.70	N/A	-1	33%	-0.23	DESCUENTO VENTANAS
0.84	1.46	N/A	-1	33%	-0.40	DESCUENTO VENTANAS
11.39	2.50	N/A	1	33%	9.40	INGRESO AUTO CLAVE
2.10	2.10	N/A	-1	33%	-1.46	DESCUENTO PUERTAS
0.81	1.00	N/A	-1	33%	-0.27	DESCUENTO VENTANAS
61.80	2.50	N/A	1	33%	50.99	CICULACION DE QUIRURGICOS A SALA DE PARTOS
18.61	2.10	N/A	-1	33%	-12.90	DESCUENTO PUERTAS
1.50	1.26	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO VENTANAS
2.15	0.90	N/A	-1	33%	-0.64	DESCUENTO VENTANAS
1.00	1.00	N/A	-2	33%	-0.66	DESCUENTO VENTANAS
1.00	1.50	N/A	-1	33%	-0.50	DESCUENTO VENTANAS
2.00	2.50	N/A	-1	33%	-1.65	DESCUENTO ENTRADA A PASILLO
11.67	2.50	N/A	1	33%	9.63	CUARTO DE EQUIPOS
1.00	2.10	N/A	-1	33%	-0.69	DESCUENTO PUERTAS
21.53	2.50	N/A	1	33%	17.76	DESCANSO QUIROFANOS
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO PUERTAS
0.90	2.10	N/A	-2	33%	-1.25	DESCUENTO PUERTAS
3.21	0.50	N/A	-1	33%	-0.53	DESCUENTO VENTANAS
2.42	2.60	N/A	1	33%	2.08	TRABAJO SUCIO
3.50	2.10	N/A	-1	33%	-2.43	DESCUENTO PUERTAS
2.00	0.37	N/A	-1	33%	-0.24	DESCUENTO PUERTAS
1.00	0.70	N/A	-1	33%	-0.23	DESCUENTO VENTANAS
12.91	2.50	N/A	1	33%	10.65	FARMACIA
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO PUERTAS
1.00	1.00	N/A	-3	33%	-0.99	DESCUENTO VENTANAS
0.37	2.00	N/A	-1	33%	-0.24	DESCUENTO VENTANAS
5.95	2.50	N/A	1	33%	4.91	BODEGA
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO PUERTAS
13.66	2.50	N/A	1	33%	11.27	DESCANSO
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO PUERTAS
0.60	2.10	N/A	-1	33%	-0.42	DESCUENTO PUERTAS











1.00	1.00	N/A	-1	33%	**-0.33**	DESCUENTO VENTANAS
8.82	2.50	N/A	1	33%	**7.28**	PASILLO VESTIER
0.80	2.10	N/A	-3	33%	**-1.66**	DESCUENTO PUERTAS
20.57	2.40	N/A	1	33%	**16.29**	VESTIER MUJERES
0.80	2.10	N/A	-2	33%	**-1.11**	DESCUENTO PUERTAS
0.70	2.10	N/A	-3	33%	**-1.46**	DESCUENTO VENTANAS
20.70	2.40	N/A	1	33%	**16.39**	VESTIER HOMBRES
0.80	2.10	N/A	2	33%	**1.11**	DESCUENTO PUERTAS
0.70	2.10	N/A	2	33%	**0.97**	DESCUENTO VENTANAS
83.30	2.45	N/A	1	33%	**67.35**	PASILLO PRINCIPAL A UCI
1.40	2.10	N/A	-1	33%	**-0.97**	DESCUENTO PUERTAS
1.00	0.70	N/A	-1	33%	**-0.23**	DESCUENTO VENTANAS
0.80	2.10	N/A	-1	33%	**-0.55**	DESCUENTO VENTANAS
2.00	2.45	N/A	-1	33%	**-1.62**	DESCUENTO VENTANAS
0.90	2.10	N/A	-1	33%	**-0.62**	DESCUENTO VENTANAS
1.00	1.50	N/A	-1	33%	**-0.50**	DESCUENTO VENTANAS
1.96	2.10	N/A	-1	33%	**-1.36**	DESCUENTO VENTANAS
1.00	2.10	N/A	-1	33%	**-0.69**	DESCUENTO PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-1	33%	**-0.55**	DESCUENTO PUERTAS
0.76	2.10	N/A	-1	33%	**-0.53**	DESCUENTO PUERTAS
1.70	2.10	N/A	-1	33%	**-1.18**	DESCUENTO PUERTAS
1.00	2.10	N/A	-1	33%	**-0.69**	DESCUENTO PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-1	33%	**-0.55**	DESCUENTO PUERTAS
0.60	2.10	N/A	-1	33%	**-0.42**	DESCUENTO PUERTAS
0.70	2.10	N/A	-1	33%	**-0.49**	DESCUENTO PUERTAS
2.00	2.10	N/A	-1	33%	**-1.39**	DESCUENTO PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-1	33%	**-0.55**	DESCUENTO PUERTAS
1.10	2.45	N/A	-1	33%	**-0.89**	DESCUENTO PUERTAS
1.70	2.10	N/A	-2	33%	**-2.36**	DESCUENTO PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-1	33%	**-0.55**	DESCUENTO PUERTAS
1.00	2.10	N/A	-1	33%	**-0.69**	DESCUENTO PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-1	33%	**-0.55**	DESCUENTO PUERTAS
3.88	0.98	N/A	1	33%	**1.25**	RESECION
34.33	0.50	N/A	1	33%	**5.66**	TRABAJO DE PARTO
1.67	2.10	N/A	-1	33%	**-1.16**	DESCUENTO PUERTAS
0.90	2.10	N/A	-1	33%	**-0.62**	DESCUENTO PUERTAS
0.70	2.10	N/A	-1	33%	**-0.49**	DESCUENTO PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-1	33%	**-0.55**	DESCUENTO PUERTAS
2.13	0.90	N/A	-1	33%	**-0.63**	DESCUENTO PUERTAS
1.50	1.30	N/A	-3	33%	**-1.93**	DESCUENTO PUERTAS
4.90	0.85	N/A	1	33%	**1.37**	CENTRAL DE EMFERMERIA
38.26	2.50	N/A	1	33%	**31.56**	RECUPERACION DE PARTOS
0.95	2.10	N/A	-1	33%	**-0.66**	DESCUNTO DE PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-1	33%	**-0.55**	DESCUNTO DE PUERTAS
1.00	2.10	N/A	-1	33%	**-0.69**	DESCUNTO DE PUERTAS
1.50	1.30	N/A	-2	33%	**-1.29**	DESCUNTO DE VENTANA
0.90	2.10	N/A	-1	33%	**-0.62**	DESCUNTO DE PUERTAS
2.00	2.10	N/A	-1	33%	**-1.39**	DESCUNTO DE PUERTAS
5.22	0.77	N/A	1	33%	**1.33**	CENTRAL DE EMFERMERIA
5.95	2.50	N/A	1	33%	**4.91**	ROPA LIMPIA
0.95	2.10	N/A	-1	33%	**-0.66**	DESCUNTO DE PUERTAS
19.11	2.50	N/A	1	33%	**15.77**	VESTIER PARTOS
0.90	2.10	N/A	-1	33%	**-0.62**	DESCUNTO DE PUERTAS
1.00	2.10	N/A	-1	33%	**-0.69**	DESCUNTO DE PUERTAS
96.00	2.50	N/A	1	33%	**79.20**	UCI ADULTOS
1.96	2.10	N/A	-1	33%	**-1.36**	DESCUNTO DE PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-1	33%	**-0.55**	DESCUNTO DE PUERTAS
0.70	2.10	N/A	-1	33%	**-0.49**	DESCUNTO DE PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-1	33%	**-0.55**	DESCUNTO DE PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-2	33%	**-1.11**	DESCUNTO DE PUERTAS
0.90	2.10	N/A	-1	33%	**-0.62**	DESCUNTO DE PUERTAS
1.60	2.10	N/A	-2	33%	**-2.22**	DESCUNTO DE PUERTAS
1.50	1.30	N/A	-4	33%	**-2.57**	DESCUNTO DE VENTANA
0.95	0.95	N/A	-2	33%	**-0.60**	DESCUNTO DE VENTANA
1.10	2.10	N/A	-2	33%	**-1.52**	DESCUNTO DE PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-4	33%	**-2.22**	DESCUNTO DE PUERTAS
1.30	0.92	N/A	-1	33%	**-0.39**	DESCUNTO DE VENTANA
1.30	1.30	N/A	-1	33%	**-0.56**	DESCUNTO DE VENTANA
1.25	0.80	N/A	-2	33%	**-0.66**	DESCUNTO DE VENTANA
0.95	0.95	N/A	-1	33%	**-0.30**	DESCUNTO DE VENTANA
1.20	1.30	N/A	-1	33%	**-0.51**	DESCUNTO DE VENTANA
5.19	0.85	N/A	1	33%	**1.46**	CENTRAL DE EMFERMERIA FRENTE A UCI ADULTOS
7.28	0.78	N/A	1	33%	**1.87**	CENTRAL DE EMFERMERIA FRENTE A UCI ADULTOS
7.65	2.50	N/A	1	33%	**6.31**	FILTRO ACCESO FAMILIARES
0.80	2.10	N/A	-2	33%	**-1.11**	DESCUNTO DE PUERTAS
6.20	2.50	N/A	1	33%	**5.12**	IMFORMACION FAMILIARES
0.70	2.10	N/A	-1	33%	**-0.49**	DESCUNTO DE PUERTAS
19.41	2.50	N/A	1	33%	**16.01**	FILTRO ACCESO PERSONAL
0.80	2.10	N/A	-3	33%	**-1.66**	DESCUNTO DE PUERTAS
0.70	2.10	N/A	-2	33%	**-0.97**	DESCUNTO DE PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-1	33%	**-0.55**	DESCUNTO DE PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-1	33%	**-0.55**	DESCUNTO DE PUERTAS
9.50	2.50	N/A	1	33%	**7.84**	DESCANSO
1.00	2.10	N/A	-1	33%	**-0.69**	DESCUNTO DE PUERTAS
1.50	1.00	N/A	-1	33%	**-0.50**	DESCUNTO DE PUERTAS
12.10	2.50	N/A	1	33%	**9.98**	EXTRACION
0.90	2.10	N/A	-1	33%	**-0.62**	DESCUNTO DE PUERTAS
9.81	2.50	N/A	1	33%	**8.09**	FILTRO
0.80	2.10	N/A	-1	33%	**-0.55**	DESCUNTO DE PUERTAS
0.70	2.10	N/A	-1	33%	**-0.49**	DESCUNTO DE PUERTAS
11.51	2.50	N/A	1	33%	**9.50**	PASILLO ACCESO UCI
2.00	2.10	N/A	-2	33%	**-2.77**	DESCUNTO DE VENTANA
0.85	3.10	N/A	-1	33%	**-0.87**	DESCUNTO DE VENTANA
1.00	2.10	N/A	-1	33%	**-0.69**	DESCUNTO DE PUERTAS
0.90	2.10	N/A	-1	33%	**-0.62**	DESCUNTO DE PUERTAS
0.66	2.10	N/A	-1	33%	**-0.46**	DESCUNTO DE PUERTAS
17.21	2.50	N/A	1	33%	**14.20**	LACTARIO
1.00	2.10	N/A	-1	33%	**-0.69**	DESCUNTO DE PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-2	33%	**-1.11**	DESCUNTO DE PUERTAS
11.91	2.40	N/A	1	33%	**9.43**	AMBIENTE TRABAJO ESTERIL
0.80	2.10	N/A	-3	33%	**-1.66**	DESCUNTO DE PUERTAS
0.70	1.00	N/A	-1	33%	**-0.23**	DESCUNTO DE VENTANA
96.38	2.50	N/A	1	33%	**79.51**	UCI NEONATAL
2.00	2.10	N/A	-1	33%	**-1.39**	DESCUNTO DE PUERTAS
1.35	2.10	N/A	-1	33%	**-0.94**	DESCUNTO DE PUERTAS
0.90	1.30	N/A	-1	33%	**-0.39**	DESCUNTO DE VENTANA
1.30	1.30	N/A	-6	33%	**-3.35**	DESCUNTO DE VENTANA
1.30	1.05	N/A	-1	33%	**-0.45**	DESCUNTO DE VENTANA
0.70	1.00	N/A	-1	33%	**-0.23**	DESCUNTO DE VENTANA
0.70	1.20	N/A	-2	33%	**-0.55**	DESCUNTO DE VENTANA
0.90	1.30	N/A	-1	33%	**-0.39**	DESCUNTO DE VENTANA
1.00	2.10	N/A	-1	33%	**-0.69**	DESCUNTO DE VENTANA
0.70	2.10	N/A	-1	33%	**-0.49**	DESCUNTO DE VENTANA
0.90	2.50	N/A	-1	33%	**-0.74**	DESCUNTO DE VENTANA
1.35	2.10	N/A	-1	33%	**-0.94**	DESCUNTO DE PUERTAS
0.70	2.10	N/A	-1	33%	**-0.49**	DESCUNTO DE PUERTAS
0.75	2.10	N/A	-1	33%	**-0.52**	DESCUNTO DE PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-1	33%	**-0.55**	DESCUNTO DE PUERTAS
15.00	0.66	N/A	1	33%	**3.27**	UCI AISLADO
12.79	0.66	N/A	1	33%	**2.79**	UCI AISLADO
4.68	0.82	N/A	4	33%	**5.07**	CENTRAL DE EMFERMERIA
10.64	0.82	N/A	1	33%	**2.88**	CENTRAL DE EMFERMERIA
11.41	2.50	N/A	1	33%	**9.41**	PASILLO DESCANSO
0.80	2.10	N/A	-4	33%	**-2.22**	DESCUNTO DE PUERTAS
20.32	2.50	N/A	1	33%	**16.76**	DESCUNTO DE PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-3	33%	**-1.66**	DESCUNTO DE VENTANA
1.90	1.30	N/A	-1	33%	**-0.82**	DESCUNTO DE VENTANA
1.30	1.30	N/A	-1	33%	**-0.56**	DESCUNTO DE VENTANA
0.90	1.30	N/A	-1	33%	**-0.39**	DESCUNTO DE VENTANA
11.78	2.50	N/A	1	33%	**9.72**	PASILLO ASEO Y LAVADO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	**-0.83**	DESCUNTO DE PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-1	33%	**-0.55**	DESCUNTO DE PUERTAS
17.56	2.50	N/A	1	33%	**14.49**	PASILLO ASESO ASISTENCIAL
1.80	2.10	N/A	-1	33%	**-1.25**	DESCUNTO DE PUERTAS
0.90	2.10	N/A	-1	33%	**-0.62**	DESCUNTO DE PUERTAS
0.75	2.10	N/A	-1	33%	**-0.52**	DESCUNTO DE PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-3	33%	**-1.66**	DESCUNTO DE PUERTAS
1.73	2.10	N/A	-1	33%	**-1.20**	DESCUNTO DE PUERTAS
2.67	2.30	N/A	1	33%	**2.03**	ROPA LIMPIA
2.90	2.30	N/A	1	33%	**2.20**	ROPA SUCIA
13.60	2.60	N/A	1	33%	**11.67**	VESTIER ASISTENCIAL
0.80	2.10	N/A	-2	33%	**-1.11**	DESCUNTO DE PUERTAS












0.70	2.10	N/A	-1	33%	**-0.49**	DESCUNTO DE PUERTAS
0.70	3.60	N/A	-1	33%	**-0.83**	DESCUNTO DE PUERTAS
9.21	2.40	N/A	1	33%	**7.29**	COORDINACION
1.80	2.10	N/A	-1	33%	**-1.25**	DESCUNTO DE PUERTAS
4.29	0.70	N/A	-1	33%	**-0.99**	DESCUNTO DE VENTANA
23.88	2.50	N/A	1	33%	**19.70**	HALL PRINCIPAL
1.90	2.10	N/A	-1	33%	**-1.32**	DESCUNTO DE PUERTAS
0.70	2.10	N/A	-1	33%	**-0.49**	DESCUNTO DE PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-2	33%	**-1.11**	DESCUNTO DE PUERTAS
2.20	2.10	N/A	-1	33%	**-1.52**	DESCUNTO DE PUERTAS
5.56	2.40	N/A	1	33%	**4.40**	T LIMPIO CUIDADOS INTERMEDIOS
0.70	2.06	N/A	-1	33%	**-0.48**	DESCUENTO PUERTA
7.46	2.40	N/A	1	33%	**5.91**	T LIMPIO CUIDADOS INTENSIVOS
0.90	2.06	N/A	-1	33%	**-0.61**	DESCUENTO PUERTA
7.00	2.40	N/A	1	33%	**5.54**	T LIMPIO RECUPERACION SALA DE PARTOS
0.80	2.06	N/A	-1	33%	**-0.54**	DESCUENTO PUERTA
0.90	0.95	N/A	-1	33%	**-0.28**	DESCUENTO PUERTA
6.20	2.40	N/A	1	33%	**4.91**	T SUCIO RECUPERACION SALA DE PARTOS
0.80	2.06	N/A	-1	33%	**-0.54**	DESCUENTO PUERTA
9.80	2.40	N/A	1	33%	**7.76**	T LIMPIO RECUPERACION SALA DE PARTOS
0.70	2.06	N/A	-1	33%	**-0.48**	DESCUENTO PUERTAS
		PISO 3				
2.28	2.80	N/A	1	33%	**2.11**	LUDOTECA
1.55	2.80	N/A	1	33%	**1.43**	LUDOTECA
1.57	2.80	N/A	1	33%	**1.45**	LUDOTECA
1.55	2.80	N/A	1	33%	**1.43**	LUDOTECA
2.57	2.80	N/A	1	33%	**2.37**	LUDOTECA
6.68	2.80	N/A	1	33%	**6.17**	LUDOTECA
4.78	2.80	N/A	1	33%	**4.42**	LUDOTECA
4.78	2.80	N/A	1	33%	**4.42**	LUDOTECA
5.01	2.80	N/A	1	33%	**4.63**	LUDOTECA
4.80	2.80	N/A	1	33%	**4.44**	LUDOTECA
3.35	2.80	N/A	1	33%	**3.10**	LUDOTECA
4.91	2.80	N/A	1	33%	**4.54**	LUDOTECA
2.13	2.80	N/A	1	33%	**1.97**	LUDOTECA
1.93	2.80	N/A	1	33%	**1.78**	LUDOTECA
1.93	2.80	N/A	1	33%	**1.78**	LUDOTECA
2.23	2.80	N/A	1	33%	**2.06**	LUDOTECA
3.46	2.80	N/A	1	33%	**3.20**	LUDOTECA
7.90	2.80	N/A	1	33%	**7.30**	LUDOTECA
4.76	2.80	N/A	1	33%	**4.40**	LUDOTECA
4.17	2.80	N/A	1	33%	**3.85**	LUDOTECA
1.93	2.80	N/A	1	33%	**1.78**	LUDOTECA
1.10	2.80	N/A	1	33%	**1.02**	LUDOTECA
2.53	2.80	N/A	1	33%	**2.34**	LUDOTECA
0.93	2.80	N/A	1	33%	**0.86**	LUDOTECA
1.76	2.80	N/A	1	33%	**1.63**	LUDOTECA
1.93	2.80	N/A	1	33%	**1.78**	LUDOTECA
1.50	1.00	N/A	-1	33%	**-0.50**	DESCUENTO VENTANA AREA LUDOTECA
1.20	1.80	N/A	-1	33%	**-0.71**	DESCUENTO VENTANA AREA LUDOTECA
1.20	2.00	N/A	-1	33%	**-0.79**	DESCUENTO VENTANA AREA LUDOTECA
2.24	4.78	N/A	-1	33%	**-3.53**	DESCUENTO VENTANA AREA LUDOTECA
2.25	2.30	N/A	-1	33%	**-1.71**	DESCUENTO VENTANA AREA LUDOTECA
1.35	4.80	N/A	-1	33%	**-2.14**	DESCUENTO VENTANA AREA LUDOTECA
1.35	3.35	N/A	-1	33%	**-1.49**	DESCUENTO VENTANA AREA LUDOTECA
0.90	2.16	N/A	-1	33%	**-0.64**	DESCUENTO VENTANA AREA LUDOTECA
0.80	2.16	N/A	-2	33%	**-1.14**	DESCUENTO PUERTA AREA LUDOTECA
0.90	2.16	N/A	-1	33%	**-0.64**	DESCUENTO PUERTA AREA LUDOTECA
11.87	2.55	N/A	1	33%	**9.99**	EXTRACION DE LECHE MATERIAL
0.90	2.16	N/A	-1	33%	**-0.64**	DESCUENTO PUERTA LECHE MATERIAL
7.28	2.60	N/A	1	33%	**6.25**	DEPOSITO DE INSUMOS
0.80	2.10	N/A	-1	33%	**-0.55**	DESCUENTO PUERTA AREA DEPOSITO
5.92	2.60	N/A	1	33%	**5.08**	FILTRO INGRESO
0.80	2.10	N/A	-1	33%	**-0.55**	PREPARACION DE FORMULAS
15.02	2.60	N/A	1	33%	**12.89**	PREPARACION DE FORMULAS
0.80	2.10	N/A	-1	33%	**-0.55**	PREPARACION DE FORMULAS
1.96	1.25	N/A	-1	33%	**-0.81**	PREPARACION DE FORMULAS
1.55	1.05	N/A	-1	33%	**-0.54**	PREPARACION DE FORMULAS
11.50	2.60	N/A	1	33%	**9.87**	IMFORMACION FAMILIARES
0.90	2.80	N/A	-1	33%	**-0.83**	IMFORMACION FAMILIARES
13.17	2.70	N/A	1	33%	**11.73**	COORDINACIÓN PEDIATRA
0.90	2.10	N/A	-1	33%	**-0.62**	COORDINACIÓN PEDIATRA
32.31	2.54	N/A	1	33%	**27.08**	CIRCULACION
0.90	2.10	N/A	-5	33%	**-3.12**	CIRCULACION
0.70	2.10	N/A	-2	33%	**-0.97**	CIRCULACION
13.30	2.70	N/A	1	33%	**11.85**	DESCANSO DE MEDICO
0.70	2.50	N/A	-1	33%	**-0.58**	DESCANSO DE MEDICO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	**-0.62**	DESCANSO DE MEDICO
10.10	2.70	N/A	1	33%	**9.00**	DESCANSO EMFERMERIA
0.70	2.50	N/A	-1	33%	**-0.58**	DESCANSO EMFERMERIA
4.05	2.55	N/A	1	33%	**3.41**	ESTACION DE CAFÉ
0.90	2.10	N/A	-1	33%	**-0.62**	ESTACION DE CAFÉ
15.45	2.80	N/A	1	33%	**14.28**	COORDINACION UCI PEDIATRICA
1.90	1.36	N/A	-1	33%	**-0.85**	COORDINACION UCI PEDIATRICA
1.30	1.36	N/A	-1	33%	**-0.58**	COORDINACION UCI PEDIATRICA
0.90	2.10	N/A	-1	33%	**-0.62**	COORDINACION UCI PEDIATRICA
4.04	2.70	N/A	1	33%	**3.60**	TRANFERENCIA MEDICAMENTOS
9.35	2.70	N/A	1	33%	**8.33**	ASISTENCIAL
0.70	0.80	N/A	-1	33%	**-0.18**	ASISTENCIAL
0.80	2.10	N/A	-1	33%	**-0.55**	ASISTENCIAL
8.18	2.60	N/A	1	33%	**7.02**	ROPA LIMPIA
0.70	1.14	N/A	-1	33%	**-0.26**	ROPA LIMPIA
0.80	2.10	N/A	-1	33%	**-0.55**	ROPA LIMPIA
8.40	2.60	N/A	1	33%	**7.21**	CUARTO STERIL DEPOSITO DE INSUMOS
0.70	0.80	N/A	-1	33%	**-0.18**	CUARTO STERIL DEPOSITO DE INSUMOS
0.80	2.10	N/A	-1	33%	**-0.55**	CUARTO STERIL DEPOSITO DE INSUMOS
9.13	2.60	N/A	1	33%	**7.83**	CUARTO EQUIPOS
0.80	2.10	N/A	1	33%	**0.55**	CUARTO EQUIPOS
0.70	0.80	N/A	1	33%	**0.18**	CUARTO EQUIPOS
32.02	2.73	N/A	1	33%	**28.85**	CIRCULACION
0.80	2.10	N/A	-7	33%	**-3.88**	CIRCULACION
0.90	2.10	N/A	-1	33%	**-0.62**	CIRCULACION
23.24	2.80	N/A	1	33%	**21.47**	CIRCULACION IMFORMACION FAMILIAR
2.00	0.73	N/A	6	33%	**2.89**	CIRCULACION IMFORMACION FAMILIAR
0.90	2.10	N/A	-1	33%	**-0.62**	CIRCULACION IMFORMACION FAMILIAR
0.20	2.10	N/A	-1	33%	**-0.14**	CIRCULACION IMFORMACION FAMILIAR
0.80	2.10	N/A	-1	33%	**-0.55**	CIRCULACION IMFORMACION FAMILIAR
14.64	2.57	N/A	1	33%	**12.42**	ORATORIO
2.30	2.10	N/A	-1	33%	**-1.59**	ORATORIO
2.45	2.10	N/A	-2	33%	**-3.40**	ORATORIO
17.80	2.55	N/A	1	33%	**14.98**	SALA DE ESPERA
2.32	2.12	N/A	-1	33%	**-1.62**	SALA DE ESPERA
2.10	2.10	N/A	-1	33%	**-1.46**	SALA DE ESPERA
0.80	2.10	N/A	-3	33%	**-1.66**	SALA DE ESPERA
2.00	2.10	N/A	-1	33%	**-1.39**	SALA DE ESPERA
11.48	2.75	N/A	1	33%	**10.42**	U.C.I. 1
0.90	1.50	N/A	-1	33%	**-0.45**	U.C.I. 1 DESCUENTO
11.83	2.70	N/A	1	33%	**10.54**	U.C.I. 3
0.90	1.50	N/A	-1	33%	**-0.45**	U.C.I. 3 DESCUENTO
2.50	0.60	N/A	-1	33%	**-0.50**	U.C.I. 3 DESCUENTO
1.12	0.40	N/A	-1	33%	**-0.15**	U.C.I. 3 DESCUENTO
11.34	2.70	N/A	1	33%	**10.10**	U.C.I. 5
0.90	1.50	N/A	-1	33%	**-0.45**	U.C.I. 5 DESCUENTO
0.70	2.50	N/A	-1	33%	**-0.58**	U.C.I. 5 DESCUENTO
1.10	0.16	N/A	-1	33%	**-0.06**	U.C.I. 5 DESCUENTO
11.92	2.70	N/A	1	33%	**10.62**	U.C.I. 7
0.90	1.50	N/A	-1	33%	**-0.45**	U.C.I. 7 DESCUENTO
0.70	2.50	N/A	-1	33%	**-0.58**	U.C.I. 7 DESCUENTO
1.10	0.16	N/A	-1	33%	**-0.06**	U.C.I. 7 DESCUENTO
11.51	2.70	N/A	1	33%	**10.26**	U.C.I. 9
0.90	1.50	N/A	-1	33%	**-0.45**	U.C.I. 9 DESCUENTO
2.50	2.50	N/A	-1	33%	**-2.06**	U.C.I. 9 DESCUENTO
1.10	0.16	N/A	-1	33%	**-0.06**	U.C.I. 9 DESCUENTO
13.81	2.75	N/A	1	33%	**12.53**	U.C.I. 11
0.90	1.50	N/A	-1	33%	**-0.45**	U.C.I. 11 DESCUENTO
2.50	2.50	N/A	-1	33%	**-2.06**	U.C.I. 11 DESCUENTO
1.10	0.16	N/A	-1	33%	**-0.06**	U.C.I. 11 DESCUENTO
13.50	2.70	N/A	1	33%	**12.03**	U.C.I. 12
0.90	2.15	N/A	-1	33%	**-0.64**	U.C.I. 12 DESCUENTO
0.90	1.50	N/A	-1	33%	**-0.45**	U.C.I. 12 DESCUENTO
1.00	1.00	N/A	-1	33%	**-0.33**	U.C.I. 12 DESCUENTO



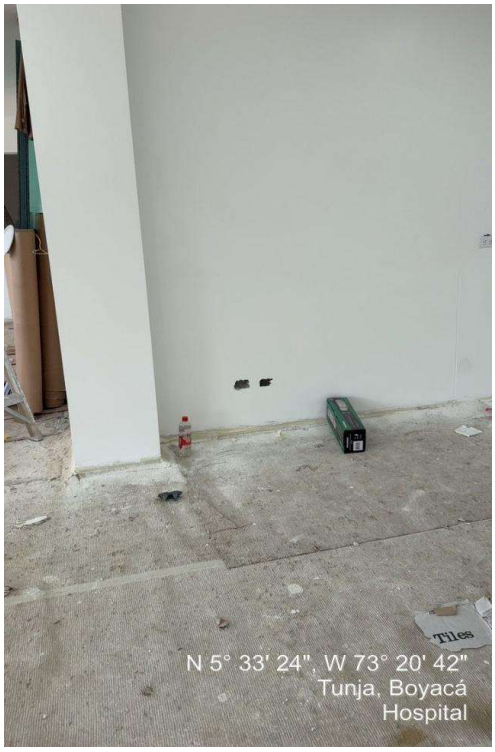



1.10	0.16	N/A	-1	33%	**-0.06**	U.C.I. 12 DESCUENTO
0.23	2.70	N/A	-1	33%	**-0.20**	U.C.I. 12 DESCUENTO
9.62	2.70	N/A	1	33%	**8.57**	U.C.I. 10
1.50	0.90	N/A	-1	33%	**-0.45**	U.C.I. 10 DESCUENTO
0.70	2.50	N/A	-1	33%	**-0.58**	U.C.I. 10 DESCUENTO
1.10	0.16	N/A	-1	33%	**-0.06**	U.C.I. 10 DESCUENTO
10.40	2.70	N/A	1	33%	**9.27**	U.C.I. 8
0.90	2.70	N/A	-1	33%	**-0.80**	U.C.I. 8 DESCUENTO
0.70	3.05	N/A	-1	33%	**-0.70**	U.C.I. 8 DESCUENTO
1.10	0.16	N/A	-1	33%	**-0.06**	U.C.I. 8 DESCUENTO
10.00	2.70	N/A	1	33%	**8.91**	U.C.I.
0.90	1.50	N/A	-1	33%	**-0.45**	U.C.I. 6 DESCUENTO
0.70	3.00	N/A	-1	33%	**-0.69**	U.C.I. 6 DESCUENTO
1.10	0.16	N/A	-1	33%	**-0.06**	U.C.I. 6 DESCUENTO
7.00	2.70	N/A	1	33%	**6.24**	U.C.I. 4
3.00	0.70	N/A	-1	33%	**-0.69**	U.C.I. 4 DESCUENTO
6.70	2.70	N/A	1	33%	**5.97**	U.C.I. 2
3.00	0.70	N/A	-1	33%	**-0.69**	U.C.I. 2 DESCUENTO
2.80	2.70	N/A	1	33%	**2.49**	CIRCULACION
0.80	2.10	N/A	-2	33%	**-1.11**	CIRCULACION
17.84	2.40	N/A	1	33%	**14.13**	HABITACIÓN 301
0.90	2.10	N/A	-1	33%	**-0.62**	DESCUENTO
1.00	1.45	N/A	-1	33%	**-0.48**	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	33%	**-0.50**	DESCUENTO
1.94	2.10	N/A	1	33%	**1.34**	HABITACIÓN 301 - CLOSET
18.17	2.40	N/A	1	33%	**14.39**	HABITACIÓN 302
1.90	2.10	N/A	1	33%	**1.32**	HABITACIÓN 302 - CLOSET
1.20	2.10	N/A	-1	33%	**-0.83**	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	33%	**-0.50**	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	**-0.62**	DESCUENTO
0.95	0.95	N/A	-1	33%	**-0.30**	DESCUENTO
18.43	2.40	N/A	1	33%	**14.60**	HABITACIÓN 303
1.95	2.10	N/A	1	33%	**1.35**	HABITACIÓN 303 - CLOSET
0.75	2.00	N/A	-1	33%	**-0.50**	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	**-0.83**	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	**-0.62**	DESCUENTO
1.30	1.50	N/A	-1	33%	**-0.64**	DESCUENTO
26.42	2.40	N/A	1	33%	**20.92**	HABITACIÓN 304
1.95	2.10	N/A	1	33%	**1.35**	HABITACIÓN 304 - CLOSET
0.75	2.00	N/A	-1	33%	**-0.50**	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	**-0.62**	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	**-0.83**	DESCUENTO
1.30	1.50	N/A	-1	33%	**-0.64**	DESCUENTO
18.61	2.40	N/A	1	33%	**14.74**	HABITACIÓN 305
1.95	2.10	N/A	1	33%	**1.35**	HABITACIÓN 305 - CLOSET
0.75	2.00	N/A	-1	33%	**-0.50**	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	**-0.62**	DESCUENTO
1.30	1.50	N/A	-1	33%	**-0.64**	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	**-0.83**	DESCUENTO
27.02	2.40	N/A	1	33%	**21.40**	HABITACIÓN 306
1.95	2.10	N/A	1	33%	**1.35**	HABITACIÓN 306 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	33%	**-0.64**	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	**-0.83**	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	33%	**-0.50**	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	**-0.62**	DESCUENTO
18.49	2.40	N/A	1	33%	**14.64**	HABITACIÓN 307
1.95	2.10	N/A	1	33%	**1.35**	HABITACIÓN 307 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	33%	**-0.64**	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	**-0.83**	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	33%	**-0.50**	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	**-0.62**	DESCUENTO
23.62	2.40	N/A	1	33%	**18.71**	HABITACIÓN 308
1.95	2.10	N/A	1	33%	**1.35**	HABITACIÓN 308 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	33%	**-0.64**	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	**-0.83**	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	33%	**-0.50**	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	**-0.62**	DESCUENTO
7.33	2.40	N/A	1	33%	**5.81**	CUARTO DE EQUIPOS
0.80	2.10	N/A	-1	33%	**-0.55**	DESCUENTO
18.20	2.40	N/A	1	33%	**14.41**	HABITACIÓN 309
1.95	2.10	N/A	1	33%	**1.35**	HABITACIÓN 309 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	33%	**-0.64**	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	**-0.83**	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	33%	**-0.50**	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	**-0.62**	DESCUENTO
18.15	2.40	N/A	1	33%	**14.37**	HABITACIÓN 310
1.95	2.10	N/A	1	33%	**1.35**	HABITACIÓN 310 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	33%	**-0.64**	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	**-0.83**	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	33%	**-0.50**	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	**-0.62**	DESCUENTO
17.95	2.40	N/A	1	33%	**14.22**	HABITACIÓN 311
1.95	2.10	N/A	1	33%	**1.35**	HABITACIÓN 311 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	33%	**-0.64**	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	33%	**-0.50**	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	**-0.62**	DESCUENTO
18.78	2.10	N/A	1	33%	**13.01**	HABITACIÓN 312
1.95	2.10	N/A	1	33%	**1.35**	HABITACIÓN 312 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	33%	**-0.64**	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	33%	**-0.50**	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	**-0.62**	DESCUENTO
21.42	2.40	N/A	1	33%	**16.96**	HABITACIÓN 313
1.95	2.10	N/A	1	33%	**1.35**	HABITACIÓN 313 - CLOSET
1.20	1.50	N/A	-1	33%	**-0.59**	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	33%	**-0.50**	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	**-0.83**	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	**-0.62**	DESCUENTO
18.33	2.40	N/A	1	33%	**14.52**	HABITACIÓN 314
1.95	2.10	N/A	1	33%	**1.35**	HABITACIÓN 314 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	33%	**-0.64**	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	**-0.83**	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	33%	**-0.50**	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	**-0.62**	DESCUENTO
18.42	2.40	N/A	1	33%	**14.59**	HABITACIÓN 315
1.95	2.10	N/A	1	33%	**1.35**	HABITACIÓN 315 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	33%	**-0.64**	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	**-0.83**	DESCUENTO
0.45	2.00	N/A	-1	33%	**-0.30**	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	**-0.62**	DESCUENTO
18.02	2.40	N/A	1	33%	**14.27**	HABITACIÓN 316
1.95	2.10	N/A	1	33%	**1.35**	HABITACIÓN 316 - CLOSET
1.20	2.10	N/A	-1	33%	**-0.83**	DESCUENTO
0.95	1.45	N/A	-1	33%	**-0.45**	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	33%	**-0.50**	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	**-0.62**	DESCUENTO
18.37	2.40	N/A	1	33%	**14.55**	HABITACIÓN 317
1.95	2.10	N/A	1	33%	**1.35**	HABITACIÓN 317 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	33%	**-0.64**	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	**-0.83**	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	33%	**-0.50**	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	**-0.62**	DESCUENTO
18.28	2.40	N/A	1	33%	**14.48**	HABITACIÓN 318
1.95	2.10	N/A	1	33%	**1.35**	HABITACIÓN 318 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	33%	**-0.64**	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	**-0.83**	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	33%	**-0.50**	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	**-0.62**	DESCUENTO
18.35	2.40	N/A	1	33%	**14.53**	HABITACIÓN 319
1.95	2.10	N/A	1	33%	**1.35**	HABITACIÓN 319 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	33%	**-0.64**	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	**-0.83**	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	33%	**-0.50**	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	**-0.62**	DESCUENTO
18.38	2.40	N/A	1	33%	**14.56**	HABITACIÓN 320
1.95	2.10	N/A	1	33%	**1.35**	HABITACIÓN 320 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	33%	**-0.64**	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	**-0.83**	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	33%	**-0.50**	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	**-0.62**	DESCUENTO
18.21	2.40	N/A	1	33%	**14.42**	HABITACIÓN 321
1.95	2.10	N/A	1	33%	**1.35**	HABITACIÓN 321 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	33%	**-0.64**	DESCUENTO









1.20	2.10	N/A	-1	33%	-0.83	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	33%	-0.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO
17.96	2.40	N/A	1	33%	14.22	HABITACIÓN 322
1.95	2.10	N/A	1	33%	1.35	HABITACIÓN 322 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	33%	-0.64	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	-0.83	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	33%	-0.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO
18.48	2.40	N/A	1	33%	14.64	HABITACIÓN 323
1.95	2.10	N/A	1	33%	1.35	HABITACIÓN 323 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	33%	-0.64	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	-0.83	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	33%	-0.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO
18.01	2.40	N/A	1	33%	14.26	HABITACIÓN 324
1.95	2.10	N/A	1	33%	1.35	HABITACIÓN 324 - CLOSET
0.95	0.90	N/A	-1	33%	-0.28	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	-0.83	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	33%	-0.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO
18.18	2.40	N/A	1	33%	14.40	HABITACIÓN 325
1.95	2.10	N/A	1	33%	1.35	HABITACIÓN 325 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	33%	-0.64	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	33%	-0.50	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	-0.83	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO
5.10	2.40	N/A	1	33%	4.04	ZONA TRABAJO NORTE
7.91	0.85	N/A	1	33%	2.22	
83.05	2.40	N/A	1	33%	65.78	CIRCULACIÓN HABITACIONES
1.20	2.10	N/A	-25	33%	-20.79	DESCUENTO
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO
0.80	0.80	N/A	-3	33%	-0.63	DESCUENTO GABINETE
0.33	0.25	N/A	-2	33%	-0.05	DESCUENTO CAJA CORTE GASES
13.90	1.05	N/A	1	33%	4.82	CENTRAL ENFERMERIA
5.14	2.40	N/A	1	33%	4.07	
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO
8.78	2.40	N/A	1	33%	6.95	TRABAJO LIMPIO
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO
3.41	2.40	N/A	1	33%	2.70	ROPA LIMPIA
0.70	2.10	N/A	-1	33%	-0.49	DESCUENTO
5.86	2.40	N/A	1	33%	4.64	TRABAJO SUCIO
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO
11.69	2.40	N/A	1	33%	9.26	PROCEDIMIENTOS
1.40	2.10	N/A	-1	33%	-0.97	DESCUENTO
11.28	2.40	N/A	1	33%	8.93	DESCANSO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO
1.30	1.50	N/A	-1	33%	-0.64	DESCUENTO
27.87	2.40	N/A	1	33%	22.07	CIRCULACIÓN RESTRINGIDA
1.20	1.50	N/A	-1	33%	-0.59	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO
1.30	2.10	N/A	-1	33%	-0.90	DESCUENTO
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO
1.40	2.10	N/A	-1	33%	-0.97	DESCUENTO
0.83	0.83	N/A	-1	33%	-0.23	DESCUENTO GABINTE
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO
4.58	2.60	N/A	1	33%	3.93	SALIDA BALCON SUR
6.28	0.85	N/A	1	33%	1.76	BALCON SUR
2.10	2.40	N/A	1	33%	1.66	ROPA LIMPIA
4.68	2.40	N/A	1	33%	3.71	RESIDUOS ORDINARIOS
0.75	2.10	N/A	-1	33%	-0.52	DESCUENTO
4.02	2.40	N/A	1	33%	3.18	RESIDUOS PELIGROSOS
0.75	2.10	N/A	-1	33%	-0.52	DESCUENTO
14.35	2.40	N/A	1	33%	11.37	PASILLO ACCESO
0.75	2.10	N/A	-2	33%	-1.04	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-3	33%	-1.87	DESCUENTO
0.75	2.40	N/A	-1	33%	-0.59	DESCUENTO
23.10	2.40	N/A	1	33%	18.30	HALL
6.35	1.45	N/A	-1	33%	-3.04	DESCUENTO
3.45	1.45	N/A	-1	33%	-1.65	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	-0.83	DESCUENTO
1.05	1.66	N/A	-1	33%	-0.58	DESCUENTO
1.00	2.10	N/A	-1	33%	-0.69	DESCUENTO
12.36	2.40	N/A	1	33%	9.79	COORDINACIÓN
1.05	2.66	N/A	-1	33%	-0.92	DESCUENTO
1.00	2.10	N/A	-1	33%	-0.69	DESCUENTO
1.66	1.47	N/A	-1	33%	-0.81	DESCUENTO
0.78	1.47	N/A	-1	33%	-0.38	DESCUENTO
		PISO 4				
17.84	2.40	N/A	1	33%	14.13	HABITACIÓN 401
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO
1.00	1.45	N/A	-1	33%	-0.48	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	33%	-0.50	DESCUENTO
1.94	2.10	N/A	1	33%	1.34	HABITACIÓN 401 - CLOSET
18.17	2.40	N/A	1	33%	14.39	HABITACIÓN 402
1.90	2.10	N/A	1	33%	1.32	HABITACIÓN 402 - CLOSET
1.20	2.10	N/A	-1	33%	-0.83	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	33%	-0.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO
0.95	0.95	N/A	-1	33%	-0.30	DESCUENTO
18.43	2.40	N/A	1	33%	14.60	HABITACIÓN 403
1.95	2.10	N/A	1	33%	1.35	HABITACIÓN 403 - CLOSET
0.75	2.00	N/A	-1	33%	-0.50	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	-0.83	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO
1.30	1.50	N/A	-1	33%	-0.64	DESCUENTO
26.42	2.40	N/A	1	33%	20.92	HABITACIÓN 404
1.95	2.10	N/A	1	33%	1.35	HABITACIÓN 404 - CLOSET
0.75	2.00	N/A	-1	33%	-0.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	-0.83	DESCUENTO
1.30	1.50	N/A	-1	33%	-0.64	DESCUENTO
18.61	2.40	N/A	1	33%	14.74	HABITACIÓN 405
1.95	2.10	N/A	1	33%	1.35	HABITACIÓN 405 - CLOSET
0.75	2.00	N/A	-1	33%	-0.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO
1.30	1.50	N/A	-1	33%	-0.64	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	-0.83	DESCUENTO
27.02	2.40	N/A	1	33%	21.40	HABITACIÓN 406
1.95	2.10	N/A	1	33%	1.35	HABITACIÓN 406 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	33%	-0.64	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	-0.83	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	33%	-0.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO
18.49	2.40	N/A	1	33%	14.64	HABITACIÓN 407
1.95	2.10	N/A	1	33%	1.35	HABITACIÓN 407 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	33%	-0.64	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	-0.83	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	33%	-0.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO
23.62	2.40	N/A	1	33%	18.71	HABITACIÓN 408
1.95	2.10	N/A	1	33%	1.35	HABITACIÓN 408 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	33%	-0.64	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	-0.83	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	33%	-0.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO
7.33	2.40	N/A	1	33%	5.81	CUARTO DE EQUIPOS
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO
18.20	2.40	N/A	1	33%	14.41	HABITACIÓN 409
1.95	2.10	N/A	1	33%	1.35	HABITACIÓN 409 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	33%	-0.64	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	-0.83	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	33%	-0.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO
18.15	2.40	N/A	1	33%	14.37	HABITACIÓN 410
1.95	2.10	N/A	1	33%	1.35	HABITACIÓN 410 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	33%	-0.64	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	-0.83	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	33%	-0.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO
17.95	2.40	N/A	1	33%	14.22	HABITACIÓN 411









1.95	2.10	N/A	1	33%	**1.35**	HABITACIÓN 411 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	33%	**-0.64**	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	33%	**-0.50**	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	**-0.62**	DESCUENTO
18.78	2.10	N/A	1	33%	**13.01**	HABITACIÓN 412
1.95	2.10	N/A	1	33%	**1.35**	HABITACIÓN 412 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	33%	**-0.64**	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	33%	**-0.50**	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	**-0.62**	DESCUENTO
21.42	2.40	N/A	1	33%	**16.96**	HABITACIÓN 413
1.95	2.10	N/A	1	33%	**1.35**	HABITACIÓN 413 - CLOSET
1.20	1.50	N/A	-1	33%	**-0.59**	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	33%	**-0.50**	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	**-0.83**	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	**-0.62**	DESCUENTO
18.33	2.40	N/A	1	33%	**14.52**	HABITACIÓN 414
1.95	2.10	N/A	1	33%	**1.35**	HABITACIÓN 414 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	33%	**-0.64**	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	**-0.83**	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	33%	**-0.50**	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	**-0.62**	DESCUENTO
18.42	2.40	N/A	1	33%	**14.59**	HABITACIÓN 415
1.95	2.10	N/A	1	33%	**1.35**	HABITACIÓN 415 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	33%	**-0.64**	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	**-0.83**	DESCUENTO
0.45	2.00	N/A	-1	33%	**-0.30**	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	**-0.62**	DESCUENTO
18.02	2.40	N/A	1	33%	**14.27**	HABITACIÓN 416
1.95	2.10	N/A	1	33%	**1.35**	HABITACIÓN 416 - CLOSET
1.20	2.10	N/A	-1	33%	**-0.83**	DESCUENTO
0.95	1.45	N/A	-1	33%	**-0.45**	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	33%	**-0.50**	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	**-0.62**	DESCUENTO
18.37	2.40	N/A	1	33%	**14.55**	HABITACIÓN 417
1.95	2.10	N/A	1	33%	**1.35**	HABITACIÓN 417 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	33%	**-0.64**	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	**-0.83**	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	33%	**-0.50**	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	**-0.62**	DESCUENTO
18.28	2.40	N/A	1	33%	**14.48**	HABITACIÓN 418
1.95	2.10	N/A	1	33%	**1.35**	HABITACIÓN 418 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	33%	**-0.64**	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	**-0.83**	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	33%	**-0.50**	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	**-0.62**	DESCUENTO
18.35	2.40	N/A	1	33%	**14.53**	HABITACIÓN 419
1.95	2.10	N/A	1	33%	**1.35**	HABITACIÓN 419 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	33%	**-0.64**	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	**-0.83**	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	33%	**-0.50**	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	**-0.62**	DESCUENTO
18.38	2.40	N/A	1	33%	**14.56**	HABITACIÓN 420
1.95	2.10	N/A	1	33%	**1.35**	HABITACIÓN 420 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	33%	**-0.64**	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	**-0.83**	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	33%	**-0.50**	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	**-0.62**	DESCUENTO
18.21	2.40	N/A	1	33%	**14.42**	HABITACIÓN 421
1.95	2.10	N/A	1	33%	**1.35**	HABITACIÓN 421 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	33%	**-0.64**	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	**-0.83**	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	33%	**-0.50**	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	**-0.62**	DESCUENTO
17.96	2.40	N/A	1	33%	**14.22**	HABITACIÓN 422
1.95	2.10	N/A	1	33%	**1.35**	HABITACIÓN 422 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	33%	**-0.64**	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	**-0.83**	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	33%	**-0.50**	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	**-0.62**	DESCUENTO
18.48	2.40	N/A	1	33%	**14.64**	HABITACIÓN 423
1.95	2.10	N/A	1	33%	**1.35**	HABITACIÓN 423 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	33%	**-0.64**	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	**-0.83**	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	33%	**-0.50**	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	**-0.62**	DESCUENTO
18.01	2.40	N/A	1	33%	**14.26**	HABITACIÓN 424
1.95	2.10	N/A	1	33%	**1.35**	HABITACIÓN 424 - CLOSET
0.95	0.90	N/A	-1	33%	**-0.28**	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	**-0.83**	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	33%	**-0.50**	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	**-0.62**	DESCUENTO
18.18	2.40	N/A	1	33%	**14.40**	HABITACIÓN 425
1.95	2.10	N/A	1	33%	**1.35**	HABITACIÓN 425 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	33%	**-0.64**	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	33%	**-0.50**	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	**-0.83**	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	**-0.62**	DESCUENTO
5.10	2.40	N/A	1	33%	**4.04**	ZONA TRABAJO NORTE
7.91	0.85	N/A	1	33%	**2.22**	
83.05	2.40	N/A	1	33%	**65.78**	CIRCULACIÓN HABITACIONES
1.20	2.10	N/A	-25	33%	**-20.79**	DESCUENTO
0.80	2.10	N/A	-1	33%	**-0.55**	DESCUENTO
0.80	0.80	N/A	-3	33%	**-0.63**	DESCUENTO GABINETE
0.33	0.25	N/A	-2	33%	**-0.05**	DESCUENTO CAJA CORTE GASES
13.90	1.05	N/A	1	33%	**4.82**	CENTRAL ENFERMERIA
5.14	2.40	N/A	1	33%	**4.07**	
0.80	2.10	N/A	-1	33%	**-0.55**	DESCUENTO
8.78	2.40	N/A	1	33%	**6.95**	TRABAJO LIMPIO
0.80	2.10	N/A	-1	33%	**-0.55**	DESCUENTO
3.41	2.40	N/A	1	33%	**2.70**	ROPA LIMPIA
0.70	2.10	N/A	-1	33%	**-0.49**	DESCUENTO
5.86	2.40	N/A	1	33%	**4.64**	TRABAJO SUCIO
0.80	2.10	N/A	-1	33%	**-0.55**	DESCUENTO
11.69	2.40	N/A	1	33%	**9.26**	PROCEDIMIENTOS
1.40	2.10	N/A	-1	33%	**-0.97**	DESCUENTO
11.28	2.40	N/A	1	33%	**8.93**	DESCANSO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	**-0.62**	DESCUENTO
1.30	1.50	N/A	-1	33%	**-0.64**	DESCUENTO
27.87	2.40	N/A	1	33%	**22.07**	CIRCULACIÓN RESTRINGIDA
1.20	1.50	N/A	-1	33%	**-0.59**	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	**-0.62**	DESCUENTO
1.30	2.10	N/A	-1	33%	**-0.90**	DESCUENTO
0.80	2.10	N/A	-1	33%	**-0.55**	DESCUENTO
1.40	2.10	N/A	-1	33%	**-0.97**	DESCUENTO
0.83	0.83	N/A	-1	33%	**-0.23**	DESCUENTO GABINTE
0.80	2.10	N/A	-1	33%	**-0.55**	DESCUENTO
4.58	2.60	N/A	1	33%	**3.93**	SALIDA BALCON SUR
6.28	0.85	N/A	1	33%	**1.76**	BALCON SUR
2.10	2.40	N/A	1	33%	**1.66**	ROPA LIMPIA
4.68	2.40	N/A	1	33%	**3.71**	RESIDUOS ORDINARIOS
0.75	2.10	N/A	-1	33%	**-0.52**	DESCUENTO
4.02	2.40	N/A	1	33%	**3.18**	RESIDUOS PELIGROSOS
0.75	2.10	N/A	-1	33%	**-0.52**	DESCUENTO
14.35	2.40	N/A	1	33%	**11.37**	PASILLO ACCESO
0.75	2.10	N/A	-2	33%	**-1.04**	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-3	33%	**-1.87**	DESCUENTO
0.75	2.40	N/A	-1	33%	**-0.59**	DESCUENTO
23.10	2.40	N/A	1	33%	**18.30**	HALL
6.35	1.45	N/A	-1	33%	**-3.04**	DESCUENTO
3.45	1.45	N/A	-1	33%	**-1.65**	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	**-0.83**	DESCUENTO
1.05	1.66	N/A	-1	33%	**-0.58**	DESCUENTO
1.00	2.10	N/A	-1	33%	**-0.69**	DESCUENTO
12.36	2.40	N/A	1	33%	**9.79**	COORDINACIÓN
1.05	2.66	N/A	-1	33%	**-0.92**	DESCUENTO
1.00	2.10	N/A	-1	33%	**-0.69**	DESCUENTO
1.66	1.47	N/A	-1	33%	**-0.81**	DESCUENTO
0.78	1.47	N/A	-1	33%	**-0.38**	DESCUENTO
2.30	1.2	N/A	1	33%	**0.91**	HAB 401
1.70	2.4	N/A	1	33%	**1.35**	PASILLO HAB 401 GABINETE
0.81	0.81	N/A	-1	33%	**-0.22**	DESCUENTO GABINETE
3.20	2.4	N/A	1	33%	**2.53**	HAB 403



1.00	1.5	N/A	1	33%	**0.50**	HAB 405
2.40	2.4	N/A	1	33%	**1.90**	HAB 407
0.94	2.4	N/A	1	33%	**0.74**	HAB 406
1.20	2.4	N/A	1	33%	**0.95**	HAB 409
3.14	2.4	N/A	1	33%	**2.49**	HAB 410
1.00	1.5	N/A	1	33%	**0.50**	HAB 411
2.30	2.4	N/A	1	33%	**1.82**	HAB 412
1.70	2.4	N/A	1	33%	**1.35**	PASILLO HAB 417
0.81	0.81	N/A	-1	33%	**-0.22**	PASILLO HAB 418
1.20	1.5	N/A	1	33%	**0.59**	HAB 414
1.20	1.5	N/A	1	33%	**0.59**	HAB 415
2.04	2.4	N/A	1	33%	**1.62**	HAB 416
2.10	1.4	N/A	1	33%	**0.97**	HAB 417
1.00	1.6	N/A	1	33%	**0.53**	HAB 418
3.08	2.4	N/A	1	33%	**2.44**	HAB 419
1.80	1.5	N/A	1	33%	**0.89**	HAB 420
1.30	1.7	N/A	1	33%	**0.73**	HAB 421
1.30	1.5	N/A	1	33%	**0.64**	HAB 422
1.20	1.5	N/A	1	33%	**0.59**	HAB 423
1.20	1.5	N/A	1	33%	**0.59**	HAB 424
1.60	2.4	N/A	1	33%	**1.27**	PASILLO GABINETE
0.80	0.8	N/A	-1	33%	**-0.21**	GABINETE

OBS

TAL	**3,218.46**	**Metro Cuadrado**
RIOR	**0.00**	**Metro Cuadrado**
CTA	**3,218.46**	**Metro Cuadrado**

Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoria:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	1.06	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	CAP	1.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA	UNIDAD	Metro Cuadrado	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico











Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
FACHADA SUR-OCCIDENTAL						
8.54	10.24	N/A	1	60%	**43.72**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
14.58	10.24	N/A	1	60%	**74.65**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
2	0.38	N/A	-1	60%	**-0.38**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
0.95	0.95	N/A	-1	60%	**-0.45**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.3	1.3	N/A	-1	60%	**-0.85**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
2.65	2.5	N/A	-1	60%	**-3.31**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.27	1.3	N/A	-1	60%	**-0.83**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.27	1.3	N/A	-1	60%	**-0.83**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.27	1.3	N/A	-1	60%	**-0.83**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.27	1.3	N/A	-1	60%	**-0.83**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.27	1.3	N/A	-1	60%	**-0.83**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.27	1.3	N/A	-1	60%	**-0.83**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.89	1.27	N/A	-1	60%	**-1.20**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
0.98	0.95	N/A	-1	60%	**-0.47**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.3	1.28	N/A	-1	60%	**-0.83**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.3	1.23	N/A	-1	60%	**-0.80**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.4	1.29	N/A	-1	60%	**-0.90**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1	0.7	N/A	-1	60%	**-0.35**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.04	1.29	N/A	-1	60%	**-0.67**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
0.94	1.28	N/A	-1	60%	**-0.60**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.3	1.28	N/A	-1	60%	**-0.83**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.19	1.35	N/A	-1	60%	**-0.80**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
3.34	1.35	N/A	-1	60%	**-2.25**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
2.55	2.24	N/A	-1	60%	**-2.86**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
3.02	2.24	N/A	-1	60%	**-3.38**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.3	1.35	N/A	-1	60%	**-0.88**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
16.2	10	N/A	1	60%	**81.00**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
6.9	10.24	N/A	1	60%	**35.33**	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.3	1.3	N/A	-2	60%	**-1.69**	DESCUENTO NOR OCCIDENTE VENTANA
1.02	0.93	N/A	-1	60%	**-0.47**	DESCUENTO SUR OCCIDENTE VENTANA
0.5	1.03	N/A	-1	60%	**-0.26**	DESCUENTO SUR OCCIDENTE VENTANA
0.68	1.3	N/A	-1	60%	**-0.44**	DESCUENTO SUR OCCIDENTE VENTANA
1.9	0.7	N/A	-2	60%	**-1.33**	DESCUENTO SUR OCCIDENTE VENTANA
0.93	0.295	N/A	-1	60%	**-0.14**	DESCUENTO SUR OCCIDENTE VENTANA
4.8	1.3	N/A	-1	60%	**-3.12**	DESCUENTO NOR OCCIDENTE VENTANA
3.01	2.4	N/A	-1	60%	**-3.61**	DESCUENTO NOR OCCIDENTE VENTANA
3.01	2.4	N/A	-1	60%	**-3.61**	DESCUENTO SUR OCCIDENTE VENTANA
0.8	0.7	N/A	-2	60%	**-0.56**	DESCUENTO SUR OCCIDENTE VENTANA
0.7	0.67	N/A	-1	60%	**-0.23**	DESCUENTO SUR OCCIDENTE VENTANA
1.16	0.68	N/A	-1	60%	**-0.39**	DESCUENTO SUR OCCIDENTE VENTANA
FACHADA NOR-OCCIDENTAL						
20.36	10.24	N/A	1	60%	**104.24**	FACHADA NOR OCCIDENTAL
3.03	2.4	N/A	-1	60%	**-3.64**	DESCUENTO VENTANA NOR OCCIDENTAL
3.01	2.4	N/A	-1	60%	**-3.61**	DESCUENTO VENTANA NOR OCCIDENTAL
3.01	2.4	N/A	-1	60%	**-3.61**	DESCUENTO VENTANA NOR OCCIDENTAL
1.33	0.68	N/A	-1	60%	**-0.45**	DESCUENTO VENTANA NOR OCCIDENTAL
3.25	0.68	N/A	-1	60%	**-1.11**	DESCUENTO VENTANA NOR OCCIDENTAL
3.06	0.68	N/A	-1	60%	**-1.04**	DESCUENTO VENTANA NOR OCCIDENTAL
3.04	0.68	N/A	-1	60%	**-1.03**	DESCUENTO VENTANA NOR OCCIDENTAL
3.1	0.68	N/A	-1	60%	**-1.05**	DESCUENTO VENTANA NOR OCCIDENTAL
3.05	0.7	N/A	-1	60%	**-1.07**	DESCUENTO VENTANA NOR OCCIDENTAL
3.05	0.7	N/A	-1	60%	**-1.07**	DESCUENTO VENTANA NOR OCCIDENTAL
3.05	0.7	N/A	-1	60%	**-1.07**	DESCUENTO VENTANA NOR OCCIDENTAL
3.05	0.7	N/A	-1	60%	**-1.07**	DESCUENTO VENTANA NOR OCCIDENTAL
FACHADA SUR						
14.5	5.76	N/A	1	60%	**41.76**	FACHADA SUR
12.86	4.21	N/A	1	60%	**27.07**	FACHADA SUR AL LADO LUDOTECA
2.14	2.9	N/A	1	60%	**3.10**	FACHADA SUR AL LADO LUDOTECA
15.41	7.25	N/A	1	60%	**55.86**	FACHADA SUR AL LADO LUDOTECA
3.23	0.2	N/A	-1	60%	**-0.32**	DESCUENTO SUR VENTANA
3.29	0.2	N/A	-1	60%	**-0.33**	DESCUENTO SUR VENTANA
1.2	1.8	N/A	-1	60%	**-1.08**	DESCUENTO SUR VENTANA
0.8	2.1	N/A	-1	60%	**-0.84**	DESCUENTO SUR VENTANA
2	1.2	N/A	-1	60%	**-1.20**	DESCUENTO SUR VENTANA
1.3	1.5	N/A	-3	60%	**-2.93**	DESCUENTO SUR VENTANA
0.71	1.2	N/A	-1	60%	**-0.43**	DESCUENTO SUR VENTANA
0.84	1.98	N/A	-1	60%	**-0.83**	DESCUENTO SUR VENTANA
0.84	1.98	N/A	-1	60%	**-0.83**	DESCUENTO SUR VENTANA
1.2	1.2	N/A	-2	60%	**-1.44**	DESCUENTO SUR VENTANA
0.84	1.98	N/A	-1	60%	**-0.83**	DESCUENTO SUR VENTANA
0.84	1.98	N/A	-1	60%	**-0.83**	DESCUENTO SUR VENTANA
0.94	0.95	N/A	-1	60%	**-0.45**	DESCUENTO SUR VENTANA
6.45	5.96	N/A	-1	60%	**-19.22**	DESCUENTO PUERTA PRICIPAL
1.3	1.3	N/A	-1	60%	**-0.85**	DESCUENTO VENTANA SUR
1.3	1.3	N/A	-1	60%	**-0.85**	DESCUENTO VENTANA SUR
0.91	1.3	N/A	-1	60%	**-0.59**	DESCUENTO VENTANA SUR
1.3	1.3	N/A	-1	60%	**-0.85**	DESCUENTO VENTANA SUR
1.3	1.3	N/A	-1	60%	**-0.85**	DESCUENTO VENTANA SUR
0.92	1.1	N/A	-1	60%	**-0.51**	DESCUENTO VENTANA SUR
0.9	1.1	N/A	-1	60%	**-0.50**	DESCUENTO VENTANA SUR
1.3	1.1	N/A	-1	60%	**-0.72**	DESCUENTO VENTANA SUR
1.3	1.1	N/A	-1	60%	**-0.72**	DESCUENTO VENTANA SUR
1.3	1.29	N/A	-1	60%	**-0.84**	DESCUENTO VENTANA SUR
13.26	5.7	N/A	1	60%	**37.79**	ENTRE: PISOS 1 - 2 Y EJES 1 - 3
0.5	0.5	N/A	-1	60%	**-0.13**	DESCUENTO: (PISO 1) VENTANA 34
0.5	0.5	N/A	-1	60%	**-0.13**	DESCUENTO: (PISO 1) VENTANA 35
1.22	0.55	N/A	-1	60%	**-0.34**	DESCUENTO: (PISO 1) VENTANA 36
0.48	0.48	N/A	-1	60%	**-0.12**	DESCUENTO: (PISO 2) VENTANA 1
1.2	1.3	N/A	-1	60%	**-0.78**	DESCUENTO: (PISO 2) VENTANA 2
0.98	0.8	N/A	-1	60%	**-0.39**	DESCUENTO: (PISO 2) VENTANA 3
0.96	0.96	N/A	-1	60%	**-0.46**	DESCUENTO: (PISO 2) VENTANA 1'
8.25	4.2	N/A	1	60%	**17.33**	FACHADA SUR
2.3	2.25	N/A	-1	60%	**-2.59**	DESCUENTO VENTANA
4.78	2.25	N/A	-1	60%	**-5.38**	DESCUENTO VENTANA
4.38	7.2	N/A	1	60%	**15.77**	FACHADA SUR
0.97	0.97	N/A	-1	60%	**-0.47**	DESCUENTO VENTANA
1.62	3	N/A	1	60%	**2.43**	FACHADA SUR
2.8	3.8	N/A	1	60%	**5.32**	FACHADA SUR
FACHADA NORTE						
6.05	4.39	N/A	1	60%	**13.28**	FACHADA NORTE
3.82	5.58	N/A	1	60%	**10.66**	FACHADA NORTE
2.35	3.82	N/A	-1	60%	**-4.49**	DESCUENTO VENTANA
5.59	5.79	N/A	1	60%	**16.18**	FACHADA NORTE
4.49	13.32	N/A	1	60%	**29.90**	FACHADA NORTE
4.46	5.04	N/A	1	60%	**11.24**	FACHADA NORTE
3.52	0.5	N/A	-1	60%	**-0.88**	DESCUENTO VENTANA
3.52	0.5	N/A	-1	60%	**-0.88**	DESCUENTO VENTANA
3.28	0.5	N/A	-1	60%	**-0.82**	DESCUENTO VENTANA
4.13	0.92	N/A	-1	60%	**-1.90**	DESCUENTO PUERTA
7	7.1	N/A	1	60%	**24.85**	FACHADA NORTE
7	1.83	N/A	-1	60%	**-6.41**	DESCUENTO VENTANA
7	1.83	N/A	-1	60%	**-6.41**	DESCUENTO VENTANA
11.41	4.43	N/A	1	60%	**25.27**	FACHADA ENTRADA URGENCIAS
0.95	0.95	N/A	-1	60%	**-0.45**	DESCUENTO VENTANAS PISO 2





FACHADA ORIENTAL						
3.52	8.73	N/A	1	**60%**	**15.36**	FACHADA ORIENTAL
3.01	2.4	N/A	-1	**60%**	**-3.61**	DESCUENTO VENTANA
3.01	0.68	N/A	-1	**60%**	**-1.02**	DESCUENTO VENTANA
3.05	0.7	N/A	-1	**60%**	**-1.07**	DESCUENTO VENTANA
20.11	15.35	N/A	1	**60%**	**154.34**	FACHADA ORIENTAL
0.70	6.00	N/A	1	**60%**	**4.20**	FACHADA NORTE
1.30	1.30	N/A	-3	**60%**	**-2.54**	DESCUENTO VENTANAS PISO 1
0.45	0.95	N/A	-1	**60%**	**-0.21**	DESCUENTO VENTANAS PISO 1
1.30	1.30	N/A	-3	**60%**	**-2.54**	DESCUENTO VENTANAS PISO 2
0.45	0.95	N/A	-1	**60%**	**-0.21**	DESCUENTO VENTANAS PISO 2
1.30	1.30	N/A	-3	**60%**	**-2.54**	DESCUENTO VENTANAS PISO 3
2.24	0.50	N/A	-3	**60%**	**-1.68**	DESCUENTO VENTANAS PISO 4
0.40	2.00	N/A	-1	**60%**	**-0.40**	DESCUENTO VENTANAS PISO 5
22.82	15.3	N/A	1	**60%**	**174.57**	FACHADA ORIENTAL - ENTRE EJES A' - E
1.3	1.5	N/A	-19	**60%**	**-18.53**	DESCUENTO VENTANA 1
0.95	0.95	N/A	-6	**60%**	**-2.71**	DESCUENTO VENTANA 2
0.95	1.5	N/A	-2	**60%**	**-1.43**	DESCUENTO VENTANA 3
0.9	1.5	N/A	-1	**60%**	**-0.68**	DESCUENTO VENTANA 4
0.56	0.3	N/A	-7	**60%**	**-0.59**	DESCUENTO VENTANA 5
2	0.37	N/A	-2	**60%**	**-0.74**	DESCUENTO VENTANA 6
1.2	0.37	N/A	-2	**60%**	**-0.44**	DESCUENTO VENTANA 7
FACHADA TERRAZA 3ER NIVEL (CIRCULACIÓN EXTERIOR)						
21.4	4.1	N/A	1	**60%**	**43.87**	FACHADA CIRCULACION 3ER NIVEL
2.5	0.7	N/A	-5	**60%**	**-4.38**	DESCUENTO VENTANA
21.4	7.1	N/A	1	**60%**	**75.97**	FACHADA CIRCULACION 3ER NIVEL
1.3	1.5	N/A	-6	**60%**	**-5.85**	DESCUENTO VENTANA
0.85	2	N/A	-6	**60%**	**-5.10**	DESCUENTO PUERTA
1.2	1.2	N/A	-6	**60%**	**-4.32**	DESCUENTO VENTANA
FACHADA QUINTO PISO (TERRAZA)						
5.45	4.1	N/A	1	**60%**	**13.41**	CUARTO DE MAQUINAS - FACHADA NORTE
6.6	1.47	N/A	1	**60%**	**5.82**	CUARTO DE MAQUINAS - FACHADA NORTE
5.45	2.6	N/A	1	**60%**	**8.50**	CUARTO DE MAQUINAS - FACHADA NORTE
1.23	2.3	N/A	-1	**60%**	**-1.70**	DESCUENTO ESCALERA AZOTEA
0.92	0.94	N/A	-1	**60%**	**-0.52**	DESCUENTO VENTANA
0.9	2.24	N/A	-1	**60%**	**-1.21**	DESCUENTO PUERTA MAQUINA
142.8	0.74	N/A	1	**60%**	**63.40**	ANTEPECHO PERIMETRAL
68.9	0.8	N/A	1	**60%**	**33.07**	ANTEPECHO PERIMETRAL - AZOTEA CUARTO MAQUINA
7.74	2.65	N/A	1	**60%**	**12.31**	CUARTO DE MAQUINAS - FACHADA ORIENTAL
1.50	2.10	N/A	-1	**60%**	**-1.89**	DESCUENTO PUERTA
8.85	1.47	N/A	1	**60%**	**7.81**	ANTEPECHO EXTERIOR - FACHADA ORIENTAL
142.8	0.74	N/A	1	**100%**	**105.67**	ANTEPECHO PERIMETRAL
68.9	0.8	N/A	1	**100%**	**55.12**	ANTEPECHO PERIMETRAL - AZOTEA CUARTO MAQUINA

OBSERVACIONES:

TOTAL	**1,250.07**	**Metro Cuadrado**
ACUMULADO ANTERIOR	**400.95**	**Metro Cuadrado**
PRESENTE ACTA	**849.12**	**Metro Cuadrado**

Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	1.07	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES ANCHOS MENORES DE 0,6 M	CAP	1.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA	UNIDAD	Metro lineal		UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico











Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
FACHADA SUR-OCCIDENTAL						
2	N/A	N/A	1	60%	1.20	FACHADA SUR OCCIDENTAL
0.95	N/A	N/A	1	60%	0.57	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.3	N/A	N/A	1	60%	0.78	FACHADA SUR OCCIDENTAL
2.65	N/A	N/A	1	60%	1.59	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.27	N/A	N/A	1	60%	0.76	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.27	N/A	N/A	1	60%	0.76	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.27	N/A	N/A	1	60%	0.76	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.27	N/A	N/A	1	60%	0.76	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.27	N/A	N/A	1	60%	0.76	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.27	N/A	N/A	1	60%	0.76	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.89	N/A	N/A	1	60%	1.13	FACHADA SUR OCCIDENTAL
0.98	N/A	N/A	1	60%	0.59	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.3	N/A	N/A	1	60%	0.78	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.3	N/A	N/A	1	60%	0.78	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.4	N/A	N/A	1	60%	0.84	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1	N/A	N/A	1	60%	0.60	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.04	N/A	N/A	1	60%	0.62	FACHADA SUR OCCIDENTAL
0.94	N/A	N/A	1	60%	0.56	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.3	N/A	N/A	1	60%	0.78	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.19	N/A	N/A	1	60%	0.71	FACHADA SUR OCCIDENTAL
3.34	N/A	N/A	1	60%	2.00	FACHADA SUR OCCIDENTAL
2.55	N/A	N/A	1	60%	1.53	FACHADA SUR OCCIDENTAL
3.02	N/A	N/A	1	60%	1.81	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.3	N/A	N/A	1	60%	0.78	FACHADA SUR OCCIDENTAL
0.38	N/A	N/A	1	60%	0.23	FACHADA SUR OCCIDENTAL
0.95	N/A	N/A	1	60%	0.57	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.3	N/A	N/A	1	60%	0.78	FACHADA SUR OCCIDENTAL
2.5	N/A	N/A	1	60%	1.50	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.3	N/A	N/A	1	60%	0.78	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.3	N/A	N/A	1	60%	0.78	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.3	N/A	N/A	1	60%	0.78	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.3	N/A	N/A	1	60%	0.78	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.3	N/A	N/A	1	60%	0.78	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.3	N/A	N/A	1	60%	0.78	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.27	N/A	N/A	1	60%	0.76	FACHADA SUR OCCIDENTAL
0.95	N/A	N/A	1	60%	0.57	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.28	N/A	N/A	1	60%	0.77	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.23	N/A	N/A	1	60%	0.74	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.29	N/A	N/A	1	60%	0.77	FACHADA SUR OCCIDENTAL
0.7	N/A	N/A	1	60%	0.42	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.29	N/A	N/A	1	60%	0.77	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.28	N/A	N/A	1	60%	0.77	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.28	N/A	N/A	1	60%	0.77	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.35	N/A	N/A	1	60%	0.81	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.35	N/A	N/A	1	60%	0.81	FACHADA SUR OCCIDENTAL
2.24	N/A	N/A	1	60%	1.34	FACHADA SUR OCCIDENTAL
2.24	N/A	N/A	1	60%	1.34	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.35	N/A	N/A	1	60%	0.81	FACHADA SUR OCCIDENTAL
FACHADA NOR-OCCIDENTAL						
3.03	N/A	N/A	1	60%	1.82	VENTANA NOR OCCIDENTAL
3.01	N/A	N/A	1	60%	1.81	VENTANA NOR OCCIDENTAL
3.01	N/A	N/A	1	60%	1.81	VENTANA NOR OCCIDENTAL
1.33	N/A	N/A	1	60%	0.80	VENTANA NOR OCCIDENTAL
3.25	N/A	N/A	1	60%	1.95	VENTANA NOR OCCIDENTAL
3.06	N/A	N/A	1	60%	1.84	VENTANA NOR OCCIDENTAL
3.04	N/A	N/A	1	60%	1.82	VENTANA NOR OCCIDENTAL
3.1	N/A	N/A	1	60%	1.86	VENTANA NOR OCCIDENTAL
3.05	N/A	N/A	1	60%	1.83	VENTANA NOR OCCIDENTAL
3.05	N/A	N/A	1	60%	1.83	VENTANA NOR OCCIDENTAL
3.05	N/A	N/A	1	60%	1.83	VENTANA NOR OCCIDENTAL
3.05	N/A	N/A	1	60%	1.83	VENTANA NOR OCCIDENTAL
2.4	N/A	N/A	1	60%	1.44	VENTANA NOR OCCIDENTAL
2.4	N/A	N/A	1	60%	1.44	VENTANA NOR OCCIDENTAL
2.4	N/A	N/A	1	60%	1.44	VENTANA NOR OCCIDENTAL
0.68	N/A	N/A	1	60%	0.41	VENTANA NOR OCCIDENTAL
0.68	N/A	N/A	1	60%	0.41	VENTANA NOR OCCIDENTAL
0.68	N/A	N/A	1	60%	0.41	VENTANA NOR OCCIDENTAL
0.68	N/A	N/A	1	60%	0.41	VENTANA NOR OCCIDENTAL
0.68	N/A	N/A	1	60%	0.41	VENTANA NOR OCCIDENTAL
0.7	N/A	N/A	1	60%	0.42	VENTANA NOR OCCIDENTAL
0.7	N/A	N/A	1	60%	0.42	VENTANA NOR OCCIDENTAL
0.7	N/A	N/A	1	60%	0.42	VENTANA NOR OCCIDENTAL
0.7	N/A	N/A	1	60%	0.42	VENTANA NOR OCCIDENTAL
FACHADA OCCIDENTAL						
1.3	N/A	N/A	2	60%	1.56	FACHADA OCCIDENTAL
0.93	N/A	N/A	2	60%	1.12	FACHADA OCCIDENTAL
1.03	N/A	N/A	2	60%	1.24	FACHADA OCCIDENTAL
1.3	N/A	N/A	2	60%	1.56	FACHADA OCCIDENTAL
0.7	N/A	N/A	2	60%	0.84	FACHADA OCCIDENTAL
0.295	N/A	N/A	2	60%	0.35	FACHADA OCCIDENTAL
1.3	N/A	N/A	2	60%	1.56	FACHADA OCCIDENTAL
2.4	N/A	N/A	2	60%	2.88	FACHADA OCCIDENTAL
2.4	N/A	N/A	2	60%	2.88	FACHADA OCCIDENTAL
0.7	N/A	N/A	8	60%	3.36	FACHADA OCCIDENTAL
0.67	N/A	N/A	2	60%	0.80	FACHADA OCCIDENTAL
0.68	N/A	N/A	2	60%	0.82	FACHADA OCCIDENTAL
5.2	N/A	N/A	1	60%	3.12	ALFAJIA OCCIDENTAL
6.9	N/A	N/A	1	60%	4.14	ALFAJIA OCCIDENTAL
9.3	N/A	N/A	1	60%	5.58	ALFAJIA OCCIDENTAL
20.36	N/A	N/A	1	60%	12.22	ALFAJIA OCCIDENTAL
FACHADA SUR						
1.3	N/A	N/A	4	60%	3.12	FACHADA SUR
1.02	N/A	N/A	2	60%	1.22	FACHADA SUR
0.5	N/A	N/A	2	60%	0.60	FACHADA SUR
0.68	N/A	N/A	2	60%	0.82	FACHADA SUR
1.9	N/A	N/A	4	60%	4.56	FACHADA SUR
0.93	N/A	N/A	2	60%	1.12	FACHADA SUR
4.8	N/A	N/A	2	60%	5.76	FACHADA SUR
3.01	N/A	N/A	2	60%	3.61	FACHADA SUR
3.01	N/A	N/A	2	60%	3.61	FACHADA SUR
0.8	N/A	N/A	4	60%	1.92	FACHADA SUR
0.7	N/A	N/A	4	60%	1.68	FACHADA SUR
1.16	N/A	N/A	2	60%	1.39	FACHADA SUR
1.3	N/A	N/A	1	60%	0.78	VENTANA SUR
1.3	N/A	N/A	1	60%	0.78	VENTANA SUR
0.91	N/A	N/A	1	60%	0.55	VENTANA SUR
1.3	N/A	N/A	1	60%	0.78	VENTANA SUR
1.3	N/A	N/A	1	60%	0.78	VENTANA SUR
0.92	N/A	N/A	1	60%	0.55	VENTANA SUR
0.9	N/A	N/A	1	60%	0.54	VENTANA SUR
1.3	N/A	N/A	1	60%	0.78	VENTANA SUR









1.3	N/A	N/A	1	60%	0.78	VENTANA SUR
1.3	N/A	N/A	1	60%	0.78	VENTANA SUR
1.3	N/A	N/A	1	60%	0.78	VENTANA SUR
1.3	N/A	N/A	1	60%	0.78	VENTANA SUR
1.3	N/A	N/A	1	60%	0.78	VENTANA SUR
1.3	N/A	N/A	1	60%	0.78	VENTANA SUR
1.3	N/A	N/A	1	60%	0.78	VENTANA SUR
1.1	N/A	N/A	1	60%	0.66	VENTANA SUR
1.1	N/A	N/A	1	60%	0.66	VENTANA SUR
1.1	N/A	N/A	1	60%	0.66	VENTANA SUR
1.1	N/A	N/A	1	60%	0.66	VENTANA SUR
1.29	N/A	N/A	1	60%	0.77	VENTANA SUR
5.72	N/A	N/A	2	60%	6.86	FACHADA SUR AL LADO DE LUDOTECA
3.23	N/A	N/A	2	60%	3.88	FACHADA SUR AL LADO DE LUDOTECA
0.2	N/A	N/A	1	60%	0.12	FACHADA SUR AL LADO DE LUDOTECA
2	N/A	N/A	1	60%	1.20	FACHADA SUR AL LADO DE LUDOTECA
1.2	N/A	N/A	2	60%	1.44	FACHADA SUR AL LADO DE LUDOTECA
1.8	N/A	N/A	1	60%	1.08	FACHADA SUR AL LADO DE LUDOTECA
2.1	N/A	N/A	1	60%	1.26	FACHADA SUR AL LADO DE LUDOTECA
0.8	N/A	N/A	1	60%	0.48	FACHADA SUR AL LADO DE LUDOTECA
7.25	N/A	N/A	1	60%	4.35	FACHADA SUR AL LADO DE LUDOTECA
1.5	N/A	N/A	3	60%	2.70	FACHADA SUR AL LADO DE LUDOTECA
2	N/A	N/A	3	60%	3.60	FACHADA SUR AL LADO DE LUDOTECA
1.2	N/A	N/A	5	60%	3.60	FACHADA SUR AL LADO DE LUDOTECA
0.84	N/A	N/A	1	60%	0.50	FACHADA SUR AL LADO DE LUDOTECA
2.27	N/A	N/A	2	60%	2.72	FACHADA SUR AL LADO DE LUDOTECA
7.25	N/A	N/A	1	60%	4.35	FACHADA SUR AL LADO DE LUDOTECA
6.59	N/A	N/A	1	60%	3.95	FACHADA SUR AL LADO DE LUDOTECA
2.99	N/A	N/A	1	60%	1.79	FACHADA SUR AL LADO DE LUDOTECA
5.7	N/A	N/A	7	60%	23.94	ENTRE PISOS 1 - 2 Y EJES 1 - 3: (COLUMNAS)
0.5	N/A	N/A	2	60%	0.60	PISO 1 Y EJES 1 A 3: VENTANA 34 (ALTO)
0.5	N/A	N/A	2	60%	0.60	PISO 1 Y EJES 1 A 3: VENTANA 34 (ANCHO)
0.5	N/A	N/A	2	60%	0.60	PISO 1 Y EJES 1 A 3: VENTANA 35 (ALTO)
0.5	N/A	N/A	2	60%	0.60	PISO 1 Y EJES 1 A 3: VENTANA 35 (ANCHO)
1.22	N/A	N/A	2	60%	1.46	PISO 1 Y EJES 1 A 3: VENTANA 36 (ALTO)
0.55	N/A	N/A	2	60%	0.66	PISO 1 Y EJES 1 A 3: VENTANA 36 (ANCHO)
0.48	N/A	N/A	2	60%	0.58	PISO 2 Y EJES 1 A 3: VENTANA 1 (ALTO)
0.48	N/A	N/A	2	60%	0.58	PISO 2 Y EJES 1 A 3: VENTANA 1 (ANCHO)
1.2	N/A	N/A	2	60%	1.44	PISO 2 Y EJES 1 A 3: VENTANA 2 (ALTO)
1.3	N/A	N/A	2	60%	1.56	PISO 2 Y EJES 1 A 3: VENTANA 2 (ANCHO)
0.98	N/A	N/A	2	60%	1.18	PISO 2 Y EJES 1 A 3: VENTANA 3 (ALTO)
0.8	N/A	N/A	2	60%	0.96	PISO 2 Y EJES 1 A 3: VENTANA 3 (ANCHO)
0.96	N/A	N/A	2	60%	1.15	PISO 2 Y EJES 1 A 3: VENTANA 1' (ALTO)
0.96	N/A	N/A	2	60%	1.15	PISO 2 Y EJES 1 A 3: VENTANA 1' (ANCHO)
4.1	N/A	N/A	3	60%	7.38	FACHADA SUR
1.63	N/A	N/A	12	60%	11.74	FACHADA SUR
4.49	N/A	N/A	1	60%	2.69	FACHADA SUR
4.37	N/A	N/A	1	60%	2.62	FACHADA SUR
3.82	N/A	N/A	1	60%	2.29	FACHADA SUR
2.5	N/A	N/A	10	60%	15.00	FACHADA SUR
0.7	N/A	N/A	10	60%	4.20	FACHADA SUR
1.3	N/A	N/A	12	60%	9.36	FACHADA SUR
1.5	N/A	N/A	12	60%	10.80	FACHADA SUR
1.2	N/A	N/A	18	60%	12.96	FACHADA SUR
2	N/A	N/A	12	60%	14.40	FACHADA SUR
0.85	N/A	N/A	6	60%	3.06	FACHADA SUR
7.2	N/A	N/A	2	60%	8.64	FACHADA SUR
0.97	N/A	N/A	4	60%	2.33	FACHADA SUR
2.8	N/A	N/A	1	60%	1.68	FACHADA SUR
16.2	N/A	N/A	1	66%	10.69	ALFAJIA SUR
5.3	N/A	N/A	1	66%	3.50	ALFAJIA SUR
14.06	N/A	N/A	1	66%	9.28	ALFAJIA SUR
15.41	N/A	N/A	1	66%	10.17	ALFAJIA SUR
8.25	N/A	N/A	1	66%	5.45	ALFAJIA SUR
			FACHADA NORTE			
3.70	N/A	N/A	1	60%	2.22	ENTRADA URGENCIAS
0.95	N/A	N/A	4	60%	2.28	VENTANA URGENCIAS
			FACHADA ORIENTAL			
13.44	N/A	N/A	3	60%	24.19	FACHADA ORIENTAL
2.73	N/A	N/A	1	60%	1.64	FACHADA ORIENTAL
3.00	N/A	N/A	2	60%	3.60	FACHADA ORIENTAL
1.30	N/A	N/A	18	60%	14.04	FAJA VENTANA
0.45	N/A	N/A	2	60%	0.54	FAJA VENTANA
2.24	N/A	N/A	3	60%	4.03	FAJA VENTANA
0.40	N/A	N/A	2	60%	0.48	FAJA VENTANA
0.95	N/A	N/A	2	60%	1.14	FAJA VENTANA
0.50	N/A	N/A	2	60%	0.60	FAJA VENTANA
2.00	N/A	N/A	2	60%	2.40	FAJA VENTANA
15.00	N/A	N/A	5	60%	45.00	FACHADA ENTRE EJES: A' - E: FAJAS DE COLUMNA
3.07	N/A	N/A	8	60%	14.74	FACHADA ENTRE EJES: A' - E: FAJAS DE COLUMNA
2.75	N/A	N/A	2	60%	3.30	FACHADA ENTRE EJES: A' - E: FAJAS DE COLUMNA
1.30	N/A	N/A	19	60%	14.82	FACHADA ENTRE EJES: A' - E: FAJAS DE VENTANA
0.95	N/A	N/A	14	60%	7.98	FACHADA ENTRE EJES: A' - E: FAJAS DE VENTANA
0.90	N/A	N/A	1	60%	0.54	FACHADA ENTRE EJES: A' - E: FAJAS DE VENTANA
0.56	N/A	N/A	7	60%	2.35	FACHADA ENTRE EJES: A' - E: FAJAS DE VENTANA
2.00	N/A	N/A	2	60%	2.40	FACHADA ENTRE EJES: A' - E: FAJAS DE VENTANA
1.20	N/A	N/A	2	60%	1.44	FACHADA ENTRE EJES: A' - E: FAJAS DE VENTANA
1.50	N/A	N/A	22	60%	19.80	FACHADA ENTRE EJES: A' - E: FAJAS DE VENTANA
0.30	N/A	N/A	7	60%	1.26	FACHADA ENTRE EJES: A' - E: FAJAS DE VENTANA
0.37	N/A	N/A	4	60%	0.89	FACHADA ENTRE EJES: A' - E: FAJAS DE VENTANA
20.11	N/A	N/A	1	60%	12.07	ALFAJIA ORIENTAL
2.00	N/A	N/A	1	60%	1.20	ALFAJIA ORIENTAL
22.82	N/A	N/A	1	60%	13.69	ALFAJIA ORIENTAL
1.60	N/A	N/A	1	60%	0.96	ALFAJIA ORIENTAL
			FACHADA QUINTO PISO (TERRAZA)			
2.65	N/A	N/A	2	60%	3.18	CUARTO MAQUINAS - CALDERA
142.8	N/A	N/A	1	60%	85.68	ALFAJIA SOBRE ANTEPECHO PERIMETRAL
12.7	N/A	N/A	1	60%	7.62	ALFAJIA SOBRE ANTEPECHO PERIMETRAL DE
56.2	N/A	N/A	1	60%	33.72	CUARTO MAQUINAS
2.65	N/A	N/A	2	60%	3.18	CUARTO MAQUINAS - CALDERA

OBSERVACIONES:


TOTAL	**720.53**	**Metro lineal**
ACUMULADO ANTERIOR	**178.55**	**Metro lineal**
PRESENTE ACTA	**541.98**	**Metro lineal**


Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	2.01	ENCHAPE CERÁMICA BLANCA 30X60CM	CAP	1.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA	UNIDAD	Metro Cuadrado	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico















Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
PISO 1						
7.34	2.4	N/A	1	100%	17.62	BAÑO PRIMER PISO
0.87	2.02	N/A	-1	100%	-1.76	DESCUENTO
5.29	2.04	N/A	1	100%	10.79	BAÑO PRIMER PISO
0.77	2.02	N/A	-1	100%	-1.56	DESCUENTO
0.87	0.4	N/A	1	100%	0.35	WC FAMILIAR
12.94	2.4	N/A	1	100%	31.06	
0.48	0.48	N/A	-1	100%	-0.23	DESCUENTO: VENTANA
0.9	2.02	N/A	-1	100%	-1.82	DESCUENTO: PUERTA PRINCIPAL
8.1	2.4	N/A	1	100%	19.44	OBS. PEDIATRICA: BAÑO AISLADO
0.9	2.02	N/A	-1	100%	-1.82	DESCUENTO PUERTA
7.71	2.4	N/A	1	100%	18.50	SALA EDA: BAÑO
0.77	2.02	N/A	-1	100%	-1.56	DESCUENTO: PUERTA
5.7	2.4	N/A	1	100%	13.68	SALA ERA: BAÑO
0.89	2.02	N/A	-1	100%	-1.80	DESCUENTO: PUERTA
3.4	2.4	N/A	1	100%	8.16	LAVADO DE PACIENTES
4.32	2.4	N/A	1	100%	10.37	LAVADO DE PACIENTES
1.47	1.03	N/A	1	100%	1.51	LAVADO DE PACIENTES
5.57	2.4	N/A	1	100%	13.37	CONSULTORIO 4
0.76	2	N/A	-1	100%	-1.52	DESCUENTO PUERTAS
5.75	2.4	N/A	1	100%	13.80	CONSULTORIO 1
0.97	2.02	N/A	-1	100%	-1.96	DESCUENTO PUERTAS
5.13	2.4	N/A	1	100%	12.31	CONSULTORIO 2
0.87	0.87	N/A	-1	100%	-0.76	DESCUENTO PUERTAS
6	2.4	N/A	1	100%	14.40	CONSULTORIO 5
2.02	0.87	N/A	-1	100%	-1.76	DESCUENTO PUERTAS
5.71	2.4	N/A	1	100%	13.70	SALA ERA
2.02	0.87	N/A	-1	100%	-1.76	DESCUENTO PUERTAS
9.83	2.4	N/A	1	100%	23.59	W.C MUJERES - SALA ESPERA ADULTOS
0.76	2.02	N/A	-1	100%	-1.54	DESCUENTO PUERTAS
8.04	2.4	N/A	1	100%	19.30	BAÑO PMR - SALA ESPERA ADULTOS
0.98	2.02	N/A	-1	100%	-1.98	DESCUENTO PUERTAS
12.26	2.4	N/A	1	100%	29.42	W.C HOMBRES - SALA ESPERA ADULTOS
0.78	2.02	N/A	-1	100%	-1.58	DESCUENTO PUERTAS
7.85	2.4	N/A	1	100%	18.84	WC MIXTO PMR
0.88	2.04	N/A	-1	100%	-1.80	DESCUENTO PUERTA
5.85	2.1	N/A	1	100%	12.29	WC LABORATORIO
0.76	2.02	N/A	-1	100%	-1.54	DESCUENTO PUERTA
5.71	2.4	N/A	1	100%	13.70	WC ÁREA ADMINISTRATIVA FARMACIA
0.68	2.02	N/A	-1	100%	-1.37	DESCUENTO PUERTA
5.43	2.4	N/A	1	100%	13.03	WC IMAGENOLOGÍA
0.79	2.02	N/A	-1	100%	-1.60	DESCUENTO PUERTA
5.76	2.4	N/A	1	100%	13.82	WC PERSONAL ASISTENCIAL
0.79	2.02	N/A	-1	100%	-1.60	DESCUENTO PUERTA
5.96	2.4	N/A	1	100%	14.30	WC PERSONAL ASISTENCIAL
0.8	2.02	N/A	-1	100%	-1.62	DESCUENTO PUERTA
6.25	2.4	N/A	1	100%	15.00	WC MONITOREO GINECOBSTETRICIA
0.89	2.02	N/A	-1	100%	-1.80	DESCUENTO PUERTA
5.38	2.4	N/A	1	100%	12.91	WC ECOGRAFIA - IMAGENOLOGÍA
1.18	2.02	N/A	-1	100%	-2.38	DESCUENTO PUERTA
1.2	1.67	N/A	1	100%	2.00	C. ASEO LABORATORIO
0.7	1.33	N/A	1	100%	0.93	MESÓN LABORATORIO
PISO 2						
9.26	2.4	N/A	1	100%	22.22	BAÑO UCI UARO - FRENTE CAMA 8
1.07	2.01	N/A	-1	100%	-2.15	DESCUENTO PUERTA
7.82	2.4	N/A	1	100%	18.77	FILTRO UARO
0.8	2	N/A	-1	100%	-1.60	DESCUENTO PUERTA
4.86	2.4	N/A	1	100%	11.66	BAÑO RECUPERACIÓN PARTO (FONDO)
0.8	2	N/A	-1	100%	-1.60	DESCUENTO PUERTA
6.62	2.4	N/A	1	100%	15.89	BAÑO RECUPERACIÓN PARTO (POSTERIOR CENTRAL ENFERMERIA)
1	2	N/A	-1	100%	-2.00	DESCUENTO PUERTA
8.44	2.4	N/A	1	100%	20.26	BAÑO TRABAJO PARTO
0.9	2	N/A	-1	100%	-1.80	DESCUENTO PUERTA
5.42	2.4	N/A	1	100%	13.01	BAÑO DESCANSO
0.6	2	N/A	-1	100%	-1.20	DESCUENTO PUERTA
5.05	2.4	N/A	1	100%	12.12	DUCHA VESTIER MUJERES
0.7	2	N/A	-1	100%	-1.40	DESCUENTO PUERTA
4.58	2.4	N/A	1	100%	10.99	BAÑO 1 VESTIER MUJERES
0.7	2	N/A	-1	100%	-1.40	DESCUENTO PUERTA
4.54	2.4	N/A	1	100%	10.90	BAÑO 2 VESTIER MUJERES
0.7	2	N/A	-1	100%	-1.40	DESCUENTO PUERTA
PISO 3						
7.13	2.4	N/A	1	100%	17.11	HABITACION 301
0.87	2.02	N/A	-1	100%	-1.76	DESCUENTO
7.42	2.4	N/A	1	100%	17.81	HABITACION 302
0.87	2.02	N/A	-1	100%	-1.76	DESCUENTO
7.24	2.4	N/A	1	100%	17.38	HABITACION 307
0.87	2.02	N/A	-1	100%	-1.76	DESCUENTO
7.7	2.4	N/A	1	100%	18.48	HABITACION 308
0.87	2.02	N/A	-1	100%	-1.76	DESCUENTO
7.02	2.4	N/A	1	100%	16.85	HABITACION 310
0.87	2.02	N/A	-1	100%	-1.76	DESCUENTO
7.12	2.4	N/A	1	100%	17.09	HABITACION 311
0.87	2.02	N/A	-1	100%	-1.76	DESCUENTO
7.4	2.4	N/A	1	100%	17.76	HABITACION 316
0.8	2.02	N/A	-1	100%	-1.62	DESCUENTO
7.69	2.4	N/A	1	100%	18.46	HABITACION 318
0.87	2.02	N/A	-1	100%	-1.76	DESCUENTO
7.23	2.4	N/A	1	100%	17.35	HABITACION 325
0.87	2.02	N/A	-1	100%	-1.76	DESCUENTO
4.8	2.4	N/A	1	100%	11.52	BAÑO DESCANSO PISO 3
0.87	2.02	N/A	-1	100%	-1.76	DESCUENTO
4.8	1.2	N/A	1	100%	5.76	CUARTO ASEO TRANSFERCIA MEDICAMENTOS
0.77	1.2	N/A	-1	100%	-0.92	DESCUENTO PUERTA
5.94	2.4	N/A	1	100%	14.26	W.C ACCESO ASISTENCIAL
0.77	2.02	N/A	-1	100%	-1.56	DESCUENTO PUERTA
0.7	0.6	N/A	-1	100%	-0.42	DESCUENTO VENTANA
7.02	2.4	N/A	1	100%	16.85	BAÑO LUDOTECA
0.85	1.99	N/A	-1	100%	-1.69	DESCUENTO PUERTA
6.15	2.4	N/A	1	100%	14.76	BAÑO LUDOTECA
0.6	1.99	N/A	-1	100%	-1.19	DESCUENTO PUERTA ASEO
3.44	1.2	N/A	1	100%	4.13	ASEO
7.2	2.4	N/A	1	100%	17.28	BAÑO LUDOTECA
0.77	1.99	N/A	-1	100%	-1.53	DESCUENTO PUERTA
5.84	2.4	N/A	1	100%	14.02	W.C - CONTINUO A COORDINACION
0.67	2.02	N/A	-1	100%	-1.35	DESCUENTO PUERTA
5.84	2.4	N/A	1	100%	14.02	W.C - CONTINUO A COORDINACION
0.67	2.02	N/A	-1	100%	-1.35	DESCUENTO PUERTA
6.22	2.4	N/A	1	100%	14.93	
1.21	0.04	N/A	1	100%	0.05	
2.4	0.02	N/A	1	100%	0.05	UCI PEDIATRICA: BAÑO PMR
2.02	0.05	N/A	1	100%	0.10	
0.87	0.05	N/A	1	100%	0.04	
3.64	1.2	N/A	1	100%	4.37	CUARTO ASEO (CIRCULACIÓN RESTRINGIDA)
0.13	0.49	N/A	-2	100%	-0.13	DESCUENTO: MURO POCETA
PISO 4						
7.55	2.4	N/A	1	100%	18.12	HABITACION # 1



0.85	2.02	N/A	-1	**100%**	**-1.72**	DESCUENTO
6.27	2.4	N/A	1	**100%**	**15.05**	HABITACION # 2
0.85	2.02	N/A	-1	**100%**	**-1.72**	DESCUENTO
7.44	2.4	N/A	1	**100%**	**17.86**	HABITACION # 11
0.85	2.02	N/A	-1	**100%**	**-1.72**	DESCUENTO
7.74	2.4	N/A	1	**100%**	**18.58**	HABITACION # 16
0.87	2.02	N/A	-1	**100%**	**-1.76**	DESCUENTO
7.42	2.4	N/A	1	**100%**	**17.81**	HABITACION # 18
0.87	2.02	N/A	-1	**100%**	**-1.76**	DESCUENTO
7.25	2.4	N/A	1	**100%**	**17.40**	HABITACION # 8
0.87	2.02	N/A	-1	**100%**	**-1.76**	DESCUENTO
7.25	2.4	N/A	1	**100%**	**17.40**	HABITACION # 7
0.87	2.02	N/A	-1	**100%**	**-1.76**	DESCUENTO
7.15	2.4	N/A	1	**100%**	**17.16**	HABITACION # 10
0.87	2.02	N/A	-1	**100%**	**-1.76**	DESCUENTO
7.29	2.4	N/A	1	**100%**	**17.50**	HABITACION # 24
0.87	2.02	N/A	-1	**100%**	**-1.76**	DESCUENTO
7.01	2.4	N/A	1	**100%**	**16.82**	HABITACION # 25
0.87	2.02	N/A	-1	**100%**	**-1.76**	DESCUENTO
4.73	2.4	N/A	1	**100%**	**11.35**	BAÑO DESCANSO PISO 4
0.87	2.02	N/A	-1	**100%**	**-1.76**	DESCANSO
4.02	1.2	N/A	1	**100%**	**4.82**	ASEO CIRCULACIÓN RESTRINGIDA

OBSERVACIONES:

TOTAL	**905.88**	**Metro Cuadrado**
ACUMULADO ANTERIOR	**286.14**	**Metro Cuadrado**
PRESENTE ACTA	**619.74**	**Metro Cuadrado**

Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoria:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	2.02	REMATES BOCEL ALUMINIO "WINGS"	CAP	1.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA	UNIDAD	Metro lineal			UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL
Registro fotográfico					Dimensiones					Total (m)	Observaciones
					L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
					PISO 4						
					2.4	N/A	N/A	4	100%	**9.60**	HABITACION # 1 PISO 4
					2.87	N/A	N/A	1	100%	**2.87**	HABITACION # 1 PISO 4
					2.4	N/A	N/A	4	100%	**9.60**	HABITACION # 2 PISO 4
					2.87	N/A	N/A	1	100%	**2.87**	HABITACION # 2 PISO 4
					2.4	N/A	N/A	3	100%	**7.20**	HABITACION # 11 PISO 4
					2.87	N/A	N/A	1	100%	**2.87**	HABITACION # 11 PISO 4
					2.4	N/A	N/A	4	100%	**9.60**	HABITACION # 16 PISO 4
					2.89	N/A	N/A	1	100%	**2.89**	HABITACION # 16 PISO 4
					2.4	N/A	N/A	3	100%	**7.20**	HABITACION # 18 PISO 4
					2.87	N/A	N/A	1	100%	**2.87**	HABITACION # 18 PISO 4
					2.4	N/A	N/A	4	100%	**9.60**	HABITACION # 7 PISO 4
					2.89	N/A	N/A	1	100%	**2.89**	HABITACION # 7 PISO 4
					2.4	N/A	N/A	2	100%	**4.80**	HABITACION # 8 PISO 4
					2.87	N/A	N/A	1	100%	**2.87**	HABITACION # 8 PISO 4
					2.4	N/A	N/A	4	100%	**9.60**	HABITACION # 10 PISO 4
					2.89	N/A	N/A	1	100%	**2.89**	HABITACION # 10 PISO 4
					2.4	N/A	N/A	3	100%	**7.20**	HABITACION # 24 PISO 4
					2.89	N/A	N/A	1	100%	**2.89**	HABITACION # 24 PISO 4
					2.4	N/A	N/A	4	100%	**9.60**	HABITACION # 25 PISO 4
					2.89	N/A	N/A	1	100%	**2.89**	HABITACION # 25 PISO 4
					2.1	N/A	N/A	1	100%	**2.10**	BAÑO DESCANSO
					0.87	N/A	N/A	1	100%	**0.87**	BAÑO DESCANSO
					2.4	N/A	N/A	1	100%	**2.40**	BAÑO DESCANSO
					0.89	N/A	N/A	1	**100%**	**0.89**	HABITACIÓN 422
					2.06	N/A	N/A	1	**100%**	**2.06**	HABITACIÓN 422
					0.89	N/A	N/A	1	**100%**	**0.89**	HABITACIÓN 423
					2.05	N/A	N/A	1	**100%**	**2.05**	HABITACIÓN 423
					0.89	N/A	N/A	1	**100%**	**0.89**	HABITACIÓN 420
					2.05	N/A	N/A	1	**100%**	**2.05**	HABITACIÓN 420
					0.89	N/A	N/A	1	**100%**	**0.89**	HABITACIÓN 421
					2.05	N/A	N/A	1	**100%**	**2.05**	HABITACIÓN 421
					0.89	N/A	N/A	1	**100%**	**0.89**	HABITACIÓN 419
					2.05	N/A	N/A	1	**100%**	**2.05**	HABITACIÓN 419
					4.12	N/A	N/A	1	**100%**	**4.12**	ASEO CIRCULACIÓN RESTRINGIDA
					1.17	N/A	N/A	1	**100%**	**1.17**	ASEO CIRCULACIÓN RESTRINGIDA
					0.87	N/A	N/A	1	**100%**	**0.87**	HABITACIÓN 417
					2.04	N/A	N/A	1	**100%**	**2.04**	HABITACIÓN 417
					0.87	N/A	N/A	1	**100%**	**0.87**	HABITACIÓN 415
					2.02	N/A	N/A	1	**100%**	**2.02**	HABITACIÓN 415
					0.87	N/A	N/A	1	**100%**	**0.87**	HABITACIÓN 414
					2.02	N/A	N/A	1	**100%**	**2.02**	HABITACIÓN 414
					0.87	N/A	N/A	1	**100%**	**0.87**	HABITACIÓN 413
					2.02	N/A	N/A	1	**100%**	**2.02**	HABITACIÓN 413
					0.87	N/A	N/A	1	**100%**	**0.87**	HABITACIÓN 412
					2.02	N/A	N/A	1	**100%**	**2.02**	HABITACIÓN 412
					0.87	N/A	N/A	1	**100%**	**0.87**	HABITACIÓN 409
					2.02	N/A	N/A	1	**100%**	**2.02**	HABITACIÓN 409
					0.87	N/A	N/A	1	**100%**	**0.87**	HABITACIÓN 405
					2.02	N/A	N/A	1	**100%**	**2.02**	HABITACIÓN 405
					0.87	N/A	N/A	1	**100%**	**0.87**	HABITACIÓN 406
					2.02	N/A	N/A	1	**100%**	**2.02**	HABITACIÓN 406
					PISO 3						
					2.4	N/A	N/A	4	100%	**9.60**	HABITACION 301
					0.87	N/A	N/A	1	100%	**0.87**	HABITACION 301
					2.02	N/A	N/A	1	100%	**2.02**	HABITACION 301
					2.02	N/A	N/A	1	100%	**2.02**	HABITACION 302
					0.87	N/A	N/A	1	100%	**0.87**	HABITACION 302
					2.4	N/A	N/A	4	100%	**9.60**	HABITACION 302
					2.4	N/A	N/A	4	100%	**9.60**	HABITACION 307
					2.02	N/A	N/A	1	100%	**2.02**	HABITACION 307
					0.87	N/A	N/A	1	100%	**0.87**	HABITACION 307
					2.4	N/A	N/A	2	100%	**4.80**	HABITACION 308
					2.02	N/A	N/A	1	100%	**2.02**	HABITACION 308
					0.87	N/A	N/A	1	100%	**0.87**	HABITACION 308
					2.4	N/A	N/A	4	100%	**9.60**	HABITACION 310
					2.02	N/A	N/A	1	100%	**2.02**	HABITACION 310
					0.87	N/A	N/A	1	100%	**0.87**	HABITACION 310
					2.4	N/A	N/A	4	100%	**9.60**	HABITACION 311
					2.02	N/A	N/A	1	100%	**2.02**	HABITACION 311
					0.87	N/A	N/A	1	100%	**0.87**	HABITACION 311
					2.4	N/A	N/A	4	100%	**9.60**	HABITACION 316
					2.02	N/A	N/A	1	100%	**2.02**	HABITACION 316
					0.87	N/A	N/A	1	100%	**0.87**	HABITACION 316
					2.4	N/A	N/A	4	100%	**9.60**	HABITACION 318
					2.02	N/A	N/A	1	100%	**2.02**	HABITACION 318
					0.87	N/A	N/A	1	100%	**0.87**	HABITACION 318
					2.4	N/A	N/A	4	100%	**9.60**	HABITACION 325
					0.87	N/A	N/A	1	100%	**0.87**	HABITACION 325
					2.02	N/A	N/A	1	100%	**2.02**	HABITACION 325
					2.02	N/A	N/A	1	100%	**2.02**	DESCANSO
					0.87	N/A	N/A	1	100%	**0.87**	DESCANSO
					2.4	N/A	N/A	1	100%	**2.40**	DESCANSO
					1.2	N/A	N/A	1	100%	**1.20**	CUARTO DE ASEO
					0.77	N/A	N/A	1	100%	**0.77**	CUARTO DE ASEO
					2.02	N/A	N/A	1	100%	**2.02**	CUARTO DE ASEO
					1.21	N/A	N/A	1	**100%**	**1.21**	UCI PEDIATRICA - BAÑO PMR: SOBREANCHO LAVAMANOS
					2.4	N/A	N/A	1	**100%**	**2.40**	UCI PEDIATRICA - BAÑO PM: ESQUINERO
					2.02	N/A	N/A	1	**100%**	**2.02**	UCI PEDIATRICA - BAÑO PMR: PUERTA
					0.89	N/A	N/A	1	**100%**	**0.89**	
					1.17	N/A	N/A	2	**100%**	**2.34**	CUARTO ASEO - CIRCILACIÓN RESTRINGIDA: MURO POCETA ASEO
					1.2	N/A	N/A	1	**100%**	**1.20**	CUARTO ASE - CIRCILACIÓN RESTRINGIDA: MURO
					0.87	N/A	N/A	0	**100%**	**0.00**	WC CIRCULACIÓN
					2.06	N/A	N/A	-1	**100%**	**-2.06**	WC CIRCULACIÓN
					PISO 2						
					2.02	N/A	N/A	1	**100%**	**2.02**	BAÑO UCI ADULTO
					1.05	N/A	N/A	1	**100%**	**1.05**	BAÑO UCI ADULTO
					2.02	N/A	N/A	1	**100%**	**2.02**	BAÑO FILTRO ACCESO U.R.O
					0.76	N/A	N/A	1	**100%**	**0.76**	BAÑO FILTRO ACCESO U.R.O
					2.40	N/A	N/A	1	**100%**	**2.40**	BAÑO FILTRO ACCESO U.R.O
					2.02	N/A	N/A	2	**100%**	**4.04**	BAÑO RECUPERACION PARTO
					0.96	N/A	N/A	1	**100%**	**0.96**	BAÑO RECUPERACION PARTO
					2.02	N/A	N/A	1	**100%**	**2.02**	BAÑO RECUPERACION PARTO
					0.77	N/A	N/A	1	**100%**	**0.77**	BAÑO RECUPERACION PARTO
					2.02	N/A	N/A	2	**100%**	**4.04**	BAÑO PREPARACION PARTO
					0.77	N/A	N/A	1	**100%**	**0.77**	BAÑO PREPARACION PARTO
					2.40	N/A	N/A	1	**100%**	**2.40**	BAÑO PREPARACION PARTO
					2.02	N/A	N/A	1	**100%**	**2.02**	BAÑO DESCANSO PARTO
					0.77	N/A	N/A	1	**100%**	**0.77**	BAÑO VESTIER MUJER
					0.65	N/A	N/A	1	**100%**	**0.65**	BAÑO VESTIER MUJER
					2.02	N/A	N/A	1	**100%**	**2.02**	BAÑO VESTIER MUJER
					0.67	N/A	N/A	1	**100%**	**0.67**	BAÑO VESTIER MUJER





















2.02	N/A	N/A	1	100%	2.02	BAÑO VESTIER MUJER
0.65	N/A	N/A	1	100%	0.65	BAÑO VESTIER MUJER
		PISO 1				
2.87	N/A	N/A	1	100%	2.87	BAÑO PRIMER PISO
2.77	N/A	N/A	1	100%	2.77	BAÑO PRIMER PISO
0.75	N/A	N/A	2	100%	1.50	WC FAMILIAR: SOBREANCHO LAVAMANOS
0.38	N/A	N/A	1	100%	0.38	
2.02	N/A	N/A	5	100%	10.10	WC FAMILIAR: PUERTAS (ALTOS)
1.4	N/A	N/A	3	100%	4.20	WC FAMILIAR: COLUMNAS
1.38	N/A	N/A	2	100%	2.76	WC FAMILIAR: ACCESO HACIA CAMBIADOR
0.87	N/A	N/A	1	100%	0.87	WC FAMILIAR: PUERTA PRINCIPAL (ANCHO)
0.9	N/A	N/A	1	100%	0.90	WC FAMILIAR: PUERTA SANITARIO ANCHO
2.02	N/A	N/A	2	100%	4.04	SALA EDA - BAÑO: PUERTA
0.77	N/A	N/A	1	100%	0.77	
2	N/A	N/A	1	100%	2.00	CONSULTORIO 4
0.76	N/A	N/A	1	100%	0.76	CONSULTORIO 4
2.4	N/A	N/A	1	100%	2.40	CONSULTORIO 1
2.97	N/A	N/A	1	100%	2.97	CONSULTORIO 1
2.4	N/A	N/A	1	100%	2.40	CONSULTORIO 2
2.02	N/A	N/A	1	100%	2.02	CONSULTORIO 2
0.87	N/A	N/A	1	100%	0.87	CONSULTORIO 2
2.02	N/A	N/A	1	100%	2.02	CONSULTORIO 5
0.87	N/A	N/A	1	100%	0.87	CONSULTORIO 5
2.02	N/A	N/A	1	100%	2.02	SALA ERA
0.87	N/A	N/A	1	100%	0.87	SALA ERA
0.76	N/A	N/A	1	100%	0.76	W.C MUJERES
2.02	N/A	N/A	1	100%	2.02	W.C MUJERES
2.98	N/A	N/A	1	100%	2.98	BAÑO DISCAPASITADOS
2.4	N/A	N/A	2	100%	4.80	W.C HOMBRES
2.78	N/A	N/A	1	100%	2.78	W.C HOMBRES
2.02	N/A	N/A	1	100%	2.02	WC MIXTO PRM
0.88	N/A	N/A	1	100%	0.88	
2.02	N/A	N/A	1	100%	2.02	WC AREA ADMINISTRATIVA FARMACIA
0.67	N/A	N/A	1	100%	0.67	
0.88	N/A	N/A	1	100%	0.88	WC LABORATORIO
2.02	N/A	N/A	1	100%	2.02	
2.02	N/A	N/A	2	100%	4.04	WC PROCEDIMIENTOS DE IMAGENOLOGÍA
0.77	N/A	N/A	1	100%	0.77	
2.02	N/A	N/A	1	100%	2.02	WC ECOGRAFO
1.18	N/A	N/A	1	100%	1.18	
2.02	N/A	N/A	1	100%	2.02	WC PERSONAL ASISTENCIAL 1
0.8	N/A	N/A	1	100%	0.80	
0.8	N/A	N/A	1	100%	0.80	WC PERSONAL ASISTENCIAL 2
2.02	N/A	N/A	1	100%	2.02	
2.4	N/A	N/A	2	100%	4.80	WC MONITOREO GINECOBSTETRICIA
2.02	N/A	N/A	2	100%	4.04	
0.88	N/A	N/A	1	100%	0.88	
1	N/A	N/A	2	100%	2.00	WC PRINCIPAL
0.4	N/A	N/A	2	100%	0.80	WC PRINCIPAL
4.3	N/A	N/A	1	100%	4.30	ASEO CIRCILACIÓN URG
1.2	N/A	N/A	1	100%	1.20	ASEO CIRCILACIÓN URG
1.07	N/A	N/A	2	100%	2.14	ASEO CIRCILACIÓN URG
0.88	N/A	N/A	1	100%	0.88	WC FAMILIAR OBSERVACIONES
2	N/A	N/A	1	100%	2.00	WC FAMILIAR OBSERVACIONES
0.75	N/A	N/A	1	100%	0.75	C. ASEO LABOTORIO
3.37	N/A	N/A	1	100%	3.37	C. ASEO LABOTORIO
0.7	N/A	N/A	10	100%	7.00	MESÓN LABORATORIO
0.87	N/A	N/A	2	100%	1.74	C. ASEO PASILLO OBSERVACIONES A FARMACIA
		PISO 2				
2.02	N/A	N/A	1	100%	2.02	BAÑO UCI ADULTO
1.05	N/A	N/A	1	100%	1.05	BAÑO UCI ADULTO
2.02	N/A	N/A	1	100%	2.02	BAÑO FILTRO ACCESO U.R.O
0.76	N/A	N/A	1	100%	0.76	BAÑO FILTRO ACCESO U.R.O
2.40	N/A	N/A	1	100%	2.40	BAÑO FILTRO ACCESO U.R.O
2.02	N/A	N/A	2	100%	4.04	BAÑO RECUPERACION PARTO
0.96	N/A	N/A	1	100%	0.96	BAÑO RECUPERACION PARTO
2.02	N/A	N/A	1	100%	2.02	BAÑO RECUPERACION PARTO
0.77	N/A	N/A	1	100%	0.77	BAÑO RECUPERACION PARTO
2.02	N/A	N/A	2	100%	4.04	BAÑO PREPARACION PARTO
0.77	N/A	N/A	1	100%	0.77	BAÑO PREPARACION PARTO
2.40	N/A	N/A	1	100%	2.40	BAÑO PREPARACION PARTO
2.02	N/A	N/A	1	100%	2.02	BAÑO DESCANSO PARTO
0.77	N/A	N/A	1	100%	0.77	BAÑO VESTIER MUJER
0.65	N/A	N/A	1	100%	0.65	BAÑO VESTIER MUJER
2.02	N/A	N/A	1	100%	2.02	BAÑO VESTIER MUJER
0.67	N/A	N/A	1	100%	0.67	BAÑO VESTIER MUJER
2.02	N/A	N/A	1	100%	2.02	BAÑO VESTIER MUJER
0.65	N/A	N/A	1	100%	0.65	BAÑO VESTIER MUJER

OBSERVACIONES:

TOTAL	**472.04**	**Metro lineal**
ACUMULADO ANTERIOR	**165.03**	**Metro lineal**
PRESENTE ACTA	**307.01**	**Metro lineal**

Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA								
ITEM	3.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO	CAP	3.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS - BASES - ACABADOS	UNIDAD	Metro lineal		UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL
Registro fotográfico					Dimensiones				Total (m)	Observaciones
					L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%	
					PISO 1					
					28.73	N/A	N/A	1	90%	25.86	AUDITORIO
					39.16	N/A	N/A	1	90%	35.24	CAFETERIA
					1.64	N/A	N/A	1	90%	1.48	
					20.06	N/A	N/A	1	90%	18.05	COCINA
					35.37	N/A	N/A	1	90%	31.83	SALA ESPERA IMAGENOLOGIA
					22.25	N/A	N/A	1	90%	20.03	RECEPCIÓN MEDICAMENTO FARMACIA
					28.27	N/A	N/A	1	90%	25.44	FARMACIA
					45.22	N/A	N/A	1	90%	40.70	EQUIPOS LABORATORIO
					25.43	N/A	N/A	1	90%	22.89	CENTRIFUGA Y LOQUER LABORATORIO
					9.94	N/A	N/A	1	90%	8.95	NEVERAS LABORATORIO
					13.51	N/A	N/A	1	90%	12.16	PRETRASFUNCIONAL LABORATORIO
					18.64	N/A	N/A	1	90%	16.78	RESIDUOS PELIGROSO, RESIDUOS RECICLABLE,ASEO LABORATORIO
					7.00	N/A	N/A	1	90%	6.30	INGRESO LABORATORIO
					11.06	N/A	N/A	1	90%	9.95	TOMA DE MUESTRA GINECOLOGIA
					16.60	N/A	N/A	1	90%	14.94	TOMA DE MUESTRA
					10.47	N/A	N/A	1	90%	9.42	PASILLO SUR IMAGENOLOGIA
					6.74	N/A	N/A	1	90%	6.07	PROCEDIMIENTO IMAGENOLOGIA
					9.33	N/A	N/A	1	90%	8.40	SALA DE ESPERA ECOGRAFIA
					20.36	N/A	N/A	1	90%	18.32	ECOGRAFO 1
					15.15	N/A	N/A	1	90%	13.64	ECOGRAFO 2
					14.64	N/A	N/A	1	90%	13.18	ADMISIONES PROCEDIMIENTO
					19.82	N/A	N/A	1	90%	17.84	PROCEDIMIENTO CARDIO
					12.19	N/A	N/A	1	90%	10.97	CONSULTORIO CARDIOLOGIA
					20.00	N/A	N/A	1	90%	18.00	OBSERVACION GINECOPEDIATRIA
					11.29	N/A	N/A	1	90%	10.16	CIRCULACION RX
					9.09	N/A	N/A	1	90%	8.18	CIRCULACION MAMOGRAFIA
					34.67	N/A	N/A	1	90%	31.20	OBSERVACION PEDIATRICA
					23.41	N/A	N/A	1	90%	21.07	CENTRAL DE ENFERMERIA
					7.78	N/A	N/A	1	90%	7.00	DISPARO
					16.26	N/A	N/A	1	90%	14.63	T.A.C
					14.48	N/A	N/A	1	90%	13.03	OFICINA RADIOLOGIA Y RECIDUO RX
					9.48	N/A	N/A	1	90%	8.53	SALA LECTURA RADIOLOGIA
					2.53	N/A	N/A	1	90%	2.28	CIRCULACION FRENTE SALA DE LECTURA
					3.95	N/A	N/A	1	90%	3.56	RESIDUO ORDINARIO Y RECICLABLE
					3.50	N/A	N/A	1	90%	3.15	RESIDUO PELIGROSO
					15.46	N/A	N/A	1	90%	13.91	SALA EDA
					18.54	N/A	N/A	1	90%	16.69	DIGITACION
					3.89	N/A	N/A	1	90%	3.50	ROPA SUCIA
					4.85	N/A	N/A	1	90%	4.37	EQUIPO
					13.83	N/A	N/A	1	90%	12.45	ERA
					9.57	N/A	N/A	1	90%	8.61	CIRCULACION CENTRA DE ENFERMERIA A ERA
					10.68	N/A	N/A	1	90%	6.41	DIRECCION DE URGENCIAS
					13.06	N/A	N/A	1	90%	7.84	PROCEDIMEINTOS ASEPTICOS
					13.95	N/A	N/A	1	90%	8.37	SALA DE YESOS
					13.3	N/A	N/A	1	90%	7.98	CONSULTORIO 5
					26.96	N/A	N/A	1	90%	16.18	MONITOREO GINECOPSTETRICIA
					14.56	N/A	N/A	1	90%	8.74	CONSULTORIO 2
					14.57	N/A	N/A	1	90%	8.74	CONSULTORIO 1
					14.86	N/A	N/A	1	90%	8.92	CONSULTORIO 4
					15.4	N/A	N/A	1	90%	9.24	CONSULTORIO 3
					21.2	N/A	N/A	1	90%	12.72	REANIMACIÓN
					28.24	N/A	N/A	1	90%	16.94	CIRCULACION URGENCIAS
					4.71	N/A	N/A	1	90%	4.24	PASILLO URGENCIAS
					8.2	N/A	N/A	1	90%	7.38	TRIAGE # 2
					12.72	N/A	N/A	1	90%	11.45	CIRCULACION TRIAGE Y SILLAS DE RUEDAS
					11.13	N/A	N/A	1	90%	10.02	TRIAGE # 1
					47.32	N/A	N/A	1	90%	42.59	SALA DE ESPERA ADULTOS
					31.27	N/A	N/A	1	90%	28.14	CIRCULACION DE ESPERA URGENCIAS A HALL PRINCIPAL
					31.27	N/A	N/A	1	90%	28.14	CIRCULACION DE ESPERA URGENCIAS A HALL PRINCIPAL
					9.87	N/A	N/A	1	90%	8.88	FACTURACIÓN
					15.8	N/A	N/A	1	90%	14.22	DESCANSO MEDICO
					16.27	N/A	N/A	1	90%	14.64	DATA CENTER
					11.53	N/A	N/A	1	90%	10.38	HALL CENTRAL
					5.31	N/A	N/A	1	90%	4.78	WC CAFETERIA
					6.49	N/A	N/A	1	90%	5.84	WC DISCAPACITADOS CAFETERIA
					7.11	N/A	N/A	1	90%	6.40	WC DISCAPACITADOS SALA DE ESPERA ADULTOS
					9.07	N/A	N/A	1	90%	8.16	WC DAMAS SALA DE ESPERA ADULTOS
					4.79	N/A	N/A	1	90%	4.31	WC DESCANSO MEDICO 1
					5.16	N/A	N/A	1	90%	4.64	WC DESCANSO MEDICO 2
					27.24	N/A	N/A	1	90%	24.52	DESCANSO MEDICO
					4.8	N/A	N/A	1	90%	4.32	CONSULTORIO 4
					4.98	N/A	N/A	1	90%	4.48	CONSULTORIO 1
					4.79	N/A	N/A	1	90%	4.31	CONSULTORIO 2
					5.31	N/A	N/A	1	90%	4.78	MONITOREO GINECOPSTETRICIA
					5.14	N/A	N/A	1	90%	4.63	CONSULTORIO 5
					4.85	N/A	N/A	1	90%	4.37	SALA ERA
					17.15	N/A	N/A	1	90%	15.44	WC FAMILIAR
					6.65	N/A	N/A	1	90%	5.99	WC DISCAPACITADOS GINECOPSTETRICIA
					6.05	N/A	N/A	1	90%	5.45	BAÑO VESTIER ADMISIONES
					4.27	N/A	N/A	1	90%	3.84	WC ECOGRAFO 1
					4.27	N/A	N/A	1	90%	3.84	WC ECOGRAFO 2
					4.72	N/A	N/A	1	90%	4.25	WC PROCEDIMIENTOS IMAGENOLOGIA
					4.28	N/A	N/A	1	90%	3.85	WC TOMA DE MUESTRAS
					5.08	N/A	N/A	1	90%	4.57	WC LABORATORIO
					5.03	N/A	N/A	1	90%	4.53	WC FARMACIA
					6.22	N/A	N/A	1	90%	5.60	WC MIXTO ESPERA IMAGENOLOGIA
					6.227	N/A	N/A	1	90%	5.60	WC DISCAPACITADOS ESPERA IMAGENOLOGIA
					6.5	N/A	N/A	1	90%	5.85	ASEO URGENCIAS
					7	N/A	N/A	1	90%	6.30	
					7.6	N/A	N/A	1	90%	6.84	ADMISIONES URGENCIAS
					5.7	N/A	N/A	1	90%	5.13	
					4.8	N/A	N/A	1	90%	4.32	WC CONSULTORIO 3
					11.3	N/A	N/A	1	90%	10.17	LAVADO PACIENTES
					5.28	N/A	N/A	1	90%	4.75	WC MONITOREO GINECOPSTETRICIA
					12.3	N/A	N/A	1	90%	11.07	BAÑO HOMBRES ESPERA ADULTOS
					3.03	N/A	N/A	1	90%	2.73	TRIAGE 1 MURO ADISIONAL
					3.82	N/A	N/A	1	90%	3.44	ROPA LIMPIA DIGITACION
					3.87	N/A	N/A	1	90%	3.48	SALA EDA MURO ADISIONAL
					6.92	N/A	N/A	1	90%	6.23	WC SALA EDA
					7.15	N/A	N/A	1	90%	6.44	WC OBSERVACION PEDIATRICA
					6.22	N/A	N/A	1	90%	5.60	TRABAJO LIMPIO OBSERVACION PEDIATRIA
					5.6	N/A	N/A	1	90%	5.04	TRABAJO SUCIO OBSERVACION PEDIATRIA
					6.5	N/A	N/A	1	90%	5.85	ASEO PASILLO IMAGENOLOGIA
					5.97	N/A	N/A	1	90%	5.37	TRABAJO LIMPIO INSUMOS
					PISO 2					
					13.57	N/A	N/A	1	80%	10.86	UCI URO - 9
					15.64	N/A	N/A	1	80%	12.51	UCI URO - 8
					13.63	N/A	N/A	1	80%	10.90	UCI URO - 7
					11.67	N/A	N/A	1	80%	9.34	PASILLO Y/O CIRCULACIÓN DE UCI URO: DE 7 A 9
					7.61	N/A	N/A	1	80%	6.09	UCI AURO - 6
					13.2	N/A	N/A	1	80%	10.56	
					14.17	N/A	N/A	1	80%	11.34	UCI URO - 5
					14.15	N/A	N/A	1	80%	11.32	UCI URO - 4
					14.14	N/A	N/A	1	80%	11.31	UCI URO - 3
					13.92	N/A	N/A	1	80%	11.14	UCI URO - 2
					14.09	N/A	N/A	1	80%	11.27	UCI URO - 1
					18.22	N/A	N/A	1	80%	14.58	PASILLO Y/O CIRCULACIÓN DE UCI URO: DE 1 A 5
					9.53	N/A	N/A	1	80%	7.62	CENTRAL DE ENFERMERIA + MATERIAL: FRENTE A UCI URO 8
					3.51	N/A	N/A	1	80%	2.81	INGRESO CUARTOS DE UCI URO
					10.26	N/A	N/A	1	80%	8.21	CENTRAL DE ENFERMERIA: FRENTE A UCI URO 3
					2.57	N/A	N/A	1	80%	2.06	INFORMACIÓN FAMILIAR
					6.52	N/A	N/A	1	80%	5.22	FILTRO ACCESO PERSONAL UARO
					5.04	N/A	N/A	1	80%	4.03	PASILLO ACCESO BAÑO COSTADO DE VESTIER PACIENTES
					18.31	N/A	N/A	1	80%	14.65	VESTIER PACIENTES
					2.3	N/A	N/A	1	80%	1.84	RACK
					40.76	N/A	N/A	1	80%	32.61	RECUPERACIÓN SALA PARTO
					9.93	N/A	N/A	1	80%	7.94	ESTACIÓN ENFERMERIA RECUPERACIÓN
					9.04	N/A	N/A	1	80%	7.23	CIRCULACIÓN DE: SALA PARTO A UCI ADULTO (LATERAL IZQUIERDO)
					17.67	N/A	N/A	1	80%	14.14	CIRCULACIÓN DE: SALA DE PARTO 1 Y 2 A DESCANSO
					10.51	N/A	N/A	1	80%	8.41	CUARTO DE EQUIPOS
					8.68	N/A	N/A	1	80%	6.94	CIRCULACIÓN HACIA QUIROFANOS DESDE RECUPERACIÓN PARTOS (COSTADO DERECHO)
					20.8	N/A	N/A	1	80%	16.64	DESCANSO MÉDICO - QUIROFÁNOS
					9.32	N/A	N/A	1	80%	7.46	CIRCULACIÓN QUIROFANO: DEL 1 AL 3 (COSTADO DERECHO)
					5.33	N/A	N/A	1	80%	4.26	BODEGA
					49.36	N/A	N/A	1	80%	39.49	RECUPERACIÓN QUIRURGICA + ESTACIÓN ENFERMERIA
					10.7	N/A	N/A	1	80%	8.56	PASILLO A AUTOCLAVE: DESDE RECUPERACIÓN QUIRÚRGICA
					31.83	N/A	N/A	1	80%	25.46	AUTOCLAVE
					7.85	N/A	N/A	1	80%	6.28	PASILLO AUTOCLAVE - HACIA QUIROFANOS (COSTADO DERECHO)
					2.75	N/A	N/A	1	80%	2.20	
					14.34	N/A	N/A	1	80%	11.47	PREPARACIÓN PACIENTES AMBULATORIOS
					5.39	N/A	N/A	1	80%	4.31	WC H: PREPARACIÓN DE PACIENTES AMBULA.



















6.06	N/A	N/A	1	80%	4.85	WC M: PREPARACIÓN DE PACIENTES AMBULA
14.54	N/A	N/A	1	80%	11.63	PASILLO QUIROFANOS - DEL 3 AL 1 (COSTADO DERECHO)
14.38	N/A	N/A	1	80%	11.50	FARMACIA
24.89	N/A	N/A	1	80%	19.91	PASILLO POSTERIOR FARMACIA
5.85	N/A	N/A	1	80%	4.68	RESIDUOS TEMPARALES 1
4.76	N/A	N/A	1	80%	3.81	RESIDUOS TEMPARALES 2
5.21	N/A	N/A	1	80%	4.17	ASEO (FUERA DE QUIROFANO 3)
13.19	N/A	N/A	1	80%	10.55	PASILLO RECUPARACIÓN PARTOS - DESDE QUIROFANOS (COSTADO DERECHO)
15.4	N/A	N/A	1	80%	12.32	DESCANSO: RECUPERACIÓN Y QUIROFANOS
5.18	N/A	N/A	1	80%	4.14	BODEGA (COSTADO DERECHO DE DESCANSO
5.31	N/A	N/A	1	80%	4.25	CIRCULACIÓN: DESCANSO/VESTIER
16.89	N/A	N/A	1	80%	13.51	VESTIER MUJERES VESTIER MUJERES
18.25	N/A	N/A	1	80%	14.60	VESTIER MUJERES VESTIER HOMBRES
4.53	N/A	N/A	1	80%	3.62	VESTIER MUJERES: DUCHA
4.11	N/A	N/A	1	80%	3.29	VESTIER MUJERES: BAÑO 1
4.06	N/A	N/A	1	80%	3.25	VESTIER MUJERES: BAÑO 2
3.72	N/A	N/A	1	80%	2.98	VESTIER HOMBRE: DUCHA
4.35	N/A	N/A	1	80%	3.48	VESTIER HOMBRE: BAÑO
3.09	N/A	N/A	1	80%	2.47	RESIDUO ORDINARIO (PASILLO FRENTE A RECUPERACIÓN PARTOS)
3.17	N/A	N/A	1	80%	2.54	RESIDUO PELIGROSO (PASILLO FRENTE A RECUPERACIÓN PARTOS)
7.01	N/A	N/A	1	80%	5.61	RECEPCIÓN - CONTROL (COSTADO DE RACK)
1.61	N/A	N/A	1	80%	1.29	MURO EXTERIOR: DESCANSO-UCI URO
8.78	N/A	N/A	1	80%	7.02	DESCANSO: UCI URO
6.26	N/A	N/A	1	80%	5.01	FILTRO FAMILIARES URO
19.08	N/A	N/A	1	80%	15.26	CIRCULACIÓN: UCI URO A UCI NEO
6.2	N/A	N/A	1	80%	4.96	INGRESO UCI NEO (DESDE UCI URO)
9.4	N/A	N/A	1	80%	7.52	FILTRO VISITANTES: UCO NEO
15.11	N/A	N/A	1	80%	12.09	LACTARIO + BODEGA
4.76	N/A	N/A	1	80%	3.81	WC PMR (COSTADO DE RESIDUOS TEMPORALES)
10.05	N/A	N/A	1	80%	8.04	AMBIENTE TRABAJO ESTERIL
11.35	N/A	N/A	1	80%	9.08	EXTRACCIÓN
2.67	N/A	N/A	1	80%	2.14	RESIDUOS TEMPORALES
9.76	N/A	N/A	1	80%	7.81	CIRCULACIÓN ASEO: UCI NEO
5.92	N/A	N/A	1	80%	4.74	LAVADO DE INCUBADORAS
2.53	N/A	N/A	1	80%	2.02	ASEO : UCI NEO
45.52	N/A	N/A	1	80%	36.42	UCI NEO: INTENSIVOS
11.08	N/A	N/A	1	80%	8.86	CENTRAL ENFERMERIA: UCI INTENSIVOS
68.09	N/A	N/A	1	80%	54.47	UCI NEO: INTERMEDIOS
3.84	N/A	N/A	4	80%	12.29	CENTRAL ENFERMERIA: UCI NEO INTERMEDIOS
4.78	N/A	N/A	1	80%	3.82	T. LIMPIO: CENTRAL ENFERMERÍ INTERMEDIO
2.3	N/A	N/A	1	80%	1.84	ESTACIÓN SATELITE Y ARCHIVO
11.24	N/A	N/A	1	80%	8.99	PASILLO: HACIA DESCANSO UCI NEO
18.03	N/A	N/A	1	80%	14.42	DESCANSO: UCI NEO
4.83	N/A	N/A	1	80%	3.86	INSUMOS TERAPIA RESPIRATORIA
5.57	N/A	N/A	1	80%	4.46	T. SUCIO: UCI NEO
4.79	N/A	N/A	1	80%	3.83	WC (EN PASILLO HACIA DESCANSO UCI NEO)
8.23	N/A	N/A	1	80%	6.58	ESPACIO: POCETAS (HACIA DESCANSO) + MURO POSTERIOR DE CENTRAL ENFERMERIA DE INTENSIVOS
20.14	N/A	N/A	1	80%	16.11	CUARTO DE EQUIPOS
6.77	N/A	N/A	1	80%	5.42	LIMPIO: UCI NEO
6.66	N/A	N/A	1	80%	5.33	SUCIO: UCI NEO
8.54	N/A	N/A	1	80%	6.83	PASILLO: VESTIER PERSONAL ASISTENCIAL
2.67	N/A	N/A	1	80%	2.14	SUCIO: PASILLO VESTIER PERSONAL ASISTENCIAL
2.92	N/A	N/A	1	80%	2.34	LIMPIO: PASILLO VESTIER PERSONAL ASISTENCIAL
6.13	N/A	N/A	1	80%	4.90	INSUMOS TERAPIA RESPIRATORIA
4.88	N/A	N/A	1	80%	3.90	WC: MUJERES
6.31	N/A	N/A	1	80%	5.05	WC PMR: MUJERES
11.25	N/A	N/A	1	80%	9.00	COORDINACIÓN UCI NEO
11.57	N/A	N/A	1	80%	9.26	VESTIER ASISTENCIAL
5.83	N/A	N/A	1	80%	4.66	WC: VESTIER
24.14	N/A	N/A	1	80%	19.31	SALA ESPERA-HALL
4.05	N/A	N/A	1	80%	3.24	RACK
9.48	N/A	N/A	1	80%	7.58	PASILLO: HACIA WCH Y VESTIER AUTOCLAVE
4.51	N/A	N/A	1	80%	3.61	WC H (PASILLO HACIA VESTIER AUTOCLAVE)
4.05	N/A	N/A	1	80%	3.24	VESTIER AUTOCLAVE
9.81	N/A	N/A	1	80%	7.85	FILTRO AUTOCLAVE
11.93	N/A	N/A	1	80%	9.54	WC PMR HOMBRE + INGRESO WC
3.93	N/A	N/A	1	80%	3.14	ROPA SUCIA (EXTERIOR DE RECUPERACIÓN PARTO)
5.46	N/A	N/A	1	80%	4.37	T. SUCIO (FRENTE CENTRAL ENFERMERIA DE RECUPERACIÓN PARTOS)
41.22	N/A	N/A	1	80%	32.98	TRABAJO PARTO + CENTRAL DE ENFERMERIA
7.77	N/A	N/A	1	80%	6.22	WC: TRABAJO PARTO
6.86	N/A	N/A	1	80%	5.49	T. LIMPIO (FRENTE CENTRAL ENFERMERIA DE RECUPERACIÓN PARTOS)
5.59	N/A	N/A	1	80%	4.47	ROPA LIMPIA: CENTRAL ENFER. DE RECUPERACIÓN PARTO
6.9	N/A	N/A	1	80%	5.52	T. LIMPIO: CENTRAL ENFER. DE RECUPERACIÓN PARTO
5.47	N/A	N/A	1	80%	4.38	WC 1: RECUPERACIÓN PARTO
4.2	N/A	N/A	1	80%	3.36	WC 2: RECUPERACIÓN PARTO
3.78	N/A	N/A	1	80%	3.02	DEP. ROPA SUCIA: UCI ARO
5.64	N/A	N/A	1	80%	4.51	LIMPIO: UCI ARO
7.24	N/A	N/A	1	80%	5.79	WC: UARO AISLADO -06
6.79	N/A	N/A	1	80%	5.43	WC 1 (FRENTE UARO-07)
8.36	N/A	N/A	1	80%	6.69	WC 2 (FRENTE UARO-07)
5.34	N/A	N/A	1	80%	4.27	EQUIPOS: FRENTE UARO-09
3.24	N/A	N/A	1	80%	2.59	ASEO: FRENTE UARO-09
4.85	N/A	N/A	1	80%	3.88	T. SUCIO: CENTRAL DE ENFERMERIA FRENTE A UARO 08
		PISO 3				
17.72	N/A	N/A	1	60%	10.63	UCI PEDIATRICA 1
16.35	N/A	N/A	1	60%	9.81	UCI PEDIATRICA 3
17.55	N/A	N/A	1	60%	10.53	UCI PEDIATRICA 5
13.86	N/A	N/A	1	60%	8.32	UCI PEDIATRICA 7
16.96	N/A	N/A	1	60%	10.18	UCI PEDIATRICA 9
15.94	N/A	N/A	1	60%	9.56	UCI PEDIATRICA 11
13.43	N/A	N/A	1	60%	8.06	UCI PEDIATRICA 12
14.14	N/A	N/A	1	60%	8.48	UCI PEDIATRICA 10
15.77	N/A	N/A	1	60%	9.46	UCI PEDIATRICA 8
12.67	N/A	N/A	1	60%	7.60	UCI PEDIATRICA 6
15.61	N/A	N/A	1	60%	9.37	UCI PEDIATRICA 4
12.33	N/A	N/A	1	60%	7.40	UCI PEDIATRICA 2
16.77	N/A	N/A	1	60%	10.06	PASILLO A CUARTO DE EQUIPOS
8.47	N/A	N/A	1	60%	5.08	CUARTO DE EQUIPOS
8.68	N/A	N/A	1	60%	5.21	CUARTO ESTERIL DEPOSITO DE INSUMOS
		PISO 4				
16.31	N/A	N/A	1	80%	13.05	HABITACION 424
16.67	N/A	N/A	1	80%	13.34	HABITACION 425
16.07	N/A	N/A	1	80%	12.86	HABITACION 418
16.22	N/A	N/A	1	80%	12.98	HABITACION 416
31.13	N/A	N/A	1	80%	24.90	PASILLO CIRCULACIÓN NORTE
10.40	N/A	N/A	1	80%	8.32	CIRCULACIÓNA ACCESO
8.14	N/A	N/A	1	80%	6.51	PASILLO SALIDA DE EMERGENCIA
17.63	N/A	N/A	1	80%	14.10	HALL
12.71	N/A	N/A	1	80%	10.17	IAMI
18.72	N/A	N/A	1	80%	14.98	CENTRAL DE ENFERMERIA
25.46	N/A	N/A	1	80%	20.37	PASILLO CIRCULACIÓN RESTRINGIDA
11.42	N/A	N/A	1	80%	9.14	PROCEDIMIENTOS
10.13	N/A	N/A	1	80%	8.10	DESCANSO MEDICO
8.48	N/A	N/A	1	80%	6.78	WC HABITACION 401
16.01	N/A	N/A	1	80%	12.81	HABITACION 402
8.85	N/A	N/A	1	80%	7.08	WC HABITACION 402
16.55	N/A	N/A	1	80%	13.24	HABITACION 407
8.63	N/A	N/A	1	80%	6.90	WC HABITACION 407
21.49	N/A	N/A	1	80%	17.19	HABITACION 408
4.17	N/A	N/A	1	80%	3.34	WC HABITACION 408
16.34	N/A	N/A	1	80%	13.07	HABITACION 410
8.56	N/A	N/A	1	80%	6.85	WC HABITACION 410
4.68	N/A	N/A	1	80%	3.74	PROCEDIMIENTOS
4.34	N/A	N/A	1	80%	3.47	WC DESCANSO
16.16	N/A	N/A	1	80%	12.93	HABITACION 411
8.38	N/A	N/A	1	80%	6.70	WC HABITACION 411
24.10	N/A	N/A	1	80%	19.28	PUESTO DE TRABAJO BALCON NORTE
15.51	N/A	N/A	1	80%	12.41	PASILLO SUR DESDE HABITACION 411
8.22	N/A	N/A	1	80%	6.58	
8.27	N/A	N/A	1	80%	6.62	BALCON SUR

OBSERVACIONES:

TOTAL	**2,599.81**	**Metro lineal**
ACUMULADO ANTERIOR	**1,922.00**	**Metro lineal**
PRESENTE ACTA	**677.81**	**Metro lineal**

Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoria:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	3.03	BOCA PUERTA EN GRANITO PULIDO (NO INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE)	CAP	3.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS - BASES - ACABADOS	UNIDAD	Metro lineal	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico









Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
PISO 4						
1.21	N/A	N/A	1	**80%**	**0.97**	HABITACION 424
1.2	N/A	N/A	1	**80%**	**0.96**	HABITACION 425
1.21	N/A	N/A	1	**80%**	**0.97**	HABITACION 423
1.2	N/A	N/A	1	**80%**	**0.96**	HABITACION 422
1.21	N/A	N/A	1	**80%**	**0.97**	HABITACION 421
1.2	N/A	N/A	1	**80%**	**0.96**	HABITACION 420
1.2	N/A	N/A	1	**80%**	**0.96**	HABITACION 419
1.2	N/A	N/A	1	**80%**	**0.96**	HABITACION 417
1.2	N/A	N/A	1	**80%**	**0.96**	HABITACION 416
1.2	N/A	N/A	1	**80%**	**0.96**	HABITACION 415
1.2	N/A	N/A	1	**80%**	**0.96**	HABITACION 414
1.2	N/A	N/A	1	**80%**	**0.96**	HABITACION 413
1.2	N/A	N/A	1	**80%**	**0.96**	HABITACION 418
1.76	N/A	N/A	1	**80%**	**1.41**	RESIDUS ORDINARIOS
1.76	N/A	N/A	1	**80%**	**1.41**	RESIDUOS PELIGROSOS
0.75	N/A	N/A	1	**80%**	**0.60**	ROPA SUCIA
0.9	N/A	N/A	1	**80%**	**0.72**	BAÑO MUJERES
0.87	N/A	N/A	1	**80%**	**0.70**	BAÑOS HOMBRES
0.93	N/A	N/A	1	**80%**	**0.74**	RACK
0.8	N/A	N/A	1	**80%**	**0.64**	TRABAJO SUCIO
0.7	N/A	N/A	1	**80%**	**0.56**	ROPA LIMPIA
1.2	N/A	N/A	1	**80%**	**0.96**	HABITACION 401
1.2	N/A	N/A	1	**80%**	**0.96**	HABITACION 402
1.2	N/A	N/A	1	**80%**	**0.96**	HABITACION 403
1.2	N/A	N/A	1	**80%**	**0.96**	HABITACION 404
1.2	N/A	N/A	1	**80%**	**0.96**	HABITACION 405
1.2	N/A	N/A	1	**80%**	**0.96**	HABITACION 406
1.2	N/A	N/A	1	**80%**	**0.96**	HABITACION 407
1.2	N/A	N/A	1	**80%**	**0.96**	HABITACION 408
0.8	N/A	N/A	1	**80%**	**0.64**	CUARTO DE EQUIPOS
1.2	N/A	N/A	1	**80%**	**0.96**	HABITACION 409
1.2	N/A	N/A	1	**80%**	**0.96**	HABITACION 410
1.2	N/A	N/A	1	**80%**	**0.96**	HABITACION 411
1.2	N/A	N/A	1	**80%**	**0.96**	HABITACION 412
PISO 1						
0.8	N/A	N/A	1	**90%**	**0.72**	WC CAFETERIA
0.9	N/A	N/A	1	**90%**	**0.81**	WC DISCAPACITADOS CAFETERIA
0.97	N/A	N/A	1	**90%**	**0.87**	WC DISCAPACITADOS SALA DE ESPERA ADULTOS
0.8	N/A	N/A	1	**80%**	**0.64**	WC DAMAS SALA DE ESPERA ADULTOS
0.8	N/A	N/A	1	**80%**	**0.64**	WC DESCANSO MEDICO 1
0.8	N/A	N/A	1	**80%**	**0.64**	WC DESCANSO MEDICO 2
0.8	N/A	N/A	1	**80%**	**0.64**	CONSULTORIO 4
1	N/A	N/A	1	**80%**	**0.80**	CONSULTORIO 1
0.9	N/A	N/A	1	**80%**	**0.72**	CONSULTORIO 2
0.9	N/A	N/A	1	**80%**	**0.72**	MONITOREO GINECOPSTETRICIA
0.9	N/A	N/A	1	**80%**	**0.72**	CONSULTORIO 5
0.9	N/A	N/A	1	**80%**	**0.72**	SALA ERA
0.9	N/A	N/A	1	**80%**	**0.72**	WC FAMILIAR
1.66	N/A	N/A	1	**80%**	**1.33**	
2.26	N/A	N/A	1	**80%**	**1.81**	WC DISCAPACITADOS GINECOPSTETRICIA
0.9	N/A	N/A	1	**80%**	**0.72**	BAÑO VESTIER ADMISIONES
0.8	N/A	N/A	1	**80%**	**0.64**	WC ECOGRAFO 1
1.2	N/A	N/A	1	**80%**	**0.96**	WC ECOGRAFO 2
0.8	N/A	N/A	1	**80%**	**0.64**	WC PROCEDIMIENTOS IMAGENOLOGIA
0.8	N/A	N/A	1	**80%**	**0.64**	WC TOMA DE MUESTRAS
0.8	N/A	N/A	1	**90%**	**0.72**	WC LABORATORIO
0.7	N/A	N/A	1	**90%**	**0.63**	WC FARMACIA
0.9	N/A	N/A	1	**90%**	**0.81**	WC MIXTO ESPERA IMAGENOLOGIA
0.9	N/A	N/A	1	**90%**	**0.81**	WC DISCAPACITADOS ESPERA IMAGENOLOGIA
0.8	N/A	N/A	1	**80%**	**0.64**	CONSULTORIO 3
1.5	N/A	N/A	1	**80%**	**1.20**	LAVADO DE PACIENTES
0.9	N/A	N/A	1	**80%**	**0.72**	LAVADO GINECOPSTETRICIA
0.8	N/A	N/A	1	**80%**	**0.64**	BAÑO HOMBRES ESPERA ADULTOS
0.8	N/A	N/A	1	**80%**	**0.64**	ROPA LIMPIA DIGITACIÓN
1.82	N/A	N/A	1	**80%**	**1.46**	BAÑO SALA EDA
1.96	N/A	N/A	1	**80%**	**1.57**	BAÑO OBSERVACION PEDIATRICA
0.8	N/A	N/A	1	**80%**	**0.64**	TRABAJO LIMPIO
0.8	N/A	N/A	1	**80%**	**0.64**	TRABAJO SUCIO
0.9	N/A	N/A	1	**80%**	**0.72**	ASEO IMAGENOLOGIA
0.8	N/A	N/A	1	**80%**	**0.64**	TRABAJO LIMPIO INSUMOS
1.8	N/A	N/A	1	**80%**	**1.44**	INGRESO IMAGENOLOGIA

OBSERVACIONES:

TOTAL	**61.45**	**Metro lineal**
ACUMULADO ANTERIOR	**0.00**	**Metro lineal**
PRESENTE ACTA	**61.45**	**Metro lineal**


Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:

PROYECTO	REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO FIJO PARA LA OPERACIÓN DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARÍA JOSEFA CANELONES" DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ITEM	3.04	PULIDA Y DESTRONADO DE PISO EN BALDOSIN DE GRANITO	CAP	3.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS - BASES - ACABADOS	UNIDAD	Metro Cuadrado	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico




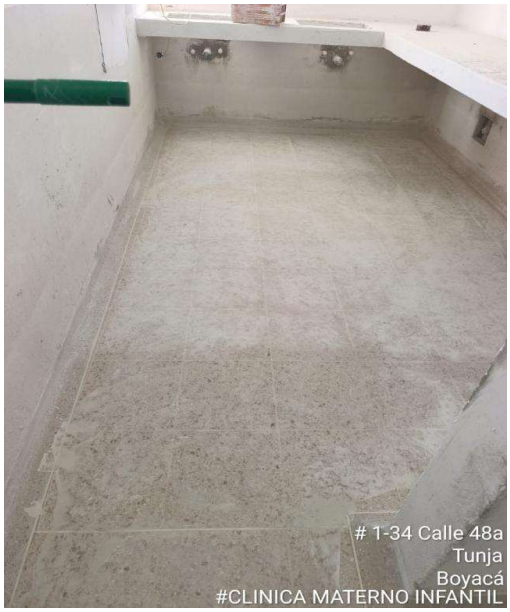




Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
		SOTANO				
6.96	9.98	N/A	1	0%	**0.00**	COCINA
0.96	0.60	N/A	-1	0%	**0.00**	DESCUENTO
0.30	0.30	N/A	-1	0%	**0.00**	
0.26	0.60	N/A	-1	0%	**0.00**	
5.90	0.15	N/A	-1	0%	**0.00**	
2.60	4.34	N/A	1	0%	**0.00**	CONSULTORIO DIETAS
1.74	2.02	N/A	1	0%	**0.00**	SALA DE ESTAR
1.83	1.00	N/A	1	0%	**0.00**	PASILLO SALA DE ESTAR
4.20	1.60	N/A	1	0%	**0.00**	
2.10	0.40	N/A	1	0%	**0.00**	
4.39	1.81	N/A	1	0%	**0.00**	PASILLO CONSULTORIO DIETAS
12.34	2.34	N/A	1	0%	**0.00**	PASILLO ASCENSORES
2.17	2.21	N/A	1	0%	**0.00**	
1.26	0.45	N/A	1	0%	**0.00**	
2.20	1.08	N/A	1	0%	**0.00**	CUARTO BAJO ESCALERAS
4.07	4.84	N/A	1	0%	**0.00**	DEPOSITO ALMACEN
0.30	0.42	N/A	-1	0%	**0.00**	DESCUENTO
0.80	0.15	N/A	1	0%	**0.00**	BOCA PUERTA DEPOSITO
3.88	1.80	N/A	1	0%	**0.00**	PASILLO ROPA LIMPIA
2.45	6.74	N/A	1	0%	**0.00**	PASILLO DEPOSITO DE CADAVERES
0.84	1.47	N/A	1	0%	**0.00**	
1.37	2.14	N/A	1	0%	**0.00**	
2.75	2.12	N/A	1	0%	**0.00**	PASILLO IGRESO ARCHIVO
2.88	1.55	N/A	1	0%	**0.00**	
3.94	9.85	N/A	1	0%	**0.00**	ARCHIVO
7.98	5.04	N/A	1	0%	**0.00**	
0.43	0.27	N/A	-1	0%	**0.00**	DESCUETO
0.43	0.20	N/A	-1	0%	**0.00**	
1.60	1.45	N/A	-1	0%	**0.00**	
10.00	1.76	N/A	1	0%	**0.00**	BODEGA FARMACIA
11.98	5.04	N/A	1	0%	**0.00**	
1.60	1.62	N/A	1	0%	**0.00**	
0.27	0.42	N/A	-1	0%	**0.00**	DESCUENTO
0.44	0.20	N/A	-2	0%	**0.00**	
0.20	0.20	N/A	-2	0%	**0.00**	
4.83	2.49	N/A	1	0%	**0.00**	CUARTO ASEO
0.42	0.24	N/A	-1	0%	**0.00**	DESCUENTO
1.60	2.60	N/A	1	0%	**0.00**	DEPOSITO 1
1.62	2.40	N/A	1	0%	**0.00**	DEPOSITO 2
7.20	5.52	N/A	1	0%	**0.00**	LAVANDERIA
3.70	0.50	N/A	-1	0%	**0.00**	DESCUENTO
		PISO 1				
7.03	2.36	N/A	1	90%	**14.93**	LABORATORIO
2.00	0.15	N/A	1	90%	**0.27**	LABORATORIO
5.88	2.36	N/A	1	90%	**12.49**	LABORATORIO
1.65	1.10	N/A	1	90%	**1.63**	LABORATORIO
0.80	0.15	N/A	1	90%	**0.11**	LABORATORIO
3.48	2.19	N/A	1	90%	**6.86**	LABORATORIO
3.90	1.62	N/A	1	90%	**5.69**	LABORATORIO
3.59	2.19	N/A	1	90%	**7.08**	LABORATORIO
3.89	2.32	N/A	1	90%	**8.12**	LABORATORIO
6.79	1.19	N/A	1	90%	**7.27**	PASILLO LABORATORIO
4.06	1.21	N/A	1	90%	**4.42**	PASILLO LABORATORIO
0.25	0.25	N/A	-3	90%	**-0.17**	DESCUENTOS
1.30	0.15	N/A	-1	90%	**-0.18**	DESCUENTOS
3.66	2.54	N/A	1	90%	**8.37**	RECEPCION MUESTRAS
4.78	0.15	N/A	-1	90%	**-0.65**	DESCUENTOS
3.62	1.08	N/A	1	90%	**3.52**	TOMA MUESTRAS GINECOLOGICAS
1.62	2.44	N/A	1	90%	**3.56**	TOMA MUESTRAS GINECOLOGICAS
0.64	0.36	N/A	-1	90%	**-0.21**	DESCUENTOS
3.76	3.01	N/A	1	90%	**10.19**	TOMA MUESTRA
2.90	1.89	N/A	1	90%	**4.93**	RECIBO Y TOMA MUESTRAS
4.96	3.06	N/A	1	90%	**13.66**	FARMACIA
1.92	1.79	N/A	1	90%	**3.09**	FARMACIA
6.94	4.89	N/A	1	90%	**30.54**	FARMACIA
2.17	0.15	N/A	-1	90%	**-0.29**	DESCUENTOS
1.14	0.15	N/A	-1	90%	**-0.15**	DESCUENTOS
1.77	2.45	N/A	-1	90%	**-3.90**	DESCUENTOS
1.63	2.22	N/A	1	90%	**3.26**	ADMINISTRATIVA
15.73	2.00	N/A	1	90%	**28.31**	PASILLO
4.27	1.60	N/A	1	90%	**6.15**	PASILLO
2.42	1.91	N/A	1	90%	**4.16**	SALA PROCEDIMIENTOS
2.80	2.67	N/A	1	90%	**6.73**	SALA LECTURA
0.56	0.35	N/A	-1	90%	**-0.18**	DESCUENTOS
6.75	2.91	N/A	1	90%	**17.68**	ECOGRAFO
1.61	1.55	N/A	-1	90%	**-2.25**	DESCUENTOS
5.17	2.93	N/A	1	90%	**13.63**	CONSULTORIO ECOGRAFO
1.33	1.54	N/A	-1	90%	**-1.84**	DESCUENTOS
0.42	0.36	N/A	-1	90%	**-0.14**	DESCUENTOS
3.73	2.16	N/A	1	90%	**7.25**	ESPERA
1.57	0.46	N/A	1	90%	**0.65**	ESPERA
0.43	0.41	N/A	-1	90%	**-0.16**	DESCUENTOS
3.26	2.68	N/A	1	90%	**7.86**	OFICINA RADIOLOGIA
1.90	0.13	N/A	-1	90%	**-0.22**	DESCUENTOS
0.61	0.21	N/A	-1	90%	**-0.12**	DESCUENTOS
5.28	3.39	N/A	1	0%	**0.00**	RAYOS X
1.94	0.13	N/A	-1	0%	**0.00**	DESCUENTOS
0.60	0.27	N/A	-1	0%	**0.00**	DESCUENTOS
0.25	0.27	N/A	-1	0%	**0.00**	DESCUENTOS
1.43	2.02	N/A	1	0%	**0.00**	DISPARO
4.91	2.41	N/A	1	0%	**0.00**	PASILLO RX
1.53	1.88	N/A	1	0%	**0.00**	PASILLO RX
2.03	0.88	N/A	1	80%	**1.43**	VESTIER
2.36	2.76	N/A	1	80%	**5.21**	MAMOGRAFO
5.08	3.14	N/A	1	80%	**12.76**	PROCEDIMIENTOS
3.43	3.60	N/A	1	80%	**9.88**	ADMISIONES
1.98	0.51	N/A	1	80%	**0.81**	ADMISIONES
1.92	0.15	N/A	-1	80%	**-0.23**	DESCUENTOS
4.06	2.50	N/A	1	80%	**8.12**	CONSULTORIO CARDIOLOGIA
1.21	0.28	N/A	-1	80%	**-0.27**	DESCUENTOS
0.50	0.33	N/A	-1	80%	**-0.13**	DESCUENTOS
5.86	3.40	N/A	1	80%	**15.94**	T.A.C
2.83	2.61	N/A	1	80%	**5.91**	DISPARO
0.41	0.28	N/A	-1	80%	**-0.09**	DESCUENTOS
0.67	0.26	N/A	-1	80%	**-0.14**	DESCUENTOS
4.76	4.72	N/A	1	80%	**17.97**	OBSERVACION GINECOBSTETRICIA
4.22	3.99	N/A	1	80%	**13.47**	OBSERVACION GINECOBSTETRICIA
0.42	0.42	N/A	-1	80%	**-0.14**	DESCUENTOS
3.00	2.86	N/A	1	80%	**6.86**	CENTRAL ENFERMERA
0.41	0.42	N/A	-1	80%	**-0.14**	DESCUENTOS
5.12	2.00	N/A	1	80%	**8.19**	PASILLO
3.16	1.42	N/A	1	80%	**3.59**	PASILLO
15.24	3.78	N/A	1	80%	**46.09**	OBSERVACION PEDIATRICA
8.94	0.24	N/A	-1	80%	**-1.72**	DESCUENTOS



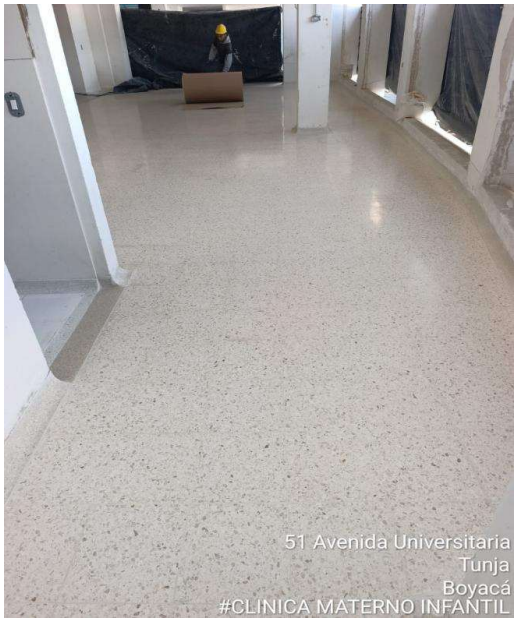



2.75	0.11	N/A	-1	80%	-0.24	DESCUENTOS
0.80	0.11	N/A	-1	80%	-0.07	DESCUENTOS
0.42	0.25	N/A	-3	80%	-0.25	DESCUENTOS
32.04	2.56	N/A	1	80%	65.62	PASILLO URGENCIA
1.34	1.08	N/A	1	80%	1.16	RESIDUOS ORDINARIOS
1.00	1.13	N/A	1	80%	0.90	RESIDUOS PELIGROSOS
2.68	3.06	N/A	1	80%	6.56	DIRECCION URGENCIAS
3.50	1.75	N/A	1	80%	4.90	SALA ERA
3.23	2.24	N/A	1	80%	5.79	SALA ERA
0.30	0.30	N/A	-1	80%	-0.07	DESCUENTOS
0.80	0.28	N/A	-1	80%	-0.18	DESCUENTOS
3.55	3.52	N/A	1	80%	10.00	PROCEDIMIENTOS ASCEPTICOS
0.42	0.28	N/A	-1	80%	-0.09	DESCUENTOS
1.19	5.25	N/A	1	80%	5.00	DIGITACION
2.65	1.99	N/A	1	80%	4.22	DIGITACION
1.42	1.31	N/A	1	80%	1.49	INSUMOS FARMACIA
1.43	0.43	N/A	1	80%	0.49	EQUIPOS
3.49	4.33	N/A	1	80%	12.09	SALA YESOS
2.65	3.46	N/A	1	80%	7.34	SALA ERA
1.85	1.16	N/A	1	80%	1.72	SALA ERA
0.89	0.25	N/A	-1	80%	-0.18	DESCUENTOS
0.25	0.27	N/A	-1	80%	-0.05	DESCUENTOS
3.77	1.84	N/A	1	80%	5.55	CONSULTORIO 5
2.08	2.27	N/A	1	80%	3.78	CONSULTORIO 5
0.42	0.28	N/A	-1	80%	-0.09	DESCUENTOS
3.85	1.74	N/A	1	80%	5.36	MONITOREO GINECOBSTETRICIA
5.58	5.48	N/A	1	80%	24.46	MONITOREO GINECOBSTETRICIA
2.18	1.38	N/A	-1	80%	-2.41	DESCUENTOS
0.32	0.30	N/A	-1	80%	-0.08	DESCUENTOS
0.44	0.80	N/A	-1	80%	-0.28	DESCUENTOS
5.09	1.52	N/A	1	80%	6.19	CONSULTORIO 2
3.67	1.72	N/A	1	80%	5.05	CONSULTORIO 2
4.98	1.60	N/A	1	80%	6.37	CONSULTORIO 1
3.28	1.92	N/A	1	80%	5.04	CONSULTORIO 1
0.29	0.22	N/A	-1	80%	-0.05	DESCUENTOS
3.93	1.64	N/A	1	80%	5.16	CONSULTORIO 4
0.44	0.83	N/A	-1	80%	-0.29	DESCUENTOS
1.83	0.40	N/A	-1	80%	-0.59	DESCUENTOS
5.74	3.17	N/A	1	80%	14.56	CONSULTORIO 3
1.65	0.83	N/A	-1	80%	-1.10	DESCUENTOS
6.16	5.06	N/A	1	80%	24.94	REANIMACION
1.16	0.30	N/A	1	80%	0.28	REANIMACION
5.81	2.91	N/A	1	80%	13.53	ADMISIONES URGENCIAS
1.90	0.15	N/A	-1	80%	-0.23	DESCUENTOS
1.06	0.51	N/A	-1	80%	-0.43	DESCUENTOS
0.43	0.30	N/A	-1	80%	-0.10	DESCUENTOS
0.88	1.50	N/A	1	80%	1.06	ACCESO LAVADO PACIENTES
2.26	2.09	N/A	1	80%	3.78	CONSULTORIO TRIAGE 2
0.44	0.26	N/A	-1	80%	-0.09	DESCUENTOS
2.76	3.33	N/A	1	80%	7.35	CONSULTORIO TRIAGE 1
0.30	0.26	N/A	-1	80%	-0.06	DESCUENTOS
2.93	1.48	N/A	1	80%	3.47	CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS
0.80	0.29	N/A	-1	80%	-0.19	DESCUENTOS
2.05	2.81	N/A	1	80%	4.61	PASILLO TRIAGE
2.93	1.80	N/A	1	0%	0.00	CUARTO EQUIPOS
0.23	0.20	N/A	-1	0%	0.00	DESCUENTOS
2.95	3.25	N/A	1	0%	0.00	CENTRAL DE CABLEADO
0.43	0.19	N/A	-1	0%	0.00	DESCUENTOS
0.93	2.22	N/A	1	0%	0.00	RACK
5.13	2.76	N/A	1	0%	0.00	DESCANSO INTERNOS
1.39	0.34	N/A	1	0%	0.00	DESCANSO INTERNOS
3.63	2.65	N/A	1	0%	0.00	FACTURACION Y ADMISIONES
0.20	0.33	N/A	-1	0%	0.00	DESCUENTOS
0.30	0.55	N/A	-1	0%	0.00	DESCUENTOS
0.30	0.47	N/A	-1	0%	0.00	DESCUENTOS
2.55	3.00	N/A	1	0%	0.00	HALL
12.37	6.43	N/A	1	0%	0.00	HALL
4.54	5.81	N/A	1	80%	21.10	SALA DE ESPERA
1.18	0.34	N/A	-1	80%	-0.32	DESCUENTOS
1.81	4.63	N/A	1	80%	6.70	PASILLO
3.68	1.15	N/A	1	80%	3.39	ADMISIONES
1.00	0.15	N/A	-1	80%	-0.12	DESCUENTOS
6.45	1.60	N/A	1	80%	8.26	ACCESO PRINCIPAL
11.60	6.34	N/A	1	90%	66.19	CAFETERIA
2.26	2.15	N/A	1	90%	4.37	CAFETERIA
2.98	4.24	N/A	1	90%	11.37	CAFETERIA
4.90	2.55	N/A	1	90%	11.25	CAFETERIA
4.40	1.67	N/A	1	90%	6.61	CAFETERIA
0.60	0.27	N/A	-1	90%	-0.15	DESCUENTOS
0.26	0.27	N/A	-1	90%	-0.06	DESCUENTOS
0.30	0.30	N/A	-1	90%	-0.08	DESCUENTOS
2.23	1.34	N/A	-1	90%	-2.69	DESCUENTOS
6.44	5.11	N/A	1	90%	29.62	SALA DE ESTAR
3.28	1.60	N/A	-1	90%	-4.72	DESCUENTOS
9.97	7.15	N/A	1	90%	64.16	AUDITORIO
4.41	0.28	N/A	-1	90%	-1.11	DESCUENTOS
0.60	0.69	N/A	-1	90%	-0.37	DESCUENTOS
12.39	1.91	N/A	1	80%	18.93	PASILLOS
2.21	1.91	N/A	1	80%	3.38	PASILLOS
9.84	6.70	N/A	1	80%	52.74	SALA ESPERA ADULTOS
4.32	2.63	N/A	1	80%	9.09	SALA ESPERA ADULTOS
1.12	1.70	N/A	1	80%	1.52	SALA ESPERA ADULTOS
0.60	0.50	N/A	-1	80%	-0.24	DESCUENTOS
6.38	0.15	N/A	-1	80%	-0.77	DESCUENTOS
2.23	4.12	N/A	1	0%	0.00	ACCESO EMERGENCIAS
3.83	1.10	N/A	1	0%	0.00	ACCESO A BAÑOS
1.10	0.95	N/A	1	0%	0.00	CUARTO EN MONITOREO GINECOBSTETRICIA
1.60	0.52	N/A	2	0%	0.00	ACCESO ASCENSOR
		PISO 2				
4.69	2.00	N/A	1	0%	0.00	PASILLO INGRESO NEONATAL
2.34	3.10	N/A	1	0%	0.00	TRABAJOS ESTERIL
0.76	0.60	N/A	-1	0%	0.00	DESCUENTO
2.52	1.93	N/A	1	0%	0.00	FILTRO VISITANTES
0.60	0.35	N/A	-1	0%	0.00	DESCUENTO
0.66	0.18	N/A	-1	0%	0.00	DESCUENTO
10.36	2.20	N/A	1	0%	0.00	PASILLO ASCENSOR
2.31	3.40	N/A	1	0%	0.00	LACTARIO
0.88	0.70	N/A	-1	0%	0.00	DESCUENTO
1.60	1.30	N/A	1	0%	0.00	BODEGA LACTARIO
2.76	3.23	N/A	1	0%	0.00	ESTRACCION
0.95	0.58	N/A	-1	0%	0.00	DESCUENTO
25.00	1.98	N/A	1	0%	0.00	PASILLO PUERTA QUIROFANOS
2.17	2.42	N/A	1	0%	0.00	PASILLO UCI ADULTOS
15.33	2.69	N/A	1	0%	0.00	
2.78	1.95	N/A	1	0%	0.00	
9.25	2.28	N/A	1	0%	0.00	
19.79	4.68	N/A	1	0%	0.00	UCI ADULTOS
31.83	0.15	N/A	-1	0%	0.00	DESCUENTO
9.81	4.00	N/A	1	0%	0.00	UCI ADULTOS FONDO
11.90	0.15	N/A	-1	0%	0.00	











3.85	0.42	N/A	-1	0%	0.00	DESCUENTO
0.20	0.60	N/A	-9	0%	0.00	
2.02	3.03	N/A	1	0%	0.00	CENTRAL ENFERMERIA UCI
2.74	1.10	N/A	1	0%	0.00	FILTRO ACCESO FAMILIA
2.14	1.11	N/A	1	0%	0.00	INFORMACION FAMILARES
3.05	1.16	N/A	1	0%	0.00	CENTRAL ENFERMERIA 2
1.34	1.44	N/A	1	0%	0.00	DEPOSITO DE INSUMOS
1.18	2.00	N/A	1	0%	0.00	EQUIPOS
0.77	1.13	N/A	1	0%	0.00	RACK
2.75	2.27	N/A	1	0%	0.00	DESCANSO
1.27	0.15	N/A	-1	0%	0.00	DESCUENTO
1.29	1.56	N/A	1	0%	0.00	RECEPCIÓN
1.71	1.31	N/A	1	0%	0.00	RACK
0.77	0.18	N/A	-1	0%	0.00	DESCUENTO
2.68	1.27	N/A	1	0%	0.00	PASILLO ACCESO
2.94	0.80	N/A	1	0%	0.00	FILTRO PERSONAL
1.63	2.74	N/A	1	0%	0.00	
1.20	0.28	N/A	-1	0%	0.00	DESCUENTO
5.38	2.41	N/A	1	0%	0.00	VESTIER PASILLO
2.88	0.15	N/A	-1	0%	0.00	DESCUENTO
1.94	1.02	N/A	-1	0%	0.00	
0.52	0.34	N/A	-1	0%	0.00	
1.43	2.28	N/A	1	0%	0.00	VESTIER
13.66	9.62	N/A	1	0%	0.00	RECUPERACION PARTOS
5.37	5.21	N/A	-1	0%	0.00	DESCUENTOS
4.29	4.39	N/A	-1	0%	0.00	
3.03	1.86	N/A	-1	0%	0.00	
0.40	0.40	N/A	-1	0%	0.00	
0.44	0.27	N/A	-1	0%	0.00	
0.42	0.27	N/A	-1	0%	0.00	
4.30	2.38	N/A	-1	0%	0.00	CENTRAL DE ENFERMERIA
4.93	0.15	N/A	-1	0%	0.00	DESCUENTO
28.21	2.00	N/A	1	0%	0.00	PASILLO QUIEROFANOS
0.25	2.42	N/A	1	0%	0.00	
10.89	2.17	N/A	1	0%	0.00	PASILLO AUTOCLAVE
3.90	2.05	N/A	1	0%	0.00	EQUIPOS
1.04	0.15	N/A	-1	0%	0.00	DESCUENTO
2.43	2.97	N/A	1	0%	0.00	DESCANSO
0.70	0.15	N/A	-1	0%	0.00	DESCUENTO
2.21	3.61	N/A	1	0%	0.00	DESCANSO
2.01	0.12	N/A	-1	0%	0.00	DESCUENTO
0.86	0.34	N/A	-1	0%	0.00	
0.59	1.34	N/A	1	0%	0.00	
5.00	1.76	N/A	1	0%	0.00	FARMACIA
0.43	0.40	N/A	-1	0%	0.00	DESCUENTO
0.95	0.14	N/A	-1	0%	0.00	
1.17	1.80	N/A	1	0%	0.00	BODEGA
0.80	0.20	N/A	1	0%	0.00	
5.17	1.00	N/A	1	0%	0.00	PASILLO FARMACIA
5.65	0.92	N/A	1	0%	0.00	
2.56	1.16	N/A	1	0%	0.00	
3.50	3.72	N/A	1	0%	0.00	DESCANSO
1.65	1.10	N/A	-1	0%	0.00	DESCUENTO
0.44	0.44	N/A	-1	0%	0.00	
3.86	1.10	N/A	1	0%	0.00	PASILLO DESCANSO
8.02	2.38	N/A	1	0%	0.00	VESTIER MUJERES
5.90	1.25	N/A	-1	0%	0.00	DESCUENTO
1.19	0.90	N/A	1	0%	0.00	VESTIER HOMBRES
2.45	2.64	N/A	1	0%	0.00	
1.21	0.35	N/A	1	0%	0.00	
4.32	2.14	N/A	1	0%	0.00	
1.13	1.77	N/A	-1	0%	0.00	DESCUENTO
5.02	8.53	N/A	1	0%	0.00	AUTOCLAVE
0.78	0.74	N/A	1	0%	0.00	
0.73	1.56	N/A	-1	0%	0.00	DESCUENTO
2.07	1.43	N/A	-1	0%	0.00	
3.92	0.15	N/A	-1	0%	0.00	
3.55	2.39	N/A	1	0%	0.00	RECUPERACION PACIENTES
2.76	1.39	N/A	1	0%	0.00	
0.34	1.24	N/A	1	0%	0.00	
5.86	2.00	N/A	1	0%	0.00	PASILLO AUTOCLAVE
1.59	2.00	N/A	1	0%	0.00	
4.07	5.86	N/A	1	0%	0.00	PREPARACIO CIRUGIA
6.56	4.67	N/A	1	0%	0.00	RECUPERACION QUIRURGICA
4.11	6.00	N/A	1	0%	0.00	
2.13	3.04	N/A	-1	0%	0.00	DESCUENTO
1.44	1.50	N/A	1	0%	0.00	BODEGA
6.58	0.12	N/A	-1	0%	0.00	DESCUENTO
0.42	0.41	N/A	-1	0%	0.00	
6.55	8.92	N/A	1	0%	0.00	HALL
3.05	6.29	N/A	1	0%	0.00	
0.45	0.40	N/A	1	0%	0.00	DESCUENTO
1.23	1.33	N/A	1	0%	0.00	HALL
4.59	0.91	N/A	1	0%	0.00	INGRESO AUTOCLAVE POR HALL
0.56	0.20	N/A	-1	0%	0.00	DESCUENTO
1.82	1.73	N/A	1	0%	0.00	INSUMOS
8.80	0.90	N/A	1	0%	0.00	PASILLO
3.00	3.23	N/A	1	0%	0.00	COORDINACION UCI NEONATAL
0.25	0.42	N/A	-1	0%	0.00	DESCUENTO
3.37	3.59	N/A	1	0%	0.00	VESTIER PERSONAL ASISTENCIA
1.75	1.72	N/A	1	0%	0.00	INSUMOS TERAPIA
2.78	4.85	N/A	1	0%	0.00	DESCANSO
2.00	0.15	N/A	-1	0%	0.00	DESCUENTO
10.98	4.83	N/A	1	0%	0.00	CUIDADOS INTERMEDIOS
0.42	3.82	N/A	1	0%	0.00	CUIDADOS INTERMEDIOS
0.42	3.02	N/A	1	0%	0.00	CUIDADOS INTERMEDIOS
3.10	1.50	N/A	1	0%	0.00	CUIDADOS INTERMEDIOS
9.38	4.62	N/A	1	0%	0.00	CUIDADOS INTERMEDIOS
0.12	2.88	N/A	-4	0%	0.00	DESCUENTO MUROS
0.42	2.31	N/A	1	0%	0.00	CUIDADOS INTENSOS
0.42	6.31	N/A	1	0%	0.00	CUIDADOS INTENSOS
12.19	4.09	N/A	1	0%	0.00	CUIDADOS INTENSOS
6.41	0.12	N/A	-1	0%	0.00	DESCUENTO MUROS
5.68	4.18	N/A	1	0%	0.00	CUIDADOS INTENSIVOS
6.66	4.07	N/A	1	0%	0.00	CUIDADOS INTENSIVOS
0.84	5.49	N/A	1	0%	0.00	CIRCULACION LAVADO ENCUVADORAS
2.51	2.06	N/A	1	0%	0.00	CIRCULACION FRENTE AMBIENTE DE TRABAJO ESTERIL
0.80	5.46	N/A	1	0%	0.00	CICULACION A DESCANSO
0.12	5.48	N/A	-1	0%	0.00	DESCUENTO MURO CENTRAL EMFERMERIA
0.40	0.76	N/A	-1	0%	0.00	DESCUENTO AREA DE COLUMNAS
0.42	0.33	N/A	-1	0%	0.00	DESCUENTO AREA DE COLUMNAS
0.42	0.81	N/A	-1	0%	0.00	DESCUENTO AREA DE COLUMNAS
7.51	0.12	N/A	-1	0%	0.00	DESCUENTO MUROS
6.76	7.22	N/A	1	0%	0.00	RECUPERACIÓN PARTOS
0.66	0.10	N/A	1	0%	0.00	
0.40	0.10	N/A	-1	0%	0.00	DESCUENTO: COLUMNAS
0.15	0.10	N/A	-1	0%	0.00	DESCUENTO: COLUMNAS
0.74	0.30	N/A	-1	0%	0.00	DESCUENTO: COLUMNAS
0.75	0.26	N/A	-1	0%	0.00	DESCUENTO: COLUMNAS
0.60	0.16	N/A	-1	0%	0.00	DESCUENTO: COLUMNAS
1.45	0.16	N/A	-1	0%	0.00	DESCUENTO: ESPACIO DE DIJITACIÓN
2.85	3.68	N/A	1	0%	0.00	CENTRAL ENFERMERIA - RECUPERACIÓN PARTOS
3.90	0.16	N/A	-1	0%	0.00	DESCUENTO: ÁREA









5.52	0.83	N/A	1	0%	0.00	UCI NEO - CIRCULACIÓN CUARTO DE ASEO
		PISO 3				
4.57	2.13	N/A	1	0%	0.00	HORATORIO
9.00	6.61	N/A	1	0%	0.00	HALL ORATORIO
6.66	0.15	N/A	-1	0%	0.00	DESCUENTO
1.50	0.15	N/A	-1	0%	0.00	
2.75	2.30	N/A	-1	0%	0.00	
7.43	2.00	N/A	1	0%	0.00	PASILLO INGRESO
13.54	1.80	N/A	1	0%	0.00	PASILLO SCIRCULACIÓN RESTRINGIDA
2.24	1.68	N/A	1	0%	0.00	
0.80	0.90	N/A	1	0%	0.00	
4.30	0.30	N/A	1	0%	0.00	
2.50	3.52	N/A	1	0%	0.00	DESCANSO VESTIER
1.35	1.64	N/A	-1	0%	0.00	DESCUENTO
2.14	0.92	N/A	1	0%	0.00	DEPOSITO INSUMOS
2.25	2.39	N/A	1	0%	0.00	PROCEDIMIENTOS
1.43	1.23	N/A	1	0%	0.00	
0.43	0.42	N/A	-1	0%	0.00	DESCUENTO
4.70	2.07	N/A	1	0%	0.00	CENTRAL DE ENFERMERIA
0.90	0.37	N/A	-1	0%	0.00	DESCUENTO
0.27	0.32	N/A	-1	0%	0.00	
3.40	3.84	N/A	1	0%	0.00	HABITACIÓN 308
4.74	1.57	N/A	1	0%	0.00	
2.74	0.37	N/A	-1	0%	0.00	DESCUENTO
3.32	3.29	N/A	1	0%	0.00	HABITACÓN 302
0.84	0.30	N/A	1	0%	0.00	
2.65	1.65	N/A	1	0%	0.00	
3.46	3.27	N/A	1	0%	0.00	HABITACIÓN 301
2.61	1.65	N/A	1	0%	0.00	
47.44	1.99	N/A	1	0%	0.00	PASILLO PRINCIPAL
3.30	3.49	N/A	1	0%	0.00	HABITACIÓN 307
1.58	0.33	N/A	1	0%	0.00	
2.42	1.45	N/A	1	0%	0.00	
0.14	0.26	N/A	-1	0%	0.00	DESCUENTO
2.41	1.52	N/A	1	0%	0.00	HABITACIÓN 310
3.21	3.41	N/A	1	0%	0.00	
0.33	1.65	N/A	1	0%	0.00	
2.43	1.47	N/A	1	0%	0.00	HABITACIÓN 311
3.51	3.15	N/A	1	0%	0.00	
0.33	1.56	N/A	1	0%	0.00	
2.55	1.48	N/A	1	0%	0.00	HABITACIÓN 316
3.29	3.28	N/A	1	0%	0.00	
0.33	1.58	N/A	1	0%	0.00	
2.60	1.47	N/A	1	0%	0.00	HABITACIÓN 318
3.40	3.05	N/A	1	0%	0.00	
0.33	1.55	N/A	1	0%	0.00	
2.51	1.56	N/A	1	0%	0.00	HABITACIÓN 324
0.33	1.67	N/A	1	0%	0.00	
3.34	3.48	N/A	1	0%	0.00	
2.50	1.62	N/A	1	0%	0.00	HABITACIÓN 325
3.45	3.53	N/A	1	0%	0.00	
0.33	1.72	N/A	1	0%	0.00	
0.32	0.38	N/A	-1	0%	0.00	DESCUENTO
1.20	2.00	N/A	1	0%	0.00	BALCON NORTE
1.34	5.13	N/A	1	0%	0.00	
5.13	1.80	N/A	1	0%	0.00	BALCON SUR
1.50	1.20	N/A	1	0%	0.00	BAÑO HABITACION 302
1.60	1.20	N/A	1	0%	0.00	BAÑO HABITACION 301
1.84	1.20	N/A	1	0%	0.00	BAÑO HABITACION 307
1.30	1.80	N/A	1	0%	0.00	BAÑO HABITACION 308
1.70	1.30	N/A	1	0%	0.00	BAÑO HABITACION 310
1.50	1.30	N/A	1	0%	0.00	BAÑO HABITACION 311
1.60	1.40	N/A	1	0%	0.00	BAÑO HABITACION 316
1.40	1.30	N/A	1	0%	0.00	BAÑO HABITACION 318
1.70	1.30	N/A	1	0%	0.00	BAÑO HABITACION 325
1.40	1.30	N/A	1	0%	0.00	BAÑO HABITACION 324
2.26	1.37	N/A	1	0%	0.00	DEPOSITO INSUMOS
0.79	0.16	N/A	1	0%	0.00	DEPOSITO INSUMOS
1.38	1.58	N/A	1	0%	0.00	FILTRO INGRESO
0.79	0.16	N/A	1	0%	0.00	FILTRO INGRESO
0.76	0.61	N/A	1	0%	0.00	PREPACION FORMULAS
0.61	1.58	N/A	1	0%	0.00	PREPACION FORMULAS
3.86	2.52	N/A	1	0%	0.00	PREPACION FORMULAS
0.79	0.15	N/A	1	0%	0.00	PREPACION FORMULAS
3.74	2.01	N/A	1	0%	0.00	CIRCULACION
3.07	0.30	N/A	1	0%	0.00	CIRCULACION
2.00	0.30	N/A	1	0%	0.00	CIRCULACION
1.90	0.60	N/A	1	0%	0.00	CIRCULACION
7.94	1.31	N/A	1	0%	0.00	CIRCULACION
0.75	0.93	N/A	1	0%	0.00	CIRCULACION
1.59	0.93	N/A	1	0%	0.00	CIRCULACION
0.90	0.15	N/A	1	0%	0.00	CIRCULACION
3.59	2.15	N/A	1	0%	0.00	IMFORMACION A FAMILIARES
5.45	1.32	N/A	1	0%	0.00	CIRCULACION
2.17	1.52	N/A	1	0%	0.00	ESTACION DE CAFÉ
3.27	4.91	N/A	1	0%	0.00	DESCANSO MEDICO
0.90	0.15	N/A	1	0%	0.00	DESCANSO MEDICO
3.76	3.15	N/A	1	0%	0.00	DESCANSO EMFERMERIA
4.94	3.53	N/A	1	0%	0.00	TERRAZA SOLAR
5.11	3.25	N/A	1	0%	0.00	LUDOTECA
9.89	6.86	N/A	1	0%	0.00	
4.70	0.16	N/A	-1	0%	0.00	DESCUENTO CENTRAL ENFERMERIA
4.11	3.00	N/A	1	0%	0.00	INGRESO A LUDOTECA
1.55	1.29	N/A	-1	0%	0.00	DESCUENTO
3.53	2.00	N/A	1	0%	0.00	PASILLO A ZONA ADMINISTRATIVA
0.86	1.63	N/A	1	0%	0.00	BODEGA
4.85	3.72	N/A	1	0%	0.00	UCI 11
0.84	0.15	N/A	-1	0%	0.00	DESCUENTO
4.92	3.55	N/A	1	0%	0.00	UCI 9
0.15	1.60	N/A	-1	0%	0.00	DESCUENTO
3.99	2.88	N/A	1	0%	0.00	UCI 12
0.40	0.12	N/A	-1	0%	0.00	DESCUENTO
3.27	3.30	N/A	1	0%	0.00	UCI 10
0.73	1.00	N/A	1	0%	0.00	UCI 10
1.20	0.15	N/A	-1	0%	0.00	DESCUENTO
1.87	5.43	N/A	1	0%	0.00	CICULACION ENTRE UCIS 12-10-09-11
3.20	3.98	N/A	1	0%	0.00	UCI 8
0.98	1.00	N/A	1	0%	0.00	UCI 8
1.60	0.15	N/A	-1	0%	0.00	DESCUENTO
5.25	3.30	N/A	1	0%	0.00	UCI 7
1.60	0.15	N/A	-1	0%	0.00	DESCUENTO
5.32	3.30	N/A	1	0%	0.00	UCI 5
1.78	0.15	N/A	-1	0%	0.00	DESCUENTO
4.55	3.25	N/A	1	0%	0.00	UCI 6
1.65	0.15	N/A	-1	0%	0.00	DESCUENTO
1.54	6.92	N/A	1	0%	0.00	CIRCULACION 6-5-7-8
4.12	3.24	N/A	1	0%	0.00	UCI 4
1.23	0.15	N/A	-1	0%	0.00	DESCUENTO
3.74	3.25	N/A	1	0%	0.00	UCI 2
1.58	0.15	N/A	-1	0%	0.00	DESCUENTO
5.45	2.96	N/A	1	0%	0.00	UCI 1 AISLADO
2.61	0.15	N/A	-1	0%	0.00	DESCUENTO





5.50	3.29	N/A	1	0%	0.00	UCI 3
1.70	0.15	N/A	-1	0%	0.00	DESCUENTO
6.35	2.35	N/A	1	0%	0.00	CIRCULACION ENTRE UCIS 1-3-5-6
13.84	2.00	N/A	1	0%	0.00	CIRCULACION ENTRE UCI Y LUDOTECA
1.31	3.07	N/A	1	0%	0.00	CIRCULACION FRENTE A TRABAJO LIMPIO
7.92	0.95	N/A	1	0%	0.00	CIRCULACION A TRANFERENCIA
1.71	2.82	N/A	1	0%	0.00	CUARTO EQUIPOS
1.50	2.79	N/A	1	0%	0.00	CUARTO ESTERIL
1.00	0.50	N/A	1	0%	0.00	TRANSFERENCIA MEDICAMENTOS
1.65	0.88	N/A	1	0%	0.00	TRANSFERENCIA MEDICAMENTOS
0.80	0.15	N/A	1	0%	0.00	ACCESO ASISTENCIAL
1.11	3.24	N/A	1	0%	0.00	ACCESO ASISTENCIAL
0.83	0.15	N/A	1	0%	0.00	TRANSFERENCIA MEDICAMENTOS
0.92	1.70	N/A	1	0%	0.00	TRANSFERENCIA MEDICAMENTOS
1.35	2.01	N/A	1	0%	0.00	IMFORMACION FAMILIAR
3.99	2.92	N/A	1	0%	0.00	EXTRACION LECHE MATERNA
3.60	2.99	N/A	1	0%	0.00	COORDINACION PEDIATRA
1.36	1.63	N/A	1	0%	0.00	COORDINACION UCI PEDIATRA
2.98	3.19	N/A	1	0%	0.00	COORDINACION UCI PEDIATRA
		PISO 4				
5.15	1.53	N/A	1	60%	4.73	BALCON SUR
47.37	2.00	N/A	1	60%	56.84	PASILLO HABITACIONES
2.00	1.14	N/A	1	60%	1.37	BALCON NORTE
1.62	5.12	N/A	1	60%	4.98	
2.42	1.50	N/A	1	60%	2.18	HABITACIÓN 425
0.33	1.61	N/A	1	60%	0.32	
3.52	3.36	N/A	1	60%	7.10	
0.31	0.35	N/A	-1	60%	-0.07	DESCUENTO
2.42	1.58	N/A	1	60%	2.29	HABITACIÓN 424
0.33	1.70	N/A	1	60%	0.34	
3.46	3.36	N/A	1	60%	6.98	
2.40	1.47	N/A	1	60%	2.12	HABITACIÓN 418
0.33	1.58	N/A	1	60%	0.31	
3.06	3.52	N/A	1	60%	6.46	
0.33	1.56	N/A	1	60%	0.31	HABITACIÓN 416
3.24	3.28	N/A	1	60%	6.38	
2.55	1.48	N/A	1	60%	2.26	
2.39	1.48	N/A	1	60%	2.12	HABITACIÓN 411
0.33	1.61	N/A	1	60%	0.32	
3.50	3.08	N/A	1	60%	6.47	
2.41	1.52	N/A	1	60%	2.20	HABITACIÓN 410
3.21	3.41	N/A	1	60%	6.57	
0.33	1.56	N/A	1	60%	0.31	
3.30	3.49	N/A	1	60%	6.91	HABITACIÓN 407
1.58	0.33	N/A	1	60%	0.31	
2.42	1.45	N/A	1	60%	2.11	
0.14	0.26	N/A	-1	60%	-0.02	DESCUENTO
2.42	1.53	N/A	1	60%	2.22	HABITACIÓN 401
0.30	1.66	N/A	1	60%	0.30	
3.36	1.15	N/A	1	60%	2.32	
3.29	3.32	N/A	1	60%	6.55	HABITACIÓN 402
0.84	0.30	N/A	1	60%	0.15	
2.65	1.65	N/A	1	60%	2.62	
13.63	1.78	N/A	1	60%	14.56	PASILLO CIRCULACIÓN RESTRINGIDA
4.39	0.27	N/A	1	60%	0.71	
1.49	2.44	N/A	1	60%	2.18	
0.80	0.80	N/A	1	60%	0.38	
3.53	2.50	N/A	1	60%	5.30	DESCANSO Y VESTIER
1.65	1.34	N/A	-1	60%	-1.33	DESCUENTO
4.81	1.56	N/A	1	60%	4.50	HABITACIÓN 408
3.01	3.69	N/A	1	60%	6.66	
0.33	1.68	N/A	1	60%	0.33	
2.83	0.27	N/A	-1	60%	-0.46	DESCUENTO
2.32	2.24	N/A	1	60%	3.12	PROCEDIMIENTOS
1.48	1.28	N/A	1	60%	1.14	
0.44	0.44	N/A	-1	60%	-0.12	DESCUENTO
4.88	2.10	N/A	1	60%	6.15	CENTRAL DE ENFERMERIA
0.38	0.87	N/A	-1	60%	-0.20	DESCUENTO
0.27	0.32	N/A	-1	60%	-0.05	
7.50	2.00	N/A	1	60%	9.00	PASILLO INGRESO
8.95	6.77	N/A	1	60%	36.35	HALL
9.16	0.15	N/A	-1	60%	-0.82	DESCUENTO
0.40	0.65	N/A	-1	60%	-0.16	
0.35	0.42	N/A	-1	60%	-0.09	
1.50	1.30	N/A	1	60%	1.17	BAÑO HABITACION 401
1.50	1.20	N/A	1	60%	1.08	BAÑO HABITACION 402
1.84	1.20	N/A	1	60%	1.32	BAÑO HABITACION 407
1.80	1.30	N/A	1	60%	1.40	BAÑO HABITACION 408
1.70	1.30	N/A	1	60%	1.33	BAÑO HABITACION 410
1.50	1.30	N/A	1	60%	1.17	BAÑO HABITACION 411
1.60	1.40	N/A	1	60%	1.34	BAÑO HABITACION 416
1.60	1.20	N/A	1	60%	1.15	BAÑO HABITACION 418
1.40	1.30	N/A	1	60%	1.09	BAÑO HABITACION 424
1.60	1.30	N/A	1	60%	1.25	BAÑO HABITACION 425

OBSERVACIONES:

TOTAL	**1199.86**	**Metro Cuadrado**
ACUMULADO ANTERIOR	**0.00**	**Metro Cuadrado**
PRESENTE ACTA	**1199.86**	**Metro Cuadrado**

Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	4.04	VENTANA EN ALUMINIO PINTURA BLANCA HOSPITALARIA. NO INCLUYE VIDRIO, ESTE SE PAGA POR SU RESPECTIVO ITEM	CAP	4.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA METALICA	UNIDAD	Metro Cuadrado	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico











Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
		PISO 1				
	1.27	1.3	1	100%	1.65	V1: LABORATORIO
	1.27	1.3	1	100%	1.65	V2: LABORATORIO
	1.27	1.3	1	100%	1.65	V3: LABORATORIO - ANALIZADOR
	1.27	1.3	1	100%	1.65	V4: FARMACIA - RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS)
	1.27	1.3	1	100%	1.65	V5: FARMACIA - ÁREA ESTANTERIA
	1.27	1.3	1	100%	1.65	V6: FARMACIA - ÁREA ESTANTERIA
	2.65	2.5	1	100%	6.63	V7: FARMACIA - ÁREA ESTANTERIA
	1.3	1.3	1	100%	1.69	V8: FARMACIA - ESCALERAS A SÓTANO
	3.01	2.4	1	100%	7.22	V9: FARMACIA - ENTREA FARMACIA
	3.01	2.4	1	100%	7.22	V10: SALA ESPERA IMAGENOLOGÍA
	3.03	2.4	1	100%	7.27	V11: SALA ESPERA IMAGENOLOGÍA
	3	2.4	1	100%	7.20	V12: CAFETERIA
	3.01	2.4	1	100%	7.22	V13: CAFETERIA
	3.06	2.4	1	100%	7.34	V14: CAFETERIA
	1.2	1.75	1	100%	2.10	V19: SALA ESPERA ADULTOS
	1.2	2.1	1	100%	2.52	V20: SALA ESPERA ADULTOS
	1.22	0.55	1	100%	0.67	V36: OBS. GINECOBSTETRICIA
	1.3	1.3	1	100%	1.69	V37: PROCEDIMIENTOS IMAGENOLOGÍA
	0.91	1.3	1	100%	1.18	V39: CONCULTORIO PARA ECOGRAFO
	1.3	1.3	1	100%	1.69	V41: ECOGRAFO
	0.68	1.3	1	100%	0.88	V43: LABORATORIO - RESIDUOS PELIGROSOS
	1.02	0.95	1	100%	0.97	V45: ÁREA ADMINISTRATIVA LABORATORIO
	1.3	1.3	1	100%	1.69	V46: LABORATORIO
	0.65	0.5	1	100%	0.33	V49: ÁREA ADMINISTRATIVA FARMACIA
	0.65	1	1	100%	0.65	V50: TRANSFUNCIONAL
	1.85	1.52	1	100%	2.81	V55: OFICINA RADIOLOGIA
	0.7	0.98	1	100%	0.69	V64: SALA ESPERA ADULTOS FRENTE A ADMISIONES URG
		PISO 2				
	1.9	0.7	1	100%	1.33	V12
	1.9	0.7	1	100%	1.33	V13
	1.3	1.28	1	100%	1.66	V14
	1.3	1.29	1	100%	1.68	V15
	1.4	1.29	1	100%	1.81	V16
	1	0.7	1	100%	0.70	V17
	1.04	1.29	1	100%	1.34	V18
	0.94	1.28	1	100%	1.20	V19
	1.3	1.28	1	100%	1.66	V20
	1.89	1.27	1	100%	2.40	V21
	0.98	0.95	1	100%	0.93	V22
	2.87	0.69	1	100%	1.98	V23
	3.04	0.69	1	100%	2.10	V24
	3.25	0.68	1	100%	2.21	V27
	3.06	0.68	1	100%	2.08	V28
	3.04	0.68	1	100%	2.07	V29
	3.1	0.68	1	100%	2.11	V30
	2.5	0.68	1	100%	1.70	V31
		PISO 3				
	3.34	1.35	1	100%	4.51	V4
	1.52	1.36	1	100%	2.07	V5 (IZQ)
	1.66	2.24	1	100%	3.72	V5 (DERCH)
	2.994	2.26	1	100%	6.77	V6
	1.3	1.35	1	100%	1.76	V7
	1.9	1.35	1	100%	2.57	V8
	0.8	0.7	1	100%	0.56	V9
	0.8	0.7	1	100%	0.56	V10
	0.697	0.688	1	100%	0.48	V11
	1.16	0.7	1	100%	0.81	V12
	0.8	0.7	1	100%	0.56	V13
	0.8	0.7	1	100%	0.56	V14
	0.8	0.7	1	100%	0.56	V15
	0.8	0.7	1	100%	0.56	V16
	3.05	0.7	1	100%	2.14	V17
	3.05	0.7	1	100%	2.14	V18
	3.05	0.7	1	100%	2.14	V19
	3.05	0.7	1	100%	2.14	V20
	3.05	0.7	1	100%	2.14	V21
	1	0.99	1	100%	0.99	V22

OBSERVACIONES:

TOTAL	147.57	Metro Cuadrado
ACUMULADO ANTERIOR	0.00	Metro Cuadrado
PRESENTE ACTA	147.57	Metro Cuadrado

Elaboró contratista:	Estefania Carvajal Henao	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	4.06	MANTENIMIENTO VENTANA EXISTENTE EN PVC	CAP	4.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA METALICA	UNIDAD	Metro Cuadrado	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL


Registro fotográfico









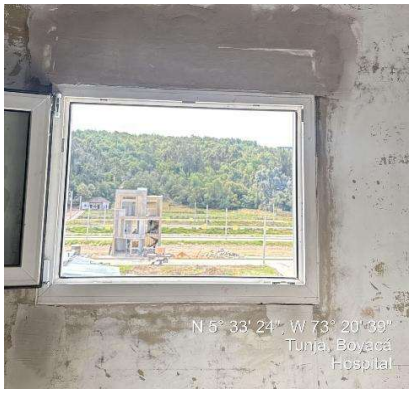

	Dimensiones					Total (m)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
			PISO 4				
		1	1	1	90%	0.90	V1: HABITACIÓN 02
		1.3	1.5	1	90%	1.76	V2: HABITACIÓN 04
		1.3	1.5	1	90%	1.76	V3: HABITACIÓN 06
		1.3	1.5	1	90%	1.76	V4: HABITACIÓN 08
		1.2	1.3	1	90%	1.40	V11: HABITACIÓN 13
		1.3	1.5	1	90%	1.76	V12: HABITACIÓN 15
		1.3	1.5	1	90%	1.76	V13: HABITACIÓN 17
		1.3	1.5	1	90%	1.76	V14: HABITACIÓN 19
		1.3	1.5	1	90%	1.76	V15: HABITACIÓN 21
		1.3	1.5	1	90%	1.76	V16: HABITACIÓN 23
		1.3	1.5	1	90%	1.76	V17: HABITACIÓN 25
		0.95	0.45	1	90%	0.38	V21: HABITACIÓN 24
		1.3	1.3	1	90%	1.52	V22: HABITACIÓN 22
		1.3	1.3	1	90%	1.52	V23: HABITACIÓN 20
		1.3	1.3	1	90%	1.52	V24: HABITACIÓN 18
		1.3	1.3	1	90%	1.52	V26: HABITACIÓN 14
		1.3	1.3	1	90%	1.52	V27: HABITACIÓN 12
		1.3	1.3	1	90%	1.52	V28: HABITACIÓN 11
		1.3	1.3	1	90%	1.52	V30: HABITACIÓN 09
		1.3	1.3	1	90%	1.52	V31: HABITACIÓN 07
		1.3	1.3	1	90%	1.52	V32: HABITACIÓN 05
		1.3	1.3	1	90%	1.52	V33: HABITACIÓN 03
			PISO 3				
		0.95	0.75	1	90%	0.64	V27: HABITACIÓN 24
		1.3	1.3	1	90%	1.52	V28: HABITACIÓN 22
		1.3	1.3	1	90%	1.52	V29: HABITACIÓN 20
		1.3	1.3	1	90%	1.52	V30: HABITACIÓN 18
		1.3	1.3	1	90%	1.52	V32: HABITACIÓN 14
		1.3	1.3	1	90%	1.52	V33: HABITACIÓN 12
		1.3	1.3	1	90%	1.52	V34: HABITACIÓN 11
		1.3	1.3	1	90%	1.52	V36: HABITACIÓN 9
		1.3	1.3	1	90%	1.52	V37: HABITACIÓN 7
		1.3	1.3	1	90%	1.52	V38: HABITACIÓN 5
		1.3	1.3	1	90%	1.52	V39: HABITACIÓN 3
		0.97	0.71	1	90%	0.62	V3': HABITACIÓN 2 (COSTADO SUR)
		1.2	1.19	1	90%	1.29	V41: HABITACIÓN 4
		1.2	1.19	1	90%	1.29	V42: HABITACIÓN 6
		0.87	2	1	90%	1.57	V47: HABITACIÓN 13
		1.2	1.18	1	90%	1.27	V48: HABITACIÓN 15
		1.2	1.18	1	90%	1.27	V49: HABITACIÓN 17
		1.2	1.18	1	90%	1.27	V50: HABITACIÓN 19
		1.2	1.18	1	90%	1.27	V51: HABITACIÓN 21
		1.2	1.18	1	90%	1.27	V52: HABITACIÓN 23
		1.2	1.18	1	90%	1.27	V53: HBAITACIÓN 25
			PISO 1				
		0.95	0.92	1	90%	0.79	V27: CONSULTORIO 2
		1.3	0.96	1	90%	1.12	V28: SALA ERA
		1.3	0.95	1	90%	1.11	V29: DIGITACIÓN
		2.45	0.5	1	90%	1.10	V30: OBS. PEDIATRIA AISLADO
		2.24	0.5	1	90%	1.01	V31: OBS. PEDIATRIA
		2.24	0.5	1	90%	1.01	V32: OBS. PEDIATRIA
		2.24	0.5	1	90%	1.01	V33: OBS. PEDIATRIA
		0.95	0.95	1	90%	0.81	V1': SALA EDA
			PISO 2				
				0		0.00	
				0		0.00	
				0		0.00	
				0		0.00	
				0		0.00	
				0		0.00	
				0		0.00	
				0		0.00	

OBSERVACIONES:

TOTAL	69.91	Metro Cuadrado
ACUMULADO ANTERIOR	0.00	Metro Cuadrado
PRESENTE ACTA	69.91	Metro Cuadrado

Elaboró contratista:	Estefania Carvajal Henao	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA							
ITEM	4.08	VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD ESPESOR 3+3 MM	CAP	4.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA METALICA	UNIDAD	Metro Cuadrado	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico









Dimensiones L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%	Total (m)	Observaciones
PISO 4						
MANTENIMIENTO PVC						
	0.73	0.53	1	100%	0.39	V1: HABITACIÓN 02 - FIJA
	0.31	0.31	1	100%	0.10	V1: HABITACIÓN 02 - BATIENTE
	0.57	1.38	1	100%	0.79	V2: HABITACIÓN 04 - FIJA
	0.475	1.28	1	100%	0.61	V2: HABITACIÓN 04 - BATIENTE
	0.57	1.38	1	100%	0.79	V3: HABITACIÓN 06 - FIJA
	0.475	1.28	1	100%	0.61	V3: HABITACIÓN 06 - BATIENTE
	0.57	1.38	1	100%	0.79	V4: HABITACIÓN 08 - FIJA
	0.475	1.28	1	100%	0.61	V4: HABITACIÓN 08 - BATIENTE
	0.57	1.38	1	100%	0.79	V11: HABITACIÓN 13 - FIJA
	0.475	1.28	1	100%	0.61	V11: HABITACIÓN 13 - BATIENTE
	0.57	1.38	1	100%	0.79	V12: HABITACIÓN 15 - FIJA
	0.475	1.28	1	100%	0.61	V12: HABITACIÓN 15 - BATIENTE
	0.57	1.38	1	100%	0.79	V13: HABITACIÓN 17 - FIJA
	0.475	1.28	1	100%	0.61	V13: HABITACIÓN 17 - BATIENTE
	0.57	1.38	1	100%	0.79	V14: HABITACIÓN 19 - FIJA
	0.475	1.28	1	100%	0.61	V14: HABITACIÓN 19 - BATIENTE
	0.57	1.38	1	100%	0.79	V15: HABITACIÓN 21 - FIJA
	0.475	1.28	1	100%	0.61	V15: HABITACIÓN 2 - BATIENTE
	0.57	1.38	1	100%	0.79	V16: HABITACIÓN 23 - FIJA
	0.475	1.28	1	100%	0.61	V16: HABITACIÓN 23 - BATIENTE
	0.57	1.38	1	100%	0.79	V17: HABITACIÓN 25 - FIJA
	0.475	1.28	1	100%	0.61	V17: HABITACIÓN 25 - BATIENTE
	0.73	0.53	1	100%	0.39	V21: HABITACIÓN 24 - BATIENTE
	0.57	1.18	1	100%	0.67	V22: HABITACIÓN 22 - FIJA
	0.475	1.08	1	100%	0.51	V22: HABITACIÓN 22 - BATIENTE
	0.57	1.18	1	100%	0.67	V23: HABITACIÓN 20 - FIJA
	0.475	1.08	1	100%	0.51	V23: HABITACIÓN 20 - BATIENTE
	0.57	1.18	1	100%	0.67	V24: HABITACIÓN 18 - FIJA
	0.475	1.08	1	100%	0.51	V24: HABITACIÓN 18 - BATIENTE
	0.57	1.18	1	100%	0.67	V26: HABITACIÓN 14 - FIJA
	0.475	1.08	1	100%	0.51	V26: HABITACIÓN 14 - BATIENTE
	0.57	1.18	1	100%	0.67	V27: HABITACIÓN 12 - FIJA
	0.475	1.08	1	100%	0.51	V27: HABITACIÓN 12 - BATIENTE
	0.57	1.18	1	100%	0.67	V28: HABITACIÓN 11 - FIJA
	0.475	1.08	1	100%	0.51	V28: HABITACIÓN 11 - BATIENTE
	0.57	1.18	1	100%	0.67	V30: HABITACIÓN 09 - FIJA
	0.475	1.08	1	100%	0.51	V30: HABITACIÓN 09 - BATIENTE
	0.57	1.18	1	100%	0.67	V31: HABITACIÓN 07 - FIJA
	0.475	1.08	1	100%	0.51	V31: HABITACIÓN 07 - BATIENTE
	0.57	1.18	1	100%	0.67	V32: HABITACIÓN 05 - FIJA
	0.475	1.08	1	100%	0.51	V32: HABITACIÓN 05 - BATIENTE
	0.57	1.18	1	100%	0.67	V33: HABITACIÓN 03 - FIJA
	0.475	1.08	1	100%	0.51	V33: HABITACIÓN 03 - BATIENTE
PISO 3						
VENTANAS MANTENIMIENTO: PVC						
	0.75	0.54	1	100%	0.41	V27: HABITACIÓN 24 - BATIENTE
	0.57	1.19	1	100%	0.68	V28: HABITACIÓN 22 - FIJA
	0.48	1.08	1	100%	0.52	V28: HABITACIÓN 22 - BATIENTE
	0.57	1.19	1	100%	0.68	V29: HABITACIÓN 20 - FIJA
	0.48	1.08	1	100%	0.52	V29: HABITACIÓN 21 - BATIENTE
	0.57	1.19	1	100%	0.68	V30: HABITACIÓN 18 - FIJA
	0.48	1.08	1	100%	0.52	V30: HABITACIÓN 18 - BATIENTE
	0.57	1.19	1	100%	0.68	V32: HABITACIÓN 14 - FIJA
	0.48	1.08	1	100%	0.52	V32: HABITACIÓN 14 - BATIENTE
	0.57	1.19	1	100%	0.68	V33: HABITACIÓN 12 - FIJA
	0.48	1.08	1	100%	0.52	V33: HABITACIÓN 12 - BATIENTE
	0.57	1.19	1	100%	0.68	V34: HABITACIÓN 11 - FIJA
	0.48	1.08	1	100%	0.52	V34: HABITACIÓN 11 - BATIENTE
	0.57	1.19	1	100%	0.68	V36: HABITACIÓN 9 - FIJA
	0.48	1.08	1	100%	0.52	V36: HABITACIÓN 9 - BATIENTE
	0.57	1.19	1	100%	0.68	V37: HABITACIÓN 7 - FIJA
	0.48	1.08	1	100%	0.52	V37: HABITACIÓN 7 - BATIENTE
	0.57	1.19	1	100%	0.68	V38: HABITACIÓN 5 - FIJA
	0.48	1.08	1	100%	0.52	V38: HABITACIÓN 5 - BATIENTE
	0.57	1.19	1	100%	0.68	V39: HABITACIÓN 3 - FIJA
	0.48	1.08	1	100%	0.52	V39: HABITACIÓN 3 - BATIENTE
	0.73	0.53	1	100%	0.39	V3': HABITACIÓN 2 (COSTADO SUR) - FIJA
	1.097	0.88	1	100%	0.97	V41: HABITACIÓN 4 - FIJA
	1.097	0.88	1	100%	0.97	V42: HABITACIÓN 6 - FIJA
	0.77	1.9	1	100%	1.46	V47: HABITACIÓN 13 - BATIENTE
	1.097	0.88	1	100%	0.97	V48: HABITACIÓN 15 - FIJA
	1.097	0.88	1	100%	0.97	V49: HABITACIÓN 17 - FIJA
	1.097	0.88	1	100%	0.97	V50: HABITACIÓN 19 - FIJA
	1.097	0.88	1	100%	0.97	V51: HABITACIÓN 21 - FIJA
	1.097	0.88	1	100%	0.97	V52: HABITACIÓN 23 - FIJA
	1.097	0.88	1	100%	0.97	V53: HBAITACIÓN 25 - FIJA
VENTANAS NUEVAS: ALUMINIO						
	0.25	1.3	2	100%	0.65	V4: LUDOTECA TERRAZA SOLAR - FIJA (DERECH E IZQ)
	2.68	1.3	1	100%	3.48	V4: LUDOTECA TERRAZA SOLAR - FIJA (CENTRO)
	2.34	2.197	1	100%	5.14	V6: DESCANSO ENFER. - FIJA (CENTRO)
	0.252	2.197	2	100%	1.11	V6: DESCANSO ENFER. - FIJA (DERCH E IZQ)
	1.46	1.31	1	100%	1.91	V5: DESCANSO MÉDICO - FIJA (V. IZQ)
	0.252	2.19	2	100%	1.10	PV5': DESCANSO MÉDICO - FIJA (DERCH E IZQ)
	1.02	2.19	1	100%	2.23	PV5': DESCANSO MÉDICO - FIJA (CENTRO)
	0.61	1.3	2	100%	1.59	V7: COORDINACIÓN UCI-P - FIJA (LADO 1 Y LADO 2)
	0.903	1.3	2	100%	2.35	V8: COORDINACIÓN UCI-P - FIJA (LADO 1 Y LADO 2)
	0.75	0.65	1	100%	0.49	V9: ACCESO ASISTENCIAL - FIJA
	0.75	0.65	1	100%	0.49	V10: ACCESO ASISTENCIAL - FIJA
	0.657	0.64	1	100%	0.42	V11: WC ACCESO ASISTENCIAL - FIJA
	1.091	0.647	1	100%	0.71	V12: ROPA LIMPIA - FIJA
	0.75	0.65	1	100%	0.49	V13: CUARTO ESTERIL Y DEP. INSUMOS - FIJA
	0.75	0.65	1	100%	0.49	V14: CUARTO EQUIPOS - FIJA
	0.756	0.65	1	100%	0.49	V15: TRABAJO SUCIO - FIJA
	0.756	0.65	1	100%	0.49	V16: TRABAJO LIMPIO - FIJA
	3.006	0.642	1	100%	1.93	V17: UCI-P 02 - FIJA
	2.949	0.643	1	100%	1.90	V18: UCI-P 04 - FIJA
	2.947	0.649	1	100%	1.91	V19: UCI-P 06 - FIJA
	2.99	0.65	1	100%	1.94	V20: UCI-P 08 - FIJA
	2.456	0.651	1	100%	1.60	V21: UCI-P 10 - FIJA
	0.954	0.95	1	100%	0.91	V22: UCI-P - FIJA
PISO 1						
VENTANAS MANTENIMIENTO: PVC						
	0.47	1.27	1	100%	0.60	V27: CONSULTORIO 2 - BATIENTE
	0.55	1.38	1	100%	0.76	V27: CONSULTORIO 2 - FIJA
	0.47	0.77	1	100%	0.36	V28: SALA ERA
	0.57	0.88	1	100%	0.50	V28: SALA ERA
	0.47	0.77	1	100%	0.36	V29: DIGITACIÓN
	0.57	0.88	1	100%	0.50	V29: DIGITACIÓN
	0.69	0.4	3	100%	0.83	V30: OBS. PEDIATRIA AISLADO
	0.69	0.4	3	100%	0.83	V31: OBS. PEDIATRIA
	0.69	0.4	3	100%	0.83	V32: OBS. PEDIATRIA
	0.69	0.4	3	100%	0.83	V33: OBS. PEDIATRIA
	0.72	0.75	1	100%	0.54	V1': SALA EDA
VENTANAS NUEVAS: ALUMINIO						
	0.52	1.17	1	100%	0.61	V1: LABORATORIO - FIJA
	0.52	1.17	1	100%	0.61	V1: LABORATORIO - BATIENTE
	0.53	1.17	1	100%	0.62	V2: LABORATORIO - FIJA
	0.6	1.25	1	100%	0.75	V2: LABORATORIO - BATIENTE



	0.53	1.17	1	100%	0.62	V3: LABORATORIO - ANALIZADOR - BATIENTE
	0.6	1.25	1	100%	0.75	V3: LABORATORIO - ANALIZADOR - FIJA
	0.604	1.24	1	100%	0.75	V4: FARMACIA - RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS - FIJA
	0.53	1.17	1	100%	0.62	V4: FARMACIA - RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS - BATIENTE
	0.6	1.24	1	100%	0.74	V5: FARMACIA - ÁREA ESTANTERIA - FIJA
	0.53	1.17	1	100%	0.62	V5: FARMACIA - ÁREA ESTANTERIA - BATIENTE
	0.6	1.24	1	100%	0.74	V6: FARMACIA - ÁREA ESTANTERIA - FIJA
	0.53	1.17	1	100%	0.62	V6: FARMACIA - ÁREA ESTANTERIA - BATIENTE
	1.28	1.24	2	100%	3.17	V7: FARMACIA - ÁREA ESTANTERIA - FIJA
	1.25	1.24	1	100%	1.55	V8: FARMACIA - ESCALERAS A SÓTANO - FIJA
	2.36	2.35	1	100%	5.55	V10: SALA ESPERA IMAGENOLOGÍA - FIJA (CENTRO)
	0.252	2.35	2	100%	1.18	V10: SALA ESPERA IMAGENOLOGÍA - FIJA (DERCH E IZQ)
	2.36	2.35	1	100%	5.55	V11: SALA ESPERA IMAGENOLOGÍA - FIJA (CENTRO)
	0.252	2.35	2	100%	1.18	V11: SALA ESPERA IMAGENOLOGÍA - FIJA (DERCH E IZQ)
	2.39	2.35	1	100%	5.62	V12: CAFETERIA (CENTRO)
	0.252	2.35	2	100%	1.18	V12: CAFETERIA (DERCH Y IZQ)
	2.34	2.35	1	100%	5.50	V13: CAFETERIA (CENTRO)
	0.252	2.35	2	100%	1.18	V13: CAFETERIA (DERCH E IZQ)
	2.36	2.35	1	100%	5.55	V14: CAFETERIA (CENTRO)
	0.252	2.35	2	100%	1.18	V14: CAFETERIA (DERCH E IZQ)
	2.4	2.35	1	100%	5.64	V15: CAFETERIA (CENTRO)
	0.252	2.35	2	100%	1.18	V15: CAFETERIA (DERCH E IZQ)
	1.16	0.26	1	100%	0.30	V19: SALA ESPERA ADULTOS (SUPERIOR)
	1.16	1.4	1	100%	1.62	V19: SALA ESPERA ADULTOS (POSTERIOR)
	1.12	0.26	1	100%	0.29	V20: SALA ESPERA ADULTOS (SUPERIOR)
	1.12	1.4	1	100%	1.57	V20: SALA ESPERA ADULTOS (POSTEIRIOR)
	0.56	0.44	2	100%	0.49	V36: OBS. GINECOBSTETRICIA - FIJA
	0.54	1.17	1	100%	0.63	V37: PROCEDIMIENTOS IMAGENOLOGÍA - BATIENTE
	0.61	1.24	1	100%	0.76	V37: PROCEDIMIENTOS IMAGENOLOGÍA - FIJA
	0.41	1.24	2	100%	1.02	V39: CONCULTORIO PARA ECOGRAFO - FIJA
	0.6	1.24	2	100%	1.49	V41: ECOGRAFO - FIJA
	0.6	1.25	1	100%	0.75	V43: LABORATORIO - RESIDUOS PELIGROSOS - FIJA
	0.92	0.92	1	100%	0.85	V45: ÁREA ADMINISTRATIVA LABORATORIO
	0.59	1.24	2	100%	1.46	V46: LABORATORIO - FIJA
	0.6	0.45	1	100%	0.27	V49: ÁREA ADMINISTRATIVA FARMACIA
	0.6	0.95	1	100%	0.57	V50: TRANSFUNCIONAL - FIJA
	0.875	1.35	2	100%	2.36	V55: OFICINA RADIOLOGIA - FIJA
	0.66	0.93	1	100%	0.61	V64: SALA ESPERA ADULTOS FRENTE A ADMISIONES URG - FIJA
PISO 2						
MANTENIMIENTO PVC						
	1.394	1.43	3	100%	5.98	Divisiones UARO 1 CON UARO 2
	0.775	1.43	1	100%	1.11	
	1.47	0.24	1	100%	0.35	
	0.775	0.157	1	100%	0.12	
	0.9	0.23	2	100%	0.41	
	0.117	1.34	1	100%	0.16	Divisiones UARO 2 CON UARO 3
	0.63	1.43	1	100%	0.90	
	0.63	0.157	1	100%	0.10	
	1.47	0.24	1	100%	0.35	
	0.69	1.43	1	100%	0.99	
	0.69	0.157	1	100%	0.11	
	1.354	0.157	3	100%	0.64	
	1.29	1.43	3	100%	5.53	
	0.7	1.43	1	100%	1.00	Divisiones UARO 3 CON UARO 4
	0.7	0.157	1	100%	0.11	
	1.47	0.24	1	100%	0.35	
	0.79	1.43	1	100%	1.13	
	0.785	0.157	1	100%	0.12	
	0.786	1.43	1	100%	1.12	Divisiones UARO 4 CON UARO 5
	0.79	0.157	1	100%	0.12	
	1.47	0.24	1	100%	0.35	
	0.7	1.43	1	100%	1.00	
	0.693	0.157	1	100%	0.11	
	1.29	1.43	2	100%	3.69	
	1.28	1.43	1	100%	1.83	
	1.29	0.16	2	100%	0.41	
	1.29	0.16	1	100%	0.21	
	0.703	1.43	1	100%	1.01	Divisiones UARO 5 CON UARO 6 Y 7
	0.703	0.157	1	100%	0.11	
	1.47	0.24	1	100%	0.35	
	0.79	1.43	1	100%	1.13	
	0.786	0.157	1	100%	0.12	
	1.394	1.43	3	100%	5.98	
	0.11	1.43	1	100%	0.16	
	1.47	0.24	1	100%	0.35	
	0.785	1.465	1	100%	1.15	Divisiones UARO 7 CON UARO 8
	0.79	0.157	1	100%	0.12	
	1.48	0.285	1	100%	0.42	
	1.03	0.285	2	100%	0.59	
	0.855	1.465	1	100%	1.25	
	0.855	0.157	1	100%	0.13	
	1.18	1.47	1	100%	1.73	
	1.27	1.47	1	100%	1.87	
	1.275	1.47	1	100%	1.87	
	1.19	0.16	1	100%	0.19	
	1.265	0.16	1	100%	0.20	
	1.27	0.16	1	100%	0.20	
	0.958	1.46	1	100%	1.40	UARO 8
	0.958	0.157	1	100%	0.15	
	1.47	0.285	1	100%	0.42	
	0.987	1.465	1	100%	1.45	
	0.98	0.157	1	100%	0.15	
	0.28	1.465	1	100%	0.41	UARO 9
	1.45	0.285	1	100%	0.41	
	0.33	1.455	1	100%	0.48	
	0.334	0.165	1	100%	0.06	
	0.705	1.16	1	100%	0.82	
	0.575	1.185	8	100%	5.45	VENTANAS 45-46-47-48 DE LA FACHADA ORIENTAL
	0.632	0.843	1	100%	0.53	VENTANA 44 FACHADA 0CCIDENTAL
	0.59	0.473	2	100%	0.56	ventanas 43 y 42 fachada occidental
	0.57	0.69	2	100%	0.79	
	0.475	1.082	1	100%	0.51	VENTANA 41 FACHADA 0CCIDENTAL
	0.475	1.082	2	100%	1.03	ventanas 38 y 39 fachada occidental
	0.573	1.18	2	100%	1.35	
	0.475	1.082	1	100%	0.51	VENTANA 37 FACHADA OCCIDENTAL
	0.573	1.18	1	100%	0.68	

OBSERVACIONES:

TOTAL	**222.12**	**Metro Cuadrado**
ACUMULADO ANTERIOR	**0.00**	**Metro Cuadrado**
PRESENTE ACTA	**222.12**	**Metro Cuadrado**


Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	6.03	CABLE FPLP	CAP	6.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE DETECCIÓN	UNIDAD	Metro lineal	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico



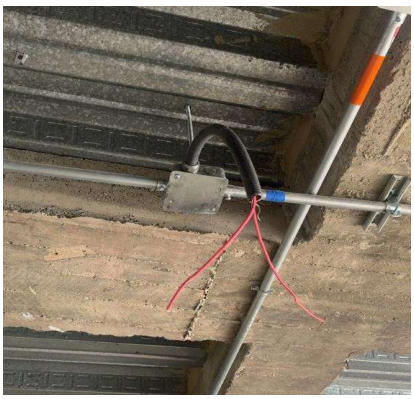







Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
PISO 1						
10.20	N/A	N/A	1	100%	10.20	LABORATORIO A LAVADO YESO
5.30	N/A	N/A	1	100%	5.30	LABORATORIO A AREA ADMINISTRATIVA
3.70	N/A	N/A	1	100%	3.70	AREA ADMINISTRATIVA LAB A HALL
5.40	N/A	N/A	1	100%	5.40	HALL A RESIDUOS PELIGROSO
5.60	N/A	N/A	1	100%	5.60	RESIDUOS PELIGROSO A MUESTRA GINECOLOGIA
8.50	N/A	N/A	1	100%	8.50	MUESTRA GINECOLOGIA A SERVICIO IMAGENOLOGIA
6.50	N/A	N/A	1	100%	6.50	LABORATORIO A FACTURACION
10.80	N/A	N/A	1	100%	10.80	FARMACIA A ENTREGA FARMACIA
9.10	N/A	N/A	1	100%	9.10	ENTREGA FARMACIA A DEPOSITO
4.50	N/A	N/A	1	100%	4.50	DEPOSITO A TRASFUNCIONAL
10.50	N/A	N/A	1	100%	10.50	TRASFUNCIONAL A HALL
12.20	N/A	N/A	1	100%	12.20	HALL A SALIDA DE ESPERA
8.50	N/A	N/A	1	100%	8.50	SALA DE ESPERA A HALL ESPERA
9.30	N/A	N/A	1	100%	9.30	HALL GENERAL A INFORMACION
7.50	N/A	N/A	1	100%	7.50	IMAGENOLOGIA A CONSULTORIO ECOGRAFO
6.50	N/A	N/A	1	100%	6.50	CONSULTORIO ECOGRAFO A CAMINADOR
11.20	N/A	N/A	1	100%	11.20	CAMINADOR A INSUMO
7.30	N/A	N/A	1	100%	7.30	INSUMO A CONSULTORIO CARDIOLOGO
6.20	N/A	N/A	1	100%	6.20	INSUMO A GINECOBSTETRICIA
8.20	N/A	N/A	1	100%	8.20	OBSERVACION GINECOBSTETRICIA A OBSERVACION PEDIATRIA
13.70	N/A	N/A	1	100%	13.70	OBSERVACION PEDIATRIA
9.50	N/A	N/A	1	100%	9.50	OBSERVACION PEDIATRIA HALL URGENCIA
5.90	N/A	N/A	1	100%	5.90	HALL URGENCIAS A VIRGEN
8.50	N/A	N/A	1	100%	8.50	DISPARO A VIRGEN
7.20	N/A	N/A	1	100%	7.20	DISPARO A HALL ECOGRAFO
7.20	N/A	N/A	1	100%	7.20	HALL ECOGRAFO A T.A.C
11.10	N/A	N/A	1	100%	11.10	T.A.C A MAMOGRAFIA
6.00	N/A	N/A	1	100%	6.00	MAMOGRAFIA 1 A MAMOGRAFIA2
4.50	N/A	N/A	1	100%	4.50	MAMOGRAFIA A OFICINA
7.50	N/A	N/A	1	100%	7.50	MAMOGRAFIA A ECPGRAFO
8.00	N/A	N/A	1	100%	8.00	ECOGRAFO A HALL
7.00	N/A	N/A	1	100%	7.00	ECOGRAFO A CONSULTORIO ECOGRAFO
7.50	N/A	N/A	1	100%	7.50	CONSULTORIO ECOGRAFO A HALL
5.50	N/A	N/A	1	100%	5.50	HALL A DIGITACION
5.90	N/A	N/A	1	100%	5.90	DIGITACION A AUDIOLOGIA
4.00	N/A	N/A	1	100%	4.00	AUDIOLOGIA A INSUMOS
15.00	N/A	N/A	1	100%	15.00	INSUMO A RACK
4.50	N/A	N/A	1	100%	4.50	RACK 1 A RACK 2
6.20	N/A	N/A	1	100%	6.20	RACK A DESCANSO INTERNO
8.70	N/A	N/A	1	100%	8.70	DESCANSO INTERNO A FACTURACION
17.00	N/A	N/A	1	100%	17.00	FACTURACION A CONSULTORIO 5
9.50	N/A	N/A	1	100%	9.50	CONSULTORIO 5 A HALL URGENCIA
6.20	N/A	N/A	1	100%	6.20	HALL URGENCIAS A YESO
7.90	N/A	N/A	1	100%	7.90	YESO A PROCESO ASEPTICO
9.90	N/A	N/A	1	100%	9.90	PROCESO ASEPTICO A EDA
15.00	N/A	N/A	1	100%	15.00	EDA A DIGITACION
4.00	N/A	N/A	1	100%	4.00	DIGITACION A ROPA LIMPIA
4.00	N/A	N/A	1	100%	4.00	ROPA LIMPIA A ROPA SUCIA
3.00	N/A	N/A	1	100%	3.00	ROPA SUCIA A EQUIPO
4.00	N/A	N/A	1	100%	4.00	EQUIPO A INSUMO FARMACIA
7.70	N/A	N/A	1	100%	7.70	INSUMO FARMACIA A ERA
7.20	N/A	N/A	1	100%	7.20	SALA ERA A CONSULTORIO 1
7.50	N/A	N/A	1	100%	7.50	CONSULTORIO 1 A LAMPARA EM
6.30	N/A	N/A	1	100%	6.30	CONSULTORIO 1 A CONSULTORIO 2
15.00	N/A	N/A	1	100%	15.00	CONSULTORIO 2 A REANIMACION PEDIATRIA
14.00	N/A	N/A	1	100%	14.00	REANIMACION PEDIATRIA A ADMISION URGENCIAS
5.00	N/A	N/A	1	100%	5.00	ADMISION URGENCIAS A CONTRA
7.00	N/A	N/A	1	100%	7.00	ADMISION URGENCIAS A CONSULTORIO 3
6.30	N/A	N/A	1	100%	6.30	CONSULTORIO 3 A HALL URGENCIAS
6.90	N/A	N/A	1	100%	6.90	HALL URGENCIAS CONSULTORIO 4
5.60	N/A	N/A	1	100%	5.60	CONSULTORIO 4 A HALL MONITOREO
7.50	N/A	N/A	1	100%	7.50	HALL MONITOREO A MONITORIO
12.30	N/A	N/A	1	100%	12.30	GINECO A COCINETA
5.80	N/A	N/A	1	100%	5.80	COCINETA A CAFETERIA
10.90	N/A	N/A	1	100%	10.90	CAFETERIA 1 A CAFETERIA 2
12.60	N/A	N/A	1	100%	12.60	CAFETERIA A AUDITORIO
12.00	N/A	N/A	1	100%	12.00	AUDITORIO A DESCANSO URGENCIAS
13.00	N/A	N/A	1	100%	13.00	DESCANSO URGENCIAS A LAMPARA EM
13.00	N/A	N/A	1	100%	13.00	DESCANSO URGENCIAS A SALA ESPERA ADULTO
12.70	N/A	N/A	1	100%	12.70	SALA ESPERA ADULTO A ENTRADA URGENCIA
7.80	N/A	N/A	1	100%	7.80	ENTRADA URGENCIAS A TRIAGE 2
6.00	N/A	N/A	1	100%	6.00	TRIAGE 2 A TRIAGE 1
PISO 3						
44.50	N/A	N/A	1	100%	44.50	PASILLO: DE SWICH 1 AL 2
36.00	N/A	N/A	1	100%	36.00	PASILLO: DE SWICH 1 AL 3
44.60	N/A	N/A	1	100%	44.60	SUR A NORTE: DE SWINCH 1 AL 2
32.00	N/A	N/A	1	100%	32.00	NORTE A SUR: DE SWICH 2 AL 3
33.50	N/A	N/A	1	100%	33.50	UCI-P: DE SWICH 3 AL 4
48.00	N/A	N/A	1	100%	48.00	PASILLO: DE SWICH 4 A BUITRON
22.30	N/A	N/A	1	100%	22.30	BUITRON A PASILLO ORATORIO
19.10	N/A	N/A	1	100%	19.10	DE ORATORIO A UCI-P 1
6.10	N/A	N/A	1	100%	6.10	DE UCI-P 3 A UCI-P 5
6.40	N/A	N/A	1	100%	6.40	DE UCI-P 5 A UCI-P 7
6.40	N/A	N/A	1	100%	6.40	DE UCI-P 7 A UCI-P 9
6.40	N/A	N/A	1	100%	6.40	DE UCI-P 9 A UCI-P 11
8.60	N/A	N/A	1	100%	8.60	DE UCI-P 11 A UCI-P 12
6.40	N/A	N/A	1	100%	6.40	DE UCI-P 12 A UCI-P 10
7.46	N/A	N/A	1	100%	7.46	DE UCI-P 10 A UCI-P 8
6.10	N/A	N/A	1	100%	6.10	DE UCI-P 8 A UCI-P 6
5.50	N/A	N/A	1	100%	5.50	DE UCI-P 6 A UCI-P 4
6.10	N/A	N/A	1	100%	6.10	DE UCI-P 4 A UCI-P 2
5.00	N/A	N/A	1	100%	5.00	DE UCI-P 2 A TRABAJO LIMPIO
7.50	N/A	N/A	1	100%	7.50	DE WC ADULTOS Y WC NIÑOS - ESTAR DE TV
5.80	N/A	N/A	1	100%	5.80	ESTAR DE TV A BODEGA
5.90	N/A	N/A	1	100%	5.90	BODEGA A CORDINACIÓN DE PEDIATRIA
6.50	N/A	N/A	1	100%	6.50	COORDINACIÓN PEDIATRIA A PREPARACIÓN DE FORMULAS
5.10	N/A	N/A	1	100%	5.10	PREPARACIÓN DE FORMULAS A PASILLO FRENTE C. ASEO
10.00	N/A	N/A	1	100%	10.00	PASILLO FRENTE C. ASEO A PASILLO DE PUNTO DE SALIDA EMERGENCIA
5.70	N/A	N/A	1	100%	5.70	PASILLO DE PUNTO DE SALIDA EMERGENCIA A RACK
6.10	N/A	N/A	1	100%	6.10	RACK A DEPOSITO DE INSUMOS
5.50	N/A	N/A	1	100%	5.50	DEPOSITO DE INSUMOS A EXTRACCIÓN DE LECHE MATERNA
9.70	N/A	N/A	1	100%	9.70	EXTRACCIÓN DE LECHE MATERNA A LUDOTECA
41.70	N/A	N/A	1	100%	41.70	LUDOTECA A HOSPITALIZACIÓN HAB. 302
10.10	N/A	N/A	1	100%	10.10	HOSPITALIZACIÓN HAB. 302 A HAB. 301
45.50	N/A	N/A	1	100%	45.50	SALA ESPERA A BUITRON
56.10	N/A	N/A	1	100%	56.10	SWICH 4 A SWICH 1
1.70	N/A	N/A	1	100%	1.70	PROCEDIMIENTOS A ASEO
6.10	N/A	N/A	1	100%	6.10	ASEO A DEPOSITO DE INSUMOS
3.70	N/A	N/A	1	100%	3.70	ASEO A CIRCULACIÓN RESTRINGIDA
4.90	N/A	N/A	1	100%	4.90	CIRCULACIÓN RESTRINGIDA A DESCANSO DE VESTIER
6.30	N/A	N/A	1	100%	6.30	DESCANSO VESTIER A INFORMACIÓN FAMILIARES
4.20	N/A	N/A	1	100%	4.20	INFORMACIÓN FAMILIARES A TRANSFER MEDICAMENTOS
9.80	N/A	N/A	1	100%	9.80	TRANSFER MEDICAMENTOS A INFORMACIÓN FAMILIARES
5.10	N/A	N/A	1	100%	5.10	INFORMACIÓN FAMILIARES A PASILLO FRENTE A COORDINACIÓN UCI-P
7.40	N/A	N/A	1	100%	7.40	PASILLO FRENTE A COORDINACIÓN UCI-P A PASILLO ALFRENTE DE WC



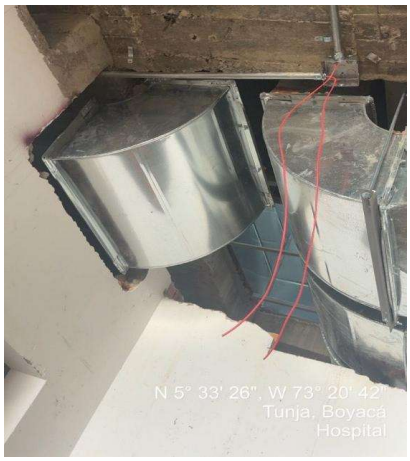



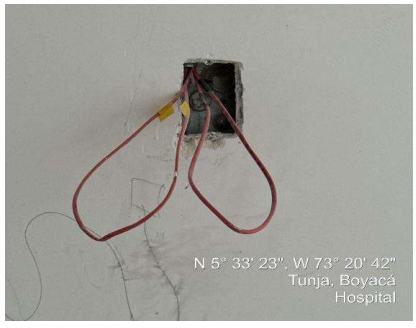

10.10	N/A	N/A	1	100%	10.10	PASILLO ALFRENTE DE WC A COORDINACIÓN UCI-P
6.80	N/A	N/A	1	100%	6.80	COORDINACIÓN UCI-P A DESCANSO ENFERMERIA
7.40	N/A	N/A	1	100%	7.40	DESCANSO ENFERMERIA A DESCANSO DE MEDICOS
7.10	N/A	N/A	1	100%	7.10	DESCANSO DE MEDICOS A COMPLEMENTACIÓN PEDAGOGICA
11.40	N/A	N/A	1	100%	11.40	COMPLEMENTACIÓN PEDAGOGICA A ESTACIÓN DE CAFÉ
8.90	N/A	N/A	1	100%	8.90	ESTACIÓN DE CAFÉ A EBTRADA DE WC ADULTOS Y WC NIÑOS
3.50	N/A	N/A	1	100%	3.50	TRABAJO LIMPIO A TRABAJO SUCIO
3.20	N/A	N/A	1	100%	3.20	TRABAJO SUCIO A CUARTO EQUIPOS
3.40	N/A	N/A	1	100%	3.40	CUARTO DE EQUIPOS A CUARTO ESTERIL Y DEPOSITO DE INSUMOS
3.30	N/A	N/A	1	100%	3.30	CUARTO ESTERIL Y DEPOSITO DE INSUMOS A ROPA LIMPIA
3.40	N/A	N/A	1	100%	3.40	ROPA LIMPIA A CUARTO DE ASEO
3.30	N/A	N/A	1	100%	3.30	CUARTO ASEO A PASILLO ALFRENTE DE CUARTO DE ASEO
9.50	N/A	N/A	1	100%	9.50	PASILLO AL FRENTE DE CUARTO ASEO A PASILLO AL FRENTE DE RESISUOS PELIGROSOS
4.70	N/A	N/A	1	100%	4.70	PASILLO AL FRENTE DE RESISUOS PELIGROSOS A RESIDUOS NO PELIGROSOS
3.00	N/A	N/A	1	100%	3.00	RESIDUOS NO PELIGROSOS A RESIDUOS PELIGROSOS
3.00	N/A	N/A	1	100%	3.00	RESIDUOS PELIGROSOS A ROPA SUCIA
8.20	N/A	N/A	1	100%	8.20	ROPA SUCIA A SALA DE ESPERA
10.20	N/A	N/A	1	100%	10.20	SALA ESPERA A ALFRENTE DE WC M
4.90	N/A	N/A	1	100%	4.90	AL FRENTE DE WC M A DEPOSITO DE RESIDUOS PELIGROSOS
2.40	N/A	N/A	1	100%	2.40	DEPOSITO DE RESIDUOS PELIGROSO A DEPOSITO DE RESIDUOS ORDINARIOS RECICLABLES
7.80	N/A	N/A	1	100%	7.80	DEPOSITO DE RESIDUOS ORDINARIOS RECICLABLES A TRABAJO LIMPIO
21.50	N/A	N/A	1	100%	21.50	TRABAJO LIMPIO A BUITRON
10.00	N/A	N/A	1	100%	10.00	HABITACIÓN 24 - 25
5.30	N/A	N/A	1	100%	5.30	HABITACIÓN 25 - 23
12.30	N/A	N/A	1	100%	12.30	HABITACIÓN 23 - 21
5.30	N/A	N/A	1	100%	5.30	HABITACIÓN 21 - 19
5.30	N/A	N/A	1	100%	5.30	HABITACIÓN 19 - 17
5.30	N/A	N/A	1	100%	5.30	HABITACIÓN 17 - 15
5.30	N/A	N/A	1	100%	5.30	HABITACIÓN 15 - 13
2.00	N/A	N/A	1	100%	2.00	PROCEDIMIENTOS A TRABAJO SUCIO
6.00	N/A	N/A	1	100%	6.00	CUARTO ASEO A PASILLO
4.50	N/A	N/A	1	100%	4.50	PASILLO A HABITACIÓN 9
5.20	N/A	N/A	1	100%	5.20	HABITACIÓN 9 - 1 0
13.30	N/A	N/A	1	100%	13.30	HABITACIÓN 10 - 11
5.30	N/A	N/A	1	100%	5.30	HABITACIÓN 11 - 12
5.30	N/A	N/A	1	100%	5.30	HABITACIÓN 12 - 14
5.30	N/A	N/A	1	100%	5.30	HABITACIÓN 14 - 16
12.60	N/A	N/A	1	100%	12.60	HABITACIÓN 16 - 18
5.30	N/A	N/A	1	100%	5.30	HABITACIÓN 18 - 20
5.30	N/A	N/A	1	100%	5.30	HABITACIÓN 20 - 22
13.30	N/A	N/A	1	100%	13.30	HABITACIÓN 1 - 2
3.30	N/A	N/A	1	100%	3.30	HABITACIÓN 2 - 3
15.50	N/A	N/A	1	100%	15.50	HABITACIÓN 3 - 4 Y 4 - 6
17.90	N/A	N/A	1	100%	17.90	HABITACIÓN 6 - 8
10.40	N/A	N/A	1	100%	10.40	HABITACIÓN 6 - 5
4.70	N/A	N/A	1	100%	4.70	HABITACIÓN 5 - 7
7.00	N/A	N/A	1	100%	7.00	HAB 7 A CUARTO EQUIPOS
5.00	N/A	N/A	1	100%	5.00	CUARTO ASEO A CUARTO EQUIPOS
3.00	N/A	N/A	1	100%	3.00	PASILLO A PROCEDIMIENTOS
		PISO 4				
5.45	N/A	N/A	1	100%	5.45	PROCEDIMIENTOS A TRABAJO LIMPIO
2.50	N/A	N/A	1	100%	2.50	TRABAJO LIMPIO A DEPOSITO
2.85	N/A	N/A	1	100%	2.85	DEPOSITO A TRABAJO SUIO
5.50	N/A	N/A	1	100%	5.50	TRABAJO SUCIO A CIRCULACION RESTRINGIDA
6.50	N/A	N/A	1	100%	6.50	CIRCULACIÓN RESTRINGIDA A DEPOSITO RESIDUOS
3.20	N/A	N/A	1	100%	3.20	DEPOSITO RECIDUOS A EQUIPOS
6.20	N/A	N/A	1	100%	6.20	EQUIPOS A CIRCULACIÓN
8.80	N/A	N/A	1	100%	8.80	CIRCULACIÓN A CIRCULACION
2.50	N/A	N/A	1	100%	2.50	CIRCCULACION A ROPA LIMPIA
2.70	N/A	N/A	1	100%	2.70	ROPA LIMPIA A ROPA SUCIA
30.00	N/A	N/A	1	100%	30.00	ROPA SUCIA A DUCTO
20.00	N/A	N/A	1	100%	20.00	DUCTO A SALA DE ESPERA
7.50	N/A	N/A	1	100%	7.50	SALA DE ESPERA A FACTURACIÓN
8.30	N/A	N/A	1	100%	8.30	FACTURACION A HABITACIÓN 13
5.00	N/A	N/A	1	100%	5.00	HABITACION 13 A HABITACIÓN 15
8.00	N/A	N/A	1	100%	8.00	HABITACION 15 A CIRCULACIÓN
5.00	N/A	N/A	1	100%	5.00	CIRCCULACION A HABITACION 17
5.30	N/A	N/A	1	100%	5.30	HABITACION 17 A HABITACION 19
3.50	N/A	N/A	1	100%	3.50	HABITACION 19 A HABITACION 21
9.00	N/A	N/A	1	100%	9.00	HABITACION 21 A CIRCULACIÓN
7.50	N/A	N/A	1	100%	7.50	DE CIRCULACION A HABITACION 23
4.50	N/A	N/A	1	100%	4.50	HABITACION 23 A HABITACION 25
8.60	N/A	N/A	1	100%	8.60	HABITACION 25 A PUESTO DE TRABAJO
8.30	N/A	N/A	1	100%	8.30	DE PUESTO DE TRABAJO A HBITACION 24
4.50	N/A	N/A	1	100%	4.50	HABITACION 24 A HABITACIÓN 22
4.30	N/A	N/A	1	100%	4.30	HABITACION 22 A HABITACIÓN 20
4.60	N/A	N/A	1	100%	4.60	HABITACION 20 A HABITACIÓN 18
4.10	N/A	N/A	1	100%	4.10	HABITACION 18 A HABITACIÓN 16
3.50	N/A	N/A	1	100%	3.50	HABITACION 16 A HABITACIÓN 14
4.50	N/A	N/A	1	100%	4.50	HABITACION 14 A HABITACIÓN 12
4.20	N/A	N/A	1	100%	4.20	HABITACION 12 A HABITACIÓN 11
4.50	N/A	N/A	1	100%	4.50	HABITACION 11 A HABITACIÓN 10
3.80	N/A	N/A	1	100%	3.80	HABITACION 10 A HABITACIÓN 09
4.80	N/A	N/A	1	100%	4.80	HABITACION 09 A HABITACIÓN 07
4.50	N/A	N/A	1	100%	4.50	HABITACION 07 A HABITACIÓN 05
8.50	N/A	N/A	1	100%	8.50	HABITACION 05 A HABITACIÓN 03
4.50	N/A	N/A	1	100%	4.50	HABITACION 03 A HABITACIÓN 01
3.50	N/A	N/A	1	100%	3.50	HABITACION 01 A HABITACIÓN 02
9.00	N/A	N/A	1	100%	9.00	HABITACION 02 A HABITACIÓN 04
4.00	N/A	N/A	1	100%	4.00	HABITACION 04 A HABITACIÓN 06
5.00	N/A	N/A	1	100%	5.00	HABITACION 06 A HABITACIÓN 08
3.50	N/A	N/A	1	100%	3.50	HABITACION 08 A CIRCULACION RESTRINGIDA
10.00	N/A	N/A	1	100%	10.00	DE CIRCULACION RESTRINGIDA A CIRCULACION RESTRINGIDA
4.30	N/A	N/A	1	100%	4.30	DE CIERCULACION RESTRINGIDA A DESCANSO VESTIER
9.50	N/A	N/A	1	100%	9.50	DE DESCANSO VESTIER A ASEO
24.90	N/A	N/A	1	100%	24.90	DE ASEO A DUCTO
20.00	N/A	N/A	1	100%	20.00	DE ASEO A DUCTO
1.50	N/A	N/A	1	100%	1.50	DE ASEO A DUCTO
28.50	N/A	N/A	1	100%	28.50	DE ASEO A DUCTO
1.50	N/A	N/A	1	100%	1.50	DE ASEO A DUCTO
46.00	N/A	N/A	1	100%	46.00	DE ASEO A DUCTO
1.50	N/A	N/A	1	100%	1.50	DE ASEO A DUCTO

OBSERVACIONES:

TOTAL	**1,969.56**	**Metro lineal**
ACUMULADO ANTERIOR	**0.00**	**Metro lineal**
PRESENTE ACTA	**1,969.56**	**Metro lineal**

Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoria:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	6.04	BOCINA CON ESTROBO	CAP	6.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE DETECCIÓN	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico



Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
N/A	N/A	N/A	4	**50%**	**2.00**	SOTANO
N/A	N/A	N/A	6	**50%**	**3.00**	PISO 1
N/A	N/A	N/A	6	**50%**	**3.00**	PISO 2
N/A	N/A	N/A	5	**50%**	**2.50**	PISO 3
N/A	N/A	N/A	3	**50%**	**1.50**	PISO 4

OBSERVACIONES:

TOTAL	12.00	Unidad

Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA								
ITEM	**6.05**	DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO	**CAP**	6.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE DETECCIÓN	UNIDAD	Unidad	**UBICACIÓN**	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones					Total (m)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
	N/A	N/A	N/A	30	**50%**	**15.00**	SOTANO
	N/A	N/A	N/A	71	**50%**	**35.50**	PISO 1
	N/A	N/A	N/A	110	**50%**	**55.00**	PISO 2
	N/A	N/A	N/A	97	**50%**	**48.50**	PISO 3
	N/A	N/A	N/A	45	**50%**	**22.50**	PISO 4

OBSERVACIONES:

	TOTAL	**176.50** **Unidad**

Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoria:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	6.06	DETECTOR TERMICO	CAP	6.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE DETECCIÓN	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico



Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
N/A	N/A	N/A	3	50%	1.50	Sotano
N/A	N/A	N/A	1	50%	0.50	Primer nivel

OBSERVACIONES:

TOTAL	2.00	Unidad

Elaboró contratista:	Estefania Carvajal Henao	FIRMA:
Aprobó Interventoria:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	6.07	ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA	CAP	6.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE DETECCIÓN	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico



Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
N/A	N/A	N/A	4	50%	2.00	SOTANO
N/A	N/A	N/A	6	50%	3.00	PISO 1
N/A	N/A	N/A	6	50%	3.00	PISO 2
N/A	N/A	N/A	5	50%	2.50	PISO 3
N/A	N/A	N/A	3	50%	1.50	PISO 4

OBSERVACIONES:

TOTAL	12.00	Unidad

Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoria:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	6.08	MODULO DE MONITOREO	CAP	6.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE DETECCIÓN	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico





Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
N/A	N/A	N/A	14	50%	7.00	SOTANO
N/A	N/A	N/A	4	50%	2.00	PISO 1
N/A	N/A	N/A	4	50%	2.00	PISO 2
N/A	N/A	N/A	4	50%	2.00	PISO 3
N/A	N/A	N/A	4	50%	2.00	PISO 4

OBSERVACIONES:

TOTAL	15.00	Unidad

Elaboró contratista:	Estefania Carvajal Henao	FIRMA:
Aprobó Interventoria:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	6.09	PANEL DE CONTROL	CAP	6.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE DETECCIÓN	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico





Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
N/A	N/A	N/A	1	100%	1.00	SOTANO

OBSERVACIONES:

TOTAL	1.00	Unidad

Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	7.01	TUBERÍA DE COBRE TIPO L. DÍAM: 1/2". INCLUYE ACCESORIOS.	CAP	7.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES	UNIDAD	Metro lineal		UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL
Registro fotográfico					Dimensiones				Total (m)	Observaciones
					L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%	










L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%	Total (m)	Observaciones
		PISO 4				
		OXIGENO				
7.85	N/A	N/A	1	100%	7.85	HABITACION 424
8.23	N/A	N/A	1	100%	8.23	HABITACION 425
8.65	N/A	N/A	1	100%	8.65	HABITACION 423
8.02	N/A	N/A	1	100%	8.02	HABITACION 422
8.24	N/A	N/A	1	100%	8.24	HABITACION 421
8.29	N/A	N/A	1	100%	8.29	HABITACION 420
8.32	N/A	N/A	1	100%	8.32	HABITACION 419
7.94	N/A	N/A	1	100%	7.94	HABITACION 418
8.11	N/A	N/A	1	100%	8.11	HABITACION 417
8.07	N/A	N/A	1	100%	8.07	HABITACION 416
8.09	N/A	N/A	1	100%	8.09	HABITACION 415
8.19	N/A	N/A	1	100%	8.19	HABITACION 414
12.16	N/A	N/A	1	100%	12.16	HABITACION 413
7.9	N/A	N/A	1	100%	7.90	HABITACION 412
7.61	N/A	N/A	1	100%	7.61	HABITACION 411
7.92	N/A	N/A	1	100%	7.92	HABITACION 410
8.24	N/A	N/A	1	100%	8.24	HABITACION 409
7.7	N/A	N/A	1	100%	7.70	HABITACION 407
10.2	N/A	N/A	1	100%	10.20	HABITACION 408
7.69	N/A	N/A	1	100%	7.69	HABITACION 405
10.54	N/A	N/A	1	100%	10.54	HABITACION 406
8.02	N/A	N/A	1	100%	8.02	HABITACION 403
10.36	N/A	N/A	1	100%	10.36	HABITACION 404
7.63	N/A	N/A	1	100%	7.63	HABITACION 401
7.94	N/A	N/A	1	100%	7.94	HABITACION 402
6.16	N/A	N/A	1	100%	6.16	CICULACION A PROCEDIMIENTOS
2.1	N/A	N/A	1	100%	2.10	CUARTO PROCEDIMIENTOS
1.52	N/A	N/A	1	100%	1.52	CUARTO PROCEDIMIENTOS
		PISO 1				
		AIRE MEDICINAL				
19.91	N/A	N/A	1	100%	19.91	PASILLO FRENTE A CONSULTORIO N°5 A CAJA C. DE PASILLO HACIA FARMACIA: PRINCIPAL
1.56	N/A	N/A	2	100%	3.12	
4.75	N/A	N/A	1	100%	4.75	PASILLO FRENTE A SALA YESO A CAJA C. EN EXTERIOR DE SALA EDA: PRINCIPAL
18.06	N/A	N/A	1	100%	18.06	
13.53	N/A	N/A	1	100%	13.53	REANIMACIÓN: DERIVACIÓN
6.26	N/A	N/A	2	100%	12.52	DERIVACIÓN TAC
14.9	N/A	N/A	2	100%	29.80	PRINCIPAL DE PASILLO OBSERVACIÓN A FARMACIA
		OXIGENO				
1.42	N/A	N/A	2	100%	2.84	PASILLO FRENTE A CONSULTORIO N°5 A CAJA C. DE PASILLO HACIA FARMACIA: ALIMENTACIÓN PRINCIPAL
11.91	N/A	N/A	1	100%	11.91	OBSERVACIÓN GINECOSTRTRICA (VIENE DE CAJA C. DE PASILLO HACIA FARMACIA): PRINCIPAL
4.99	N/A	N/A	1	100%	4.99	OBSERVACIÓN GINECOSTETRICA - CAMA 1: DERIVACIÓN
5.33	N/A	N/A	1	100%	5.33	OBSERVACIÓN GINECOSTETRICA - CAMA 2: DERIVACIÓN
6.25	N/A	N/A	1	100%	6.25	OBSERVACIÓN GINECOSTETRICA - CAMA 3: DERIVACIÓN
5.75	N/A	N/A	1	100%	5.75	OBSERVACIÓN GINECOSTETRICA - CAMA 4: DERIVACIÓN
5.31	N/A	N/A	1	100%	5.31	OBSERVACIÓN GINECOSTETRICA - CAMA 5: DERIVACIÓN
6.79	N/A	N/A	1	100%	6.79	DE CAJA DE C. EN SALA EDA A OBSERVACIÓN PEDIATRICA: PRINCIPAL
16.81	N/A	N/A	1	100%	16.81	
4.8	N/A	N/A	1	100%	4.80	OBSERVACIÓN PEDIATRICA - CAMA 1: DERIVACIÓN
8.34	N/A	N/A	1	100%	8.34	OBSERVACIÓN PEDIATRICA - CAMA 2 Y 3: DERIVACIÓN
8.87	N/A	N/A	1	100%	8.87	OBSERVACIÓN PEDIATRICA - CAMA 4 Y 5: DEREIVACIÓN
5.7	N/A	N/A	1	100%	5.70	OBSERVACIÓN PEDIATRICA - CAMA 6: DERIVACIÓN
4.91	N/A	N/A	1	100%	4.91	OBSERVACIÓN PEDIATRICA - CAMA 7: DERIVACIÓN
7.7	N/A	N/A	1	100%	7.70	OBSERVACIÓN PEDIATRICA - CAMA 8 Y 9: DEREIVACIÓN
4.39	N/A	N/A	1	100%	4.39	PASILLO FRENTE A SALA YESO A CAJA C. EN EXTERIOR DE SALA EDA: ALIMENTACIÓN PRINCIPAL
18.06	N/A	N/A	1	100%	18.06	
13.71	N/A	N/A	1	100%	13.71	REANIMACIÓN: DERIVACIÓN
12.69	N/A	N/A	1	100%	12.69	SALA EDA: DERIVACIÓN
8.37	N/A	N/A	1	100%	8.37	SALA YESOS: DERIVACIÓN
9.37	N/A	N/A	1	100%	9.37	PROCEDIMIENTOS ASEPTICOS: DERIVACIÓN
5	N/A	N/A	1	100%	5.00	DERIVACIÓN DE REANIMACIÓN A TRIAGE 2
6.57	N/A	N/A	1	100%	6.57	DERIVACIÓN TAC
5.4	N/A	N/A	1	100%	5.40	DERIVACIÓN RX (SOLO HASTA PUERTA ACCESO)
5.3	N/A	N/A	1	100%	5.30	SALA PROCEDIMIENTOS IMAGENOLOGÍA
10.7	N/A	N/A	1	100%	10.70	DERIVACIÓN PROCEDIMIENTOS - CAMA 1
11.2	N/A	N/A	1	100%	11.20	DERIVACIÓN PROCEDIMIENTOS - CAMA 2
14.8	N/A	N/A	1	100%	14.80	PRINCIPAL DE PASILLO OBSERVACIÓN A FARMACIA
8.23	N/A	N/A	1	100%	8.23	SALA EDA: DERIVACIÓN
2.56	N/A	N/A	1	100%	2.56	DERIVACIÓN TRIAGE 2
1.87	N/A	N/A	1	100%	1.87	DERIVACIÓN TRIAGE 1
		PISO 3				
		AIRE MEDICINAL				
3.58	N/A	N/A	1	100%	3.58	UCIP - 12: DERIVACIÓN
6.43	N/A	N/A	1	100%	6.43	UCIP - 11: DERIVACIÓN
4.09	N/A	N/A	1	100%	4.09	UCIP - 10: DERIVACIÓN
6.55	N/A	N/A	1	100%	6.55	UCIP - 09: DERIVACIÓN
4.75	N/A	N/A	1	100%	4.75	UCIP - 08: DERIVACIÓN
6.56	N/A	N/A	1	100%	6.56	UCIP - 07: DERIVACIÓN
5.18	N/A	N/A	1	100%	5.18	UCIP - 06: DERIVACIÓN
6.52	N/A	N/A	1	100%	6.52	UCIP - 05: DERIVACIÓN
5.24	N/A	N/A	1	100%	5.24	UCIP - 04: DERIVACIÓN
6.56	N/A	N/A	1	100%	6.56	UCIP - 03: DERIVACIÓN
5.19	N/A	N/A	1	100%	5.19	UCIP - 02: DERIVACIÓN
6.5	N/A	N/A	1	100%	6.50	UCIP - 01: DERIVACIÓN
		OXIGENO				
3.64	N/A	N/A	1	100%	3.64	UCIP - 12: DERIVACIÓN
6.37	N/A	N/A	1	100%	6.37	UCIP - 11: DERIVACIÓN
4.22	N/A	N/A	1	100%	4.22	UCIP - 10: DERIVACIÓN
6.35	N/A	N/A	1	100%	6.35	UCIP - 09: DERIVACIÓN
4.82	N/A	N/A	1	100%	4.82	UCIP - 08: DERIVACIÓN
6.52	N/A	N/A	1	100%	6.52	UCIP - 07: DERIVACIÓN
5.22	N/A	N/A	1	100%	5.22	UCIP - 06: DERIVACIÓN
6.48	N/A	N/A	1	100%	6.48	UCIP - 05: DERIVACIÓN
5.3	N/A	N/A	1	100%	5.30	UCIP - 04: DERIVACIÓN
6.53	N/A	N/A	1	100%	6.53	UCIP - 03: DERIVACIÓN
6.17	N/A	N/A	1	100%	6.17	UCIP - 02: DERIVACIÓN
6.47	N/A	N/A	1	100%	6.47	UCIP - 01: DERIVACIÓN
0.95	N/A	N/A	1	100%	0.95	ENTRA: CAJA 2G DE HABITACIÓN 13 DE HOSPITALIZACIÓN
2.25	N/A	N/A	1	100%	2.25	ENTRA Y SALE: CAJA 2G DE HABITACIÓN 7 DE HOSPITALIZACIÓN
1.41	N/A	N/A	1	100%	1.41	ENTRA: CAJA 2G DE HABITACIÓN 12 DE HOSPITALIZACIÓN
11.06	N/A	N/A	1	100%	11.06	DERIVACIÓN HABITACIÓN 1: CAMAS 1 Y 2
8.00	N/A	N/A	1	100%	8.00	DERIVACIÓN HABITACIÓN 3: CAMA 1
38.02	N/A	N/A	1	100%	38.02	DESDE PRINCIPAL POR CIRCULACIÓN RESTINGIDA A PUNTOS EN LUDOTECA
1.39	N/A	N/A	1	100%	1.39	BAJA A CAJ 2G HAB 11 HOSPITALIZACIÓN-P
0.97	N/A	N/A	1	100%	0.97	BAJA A CAJA 2G HAB 13 HOSPITALIZACIÓN-P
9.33	N/A	N/A	1	100%	9.33	DERIVACIÓN DE PASILLO A HAB 25 - CAMA 1
3.76	N/A	N/A	1	100%	3.76	DERIVACIÓN DE PRINCIPAL HAB 25 - CAMA 2
5.01	N/A	N/A	1	100%	5.01	DERIVACIÓN DE PASILLO A HAB 24
9.41	N/A	N/A	1	100%	9.41	DERIVACIÓN DE PASILLO A HAB 23 - CAMA 1
4.13	N/A	N/A	1	100%	4.13	DERIVACIÓN DE PRINCIPAL HAB 23 - CAMA 2
5.43	N/A	N/A	1	100%	5.43	DERIVACIÓN DE PASILLO A HAB 22
5.78	N/A	N/A	1	100%	5.78	DERIVACIÓN DE PASILLO A PRINCIPAL HAB 21
4.66	N/A	N/A	1	100%	4.66	DERIVACIÓN DE PASILLO A HAB 20
5.55	N/A	N/A	1	100%	5.55	DERIVACIÓN DE PASILLO A PRINCIPAL HAB 19
4.76	N/A	N/A	1	100%	4.76	DERIVACIÓN DE PASILLO A HAB 18
5.4	N/A	N/A	1	100%	5.40	DERIVACIÓN DE PASILLO A PRINCIPAL HAB 17
4.59	N/A	N/A	1	100%	4.59	DERIVACIÓN DE PASILLO A HAB 16
5.45	N/A	N/A	1	100%	5.45	DERIVACIÓN DE PASILLO A PRINCIPAL HAB 15
7.43	N/A	N/A	1	100%	7.43	DERIVACIÓN DE PASILLO A HAB 14
5.91	N/A	N/A	1	100%	5.91	DERIVACIÓN DE PASILLO A PRINCIPAL HAB 13
4.73	N/A	N/A	1	100%	4.73	DERIVACIÓN DE PASILLO A HAB 12
4.64	N/A	N/A	1	100%	4.64	DERIVACIÓN DE PASILLO A PRINCIPAL HAB 11
7.48	N/A	N/A	1	100%	7.48	DERIVACIÓN DE PASILLO A HAB 10
3.42	N/A	N/A	1	100%	3.42	DERIVACIÓN DE PRINCIPAL HAB 22 A CAMA





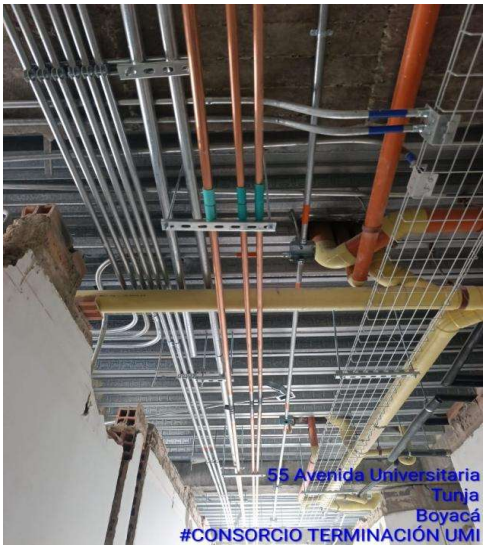



4	N/A	N/A	1	100%	4.00	DERIVACIÓN DE PRINCIPAL HAB 20 A CAMA
3.87	N/A	N/A	1	100%	3.87	DERIVACIÓN DE PRINCIPAL HAB 21 A CAMA 1
3.8	N/A	N/A	1	100%	3.80	DERIVACIÓN DE PRINCIPAL HAB 21 A CAMA 2
3.06	N/A	N/A	1	100%	3.06	DERIVACIÓN DE PRINCIPAL HAB 18 A CAMA
3.83	N/A	N/A	1	100%	3.83	DERIVACIÓN DE PRINCIPAL HAB 19 A CAMA 1
3.8	N/A	N/A	1	100%	3.80	DERIVACIÓN DE PRINCIPAL HAB 19 A CAMA 2
3.45	N/A	N/A	1	100%	3.45	DERIVACIÓN DE PRINCIPAL HAB 16 A CAMA
3.94	N/A	N/A	1	100%	3.94	DERIVACIÓN DE PRINCIPAL HAB 17 A CAMA 1
3.79	N/A	N/A	1	100%	3.79	DERIVACIÓN DE PRINCIPAL HAB 17 A CAMA 2
3.4	N/A	N/A	1	100%	3.40	DERIVACIÓN DE PRINCIPAL HAB 24 A CAMA
3.32	N/A	N/A	1	100%	3.32	DERIVACIÓN DE PRINCIPAL HAB 14 A CAMA
3.83	N/A	N/A	1	100%	3.83	DERIVACIÓN DE PRINCIPAL HAB 15 A CAMA 1
3.88	N/A	N/A	1	100%	3.88	DERIVACIÓN DE PRINCIPAL HAB 15 A CAMA 2
3.78	N/A	N/A	1	100%	3.78	DERIVACIÓN DE PRINCIPAL HAB 12 A CAMA
4.27	N/A	N/A	1	100%	4.27	DERIVACIÓN DE PRINCIPAL HAB 13 A CAMA 1
4.3	N/A	N/A	1	100%	4.30	DERIVACIÓN DE PRINCIPAL HAB 13 A CAMA 2
3.12	N/A	N/A	1	100%	3.12	DERIVACIÓN DE PRINCIPAL HAB 11 A CAMA
3.34	N/A	N/A	1	100%	3.34	DERIVACIÓN DE PRINCIPAL HAB 10 A CAMA
7.93	N/A	N/A	1	100%	7.93	DERIVACIÓN DE PASILLO A HAB 9
4.53	N/A	N/A	1	100%	4.53	DERIVACIÓN DE PASILLO CIRC. RESTRINGIDA A PUNTO PROCEDIMIENTOS
8.03	N/A	N/A	1	100%	8.03	DERIVACIÓN DE PASILLO A HAB 7
10.79	N/A	N/A	1	100%	10.79	DERIVACIÓN DE PASILLO A HAB 8
7.83	N/A	N/A	1	100%	7.83	DERIVACIÓN DE PASILLO A HAB 5
11.73	N/A	N/A	1	100%	11.73	DERIVACIÓN DE PASILLO A HAB 4 AISLADO
13.38	N/A	N/A	1	100%	13.38	DERIVACIÓN DE PASILLO A HAB 2 (CAMA 1 + CAMA 2)
13.08	N/A	N/A	1	100%	13.08	DERIVACIÓN DE PASILLO A HAB 6
		PISO 2				
		AIRE MEDICINAL				
1.51	N/A	N/A	1	100%	1.51	A CAJA 5G DE QUIROFANO 3
2.11	N/A	N/A	1	100%	2.11	A CAJA 5G DE QUIROFANO 2
2.03	N/A	N/A	1	100%	2.03	A CAJA 5G DE QUIROFANO 1
1.82	N/A	N/A	1	100%	1.82	PRINCIPAL A CAJA 3G DE SALA PARTO 2
1.9	N/A	N/A	1	100%	1.90	PRINCIPAL A CAJA 3G DE SALA PARTO 1
1.59	N/A	N/A	1	100%	1.59	ENTRA: CAJA 3G DE UCI URO
1.45	N/A	N/A	1	100%	1.45	SALE: DE CAJA 3G A PRINCIPAL DE UCI URO
4.09	N/A	N/A	1	100%	4.09	DERIVACIÓN CAMA 1 DE UCI URO
4.56	N/A	N/A	4	100%	18.24	DERIVACIÓN CAMA 2 A 5 DE UCI URO
6.13	N/A	N/A	1	100%	6.13	DERIVACIÓN CAMA 6 DE UCI URO
3.41	N/A	N/A	1	100%	3.41	DERIVACIÓN CAMA 7 A 9 DE UCI URO
16.96	N/A	N/A	1	100%	16.96	DE CAJA 3G DE INGRESO UCI-NEO INTENSIVOS POR UCI UARO A PRINCIPAL DE UCI-NEO INTENSIVO (AISLADO 1)
2.1	N/A	N/A	1	100%	2.10	DE AISLADO 1 A CAMA FRENTE A AISLADO 2
2.2	N/A	N/A	1	100%	2.20	DE PRINCIPAL A CAMA 1 - COSTADO DE AISLADO 2
0.85	N/A	N/A	1	100%	0.85	DE PRINCIPAL A CAMA 1 - COSTADO DE AISLADO 1
2.28	N/A	N/A	1	100%	2.28	DE PRINCIPAL A CAMA 2 - COSTADO DE AISLADO 2
2.19	N/A	N/A	1	100%	2.19	DE PRINCIPAL A CAMA 3 - COSTADO DE AISLADO 2
0.83	N/A	N/A	1	100%	0.83	DE PRINCIPAL A CAMA 2 - COSTADO DE AISLADO 1
0.82	N/A	N/A	1	100%	0.82	DE PRINCIPAL A CAMA 3 - COSTADO DE AISLADO 1
2.2	N/A	N/A	1	100%	2.20	DE PRINCIPAL A CAMA 4 - COSTADO DE AISLADO 2
0.68	N/A	N/A	1	100%	0.68	DE PRINCIPAL A CAMA 4 - COSTADO DE AISLADO 1
21.27	N/A	N/A	1	100%	21.27	DE CAJA 3G DE INGRESO POR UCI UARO A PRINCIPAL DE UCI-NEO INTERMEDIO
3.04	N/A	N/A	1	100%	3.04	DERIVACIÓN A AISLADO 1-INTERMEDIO
1.96	N/A	N/A	1	100%	1.96	DERIVACIÓN A AISLADO 2-INTERMEDIO
1.84	N/A	N/A	1	100%	1.84	DERIVACIÓN A CAMA 2 - COSTADO AISLADO 2
0.72	N/A	N/A	1	100%	0.72	DERIVACIÓN A CAMA 1 - COSTADO AISLADO 1
0.8	N/A	N/A	1	100%	0.80	DERIVACIÓN CAMA 2 - FRENTE A CAMA AISLADO 1 Y FRENTE A CAMA 1
0.71	N/A	N/A	1	100%	0.71	DERIVACIÓN CAMA 3 - FRENTE A CAMA AISLADO 1 Y COSTADO A CAMA 1
0.69	N/A	N/A	1	100%	0.69	DERIVACIÓN CAMA 4 - FRENTE A CAMA AISLADO 1 Y COSTADO A CAMA 2
0.76	N/A	N/A	1	100%	0.76	DERIVACIÓN CAMA 6 - FRENTE A CAMA AISLADO 1 Y COSTADO A CAMA 4
0.8	N/A	N/A	1	100%	0.80	DERIVACIÓN CAMA 5 - FRENTE A CAMA AISLADO 1 Y COSTADO A CAMA 3
5.57	N/A	N/A	1	100%	5.57	PRINCIPAL DE CAMAS FRENTE A AISLADO 1-INTERMEDIO
21.62	N/A	N/A	1	100%	21.62	DE CAJA 3G FRENTE A ESTACIÓN SATELITE A PRINCIPAL DE CAMAS DE UCI-NEO BÁSICO
1.1	N/A	N/A	1	100%	1.10	DERIVACIÓN CAMA DE UCI-NEO BÁSICO
0.98	N/A	N/A	1	100%	0.98	DERIVACIÓN CAMA DE UCI-NEO BÁSICO
0.85	N/A	N/A	1	100%	0.85	DERIVACIÓN CAMA DE UCI-NEO BÁSICO
1.98	N/A	N/A	1	100%	1.98	DERIVACIÓN CAMA DE UCI-NEO BÁSICO
0.85	N/A	N/A	1	100%	0.85	DERIVACIÓN CAMA DE UCI-NEO BÁSICO
1.96	N/A	N/A	1	100%	1.96	DERIVACIÓN CAMA DE UCI-NEO BÁSICO
0.76	N/A	N/A	1	100%	0.76	DERIVACIÓN CAMA DE UCI-NEO BÁSICO
2.04	N/A	N/A	1	100%	2.04	DERIVACIÓN CAMA DE UCI-NEO BÁSICO
2.19	N/A	N/A	1	100%	2.19	DERIVACIÓN CAMA DE UCI-NEO BÁSICO
0.93	N/A	N/A	1	100%	0.93	DERIVACIÓN CAMA DE UCI-NEO BÁSICO
1.16	N/A	N/A	1	100%	1.16	DERIVACIÓN CAMA DE UCI-NEO BÁSICO
0.98	N/A	N/A	1	100%	0.98	DERIVACIÓN CAMA DE UCI-NEO BÁSICO
1.47	N/A	N/A	1	100%	1.47	DERIVACIÓN CAMA DE UCI-NEO BÁSICO
1.46	N/A	N/A	1	100%	1.46	DERIVACIÓN CAMA DE UCI-NEO BÁSICO
2.21	N/A	N/A	1	100%	2.21	UCI-NEO INTENSIVOS: SALE DE CAJA 3G DE INGRESO POR UCI UARO
2.59	N/A	N/A	1	100%	2.59	UCI-NEO INTENSIVOS: ENTRA DE CAJA 3G DE INGRESO POR UCI UARO
2.83	N/A	N/A	1	100%	2.83	UCI-NEO INTERMEDIOS: ENTRA DE CAJA 3G DE INGRESO POR UCI UARO
1.78	N/A	N/A	1	100%	1.78	UCI-NEO INTERMEDIOS: SALE DE CAJA 3G DE INGRESO POR UCI UARO
2.76	N/A	N/A	1	100%	2.76	UCI-NEO BÁSICOS: ENTRA DE CAJA 3G DE INGRESO POR UCI UARO
2.23	N/A	N/A	1	100%	2.23	UCI-NEO BÁSICOS: SALE DE CAJA 3G DE INGRESO POR UCI UARO
		OXIGENO				
1.57	N/A	N/A	1	100%	1.57	A CAJA 5G DE QUIROFANO 3
2.08	N/A	N/A	1	100%	2.08	A CAJA 5G DE QUIROFANO 2
2.09	N/A	N/A	1	100%	2.09	A CAJA 5G DE QUIROFANO 1
1.93	N/A	N/A	1	100%	1.93	PRINCIPAL A CAJA 3G DE SALA PARTO 2
1.94	N/A	N/A	1	100%	1.94	PRINCIPAL A CAJA 3G DE SALA PARTO 1
10.97	N/A	N/A	1	100%	10.97	PRINCIPAL FRENTE A QUIROFANO 2 A PASILLO AUTOCLAVE
3.35	N/A	N/A	1	100%	3.35	PASILLO AUTOCLAVE A CAJA 2G
6.13	N/A	N/A	1	100%	6.13	SALE: CAJA 2G A RECUPERACIÓN QUIRURGICA
4.88	N/A	N/A	1	100%	4.88	PRINCIPAL DE RECUPERACIÓN QUIRURGICA A CAMAS 3 Y 4
4.34	N/A	N/A	1	100%	4.34	DERIVACIÓN A CAMA 3
1.56	N/A	N/A	1	100%	1.56	DERIVACIÓN A CAMA 4
9.02	N/A	N/A	1	100%	9.02	DERIVACIÓN A CAMAS: 1 Y 2
14.24	N/A	N/A	1	100%	14.24	DERIVACIÓN A CAMAS: 5 Y 6
3.83	N/A	N/A	1	100%	3.83	DERIVACIÓN A CAMA 7
5.66	N/A	N/A	1	100%	5.66	DERIVACIÓN DE CAMA 7 A CAMA 8
5.24	N/A	N/A	1	100%	5.24	DERIVACIÓN DE CAMA 8 A CAMA 9
3.22	N/A	N/A	1	100%	3.22	ENTRA: PRINCIPAL PASILLO TRABAJO PARTO A CAJA DE 2G DE RECUPERACIÓN PARTOS
18.64	N/A	N/A	1	100%	18.64	DE CAJA 2G A DERIVACIÓN DE CAMAS DE RECUPERACIÓN PARTOS
2.36	N/A	N/A	4	100%	9.44	DERIVACIÓN A CAMAS: 1, 2, 4, 5
2.7	N/A	N/A	1	100%	2.70	DERIVACIÓN DE CAMA 2 A CAMA 3
9.13	N/A	N/A	1	100%	9.13	DE PRINCIPAL RECUPERACIÓN PARTOS A TRABAJO PARTOS
4.43	N/A	N/A	1	100%	4.43	DERIVACIÓN CAMA 1 (COSTADO DE CENTRAL)
6.47	N/A	N/A	1	100%	6.47	DERIVACIÓN A CAMAS: 2, 3, 4, 5
6.34	N/A	N/A	1	100%	6.34	
1.35	N/A	N/A	1	100%	1.35	ENTRA: CAA 3G DE UCI URO A PRINCIPAL
1.3	N/A	N/A	1	100%	1.30	SALE: CAA 3G DE UCI URO A PRINCIPAL
4.22	N/A	N/A	1	100%	4.22	DERIVACIÓN CAMA 1 - UCI URO
4.37	N/A	N/A	4	100%	17.48	DERIVACIÓN CAMAS: 2, 3, 4, 5 - UCI URO
6.13	N/A	N/A	1	100%	6.13	DERIVACIÓN CAMA 6 - UCI URO
3.45	N/A	N/A	3	100%	10.35	DERIVACIÓN CAMAS: 7, 8, 9 - UCI URO
17.16	N/A	N/A	1	100%	17.16	DE CAJA 3G DE INGRESO UCI-NEO INTENSIVOS POR UCI UARO A PRINCIPAL DE UCI-NEO INTENSIVO (AISLADO 1)
2	N/A	N/A	1	100%	2.00	DE AISLADO 1 A CAMA FRENTE A AISLADO 2
2.12	N/A	N/A	1	100%	2.12	DE PRINCIPAL A CAMA 1 - COSTADO DE AISLADO 2
0.95	N/A	N/A	1	100%	0.95	DE PRINCIPAL A CAMA 1 - COSTADO DE AISLADO 1
2.18	N/A	N/A	1	100%	2.18	DE PRINCIPAL A CAMA 2 - COSTADO DE AISLADO 2
2.09	N/A	N/A	1	100%	2.09	DE PRINCIPAL A CAMA 3 - COSTADO DE AISLADO 2
0.93	N/A	N/A	1	100%	0.93	DE PRINCIPAL A CAMA 2 - COSTADO DE AISLADO 1
0.92	N/A	N/A	1	100%	0.92	DE PRINCIPAL A CAMA 3 - COSTADO DE AISLADO 1
2.1	N/A	N/A	1	100%	2.10	DE PRINCIPAL A CAMA 4 - COSTADO DE AISLADO 2
0.78	N/A	N/A	1	100%	0.78	DE PRINCIPAL A CAMA 4 - COSTADO DE AISLADO 1
21.27	N/A	N/A	1	100%	21.27	DE CAJA 3G DE INGRESO POR UCI UARO A PRINCIPAL DE UCI-NEO INTERMEDIO
3.14	N/A	N/A	1	100%	3.14	DERIVACIÓN A AISLADO 1-INTERMEDIO





2.06	N/A	N/A	1	**100%**	**2.06**	DERIVACIÓN A AISLADO 2-INTERMEDIO
1.94	N/A	N/A	1	**100%**	**1.94**	DERIVACIÓN A CAMA 2 - COSTADO AISLADO 2
0.82	N/A	N/A	1	**100%**	**0.82**	DERIVACIÓN A CAMA 1 - COSTADO AISLADO 1
0.7	N/A	N/A	1	**100%**	**0.70**	DERIVACIÓN CAMA 2 - FRENTE A CAMA AISLADO 1 Y FRENTE A CAMA 1
0.81	N/A	N/A	1	**100%**	**0.81**	DERIVACIÓN CAMA 3 - FRENTE A CAMA AISLADO 1 Y COSTADO A CAMA 1
0.59	N/A	N/A	1	**100%**	**0.59**	DERIVACIÓN CAMA 4 - FRENTE A CAMA AISLADO 1 Y COSTADO A CAMA 2
0.66	N/A	N/A	1	**100%**	**0.66**	DERIVACIÓN CAMA 6 - FRENTE A CAMA AISLADO 1 Y COSTADO A CAMA 4
0.7	N/A	N/A	1	**100%**	**0.70**	DERIVACIÓN CAMA 5 - FRENTE A CAMA AISLADO 1 Y COSTADO A CAMA 3
5.59	N/A	N/A	1	**100%**	**5.59**	PRINCIPAL DE CAMAS FRENTE A AISLADO 1-INTERMEDIO
21.62	N/A	N/A	1	**100%**	**21.62**	DE CAJA 3G FRENTE A ESTACIÓN SATELITE A PRINCIPAL DE CAMAS DE UCI-NEO BÁSICO
1	N/A	N/A	1	**100%**	**1.00**	DERIVACIÓN CAMA DE UCI-NEO BÁSICO
1.08	N/A	N/A	1	**100%**	**1.08**	DERIVACIÓN CAMA DE UCI-NEO BÁSICO
0.75	N/A	N/A	1	**100%**	**0.75**	DERIVACIÓN CAMA DE UCI-NEO BÁSICO
1.98	N/A	N/A	1	**100%**	**1.98**	DERIVACIÓN CAMA DE UCI-NEO BÁSICO
0.75	N/A	N/A	1	**100%**	**0.75**	DERIVACIÓN CAMA DE UCI-NEO BÁSICO
2.06	N/A	N/A	1	**100%**	**2.06**	DERIVACIÓN CAMA DE UCI-NEO BÁSICO
0.66	N/A	N/A	1	**100%**	**0.66**	DERIVACIÓN CAMA DE UCI-NEO BÁSICO
2.14	N/A	N/A	1	**100%**	**2.14**	DERIVACIÓN CAMA DE UCI-NEO BÁSICO
2.09	N/A	N/A	1	**100%**	**2.09**	DERIVACIÓN CAMA DE UCI-NEO BÁSICO
1.03	N/A	N/A	1	**100%**	**1.03**	DERIVACIÓN CAMA DE UCI-NEO BÁSICO
1.06	N/A	N/A	1	**100%**	**1.06**	DERIVACIÓN CAMA DE UCI-NEO BÁSICO
1.08	N/A	N/A	1	**100%**	**1.08**	DERIVACIÓN CAMA DE UCI-NEO BÁSICO
1.37	N/A	N/A	1	**100%**	**1.37**	DERIVACIÓN CAMA DE UCI-NEO BÁSICO
1.36	N/A	N/A	1	**100%**	**1.36**	DERIVACIÓN CAMA DE UCI-NEO BÁSICO
1.99	N/A	N/A	1	**100%**	**1.99**	UCI-NEO INTENSIVOS: SALE DE CAJA 3G DE INGRESO POR UCI UARO
2.44	N/A	N/A	1	**100%**	**2.44**	UCI-NEO INTENSIVOS: ENTRA DE CAJA 3G DE INGRESO POR UCI UARO
2.6	N/A	N/A	1	**100%**	**2.60**	UCI-NEO INTERMEDIOS: ENTRA DE CAJA 3G DE INGRESO POR UCI UARO
1.61	N/A	N/A	1	**100%**	**1.61**	UCI-NEO INTERMEDIOS: SALE DE CAJA 3G DE INGRESO POR UCI UARO
2.55	N/A	N/A	1	**100%**	**2.55**	UCI-NEO BÁSICOS: ENTRA DE CAJA 3G DE INGRESO POR UCI UARO
2.02	N/A	N/A	1	**100%**	**2.02**	UCI-NEO BÁSICOS: SALE DE CAJA 3G DE INGRESO POR UCI UARO
NITROGENO						
1.66	N/A	N/A	1	**100%**	**1.66**	A CAJA 5G DE QUIROFANO 3
2.04	N/A	N/A	1	**100%**	**2.04**	A CAJA 5G DE QUIROFANO 2
2.12	N/A	N/A	1	**100%**	**2.12**	A CAJA 5G DE QUIROFANO 1
DIOXIDO DE CARBONO (CO2)						
1.59	N/A	N/A	1	**100%**	**1.59**	A CAJA 5G DE QUIROFANO 3
1.67	N/A	N/A	1	**100%**	**1.67**	A CAJA 5G DE QUIROFANO 2
2	N/A	N/A	1	**100%**	**2.00**	A CAJA 5G DE QUIROFANO 1

OBSERVACIONES:

TOTAL	**1,500.28**	**Metro lineal**
ACUMULADO ANTERIOR	**886.27**	**Metro lineal**
PRESENTE ACTA	**614.01**	**Metro lineal**

Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoria:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	7.02	TUBERÍA DE COBRE TIPO L. DÍAM: 3/4". INCLUYE ACCESORIOS.	CAP	7.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES	UNIDAD	Metro lineal		UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL
Registro fotográfico					Dimensiones				Total (m)	Observaciones
					L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%	











			PISO 4				
			VACIO				
7.37	N/A	N/A	1	100%	7.37	HABITACION 424	
8.95	N/A	N/A	1	100%	8.95	HABITACION 425	
8.86	N/A	N/A	1	100%	8.86	HABITACION 423	
8.26	N/A	N/A	1	100%	8.26	HABITACION 422	
8.67	N/A	N/A	1	100%	8.67	HABITACION 421	
7.66	N/A	N/A	1	100%	7.66	HABITACION 420	
8.66	N/A	N/A	1	100%	8.66	HABITACION 419	
7.56	N/A	N/A	1	100%	7.56	HABITACION 418	
8.69	N/A	N/A	1	100%	8.69	HABITACION 417	
7.91	N/A	N/A	1	100%	7.91	HABITACION 416	
8.41	N/A	N/A	1	100%	8.41	HABITACION 415	
7.77	N/A	N/A	1	100%	7.77	HABITACION 414	
12.71	N/A	N/A	1	100%	12.71	HABITACION 413	
7.82	N/A	N/A	1	100%	7.82	HABITACION 412	
8.23	N/A	N/A	1	100%	8.23	HABITACION 411	
7.9	N/A	N/A	1	100%	7.90	HABITACION 410	
8.23	N/A	N/A	1	100%	8.23	HABITACION 409	
8.06	N/A	N/A	1	100%	8.06	HABITACION 407	
11.14	N/A	N/A	1	100%	11.14	HABITACION 408	
8.34	N/A	N/A	1	100%	8.34	HABITACION 405	
10.54	N/A	N/A	1	100%	10.54	HABITACION 406	
8.03	N/A	N/A	1	100%	8.03	HABITACION 403	
10.96	N/A	N/A	1	100%	10.96	HABITACION 404	
7.87	N/A	N/A	1	100%	7.87	HABITACION 401	
8.06	N/A	N/A	1	100%	8.06	HABITACION 402	
2.41	N/A	N/A	1	100%	2.41	CUARTO PROCEDIMIENTOS	
1.32	N/A	N/A	1	100%	1.32	CUARTO PROCEDIMIENTOS	
			OXIGENO				
6.03	N/A	N/A	1	100%	6.03	CIRCULACION PROCEDIMIENTOS	
23.69	N/A	N/A	1	100%	23.69	CIRCULACION HALL PRICIPAL ANILLO SUR	
0.09	N/A	N/A	2	100%	0.18	CIRCULACION HALL PRICIPAL ANILLO SUR	
1.4	N/A	N/A	2	100%	2.80	CIRCULACION HALL PRICIPAL ANILLO SUR	
23.46	N/A	N/A	1	100%	23.46	CIRCULACION HALL PRICIPAL ANILLO SUR	
21.13	N/A	N/A	2	100%	42.26	CIRCULACION HALL PRICIPAL ANILLO NORTE	
1.07	N/A	N/A	2	100%	2.14	CIRCULACION HALL PRICIPAL ANILLO NORTE	
0.9	N/A	N/A	2	100%	1.80	CIRCULACION HALL PRICIPAL ANILLO NORTE	
1.32	N/A	N/A	1	100%	1.32	CAJA DE CORTE	
1.26	N/A	N/A	1	100%	1.26	CAJA DE CORTE	
			PISO 1				
			NITROGENO				
7.16	N/A	N/A	1	100%	7.16	LAVADO DE PACIENTES A ACCESO PASILLO URGENCIAS: RED PRENCIPAL DE TANQUE	
13.96	N/A	N/A	1	100%	13.96	ACCESO A PASILLO URGANCIAS A FRENTE A CONSULTORIO N°5: RED PRINCIPAL	
5.5	N/A	N/A	1	100%	5.50	PRINCIPAL PASILLO URG - SUBE POR BUITRÓN DE PISO 1 A 2 FRENTE A CONSULTORIO N°5	
			DIOXIDO DE CARBONO (CO2)				
7.13	N/A	N/A	1	100%	7.13	LAVADO DE PACIENTES A ACCESO PASILLO URGENCIAS: RED PRENCIPAL DE TANQUE	
13.93	N/A	N/A	1	100%	13.93	ACCESO A PASILLO URGANCIAS A FRENTE A CONSULTORIO N°5: RED PRINCIPAL	
5.5	N/A	N/A	1	100%	5.50	PRINCIPAL PASILLO URG - SUBE POR BUITRÓN DE PISO 1 A 2 FRENTE A CONSULTORIO N°5	
			OXIGENO				
1.8	N/A	N/A	1	100%	1.80	PASILLO FRENTE A CONSULTORIO N°5 A CAJA C. DE PASILLO HACIA FARMACIA: PRINCIPAL	
			VACIO				
1.7	N/A	N/A	2	100%	3.40	PASILLO FRENTE A CONSULTORIO N°5 A CAJA C. DE PASILLO HACIA FARMACIA: PRINCIPAL	
11.82	N/A	N/A	1	100%	11.82	OBSERVACIÓN GINECOSTRTRICA (VIENE DE CAJA C. DE PASILLO HACIA FARMACIA): PRINCIPAL	
4.86	N/A	N/A	1	100%	4.86	OBSERVACIÓN GINECOSTETRICA - CAMA 1: DERIVACIÓN	
5.32	N/A	N/A	1	100%	5.32	OBSERVACIÓN GINECOSTETRICA - CAMA 2: DERIVACIÓN	
6.13	N/A	N/A	1	100%	6.13	OBSERVACIÓN GINECOSTETRICA - CAMA 3: DERIVACIÓN	
5.68	N/A	N/A	1	100%	5.68	OBSERVACIÓN GINECOSTETRICA - CAMA 4: DERIVACIÓN	
5.31	N/A	N/A	1	100%	5.31	OBSERVACIÓN GINECOSTETRICA - CAMA 5: DERIVACIÓN	
6.76	N/A	N/A	1	100%	6.76	DE CAJA DE C. EN SALA EDA A OBSERVACIÓN PEDIATRICA: PRINCIPAL	
16.61	N/A	N/A	1	100%	16.61	OBSERVACIÓN PEDIATRICA - CAMA 1: DERIVACIÓN	
4.7	N/A	N/A	1	100%	4.70	OBSERVACIÓN PEDIATRICA - CAMA 2 Y 3: DERIVACIÓN	
8.13	N/A	N/A	1	100%	8.13	OBSERVACIÓN PEDIATRICA - CAMA 4 Y 5: DEREIVACIÓN	
8.87	N/A	N/A	1	100%	8.87	OBSERVACIÓN PEDIATRICA - CAMA 6: DERIVACIÓN	
5.58	N/A	N/A	1	100%	5.58	OBSERVACIÓN PEDIATRICA - CAMA 7: DERIVACIÓN	
4.82	N/A	N/A	1	100%	4.82	OBSERVACIÓN PEDIATRICA - CAMA 8 Y 9: DEREIVACIÓN	
7.44	N/A	N/A	1	100%	7.44	PASILLO FRENTE A SALA YESO A CAJA C. EN EXTERIOR DE SALA EDA: ALIMENTACIÓN PRINCIPAL	
4.9	N/A	N/A	1	100%	4.90	REANIMACIÓN: DERIVACIÓN	
18.6	N/A	N/A	1	100%	18.60	PROCEDIMIENTOS ASEPTICOS: DERIVACIÓN	
13.74	N/A	N/A	1	100%	13.74	DERIVACIÓN DE REANIMACIÓN A TRIAGE 2	
9.36	N/A	N/A	1	100%	9.36	DERIVACIÓN DE TAC	
5	N/A	N/A	1	100%	5.00	DERIVACIÓN SALA DE PROCEDIMIENTOS DE IMAGENOLOGÍA	
6.24	N/A	N/A	1	100%	6.24	DERIVACIÓN PROCEDIMIENTOS - CAMA 1	
5.2	N/A	N/A	1	100%	5.20	DERIVACIÓN PROCEDIMIENTOS - CAMA 2	
10.8	N/A	N/A	1	100%	10.80	PRINCIPAL DE PASILLO OBS. GINECOBSTETRICIA A FARMACIA	
11.3	N/A	N/A	1	100%	11.30	DERIVACIÓN TRIAGE 2	
15	N/A	N/A	1	100%	15.00	DERIVACIÓN TRIAGE 1	
2.46	N/A	N/A	1	100%	2.46		
1.76	N/A	N/A	1	100%	1.76		
			PISO 3				
			OXIGENO				
23.35	N/A	N/A	1	100%	23.35	UCI PEDIATRICA - CIRCULACIÓN: PRINCIPAL	
14.83	N/A	N/A	1	100%	14.83	SALE: CAJA 3G DE UCI PEDIATRICA A BUITRON EN PASILLO HACIA HOSPITALIZACIÓN	
20.82	N/A	N/A	1	100%	20.82	ENTRA: A CAJA 2G DE PASILLO HOSPITALIZACIÓN ENTRE HABITACIONES 13 A 25	
10.82	N/A	N/A	1	100%	10.82	PRINCIPAL PASILLO HOSPITALIZACIÓN ENTRE HABITACIONES 1 A 7 HASTA CAJA 2G	
9.68	N/A	N/A	1	100%	9.68	PRINCIPAL PASILLO HOSPITALIZACIÓN ENTRE HABITACIONES 7 A 12 HASTA CAJA 2G	
25.19	N/A	N/A	1	100%	25.19	PRINCIPAL PASILLO HOSPITALIZACIÓN DE CAJA 2G A HABITACIÓN 25 (COSTADO DERECH)	
6.29	N/A	N/A	1	100%	6.29	DE VÁLVULAS PASILLO HALL A PASILLO HOSPITALIZACIÓN	
2.23	N/A	N/A	1	100%	2.23	DE PASILLO HOSPITALIZACIÓN A CAJA 2G DE HAB 11	
3.82	N/A	N/A	1	100%	3.82	DE PASILLO HOSPITALIZACIÓN A CAJA 2G DE HAB 13	
			VACIO				
3.54	N/A	N/A	1	100%	3.54	UCIP - 12: DERIVACIÓN	
6.49	N/A	N/A	1	100%	6.49	UCIP - 11: DERIVACIÓN	
4.05	N/A	N/A	1	100%	4.05	UCIP - 10: DERIVACIÓN	
6.61	N/A	N/A	1	100%	6.61	UCIP - 09: DERIVACIÓN	
4.71	N/A	N/A	1	100%	4.71	UCIP - 08: DERIVACIÓN	
6.66	N/A	N/A	1	100%	6.66	UCIP - 07: DERIVACIÓN	
5.14	N/A	N/A	1	100%	5.14	UCIP - 06: DERIVACIÓN	
6.66	N/A	N/A	1	100%	6.66	UCIP - 05: DERIVACIÓN	
5.15	N/A	N/A	1	100%	5.15	UCIP - 04: DERIVACIÓN	
6.62	N/A	N/A	1	100%	6.62	UCIP - 03: DERIVACIÓN	
5.1	N/A	N/A	1	100%	5.10	UCIP - 02: DERIVACIÓN	
6.55	N/A	N/A	1	100%	6.55	UCIP - 01: DERIVACIÓN	
1.44	N/A	N/A	1	100%	1.44	ENTRA: CAJA 2G DE HABITACIÓN 13	
2.55	N/A	N/A	1	100%	2.55	ENTRA Y SALE: CAJA 2G HABITALCIÓN 7	
1.48	N/A	N/A	1	100%	1.48	ENTRA: CAJA 2G HABITACIÓN 12	
11.47	N/A	N/A	1	100%	11.47	DERIVACIÓN A HABITACIÓN 1: CAMAS 1 Y 2	
7.9	N/A	N/A	1	100%	7.90	DERIVACIÓN A HABITACIÓN 3: CAMA 1	
1.31	N/A	N/A	1	100%	1.31	BAJA A CAJA 2G DE HAB 11 HOSPITALIZACIÓN	
1.09	N/A	N/A	1	100%	1.09	BAJA A CAJA 2G DE HAB 13 HOSPITALIZACIÓN	
9.43	N/A	N/A	1	100%	9.43	DERIVACIÓN DE PASILLO A HAB 25 - CAMA 1	
3.86	N/A	N/A	1	100%	3.86	DERIVACIÓN DE PASILLO A HAB 25 - CAMA 2	
5.01	N/A	N/A	1	100%	5.01	DERIVACIÓN DE PASILLO A HAB 24	
9.36	N/A	N/A	1	100%	9.36	DERIVACIÓN DE PASILLO A HAB 23 - CAMA 1	
4.07	N/A	N/A	1	100%	4.07	DERIVACIÓN DE PASILLO A HAB 23 - CAMA 2	
5.06	N/A	N/A	1	100%	5.06	DERIVACIÓN DE PASILLO A HAB 22	
6.27	N/A	N/A	1	100%	6.27	DERIVACIÓN DE PASILLO A PRINCIPAL HAB 21	
5.11	N/A	N/A	1	100%	5.11	DERIVACIÓN DE PASILLO A HAB 20	
5.65	N/A	N/A	1	100%	5.65	DERIVACIÓN DE PASILLO A PRINCIPAL HAB 19	
5.14	N/A	N/A	1	100%	5.14	DERIVACIÓN DE PASILLO A HAB 18	
5.8	N/A	N/A	1	100%	5.80	DERIVACIÓN DE PASILLO A PRINCIPAL HAB 17	
4.79	N/A	N/A	1	100%	4.79	DERIVACIÓN DE PASILLO A HAB 16	
5.65	N/A	N/A	1	100%	5.65	DERIVACIÓN DE PASILLO A PRINCIPAL HAB 15	
5.03	N/A	N/A	1	100%	5.03	DERIVACIÓN DE PASILLO A HAB 14	
6.21	N/A	N/A	1	100%	6.21	DERIVACIÓN DE PASILLO A PRINCIPAL HAB 13	
5.03	N/A	N/A	1	100%	5.03	DERIVACIÓN DE PASILLO A HAB 12	
4.95	N/A	N/A	1	100%	4.95	DERIVACIÓN DE PASILLO A PRINCIPAL HAB 11	
7.68	N/A	N/A	1	100%	7.68	DERIVACIÓN DE PASILLO A HAB 10	
3.52	N/A	N/A	1	100%	3.52	DERIVACIÓN DE PRINCIPAL HAB 22 A CAMA	
3.90	N/A	N/A	1	100%	3.90	DERIVACIÓN DE PRINCIPAL HAB 20 A CAMA	
3.97	N/A	N/A	1	100%	3.97	DERIVACIÓN DE PRINCIPAL HAB 21 A CAMA 1	



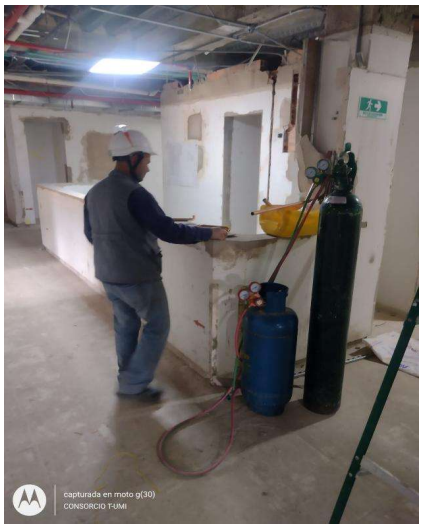

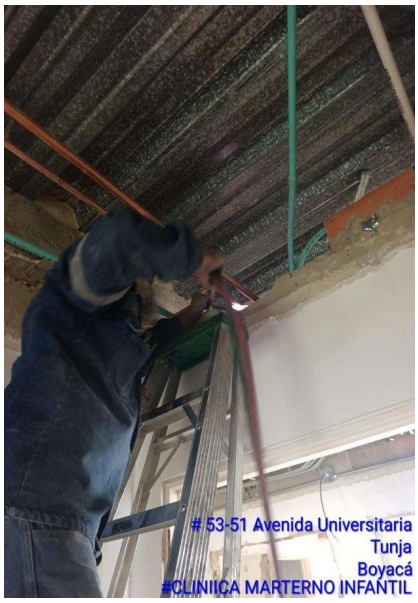



3.90	N/A	N/A	1	100%	3.90	DERIVACIÓN DE PRINCIPAL HAB 21 A CAMA 2
3.16	N/A	N/A	1	100%	3.16	DERIVACIÓN DE PRINCIPAL HAB 18 A CAMA
3.70	N/A	N/A	1	100%	3.70	DERIVACIÓN DE PRINCIPAL HAB 19 A CAMA 1
3.70	N/A	N/A	1	100%	3.70	DERIVACIÓN DE PRINCIPAL HAB 19 A CAMA 2
3.35	N/A	N/A	1	100%	3.35	DERIVACIÓN DE PRINCIPAL HAB 16 A CAMA
4.04	N/A	N/A	1	100%	4.04	DERIVACIÓN DE PRINCIPAL HAB 17 A CAMA 1
3.98	N/A	N/A	1	100%	3.98	DERIVACIÓN DE PRINCIPAL HAB 17 A CAMA 2
3.30	N/A	N/A	1	100%	3.30	DERIVACIÓN DE PRINCIPAL HAB 24 A CAMA
3.35	N/A	N/A	1	100%	3.35	DERIVACIÓN DE PRINCIPAL HAB 14 A CAMA
3.80	N/A	N/A	1	100%	3.80	DERIVACIÓN DE PRINCIPAL HAB 15 A CAMA 1
3.81	N/A	N/A	1	100%	3.81	DERIVACIÓN DE PRINCIPAL HAB 15 A CAMA 2
3.76	N/A	N/A	1	100%	3.76	DERIVACIÓN DE PRINCIPAL HAB 12 A CAMA
4.23	N/A	N/A	1	100%	4.23	DERIVACIÓN DE PRINCIPAL HAB 13 A CAMA 1
4.25	N/A	N/A	1	100%	4.25	DERIVACIÓN DE PRINCIPAL HAB 13 A CAMA 2
3.21	N/A	N/A	1	100%	3.21	DERIVACIÓN DE PRINCIPAL HAB 11 A CAMA
3.19	N/A	N/A	1	100%	3.19	DERIVACIÓN DE PRINCIPAL HAB 10 A CAMA
8.13	N/A	N/A	1	100%	8.13	DERIVACIÓN DE PASILLO A HAB 9
9.08	N/A	N/A	1	100%	9.08	DERIVACIÓN DE PASILLO CIRC. RESTRINGIDA A PUNTO PROCEDIMIENTOS
8.28	N/A	N/A	1	100%	8.28	DERIVACIÓN DE PASILLO A HAB 7
10.95	N/A	N/A	1	100%	10.95	DERIVACIÓN DE PASILLO A HAB 8
8.21	N/A	N/A	1	100%	8.21	DERIVACIÓN DE PASILLO A HAB 5
12.00	N/A	N/A	1	100%	12.00	DERIVACIÓN DE PASILLO A HAB 4 AISLADO
13.16	N/A	N/A	1	100%	13.16	DERIVACIÓN DE PASILLO A HAB 2 (CAMA 1 + CAMA 2)
13.48	N/A	N/A	1	100%	13.48	DERIVACIÓN DE PASILLO A HAB 6
		PISO 2				
		OXIGENO				
9.96	N/A	N/A	1	100%	9.96	PRINCIPAL DE QUIRÓFANO 1 A SALA PARTO 1
5.46	N/A	N/A	1	100%	5.46	SALE: CAJA 3G A PRINCIPAL UCI URO
17.03	N/A	N/A	1	100%	17.03	PRINCIPAL PASILLO UCI URO
10.33	N/A	N/A	1	100%	10.33	PRINCIPAL PASILLO UCI URO: ENTRE CAMAS 7 A 9
12.05	N/A	N/A	1	100%	12.05	DE CAJA 3G DE INGRESO UCI-NEO INTENSIVOS A CAJA 3G FRENTE A ESTACIÓN SATELITE
		VACIO				
3.99	N/A	N/A	1	100%	3.99	A CAJA 5G DE QUIROFANO 3
1.98	N/A	N/A	1	100%	1.98	A CAJA 5G DE QUIROFANO 2
1.9	N/A	N/A	1	100%	1.90	A CAJA 5G DE QUIROFANO 1
2.1	N/A	N/A	1	100%	2.10	PRINCIPAL A CAJA 3G DE SALA PARTO 2
2	N/A	N/A	1	100%	2.00	PRINCIPAL A CAJA 3G DE SALA PARTO 1
11.12	N/A	N/A	1	100%	11.12	PRINCIPAL FRENTE QUIROFANO 2 A PASILLO AUTOCLAVE
3.8	N/A	N/A	1	100%	3.80	DE PASILLO AUTOCLAVE A CAJA 2G
6.46	N/A	N/A	1	100%	6.46	DE CAJA 2G A RECUPERACIÓN QUIRURGICA
4.97	N/A	N/A	1	100%	4.97	PRINIPAL A CAMAS: 3 Y 4
4.44	N/A	N/A	1	100%	4.44	DERIVACIÓN CAMA 3
1.67	N/A	N/A	1	100%	1.67	DERIVACIÓN CAMA 4
8.92	N/A	N/A	1	100%	8.92	DERIVACIÓN A CAMAS: 1 Y 2
14.44	N/A	N/A	1	100%	14.44	DERIVACIÓN A CAMAS: 5 Y 6
3.93	N/A	N/A	1	100%	3.93	DERIVACIÓN CAMA 7
5.66	N/A	N/A	1	100%	5.66	DERIVACIÓN DE CAMA 7 A CAMA 8
5.24	N/A	N/A	1	100%	5.24	DERIVACIÓN DE CAMA 8 A CAMA 9
3.46	N/A	N/A	1	100%	3.46	ENTRA: DE PASILLO TRABAJO PARTO A CAJA 2G DE RECUPERACIÓN PARTOS
18.44	N/A	N/A	1	100%	18.44	SALE: DE CAJA 2G A CAMAS DE RECUPERACIÓN PARTOS
23.6	N/A	N/A	4	100%	94.40	DERIVACIÓN A CAMAS: 1, 2, 4, 5
2.7	N/A	N/A	1	100%	2.70	DERIVACIÓN DE CAMA 2 A CAMA 3
9.03	N/A	N/A	1	100%	9.03	PRINCIPAL RECUPERACIÓN PARTOS A TRABAJO PARTO
4.53	N/A	N/A	1	100%	4.53	DERIVACIÓN CAMA 1 DE TRABAJO PARTO (COSTADO DE CENTRAL)
6.57	N/A	N/A	1	100%	6.57	DERIVACIÓN A CAMAS: 2, 3, 4, 5
6.34	N/A	N/A	1	100%	6.34	
4.21	N/A	N/A	1	100%	4.21	DERIVACIÓN CAMA 1 DE UCI URO
4.51	N/A	N/A	4	100%	18.04	DERIVACIÓN CAMA 2 A 5 DE UCI URO
6.13	N/A	N/A	1	100%	6.13	DERIVACIÓN CAMA 6 DE UCI URO
3.31	N/A	N/A	3	100%	9.93	DERIVACIÓN CAMA 7 A 9 DE UCI URO
18.36	N/A	N/A	1	100%	18.36	DE CAJA 3G DE INGRESO UCI-NEO INTENSIVOS POR UCI UARO A PRINCIPAL DE UCI-NEO INTENSIVO (AISLADO 1)
2.2	N/A	N/A	1	100%	2.20	DE AISLADO 1 A CAMA FRENTE A AISLADO 2
2.28	N/A	N/A	1	100%	2.28	DE PRINCIPAL A CAMA 1 - COSTADO DE AISLADO 2
0.75	N/A	N/A	1	100%	0.75	DE PRINCIPAL A CAMA 1 - COSTADO DE AISLADO 1
2.39	N/A	N/A	1	100%	2.39	DE PRINCIPAL A CAMA 2 - COSTADO DE AISLADO 2
2.29	N/A	N/A	1	100%	2.29	DE PRINCIPAL A CAMA 3 - COSTADO DE AISLADO 2
0.73	N/A	N/A	1	100%	0.73	DE PRINCIPAL A CAMA 2 - COSTADO DE AISLADO 1
0.72	N/A	N/A	1	100%	0.72	DE PRINCIPAL A CAMA 3 - COSTADO DE AISLADO 1
2.3	N/A	N/A	1	100%	2.30	DE PRINCIPAL A CAMA 4 - COSTADO DE AISLADO 2
0.58	N/A	N/A	1	100%	0.58	DE PRINCIPAL A CAMA 4 - COSTADO DE AISLADO 1
21.27	N/A	N/A	1	100%	21.27	DE CAJA 3G DE INGRESO POR UCI UARO A PRINCIPAL DE UCI-NEO INTERMEDIO
2.94	N/A	N/A	1	100%	2.94	DERIVACIÓN A AISLADO 1-INTERMEDIO
1.86	N/A	N/A	1	100%	1.86	DERIVACIÓN CAMA 1 COSTADO AISLADO
1.74	N/A	N/A	1	100%	1.74	DERIVACIÓN CAMA 2 COSTADO AISLADO
0.62	N/A	N/A	1	100%	0.62	DERIVACIÓN CAMA 1 FRENTE AISLADO
0.9	N/A	N/A	1	100%	0.90	DERIVACIÓN CAMA 2 FRENTE AISLADO Y FRENTE CAMA 1
0.61	N/A	N/A	1	100%	0.61	DERIVACIÓN CAMA 3 FRENTE A AISLADO Y COSTADO DE CAMA 1
0.79	N/A	N/A	1	100%	0.79	DERIVACIÓN CAMA 4 FRENTE A AISLADO Y COSTADO DE CAMA 2
0.86	N/A	N/A	1	100%	0.86	DERIVACIÓN CAMA 6 FRENTE A AISLADO Y COSTADO DE CAMA 4
0.9	N/A	N/A	1	100%	0.90	DERIVACIÓN CAMA 5 FRENTE A AISLADO Y COSTADO DE CAMA 3
5.68	N/A	N/A	1	100%	5.68	PRINCIPAL CAMAS FRENTE A AISLADO-INTERMEDIO
21.62	N/A	N/A	1	100%	21.62	DE CAJA 3G FRENTE A ESTACIÓN SATELITE A PRINCIPAL DE CAMAS DE UCI-NEO BÁSICO
1.2	N/A	N/A	1	100%	1.20	DERIVACIÓN CAMA DE UCI-NEO BÁSICO
0.88	N/A	N/A	1	100%	0.88	DERIVACIÓN CAMA DE UCI-NEO BÁSICO
0.95	N/A	N/A	1	100%	0.95	DERIVACIÓN CAMA DE UCI-NEO BÁSICO
2.26	N/A	N/A	1	100%	2.26	DERIVACIÓN CAMA DE UCI-NEO BÁSICO
0.95	N/A	N/A	1	100%	0.95	DERIVACIÓN CAMA DE UCI-NEO BÁSICO
1.86	N/A	N/A	1	100%	1.86	DERIVACIÓN CAMA DE UCI-NEO BÁSICO
0.89	N/A	N/A	1	100%	0.89	DERIVACIÓN CAMA DE UCI-NEO BÁSICO
1.94	N/A	N/A	1	100%	1.94	DERIVACIÓN CAMA DE UCI-NEO BÁSICO
2.29	N/A	N/A	1	100%	2.29	DERIVACIÓN CAMA DE UCI-NEO BÁSICO
0.83	N/A	N/A	1	100%	0.83	DERIVACIÓN CAMA DE UCI-NEO BÁSICO
1.26	N/A	N/A	1	100%	1.26	DERIVACIÓN CAMA DE UCI-NEO BÁSICO
0.88	N/A	N/A	1	100%	0.88	DERIVACIÓN CAMA DE UCI-NEO BÁSICO
1.57	N/A	N/A	1	100%	1.57	DERIVACIÓN CAMA DE UCI-NEO BÁSICO
1.56	N/A	N/A	1	100%	1.56	DERIVACIÓN CAMA DE UCI-NEO BÁSICO
2.39	N/A	N/A	1	100%	2.39	UCI-NEO INTENSIVOS: SALA CAJA 3G DE INGRESO POR UCI UARO
2.88	N/A	N/A	1	100%	2.88	UCI-NEO INTENSIVOS: ENTRA CAJA 3G DE INGRESO POR UCI UARO
3	N/A	N/A	1	100%	3.00	UCI-NEO INTERMEDIOS: ENTRA CAJA 3G DE INGRESO POR UCI UARO
2	N/A	N/A	1	100%	2.00	UCI-NEO INTERMEDIOS: SALE CAJA 3G DE INGRESO POR UCI UARO
1.73	N/A	N/A	1	100%	1.73	UCI-NEO BÁSICOS: ENTRA CAJA 3G FRENTE A ESTACIÓN SATELITE
2.58	N/A	N/A	1	100%	2.58	UCI-NEO BÁSICOS: SALE CAJA 3G FRENTE A ESTACIÓN SATELITE
		AIRE MEDICINAL				
9.96	N/A	N/A	3	100%	29.88	PRINCIPAL QUIROFANO 1 A SALA PARTO 1
		NITROGENO				
4.63	N/A	N/A	1	100%	4.63	DE CAJA 5G DE QUIROFANO 3 A CAJA 5G DE QUIROFANO 2
7.15	N/A	N/A	1	100%	7.15	DE CAJA 5G DE QUIROFANO 2 A CAJA 5G DE QUIROFANO 1
19.6	N/A	N/A	1	100%	19.60	PRINCIPAL QUIROFANOS A PASILLO TRABAJO PARTO
3.08	N/A	N/A	1	100%	3.08	PRINCIPAL DE PASILLO RECUPERACIÓN PARTOS A BUITRON DETRÁS DE CUARTO ASEO DE RECUPERACIÓN PARTOS
		DIOXIDO DE CARBONO (CO2)				
4.63	N/A	N/A	1	100%	4.63	DE CAJA 5G DE QUIROFANO 3 A CAJA 5G DE QUIROFANO 2
7.15	N/A	N/A	1	100%	7.15	DE CAJA 5G DE QUIROFANO 2 A CAJA 5G DE QUIROFANO 1
19.6	N/A	N/A	1	100%	19.60	PRINCIPAL QUIROFANOS A PASILLO TRABAJO PARTO
3.08	N/A	N/A	1	100%	3.08	PRINCIPAL DE PASILLO RECUPERACIÓN PARTOS A BUITRON DETRÁS DE CUARTO ASEO DE RECUPERACIÓN PARTOS

OBSERVACIONES:

TOTAL	**1,605.48**	**Metro lineal**
ACUMULADO ANTERIOR	**1,119.97**	**Metro lineal**
PRESENTE ACTA	**485.51**	**Metro lineal**

Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	7.03	TUBERÍA DE COBRE TIPO L. DÍAM: 1". INCLUYE ACCESORIOS.	CAP	7.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES	UNIDAD	Metro lineal	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL


Registro fotográfico









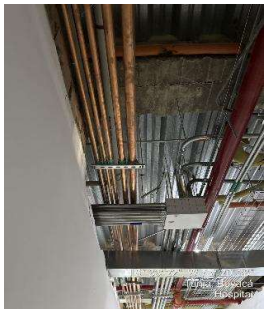



Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
PISO 4						
VACIO						
23.9	N/A	N/A	1	100%	**23.90**	ANILLO SUR CIRCULACION PRINCIPAL
23.67	N/A	N/A	1	100%	**23.67**	ANILLO SUR CIRCULACION PRINCIPAL
0.9	N/A	N/A	2	100%	**1.80**	ANILLO SUR CIRCULACION PRINCIPAL
1.65	N/A	N/A	2	100%	**3.30**	ANILLO SUR CIRCULACION PRINCIPAL
21.28	N/A	N/A	2	100%	**42.56**	ANILLO NORTE CIRCULACION PRINCIPAL
0.9	N/A	N/A	2	100%	**1.80**	ANILLO NORTE CIRCULACION PRINCIPAL
1.33	N/A	N/A	2	100%	**2.66**	ANILLO NORTE CIRCULACION PRINCIPAL
1.31	N/A	N/A	1	100%	**1.31**	CAJA DE CORTE DOBLE
1.35	N/A	N/A	1	100%	**1.35**	CAJA DE CORTE DOBLE
6.71	N/A	N/A	1	100%	**6.71**	TUBERIA EN DUCTO ALIMENTACION
PISO 1						
OXIGENO						
18.12	N/A	N/A	1	100%	**18.12**	PASILLO FRENTE A CONSULTORIO N°5 A CAJA C. DE PASILLO HACIA FARMACIA: PRINCIPAL
VACIO						
19.92	N/A	N/A	1	100%	**19.92**	PASILLO FRENTE A CONSULTORIO N°5 A CAJA C. DE PASILLO HACIA FARMACIA: PRINCIPAL
PISO 3						
AIRE MEDICINAL						
23.35	N/A	N/A	1	100%	**23.35**	UCI PEDIATRICA - CIRCULACIÓN: PRINCIPAL
2.53	N/A	N/A	1	100%	**2.53**	TRAMO DE PASILLO HALLA A VÁLVULAS DE PASILLO HACIA HOSPITALIZACIÓN
VACIO						
23.35	N/A	N/A	1	100%	**23.35**	UCI PEDIATRICA - CIRCULACIÓN: PRINCIPAL
14.37	N/A	N/A	1	100%	**14.37**	SALE: CAJA 3G DE UCI-P A HOSPITALIZACIÓN
19.45	N/A	N/A	1	100%	**19.45**	ENTRA: CAJA 2G A PASILLO HOSPITALIZACIÓN ENTRE HABITACIONES 13 A 25
10.66	N/A	N/A	1	100%	**10.66**	PASILLO HOSPITALIZACIÓN DE HABITACIONES 1 A 7 HASTA CAJA 2G
9.73	N/A	N/A	1	100%	**9.73**	PASILLO HOSPITALIZACIÓN DE HABITACIONES 7 A 12 HASTA CAJA 2G
24.19	N/A	N/A	1	100%	**24.19**	PASILLO HOSPITALIZACIÓN DE CAJA 2G DE HAB. 12 A HAB. 25
6.35	N/A	N/A	1	100%	**6.35**	DE VÁLVULAS DE PASILLO HALL A PASILLO HOSPITALIZACIÓN
2.47	N/A	N/A	1	100%	**2.47**	DE PASILLO HOSPITALIZACIÓN A CAJA 2G DE HAB 11
3.6	N/A	N/A	1	100%	**3.60**	DE PASILLO HOSPITALIZACIÓN A CAJA 2G DE HAB 13
PISO 2						
OXIGENO						
4.78	N/A	N/A	1	100%	**4.78**	PRINCIPAL A CAJA 5G DE QUIROFANO 3 A 2
7.21	N/A	N/A	1	100%	**7.21**	PRINCIPAL A CAJA 5G DE QUIROFANO 2 A 1
5.31	N/A	N/A	1	100%	**5.31**	PRINCIPAL DE QUIROFANO 1 A PRINCIPAL DE TRABAJO DE PARTO
19.6	N/A	N/A	1	100%	**19.60**	PRINCIPAL DE PASILLO TRABAJO DE PARTO
8.2	N/A	N/A	1	100%	**8.20**	PRINCIPAL DE: RESIDUOS ORDINARIOS A CAJA 3G DE UCI URO
1.42	N/A	N/A	1	100%	**1.42**	ENTRA: CAJA 3G DE UCI URO
4.11	N/A	N/A	1	100%	**4.11**	PASILLO ENTRE UCI URO A UCI NEO
4.13	N/A	N/A	1	100%	**4.13**	
2.5	N/A	N/A	1	100%	**2.50**	ENTRA UCI-NEO INTENSIVOS DESDE PASILLO QUE VIENE DE UCI UARO
7	N/A	N/A	1	100%	**7.00**	SUBE DE PISO 2 AL 4 - PRINCIPAL QUE VIENE DE PASILLO RECUPERACIÓN PARTOS POR BUITRON FRENTE CONTROL
VACIO						
9.96	N/A	N/A	1	100%	**9.96**	PRINCIPAL QUIROFANOS A PRINCIPAL SALA DE PARTO
3.06	N/A	N/A	1	100%	**3.06**	ENTRA: CAJA 3G DE UCI URO
7.17	N/A	N/A	1	100%	**7.17**	SALE: CAJA 3G A PRINCIPAL UCI URO
17.13	N/A	N/A	1	100%	**17.13**	PRINCIPAL PASILLO UCI URO - ENTRE CAMAS 1 A 6
10.33	N/A	N/A	1	100%	**10.33**	PRINCIPAL PASILLO UCI URO - ENTRE CAMAS 7 A 9
7	N/A	N/A	1	100%	**7.00**	PRINCIPAL DE ENTRADA A UCI-NEO INTENSIVOS A CAJA DE 3G DE INGRESO
AIRE MEDICINAL						
1.31	N/A	N/A	1	100%	**1.31**	ENTRA: CAJA 3G DE UCI URO
5.56	N/A	N/A	1	100%	**5.56**	SALE: CAJA 3G A PRINCIPAL DE UCI URO
17.13	N/A	N/A	1	100%	**17.13**	PRINCIPAL PASILLO UCI URO - ENTRE CAMAS 1 A 6
10.33	N/A	N/A	1	100%	**10.33**	PRINCIPAL PASILLO UCI URO - ENTRE CAMAS 7 A 9

OBSERVACIONES:

TOTAL	**440.39**	**Metro lineal**
ACUMULADO ANTERIOR	**423.64**	**Metro lineal**
PRESENTE ACTA	**16.75**	**Metro lineal**

Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	7.04	TUBERÍA DE COBRE TIPO L. DÍAM: 1-1/2". INCLUYE ACCESORIOS.	CAP	7.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES	UNIDAD	Metro lineal	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico









Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
PISO 1						
OXIGENO						
7.21	N/A	N/A	1	100%	7.21	LAVADO DE PACIENTES A ACCESO PASILLO URGENCIAS: RED PRENCIPAL DE TANQUE
14.01	N/A	N/A	1	100%	14.01	ACCESO A PASILLO URGANCIAS A FRENTE A CONSULTORIO N°5: RED PRINCIPAL
5.5	N/A	N/A	1	100%	5.50	PRINCIPAL PASILLO URG - SUBE POR BUITRÓN DE PISO 1 A 2 FRENTE A CONSULTORIO N°5
AIRE MEDICINAL						
7.25	N/A	N/A	1	100%	7.25	LAVADO DE PACIENTES A ACCESO PASILLO URGENCIAS: RED PRENCIPAL DE TANQUE
14.05	N/A	N/A	1	100%	14.05	ACCESO A PASILLO URGANCIAS A FRENTE A CONSULTORIO N°5: RED PRINCIPAL
5.5	N/A	N/A	1	100%	5.50	PRINCIPAL PASILLO URG - SUBE POR BUITRÓN DE PISO 1 A 2 FRENTE A CONSULTORIO N°5
PISO 2						
OXIGENO						
2.67	N/A	N/A	1	100%	2.67	SUBE DE PISO 2 AL 3 - PRINCIPAL QUE VIENE DE PASILLO RECUPERACIÓN PARTOS POR BUITRON FRENTE CONTROL
AIRE MEDICINAL						
4.86	N/A	N/A	1	100%	4.86	PRINCIPAL DE CAJA 5G DE QUIROFANO 3 A 2
6.96	N/A	N/A	1	100%	6.96	PRINCIPAL DE CAJA 5G DE QUIROFANO 2 A 1
5.21	N/A	N/A	1	100%	5.21	PRINCIPAL FRENTE QUIROFANO 1 A PASILLO TRABAJO DE PARTO
5.31	N/A	N/A	1	100%	5.31	
19.6	N/A	N/A	1	100%	19.60	PRINCIPAL PASILLO TRABAJO DE PARTO
8.8	N/A	N/A	1	100%	8.80	PRINCIPAL: DE RESIDUOS ORDINARIOS A CAJA 3G UCI URO
4.02	N/A	N/A	1	100%	4.02	PASILLO UCI URO A UCI NEO
4.12	N/A	N/A	1	100%	4.12	
2.3	N/A	N/A	1	100%	2.30	PRINCIPAL QUE VIENE DE PASILLO RECUPERACIÓN PARTOS A BUITRON FRENTE CONTROL
2.46	N/A	N/A	1	100%	2.46	ENTRA A UCI-NEO INTENSIVOS DESDE UCI UARO
3.36	N/A	N/A	1	100%	3.36	SUBE DE PISO 2 AL 3 - PRINCIPAL QUE VIENE DE PASILLO RECUPERACIÓN PARTOS POR BUITRON FRENTE CONTROL

OBSERVACIONES:

TOTAL	**123.19**	**Metro lineal**
ACUMULADO ANTERIOR	**101.40**	**Metro lineal**
PRESENTE ACTA	**21.79**	**Metro lineal**

Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:


PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	7.05	GENTEC CHEM WALL OUTLET - 1/2" - O2	CAP	7.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico







Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
PISO 1						
N/A	N/A	N/A	1	**100%**	**1.00**	SALA PROCEDIMIENTOS IMAGENOLOGÍA
N/A	N/A	N/A	2	**100%**	**2.00**	PROCEDIMIENTOS IMAGENOLOGÍA
N/A	N/A	N/A	1	**100%**	**1.00**	T.A.C.
N/A	N/A	N/A	1	**100%**	**1.00**	SALA YESOS
N/A	N/A	N/A	2	**100%**	**2.00**	SAL EDA
N/A	N/A	N/A	5	**100%**	**5.00**	SALA ERA
N/A	N/A	N/A	1	**100%**	**1.00**	TRIAGE 1
N/A	N/A	N/A	1	**100%**	**1.00**	TRIAGE 2
PISO 2						
N/A	N/A	N/A	3	**100%**	**3.00**	RECUPERACIÓN QUIRUUGICA AMBULATORI
PISO 3						
N/A	N/A	N/A	2	**100%**	**2.00**	LUDOTECA
N/A	N/A	N/A	1	**100%**	**1.00**	PROCEDIMIENTOS
PISO 4						
N/A	N/A	N/A	1	**100%**	**1.00**	PROCEDIMIENTOS

OBSERVACIONES:


TOTAL	**21.00**	**Unidad**
ACUMULADO ANTERIOR	**0.00**	**Unidad**
PRESENTE ACTA	**21.00**	**Unidad**


Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	7.06	GENTEC CHEM WALL OUTLET - 1/2" - VAC	CAP	7.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico







Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
PISO 1						
N/A	N/A	N/A	1	**100%**	**1.00**	SALA PROCEDIMIENTOS IMAGENOLOGÍA
N/A	N/A	N/A	2	**100%**	**2.00**	PROCEDIMIENTOS IMAGENOLOGÍA
N/A	N/A	N/A	1	**100%**	**1.00**	T.A.C.
N/A	N/A	N/A	1	**100%**	**1.00**	TRIAGE 1
N/A	N/A	N/A	1	**100%**	**1.00**	TRIAGE 2
PISO 2						
N/A	N/A	N/A	3	**100%**	**3.00**	RECUPERACIÓN QUIRUUGICA AMBULATORI
PISO 3						
N/A	N/A	N/A	1	**100%**	**1.00**	PROCEDIMIENTOS
PISO 4						
N/A	N/A	N/A	1	**100%**	**1.00**	PROCEDIMIENTOS

OBSERVACIONES:

TOTAL	**11.00**	**Unidad**
ACUMULADO ANTERIOR	**0.00**	**Unidad**
PRESENTE ACTA	**11.00**	**Unidad**

Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	7.07	GENTEC CHEM WALL OUTLET - 1/2" - AIR	CAP	7.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico



Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
PISO 1						
N/A	N/A	N/A	1	100%	1.00	T.A.C.

OBSERVACIONES:

TOTAL	1.00	Unidad
ACUMULADO ANTERIOR	0.00	Unidad
PRESENTE ACTA	1.00	Unidad

Elaboró contratista:	Estefania Carvajal Henao	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	8.03	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	CAP	8.00	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	UNIDAD	Metro Cúbico	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico







Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
14.19	9.63	0.2	1	100%	27.3	TANQUE SOBREANCHOS DE ENTIBADO - NIVELACION PARA CICLOPEO
26.2	2.4	1.6	1	100%	100.6	FILTRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO

OBSERVACIONES:

TOTAL	127.94	Metro Cúbico
ACUMULADO ANTERIOR	27.33	Metro Cúbico
PRESENTE ACTA	100.61	Metro Cúbico


Elaboró contratista:	Estefania Carvajal Henao	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	8.05	TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO	CAP	8.00	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	UNIDAD	M3-Km	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico



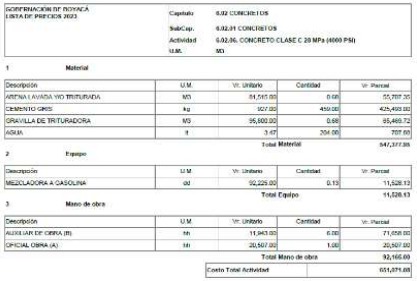





Dimensiones					Total (m)	Observaciones
m3	km cantera	km a restar	km	cantidad		
341.62	8.3	5	3.3	1.00	**1127.36**	**8.02 EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM**
127.94	8.3	0	8.3	1.00	**1061.88**	**8.03 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN**
25.97						**8.09 CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS**
25.97	8.3	0	8.3	0.68	**146.58**	ARENA
25.97	21	0	21	0.68	**370.85**	TRITURADO
15.40						**8.10 CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS**
15.40	8.3	0	8.3	0.68	**86.91**	ARENA
15.40	21	0	21	0.68	**219.90**	TRITURADO
841.74	8.3	0	8.3	1.00	**6986.47**	**9.01 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN**
60.37	8.3	0	8.3	1.00	**501.08**	**NP 16. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAVAS PARA LECHO FILTRANTE (16- 25 MM) DE CANTO RODADO.**
789.85						**NP 18. CONCRETO CICLÓPEO DE 21 MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P**
841.74	8.3	0	8.3	0.6	**4191.88**	ARENA
841.74	21	0	21	0.6	**10605.96**	TRITURADO
841.74	21	0	21	0.4	**7070.64**	PIEDRA

OBSERVACIONES: Los agregados son traídos de la cantera agregados santa lucía que queda a 21 km del lugar de la obra y arena de cantera Dubai que está a 8,3 km del proyecto.

TOTAL	**32,369.51**	**M3-Km**
ACUMULADO ANTERIOR	**0.00**	**M3-Km**
PRESENTE ACTA	**32,369.51**	**M3-Km**

Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	8.06	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	CAP	8.00	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	UNIDAD	M3-Km	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico





Dimensiones					Total (m)	Observaciones
m3	km cantera	km a restar	km	cantidad		
13.66	21	0	21	1.00	**286.96**	**8.04 RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA**
397.56	21	1	20	1.00	**7951.25**	**9.02 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR**

OBSERVACIONES: Los agregados son traídos de la cantera agregados santa lucía que queda a 21 km del lugar de la obra

TOTAL	**8,238.21**	**M3-Km**
ACUMULADO ANTERIOR	**0.00**	**M3-Km**
PRESENTE ACTA	**8,238.21**	**M3-Km**

Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	8.07	ENTIBADOS EN MADERA TIPO 2 PARA EXCAVACIONES 1 A 7 USOS	CAP	8.00	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	UNIDAD	Metro Cuadrado	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico





Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
14.19	9.63	2.5	1	100%	95.03	PERIMETRAL MUROS TANQUE DE ALAMACENAMIENTO

OBSERVACIONES:

TOTAL	95.03	Metro Cuadrado
ACUMULADO ANTERIOR	0.00	Metro Cuadrado
PRESENTE ACTA	95.03	Metro Cuadrado


Elaboró contratista:	Estefania Carvajal Henao	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	8.08	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.07MTS 14MPA (2000PSI)	CAP	8.00	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	UNIDAD	Metro Cuadrado	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico







Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
11.88	7.56		1	100%	89.81	TANQUE DE ALMACENAMIENTO
2.22	0.95		1	100%	2.11	TANQUE DE ALMACENAMIENTO
2.20	1.16		6	100%	15.31	SUMIDEROS - URBANISMO
1.00	1.00		8	100%	8.00	ZAPATAS - ESTRUCTURA MANIFOLD
63.00	0.35		1	100%	22.05	VIGA CIMIENTO DE CERRAMIENTO
15.51	0.3		1	100%	4.7	PLAZOLETA DE ESTATUA - URBANISMO

OBSERVACIONES:

TOTAL	141.94	Metro Cuadrado
ACUMULADO ANTERIOR	0.00	Metro Cuadrado
PRESENTE ACTA	141.94	Metro Cuadrado

Elaboró contratista:	Estefania Carvajal Henao	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	8.1	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	CAP	8.00	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	UNIDAD	Metro Cúbico	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico





Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
28.2	0.3	1.5	1	100%	12.69	MUROS PERIMETRALES: TANQUE ALMACENAMIENTO
4.2	0.3	2.15	1	100%	2.71	MURO PERIMETRAL: CUARTO EQUIPOS

OBSERVACIONES:

TOTAL	15.40	Metro Cúbico
ACUMULADO ANTERIOR	12.69	Metro Cúbico
PRESENTE ACTA	2.71	Metro Cúbico

Elaboró contratista:	Estefania Carvajal Henao	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA:


PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	8.11	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPA	CAP	8.00	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	UNIDAD	kilogramo	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico





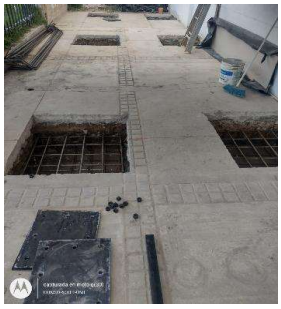





Nº Barra	Dimensiones: L (m) incluye ganchos	Kg/m	Elementos iguales	Total KG	%	Total (m)	Observaciones
TANQUE DE ALMACENAMIENTO							
1/2	8.50	0.994	48	405.55	100%	**405.6**	Longituinal inferior losa de piso
1/2	4.50	0.994	48	214.70	100%	**214.7**	
1/2	5.50	0.994	48	262.42	100%	**262.4**	Longituinal superior losa de piso
1/2	7.50	0.994	48	357.84	100%	**357.8**	
1/2	7.45	0.994	77	570.21	100%	**570.2**	Transversal inferior losa de piso
1/2	7.45	0.994	77	570.21	100%	**570.2**	Transversal superior losa de piso
1/2	1.80	0.994	40	71.57	100%	**71.6**	Vertical muro oriental
1/2	2.50	0.994	40	99.40	100%	**99.4**	Vertical muro oriental
1/2	11.00	0.994	10	109.34	100%	**109.3**	Transversal muro oriental
1/2	7.50	0.994	10	74.55	100%	**74.6**	Transversal muro oriental
1/2	2.50	0.994	86	213.71	100%	**213.7**	Vertical muro divisorio cuarto de maquinas
1/2	6.85	0.994	20	136.18	100%	**136.2**	Transversal oriental muro divisorio cuarto de maquinas
1/2	5.75	0.994	10	57.16	100%	**57.2**	Transversal occidental muro divisorio cuarto de maquinas
1/2	2.50	0.994	86	213.71	100%	**213.7**	Vertical muro occidental
1/2	8.80	0.994	10	87.47	100%	**87.5**	Transversal occidental muro occidental
1/2	6.85	0.994	10	68.09	100%	**68.1**	
1/2	5.75	0.994	10	57.16	100%	**57.2**	Transversal oriental muro occidental
1/2	2.50	0.994	126	313.11	100%	**313.1**	Vertical muro norte
1/2	6.35	0.994	10	63.12	100%	**63.1**	Transversal sur muro norte
1/2	2.50	0.994	152	377.72	100%	**377.7**	Vertical muro sur
1/2	12.00	0.994	10	119.28	100%	**119.3**	Transversal Norte, muro sur
5/8	12.00	1.552	40	744.96	100%	**745.0**	Longitudinal inferior losa de cubierta
5/8	6.40	1.552	80	794.62	100%	**794.6**	Longitudinal superior losa de cubierta
5/8	6.85	1.552	75	797.34	100%	**797.3**	Transversal inferior losa de cubierta
5/8	3.85	1.552	150	896.28	100%	**896.3**	Transversal superior losa de cubierta
CERRAMIENTO OCCIDENTAL							
							VIGA CIMIENTO
1/2	70.35	0.994	1	69.93	100%	**69.9**	Longitudinal (traslapo: 70cm)
3/8	1.00	0.56	420	235.20	100%	**235.2**	Transversal (fleje C/15 - S:20x20cm - G:10cm)
URBANISMO							
							SUMIDERO 1 - COSTADO NOROCCIDENTA VÍA JUNTO ZONA ANDÉN URBANISMO
3/8	2.90	0.56	4	6.50	100%	**6.5**	Longitudinal (lado 1)
3/8	2.50	0.56	5	7.00	100%	**7.0**	Longitudinal (lado 2)
3/8	4.20	0.56	4	9.41	100%	**9.4**	Transversal (traslapo: 40cm)
						0.0	
							SUMIDERO 2 - COSTADO NOROCCIDENTA VÍA JUNTO ZONA ANDÉN EDF. ESPECIALISTA
3/8	2.90	0.56	4	6.50	100%	**6.5**	Longitudinal (lado 1)
3/8	2.50	0.56	5	7.00	100%	**7.0**	Longitudinal (lado 2)
3/8	4.20	0.56	4	9.41	100%	**9.4**	Transversal (traslapo: 40cm)
							SUMIDERO 3 - COSTADO NOROCCIDENTA VÍA JUNTO ZONA ANDÉN URBANISMO
3/8	2.90	0.56	4	6.50	100%	**6.5**	Longitudinal (lado 1)
3/8	2.50	0.56	5	7.00	100%	**7.0**	Longitudinal (lado 2)
3/8	4.20	0.56	4	9.41	100%	**9.4**	Transversal (traslapo: 40cm)
							SUMIDERO 4 - COSTADO NOROCCIDENTA VÍA JUNTO ZONA ANDÉN EDF. ESPECIALISTA
3/8	2.90	0.56	4	6.50	100%	**6.5**	Longitudinal (lado 1)
3/8	2.50	0.56	5	7.00	100%	**7.0**	Longitudinal (lado 2)
3/8	4.20	0.56	4	9.41	100%	**9.4**	Transversal (traslapo: 40cm)
							SUMIDERO 5 - COSTADO NOROCCIDENTAL INGRESO VÍA
3/8	2.90	0.56	4	6.50	100%	**6.5**	Longitudinal (lado 1)
3/8	2.50	0.56	5	7.00	100%	**7.0**	Longitudinal (lado 2)
3/8	4.20	0.56	4	9.41	100%	**9.4**	Transversal (traslapo: 40cm)
							SUMIDERO 6 - COSTADO NOROCCIDENTAL INGRESO VÍA
3/8	2.90	0.56	4	6.50	100%	**6.5**	Longitudinal (lado 1)
3/8	2.50	0.56	5	7.00	100%	**7.0**	Longitudinal (lado 2)
3/8	4.20	0.56	4	9.41	100%	**9.4**	Transversal (traslapo: 40cm)
							POZO 1 - VÍA COSTADO OCCIDENTAL
1/2	1.00	0.994	28	27.83	100%	**27.8**	Longitudinal
3/8	6.00	0.56	4	13.44	100%	**13.4**	Transversal (C/20cm - D:120cm - traslapo: 80cm)
							POZO 2 - VÍA COSTADO OCCIDENTAL
1/2	1.30	0.994	28	36.18	100%	**36.2**	Longitudinal
3/8	6.00	0.56	4	13.44	100%	**13.4**	Transversal (C/20cm - D:120cm - traslapo: 80cm)
							POZO 3 - COSTADO SUR
1/2	1.00	0.994	28	27.83	100%	**27.8**	Longitudinal
3/8	6.00	0.56	4	13.44	100%	**13.4**	Transversal (C/20cm - D:120cm - traslapo: 80cm)
							PLAZOLETA ESTATUA
1/2	18.22	0.994	2	36.23	100%	**36.2**	Longitudinal - radio externo (traslapo: 70cm)
1/2	17.31	0.994	4	68.82	100%	**68.8**	Longitudinal - radio interno (traslapo: 70cm)
3/8	1.00	0.56	109	61.04	100%	**61.0**	Transversal (fleje C/15 - S:20x20cm - G:10cm)





CASETA GASES MEDICINALES							
							ZAPATA 1
1/2	1.10	0.994	5	5.47	**100%**	**5.5**	Lado 1
1/2	1.10	0.994	5	5.47	**100%**	**5.5**	Lado 2
							ZAPATA 2
1/2	1.10	0.994	5	5.47	**100%**	**5.5**	Lado 1
1/2	1.10	0.994	5	5.47	**100%**	**5.5**	Lado 2
							ZAPATA 3
1/2	1.10	0.994	5	5.47	**100%**	**5.5**	Lado 1
1/2	1.10	0.994	5	5.47	**100%**	**5.5**	Lado 2
							ZAPATA 4
1/2	1.10	0.994	5	5.47	**100%**	**5.5**	Lado 1
1/2	1.10	0.994	5	5.47	**100%**	**5.5**	Lado 2
							ZAPATA 5
1/2	1.10	0.994	5	5.47	**100%**	**5.5**	Lado 1
1/2	1.10	0.994	5	5.47	**100%**	**5.5**	Lado 2
							ZAPATA 6
1/2	1.10	0.994	5	5.47	**100%**	**5.5**	Lado 1
1/2	1.10	0.994	5	5.47	**100%**	**5.5**	Lado 2
							ZAPATA 7
1/2	1.10	0.994	5	5.47	**100%**	**5.5**	Lado 1
1/2	1.10	0.994	5	5.47	**100%**	**5.5**	Lado 2
							ZAPATA 8
1/2	1.10	0.994	5	5.47	**100%**	**5.5**	Lado 1
1/2	1.10	0.994	5	5.47	**100%**	**5.5**	Lado 2

OBSERVACIONES:

TOTAL	**8,503.96**	**kilogramo**
ACUMULADO ANTERIOR	**3,516.98**	**kilogramo**
PRESENTE ACTA	**4,986.99**	**kilogramo**

Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	9.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	CAP	9.00	CONSTRUCCIÓN DE URBANISMO	UNIDAD	metro cubico	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico











Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
URBANISMO						
68.16	0.5	0.4	1	100%	13.63	BORDILLO PERIMETRAL DE COSTADO OCCIDENTAL
33.12	7.00	0.73	1	100%	169.24	VÍA PRINCIPAL
7.00	9.13	0.73	1	100%	23.33	VÍA PRINCIPAL (ÁREA: TRIANGULO)
54.94	17.53	0.30	1	100%	144.46	ANDÉN Y ZONA VERDE (ÁREA: TRIANGULO)
5.80	8.71	0.60	1	100%	30.31	VÍA PRINCIPAL - ACCESO FARMACIA
6.24	4.55	0.60	1	100%	17.04	
9.37	2.00	0.30	1	100%	5.62	ANDÉN CONTIGUO A TANQUES DE AGUA POTABLE
5.54	15.00	0.80	1	100%	66.48	ZONA PEATONAL - ACCESO PRINCIPAL
4.61	9.74	0.80	1	100%	35.92	
63	0.35	0.50	1	100%	11.03	VIGA DE CIMIENTO PARA CERRAMIENTO
15.51	0.3	0.4	1	100%	1.9	PLAZOLETA DE ESTATUA - URBANISMO
r	área	h (m)	Cantidad	%		
6	113.10	0.73	1	100%	82.56	ROTONDA (CIRCULAR)
RED DE ALCANTARILLADO						
53	1.3	1.2	1	100%	82.68	TUBERIA 12" - DE CAJA DE INSPECCIÓN SUR A MH NORTE
28	1.3	1.45	1	100%	52.78	TUBERIA 12" - DE MH NORTE A MH VÍA DE INGRESO
31.3	1.3	0.83	1	100%	33.77	TUBERIA 10" - DE SUR A NORTE
17	1.3	0.83	1	100%	18.34	TUBERIA 10" - DE CAJA INSPECCIÓN SUR A MH NORTE
4	1.3	0.83	1	100%	4.32	TUBERIA 8" - DE SUR A NORTE
2.2	1.16	0.85	6	100%	13.02	SUMIDEROS
16	0.8	0.5	1	100%	6.40	TUBERIA 8" - COSTADO SUR
3	0.8	0.5	1	100%	1.20	TUBERIA 8" - COSTADO SUR
2	0.8	0.5	1	100%	0.80	TUBERIA 8" - COSTADO SUR
14	0.8	0.5	1	100%	5.60	TUBERIA 8" - COSTADO SUR
12.1	0.95	0.6	1	100%	6.90	CONEXIÓN DE SUMIDEROS A CAJA: COSTADO NORTOCCIDENTAL
4.3	0.95	0.6	1	100%	2.45	CONEXIÓN DE SUMIDEROS A CAJA: COSTADO NORTOCCIDENTAL
5.3	0.95	0.6	1	100%	3.02	CONEXIÓN DE SUMIDEROS A CAJA: COSTADO NORTOCCIDENTAL
4.12	0.95	0.6	1	100%	2.35	CONEXIÓN DE SUMIDEROS A CAJA: COSTADO NORTOCCIDENTAL
r	área	h (m)	Cantidad	%		
0.8	2.01	1	1	100%	2.01	POZO 1 DE INSPECCIÓN (CIRCULAR)
0.8	2.01	1.3	1	100%	2.61	POZO 2 DE INSPECCIÓN (CIRCULAR)
0.8	2.01	1	1	100%	2.01	POZO 3 DE INSPECCIÓN (CIRCULAR)

OBSERVACIONES:

TOTAL	**841.74**	**metro cubico**
ACUMULADO ANTERIOR	**803.41**	**metro cubico**
PRESENTE ACTA	**38.33**	**metro cubico**

Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	NP 1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CERÁMICA ANTIDESLIZANTE	CAP	10.00	ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD	Metro Cuadrado	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico













Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
PISO 3						
1.7	1.54	N/A	1	**100%**	**2.62**	UCI PEDIATRICA: BAÑO PMR
2.385	1.4	N/A	1	**100%**	**3.34**	UCI PEDIATRICA: TRABAJO SUCIO
2.37	1.36	N/A	1	**100%**	**3.22**	UCI PEDIATRICA: TRABAJO LIMPIO
1.12	0.78	N/A	1	**100%**	**0.87**	UCI PEDIATRICA: ROPA SUCIA
1.12	0.78	N/A	1	**100%**	**0.87**	UCI PEDIATRICA: RESIDUOS PELIGROSOS
1.13	0.72	N/A	1	**100%**	**0.81**	UCI PEDIATRICA: RESIDUOS NO PELIGROSOS
1.74	1.4	N/A	1	**100%**	**2.44**	LUDOTECA: BAÑO PMR
0.68	0.33	N/A	1	**100%**	**0.22**	
2.71	1.45	N/A	1	**100%**	**3.93**	LUDOTECA: ÁREA LAVAMANOS
0.52	0.33	N/A	1	**100%**	**0.17**	LUDOTECA: CUARTO ASEO
1.05	0.68	N/A	1	**100%**	**0.71**	
0.62	0.3	N/A	1	**100%**	**0.19**	LUDOTECA: BAÑOS
0.66	0.34	N/A	1	**100%**	**0.22**	
1.46	1.6	N/A	1	**100%**	**2.34**	
0.68	0.72	N/A	1	**100%**	**0.49**	CUARTO ASEO CIRCULACIÓN RESTRINGIDA
0.29	0.53	N/A	1	**100%**	**0.15**	
PISO 1						
3.8	1.93	N/A	1	**100%**	**7.33**	LAVADO DE PACIENTES
2.67	1.93	N/A	1	**100%**	**5.15**	W.C MUJERES
1.52	2.21	N/A	1	**100%**	**3.36**	BAÑO DISCAPASITADOS
1.94	2.65	N/A	1	**100%**	**5.14**	W.C SALA ESPERA ADULTO
1.2	1.76	N/A	1	**100%**	**2.11**	W.C SALA ESPERA ADULTO
1.36	1.25	N/A	1	**100%**	**1.70**	CONSULTORIO 1
1.46	1.1	N/A	1	**100%**	**1.61**	CONSULTORIO 2
1.5	1.02	N/A	1	**100%**	**1.53**	CONSULTORIO 3
1.56	1.19	N/A	1	**100%**	**1.86**	CONSULTORIO 4
1.22	1.35	N/A	1	**100%**	**1.65**	SALA ERA
2.11	1.53	N/A	1	**100%**	**3.23**	WC MIXTO PMR
2.11	1.13	N/A	1	**100%**	**2.38**	WC MUJERES
1.17	1.45	N/A	1	**100%**	**1.70**	WC AREA ADMINISTRATIVA FARMACIA
1.78	0.84	N/A	1	**100%**	**1.50**	WC LABORATORIO
1.05	1.3	N/A	1	**100%**	**1.37**	WC ENTREGA MUESTRAS
2.07	1.44	N/A	1	**100%**	**2.98**	WC PROCEDIMIENTOS DE IMAGENOLOGIA
1.28	1.14	N/A	1	**100%**	**1.46**	WC ECOGRAFO
1.27	1	N/A	1	**100%**	**1.27**	WC CONSULTORIO DE ECOGRAFO
1.32	19	N/A	1	**100%**	**25.08**	WC ADMINISTRACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
1	2.02	N/A	1	**100%**	**2.02**	T. LIMPIO ADMISIONES
1.7	1.2	N/A	1	**100%**	**2.04**	T. LIMPIO OBSERVACION PEDIATRIA
1.66	1	N/A	1	**100%**	**1.66**	T. SUCIO OBSERVACIÓN PEDIATRIA
6	1.85	N/A	1	**100%**	**11.10**	WC FAMILIAR OBS. PEDIATRIA
1.36	1.3	N/A	1	**100%**	**1.77**	WC PERSONAL ASISTENCIAL 1
1.14	1.36	N/A	1	**100%**	**1.55**	WC PERSONAL ASISTENCIAL 2
1.8	1.1	N/A	1	**100%**	**1.98**	WC MONITOREO GINECOSTETRICIA
PISO 2						
1.15	1.15	N/A	1	**100%**	**1.32**	WC RECUPERACIÓN PARTO
2.21	1.36	N/A	1	**100%**	**3.01**	TRABAJO LIMPIO - RECUPERACIÓN PARTOS
2.21	0.82	N/A	1	**100%**	**1.81**	ROPA LIMPIA - RECUPERACIÓN PARTOS
1.56	1.25	N/A	1	**100%**	**1.95**	TRABAJO SUCIO - RECUPERACIÓN PARTOS
2.64	1.25	N/A	1	**100%**	**3.30**	TRABAJO LIMPIO - RECUPERACIÓN PARTOS DETRÁS DE CENTRAL ENFERMERIA
1.15	1.36	N/A	1	**100%**	**1.56**	WC DESCANSO
1.04	1	N/A	1	**100%**	**1.04**	WC VESTIER MUJERES
2.74	1.15	N/A	1	**100%**	**3.15**	WC-H PMR
2.1	0.93	N/A	1	**100%**	**1.95**	
1.33	0.45	N/A	1	**100%**	**0.60**	
3.5	1.82	N/A	1	**100%**	**6.37**	FILTRO A ESTERILIZACIÓN
1.21	1.16	N/A	1	**100%**	**1.40**	
1.93	1.18	N/A	1	**100%**	**2.28**	TRABAJO LIMPIO - RECUPERACIÓN QUIRURGICA
1.93	1.18	N/A	1	**100%**	**2.28**	TRABAJO SUCIO - RECUPERACIÓN QUIRUGICA
1.68	1.02	N/A	1	**100%**	**1.71**	C. ASEO - FRENTE A QUIROFANO 3
1.34	0.86	N/A	1	**100%**	**1.15**	WC VESTIER HOMBRES
1.03	0.87	N/A	1	**100%**	**0.90**	DUCHA VESTIER HOMBRES
1.94	0.87	N/A	1	**100%**	**1.69**	ROPA SUCIA CENTRAL DE ENFERMERIA
1.26	1.3	N/A	1	**100%**	**1.64**	T. SUCIO CENTRAL DE ENFERMERIA
0.95	1.83	N/A	1	**100%**	**1.74**	MATERIAL - INSUMOS UCI URO
1.25	1	N/A	1	**100%**	**1.25**	DUCHA VESTIER MUJERE
1.27	2	N/A	1	**100%**	**2.54**	LAVADO INCUVADORA
1.23	1.66	N/A	1	**100%**	**2.04**	T- SUCIO UCI NEO

OBSERVACIONES:

TOTAL	**163.81**	**Metro Cuadrado**
ACUMULADO ANTERIOR	**0.00**	**Metro Cuadrado**
PRESENTE ACTA	**163.81**	**Metro Cuadrado**

Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	NP 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8"	CAP	10.00	ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD	Metro lineal	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico





Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
URBANISMO						
4			1	100%	4.00	ENTRE POZOS: DE COSTADO: SUR A NORTE
16			1	100%	16.00	CONEXIÓN DE DESCARCGAS: COSTADO SUR
14			1	100%	14.00	CONEXIÓN DE DESCARCGAS: COSTADO SUR
4.3			1	100%	4.30	CONEXIÓN DE DESCARGA SUMINDEROS: COSTADO NOROCCIDENTAL
5.3			1	100%	5.30	CONEXIÓN DE DESCARGA SUMINDEROS: COSTADO NOROCCIDENTAL
4.12			1	100%	4.12	CONEXIÓN DE DESCARGA SUMINDEROS: COSTADO NOROCCIDENTAL

OBSERVACIONES:

TOTAL	47.72	Metro lineal
ACUMULADO ANTERIOR	4.00	Metro lineal
PRESENTE ACTA	43.72	Metro lineal

Elaboró contratista:	Estefanía Carvajal Henao	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	NP 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"	CAP	10.00	ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD	Metro lineal	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico







Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
URBANISMO						
53			1	100%	53.00	DE CAJA DE INSPECCIÓN SUR A MH NORTE RED SANITARIA
28			1	100%	28.00	DE MH NORTE A MH VÍA DE INGRESO RED SANITARIA
21			1	100%	21.00	DE CAJA FRENTE A TANQUE RCI A MH FRENTE A TORRES ESPECIALISTAS RED AGUAS LLUVIAS
12.1			1	100%	12.10	CONEXIÓN DE DESCARGA SUMINDEROS: COSTADO NOROCCIDENTAL

OBSERVACIONES:

TOTAL	114.10	Metro lineal
ACUMULADO ANTERIOR	102.00	Metro lineal
PRESENTE ACTA	12.10	Metro lineal

Elaboró contratista:	Estefania Carvajal Henao	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	NP 20	REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA DE LADRILLO O DE BLOQUE	CAP	10.00	ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD	Metro lineal	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico







Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
PISO 1						
13.2	N/A	N/A	1	**100%**	**13.2**	W.C BAÑO HOMBRES
9.2	N/A	N/A	1	**100%**	**9.2**	W.C BAÑO MUJERES
2.3	N/A	N/A	1	**100%**	**2.3**	BAÑO COLSULTORIO 3
7.43	N/A	N/A	1	**100%**	**7.4**	BAÑO CONSULTORIO 1
7.5	N/A	N/A	1	**100%**	**7.5**	BAÑO CONSULTORIO 2
7.5	N/A	N/A	1	**100%**	**7.5**	BAÑO MONITOREO
7.5	N/A	N/A	1	**100%**	**7.5**	BAÑO COSULTORIO 5
7.5	N/A	N/A	1	**100%**	**7.5**	SARTA ERA BAÑO
2.3	N/A	N/A	1	**100%**	**2.3**	SARA ERA
7.5	N/A	N/A	1	**100%**	**7.5**	BAÑO CUBICULO AISLAMIENTO
7.5	N/A	N/A	1	**100%**	**7.5**	BAÑO VESTIER ADMINISTRACION
7.5	N/A	N/A	1	**100%**	**7.5**	PROCEDIMIENTO IMAGEONOLOGIA
7.5	N/A	N/A	1	**100%**	**7.5**	TOMA DE MIUESTRAS GINECOLOGICAS
7.5	N/A	N/A	1	**100%**	**7.5**	BAÑO LAVADO DE OJOS
7.5	N/A	N/A	1	**100%**	**7.5**	W.C SALA DE ESPERA
1.36	N/A	N/A	2	**100%**	**2.7**	REANIMACION
1.34	N/A	N/A	3	**100%**	**4.0**	MONITOREO GECO
1.43	N/A	N/A	2	**100%**	**2.9**	SALA ERA
1.56	N/A	N/A	1	**100%**	**1.6**	SALA ERA
1.67	N/A	N/A	1	**100%**	**1.7**	SALA ERA
0.2	N/A	N/A	3	**100%**	**0.6**	SALA ERA
1.1	N/A	N/A	1	**100%**	**1.1**	YESOS
1.3	N/A	N/A	1	**100%**	**1.3**	PROCEDIMIENTO
1.4	N/A	N/A	2	**100%**	**2.8**	CIRCULACION
4.44	N/A	N/A	1	**100%**	**4.4**	OBSERVACION PEDIATRA
1.61	N/A	N/A	1	**100%**	**1.6**	OBSERVACION PEDIATRA
2.65	N/A	N/A	1	**100%**	**2.7**	OBSERVACION PEDIATRA
5.53	N/A	N/A	1	**100%**	**5.5**	OBSERVACION PEDIATRA
5.24	N/A	N/A	1	**100%**	**5.2**	OBSERVACION PEDIATRA
1.4	N/A	N/A	2	**100%**	**2.8**	ALARMA
1.35	N/A	N/A	3	**100%**	**4.1**	OBSERVACION GINECO
1.1	N/A	N/A	3	**100%**	**3.3**	CAJA DE CORTE CIRCULAR
1.17	N/A	N/A	1	**100%**	**1.2**	TOMOHGRAFO
1.4	N/A	N/A	2	**100%**	**2.8**	CARDIO
1.3	N/A	N/A	1	**100%**	**1.3**	RX
PISO 2						
7.5	N/A	N/A	1	**100%**	**7.5**	W.C DISCAPACITADOS
2.3	N/A	N/A	1	**100%**	**2.3**	VESTIER MUJERES BAÑO
7.5	N/A	N/A	1	**100%**	**7.5**	VESTIER MUJERES BAÑO
2.3	N/A	N/A	1	**100%**	**2.3**	VESTIER HOMBRES BAÑO
7.5	N/A	N/A	1	**100%**	**7.5**	BAÑOS RECUPERACION PARTO
7.5	N/A	N/A	1	**100%**	**7.5**	PREPARACION PASIENTES AISLADOS
7.5	N/A	N/A	1	**100%**	**7.5**	PREPARACION PASIENTES AISLADOS
7.5	N/A	N/A	1	**100%**	**7.5**	W.C DISCAPASITADOS COORDINACION UCI
2.3	N/A	N/A	1	**100%**	**2.3**	W.C HOMBRES COORDINACIÓN UCI
7.5	N/A	N/A	1	**100%**	**7.5**	BAÑO DISCAPISTADOS AL LADO DEL LACTARIO
7.5	N/A	N/A	1	**100%**	**7.5**	BAÑO FRENTE A UCI ADULTOS
2.3	N/A	N/A	1	**100%**	**2.3**	BAÑO FRENTE A UCI ADULTOS
7.5	N/A	N/A	1	**100%**	**7.5**	BAÑO AISLADO UARO
0.87	N/A	N/A	1	**100%**	**0.9**	UCI ADULTOS CENTRAL DE EMFERMERIA
1.08	N/A	N/A	1	**100%**	**1.1**	ENTRADA UCI ADULTOS
1	N/A	N/A	1	**100%**	**1.0**	CIRCULACION A SALA DE PARTOS
0.95	N/A	N/A	2	**100%**	**1.9**	RECUPERACION SALA DE PARTOS
1.2	N/A	N/A	1	**100%**	**1.2**	RECUPERACION SALA DE PARTOS
1.62	N/A	N/A	1	**100%**	**1.6**	RECUPERACION SALA DE PARTOS
0.55	N/A	N/A	1	**100%**	**0.6**	RECUPERACION SALA DE PARTOS
1.13	N/A	N/A	1	**100%**	**1.1**	RECUPERACION SALA DE PARTOS
2.16	N/A	N/A	1	**100%**	**2.2**	PREPARACION PARTOS
1.11	N/A	N/A	1	**100%**	**1.1**	PREPARACION PARTOS
1.11	N/A	N/A	1	**100%**	**1.1**	PREPARACION PARTOS
1.4	N/A	N/A	4	**100%**	**5.6**	CIRCULACION SALA DE PARTOS
1.11	N/A	N/A	3	**100%**	**3.3**	SALA DE PARTOS 2
1.21	N/A	N/A	6	**100%**	**7.3**	CICULACION QUIROFANOS
5.72	N/A	N/A	1	**100%**	**5.7**	RECUPERACION QUIRURGICA
8.21	N/A	N/A	1	**100%**	**8.2**	RECUPERACION QUIRURGICA
1.04	N/A	N/A	2	**100%**	**2.1**	RECUPERACION QUIRURGICA
1.26	N/A	N/A	3	**100%**	**3.8**	RECUPERACION QUIRURGICA
0.94	N/A	N/A	2	**100%**	**1.9**	RECUPERACION QUIRURGICA
1.15	N/A	N/A	2	**100%**	**2.3**	ENTRADA CUIDADOS INTERMEDIOS
1	N/A	N/A	6	**100%**	**6.0**	EBNTRADA CUIDADOS INTENSIVOS
				100%	**1.0**	
PISO 3						
2.2	N/A	N/A	1	**100%**	**2.2**	W.C ADULTOS LUDOTECA
9.6	N/A	N/A	1	**100%**	**9.6**	W.C NIÑOS LUDOTECA
7.5	N/A	N/A	1	**100%**	**7.5**	W.C COORDINACION PEDIATRIA
2.3	N/A	N/A	1	**100%**	**2.3**	W.C COORDINACION PEDIATRIA
2.3	N/A	N/A	1	**100%**	**2.3**	W.C ACESO ASISTENCIAL
7.5	N/A	N/A	1	**100%**	**7.5**	UCI PEDIATRIA
1.29	N/A	N/A	2	**100%**	**2.6**	301
1.03	N/A	N/A	1	**100%**	**1.0**	307
1.3	N/A	N/A	1	**100%**	**1.3**	310
1.12	N/A	N/A	1	**100%**	**1.1**	311
1.16	N/A	N/A	1	**100%**	**1.2**	316
1.17	N/A	N/A	1	**100%**	**1.2**	318
1.04	N/A	N/A	1	**100%**	**1.0**	325
0.85	N/A	N/A	4	**100%**	**3.4**	VALVULA DE CORTE CICULACION
1.32	N/A	N/A	1	**100%**	**1.3**	UCI PEDIATRIA
1.11	N/A	N/A	1	**100%**	**1.1**	ENTRADA UCI PEDIATRIA
4.64	N/A	N/A	1	**100%**	**4.64**	PROCEDIMIENTOS: TOMAS E INTERRUPTORES
1.01	N/A	N/A	1	**100%**	**1.01**	CENTRAL ENFERMERIA: ALARMAS
6.2	N/A	N/A	1	**100%**	**6.20**	CENTRAL ENFERMERIA: TOMAS
3.07	N/A	N/A	1	**100%**	**3.07**	CENTRAL ENFERMERIA: TOMAS
5.7	N/A	N/A	1	**100%**	**5.70**	HAB 11: TOMAS E INTERRUPTORES
1.14	N/A	N/A	1	**100%**	**1.14**	HAB 11: RED DE GAS MEDICINAL
1.83	N/A	N/A	1	**100%**	**1.83**	HAB 11: TOMAS E INTERRUPTORES
0.79	N/A	N/A	1	**100%**	**0.79**	HAB 11: SALIDA TV
1.28	N/A	N/A	1	**100%**	**1.28**	HAB 12: RED DE GAS MEDICINAL
0.77	N/A	N/A	1	**100%**	**0.77**	HAB 12: SALIDA TV
5.34	N/A	N/A	1	**100%**	**5.34**	HAB 12: TOMAS E INTERRUPTORES
0.95	N/A	N/A	2	**100%**	**1.90**	PASILLO: CAJA DE GAS MEDICINAL DE HAB 13
0.91	N/A	N/A	2	**100%**	**1.82**	PASILLO: CAJA DE GAS MEDICINAL DE HAB 11
1.26	N/A	N/A	1	**100%**	**1.26**	HAB 13: RED GAS MEDICINAL
3.81	N/A	N/A	1	**100%**	**3.81**	HAB 13: TOMAS E INTERRUPTORES
1.62	N/A	N/A	1	**100%**	**1.62**	HAB 13: SALIDA TV
1.29	N/A	N/A	1	**100%**	**1.29**	HAB 14: RED GAS MEDICINAL
5.73	N/A	N/A	1	**100%**	**5.73**	HAB 14: TOMAS E INTERRUPTORES
0.74	N/A	N/A	1	**100%**	**0.74**	HAB 14: SALIDA TV
8.22	N/A	N/A	1	**100%**	**8.22**	HAB 15: TOMAS E INTERRUPTORES
1.22	N/A	N/A	1	**100%**	**1.22**	HAB 15: TOMAS E INTERRUPTORES
1.26	N/A	N/A	1	**100%**	**1.26**	HAB 15: RED GAS MEDICINAL
7.21	N/A	N/A	1	**100%**	**7.21**	HAB 15: TOMAS E INTERRUPTORES
0.75	N/A	N/A	1	**100%**	**0.75**	HAB 15: SALIDA TV
2.63	N/A	N/A	1	**100%**	**2.63**	HAB 1: SALIDA TV
2.63	N/A	N/A	1	**100%**	**2.63**	HAB 1: RED DE GAS MEDICINAL



11.04	N/A	N/A	1	100%	11.04	HAB 1: TOMAS E INTERRUPTORES
2.44	N/A	N/A	1	100%	2.44	HAB 2: SALIDA TV
2.05	N/A	N/A	1	100%	2.05	HAB 2: TOMAS E INTERRUPTORES
1.29	N/A	N/A	1	100%	1.29	PASILLO: ALARMA DE DETECCIÓN HAB 1
1.32	N/A	N/A	1	100%	1.32	HAB 3: RED DE GAS MEDICINAL
0.67	N/A	N/A	1	100%	0.67	HAB 3: SALIDA TV
7.58	N/A	N/A	1	100%	7.58	HAB 3: TOMAS E INTERRUPTORES
0.67	N/A	N/A	1	100%	0.67	HAB 4: SALIDA TV
2.17	N/A	N/A	1	100%	2.17	HAB 4: TOMAS E INTERRUPTORES
1.51	N/A	N/A	1	100%	1.51	HAB 4: TOMAS E INTERRUPTORES
0.7	N/A	N/A	1	100%	0.70	HAB 5: SALIDA TV
1.29	N/A	N/A	1	100%	1.29	HAB 5: RED DE GAS MEDICINAL
6.39	N/A	N/A	1	100%	6.39	HAB 5: TOMAS E INTERRUPTORES
0.96	N/A	N/A	1	100%	0.96	HAB 6: SALIDA TV
2.14	N/A	N/A	1	100%	2.14	HAB 6: TOMAS E INTERRUPTORES
1.93	N/A	N/A	1	100%	1.93	HAB 6: TOMAS E INTERRUPTORES
1.29	N/A	N/A	1	100%	1.29	HAB 7: RED GAS MEDICINAL
7.73	N/A	N/A	1	100%	7.73	HAB 7: TOMAS E INTERRUPTORES
0.8	N/A	N/A	1	100%	0.80	HAB 8: SALIDA TV
1.54	N/A	N/A	1	100%	1.54	HAB 8: INTERRUPTOR
0.91	N/A	N/A	2	100%	1.82	PASILLO: CAJA GAS MEDICINAL HAB 7
0.79	N/A	N/A	1	100%	0.79	HAB 9: SALIDA TV
1.26	N/A	N/A	1	100%	1.26	HAB 9: RED DE GAS MEDICINAL
2.93	N/A	N/A	1	100%	2.93	HAB 9: TOMAS
0.78	N/A	N/A	1	100%	0.78	HAB 10: SALIDA TV
1.33	N/A	N/A	1	100%	1.33	HAB 10: RED DE GAS MEDICINAL
2.78	N/A	N/A	1	100%	2.78	HAB 10: TOMAS E INTERRUPTORES
3.42	N/A	N/A	1	100%	3.42	HAB 10: TOMAS E INTERRUPTORES
1.13	N/A	N/A	1	100%	1.13	PROCEDIMIENTOS: RED DE GAS MEDICINAL
			PISO 4			
1.3	N/A	N/A	1	100%	1.3	401
1.25	N/A	N/A	1	100%	1.3	403
1.26	N/A	N/A	1	100%	1.3	405
1.27	N/A	N/A	1	100%	1.3	407
1.27	N/A	N/A	1	100%	1.3	408
1.28	N/A	N/A	1	100%	1.3	410
0.81	N/A	N/A	2	100%	1.6	CENTRAL DE EMFERMERIA
1.2	N/A	N/A	1	100%	1.2	411
1.25	N/A	N/A	1	100%	1.3	412
1.26	N/A	N/A	2	100%	2.5	413
1.28	N/A	N/A	1	100%	1.3	414
1.26	N/A	N/A	1	100%	1.3	415
1.27	N/A	N/A	1	100%	1.3	416
1.27	N/A	N/A	1	100%	1.3	417
1.2	N/A	N/A	1	100%	1.2	418
1.3	N/A	N/A	1	100%	1.3	419
1.26	N/A	N/A	1	100%	1.3	420
1.27	N/A	N/A	1	100%	1.3	422
1.21	N/A	N/A	1	100%	1.2	423
1.26	N/A	N/A	1	100%	1.3	424
1.25	N/A	N/A	1	100%	1.3	425
1.1	N/A	N/A	4	100%	4.4	VALVULAS DE CORTE

OBSERVACIONES:

TOTAL	**525.23**	**Metro lineal**
ACUMULADO ANTERIOR	**379.62**	**Metro lineal**
PRESENTE ACTA	**145.61**	**Metro lineal**

Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCION PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	NP 21	CORTE Y DEMOLICION MURO Y/O PISO EN BALDOSA DE GRANO PARA LA INSTALACION DE MEDIA CAÑA	CAP	10.00

Registro fotográfico










ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD	Metro lineal		UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL
Dimensiones				Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
PISO 1						
28.73	N/A	N/A	2	100%	57.46	AUDITORIO
39.16	N/A	N/A	2	100%	78.32	CAFETERIA
1.64	N/A	N/A	2	100%	3.28	
20.06	N/A	N/A	2	100%	40.12	COCINA
35.37	N/A	N/A	2	100%	70.74	SALA ESPERA IMAGENOLOGIA
22.25	N/A	N/A	2	100%	44.50	RECEPCIÓN MEDICAMENTO FARMACIA
28.27	N/A	N/A	2	100%	56.54	FARMACIA
45.22	N/A	N/A	2	100%	90.44	EQUIPOS LABORATORIO
25.43	N/A	N/A	2	100%	50.86	CENTRIFUGA Y LOQUER LABORATORIO
9.94	N/A	N/A	2	100%	19.88	NEVERAS LABORATORIO
13.51	N/A	N/A	2	100%	27.02	PRETRASFUNCIONAL LABORATORIO
18.64	N/A	N/A	2	100%	37.28	RESIDUOS PELIGROSO, RESIDUOS RECICLABLE,ASEO LABORATORIO
7.00	N/A	N/A	2	100%	14.00	INGRESO LABORATORIO
11.06	N/A	N/A	2	100%	22.12	TOMA DE MUESTRA GINECOLOGIA
16.60	N/A	N/A	2	100%	33.20	TOMA DE MUESTRA
10.47	N/A	N/A	2	100%	20.94	PASILLO SUR IMAGENOLOGIA
6.74	N/A	N/A	2	100%	13.48	PROCEDIMIENTO IMAGENOLOGIA
9.33	N/A	N/A	2	100%	18.66	SALA DE ESPERA ECOGRAFIA
20.36	N/A	N/A	2	100%	40.72	ECOGRAFO 1
15.15	N/A	N/A	2	100%	30.30	ECOGRAFO 2
14.64	N/A	N/A	2	100%	29.28	ADMISIONES PROCEDIMIENTO
19.82	N/A	N/A	2	100%	39.64	PROCEDIMIENTO CARDIO
12.19	N/A	N/A	2	100%	24.38	CONSULTORIO CARDIOLOGIA
20.00	N/A	N/A	2	100%	40.00	OBSERVACION GINECOPEDIATRIA
11.29	N/A	N/A	2	100%	22.58	CIRCULACION RX
9.09	N/A	N/A	2	100%	18.18	CIRCULACION MAMOGRAFIA
34.67	N/A	N/A	2	100%	69.34	OBSERVACION PEDIATRICA
23.41	N/A	N/A	2	100%	46.82	CENTRAL DE ENFERMERIA
7.78	N/A	N/A	2	100%	15.56	DISPARO
16.26	N/A	N/A	2	100%	32.52	T.A.C
14.48	N/A	N/A	2	100%	28.96	OFICINA RADIOLOGIA Y RECIDUO RX
9.48	N/A	N/A	2	100%	18.96	SALA LECTURA RADIOLOGIA
2.53	N/A	N/A	2	100%	5.06	CIRCULACION FRENTE SALA DE LECTURA
3.95	N/A	N/A	2	100%	7.90	RESIDUO ORDINARIO Y RECICLABLE
3.50	N/A	N/A	2	100%	7.00	RESIDUO PELIGROSO
15.46	N/A	N/A	2	100%	30.92	SALA EDA
18.54	N/A	N/A	2	100%	37.08	DIGITACION
3.89	N/A	N/A	2	100%	7.78	ROPA SUCIA
4.85	N/A	N/A	2	100%	9.70	EQUIPO
13.83	N/A	N/A	2	100%	27.66	ERA
9.57	N/A	N/A	2	100%	19.14	CIRCULACION CENTRA DE ENFERMERIA A ERA
10.68	N/A	N/A	2	100%	6.41	DIRECCION DE URGENCIAS
13.06	N/A	N/A	2	100%	7.84	PROCEDIMIENTOS ASEPTICOS
13.95	N/A	N/A	2	100%	8.37	SALA DE YESOS
13.3	N/A	N/A	2	100%	7.98	CONSULTORIO 5
26.96	N/A	N/A	2	100%	16.18	MONITOREO GINECOPSTETRICIA
14.56	N/A	N/A	2	100%	8.74	CONSULTORIO 2
14.57	N/A	N/A	2	100%	8.74	CONSULTORIO 1
14.86	N/A	N/A	2	100%	8.92	CONSULTORIO 4
15.4	N/A	N/A	2	100%	9.24	CONSULTORIO 3
21.2	N/A	N/A	2	100%	12.72	REANIMACIÓN
28.24	N/A	N/A	2	100%	16.94	CIRCULACION URGENCIAS
4.71	N/A	N/A	2	100%	9.42	PASILLO URGENCIAS
8.2	N/A	N/A	2	100%	16.40	TRIAGE # 2
12.72	N/A	N/A	2	100%	25.44	CIRCULACION TRIAGE Y SILLAS DE RUEDAS
11.13	N/A	N/A	2	100%	22.26	TRIAGE # 1
47.32	N/A	N/A	2	100%	94.64	SALA DE ESPERA ADULTOS
31.27	N/A	N/A	2	100%	62.54	CIRCULACION DE ESPERA URGENCIAS A HALL PRINCIPAL
31.27	N/A	N/A	2	100%	62.54	CIRCULACION DE ESPERA URGENCIAS A HALL PRINCIPAL
9.87	N/A	N/A	2	100%	19.74	FACTURACIÓN
15.8	N/A	N/A	2	100%	31.60	DESCANSO MEDICO
16.27	N/A	N/A	2	100%	32.54	DATA CENTER
11.53	N/A	N/A	2	100%	23.06	HALL CENTRAL
5.31	N/A	N/A	2	100%	10.62	WC CAFETERIA
6.49	N/A	N/A	2	100%	12.98	WC DISCAPACITADOS CAFETERIA
7.11	N/A	N/A	2	100%	14.22	WC DISCAPACITADOS SALA DE ESPERA ADULTOS
9.07	N/A	N/A	2	100%	18.14	WC DAMAS SALA DE ESPERA ADULTOS
4.79	N/A	N/A	2	100%	9.58	WC DESCANSO MEDICO 1
5.16	N/A	N/A	2	100%	10.32	WC DESCANSO MEDICO 2
27.24	N/A	N/A	2	100%	54.48	DESCANSO MEDICO
4.8	N/A	N/A	2	100%	9.60	CONSULTORIO 4
4.98	N/A	N/A	2	100%	9.96	CONSULTORIO 1
4.79	N/A	N/A	2	100%	9.58	CONSULTORIO 2
5.31	N/A	N/A	2	100%	10.62	MONITOREO GINECOPSTETRICIA
5.14	N/A	N/A	2	100%	10.28	CONSULTORIO 5
4.85	N/A	N/A	2	100%	9.70	SALA ERA
17.15	N/A	N/A	2	100%	34.30	WC FAMILIAR
6.65	N/A	N/A	2	100%	13.30	WC DISCAPACITADOS GINECOPSTETRICIA
6.05	N/A	N/A	2	100%	12.10	BAÑO VESTIER ADMISIONES
4.27	N/A	N/A	2	100%	8.54	WC ECOGRAFO 1
4.27	N/A	N/A	2	100%	8.54	WC ECOGRAFO 2
4.72	N/A	N/A	2	100%	9.44	WC PROCEDIMIENTOS IMAGENOLOGIA
4.28	N/A	N/A	2	100%	8.56	WC TOMA DE MUESTRAS
5.08	N/A	N/A	2	100%	10.16	WC LABORATORIO
5.03	N/A	N/A	2	100%	10.06	WC FARMACIA
6.22	N/A	N/A	2	100%	12.44	WC MIXTO ESPERA IMAGENOLOGIA
6.227	N/A	N/A	2	100%	12.45	WC DISCAPACITADOS ESPERA IMAGENOLOGIA
6.5	N/A	N/A	2	100%	13.00	ASEO URGENCIAS
7	N/A	N/A	2	100%	14.00	ADMISIONES URGENCIAS
7.6	N/A	N/A	2	100%	15.20	
5.7	N/A	N/A	2	100%	11.40	
4.8	N/A	N/A	2	100%	9.60	WC CONSULTORIO 3
11.3	N/A	N/A	2	100%	22.60	LAVADO PACIENTES
5.28	N/A	N/A	2	100%	10.56	WC MONITOREO GINECOPSTETRICIA
12.3	N/A	N/A	2	100%	24.60	BAÑO HOMBRES ESPERA ADULTOS
3.03	N/A	N/A	2	100%	6.06	TRIAGE 1 MURO ADISIONAL
3.82	N/A	N/A	2	100%	7.64	ROPA LIMPIA DIGITACION
3.87	N/A	N/A	2	100%	7.74	SALA EDA MURO ADISIONAL
6.92	N/A	N/A	2	100%	13.84	WC SALA EDA
7.15	N/A	N/A	2	100%	14.30	WC OBSERVACION PEDIATRICA
6.22	N/A	N/A	2	100%	12.44	TRABAJO LIMPIO OBSERVACION PEDIATRIA
5.6	N/A	N/A	2	100%	11.20	TRABAJO SUCIO OBSERVACION PEDIATRIA
6.5	N/A	N/A	2	100%	13.00	ASEO PASILLO IMAGENOLOGIA
5.97	N/A	N/A	2	100%	11.94	TRABAJO LIMPIO INSUMOS
PISO 2						
13.57	N/A	N/A	2	100%	27.14	UCI URO - 9
15.64	N/A	N/A	2	100%	31.28	UCI URO - 8
13.63	N/A	N/A	2	100%	27.26	UCI URO - 7
11.67	N/A	N/A	2	100%	23.34	PASILLO Y/O CIRCULACIÓN DE UCI URO: DE 7 A 9
7.61	N/A	N/A	2	100%	15.22	UCI AURO - 6
13.2	N/A	N/A	2	100%	26.40	
14.17	N/A	N/A	2	100%	28.34	UCI URO - 5
14.15	N/A	N/A	2	100%	28.30	UCI URO - 4
14.14	N/A	N/A	2	100%	28.28	UCI URO - 3
13.92	N/A	N/A	2	100%	27.84	UCI URO - 2
14.09	N/A	N/A	2	100%	28.18	UCI URO - 1
18.22	N/A	N/A	2	100%	36.44	PASILLO Y/O CIRCULACIÓN DE UCI URO: DE 1 A 5
9.53	N/A	N/A	2	100%	19.06	CENTRAL DE ENFERMERIA + MATERIAL: FRENTE A UCI URO 8
3.51	N/A	N/A	2	100%	7.02	INGRESO CUARTOS DE UCI URO
10.26	N/A	N/A	2	100%	20.52	CENTRAL DE ENFERMERIA: FRENTE A UCI URO 3
2.57	N/A	N/A	2	100%	5.14	INFORMACIÓN FAMILIAR
6.52	N/A	N/A	2	100%	13.04	FILTRO ACCESO PERSONAL UARO
5.04	N/A	N/A	2	100%	10.08	PASILLO ACCESO BAÑO COSTADO DE VESTIER PACIENTES
18.31	N/A	N/A	2	100%	36.62	VESTIER PACIENTES
2.3	N/A	N/A	2	100%	4.60	RACK
40.76	N/A	N/A	2	100%	81.52	RECUPERACIÓN SALA PARTO
9.93	N/A	N/A	2	100%	19.86	ESTACIÓN ENFERMERIA RECUPERACIÓN
9.04	N/A	N/A	2	100%	18.08	CIRCULACIÓN DE: SALA PARTO A UCI ADULTO (LATERAL IZQUIERDO)
17.67	N/A	N/A	2	100%	35.34	CIRCULACIÓN DE: SALA DE PARTO 1 Y 2 A DESCANSO
10.51	N/A	N/A	2	100%	21.02	CUARTO DE EQUIPOS
8.68	N/A	N/A	2	100%	17.36	CIRCULACIÓN HACIA QUIROFANOS DESDE RECUPERACIÓN PARTOS (COSTADO DERECHO)
20.8	N/A	N/A	2	100%	41.60	DESCANSO MÉDICO - QUIROFANOS
9.32	N/A	N/A	2	100%	18.64	CIRCULACIÓN QUIROFANO: DEL 1 AL 3 (COSTADO DERECHO)
5.33	N/A	N/A	2	100%	10.66	BODEGA
49.36	N/A	N/A	2	100%	98.72	RECUPERACIÓN QUIRURGICA + ESTACIÓN ENFERMERIA
10.7	N/A	N/A	2	100%	21.40	PASILLO A AUTOCLAVE: DESDE RECUPERACIÓN QUIRURGICA
31.83	N/A	N/A	2	100%	63.66	AUTOCLAVE
7.85	N/A	N/A	2	100%	15.70	PASILLO AUTOCLAVE - HACIA QUIROFANOS (COSTADO DERECHO)
2.75	N/A	N/A	2	100%	5.50	
14.34	N/A	N/A	2	100%	28.68	PREPARACIÓN PACIENTES AMBULATORIOS
5.39	N/A	N/A	2	100%	10.78	WC H: PREPARACIÓN DE PACIENTES AMBULA.
6.06	N/A	N/A	2	100%	12.12	WC M: PREPARACIÓN DE PACIENTES AMBULA.
14.54	N/A	N/A	2	100%	29.08	PASILLO QUIROFANOS - DEL 3 AL 1 (COSTADO DERECHO)
14.38	N/A	N/A	2	100%	28.76	FARMACIA
24.89	N/A	N/A	2	100%	49.78	PASILLO POSTERIOR FARMACIA



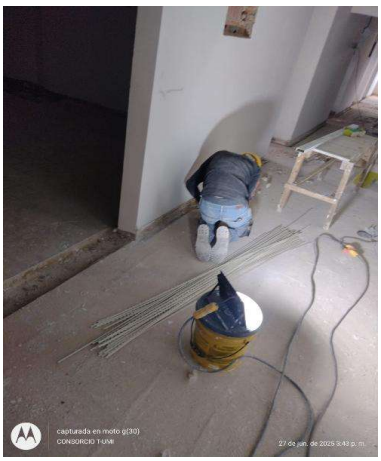





5.85	N/A	N/A	2	100%	11.70	RESIDUOS TEMPARALES 1
4.76	N/A	N/A	2	100%	9.52	RESIDUOS TEMPARALES 2
5.21	N/A	N/A	2	100%	10.42	ASEO (FUERA DE QUIROFANO 3)
13.19	N/A	N/A	2	100%	26.38	PASILLO RECUPARACIÓN PARTOS - DESDE QUIROFANOS (COSTADO DERECHO)
15.4	N/A	N/A	2	100%	30.80	DESCANSO: RECUPERACIÓN Y QUIROFANOS
5.18	N/A	N/A	2	100%	10.36	BODEGA (COSTADO DERECHO DE DESCANSO
5.31	N/A	N/A	2	100%	10.62	CIRCULACIÓN: DESCANSO/VESTIER
16.89	N/A	N/A	2	100%	33.78	VESTIER MUJERES VESTIER MUJERES
18.25	N/A	N/A	2	100%	36.50	VESTIER MUJERES VESTIER HOMBRES
4.53	N/A	N/A	2	100%	9.06	VESTIER MUJERES: DUCHA
4.11	N/A	N/A	2	100%	8.22	VESTIER MUJERES: BAÑO 1
4.06	N/A	N/A	2	100%	8.12	VESTIER MUJERES: BAÑO 2
3.72	N/A	N/A	2	100%	7.44	VESTIER HOMBRE: DUCHA
4.35	N/A	N/A	2	100%	8.70	VESTIER HOMBRE: BAÑO
3.09	N/A	N/A	2	100%	6.18	RESIDUO ORDINARIO (PASILLO FRENTE A RECUPERACIÓN PARTOS)
3.17	N/A	N/A	2	100%	6.34	RESIDUO PELIGROSO (PASILLO FRENTE A RECUPERACIÓN PARTOS)
7.01	N/A	N/A	2	100%	14.02	RECEPCIÓN - CONTROL (COSTADO DE RACK)
1.61	N/A	N/A	2	100%	3.22	MURO EXTERIOR: DESCANSO-UCI URO
8.78	N/A	N/A	2	100%	17.56	DESCANSO: UCI URO
6.26	N/A	N/A	2	100%	12.52	FILTRO FAMILIARES URO
19.08	N/A	N/A	2	100%	38.16	CIRCULACIÓN: UCI URO A UCI NEO
6.2	N/A	N/A	2	100%	12.40	INGRESO UCI NEO (DESDE UCI URO)
9.4	N/A	N/A	2	100%	18.80	FILTRO VISITANTES: UCO NEO
15.11	N/A	N/A	2	100%	30.22	LACTARIO + BODEGA
4.76	N/A	N/A	2	100%	9.52	WC PMR (COSTADO DE RESIDUOS TEMPORALES)
10.05	N/A	N/A	2	100%	20.10	AMBIENTE TRABAJO ESTERIL
11.35	N/A	N/A	2	100%	22.70	EXTRACCIÓN
2.67	N/A	N/A	2	100%	5.34	RESIDUOS TEMPORALES
9.76	N/A	N/A	2	100%	19.52	CIRCULACIÓN ASEO: UCI NEO
5.92	N/A	N/A	2	100%	11.84	LAVADO DE INCUBADORAS
2.53	N/A	N/A	2	100%	5.06	ASEO - UCI NEO
45.52	N/A	N/A	2	100%	91.04	UCI NEO: INTENSIVOS
11.08	N/A	N/A	2	100%	22.16	CENTRAL ENFERMERIA: UCI INTENSIVOS
68.09	N/A	N/A	2	100%	136.18	UCI NEO: INTERMEDIOS
3.84	N/A	N/A	2	100%	7.68	CENTRAL ENFERMERIA: UCI NEO INTERMEDIOS
4.78	N/A	N/A	2	100%	9.56	T. LIMPIO: CENTRAL ENFERMERI INTERMEDIO
2.3	N/A	N/A	2	100%	4.60	ESTACIÓN SATELITE Y ARCHIVO
11.24	N/A	N/A	2	100%	22.48	PASILLO: HACIA DESCANSO UCI NEO
18.03	N/A	N/A	2	100%	36.06	DESCANSO: UCI NEO
4.83	N/A	N/A	2	100%	9.66	INSUMOS TERAPIA RESPIRATORIA
5.57	N/A	N/A	2	100%	11.14	T. SUCIO: UCI NEO
4.79	N/A	N/A	2	100%	9.58	WC (EN PASILLO HACIA DESCANSO UCI NEO)
8.23	N/A	N/A	2	100%	16.46	ESPACIO: POCETAS (HACIA DESCANSO) + MURO POSTERIOR DE CENTRAL ENFERMERIA DE INTENSIVOS
20.14	N/A	N/A	2	100%	40.28	CUARTO DE EQUIPOS
6.77	N/A	N/A	2	100%	13.54	LIMPIO: UCI NEO
6.66	N/A	N/A	2	100%	13.32	SUCIO: UCI NEO
8.54	N/A	N/A	2	100%	17.08	PASILLO: VESTIER PERSONAL ASISTENCIAL
2.67	N/A	N/A	2	100%	5.34	SUCIO: PASILLO VESTIER PERSONAL ASISTENCIAL
2.92	N/A	N/A	2	100%	5.84	LIMPIO: PASILLO VESTIER PERSONAL ASISTENCIAL
6.13	N/A	N/A	2	100%	12.26	INSUMOS TERAPIA RESPIRATORIA
4.88	N/A	N/A	2	100%	9.76	WC: MUJERES
6.31	N/A	N/A	2	100%	12.62	WC PMR: MUJERES
11.25	N/A	N/A	2	100%	22.50	COORDINACIÓN UCI NEO
11.57	N/A	N/A	2	100%	23.14	VESTIER ASISTENCIAL
5.83	N/A	N/A	2	100%	11.66	WC: VESTIER
24.14	N/A	N/A	2	100%	48.28	SALA ESPERA-HALL
4.05	N/A	N/A	2	100%	8.10	RACK
9.48	N/A	N/A	2	100%	18.96	PASILLO: HACIA WCH Y VESTIER AUTOCLAVE
4.51	N/A	N/A	2	100%	9.02	WC H (PASILLO HACIA VESTIER AUTOCLAVE)
4.05	N/A	N/A	2	100%	8.10	VESTIER AUTOCLAVE
9.81	N/A	N/A	2	100%	19.62	FILTRO AUTOCLAVE
11.93	N/A	N/A	2	100%	23.86	WC PMR HOMBRE + INGRESO WC
3.93	N/A	N/A	2	100%	7.86	ROPA SUCIA (EXTERIOR DE RECUPERACIÓN PARTO)
5.46	N/A	N/A	2	100%	10.92	T. SUCIO (FRENTE CENTRAL ENFERMERIA DE RECUPERACIÓN PARTOS)
41.22	N/A	N/A	2	100%	82.44	TRABAJO PARTO + CENTRAL DE ENFERMERIA
7.77	N/A	N/A	2	100%	15.54	WC: TRABAJO PARTO
6.86	N/A	N/A	2	100%	13.72	T. LIMPIO (FRENTE CENTRAL ENFERMERIA DE RECUPERACIÓN PARTOS)
5.59	N/A	N/A	2	100%	11.18	ROPA LIMPIA: CENTRAL ENFER. DE RECUPERACIÓN PARTO
6.9	N/A	N/A	2	100%	13.80	T. LIMPIO: CENTRAL ENFER. DE RECUPERACIÓN PARTO
5.47	N/A	N/A	2	100%	10.94	WC 1: RECUPERACIÓN PARTO
4.2	N/A	N/A	2	100%	8.40	WC 2: RECUPERACIÓN PARTO
3.78	N/A	N/A	2	100%	7.56	DEP. ROPA SUCIA: UCI ARO
5.64	N/A	N/A	2	100%	11.28	LIMPIO: UCI ARO
7.24	N/A	N/A	2	100%	14.48	WC: UARO AISLADO -06
6.79	N/A	N/A	2	100%	13.58	WC 1 (FRENTE UARO-07)
8.36	N/A	N/A	2	100%	16.72	WC 2 (FRENTE UARO-07)
5.34	N/A	N/A	2	100%	10.68	EQUIPOS: FRENTE UARO-09
3.24	N/A	N/A	2	100%	6.48	ASEO: FRENTE UARO-09
4.85	N/A	N/A	2	100%	9.70	T. SUCIO: CENTRAL DE ENFERMERIA FRENTE A UARO-08
		PISO 3				
17.72	N/A	N/A	2	100%	35.44	UCI PEDIATRICA 1
16.35	N/A	N/A	2	100%	32.70	UCI PEDIATRICA 3
17.55	N/A	N/A	2	100%	35.10	UCI PEDIATRICA 5
13.86	N/A	N/A	2	100%	27.72	UCI PEDIATRICA 7
16.96	N/A	N/A	2	100%	33.92	UCI PEDIATRICA 9
15.94	N/A	N/A	2	100%	31.88	UCI PEDIATRICA 11
13.43	N/A	N/A	2	100%	26.86	UCI PEDIATRICA 12
14.14	N/A	N/A	2	100%	28.28	UCI PEDIATRICA 10
15.77	N/A	N/A	2	100%	31.54	UCI PEDIATRICA 8
12.67	N/A	N/A	2	100%	25.34	UCI PEDIATRICA 6
15.61	N/A	N/A	2	100%	31.22	UCI PEDIATRICA 4
12.33	N/A	N/A	2	100%	24.66	UCI PEDIATRICA 2
16.77	N/A	N/A	2	100%	33.54	PASILLO A CUARTO DE EQUIPOS
8.47	N/A	N/A	2	100%	16.94	CUARTO DE EQUIPOS
8.68	N/A	N/A	2	100%	17.36	CUARTO ESTERIL DEPOSITO DE INSUMOS
		PISO 4				
16.31	N/A	N/A	2	100%	32.62	HABITACION 424
16.67	N/A	N/A	2	100%	33.34	HABITACION 425
16.07	N/A	N/A	2	100%	32.14	HABITACION 418
16.22	N/A	N/A	2	100%	32.44	HABITACION 416
31.13	N/A	N/A	2	100%	62.26	PASILLO CIRCULACIÓN NORTE
10.40	N/A	N/A	2	100%	20.80	CIRCULACIÓNA ACCESO
8.14	N/A	N/A	2	100%	16.28	PASILLO SALIDA DE EMERGENCIA
17.63	N/A	N/A	2	100%	35.26	HALL
12.71	N/A	N/A	2	100%	25.42	IAMI
18.72	N/A	N/A	2	100%	37.44	CENTRAL DE ENFERMERIA
25.46	N/A	N/A	2	100%	50.92	PASILLO CIRCULACIÓN RESTRINGIDA
11.42	N/A	N/A	2	100%	22.84	PROCEDIMEINTOS
10.13	N/A	N/A	2	100%	20.26	DESCANSO MEDICO
8.48	N/A	N/A	2	100%	16.96	WC HABITACION 401
16.01	N/A	N/A	2	100%	32.02	HABITACION 402
8.85	N/A	N/A	2	100%	17.70	WC HABITACION 402
16.55	N/A	N/A	2	100%	33.10	HABITACION 407
8.63	N/A	N/A	2	100%	17.26	WC HABITACION 407
21.49	N/A	N/A	2	100%	42.98	HABITACION 408
4.17	N/A	N/A	2	100%	8.34	WC HABITACION 408
16.34	N/A	N/A	2	100%	32.68	HABITACION 410
8.56	N/A	N/A	2	100%	17.12	WC HABITACION 410
4.68	N/A	N/A	2	100%	9.36	PROCEDIMEINTOS
4.34	N/A	N/A	2	100%	8.68	WC DESCANSO
16.16	N/A	N/A	2	100%	32.32	HABITACION 411
8.38	N/A	N/A	2	100%	16.76	WC HABITACION 411
24.10	N/A	N/A	2	100%	48.20	PUESTO DE TRABAJO BALCON NORTE
15.51	N/A	N/A	2	100%	31.02	PASILLO SUR DESDE HABITACION 411
8.22	N/A	N/A	2	100%	16.44	
8.27	N/A	N/A	2	100%	16.54	BALCON SUR

OBSERVACIONES:

TOTAL	**6,134.30**	**Metro lineal**
ACUMULADO ANTERIOR	**0.00**	**Metro lineal**
PRESENTE ACTA	**6,134.30**	**Metro lineal**

Elaboró contratista:	**Estefanía Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoria:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	NP 23	FAJA EN MURO UNA CARA DE E = 0.08 M., EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DE 8 MM.	CAP	10.00	ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD	Metro lineal	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico





Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
PISO 3						
2.44	NA	NA	10	100%	**24.40**	LUDOTECA
2.44	NA	NA	6	100%	**14.64**	LUDOTECA
2.44	NA	NA	3	100%	**7.32**	EXTRACION
2.44	NA	NA	2	100%	**4.88**	COORDINACION UCI PEDIATRICA
2.44	NA	NA	5	100%	**12.20**	TRABAJO SUCIO
2.44	NA	NA	2	100%	**4.88**	COORDINACION UCI
2.44	NA	NA	3	100%	**7.32**	UCI-P 2
2.44	NA	NA	2	100%	**4.88**	UCI-P 9
2.44	NA	NA	3	100%	**7.32**	UCI-P 10
2.44	NA	NA	5	100%	**12.20**	UCI-P 6
2.44	NA	NA	2	100%	**4.88**	UCI-P 7

OBSERVACIONES:

TOTAL	**104.92**	**Metro lineal**
ACUMULADO ANTERIOR	**0.00**	**Metro lineal**
PRESENTE ACTA	**104.92**	**Metro lineal**

Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	NP 27	FAJA PAÑETE LISO MUROS 1:4	CAP	10.00	ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD	Metro lineal	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico







Dimensiones L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%	Total (m)	Observaciones
SOTANO						
0.7			1	100%	0.70	ROPA SUCIA
2.1			2	100%	4.20	
0.7			1	100%	0.70	CUARTO ASEO
2.1			2	100%	4.20	
0.8			1	100%	0.80	BAÑO
2.1			2	100%	4.20	
1.55			1	100%	1.55	CIRCULACION ARCHIVO
2.1			2	100%	4.20	
PISO 1						
0.7			1	100%	0.70	VESTIER TAC
2.1			2	100%	4.20	
0.7			1	100%	0.70	OBSERVACION GINECOPSTETRICIA INTERNA
2.1			2	100%	4.20	
0.9			1	100%	0.90	BAÑO MIXTO SALA ESPERA
2.1			2	100%	4.20	
0.9			1	100%	0.90	BAÑO MOVILIDAD REDUCIDA SALA DE ESPERA
2.1			2	100%	4.20	
PISO 2						
0.8			1	100%	0.80	U,R,O INCAPACIDADES
2.1			2	100%	4.20	
0.8			1	100%	0.80	W.C
2.1			2	100%	4.20	
0.7			1	100%	0.70	TRABAJO SUCIO
2.1			2	100%	4.20	
0.7			1	100%	0.70	ASEO
2.1			2	100%	4.20	
0.7			1	100%	0.70	DEP ROPA SUCIA
2.1			2	100%	4.20	
0.7			1	100%	0.70	TRABAJO LIMPIO
2.1			2	100%	4.20	
0.7			1	100%	0.70	FILTRO ACCESO FAMILIARES U.R.O
2.1			2	100%	4.20	
0.7			1	100%	0.70	FILTRO ACCESO U.R.O
2.1			2	100%	4.20	
0.7			1	100%	0.70	RACK
2.1			2	100%	4.20	
0.8			1	100%	0.80	ACCESO BAÑO
2.1			2	100%	4.20	
1			1	100%	1.00	VESTIER PASIENTES
2.1			2	100%	4.20	
0.7			1	100%	0.70	ASEO
2.1			2	100%	4.20	
0.9			1	100%	0.90	W.C.H INCAPACIDADES
2.1			2	100%	4.20	
0.8			1	100%	0.80	DUCTO
2.1			2	100%	4.20	
0.8			1	100%	0.80	DESCANSO
2.1			2	100%	4.20	
0.7			1	100%	0.70	TRABAJO SUCIO
2.1			2	100%	4.20	
0.8			1	100%	0.80	BAÑO RECUPERACION SALA DE PARTOS
2.1			2	100%	4.20	
0.7			1	100%	0.70	TRABAJO LIMPIO
2.1			2	100%	4.20	
0.8			1	100%	0.80	BAÑO EN TRABAJO DE PARTOS
2.1			2	100%	4.20	
0.7			1	100%	0.70	ASEO
2.1			2	100%	4.20	
0.8			1	100%	0.80	AMBIENTE DE TRABAJO ESTERIL
2.1			2	100%	4.20	
0.7			1	100%	0.70	BODEGA
2.1			2	100%	4.20	
PISO 3						
1.2			1	100%	1.20	301 ENTRADA HABITACION
2.1			2	100%	4.20	
0.9			1	100%	0.90	301 BAÑO
2.1			2	100%	4.20	
1.2			1	100%	1.20	302 ENTRADA HABITACION
2.1			2	100%	4.20	
0.9			1	100%	0.90	302 BAÑO
2.1			2	100%	4.20	
1.2			1	100%	1.20	303 ENTRADA HABITACION
2.1			2	100%	4.20	
0.9			1	100%	0.90	303 BAÑO
2.1			2	100%	4.20	
1.2			1	100%	1.20	304 ENTRADA HABITACION
2.1			2	100%	4.20	
0.9			1	100%	0.90	304 BAÑO
2.1			2	100%	4.20	
1.2			1	100%	1.20	305 ENTRADA HABITACION
2.1			2	100%	4.20	
0.9			1	100%	0.90	305 BAÑO
2.1			2	100%	4.20	
1.2			1	100%	1.20	306 ENTRADA HABITACION
2.1			2	100%	4.20	
0.9			1	100%	0.90	306 BAÑO
2.1			2	100%	4.20	
1.2			1	100%	1.20	307 ENTRADA HABITACION
2.1			2	100%	4.20	
0.9			1	100%	0.90	307 BAÑO
2.1			2	100%	4.20	
1.2			1	100%	1.20	308 ENTRADA HABITACION
2.1			2	100%	4.20	
0.9			1	100%	0.90	308 BAÑO
2.1			2	100%	4.20	
1.2			1	100%	1.20	309 ENTRADA HABITACION
2.1			2	100%	4.20	
0.9			1	100%	0.90	309 BAÑO
2.1			2	100%	4.20	
1.2			1	100%	1.20	310 ENTRADA HABITACION
2.1,			2	100%	2.00	
0.9			1	100%	0.90	310 BAÑO









2.1			2	100%	4.20	310 BAÑO
1.2			1	100%	1.20	311 ENTRADA HABITACION
2.1			2	100%	4.20	
0.9			1	100%	0.90	311 BAÑO
2.1			2	100%	4.20	
1.2			1	100%	1.20	312 ENTRADA HABITACION
2.1			2	100%	4.20	
0.9			1	100%	0.90	312 BAÑO
2.1			2	100%	4.20	
1.2			1	100%	1.20	313 ENTRADA HABITACION
2.1			2	100%	4.20	
0.9			1	100%	0.90	313 BAÑO
2.1			2	100%	4.20	
1.2			1	100%	1.20	314 ENTRADA HABITACION
2.1			2	100%	4.20	
0.9			1	100%	0.90	314 BAÑO
2.1			2	100%	4.20	
1.2			1	100%	1.20	315 ENTRADA HABITACION
2.1			2	100%	4.20	
0.9			1	100%	0.90	315 BAÑO
2.1			2	100%	4.20	
1.2			1	100%	1.20	316 ENTRADA HABITACION
2.1			2	100%	4.20	
0.9			1	100%	0.90	316 BAÑO
2.1			2	100%	4.20	
1.2			1	100%	1.20	317 ENTRADA HABITACION
2.1			2	100%	4.20	
0.9			1	100%	0.90	317 BAÑO
2.1			2	100%	4.20	
1.2			1	100%	1.20	318 ENTRADA HABITACION
2.1			2	100%	4.20	
0.9			1	100%	0.90	318 BAÑO
2.1			2	100%	4.20	
1.2			1	100%	1.20	319 ENTRADA HABITACION
2.1			2	100%	4.20	
0.9			1	100%	0.90	319 BAÑO
2.1			2	100%	4.20	
1.2			1	100%	1.20	320 ENTRADA HABITACION
2.1			2	100%	4.20	
0.9			1	100%	0.90	320 BAÑO
2.1			2	100%	4.20	
1.2			1	100%	1.20	321 ENTRADA HABITACION
2.1			2	100%	4.20	
0.9			1	100%	0.90	321 BAÑO
2.1			2	100%	4.20	
1.2			1	100%	1.20	322 ENTRADA HABITACION
2.1			2	100%	4.20	
0.9			1	100%	0.90	322 BAÑO
2.1			2	100%	4.20	
1.2			1	100%	1.20	323 ENTRADA HABITACION
2.1			2	100%	4.20	
0.9			1	100%	0.90	323 BAÑO
2.1			2	100%	4.20	
1.2			1	100%	1.20	324 ENTRADA HABITACION
2.1			2	100%	4.20	
0.9			1	100%	0.90	324 BAÑO
2.1			2	100%	4.20	
1.2			1	100%	1.20	325 ENTRADA HABITACION
2.1			2	100%	4.20	
0.9			1	100%	0.90	325 BAÑO
2.1			2	100%	4.20	
0.7			1	100%	0.70	TRABAJO LIMPIO
2.1			2	100%	4.20	
0.7			1	100%	0.70	TRABAJO SUCIO
2.1			2	100%	4.20	
0.7			1	100%	0.70	ROPA LIMPIA
2.1			2	100%	4.20	
1.4			1	100%	1.40	PROCEDIMIENTO
2.1			2	100%	4.20	
0.7			1	100%	0.70	ASEO
2.1			2	100%	4.20	
0.8			1	100%	0.80	DECANSO Y VESTIER
2.1			2	100%	4.20	
0.7			1	100%	0.70	ROPA SUCIA
2.1			2	100%	4.20	
0.7			1	100%	0.70	DEP RESIDUOS
2.1			2	100%	4.20	
0.7			1	100%	0.70	DEP RESIDUOS PELIGROSOS
2.1			2	100%	4.20	
0.8			1	100%	0.80	WC . M
2.1			2	100%	4.20	
0.8			1	100%	0.80	WC . H
2.1			2	100%	4.20	
0.8			1	100%	0.80	DUCTO
2.1			2	100%	4.20	
4.64			1	100%	4.64	PROCEDIMIENTOS: TOMAS E INTERRUPTORES
1.01			1	100%	1.01	CENTRAL ENFERMERIA: ALARMAS
6.2			1	100%	6.20	CENTRAL ENFERMERIA: TOMAS
3.07			1	100%	3.07	CENTRAL ENFERMERIA: TOMAS
5.7			1	100%	5.70	HAB 11: TOMAS E INTERRUPTORES
1.14			1	100%	1.14	HAB 11: RED DE GAS MEDICINAL
1.83			1	100%	1.83	HAB 11: TOMAS E INTERRUPTORES
0.79			1	100%	0.79	HAB 11: SALIDA TV
1.28			1	100%	1.28	HAB 12: RED DE GAS MEDICINAL
0.77			1	100%	0.77	HAB 12: SALIDA TV
5.34			1	100%	5.34	HAB 12: TOMAS E INTERRUPTORES
0.95			2	100%	1.90	PASILLO: CAJA DE GAS MEDICINAL DE HAB 13
0.91			2	100%	1.82	PASILLO: CAJA DE GAS MEDICINAL DE HAB 11
1.26			1	100%	1.26	HAB 13: RED GAS MEDICINAL
3.81			1	100%	3.81	HAB 13: TOMAS E INTERRUPTORES
1.62			1	100%	1.62	HAB 13: SALIDA TV
1.29			1	100%	1.29	HAB 14: RED GAS MEDICINAL
5.73			1	100%	5.73	HAB 14: TOMAS E INTERRUPTORES
0.74			1	100%	0.74	HAB 14: SALIDA TV
8.22			1	100%	8.22	HAB 15: TOMAS E INTERRUPTORES
1.22			1	100%	1.22	HAB 15: TOMAS E INTERRUPTORES
1.26			1	100%	1.26	HAB 15: RED GAS MEDICINAL
7.21			1	100%	7.21	HAB 15: TOMAS E INTERRUPTORES
0.75			1	100%	0.75	HAB 15: SALIDA TV
2.63			1	100%	2.63	HAB 1: SALIDA TV
2.63			1	100%	2.63	HAB 1: RED DE GAS MEDICINAL
11.04			1	100%	11.04	HAB 1: TOMAS E INTERRUPTORES
2.44			1	100%	2.44	HAB 2: SALIDA TV
2.05			1	100%	2.05	HAB 2: TOMAS E INTERRUPTORES
1.29			1	100%	1.29	PASILLO: ALARMA DE DETECCIÓN HAB 1
1.32			1	100%	1.32	HAB 3: RED DE GAS MEDICINAL







0.67			1	100%	**0.67**	HAB 3: SALIDA TV
7.58			1	100%	**7.58**	HAB 3: TOMAS E INTERRUPTORES
0.67			1	100%	**0.67**	HAB 4: SALIDA TV
2.17			1	100%	**2.17**	HAB 4: TOMAS E INTERRUPTORES
1.51			1	100%	**1.51**	HAB 4: TOMAS E INTERRUPTORES
0.7			1	100%	**0.70**	HAB 5: SALIDA TV
1.29			1	100%	**1.29**	HAB 5: RED DE GAS MEDICINAL
6.39			1	100%	**6.39**	HAB 5: TOMAS E INTERRUPTORES
0.96			1	100%	**0.96**	HAB 6: SALIDA TV
2.14			1	100%	**2.14**	HAB 6: TOMAS E INTERRUPTORES
1.93			1	100%	**1.93**	HAB 6: TOMAS E INTERRUPTORES
1.29			1	100%	**1.29**	HAB 7: RED GAS MEDICINAL
7.73			1	100%	**7.73**	HAB 7: TOMAS E INTERRUPTORES
0.8			1	100%	**0.80**	HAB 8: SALIDA TV
1.54			1	100%	**1.54**	HAB 8: INTERRUPTOR
0.91			2	100%	**1.82**	PASILLO: CAJA GAS MEDICINAL HAB 7
0.79			1	100%	**0.79**	HAB 9: SALIDA TV
1.26			1	100%	**1.26**	HAB 9: RED DE GAS MEDICINAL
2.93			1	100%	**2.93**	HAB 9: TOMAS
0.78			1	100%	**0.78**	HAB 10: SALIDA TV
1.33			1	100%	**1.33**	HAB 10: RED DE GAS MEDICINAL
2.78			1	100%	**2.78**	HAB 10: TOMAS E INTERRUPTORES
3.42			1	100%	**3.42**	HAB 10: TOMAS E INTERRUPTORES
1.13			1	100%	**1.13**	PROCEDIMIENTOS: RED DE GAS MEDICINAL
		PISO 4				
N/A	1.2	2.1	1	100%	**5.40**	401 ENTRADA HABITACION
N/A	0.9	2.1	1	100%	**5.10**	401 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	**5.40**	402 ENTRADA HABITACION
N/A	0.9	2.1	1	100%	**5.10**	402 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	**5.40**	403 ENTRADA HABITACION
N/A	0.9	2.1	1	100%	**5.10**	403 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	**5.40**	404 ENTRADA HABITACION
N/A	0.9	2.1	1	100%	**5.10**	404 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	**5.40**	405 ENTRADA HABITACION
N/A	0.9	2.1	1	100%	**5.10**	405 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	**5.40**	406 ENTRADA HABITACION
N/A	0.9	2.1	1	100%	**5.10**	406 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	**5.40**	407 ENTRADA HABITACION
N/A	0.9	2.1	1	100%	**5.10**	407 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	**5.40**	408 ENTRADA HABITACION
N/A	0.9	2.1	1	100%	**5.10**	408 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	**5.40**	409 ENTRADA HABITACION
N/A	0.9	2.1	1	100%	**5.10**	409 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	**5.40**	410 ENTRADA HABITACION
N/A	0.9	2.1	1	100%	**5.10**	410 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	**5.40**	411 ENTRADA HABITACION
N/A	0.9	2.1	1	100%	**5.10**	411 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	**5.40**	412 ENTRADA HABITACION
N/A	0.9	2.1	1	100%	**5.10**	412 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	**5.40**	413 ENTRADA HABITACION
N/A	0.9	2.1	1	100%	**5.10**	413 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	**5.40**	414 ENTRADA HABITACION
N/A	0.9	2.1	1	100%	**5.10**	414 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	**5.40**	415 ENTRADA HABITACION
N/A	0.9	2.1	1	100%	**5.10**	415 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	**5.40**	416 ENTRADA HABITACION
N/A	0.9	2.1	1	100%	**5.10**	416 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	**5.40**	417 ENTRADA HABITACION
N/A	0.9	2.1	1	100%	**5.10**	417 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	**5.40**	418 ENTRADA HABITACION
N/A	0.9	2.1	1	100%	**5.10**	418 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	**5.40**	419 ENTRADA HABITACION
N/A	0.9	2.1	1	100%	**5.10**	419 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	**5.40**	420 ENTRADA HABITACION
N/A	0.9	2.1	1	100%	**5.10**	420 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	**5.40**	421 ENTRADA HABITACION
N/A	0.9	2.1	1	100%	**5.10**	421 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	**5.40**	422 ENTRADA HABITACION
N/A	0.9	2.1	1	100%	**5.10**	422 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	**5.40**	423 ENTRADA HABITACION
N/A	0.9	2.1	1	100%	**5.10**	423 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	**5.40**	424 ENTRADA HABITACION
N/A	0.9	2.1	1	100%	**5.10**	424 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	**5.40**	425 ENTRADA HABITACION
N/A	0.9	2.1	1	100%	**5.10**	425 BAÑO
N/A	0.8	2.1	1	100%	**5.00**	TRABAJO LIMPIO
N/A	0.8	2.1	1	100%	**5.00**	TRABAJO SUCIO
N/A	0.8	2.1	1	100%	**5.00**	ROPA LIMPIA
N/A	1.4	2.1	1	100%	**5.60**	PROCEDIMIENTO
N/A	0.7	2.1	1	100%	**4.90**	ASEO
N/A	0.8	2.1	1	100%	**5.00**	DECANSO Y VESTIER
N/A	0.7	2.1	1	100%	**4.90**	ROPA SUCIA
N/A	0.7	2.1	1	100%	**4.90**	DEP RESIDUOS
N/A	0.7	2.1	1	100%	**4.90**	DEP RESIDUOS PELIGROSOS
N/A	0.8	2.1	1	100%	**5.00**	WC . M
N/A	0.8	2.1	1	100%	**5.00**	WC . H
N/A	0.8	2.1	1	100%	**5.00**	DUCTO

OBSERVACIONES:

TOTAL	**938.16**	**Metro lineal**
ACUMULADO ANTERIOR	**623.45**	**Metro lineal**
PRESENTE ACTA	**314.71**	**Metro lineal**

Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	NP 28	DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS.	CAP	10.00	ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD	Metro cuadrado		UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico









Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
SOTANO						
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	ROPA SUCIA
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	CUARTO ASEO
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	BAÑO
N/A	1.55	2.1	1	100%	3.255	CIRCULACION ARCHIVO
PISO 1						
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	VESTIER TAC
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	OBSERVACION GINECOPSTETRICIA INTERNA
N/A	0.9	2.1	1	100%	1.89	BAÑO MIXTO SALA ESPERA
N/A	0.9	2.1	1	100%	1.89	BAÑO MOVILIDAD REDUCIDA SALA DE ESPERA
PISO 2						
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	U.R.O INCAPACIDADES
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	W.C
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	TRABAJO SUCIO
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	ASEO
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	DEP ROPA SUCIA
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	TRABAJO LIMPIO
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	FILTRO ACCESO FAMILIARES U.R.O
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	FILTRO ACCESO U.R.O
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	RACK
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	ACCESO BAÑO
N/A	1	2.1	1	100%	2.1	VESTIER PACIENTES
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	ASEO
N/A	0.9	2.1	1	100%	1.89	W.C.H INCAPACIDADES
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	DUCTO
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	DESCANSO
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	TRABAJO SUCIO
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	BAÑO RECUPERACION SALA DE PARTOS
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	TRABAJO LIMPIO
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	BAÑO EN TRABAJO DE PARTOS
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	ASEO
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	AMBIENTE DE TRABAJO ESTERIL
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	BODEGA
PISO 3						
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	301 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	301 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	302 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	302 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	303 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	303 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	304 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	304 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	305 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	305 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	306 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	306 BAÑO
N/A	1.2	2.1	4	100%	10.08	307 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	307 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	308 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	308 BAÑO
N/A	1.2	2.1	4	100%	10.08	309 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	309 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	310 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	310 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	311 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	311 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	312 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	312 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	313 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	313 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	314 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	314 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	315 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	315 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	316 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	316 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	317 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	317 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	318 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	318 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	319 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	319 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	320 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	320 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	321 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	321 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	322 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	322 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	323 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	323 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	324 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	324 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	325 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	325 BAÑO
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	TRABAJO LIMPIO
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	TRABAJO SUCIO
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	ROPA LIMPIA
N/A	1.4	2.1	1	100%	2.94	PROCEDIMIENTO
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	ASEO
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	DECANSO Y VESTIER
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	ROPA SUCIA
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	DEP RESIDUOS
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	DEP RESIDUOS PELIGROSOS
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	WC . M
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	WC . H
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	DUCTO
PISO 4						
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	401 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	401 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	402 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	402 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	403 ENTRADA HABITACION





N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	403 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	404 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	404 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	405 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	405 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	406 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	406 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	407 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	407 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	408 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	408 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	409 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	409 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	410 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	410 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	411 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	411 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	412 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	412 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	413 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	413 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	414 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	414 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	415 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	415 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	416 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	416 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	417 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	417 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	418 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	418 BAÑO
N/A	1.2	8	1	100%	9.6	419 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	419 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	420 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	420 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	421 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	421 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	422 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	422 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	423 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	423 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	424 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	424 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	425 ENTRADA HABITACION
N/A	0.9	2.1	1	100%	1.89	425 BAÑO
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	TRABAJO LIMPIO
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	TRABAJO SUCIO
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	ROPA LIMPIA
N/A	1.4	2.1	1	100%	2.94	PROCEDIMIENTO
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	ASEO
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	DECANSO Y VESTIER
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	ROPA SUCIA
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	DEP RESIDUOS
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	DEP RESIDUOS PELIGROSOS
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	WC . M
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	WC . H
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	DUCTO

OBSERVACIONES:

TOTAL	**322.61**	**Metro cuadrado**
ACUMULADO ANTERIOR	**240.77**	**Metro cuadrado**
PRESENTE ACTA	**81.84**	**Metro cuadrado**

Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	NP 29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO L. DÍAM: 2". INCLUYE ACCESORIOS.	CAP	10.00	ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD	Metro lineal	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico













Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
ENTREPISOS						
VACIO						
6.7	N/A	N/A	1	**100%**	**6.7**	Red de distribucion central de vacio de 2 piso a piso 4 - POR BUITRON
PISO 1						
VACIO						
7.35	N/A	N/A	1	**100%**	**7.35**	LAVADO DE PACIENTES A ACCESO PASILLO URGENCIAS: RED PRENCIPAL DE TANQUE
14.15	N/A	N/A	1	**100%**	**14.15**	PASILLO FRENTE A CONSULTORIO N°5 A CAJA C. DE PASILLO HACIA FARMACIA: PRINCIPAL
5.5	N/A	N/A	1	**100%**	**5.5**	PRINCIPAL PASILLO URG - SUBE POR BUITRÓN DE PISO 1 A 2 FRENTE A CONSULTORIO N°5
PISO 2						
VACIO						
4.87	N/A	N/A	1	**100%**	**4.87**	PRINCIPAL ENTRE CAJA 5G DE QUIROFANO 3 A 2
6.76	N/A	N/A	1	**100%**	**6.76**	PRINCIPAL ENTRE CAJA 5G DE QUIROFANO 2 A 1
5.31	N/A	N/A	1	**100%**	**5.31**	PRINCIPAL FRENTE A QUIROFANO A A PRINCIPAL PASILLO TRABAJO DE PARTO
19.6	N/A	N/A	1	**100%**	**19.6**	PRINCIPAL PASILLO TRABAJO DE PARTO
8.92	N/A	N/A	1	**100%**	**8.92**	PRINCIPAL: DE RESIDUOS ORDINARIOS A CAJA 3G DE UCI UARO
4.05	N/A	N/A	1	**100%**	**4.05**	PASILLO DE UCI UARO A UCI NEO
4.02	N/A	N/A	1	**100%**	**4.02**	
2.36	N/A	N/A	1	**100%**	**2.36**	ENTRADA A UCI-NEO INTENSIVOS DESDE UCI UARO
2	N/A	N/A	1	**100%**	**2**	PRINCIPAL DE PASILLO RECUPERACIÓN PARTOS A BUITRON DETRÁS DE CUARTO ASEO DE RECUPERACIÓN PARTOS

OBSERVACIONES:

TOTAL	**91.59**	**Metro lineal**
ACUMULADO ANTERIOR	**81.73**	**Metro lineal**
PRESENTE ACTA	**9.86**	**Metro lineal**

Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	NP 31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE CORTE TIPO BOLA 4 TORNILLOS EN BRONCE DIAM 2"	CAP	10.00	ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico







Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
PISO 4						
N/A	N/A	N/A	1	**100%**	**1.00**	CIRCULACIÓN DE HALL A HOSPITALIZACIÓN
PISO 2						
N/A	N/A	N/A	1	**100%**	**1.00**	PASILLO RECUPERACIÓN (VACIO)

OBSERVACIONES:

TOTAL	**2.00**	**Unidad**
ACUMULADO ANTERIOR	**1.00**	**Unidad**
PRESENTE ACTA	**1.00**	**Unidad**

Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	NP 35	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE Y DIMENSIONES SEGUN DISEÑO. INCLUYE: SOPORTERIA (TIPO MÉNSULA, CUELGA, CORREA, VARILLA, O CUALQUIER OTRO REQUERIDO), ELEMENTOS DE SUJECIÓN, ANCLAJES, SELLANTE, ESQUINEROS, TORNILLERÍA Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	CAP	10.00	ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD	Kilogramo	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico












Dimensiones							Total (KG)	Elemento	Observaciones
L (m)	A (pulgadas)	h (pulgadas)	Cantidad	No de pestañas	Calibre	peso x m2 (kg)			
PISO 1									
SISTEMA DE SUMINISTRO (1)									
1.13	22	12	10	2	24	4.69	98.83	DUCTO	
0.7	22	12	1	2	24	4.69	6.40	AJUSTE	
1.13	22	12	3	2	24	4.69	29.65	DUCTO	Sobre equipos, sala de yesos, descanso internos, hall principal y sala de espera
0.21	22	12	1	2	24	4.69	2.43	SEMI CODO	
0.68	22	12	3	2	24	4.69	18.71	CODOS	
0.52	22	12	1	2	24	4.69	4.94	AJUSTE	
1.13	22	12	16	2	24	4.69	158.12	DUCTO	
0.52	22	12	1	2	24	4.69	4.94	AJUSTE	
0.86	12	22	1	2	24	4.69	7.70	CURBA	
0.74	12	22	1	2	24	4.69	6.72	DUCTO	Circulación
0.7	12	22	1	2	24	4.69	6.40	CODOS	
1.13	12	22	5	2	24	4.69	49.41	DUCTO	
0.8	12	22	1	2	24	4.69	7.21	DUCTO	
0.13	11.5	7	1	2	24	4.69	0.97	ZAPATO	
0.07	9	7	1	2	24	4.69	0.61	ZAPATO	
1.13	9	7	1	2	24	4.69	4.65	DUCTO	
0.3	9	7	1	2	24	4.69	1.49	DUCTO	
0	9	7	1	2	24	4.69	0.40	TAPA	
0.13	11	5	1	2	24	4.69	0.84	ZAPATO	
0.07	8	5	1	2	24	4.69	0.50	ZAPATO	
0.9	8	5	1	2	24	4.69	3.07	DUCTO	
0	8	5	1	2	24	4.69	0.30	TAPA	
0.15	11	5	1	2	24	4.69	0.91	ZAPATO	
0.37	8	5	1	2	24	4.69	1.42	ZAPATO	
1.13	8	5	1	2	24	4.69	3.78	DUCTO	
0	8	5	1	2	24	4.69	0.30	TAPA	
0.52	21	12	1	2	24	4.69	4.80	REDUCCION	
1.13	20	12	4	2	24	4.69	37.21	DUCTO	
0	20	12	1	2	24	4.69	1.11	TAPA	Farmacia
0.12	11.5	9	1	2	24	4.69	1.03	ZAPATO	
0.08	9	9	1	2	24	4.69	0.73	ZAPATO	
0.4	9	9	1	2	24	4.69	2.10	DUCTO	
0.3	9	9	1	2	24	4.69	1.67	REDUCCION	
0.2	6	9	1	2	24	4.69	1.04	DUCTO	
1.13	6	9	2	2	24	4.69	8.72	DUCTO	
0.45	6	9	1	2	24	4.69	1.93	DUCTO	
0.42	6	9	1	2	24	4.69	1.82	CODO	
0	6	9	1	2	24	4.69	0.36	TAPA	
0.2	11.5	6	1	2	24	4.69	1.21	ZAPATO	
1.13	6	9	1	2	24	4.69	4.36	DUCTO	
0	6	9	1	2	24	4.69	0.36	TAPA	
0.2	23	10	1	2	24	4.69	2.28	ZAPATO	
1.13	20	10	1	2	24	4.69	8.72	DUCTO	
0.52	19	10	1	2	24	4.69	4.21	REDUCCION	
1.13	18	10	2	2	24	4.69	16.28	DUCTO	
0.4	17	10	1	2	24	4.69	3.15	REDUCCION	
1.13	16	10	1	2	24	4.69	7.56	DUCTO	
0.4	8.5	13	1	2	24	4.69	2.51	REDUCCION	
1.13	7	10	1	2	24	4.69	4.94	DUCTO	
0.13	11.5	5	2	2	24	4.69	1.73	ZAPATO	
0.07	9	5	2	2	24	4.69	1.07	ZAPATO	
0.8	9	5	2	2	24	4.69	5.94	DUCTO	
0.13	11.5	5	1	2	24	4.69	0.86	ZAPATO	
0.07	9	5	1	2	24	4.69	0.53	ZAPATO	
1.13	5	9	1	2	24	4.69	4.07	DUCTO	
0.6	5	9	1	2	24	4.69	2.30	DUCTO	
0	5	9	1	2	24	4.69	0.32	TAPA	
0	10	7	1	2	24	4.69	0.43	TAPA	
0.2	16.5	10	1	2	24	4.69	1.83	ZAPATO	
0.3	10	14	1	2	24	4.69	2.23	DUCTO	
1.13	10	14	1	2	24	4.69	6.98	DUCTO	
0.3	9	12	1	2	24	4.69	1.95	REDUCCION	Laboratorio
1.13	8	10	2	2	24	4.69	10.46	DUCTO	
0.52	8	9	1	2	24	4.69	2.47	REDUCCION	
1.13	8	8	2	2	24	4.69	9.30	DUCTO	
0.52	8	8	1	2	24	4.69	2.33	DUCTO	
0.4	6.5	8	1	2	24	4.69	1.69	REDUCCION	
1.13	8	5	4	2	24	4.69	15.11	DUCTO	
0.41	8	5	1	2	24	4.69	1.55	CODO	
0	8	5	1	2	24	4.69	0.30	TAPA	
0.13	10.5	5	2	2	24	4.69	1.62	ZAPATO	
0.07	8	5	2	2	24	4.69	0.99	ZAPATO	
1.13	8	5	2	2	24	4.69	7.56	DUCTO	
0.75	8	5	2	2	24	4.69	5.20	DUCTO	
0	8	5	2	2	24	4.69	0.60	TAPA	
0.12	10.5	5	1	2	24	4.69	0.78	ZAPATO	
0.52	8	5	1	2	24	4.69	1.89	ZAPATO	
0	8	5	1	2	24	4.69	0.30	TAPA	
0.12	11.5	7	7	2	24	4.69	6.48	ZAPATO	
0.08	9	7	7	2	24	4.69	4.54	ZAPATO	
1.13	9	7	7	2	24	4.69	32.55	DUCTO	
0.3	9	7	7	2	24	4.69	10.41	DUCTO (AJUSTE)	
0	9	7	7	2	24	4.69	2.80	TAPA	
0.12	10.5	5	7	2	24	4.69	5.43	ZAPATO	
0.08	8	5	7	2	24	4.69	3.69	ZAPATO	FARMACIA
0.9	8	5	7	2	24	4.69	21.46	DUCTO	
0	8	5	7	2	24	4.69	2.09	TAPA	
0.15	10.5	4	7	2	24	4.69	5.80	ZAPATO	
0.38	8	4	7	2	24	4.69	9.41	DUCTO	
1.13	8	4	7	2	24	4.69	24.42	DUCTO	
0	8	4	7	2	24	4.69	1.84	TAPA	
SISTEMA DE SUMINISTRO (2)									
1.13	20	12	10	2	24	4.69	93.01	DUCTO	
0.7	20	12	1	2	24	4.69	6.02	AJUSTE	
0.21	20	12	2	2	24	4.69	4.57	SEMI CODO	
1.13	20	12	1	2	24	4.69	9.30	DUCTO	
0.23	20	12	1	2	24	4.69	2.44	AJUSTE	
0.72	20	12	1	2	24	4.69	6.18	AJUSTE	
1.13	20	12	3	2	24	4.69	27.90	DUCTO	
0.52	18.5	12	1	2	24	4.69	4.43	REDUCION	Sobre sala ERA, Sala de Yesos, Hall y Sala de espera
1.13	17	12	3	2	24	4.69	25.29	DUCTO	
0.78	17	12	1	2	24	4.69	6.01	AJUSTE	
0.4	15	12	1	2	24	4.69	3.15	REDUCION	
1.13	13	12	3	2	24	4.69	21.80	DUCTO	
0.4	13	12	1	2	24	4.69	2.92	AJUSTE	
0.61	13	12	1	2	24	4.69	4.17	CODO	
1.13	13	12	1	2	24	4.69	7.27	DUCTO	
0.3	11	12.5	1	2	24	4.69	2.18	REDUCION	
0.13	5	6	1	2	24	4.69	0.58	ZAPATO	
0.07	12	6	1	2	24	4.69	0.69		
1.13	12	6	1	2	24	4.69	5.23	DUCTO	
0	12	6	1	2	24	4.69	0.45	TAPA	
0.13	14.5	5	1	2	24	4.69	1.02	ZAPATO	
0.07	12	5	1	2	12	4.69	0.65		
1.13	12	5	1	2	24	4.69	4.94	DUCTO	
0.2	12	5	1	2	24	4.69	1.17	DUCTO	
0	12	5	1	2	24	4.69	0.40	TAPA	Hall central
0.13	14.5	5	1	2	24	4.69	1.02	ZAPATO	
0.07	12	5	1	2	24	4.69	0.65		
1.13	12	5	1	2	24	4.69	4.94	DUCTO	
0	12	5	1	2	24	4.69	0.40	TAPA	
0.4	11.5	9	1	2	24	4.69	2.39	REDUCCION	
1.13	8	9	2	2	24	4.69	9.88	DUCTO	
0	8	9	1	2	24	4.69	0.44	TAPA	
0.36	10	4	2	2	24	4.69	3.00	DUCTO	BAÑO SALA ESPERA
0.52	10	4	2	2	24	4.69	4.07	DUCTO	
0	10	4	4	2	24	4.69	1.24	TAPA	
0.12	10	4	1	2	24	4.69	0.70	ZAPATO	DESCANSO ASISTENCIAL
0.4	8	4	1	2	24	4.69	1.40	ZAPATO	
1.13	8	4	3	2	24	4.69	10.46	DUCTO	
0.3	7	4	1	2	24	4.69	1.02	REDUCCIÓN	
1.13	6	4	1	2	24	4.69	2.91	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4.69	0.22	TAPA	
0.12	12.5	6	1	2	24	4.69	0.93	ZAPATO	
0.08	10	6	1	2	24	4.69	0.65	ZAPATO	
1.13	10	6	3	2	24	4.69	13.95	DUCTO	
0.13	10.5	4	1	2	24	4.69	0.76	ZAPATO	
0.4	8	4	1	2	24	4.69	1.40	ZAPATO	
0	8	4	1	2	24	4.69	0.26	TAPA	
0.4	10	7	1	2	24	4.69	1.98	REDUCCIÓN	
0.52	8	10	1	2	24	4.69	2.62	DUCTO	CONSULTORIO 4 Y 5
0.52	9.5	7	1	2	24	4.69	2.40	REDUCCIÓN	
0.64	6	9	1	2	24	4.69	2.61	DUCTO	
1.13	6	9	2	2	24	4.69	8.72	DUCTO	
0	6	9	1	2	24	4.69	0.36	TAPA	
0.15	11	4	1	2	24	4.69	0.86	ZAPATO	
0.4	8	4	1	2	24	4.69	1.40	ZAPATO	
0	8	4	1	2	24	4.69	0.26	TAPA	
0.15	8	4	1	2	24	4.69	0.69	ZAPATO	
0.25	6	4	1	2	24	4.69	0.81	ZAPATO	
0	6	4	1	2	24	4.69	0.22	TAPA	
0.85	8	6	1	2	24	4.69	3.14	DUCTO	
0.4	8	6	1	2	24	4.69	1.63	CODO	CONSULTORIO 4 Y 6
1.13	8	6	2	2	24	4.69	8.14	DUCTO	
0.25	8	6	1	2	24	4.69	1.13	DUCTO	
	8	6	1	2	24	4.69	0.33	DESVIO	
1.13	8	6	2	2	24	4.69	8.14	DUCTO	
0	8	6	1	2	24	4.69	0.33	TAPA	
0.2	11.5	5	2	2	24	4.69	2.28	ZAPATO	
1.13	9	5	2	2	24	4.69	8.14	DUCTO	SALA ESPERA
0.94	9	5	2	2	24	4.69	6.87	DUCTO	
0	9	5	2	2	24	4.69	0.65	TAPA	
0.15	11.5	6	1	2	24	4.69	1.00	ZAPATO	
0.05	9	6	1	2	24	4.69	0.50	ZAPATO	
1.13	9	6	1	2	24	4.69	4.36	DUCTO	
0	9	6	1	2	24	4.69	0.36	TAPA	
0.2	9	9	11	1	24	4.69	11.56	CUELLO	
0.14	10.5	5	2	2	24	4.69	1.70	ZAPATO	





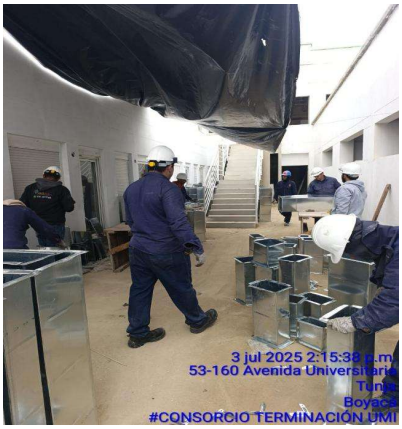







0.06	8	5	1	2	24	4.69	0.46	ZAPATO	
SISTEMA DE SUMINISTRO (3)									
1.13	22	12	2	2	24	4.69	19.77	DUCTO	
0.52	20.5	11	1	2	24	4.69	4.58	REDUCION	
1.13	19	10	9	2	24	4.69	75.86	DUCTO	Sobre consultorio 2 y Monitoreo ginecopstetricia.
0.4	16.5	9	1	2	24	4.69	2.98	REDUCION	
1.13	14	8	1	2	24	4.69	6.39	DUCTO	
0	14	8	1	2	24	4.69	0.61	TAPA	
0.13	12	6	1	2	24	4.69	0.94	ZAPATO	
0.07	9	6	1	2	24	4.69	0.57		
1.13	9	6	3	2	24	4.69	13.08	DUCTO	
0.2	9	6	1	2	24	4.69	1.04	DUCTO	
0	9	6	1	2	24	4.69	0.36	TAPA	
0.13	12	6	1	2	24	4.69	0.94	ZAPATO	Consultorios
0.07	9	6	1	2	24	4.69	0.57		
1.13	9	6	1	2	24	4.69	4.36	DUCTO	
0.9	9	6	1	2	24	4.69	3.54	DUCTO	
0	9	6	1	2	24	4.69	0.36	TAPA	
1.13	12	12	1	2	24	4.69	6.98	DUCTO	
1.13	14	8	2	2	24	4.69	12.79	DUCTO	Monitoreo ginecopstetricia
0.3	11.5	8	1	2	24	4.69	1.81	REDUCCION	
1.13	8	9	1	2	8	4.69	4.94	DUCTO	
0.3	6.5	9	1	2	24	4.69	1.44	REDUCCION	
1.13	9	5	1	2	24	4.69	4.07	DUCTO	Facturación
1	9	5	1	2	24	4.69	3.64	TAPA	
1.13	9	5	2	2	24	4.69	8.14	DUCTO	
0.1	9	5	1	2	24	4.69	0.63	DUCTO	
0	9	5	1	2	24	4.69	0.32	TAPA	
SISTEMA DE SUMINISTRO (4)									
0	12	6	1	2	24	4.69	0.45	TAPA	
1.13	12	6	2	2	24	4.69	10.46	DUCTO	
1	12	6	1	2	24	4.69	4.67	DUCTO	
0.5	12	6	1	2	24	4.69	2.53	CODO	
0.3	8	12	1	2	24	4.69	1.86	REDUCION	
1.13	10	12	2	2	24	4.69	12.79	DUCTO	
0.72	10	12	1	2	24	4.69	4.25	DUCTO	Sobre reanimación, acceso a urgencias, sala de espera adultos, auditorio, cafeteria y Hall..
0.5	10	12	1	2	24	4.69	3.09	CODO	
0.3	11	14	1	2	24	4.69	2.32	REDUCION	
1.13	16	12	3	2	24	4.69	24.42	DUCTO	
0.52	18	12	1	2	24	4.69	4.36	REDUCION	
1.13	21	12	33	2	24	4.69	316.54	DUCTO	
0.35	21	12	2	2	24	4.69	6.92	SEMI CODO	
0.52	21	12	1	2	24	4.69	4.80	DUCTO	
0.66	21	12	3	2	24	4.69	17.69	CODO	
0.25	21	12	1	2	24	4.69	2.67	AJUSTE	
1.3	21	12	1	2	24	4.69	10.93	DUCTO	
0.12	14.5	6	2	2	24	4.69	2.05	ZAPATO	
0.08	12	6	2	2	24	4.69	1.46		
0.74	12	6	1	2	24	4.69	3.56	DUCTO	CAFETERIA
0.72	12	6	1	2	24	4.69	3.47	DUCTO	
1.13	12	6	1	2	24	4.69	5.23	DUCTO	
0	12	6	1	2	24	4.69	0.45	TAPA	
SISTEMA DE SUMINISTRO (5)									
0.6	18	12	1	2	24	4.69	4.93	CODO	
1.13	18	12	15	2	24	4.69	130.80	DUCTO	
0.52	18	11	1	2	24	4.69	4.21	REDUCION	
1.13	18	10	2	2	24	4.69	16.28	DUCTO	
0.44	18	10	1	2	24	4.69	3.54	DUCTO	
0.52	15	10	1	2	24	4.69	3.63	REDUCION	
1.13	12	1	2	2	24	4.69	7.56	DUCTO	
0.52	12	7.5	1	2	24	4.69	2.83	REDUCION	
1.13	12	5	5	2	24	4.69	24.71	DUCTO	
0.5	12	5	1	2	24	4.69	2.39	CODO	
0.72	12	5	1	2	24	4.69	3.28	AJUSTE	
1.13	18	12	3	2	24	4.69	26.16	DUCTO	
0.1	18	12	1	2	24	4.69	1.36	DUCTO	
0.65	18	12	1	2	24	4.69	5.29	CODO	Sobre reanimación, acceso a urgencias, sala de espera adultos, auditorio y cafeteria.
0.52	19.5	12	1	2	24	4.69	4.58	REDUCCION	
1.13	21	12	3	2	24	4.69	28.78	DUCTO	
0.12	12	6	1	2	24	4.69	0.90	ZAPATO	
0.08	9	6	1	2	24	4.69	0.61		
0.6	9	6	1	2	24	4.69	2.47	DUCTO	
0	6	9	1	2	24	4.69	0.36	TAPA	
0.13	11.5	6	3	2	24	4.69	2.75	ZAPATO	
0.07	9	6	3	2	24	4.69	1.72		
1.13	9	6	3	2	24	4.69	13.08	DUTO	
0.93	9	6	3	2	24	4.69	10.94	CODO	
0.52	9	6	3	2	24	4.69	6.54	DUCTO	
0	9	6	3	2	24	4.69	1.09	TAPA	
0.13	12	6	3	2	24	4.69	2.83	ZAPATO	
0.07	9	6	3	2	24	4.69	1.72		
0.52	9	6	3	2	24	4.69	6.54	DUCTO	
0	9	6	3	2	24	4.69	1.09	TAPA	
SISTEMA DE SUMINISTRO (6)									
1.13	22	12	1	2	24	4.69	9.88	DUCTO	
0.3	22	12	1	2	24	4.69	3.16	CODO	
0.17	22	12	1	2	24	4.69	2.11	AJUSTE	
1.13	22	12	2	2	24	4.69	19.77	DUCTO	
1.13	22	12	6	2	24	4.69	59.30	DUCTO	
0.52	22	12	1	2	24	4.69	4.94	REDUCION	Sobre lavado depacientes, acceso a urgencias y sala de spera adultos
0.4	22	12	1	2	24	4.69	3.97	DUCTO	
1.13	22	11	2	2	24	4.69	19.18	DUCTO	
0.4	15	10	1	2	24	4.69	2.92	REDUCION	
1.13	15	10	2	2	24	4.69	14.53	DUCTO	
0.56	10	10	1	2	24	4.69	3.10	DUCTO	
0	10	10	1	2	24	4.69	0.55	TAPA	
0.12	17	11	1	2	24	4.69	1.40	TRAPECIO DEL ZAPATO	
0.8	22	11	1	2	24	4.69	7.00	ZAPATO PARTE RECTA	
0.15	12	6	3	2	24	4.69	3.09	ZAPATO	
0.28	9	6	3	2	24	4.69	3.97		
0.2	9	6	1	2	24	4.69	1.04	DUCTO	Sala de espera urgencias
0.52	9	6	3	2	24	4.69	6.54	DUCTO	
0	9	6	3	2	24	4.69	1.09	TAPA	
1.13	12	12	10	2	24	4.69	69.76	ducto	
0.15	10.5	4	1	2	24	4.69	0.83	ZAPATO	
0.05	8	4	1	2	24	4.69	0.40	ZAPATO	
0.52	8	4	1	2	24	4.69	1.74	DUCTO	
1.13	8	4	1	2	24	4.69	3.49	DUCTO	
0.38	8	8	1	1	24	4.69	1.62	CUELLO	CONSULTORIO TRIAGE 1
0	8	4	1	2	24	4.69	0.26	TAPA	
0.52	15.5	8	1	2	24	4.69	3.42	REDUCION	
1.13	9	4	2	2	24	4.69	7.56	DUCTO	
0.36	9	4	1	2	24	4.69	1.39	CODO	
0	9	4	1	2	24	4.69	0.29	TAPA	
SISTEMA DE SUMINISTRO (7)									
1.13	18	12	3	2	24	4.69	26.16	DUCTO	
0.13	11.5	6	1	2	24	4.69	0.92	ZAPATO	
0.07	6	9	1	2	24	4.69	0.57		
1.13	6	9	1	2	24	4.69	4.36	DUCTO	Reanimación
0	6	9	1	2	24	4.69	0.36	TAPA	
0.52	16.5	12	1	2	24	4.69	4.14	REDUCCION	
1.13	15	12	1	2	24	4.69	7.85	DUCTO	
0.2	15	12	1	2	24	4.69	1.87	ZAPATO	
0.38	15	12	1	2	24	4.69	3.02		Circulación
1.13	15	12	2	2	24	4.69	15.70	DUCTO	
0.32	14	12	1	2	24	4.69	2.54	REDUCCION	
0.46	4	12	1	2	24	4.69	2.10	DUCTO	
0.45	13	12	1	2	24	4.69	3.22	CODO	Consultorios
1.13	13	12	1	2	24	4.69	7.27	DUCTO	
0.3	13	11	1	2	24	4.69	2.23	REDUCCION	
1.13	13	10	2	2	24	4.69	13.37	DUCTO	
0.13	12	6	1	2	24	4.69	0.94	ZAPATO	
0.07	9	6	1	2	24	4.69	0.57		
0.42	6	9	1	2	24	4.69	1.82	CODO	
0.52	6	9	1	2	24	4.69	2.18	DUCTO	
0	6	9	1	2	24	4.69	0.36	TAPA	
0	13	10	1	2	24	4.69	0.68	TAPA	Admisiones
0.12	16.5	8	1	2	24	4.69	1.23	ZAPATO	
0.08	8	14	1	2	24	4.69	0.89		
1.13	8	14	2	2	24	4.69	12.79	DUCTO	
0.8	8	14	1	2	24	4.69	4.66	DUCTO	
0.3	13	8	1	2	13	4.69	1.95	REDUCCION	
1.13	12	8	6	2	24	4.69	34.88	DUCTO	
0.52	12	8	1	2	24	4.69	2.91	DUCTO	
0.29	7	11.5	1	2	24	4.69	1.67	REDUCCIÓN	Baños y descanso asistencial
0.25	9	6	1	2	24	4.69	1.22	DUCTO	
1.13	9	6	1	2	24	4.69	4.36	DUCTO	
0	9	6	1	2	24	4.69	0.36	TAPA	
0	9	6	1	2	24	4.69	0.36	TAPA	
0.52	9	6	1	2	24	4.69	2.18	DUCTO	
0.15	12	5	1	2	24	4.69	0.97	ZAPATO (T)	
0.05	9	5	1	2	24	4.69	0.47	ZAPATO (R)	
0.42	9	5	1	2	24	4.69	1.70	CODO	
0.52	9	5	1	2	24	4.69	2.03	DUCTO	
0	9	5	1	2	24	4.69	0.32	TAPA	
0.15	11	4	1	2	24	4.69	0.86	ZAPATO (T)	
0.05	8	4	1	2	24	4.69	0.40	ZAPATO (R)	
0.52	8	4	1	2	24	4.69	1.74	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4.69	0.26	TAPA	
0.15	12	6	1	2	24	4.69	1.03	ZAPATO (T)	
0.2	9	6	1	2	24	4.69	1.04	ZAPATO (R)	
1.13	9	6	1	2	24	4.69	4.36	DUCTO	
0.58	9	6	1	2	24	4.69	2.39	DUCTO	
0	9	6	1	2	24	4.69	0.36	TAPA	
0.13	12	5	1	2	24	4.69	0.89	ZAPATO	
0.07	9	6	1	2	24	4.69	0.57	ZAPATO	
0.52	9	6	1	2	24	4.69	2.18	DUCTO	
1.13	9	6	2	2	24	4.69	8.72	DUCTO	
0.42	9	6	1	2	24	4.69	1.82	DUCTO	
0	9	6	1	2	24	4.69	0.36	TAPA	
0.25	9	6	1	2	24	4.69	1.22	ZAPATO	
0.15	12	6	1	2	24	4.69	1.03	ZAPATO	
SISTEMA DE SUMINISTRO (8)									
1.13	12	22	3	2	24	4.69	29.65	DUCTO	














0.52	12	20	1	2	24	4.69	4.65	REDUCCION	
1.13	18	12	3	2	24	4.69	26.16	DUCTO	
0.45	18	12	1	2	24	4.69	3.86	DUCTO	
0.52	17	12	1	2	24	4.69	4.21	REDUCCION	
0.6	16	12	1	2	24	4.69	4.60	DUCTO	
0.55	16	12	1	2	24	4.69	4.27	CODO	
1.13	16	12	1	2	24	4.69	8.14	DUCTO	
0.6	16	12	1	2	24	4.69	4.60	DUCTO	
0.52	16	11	1	2	24	4.69	3.92	REDUCCION	
1.13	16	11	1	2	24	4.69	7.85	DUCTO	
0.13	14.5	8	1	2	24	4.69	1.18	ZAPATO	
0.07	12	8	1	2	24	4.69	0.76		
1.13	12	8	1	2	24	4.69	5.81	DUCTO	
0.7	12	8	1	2	24	4.69	3.76	DUCTO	
0.4	10.5	7	1	2	24	4.69	2.04	REDUCCION	
1.13	9	6	2	2	24	4.69	8.72	DUCTO	
0	9	6	1	2	24	4.69	0.36	TAPA	
0.13	11.5	6	1	2	24	4.69	0.92	ZAPATO	Observacion pediatrica
0.4	9	6	1	2	24	4.69	1.75		
0	9	6	1	2	24	4.69	0.36	TAPA	
0.13	14.5	6	1	2	24	4.69	1.07	ZAPATO	
0.07	12	6	1	2	24	4.69	0.69		
0.8	12	6	1	2	24	4.69	3.82	DUCTO	
0	12	6	1	2	24	4.69	0.45	TAPA	
0.13	14.5	10	1	2	24	4.69	1.28	ZAPATO	
0.07	10	12	1	2	24	4.69	0.84		
1.13	10	12	4	2	24	4.69	25.58	DUCTO	
0.52	9	12	1	2	24	4.69	3.05	REDUCCION	
1.13	8	12	4	2	24	4.69	23.25	DUCTO	
0.4	8	12	1	2	24	4.69	2.33	CODO	
0.35	7	10.5	1	2	24	4.69	1.83	REDUCCION	
0.7	6	9	1	2	24	4.69	2.82	DUCTO	
0.4	6	9	1	2	24	4.69	1.75	CODO	
1.13	6	9	1	2	24	4.69	4.36	DUCTO	
0.5	6	9	1	2	24	4.69	2.11	DUCTO	
0	6	9	1	2	24	4.69	0.36	TAPA	
0.52	14.5	9	1	2	24	4.69	3.42	REDUCCIÓN	
1.13	12	8	2	2	24	4.69	11.63	DUCTO	
0.45	12	8	1	2	24	4.69	2.57	DCODA	
0	12	8	1	2	24	4.69	0.54	TAPA	
0.2	14.5	5	1	2	24	4.69	1.35	DUCTO	SALA EDA
1.13	12	5	2	2	24	4.69	9.88	DUCTO	
0	12	5	1	2	24	4.69	0.40	TAPA	
0.15	14	5	2	2	24	4.69	2.17	ZAPATO	
0.05	14	5	2	2	24	4.69	1.27	ZAPATO	OBSERVACIÓN GINECOSTETRICIA
1.13	12	5	2	2	24	4.69	9.88	DUCTO	
0	12	5	2	2	24	4.69	0.80	TAPA	
0.12	16.5	8	1	2	24	4.69	1.23	ZAPATO	
0.17	14	8	1	2	24	4.69	1.36	ZAPATO	
1.13	9	6	1	2	24	4.69	4.36	DUCTO	FACTURACIÓN
0.9	9	6	1	2	24	4.69	3.54	DUCTO	
0	9	6	1	2	24	4.69	0.36	TAPA	
SISTEMA DE SUMINISTRO (9)									
1.13	12	21	3	2	24	4.69	28.78	DUCTO	
0.52	19	12	1	2	24	4.69	4.51	REDUCCION	
1.13	17	12	11	2	24	4.69	92.72	DUCTO	
0.52	16	12	1	2	24	4.69	4.07	REDUCCION	
1.13	15	12	5	2	24	4.69	39.24	DUCTO	
0.4	10	12	1	2	24	4.69	2.57	REDUCCION	
1.13	8	9	1	2	24	4.69	4.94	DUCTO	
0.6	8	9	1	2	24	4.69	2.79	DUCTO	
0.4	8	9	1	2	24	4.69	1.98	CODO	Circuación farmacia
1.13	8	9	2	2	24	4.69	9.88	DUCTO	
0.3	6	9	1	2	24	4.69	1.39	REDUCCION	
0.98	6	9	1	2	24	4.69	3.82	DUCTO	
0.4	6	9	1	2	24	4.69	1.75	CODO	
0.4	6	9	1	1	24	4.69	1.59	DUCTO	
0	6	9	1	2	24	4.69	0.36	TAPA	
0.15	10.5	8	1	2	24	4.69	1.06	ZAPATO	
1.13	8	8	2	2	24	4.69	9.30	DUCTO	
0.6	8	8	1	2	24	4.69	2.63	DUCTO	Coordinacion imagenologia
0.4	8	6.5	1	2	24	4.69	1.69	REDUCCION	
1	8	5	1	2	24	4.69	3.38	DUCTO	
0	8	5	1	2	24	4.69	0.30	TAPA	
0.4	8	5	1	2	24	4.69	1.52	CODO	
1.13	8	5	1	2	24	4.69	3.78	DUCTO	
0.65	8	5	1	2	24	4.69	2.29	DUCTO	
0.13	10.5	5	1	2	24	4.69	0.81	ZAPATO	
0.07	8	5	1	2	24	4.69	0.50	ZAPATO	
1.13	8	5	1	2	24	4.69	3.78	DUCTO	
0	8	5	1	2	24	4.69	0.30	TAPA	
0	9	5	1	2	24	4.69	0.32	TAPA	
0.85	9	5	1	2	24	4.69	3.14	DUCTO	
0.4	9	5	1	2	24	4.69	1.63	CODO	
0.45	9	5	1	2	24	4.69	1.80	DUCTO	
1.13	9	5	2	2	24	4.69	8.14	DUCTO	
0.4	10	6.5	1	2	24	4.69	1.93	REDUCCION	
1.13	8	11	3	2	24	4.69	16.57	DUCTO	
0.4	8	11	1	2	24	4.69	2.22	DUCTO	
0.52	8	11	1	2	24	4.69	2.76	DUCTO	
0.13	8	13	1	2	24	4.69	1.10	ZAPATO	
0.07	8	10	1	2	24	4.69	0.69	ZAPATO	
0.13	11.5	5	1	2	24	4.69	0.86	ZAPATO	
0.07	5	9	1	2	24	4.69	0.53	ZAPATO	
0.8	5	9	1	2	24	4.69	2.97	DUCTO	
0	5	9	1	2	24	4.69	0.32	TAPA	
0.15	4	10.5	1	2	24	4.69	0.83	ZAPATO	
0.4	4	8	1	2	24	4.69	1.40	ZAPATO	
0	4	8	1	2	24	4.69	0.26	TAPA	
0.13	5	14.5	1	2	24	4.69	1.02	ZAPATO	Procedimientos
0.07	5	12	1	2	24	4.69	0.65	ZAPATO	
1.13	5	12	2	2	24	4.69	9.88	DUCTO	
0	5	12	1	2	24	4.69	0.40	TAPA	
0.13	6	11.5	1	2	24	4.69	0.92	ZAPATO	
0.07	6	9	1	2	24	4.69	0.57	ZAPATO	
1.13	6	9	3	2	24	4.69	13.08	DUCTO	Observacion pediatrica
0.4	6	9	1	2	24	4.69	1.75	CODO	
0.52	6	9	1	2	24	4.69	2.18	DUCTO	
0	6	9	1	2	24	4.69	0.36	TAPA	
1.13	8	5	1	2	24	4.69	3.78	DUCTO	
0	8	5	1	2	24	4.69	0.30	TAPA	
0.13	10.5	8	1	2	24	4.69	0.97	ZAPATO	
0.05	8	8	1	2	24	4.69	0.53	ZAPATO	
0.58	8	8	1	2	24	4.69	2.55	DUCTO	
1.13	8	8	2	2	24	4.69	9.30	DUCTO	
0.4	8	6.5	1	2	24	4.69	1.69	REDUCCIÓN	
1.13	8	5	2	2	24	4.69	7.56	DUCTO	
0.6	8	5	1	2	24	4.69	2.14	DUCTO	
0	8	5	1	2	24	4.69	0.30	TAPA	
0.4	8	5		2	24	4.69	0.00	CODO	
SISTEMA DE SUMINISTRO (10)									
1.13	22	12	3	2	24	4.69	29.65	DUCTO	Observacion pediatrica
0.52	20.5	12	1	2	24	4.69	4.72	REDUCCION	
1.13	19	12	3	2	24	4.69	27.03	DUCTO	Circulación
0.82	19	12	1	2	24	4.69	6.72	DUCTO	
0.52	13	11	1	2	24	4.69	3.49	REDUCCION	Coordinación y circulación de urgencias
0.52	10	8	1	2	24	4.69	2.62	DUCTO	
1.13	10	8	1	2	24	4.69	5.23	DUCTO	
0	10	8	1	2	24	4.69	0.47	TAPA	
0.15	11.5	4	1	2	24	4.69	0.89	ZAPATO	
0.05	9	4	1	2	24	4.69	0.43	ZAPATO	
0.65	9	4	1	2	24	4.69	2.29	DUCTO	
0	9	4	1	2	24	4.69	0.29	TAPA	
0.13	11.5	6	1	2	24	4.69	0.92	ZAPATO	
0.07	9	6	1	2	24	4.69	0.57	ZAPATO	
1.13	9	6	2	2	24	4.69	8.72	DUCTO	
0.63	9	6	1	2	24	4.69	2.57	DUCTO	
0	9	6	1	2	24	4.69	0.36	TAPA	
0.2	14	5	1	2	24	4.69	1.31	ZAPATO	
1.13	12	5	2	2	24	4.69	9.88	DUCTO	
0	12	5	1	2	24	4.69	0.40	TAPA	
0.2	15.5	9	1	2	24	4.69	1.69	ZAPATO	
1.13	13	9	4	2	24	4.69	25.58	DUCTO	
0.7	13	9	1	2	24	4.69	4.14	DUCTO	
0.13	11.5	6	1	2	24	4.69	0.92	ZAPATO	Urgencias,, circulacion, sala de vesos. y TAC
0.07	9	6	1	2	24	4.69	0.57	ZAPATO	
1.13	9	6	5	2	24	4.69	21.80	DUCTO	
0.52	9	6	1	2	24	4.69	2.18	DUCTO	
0.15	11.5	9	1	2	24	4.69	1.17	ZAPATO	
0.05	9	9	1	2	24	4.69	0.60	ZAPATO	
1.13	9	9	1	2	24	4.69	5.23	DUCTO	
0.9	9	9	1	2	24	4.69	4.25	DUCTO	
0.52	6.5	9	1	2	24	4.69	2.25	REDUCCION	
1.13	4	9	2	2	24	4.69	7.56	DUCTO	
0.52	4	9	1	2	24	4.69	1.89	DUCTO	
0.2	16	8	1	2	24	4.69	1.66	ZAPATO	
1.13	13	8	2	2	24	4.69	12.21	DUCTO	
0.3	11.5	8	1	2	24	4.69	1.81	REDUCCION	
0.4	10	8	1	2	24	4.69	2.10	DUCTO	
0.13	11.5	6	1	2	24	4.69	0.92	ZAPATO	
0.07	9	6	1	2	24	4.69	0.57	ZAPATO	
0.55	10	8	1	2	24	4.69	2.74	CODO	
0.4	10	8	1	2	24	4.69	2.10	DUCTO	
1.13	10	8	3	2	24	4.69	15.70	DUCTO	
0.52	9.5	6.5	1	2	24	4.69	2.33	REDUCCION	
1.13	9	5	3	2	24	4.69	12.21	DUCTO	
0.4	9	6	1	2	24	4.69	1.75	CODO	
0.7	9	6	1	2	24	4.69	2.82	DUCTO	
0	9	6	2	2	24	4.69	0.72	TAPA	
0.13	9	6	1	2	24	4.69	0.79	DUCTO	
SISTEMA DE RETORNO (1)									
0.52	12.5	10	1	2	24	4.69	3.27	REDUCCION	Laboratoio,farmacia, sala de espera contigua a hall y cafeteria.
1.13	13	10	5	2	24	4.69	33.43	DUCTO	
0.4	13	10	1	2	24	4.69	2.69	AJUSTE	
0.52	13	10	1	2	24	4.69	3.34	CODO	





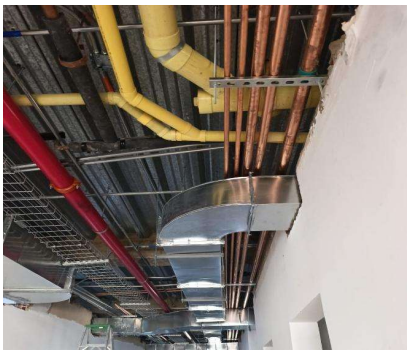






0.33	13.5	10	1	2	24	4.69	2.35	REDUCCION	
1.13	14	10	2	2	24	4.69	13.95	DUCTO	
1.13	14	10	5	2	24	4.69	34.88	DUCTO	
0.8	14	10	1	2	24	4.69	5.09	DUCTO	
0.52	14	10	1	2	24	4.69	3.49	CODO	
0.25	14	10	1	2	24	4.69	1.94	DUCTO	
0.2	16.5	10	1	2	24	4.69	1.83	ZAPATO	
1.13	16	10	14	2	24	4.69	105.80	DUCTO	
0.52	16	10	2	2	24	4.69	7.56	CODO	
0.52	16	10	3	2	24	4.69	11.34	DESVIACIÓN	
0.6	16	10	2	2	24	4.69	8.55	CODO	SALA ESPERA
0.6	16	10	1	2	24	4.69	4.27	DUCTO	
0.14	16	10	1	2	24	4.69	1.42	DUCTO	
0.52	12	7	1	2	24	4.69	2.76	REDUCCIÓN	BAÑO PMR
1.13	8	4	1	2	24	4.69	3.49	DUCTO	
0.52	8	4	1	2	24	4.69	1.74	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4.69	0.26	TAPA	
0.48	18	8	1	2	24	4.69	3.53	REDUCCIÓN	FARMACIA
1.13	22	6	2	2	24	4.69	16.28	DUCTO	
0.7	18	8	1	2	24	4.69	4.89	REDUCCIÓN	
0	8	4	1	2	24	4.69	0.26	TAPA	
0.78	8	4	1	2	24	4.69	2.49	DUCTO	LABORATORÍO
1.13	8	4	1	2	24	4.69	3.49	DUCTO	
0.4	8	4	1	2	24	4.69	1.40	DUCTO	
0.15	10.5	4	1	2	24	4.69	0.83	ZAPATO	
0.12	8.5	6	1	2	24	4.69	0.73	ZAPATO	TOMA DE MUESTRAS
0.08	6	6	1	2	24	4.69	0.49	ZAPATO	
1.13	6	6	1	2	24	4.69	3.49	DUCTO	
0.4	6	6	1	2	24	4.69	1.40	DUCTO	
1.13	6	6	2	2	24	4.69	6.98	DUCTO	
0.15	10.5	4	1	2	24	4.69	0.83	ZAPATO	
0.38	8	4	1	2	24	4.69	1.34	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4.69	0.26	TAPA	
0.15	10.5	4	1	2	24	4.69	0.83	ZAPATO	
0.4	8	4	1	2	24	4.69	1.40	DUCTO	
0.44	8	4	1	2	24	4.69	1.52	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4.69	0.26	TAPA	ECÓGRAFO
1.13	13	10	1	2	24	4.69	6.69	DUCTO	
0.52	12.5	10	1	2	24	4.69	3.27	REDUCCIÓN	
1	12	10	1	2	24	4.69	5.71	DUCTO	
1.13	12	10	2	2	24	4.69	12.79	DUCTO	
0.52	12	9	1	2	24	4.69	3.05	REDUCCIÓN	
0.4	12	9	1	2	24	4.69	2.45	DUCTO	
0.47	12	8	2	2	24	4.69	5.34	CODO	
0.72	12	8	1	2	24	4.69	3.86	DUCTO	
0.77	12	8	1	2	24	4.69	4.10	DUCTO	
0.81	12	8	1	2	24	4.69	4.29	DUCTO	
0.3	12	8	1	2	24	4.69	1.86	DUCTO	PROCEDIMIENTOS
1.13	12	8	7	2	24	4.69	40.69	DUCTO	
0.52	11	7.5	1	2	24	4.69	2.69	REDUCCIÓN	
0.05	10	7	2	2	24	4.69	1.13	DUCTO	
1.13	10	7	1	2	24	4.69	4.94	DUCTO	
0.35	10	6	1	2	24	4.69	1.68	REDUCCIÓN	
1	10	5	1	2	24	4.69	3.90	DUCTO	
0.45	10	5	1	2	24	4.69	1.93	CODO	
1.13	10	5	4	2	24	4.69	17.44	DUCTO	OBSERVACIÓN GINESCOTETRICA
0.05	10	5	1	2	24	4.69	0.50	DUCTO	
0.52	8	5.5	1	2	24	4.69	1.96	REDUCCIÓN	
1.13	6	4	4	2	24	4.69	11.63	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4.69	0.22	TAPA	
0.2	10.5	5	2	2	24	4.69	2.14	ZAPATO	BAÑO OBSERVACIÓN PEDIATRICA
1.13	8	5	1	2	24	4.69	3.78	DUCTO	
0.52	8	5	1	2	24	4.69	1.89	DUCTO	
0	8	5	2	2	24	4.69	0.60	TAPA	
0.4	7	4.5	1	2	24	4.69	1.34	REDUCCIÓN	
0.35	6	4	1	2	24	4.69	1.05	DUCTO	ROPA SUCIA
0	6	4	1	2	24	4.69	0.22	TAPA	
0.14	8.5		2	2	24	4.69	0.93	ZAPATO	
0.4	6	4	2	2	24	4.69	2.33	DUCTO	
0	6	4	2	2	24	4.69	0.44	TAPA	
0.2	14.5	4	1	2	24	4.69	1.28	ZAPATO	
1.13	12	5	2	2	24	4.69	9.88	DUCTO	
0	12	5	1	2	24	4.69	0.40	TAPA	
0.15	8.5	5	1	2	24	4.69	0.77	ZAPATA	PROCEDIMIENTOS
0.4	6	4	1	2	24	4.69	1.17	DUCTO	
1.13	6	4	1	2	24	4.69	2.91	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4.69	0.22	TAPA	
0.12	11.5	6	1	2	24	4.69	0.88	ZAPATATO	
0.41	8	6	1	2	24	4.69	1.67	DUCTO	
1.13	8	6	1	2	24	4.69	4.07	DUCTO	
0	8	6	1	2	24	4.69	0.33	TAPA	
0.21	10.5	4	2	2	24	4.69	2.07	ZAPATO	
0.4	8	4	2	2	24	4.69	2.80	DUCTO	
1.05	8	4	1	2	24	4.69	3.26	DUCTO	
1.13	8	4	1	2	24	4.69	3.49	DUCTO	
0.8	8	4	1	2	24	4.69	2.54	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4.69	0.26	TAPA	ECÓGRAFO
0.8	8	4	1	2	24	4.69	2.54	DUCTO	
0.15	8.5	4	1	2	24	4.69	0.71	ZAPATO	
0.4	6	4	1	2	24	4.69	1.17	DUCTO	
0.86	6	4	1	2	24	4.69	2.26	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4.69	0.22	TAPA	
			SISTEMA DE RETORNO (2)						
1.13	19	10	5	2	24	4.69	42.15	DUCTO	COCINETA
0.3	19	10	1	2	24	4.69	2.69	DUCTO	
0.65	19	10	2	2	24	4.69	10.23	CODO	
0.42	19	10	1	2	24	4.69	3.52	DUCTO	
1.13	19	10	2	2	24	4.69	16.86	DUCTO	CIRCULACIÓN A SALA ESPERA
0.4	19	9	1	2	24	4.69	3.27	REDUCCIÓN	
1.13	19	8	1	2	24	4.69	7.85	DUCTO	
0.82	19	8	1	2	24	4.69	5.85	DUCTO	
0.52	19	8	1	2	24	4.69	3.92	DUCTO	
0.8	19	8	1	2	24	4.69	5.73	DESVIO	
0.4	17.5	8	1	2	24	4.69	2.98	REDUCCIÓN	
1.13	16	8	1	2	24	4.69	6.98	DUCTO	
0.52	16	8	1	2	24	4.69	3.49	DUCTO	
0	16	8	1	2	24	4.69	0.68	TAPA	
0.12	16.5	8	1	2	24	4.69	1.23	ZAPATO	BAÑO
0.21	14	8	1	2	24	4.69	1.57	ZAPATO	
1.13	14	8	2	2	24	4.69	12.79	DUCTO	
1.05	14	8	1	2	24	4.69	5.98	DUCTO	
1.13	14	8	5	2	24	4.69	31.97	DUCTO	
0.85	14	8	1	2	24	4.69	4.93	DUCTO	ATECCIÓN URGENCIAS
1.13	14	8	1	2	24	4.69	6.39	DUCTO	
0.55	14	8	1	2	24	4.69	3.35	DUCTO	
0.55	14	8	1	2	24	4.69	3.35	CODO	CIRCULACIÓN URGENCIAS
1.13	14	8	2	2	24	4.69	12.79	DUCTO	
0.9	14	8	1	2	24	4.69	5.19	DUCTO	
1.13	14	8	2	2	24	4.69	12.79	DUCTO	
0.4	13	8	1	2	24	4.69	2.45	REDUCCIÓN	
1.13	12	8	4	2	24	4.69	23.25	DUCTO	
0.4	11	8	1	2	24	4.69	2.22	REDUCCIÓN	
1.13	10	8	2	2	24	4.69	10.46	DUCTO	
0.35	12	7	2	2	24	4.69	3.98	REDUCCIÓN	
1.22	14	6	1	2	24	4.69	6.24	DUCTO	
1.07	8	6	1	2	24	4.69	3.87	DUCTO	
1.13	8	6	6	2	24	4.69	24.42	DUCTO	
0.2	8	5	1	2	24	4.69	0.90	REDUCCIÓN	
1.13	8	4	1	2	24	4.69	3.49	DUCTO	
0.2	8	4	1	2	24	4.69	0.83	DUCTO	
0.142	8	4	1	2	24	4.69	0.66	CODO	
1.07	8	4	1	2	24	4.69	3.32	DUCTO	
1.13	8	4	1	2	24	4.69	3.49	DUCTO	
0.7	8	4	1	2	24	4.69	2.26	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4.69	0.26	TAPA	
1.6	10	4	1	2	24	4.69	5.64	ZAPATO	
0.4	8	4	1	2	24	4.69	1.40	ZAPATO	
0.4	8	4	1	2	24	4.69	1.40	DUCTO	OBSERVACIÓN PEDIATRICA
0.15	8.5	4	1	2	24	4.69	0.71	ZAPATO	
0.05	6	4	1	2	24	4.69	0.33	ZAPATO	
0.43	6	4	1	2	24	4.69	1.24	DUCTO	
1.13	6	4	2	2	24	4.69	5.81	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4.69	0.22	TAPA	
0.15	8.5	4	1	2	24	4.69	0.71	ZAPATO	SALA EDA
0.5	6	4	1	2	24	4.69	1.41	ZAPATO	
0.75	6	4	1	2	24	4.69	2.00	DUCTO	
1.13	6	4	3	2	24	4.69	8.72	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4.69	0.22	TAPA	
1.13	6	4	3	2	24	4.69	8.72	DUCTO	DIGITACIÓN
0	6	4	1	2	24	4.69	0.22	TAPA	
0.15	8.5	4	1	2	24	4.69	0.71	ZAPATO	SALA ERA
0.05	6	4	1	2	24	4.69	0.33	ZAPATO	
0.75	6	4	1	2	24	4.69	2.00	DUCTO	
0.52	6	4	1	2	24	4.69	1.45	DUCTO	
1.13	6	4	1	2	24	4.69	2.91	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4.69	0.22	TAPA	
0.15	10.5	4	1	2	24	4.69	0.83	ZAPATO	CONSULTORÍO # 2
0.05	8	4	1	2	24	4.69	0.40	ZAPATO	
0.85	8	4	1	2	24	4.69	2.69	DUCTO	
1.13	8	4	1	2	24	4.69	3.49	DUCTO	
0.45	8	4	1	2	24	4.69	1.54	CODO	
0.4	8	4	1	2	24	4.69	1.40	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4.69	0.26	TAPA	
0.15	10.5	4	1	2	24	4.69	0.83	ZAPATO	CONSULTORÍO # 1
0.05	8	4	1	2	24	4.69	0.40	ZAPATO	
0.9	8	4	1	2	24	4.69	2.83	DUCTO	
1.13	8	4	1	2	24	4.69	3.49	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4.69	0.26	TAPA	
12	10.5	4	1	2	24	4.69	41.77	ZAPATO	BAÑOS CAFETERIA
0.08	8	4	1	2	24	4.69	0.49	ZAPATO	
0.25	8	4	1	2	24	4.69	0.97	CODO	
0.86	8	4	1	2	24	4.69	2.72	DUCTO	
1.13	8	4	4	2	24	4.69	13.95	DUCTO	
0.52	7	4	1	2	24	4.69	1.60	REDUCCIÓN	
1.13	6	4	2	2	24	4.69	5.81	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4.69	0.22	TAPA	
0.08	10	6	1	2	24	4.69	0.65	ZAPATO	BAÑO SALA ESPERA
0.12	8	6	1	2	24	4.69	0.70	ZAPATO	
1.13	8	6	1	2	24	4.69	4.07	DUCTO	








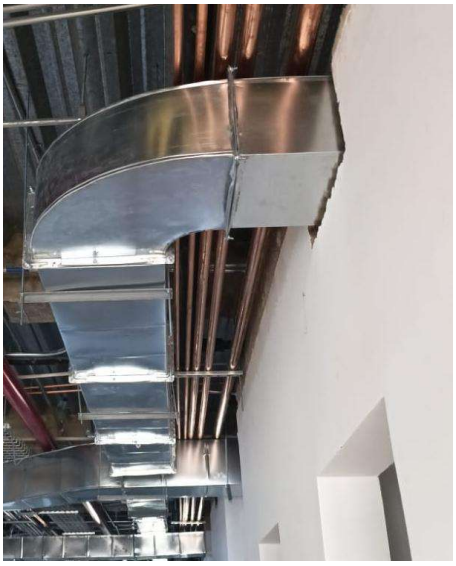

1	8	6	1	2	24	4.69	3.64	DUCTO	
1.4	8	6	1	2	24	4.69	4.97	DUCTO	
1.13	8	6	1	2	24	4.69	4.07	DUCTO	
0.3	8	5	1	2	24	4.69	1.21	REDUCCIÓN	
0.8	8	4	1	2	24	4.69	2.54	DUCTO	
0	8	4	4	2	24	4.69	1.05	TAPA	
0.1	12	4	4	2	24	4.69	2.90	ZAPATO	
0.1	10	4	4	2	24	4.69	2.54	ZAPATO	
0.52	14	10	1	2	24	4.69	3.49	DESVIO	
0.84	14	10	1	2	24	4.69	5.32	DESVIO	
0.52	14	10	1	2	24	4.69	3.49	DUCTO	PASILLO URG
0.52	9	7	1	2	24	4.69	2.33	REDUCCIÓN	
SISTEMA DE EXTRACCION DE CIELOS - PLENUM									
1.13	60	20	2	2	18	10.10	100.15	DUCTO	DE 1ER PISO A 2DO PISO -
0.3	60	20	1	2	18	10.10	16.01	DUCTO	POR BUITRON DE 2DO PISO
0.35	20	60	1	2	18	10.10	18.06	CODO	DETRÁS DE C. ASEO DE
0.52	20	60	1	2	18	10.10	25.04	DUCTO	RECIPERACIÓN PARTOS
CUELLOS DE TODO EL SISTEMA PISO 1									
0.13	9	9	1	1	24	4.69	0.75	FARMACIA	
0.16	9	9	1	1	24	4.69	0.88	FARMACIA	
0.2	8	8	1	1	24	4.69	0.93	AREA ADMINISTRATIVA	
0.2	8	6	1	1	24	4.69	0.82	BAÑO AREA ADNINISTRATIVA	
0.2	8	8	1	1	24	4.69	0.93	AREA ESCALERAS FARMACIA	
0.2	8	8	1	1	24	4.69	0.93	FARMACIA AREA ESTANTERIA	
0.2	9	9	1	1	24	4.69	1.05	LABORATORIO	
0.2	9	9	1	1	24	4.69	1.05	LABORATORIO	
0.2	9	9	1	1	24	4.69	1.05	LABORATORIO	
0.2	8	6	1	1	24	4.69	0.82	LABORATORIO	
0.2	8	6	1	1	24	4.69	0.82	LABORATORIO	
0.2	8	8	1	1	24	4.69	0.93	LABORATORIO	
0.2	8	6	1	1	24	4.69	0.82	AREA ADMINISTRATIVA LABORATORIO	
0.2	8	6	1	1	24	4.69	0.82	AREA ADMINISTRATIVA LABORATORIO	
0.2	8	6	1	1	24	4.69	0.82	AREA ADMINISTRATIVA LABORATORIO	
0.2	8	6	1	1	24	4.69	0.82	CIRCULACCION A ASEO LABORATORIO	
0.2	8	8	1	1	24	4.69	0.93	TOMA DE MUESTRAS GINECOLOGICAS	
0.2	8	6	1	1	24	4.69	0.82	BAÑO TOMA DE MUESTRAS GINECOLOGICAS	
0.2	9	9	1	1	24	4.69	1.05	TOMO DE MUESTRAS	
0.2	8	8	1	1	24	4.69	0.93	TOMO DE MUESTRAS	
0.2	8	8	1	1	24	4.69	0.93	SALA DE LECTURA IMAGENEOLOGIA	
0.2	8	8	1	1	24	4.69	0.93	OFICINA RADIOLOGIA	
0.2	8	8	1	1	24	4.69	0.93	PROCEDIMIENTO IMAGEONOLOGIA	
0.2	9	9	1	1	24	4.69	1.05	ECOGRAFO SERVICIO IMAGEONOLOGIA	
0.2	9	9	1	1	24	4.69	1.05	BAÑO VESTIER IMAGEONOLOGIA	
0.2	8	6	1	1	24	4.69	0.82	ECOGRAFO SERVICIO IMAGEONOLOGIA	
0.2	8	6	1	1	24	4.69	0.82	BAÑO PROCEDIMIENTO IMAGEONOLOGIA	
0.2	9	9	1	1	24	4.69	1.05	CONSULTORIO DISPONIBLE PARA ECOGRAFO	
0.2	8	6	1	1	24	4.69	0.82	ECOGRAFO	
0.25	12	12	1	1	24	4.69	1.69	ADMISIONES	
0.17	12	12	1	1	24	4.69	1.23	PROCEDIMIENTOS	
0.34	8	8	1	1	24	4.69	1.28	ISUMOS	
0.34	8	6	1	1	24	4.69	1.28	ASEO EN PROCEDIMIENTOS	
0.34	9	9	1	1	24	4.69	1.65	CONSULTORIO CARDIOLOGO	
0.16	9	9	1	1	24	4.69	0.88	ASEO FRENTE A T.A.C	
0.24	8	6	1	1	24	4.69	0.95	CONSULTORIO CARDIOLOGO	
0.09	9	9	1	1	24	4.69	0.58	MAMOGRAFO	
0.18	9	9	1	1	24	4.69	0.96	T.A.C	
0.14	9	9	1	1	24	4.69	0.79	DISPARO	
0.16	12	12	1	1	24	4.69	1.17	OBSERVACION GINECOSTETRICIA	
0.16	12	12	1	1	24	4.69	1.17	OBSERVACION GINECOSTETRICIA	
0.31	8	6	1	1	24	4.69	1.18	BAÑO OBSERVACION GINECOSTETRICIA	
0.34	8	6	1	1	24	4.69	1.28	T.SUCIO	
0.34	8	6	1	1	24	4.69	1.28	T.LIMPIO	
0.25	8	6	1	1	24	4.69	0.98	W.C FAMILIAR	
0.2	9	9	1	1	24	4.69	1.05	OBSERVACION PEDIATRA	
0.17	9	9	1	1	24	4.69	0.92	OBSERVACION PEDIATRA	
0.2	9	9	1	1	24	4.69	1.05	CENTRAL EMFERMERIA EN OBESERVACION	
0.16	9	9	1	1	24	4.69	0.88	OBSERVACION PEDIATRA	
0.16	9	9	1	1	24	4.69	0.88	OBSERVACION PEDIATRA	
0.16	8	8	1	1	24	4.69	0.78	OBSERVACION PEDIATRA CUBICULO DE AISLAMIENTO	
0.23	8	6	1	1	24	4.69	0.92	BAÑOM CUBICULO AISLAMIENTO	
0.25	8	6	1	1	24	4.69	0.98	RESIDUOS ORDINARIOS	
0.22	8	6	1	1	24	4.69	0.88	RESIDUOS PELIGROSOS	
0.3	8	6	1	1	24	4.69	1.15	SALA EDA	
0.27	12	12	1	1	24	4.69	1.80	BAÑO SALA EDA	
0.21	9	9	1	1	24	4.69	1.09	DIR. URGENCIAS	
0.16	9	9	1	1	24	4.69	0.88	PROCEDIENTOS ACEPTICOS	
0.16	9	9	1	1	24	4.69	0.88	DIGITACION	
0.3	8	6	1	1	24	4.69	1.15	ROPA LIMPIA	
0.26	8	6	1	1	24	4.69	1.02	ROPA SUCIA	
0.12	9	9	1	1	24	4.69	0.71	SALA DE YESOS	
0.3	8	6	1	1	24	4.69	1.15	W. C SALA ERA	
0.15	9	9	1	1	24	4.69	0.84	SALA ERA	
0.3	8	6	1	1	24	4.69	1.15	W.C CONSULTORIO 2	
0.16	9	9	1	1	24	4.69	0.88	CONSULTORIO 2	
0.16	9	9	1	1	24	4.69	0.88	CONSULTORIO 5	
0.16	9	9	1	1	24	4.69	0.88	W.C CONSULTORIO 5	
0.12	12	12	1	1	24	4.69	0.94	MONITOREO GINECOSTETRICIA	
0.12	12	12	1	1	24	4.69	0.94	MONITOREO GINECOSTETRICIA	
0.24	8	6	1	1	24	4.69	0.95	MONITOREO GINECOSTETRICIA	
0.1	9	9	1	1	24	4.69	0.62	CONSULTORIO 4	
0.25	8	6	1	1	24	4.69	0.98	BAÑO CONSULTORIO 5	
0.15	9	9	1	1	24	4.69	0.84	CONSULTORIO 1	
0.34	8	6	1	1	24	4.69	1.28	BAÑO CONSULTORIO 1	
0.14	9	9	1	1	24	4.69	0.79	REANIMACION	
0.21	9	9	1	1	24	4.69	1.09	REANIMACION	
0.17	9	9	1	1	24	4.69	0.92	CONSULTORIO 3	
0.25	8	6	1	1	24	4.69	0.98	BAÑO CONSULTORIO 3	
0.15	9	9	1	1	24	4.69	0.84	ADMISION URGENCIAS	
0.18	8	8	1	1	24	4.69	0.86	ADMISION URGENCIAS	
0.12	9	9	1	1	24	4.69	0.71	ACCESO URGENCIAS	
0.16	9	9	1	1	24	4.69	0.88	SALA ESPERA ADULTOS	
0.18	9	9	1	1	24	4.69	0.96	SALA ESPERA ADULTOS	
0.14	9	9	1	1	24	4.69	0.79	SALA ESPERA ADULTOS	
0.16	9	9	1	1	24	4.69	0.88	SALA ESPERA ADULTOS	
0.14	9	9	1	1	24	4.69	0.79	SALA ESPERA ADULTOS	
0.16	9	9	1	1	24	4.69	0.88	SALA ESPERA ADULTOS	
0.21	9	9	1	1	24	4.69	1.09	AUDITORIO	
0.21	9	9	1	1	24	4.69	1.09	AUDITORIO	
0.18	9	9	1	1	24	4.69	0.96	AUDITORIO	
0.18	9	9	1	1	24	4.69	0.96	AUDITORIO	
0.18	9	9	1	1	24	4.69	0.96	AUDITORIO	
0.18	9	9	1	1	24	4.69	0.96	AUDITORIO	
0.18	8	6	1	1	24	4.69	0.75	BAÑO CAFETERIA	
0.18	8	6	1	1	24	4.69	0.75	BAÑO CAFETERIA	
0.19	12	12	1	1	24	4.69	1.34	CAFETERIA	
0.17	12	12	1	1	24	4.69	1.23	CAFETERIA	
0.17	12	12	1	1	24	4.69	1.23	CAFETERIA	
0.19	12	12	1	1	24	4.69	1.34	CAFETERIA	
0.2	12	12	1	1	24	4.69	1.40	CAFETERIA	
0.23	12	12	1	1	24	4.69	1.57	HALL GENERAL	
0.19	12	12	1	1	24	4.69	1.34	HALL GENERAL	
0.12	12	12	1	1	24	4.69	0.94	HALL GENERAL	
0.13	12	12	1	1	24	4.69	1.00	HALL GENERAL	
0.13	12	12	1	1	24	4.69	1.00	HALL GENERAL	
0.19	9	9	1	1	24	4.69	1.01	FACTURACION AUTORIZACION	
0.22	9	9	1	1	24	4.69	1.14	CENYTRO DE CABLEADO	
0.12	9	9	1	1	24	4.69	0.71	DESCABNSO INTERNOS	
0.08	9	9	1	1	24	4.69	0.54	SALA ESPERA	
0.1	9	9	1	1	24	4.69	0.62	SALA ESPERA	
0.08	9	9	1	1	24	4.69	0.54	SALA ESPERA	
0.1	9	9	1	1	24	4.69	0.62	SALA ESPERA	
0.16	8	6	1	1	24	4.69	0.68	SALA ESPERA	
0.16	8	6	1	1	24	4.69	0.68	SALA ESPERA	
0.37	8	6	1	1	24	4.69	1.38	BAÑO PERSONAL ASISTENCIAL	
0.37	8	6	1	1	24	4.69	1.38	BAÑO PERSONAL ASISTENCIAL	
0.22	9	9	1	1	24	4.69	1.14	PERSONAL ASISTENCIAL	
0.2	9	9	1	1	24	4.69	1.05	PERSONAL ASISTENCIAL	
0.33	8	6	1	1	24	4.69	1.25	BAÑOS DISCAPASITADOS	
0.27	8	6	1	1	24	4.69	1.05	W.C MUJERES	
0.27	8	6	1	1	24	4.69	1.05	W.C MUJERES	
0.27	8	6	1	1	24	4.69	1.05	W.C HOMBRE	
0.27	8	6	1	1	24	4.69	1.05	W.C HOMBRE	
0.31	8	6	1	1	24	4.69	1.18	W.C HOMBRE	
PISO 4									
SISTEMA DE SUMINISTRO (1)									
0.15	10.5	4	2	2	24	4.69	1.66	ZAPATO	
0.05	8	4	2	2	24	4.69	0.80	ZAPATO	
1.13	8	4	5	2	24	4.69	17.44	DUCTO	
0.52	8	4	1	2	24	4.69	1.74	DUCTO	
0	8	4	2	2	24	4.69	0.53	TAPAS	
0.15	10.5	4	1	2	24	4.69	0.83	ZAPATO	
0.05	8	4	1	2	24	4.69	0.40	ZAPATO	
1.13	8	4	2	2	24	4.69	6.98	DUCTO	
0.4	8	4	1	2	24	4.69	1.40	CODO	
0.3	1.5	4	1	2	24	4.69	0.51	REDUCCIÓN	
0.65	7	4	1	2	24	4.69	1.94	DUCTO	
0	7	4	1	2	24	4.69	0.24	TAPAS	
0.4	10	8	1	2	24	4.69	2.10	DUCTO	
0.15	10.5	6	1	2	24	4.69	0.94	ZAPATO	
0.05	8	6	1	2	24	4.69	0.47	ZAPATO	
0.45	10	6	1	2	24	4.69	2.06	DUCTO	
1.13	10	5	1	2	24	4.69	4.36	DUCTO	
0.4	8	4	1	2	24	4.69	1.40	REDUCCIÓN	
0.15	10.5	4	1	2	24	4.69	0.83	ZAPATO	

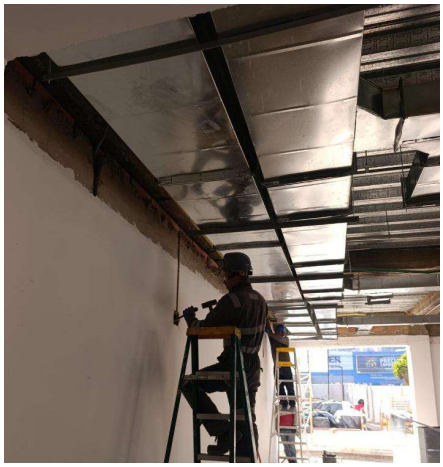







0.05	8	4	1	2	24	4.69	0.40	ZAPATO	
0.54	8	4	1	2	24	4.69	1.80	DUCTO	
0.4	8	4	1	2	24	4.69	1.40	CODO	
1	8	4	1	2	24	4.69	3.12	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4.69	0.26	TAPAS	
0.15	10.5	4	1	2	24	4.69	0.83	ZAPATO	
0.05	8	4	1	2	24	4.69	0.40	ZAPATO	
1.13	8	4	2	2	24	4.69	6.98	DUCTO	
0.2	8	4	1	2	24	4.69	0.83	DUCTO	
0.4	8	4	1	2	24	4.69	1.40	CODO	
0.3	7	4	1	2	24	4.69	1.02	REDUCCIÓN	
0.52	6	4	1	2	24	4.69	1.45	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4.69	0.22	TAPAS	
0.15	10.5	6	1	2	24	4.69	0.94	ZAPATO	
0.05	8	6	1	2	24	4.69	0.47	ZAPATO	
1.13	8	6	2	2	24	4.69	8.14	DUCTO	
0.52	8	6	1	2	24	4.69	2.03	DUCTO	
0	8	6	1	2	24	4.69	0.33	TAPAS	
0.15	10.5	4	1	2	24	4.69	0.83	ZAPATO	
0.05	8	4	1	2	24	4.69	0.40	ZAPATO	
0.52	8	4	1	2	24	4.69	1.74	DUCTO	
0.4	8	4	1	2	24	4.69	1.40	CODO	
0.94	8	4	1	2	24	4.69	2.94	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4.69	0.26	TAPAS	
0.15	10.5	4	1	2	24	4.69	0.83	ZAPATO	
0.05	8	4	1	2	24	4.69	0.40	ZAPATO	
0.2	8	4	1	2	24	4.69	0.83	DUCTO	
1.13	8	4	2	2	24	4.69	6.98	DUCTO	
0.4	8	4	1	2	24	4.69	1.40	CODO	
0.6	7	4	1	2	24	4.69	1.81	REDUCCIÓN	
0.6	6	4	1	2	24	4.69	1.64	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4.69	0.22	TAPAS	
0.15	9	4	2	2	24	4.69	1.49	ZAPATO	
0.05	6	4	2	2	24	4.69	0.67	ZAPATO	
1.13	6	4	5	2	24	4.69	14.53	DUCTO	
0.65	6	4	1	2	24	4.69	1.76	DUCTO	
0.15	12.5	6	1	2	24	4.69	1.06	ZAPATO	
0.05	10	6	1	2	24	4.69	0.53	ZAPATO	
1.13	10	6	2	2	24	4.69	9.30	DUCTO	
0.4	8	5	1	2	24	4.69	1.52	REDUCCIÓN	
0.52	6	4	1	2	24	4.69	1.45	DUCTO	
1.13	6	4	1	2	24	4.69	2.91	DUCTO	
0.4	6	4	1	2	24	4.69	1.17	CODO	
0.7	6	4	1	2	24	4.69	1.88	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4.69	0.22	TAPAS	
0.15	9	4	1	2	24	4.69	0.74	ZAPATO	
0.4	6	4	1	2	24	4.69	1.17	ZAPATO	
1.13	6	4	1	2	24	4.69	2.91	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4.69	0.22	TAPAS	
1.13	6	4	4	2	24	4.69	11.63	DUCTO	
0.65	6	4	1	2	24	4.69	1.76	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4.69	0.22	TAPAS	
0.15	9	4	1	2	24	4.69	0.74	ZAPATO	
0.05	6	4	1	2	24	4.69	0.33	ZAPATO	
1.13	6	4	1	2	24	4.69	2.91	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4.69	0.22	TAPAS	
SISTEMA DE RETORNO (1)									
1.13	21	12	9	2	24	4.69	86.33	DUCTO	
0.6	21	12	1	2	24	4.69	5.42	DESVIO	
0	21	12	1	2	24	4.69	1.15	TAPA	
0.16	14.5	8	1	2	24	4.69	1.34	ZAPATO	
0.05	12	8	1	2	24	4.69	0.67	ZAPATO	
0.52	12	8	1	2	24	4.69	2.91	DESVIO	
1.13	10	8	5	2	24	4.69	26.16	DUCTO	
0.52	9	6	1	2	24	4.69	2.18	REDUCCION	
1.13	8	4	5	2	24	4.69	17.44	DUCTO	
0.52	8	4	1	2	24	4.69	1.74	DUCTO	
0.15	16.5	11	1	2	24	4.69	1.57	ZAPATO	
0.5	14	11	1	2	24	4.69	3.51	ZAPATO	
0.8	14	11	1	2	24	4.69	5.30	DUCTO	
0.52	14	11	1	2	24	4.69	3.63	DESVIO	Red principal de retorno piso 4, todo sobre pasillo.
1.13	14	11	3	2	24	4.69	21.80	DUCTO	
0.52	13.5	10.5	1	2	24	4.69	3.49	REDUCCION	
1.13	13	10	5	2	24	4.69	33.43	DUCTO	
0.75	13	10	1	2	24	4.69	4.60	DUCTO	
0.52	12.5	10	1	2	24	4.69	3.27	REDUCCION	
1.13	12	10	5	2	24	4.69	31.97	DUCTO	
0.75	12	10	1	2	24	4.69	4.40	DUCTO	
0.52	10	10	1	2	24	4.69	2.91	REDUCCION	
1.13	10	8	5	2	24	4.69	26.16	DUCTO	
0.75	10	8	1	2	24	4.69	3.60	DUCTO	
0.52	9	86	1	2	24	4.69	13.81	REDUCCION	
1.13	8	4	5	2	24	4.69	17.44	DUCTO	
0.75	8	4	1	2	24	4.69	2.40	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4.69	0.26	TAPA	
0.22	8	4	1	2	24	4.69	0.89	CODO	
1.13	8	4	1	2	24	4.69	3.49	DUCTO	
0.6	8	4	1	2	24	4.69	1.97	DUCTO	
0.2	8	4	1	2	24	4.69	0.83	DUCTO	WC HABITACIONES: 421 - 423
0.41	8	4	1	2	24	4.69	1.43	CODO	
0	7	4	1	2	24	4.69	0.24	REDUCCIÓN	
0.52	6	4	1	2	24	4.69	1.45	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4.69	0.22	TAPA	
0.22	8	4	1	2	24	4.69	0.89	CODO	
1.13	8	4	1	2	24	4.69	3.49	DUCTO	
0.6	8	4	1	2	24	4.69	1.97	DUCTO	
0.2	8	4	1	2	24	4.69	0.83	DUCTO	WC HABITACIONES: 417 - 419
0.41	8	4	1	2	24	4.69	1.43	CODO	
0.3	7	4	1	2	24	4.69	1.02	REDUCCIÓN	
0.6	6	4	1	2	24	4.69	1.64	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4.69	0.22	TAPA	
0.22	8	4	1	2	24	4.69	0.89	CODO	
1.13	8	4	1	2	24	4.69	3.49	DUCTO	
0.6	8	4	1	2	24	4.69	1.97	DUCTO	
0.45	8	4	1	2	24	4.69	1.54	DUCTO	WC HABITACIONES: 409 - 407
0.41	8	4	1	2	24	4.69	1.43	CODO	
0.3	7	4	1	2	24	4.69	1.02	REDUCCIÓN	
0.62	6	4	1	2	24	4.69	1.69	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4.69	0.22	TAPA	
0.22	8	4	1	2	24	4.69	0.89	CODO	
1.13	8	4	1	2	24	4.69	3.49	DUCTO	
0.98	8	4	1	2	24	4.69	3.06	DESVIO	
1	8	4	1	2	24	4.69	3.12	DUCTO	WC HABITACIONES: 406 - 404
1.13	8	4	2	2	24	4.69	6.98	DUCTO	
0.41	8	4	1	2	24	4.69	1.43	CODO	
0	7	4	1	2	24	4.69	0.24	REDUCCIÓN	
0.52	6	4	1	2	24	4.69	1.45	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4.69	0.22	TAPA	
0.17	8	6	1	1	24	4.69	0.72	CUELLO	WC HAB 412
0.32	8	6	1	1	24	4.69	1.22	CUELLO	WC HAB 413
0.19	8	6	1	1	24	4.69	0.78	CUELLO	WC HAB 414
0.3	8	6	1	1	24	4.69	1.15	CUELLO	WC HAB 415
0.1	8	6	1	1	24	4.69	0.48	CUELLO	WC HAB 416
0.32	8	6	1	1	24	4.69	1.22	CUELLO	WC HAB 417
0.12	8	6	1	1	24	4.69	0.55	CUELLO	WC HAB 418
0.26	8	6	1	1	24	4.69	1.02	CUELLO	WC HAB 419
0.25	8	6	1	1	24	4.69	0.98	CUELLO	WC HAB 420
0.28	8	6	1	1	24	4.69	1.08	CUELLO	WC HAB 421
0.25	8	6	1	1	24	4.69	0.98	CUELLO	WC HAB 422
0.3	8	6	1	1	24	4.69	1.15	CUELLO	WC HAB 423
0.11	8	6	1	1	24	4.69	0.52	CUELLO	WC HAB 424
0.17	8	6	1	1	24	4.69	0.72	CUELLO	WC HAB 425
CUELLOS DE LOS SISTEMAS EN EL PISO									
0.16	8	6	1	1	24	4.69	0.68	CUELLO	HABITACIÓN 411
0.12	8	6	1	1	24	4.69	0.55	CUELLO	HABITACIÓN 410
0.2	8	6	1	1	24	4.69	0.82	CUELLO	HABITACIÓN 409
0.17	8	6	1	1	24	4.69	0.72	CUELLO	HABITACIÓN 408
0.1	8	6	1	1	24	4.69	0.48	CUELLO	HABITACIÓN 407
0.19	8	6	1	1	24	4.69	0.78	CUELLO	HABITACIÓN 406
0.255	8	6	1	1	24	4.69	1.00	CUELLO	HABITACIÓN 405
0.19	8	6	1	1	24	4.69	0.78	CUELLO	HABITACIÓN 404
0.25	8	6	1	1	24	4.69	0.98	CUELLO	HABITACIÓN 403
0.19	8	6	1	1	24	4.69	0.78	CUELLO	HABITACIÓN 402
0.15	8	6	1	1	24	4.69	0.65	CUELLO	HABITACIÓN 401
0.13	8	6	1	1	24	4.69	0.58	CUELLO	TRABAJO SUCIO
0.16	8	6	1	1	24	4.69	0.68	CUELLO	PROCEDIMIENTOS
0.105	8	6	1	1	24	4.69	0.50	CUELLO	ASEO
0.1	8	6	1	1	24	4.69	0.48	CUELLO	BAÑO DESCANSO
0.18	8	6	1	1	24	4.69	0.75	CUELLO	TRABAJO LIMPIO
0.44	8	6	1	1	24	4.69	1.62	CUELLO	WC CIRCULACIÓN HALL
0.43	8	6	1	1	24	4.69	1.58	CUELLO	WC CIRCULACIÓN HALL
PISO 2									
SISTEMA DE SUMINISTRO (1)									
1.13	20	12	1	2	24	4.69	9.30	DUCTO	
0.52	18	12	1	2	24	4.69	4.36	REDUCCIÓN	
1.13	16	12	4	2	24	4.69	32.55	DUCTO	
0.52	16	11	1	2	24	4.69	3.92	REDUCCIÓN	
1.13	16	10	4	2	24	4.69	30.23	DUCTO	
0.52	15	9	1	2	24	4.69	3.49	REDUCCIÓN	
0.4	14	8	1	2	24	4.69	2.57	DUCTO	
1.13	14	8	1	2	24	4.69	6.39	DUCTO	
0.4	12	8	1	2	24	4.69	2.33	REDUCCIÓN	
0.5	10	8	1	2	24	4.69	2.53	DUCTO	
1.13	10	8	2	2	24	4.69	10.46	DUCTO	
0.6	10	8	1	2	24	4.69	2.96	DUCTO	
0.4	9.5	7	1	2	24	4.69	1.93	REDUCCIÓN	
0.52	9	6	1	2	24	4.69	2.18	DUCTO	
0	9	6	1	2	24	4.69	0.36	TAPA	
0.3	10	8	1	2	24	4.69	1.67	DUCTO	
0.45	10	8	1	2	24	4.69	2.32	CODO	
0.15	12.5	8	1	2	24	4.69	1.17	ZAPATO (T)	
0.05	9	8	1	2	24	4.69	0.57	ZAPATO (R)	
1.13	9	8	2	2	24	4.69	9.88	DUCTO	
0.58	9	8	1	2	24	4.69	2.71	DUCTO	UCI UARO - CAMA 7
0.45	9	7	1	2	24	4.69	2.06	REDUCCIÓN	
0.42	9	6	1	2	24	4.69	1.82	CODO	
1.13	9	6	1	2	24	4.69	4.36	DUCTO	
0	9	6	1	2	24	4.69	0.36	TAPA	
0.125	10.5	4	1	2	24	4.69	0.74	ZAPATO (T)	












0.075	8	4	1	2	24	4.69	0.47	ZAPATO (R)	UCI UARO - DE CAMA 7 A FILTRO CAMA 6 AISLADO
1.13	8	4	2	2	24	4.69	6.98	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4.69	0.26	TAPA	
0.15	11.5	6	1	2	24	4.69	1.00	ZAPATO	UCI URO 08
0.05	9	6	1	2	24	4.69	0.50	ZAPATO	
1.13	9	6	2	2	24	4.69	8.72	DUCTO	
0.6	9	6	1	2	24	4.69	2.47	DUCTO	
0.88	9	6	1	2	24	4.69	3.47	DUCTO	
0	9	6	1	2	24	4.69	0.36	TAPA	
0.15	10.5	4	1	2	24	4.69	0.83	ZAPATO	CENTRAL DE ENFERMERIA
0.16	8	4	1	2	24	4.69	0.71	ZAPATO	
0.8	8	4	1	2	24	4.69	2.54	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4.69	0.26	TAA	
1.13	12	8	2	2	24	4.69	11.63	DUCTO	UCI URO 05 A A AISLADO
0.52	10.5	7.5	1	2	24	4.69	2.62	REDUCCIÓN	
1.13	9	7	1	2	24	4.69	4.65	DUCTO	
0	9	7	1	2	24	4.69	0.40	TAPA	
0.15	14.5	8	1	2	24	4.69	1.29	ZAPATO	
0.38	12	8	1	2	24	4.69	2.24	ZAPATO	
0.15	10.5	5	1	2	24	4.69	0.89	ZAPATO	UCI URO 09
0.37	8	5	1	2	24	4.69	1.42	ZAPATO	
1.13	8	5	2	2	24	4.69	7.56	DUCTO	
SISTEMA DE SUMINISTRO UMA (1)									
0.425	10	12	1	2	24	4.69	2.70	CODO (AISLADO)	PASA INTERNAMENTE POR DE QUIROFANO 1 Y 2
1.13	12	10	8	2	24	4.69	51.16	DUCTO (AISLADO)	
SISTEMA DE SUMINISTRO (2)									
1.13	21	10	1	2	24	4.69	9.01	DUCTO	
0.15	14.5	8	2	2	24	4.69	2.57	ZAPATO	
0.05	12	8	2	2	24	4.69	1.33	ZAPATO	
0.8	12	8	1	2	24	4.69	4.24	DUCTO	
1.13	12	8	1	2	24	4.69	5.81	DUCTO	
0.4	10.5	7	1	2	24	4.69	2.04	REDUCCIÓN	
0.3	9	6	1	2	24	4.69	1.39	DUCTO	
1.13	9	6	2	2	24	4.69	8.72	DUCTO	
0.52	9	6	1	2	24	4.69	2.18	DUCTO	
0	9	6	1	2	24	4.69	0.36	TAPA	
0.9	12	8	1	2	24	4.69	4.72	DUCTO	
0.52	10.5	7	1	2	24	4.69	2.54	REDUCCIÓN	
0.52	9	6	1	2	24	4.69	2.18	DUCTO	
1.13	9	6	2	2	24	4.69	8.72	DUCTO	
0.66	9	6	1	2	24	4.69	2.68	DUCTO	
0.52	18.5	11	1	2	24	4.69	4.29	REDUCCIÓN	
1.13	16	10	3	2	24	4.69	22.67	DUCTO	
0.5	15	9	1	2	24	4.69	3.37	REDUCCIÓN	
1.13	14	8	3	2	24	4.69	19.18	DUCTO	
0.6	14	8	1	2	24	4.69	3.62	DUCTO	
0.52	11	7	1	2	24	4.69	2.62	REDUCCIÓN	
1.13	8	6	2	2	24	4.69	8.14	DUCTO	
0.52	8	5	1	2	24	4.69	1.89	REDUCCIÓN	
1.13	8	4	3	2	24	4.69	10.46	DUCTO	
0.4	8	4	1	2	24	4.69	1.40	CODO	
0.8	8	4	1	2	24	4.69	2.54	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4.69	0.26	TAPA	
0.15	11.5	6	1	2	24	4.69	1.00	ZAPATO	CENTRAL ENFERMERIA UCI URO
0.05	9	6	1	2	24	4.69	0.50	ZAPATO	
0.3	9	6	1	2	24	4.69	1.39	DUCTO	
1.13	9	6	1	2	24	4.69	4.36	DUCTO	
0	9	6	1	2	24	4.69	0.36	TAPA	
0.15	11.5	6	1	2	24	4.69	1.00	ZAPATO	
0.05	9	6	1	2	24	4.69	0.50	ZAPATO	
0.52	9	6	1	2	24	4.69	2.18	DUCTO	
0	9	6	1	2	24	4.69	0.36	TAPA	
0.15	10.5	5	1	2	24	4.69	0.89	ZAPATO	EXTRACCIÓN
0.05	8	5	1	2	24	4.69	0.43	ZAPATO	
1.13	8	5	1	2	24	4.69	3.78	DUCTO	
0	8	5	1	2	24	4.69	0.30	TAPA	
0.15	10.5	4	1	2	24	4.69	0.83	ZAPATO	VESTIER
0.05	8	4	1	2	24	4.69	0.40	ZAPATO	
0.52	8	4	1	2	24	4.69	1.74	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4.69	0.26	TAPA	
SISTEMA DE SUMINISTRO UMA (2)									
1.13	12	10	2	2	24	4.69	12.79	DUCTO (AISLADO)	PASA INTERNAMENTE POR DESCANSO A DE QUIROFANO 1
0.52	12	10	1	2	24	4.69	3.20	CODO (AISLADO)	
0.425	12	10	3	2	24	4.69	8.10	DUCTO (AISLADO)	
1.13	12	10	2	2	24	4.69	12.79	REDUCCIÓN (AISLADO)	
0.52	11	10	1	2	24	4.69	3.05	DUCTO (AISLADO)	
1.13	101	10	1	2	24	4.69	32.26	DUCTO (AISLADO)	
0.2	10	10	1	2	24	4.69	1.38	CODO (AISLADO)	
0.33	10	10	1	2	24	4.69	2.00	DUCTO (AISLADO)	
1.13	10	10	1	2	24	4.69	5.81	DUCTO (AISLADO)	
0	10	10	1	2	24	4.69	0.55	TAPA (AISLADO)	
SISTEMA DE SUMINISTRO (3)									
1.13	22	12	1	2	24	4.69	9.88	DUCTO	RECUPERACIÓN PARTOS
0.52	19	12	1	2	24	4.69	4.51	REDUCCIÓN	
1.13	16	12	2	2	24	4.69	16.28	DUCTO	
0.52	14	12	1	2	24	4.69	3.78	REDUCCIÓN	
1.13	12	12	2	2	24	4.69	13.95	DUCTO	
0.4	12	10	1	2	24	4.69	2.57	REDUCCIÓN	
1.13	12	8	5	2	24	4.69	29.07	DUCTO	
0.4	10	7	1	2	24	4.69	1.98	REDUCCIÓN	
1.13	8	6	1	2	24	4.69	4.07	DUCTO	
0.52	8	6	1	2	24	4.69	2.03	DUCTO	
0	8	6	1	2	24	4.69	0.33	TAPA	
0.21	22	12	1	2	24	4.69	2.43	DUCTO	
0.66	22	12	1	2	24	4.69	6.08	CODO	
1.13	22	12	2	2	24	4.69	19.77	DUCTO	
0.72	22	12	1	2	24	4.69	6.56	DUCTO	
0.66	22	12	1	2	24	4.69	6.08	CODO	
0.6	22	12	1	2	24	4.69	5.59	DUCTO	
SISTEMA DE SUMINISTRO UMA (3)									
1.13	12	10	2	2	24	4.69	12.79	DUCTO (AISLADO)	DESCANSO
0.52	12	10	1	2	24	4.69	3.20	CODO (AISLADO)	
0.425	12	10	3	2	24	4.69	8.10	DUCTO (AISLADO)	PASA INTERNAMENTE DE QUIROFANO 1 A 2
1.13	12	10	2	2	24	4.69	12.79	REDUCCIÓN (AISLADO)	
0.52	11	10	1	2	24	4.69	3.05	DUCTO (AISLADO)	
1.13	101	10	1	2	24	4.69	32.26	DUCTO (AISLADO)	
0.2	10	10	1	2	24	4.69	1.38	CODO (AISLADO)	
0.33	10	10	1	2	24	4.69	2.00	DUCTO (AISLADO)	
1.13	10	10	1	2	24	4.69	5.81	DUCTO (AISLADO)	
0	10	10	1	2	24	4.69	0.55	TAPA (AISLADO)	
SISTEMA DE SUMINISTRO (4)									
1.13	21	12	2	2	24	4.69	19.18	DUCTO	TRABAJO DE PARTOS
0.52	21	12	1	2	24	4.69	4.80	DUCTO	
0.52	19.5	12	1	2	24	4.69	4.58	REDUCCIÓN	
1.13	18	12	3	2	24	4.69	26.16	DUCTO	
0.21	18	12	1	2	24	4.69	2.14	DUCTO	
0.52	15	10	1	2	24	4.69	3.63	REDUCCIÓN	
1.13	12	8	2	2	24	4.69	11.63	DUCTO	
0.65	12	8	1	2	24	4.69	3.53	DESVIO	
1.13	12	8	1	2	24	4.69	5.81	DUCTO	
0.4	10.5	7	1	2	24	4.69	2.04	REDUCCIÓN	
1.06	9	6	1	2	24	4.69	4.11	DESVIO	
1.13	9	6	1	2	24	4.69	4.36	DUCTO	
0.4	9	6	1	2	24	4.69	1.75	CODO	
1.13	9	6	3	2	24	4.69	13.08	DUCTO	
0.33	9	6	1	2	24	4.69	1.50	DUCTO	
0	9	6	1	2	24	4.69	0.36	TAPA	
0.13	14	6	1	2	24	4.69	1.05	ZAPATO	
0.07	12	6	1	2	24	4.69	0.69	ZAPATO	
1.13	12	6	2	2	24	4.69	10.46	DUCTO	
0	12	6	1	2	24	4.69	0.45	TAPA	
SISTEMA DE SUMINISTRO UMA (4)									
1.13	12	10	4	2	24	4.69	25.58	DUCTO (AISLADO)	SALA PARTOS 2
SISTEMA DE SUMINISTRO (5)									
1.13	23	12	7	2	24	4.69	71.21	DUCTO (BUITRON)	BAJA: BUITRON FRENTE CONTROL (RECEPCIÓN) A UCI NEO - INTENSIVOS
0.5	23	12	1	2	24	4.69	4.92	CODO	
0.51	12	23	1	2	24	4.69	5.00	CODO	
0.68	12	23	1	2	24	4.69	6.42	DESVIO	
1	12	23	1	2	24	4.69	9.09	DUCTO	
0.58	12	23	1	2	24	4.69	5.59	DESVIO	
1.13	12	23	2	2	24	4.69	20.35	DUCTO	
1.13	12	23	10	2	24	4.69	101.73	DUCTO	
0.77	12	23	1	2	24	4.69	7.17	CODO	
0.85	12	23	1	2	24	4.69	7.84	DUCTO	
1.13	12	23	5	2	24	4.69	50.87	DUCTO	
0.52	12	20.5	1	2	24	4.69	4.72	REDUCCIÓN	
0.52	12	18	1	2	24	4.69	4.36	DUCTO	
1.13	12	18	2	2	24	4.69	17.44	DUCTO	
0.52	11	15.5	1	2	24	4.69	3.85	REDUCCIÓN	
0.3	10	13	1	2	24	4.69	2.14	DUCTO	
1.13	10	13	2	2	24	4.69	13.37	DUCTO	
0.4	10	11.5	1	2	24	4.69	2.51	REDUCCIÓN	
0.52	10	10	1	2	24	4.69	2.91	DUCTO	
0.52	9	7	1	2	24	4.69	2.33	REDUCCIÓN	
0.52	8	4	1	2	24	4.69	1.74	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4.69	0.26	TAPA	
0.13	14.5	5	1	2	24	4.69	1.02	ZAPATO (T)	
0.41	12	5	1	2	24	4.69	2.03	ZAPATO (R)	
1.13	12	5	1	2	24	4.69	4.94	DUCTO	
0	12	5	1	2	24	4.69	0.40	TAPA	
0.15	14.5	5	1	2	24	4.69	1.12	ZAPATO (T)	
0.39	12	5	1	2	24	4.69	1.94	ZAPATO (R)	
1.13	12	5	1	2	24	4.69	4.94	DUCTO	
0	12	5	1	2	24	4.69	0.40	TAPA	
0.13	14	7	1	2	24	4.69	1.10	ZAPATO	UCI NEONATAL INTENSIVOS A INTERMEDIOS
0.7	12	7	1	2	24	4.69	3.58	ZAPATO	
1.13	12	7	1	2	24	4.69	5.52	DUCTO	
0.52	12	6	1	2	24	4.69	2.62	REDUCCIÓN	
0.21	12	5	1	2	24	4.69	1.22	DUCTO	
1.13	12	5	1	2	24	4.69	4.94	DUCTO	
0	12	5	1	2	24	4.69	0.40	TAPA	
0.15	10.5	4	1	2	24	4.69	0.83	ZAPATO	

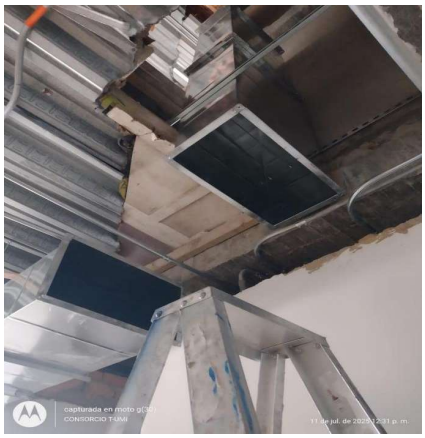









0.37	8	4	1	2	24	4.69	1.32	ZAPATO	
0	8	4	1	2	24	4.69	0.26	TAPA	
0.15	14.5	7	1	2	24	4.69	1.23	ZAPATO	
0.38	12	7	1	2	24	4.69	2.13	ZAPATO	UCI NEONATAL - INTERMEDIOS
1.13	12	7	3	2	24	4.69	16.57	DUCTO	
0.7	12	7	1	2	24	4.69	3.58	DUCTO	
0.15	10.5	1	1	2	24	4.69	0.66	ZAPATO	
0.38	8	1	1	2	24	4.69	1.01	ZAPATO	
0	8	1	1	2	24	4.69	0.16	TAPA	
0	12	7	1	2	24	4.69	0.50	TAPA	
0.15	14.5	5	1	2	24	4.69	1.12	ZAPATO	
0.38	12	5	1	2	24	4.69	1.90	ZAPATO	UCI NEONATAL - INTENSIVOS
1.13	12	5	1	2	24	4.69	4.94	DUCTO	
0	12	5	1	2	24	4.69	0.40	TAPA	
SISTEMA DE SUMINISTRO (6)									
1.13	22	12	7	2	24	4.69	69.18	DUCTO (BUITRON)	
0.5	22	12	3	2	24	4.69	14.34	CODO	
0.53	22	12	1	2	24	4.69	5.02	DUCTO	
0.62	22	12	1	2	24	4.69	5.75	DUCTO	
1.13	22	12	9	2	24	4.69	88.94	DUCTO	
1	22	12	1	2	24	4.69	8.83	DUCTO	
0.5	22	12	1	2	24	4.69	4.78	CODO	
0.4	22	12	1	2	24	4.69	3.97	DUCTO	
1.13	22	12	9	2	24	4.69	88.94	DUCTO	
0.5	22	12	1	2	24	4.69	4.78	CODO	
1.13	22	12	7	2	24	4.69	69.18	DUCTO	
0.52	14	10.5	1	2	24	4.69	3.56	REDUCCIÓN	
0.18	22.5	12	1	2	24	4.69	2.22	ZAPATO (T)	UCI NEO - INTERMEDIOS
0.05	20	12	1	2	24	4.69	1.07	ZAPATO (R)	
0.7	20	12	1	2	24	4.69	6.02	DUCTO	
1.13	20	12	1	2	24	4.69	9.30	DUCTO	
0.52	19	11	1	2	24	4.69	4.36	REDUCCIÓN	
0.52	18	10	1	2	24	4.69	4.07	DUCTO	
1.13	18	10	1	2	24	4.69	8.14	DUCTO	
0	18	10	1	2	24	4.69	0.88	TAPA	
0.13	14.5	8	1	2	24	4.69	1.18	ZAPATO (T)	
0.07	12	8	1	2	24	4.69	0.76	ZAPATO (R)	
1.13	12	8	1	2	24	4.69	5.81	DUCTO	
0	12	8	1	2	24	4.69	0.54	TAPA	
0.12	14.5	5	1	2	24	4.69	0.98	ZAPATO (T)	
0.05	12	5	1	2	24	4.69	0.57	ZAPATO (R)	
1.13	12	5	3	2	24	4.69	14.82	DUCTO	
0	12	5	1	2	24	4.69	0.40	TAPA	
0.15	14.5	5	1	2	24	4.69	1.12	ZAPATO (T)	
0.41	12	5	1	2	24	4.69	2.03	ZAPATO (R)	
0.52	12	5	1	2	24	4.69	2.47	DUCTO	
0	12	5	1	2	24	4.69	0.40	TAPA	
0.15	14.5	8	1	2	24	4.69	1.29	ZAPATO (T)	
0.05	12	8	1	2	24	4.69	0.67	ZAPATO (R)	
1.13	12	8	2	2	24	4.69	11.63	DUCTO	
0.52	12	8	1	2	24	4.69	2.91	DUCTO	
0.13	10.5	5	1	2	24	4.69	0.81	ZAPATO (T)	
0.41	12	5	1	2	24	4.69	2.03	ZAPATO (R)	
1.13	12	5	2	2	24	4.69	9.88	DUCTO	
0.13	16.5	4	1	2	24	4.69	1.07	ZAPATO (T)	
0.07	14	4	1	2	24	4.69	0.69	ZAPATO (R)	
0.52	14	1	1	2	24	4.69	2.18	DUCTO	
0	14	4	1	2	24	4.69	0.40	TAPA	
0	12	8	1	2	24	4.69	0.54	TAPA	
0.13	14.5	5	1	2	24	4.69	1.02	ZAPATO (T)	
0.41	12	5	1	2	24	4.69	2.03	ZAPATO (R)	
0.52	12	5	1	2	24	4.69	2.47	DUCTO	
0	12	5	1	2	24	4.69	0.40	TAPA	
0.13	14.5	5	1	2	24	4.69	1.02	ZAPATO (T)	
0.41	12	5	1	2	24	4.69	2.03	ZAPATO (R)	
1.13	12	5	2	2	24	4.69	9.88	DUCTO	
0	12	5	1	2	24	4.69	0.40	TAPA	
0.125	14.5	5	1	2	24	4.69	1.00	ZAPATO (T)	
0.075	12	5	1	2	24	4.69	0.67	ZAPATO (R)	
1.13	12	5	1	2	24	4.69	4.94	DUCTO	
0	12	5	1	2	24	4.69	0.40	TAPA	
0.87	8	6	1	2	24	4.69	3.20	DUCTO	
0.4	8	6	1	2	24	4.69	1.63	CODO	
1.13	8	6	2	2	24	4.69	8.14	DUCTO	
0	8	6	1	2	24	4.69	0.33	TAPA	
0.15	10.5	4	1	2	24	4.69	0.83	ZAPATO (T)	
0.05	8	4	1	2	24	4.69	0.40	ZAPATO (R)	
1.13	8	4	1	2	24	4.69	3.49	DUCTO	DESCANSO UCI NEO
0	8	4	1	2	24	4.69	0.26	TAPA	
1.25	10.5	4	1	2	24	4.69	4.63	ZAPATO (T)	
0.075	8	4	1	2	24	4.69	0.47	ZAPATO (R)	
0.4	8	4	1	2	24	4.69	1.40	DUCTO	
1.13	8	4	1	2	24	4.69	3.49	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4.69	0.26	TAPA	
0.15	8.5	4	1	2	24	4.69	0.71	ZAPATO (T)	
0.05	6	4	1	2	24	4.69	0.33	ZAPATO (R)	INSUMOS TERAPIA RESPIRATORIA
1.13	6	4	2	2	24	4.69	5.81	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4.69	0.22	TAPA	
SISTEMA DE SUMINISTRO (7)									
1.13	22	12	7	2	24	4.69	69.18	DUCTO (BUITRON)	
0.5	22	12	2	2	24	4.69	9.56	CODO	
1.13	22	12	5	2	24	4.69	49.41	DUCTO	
0.52	19	12	1	2	24	4.69	4.51	REDUCCIÓN	
1.13	16	12	5	2	24	4.69	40.69	DUCTO	
0.73	16	12	1	2	24	4.69	5.47	DUCTO	
0.52	13	9	1	2	24	4.69	3.20	REDUCCIÓN	
0.5	10	6	1	2	24	4.69	2.25	CODO	
1.13	16	12	1	2	24	4.69	8.14	DUCTO	SALA ESPERA
1.13	10	6	3	2	24	4.69	13.95	DUCTO	
0.4	9	5.5	1	2	24	4.69	1.69	REDUCCIÓN	
0.9	8	5	1	2	24	4.69	3.07	DUCTO	VESTIER PERSONAL ASISTENCIAL
1.13	8	5	2	2	24	4.69	7.56	DUCTO	
0.4	8	5	1	2	24	4.69	1.52	DUCTO	
0.4	8	5	1	2	24	4.69	1.52	CODO	
0	8	5	1	2	24	4.69	0.30	TAPA	
0.15	10.5	5	1	2	24	4.69	0.89	CODO	
0.05	8	5	1	2	24	4.69	0.43	TAPA	COORDINACIÓN UCI NEO
1.13	8	5	1	2	24	4.69	3.78	CODO	
0	8	5	1	2	24	4.69	0.30	TAPA	
0.15	14.5	10	1	2	24	4.69	1.40	ZAPATO (T)	
0.38	12	10	1	2	24	4.69	2.46	ZAPATO (R)	
1.13	12	10	2	2	24	4.69	12.79	DUCTO	
0.65	12	10	1	2	24	4.69	3.88	DUCTO	DE SALA ESPERA A RECUPERACIÓN QUIRURGIA AMBULATORIA
0.4	12	8	1	2	24	4.69	2.33	REDUCCIÓN	
1.13	12	6	6	2	24	4.69	31.39	DUCTO	
0.5	12	6	1	2	24	4.69	2.53	CODO	
0	12	6	1	2	24	4.69	0.45	TAPA	
0.125	14.5	6	1	2	24	4.69	1.05	ZAPATO (T)	
0.075	12	6	1	2	24	4.69	0.71	ZAPATO (R)	
0.72	12	6	1	2	24	4.69	3.47	DUCTO	
0	12	6	1	2	24	4.69	0.45	TAPA	
0.15	14.5	6	1	2	24	4.69	1.17	ZAPATO (T)	SALA ESPERA
0.35	12	6	1	2	24	4.69	1.89	ZAPATO (R)	
1.13	12	6	1	2	24	4.69	5.23	DUCTO	
0.61	12	6	1	2	24	4.69	3.00	DUCTO	
0	12	6	1	2	24	4.69	0.45	TAPA	
0.66	22	12	1	2	24	4.69	6.08	CODO	SALA ESPERA
SISTEMA DE SUMINISTRO (8)									
1.13	22	12	7	2	24	4.69	69.18	DUCTO (BUITRON)	
0.5	22	12	2	2	24	4.69	9.56	CODO	
0.57	22	12	1	2	24	4.69	5.35	DUCTO	
1.13	22	12	3	2	24	4.69	29.65	DUCTO	
0.5	22	12	3	2	24	4.69	14.34	CODO	
1.13	22	12	6	2	24	4.69	59.30	DUCTO	
0.3	22	12	2	2	24	4.69	6.32	DUCTO	
1.13	22	12	3	2	24	4.69	29.65	DUCTO	
0.5	22	12	2	2	24	4.69	9.56	CODO	
0.8	22	12	1	2	24	4.69	7.21	DUCTO	
1.13	22	12	2	2	24	4.69	19.77	DUCTO	
0.53	21	12	1	2	24	4.69	4.87	REDUCCIÓN	
0.51	20	12	1	2	24	4.69	4.57	DUCTO	
1.13	20	12	3	2	24	4.69	27.90	DUCTO	
0.52	15	11	1	2	24	4.69	3.78	REDUCCIÓN	
1.13	10	8	4	2	24	4.69	20.93	DUCTO	
0.52	10	8	1	2	24	4.69	2.62	DUCTO	
0.15	11.5	5	1	2	24	4.69	0.94	ZAPATO	
0.05	9	5	1	2	24	4.69	0.47	ZAPATO	
0.2	9	5	1	2	24	4.69	0.97	DUCTO	
1.13	9	5	2	2	24	4.69	8.14	DUCTO	
0	9	5	1	2	24	4.69	0.32	TAPA	
0.15	12	6	1	2	24	4.69	1.03	ZAPATO	
0.4	9	6	1	2	24	4.69	1.75	ZAPATO	
0.6	9	6	1	2	24	4.69	2.47	DUCTO	
0.4	9	6	1	2	24	4.69	1.75	CODO	
1.13	9	6	1	2	24	4.69	4.36	DUCTO	
0.6	9	6	1	2	24	4.69	2.47	DUCTO	
0	9	6	1	2	24	4.69	0.36	TAPA	
0.15	16.5	8	1	2	24	4.69	1.40	ZAPATO	
0.4	14	8	1	2	24	4.69	2.57	ZAPATO	
1.13	14	8	1	2	24	4.69	6.39	DUCTO	
0.52	14	8	1	2	24	4.69	3.20	DUCTO	
0	14	8	1	2	24	4.69	0.61	TAPA	
0.15	14.5	9	1	2	24	4.69	1.34	ZAPATO	
0.38	12	9	1	2	24	4.69	2.35	ZAPATO	
1.13	12	9	4	2	24	4.69	24.42	DUCTO	
0	12	9	1	2	24	4.69	0.59	TAPA	
0.15	11.5	5	1	2	24	4.69	0.94	ZAPATO	
0.37	9	5	1	2	24	4.69	1.53	ZAPATO	FRENTE A QUIRURGICOS 2 Y 1
0	9	5	3	2	24	4.69	0.97	DUCTO	
0	9	5	1	2	24	4.69	0.32	TAPA	
SISTEMA DE RETORNO (1)									
0.45	17	12	1	2	24	4.69	3.73	ducto	
0.111	12	17	1	2	24	4.69	1.39	desvio	
1.13	17	12	14	2	24	4.69	118.01	ducto	
0.58	17	12	3	2	24	4.69	13.89	codo	
0.35	17	12	1	2	24	4.69	3.04	ajuste	
0.52	15.5	12	1	2	24	4.69	4.00	reduccion	
1.13	14	12	1	2	24	4.69	7.56	ducto	













0.75	14	12	1	2	24	4.69	5.20	ajuste	
0.52	14	12	1	2	24	4.69	3.78	reducion	
1.13	13	12	2	2	24	4.69	14.53	ducto	
0.52	13	11.5	1	2	24	4.69	3.56	reducion	
0.74	13	11	1	2	24	4.69	4.75	ajuste	
0.5	13	11	1	2	24	4.69	3.37	codo	
1.13	13	11	4	2	24	4.69	27.90	ducto	
0.52	13	9.5	1	2	24	4.69	3.27	reducion	
1.13	13	8	7	2	24	4.69	42.73	ducto	
0	13	8	1	2	24	4.69	0.58	tapa	
0.13	14	6	1	2	24	4.69	1.05	zapato	
0.07	11	6	2	2	24	4.69	1.30	zapto	
1.13	11	6	4	2	24	4.69	19.77	ducto	
0.4	9.5	6	1	2	24	4.69	1.81	reducion	
0.4	8	6	1	2	24	4.69	1.63	codo	
1.13	8	6	3	2	24	4.69	12.21	ducto	
1.13	8	6	2	2	24	4.69	8.14	ducto	
0.4	8	3	1	2	24	4.69	1.28	reducion	
1.13	8	4	10	2	24	4.69	34.88	ducto	
0.4	8	4	1	2	24	4.69	1.40	codo	
0.15	10.5	4	1	2	24	4.69	0.83	zapato	
0.05	8	4	1	2	24	4.69	0.40	zapato	
1.13	8	4	7	2	24	4.69	24.42	ducto	
0.52	8	4	1	2	24	4.69	1.74	ajuste	
0	8	4	1	2	24	4.69	0.26	tapa	
0.15	10.5	6	1	2	24	4.69	0.94	zapato	
0.05	8	6	1	2	24	4.69	0.47	zapato	
1.13	8	6	4	2	24	4.69	16.28	ducto	
0.3	8	3	1	2	24	4.69	1.02	reducion	
1.13	8	4	3	2	24	4.69	10.46	ducto	
0	8	4	1	2	24	4.69	0.26	tapa	
0.46	13	12	1	2	24	4.69	3.28	DUCTO	RECUPERACIÓN PARTOS
0.5	13	12	2	2	24	4.69	7.03	DUCTO	
0.77	13	12	1	2	24	4.69	5.12	DUCTO	
0.33	17	12	1	2	24	4.69	2.90	DUCTO	PASILLO UCI NEO
0.35	17	12	2	2	24	4.69	6.08	DUCTO	
0.54	17	12	1	2	24	4.69	4.35	DUCTO	
0.13	8.5	6	1	2	24	4.69	0.76	ZAPATO	
0.07	6	66	1	2	24	4.69	2.74	ZAPATO	
1.13	6	6	1	2	24	4.69	3.49	DUCTO	TRABAJO SUCIO RECUPERACIÓN PARTO A WC RECUPERACIÓN PARTO
0.3	6	5	1	2	24	4.69	1.02	REDUCCIÓN	
1.09	6	4	1	2	24	4.69	2.81	DUCTO	
1.13	6	4	1	2	24	4.69	2.91	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4.69	0.22	TAPA	
SISTEMA DE RETORNO UMA (1)									
1.13	12	10	13	2	24	4.69	83.13	DUCTO (AISLADO)	FRENTE A QUIROFANOS 1 - 2 - 3
SISTEMA DE RETORNO (2)									
0.45	10	15	1	2	24	4.69	3.22	codo	
1.13	15	10	2	2	24	4.69	14.53	ducto	
0.4	10.5	8	1	2	24	4.69	2.16	reducion	
11.3	6	6	2	2	24	4.69	65.13	ducto	
0.52	6	6	1	2	24	4.69	1.74	ducto	
0.3	6	6	1	2	24	4.69	1.12	reducion	
0.36	6	6	1	2	24	4.69	1.29	ducto	
1.13	6	6	1	2	24	4.69	3.49	ducto	
0.67	6	6	1	2	24	4.69	2.17	ducto	
0.4	6	5	1	2	24	4.69	1.28	codo	
1.13	6	4	1	2	24	4.69	2.91	ducto	
	6	4	1	2	24	4.69	0.22	ajuste	
0.52	10	9	1	2	24	4.69	2.76	reducion	
1.3	12	8	7	2	24	4.69	46.36	ducto	
1.13	12	8	3	2	24	4.69	17.44	tapa	
0.61	12	8	3	2	24	4.69	10.01	reducion	
0.52	12	8	1	2	24	4.69	2.91	ducto	
0.44	12	8	1	2	24	4.69	2.53	ducto	
0.5	11	8	1	2	24	4.69	2.67	ajuste	
0.83	10	8	1	2	24	4.69	3.95	ajuste	
0.44	10	8	1	2	24	4.69	2.27	codo	
1.13	10	8	2	2	24	4.69	10.46	reducion	
0.37	10	7	1	2	24	4.69	1.86	reducion	
1	10	6	1	2	24	4.69	4.16	ducto	
0.4	8	6	1	2	24	4.69	1.63	reducion	
0.52	6	6	1	2	24	4.69	1.74	ducto	
0.4	6	6	1	2	24	4.69	1.40	codo	
1.13	6	6	1	2	24	4.69	3.49	ducto	
0	6	6	1	2	24	4.69	0.28	tapa	
0.15	8.5	4	1	2	24	4.69	0.71	zapato	
0.05	6	4	1	2	24	4.69	0.33	zapato	
1.13	6	4	1	2	24	4.69	2.91	ducto	
0.38	6	4	1	2	24	4.69	1.12	codo	
0.15	8.5	4	1	2	24	4.69	0.71	ZAPATO	
0.05	6	4	1	2	24	4.69	0.33	ZAPATO	
1.13	6	4	1	2	24	4.69	2.91	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4.69	0.22	TAPA	UCI NEONATAL - TRABAJO LIMPIO Y SUCIO
0.13	12.5	4	1	2	24	4.69	0.86	ZAPATO	
0.26	10	4	1	2	24	4.69	1.17	ZAPATO	
0.93	10	4	1	2	24	4.69	3.40	DUCTO	
1.13	10	4	1	2	24	4.69	4.07	DUCTO	
0.42	10	4	1	2	24	4.69	1.70	DUCTO	CUARTO EQUIPOS
0.52	10	4	1	2	24	4.69	2.03	DUCTO	
0.36	10	4	1	2	24	4.69	1.50	DUCTO	
1.13	10	4	3	2	24	4.69	12.21	DUCTO	
0.52	10	4	1	2	24	4.69	2.03	DUCTO	DE ROPA SUCIA A TRABAJO SUCIO
0.6	10	4	1	2	24	4.69	2.30	DESVIO	
0.52	10	4	1	2	24	4.69	2.03	DUCTO	
0.52	9	4	1	2	24	4.69	1.89	REDUCCIÓN	
1.13	8	4	2	2	24	4.69	6.98	DUCTO	TRABAJO SUCIO
0.68	12	10	1	2	24	4.69	4.04	DESVIO	
0.52	12	10	1	2	24	4.69	3.20	DUCTO	FRENTE ASCENSOR
0.45	12	10	1	2	24	4.69	2.83	CODO	
0.15	8.5	4	1	2	24	4.69	0.71	ZAPATO	ASEO
0.38	6	4	1	2	24	4.69	1.12	ZAPATO	
0	6	4	1	2	24	4.69	0.22	TAPA	
0.58	17	12	1	2	24	4.69	4.63	CODO	
0.73	17	12	1	2	24	4.69	5.67	DUCTO	VESTIER PACIENTES
1.13	17	12	1	2	24	4.69	8.43	DUCTO	
0.6	10	4	1	2	24	4.69	2.30	DESVIO	
0.52	8	6	1	2	24	4.69	2.03	DESVIO	
SISTEMA DE EXTRACCION - REGILLAS SOBREPUESTAS									
0.52	60	20	1	2	18	10.10	25.04	DUCTO	VESTIER PACIENTES
1.13	60	20	1	2	18	10.10	50.08	DUCTO	
1.25	60	20	1	2	18	10.10	55.00	DESVIO	
1.13	33	33	6	2	18	10.10	247.88	DUCTO	DE 2DO A TERRAZA
0.52	33	33	1	2	18	10.10	20.66	DUCTO	
0	33	33	1	2	18	10.10	4.04	TAPA	
1.13	48	20	6	2	18	10.10	255.39	DUCTO	POR BUITRON A TERRAZA
0.52	48	20	1	2	18	10.10	21.28	AJUSTE	
1.13	28	12	7	2	24	4.69	81.39	DUCTO	
0.515	28	12	2	2	24	4.69	11.53	CODO	
SISTEMA DE RETORNO UMA (2)									
1.13	12	10	4	2	24	4.69	25.58	DUCTO (AISLADO)	QUIROFANO 1 (INTERNO)
SISTEMA DE RETORNO UMA (3)									
1.13	12	10	4	2	24	4.69	25.58	DUCTO (AISLADO)	QUIROFANO 1 (INTERNO)
1.13	12	10	8	2	24	4.69	51.16	DUCTO (AISLADO)	SALA PARTOS 2 A SALA PARTO 1
0	12	10	1	2	24	4.69	0.64	TAPA (AISLADO)	
SISTEMA DE RETORNO UMA (4)									
1.13	12	10	4	2	24	4.69	25.58	DUCTO (AISLADO)	SALA PARTOS 2
0	12	10	1	2	24	4.69	0.64	TAPA (AISLADO)	
PISO 3									
SISTEMA DE SUMINISTRO (1)									
0.5	18	14	1	2	24	4.69	4.50	CODO	
1.13	18	14	7	2	24	4.69	65.11	DUCTO	
0.5	18	14	1	2	24	4.69	4.50	CODO	
0.4	16	13	1	2	24	4.69	3.39	REDUCCIÓN	
0.52	14	12	1	2	24	4.69	3.78	DUCTO	
0.2	14	12	1	2	24	4.69	1.80	DUCTO	
1.13	14	12	2	2	24	4.69	15.11	DUCTO	
0.52	14	11	1	2	24	4.69	3.63	REDUCCIÓN	
1.13	14	10	3	2	24	4.69	20.93	DUCTO	
0.52	13	10	1	2	24	4.69	3.34	REDUCCIÓN	
1.13	12	10	3	2	24	4.69	19.18	DUCTO	
0.52	10.5	7.5	1	2	24	4.69	2.62	REDUCCIÓN	
1.13	9	5	2	2	24	4.69	8.14	DUCTO	
0.52	9	5	1	2	24	4.69	2.03	DUCTO	
0.42	9	5	1	2	24	4.69	1.70	CODO	
0	9	5	1	2	24	4.69	0.32	TAPA	
0.15	14.5	6	1	2	24	4.69	1.17	ZAPATO	
0.05	12	6	1	2	24	4.69	0.60	ZAPATO	
0.8	12	6	1	2	24	4.69	3.82	DUCTO	
0	12	6	1	2	24	4.69	0.45	TAPA	
0.15	11.5	5	5	2	24	4.69	4.72	ZAPATO	
0.05	9	5	5	2	24	4.69	2.33	ZAPATO	
1.13	9	5	10	2	24	4.69	40.69	DUCTO	
0	9	5	6	2	24	4.69	1.95	TAPA	
0.12	14.5	6	1	2	24	4.69	1.03	ZAPATO (T)	
0.08	12	6	1	2	24	4.69	0.73	ZAPATO (R)	CAMAS UCI PEDIATRICA
0.72	12	6	1	2	24	4.69	3.47	DUCTO	
0	12	6	1	2	24	4.69	0.45	TAPA	
1.13	18	14	1	2	24	4.69	9.30	DUCTO	SUBE: PRINCIPAL CAMA 1 UCI PEDIATRICA
SISTEMA DE SUMINISTRO (2)									
1.13	16	14	1	2	24	4.69	8.72	DUCTO	
0.52	16	13	1	2	24	4.69	4.21	REDUCCIÓN	
1.13	16	12	2	2	24	4.69	16.28	DUCTO	
0.2	16	12	1	2	24	4.69	1.93	DUCTO	
0.52	15	12	1	2	24	4.69	3.92	REDUCCIÓN	
1.13	14	12	2	2	24	4.69	15.11	DUCTO	
0.7	14	12	1	2	24	4.69	4.89	DUCTO	
0.52	14	11	1	2	24	4.69	3.63	REDUCCIÓN	
1.13	14	10	1	2	24	4.69	6.98	DUCTO	
0.52	12	10	1	2	24	4.69	3.20	REDUCCIÓN	
1.13	10	10	1	2	24	4.69	5.81	DUCTO	
0.5	10	9	1	2	24	4.69	2.67	REDUCCIÓN	














1.13	10	8	2	2	24	4.69	10.46	DUCTO	
0.73	10	8	1	2	24	4.69	3.52	DUCTO	
0.52	9.5	6.5	1	2	24	4.69	2.33	REDUCCIÓN	
1.13	9	5	2	2	24	4.69	8.14	DUCTO	
0.7	9	5	1	2	24	4.69	2.64	DUCTO	
0.52	16	14	1	2	24	4.69	4.36	CODO	SUBE: PRINCIPAL EN CAMA 1 DE UCI PEDIATRICA
0.35	16	14	1	2	24	4.69	3.14	DUCTO	
0.58	14	14	1	2	24	4.69	4.47	DUCTO	
0.15	11	5	5	2	24	4.69	4.57	ZAPATO (T)	
0.05	9	5	5	2	24	4.69	2.33	ZAPATO (R)	
0	9	5	5	2	24	4.69	1.62	TAPA	
0.72	9	5	1	2	24	4.69	2.70	DUCTO	
0.73	9	5	1	2	24	4.69	2.74	DUCTO	
0.76	9	5	1	2	24	4.69	2.84	DUCTO	
0.82	9	5	1	2	24	4.69	3.04	DUCTO	
0.8	9	5	1	2	24	4.69	2.97	DUCTO	
0.42	9	5	1	2	24	4.69	1.70	CODO	CAMAS UCI PEDIATRICA
0.87	9	5	1	2	24	4.69	3.20	DUCTO	
0	9	5	1	2	24	4.69	0.32	TAPA	
0.52	9	5	1	2	24	4.69	2.03	DUCTO	
0.15	9	5	1	2	24	4.69	0.80	ZAPATO (T)	
0.05	9	5	1	2	24	4.69	0.47	ZAPATO (R)	
1.13	9	5	1	2	24	4.69	4.07	DUCTO	
0.87	9	5	1	2	24	4.69	3.20	DUCTO	
0	9	5	1	2	24	4.69	0.32	TAPA	
SISTEMA DE SUMINISTRO (3)									
1.13	12	10	3	2	24	4.69	19.18	DUCTO	
0.52	12	8	1	2	24	4.69	2.91	REDUCCIÓN	
1.13	12	6	5	2	24	4.69	26.16	DUCTO	
0.46	10	5.5	1	2	24	4.69	2.03	REDUCCIÓN	
1.13	8	5	1	2	24	4.69	3.78	DUCTO	
1.13	8	5	1	2	24	4.69	3.78	DUCTO	
0.62	8	5	1	2	24	4.69	2.20	DUCTO	DESCANSO Y VESTIER FRENTE A INFOR. FAMILIARES UCI-P
0.39	8	5	1	2	24	4.69	1.49	CODO	
0.52	5	8	1	2	24	4.69	1.89	DESVIO	
SISTEMA DE SUMINISTRO (4)									
0.5	19	14	1	2	24	4.69	4.64	CODO	
1.13	19	14	2	2	24	4.69	19.18	DUCTO	
0.52	18	14	1	2	24	4.69	4.65	REDUCCIÓN	
1.13	17	14	4	2	24	4.69	36.04	DUCTO	
0.52	16.5	12	1	2	24	4.69	4.14	REDUCCIÓN	
1.13	14	10	4	2	24	4.69	27.90	DUCTO	
0.52	12	10	1	2	24	4.69	3.20	REDUCCIÓN	
1.13	10	10	4	2	24	4.69	23.25	DUCTO	
0	10	10	1	2	24	4.69	0.55	TAPA	
1.13	19	14	2	2	24	4.69	19.18	DUCTO	SUBE - LUDOTECA
0.15	14.5	5	4	2	24	4.69	4.46	ZAPATO	
0.05	12.5	5	4	2	24	4.69	2.33	ZAPATO	
0.52	12.5	5	2	2	24	4.69	5.09	DUCTO	
1.13	12	5	6	2	24	4.69	29.65	DUCTO	
0	12	5	6	2	24	4.69	2.41	TAPA	LUDOTECA
0.15	11	6	1	2	24	4.69	0.97	ZAPATO	
0.05	9	6	1	2	24	4.69	0.50	ZAPATO	
1.13	9	6	2	2	24	4.69	8.72	DUCTO	
0	9	6	1	2	24	4.69	0.36	TAPA	
SISTEMA DE SUMINISTRO (5)									
1.13	16	12	3	2	24	4.69	24.42	DUCTO	
0.52	14	11.5	1	2	24	4.69	3.71	REDUCCIÓN	
0.38	12	9	1	2	24	4.69	2.35	DUCTO	
1.13	12	9	3	2	24	4.69	18.31	DUCTO	
0.52	12	7.5	1	2	24	4.69	2.83	REDUCCIÓN	
1.13	12	6	5	2	24	4.69	26.16	DUCTO	
0.17	14.5	9	1	2	24	4.69	1.46	ZAPATO (T)	
0.38	12	9	1	2	24	4.69	2.35	ZAPATO (R)	
1.13	12	9	2	2	24	4.69	12.21	DUCTO	
0.73	12	9	1	2	24	4.69	4.10	DUCTO	ENTRA: EXTRACCIÓN DE LECHE MATERNA
0.4	12	8	1	2	24	4.69	2.33	REDUCCIÓN	
0.42	12	7	1	2	24	4.69	2.31	CODO	
1.13	12	7	1	2	24	4.69	5.52	DUCTO	
0	12	7	1	2	24	4.69	0.50	TAPA	
0.14	11	6	1	2	24	4.69	0.93	ZAPATO (T)	
0.07	9	6	1	2	24	4.69	0.57	ZAPATO (R)	ENTRA: PREPARACIÓN DE FORMULAS
1.13	9	6	1	2	24	4.69	4.36	DUCTO	
0.52	9	6	1	2	24	4.69	2.18	DUCTO	
0	9	6	1	2	24	4.69	0.36	TAPA	
1.13	12	6	1	2	24	4.69	5.23	DUCTO	
0.5	12	6	1	2	24	4.69	2.53	CODO	
0.55	12	6	1	2	24	4.69	2.74	DUCTO	ENTRA: DESCANSO ENFERMERIA
1	12	6	1	2	24	4.69	4.67	DESVIO	
0.4	10.5	6	1	2	24	4.69	1.93	REDUCCIÓN	
1.13	9	6	2	2	24	4.69	8.72	DUCTO	
0	9	6	2	2	24	4.69	0.72	TAPA	
0.15	14.5	6	1	2	24	4.69	1.17	ZAPATO (T)	
0.05	12	6	1	2	24	4.69	0.60	ZAPATO (R)	
0.52	12	6	1	2	24	4.69	2.62	DUCTO	ENTRA: INFORMACIÓN FAMILIARES
1.13	12	6	1	2	24	4.69	5.23	DUCTO	
0.12	10.5	5	1	2	24	4.69	0.78	ZAPATO (T)	
0.08	8	5	1	2	24	4.69	0.53	ZAPATO (R)	
0.74	8	5	1	2	24	4.69	2.57	DUCTO	
0	8	5	1	2	24	4.69	0.30	TAPA	
0.34	10.5	6	1	2	24	4.69	1.69	REDUCCIÓN	
1.13	9	6	2	2	24	4.69	8.72	DUCTO	ENTRA: COORDINACIÓN PEDIATRIA
0.42	9	6	1	2	24	4.69	1.82	CODO	
0	9	6	1	2	24	4.69	0.36	TAPA	
1.13	16	12	1	2	24	4.69	8.14	DUCTO	PASILLO FRENTE A COORD. UCI-P
SISTEMA DE SUMINISTRO (6)									
1.13	12	8	2	2	24	4.69	11.63	DUCTO	
0.5	12	8	1	2	24	4.69	2.81	CODO	
0.52	11	8	1	2	24	4.69	2.76	REDUCCIÓN	
1.13	10	8	4	2	24	4.69	20.93	DUCTO	PASILLO TÉCNICO - UCI PEDIATRICA
0.52	9	6.5	1	2	24	4.69	2.25	REDUCCIÓN	
1.13	8	5	3	2	24	4.69	11.34	DUCTO	
0.3	4.5	7	1	2	24	4.69	1.07	REDUCCIÓN	
1.13	6	4	1	2	24	4.69	2.91	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4.69	0.22	TAPA	
0.15	10.5	4	1	2	24	4.69	0.83	ZAPATO (T)	
0.05	8	4	1	2	24	4.69	0.40	ZAPATO (R)	TRASNFER MÉDICAMENTOS
1.13	8	4	2	2	24	4.69	6.98	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4.69	0.26	TAPA	
SISTEMA DE RETORNO (1)									
1.13	10	8	10	2	24	4.69	52.32	DUCTO	
0.4	10	8	1	2	24	4.69	2.10	CODO	
0.75	10	8	1	2	24	4.69	3.60	DUCTO	
0.52	10	6.5	1	2	24	4.69	2.40	REDUCCIÓN	
0.52	11	9	1	2	24	4.69	2.91	REDUCCIÓN	
1.13	12	10	1	2	24	4.69	6.39	DESVIO	ACCESO - LUDOTECA
1.13	12	10	1	2	24	4.69	6.39	DUCTO	
0.76	12	10	1	2	24	4.69	4.46	DUCTO	
1.13	10	8	2	2	24	4.69	10.46	DUCTO	
0.15	10.5	4	1	2	24	4.69	0.83	ZAPATO (T)	ENTRA A DEPOSITO DE INSUMOS
0.08	8	4	1	2	24	4.69	0.49	ZAPATO (R)	
1.13	8	4	1	2	24	4.69	3.49	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4.69	0.26	TAPA	
0.45	10	6	1	2	24	4.69	2.06	REDUCCIÓN	
0.52	10	4	1	2	24	4.69	2.03	DUCTO	
0.7	10	4	1	2	24	4.69	2.64	DUCTO	
1.13	10	4	1	2	24	4.69	4.07	DUCTO	
1.08	10	4	1	2	24	4.69	3.90	DUCTO	
0	10	4	1	2	24	4.69	0.31	TAPA	
0.12	10.5	4	1	2	24	4.69	0.73	ZAPATO (T)	ZONA DE BAÑOS LUDOTEA
0.27	8	4	1	2	24	4.69	1.03	ZAPATO (R)	
1.13	8	4	2	2	24	4.69	6.98	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4.69	0.26	TAPA	
0.15	10.5	4	1	2	24	4.69	0.83	ZAPATO (T)	
0.05	8	4	1	2	24	4.69	0.40	ZAPATO (R)	
0.82	8	4	1	2	24	4.69	2.60	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4.69	0.26	TAPA	
0.15	10.5	4	1	2	24	4.69	0.83	ZAPATO (T)	
0.05	8	4	1	2	24	4.69	0.40	ZAPATO (R)	BODEGA - LUDOTECA
1.13	8	4	2	2	24	4.69	6.98	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4.69	0.26	TAPA	
0.15	10.5	4	1	2	24	4.69	0.83	ZAPATO (T)	
0.05	8	4	1	2	24	4.69	0.40	ZAPATO (R)	
1.13	8	4	3	2	24	4.69	10.46	DUCTO	
0.42	8	4	1	2	24	4.69	1.46	CODO	
1.13	8	4	2	2	24	4.69	6.98	DUCTO	SALE: BAÑO LUDOTECA A BAÑOS DESCANSO MÉDICO
0	8	4	1	2	24	4.69	0.26	TAPA	
0.15	10.5	4	2	2	24	4.69	1.66	ZAPATO (T)	
0.05	8	4	2	2	24	4.69	0.80	ZAPATO (R)	
0.48	8	4	2	2	24	4.69	3.26	DUCTO	
0	8	4	2	2	24	4.69	0.53	TAPA	
0.41	10	8	1	2	24	4.69	2.14	CODO	
1.13	10	8	1	2	24	4.69	5.23	DUCTO	
0.36	9	8	1	2	24	4.69	1.82	REDUCCIÓN	
1.13	8	8	3	2	24	4.69	13.95	DUCTO	
0.4	8	8	1	2	24	4.69	1.87	CODO	
0.4	8	8	1	2	24	4.69	1.87	DUCTO	
1.23	8	8	1	2	24	4.69	5.03	DUCTO	
0.4	8	8	1	2	24	4.69	1.87	CODO	
0.5	8	8	1	2	24	4.69	2.25	DUCTO	
0.72	8	8	1	2	24	4.69	3.09	DUCTO	
0.4	8	8	1	2	24	4.69	1.87	CODO	
1.13	8	8	3	2	24	4.69	13.95	DUCTO	DE LUDOTECA A ZONA ADMINISTRATIVA UCI PEDIATRICA
0.75	8	8	1	2	24	4.69	3.20	DUCTO	
0.7	8	8	1	2	24	4.69	3.01	DUCTO	
0.73	8	8	1	2	24	4.69	3.13	DUCTO	
0.15	9	4	1	2	24	4.69	0.74	ZAPATO	
0.18	6	4	1	2	24	4.69	0.64	ZAPATO	
0.35	6	4	1	2	24	4.69	1.05	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4.69	0.22	TAPA	
1.13	8	8	1	2	24	4.69	4.65	DUCTO	
0.52	8	7.5	1	2	24	4.69	2.25	REDUCCIÓN	
0.52	8	5.5	1	2	24	4.69	1.96	REDUCCIÓN	
1.13	8	4	3	2	24	4.69	10.46	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4.69	0.26	CODO	







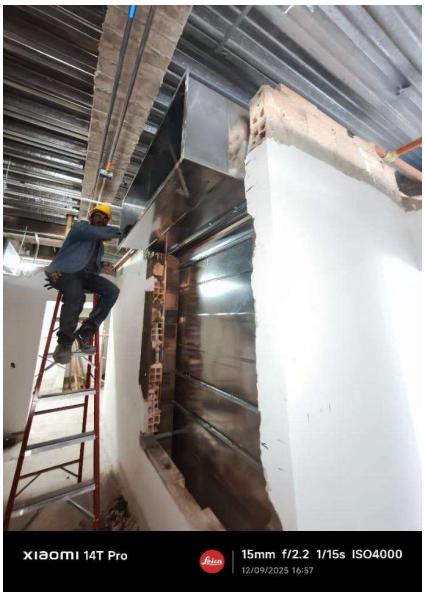



0.52	8	4	1	2	24	4.69	1.74	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4.69	0.26	TAPA	
SISTEMA DE RETORNO (2)									
1.13	21	12	8	2	24	4.69	76.74	DUCTO	
1.13	14	11	4	2	24	4.69	29.07	DUCTO	
0.52	13.5	10.5	1	2	24	4.69	3.49	REDUCCIÓN	
1.13	13	10	5	2	24	4.69	33.43	DUCTO	
0.7	13	10	1	2	24	4.69	4.33	DUCTO	
0.52	12.5	10	1	2	24	4.69	3.27	REDUCCIÓN	
1.13	12	10	5	2	24	4.69	31.97	DUCTO	
0.7	12	10	1	2	24	4.69	4.14	DUCTO	
0.52	11	9	1	2	24	4.69	2.91	REDUCCIÓN	
1.13	10	8	5	2	24	4.69	26.16	DUCTO	
0.7	10	8	1	2	24	4.69	3.39	DUCTO	
0.52	9	6	1	2	24	4.69	2.18	REDUCCIÓN	
1.13	8	4	4	2	24	4.69	13.95	DUCTO	
0.61	12	8	1	2	24	4.69	3.34	DUCTO	
0.52	10.5	8	1	2	24	4.69	2.69	REDUCCIÓN	
1.13	9	8	5	2	24	4.69	24.71	DUCTO	
0.5	9	8	1	2	24	4.69	2.39	DUCTO	
0.52	8.5	6	1	2	24	4.69	2.11	REDUCCIÓN	
1.13	8	4	5	2	24	4.69	17.44	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4.69	0.26	TAPA	
1.13	21	12	1	2	24	4.69	9.59	DUCTO	
0	21	12	1	2	24	4.69	1.15	TAPA	
0.12	14	8	1	2	24	4.69	1.10	ZAPATO	
0.29	12	8	1	2	24	4.69	1.81	DUCTO	
0.15	16.5	11	1	2	24	4.69	1.57	ZAPATO	
0.16	14	11	1	2	24	4.69	1.49	ZAPATO	
0.13	8.5	4	1	2	24	4.69	0.66	ZAPATO	
0.07	6	4	1	2	24	4.69	0.38	ZAPATO	CIRCULACIÓN RESTRINGIDA
1.13	6	4	2	2	24	4.69	5.81	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4.69	0.22	TAPA	
0.8	13	10	1	2	24	4.69	4.88	DUCTO	
1.13	13	10	2	2	24	4.69	13.37	DUCTO	
0.15	14.5	10	1	2	24	4.69	1.40	ZAPATO	
0.05	12	10	1	2	24	4.69	0.73	ZAPATO	
0.4	12	10	1	2	24	4.69	2.57	DUCTO	
0	13	10	1	2	24	4.69	0.68	TAPA	
1.13	6	4	4	2	24	4.69	11.63	DUCTO	
0.4	6	4	1	2	24	4.69	1.17	DUCTO	DESCANSO ME´DICO
0.35	6	4	1	2	24	4.69	1.05	CODO	
0	6	4	1	2	24	4.69	0.22	TAPA	
0.13	11.5	4	1	2	24	4.69	0.81	ZAPATO	
0.07	8	4	1	2	24	4.69	0.46	ZAPATO	
0.52	8	4	1	2	24	4.69	1.74	DUCTO	HABITACIÓN 301
1.13	8	4	2	2	24	4.69	6.98	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4.69	0.26	TAPA	
0.13	11.5	4	1	2	24	4.69	0.81	ZAPATO	
0.07	8	4	1	2	24	4.69	0.46	ZAPATO	
1.13	8	4	3	2	24	4.69	10.46	DUCTO	HABITACIÓN 302
0.76	8	4	1	2	24	4.69	2.43	DUCTO	
0.52	8	4	1	2	24	4.69	1.74	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4.69	0.26	TAPA	
0.35	8	4	1	2	24	4.69	1.26	CODO	HABITACIÓN 307
1.13	8	4	1	2	24	4.69	3.49	DUCTO	
1.07	8	4	1	2	24	4.69	3.32	DUCTO	
0.3	8	6	1	2	24	4.69	1.30	CODO	
0.52	8	6	1	2	24	4.69	2.03	DUCTO	
0.52	8	5	1	2	24	4.69	1.89	REDUCCIÓN	
0.4	8	5	1	2	24	4.69	1.52	DUCTO	
1.13	8	5	1	2	24	4.69	3.78	DUCTO	
0.15	10.5	4	1	2	24	4.69	0.83	ZAPATO	HABITACIONES: 310 - 311
0.05	8	4	1	2	24	4.69	0.40	ZAPATO	
0.42	8	4	1	2	24	4.69	1.46	DUCTO	
0.4	8	4	1	2	24	4.69	1.40	CODO	
0.52	8	4	1	2	24	4.69	1.74	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4.69	0.26	TAPA	
0.15	10	6	1	2	24	4.69	0.91	ZAPATO	
0.25	8	6	1	2	24	4.69	1.13	ZAPATO	
0.52	8	6	1	2	24	4.69	2.03	DUCTO	
1.13	8	6	1	2	24	4.69	4.07	DUCTO	
0.3	8	5	1	2	24	4.69	1.21	REDUCCIÓN	
0.52	8	4	1	2	24	4.69	1.74	DUCTO	HABITACIONES: 316 - 318
0	8	4	1	2	24	4.69	0.26	TAPA	
0.14	11	4	1	2	24	4.69	0.82	ZAPATO	
0.42	8	4	1	2	24	4.69	1.46	ZAPATO	
0.4	8	4	1	2	24	4.69	1.40	CODO	
0.95	8	4	1	2	24	4.69	2.97	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4.69	0.26	TAPA	
0.15	8	4	1	2	24	4.69	0.69	DUCTO	
1.13	8	4	1	2	24	4.69	3.49	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4.69	0.26	TAPA	HABITACIÓN: 324
0.15	8.5	4	1	2	24	4.69	0.71	ZAPATO	
0.3	6	4	1	2	24	4.69	0.93	ZAPATO	
0.39	6	4	1	2	24	4.69	1.14	DUCTO	
1.13	6	4	2	2	24	4.69	5.81	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4.69	0.22	TAPA	
SISTEMA DE EXTRACCION - CUARTO AISLADO									
1.13	12	10	15	2	24	4.69	95.92	DUCTO	
0.52	12	10	1	2	24	4.69	3.20	DUCTO	UCI-P AISLADO - HAB 11
1.13	12	10	1	2	24	4.69	6.39	DUCTO	
0	12	10	1	2	24	4.69	0.64	TAPA	
SISTEMA DE EXTRACCIÓN									
0.14	12	12	1	1	24	4.69	1.06	CUELLO	LUDOTECA - PUESTO ENFER.
0.14	12	12	1	1	24	4.69	1.06	CUELLO	ÁREA MUÑECOS Y JUGUETES
0.14	12	12	1	1	24	4.69	1.06	CUELLO	JUEGOS ESTIMULACIÓN
0.14	12	12	1	1	24	4.69	1.06	CUELLO	JUEGOS DE MESA
0.14	8	8	1	1	24	4.69	0.71	CUELLO	ESTAR TV
0.14	12	12	1	1	24	4.69	1.06	CUELLO	TERRAZA SOLAR
0.33	9	9	1	1	24	4.69	1.61	CUELLO	DESCANSO MÉDICO
0.33	9	9	1	1	24	4.69	1.61	CUELLO	DESCANSO ENFERMERIA
0.12	8	8	1	1	24	4.69	0.63	CUELLO	COORDINACIÓN UCI P
0.23	8	6	1	1	24	4.69	0.92	CUELLO	WC NIÑOS
0.23	8	6	1	1	24	4.69	0.92	CUELLO	WC NIÑOS
0.23	8	6	1	1	24	4.69	0.92	CUELLO	CUARTO ASEO
0.23	8	6	1	1	24	4.69	0.92	CUELLO	BAÑOS
0.23	8	6	1	1	24	4.69	0.92	CUELLO	BAÑOS
0.17	9	9	1	1	24	4.69	0.92	CUELLO	COORDINACIÓN PEDIATRIA
0.17	9	8	1	1	24	4.69	0.87	CUELLO	INFORMACIÓN FAMILIAR
0.23	9	6	1	1	24	4.69	0.98	CUELLO	WC ADULTOS
0.16	12	12	1	1	24	4.69	1.17	CUELLO	EXTRACCIÓN LECHE MATERNA
0.36	8	6	1	1	24	4.69	1.35	CUELLO	CUARTO ASEO
0.15	8	6	1	1	24	4.69	0.65	CUELLO	DEPOSITO INSUMOS
0.07	8	6	1	1	24	4.69	0.38	CUELLO	WC DESCANSO VESTIER
0.35	9	9	1	1	24	4.69	1.69	CUELLO	INFORMACIÓN FAMILIAR
0.35	9	9	1	1	24	4.69	1.69	CUELLO	CIRCULACIÓN A LUDOTECA
0.1	8	8	1	1	24	4.69	0.55	CUELLO	ACCESO ASISTENCIAL
0.12	8	6	1	1	24	4.69	0.55	CUELLO	WC ACCESO ASISTENCIAL
0.1	8	6	1	1	24	4.69	0.48	CUELLO	ROPA LIMPIA
0.15	8	6	1	1	24	4.69	0.65	CUELLO	CUARTO ESTERIL
0.12	8	6	1	1	24	4.69	0.55	CUELLO	TRABAJO SUCIO
0.12	8	6	1	1	24	4.69	0.55	CUELLO	TRABAJO LIMPIO
0.26	6	6	1	1	24	4.69	0.87	CUELLO	INFORMACIÓN
0.26	9	9	1	1	24	4.69	1.31	CUELLO	CIRCULACIÓN A INFORMACIÓN
0.2	9	9	1	1	24	4.69	1.05	CUELLO	CIRCULACIÓN A INFORMACIÓN
0.15	9	9	1	1	24	4.69	0.84	CUELLO	UCI-P 02
0.19	9	9	1	1	24	4.69	1.01	CUELLO	UCI-P 04
0.18	9	9	1	1	24	4.69	0.96	CUELLO	UCI-P 06
0.15	9	9	1	1	24	4.69	0.84	CUELLO	UCI-P 08
13	9	9	1	1	24	4.69	55.94	CUELLO	UCI-P 10
0.13	9	9	1	1	24	4.69	0.75	CUELLO	UCI-P 12
0.14	12	12	1	1	24	4.69	1.06	CUELLO	CIRCULACIÓN UCIP
0.35	12	12	1	1	24	4.69	2.26	CUELLO	CIRCULACIÓN UCIP
0.14	12	12	1	1	24	4.69	1.06	CUELLO	CIRCULACIÓN UCIP
0.34	9	9	1	1	24	4.69	1.65	CUELLO	UCI-P 01
0.37	9	9	1	1	24	4.69	1.78	CUELLO	UCI-P 03
0.36	9	9	1	1	24	4.69	1.74	CUELLO	UCI-P 05
0.37	9	9	1	1	24	4.69	1.78	CUELLO	UCI-P 07
0.36	9	9	1	1	24	4.69	1.74	CUELLO	UCI-P 09
0.6	14	10	1	1	24	4.69	3.69	CUELLO	UCI-P 11
SOTANO									
SISTEMA DE RETORNO (1)									
0.7	57	14	1	2	**18**	10.10	28.78	DUCTO	
1.13	57	14	1	2	**18**	10.10	44.44	DUCTO	
0.55	56	13	1	2	**18**	10.10	22.66	REDUCCIÓN	
1.13	56	12	9	2	**18**	10.10	383.09	DUCTO	
0.52	48.5	12	1	2	**18**	10.10	18.94	REDUCCIÓN	
1.13	42	12	15	2	**18**	10.10	507.03	DUCTO	PARQUADEROS: 28 - 27 - 26 - 25 A PARQUEADERO 13
0.52	31.5	12	1	2	**18**	10.10	13.61	REDUCCIÓN	
1.13	21	12	5	2	24	4.69	47.96	DUCTO	
0.12	24.5	10	1	2	24	4.69	1.73	ZAPATO	
0.16	22	10	1	2	24	4.69	1.91	ZAPATO	
1.13	22	10	6	2	24	4.69	55.81	DUCTO	
0.54	22	10	1	2	24	4.69	4.80	DUCTO	
0.52	17	10	1	2	24	4.69	3.92	REDUCCIÓN	
1.13	12	10	3	2	24	4.69	19.18	DUCTO	
0.38	15	10	1	2	24	4.69	2.80	DUCTO	
1.13	15	10	1	2	24	4.69	7.27	DUCTO	
0.84	15	10	1	2	24	4.69	5.54	DUCTO	
1.13	15	10	5	2	24	4.69	36.33	DUCTO	
0.53	15	10	1	2	24	4.69	3.69	DUCTO	PARQUEADEROS: 33 -36 A BODEGA DE SERVICIOS GENERALES
0.35	12.5	9	1	2	24	4.69	2.25	REDUCCIÓN	
1.13	10	8	5	2	24	4.69	26.16	DUCTO	
0.44	10	8	1	2	24	4.69	2.27	CODO	
1.13	10	8	4	2	24	4.69	20.93	DUCTO	
0.13	12.5	8	1	2	24	4.69	1.07	ZAPATO	
0.07	10	8	1	2	24	4.69	0.69	ZAPATO	
0.4	12	8	1	2	24	4.69	2.33	DUCTO	
1.13	12	8	1	2	24	4.69	5.81	DUCTO	



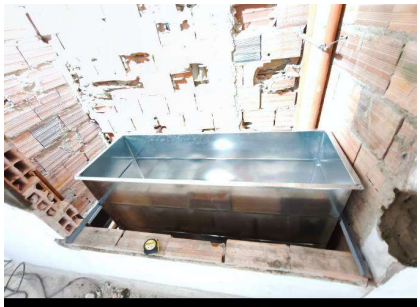



0.6	12	8	1	2	24	4.69	3.29	DUCTO	FRENTE A CUARTO ELÉCTRICO A DEP. CADAVERES
1.13	12	8	7	2	24	4.69	40.69	DUCTO	
0.57	12	8	1	2	24	4.69	3.14	DUCTO	
0.3	11	7	1	2	24	4.69	1.67	REDUCCIÓN	
0.52	10	6	1	2	24	4.69	2.33	DUCTO	
0.86	10	6	1	2	24	4.69	3.62	DUCTO	
0.18	8.5	4	1	2	24	4.69	0.80	ZAPATO	BIENESTAR A HALL Y DEP. ALMACEN
0.36	6	4	1	2	24	4.69	1.07	ZAPATO	
1.13	6	4	13	2	24	4.69	37.79	DUCTO	
0.36	6	4	1	2	24	4.69	1.07	CODO	
0.6	6	4	1	2	24	4.69	1.64	DUCTO	
0.36	6	4	1	2	24	4.69	1.07	CODO	
0.52	9	6	1	2	24	4.69	2.18	REDUCCIÓN	
1.13	8	4	1	2	24	4.69	3.49	DUCTO	DEPARTAMENTO BIOMEDICO
0	8	4	1	2	24	4.69	0.26	TAPA	
0.15	10.5	4	2	2	24	4.69	1.66	ZAPATO	
0.37	8	4	2	2	24	4.69	2.63	ZAPATO	
0	8	4	2	2	24	4.69	0.53	TAPA	
1.13	10	8	4	2	24	4.69	20.93	DUCTO	TALLER MANTENIMIENTO
0	10	8	1	2	24	4.69	0.47	TAPA	
0.15	12.5	4	1	2	24	4.69	0.94	ZAPATO	
0.05	10	4	1	2	24	4.69	0.47	ZAPATO	
0.52	10	4	1	2	24	4.69	2.03	DUCTO	
0.52	10	6	1	2	24	4.69	2.33	REDUCCIÓN	
0.52	10	5	1	2	24	4.69	2.18	DUCTO	CONSULTORIO DE DIETAS A CUARTO ASEO Y BAÑO
1.13	10	5	9	2	24	4.69	39.24	DUCTO	
0.52	8	5	1	2	24	4.69	1.89	REDUCCIÓN	
1.13	8	5	1	2	24	4.69	3.78	DUCTO	
0.95	8	5	1	2	24	4.69	3.22	DUCTO	
0	8	5	1	2	24	4.69	0.30	TAPA	
0.15	10.5	4	1	2	24	4.69	0.83	ZAPATO	
0.37	8	4	1	2	24	4.69	1.32	ZAPATO	
0	8	4	1	2	24	4.69	0.26	TAPA	
0.15	8.5	5	1	2	24	4.69	0.77	ZAPATO	
0.37	6	5	1	2	24	4.69	1.21	ZAPATO	
1.13	6	5	1	2	24	4.69	3.20	DUCTO	
0	6	5	1	2	24	4.69	0.25	TAPA	
0.13	17.5	10	1	2	24	4.69	1.44	ZAPATO	PARQUEADERO 29 A 26
0.38	15	10	1	2	24	4.69	2.80	ZAPATO	
1.13	15	10	1	2	24	4.69	7.27	DUCTO	
0	15	10	1	2	24	4.69	0.76	TAPA	
0.175	20	10	2	1	24	4.69	3.14	CUELLO	
0.17	17.5	10	1	2	24	4.69	1.70	ZAPATO	
0.38	15	10	1	2	24	4.69	2.80	ZAPATO	
1.13	15	10	1	2	24	4.69	7.27	DUCTO	
0	15	10	1	2	24	4.69	0.76	TAPA	
0.175	20	10	2	1	24	4.69	3.14	CUELLO	PARQUEADEROS: 48, 35, 17
0.175	20	10	2	1	24	4.69	3.14	CUELLO	
0.175	20	10	2	1	24	4.69	3.14	CUELLO	
0.13	17.5	10	1	2	24	4.69	1.44	ZAPATO	
0.54	15	10	1	2	24	4.69	3.75	ZAPATO	
1.13	15	10	1	2	24	4.69	7.27	DUCTO	
0	15	10	1	2	24	4.69	0.76	TAPA	
0.175	20	10	2	1	24	4.69	3.14	CUELLO	
FACHADA ORIENTAL									
SISTEMA DE SUMINISTRO (1)									
1.13	20	12	8	2	24	4.69	74.41	DUCTO	ENTRE EJES G Y H
0.515	12	20	2	2	24	4.69	9.23	CODO	
SISTEMA DE SUMINISTRO (1)									
1.13	21	12	8	2	24	4.69	76.74	DUCTO	ENTRE EJES E Y F
0.515	12	21	2	2	24	4.69	9.51	CODO	
SISTEMA DE SUMINISTRO (3)									
0.66	22	12	2	2	24	4.69	12.15	CODO	ENTRE EJES E - D
0.46	12	22	2	2	24	4.69	8.91	CODO	
1.13	22	12	6	2	24	4.69	59.30	DUCTO	
SISTEMA DE SUMINISTRO (4)									
0.46	21	12	2	2	24	4.69	8.65	CODO	ENTRE EJES C - B
1.13	21	12	7	2	24	4.69	67.14	DUCTO	

OBSERVACIONES:

	TOTAL	**13,136.98 Kilogramo**
	ACUMULADO ANTERIOR	**8,924.57 Kilogramo**
	PRESENTE ACTA	**4,212.42 Kilogramo**

Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó Interventoria:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	NP 38	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VÍAS DE 8" X 8" , TIPO ALETA FIJA IGUALES O SIMILARES A LA REFERENCIA L-JS DE LAMINAIRE CON CONTROL DE VOLUMEN DE HOJAS MÚLTIPLES OPUESTAS OPERADAS POR UN SISTEMA DE PIÑÓN. INCLUYE: ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	CAP	10.00	ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico







Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
		PISO 1				
N/A	N/A	N/A	1	50%	0.5	LABORATORIO
N/A	N/A	N/A	1	50%	0.5	TOMA DE MUESTRAS
N/A	N/A	N/A	1	50%	0.5	TOMA DE MUESTRAS GINECOLOGICAS
N/A	N/A	N/A	1	50%	0.5	RECIBO Y ENTRAGA DE MUESTRAS
N/A	N/A	N/A	2	50%	1	FARMACIA ENTREGA
N/A	N/A	N/A	1	50%	0.5	TRIAGE 2

OBSERVACIONES: SE CONTEMPLA SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CIERTAS ZONAS

TOTAL	3.50	Unidad
ACUMULADO ANTERIOR	0.00	Unidad
PRESENTE ACTA	3.50	Unidad

Elaboró contratista:	Estefania Carvajal Henao	FIRMA:
Aprobó Interventoria:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	NP 39	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VÍAS DE 9" X 9" , TIPO ALETA FIJA IGUALES O SIMILARES A LA REFERENCIA L-JS DE LAMINAIRE CON CONTROL DE VOLUMEN DE HOJAS MÚLTIPLES OPUESTAS OPERADAS POR UN SISTEMA DE PIÑÓN. INCLUYE: ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	CAP	10.00	ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico






Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
PISO 1						
N/A	N/A	N/A	57	50%	28.50	SUMINISTRO

OBSERVACIONES: SE CONTEMPLA SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CIERTAS ZONAS

TOTAL	28.50	Unidad
ACUMULADO ANTERIOR	0.00	Unidad
PRESENTE ACTA	28.50	Unidad

Elaboró contratista:	Estefania Carvajal Henao	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	NP 40	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VÍAS DE 12" X 12" , TIPO ALETA FIJA IGUALES O SIMILARES A LA REFERENCIA L-JS DE LAMINAIRE CON CONTROL DE VOLUMEN DE HOJAS MÚLTIPLES OPUESTAS OPERADAS POR UN SISTEMA DE PIÑÓN. INCLUYE: ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	CAP	10.00	ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico







Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
PISO 1						
N/A	N/A	N/A	5	50%	2.5	CAFETERIA
N/A	N/A	N/A	2	50%	1	HALL GENERAL
N/A	N/A	N/A	1	50%	0.5	ADMISIONES
N/A	N/A	N/A	1	50%	0.5	PROCEDIMIENTOS
N/A	N/A	N/A	1	50%	0.5	OBSERVACION GINECOBTETRICIA
N/A	N/A	N/A	1	50%	0.5	SALA EDA

OBSERVACIONES: SE CONTEMPLA SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CIERTAS ZONAS

TOTAL	5.50	Unidad
ACUMULADO ANTERIOR	0.00	Unidad
PRESENTE ACTA	5.50	Unidad

Elaboró contratista:	Estefania Carvajal Henao	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA:

CONSORCIO TERMINACION UMI
NIT 901.919.277-7
Diagonal 74D 32BB 25
Tel: (604) 4883991
Medellín - Colombia
retencionesdelafuente@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 5

Señores	ESE Hospital Universitarios San Rafael de Tunja		
NIT	891.800.231-0	**Teléfono**	(608) 7405030 - Ext. 000
Dirección	Carrera 11 27 27	**Ciudad**	Tunja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/10/2025, 09:13
Expedición	14/10/2025, 09:13
Vencimiento	21/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CONTRATO 345 DE 2025	1.00	1,138,629,789.00
2	AIU	1.00	341,588,937.00

Total items: 2

Total Bruto	1,480,218,726.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,480,218,726.00

Valor en Letras:
Mil cuatrocientos ochenta millones doscientos dieciocho mil setecientos veintiseis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-21 por $ 1,480,218,726.00

Observaciones:
Valor total ejecutado presente acta parcial #4 (1 de Agosto 2025 a 31 de Agosto 2025)
$ 1.480.218.726

Favor consignar en la cuenta de Ahorros DAVIVIENDA No 0371 0009 3436 a nombre de CONSORCIO TERMINACION UMI Nit. 901.919.277-7

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764090657101 aprobado en 20250318 prefijo FV desde el número 1 al**

100 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4112 Construcción de edificios no residenciales Tarifa
CUFE: 7564bb4524ded17054443c27cf9ce34c776dd18d746cda5d379686c3bef0387a3e9426d841cb28680f38406a601a814d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DAVIVIENDA

CERTIFICACIÓN

Banco Davivienda S.A certifica que el **CONSORCIO TEMINACION UMI** con Nit **901.919.277-7** tiene con el Banco la siguiente cuenta de ahorros Persona Jurídica:

Cuenta de Ahorros	**0371 0009 3436**
Fecha de Apertura	**05/06/2025**

Se expide por solicitud del cliente a los 05 días del mes de Junio del año 2025 dirigida **A QUIEN INTERESE**

Cordialmente,

DAVIVIENDA
0371 - OFICINA SANTA TERESITA

FIRMA AUTORIZADA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco Davivienda S.A.

Tu a 07 e octubre e 0

e ores
os ta U ers tar o a a ae e
Tu a Carrera 11 o 7 7
Tu a e arta e to e Bo ac

su to Cert cac e ago e segur a soc a a ortes ega es

Cor a sa u o

o ste a a Car a a e ao e t ca a co C C 1 037 30 1 1 e co c e
e rese ta te ega B O U TO cert co ue e
CO O C O T C U e t ca o co T 01 1 77 7 se e cue tra a
a a a sa o e e ago e ortes a egur a oc a ara sca es ge tes e
to os sus e ea os e co or a co o estab ec o or e art cu o 0 e a e 7
e 0 e s s os c o es sobre a ater a O T T
U OC T C Corres o e tes a
er o o co re o e tre e 01 e agosto e 31 e agosto e 0

a rese te cert cac se e e e Tu a a os 07 as e es e octubre e 0

te ta e te

T C O
T T
CO O C O T C U

Tu a 07 e octubre e 0

e ores
os ta U ers tar o a a ae e
Tu a Carrera 11 o 7 7
Tu a e arta e to e Bo ac

su to Cert cac e ago e segur a soc a a ortes ega es

Cor a sa u o

o abet e r as oto e t ca a co C C 00 013 co Tar eta ro es o a
o 07 3 T e a u ta Ce tra e Co ta ores e Co o b a e co c e
Co ta or B O U TO cert co ue e CO O C O
T C U e t ca o co T 01 1 77 7 se e cue tra a a a a
sa o e e ago e ortes a egur a oc a ara sca es ge tes e to os sus
e ea os e co or a co o estab ec o or e art cu o 0 e a e 7 e 0
e s s os c o es sobre a ater a O T T
U OC T C Corres o e tes a er o o
co re o e tre e 01 e agosto e 31 e agosto e 0

a rese te cert cac se e e e Tu a a os 07 as e es e octubre e 0

te ta e te

B T OTO
CO T O
CO O C O T C U

CONSORCIO TERMINACIÓN UMI
NIT: 901.919.277-7
consorcioterminacionumi@gmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **44.008.013**

ARIAS SOTO

APELLIDOS

ELIZABETH JEIN

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-ENE-1986**

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60	**B-**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

28-ENE-2004 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0100100-00392145-F-0044008013-20120809 **00307**44926A 1 2031933722


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
207538-T
ELIZABETH JEIN
ARIAS SOTO
C.C. 44008013
RESOLUCION INSCRIPCION 650
FECHA 30/09/2015
UNIVERSIDAD AUTONOMA LATINOAMERICANA
DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ
221265

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2 8 B F 0 1 2 2 6 1 1 E 1 0 5 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ELIZABETH JEIN ARIAS SOTO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 44008013 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 207538-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

AGOSTO 2025

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-09, 01:25:28 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 79806242

Periodo Cotización: agosto de 2025 **Periodo Servicio:** septiembre de 2025

PAGADO 09/09/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO TERMINACION UMI		
Documento	NI901919277	**Dirección**	AV 51 #51 - 60 AVENIDA UNIVERSITARIA
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2621938
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	TUNJA	**Departamento**	BOYACA
Representante Legal	CARVAJAL HENAO ESTEFANIA	**Identificación**	CC 1037630191
Total Afiliados	61	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1002329251	SERGIO ANDRES URIAN BAUTISTA	01	00												X					0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 237.250	$ 38.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 237.250	$ 9.500	0,000	$ 237.250	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 237.250	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47.500
CC 1002329251	SERGIO ANDRES URIAN BAUTISTA	01	00																	0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.186.250	$ 189.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.186.250	$ 47.500	6,960	$ 1.186.250	$ 82.600	(CCF10) COMFABOY	$ 1.186.250	$ 47.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 367.400
CC 1002364930	DEYVIT STEVEN ACERO MENDOZA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF10) COMFABOY	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 1002395483	DEYNER STIVEN PIRACOCA ESPINOSA	01	00											X						0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 189.800	$ 30.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 189.800	$ 0	0,000	$ 189.800	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 189.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.400
CC 1002395483	DEYNER STIVEN PIRACOCA ESPINOSA	01	00												X					0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 94.900	$ 15.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 94.900	$ 3.800	0,000	$ 94.900	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 94.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.000
CC 1002395483	DEYNER STIVEN PIRACOCA ESPINOSA	01	00		X															0	24	24	24	24	(230301) PORVENIR	$ 1.138.800	$ 182.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.138.800	$ 45.600	6,960	$ 1.138.800	$ 79.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.138.800	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 352.800
CC 1006002201	DUBER HERNANDO BERNAL RODRIGUEZ	01	00	X																0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 189.800	$ 30.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 189.800	$ 7.600	6,960	$ 189.800	$ 13.300	(CCF10) COMFABOY	$ 189.800	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.900
CC 1016033129	EMILIO JOSE SILVA PACHECO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.780.000	$ 284.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.780.000	$ 71.200	6,960	$ 1.780.000	$ 123.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.780.000	$ 71.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 551.100
CC 1026160645	DAVID LEANDRO GIL ACEVEDO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.400.000	$ 384.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.400.000	$ 96.000	6,960	$ 2.400.000	$ 167.100	(CCF04) COMFAMA	$ 2.400.000	$ 96.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 743.100
CC 1029520476	ANDERSON GIOVANY LOPEZ RODRIGUEZ	01	00											X						0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 47.450	$ 7.600	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 47.450	$ 0	0,000	$ 47.450	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 47.450	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.600
CC 1029520476	ANDERSON GIOVANY LOPEZ RODRIGUEZ	01	00		X															0	16	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 759.200	$ 121.500	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 759.200	$ 30.400	6,960	$ 759.200	$ 52.900	(CCF10) COMFABOY	$ 759.200	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 235.200
CC 1029520797	JUAN FELIPE NOVA FONSECA	01	00												X					0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 237.250	$ 38.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 237.250	$ 9.500	0,000	$ 237.250	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 237.250	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47.500
CC 1029520797	JUAN FELIPE NOVA FONSECA	01	00																	0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.186.250	$ 189.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.186.250	$ 47.500	6,960	$ 1.186.250	$ 82.600	(CCF10) COMFABOY	$ 1.186.250	$ 47.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 367.400
CC 1032255551	WILLIAM MIGUEL SANCHEZ TORIBIO	01	00		X															0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.200.000	$ 352.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.200.000	$ 88.000	6,960	$ 2.200.000	$ 153.200	(CCF10) COMFABOY	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 681.200
CC 1037630191	ESTEFANIA CARVAJAL HENAO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 4.000.000	$ 640.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.000.000	$ 160.000	6,960	$ 4.000.000	$ 278.400	(CCF04) COMFAMA	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.238.400
CC 1048015312	WILMAR ALEXANDER JIMENEZ RIVERA	01	00		X															0	15	15	15	15	(25-14) COLPENSIONES	$ 850.000	$ 136.000	(EPS010) EPS SURA	$ 850.000	$ 34.000	6,960	$ 850.000	$ 59.200	(CCF04) COMFAMA	$ 850.000	$ 34.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.200
CC 1049610366	ANDERSON ESTEBAN VANEGAS RACHE	01	00											X						0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 47.450	$ 7.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 47.450	$ 0	0,000	$ 47.450	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 47.450	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.600
CC 1049610366	ANDERSON ESTEBAN VANEGAS RACHE	01	00	X																0	24	24	24	24	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.138.800	$ 182.300	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.138.800	$ 45.600	6,960	$ 1.138.800	$ 79.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.138.800	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 352.800
CC 1049612358	OSCAR MAURICIO RATIVA SUAREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.920.000	$ 307.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.920.000	$ 76.800	6,960	$ 1.920.000	$ 133.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.920.000	$ 76.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 594.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 09/09/2025 **Empresa NI901919277 CONSORCIO TERMINACION UMI** **Planilla Nro: 79806242** **Periodo Cotización: agosto de 2025** **Periodo Servicio: septiembre de**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1049612648	JOEL FERNANDO AUNTA MOLINA	01	00	X																0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 569.400	$ 91.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 569.400	$ 22.800	6,960	$ 569.400	$ 39.700	(CCF10) COMFABOY	$ 569.400	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 176.500
CC 1049619098	YEISSON ALEXANDER RATIVA SUAREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.920.000	$ 307.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.920.000	$ 76.800	6,960	$ 1.920.000	$ 133.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.920.000	$ 76.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 594.500
CC 1049625680	JOSE ALBERTO MARULANDA MORCILLO	01	00											X						0	1	1	1	1	(231001) COLFONDOS	$ 59.334	$ 9.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 59.334	$ 0	0,000	$ 59.334	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 59.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.500
CC 1049625680	JOSE ALBERTO MARULANDA MORCILLO	01	00	X																0	8	8	8	8	(231001) COLFONDOS	$ 474.667	$ 76.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 474.667	$ 19.000	6,960	$ 474.667	$ 33.100	(CCF10) COMFABOY	$ 474.667	$ 19.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 147.100
CC 1049635357	ANDRES FELIPE LEGUIZAMON AGUILAR	01	00											X						0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 47.450	$ 7.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 47.450	$ 0	0,000	$ 47.450	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 47.450	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.600
CC 1049635357	ANDRES FELIPE LEGUIZAMON AGUILAR	01	00	X																0	24	24	24	24	(230301) PORVENIR	$ 1.138.800	$ 182.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.138.800	$ 45.600	6,960	$ 1.138.800	$ 79.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.138.800	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 352.800
CC 1049637057	FABIO ANDRES HURTADO VARGAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.700.000	$ 68.000	6,960	$ 1.700.000	$ 118.400	(CCF10) COMFABOY	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 526.400
CC 1049638614	JONATAN SNEIDER DIAZ AREVALO	01	00												X					0	4	4	4	4	(231001) COLFONDOS	$ 189.800	$ 30.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 189.800	$ 7.600	0,000	$ 189.800	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 189.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.000
CC 1049638614	JONATAN SNEIDER DIAZ AREVALO	01	00																	0	26	26	26	26	(231001) COLFONDOS	$ 1.233.700	$ 197.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.233.700	$ 49.400	6,960	$ 1.233.700	$ 85.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.233.700	$ 49.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 382.100
CC 1049640553	JOHAO ALEXANDER RUIZ PEÑA	01	00											X						0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 178.000	$ 28.500	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 178.000	$ 0	0,000	$ 178.000	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.500
CC 1049640553	JOHAO ALEXANDER RUIZ PEÑA	01	00																	0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.602.000	$ 256.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.602.000	$ 64.100	6,960	$ 1.602.000	$ 111.500	(CCF10) COMFABOY	$ 1.602.000	$ 64.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.100
CC 1049642651	MARCO ANTONIO MOLINA LOPEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.780.000	$ 284.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.780.000	$ 71.200	6,960	$ 1.780.000	$ 123.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.780.000	$ 71.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 551.100
CC 1049649890	HEYNER ARLEY DIAZ LOPEZ	01	00		X															0	17	17	17	17	(230301) PORVENIR	$ 806.650	$ 129.100	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 806.650	$ 32.300	6,960	$ 806.650	$ 56.200	(CCF10) COMFABOY	$ 806.650	$ 32.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 249.900
CC 1049651962	HARRINSON RIVERA MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.780.000	$ 284.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.780.000	$ 71.200	6,960	$ 1.780.000	$ 123.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.780.000	$ 71.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 551.100
CC 1049652578	EDWIN YESID CASTILLO RUBIO	01	00	X																0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 189.800	$ 30.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 189.800	$ 7.600	6,960	$ 189.800	$ 13.300	(CCF10) COMFABOY	$ 189.800	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.900
CC 1049656819	ANDRES FELIPE LOPEZ PINZON	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1049662404	RICARDO DANIEL LOPEZ CASTELLANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.780.000	$ 284.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.780.000	$ 71.200	6,960	$ 1.780.000	$ 123.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.780.000	$ 71.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 551.100
CC 1050090863	LUIS MIGUEL FORERO YANQUEN	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1050091640	NICOLAS ALEJANDRO ALVARADO SANCHEZ	01	00											X						0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 142.350	$ 22.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 142.350	$ 0	0,000	$ 142.350	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 142.350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.800
CC 1050091640	NICOLAS ALEJANDRO ALVARADO SANCHEZ	01	00		X															0	18	18	18	18	(25-14) COLPENSIONES	$ 854.100	$ 136.700	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 854.100	$ 34.200	6,960	$ 854.100	$ 59.500	(CCF10) COMFABOY	$ 854.100	$ 34.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 264.600
CC 1050096499	CRISTIAN JULIAN FAGUA BULLA	01	00											X						0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 94.900	$ 15.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 94.900	$ 0	0,000	$ 94.900	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 94.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.200
CC 1050096499	CRISTIAN JULIAN FAGUA BULLA	01	00																	0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.328.600	$ 212.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.328.600	$ 53.200	6,960	$ 1.328.600	$ 92.500	(CCF10) COMFABOY	$ 1.328.600	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411.500
CC 1051067060	YECID ALEXANDER SILVA PACHECO	01	00	X																0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 189.800	$ 30.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 189.800	$ 7.600	6,960	$ 189.800	$ 13.300	(CCF10) COMFABOY	$ 189.800	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.900
CC 1051068068	RONAL STEVEN MORENO VANEGAS	01	00											X						0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 94.900	$ 15.200	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 94.900	$ 0	0,000	$ 94.900	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 94.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.200
CC 1051068068	RONAL STEVEN MORENO VANEGAS	01	00	X																0	23	23	23	23	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.091.350	$ 174.700	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.091.350	$ 43.700	6,960	$ 1.091.350	$ 76.000	(CCF10) COMFABOY	$ 1.091.350	$ 43.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 338.100
CC 1053329226	LUIS ARCADIO RUBIANO SUAREZ	01	00	X																0	10	10	10	10	(230201) PROTECCION	$ 474.500	$ 76.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 474.500	$ 19.000	6,960	$ 474.500	$ 33.100	(CCF10) COMFABOY	$ 474.500	$ 19.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 147.100
CC 1056074885	WILMER CAMILO BARON PEÑA	01	00											X						0	2	2	2	2	(231001) COLFONDOS	$ 118.667	$ 19.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 118.667	$ 0	0,000	$ 118.667	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 118.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.000
CC 1056074885	WILMER CAMILO BARON PEÑA	01	00																	0	28	28	28	28	(231001) COLFONDOS	$ 1.661.334	$ 265.900	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.661.334	$ 66.500	6,960	$ 1.661.334	$ 115.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.661.334	$ 66.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 514.600
CC 1056802565	CESAR AURELIO TEJEDOR PATIÑO	01	00	X																0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 189.800	$ 30.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 189.800	$ 7.600	6,960	$ 189.800	$ 13.300	(CCF10) COMFABOY	$ 189.800	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.900
CC 1069926313	DIEGO MIGUEL PEDREROS LEMUS	01	00												X					0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 142.350	$ 22.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 142.350	$ 5.700	0,000	$ 142.350	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 142.350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.500
CC 1069926313	DIEGO MIGUEL PEDREROS LEMUS	01	00												X					0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 94.900	$ 15.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 94.900	$ 3.800	0,000	$ 94.900	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 94.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.000
CC 1069926313	DIEGO MIGUEL PEDREROS LEMUS	01	00											X						0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 47.450	$ 7.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 47.450	$ 0	0,000	$ 47.450	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 47.450	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.600
CC 1069926313	DIEGO MIGUEL PEDREROS LEMUS	01	00		X															0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 521.950	$ 83.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 521.950	$ 20.900	6,960	$ 521.950	$ 36.400	(CCF10) COMFABOY	$ 521.950	$ 20.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 161.800
CC 1082479583	JAIR ROBERTO VILLARREAL RANGEL	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1095825783	YEISMAR ARLEY RODRIGUEZ GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1096202957	CINDY JOHANNA SUAREZ SERRANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.400.000	$ 384.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.400.000	$ 96.000	6,960	$ 2.400.000	$ 167.100	(CCF10) COMFABOY	$ 2.400.000	$ 96.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 743.100
CC 1096951661	JULIAN DAVID SALGUERO SOTO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1108933336	MARCO FABIAN SANCHEZ SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Pagado: 09/09/2025 **Empresa NI901919277 CONSORCIO TERMINACION UMI** **Planilla Nro: 79806242** **Periodo Cotización: agosto de 2025** **Periodo Servicio: septiembre de**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1116992589	HAIVER ARNULFO CONTRERAS MENDOZA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1128429572	JUAN GABRIEL BERRIO VARGAS	01	00											X						0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 59.334	$ 9.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 59.334	$ 0	0,000	$ 59.334	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 59.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.500
CC 1128429572	JUAN GABRIEL BERRIO VARGAS	01	00																	0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION	$ 1.720.667	$ 275.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.720.667	$ 68.900	6,960	$ 1.720.667	$ 119.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.720.667	$ 68.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 533.000
CC 15877344	HERNAN JHADEER MURAYARI RAMOS	01	00											X						0	4	4	4	4	(25-14) COLPENSIONES	$ 189.800	$ 30.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 189.800	$ 0	0,000	$ 189.800	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 189.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.400
CC 15877344	HERNAN JHADEER MURAYARI RAMOS	01	00	X																0	21	21	21	21	(25-14) COLPENSIONES	$ 996.450	$ 159.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 996.450	$ 39.900	6,960	$ 996.450	$ 69.400	(CCF10) COMFABOY	$ 996.450	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 308.700
CC 23284683	YASMIN CECILIA DIAZ PEREZ	01	00											X						0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 47.450	$ 7.600	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 47.450	$ 0	0,000	$ 47.450	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 47.450	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.600
CC 23284683	YASMIN CECILIA DIAZ PEREZ	01	00	X																0	9	9	9	9	(230201) PROTECCION	$ 427.050	$ 68.400	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 427.050	$ 17.100	6,960	$ 427.050	$ 29.800	(CCF10) COMFABOY	$ 427.050	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.400
CC 4061382	VICENTE BURGOS MALDONADO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(CCFC55) EPS CAJACOPI	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 4252509	MARIO ALIPIO CAMACHO BETANCOUR	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 43429459	MARGOTH ELENA MEDINA RIVERA	01	03																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 1.900.000	$ 76.000	6,960	$ 1.900.000	$ 132.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.900.000	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 284.300
CC 52443156	DORIS LOBATON TORRES	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 7120249	ERLIS ANTONIO RIVERA HUERFANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 7164173	WILLIAM RODRIGUEZ PINEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 7164375	LUIS EDUARDO VALENZUELA CASTIBLANCO	01	00	X																0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.483.334	$ 237.400	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.483.334	$ 59.400	6,960	$ 1.483.334	$ 103.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.483.334	$ 59.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 459.500
CC 7165070	EUGENIO SORA ARAQUE	01	00		X															0	24	24	24	24	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.424.000	$ 227.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.424.000	$ 57.000	6,960	$ 1.424.000	$ 99.200	(CCF10) COMFABOY	$ 1.424.000	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 441.100
CC 71677387	JORGE ELIECER CORTES GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300
CC 7181307	JAIRO HERNANDO VANEGAS PANADERO	01	00	X																0	25	25	25	25	(230201) PROTECCION	$ 1.186.250	$ 189.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.186.250	$ 47.500	6,960	$ 1.186.250	$ 82.600	(CCF10) COMFABOY	$ 1.186.250	$ 47.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 367.400
CC 7181812	ROBERT MACIAS DURAN	01	00											X						0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 59.334	$ 9.500	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 59.334	$ 0	0,000	$ 59.334	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 59.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.500
CC 7181812	ROBERT MACIAS DURAN	01	00																	0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.720.667	$ 275.400	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.720.667	$ 68.900	6,960	$ 1.720.667	$ 119.800	(CCF10) COMFABOY	$ 1.720.667	$ 68.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 533.000
CC 72249576	CARLOS AUGUSTO BERRIO CANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.780.000	$ 284.800	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.780.000	$ 71.200	6,960	$ 1.780.000	$ 123.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.780.000	$ 71.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 551.100
CC 79791276	GERMAN ALONSO GUTIERREZ BONILLA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 79824451	JOSE CARLOS JULIO LOPEZ BERNAL	01	00											X						0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 94.900	$ 15.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 94.900	$ 0	0,000	$ 94.900	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 94.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.200
CC 79824451	JOSE CARLOS JULIO LOPEZ BERNAL	01	00																	0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.328.600	$ 212.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.328.600	$ 53.200	6,960	$ 1.328.600	$ 92.500	(CCF10) COMFABOY	$ 1.328.600	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411.500
CC 86049770	EIDER GUSTAVO REINA SIEMPIRA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.780.000	$ 284.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.780.000	$ 71.200	6,960	$ 1.780.000	$ 123.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.780.000	$ 71.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 551.100
CC 98563499	NORBER RAMIRO CORTES GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 98564715	OSCAR DUVAN SANCHEZ MARIN	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.000.000	$ 120.000	6,960	$ 3.000.000	$ 208.800	(CCF04) COMFAMA	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 85.526.588	$ 87.426.588	$ 87.426.588	$ 87.426.588	$ 13.686.800	$ 3.438.300	$ 5.912.400	$ 3.398.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.435.900	$ 0	$ 26.435.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 34458551
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-09-16

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JOHNNY HERRERA CASTAÑO	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	73557984	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE PORTOBELO NO 49 39	DEPARTAMENTO	BOLIVAR	MUNICIPIO	ARJONA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4542	CORREO ELECTRÓNICO	OPERACIONES.PLANILLAS@GMAIL.COM	TELÉFONO	6292615
FAX	6533606	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Administrador de pensiones

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 08	Año: 2025	Mes: 08	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		34458551

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-73557984	59	No	No	No	13	52	1701001	Salario	HERRERA CASTAÑO JOHNNY	$3.200.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 73557984																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 73557984	PROTECCION	30	$3.200.000	0.1600000	$512.000	$0	$0	$512.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 73557984	SANITAS	30	$3.200.000	0.1250000	$400.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.200.000	1	0.0052200	$16.800

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-73557984	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 08											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	1	$512.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$512.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	$400.000	$0	0	$0	0	$0	$400.000	0	$0	$0	$400.000	$0	0	$0	$0	$400.000	$0	$0	$400.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	$16.800	0	$0	$0	$16.800	0	$0	$16.800	0	$0	$0	$16.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$400.000
PENSIONES	1	$512.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$16.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$928.800

Tunja, 07 de octubre de 2025

Señores
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
DR. VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
Supervisor
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría No 352 de 2025, "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."

Asunto: CERTIFICACION ACTA PARCIAL No 4 CONTRATO DE OBRA No 345 DE 2025.

Cordial Saludo.

Por medio de la presente nos permitimos certificar acta parcial No 3 del contrato de obra 345 de 2025 "CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", las actividades ejecutadas en el periodo comprendido del 01 de agosto al 31 de agosto de 2025, correspondiente a los componentes técnicos, financieros, contables, SST y Ambientales lo anterior en cumplimiento a lo contemplado contractualmente.

Técnico.
Certifica que las cantidades presentadas en acta parcial son la ejecutadas en obra, de acuerdo con las memorias de cálculo presentadas y firmadas por la interventoría.

El porcentaje de tiempo transcurrido, avance de obra ejecutado y avance de obra programado son los indicados teniendo en cuenta programación de obra.

El seguimiento financiero es acorde a las actas parciales de obra.

Ambiental.

Certifica que las licencias y permisos ambientales se encuentran al día en la fecha de corte de la presente acta.
Certifica que el almacenamiento y disposición de materiales y residuos se ha realizado conforme a la normatividad legal ambiental vigente y el contratista cumple con los respectivos soportes de cumplimiento ambiental.

Que se verificaron cada una de las actividades del Plan de Manejo ambiental definidas por el contratista y se verifico el total cumplimiento y eficacia de las mismas en el periodo de la presente acta.

Seguridad Salud En El Trabajo

Informe a seguimiento mensual obra civil.
Indicadores clave de desempeño.
Cumplimiento normativo formación y capacitación.
Evaluación de la efectividad de la formación.

Lo anterior en cumplimiento a lo contemplado contractualmente.

Atentamente,



BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Tunja, 07 de octubre de 2025

Señores
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
DR. VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
Supervisor
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría No 352 de 2025, "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."

Asunto: CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

Cordial Saludo.

Por medio del presente certificamos que luego de verificadas las planillas y constatadas con el personal en obra, el Consorcio Terminación UMI identificado con NIT. 901.919.277-7 se encuentra al día y a PAZ Y SALVO en el pago de Aportes a Seguridad Social y Parafiscales Vigentes de todos sus empleados, de conformidad con lo establecido por el artículo 50, de la Ley 789 de 2002 y demás disposiciones sobre la materia (APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES). Para el periodo comprendido entre el 01 de agosto y el 31 de agosto de 2025.

Atentamente,



BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Tunja, 07 de octubre de 2025

Señores
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
DR. VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
Supervisor
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría No 352 de 2025, "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."

Asunto: CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS.

Cordial Saludo.

Por medio del presente certificamos que luego de verificadas cada una de las actividades ejecutadas en obra por el contratista Consorcio Terminación UMI en el periodo comprendido entre el 01 de agosto y el 31 de agosto de 2025, las mismas cumplen en su totalidad con las especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos.

Atentamente,

BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Tunja, 07 de octubre de 2025

Señores
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
DR. VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
Supervisor
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría No 352 de 2025, "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."

Asunto: CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CONTRATISTA DE OBRA AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Cordial Saludo.

Por medio del presente certificamos que luego de verificadas las condiciones en obra y la documentación presentada por el contratista Consorcio Terminación UMI para el periodo comprendido entre el 01 de agosto y el 31 de agosto de 2025, se da cumplimiento a todo lo relacionado con los requisitos Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Atentamente,

BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

CERTIFICADO DE ADHERENCIA ISO 14001 DE 2015
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
MES DE AGOSTO 2025

El presente informe se genera luego de realizar revisión documental, operacional y verificación de la certificación del contratista CONSORCIO TERMINACIÓN UMI de los requisitos contractuales solicitados, socializados y pactados en el contrato 345 de 2025, cuyo objeto contractual es la "CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA".

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL- CUMPLIMIENTO ISO 14001 DE 2015				
REQUISITO		**CUMPLIMIENTO**		**SEGUIMIENTO AGOSTO DE 2025**
		CUMPLE	**NO CUMPLE**	
FUENTES DE MATERIALES E INSUMOS				
1	Licencias ambientales de las canteras de la materia prima (Arena, Grava, etc.).	1		LICENCIA AMBIENTAL LUIS HERNANDO ACERO CUERVO: FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2007. LICENCIA MINERA DE JESUS MARIA REYES MOZO OOLA00023-21- EN PROCESO. LA ANTERIOR INFORMACIÓN ES AVALADA POR LA INTERVENTORIA EN SU INFORME MENSUAL. **Vigente para el mes de agosto del 2025.**
2	Almacenamiento del material de forma adecuada conforme a las características técnicas que debe tener el acopio de cada material (Fotografías)	**1**		SE ADJUNTAN EVIDENCIAS DE ACOPIO ADECUADAS – SE CORROBORAN POR MEDIO DE INSPECCION EN SITIO. **Vigente para el mes de agosto del 2025.**
3	Títulos Mineros de las canteras de material.	1		TITULO MINERO DE AGREGADOS EL VERGEL CUYO REPRESENTANTE LEGAL JESUS MARIA REYES MOZO CODIGO DEL EXPEDIENTE ARE-TIR-15241 EN CONCESION A NELSON ARCOS PACACIRA.

				Vigente para el mes de agosto del 2025.
4	Órdenes de compra o facturas de compra que acrediten el vínculo comercial con esas canteras.	1		ORDEN DE COMPRA AGREGADOS EL VERGEL. ORDEN DE COMPRA FERRECONSTRUCCIONES JL. S.A.S ORDEN DE COMPRA ARGOS. **Vigente para el mes de agosto del 2025.**
5	Demarcar las áreas con el nombre de material de acopio (Fotografías)	**1**		SE ADJUNTAN EVIDENCIAS DE ACOPIO ADECUADAS – SE CORROBORAN POR MEDIO DE INSPECCION EN SITIO. **Vigente para el mes de agosto del 2025.**
	Garantizar que el sitio de acopio cumpla con las condiciones de temperatura y humedad para garantizar la calidad de los materiales.	**1**		SE ADJUNTAN EVIDENCIAS DE ACOPIO ADECUADAS – SE CORROBORAN POR MEDIO DE INSPECCION EN SITIO. **Vigente para el mes de agosto del 2025.**
IMPACTOS AMBIENTALES Y CONTROLES DE MANEJO				
1	Matriz de aspectos e impactos ambientales, metodología CONESA. **Única vez al inicio del contrato.**	1		Se carga matriz de aspectos e impactos ambientales dentro del PAGA. **Vigente para el mes de agosto del 2025.**
2	Plan de Manejo Ambiental con cronograma de actividades definido al tiempo de duración de la obra, en este se deben contemplar todos los recursos de la matriz de aspectos e impactos y plantear las actividades que se ejecutaran para minimizar los impactos. **Mensualmente deberán ser reportadas las actividades y resultado de indicadores de las Fichas de Manejo Ambiental**	1		EVIDENCIAS DEL PAGA COMPLETAS – CARGADAS EN EL DRIVE DE INFORMACIÓN. **Vigente para el mes de agosto del 2025.**

	Plan de Manejo de los residuos en donde se clasifiquen e identifiquen los tipos de residuos generados por la obra y la correcta forma de disponerlos	1		CONTRATO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y RESPECTIVA CERTIFICACION POR EL AREA DE INTERVENTORIA. **Vigente para el mes de agosto del 2025.**
3	ETIQUETAR LAS CANECAS, LOS CONTENEDORES Y LOS DIFERENTES ESPACIOS CONFORME A LOS RESIDUOS QUE SE PUEDEN DEPOSITAR EN ESTOS ESPACIOS. **Única vez al inicio del contrato.**	1		PUNTO ECOLOGICO EN BUEN ESTADO. **Vigente para el mes de agosto del 2025.**
ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN CORRECTA DE ESCOMBROS				
1	Presentar ante la corporación autónoma regional de Boyacá el Plan de Manejo y solicitar apertura de expediente como gran generador de Residuos de Construcción y Demolición, realizar luego del inicio del trámite todos los informes normativos que exija la corporación para cumplir con el Plan de Manejo de este tipo de residuos. Cargar en el drive el Plan presentado, el radicado, y posteriormente el radicado de respuesta. **Única vez al inicio del contrato.**	1		Plan de RCD radicados a Corpoboyacá. **Vigente para el mes de agosto del 2025.**
2	Presentación de informes mensuales con información referente a Manejo de Residuos, Orden y Limpieza	1		Respuesta oportuna de informe de hallazgos de la inspección ambiental realizada el 21 de agosto del 2025. **Vigente para el mes de agosto del 2025.**
	INCLUIR EN EL INFORME FOTOGRAFIAS DEL CORRECTO ALMACENAMIENTO DE LOS ESCOMBROS	1		
3	Reportar semanalmente al área de gestión ambiental la salida de escombros que incluya el siguiente cuadro y cargar en el	1		Certificaciones de disposición final de los escombros. **Vigente para el mes de agosto del**

	drive el archivo Excel que contenga el cuadro y las respectivas actas de disposición final.			**2025.**
SUSTANCIAS QUIMICAS				
1	Fichas de seguridad de sustancias químicas empleadas	1		Se reciben 51 fichas de seguridad- Evidencia correos de notificación. **Vigente para el mes de agosto del 2025.**
VEHICULOS DE OBRA				
1	Relación de vehículos y respectiva revisión tecno mecánica de los mismos	1		Se recibe información y revisiones tecno mecánicas vigentes de los vehículos. **Vigente para el mes de agosto del 2025.**
CANINOS DE LA INSTITUCIÓN				
1	Documentos de vacunación y carta de responsabilidad de tenencia canina en caso de ser responsables de algún canino	1		SE ENTREGAN CARNETS DE VACUNACION DE RAFAEL-RAFAELA Y PILOTICO. **Vigente para el mes de agosto del 2025.**
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		**14**	**0**	**100%**

LA ANTERIOR INFORMACIÓN ES AVALADA Y CERTIFICADA POR LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO EN EL INFORME PRESENTADO PARA EL MES DE JULIO.

En conclusión, se puede observar que para el mes de **AGOSTO DE 2025** el contratista presenta adherencia de 100% al sistema de gestión ambiental.

Atentamente,

Laura Natalia Espinosa G

LAURA NATALIA ESPINOSA GRIMALDOS
Líder Sistema de Gestión Ambiental
E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja

Valeria Herrera T.

VALERIA HERRERA TINJACA
Sistema de Gestión Ambiental
E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja

CERTIFICADO DE ADHERENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MES DE AGOSTO 2025

El presente informe se genera luego de realizar revisión documental, operacional de la empresa CONSORCIO TERMINACION UMI, de los requisitos contractuales solicitados, socializados y pactados en el contrato 345 de 2025, cuyo objeto contractual es ***"Construcción de la ampliación de urgencias de la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja".*** A continuación, se detalla lo siguiente:

	ITEM A EVALUAR	C	N.C	NA
1	El consorcio terminación UMI presentar ATS Analís de trabajo seguro hasta la fecha de entrega de la información.	1		
2	El consorcio terminación UMI certificación de equipos de trabajo en alturas con fecha.	1		
3	El consorcio terminación UMI cuenta Inspecciones de arnés, eslinga, línea de vida	1		
4	El consorcio terminación UMI cuanta con registro de entrega de elementos de protección personal, estos son ergonómicos de acuerdo al peligro y/o factor de riesgo existente en su actividad, verificando que cumplan con la normatividad legal vigente y se realiza control.	**1**		
5	El consorcio terminación UMI Cuenta con registro de accidentes e incidentes presentar indicadores	1		
6	El consorcio terminación UMI cuenta con plan de seguridad vial (Programas de gestión de riesgos críticos y factores de desempeño, Plan anual de trabajo, Vías seguras administradas por la organización, Inspección de vehículos y equipos, Mantenimiento y control de vehículos seguros y equipos, Plan de capacitación de conductores,	1		
7	El consorcio terminación UMI cuenta inspección a herramientas	1		
8	El consorcio terminación UMI cuenta con Inspección de elementos de protección personal	1		
9	Inspección de maquinaria y equipos	1		
10	El consorcio terminación UMI Verifica el uso de elementos de protección personal	1		
11	El consorcio terminación UMI cuenta con Lista de asistencia de El consorcio	1		

Powered by CamScanner

	terminación UMI realiza capacitaciones, reinducción			
12	El consorcio terminación UMI cuenta con vacuna de tétano para sus trabajadores	1		
13	El consorcio terminación UMI Verifica la señalización del control de acceso en especial los que tienen que ver con cliente externo y la seguridad de personal ajeno a obra) esta es clara, pertinente, suficiente	1		
TOTAL		100%		

Por lo anterior se certifica CUMPLIMIENTO DE 100% con los criterios evaluados para el mes de AGOSTO 2025

RICARDO CASTRO

Elaboro JOSÉ RICARDO CASTRO
Profesional de apoyo SGSST
E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja

Powered by CamScanner
