FECHA (D/M/A): 01-09-2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Rutual
RANGO: 1	CANTIDAD: 10.15 Ton
ZONA 1	FRENTE DE TRABAJO: 3
COMUNA 2	
BARRIO Villa del socorro	

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO : 7:00 A.m	
TERMINACIÓN: 5:00 p.m	
3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA Soleada
	TARDE SOLEADA

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Instalación de la señalización vertical según el PMT.
Demarcación de las zonas a intervenir
Demolición y Acopio de los escombros sobrantes de las demoliciones.
Imprimación con emulsión asfáltica en los puntos a intervenir.
Colocación y Compactación mecánica de la mezcla asfáltica MDC-19 con RAP en los puntos intervenidos
Se realiza chequeo de la temperatura de la mezcla asfáltica en campo 135°C.

Se realiza charla técnica por parte del contratista al Grupo de trabajo.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Willvm Tobón Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	NOMBRE: alexander Vásquez Giraldo Vo. Bo.TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	FIRMA NOMBRE: Vo. Bo.INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A):

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	William Tobon	X		Consorcio Vialmed
2	Encargado				
3	Liguero	Diego Cano	X		E Y P
4	Rastrillero	Yovanny Cuesta	X		E Y P
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Faber Quiroz	X		E Y P
7	Ayudante	John Jairo Valencia	X		E Y P
8	Ayudante	Juan Esteban Murillo	X		E Y P
9	Ayudante	Jose Nilsen Saldarriaga	X		E Y P
10	Ayudante	David Zapata Arboleda	X		E Y P
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Jhorlet Contreras	X		E Y P
17	Operador compresor	Jhon Jairo Herrera	X		E Y P
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Yair Alzate	X		
29	Conductor Volqueta(s)	Alexander Yali	X		
		Janeth Ortiz Manjares	X		
		Maricelly Rincon	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	Husvarna LP 6500	X		
2	Compresor	Doosan C-185			
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	X		
10	Placa vibratoria	Honda FC-30	X		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Chevrolet NPR WCS338	X		
16	Volqueta(s)	Freightliner GTY 061	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A):

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4004639	160400	1	CR44A CL104A-07	5.38	1.70	0.14	9.15	1.28	3.07
4004639	160406	2 B	CR44A CL104A	2.60 1.20	1.80 2.75	0.14	4.68 3.30	0.66 0.46	1.58 1.10
4004638	160405	3	CR45 CL104-11	1.20	2.37	0.13	2.84	0.37	0.89
4004638	160403	4	CR45 CL104-11+5m	0.75	5.60	0.14	4.20	0.59	1.42
4001710	160404	5	CR45 CL104-07	1.30	4.75	0.14	6.18	0.87	2.09
TOTALES							30.35	4.23	10.15

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
233629	GTY061	10.15	10.15	141


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
22980	GTY 061	Sencilla	1	Procopal

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 01-09-2025

10. ESQUEMAS

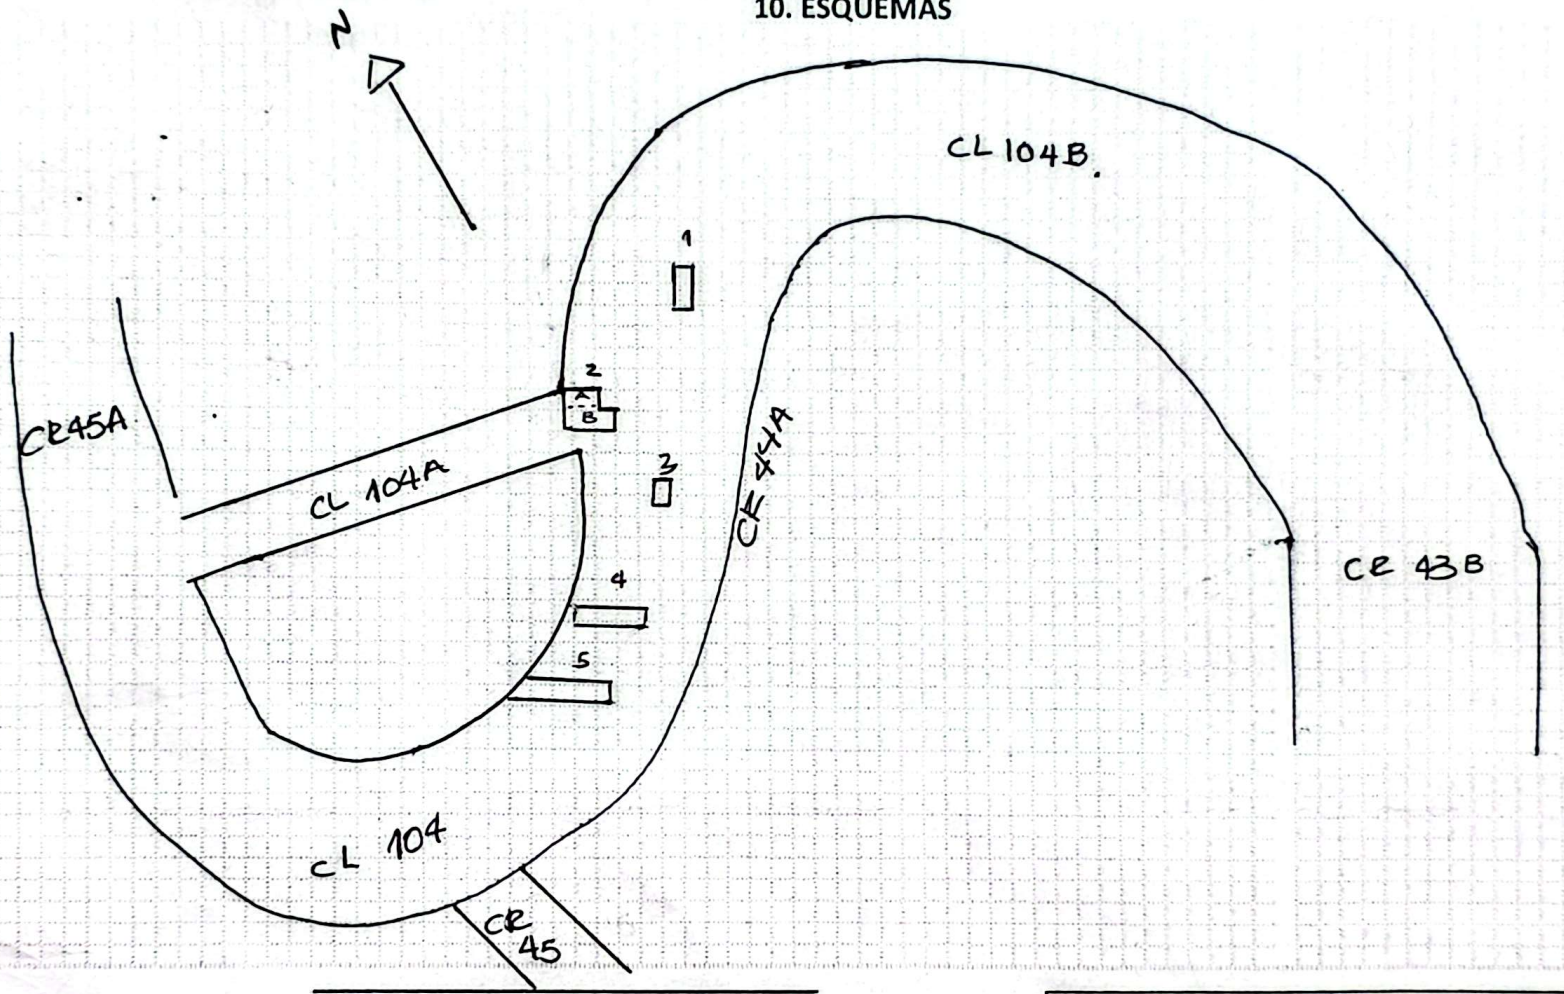

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	3
RANGO:	1	CANTIDAD:	10.15
BARRIO	Villa del Socorro	DIRECCIÓN	CR 44A CL 104A - 07

Powered by CamScanner

Estructuras y Pavimentos S.A.S

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS - BASCULA

02 SEP 2025

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 22980

PROVEEDOR: Ivan Ramirez Jaimes

VALE POR UN VIAJE: Escombros

01-09-25

PLACA No: GTY061 CAPACIDAD: 7.0 M3

DESTINO: Procopal

RECIBIDO POR:

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

William Tobón
Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

PROCOPAL S.A.
Ingenieros Contratistas

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

TIQUETE DE BASCULA: 233629

FECHA: 01/09/2025

HORA: 10:23:40 AM

CONDUCTOR: ALEX YALI

PLACA: GTY061

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ.ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890904388

PESO BRUTO: 18.32 Tonnes

PESO TARA: 8.17 Tonnes

PESO NETO: 10.15 Tonnes

PRODUCTO: 112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP NDC19

TEMPERATURA: 141°C

VIAJE NUMERO: 6

TOTAL DESPACHADO: 57.25 Tonnes

William Tobón

Powered by CamScanner
