FECHA (D/M/A): 03-09-2025	BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Puntual		
RANGO:	1	CANTIDAD:	11.01 Ton
ZONA	1	FRENTE DE TRABAJO:	3
COMUNA	2		
BARRIO	Villa del Socorro		

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	**CONTRATO No.** 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	**CONTRATO No.** 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	**JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:**
INICIO : 7:00 A.m	
TERMINACIÓN: 5:00 p.m	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Seca
TARDE: Soleada

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Instalación de la señalización vertical segun el PMT
Demarcación de los puntos a intervenir
Demolición y Acopio de los escombros sobrantes de las demoliciones.
Imprimación con emulsión asfáltica en los puntos a intervenir
Colocación y Compactación mecánica de la mezcla asfaltica MDC-19 con RAP en los puntos intervenidos.
Se realiza el chequeo de la temperatura de la mezcla asfáltica MDC-19 137°C.
Nota: Se afecta en la intervención de la jornada la señalización horizontal Linea Central amarilla en el segmento 4004641 CL 105 CR 45A-28 villa del Socorro.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: William Tobón Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	alexander Vasquez Giraldo Vo. Bo.TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Vo. Bo.INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A):

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	William Tobon	X		Consorcio Vialmed
2	Encargado				
3	Liguero	Diego cano	X		E Y P
4	Rastrillero	Yovanny Cuesta	X		E YP
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Faber Quiroz	X		E Y P
7	Ayudante	Jhon Jairo Valencia	X		E Y P
8	Ayudante	Juan Esteban Murillo	X		E Y P
9	Ayudante	Jose Nilson Saldariaga	X		E Y P
10	Ayudante	David Zapata Arboleda	X		E YP
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Jhorlet Contreras	X		E Y P
17	Operador compresor	Jhon Jairo Herrera	X		E YP
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Yair Alzate	X		
29	Conductor Volqueta(s)	Alexander Yali	X		
		Janeth Ortiz Manjares	X		
		Maricelly Rincon	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	Husqvarna LP 6500	X		
2	Compresor	Doosan C-185	X		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	X		
10	Placa vibratoria	Honda FC-30	X		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Chevrolet NPR WCS33B	X		
16	Volqueta(s)	Freightliner GTY 061	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A):

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4004641	160522	1 A	CL 105 CR 45A-28	2,65	1,60	0.12	4.24	0.51	1.22
4004641		B		1,85	1,50	0.12	2.78	0,33	0.79
4004641	160523	2 A	CL 105 CR 45A-40	4,07	1,50	0.13	6.11	0.79	1.90
4004715		B		1,30	2,38	0.12	3.09	0.37	0.89
4004641	160524	3	CR 46A CL 104A -18	2,30	5,55	0.12	12.77	1.53	3.67
4001715	160525	4	CR 46A CL 104A-07	5,90	1,50	0.12	8.85	1.06	2.54
TOTALES							37.84	4.59	11.01

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
233690	GTY061	11.01	11.01	141


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
22982	GTY061	Sencilla	1	Procopal

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 03-09-2025

10. ESQUEMAS

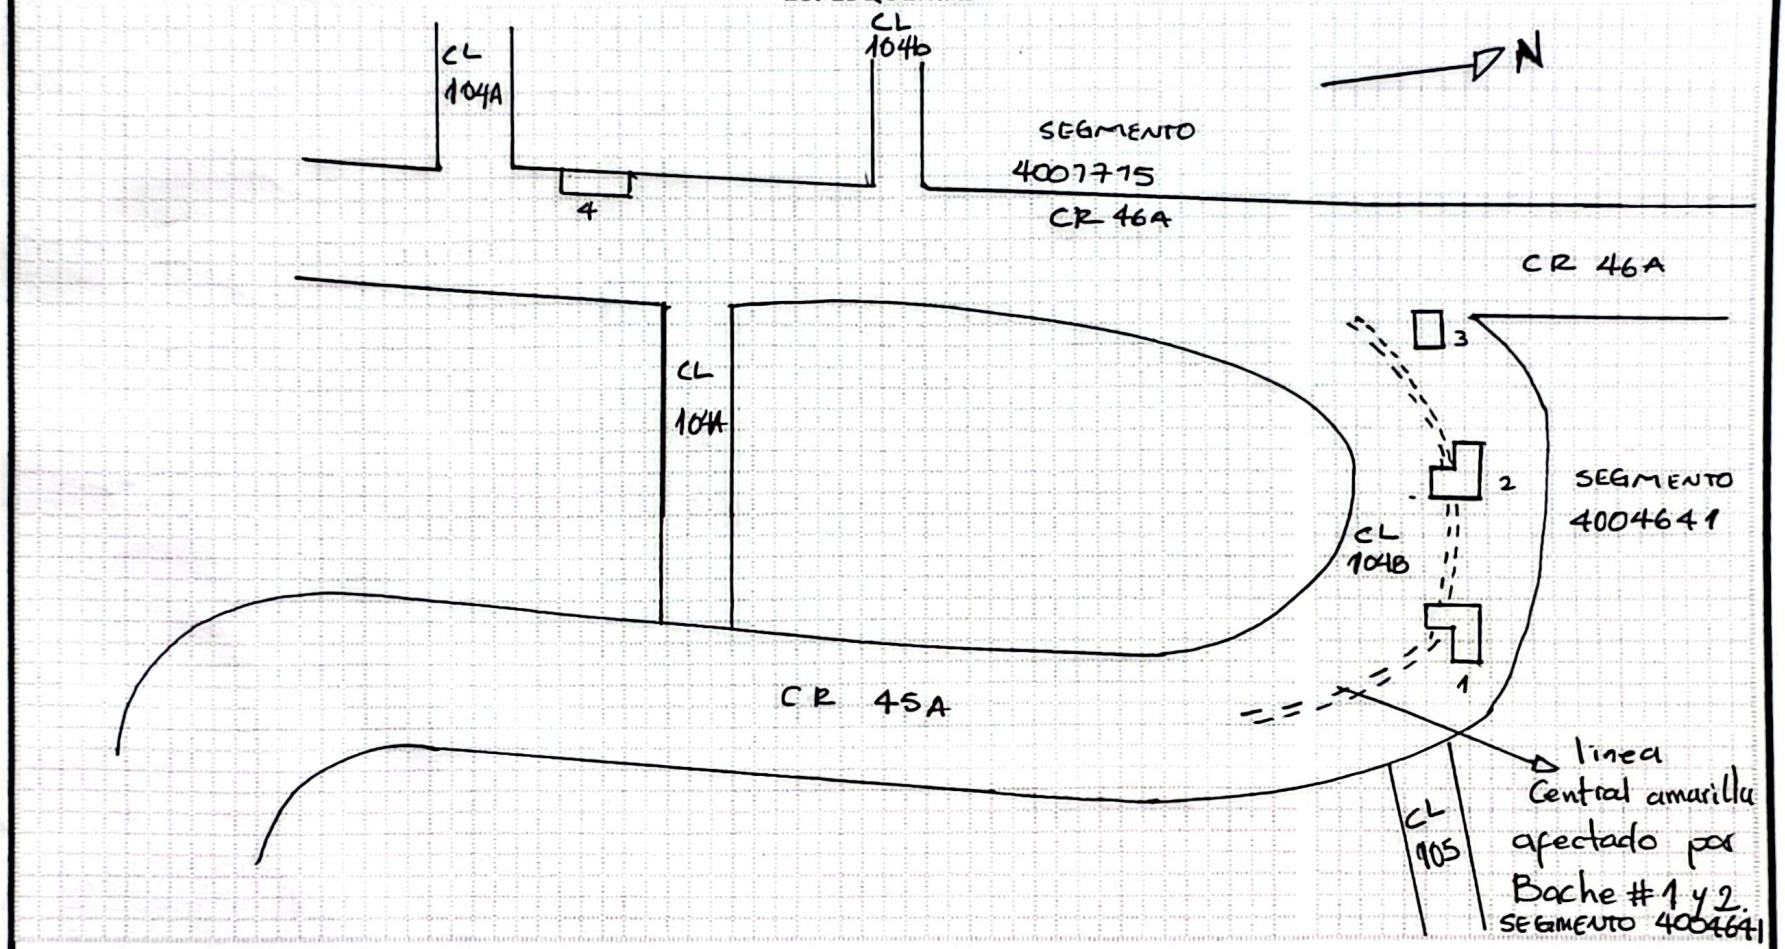

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	3
RANGO:	1	CANTIDAD:	11.01
BARRIO	Villa del Socorro	DIRECCIÓN	CL 105 CR 45A-28

Powered by CamScanner

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS **Nº 22982**

PROVEEDOR: Fuente Solmed

VALE POR UN VIAJE: Escombros

03-09-25

PLACA No: GTY061 CAPACIDAD: 70 M3

DESTINO: Procopal

RECIBIDO POR:

PROCC
04 SEP 2025
DESPACHOS - BASCULA

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

William Tobón
Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

PROCOPAL S.A.
Ingenieros

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

TIQUETE DE BASCULA: 233690

FECHA: 03/09/2025

HORA: 9:11:31 AM

CONDUCTOR: ALEX YALI

PLACA: GTY061

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890904308

PESO BRUTO: 19.16 Tonnes

PESO TARA: 8.15 Tonnes

PESO NETO: 11.01 Tonnes

PRODUCTO:112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 140C

VIAJE NUMERO: 2

TOTAL DESPACHADA: 15.82 Tonnes

William Tobón

Powered by CamScanner
