FECHA (D/M/A): 04-09-2025	BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Puntual		
RANGO:	1	CANTIDAD:	11,10 Ton
ZONA	1	FRENTE DE TRABAJO:	3
COMUNA	2		
BARRIO	Villa del Socorro		

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 7:00 a.m	
TERMINACIÓN: 5:00 p.m	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA	lluvias leves
	TARDE	Seca

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Instalación de la señalización vertical según el PMT.
Demarcación de los puntos a intervenir
Demolición y Acopio de los escombros sobrantes de las demoliciones.
Imprimación con emulsión Asfáltica en los puntos a intervenir.
Colocación y Compactación mecánica de la mezcla asfáltica MDC-19 con RAP en los puntos de intervención
Se realiza el chequeo de la temperatura de la mezcla asfáltica en campo 139°C

Nota: Se presentan lluvias de 7:00am a 10:00 a.m

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: William Tobón Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	NOMBRE: Alexander Vásquez Giraldo Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	FIRMA NOMBRE: Eduardo Rodríguez Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A):

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	William Tobon	X		Consorcio Vialmed
2	Encargado				
3	Liguero	Diego Cano	X		E Y P
4	Rastrillero	Yovanny Cuesta	X		E Y P
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Faber Quiroz	X		E Y P
7	Ayudante	Jhon Jairo Valencia	X		E Y P
8	Ayudante	Juan Esteban Murillo	X		E Y P
9	Ayudante	Jose Nilsen Saldariaga	X		E Y P
10	Ayudante	David Zapata Arboleda	X		E Y P
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Jhorlet Contreras	X		E Y P
17	Operador compresor	John Jairo Herrera	X		E Y P
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Yair Alzate	X		
29	Conductor Volqueta(s)	Alexander Yali	X		
30	Controlador vial	Janeth Ortiz Manjares	X		
31	Controlador vial	Maricelly Rincon	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	Husqvarna LP 6500	X		
2	Compresor	Doosan C-185	X		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	X		
10	Placa vibratoria	Honda FE-30	X		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Chevrolet NPR WCS 338	X		
16	Volqueta(s)	Freightliner GTY 061	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A):

8. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4001717	160584	1	CR 46A CL 104	1.76	2.00	0.14	3.52	0.49	1.18
4001717	160585	2	CR46A CL 104 – 19	1.74	1.79	0.14	3.11	0.44	1.06
4001717	160586	3	CR 46A CL104 19+5m	1.75	1.55	0.15	2.71	0.41	0.98
4001718	160587	4	CL 104 CR46A – 12	2.60	1.73	0.13	4.50	0.59	1.42
4001718	160588	5	CL 104 CR 46A-12+5m	4.70	1.70	0.13	7.99	1.04	2.50
4002215	160589	6	CL 103B CR45-61	1.15	1.82	0.13	2.09	0.27	0.65
4002215	160590	7A	CL 103B CR45-61+3m	4.35	1.60	0.14	6.96	0.97	2.33
		B		2.79	1.05	0.14	2.93	0.41	0.98
TOTALES							33.81	4.62	11.10

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
233728	GTY 061	11.10	11.10	141	22983	GTY 061	Sencilla	1	Procopal

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 04-09-2025

9. ESQUEMAS

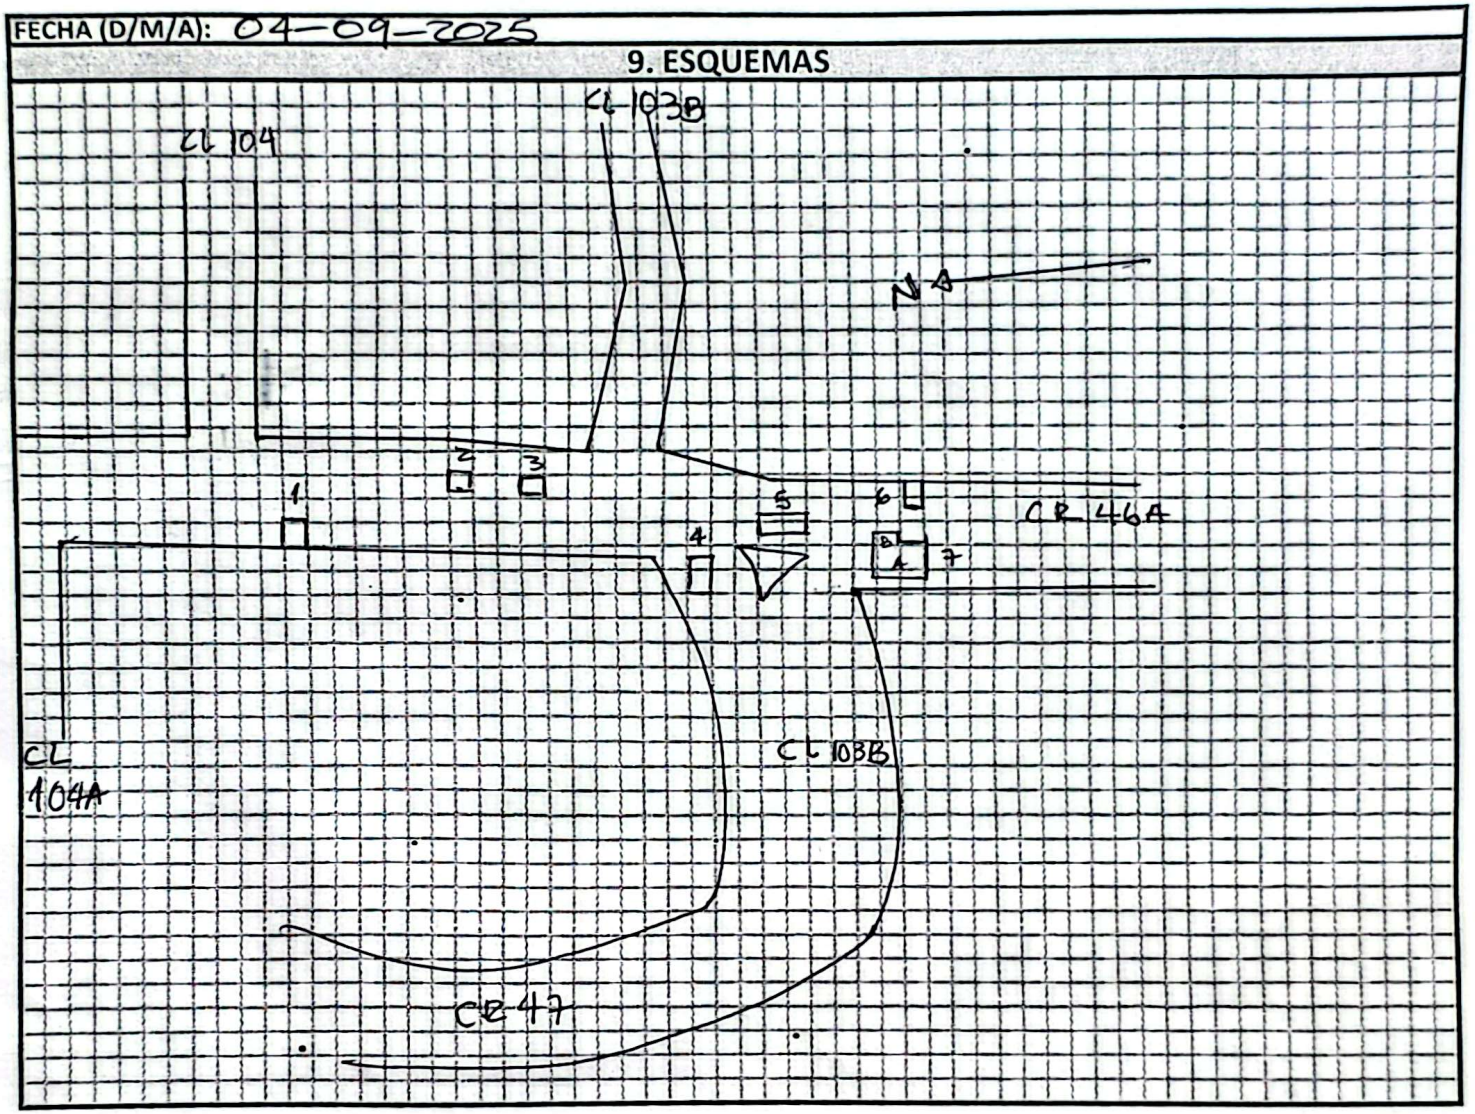

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	3
RANGO:	1	CANTIDAD:	11.10 Ton
BARRIO	Villa del Socorro.	DIRECCIÓN	CR 46A CL 104

Powered by CamScanner

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S

NIT: 900.243.322-4

PROCOPAL S.A.

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 22983

05 SEP 2025

RECIBIDO DESPACHOS - BASCULA

PROVEEDOR: Fuente 3. Volmet

VALE POR UN VIAJE: Escombros

PLACA No: GTY061 CAPACIDAD: 10 M3

DESTINO: Procopal

RECIBIDO POR:

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

William Tobón

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

PROCOPAL S.A.

Ingenieros Asociados

PROCOPAL S.A.

DESPACHOS-BASCULA

TIQUETE DE BASCULA: 233728

FECHA: 04/09/2025

HORA: 8:31:24 AM

CONDUCTOR: ALEX YALI

PLACA: GTY061

OBRA: 2307

SUMINIST. ASF. ESTRUC. PAV. UEN

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 19.27 Tonnes

PESO TARA: 8.17 Tonnes

PESO NETO: 11.10 Tonnes

PRODUCTO: 112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 141°C

VIAJE NUMERO: 3

TOTAL DESPACHADA: 27.96 Tonnes

William Tobón

Powered by CamScanner
