FECHA (D/M/A): 05-09-2025	BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Puntual		
RANGO:	1	CANTIDAD:	10.01 ton
ZONA	1	FRENTE DE TRABAJO:	3
COMUNA	1		
BARRIO	Villa del Socorro		

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 7:00 A.m	
TERMINACIÓN: 5:00 p.m	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA	Seca
	TARDE	Soleada

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Instalación de la señalización vertical según el PMT.
Demarcación de los puntos a intervenir.
Demolición y Acopio de los escombros sobrantes de las demoliciones
Imprimación con emulsión asfáltica de los puntos a intervenir.
Colocación y Compactación mecánica de la mezcla asfáltica MDC-19 con EAP en los puntos de intervención.
Se realiza chequeo de la temperatura de la mezcla asfáltica en campo 140°C

Nota: En las intervenciones de la jornada de hoy se afecta una señal horizontal Flecha blanca en el segmento 4001707 CR 43B CL 104-46.

Nota: Se presenta un incidente con un obrero que debido a la pendiente de la vía de intervención se le resbala el rodillo contra una vivienda.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: William Tobón Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	dexander Vásquez Giraldo Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	FIRMA NOMBRE: Edwin Rodríguez Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A):

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	William Tobon	X		Consorcio Vialmed
2	Encargado				
3	Liguero	Diego Cano	X		E Y P
4	Rastrillero	Yonnny Cuesta	X		E Y P
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Faber Quiroz	X		E Y P
7	Ayudante	Jhon Jairo Valencia	X		E Y P
8	Ayudante	Juan Esteban Murillo	X		E Y P
9	Ayudante	Jose Nilson Saldariaga	X		E Y P
10	Ayudante	David Zapata Arboleda	X		E Y P
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Jhorlet Castrillon	X		E Y P
17	Operador compresor	Jhon Jairo Herrera	X		E Y P
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Yair Alzate	X		
29	Conductor Volqueta(s)	Alexander Yali	X		
30	Controlador vial	Janeth Ortiz Manjares	X		
31	Controlador vial	Mariaelly Rincon	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	Husqvarna LP 6500	X		
2	Compresor	Doosan C-185	X		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	X		
10	Placa vibratoria	Honda FC-30	X		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Chevrolet NPR WCS 538	X		
16	Volqueta(s)	Freightliner 6TY 060	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A):

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4001707	160592	1	CR 43B CL 104-17	1.70	2.46	0.15	4,18	0,63	1,51
4001707	160593	2	CR43B CL 104-31	1.90	1.21	0.15	2,30	0,35	0,84
4001707	160594	3A	CR 43B CL 104-46	1.11	1.77	0.15	1,96	0,29	0,70
		B		0.85	1.50	0.14	1,28	0,18	0,43
4001707	160595	4A	CL 104B CR43B-07	6.15	1.09	0.14	6,70	0,94	2,26
		B		2.00	2.05	0.14	4.10	0,57	1,37
4001707	160596	5	CL 104B CR43B=11	2.40	1.95	0.15	4,68	0,70	1,68
4001708	160597	6	CL 104B CR43B-25	2,00	1.70	0.15	3.40	0,51	1,22
TOTALES							28,60	4.17	10.01

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
233764	GTY061	10.01	10.01	141


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
22984	GTY 061	Sencilla	1	Procopal

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 05-09-2025

10. ESQUEMAS

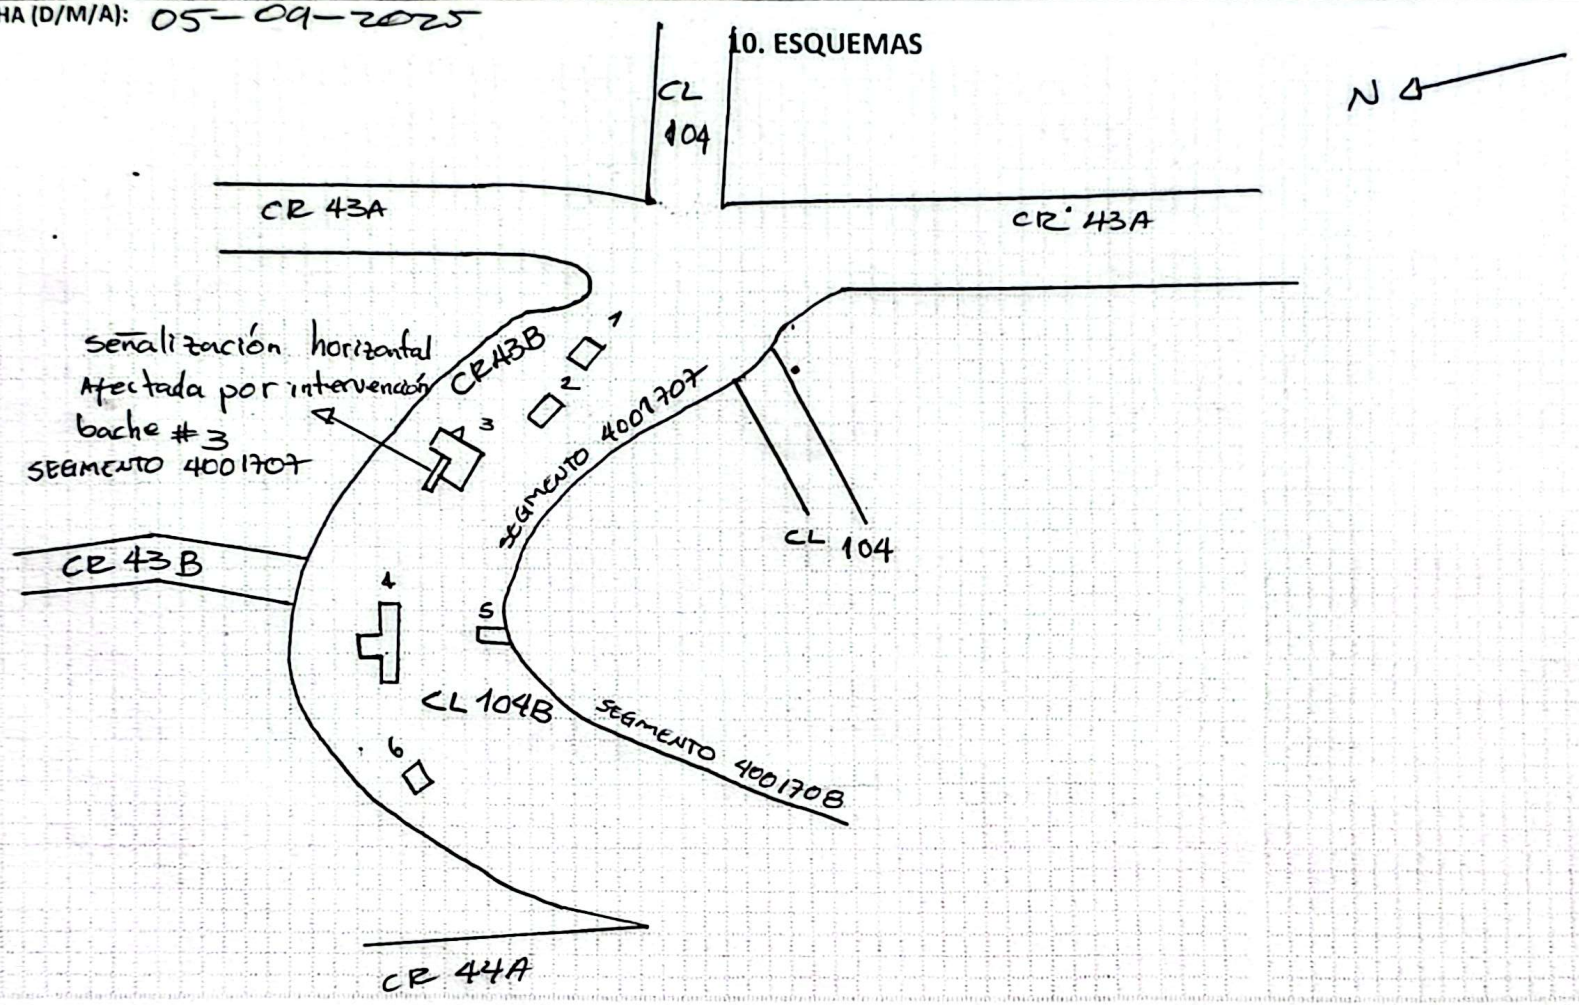

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	3
RANGO:	1	CANTIDAD:	10.01 TON
BARRIO	Villa del Socorro	DIRECCIÓN	CR 43B CL 104 - 17

Powered by CamScanner

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 22984

PROVEEDOR: Frente 3. Vialmed

VALE POR UN VIAJE: Escombros

05-09-25

PLACA No: GTY061 CAPACIDAD: 7.0 M3

DESTINO: Procopal

RECIBIDO POR:

PROCOPAL S.A
Nit: 890.900.388-0

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

William Tobón
Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellin/ Colombia

PROCOPAL S.A.
Ingeniería Aplicada
PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

TIQUETE DE BASCULA: 233764

FECHA: 05/09/2025

HORA: 8:52:10 AM

CONDUCTOR: ALEX YALI

PLACA: GTY061

OBRA: 230

SUMIN.:MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906308

PESO BRUTO: 18.22 Tonnes

PESO TARA: 8.21 Tonnes

PESO NETO: 10.01 Tonnes

PRODUCTO:112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 141°C

VIAJE NUMERO: 3

TOTAL DESPACHADA: 28.04 Tonnes

William Tobón

Powered by CamScanner
