FECHA (D/M/A): 08-09-2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Mantenimiento Puntual

RANGO: 1 CANTIDAD: 10.01 Ton

ZONA: 1

COMUNA: 1

BARRIO: Andalucia la Francia

FRENTE DE TRABAJO: 3

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 7:00 A.m

TERMINACIÓN: 5.00 p.m

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleada

TARDE: Soleada

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Instalación de la señalización vertical segun el PMT.
Demarcación de los puntos a intervenir.
Demolición y Acopio de los escombros sobrantes de las demoliciones.
Imprimación con emulsión asfáltica de los puntos a intervenir
Colocación y compactación mecánica de la mezcla asfáltica MDC-19 con RAP en los puntos de intervención
Se realiza el chequeo de la temperatura de la mezcla asfáltoca en campo 137°C.
Se realiza recolección de escombros, orden y Aseo.
Retiro de la señalización verticaul según el PMT
Con las intervenciones del dia de hoy se afecto 1 resalto ct 46 CL 107D - 15 Segmento 4002209.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: William Tobón Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	NOMBRE: alexander Vasquez Giraldo Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Juan Jose Rodriguez Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Edwin Bolaños Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

FECHA (D/M/A):

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			SI	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	William Tabon	X		Consorcio vialmed
2	Encargado				
3	Liguero	Diego Cano	X		E Y P
4	Rastrillero	Yovanny Cuesta	X		E Y P
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Faber Quiroz	X		E Y P
7	Ayudante	Jhon Jairo Valencia	X		E Y P
8	Ayudante	Juan Esteban Murillo	X		E Y P
9	Ayudante	Jose nilsen Salduarraga	X		E Y P
10	Ayudante	David Zapata Arboleda	X		E Y P
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador	Jhorlet Contreras	X		E Y P
22	Operador Compactador llantas	Jhon Jairo Herrera	X		E Y P
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Yair Alzate	X		
29	Conductor Volqueta(s)	Alexander Yali	X		
30	Controlador vial	janeth Ortiz Manjares	X		
31	Controlador vial	Maricelly Rincon	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			SI	No	
1	Rodillo manual	Husqvarna LP 6500	X		
2	Compresor	Doosan C-185	X		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	X		
10	Placa vibratoria	Honda FC-30	X		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	chevrolet NPR WCS 338	X		
16	Volqueta(s)	Freightliner GTY 061	X		

FECHA (D/M/A):


9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4002209	160746	1	CR 46 CL 107D - 13	6.45	1.78	0.18	11.48	2.07	4.97
4002209	160745	2	CR 46 CL 107D - 15	2.56	1.54	0.13	3.94	0.51	1.22
4002209	160738	3	CR 46 CL 107D-02	3.60	1.20	0.15	4.32	0.65	1.56
4002209	160744	4	CR 46 CL 107D-47	3.80	1.20	0.15	4.56	0.68	1.63
4002209	160742	5	CR 46 CL 107D-49	1.25	1.60	0.13	2.00	0.26	0.62
TOTALES							26,30	4.17	10.00

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICION
233791	GTY061	10.01	10.00	140°	22985	GTY 061	Sencilla	1	Procopal

FECHA (D/M/A): 08-09-2025

10. ESQUEMAS

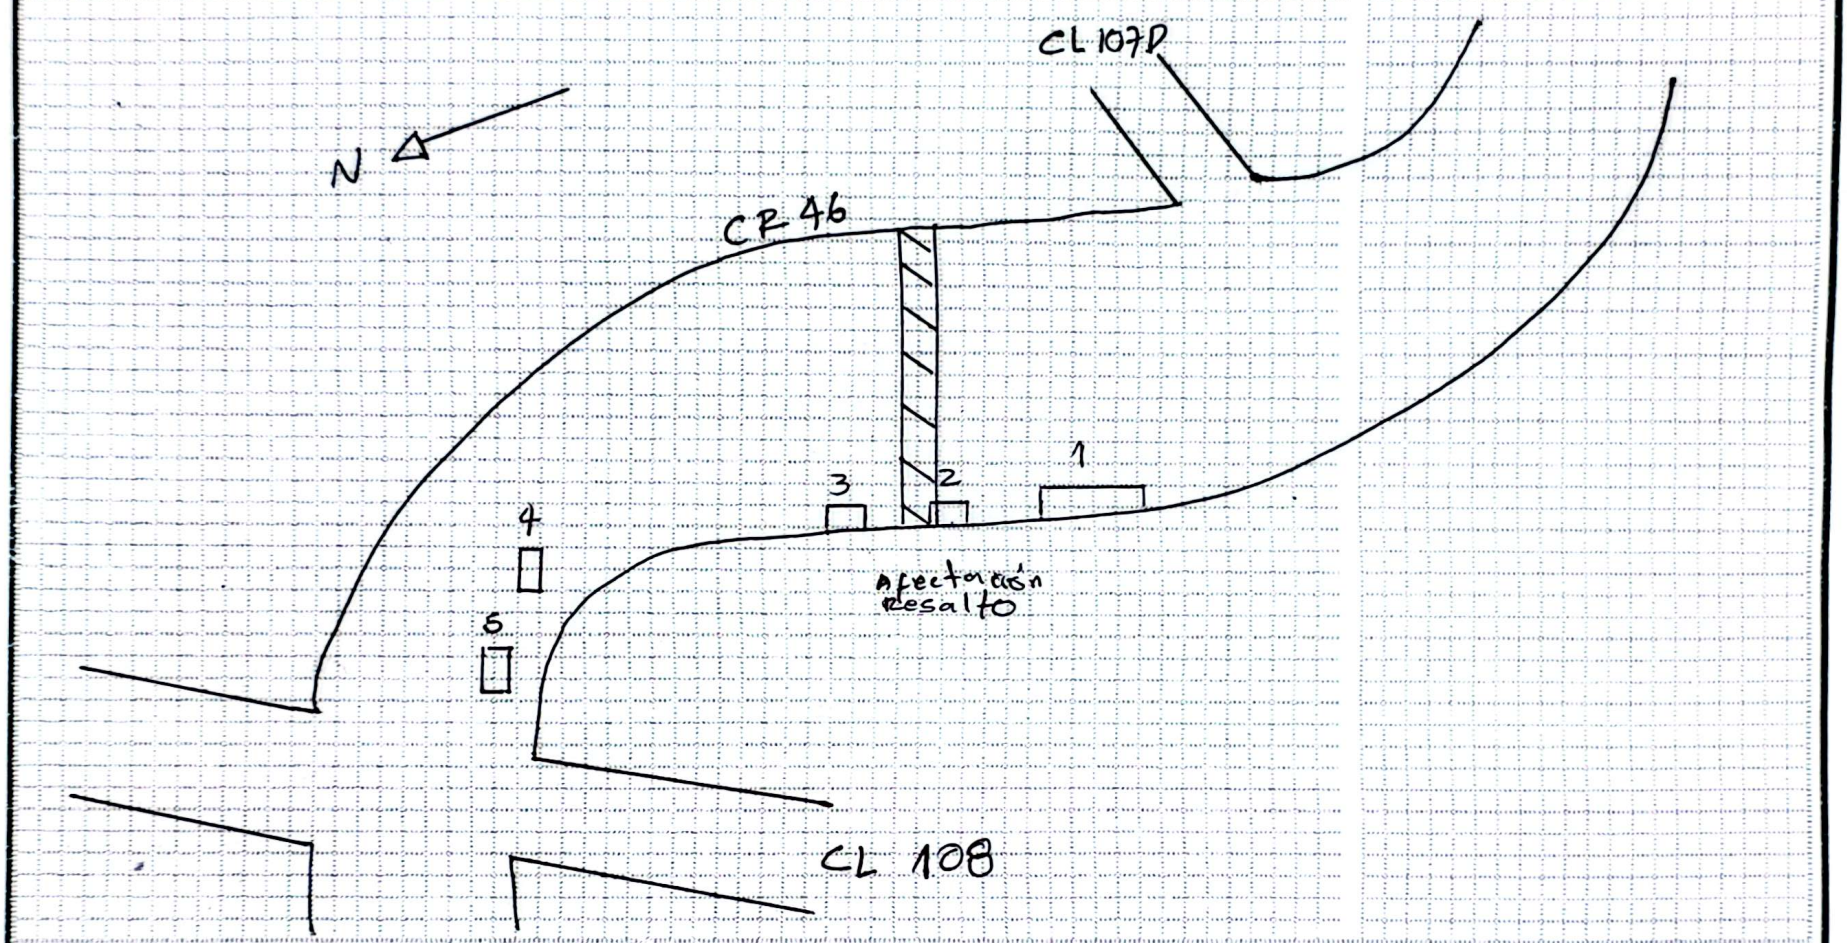

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	3
RANGO:	1	CANTIDAD:	10.00 Ton
BARRIO	Andalucia la Francia	DIRECCIÓN	Andalucia CR 46 CL 107 D-13

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 22985

PROVEEDOR: frente 3. Vialmed

VALE POR UN VIAJE: Escombros

08-09-25

PLACA No: GTY061 CAPACIDAD: 7.0 M3

DESTINO: Procopal

RECIBIDO POR:

PROCOPAL S.A
Nit. 890.906.388-0

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

William Tobón

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

ESTAN PAVIDS

PROCOPAL S.A.
Ingenieros Contratistas
DESPACHO BÁSCULA

TIQUETE DE BASCULA: 233791

FECHA: 08/09/2025

HORA: 8:45:55 AM

CONDUCTOR: ALEX YALI

PLACA: GTY061

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 18.13 Tonnes

PESO TARA: 8.12 Tonnes

PESO NETO: 10.01 Tonnes

PRODUCTO:112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 140 c

VIAJE NUMERO: 3

TOTAL DESPACHADA: 26.04 Tonnes

William Tobón
