FECHA (D/M/A):	10-09-2025	**BITACORA DE OBRA**

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Puntual		
RANGO:	1	CANTIDAD:	10.07 TON

ZONA	1	FRENTE DE TRABAJO:	3
COMUNA	1		
BARRIO	Santo Domingo Savio I		

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	**CONTRATO No.** 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	**CONTRATO No.** 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:		JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO:	7:00 A.M	
TERMINACIÓN:	5:00 p.m	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA	Soleada
	TARDE	Soleada

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Instalación de la señalización vertical según el PMT.
Demarcación de los puntos a intervenir.
Demolición y acopio de los escombros sobrantes de las demoliciones.
Imprimación con emulsión asfáltica en los puntos a intervenir
Colocación y compactación de la mezcla asfáltica MDC-19 con RAP en los puntos de intervención
Chequeo de la temperatura de la mezcla asfáltica en campo 139°C
Recolección de escombros, orden y aseo.
Retiro de la señalización vertical según el PMT.
Charla SST por parte del contratista sobre cuidados auditivos

5. FIRMAS

NOMBRE:	William Tobón Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Alexander Vasquez Giraldo Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA		
NOMBRE:	Jeyson Restrepo Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Edwin Rodriguez Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

FECHA (D/M/A):

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			SI	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	William Tobón	X		Consorcio Vialmed
2	Encargado				
3	Liguero	Diego Cano	X		E y P
4	Rastrillero	Yovanny Cuesta	X		E y P
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Faber Quiroz	X		E y P
7	Ayudante	Jhon Jairo Valencia	X		E y P
8	Ayudante	Jose isaza ISAZA	X		E y P
9	Ayudante	Jose nilsen Saldariaga	X		E y P
10	Ayudante	DAVID Zapata Arboleda	X		E y P
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Jhorlet Contreras	X		E y P
17	Operador compresor	Jhon Jairo Herrera	X		E y P
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Yair Alzate	X		
29	Conductor Volqueta(s)	Alexander Yali	X		
		Janeth Ortiz Manjares	X		
		Maricelly Pinzon	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			SI	No	
1	Rodillo manual	Husqvarna LP 6500	X		
2	Compresor	Doosan C-185	X		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Ranmeta	X		
10	Placa vibratoria	Honda PC-30	X		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Chevrolet NPR WCS 338	X		
16	Volqueta(s)	Freightliner GTY 061	X		

FECHA (D/M/A):


9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES			Area	Vol	Ton
				L (m)	A (m)	e (m)	(m2)	(m3)	(kg)
4001866	160855	1	CR 37 CL 107B-17	4,60	1,51	0.12	6,95	0.83	1,99
4001866	160856	2	CR 37 CL 107B-24	5,42	1,30	0.16	7,05	1.13	2,71
4001866	160857	3	CR 37 CL 107C	2,90	1,50	0.15	4,35	0.65	1,56
4001866	160858	4	CR 37 CL 107C+2m	2,00	2,00	0.14	4,00	0.56	1,34
4001864	160859	5	CL 107C CR 37-06	2,02	2,30	0.12	4,65	0.56	1,34
4001864	160860	6	CR 37 CL 107CC-09	2,60	1,30	0.14	3,38	0.47	1,13
TOTALES							30,38	4,20	10,07

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
233861	GTY061	10.07	10.07	141	22987	GTY 061	Sencilla	1	Procopal

FECHA (D/M/A): 10 - 09 - 2025

10. ESQUEMAS

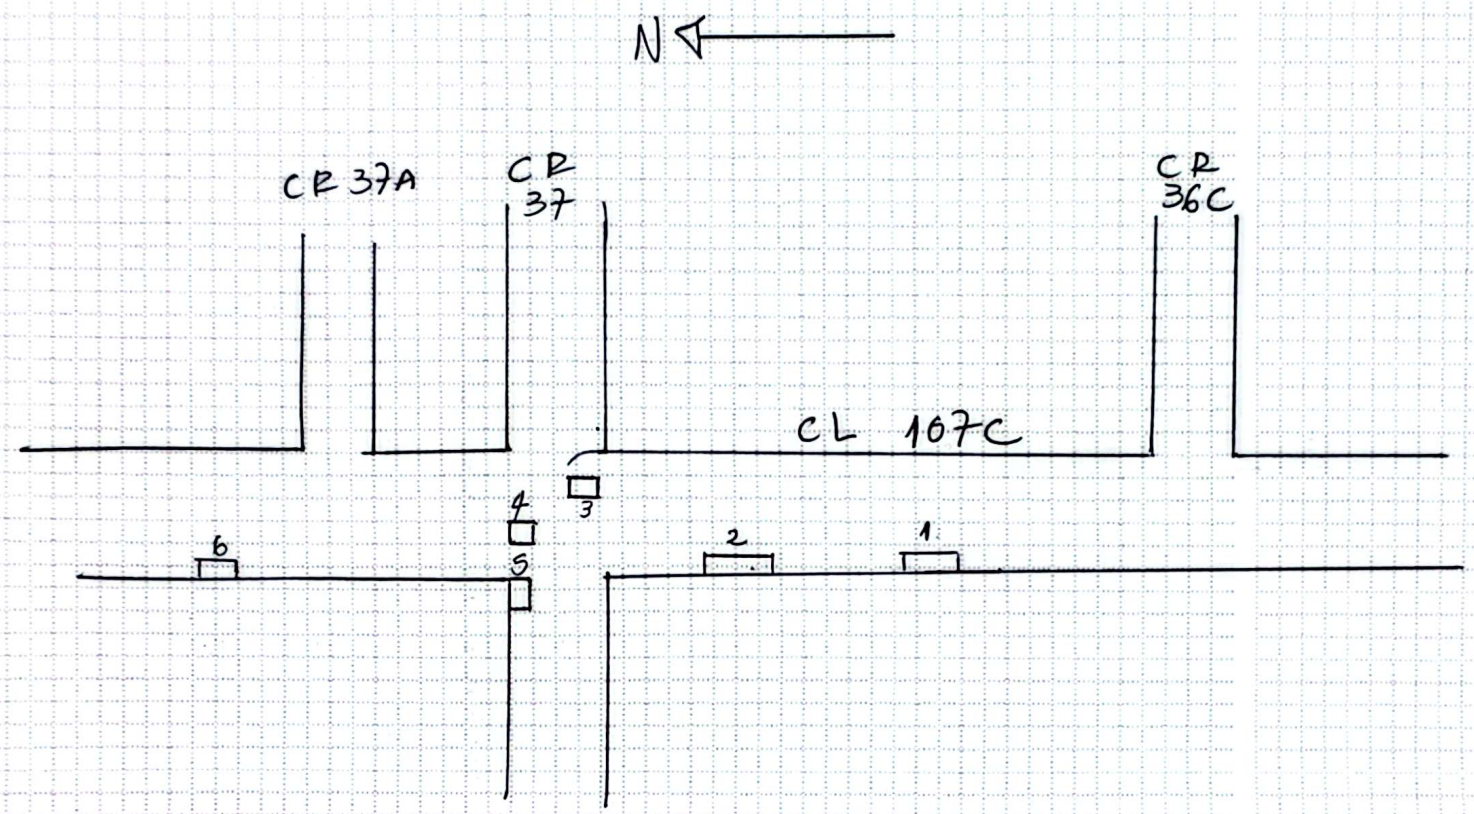

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	3
RANGO:	1	CANTIDAD:	10.07 TON
BARRIO	Santo Domingo Savio 1	DIRECCIÓN	CR 37 CL 107-17

Estructuras y Pavimentos S.A.S

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS **Nº 22987**

PROVEEDOR: Frente 3 Vial med

VALE POR UN VIAJE: Escombros

10-09-25

PLACA No: GTY061 PROCOPAL S.A. CAPACIDAD: M3

DESTINO: Procopal

RECIBIDO POR:

10 SEP 2025

DESPACHOS BASCULA

NOTA IMPORTANTE:
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

William Tobón
Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

PROCOPAL S.A.
Ingenieros Contratistas

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS BASCULA

TIQUETE DE BASCULA: 233861

FECHA: 10/09/2025

HORA: 9:08:52 AM

CONDUCTOR: ALEX YALI

PLACA: GTY061

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 18.27 Tonnes

PESO TARA: 8.20 Tonnes

PESO NETO: 10.07 Tonnes

PRODUCTO:112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MIC19

TEMPERATURA: 140°C

VIAJE NUMERO: 2

TOTAL DESPACHADA: 20.06 Tonnes

William Tobón
