FECHA (D/M/A): 12-09-2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Mantenimiento Puntual

RANGO: 1

CANTIDAD: 10, 13 dos

ZONA: 1

COMUNA: 1

BARRIO: Popular 1

FRENTE DE TRABAJO: 3

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO : 7:00 A.m

TERMINACIÓN: 5:00 p.m

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA

TARDE

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Instalación de la señalización vertical según el PMT
Demarcación de los puntos a intervenir
Demolición y Acopio de los escombros sobrantes de las demoliciones.
Imprimación con emulsión Asfáltica de los puntos de intervención.
Se Realiza chequeo de la temperatura de la mezcla Asfáltica en campo 138°C.
Se realiza recolección de escombros orden y Aseo
Retiro de la señalización vertical según PMT.
Colocación y compactación mecánica de la mezcla asfáltica MDC-19 con RAP en los puntos intervenidos

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: William Tobón Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Alexander Vasquez Giraldo Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Edwin Rodriguez Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

FECHA (D/M/A):

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA SI	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	William Tobon	X		Consorcio Vialmed
2	Encargado				
3	Liguero	Diego Cano	X		E y P
4	Rastrillero	Yovanny Cuesta	X		E y P
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Feber Quiroz	X		E y P
7	Ayudante	Jhon Jairo Valencia	X		E y P
8	Ayudante	Jose isaza isaza	X		E y P
9	Ayudante	Jose wilson saloueriaga	X		E y P
10	Ayudante	David Zapata Albaldia	X		E y P
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante		X		E y P
16	Operador Rodillo manual	Yhorlet Contreras	X		E y P
17	Operador compresor	John Jairo Herrera	X		E y P
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Yair Alzate	X		
29	Conductor Volqueta(s)	Alexander Yali	X		
30	Controladora vial	aneth Ortiz Mangares	X		
31	Controladora vial	Paola Monsalve Aguirre	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN SI	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	Husqvarna LP 6500	X		
2	Compresor	Doosan - 185	X		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Imacmyta	X		
10	Placa vibratoria	Honda FC-30	X		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Chevrolet NPR W(5338	X		
16	Volqueta(s)	Freightliner 6TY061	X		

FECHA (D/M/A):

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4001832	160949	1	cl 106 CR 42C-08	3.85	1.50	0.15	5.78	0.87	2.09
400 1848	160951	2	cl 106 CR 42C-08+3m	5.90	1.10	0.15	6,49	0.97	2.33
400 1848	160952	3A	cl 106 CR 42C-22	3.03	1.10	0.15	3.33	0.50	1.20
400 1848		B		1.10	1.65	0.14	1.82	0.25	0.60
400 1830	160953	4	cl 106 CR 42D-13	1.95	1.95	0.14	3.80	0.53	1.27
5012331	160954	5	CR 43A cl 105-05	1.70	2.60	0.14	4.42	0.62	1.49
400 1827	160955	6	CR 43A cl 104-56	1.90	1.80	0.14	3.42	0.48	1.15
TOTALES							29.06	4.22	10.13

MEZCLA ASFALTICA


REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
233948	GTY061	10.13	10.13	140

BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
22989	GTY 061	Sencilla	1	Procopal

FECHA (D/M/A): 12 - 09 - 2025

10. ESQUEMAS

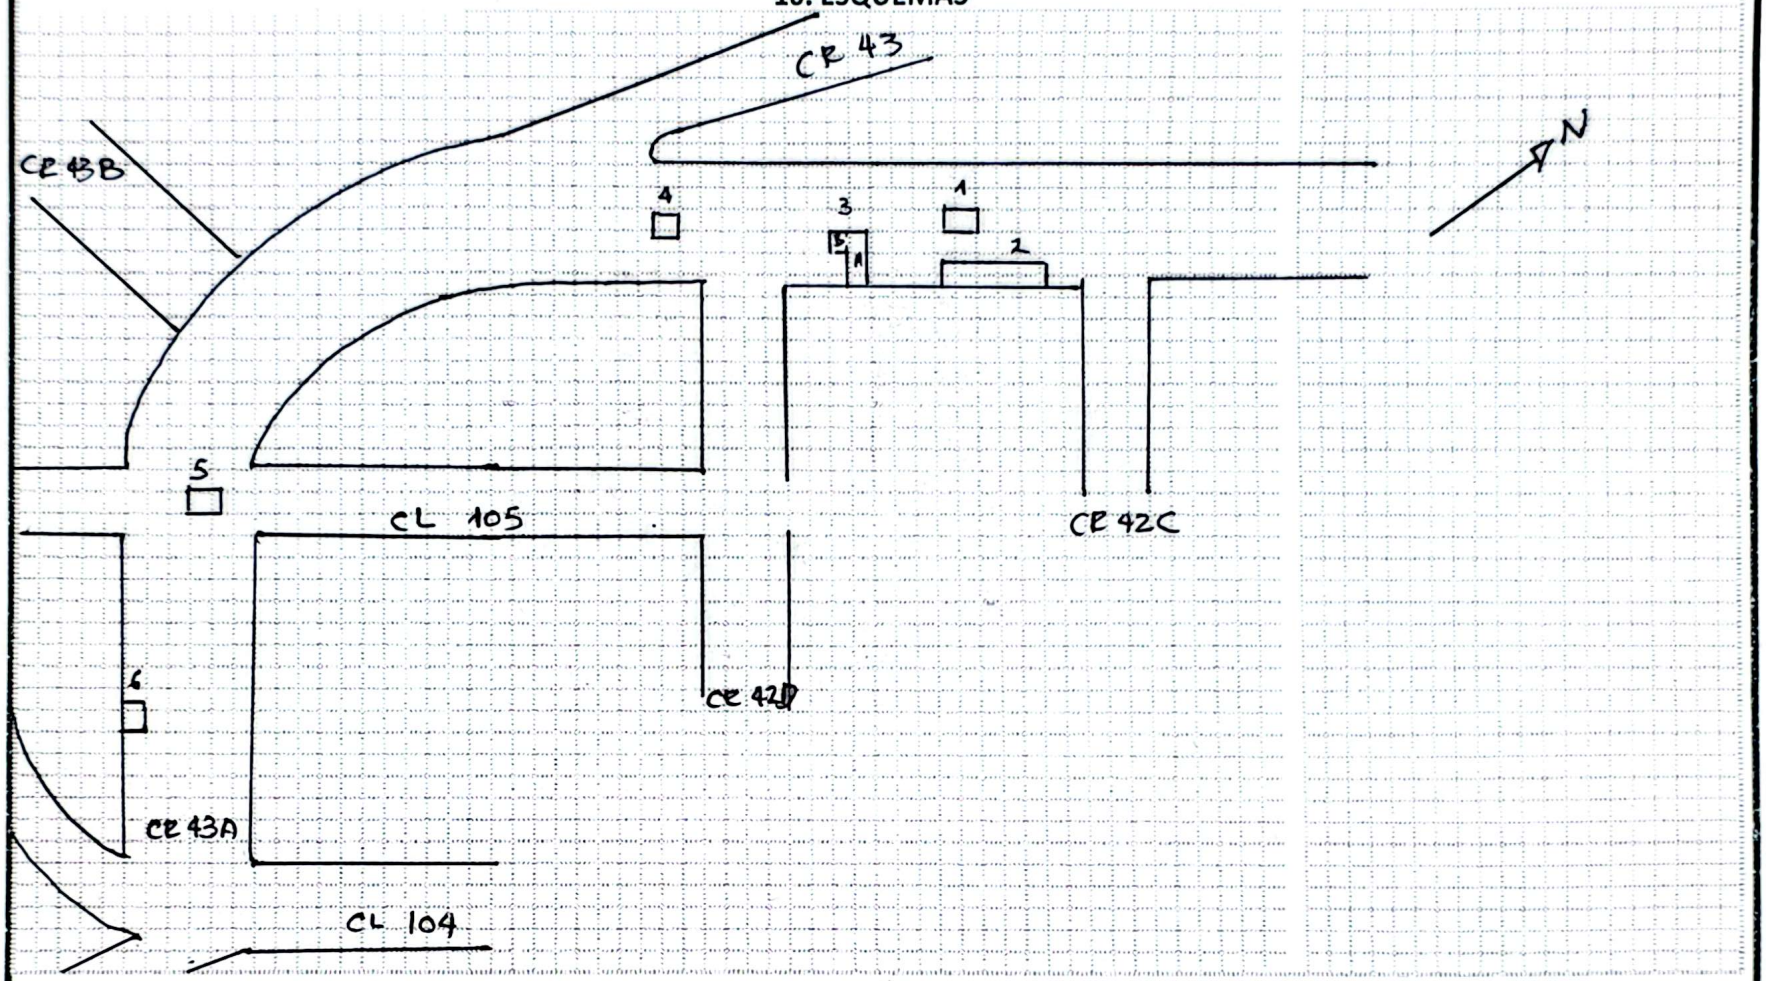

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	3
RANGO:	1	CANTIDAD:	10.13 Un
BARRIO	Popular 1	DIRECCIÓN	CL 106 CR 42C-08

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS **Nº 22989**

PROVEEDOR: Frente 3. Valmed

VALE POR UN VIAJE: Escombros

12-09-25

PLACA No: GTY061 CAPACIDAD: 7.0 M3

DESTINO: Procopal

RECIBIDO POR: [redacted]

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

NIT. 890.906.388-0
PROCOPAL S.A.
William Tobón
Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellin/ Colombia

ESTOS PAVIMOS

PROCOPAL S.A.
Ingenieros [illegible]

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

TIQUETE DE BASCULA: 233948

FECHA: 12/09/2025

HORA: 8:16:02 AM

CONDUCTOR: ALEX YALI

PLACA: GTY061

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 18.28 Tonnes

PESO TARA: 8.15 Tonnes

PESO NETO: 10.13 Tonnes

PRODUCTO:112

MEZ. DENSA TIPIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 140°C

VIAJE NUMERO: 3

TOTAL DESPACHADA: 29.93 Tonnes

William Tobón
