FECHA (D/M/A): 15-09-2025	BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Puntual		
RANGO:	1	CANTIDAD:	10.02 ton
ZONA	1	FRENTE DE TRABAJO:	3
COMUNA	2		
BARRIO	Villa del Socorro		

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:		JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:	
INICIO:	7:00 A.m		
TERMINACIÓN:	5:00 p.m		

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA	Seca
	TARDE	Seca

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Instalación de la señalización vertical según el PMT.
Demarcación de los puntos a intervenir.
Demolición y Acopio de los escombros sobrantes de las demoliciones.
Recompactación de la base granular existente.
Imprimación con emulsión asfáltica en los puntos de intervención.
Colocación y compactación mecánica de la mezcla asfáltica MDC-19 con RAP en los puntos intervenidos
Chequeo de la temperatura de la mezcla asfáltica en Campo 139°C.
Limpieza, Orden y Aseo de la zona de trabajo
Retiro de la señalización vertical según el plat.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: William Tobón Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Alexander Vasquez Giraldo Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Fernando Rodriguez. Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Eduardo Rodriguez Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A):

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	William Tobón	X		Consorcio Vialmed
2	Encargado				
3	Liguero	Diego Cano	X		E y P
4	Rastrillero	Yovanny Cuesta	X		E y P
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Faber Quiroz	X		E y P
7	Ayudante	Jhon Jairo Valencia	X		E y P
8	Ayudante	Jose Nilsen Saldariaga	X		E y P
9	Ayudante	David Zapata Arboleda	X		E y P
10	Ayudante				
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Jhorlet Contreras	X		E y P
17	Operador compresor	Jhon Jairo Herrera	X		E y P
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Yair Alzate	X		
29	Conductor Volqueta(s)	Alexander Yali	X		
30	Controlador Vial	janeth Manjares	X		
31	Controlador Vial	Paola Aguirre	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	Husqvarna LP 6500	X		
2	Compresor	Doosan C-185	X		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	X		
10	Placa vibratoria	Honda FC-30	X		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Chevrolet NPR WCS338	X		
16	Volqueta(s)	Freightliner GTY 061	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 15-09-2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L(m)	DIMENSIONES A(m)	DIMENSIONES e(m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4001827	161195	1	CR 43A CL 105-14	4,50	2,02	0.14	9.09	1.27	3.05
4001827	161196	2	CR 43A CL 105 V05	4,68	1,05	0.14	4.91	0.69	1.66
4001827	160956	3	CR 43A CL 104-20	3,46	1,37	0.15	4.74	0.71	1.70
4001830	155153	4	CR 43A CL 104-11	2,35	2,45	0.14	5.76	0.81	1.94
5012331	155709	5	CR 43A CL 103-88	1,92	2,55	0.14	4.90	0.69	1.66
TOTALES							29.40	4.17	10.01

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
233978	GTY061	10.02	10.01	141


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
22990	GTY 061	Sencilla	1	Procopal

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 15 -09-2025

10. ESQUEMAS

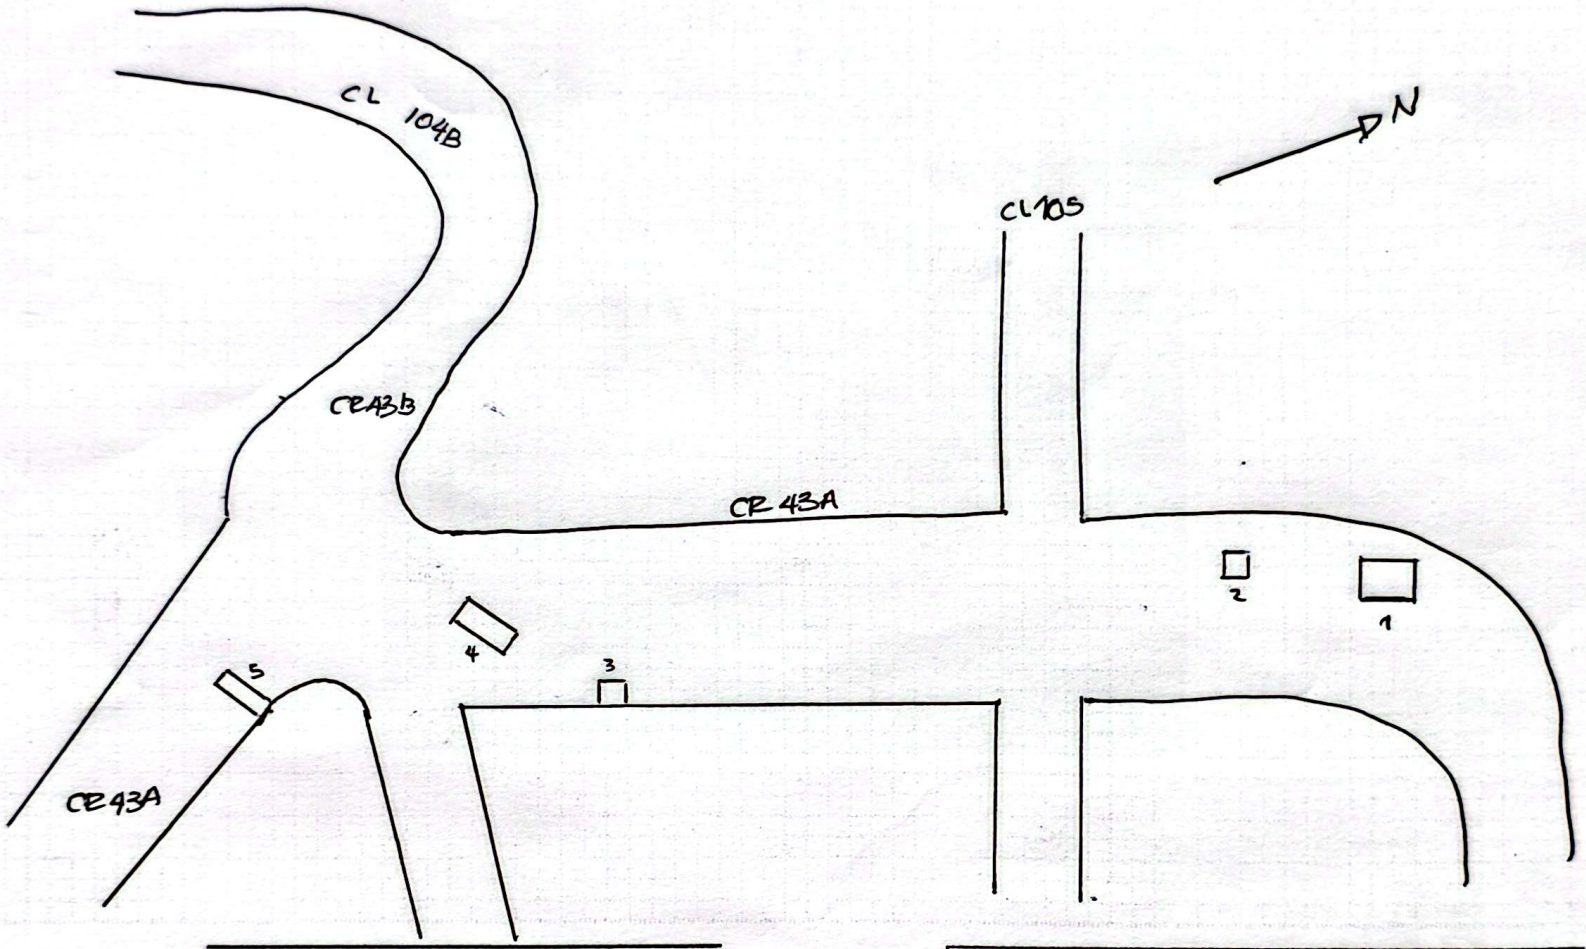

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	3
RANGO:	1	CANTIDAD:	10.01 Ton
BARRIO	Villa del Socorro	DIRECCIÓN	CR 43A CL 105-14

Powered by CamScanner

Estructuras y Pavimentos S.A.S

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS **Nº 22990**

PROVEEDOR: frente 3. Vialmed

VALE POR UN VIAJE: Escombros

15-09-25

PLACA No: GTY061 CAPACIDAD: 7.0 M3

DESTINO: Procopal

RECIBIDO POR:

PROCOPAL S.A
Nit 890.906.356-0

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

William Tobón
Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

PROCOPAL S.A.

Ingenier...

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

TIQUETE DE BASCULA: 233978

FECHA: 15/09/2025

HORA: 8:14:22 AM

CONDUCTOR: ALEX YALI

PLACA: GTY061

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 18.24 Tonnes

PESO TARA: 8.22 Tonnes

PESO NETO: 10.02 Tonnes

PRODUCTO:11

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 141°C

VIAJE NUMERO: 3

TOTAL DESPACHADA: 29.93 Tonnes

William Tobón

Powered by CamScanner
