| SOLIUN | SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT<br>PROYECTO - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES<br>INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO No. | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | V-0 |
| | | FECHA: | enero-25 |
| | | PÁGINA: | 1 de 1 |

| 1. FECHA ELABORACIÓN | 23 | sep | 2025 | 2. INFORME No. | 26 | 3. SEMANA No. | 26 | 4. PERIODO | 16 | sep | AL | 22 | sep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 5. NOMBRE DE LA INTERVENTORÍA | SOLIUN S.A.S. | 6. NIT | 900.768.458-0 |
|---|---|---|---|

| 7. CONTRATO No: | 1728 DE 2024 | 8. FECHA CONTRATO: | 27/12/2024 | 9. VALOR CONTRATO: | $ 205.747.593,00 |
|---|---|---|---|---|---|

| 10. FECHA ACTA INICIO: | 19/02/2025 | 11. FECHA DE TERMINACIÓN: | 19/10/2025 | 12. PLAZO: | 8 Meses |
|---|---|---|---|---|---|

| 13. OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: | REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL ECOBARRIO NUEVA CASTILLA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO PRIORIZADO POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HÁBITAT. |
|---|---|

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA

| 15. NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBR | CONSORCIO ANTARES IP | 16. NIT | 901901686-7 |
|---|---|---|---|

| 17. CONTRATO No: | 1753 DE 2024 | 18. FECHA CONTRATO: | 30/12/2024 | 19. VALOR CONTRATO: | $ 846.230.302,00 |
|---|---|---|---|---|---|

| 20. FECHA ACTA INICIO: | 19/02/2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 19/10/2025 | 22. PLAZO: | 8 Meses |
|---|---|---|---|---|---|

| 23. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL ECOBARRIO NUEVA CASTILLA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO PRIORIZADO POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HÁBITAT |
|---|---|

## 24. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA - OBRA

| CONTRATO DE OBRA | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA | |
|---|---|---|---|
| Valor Inicial | $ 846.230.302,00 | Valor Inicial | $ 205.747.593,00 |
| Valor Adicional 1 | $ - | Valor Adicional 1 | $ - |
| valor Adicional 2 | $ - | valor Adicional 2 | $ - |
| Valor Actualizado | $ 846.230.302,00 | Valor Actualizado | $ 205.747.593,00 |
| Plazo Inicial | 8 Meses | Plazo Inicial | 0 Meses |
| Plazo Prórroga 1 | | Plazo Prórroga 1 | |
| Plazo Actualizado | | Plazo Actualizado | |
| Fecha de Iniciación | | Fecha de Iniciación | |
| Fecha de suspensión No.1 | 18/07/2025 | Fecha de suspensión No.1 | 18/07/2025 |
| Fecha de ampliación No.1 suspensión No.1 | | Fecha de ampliación No.1 suspensión No.1 | |
| Fecha de ampliación No.2 suspensión No.1 | | Fecha de ampliación No.2 suspensión No.1 | |
| Fecha de ampliación No.3 suspensión No.1 | | Fecha de ampliación No.3 suspensión No.1 | |
| Fecha de reinicio No.1 | 18/08/2025 | Fecha de reinicio No.1 | 18/08/2025 |
| Fecha de Terminación Inicial | 19/10/2025 | Fecha de Terminación Inicial | 19/10/2025 |
| Fecha de Terminación Actual | 19/11/2025 | Fecha de Terminación Actual | 19/11/2025 |

## 25. BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS

### CONTRATO DE CONTRATISTA DE OBRA

| VR. CONTRATO | 0% | $ - |
|---|---|---|

| No. Acta | Valor del Acta | VR. Deducciones | Fecha Acta |
|---|---|---|---|
| Acta No. 1 | $ - | $ - | |
| Acta No. 2 | $ - | $ - | |
| Acta No. 3 | $ - | $ - | |
| Acta No. 4 | $ - | $ - | |
| Acta No. 5 | $ - | $ - | |
| Acta No. 6 | $ - | $ - | |
| Acta No. 7 | $ - | $ - | |
| Acta No. 8 | $ - | $ - | |
| Acta No. 9 | $ - | $ - | |
| Acta No. 10 | $ - | $ - | |
| Acta No. 11 | $ - | $ - | |
| Acta No. 12 | $ - | $ - | |
| Acta No. 13 | $ - | $ - | |
| Acta No. 14 | $ - | $ - | |
| Acta No. 15 | $ - | $ - | |
| Acta No. 16 | $ - | $ - | |
| Acta No. 17 | $ - | $ - | |
| Acta No. 18 | $ - | $ - | |
| Acta No. 19 | $ - | $ - | |
| Acta No. 20 | $ - | $ - | |

| VALOR EJECUTADO | $ - | % Avc. | 0,00% |
|---|---|---|---|
| VALOR POR EJECUTAR | $ 846.230.302,00 | % Falt. | 100,00% |
| VALOR RETEGARANTIA | $ 42.311.515,10 | % Avc. | 0,00% |
| VALOR POR DEDUCCIÓN | $ - | % Falt. | 0,00% |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| VR. CONTRATO | 0% | $ 205.747.593,00 |
|---|---|---|

| No. Acta | Valor Acumulado | VR. Deducciones | Fecha Acta |
|---|---|---|---|
| Acta No. 1 | $ - | $ - | |
| Acta No. 2 | $ - | $ - | |
| Acta No. 3 | $ - | $ - | |
| Acta No. 4 | $ - | $ - | |
| Acta No. 5 | $ - | $ - | |
| Acta No. 6 | $ - | $ - | |
| Acta No. 7 | $ - | $ - | |
| Acta No. 8 | $ - | $ - | |
| Acta No. 9 | $ - | $ - | |
| Acta No. 10 | $ - | $ - | |
| Acta No. 11 | $ - | $ - | |
| Acta No. 12 | $ - | $ - | |
| Acta No. 13 | $ - | $ - | |
| Acta No. 14 | $ - | $ - | |
| Acta No. 15 | $ - | $ - | |
| Acta No. 16 | $ - | $ - | |
| Acta No. 17 | $ - | $ - | |
| Acta No. 18 | $ - | $ - | |
| Acta No. 19 | $ - | $ - | |
| Acta No. 20 | $ - | $ - | |

| VALOR EJECUTADO | $ - | % Avc. | 0,00% |
|---|---|---|---|
| VALOR POR EJECUTAR | $ 205.747.593,00 | % Falt. | 100,00% |
| VALOR POR DEDUCCIÓN | $ - | % Falt. | 0,00% |

## 26. AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE EJECUTADO DURANTE LA SEMANA


### ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | ATRASO(-) ADELANTO (+) |
|---|---|---|---|
| Acumulado Anterior | 99,00% | 100,00% | -1,00% |
| Durante la Semana | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| **Actual Acumulado** | 99,00% | 100,00% | -1,00% |

| | | |
|---|---|---|
| **Valor Etapa** | $ | 104.776.636,00 |

| EJECUCIÓN | SEMAMA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Programada | 0,00% | 100,00% |
| Valor de la Obra | $ - | $ 104.776.636,00 |

| EJECUCIÓN | SEMAMA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Ejecutada | 0,00% | 99,00% |
| Valor de la Obra | $ - | $ 103.728.869,64 |

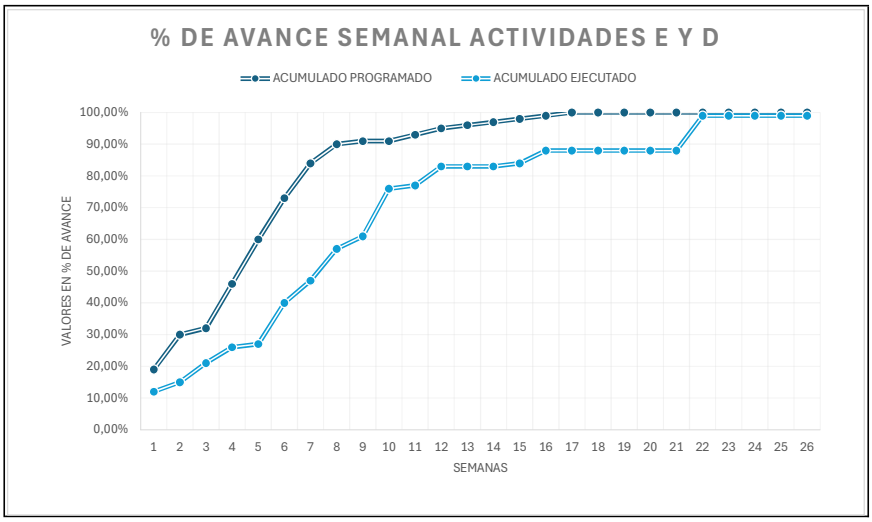



### ETAPA DE OBRA

| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | ATRASO(-) |
|---|---|---|---|
| Acumulado Anterior | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Durante la Semana | 16,95% | 10,88% | 6,07% |
| **Actual Acumulado** | 16,95% | 10,88% | 6,07% |

| | | |
|---|---|---|
| **Valor Etapa** | $ | 741.453.666,00 |

| EJECUCIÓN | SEMAMA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Programada | 10,88% | 10,88% |
| Valor de la Obra | $ 80.670.158,86 | $ 80.670.158,86 |

| EJECUCIÓN | SEMAMA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Ejecutada | 16,95% | 16,95% |
| Valor de la Obra | $ 125.676.396,39 | $ 125.676.396,39 |

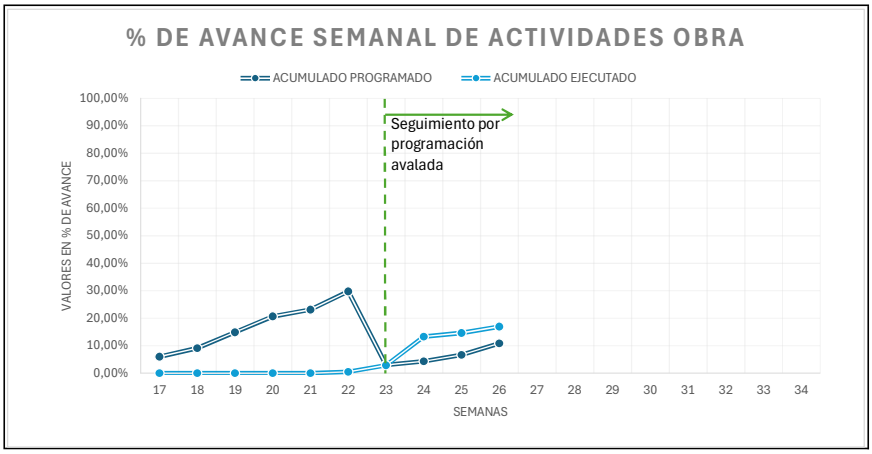


## 27. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE TÉCNICO

Avance Programado: E y D: 100% Obra: 10,88% Para el comité # 25 se reportará los porcentajes programados y de avance aquí registrados.

Avance Ejecutado: E y D: 99% Obra: 16,95%

Actividades realizadas:

LOTE B

* Se realiza chequeo de los niveles de fondo de excavación en la plazoleta de juegos infantiles
* Se evidencia un fallo en el fondo de excavación en la plazoleta de juegos infatiles, el mismo es tratado con material RCD de las demoliciones realizadas
* Se realiza selección de los bordillos que estéticamente se encuentran en mal estado y se apartan para ser devueltos al proveedor
* Se realiza limpieza manual de los adoquines desmontados que se reutilizarán
* El laboratorio por parte del contratista recoge muestras de material de SBG RCD para realizar los ensayos correspondientes
* Compactación de la subrasante previa a reinstalación de adoquín
* Se inicia con la reinstalación de adoquín en el sendero interno del parque, comenzando por la instalación de la cama de arena
* Se realiza el retiro de la grava ya instalada en el filtro francés para ser tamizada de acuardo a las especificaciones técnicas, se acopia para ser reinstalada de nuevo

LOTE A

* Se continúa con la reinstalación los adoquines desmontados con anterioridad sobre los senderos internos del parque
* Se continúa con la instalación de loseta guía sobre los senderos internos del parque objeto de intervención
* Se realiza la excavación sobre el área de la plazoleta de juegos infantiles
* Se realiza cortes de piezas de los adoquines que rematan con el bordillo existente
* Se evacúa el material producto de la excavación

## 28. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE SST - AMBIENTAL

**• Componente Ambiental :**

Se realiza recorrido desde el componente ambiental y se dejan recomendaciones en bitacora de obra el dia 15/09/2025, asociadas a organizacion de zonas de acopio , señalizacion y jornadas de aseo.
Asitencia a comite de seguimiento de Obra el dia 18/09/2025.
Se remite comunicado SDHT-1728-2024-380 Solicitud Remisión semanal de reporte ambiental y consolidado de materiales/RCD el dia 18/09/2025.
Se recibe reporte semanal por parte del contratista mediante correo electronico indicando las actividades realizadas desde el componente . 22/09/2025.
Durante la semana se reportaron los siguientes materiales con ingreso y salida en el frente de obra:

| # VALE | PLACA DE VOLQUETA | FECHA | MATERIAL | VOLUMEN | PROVEEDOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70367 | USB 947 | 17/09/2025 | SUB BASE GRANULAR TIPO B | 15 M3 | GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS | N.A |
| 70366 | USB 947 | 15/09/2025 | EXCAVACION | 15M3 | MAQUINAS AMARILLAS S.A.S | N.A |
| 70368 | SPS 241 | 19/09/2025 | EXCAVACION | 15 M3 | MAQUINAS AMARILLAS S.A.S | N.A |
| 70369 | USB 947 | 19/09/2025 | EXCAVACION | 15 M3 | MAQUINAS AMARILLAS S.A.S | N.A |
| 70370 | SPS 241 | 19/09/2025 | EXCAVACION | 15 M3 | MAQUINAS AMARILLAS S.A.S | N.A |

**• Componente SST :**

Se remite por correo documentos de ingreso del Profesional Social a la SDHT por medio oficio de SDHT-1728-2024-372 el día martes 16 de septiembre de 2025
Se recibe documentos de ingreso para revisión por medio de correo de 1 ayudante de obra el día viernes 19 de septiembre de 2025.
Se remite aval al contratista por medio de correo de documentos de 1 ayudante de obra el día lunes 22 de septiembre de 2025.
Se participa en comité de obra el día jueves 18 de septiembre de 2025, con el respectivo reporte SST Personal de obra y se entrega recomendaciones señalización en areas de trabajo a intervenir, orden y aseo.

## 29. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE SOCIAL

| ESTADO DE ACTAS DE VECINDAD | | |
|---|---|---|
| **TOTALES** | 4 | **% DE AVANCE** |
| **REALIZADAS** | 4 | 100,00% |
| **POR REALIZAR** | 0 | 0,00% |

16-18/09/2025; Punto de atención atención a la comunidad: Los días jueves y martes de 8 am a 5:00 pm, se atiende de manera presencial en el Punto de Atención al Ciudadano ubicado en el Lote B.
17/09/2025: El contratista el día 17 de septiembre del 2025, se envia comunicado sobre INC-335-2025-CANTIP sobre respuesta a requerimiento a levantamiento de actas internas.
17/09/2025: La interventoria remite oficio No. SDHT-1728-2024-375 en el cual se da respuesta a comunicado INC-335-2025-CANTIP presentado por el contratista.
18/09/2025: El contratista remite por correo comunicado a huerta sobre cumplimiento de compromisos y solicitud de definición sobre el manejo de las materas del Lote B – Proyecto Ecobarrio Nueva Castilla
18/09/2025: El día 18 de septiembre del 2025, se asiste a la reunión de seguimiento social No. 23, de manera presencial, donde se adquieren una serie de acuerdos y compromisos.
18/09/2025: Asistencia a comité integral en el cual se socializa las actividades ejecutadas por el componente social
18/09/2025: Se verifica atencion ciudadana y se registra asistencia de la interventoria en la bitácora.
20-22/09/2025: El contratista remite invitación para el comité Habitat N 4, al grupo de whatsapp y tambien se hace invitación via telefonica al comité

## 30. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE BIOSEGURIDAD

Durante el periodo el contratista de obra conto con 2 baños con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones y protocolos de bioseguridad.
Teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad y equipos de protección personal (EPP), el contratista mantiene el lugar de trabajo limpio, el contratista cuenta con la clasificación de Residuos y con tanque de agua en obra para limpieza.

| REPORTE DE OBRA | |
|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **No. DE CASOS** |
| CASOS (+) | |
| EN AISLAMIENTO | |

| REPORTE DE INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **No. DE CASOS** |
| CASOS (+) | |
| EN AISLAMIENTO | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PERSONAL OBRA ADM** | |
| **TOTAL PERSONAL OBRA - OPERATIVO** | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PERSONAL INTERVENTORÍA** | |

## 31. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE PMT

Actualmente el PMT fué observado por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) el 5 de septiembre de 2025 debido al uso de un sendero no autorizado y falta de señalización. Tras la observación, el Contratista ajustó el documento, la Interventoría lo validó y firmó el 18 de septiembre, y se radicó formalmente ante la SDM ese mismo día. Actualmente, el PMT se encuentra en etapa de revisión por parte de la SDM, a la espera de su aprobación o nuevas observaciones.

| SOLIUN | SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT<br>PROYECTO - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES<br>INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO No. | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | V-0 |
| | | FECHA: | enero-25 |
| | | PÁGINA: | 1 de 1 |

| 32. PERSONAL OPERATIVO INTERVENTORÍA | | 32. PERSONAL DE OBRA | | 33. ESTADO DE EQUIPOS EN OBRA | | | 34. ESTADO DEL TIEMPO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | CANT. | CARGO | CANT. | EQUIPO / MAQUINARÍA | CANT. | UBICACION (CIV/TRAMO) | DIA | HORAS DE LLUVIA | ESTADO |
| DIRECTOR INTERVENTRIA | 1 | RESIDENTE | 1 | MINICARGADOR | 1 | | MARTES | 0 | S |
| RESIDENTE DE INTERVENTORIA | 1 | SST-AMBIENTAL | 1 | | | | MIÉRCOLES | 0 | S |
| SST DE INTERVENTORIA | 1 | FORESTAL | 1 | | | | JUEVES | 0 | S |
| AMBIENTAL DE INTERVENTORIA | 1 | ING. APOYO | 1 | | | | VIERNES | 0 | S |
| FORESTAL | 1 | INSPECTOR SST-MA | 1 | | | | SÁBADO | 0 | S |
| APOYO AMBIENTAL | 1 | APOYO AMBIENTAL | 1 | | | | DOMINGO | 0 | S |
| SOCIAL | 1 | SOCIAL | 1 | | | | LUNES | 0 | S |
| ESP ELECTRICO | 1 | ESP ELECTRICO | 1 | | | | **TOTAL DE Hr.** | 0,00 Hr/semana | |
| ESP. HIDRAHULICO | 1 | ESTRUCTURAL | 1 | | | | | | |
| PROF. PRESUPUESTO | 1 | ING PRESUPUESTO | 1 | | | | | | |
| ESP.GEOTECNIA | 1 | TOPOGRAFO | 1 | | | | | | |
| TOPOGRAFO | 1 | CADENERO | 1 | | | | | | |
| CADENERO | 1 | INSPECTOR SST-MA | 1 | | | | | | |
| ING. DE APOYO | 1 | OFICIAL | 1 | | | | | | |
| ING DE CALIDAD | 1 | AYUDANTES | 3 | | | | | | |
| | | OPERADOR | 1 | | | | | | |
| | | BOAL | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **TOTAL DE PERSONAL** | **15** | **TOTAL DE PERSONAL** | **19** | **TOTAL DE MAQUINARIA / EQUIPO** | **1** | | | | |

**ESTADO**

**LLUVIOSO (L)**
**FAVORABLE (F)**
**SOLEADO (S)**

**35 ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA**

| FECHA DEL COMPROMISO | COMPROMISO | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO |
|---|---|---|---|
| 26 de septiembre de 2025 | 1. Verificar y firmar el acta No. 23 por parte de la Entidad. | SDHT | Interventoría |
| 19 de septiembre de 2025 | 2. Remitir formato de cierre estándar para la Fase I – Etapa I y ajustar evidencias a la fecha de cierre (8 de julio). | Interventoría | SDHT |
| 26 de septiembre de 2025 | 3. Seguimiento al aclaratorio del Director de Obra del contrato 1753 de 2024. | SDHT | Interventoría |
| 26 de septiembre de 2025 | 4. Dar alcance al oficio de inventario de materas, incluyendo registro fotográfico individual de las 20 materas identificadas. | Contratista | Interventoría |
| 26 de septiembre de 2025 | 5. Seguimiento a los resultados de ensayos de laboratorio que certifiquen la granulometría del material en campo. | Contratista | Interventoría |
| 26 de septiembre de 2025 | 6. Revisar y aprobar el comunicado de gestión de aguas residuales elaborado por el contratista y que será remitido a la Arcadia Local y a las administraciones de los conjuntos. | SDHT | Interventoría |
| 19 de septiembre de 2025 | 7. Organizar puntos de acopio y señalizar en Lote A y Lote B. | Contratista | Interventoría |
| 18 de septiembre de 2025 | 8. Subsanar y entregar presupuesto de Etapa II. | Contratista | Interventoría |
| 22 de septiembre de 2025 | 9. Coordinar visita a plana de prefabricados | Contratista | Interventoría |
| 26 de septiembre de 2025 | 10. Remitir actualización ajustada del Plan de Inspección y Ensayos. | Contratista | Interventoría |
| 26 de septiembre de 2025 | 11. Presentar la hoja de vida del auditor que cumpla el perfil y a su vez se presente la auditoria correspondiente a la Etapa de estudios y Diseños. | Contratista | Interventoría |
| 22 de septiembre de 2025 | 12. Oficio con el planteamiento de la tubería que pasa por los senderos (posible cárcamo/caja adicional) y compartir propuesta con Interventoría y SDHT. | Contratista | Interventoría |
| 26 de septiembre de 2025 | 13. Presentar el porcentaje de aprovechamiento de RCD actualizado e incluir esta información en los informes semanales. | Contratista e Interventoría | SDHT |
| 18 de septiembre de 2025 | 14. Remitir hoja de vida del nuevo Director de Interventoría. | Interventoría | SDHT |
| 26 de septiembre de 2025 | 15. Generar oficios de respuesta a los informes del 1 al 6 del componente social de la Interventoría | SDHT | Interventoría |
| 18 de septiembre de 2025 | 16. Dar respuesta al oficio, volante y metodología del Comité Mi Hábitat No. 4. | SDHT | Interventoría |
| 26 de septiembre de 2025 | 17. Revisar diseño de plazoleta Lote B para instalación de losetas tipo IDU, evaluar sobre cama de arena y capa granular, y revisar un balance presupuestal. | Contratista | Interventoría |
| 22 de septiembre de 2025 | 18. Reunir especialistas eléctricos del contratista e interventoría junto con la Entidad para definir número de luminarias en los parques. | Contratista, Interventoría y SDHT | SDHT |
| 18 de septiembre de 2025 | 19. Revisar y emitir respuesta a documento de PMT antes de las 4:00 p.m. del 18 de septiembre; en caso de aprobación, contratista radica ante SDM. | Interventoría y Contratista | SDHT |


## 36. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

### 37. OBSERVACIONES

Se observa que en el Lote A persiste desorden, ausencia de punto ecológico, falta de senderos y dispersión de materiales, en contraste con el mayor nivel de organización del Lote B.
Se verifica que aún no se ha subsanado completamente el presupuesto de la Etapa II, a pesar de las observaciones reiterativas y de la mesa de trabajo realizada.
Se detecta que la actualización del Plan de Inspección y Ensayos remitida por el Contratista no cumple con los requisitos para su aprobación.
Se identifica que no se ha presentado la hoja de vida del auditor que cumpla con el perfil establecido en el Plan de Calidad para la Etapa de Estudios y Diseños, solo se recibió tarjeta profesional y diploma.
Se constata que el Plan de Manejo de Tráfico (PMT) no se está cumpliendo, específicamente por el uso de un sendero no previsto sin la señalización adecuada, lo que generó un llamado de atención de la Secretaría de Movilidad.


### 39. RECOMENDACIONES

Se recomienda al Contratista organizar de manera inmediata los puntos de acopio en ambos lotes, implementar la señalización pendiente y establecer áreas fijas para RCD, evitando la dispersión de materiales.
Se solicita realizar una visita técnica conjunta a la planta de fabricación de los bordillos para verificar in situ el proceso de producción y los controles de calidad.
Se reitera la necesidad de que todo nuevo proveedor sea informado a la Interventoría para su revisión y aprobación previa antes de ser utilizado en obra.
Se sugiere que, para el material granular de los filtros, se tome una muestra, se realice un tamizado y se envíe a laboratorio para caracterización, a fin de validar que cumple con la granulometría requerida antes de su instalación.
Se requiere revisar y emitir respuesta a la propuesta ajustada del PMT antes de las 4:00 p.m. del mismo día 18 de septiembre, para que el Contratista pueda radicarla ante la Secretaría de Movilidad y evitar la paralización de la obra.



**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
**SOLIUN S.A.S.**

## REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA
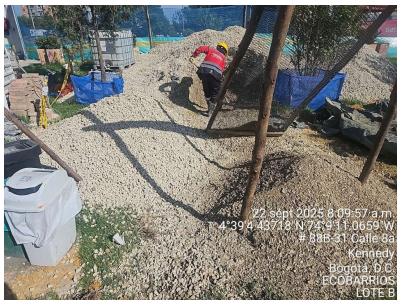
| | | |
|---|---|---|
| Descripción: Chequeo de niveles de excavación plazoleta de juegos infantiles Lote B<br> | Descripción: Corte e instalación de adoquín reutilizado en Lote A<br> | Descripción: Excavación en área de plazoleta infantil en Lote A<br> |
| Descripción: Limieza de adoquines desmontados en Lote B<br> | Descripción: Compactación de subrasante del sendero en Lote B<br> | Descripción: Preparación de arena para cama de reinstalación de adoquines en Lote B<br> |
| Descripción: Tamizado de grava triturada de acuerdo a especificaciones técnicas<br> | Descripción: Continuación de reinstalación de adoquín en sedero de Lote A<br> | Descripción: Continuación de Instalación de loseta guia en sendero de Lote A<br> |
