1652

GEAGOR BALER INGENIERÍA
CONSORCIO GEBAL

18/3/2020 Sticker web
Alcaldia Local de Kennedy
R No. 2020-581-006123-2
2020-03-18 09:22 - Folios: 1 Anexos: 184
Destino: Área de Gestion de Desarr
https://app.gobiernobogota.gov.c... 1/2

Bogotá D.C., 16 de marzo de 2020

Señores:
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
Ing. Leonardo Alexander Rodríguez López
Alcalde local de Kennedy
Transversal 78 K No. 41 A-04 Sur
Bogotá D.C

GEBAL-KEN-083

Ref. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 329-2019.
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA ADECUACIÓN DE CINCO (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PARA LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

Asunto: INFORME MENSUAL 2 DE OBRA CONTRATO COP-328-2019.

Por medio de la presente me permito adjuntar informe mensual 2 de obra que contempla el periodo de 17 de febrero hasta 16 de marzo

- INFORME TECNICO MENSUAL 2 OBRA
- AVAL DE INTERVENTORIA DEL INFORME TECNICO MENSUAL 2 DE OBRA
- INFORME AMBIENTAL MENSUAL 2
- AVAL DE INTERVENTORIA DEL INFORME MENSUAL 2 AMBIENTAL
- INFORME SG-SST MENSUAL 2
- AVAL DE INTERVENTORIA DEL INFORME MENSUAL 2 SG-SST

Cordialmente,

Ing. LADY AGUIRRE ORTIZ
Representante Legal – Directora de interventoría
CONSORCIO GEBAL


Transversal 19 A No. 98 – 28 oficina 502 - Teléfono 703 17 26
E – mail: gerencia@civingingenieria.com / gerencia@geagor.com
Bogotá D.C. - Colombia

1653

ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO	**INFORME MENSUAL N°2**	BOGOTÁ

INFORME MENSUAL N°02

PERIODO COMPRENDIDO
ENTRE EL 17 DE FEBRERO AL
16 DE MARZO DE 2020 BOGOTÁ D.C.

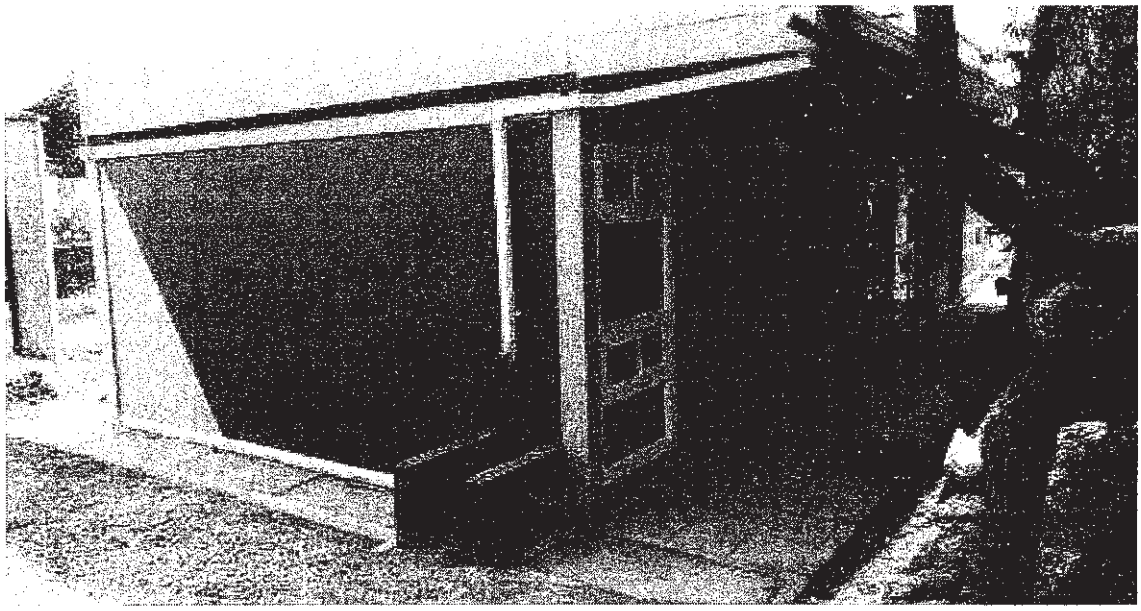

ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY
FONDO DE DESARROLLO LOCAL

CONTRATO DE OBRA NO COP-328 DE 2019

OBJETO: CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTURAS FÍSICAS DE (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PARA LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.

Contenido

Contenido

Contenido 2
1. INTRODUCCIÓN 3
2. INFORMACION BASICA 4
3. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO 5
4. AVANCE DE OBRA 7
5. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO 13
6. EVOLUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA. 16
7. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO 18
CONCLUSIONES 22

1. INTRODUCCIÓN

En este informe se describe la realización de actividades de obra del contrato COP-328 de 2019 por parte del contratista de obra EVER JOSE SALGADO SALGADO con la interventoría del CONSORCIO GEBAL

Para este informe se empezará describiendo la información básica, luego el avance del contrato, aspectos financieros, informe fotográfico, actas de obra y varios anexos. Hasta la fecha de corte de este informe se han realizado diferentes actividades en el Jardín Infantil La Cometa destinados a cumplir con los principales requisitos presentados por la Entidad Contratante (Fondo de Desarrollo local de Kennedy) y que han sido valoradas por la Interventoría responsable del seguimiento del proyecto, en los componentes técnico, administrativo, ambiental, jurídico y financiero.

A la fecha de corte del presente documento técnico han sido visitados para su conocimiento 4 de los frentes de trabajo en la localidad de Kennedy, donde se han detectado las actividades para cada intervención en áreas exteriores, cocinas, cubiertas, instalaciones eléctricas, estructura, instalaciones hidrosanitarias, pisos y enchapes, pintura, carpinterías, cielorrasos y aseo.

El informe que se desarrollará a continuación comprende el periodo del 17 de febrero de 2020 al 16 de marzo de 2020.

El Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, tiene como uno de sus objetivos primordiales promover una educación de calidad, garantizando un buen estado de la infraestructura a través de jardines frescos donde permanecen niños de la primera infancia con el fin de mejorar su calidad de vida. Destina unos recursos importantes para recuperar y mejorar las condiciones del espacio en las instituciones educativas a nivel local, que han reportado en algún tipo de observación en su infraestructura física, lo cual impide en forma temporal la prestación del servicio educativo, por lo cual por medio del contrato de obra No. COP-328 DE 2019 adjudicado al Arq. EVER JOSE SALGADO SALGADO cuyo objeto es "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTURAS FISICAS DE (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO." Para que se efectúen las actividades técnicas que permitan solventar estas observaciones y poder tener en funcionamiento las infraestructuras educativas. De igual Forma para el seguimiento y control del este proyecto se realizó el contrato de INTERVENTORÍA No. COP-329 de 2019 celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy y la firma CONSORCIO GEBAL, cuya finalidad es la interventoría externa para garantizar la calidad de las obras a ejecutar.

2. INFORMACION BASICA

2.1 GENERAL

ELEMENTOS	CONDICIONES INICIALES
CONTRATO DE OBRA No.	COP-328 DE 2019
CONTRATISTA:	EVER JOSÉ SALGADO SALGADO
NIT.CONTRATISTA:	7917558-1
VALOR DEL CONTRATO:	$ 1.359.307.248
OBJETO:	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO
PLAZO INICIAL:	6 meses o hasta terminar los recursos
SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	30 diciembre del 2019
FECHA ACTA DE INICIO:	17 enero del 2020
FECHA PLAZO CONTRACTUAL:	16 julio de 2020

2.2 VERIFICACIÓN ESTADO PÓLIZAS

3030244

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

PREVISORA SEGUROS

2 SEGURO CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

DÍA	MES	AÑO	CLASE DE	Nº CERTIFICADO	CERTIFICADO ANTERIOR Nº	A.A.
10	1	2020	MODIFICACIÓN	1		50

TOMADOR: 79568485 ENER JOSE SALGADO SALGADO
DIRECCIÓN: CRA 20 Nº 15-23 ED ARAMONS OF 304, SINCELEJO, SUCRE
CC 7917568
TELEFONO 3110242643
ASEGURADO: 830053465-FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
DIRECCION: CL 74 A KR 69 - 04, BOGOTA, CUNDINAMARCA
NIT 899.999.061-9
TELEFONO 2251570
BENEFICIARIO: SANTAFE DE BOGOTA DC
MONEDA: Pesos
TIPO CAMBIO: 1.00

DESDE			HASTA			NUMERO DE DIAS
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	
10	1	2020	5	11	2020	2131

CARGARA: ENER JOSE SALGADO SALGADO
VIGENCIA DEL RIESGO: 4.30 DIAS
PRIMA DEL RIESGO TOTAL: $671,450,825.00

SUBSCRIPTORES:
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY — NIT: 830.053.465-9

No.	Ramo	Valor Asegurado	Moneda	Vig. Desde	Vig. Hasta	Prima
1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	467,782,134.50	$I	08/01/2020	08/11/2021	81,761.85
2	PAGO DE SALARIOS PRESTACI	135,930,725.00	$I	08/01/2020	08/11/2023	0.00
3	ESTABILIDAD DE LA OBRA	135,930,725.00	$I	08/11/2020	08/11/2025	0.00

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. KDP-329 DE 2019 CUYO OBJETO ES CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA ASEGURAR Y O REPARAR LA ESTRUCTURA FISICA DE UNOS (01) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGUN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.
SE EMITE EL PRESENTE ANEXO CON EL FIN DE AJUSTAR LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA SEGÚN COMUNICACIÓN EXPRESA DEL ASEGURADO

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO. (ARTÍCULOS 81 Y 82 DE LA LEY 45/90 Y ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

EL PAGO TARDÍO DE LA PRIMA NO REHABILITA EL CONTRATO EN ESTE CASO LA COMPAÑÍA SOLO SE OBLIGA A DEVOLVER LA PARTE NO DEVENGADA DE LA PRIMA EXTEMPORÁNEAMENTE.

Prima	$ [illegible] 81,761,85
Gastos	$ [illegible] 0,00
Iva Regimen Común	$ [illegible] 15,534,56
Ajuste al Peso	$ [illegible] 0,45
TOTAL A PAGAR EN PESOS	$ [illegible] 97,350,00

SEGÚN GARANTÍA DESINCORPORATIVA ANEXA RESOLUCIÓN NO. 0060 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2018 LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SERÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE, SEGÚN DECRETO REGLAMENTARIO DE 2009 DE 1988 ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO [illegible] DEL DECRETO SOBRE REQUISITOS DE [illegible]

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

CÓDIGO	FORMULA	%	CUOTA

CLAVE	CLASE	INTERMEDIARIOS NOMBRE	%	COMISION
1428	2	ALVARO [illegible] BAR	30.00%	$ [illegible] 24,534,97

[illegible] CALLE 37 NO. 697 BOGOTA, TELEFONO DE ATENCION AL CLIENTE [illegible] EXTRANJERO [illegible] EXCLUSIVO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA O DEL HABLA [illegible] WWW.LAPREVISORA.COM.CO. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA [illegible] EL CONTENIDO DE ESTA PÓLIZA PUEDE SER CONSULTADO EN [illegible]

1658

007

30501244

LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS NIT. 860.002.400-2

PREVISORA S.A. SEGUROS

2 SEGURO CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

SUCURSAL 21	RAMO 1	CERTIFICADO DE 2020 VERIFICACIÓN	Nº CERTIFICADO 2	ANEXO
TOMADOR	2 IVER JOSE SALGADO SALGADO		CC	7917558
DIRECCION	CRA 29 Nº 18-23 ED BEMOSS OF 504, SINCELEJO, SUCRE		TELEFONO	3145942748
ASEGURADO	220 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY		NIT	830 858 261-9
DIRECCION	CL 74 A KR 61 - 00 BOGOTA, CUNDINAMARCA		TELEFONO	2358280
CIUDAD EN	SANTAFE DE BOGOTA DC		EXPEDICION	VIGENCIA
MONEDA	Pesos			NUMERO DE DIAS
TIPO CAMBIO	1.00	9536	27 / 2020	1 / 2020 00:00 11 / 01 / 2025 00:00 1740

CARGADA EVER JOSE SALGADO SALGADO — 1.30 DIAS — 9478 683 624.00

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

LA FIRMA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE SUS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ESTA PROCEDENCIA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS EFECTUADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. (ARTICULOS 81 Y 82 DE LA LEY 45/90 Y ARTICULO 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO)

EL PAGO PARCIAL DE LA PRIMA NO REHABILITA EL CONTRATO EN CASO DE MORA LA OBLIGACION SUBSISTE DESDE EL VENCIMIENTO DE LA PARTE NO DEVENGADA DE LA PRIMA O MENSUALIDAD

PRIMA	[illegible]
GASTOS	[illegible]
IVA REGIMEN COMUN	[illegible]
AJUSTE AL PESO	[illegible]
TOTAL A PAGAR EN PESOS	[illegible]

[illegible]

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

[illegible]

EL TOMADOR

[illegible]

POLIZA #
1000093

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
NIT 860.002.400-2

PREVISORA SEGUROS

13 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL

EXPEDICIÓN DÍA	EXPEDICIÓN MES	EXPEDICIÓN AÑO	CERTIFICADO DE	N° CERTIFICADO	CIA PÓLIZA LÍDER N°	CERTIFICADO LÍDER N°	A.P.
10	1	2020	MODIFICACION	1			NO

TOMADOR	2758488-EVER JOSE SALGADO SALGADO	CC	7.917.558
DIRECCIÓN	CRA 29 N° 16-21 EL BEMBOS CF 304, SINCELEJO, SUCRE	TELÉFONO	3145242646
ASEGURADO	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	NIT	899.999.061-9
DIRECCIÓN	KRA 8 CL 1C - 05, BOGOTA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	2337508

AMPARO EN	CANTIDAD ASEG	ASC	EXPEDICIÓN DÍA	EXPEDICIÓN MES	EXPEDICIÓN AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	VIGENCIA DESDE MES	VIGENCIA DESDE AÑO	VIGENCIA HASTA DÍA	VIGENCIA HASTA MES	VIGENCIA HASTA AÑO	MONTO DE FIJAS
BOGOTA	0037	37	10	1	2020	5	1	2020	5	11	2020	305
MONEDA: Pesos												
TIPO CAMBIO: 1.00												

CARGARA: SALGADO SALGADO EVER JOSE — FECHA DE PAGO: 4 JO 2020 — VALOR DE CUMPLIMIENTO PESOS: $ 0 00

SECRETARIA:
Nombre/Razon Social
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

Documento
NIT 8999990619

Porcentaje Tipo Monto
100 000 % NO APLICA

FCP-017-3 - PÓLIZA De SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACON

CARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS ANTE OCASIONE AFECTADO COMO RESULTADO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO NO. CDP-328 DE 2015 CUYO OBJETO ES CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A TODO ASTENABLE LAS ACTIVIDADES PARA AGRUPAR Y O REPARAR LA ESTRUCTURA FISICA DE CINCO (5) CARDUMES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGUN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y demás DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.

NOTA:
ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO ADICIONAL: FONDO DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY CON NIT 899.999.061 9 Y/O TERCEROS AFECTADO.

SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE LA POLIZA SE EXTIENDE AMPARAR BC VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS CUYO VLR ASEGURADO ES 300 CMMLV.

****

SE EMITE EL PRESENTE ANEXO CON EL FIN DE ACLARAR EL ASEGURADO DE LA POLIZA EL CUAL CORRESPONDE:

FONDO DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY CON NIT 899.999.061 9
Texto Continúa en Hojas de Anexos...

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EMITAN DAN FUNDAMENTO EN ELLA, FACULTARA LA TERMINACION AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y PERDERA DERECHO AL REEMBOLSO PARA EFECTOS DEL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO (ARTICULOS 81 Y 82 DE LA LEY 45/90 Y ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO).

EL PAGO PARCIAL DE LA PRIMA NO REHABILITA EL CONTRATO EN ESTE CASO LA COMPAÑÍA SOLO SE OBLIGA A DEVOLVER LA PARTE NO DEVENGADA DE LA PRIMA EXTEMPORÁNEAMENTE

PRIMA	$
GASTOS	$
FINANCIACIÓN COMISIÓN	$
AJUSTE AL PESO	$
TOTAL A PAGAR EN PESOS	$

NOMBRE DEL TOMADOR O ASEGURADO

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

CLAVE	CLASE	NOMBRE	%	RELACIÓN
6420	P	ALVARO FRANCISCO BARON		

- ORIGINAL -

1660

EVER JOSE SALGADO SALGADO	**INFORME MENSUAL N°2**	BOGOTÁ 009

POLIZA N° 1000003

LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
NIT 860.002.400-2

PREVISORA


13 : SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL


| | | |

3. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO

3.1 LOCALIZACIÓN

Para el presente periodo las obras en ejecución se desarrollan en el jardín La Cometa ubicado en la localidad de Kennedy en la dirección Cra. 74A N 42G - 52 Sur.

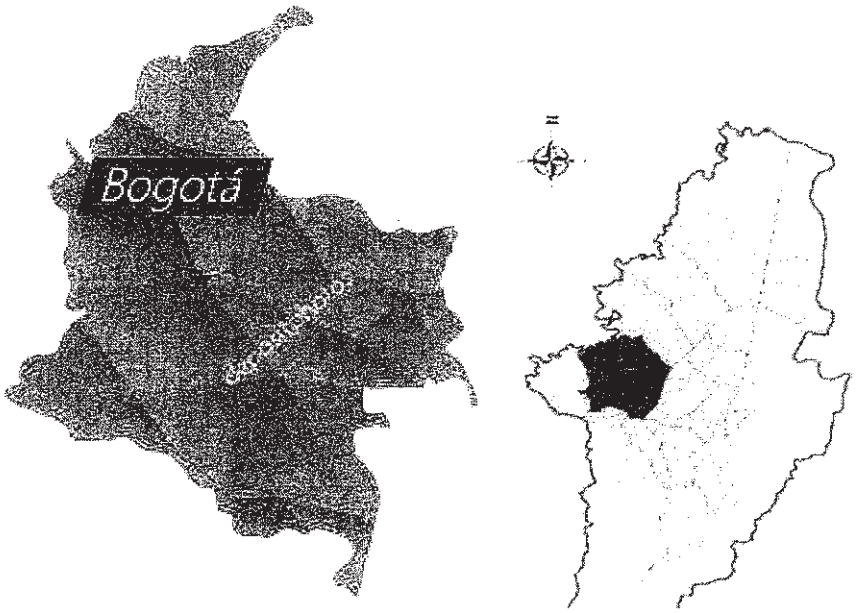

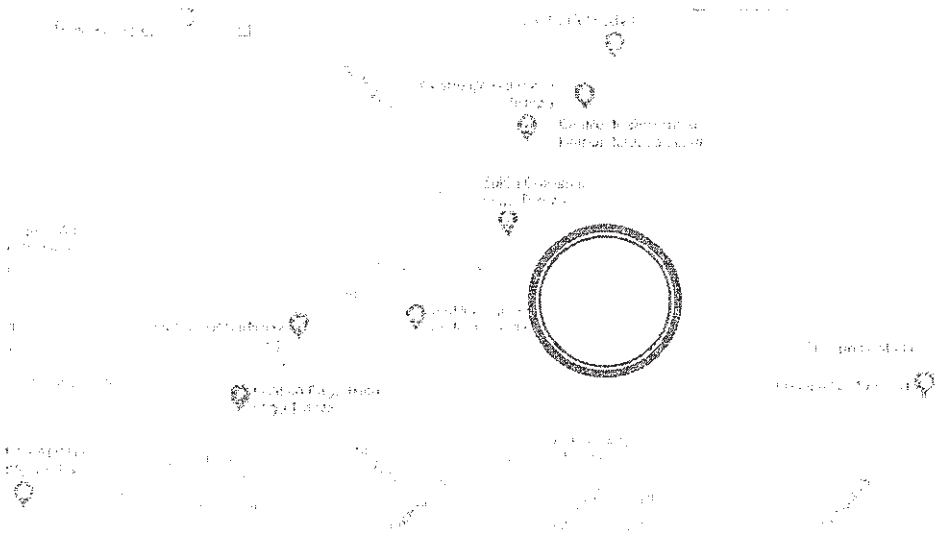

3.2 IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE OBRA

Las obras a realizar en el contrato consisten en adecuaciones y reparaciones a la estructura física de 5 jardines infantiles en la Localidad de Kennedy.

Se identifican las actividades a desarrollar basados en los requisitos de seguridad, funcionalidad y salubridad exigidos para una buena prestación de servicios para la primera infancia, y se detectan los aspectos a mejorar respecto a la estructura física en cuanto a accesibilidad y libre movilización, así como al mantenimiento en las diferentes áreas de los jardines las cuales presentan deterioro progresivo.

Como el desarrollo del contrato implica el desarrollo progresivo de las obras siguiendo la secuencia establecida en el pliego de condiciones que inicia con el primer Jardín infantil denominado La Cometa

El desarrollo del contrato llevará el siguiente orden de acuerdo a las visitas realizadas a los diferentes establecimientos:


ETAPA DE INTERVENCION	JARDIN INFANTIL	DIRECCION
1	La Cometa	Cra 74 A No. 42G-52 Sur
2	Metro	Cra 88 C No. 43-37 Sur
3	Nietos del Trueno	Cra 80 F No. 42-46 Sur
	Pio XII	Cra 79 D No. 6-15 Sur (2do. Piso)
4	Visión de Colombia	Cra 79 G No. 13 -09 Sur

4. AVANCE DE OBRA

4.1 AVANCE GENERAL DE CONTRATO



Según la programación y la ejecución contractual en el presente periodo se enuncia el avance consolidado de ejecución en el presente cuadro.




No.	JARDIN	% EJECUTADO	Valor Contractual	%
1	LA COMETA	26,27 %	$319.189.243	26,27%
2	METRO	Programación inicio	$443.488.546	25,04%
3	NIETOS DEL TRUENO	VISITA INICIAL	$188.115.456	20,54%
4	VISION COLOMBIA	VISITA PROGRAMADA	$274.087.437	21,04%
5	PIO XI	VISITA INICIAL	$ 92.583.841	7,11%



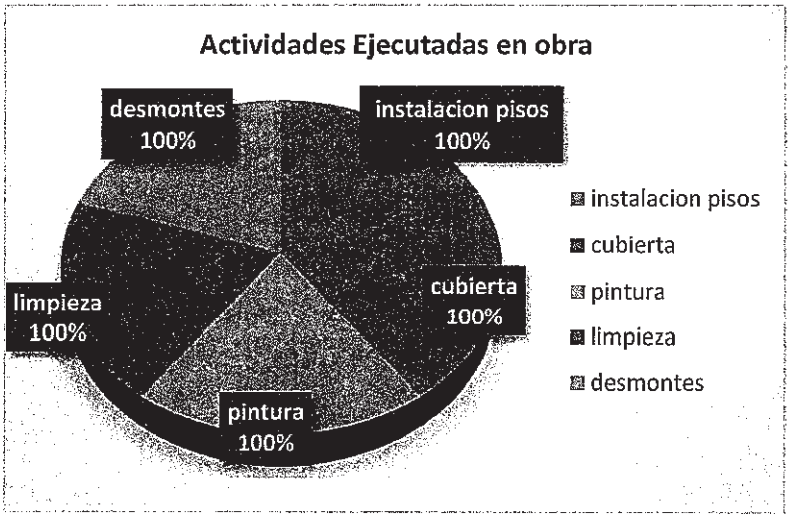





4.2 AVANCE DETALLADO POR FRENTE DE TRABAJO




A continuación, se presentan las principales actividades ejecutadas en el presente periodo en el jardín cometa


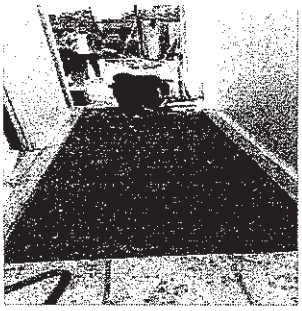
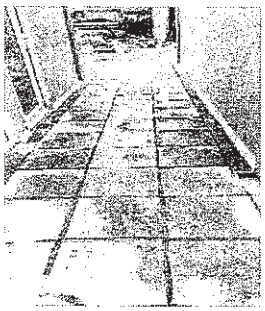
Actividad	**un**	DESMONTE, LIMPIEZA, NIVELACION Y REINSTALACION DE TABLETAS PREFABRICADAS EN CONCRETO PARA ANDENES	Ejecutado	100%
				
Observaciones			cantidad	

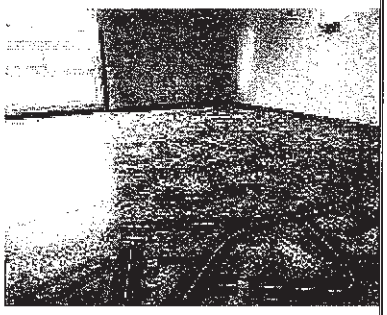
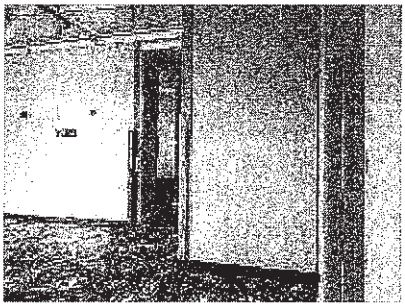
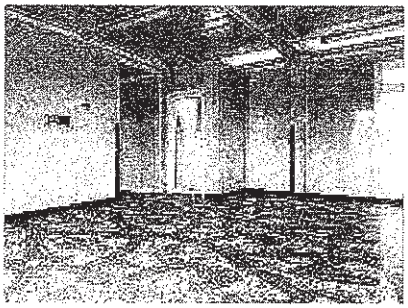
Actividad	**M2**	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESQUINEROS EN LONA VERANO DE COLORES ACOLCHADOS EN JUMBOLENE DE 1.20 X 10 CM	Ejecutado	100 %
				
Observaciones			cantidad	79

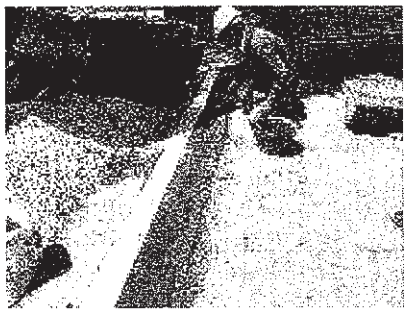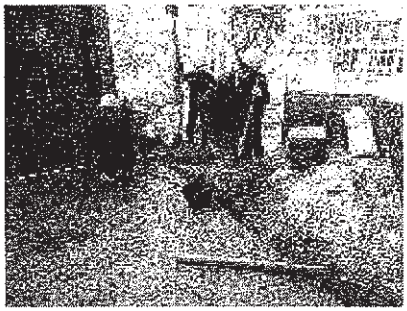

Actividad	**UN**	SUMINISTRO E ISTALACION DE PISO EN TABLETA GRES TIPO ROJO RUSTICA 10X10 INCLUYE PICADO DE LA SUPERFICIE Y ALISTADO CON MORTERO DE REPARACION DEL AREA A INSTALAR	Ejecutado	100%
				
Observaciones			cantidad	

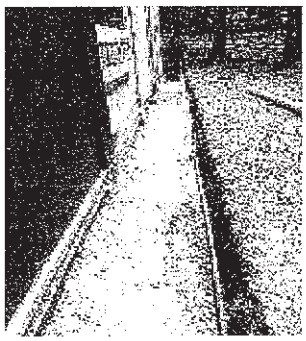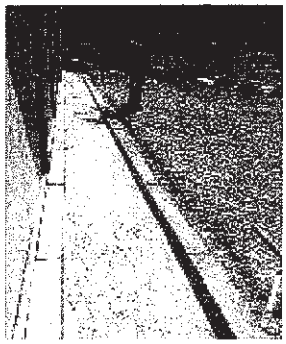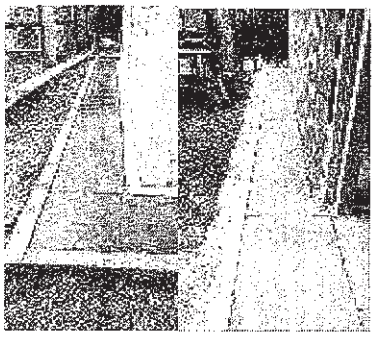
Actividad	**M2**	ANDEN EN CONCRETO E=.10 ACABADO LLANA DE MADERA ANCHO 0.60	Ejecutado	100%
				
Observaciones			cantidad	

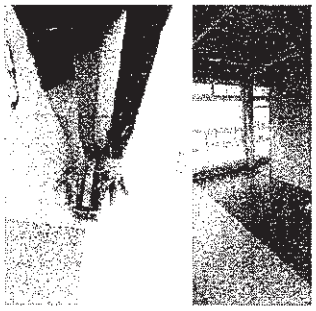
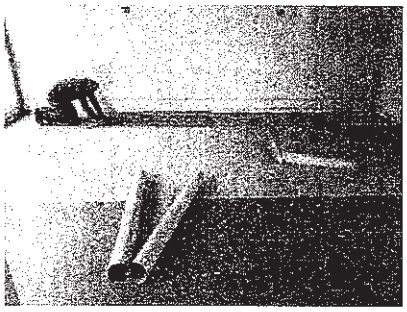
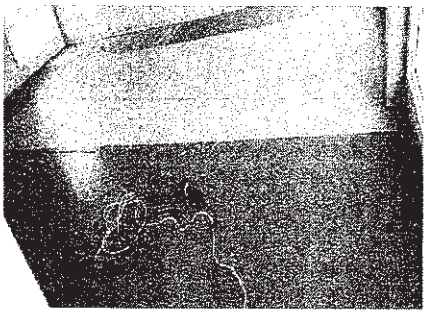
Actividad	**ML**	PISO EN ROLLO REF DELIGHT HETEROGENEO UNICOLOR CON NANOPLATA- TRAFICO INDUSTRIAL E=2.2.MM IMPORTADO LG FLOORS	Ejecutado	100%
				
Observaciones			cantidad	

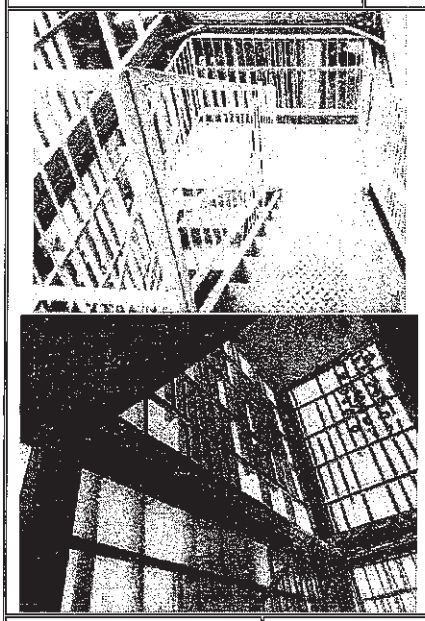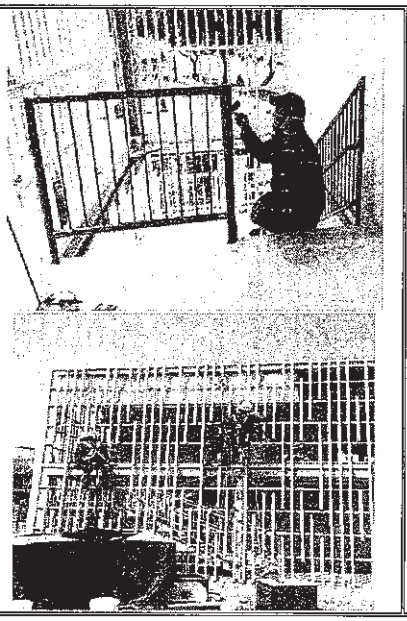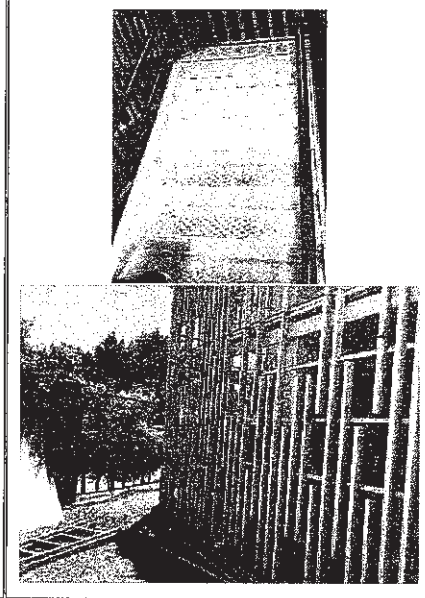Actividad	**ML**	13.4.3 Esmalte sobre cerchas, puente, y estructura metálica	Ejecutado	100%
				
Observaciones			cantidad	1132

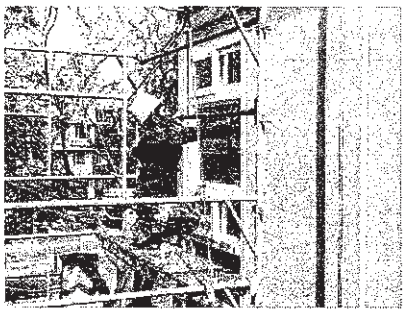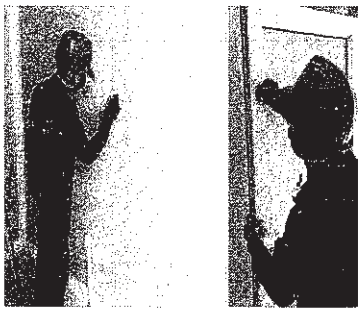Actividad	M2	NP-1 Limpieza interior paneles en pvc de muros y techos incluye retiro de figuras en vinilo, pegantes etc.	Ejecutado	100%
				
Observaciones			cantidad	

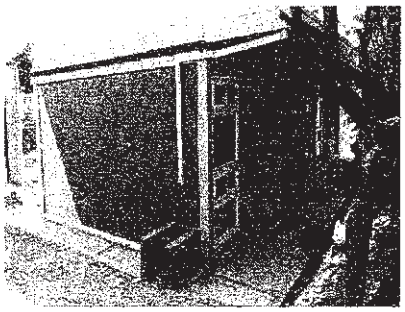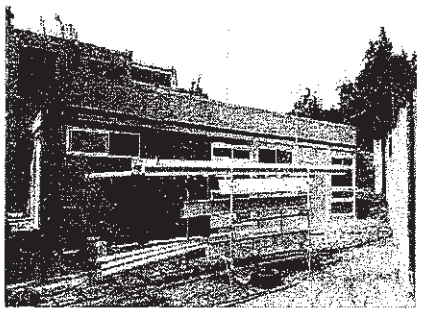Actividad	M2	13.2.3 PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA	Ejecutado	100%
				
Observaciones			cantidad	354

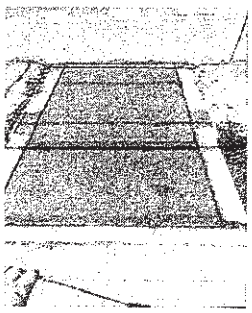Actividad	**ml**	1.1.13 DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0,20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS)	Ejecutado	100%
				
Observaciones			cantidad	2

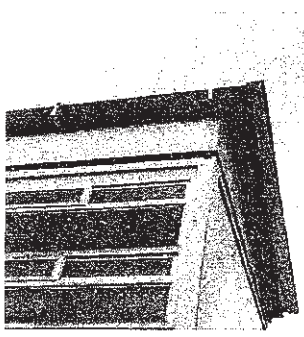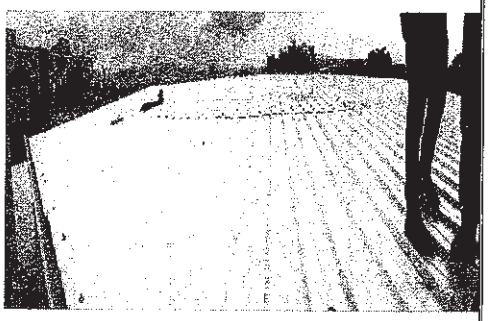Actividad	**ml**	17.1.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	Ejecutado	100%
				
Observaciones			cantidad	294

5. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

El contrato fue celebrado por el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy – Alcaldía Local por un valor de Mil trescientos cincuenta y nueve millones trescientos siete mil doscientos cuarenta y ocho pesos M/CTE ($ 1.359.307.248).

El proyecto de obra está programado para realizarse en 6 meses acorde al acta de inicio del contrato, con una totalidad de 26 semanas, hasta el corte de este informe es decir 16 de marzo de 2020, nos encontramos finalizando la semana número 09.

Con respecto a la ejecución de obras durante estas siete primeras semanas de obra ya que las dos iniciales fueron de cumplimiento de la documentación previa al inicio de las mismas, se han ejecutado diferentes actividades contractuales incluidas en el anexo técnico del contrato como algunas obras no previstas que están en proceso de legalización por parte de la interventoría y la entidad.

5.1 FLUJO DEL CONTRATO

A continuación, se presenta tabla de avance de obra semanal para El Jardín La Cometa

SEMANA	% PROG	% EJECUTADO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	% AVANCE / RETRASO
Semana 1					
Semana 2					
Semana 3					
Semana 4	0,87%	4.96%	$2.962.206	$ 16.970.649	4.09%
Semana 5	17.64%	12.90%	$56.298.611	$41.168.239	-4.74%
Semana 6	51.12%	25.40%	$163.172.299	$81.082.789	-25.72%
Semana 7	91.99%	35.58%	$293.634.959	$113.560.852	-56.42%
Semana 8	100.00%	100.00%	$319.189.243	$319.189.243	0%

Nota: en el seguimiento al flujo contractual solo se están contemplando las actividades contractuales ya que los precios no previstos se encuentran en proceso de aprobación por parte de la Interventoría y de la entidad


5.2 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO.

DESCRIPCIÓN	VALOR DEL CONTRATO				
	VLR INICIAL	VLR EJECUTADO	VLR POR EJECUTAR	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
VLR CONTRATO INICIAL	$ 1.359.307.248	$173.404.261	$1.185.902.987	12.76%	87.24%
ANTICIPO	No aplica	-	-	-	-
ACTA RECIBO PARCIAL No.1	$173.404.261	$173.404.261	$1.185.902.987	12.76%	87.24%

5.3 INVERSION POR FRENTES.

UNIDAD A INTERVENIR	COSTO DIRECTO	AIU	COSTO TOTAL	%
J.I LACOMETA	$ 271.207.282	26,16%	$ 342.155.107	26,27%
J.I. METRO	$ 258.589.293		$ 326.236.252	25,04%
J.I. NIETOS DEL TRUENO	$ 212.114.842		$ 267.604.086	20,54%
J.I. VISION COLOMBIA	$ 217.253.834		$ 274.087.437	21,04%
J.I. PIO XII	$ 73.386.050		$ 92.583.241	7,11%
			$1.302.666.723	


RELACION INVERSION POR FRENTE

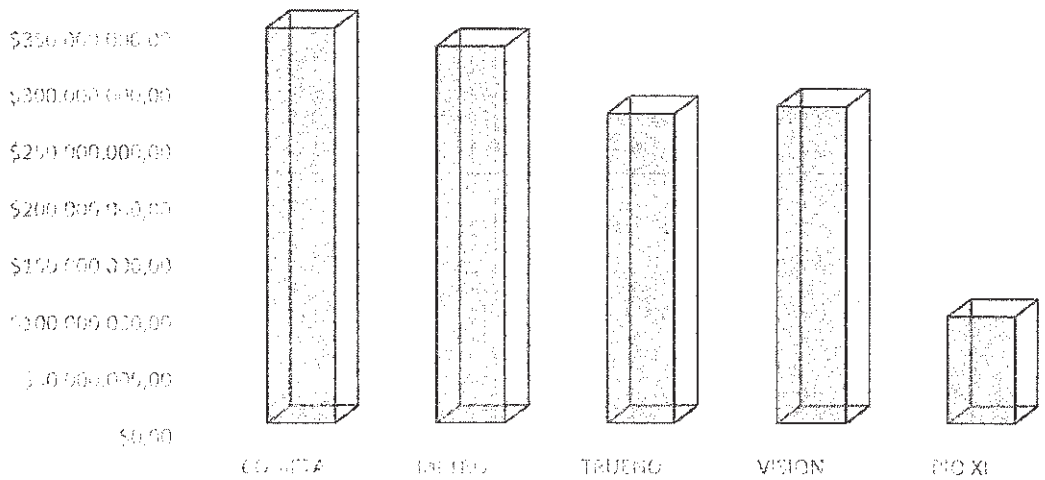

RELACION INVERSION POR FRENTE

6. EVOLUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA.

PROGRAMACION INFORME Nª1

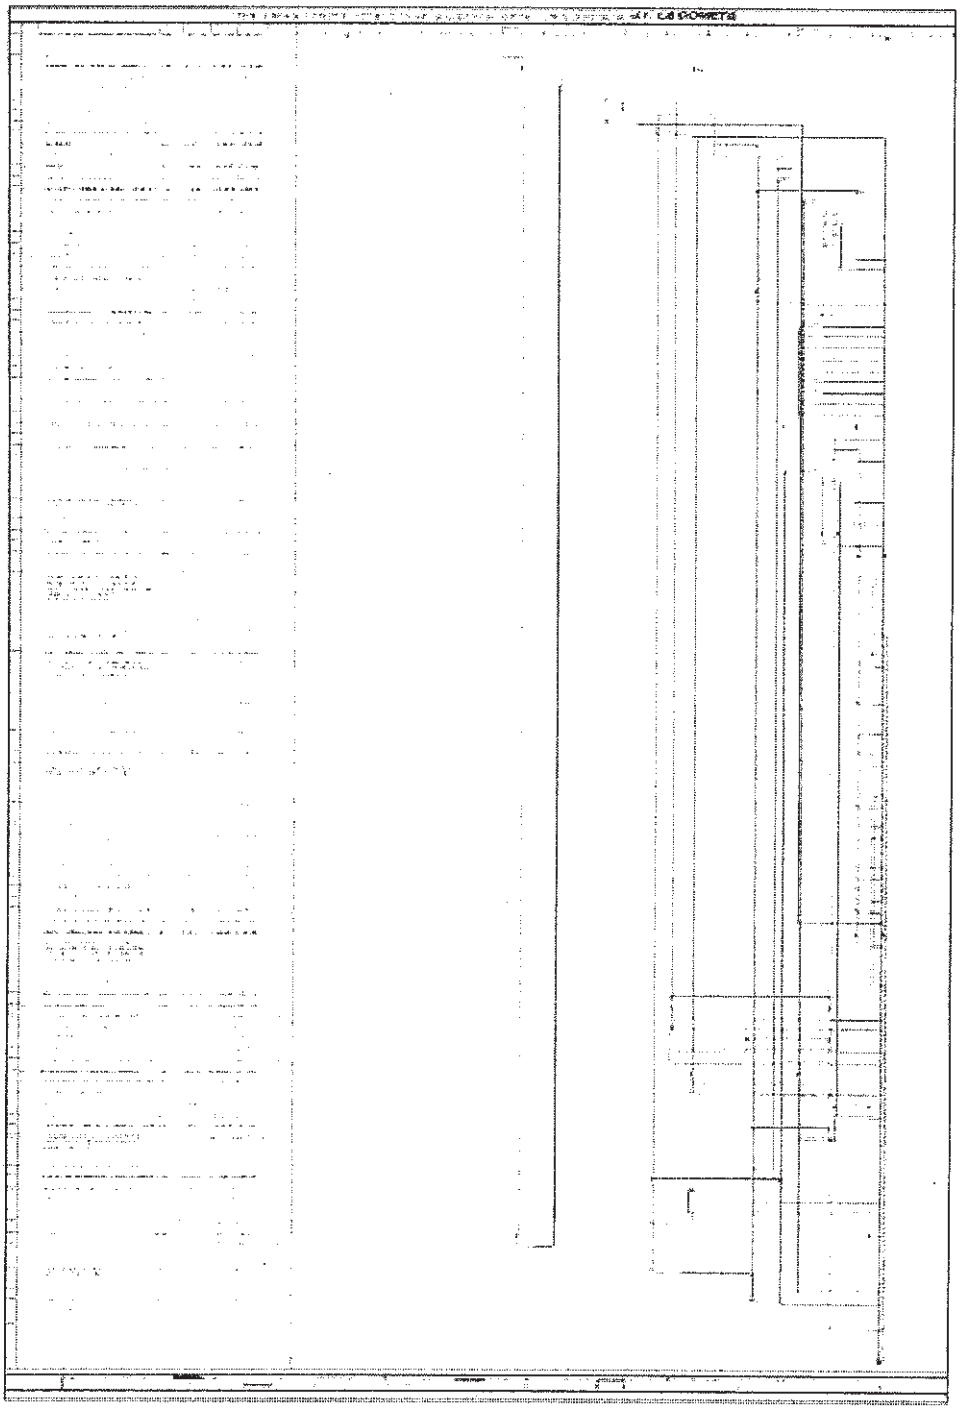

La obra avanzó en el periodo acorde a la programación inicial realizada para el jardín infantil La Cometa. Debido a los ítems no previstos se adelantó un plan de contingencia para poder dar cumplimiento a todas las actividades previstas para el normal desarrollo del jardín dando, así como resultado la entrega preliminar del jardín el pasado viernes 13 a la interventoría y a la supervisión. Se tiene programada la entrega formal el lunes 16 de marzo, para que los niños que se trasladan del jardín Metro puedan iniciar actividades el martes 17 de marzo de 2017.

De acuerdo a esta situación se iniciarán actividades en el segundo frente de obra, Jardín Infantil Metro ubicado en Carrera 88 C # 43-37 Sur, el próximo martes 17 de Marzo .

7. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

7.1 RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS CONTRATO DE OBRA

Desde la celebración del contrato se han suscrito algunos documentos de actas jurídicas que se relacionan a continuación:

TIPO DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MOTIVO
MINUTA DEL CONTRATO	30/12/2019	SUSCRIBIR CONTRATO DE OBRA
ACTA DE INICIO	17/01/2020	CELEBRAR EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO.

7.2 RELACIÓN DE ACTIVIDADES DE REUNION ENTRE CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y/O ENTIDAD

Como parte integral de la ejecución del contrato de obra se han efectuado varias actividades de reunión entre las partes en el periodo No 1 las cuales se relaciona a continuación:

Fecha	Tipo de evento	Lugar	Objeto	Temas tratados
13 enero de 2020	Reunión inicio de obra	SDIS COMETA	Se convoca a reunión para la presentación del proyecto de los contratos COP-328-2019 Y CIN-329-2018	1 Profesionales encargados del comité operativo 2 entrega de documentación para el inicio de obra periodos de informes 4 protocolo de ingreso de personal
21 enero de 2020	Reunión	Oficina consorcio Gebal	Se convoca reunión para revisión de temas administrativos	1 Obligaciones contractuales para inicio de obra 2 entrega de documentos administrativos 3 Visitas a los jardines faltantes en periodo de un mes 4 socialización a la comunidad para inicio del proyecto 5 diseño del parque y pintura fachada
24 enero de 2020	Comité ambiental	Alcaldía local Kennedy	Acordar y aclarar procedimientos en	1 apertura pin ambiental

			cuanto al tema ambiental	2 plan de manejo ambiental 3 manejo y disposición de residuos
5 febrero 2020	Comité de obra	Jardín cometa	Control y calidad de actividades desarrolladas	1 Documentación pendiente para inicio 2 personal requerido y obligatorio en comités 3 tiempo de dedicación profesionales
12 febrero de 2020	Comité de obra	Jardín cometa	Se programa comité de seguimiento para recorrido y verificación de actividades ejecutadas	1 actividades no previstas 2se solicita reevaluar el piso nova trafic ya que es muy delgado para poder garantizar su estabilidad 3 se presentan los profesionales de interventoria y obra 4 se socializa visita jardín metro 5 puntos de instalación de reflectores
19 febrero 2020	Comité de obra	Jardín cometa	Comité de seguimiento semanal	1porcentajes de ejecución y programación 2cubierta refuerzos estructurales 3 para cocinas lavamanos de pedal 4 Apus ítems no previstos 5 pintura, piso caucho, materiales
26 febrero 2020	Comité de obra	Jardín Cometa	Se programa comité de seguimiento para control de actividades	1 verificación avance de actividades 2 socialización visita jardín pioXII 3 Programación reunión inicio de obra jardín metro 4 recorrido de obra verificación de actividades.
4 marzo 2020			Control de seguimiento semanal actividades	1 entrega módulo 1 jardín cometa 2 socialización reunión inicio de obra jardín metro 3 plan de contingencia para finalizar actividades de obra

1696

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**INFORME MENSUAL N°2**	BOGOTÁ

025

11 marzo 2020			Se programa comité de seguimiento para recorrido y verificación de actividades	1 necesidades para entrega de actividades en el jardín 2 establecimiento de fechas y horarios de entrega para traslado de materiales entre jardines. 3pintura muros cocina

024

7.3 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LA INTERVENTORIA

OFICIO	FECHA	ASUNTO
FDLK03	16-01-2020	Entrega Hojas de Vida Profesionales, Pólizas, Manual SGSST
FDLK04	22-01-2020	Entrega APUS, Balance
FDLK10	28-01-2020	Reenvío Manual SGSST
FDLK12	29-01-2020	Ajuste APUS
FDLK13	29-01-2020	Actas de Vecindad
FDLK14	29-01-2020	Desglose del AIU
FDLK16	30-01-2020	Acta de aprobación de personal, Ajuste balance, Cronograma de ejecución, Formatos hojas de vida profesionales, Programación de obra
FDLK17	31-01-2020	Entrega listado y documentos personal operativo

1678

[illegible]	**INFORME MENSUAL N°2**	BOGOTÁ

00-027

CONCLUSIONES

De acuerdo al presente informe evidenciamos que el contrato tiene un avance conforme a programación y flujo de inversión.

026

ANEXOS INFORME

1680

GEAGOR
BALER INGENIERÍA
CONSORCIO GEBAL

Bogotá D.C., 16 de Marzo de 2020

Señores:
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
Ing. Leonardo Alexander RodríguezLópez
Alcalde local de Kennedy
Transversal 78 K No. 41 A-04 Sur
Bogotá D.C

GEBAL-KEN-079

Ref. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 329-2019.
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA ADECUACIÓN DE CINCO (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PARA LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

Asunto: validación Informe AMBIENTAL mensual Nº2.

Por medio de la presentey según radicado del contratista esta interventoría revisa y da visto bueno al informe AMBIENTAL mensual Nº2 donde se evidencian seguimiento al PMA y actividades ambientales realizadas por el contratista durante este periodo.

Cordialmente,

Ing. LILIANA RUBIO
Residente Ambiental
CONSORCIO GEBAL

Carrera 16 No. 96 – 64 Oficina 404 – Edificio Oficenter 96 – Teléfono 703 17 26
E – mail: gerencia@civingingenieria.com
Bogotá D.C. - Colombia

028

1689.

EVER JOSE SALGADO SALGADO
NIT:7.917.558-1

029

INFORME MENSUAL AMBIENTAL Nº 2

ELABORADO POR: ING.NUBIA VIVIANA ORDOÑEZ ESPINEL

EVER SALGADO SALGADO
BOGOTÁ D.C
2020

029

obrasedmarsella@gmail.com

INFORME MENSUAL AMBIENTAL Nº 2

Del 17 febrero a 16 de marzo de 2020

CONTRATO DE OBRA COP 328 DE 2019

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA ADECUAR Y/O REPARAR LA ESTRUCTURA FISICA DE CINCO (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.

INTERVENTORIA CONSORCIO GEBAL
Lady Mercedes Aguirre Ortiz

SUPERVISOR: Yaneth esperanza echeverria becerra
Infraestructura Alcaldía Loca de Kennedy

Elaboró	Revisó y Aprobó	Fecha
Nubia Viviana Ordoñez Espinel		

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN 4
1. **ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO** 5
2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES 12
1. VOLÚMENES DE ESCOMBROS DEL PERÍODO POR SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL18
2. CERTIFICACIONES DE ESCOMBROS DEL PERÍODO 20
3. REGISTRO DE REPORTE DE ESCOMBROS 20
4. INDICADORES DEL PGRCD 20
5. ANEXOS 2 DE LA GUÍA DE PGRCD 21
6. CERTIFICACIONES DE NO GENERACIÓN DE RCD O DE NO REUTILIZACIÓN 21

INTRODUCCIÓN

El presente documento hace referencia al informe mensual de las actividades ambientales realizadas del 17 de febrero al 16 de marzo de los corrientes alusivas al contrato de obra **COP 328 de 2019** a cargo de **EVER JOSE SALGADO SALGADO** Nit: 7.917.558-1 en sinergia con la entidad **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY,** con quien se suscribió el presente contrato de obra cuyo objeto es "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA ADECUAR Y/O REPARAR LA ESTRUCTURA FISICA DE CINCO (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO."

Para la ejecución del contrato de obra civil se otorgó un plazo inicial de seis (6) meses y se firmó acta de inicio el 17 de enero de 2020 bajo la supervisión del **Yaneth Esperanza Echeverria Becerra** del área **de infraestructura de la Alcaldia Local de Kennedy**; con la Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y sst por parte de **Consorcio GEBAL.**

1. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

A continuación, se muestra la recopilación de las actividades referentes a la gestión ambiental del mes transcurrido, actividades que fueron referenciadas también en los informes semanales:

Fecha	Actividades realizadas	Compromisos
17/02/2020 Al 23/02/2020	Para esta semana las actividades de mantenimiento locativo del J.I COMETA continúan ejecutándose. El día miércoles 19 de febrero de 2020 se da el comité de obra donde se mencionan diferentes temas de avance de las actividades. Se realiza recorrido con profesional ambiental de la interventoría para validar los aspectos ambientales que han ido apareciendo en el desarrollo de obra. Se mostró el acopio de residuos tipo no pétreos que por falta de espacio constituido de zona dura (la zona dura está constituida por las zonas transitables y la otra zona disponible, al lado de la caseta de la vigilancia, está siendo resguardada para el ingreso y potencial material granular a usar) quedó sobre cobertura vegetal. Cabe mencionar en este aparte que se solicitó a la interventoría permiso vía correo electrónico (el cual cuenta con respuesta positiva y además con recomendaciones a acatar) para esta acción con el compromiso de no afectar gravemente la zona y dejarla en adecuadas condiciones. En el recorrido se le mostró a profesional ambiental de la interventoría que el suelo fue protegido con las mismas láminas de policarbonato, además de que estos residuos resultantes no constituyen una tensión superficial alta al suelo, como	- Continuar con la gestión ambiental de obra del proyecto - Asistencia a comité de obra el miércoles 26 de febrero de 2020 a las 9 am - Atención a potenciales observaciones de la interventoría

si lo haría otro tipo de residuos a casusa de su densidad. Adicional, la zona está acordonada, aislada y se usa una sola zona para esta tarea favoreciendo el orden en el acopio de estos residuos. De igual manera, dentro del recorrido se evidenció que los individuos arbóreos no están siendo afectados por la actividad constructiva y no hay canaletas de drenaje ni residuos líquidos en inmediaciones.

Profesional de la interventoría resaltó como observación los siguientes aspectos:

- Mejorar el tema de orden y aseo dentro de la intervención: lo cual fue acatado y se muestra en el registro fotográfico del presente informe (foto 1 y 2)
- Instalar protección en el suelo (césped) cuando comience la etapa de pintura, luego que se identificó mancha de pintura azul en el suelo en la prueba realizada para mostrar los colores (foto 5): al identificar este impacto se requirió la limpieza del césped (foto 6) y el tema es mencionado en capacitación realizada al personal el día 21 de febrero de 2020 para lograr tomar medidas antes de iniciar esta actividad y se realizara seguimiento para que sean llevadas a cabo.

Se puede apreciar el punto ecológico instalado en área del desarrollo de obra, conservación del cerramiento perimetral para disminuir cualquier tipo de impacto a zonas fuera de la zona de trabajo y a pesar de que se están llevando a cabo acciones con pulidora, no está

dispersándose material particular en forma significativa (foto 10). En el informe anterior no se tuvo la precaución de mencionar que la semana pasada (viernes 14 de febrero 2020) se llevó a cabo capacitación de temas ambientales iniciales a los 4 primeros trabajadores. Adicional, El día Viernes 21 de febrero de 2020 se imparte 2° capacitación, aprovechando el ingreso del personal nuevo y como refuerzo al personal existente. Quede como evidencia de estas actividades registro fotográfico (fotos 7 y 8) y Anexo 1. Capacitaciones El día 18 de febrero de 2020 interventoría envía correo informal de aprobación de los contenidos de: Plan de Manejo Ambiental – PMA y Plan de Gestión de RCD – PG RCD del proyecto. A partir de ello, profesional ambiental de la interventoría solicita la radicación formal de los documentos para aprobación. De igual manera, se informa que ya está adelantada la gestión de recolección de los residuos tipo no pétreos resultado del desmantelamiento del Jardín Infantil COMETA. Esta recolección se realizará con el ente gestor Ambiente y Soluciones, quienes a su vez expedirán la correspondiente certificación de adecuada disposición final. ES importante indicar que todavía no se hará la recolección a la espera de que la totalidad de los residuos resultantes estén disponibles, luego que todavía se está en esta tarea y de esta manera aprovechar al máximo el servicio de recolección.	

Fecha	Actividades realizadas	Compromisos
23/02/2020 Al 01/03/2020	Para esta semana las actividades de mantenimiento locativo del J.I COMETA continúan ejecutándose. El día miércoles 26 de febrero de 2020 se llevó a cabo el comité de obra donde se mencionan diferentes temas de avance de las actividades. En dicha reunión se concertó ir el día 27 de febrero de 2020 a la alcaldía de la localidad de Kennedy para tener un encuentro con el referente ambiental y la interventoria, con quienes se validaría el tema de PIN y el registro que con este debe hacerse en la plataforma virtual de disposición final y aprovechamiento. Se realiza recorrido con profesionales asistentes al comité y se registran las distintas actividades realizadas y los cuidados en tema ambiental que han sido implementados. Para validar este asunto se muestra en el registro fotográfico las actividades llevadas a cabo: • Protección al suelo donde está el acopio temporal de no pétreos • Punto ecológico instalado • Ninguna afectación a individuos arbóreos presente • Protección a la cobertura vegetal por donde están pasando los trabajadores y las carretillas • Manejo correcto de RCD • No hay canaletas de drenaje ni residuos líquidos en inmediaciones Esta semana se generó material de excavación producto de la actividad de construcción de andenes alrededor de	- Continuar con la gestión ambiental de obra del proyecto - Asistencia a comité de obra el miércoles 04 de marzo de 2020 a las 9 am - Atención a potenciales observaciones de la interventoría

la estructura del Jardín Infantil Cometa. Este material de excavación fue colocado en zona dura y fue retirado el día viernes 28 de febrero, siendo transporta al sitio de disposición adecuado máquinas amarillas (ver registro fotográfico) en 2 viajes. Este retiro y disposición final será reportado una vez contemos con la certificación, la cual no serpa generada mientras no se cuente con el PIN de obra. En algunas áreas cayó material de excavación sobre la cobertura vegetal, pero este fue limpiado y se protege el suelo con las láminas de madera y piso vinílico para aprovecharlas Finalmente, el día 27 de febrero de 2020 desde la alcaldía local de Kennedy cancelan reunión para obtención del pin de obra y se traslada para el día 02 de Marzo de 2020. Se recuerda que la gestión de recolección de los residuos tipo no pétreos resultado de la a cargo de desmantelamiento del Jardín Infantil COMETA estará a cargo del ente gestor Ambiente y Soluciones, quienes a su vez expedirán la correspondiente certificación de adecuada disposición final. Esta gestión no se ha completado a la espera de tener la totalidad de los residuos de este tipo. En aproximadamente dos semanas da inicio las actividades de mantenimiento del Jardín Infantil Metro, por lo que la reunión de socialización a la comunidad afectada será el día 03 de marzo de 2020 (la otra semana).	

Fecha	Actividades realizadas	Compromisos
23/02/2020 Al 01/03/2020	Para esta semana las actividades de mantenimiento locativo del J.I COMETA continúan ejecutándose. El día lunes 02 de marzo de 2020 se realizó inspección de obra para validar los aspectos ambientales de la misma y coordinar la recolección de residuos existentes. En este recorrido se identificó que se estaba colocando escombro en matera donde hay individuo arbóreo. Se hizo la respectiva retroalimentación al personal y se hizo la tarea de retiro y conformación de la zona como estaba antes. La situación se verá en el registro fotográfico. El miércoles 04 de marzo se asiste a comité de obra donde se relacionaron los diferentes temas de avance de las actividades constructivas. Se realiza recorrido con profesionales asistentes al comité y se registran las distintas actividades realizadas y los cuidados en tema ambiental que han sido implementados. Profesional de interventoría solicita el cubrimiento de arena de río que está fuera del cerramiento. Al indagar con el área técnica informan que estaba siendo usada ese día, pero al finalizar la jornada esta es cubierta con el plástico que se aprecia en el registro fotográfico (Ver foto 11). Para validar gestión ambiental se muestra el registro fotográfico en el ítem 2 de las actividades llevadas a cabo: • Protección al suelo donde está el acopio temporal de no pétreos • Punto ecológico instalado • Ninguna afectación a individuos arbóreos presente: se hizo retroalimentaciones correspondientes.	- Continuar con la gestión ambiental de obra del proyecto - Asistencia a comité de obra el miércoles 04 de marzo de 2020 a las 9 am - Atención a potenciales observaciones de la interventoría

- Protección a la cobertura vegetal por donde están pasando los trabajadores y las carretillas
- Manejo correcto de RCD
- No hay canaletas de drenaje ni residuos líquidos en inmediaciones.
- Mezcla de mortero y/o cemento sobre protección al suelo.

Esta semana no se generó material de excavación nuevo producto de la actividad de construcción de andenes alrededor de la estructura del Jardín Infantil Cometa. Sin embargo, cabe mencionar que salió un nuevo viaje el 29 de febrero de 2020 que no había sido mencionado la semana pasada, para un total de 3 viajes en total hasta ahora. Este retiro y disposición final será reportado una vez contemos con la certificación, la cual no podrá generar mientras no se cuente con el PIN de obra. En este sentido también es importante mencionar que se hace revisión del del PIN, SOAT, Tecno mecánica, y licencia de conducción del conductor de la volqueta de placas BBJ060, cuyo pin es el 12840, la que transportó el material de excavación a máquinas amarillas

Se continua con protección del suelo con las láminas de madera y piso vinílico para aprovecharlas y evitar contaminación o desgaste de la cobertura vegetal.

Se esperaba esta semana tener reunión con referente ambiental en la alcaldía, pero finalmente se programa la tarde noche anterior al día del encuentro por lo que profesional ambiental del contratista ya tenía otro tema planificado y no podía asistir.

Se recuerda que la gestión de recolección de los residuos tipo no pétreos resultado de la a cargo de desmantelamiento del Jardín Infantil COMETA estará a cargo del ente gestor Ambiente y Soluciones, quienes a su vez expedirán la correspondiente certificación de adecuada disposición final. Esta gestión está programada para el miércoles 11 de marzo de los corrientes.	

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES



Foto 1. Actividades de [illegible]

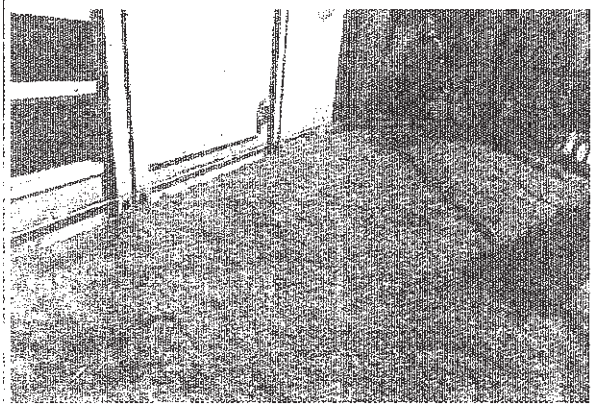


Foto 2. Actividades orden y aseo



Foto 3. Individuos arbóreos [illegible] afectaciones

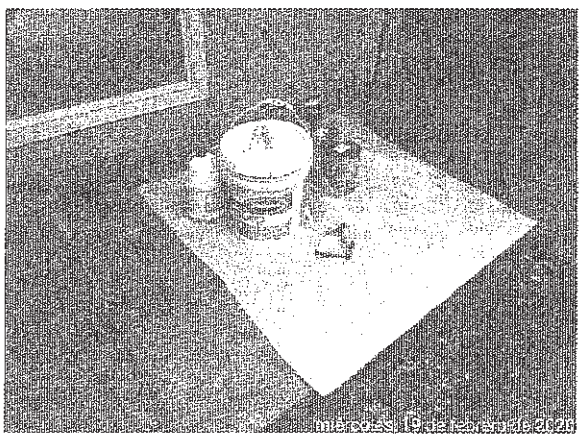


Foto 4. Protección al suelo de sustancias potencialmente contaminantes

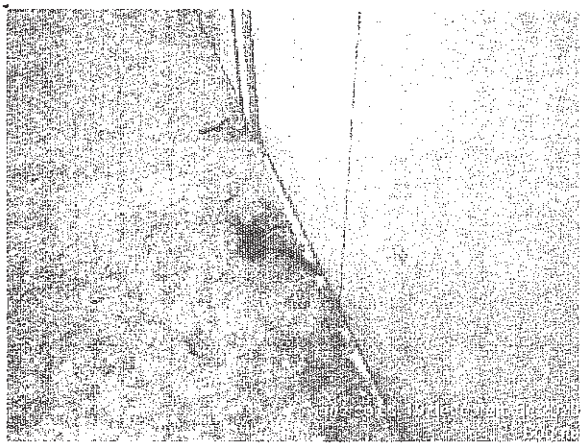


Foto 6. Señalización potencial impacto en prueba de [illegible] dado por interventoría

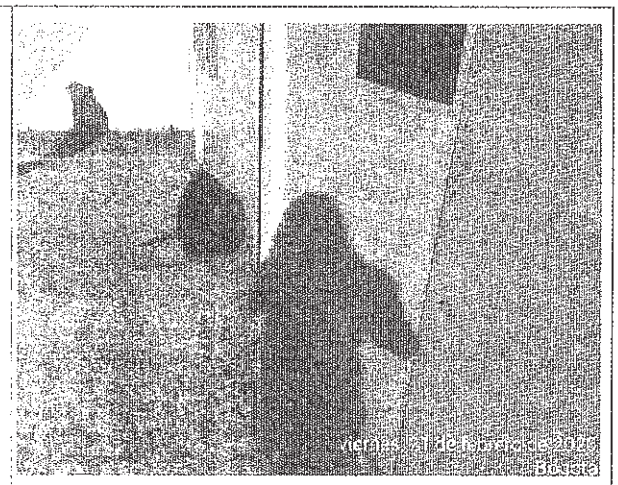


Foto 7. Se limpia la zona identificada

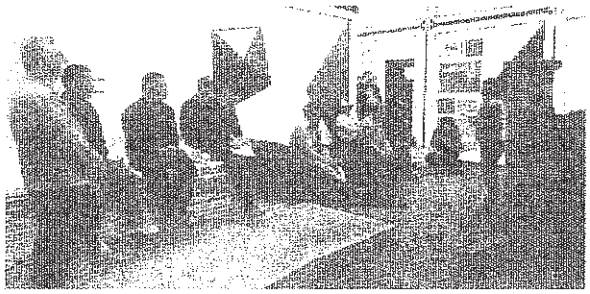


Foto 8. Capacitación: PMA y responsabilidades ambientales

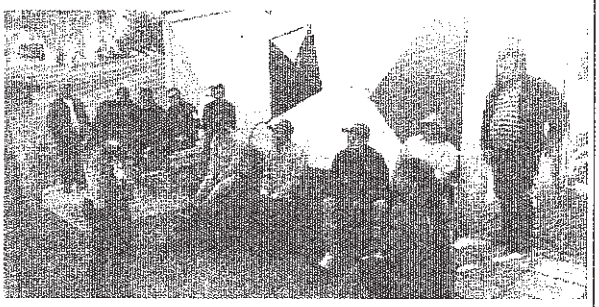


Foto 8. Capacitación: PMA y responsabilidades ambientales



Foto 9. Punto ecológico señalizado

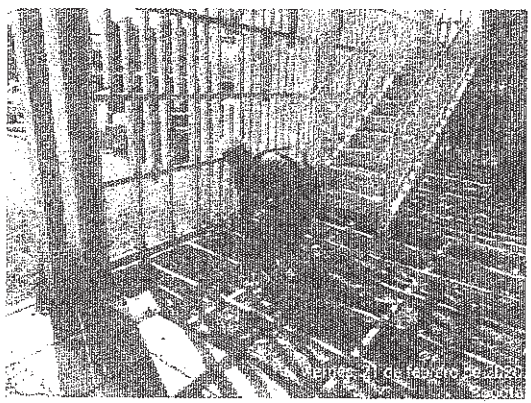


Foto 10. Trabajador puliendo, evidencia de no dispersión de material particulado

1694

EVER JOSE SALGADO SALGADO
NIT:7.917.558-1

042




Foto 1.1. Pr[illegible] del suelo en acopio temporal

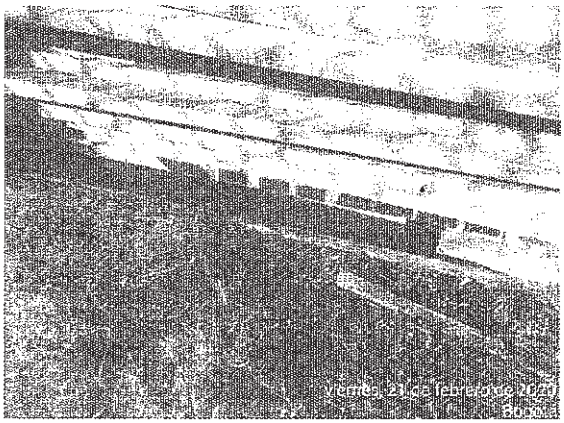


Foto 12. Protección del suelo en acopio [illegible]ral

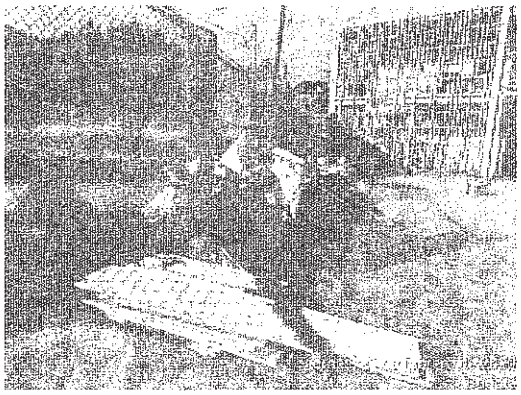


Foto [illegible] Protección del suelo en acopio temporal



Foto 6. Capacitación primera semana: PMA y responsabilidades ambientales



Foto [illegible] Acopio de materiales señalizado y con protección en suelo

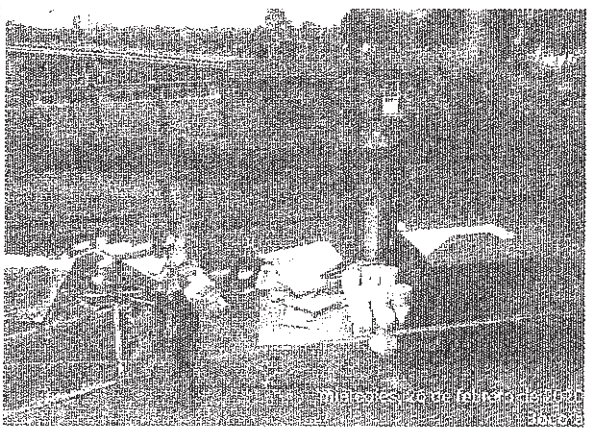


Foto 2. Acopio de materiales, señalizado y con protección en suelo

14

au

1695

EVER JOSE SALGADO SALGADO
NIT:7.917.558-1

043



Foto 7. Generación de material de excavación a Disposición Final en volquetas amarillas

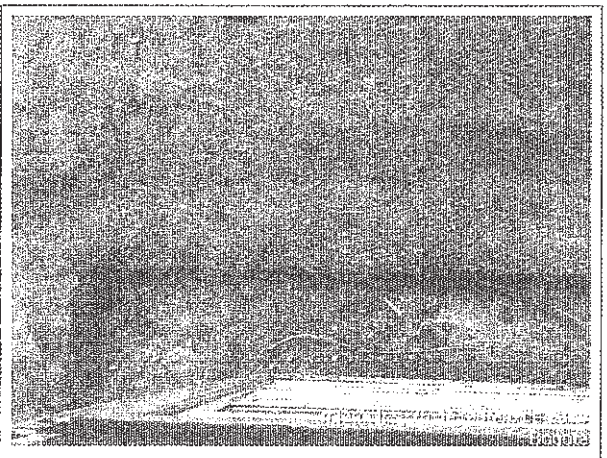


Foto 4. Excavaciones alrededor de estructura donde se genero material de excavación



Foto 5. Protección del suelo con plásticos

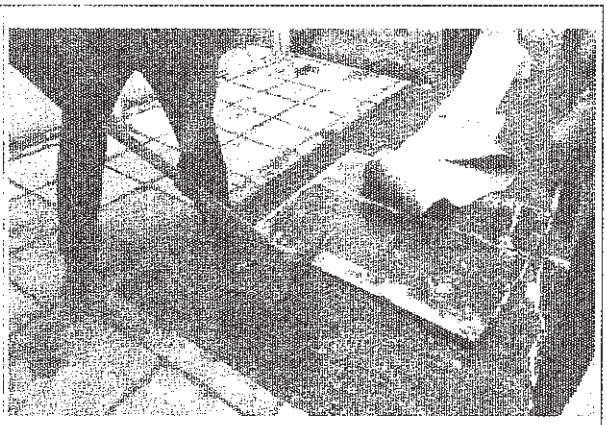


Foto 3. Limpieza material excavación del suelo

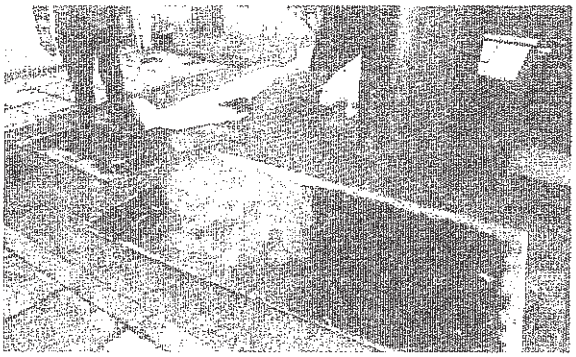


Foto 7. Protección al suelo con plásticos de trabajadores y carretillas

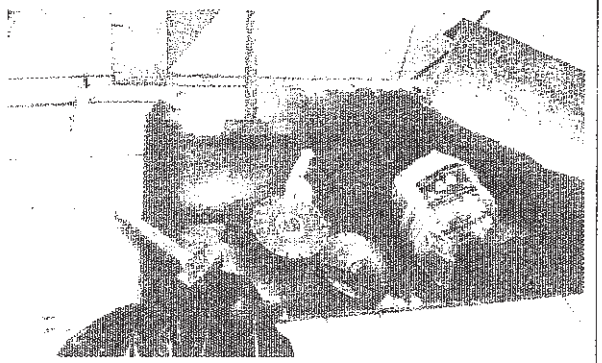


Foto 8. Protección al suelo de herramientas

15

013




Foto 9. Vale viaje # 1 de RCD: material excavación




Foto 10. Vale viaje # 2 de RCD: material excavación

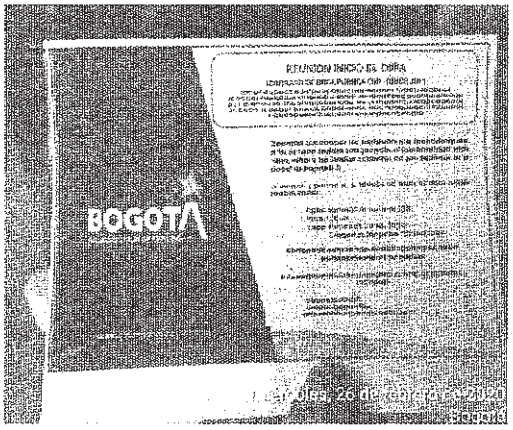


Foto 11. Vecindad próxima intervención




Foto 1. Identificación de [illegible] dentro de materiales

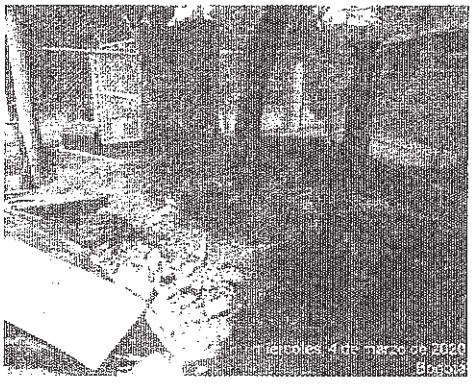


Foto 2. Acopio de materiales, señalizado y con protección ene suelo

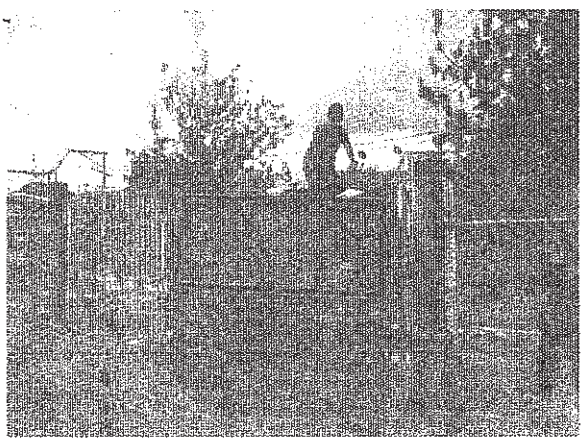


Foto 3. Cargue de volqueta con material de excavación del [illegible]

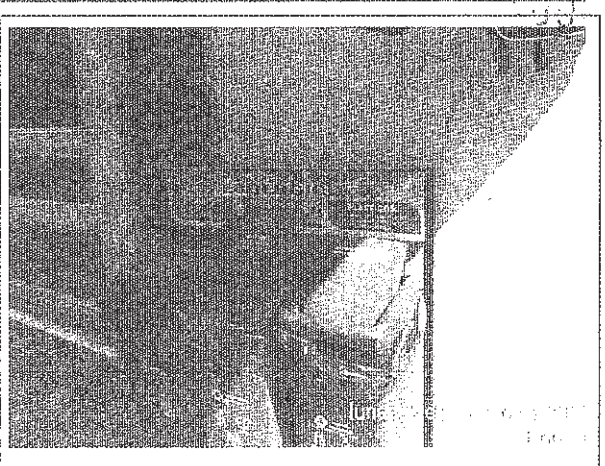


Foto 4. Punto ecológico instalado y funcionando

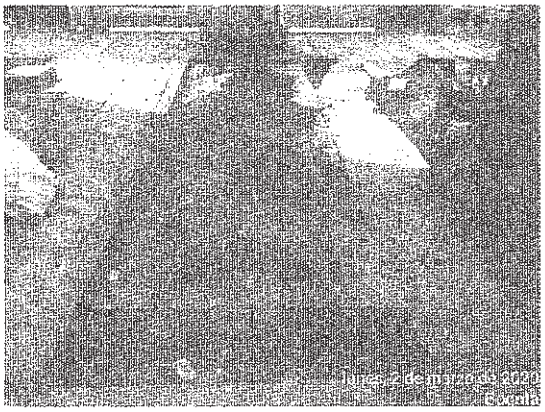


Foto 5. Mezcla mortero [illegible]

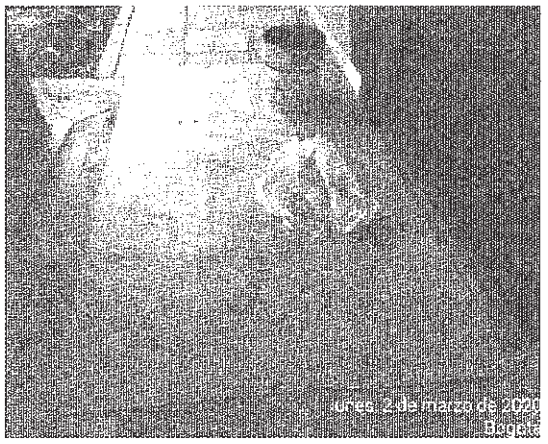


Foto 6. Protección del suelo de pinturas

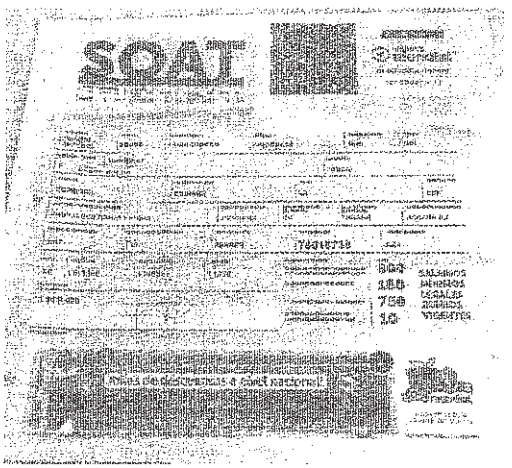


Foto 7. Revisión [illegible]




Foto 8. Revisión documentos de volqueta



Foto 9. Se requiere el retiro de elementos contaminantes

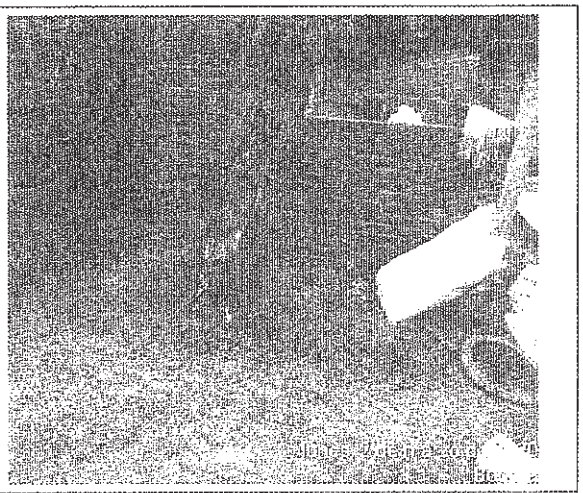


Foto 10. Los trabajadores proceden a acatar la observación



Foto [illegible] acopia adecuadamente los de material [illegible]

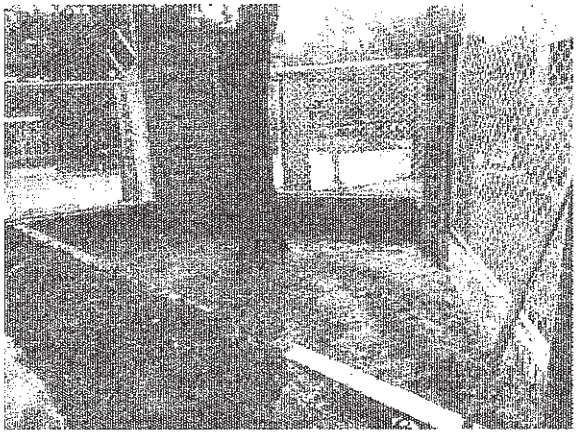


Foto 10. Finalizando la semana así quedó el área donde había acopiado excavación

[illegible] DE OBRA REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

17 [illegible]

Las [illegible] durante el periodo corresponden a los siguientes capítulos:

- Desmonte de baterías sanitarias
- Pulida de estructura del piso
- Desmonte de láminas de madera y traslado a copio
- Desmonte de piso vinílico
- Limpieza de salones bloque 1
- Lijada de estructuras
- Limpieza de pasto y en la parte inferior de bloque 2 y 3
- Desmonte de peliculas de vidrio
- Se mueve mobiliario de cocina
- Verificación de punto de desagüe
- Desmonte de láminas de policarbonato de oficina
- Orden y aseo de zonas

4. MATERIALES POR PROVEEDOR Y TIPO DE MATERIAL

A continuación, se expone el listado de materiales y el proveedor que los ha suministrado:

Proveedor	Material
I. NIPERFILES – Perfiles en PVC	Perfil media caña en PVC
KOLOMBIT	Placa de fibrocemento superboard
PELUCHIT	Piso Vinílico
CONCONCRETO_CUBIERTAS_Y_CERRAMIENTOS_INDUSTRIALES	Cubierta del techo

Adicional, nos pronunciamos anexar las fichas técnicas de los materiales exhibidos en la tabla (Ver Anexo 1)

5. VOLÚMENES DE ESCOMBROS DEL PERÍODO POR SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL

Los volúmenes que se dispuso para este periodo por parte de la obra en Jardín Cometa son:

Sitio de DF	# viajes	volumen en m3
Maquinas amarillas - manas	3	21

Adicional, se dispone con gestor de residuos no pétreos un total de **1697 kg** entre madera, material sobrante de obra y bolsas de cemento. El retiro se hace el día 11 de marzo por lo que la certificación de estos residuos se encuentra en trámite.

6. CERTIFICACIONES DE ESCOMBROS DEL PERÍODO

La certificación de disposición final de Maquinas amarillas – manas no se había podido solicitar, luego que no se contaba con el pin ambiental y sin este dato la empresa no suministra certificaciones. No obstante, el día 09 de marzo de 2020 fue posible la consecución de este: 18379 y se cuenta con los tres vales de los viajes (Ver Anexo 4). De esta manera se procede a la solicitud de la certificación. DE igual manera para lo entregado a la empresa gestora ambiente & soluciones.

7. REGISTRO DE REPORTE DE ESCOMBROS

No se realiza reporte todavía hasta no contar con las certificaciones completas, luego que la certificación de residuos pétreos y no pétreos están en trámite. Una vez se cuente con el documento válido para la secretaría distrital de ambiente, se procederá a realizar el reporte.

8. ARCHIVO CSV DE VOLQUETAS EN EXCEL

En el momento en que se cuente con el reporte de RCD en la plataforma virtual de la SDA, se adjuntará el archivo CVS relacionando los datos correspondientes.

9. INDICADORES DEL PGRCD

Para el mes de febrero se generaron indicadores con los datos obtenidos para el periodo. Estos daros serán encontrados en el Anexo 2.

1902

050

LG Hausys

MANUAL DE MANTENIMIENTO

DELIGHT

Recomendación de limpieza y cuidado Pisos en Vinilo LG

051

LG Delight

1. Medidas Preventivas.


Los pisos LG Hausys Delight están fabricados especialmente con una capa UV curada en PUR que proporciona un mantenimiento innovador y muchas opciones. Esta capa no requiere cera ni pulido, ya que la técnica única de tratamiento de superficie de LG Hausys evita que los contaminantes penetren en la capa de desgaste.


Para asegurar que estos productos conserven su aspecto original el mayor tiempo posible, LG Hausys recomienda:

1. Proteger los pisos nuevos contra daños durante la construcción con papel kraft sin teñir o paneles de madera.

2. Los tapetes de paso se instalan en los puntos de entrada al edificio para limitar la cantidad de suciedad húmeda y seca.

3. Si se mantienen correctamente, estos tapetes deben limitar la transferencia de arena y suciedad, facilitando aún más la limpieza y el mantenimiento diario.

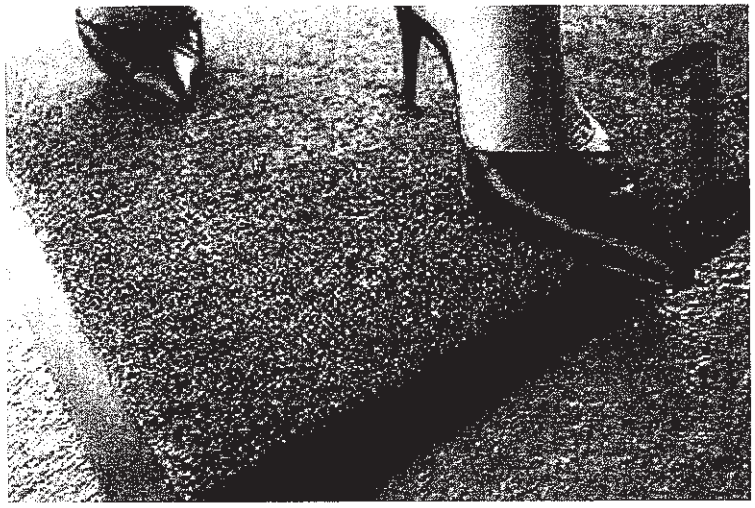

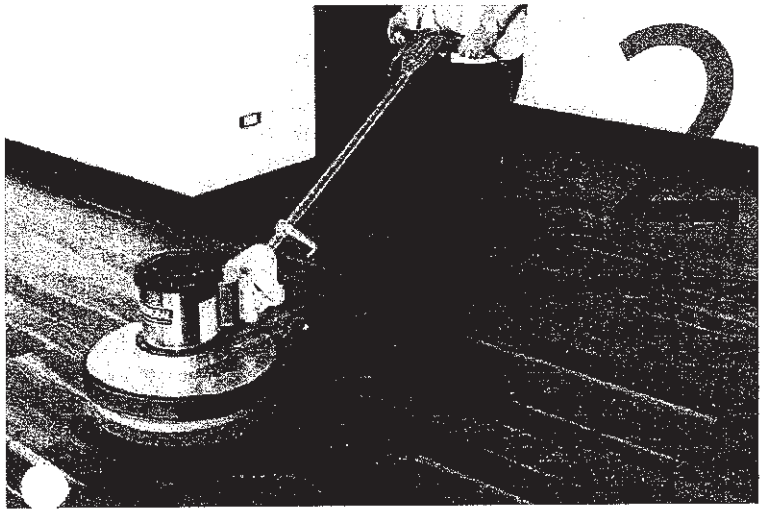

2. Limpieza inicial

1. Asegúrese de eliminar todos los residuos de adhesivos de la superficie del piso. Los agentes minerales están aprobados para retirar los adhesivos secos.

2. Barra o aspire el piso para eliminar toda la suciedad superficial, suciedad, arena.


3. Dependiendo del nivel de suciedad del sitio, después de que se complete la instalación, puede ser necesario restregar o limpiar el piso antes de adoptar el régimen de mantenimiento diario. Por favor, elija la opción adecuada a continuación.

*Limpie con un detergente neutro/diluido, enjuague con agua limpia y deje que se seque.

*Friegue el piso con detergente neutro diluido usando una máquina rotativa de velocidad estándar aproximadamente 150 a 175 rev/min. o máquina con pad rojo. Recoja la solución con una aspiradora de líquidos.

Enjuague con agua limpia y deje secar. Finalmente pula con una máquina rotativa capaz de 200 - 1000 rev/min equipada con una almohadilla de color beige.

NO APLICAR SELLANTES

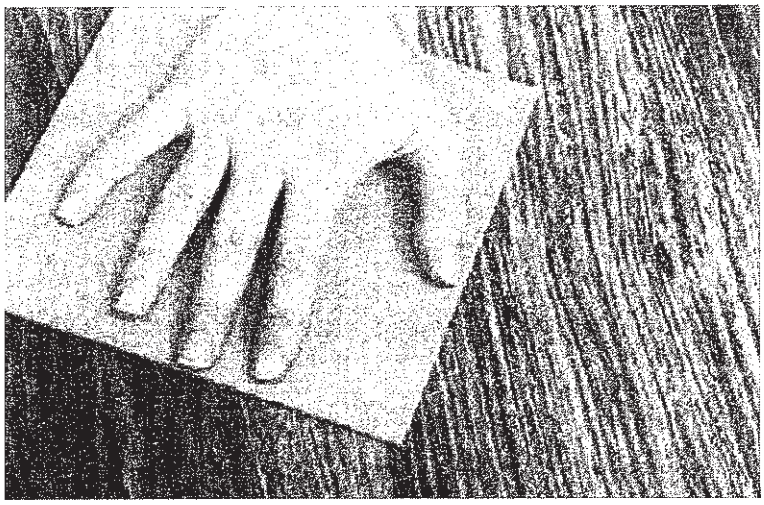

Diariamente / Semanalmente / Según sea necesario

Para mantener el aspecto original de su nuevo piso, se recomienda seguir un programa de mantenimiento de rutina.


MANUAL

ESCOBA (Limpia el polvo) TRAPERO HUMEDO (Humedezca el trapero con agua o detergente disuelto. Es importante que el líquido no sea vertido sobre el piso. Asegúrese que el trapero ha sido bien escurrido, así no necesitará secar).

QUITAMANCHAS (Para quitar las manchas de suciedad durante la limpieza, use un paño de nylon blanco)

PULIDO EN SECO (Habiendo utilizado tantos métodos manuales como mecánicos para la limpieza, el piso se puede pulir. Dicho pulimiento se usa para renovar la superficie del piso. Se hace a máquina con el disco café a una velocidad de rotación de 175rev/min.

Authorized Distributor of
LG Hausys

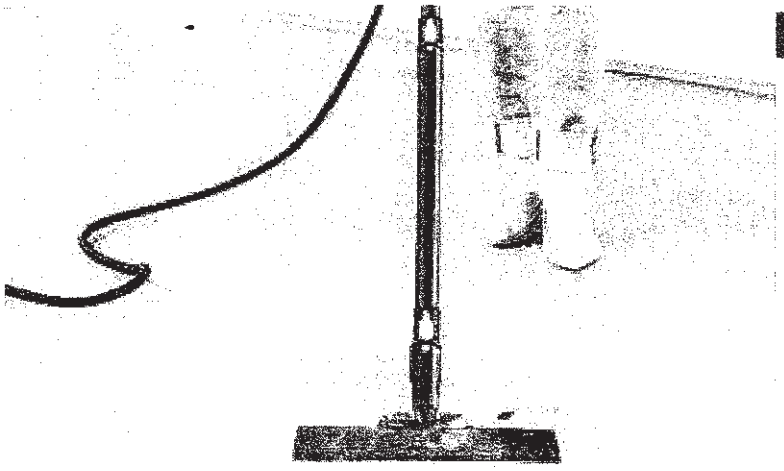

MÁQUINA

052

LIMPIEZA CON ASPIRADORA (Quitar el polvo y la suciedad suelta en el piso, se puede utilizar el trapero en áreas muy estrechas para completar la limpieza. También es muy buena cuando hay polvo causado por materiales de construcción durante reformas y construcciones)

MAQUINA BRILLADORA DE DISCO (Limpieza automática a máquina, baja velocidad, aproximadamente 150 a 175rev/min. Se le vierte el líquido desinfectante o diluyente en el tanque que humedece el disco.

Un disco rojo para limpiar y un disco blanco para brillar. Existen diferentes tipos de máquinas que actúan a diferentes velocidades dependiendo del tipo de limpieza que se vaya a efectuar. También pueden usarse discos con cepillos para una limpieza mas profunda (verdes de cerdas suaves o negros de cerdas)

3. Mantenimiento periódico

*Trapee con una solución de detergente neutro diluido, espere de 5 a 15 minutos.


*Frote el piso con un depurador de 150-250 rpm equipado con una almohadilla roja o un cepillo similar.

*Recoja la solución sucia con una aspiradora de líquidos que no permita que se seque en el piso.

*Enjuague el piso limpio con agua limpia, cambie el agua de enjuague cuantas veces sea necesario, hasta que el agua permanezca limpia.

*Después del enjuague final, permita que el piso se seque por completo.

*El piso limpio ahora se puede pulir con una máquina rotativa capaz de 200 - 1000 rpm, equipada con una almohadilla beige o similar.

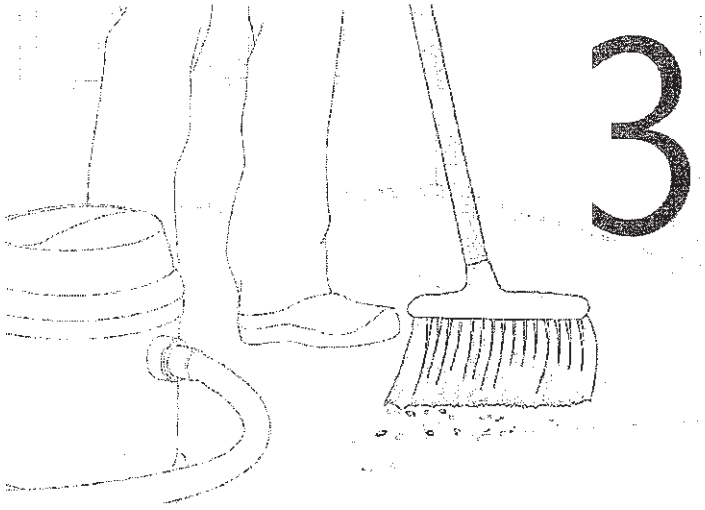

3

4. Tipos de manchas

EL DELIGHT NO REQUIERE ENCERAR O PULIR



Frutas, jugos, leche, crema, bebidas, vinos, cerveza: LIMPIADOR NEUTRO



Papel carbón, cinta máquina de escribir, esfero, tinta, labial ALCOHOL ETÍLICO




Chocolate, café, té, grasa, aceite, betún, marcas suela de zapato, azfalto.

LIMPIADOR NEUTRO- PAÑO VERDE


Mancha de cigarrillo PAÑO ROJO O BLANCO



Orines, vómito, excremento LIMPIADOR NEUTRO



Moho DETERGENTE NEUTRO CON ACIDO OXÁLICO



Chicle AGUA FRIA, CON ESPÁTULA (suave)

1705.

LG Hausysfloors

Authorized Distributor of

LG Hausys

1706

arkos® SISTEMAS ARQUITECTONICOS **TEJA ECOROOF Y ECOWALL**

CERTIFICADO DE GARANTIA

GENERALIDADES

El producto de esta garantía suministrado por ARKOS cuenta con garantía otorgada por el Proveedor o fabricante y por ARKOS como Expendedor, con el objeto de brindar al Consumidor o persona natural o jurídica a quien se factura, el respaldo sobre el producto adquirido en nuestros puntos de venta

PRODUCTOS AMPARADOS POR LA GARANTÍA

Tejas Ekoroof 36 Residencial, Ecoroof Asa 35/37 UPVC y Ecowall 27 Asa

La garantía otorgada ampara los defectos relacionados con la calidad intrínseca del producto, de resistencia al uso siempre que el consumidor cumpla con las instrucciones de instalación y con las recomendaciones de mantenimiento y uso técnico, de acuerdo con las normas técnicas del producto.

COBERTURA DE LA GARANTÍA

La garantía cubre cualquier defecto de fabricación del producto que pueda afectar su desempeño óptimo en las áreas de trabajo especificadas por el Proveedor, siempre que el constructor cumpla con las instrucciones para la instalación y el consumidor con las recomendaciones para el mantenimiento y uso del producto.

En caso que se presente defectos de fabricación en el producto amparados por la garantía y cumpliendo con las condiciones estipuladas para efectos de reconocimiento por parte de ARKOS, ésta y/o el Proveedor procederá a realizar pruebas pertinentes con el fin de establecer la idoneidad y calidad, requiriendo al servicio técnico o directamente al fabricante, para ello el cliente debe hacer llegar a servicio al cliente una muestra acertada con un tamaño significativo e informe de reclamación. En caso de que se establezca que el producto tiene un defecto de fabricación, ARKOS y/o el Proveedor, reparará o reemplazará el producto por otro igual si hay disponible o por el que más se le asemeje, o hará devoluciones en dinero equivalentes al valor neto del producto a la fecha de la compra, en los casos en que por disposición de la ley deba hacerlo.

TIEMPO DE COBERTURA DE LA GARANTÍA

El certificado de garantía para el producto tendrá vigencia a partir de la fecha de compra del producto, que corresponde a la fecha registrada en la factura de compraventa. La vigencia de la garantía está condicionada a la observancia por el consumidor de lo establecido en las instrucciones de instalación del producto, a la ficha técnica y a las recomendaciones para el mantenimiento y uso del producto de acuerdo con las características del mismo.

ECOROOF & ECOWALL - CUBIERTAS TERMOACÚSTICAS ASA		
PRODUCTO	**USO**	**TIEMPO DE GARANTÍA**
ECOROOF 36 RESIDENCIAL ASA	COMERCIAL	5 AÑOS
	RESIDENCIAL	5 AÑOS
ECOWALL 27 ASA	COMERCIAL	5 AÑOS
	RESIDENCIAL	5 AÑOS
ECOROOF 35/37 ASA	COMERCIAL	5 AÑOS
	RESIDENCIAL	5 AÑOS

EXONERACIONES DE LA COBERTURA DE LA GARANTÍA

ARKOS y/o el Proveedor quedan exonerados de responder por la garantía del producto cuando se presenta:

a) Fallas en la instalación del producto:

Las fallas en la instalación del producto se presentan, entre otras circunstancias, cuando el Consumidor no atiende las instrucciones o recomendaciones del Proveedor establecidas en la garantía y/o en los instructivos de instalación, mantenimiento y uso del producto,

b) Uso anormal del producto:

El uso anormal del producto se presenta, entre otras circunstancias, cuando se instala para un uso diferente y condiciones a las recomendadas por el Proveedor. El Consumidor debe informar suficientemente a ARKOS el fin que le quiere dar al producto, en caso de que ARKOS no sea informado y el Consumidor utilice el producto para estructuras desconocidas tampoco se responderá por la garantía;

c) Caso fortuito o fuerza mayor:

Se presenta en los eventos previstos por la ley, entre otras circunstancias, cuando ocurren eventos naturales y/o públicos no relacionados con la calidad del producto como son: Terremotos, derrumbes, inundaciones, incendios, vandalismo o asonada, impacto de objetos sobre el producto que sean superiores a las condiciones y/o características del producto.

d) Hecho de terceros:

Se presentan por acción u omisión, que pueda afectar al producto, por el Consumidor o por terceros como son, entre otros

e) La inobservancia de las recomendaciones de mantenimiento entregadas en la ficha técnica y el presente documento.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

En el evento en que se haga efectiva la garantía, la misma no cubre el valor de los materiales utilizados para la instalación como accesorios, estos entre otros o equipos; intereses sobre el valor pagado por el producto; diferencias de apariencia del producto dentro de los rangos establecidos por normas técnicas nacionales o internacionales como consecuencia natural del proceso de fabricación y exposición a rayos UV; el valor de posibles perjuicios que la reclamación pueda causar en las actividades comerciales, industriales, profesionales o habitacionales del Consumidor, ni otro gasto no especificado en la presente garantía. Cualquier otro reclamo por daño o pérdida, directa o indirecta, o consiguiente independientemente de la causa del daño, es expresamente excluida de esta garantía.

EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA

Para hacer válida la garantía del producto, el Consumidor debe cumplir con todas las instrucciones para la instalación establecidas por ARKOS y/o el Proveedor, y las recomendaciones para la instalación del producto especificadas en las fichas técnicas.

INSTRUCCIONES GENERALES

1. Antes de empezar: Lea la ficha técnica y las instrucciones de instalación del producto.
2. La fecha de comienzo de esta garantía es la fecha de la compra original y es válida sólo para el comprador original. Los demandantes deben proporcionar un recibo que indique la fecha de compra.
3. Tan pronto reciba el producto, asegúrese se encuentre en perfecto estado. Si encuentra roturas incongruencias debe notificarlas de manera inmediata a la entrega para proceder con la reposición y dejar la observación de forma escrita.
4. No golpee los materiales durante su descarga y sujételos muy bien durante su transporte protegiendo los bordes.
5. Cuando mueva el producto, no permita que se deslicen unos sobre otros, con cuidado levántelos especialmente uno a uno.
6. No deslice herramientas, ni equipos de arrastre por la parte superior del producto durante la obra.
7. Para evitar el deterioro, mantenga la superficie de los mismos limpia de restos de obra, proteja muy bien el producto.
8. Limpie inmediatamente retirando toda sustancia derramada, si es abrasiva séquela no la frote, moje con agua caliente y seque con un paño suave.
9. Se recomienda limpieza periódica del material con el fin de mantener la belleza del producto. Para evitar la acumulación de polvo o residuos.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS/MANTENIMIENTO

1. Es mejor completar la limpieza por la mañana temprano o por la noche cuando la superficie esté fría para evitar que los limpiadores se sequen o se evaporen en la teja.

2. No utilice elementos abrasivos. Asegúrese que el drenaje de agua sea eficaz.

3. Aunque la información sobre nuestros productos es exacta en la medida de nuestro conocimiento, debe considerarse solamente como una sugerencia, ya que cada consumidor, debe efectuar sus propios diseños, medidas e instalación de acuerdo con el uso específico para el que lo requiera.

4. Para que la garantía sea válida, las tejas deben ser instaladas de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o el proveedor, recordando lo siguiente:

a. Instalar el lado correcto de la teja mirando hacia el sol.

b. Mantener una distancia máxima recomendada entre los soportes o apoyos.

c. Evitar contactos con químicos, pinturas, adhesivos, agentes limpiadores otros materiales incompatibles.

d. Utilizar arandelas o EPDM, nunca PVC.

e. Espaciar los tornillos adecuadamente y evitar apretarlos más de la cuenta como lo indican las instrucciones.

f. Curvar de acuerdo con las recomendaciones de ARKOS sobre la distancia y curvatura de radio apropiados.

g. Almacénelas bajo techo, protegidas siempre de la posición horizontal preferiblemente sobre estibas o planchones con apoyos cada 30 cm.

arkos® SISTEMAS ARQUITECTONICOS **TEJA ECOROOF Y ECOWALL**

h. La cantidad máxima para almacenar debe ser 20 tejas por pila.

i. Para las tejas Arkos se recomienda una limpieza periódica con agua y jabones suaves mínimo cada 12 meses, seque inmediatamente.

Recibí a conformidad,

Nombre y Apellidos:		
Cargo:		
Empresa:		
Ciudad / País:		
Factura No.:		
Fecha Factura:		
Nombre de la obra:		
Firma Cliente:	Fecha:	
Manifiesto que el producto adquirido tendrá un uso diferente al indicado en las recomendaciones descritas por ARKOS en las fichas tecnicas y que de acuerdo a este uso se determinará la cobertura de la garantia.	Acepto SI ☐ NO ☐	Firma Asesor:

NOTA: Será obligación del comprador solicitar junto con la factura de compra la ficha técnica y manual de instalación o descargarla de nuestra página web


UNIPERFILES
PERFILES EN PVC

1710

058

REFERENCIA	PERFIL MEDIACAÑA DE 60mm EN PVC COEXTRUIDA
COLOR	Blanco y colores varios
PROCESO DE PRODUCCIÓN	Coestrusión
COMPUESTO	PVC rigido y flexible contenido de Estabilizante contra la Luz Ultravioleta (UV)
PESO	0,293 Kilogramos por metro lineal
MEDIDA DE EMPAQUE	Caja de 20 Tramos de 3,00 Metros lineales

DISEÑO

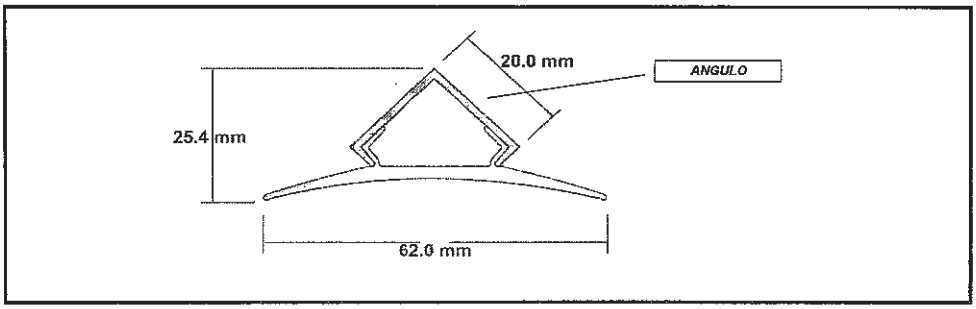

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	*ESPECIFICACIÓN*	*RESULTADO*
RESISTENCIA AL IMPACTO	40.0-45.0 J/m, Julios / Metro, NTC 369	43.0
RESISTENCIA A LA TENSIÓN	40.0-45.0 Mpa, Mega pascales, NTC 369	44.8
MINIMA TEMPERATURA DE FLEXION BAJO CARGA	1.82 Mpa, 50°C-60°C, NTC 369	64°C
EXTRACCIÓN (PERDIDA DE PESO)	Después de lavado con agua y secado 70°C, 4 hr en: H2S04, 30 diasde inmersión, 60°C 5%-15%	5%
RESISTENCIA AL FRIO	-20°C 10 hrs	No pierde elasticidad
RESISTENCIA A LOS HONGOS	Medio de cultivo, 48h	No presenta hongos
RESISTENCIA A LA LLAMA	ISO 472-1988 Duración de la persistencia de la llama bajo las condiciones de ensayo.	AUTOEXTINGUIBLE

GARANTIA

UNIPERFILES S.A.S. garantiza la no presencia de cristalizacion, decoloracion, deformacion y desprendimiento del material en condiciones normales de uso. En caso de presentar alguna de estas, procedera al cambio del producto.

LIMITACIONES

El producto final no debe ser sometido a temperaturas superiores a 60° C. e inferiores de 20°

APLICACIÓN:

El perfil Media Caña de 60 mm está diseñada para crear areas asepticas en los ángulos internos de 90 entre muro y piso, cielos rasos y muro o entre muro y muro en ambientes donde sea necesario mantener total asepxia en aplicación de las normas sanitarias; especialmente donde se realizan procedimientos medicos o con alimentos ,como cuartos frios, cocinas, zona de empaque y almacenamiento de alimentos, laboratorios y hoteles entre otros.

INSTALACION:

Instalación del perfil media caña en angulos internos de 90 grados para creacion de area aseptica:
1 PASO: Se separa la base o riel de la tapa halando hacia afuera cada una de las partes.
2 PASO: Se ancla el riel o base de la siguiente manera:
a). Entre Piso y Muro; al Muro.
b). Entre Muro y Muro a cada uno de los muros en Zig-Zag
c). Entre Muro y Cielo Raso: al Muro.

3 PASO: Proceso de anclaje de riel o base y se fija a la superficie indicada anteriormente dependiendo de donde se lleve a cabo la instalación de Mediacaña, estableciendo que cada lado del riel o base descanse en las superficies laterales del angulo a crear el area aseptica.

Para todos los casos: Si la superficie es en Sistema Liviano se ancla con tornillo autoperforante, en mamposteria (Ladrillo y/o Cemento). Con chazo tornillo o chazo puntilla a 40 centimetros cada anclaje.

RECOMENDACIÓN


Es recomendable instalarse en muros, cielos rasos y pisos que tengan superficies perfectamente lisas y formen angulo de 90°.

1711.
059

UNIPERFILES
PERFILES EN PVC

REFERENCIA	PERFIL MEDIACAÑA DE 90 MM EN PVC COEXTRUIDA
COLOR	Blanco y colores varios
PROCESO DE PRODUCCIÓN	Coestrusion
COMPUESTO	PVC rigido y flexible Contiene Estabilizante contra la Luz Ultravioleta (UV)
PESO	0,462 Kilogramos por metro lineal
MEDIDA DE EMPAQUE	Caja de 20 tramos de 3,00 Metros Lineales

DISEÑO

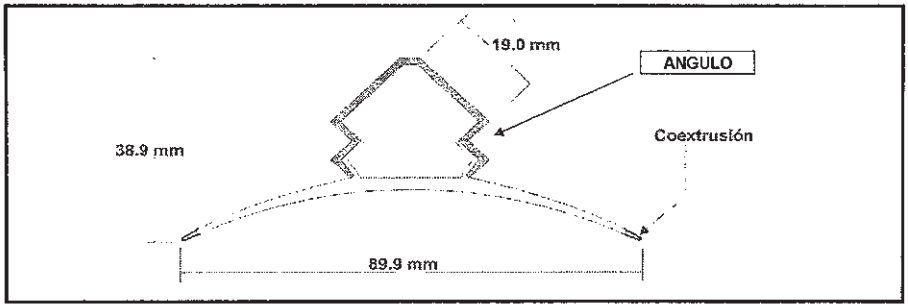

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	*ESPECIFICACIÓN*	*RESULTADO*
RESISTENCIA AL IMPACTO	40.0-45.0 J/m, Julios / Metro, NTC 369	43.0
RESISTENCIA A LA TENSION	40.0-45.0 Mpa, Mega pascales, NTC 369	44.8
MINIMA TEMPERATURA DE FLEXION BAJO CARGA	1.82 Mpa, 50°C-60°C, NTC 369	64°C
EXTRACCIÓN (PERDIDA DE PESO)	Después de lavado con agua y secado 70°C, 4 hr en: H2S04, 30 díasde inmersión, 60°C 5%-15%	5%
RESISTENCIA AL FRIO	-20°C 10 hrs	No pierde elasticidad
RESISTENCIA A LOS HONGOS	Medio de cultivo, 48h	No presenta hongos
RESISTENCIA A LA LLAMA	ISO 472-1988 Duración de la persistencia de la llama bajo las condiciones de ensayo.	AUTOEXTINGUIBLE

GARANTIA

UNIPERFILES S.A.S. garantiza la no presencia de cristalizacion, decoloracion, deformacion y desprendimiento del material en condiciones normales de uso. En caso de presentar alguna de estas, procedera al cambio del producto.

LIMITACIONES

El producto final NO debe ser sometido a temperaturas superiores a 60° C. e inferiores a 20° C.

APLICACIÓN:

El perfil Media Caña de 90 Cm Coextruida está diseñada para crear areas asepticas en los ángulos internos de 90° entre muro y piso, cielos rasos y muro o entre muro y muro en ambientes donde sea necesario mantener total asepxia en aplicación de las normas sanitarias;especialmente donde se realizan procedimientos medicos o con alimentos ,como cuartos frios, cocinas, zona de empaque y almacenamiento de alimentos, laboratorios y hoteles entre otros.

INSTALACION:

Instalación del perfil media caña en angulos internos de 90 grados para creacion de area aseptica:

1 PASO: Se separa la base o riel de la tapa halando hacia afuera cada una de las partes.

2 PASO: Se ancla el riel o base de la siguiente manera:

a). Entre Piso y Muro; al Muro.

b). Entre Muro y Muro a cada uno de los muros en Zig-Zag

c). Entre Muro y Cielo Raso; al Muro.

3 PASO: Proceso de anclaje de riel o base y se fija a la superficie indicada anteriormente dependiendo de donde se lleve a cabo la instalación de Mediacaña, estableciendo que cada lado del riel o base descanse en las superficies laterales del angulo a crear el area aseptica.

Para todos los casos: Si la superficie es en Sistema Liviano se ancla con tornillo autoperforante, en mamposteria (Ladrillo y/o Cemento). Con chazo tornillo o chazo puntilla a 40 centimetros cada anclaje.

RECOMENDACIÓN

Es recomendable instalarse en muros, cielos rasos y pisos que tengan superficies perfectamente lisas y formen angulo de 90°.

PLACA DE FIBROCEMENTO Superboard®

FICHA TÉCNICA

Las placas Superboard®, fraguadas en autoclave son de fabricación nacional, no contiene fibras de asbesto y es producida con una mezcla homogénea de cemento, refuerzos orgánicos y agregados naturales. Este producto tiene el comportamiento, desempeño tradicional y garantía de Colombit, bajo la asesoría técnica de ETEX GROUP, líder mundial en este tipo de materiales de construcción.

Consideramos importante recalcar que somos poseedores del certificado ISO 14001, relacionado con la conservación del medio ambiente, el certificado de aseguramiento de calidad NTC ISO 9000 V. 2000 y OSHAS 18000.

La placa de fibrocemento SUPERBOARD® se encuentra disponible en diferentes dimensiones y espesores de acuerdo con su uso y según lo indicado en la tabla siguiente.

Presentaciones y Usos

Formato (mm)	*Espesor (mm)*	*Peso (kg/un)*	*Usos recomendados Descripción*
605 x 605	4	2.03	Cielo rasos suspendidos o clavados
1214 x 605	4	4.34	Cielo rasos suspendidos o clavados
1220 x 1220	4	8.79	Cielo rasos clavados
2440 x 1220	6	24.72	Cielo rasos, revestimientos interiores, páneles Modulit
2440 x 1220	8	31.96	Paredes interiores, ductos de servicio, aleros, cielo rasos atornillados, Casetas Sanitarias Colombit
2440 x 1220	10	43.2	Fachadas, bases para techos, mesones de laboratorio y cocinas
2440 x 1220	14	59.75	Fachadas, bases para techos, entrepisos, estanterías
2440 x 1220	17	71.98	Entrepisos, estanterías
2440 x 1220	20	84.83	Entrepisos, estanterías

Las placas SUPERBOARD se fabrican bajo las indicaciones de la Norma NTC 4373 "Placas planas de fibrocemento" y las propiedades físicas y mecánicas de esta placa son evaluadas bajo rigurosos ensayos basados en las Normas ASTM. Los valores se indican a continuación:

1713

Superboard

Colombit
an Etex group company

061

Propiedades físicas y mecánicas

Propiedad	*Valor**	*Unidad*	*Ensayo*
Absorción	32.0	%	ASTM C 11 85
Densidad (seca al horno)	1.25	kg/cm^3	NTC 4373
Contenido de humedad	10.0	%	NTC 4373
Movimientos hídricos			
Estirameinto seco al aire saturado	0.55	mm/m	Redco Procedure
Encogimiento de saturado a seco al horno	2.39		
Movimientos térmicos			
Encogimiento de 105℃ a 25℃	$6,5x10^6$	m/m℃	Redco Procedure
Módulo de eslasticidad (E)			
Seco longitudinal	7,902	MPa	ASTM D1037
Seco transversal	6,799		
Saturado longitudinal	5,769		
Saturado transversal	4,738		
Resistencia a la flexión (MOR)			
Seco al ambiente longitudinal	15.0	MPa	NTC 4373
Seco al ambiente transversal	9.0		
Saturado longitudinal	10.5		
Saturado transversal	6.5		
Conductividad térmica	0.26	W/m℃K	ASTM C518
Resistencia a la tracción del clavo			
En húmedo	32.0	kg	ASTM D1037
En seco	64.7		
Resistencia al impacto (Charpy)			
Seco al horno	1.56	KJ/m2	ASTM D256
Saturado	2.86		
Resistencia la fuego			
Índice de expanción de la llama	0.0		ASTM E84
Índice de propagación de humo	0.0		

* Valores promedio


Mpa: Mega Pascales; W: Watios; KJ: Kilojulios; ℃K: Grados Kelvin

Línea Gratuita de Asistencia Técnica 01(800)0966200
Visítenos en Internet en www.colombit.com
Correos Electrónicos colombit@colombit.com - asistec@colombit.com - cobitcci@colombit.com
CENTRO DE CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO
Carrera 14 # 98-34 Bogotá D.C. PBX: (57) (1) (2180306) Fax: (57) (1) (2187702)

arcosistemas®


1714


062

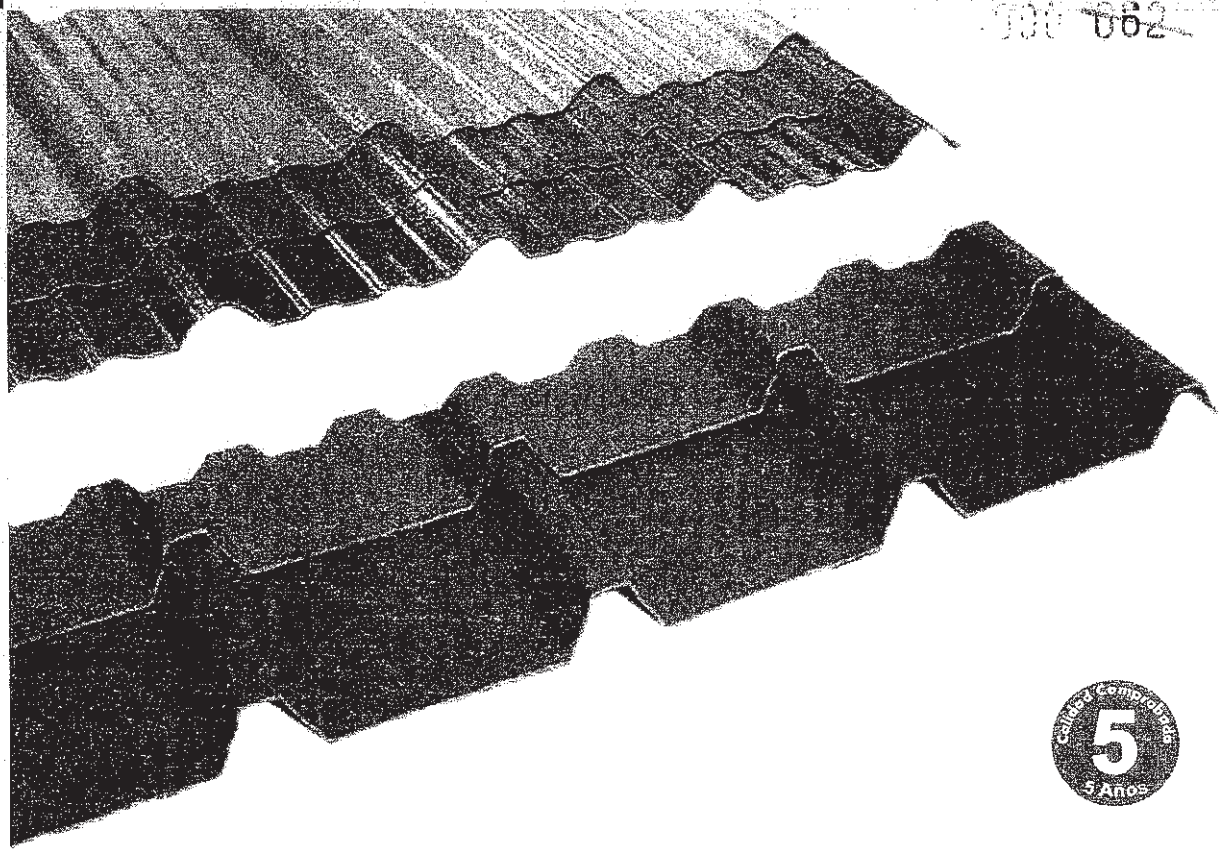


Calidad y Compromiso 5 5 Años

Gracias a su composición en UPVC y alma en PVC espumado, las tejas ECOROOF® Industrial, cuentan con alta resistencia al impacto y baja transmisión de calor y ruido. Adicionalmente una sobresaliente resistencia a diversos productos químicos, condiciones climáticas extremas y a gran esfuerzo físico, permaneciendo libres de corrosión. Características que garantizan una larga vida útil.

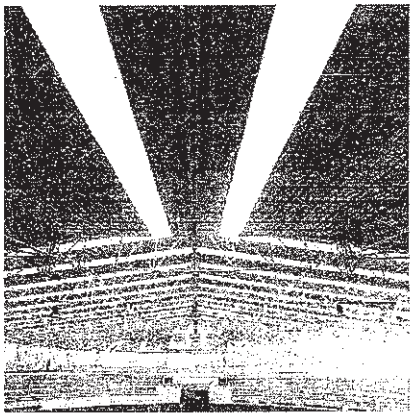

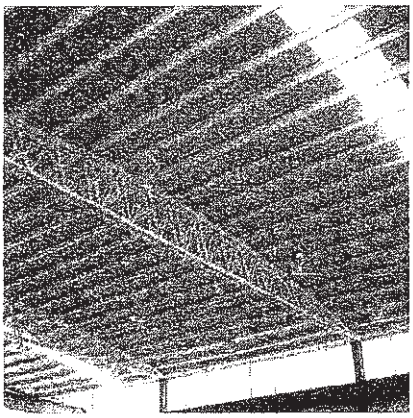

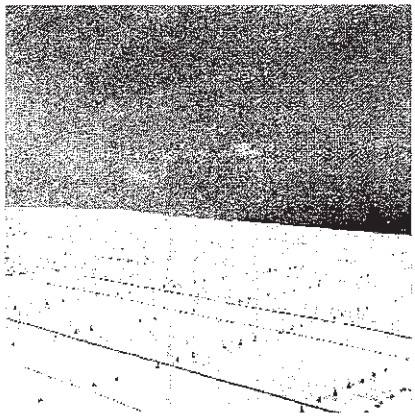

arcos®
SISTEMAS ARQUITECTONICOS

02

1995

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- RESISTENCIA AL CLIMA Y RAYOS UV
- RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
- FLEXIBILIDAD
- DURABILIDAD
- RESISTENCIA QUÍMICA
- AISLAMIENTO ACÚSTICO
- AISLAMIENTO TÉRMICO
- RESISTENCIA AL FUEGO


APLICACIONES Y USOS


- CUBIERTAS INDUSTRIALES
- TECHOS Y COBERTIZOS
- FACHADAS Y CERRAMIENTOS
- CERRAMIENTOS INDUSTRIALES Y RESIDENCIALES
- MUROS DIVISORIOS
  - GRANEROS Y ESTABLOS
  - FÁBRICAS Y BODEGAS
  - PÉRGOLAS Y CIRCULACI ONES
  - COMPLEJOS DEPORTIVOS
  - EDIFICACIONES UBICADAS EN AMBIENTES SALINOS

PROPIEDADES FÍSICAS

PROPIEDADES TÉCNICAS	UN.	TEJA ECOWALL® 10	TEJA ECOFOOF® 21	TEJA ECOWALL 27		TEJA ECOFOOF® 36		TEJA ECOROOF® 37		TEJA ECOROOF® 51
		UPVC	UPVC	UPVC	ASA UPVC	UPVC	ASA UPVC	UPVC	ASA UPVC	UPVC
Espesor	mm	1,5	1,5	2,0	1,5	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5
Longitud	m	5,9	Hasta 5,90	Hata 11.80		Hasta 11.00		Hasta 11.8		Hasta 11.80
Ancho total	m	0,82	0,89	1,13		0,92		1,07		1,27
Ancho útil	m	0,79	0,83	1,05		0,875		1,00		1,20
Peso por m2	kg/m2	3,10	3,62	3,90		4,20		4,90		5,13
Peso por metro lineal	kg/ml	2,54	3,22	4,4		3,86		5,24		6,52
Separación entre crestas	mm	79	73,5	210		216		250		300
Altura de cresta	mm	10	21	27		36		37		51
Traslapo longitudinal	cm	25,00	25,00	25,00		25,00		25,00		25,00
Traslapo lateral	cresta	1	1	1		1		1		1
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA	**w/m k**	**0,06**	**0,06**	**0,06**		**0,06**		**0,06**		**0,06**
Pendiente mín. sin traslapo	%	N/A	10	10		10		10		10
Pendiente mín. con traslapo	%	N/A	15	15		15		15		15
Voladizo máximo	cm	10,00	12,00	15,00		20,00		20,00		25,00
Radio mínimo curvatura	m	4,00	10	6,00		12		16,00		18,00
Aislamiento acústico	DB	26	26	26		22		22		22
Rango de temperatura	Desde 20°C hasta +60°C									

VENTAJA COMPARATIVA

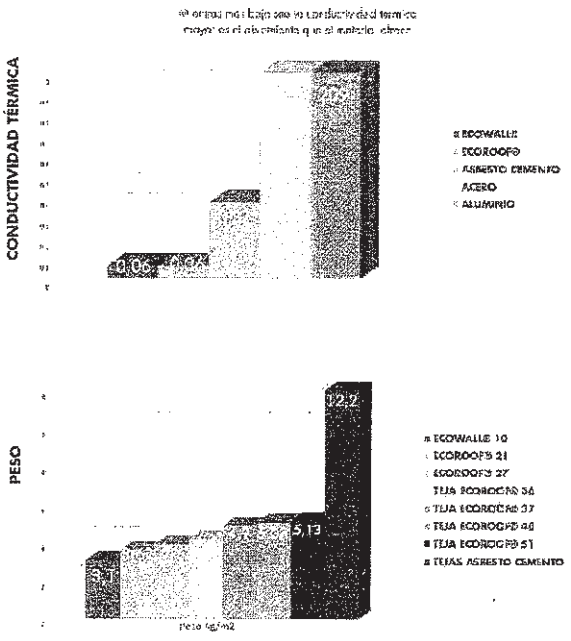

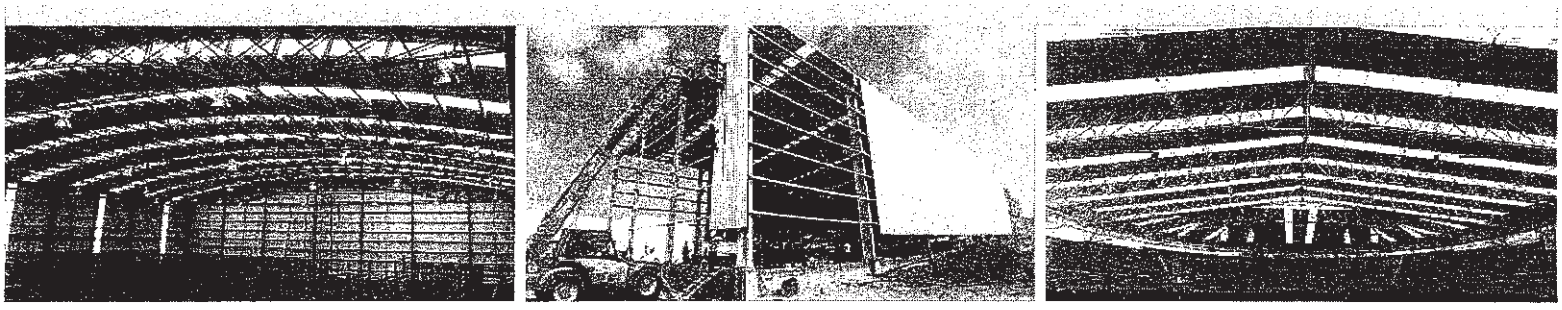


arkos®
SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS

* Esta ficha técnica está en constante actualización. Para consultar la última versión ingrese a nuestra página web www.arkos.com.co/catálogos

1796

GENERALIDADES


LÁMINA CORRUGADA ECOWALL® 10 UPVC



CE

ESPESOR (mm)	ANCHO (m)	LARGO (m)	RADIO DE CURVATURA (m)
1,5	0,82	Hasta 5,90	4,00


ECOROOF® 21 GRECA RESIDENCIAL UPVC



CE

ESPESOR (mm)	ANCHO (m)	LARGO (m)	RADIO DE CURVATURA (m)
1,5	0,89	Hasta 5,90	7,00


ECOWALL® 27 ASA - UPVC



CU CE

ESPESOR (mm)		ANCHO (m)	LARGO (m)	RADIO DE CURVATURA (m)
UPVC	ASA - UPVC			
2,0	1,5	1,13	Hasta 11,80	6,00


ECOROOF® 36 RESIDENCIAL UPVC - ASA



CU CE

ESPESOR (mm)	ANCHO (m)	LARGO (m)	RADIO DE CURVATURA (m)
2,0	0,92	Hasta 11,00	12,00


ECOROOF® 37 UPVC - ASA



CU

ESPESOR (mm)	ANCHO (m)	LARGO (m)	RADIO DE CURVATURA (m)
2,5	1,07	Hasta 11,80	16,00

ECOROOF® 51 UPVC - ASA




CU


ESPESOR (mm)	ANCHO (m)	LARGO (m)	RADIO DE CURVATURA (m)
2,5	1,27	Hasta 11,80	20,00

COLORES

Las tejas ECOROOF® se ofrecen en diversos colores. Una capa superior en resina de ingeniería (ASA), con excepcional resistencia a la intemperie, le otorga la pigmentación a las tejas. Esta capa forma parte de la fabricación misma del producto, no es sobrepuesta, lo que garantiza la estabilidad del color



ACCESORIOS



DISTANCIA ENTRE APOYOS

DISTANCIA MÁXIMA ENTRE APOYOS	CERRAMIENTO	CUBIERTA	
		PENDIENTE PLANA	PENDIENTE CURVA
ECOWALL® 10	0,80 m	N.A.	N.A.
ECOROOF® 21	1,00 m	0,80 m	1,00 m
ECOWALL® 27 2.0mm	0,90 m	0,80 m	1,00 m
ECOWALL® 27 ASA - UPVC1.5mm	0,90 m	0,60 m	0,90 m
ECOROOF®36	1,00 m	1,20 m	1,30 m
ECOROOF®36 ASA - UPVC	1,00 m	0,90 m	1,00 m
ECOROOF® 37	1,10 m	1,30 m	1,40 m
ECOROOF® 37 ASA - UPVC	1,00 m	1,00 m	1,10 m
ECOROOF® 51	1,23 m	1,60 m	1,70 m
ECOROOF® 51 ASA - UPVC	1,23 m	1,10 m	1,20 m

Las tejas ASA color requieren siempre menor distanciamiento entre correas.
Revisar cuadro de distancia entre apoyos

COMPOSICIÓN





ECOROOF®

CE IDEAL PARA CERRAMIENTOS

CU IDEAL PARA CUBIERTAS

arkos® SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS

* Esta ficha técnica está en constante actualización. Para consultar la última versión ingrese a nuestra página web www.arkos.com.co/catálogos

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

• Elija la teja para su cubierta verificando previamente la distancia máxima entre apoyos y radio de curvatura permitido, si la cubierta presenta algún tipo de geometría en especial.

• Se recomienda que en cubiertas con traslapos, la teja más corta esté apoyada en mínimo tres correas.

• Las tejas deberán ser instaladas orientando sus crestas hacia al exterior.


• Las tejas deberán ser fijadas con tornillería únicamente en su cresta, para aplicaciones en cerramientos o fachadas se fijarán en el valle de la teja.

• En su instalación las tejas no deben ser forzadas a adoptar formas irregulares como estructuras con correas no alineadas.

• No pisar directamente la teja antes, durante ni después de la instalación, utilizar para ello elementos auxiliares como planchones o escaleras.

• En la mayoría de los casos no se recomienda usar cielo raso, en caso de ser necesario es indispensable implementar una re ventilación que evite la acomulación de aire caliente. Para mayor detalle asesorarse con el departamento técnico.

• La garantía se perderá si no se siguen las indicaciones dadas.




TRASLAPOS

Las tejas ECOROOF® se aseguran empezando por la cresta que remata la cubierta, hacia la cresta que traslapa con la siguiente teja, en lo posible en sentido contrario al viento. El traslapo transversal debe ser mínimo de 25 cm



Traslapo longitudinal



Traslapo lateral

MANEJO Y MANTENIMIENTO


• Almacene las tejas bajo techo, protegidas siempre de la posición horizontal preferiblemente sobre estibas o planchones con apoyos cada 30 cms.
• Se recomienda una limpieza periódica con agua y jabones suaves mínimo cada 12 meses, seque inmediatamente. No se deben utilizar productos abrasivos o muy alcalinos, ni cepillos, estropajos y escobas.
• Las anteriores indicaciones son indispensables para mantener la vigencia de la garantía.

PERFORACIONES Y FIJACIONES

• Utilice siempre arandelas ARKOS EPDM y Capelotes; los cuales tendrán que tener una holgura de 2 a 3 mm entre la perforación y el tornillo de sujeción.

• Al inicio, al final y en los traslapos de cada teja, las fijaciones a las correas deben ser colocadas en cada una de las crestas. En las correas intermedias, las fijaciones deben ser colocadas como se indica a continuación:

ECOWALL® 10



ECOROOF® 21



ECOROOF® 27



ECOROOF® 36



ECOROOF® 37




ECOROOF® 51



FRANJAS DE ILUMINACIÓN

En nuestro portafolio de productos en policarbonato tenemos tejas ARKOS PC como el complemento traslúcido ideal, brindando la solución de franjas de iluminación en un material que garantiza alta resistencia mecánica y excelente transmisión luminosa.

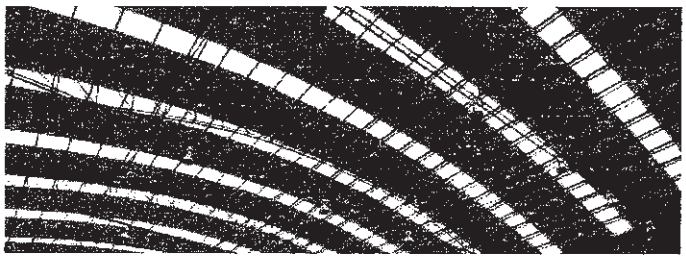

GARANTÍA

Debido a que las tejas son productos en UPVC, en su proceso de fabricación se utiliza un porcentaje de elementos reciclados que pueden presentar diferencias en tonalidad y uniformidad de color, sin que esto repercuta en sus propiedades y comportamiento físico-mecánico.

ARKOS S.A. garantiza la calidad, idoneidad, eficiencia y seguridad de los productos que suministra, siempre y cuando se cumplan los adecuados parámetros, recomendaciones y sugerencias de uso, manejo, instalación y mantenimiento informados en el contenido de las fichas técnicas elaboradas y por los asesores.

La información sobre nuestros productos es exacta en la medida de nuestro conocimiento. Sin embargo, debe considerarse solamente como una sugerencia ya que cada consumidor debe efectuar sus propios diseños, mediciones e instalación, de acuerdo con el uso específico para el que requiera los productos.

El no cumplimiento de las especificaciones de instalación, mantenimiento y uso, genera la no aplicación de la garantía.

arkos SISTEMAS ESPECIALIZADOS

DISTRIBUIDO POR

arkos CENTER

Línea de Atención al Cliente
PBX: +(57 -1) 432 2440
CEL. +(57) 311 483 10 18
(+57) 310 551 95 53

servicioalcliente@arkos.com.co
www.arkos.com.co

Encuéntrenos también en Grandes Superficies, Depósitos, Ferreterías y distribuidores autorizados en su ciudad.

Presentes en Ecuador **(ventas@arkos.com.ec)**, Panamá **(arkospanama@arkos.com.pa)** y Brasil **(arkosbrasil@arkos.com.co)**

* Esta ficha técnica está en constante actualización. Para consultar la última versión ingrese a nuestra página web www.arkos.com.co/catálogos

07201930OM1011

1718

LG Hausys

ROLLO

Heterogêneo 066




DELIGHT 2,2MM

066

1779

LG Hausys

DELIGHT 2,2MM

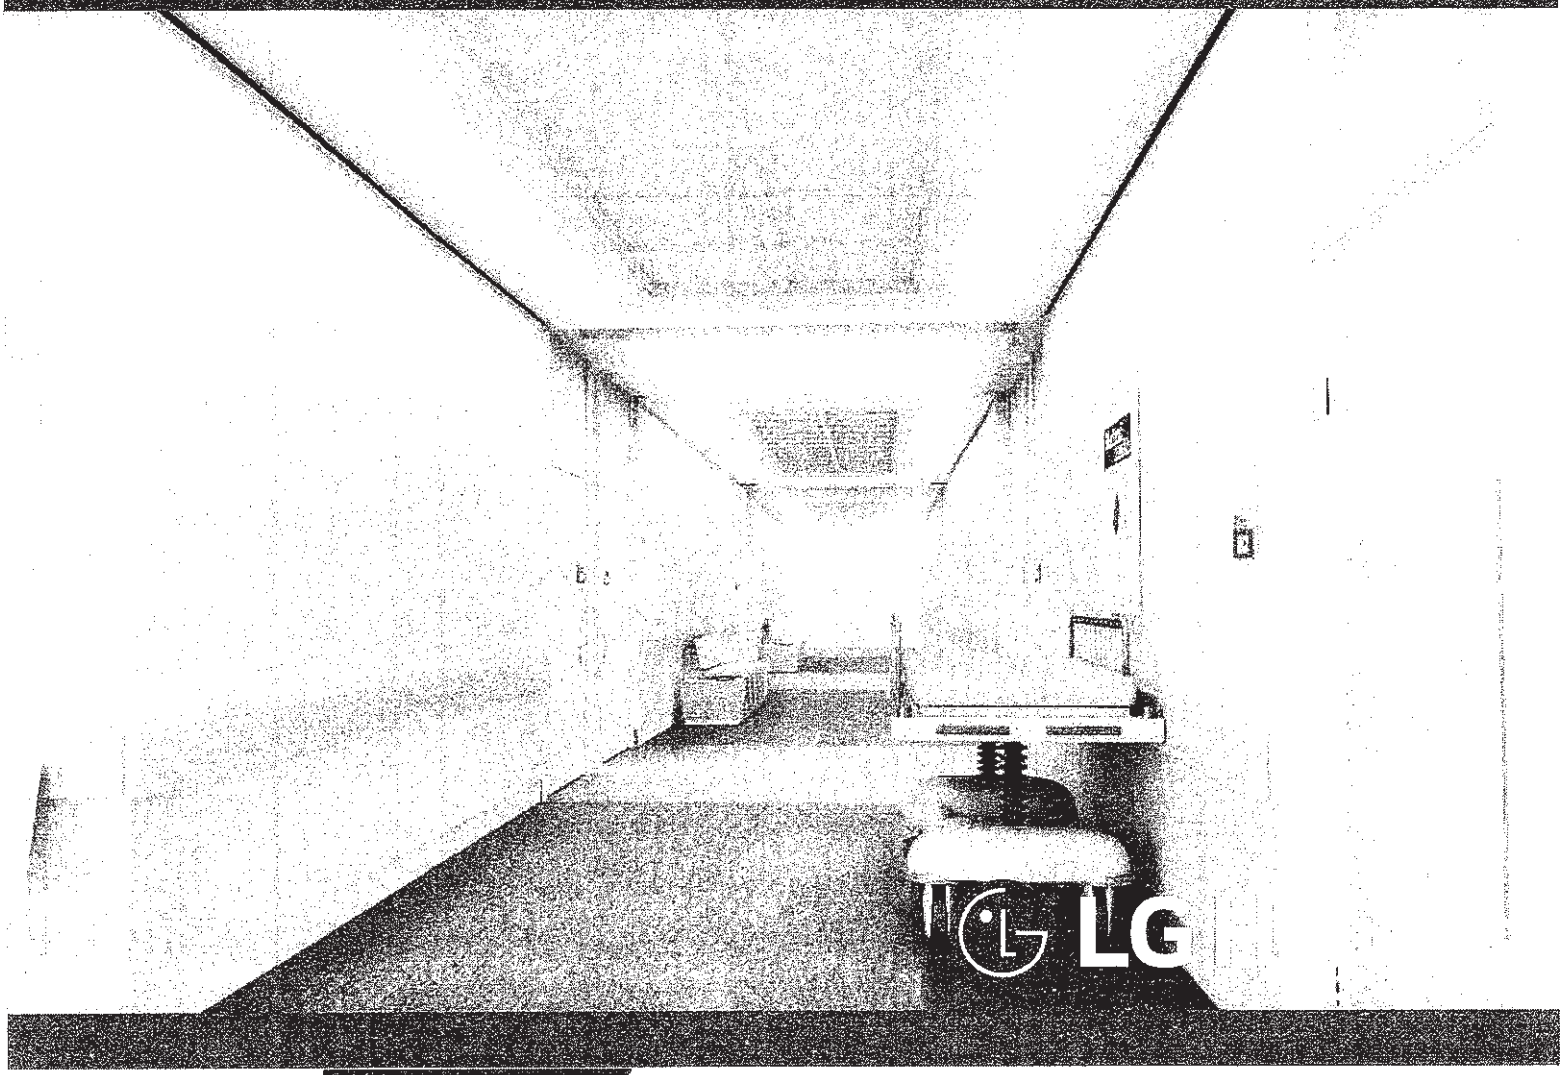

¡NUEVO!



Arena Gris Oscuro Gris Claro Azul Blanco

067

1720

LG Hausys

DELIGHT 2,2MM

Construcción



Ventajas

1. Estabilidad Dimensional Multidireccional:
La capa de fibra de vidrio garantiza que las dimensiones no cambien sin importar la variación de condiciones donde se encuentre.

2. Tratamiento Anti bacterial Nano-Silver:
No usan materiales peligrosos en su fabricación, utilizan plastificantes 100% libres de ftalato.

3. Absorción Acústica:
Posee una base espumada con una capacidad de absorción acustica de 16db tipo marlipo marmol y texturas de madera.

Características	Estándar	Delight
Tratamiento superficial		Deep Clean Plus
Diseño		Roble Heterogéneo
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
Garantía		15 Años

Nuestro piso vinílico **LG hausys** poseen apariencia de granito y mármol, de hecho te brindan una sensación unica de elegancia y frescura. Especiales para espacios hospitalarios, laboratorios, colegios, universidades y centros comerciales.





1921

Superboard

MEJORES ARQUITECTÓNICAS
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

PLACAS DE CEMENTO

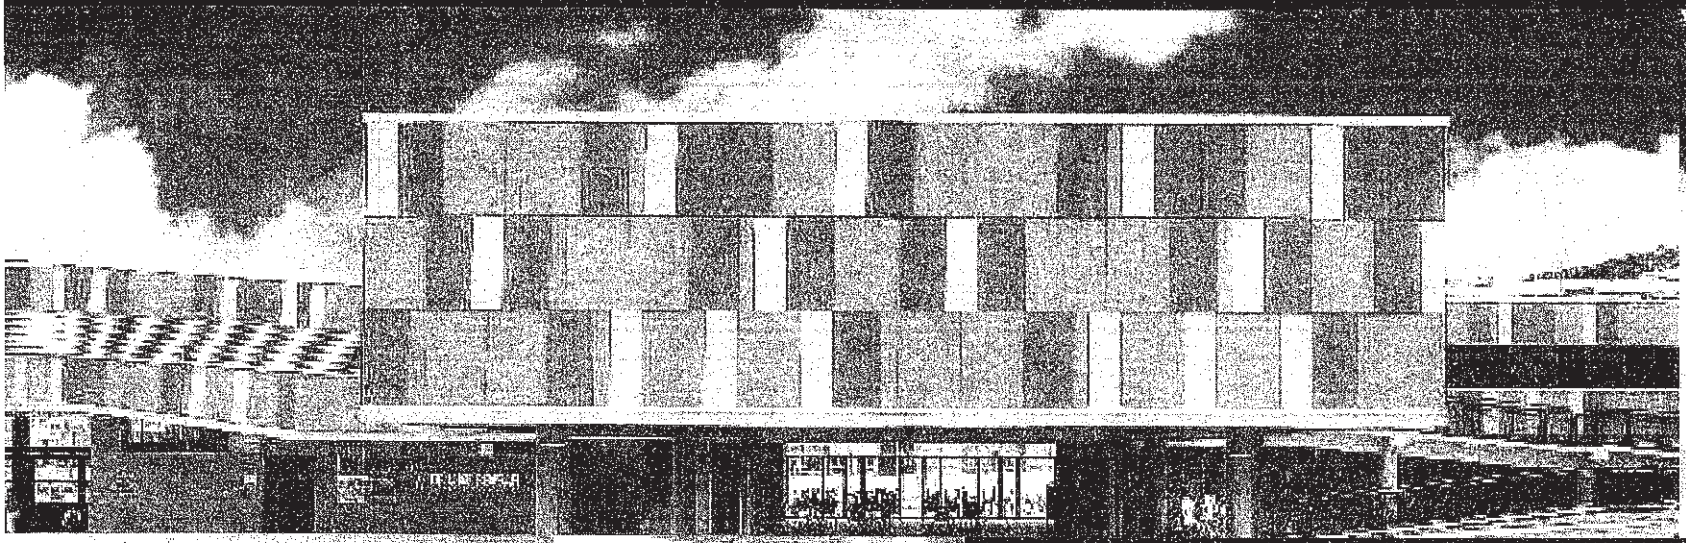

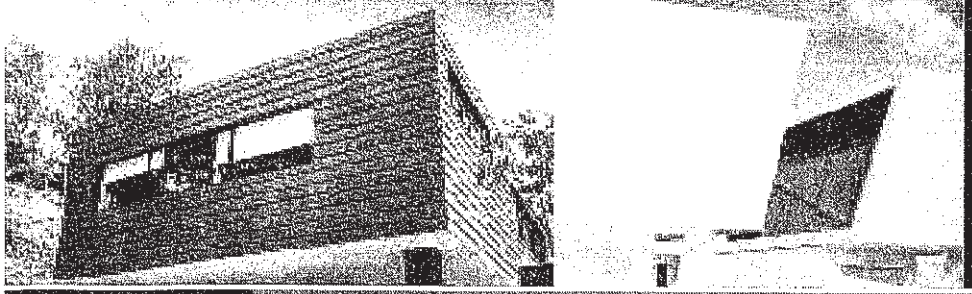


Superboard®
ESTÁNDAR

Skinco Colombia

an Etex company

1722

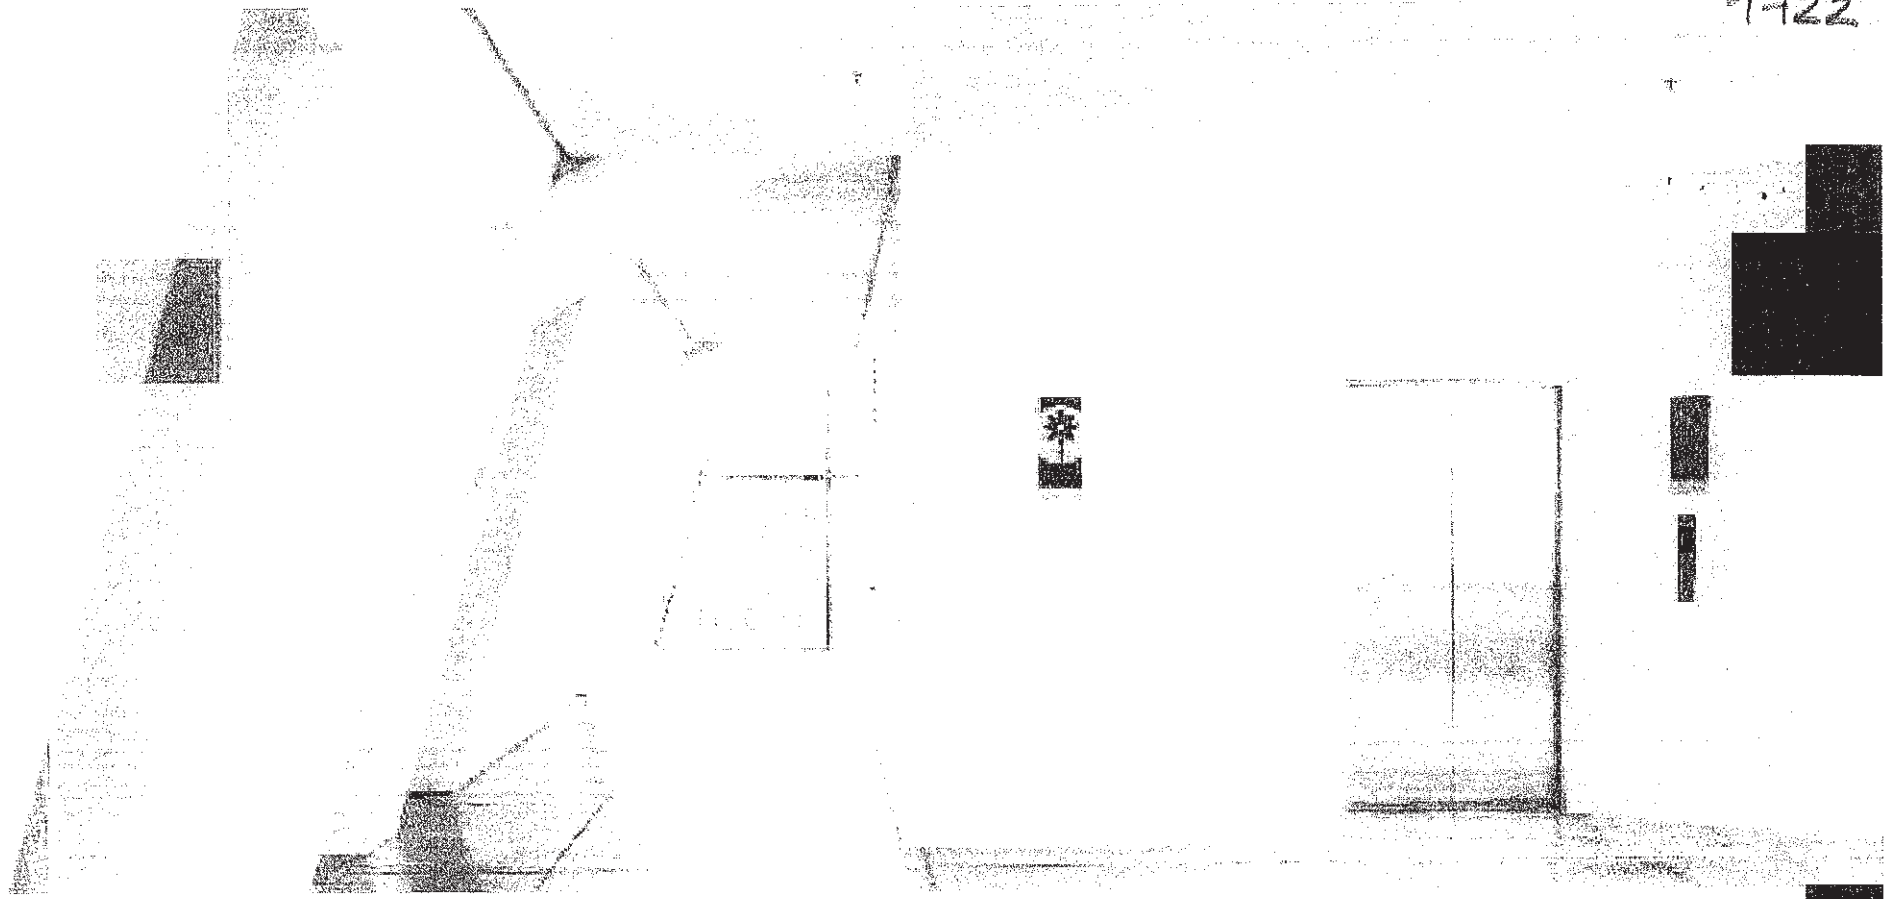

Superboard ESTÁNDAR

LA PLACA ORIGINAL, VERSÁTIL Y MULTIPROPÓSITO

Superboard® ESTÁNDAR es la placa estándar ampliamente conocida y valorada en el mercado de la construcción en seco. Superboard® ESTÁNDAR no se somete a procesos adicionales de terminación o acabado. Su inigualable desempeño y calidad dieron origen al más completo portafolio de placas.

APLICACIONES RECOMENDADAS:


Fachadas, paredes, bases para techos y cielos rasos.

1723

Superboard ESTÁNDAR

DIMENSIONES Y PROPIEDADES (VALORES PROMEDIO)

Superboard® ESTÁNDAR	
Espesores	4, 6, 8, 10 y 12 mm
Dimensiones	1220 mm x 2440 mm (tamaño estándar) Tamaños especiales bajo pedido
Tolerancias	En longitud y ancho (l): L < 1000 mm: +/- 5 mm 1000 mm < l < 1600 mm: +/- 0.5% l > 1600 mm: +/- 8 mm
	En espesor: <= 6 mm: +/- 0.6 mm > 6 mm: +/- 10%
Aplicaciones	Paredes, delorraros, recubrimientos y fachada

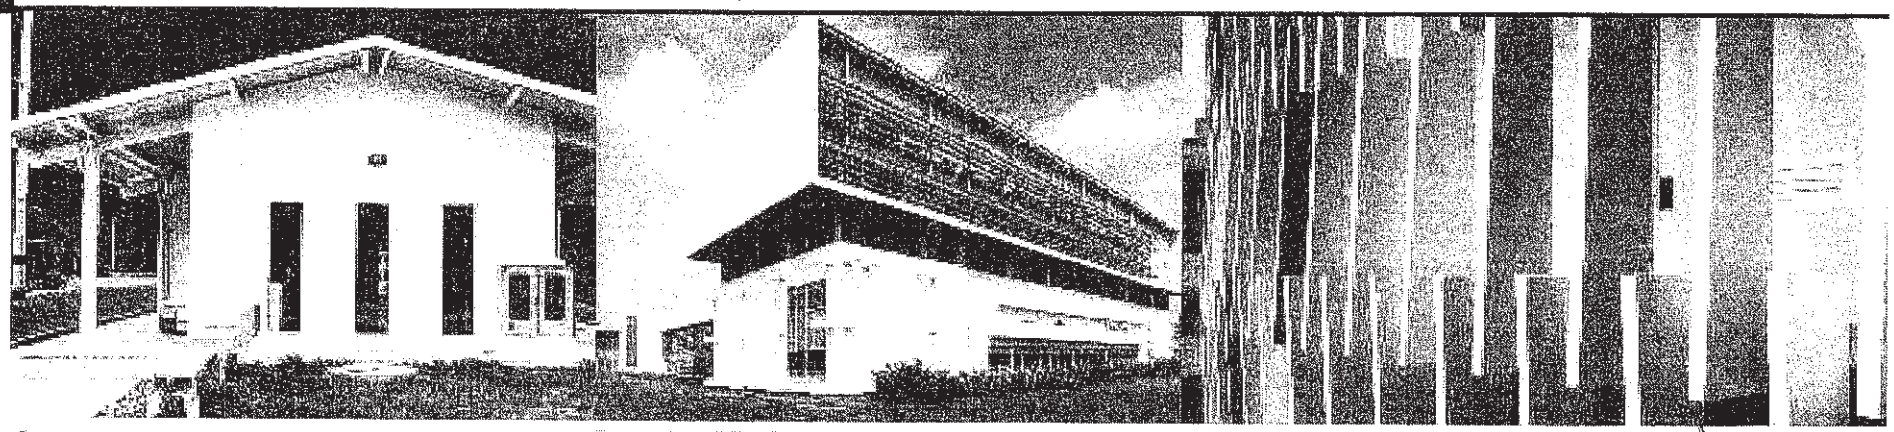

Cabañas - Hermitage
Aplicación Panel exterior
Ciudad Antigua, Antioquia


Clínica "Antigua" Comfama
Aplicación Fachada
Ciudad Colonial, Valle del Cauca

Cabañas - Centro de Servicios Antigua
Aplicación Panel exterior en Superboard® Estándar
Ciudad Antigua, Antioquia

1724

CONSTRUCCIÓN EN SECO

La construcción en seco consiste en ensamblar un soporte estructural o bastidor mediante perfiles metálicos o de madera, disponer las instalaciones auxiliares y aislantes y cerrar el conjunto utilizando placas de cemento SUPERBOARD®. De esta manera se logra una obra económica, limpia, rápida, sismoresistente, durable y reciclable.

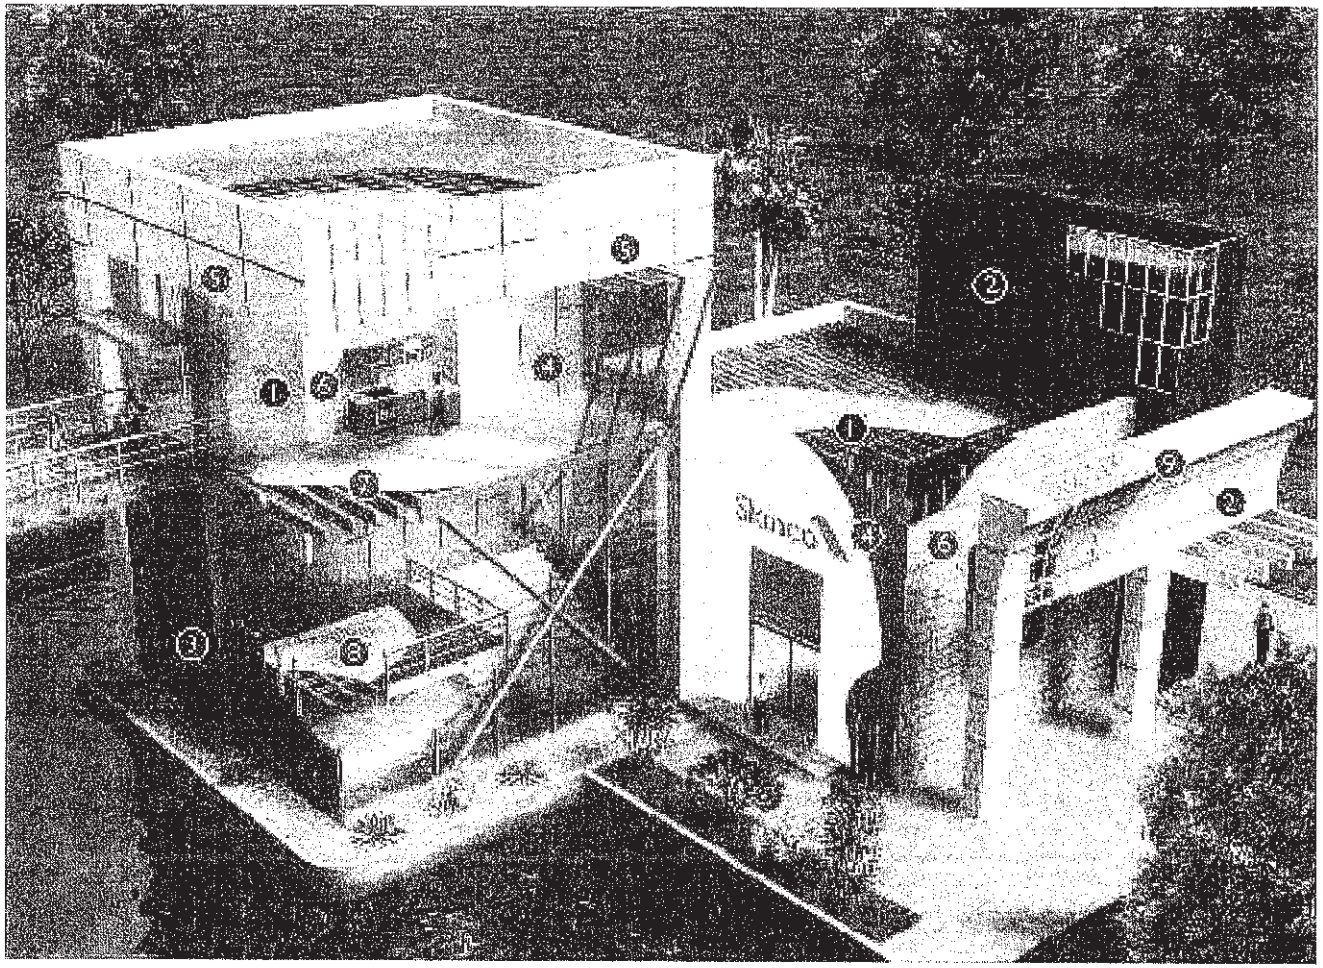

IDEAS ARQUITECTÓNICAS

1 SUPERBOARD — LA RESISTENCIA DE LA PIEZA ESTÁ ASEGURADA POR EL DISEÑO DEL EDIFICIO

2 SUPERBOARD — LA ESTRUCTURA ESTÁ PROTEGIDA ADECUADAMENTE

3 SUPERBOARD — LA FORMA ARQUITECTÓNICA ES LA PIEZA CLAVE DEL PROYECTO

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

4 SUPERBOARD — DISEÑO ADAPTABLE A DIFERENTES PROYECTOS

5 SUPERBOARD — PROGRAMACIÓN DE OBRA Y PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS

6 SUPERBOARD — PROYECTO ARQUITECTÓNICO DE CALIDAD CONSTRUCTIVA

7 SUPERBOARD — GRANTE DE GARANTÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN EN SECO

8 SUPERBOARD — GRANTE DE GARANTÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN EN SECO CON ACABADOS TÉCNICOS Y PINTURAS

9 SUPERBOARD — LA PLACA ORIGINAL NATURAL Y PARA TRATAMIENTOS

SUPERBOARD — PERFILES METÁLICOS Y TORNILLERÍA PARA ENSAMBLAJE

1725

Superboard

DIMENSIONES Y APLICACIONES	
Espesores	**Aplicaciones**
4 mm	Cielos rasos y paredes interiores clavados
6 mm	Cielos rasos, revestimientos interiores atornillados
8 mm	Paredes interiores, aleros, fachadas curvas
10 y 12 mm	Fachadas, bases para techos, formaletas
14, 17 y 20 mm	Entrepisos
Dimensiones	1220 mm x 2440 mm (tamaño estándar) 1220 mm x 3005 mm (tamaño largo)
Tolerancias	En longitud y ancho (): L =< 1000 mm: +/- 5 mm 1000 mm =< L =< 1600 mm: +/- 0.5% L > 1600 mm: +/- 8 mm
	En espesor: <= 6 mm: +/- 0.6 mm > 6 mm: +/- 10%

SUPERBOARD® es una placa de cemento fraguada en AUTOCLAVE (alta presión, humedad + alta temperatura) lo que permite a una especial selección de materias primas (mezcla homogénea de cemento reforzado, refuerzos y agregados naturales que no contengan fibras de asbesto), permitan a la placa alcanzar un inigualable nivel de estabilidad - resistencia.

SUPERBOARD® ha sido la placa líder en el mercado gracias a sus probadas características de resistencia mecánica y estabilidad dimensional lo cual le ha permitido estar presente en los proyectos más importantes desarrollados en Colombia y en los diversos países donde es comercializada.

Siniat® Colombia ha desarrollado un portafolio de placas especializadas que facilitan la instalación, mejoran el acabado y se presentan como una solución tecnológica e innovadora que da respuesta a las más diversas y exigentes requerimientos estéticos y funcionales.


RESISTENCIA A LA HUMEDAD

Por ser una placa de cemento Superboard® proporciona la máxima durabilidad y desempeño. Su estabilidad dimensional, composición excepcionalmente fuerte y resistente al agua la convierten en la mejor solución para áreas expuestas de manera constante o intermitente a la intemperie, al agua y a la humedad.



RESISTENCIA AL ABUSO

Las placas de cemento Superboard® están hechas para resistir el abuso cotidiano de impactos, asociados a los diferentes usos, a los que pudiera estar sometida gracias a la tecnología superior con las que son fabricadas.

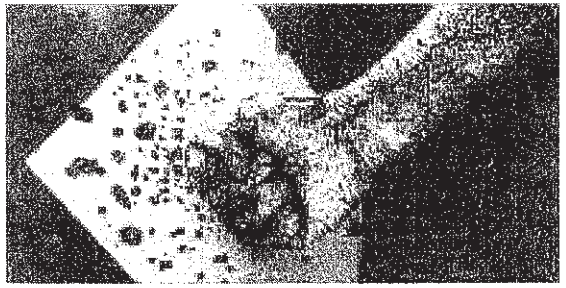


1926


Superboard

Presenta.


La Cizalla Eléctrica para **cortar** Placas de Cemento

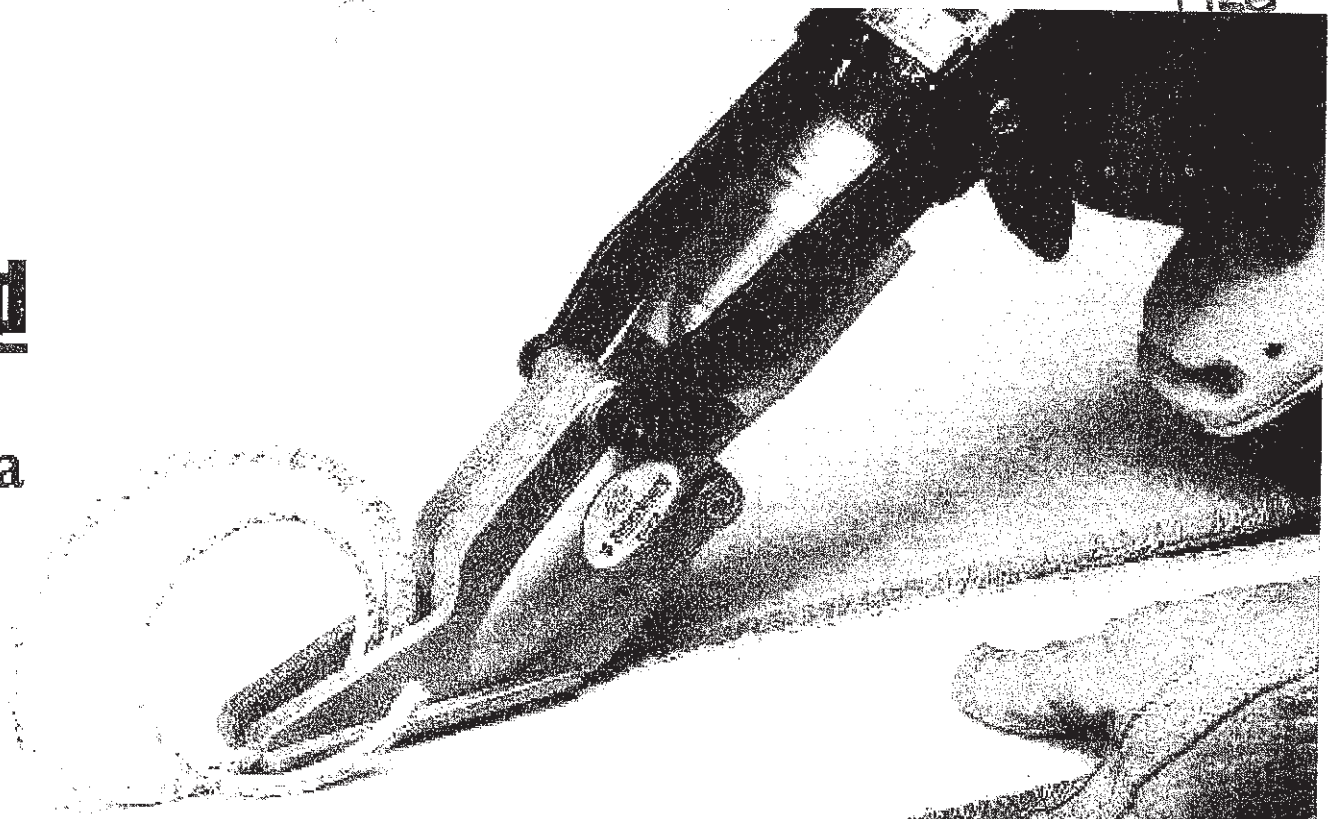

CORTES CURVOS

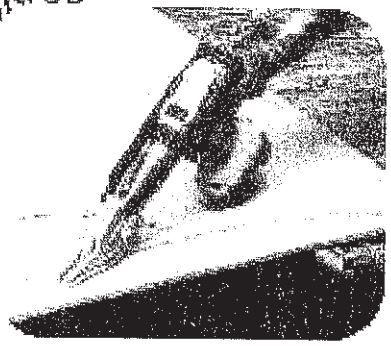

CORTES RECTOS



GENERA **MENOS POLVO EN LA OBRA.**

Corta placas Superboard de 4 a 12 mm de espesor.

Ligero y fácil de utilizar de manera segura con una sola mano.

Se *acopla fácil a su taladro*

Convierte en un instante su taladro en una herramienta profesional para cortar placas de cemento SUPERBOARD® ¡La Placa de Cemento Original!

074

1427

Skinco Colombit

Cubiertas de Asfalto

GRISES

Teja Superonda® P 10 • Teja Colombit® P7 • Teja Rural® P5

Sistemas de Proteccion Contra el Fuego

Promat

Tanques Plasticos

Acuaviva®

Pardurit®

Placas de Cemento

Superboard

Fachadas de alta gama

EQUITONE

FÁBRICA Y GERENCIA DE EXPORTACIONES
REGIONAL EJE CAFETERO
Parque Industrial Juanchito
Manizales, Caldas
Conmutador: (57)(6) 874 7747
Fax (57)(6) 874 5933 / 874 7526
skinco@skinco.co

GERENCIA COMERCIAL
REGIONAL ORIENTE
Av Cra 19 No. 120-71 Of 506
Bogotá D.C., Cundinamarca
PBX (57)(1) 366 3600
Fax (57)(1) 366 2913
skinco.co@skinco.co

REGIONAL CENTRO
Carrera 50 No. 25-119 Autopista Sur
Medellín, Antioquia
Teléfonos (57)(4) 351 6568 / 266 7107
Fax (57)(4) 351 3600
skincomed@skinco.co

REGIONAL NORTE
Vía 40 No. 85-470 Bodega No. 13
Barranquilla, Atlántico
Teléfono (57)(5) 377 3328
skincobaq@skinco.co

REGIONAL OCCIDENTE
Carrera 100 No. 5-169 Of. 312
Ciudadela Comercial Unicentro
Oficinas del Oeste
Cali, Valle
Teléfonos (57)(2) 524 4606
Fax (57)(2) 316 9764
skincocal@skinco.co

Línea gratuita de Asistencia Técnica 01 (800) 0966200

www.skinco.co

ISO 14001 ISO 9001 OHSAS 18001

an etex company

1728

Indicadores contrato N° COP 328 – 2019

Mes	Año	Gastos	Presupuesto	%	Aprovechados	Materiales usados (Ton)	Materiales usados (Ton)	EFICACIA	RCD generado mes (m3)	RCD generado mes (Ton)	RCD estimado mes (m3)	RCD estimado mes (Ton)	EFECTIVIDAD
Abril	2020	$ -	$ 2.704.442	0%	0	12,42	15,43	0,0%	0	0	2,43	2,25	0%
Febrero	2020	$ 1.325.000	$ 2.704.442	49%	0	83,55	243,61	0,0%	23,7	38,4	2,43	2,25	1707%
Marzo	2020	$ -	$ 2.704.442	0%	0	-	-	#¡DIV/0!	0		2,43	2,25	0%
Abril	2020	$ -	$ 2.704.442	0%	0	-	-	#¡DIV/0!	0		2,43	2,25	0%
Mayo	2020	$ -	$ 2.704.442	0%	0	-	-	#¡DIV/0!	0		2,43	2,25	0%
Junio	2020	$ -	$ 2.704.442	0%	0	-	-	#¡DIV/0!	0		2,43	2,25	0%
		$ 1.325.000	$ 16.226.651			95,97	259,04		23,7		14,58	13,50	

						Cantidades/t en Ton
Valor pagado por gestión de RCD	$ 16.226.651,00	$				
Materiales proyectados a usar en obra	87,39	m3	250,07	Ton	14,57	41,68
RCD proyectado a generar	14,55	m3	13,48	Ton	2,43	2,25
25% del total de materiales	21,8475	m3	62,5175	Ton		

036

036

1929

ANEXO 2. FORMATO DE SEGUIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RCD EN LA OBRA

CONTRATO DE OBRA LOCALIDAD DE TUNJUELITO No. 173 DE 2010
"[illegible] DE LOS DIFERENTES PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO"
PIN# 16370

			1	2	3				4	5 Acumulado					6 Mes de Reporte FEBRERO				
			Densidad (Ton/m3)	Cantidad generada (Ton)	Cantidad generada (m3)	Cantidad producida de RCD a reutilizar (m3)	Aprovechamiento materiales reutilizados (1)			Lugar de disposición final (2)	Volumen Total de materiales de construcción usados en obra (TON)	Volumen Total de materiales de construcción usados en obra (m3) (4)	Cantidad real generada (TON)	Cantidad real generada (m3)	Justificación (3)	Volumen Total de materiales de construcción usados en obra (TON)	Volumen Total de materiales de construcción usados en obra (m3)	Cantidad real generada (TON)	Cantidad real generada (m3)	Justificación (3)
							Reutilizados en obra	Reciclados												
RCD Pétreos	Concretos, cerámicos, ladrillos, arenas, gravas, cantos o fragmentos de roca, baldosines, morteros, asfaltos y materiales inertes		1,40	-	-														
RCD No Pétreos	Plásticos, PVC		0,70	-	-														
	Maderas		0,70	-	-														
	Cartón, Papel		0,70	-	-														
	Vidrios		0,70	-	-														
	Otros		0,70	-	-														
Residuos de Cespedón	Coberturas Vegetales		1,40	-	-														
Residuos No Finos expansivos y Residuos Finos expantivos	Tierras, Arcillas (caolín), limos y Residuos inertes poco o no plásticos y expansivos que sobrepasen el tamiz #200 de granulometría. Arcillas (caolín), limos y Residuos inertes poco o no plásticos y expansivos que sobrepasen el tamiz #200 de granulometría		1,70	-	-	-	X			Maquinas amarillas								25,70	21,00	Material de excavación llevado a Maquinas amarillas
	Concretos, cerámicos, ladrillos, arenas, gravas, cantos o fragmentos de roca, baldosines, morteros, asfaltos y materiales inertes, prefabricados	Materiales: Placa de contrapiso en concreto 0.10 y sardineles en concreto 0,10, Sanitarios línea infantil y Piso en gres 10x10, Lamina de Fibrocemento de 20 mm RCD: Demolición de enchape y Sanitarios línea infantil	1,65	13,82	22,78	0,68	1,11				1,93	1,17				20,86	12,65			Laminas de fibrocemento superboard
	Plásticos, PVC	Materiales: Tubería PVC 4", cubierta ecoroof, Piso vinílico 2 mm en rollo y mediacañas pvc RCD: Retiro de piso vinílico existente y desmonte de guardaescobas	0,70	26,95	16,83	11,20	7,83									16,83	26,95			
	Maderas		0,70	-	-													1,11	1,87	
	Cartón, Papel		0,70	-	-															
	Vidrios		0,70	-	-															
	Otros	Cielorraso superboard y estructura; cerramiento de obra	0,70	16,80	11,74		-									11,74	16,80			
	Acero, Hierro, cobre, Aluminio, estaño y zinc	Malla electrosoldada, tubería conduit 1" y estructura metálica de cubierta	7,31	26,13	190,95		-									190,95	26,13			
	Policarbreno, cartón-yeso (drywall), llantas usadas		1,20		-		-													
	Desechos de productos, químicos, emulsiones, alquitrán, pinturas, disolventes orgánicos, aceites, asfaltos, resinas, plastificantes, tintas, betunes, barnices, tejas de asbesto, escorias, plomo, cenizas volantes, luminarias, desechos explosivos y los residuos o desechos incluidos en el anexo 1 y Anexo II o que presenten las características de peligrosidad descritas en el Anexo III del Decreto 4741 de 2005	Pintura Koraza, Pintura en esmalte y Base vinílica pintura exterior	1,20	1,02	1,22		-				13,50	11,25				1,22	1,02	8,03	8,03	MATERIALES: Wahs Primer (adhere para afirmar pintura) Y PINTURA 1 EU 1 RCD: Bolsas de cemento
	Materiales que no pertenecen a grupos anteriores	Materiales y RCD: Lamparas panel led 170x30 y policarbonato	1,70	2,67	4,54	2,67	4,54											1,36	0,80	Materiales sobrantes de obra
TOTAL				87,10	260,07	14,55	13,40	-	-	-	15,43	12,42	-	-	-	243,61	83,55	38,40	23,70	

1930


ANEXO 2. FORMATO DE SEGUIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RCD EN LA OBRA

CONTRATO DE OBRA LOCALIDAD DE TUNJUELITO No.173 DE 2019
OBJETO:"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LOS DIFERENTES PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO"
PIN: _19379__

				1	2	3		4	5 Acumulado					6 Flete de Reporte ENERO				
			Densidad (Ton/m3)*	Volumen total de [illegible] (m3)	Cantidad proyectada de RCD a [illegible] (m3)	Aprovechamiento o tratamiento (1)		Lugar de disposición final	Volumen Total de [illegible] (Ton)	Volumen Total de [illegible] (m3) [4]	Cantidad real generada (Ton)	Cantidad real generada (m3)	Justificación (2)	Volumen Total de materiales de construcción usado en obra (Ton)	Volumen Total de materiales de construcción usado en obra (m3)	Cantidad real generada (Ton)	Cantidad real generada (m3)	Justificación (2)
RCD Pétreos	Concretos, ceramicas, ladrillos, arenas, gravas, cantos o fragmentos de roca, baldosines, morteros, asfaltos y materiales inertes		1,40		-													
RCD No Pétreos	Plasticos, PVC		0,70		-													
	Maderas		0,70		-													
	Cartón, Papel		0,70		-													
	Vidrio		0,70		-													
	Otros		0,70		-													
Residuos de Cespedón	Coberturas Vegetales		1,40		-													
Residuos No Finos expansivos y Residuos Finos expansivos	Tierras, Arcillas (caolin), limos y Residuos inertes poco o no plásticos y expansivos que sobrepasan el tamiz #200 de granulometria. Arcillas (caolin), limos y Residuos inertes poco o no plásticos y expansivos que sobrepasan el tamiz #200 de granulometria		1,70		-													
	Concretos, ceramicos, ladrillos, arenas, gravas, cantos o fragmentos de roca, baldosines, morteros, asfaltos y materiales inertes, prefabricados	Materiales: Placa de contrapiso en concreto 0.10 y andenes en concreto 0,10, Sanitarios linea infantil y Piso en gres 10x10, Lamina de Fibrocemento de 20 mm RCD: Demolición de anclrape y Sanitarios linea infantil	1,65	13,82	22,78	0,68	1,11							1,93	1,17			
	Plasticos, PVC	Materiales: Tuberia PVC 4", cubierta ecoroof, Piso vinilico 2 tras en rollo y mediacañas pvc RCD: Retiro de piso vinilico existente y desmonte de guardaescobas	0,70	26,95	18,83	11,20	7,83											
	Maderas		0,70	-	-													
	Cartón, Papel		0,70	-	-													
	Vidrio		0,70	-	-													
	Otros	Coloraso superboard y estructura; cerramiento de obra	0,70	16,80	11,74		-											
	Acero, Hierro, cobre, Aluminio, estaño y zinc	Malla electrosoldada, tuberia conduit 1" y estructura metalia de cubierta	7,31	26,13	190,95		-											
	Poliestireno, cartón-yeso (drywall), lanas usadas		1,20		-		-											
	Desechos de productos, químicos, emulsiones, disolución, pinturas, disolventes orgánicos, aceites, asfaltos, resinas, plastificantes, lacas, betunes, barnices, tejas de asbesto, escorias, plomo, cenizas volantes, laminarias, desechos explosivos y los residuos o desechos incluidos en el anexo I y Anexo II o que posentan las caracteristicas de peligrosidad descritas en el Anexo III del Decreto 4741 de 2005	Pintura Koraza, Pintura en esmalte y Base vinilica pintura exterior	1,20	1,02	1,22		-							13,58	11,15			
	Materiales que no pertenecen a grupos anteriores	Materiales y RCD: Lamparas panel led 120x30 y pulverizador	1,70	2,67	4,54	2,67	4,54											
TOTAL				87,39	250,07	14,55	13,48	-	-	-	-	-	-	15,43	12,42			

1939


000 079

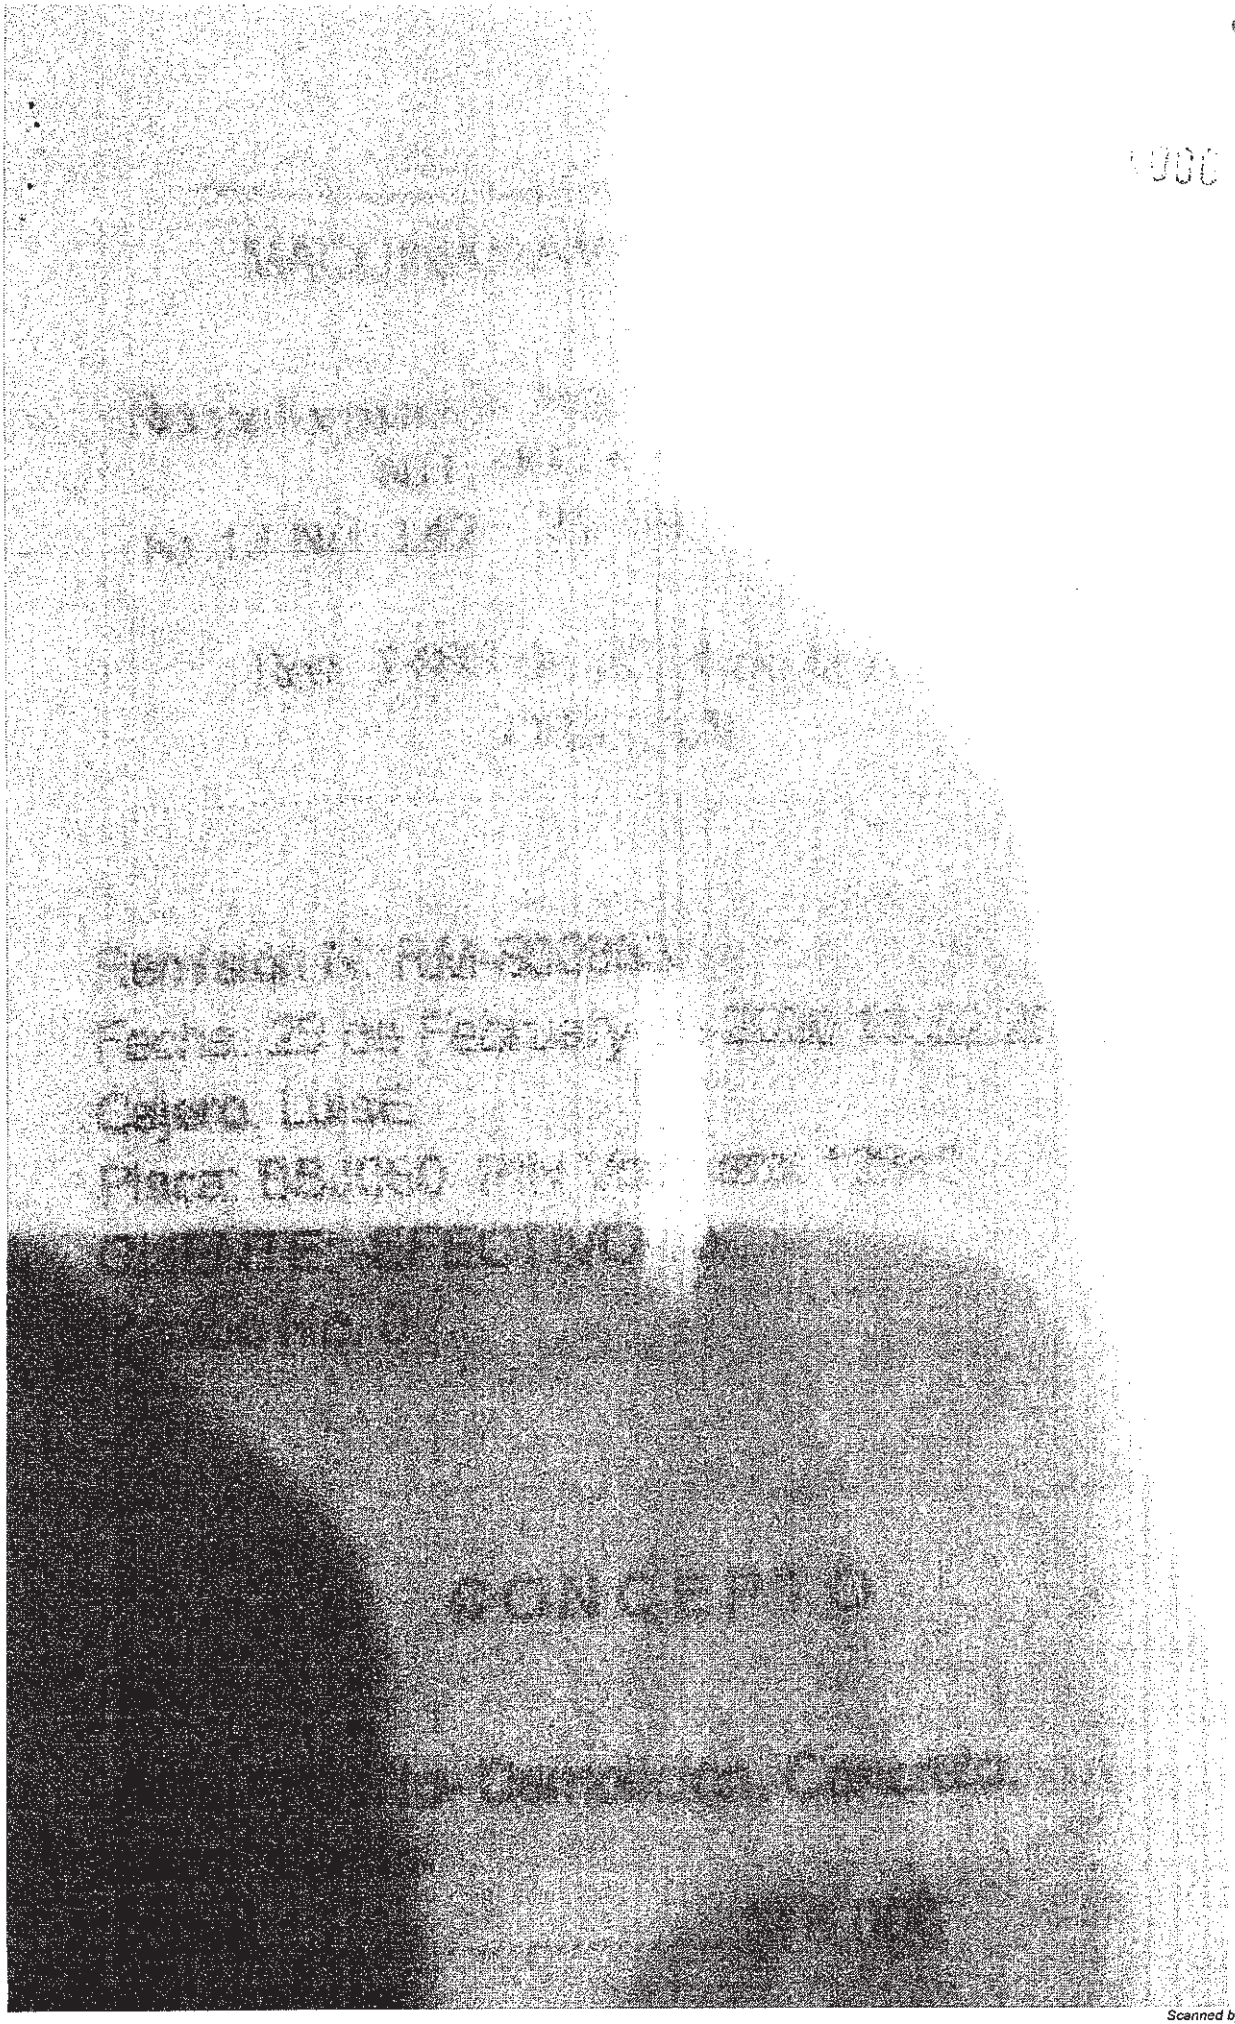

Scanned by TapScanner

1932

080

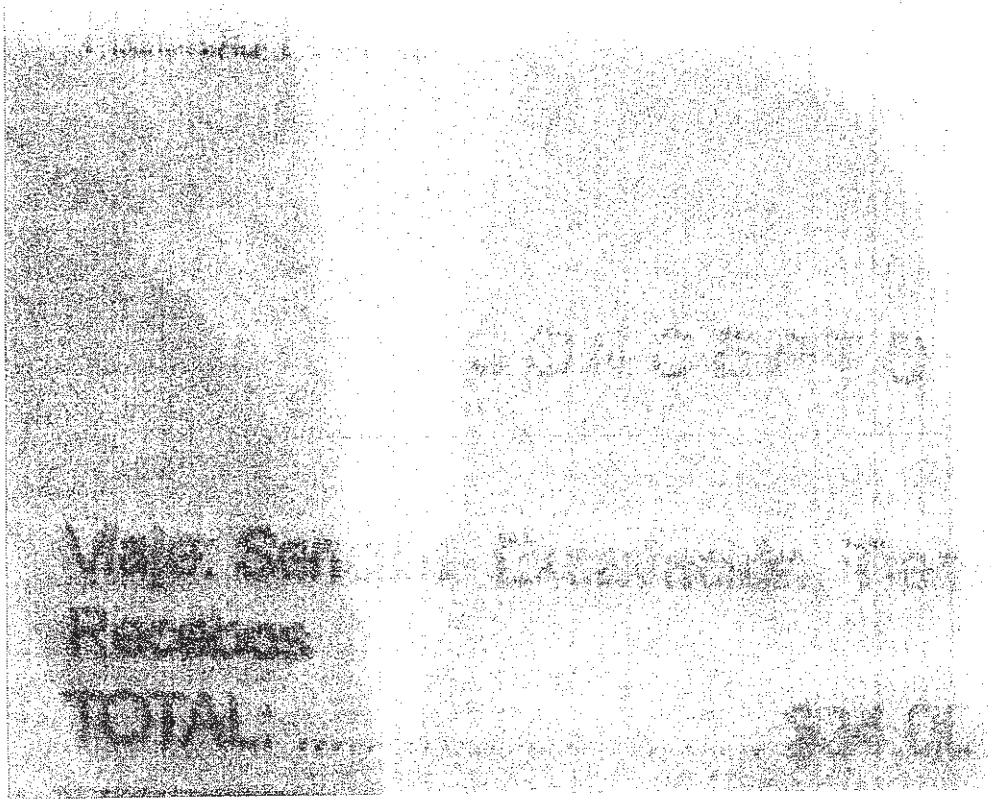

080

Scanned by TapScanner

1233

001: 081

Scanned by TapScanner


1934


082

Formato Anexo 3. Informe de aprovechamiento in situ


Nombre del proyecto: **Mantenimiento Locativo jardines Kennedy** PIN: 18379

1. Registro fotográfico del "antes" del sitio que va a ser usado para la reutilización, con referencia de la zona





2. Esquema del área a usar para la reutilización de los RCD´s

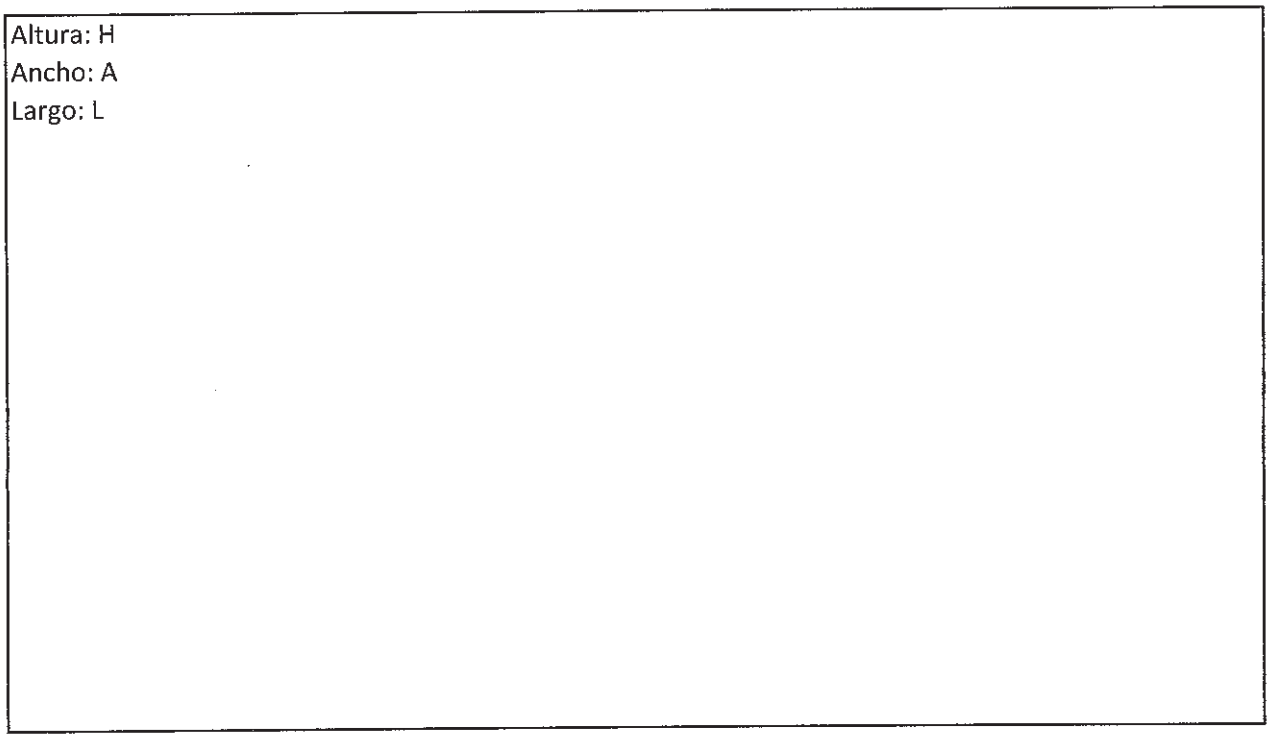

3. Tipo de material a emplear en la reutilización

N.A


082


1235

4. Descripción del proceso a realizar: definir origen del residuo y el coeficiente de compactación del material


N.A


5. Registro fotográfico durante la reutilización





6. Registro fotográfico de la finalización del proceso de reutilización





7. Volumen total de la reutilización: 0 m3
8. Duración del proceso: **ene-20**
9. Área recuperada: 0 m2
10. Valor del % de reutilización, respecto al total de material utilizado para la construcción de la obra: 0 %
11.. Comentarios, conclusiones y/o justificación por no hacer reutilización

Para el mes de Enero no se realiza reutilización

Firma de Representante Legal
Ever José Salgado Salgado

Formato Anexo 3. Informe de aprovechamiento in situ

Nombre del proyecto: **Mantenimiento Locativo jardines Kennedy** PIN: 18379

1. Registro fotográfico del "antes" del sitio que va a ser usado para la reutilización, con referencia de la zona

2. Esquema del área a usar para la reutilización de los RCD´s

Altura: H Ancho: A Largo: L

3. Tipo de material a emplear en la reutilización

N.A

9737

4. Descripción del proceso a realizar: definir origen del residuo y el coeficiente de compactación del material

000085

N.A

5. Registro fotográfico durante la reutilización

6. Registro fotográfico de la finalización del proceso de reutilización

7. Volumen total de la reutilización: 0 m3
8. Duración del proceso: **feb-20**
9. Área recuperada: 0 m2
10. Valor del % de reutilización, respecto al total de material utilizado para la construcción de la obra: 0 %
11.. Comentarios, conclusiones y/o justificación por no hacer reutilización

Para el mes de Febrero no se realiza reutilización

Firma de Representante Legal
Ever José Salgado Salgado

1738

GEAGOR BALER INGENIERÍA

Bogotá D.C., 16 de Marzo de 2020

Señores:
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
Ing. Leonardo Alexander RodríguezLópez
Alcalde local de Kennedy
Transversal 78 K No. 41 A-04 Sur
Bogotá D.C

GEBAL-KEN-081

Ref. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 329-2019.
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA ADECUACIÓN DE CINCO (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PARA LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

Asunto: validación Informe SOCIAL mensual N°2.

Que se recibió el día 16 de Marzo el segundo informe Social Mensual de Obra de fecha 17 de febrero de 2020 al 16 de Marzo de 2020 del contrato de obra N° 328-2019, el cual fue revisado y aprobado, ya que cumple con lo establecido en el Plan de Gestión social ejecutado por la firma contratista.

Cordialmente,

SONIA EDITH ORDOÑEZ REYES
Residente Social Interventoría
CONSORCIO GEBAL S.A.S.

Transversal 19 A No. 98 – 28 oficina 502 - Teléfono 703 17 26
E – mail: gerencia@civingingenieria.com / gerencia@geagor.com
Bogotá D.C. - Colombia

1939

086

EVER JOSE SALGADO SALGADO
NIT: 7.917.558-1

INFORME SOCIAL MENSUAL DE OBRA Nº 2

17 de febrero de 2020 – 16 de marzo de 2020

CONTRATO DE OBRA No 328-2019

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA ADECUAR Y/O REPARAR LA ESTRUCTURA FISICA DE CINCO (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO

INTERVENTORIA
CONSORCIO GEBAL

Elaboró	Revisó y Aprobó	Fecha
T.S Alexandra Díaz Alexandra Díaz M.	T.S. Sonia Edith Ordoñez	17/03/2020

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESARROLLO DE ACTIVIDADES MENSUALES DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 3
2.1 PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN: 4
2.2 Reunión inicio de obra 4
2.3 Reunión Extraordinaria 4
2.2 Subprograma de divulgación 4
2.2.1 Vallas Informativa punto de atención 5
2.2.2 Levantamiento de actas de vecindad de inicio 5
2.3 PROGRAMA DE ATENCION AL CIUDADANO (Atención de quejas y reclamos): 6
2.4 PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO 6
2.5 PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD 6

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe describe las actividades desarrolladas por el área de gestión social de la firma contratista, durante el periodo comprendido entre el 17 de febrero de 2020 al 16 de marzo de 2020. Para la ejecución del contrato de obra no 328-2019 cuyo objeto es "contratar mediante el sistema de precios fijos unitarios y a monto agotable las actividades para adecuar y/o reparar la estructura física de cinco (5) jardines infantiles de la secretaria distrital de integración social para la atención de la primera infancia en la localidad de Kennedy, según los estudios previos, anexo técnico, pliego de condiciones y demás documentos que hacen parte integral del proceso

Para ello en el presente informe tendrá en cuenta el desarrollo los programas y subprogramas que componen el plan de gestión social elaborado por la firma contratista Arq. Ever José Salgado Salgado. El cual fue presentado el día 17 de enero de 2020, a lo cual la interventoría a la fecha no ha dado respuesta, Este documento denominado PGS, será la base de la ejecución de las actividades sociales que se llevarán a cabo para la ejecución del presente contrato.

Entre los programas a desarrollar se encuentran:

1. Programa de información y divulgación a la comunidad.
2. Programa de atención al ciudadano
3. Programa de participación ciudadana
4. Programa de generación de empleo.
5. Programa de sostenibilidad.

2. DESARROLLO DE ACTIVIDADES MENSUALES DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

El área de gestión social, realiza la correspondiente elaboración y ejecución al cumplimiento del PGS el cual es ejecutado por la firma contratista para el desarrollo de las actividades sociales antes, durante y posterior la ejecución de obra objeto de intervención.

En cuanto a los programas inmersos en el plan de gestión social describo las siguientes actividades desarrolladas por el contratista, supervisadas, verificadas y aprobadas por la interventoría en el área de gestión social:

2.1 PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN:

Mediante este programa de información y divulgación la firma contratista, busca establecer relaciones entre los actores sociales influyentes en el contexto de la ejecución del contrato para tal fin se llevan a cabo las siguientes actividades las cuales fueron supervisadas y aprobadas por la interventoría:

2.2 Reunión inicio de obra

La firma contratista programó y ejecutó la reunión de inicio de obra para el jardín infantil Metro el día 03 de marzo del presente año, a lo cual se invitó a los entes distritales y representantes de la comunidad, con el fin de socializar las actividades a desarrollar bajo la ejecución del contrato. *(Ver anexo 1: acta de reunión).*






2.3 Reunión Extraordinaria

Durante este periodo no se llevó a cabo ninguna reunión extraordinaria

2.2 Subprograma de divulgación

El subprograma de divulgación se encuentra compuesto por las piezas informativas que describen aspectos específicos del proyecto y son muy representativas para la obra en ejecución, la firma contratista elaboró las siguientes piezas informativas:

Durante el presente periodo la firma contratista elaboró y entrego el comunicado N° 002, desde el área de gestión social, el cual tuvo como fin divulgar la reunión de inicio de obra. De igual manera realizó la distribución de 200 volantes los cuales fueron entregados a los padres de los niños y niñas del Jardín Infantil Metro, con el fin de hacer extensiva la participación de la comunidad en general de la ejecución del contrato de obra. *(Ver anexo 2: Volante y carta de invitación).*

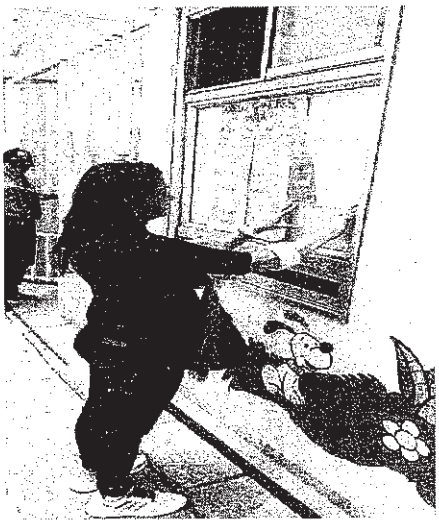



2.2.1 Vallas Informativa punto de atención

La firma contratista realizó la propuesta de la valla informativa del Punto de atención al ciudadano (PAC) el cual a la fecha se encuentra pendiente para su aprobación por parte de la alcaldía local e interventoría

2.2.2 Levantamiento de actas de vecindad de inicio

El levantamiento de las actas de vecindad es una actividad indispensable para el desarrollo del proyecto, ya que este será el soporte fundamental en caso de presentarse alguna reclamación por parte de la comunidad.

Durante el tiempo de ejecución del contrato se llevó a cabo la ejecución del acta de vecindad del JI La Metro. (*Ver anexo 3: acta de vecindad J.I Metro)*

2.3 PROGRAMA DE ATENCION AL CIUDADANO (Atención de quejas y reclamos):

2.3.1 Instalación Punto de atención al Ciudadano- PAC

De acuerdo a los lineamientos del contrato se debió implementar en el punto de atención a la comunidad el cual a la fecha tiene los elementos, el cual se encuentra ubicado en el campamento donde se desarrolla la construcción, con un horario de atención los días Miércoles de 08:00 a.m. a 12:00m; y con línea telefónica 3229013545, y correo electrónico: atencionobrassocial2019@gmial.com

2.4 PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO

La firma contratista informa que recepcionó 05 hojas de vida durante este mes, se reportan 35 personas que fueron contratadas durante el presente informe quienes realizan actividades específicas.

Para dar cumplimiento a los lineamientos de contratación del personal MONC y de acuerdo a los pliegos contractuales se cuenta con 13 personas residentes de la localidad de Kennedy, quienes hacen parte actualmente del equipo de trabajo con el fin de dar cumplimiento al 100% de mano de obra no calificada (*Ver anexo 4: listado de personal de obra).*

2.5 PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD

Se hace entrega de los correspondientes documentos sociales contemplados en el Plan de gestión social.

Se realiza documentos ejecutivos de las actividades sociales a la fecha.

Se realiza acompañamiento a las actividades técnicas (comité técnico), ambientales y SISO

T.S: ALEXANDRA DIAZ NUVAN
RESIDENTE SOCIAL

Anexo 1:
Acta de reunión y listado de asistencia

1746

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Alcaldía Local de Kennedy

093

ACTA DE REUINIÓN No.

ASUNTO Reunión Inicio de obra. J-1 Metro.

Fecha: 03-Marzo-2020	Hoja: De:
Dirección: Kra. 88c # 43-53 sur Colegio las Margaritas	
Hora de iniciación: 7:30	Hora de finalización: 9:45 AM

DESARROLLO:

Se inicia la reunión siendo las 7:30 am con los asistentes invitados a la reunión.

la profesional social Johana Torres, informa a la comunidad el proceso que se realizará para el mantenimiento que se llevará a cabo durante el contrato de obra.

Posteriormente la profesional social Alexandra Díaz informa a la comunidad el objeto contractual, beneficios, datos generales, participación de mano de obra no calificada, recomendaciones.

El arq. Alfonso Reyes realiza la información del área técnica y las actividades a realizar en el Jardín Infantil Metro.

Se informa a la comunidad que el mantenimiento se realizará aproximadamente 2 meses de duración.

La profesional Johana Torres, informa a la comunidad asistente que de acuerdo a los protocolos de la Secretaría Distrital de Integración Social los niños y niñas, serán trasladados provicionalmente al Jardín Infantil la cometa que queda ubicado en el CDC de Lago timiza el cual a la fecha se encuentra en mantenimiento y adecuación con el fin de realizar el traslado correspondiente.

Los niños y niñas que serán trasladados se realizará en transporte especializado y con todas las normas de movilidad.

Los padres que no quieran usar el servicio del J.I- Metro, debe elegir una carta manifestando que su hijo estará bajo el cuidado y protección de sus padres.

Las actividades se iniciarán a partir del 18 de marzo y por un periodo de 2 meses

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ
Alcaldía Local de Kennedy

CONTINUACIÓN DESARROLLO:

aproximadamente

- La comunidad manifiesta las siguientes inquietudes:

- El horario de los ingresos y recogida de los niños y niñas va a cambiar?

RTA: El horario de ingreso al J.I la cometa será a partir de las 8am y hasta las 3:00pm los niños que sean transportados en las rutas escolares se recogen en la puerta del J.I - Metro a las 7:15am se espera 15 o 20 minutos y se realizara el recorrido hasta el J.I La cometa. En la tarde la salida del J.I la cometa se realizará a los 3:00pm para entregar los niños en la puerta del J.I Metro.
Los niños, niñas que no sean recogidos por sus padres o familiares se efectuará la ruta de atención por ICBF

Se informa a los padres que esta actividad es transitoria y que es un proceso pedagogico que ayuda al desarrollo de niños y niñas
Se realiza consientización a los padres de familia con respecto al cambio que se lleva a cabo con los niños y niñas.

Se anexa Registro de asistencia con 174 en 16 Folios

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ
Alcaldía Local de Kennedy

GESTIÓN SOCIAL

REGISTRO DE ASISTENCIA

AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN PARA CERTIFICAR QUE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD.
LOS DATOS SOLO SE UTILIZAN PARA ESTE FIN

Fecha 03-Marzo-2020 **N° de Contrato** COP-328-2019 **Contratista:** Ever José Salgado
Tipo de evento: Reunion Inicio de obra J.I. Metro
Nombre Profesional Social: Alexandra Diaz

En Constancia de lo Anterior:

N°	Nombre y apellido	Dirección	teléfono	Firma
1	Diana Milena Alfonso Garcia	Cra 89a N. 46-45 Sur	3125425508	Diana Alfonso
2	Sonia esperanza Monague León	calle 49 G Sur N-84f14	3103040205	
3	Edwon Alegria Molano	cll 45A#88C-98 Sur.	3112580982	
4	Paola Andrea Ochoa Hernández	Kra 88c #45A-66 Sur	3046515328	Paola A. Ochoa
5	Luisa Fernanda Chiguillo Romero	cll 45A Sur #88 C98	3204346841	Luisa Chiguillo
6	Brayan José Sadaval Herrera	Cll 45A Sur #88c 98	3204346841	
7	NAUDYS ESPITIA COELLO	KR 88N 42F Sur 72	3013375872	
8	Luisannis Martinez	Cr87b 42f s2 Sur Tintalito	313 289 40 20	Luisannis
9	Yenifer Angela Monay Pitre	Cra90A N°45 A05 Sur Casa30 Hogaritas 4	3138396200	
10	Maria Paz Deva Guzman	Cra88A N-42F-92 Sur	3202147226	Maria Paz D.
11	Viviana Ospina Gonzalez	Calle 49 Sur N° 88 G 38	315 662 65 40	

Vo.Bo. Interventoría Social _____
Firma de la interventor (a)

EVER JOSE SALGADO SALGADO
CONTRATISTA CONSTRUCCION DE PROYECTOS

C61 - 89

7749

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Alcaldía Local de Kennedy

GESTIÓN SOCIAL

REGISTRO DE ASISTENCIA

AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN PARA CERTIFICAR QUE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD.
LOS DATOS SOLO SE UTILIZAN PARA ESTE FIN

Fecha 03-Marzo-2020 **N° de Contrato** 328-2019 **Contratista:** Arq. Ever Jose Salgado
Tipo de evento: Reunión dnicio de obra J.I. Metro
Nombre Profesional Social: Alexandra Diaz

En Constancia de lo Anterior:

N°	Nombre y apellido	Dirección	teléfono	Firma
12	Maria teresa salcedo Juez	Cll 49c #88f 25 Sur	3107973043	Maria Teresa Salcedo
13	Manuel Stiven Espinosa Cabrales	Cra 90A # 45A15 Sur	320888 8998	Manuel espinosa
14	Bibiana Saavedra oza	Cr 86g # 42g 30 Sur	3046596123	Bibiana oza
15	John Patiño Ramirez	Cll 42 fsur # 87b-18	5209473192	John Ramirez
16	YEIMY ALEXANDRA PARRA RAMIREZ	cll 45 Sur #88c 98	3219152935	YEIMY PARRA
17	Jalida Astrid Useche Niño.	cll 42g N. 87F 03.	3107776098.	JALIDA ASTRID
18	Edgar Ruben Avila Castro	cll 42g N. 87F 03.	3104172366	
19	Ambar Moreno Sánchez	Cll 42 H N. 82-11 Sur	3115281116	
20	Yury Alexandra Ospina Saenz	Cll 49B #87D 40 Sur	3125186232	
21	Oscar estiven bobadilla jimenez	cll 8C #92-12	3022211956	OSCAR BOBADILLA
22	Angie Julieth Martinez Ladino	Calle 45 Sur #88C-18	3212977543	Angie M.

Vo.Bo. Interventoría Social _____
Firma de la Interventor (a)

EVER JOSE SALGADO SALGADO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Alcaldía Local de Kennedy

GESTIÓN SOCIAL

REGISTRO DE ASISTENCIA

AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN PARA CERTIFICAR QUE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD.
LOS DATOS SOLO SE UTILIZAN PARA ESTE FIN

Fecha 03-Marzo-2020 **N° de Contrato** Cop. 328-2019 **Contratista:** Arq. Ever José Salgado
Tipo de evento: Reunión Inicio de obra. J.I. Metro
Nombre Profesional Social: Alexandra Diaz

En Constancia de lo Anterior:

N°	Nombre y apellido	Dirección	teléfono	Firma
23	Maria Alejandra Ramirez Araque.	calle 42c # 86c 17	3108552261	Maria Alejandra Ramirez A.
24	Carolina Avendaño Vargas	Carrera 87b # 47-33	3105832595	
25	Deisy Casallas Galvedes	Carrera 88c #43sur-53	3228017766	Deisy Casallas
26	CARLOS. PINZON - Zotelo		3223007257	PINZON. Zotelo
27	Viliana Jazmin Galeano Alejo	Cra 87k # 49b-09 sur	321-493-89-13	
28	Nury Johana Gómez Montero		3003916900	Nury Gómez
29	Laura Vanesa Claros Trujillo	Calle 45A sur #88c-98	3133705534	Laura Claros
30	Saida Claros Trujillo	Calle 45A sur #88c-98	3133705534	Saida Claros
31	Cesar Pozos	Cra 89A sur # 45-33	3013531291	Cesar Pozos
32	Omaira Ramirez	Carrera 88D 42C bis 33	3224227297	Omaira Ramirez
33	Stefany Yepez	Cl 49D Bis #88F-25	3163834712	Stefany Yepez

Vo.Bo. Interventoría Social _____
Firma de la Interventor (a)

EVER JOSE SALGADO SALGADO
GERENCIA A CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

1757

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Alcaldía Local de Kennedy

GESTIÓN SOCIAL

REGISTRO DE ASISTENCIA

AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN PARA CERTIFICAR QUE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD.
LOS DATOS SOLO SE UTILIZAN PARA ESTE FIN

Fecha 03/Marzo-2020 N° de Contrato Cop. 328-2019 Contratista: Arq. Ever Jose Salgado
Tipo de evento: Reunión inicio de obra J.I Metro
Nombre Profesional Social: Alexandra Diaz

En Constancia de lo Anterior:

N°	Nombre y apellido	Dirección	teléfono	Firma
34	Mildred Cuartas	Cr. 87 J bis # 53-69 s	314-230-44-17	Mildred Cuartas
35	Myriam Hernandez	Cll 51 B bis 89 B 59	3143612811	Myriam Hernandez
36	Diana Milena Alfonso Garcia	Cra 89a 46-45 sur.	3125425508	Diana Alfonso
37	Sonia Namesquia Leon	calle 47 Gsur # 94f 11	3103040205	Sonia Namesquia
38	Ros Alejandra Contreras Sanchez	Cll 42 G Sur # 82 B 23	3046664444	
39	Laura Buenaño-		3503876315	
40	Deisy Paez Molina	cll 49 A sur # 87-29	3144218013	Deisy Paez.
41	Angie Sofia Gonzalez Candia	Cll 49a sur #187 -29	3107568695	Angie G.
42	Sol Milena Perez Riaño	Cll 49A sur #88c-24	314 3712324	Sol Perez
43	Eliana Alexandra Bastidas	cll 49 sur 88c-50	3007317909	Eliana
44	Joz Angela Peralta Roja	Cr 90d #42f 65s	3004247987	

Vo.Bo. Interventoría Social _____
Firma de la interventor (a)

EVER JOSE SALGADO SALGAD
GERENCIA A CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Alcaldía Local de Kennedy

GESTIÓN SOCIAL

REGISTRO DE ASISTENCIA

AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN PARA CERTIFICAR QUE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD.
LOS DATOS SOLO SE UTILIZAN PARA ESTE FIN

Fecha 03-Marzo-2020 **N° de Contrato** Cop- 328-2019 **Contratista:** Arq. Ever Jose Salgado
Tipo de evento: Reunión inicio de Obra
Nombre Profesional Social: Alexandra Orozco

En Constancia de lo Anterior:

N°	Nombre y apellido	Dirección	teléfono	Firma
45	Sandra Milena Forero Cosas Páez	Calle 48 sur #89B-44	9056734/3214249990	
46	Jeny paola aldana		3142544404	jeny paola aldana
47	Doris Emelina Barchano Rs	calle 49A B Pro35	7834261	Doris Emelina Barchano
48	Sandra Milena Forero Vargas.	Calle 49A N°88926.	3022682494	Sandra Forero.
49	Carmen Valeria Lozano	cra 98d #55 sur 03	3125026671	Carmen Lozano
50	Diana Carolina Alfonso Gómez	cra 86 G N° 42F57 sur	3208413125	Diana Alfonso
57	Lucero Vasquez	cra 89 A # 45-A38 sur	3115689294	
52	Nayda Ortega Alarcon	cra 89 G 42-62 Sur	3127675804	
53	Johanna amaya Gonzalez	calle 42 D Sur 87 108	3223976202	Johanna amaya
54	Natalia Bogo Rivelos	cl 87 s # 41-21 Sur	3204361264	Natalia Bogo
55	Eilleen Carmona Trujillo	KH 49 b sur # 89-22	3135834142	

Vo.Bo. Interventoría Social _____
Firma de la interventor (a)

EVER JOSE SALGADO SALGADO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Alcaldía Local de Kennedy

GESTIÓN SOCIAL

REGISTRO DE ASISTENCIA

AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN PARA CERTIFICAR QUE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD.
LOS DATOS SOLO SE UTILIZAN PARA ESTE FIN

Fecha 03-Marzo-2020 N° de Contrato Cop. 328-2019 Contratista: Arq Ever José Salgado
Tipo de evento: Reunión Inicio Le obra. JI Metro
Nombre Profesional Social: Alexandra Díaz

En Constancia de lo Anterior:

N°	Nombre y apellido	Dirección	teléfono	Firma
56	Claudia Milena López	Cra 91 BIS N° 49A Sur 26	3107838184	Milena López I.
57	María Beatriz Pineros	Calle 49 S # 88C 50 Int 2 6	3143317917	Beatriz Pineros
58	Ana Milena Nieto Camillo	Cra 90A #46-51 Sur Cs 147	3214004060	Ana Nieto
59	LIZETH CAMILA ARANGO GOMEZ	Cra 87g bis # 42g 33	3133425584	LIZETH ARANGO G.
60	brajan Stiven barrera gil.	cra 87g bis # 42g 33	3219518170	brajan stiven barrera gil
61	Viviana Lorena Patiño Reina	Cra 90a #45a 05 Sur	311 252 0767	Viviana Lorena Patiño
62	Erica Orjuela Rodriguez	cra 87D #50-41 Sur	3115037473	Erica Orjuela
63	Yeni Esperanza Orjuela Rodriguez	Cra 87d # 50-41 Sur	3209496682	Yeni Orjuela
64	Marcela Fabiana chaparro	cll 42A Bis # 87I 08	3219481905	Marcela chaparro
65	LILIANA PACHECO PARDO	cll 47 sur # 87-06	3103549568	LILIANA PACHECO
66	Tania Mercado Torres	Calle 49 Sur # 87-08	3024012860	Tania P.

Vo.Bo. Interventoría Social

Firma de la interventor (a)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Alcaldía Local de Kennedy

GESTIÓN SOCIAL

REGISTRO DE ASISTENCIA

AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN PARA CERTIFICAR QUE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD.
LOS DATOS SOLO SE UTILIZAN PARA ESTE FIN

Fecha 03-Marzo-2020 **N° de Contrato** COP. 328-2019 **Contratista:** Ing. Ever José Salgado
Tipo de evento: Reunión Inicio de obra JJ Metro
Nombre Profesional Social: Alexandra Diaz

En Constancia de lo Anterior:

N°	Nombre y apellido	Dirección	teléfono	Firma
67	Yohana María Bilo Vargas	Cra 88 # 42f 88 Sur	3146363180	Yohana Bilo.
68	Laura tatiana montes sandoval	cll 42 G sur 89 A 72	3203087887	laura montes
69	Lizeth Adriana Garcia Molano	Cra 87i #42f - 44 Sur.	3182094869.	
70	Jessica Rivera	cr 89a #45a-38 Sur	3118065405 3133231239	Jessica Rivera
71	claudia Alarcon Rodriguez	cra 89A #45A-38 Sur	3228881496	claudia Alarcon
72	Roberto Gomez Stand	Av Ciudad Cali #42f-55 Sur	3015355476	
73	Luz Milena Gómez Ramos	Cra 86D #49A-17 Sur	3134748577	
74	Maria Camila Mayorga Moreno	cll 50 Bis #87D 70.	3223788015	Camila Mayorga.
75	Ofelmina Suárez Benitez	Calle 49 sur 87 A 51	3103011562	
76	Marco Antonio		3204369388	
77	Katherine Barrera Perez	carrera 89a #45a-38 Sur	3133739026 3142473455	Katherine B. P

Vo.Bo. Interventoría Social

Firma de la interventor (a)

EVER JOSE SALGADO SALGADO
GERENCIA A CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ
Alcaldía Local de Kennedy

GESTIÓN SOCIAL

REGISTRO DE ASISTENCIA

AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN PARA CERTIFICAR QUE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD.
LOS DATOS SOLO SE UTILIZAN PARA ESTE FIN

Fecha 03-Marzo-2020 **N° de Contrato** Cop-328-2019 **Contratista:** Arq. Ever Jose Salgado
Tipo de evento: Reunión Inicio de Obra. L.I. Metro
Nombre Profesional Social: Alexandra Gon

En Constancia de lo Anterior:

N°	Nombre y apellido	Dirección	teléfono	Firma
78	Yuly Marcela Romero Bejarano	Cra 90a #45a-05 Sur casa 22	3505721307	
79	Jenifer Perilla Cardenas	Cra 89A #45A 28 Sur	3196053986	
80	Maria Hercilia Barragan	carrera 87 F # 41 27 Sur	3124228192	
81	Yenny carolina Morales Largo	carrera 87H # 42 72 1 Sur	3008553042	Yenny carolina Morales
82	Jose Quintero	Calle 41 31c 04 Este	3125581404	
83	Zambrano Rojas Cristian Faryd	cra 87 A # 45 A 38 Sur	3116761877	Cristian Faryd Zambrano
84	Dairo Pedraza chilatra	Calle 45 A Sur # 88 C 98	3223699252	Dairo Pedraza
85	Diana Maria Basto Toro	cl 45 A Sur # 88 c 98	3142887746	
86	Lneth Tatiana Zambonda Pinzon	Calle 92 b # 42 f 30 Sur	3219968199	
87	Manuel Fortey Valbuena Hernandez	calle 51 Sur # 88 I-26	3177495529	
88	Paola Cardenas Carvajal	Calle 88F 42 f Sur 59	3142465089	Paola

Vo.Bo. Interventoría Social _____
Firma de la Interventor (a)

EVER JOSE SALGADO SALGADO
GERENCIA A CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS

1756

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ

GESTIÓN SOCIAL

REGISTRO DE ASISTENCIA

AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN PARA CERTIFICAR QUE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD.
LOS DATOS SOLO SE UTILIZAN PARA ESTE FIN

Fecha 03-Marzo-2020 N° de Contrato COP. 328-2019 Contratista: Arq. Ever Jose Salgado
Tipo de evento: Reunión Inicio de obra J.J. - Medio
Nombre Profesional Social: Alexandra Cruz

En Constancia de lo Anterior:

N°	Nombre y apellido	Dirección	teléfono	Firma
89	Olga Patricia Sanchez	CR88#42f60	3214439275	Patricia S
90	Alejandro Caicedo Bohamón	Cluesol#8Ec-10	3208876722	
91	Natalia Aguirre Rivera	Cr 80 I # 42 A 41 Sur	3203679436	Natalia Aguirre.
92	Janitzhak Andrea Canas Mercado	Cll 86 f # 41 - 14	3045274790	Janitzhak C.
93	Mónica Milena Gonzalez	Villa loma	3106811212	
94	Olga Rojas Alarcón	Cl 42 f Sur N 90 b 11	3112585855	Olga R
95	LORENA PEÑA	CRA 88 C N°45 A 66 SUR	3706742591	LORENA PEÑA
96	Yeni Torres Filigua	Cl 89 A 45 A 38 Sur.	3158653080	Yeni T.
97	BRAYAN CAMILO SANCHEZ	Calle 45 A Sur #88c 98	3734697242	
98	Ana Eliola Acosta Calderón	cra 87 f # 42.45 Sur	3132615677	
99	Jorge Mario Ortiz	Cl 88 #45 A 66	3008223611	

Vo.Bo. Interventoría Social

Firma de la Interventor (a)

EVER JOSE SALGADO SALGADO
GERENCIA A CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ
Alcaldía Local de Kennedy

GESTIÓN SOCIAL

REGISTRO DE ASISTENCIA

AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN PARA CERTIFICAR QUE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD.
LOS DATOS SOLO SE UTILIZAN PARA ESTE FIN

Fecha 03-03-2020 N° de Contrato COP-328-2019 Contratista: Arq. Ever Jose Salgado
Tipo de evento: Reunion inicio de obra. J.I. Metro
Nombre Profesional Social: Alexandra Diaz

En Constancia de lo Anterior:

N°	Nombre y apellido	Dirección	teléfono	Firma
100	Natalia Bogaca	Cra 87 I #41-21 sur	3204361264	Natalia Bogaca
101	Alexandra [illegible]		3185968902	Alexandra [illegible]
102	Raquel Sierra M.	Clle 45A sur # 88C-98	3702299568	Raquel Sierra M.
103	Eilleen Carmona Trujillo	Cll 49b sur # 89-22	3135834442	[illegible]
104	Sonia Ordoñez Reyes.	Transversal 19 #100-	3183046939	[illegible]
105	Alfonso Reyes S	Cl 71A #15-34	3164691140	[illegible]
106	Carlos Vasquez	Transv. 19 # 100	3102687677	[illegible]
107	Liliana Margarita Velosa Mateus	cll 5c #7A-32	3212605346	[illegible]
108	Eliana Astrid Nuria Monroy	Cra 100 #50B-95 sur	3502972439	[illegible]
109	Sergio Alexander Cano Rodrigues	Cra 100 Nº 50B 45 sur	3104982928	[illegible]
1				

Vo.Bo. Interventoría Social [illegible]
Firma de la interventor (a)

EVER JOSE SALGADO SALGADO
GERENCIA A CONSTRUCCION DE PROYECTOS

1758

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ
Alcaldía Local de Kennedy

GESTIÓN SOCIAL

REGISTRO DE ASISTENCIA

AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN PARA CERTIFICAR QUE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD.
LOS DATOS SOLO SE UTILIZAN PARA ESTE FIN

Fecha 03-Marzo-2020 N° de Contrato Cop-0328-2019 Contratista: Ever José Salgado
Tipo de evento: Reunión inicio de obra - S.L. - Metro/
Nombre Profesional Social: Alexandra Diaz

En Constancia de lo Anterior:

N°	Nombre y apellido	Dirección	teléfono	Firma
110	Claudia Rojas Arias	cr 88 B # 40 B 15 Sur	3142172511 3167895211	
111	Maribel Gallego Rubio	KR. 89 A N 45-38	3207666804	Maribel G. R.
112	Asly Herymeth Martinez Garcia	Cra 89 bis # 42 F 28 Sur	3232283327	Asly Martinez
113	Karen Lorena Gonzalez Leon	KR 89 A N 45-38	3209897795	Lorena Gonzalez
114	Ana Caroline Cardona Londoño	Cll 45a Sur # 88c-98	3212620897	ana cardona
115	Mauricio Sanchez Zambrano	cll 48 A Sur # 88c-80	3203649681	Mauricio Sanchez
116	Alexandra [illegible]	Calle 48A Sur 87	3185968[illegible]	Alexandra [illegible]
117	ANDERSON SANCHEZ	CRA 87 BIS # 50-56	3223415464 3103169577	ANDERSON SANCHEZ
118	Julieth stefany Duran	Cra 87D BIS # 49d - 16	3146505960	
119	Hasly cayanna Romero Caicedo	cr 91 # 42 G 42 Sur	3203516960	Hasly Romero
120	clara Inés Palacios C.	Cra 83 Mz 29 - 15 Sur	3223471769 3103035989	

Vo.Bo. Interventoría Social

Firma de la Interventor(a)

EVER JOSE SALGADO SALGADO
GERENCIA A CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Alcaldía Local de Kennedy

GESTIÓN SOCIAL

REGISTRO DE ASISTENCIA

AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN PARA CERTIFICAR QUE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD. LOS DATOS SOLO SE UTILIZAN PARA ESTE FIN

Fecha 03-Marzo-2020 **N° de Contrato** COP-328-2019 **Contratista:** Arq. Ever José Salgado
Tipo de evento: Reunión Inicio de obra J.J Metro
Nombre Profesional Social: Alexandra Diaz

En Constancia de lo Anterior:

N°	Nombre y apellido	Dirección	teléfono	Firma
121	Lisseth Paola Castro Cabarcas	KR 82B-44A-30 Sur	3143757005	Lisseth Castro C.
122	Elizabeth Castellar Burgos	cll 49 Sur #87a-51	3223799705	
123	Sandra milena pinto montiel	KR 89A N 45A 38 Sur	3223795339	
124	Diana Carolina Alfonso Giraldo	Cra 86 G N° 42F 57	3208113125	Diana Alfonso
125	Lucero Vasquez	Cra 89 A #45A 38 Sur	3115689294	
126	Carmen Valeria Lozano	Cra 98d #55 Sur 03	BR5026671	Carmen Lozano
127	Johanna amaya Gonzalez	Calle 42 D Sur 87i 08	3223926202	Johanna amaya
128	Rosi Alejandra Contreras Sanchez	Cl 42 C Sur # 82 B23	3046664444	
129	Nayda Raizel Ortega	cra 89G 42-23 Sur	3127675804	
130	Sandra Milena Forero Vargas	Calle 49 A N° 88g 26.	3022682494.	Sandra Forero.
131	Doris Emelina Barahona	Cra 11c 49 A N° 88c 35	7834261	Doris Emelina Barahona

Vo.Bo. Interventoría Social _____ **Firma de la Interventor (a)**

EVER JOSE SALGADO SALGADO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Alcaldía Local de Kennedy

GESTIÓN SOCIAL

REGISTRO DE ASISTENCIA

AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN PARA CERTIFICAR QUE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD. LOS DATOS SOLO SE UTILIZAN PARA ESTE FIN

Fecha 03-03-2020 N° de Contrato COP-328-2019 Contratista: Arq Cesar Jose Salgado
Tipo de evento: Reunion Inicio de obra JJ Metro
Nombre Profesional Social: Alexandra Diaz

En Constancia de lo Anterior:

N°	Nombre y apellido	Dirección	teléfono	Firma
132	Saida Claros Trujillo	Calle 45 A Sur # 88c 98	31337055 34	Saida Claros
133	Cesar POTES	Cra 89 A # 45-33	3013531291	Cesar POTES
134	Omaira Ramirez	Carrera 88 D 42C bis 33	3224227297	Omaira Ramirez
135	Stefany Yepez	C 11 49d BIS # 88F-25	3163834712	Stefany Yepez
136	Maria teresa salcedo juez	C 11 49C # 88 F 25 Sur	3107973043	Maria Teresa Salcedo
137	Manuel Espinosa C	Cra 90 A # 45A 15 Sur	320 8888998	
138	Jaleda Astrid Useche Niño	Cl 42g N. 87F 03 Sur.	3104172366	JALEDA ASTRID U
139	Edgar Ruben Avila Castro	Cl 42g N. 87F 03 Sur.	3107776098	
140	Maria Elsa Sanston	Cra 87D. N 48-03 Sur	3014060391	Maria Elsa Sanston
141	MELANIA MORENO MARÍN	CRA. 87 # 48-50 SUR	3112166437	
142	César m. murillo osorio	Cra 90A No 45A05s	3174801525	
143	Evelin Melissa Guzman	Cll 42 I # 87 15 18 Su	3222366651	Evelin Guzman
144	Fanny Ruth Galvis	Cll 49 B Bis # 88-73	3226572089	

Vo.Bo. Interventoría Social

Firma de la Interventor (a)

EVER JOSE SALGADO SALGADO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ
Alcaldía Local de Kennedy

GESTIÓN SOCIAL
REGISTRO DE ASISTENCIA
AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN PARA CERTIFICAR QUE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD.
LOS DATOS SOLO SE UTILIZAN PARA ESTE FIN

Fecha 03-03-2020 **N° de Contrato** COP- 328-2019 **Contratista:** Arq. Ever Jose Salado
Tipo de evento: Reunion Inicio de obra U.F. - Metro
Nombre Profesional Social: Alexandra Diaz

En Constancia de lo Anterior:

N°	Nombre y apellido	Dirección	teléfono	Firma
145	Maribel Fuentes T	interior 3 Apto 503 calle 42F sur 87-18	3144939165	Maribel Fuentes
146	maricarmen-pianales-acosta	KR89-AHS-A38Sur	3212078444	
147	Monica Andrea Marin Rueda	cll 42 #89c 81	3112111611	Monica Maria
148	JOSE. PINZON. HOTELO		3223060257	PINZON. HOTEL. 10
149	Deisy Yaneth Casallas Cavieles	Carrera 88c #42sur-53	3228017766	Deisy Casallas C.
150	Carolina Avendaño Vargas	Carrera 87b # 41-33	3105832595	
151	Maria Alejandra Ramirez A.	calle 42b #86c 17	3108552261	
152	Luz Angela Peralta Ruiz	Cra 90 d #42f 65s	3004247987	
153	Viviana Jazmin Galeano Alejo	Cra 87k #49b-09 sur	321-4938913	
154	Yury JOHANNA Gómez Montero		3003976900	Yury Gómez
155	Laura Vanessa Claros Trujillo	calle 45A sur #88c 98	3133705534	Laura Claros

Vo.Bo. Interventoría Social
Firma de la Interventor (a)

EVER JOSE SALGADO SALGADO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Alcaldía Local de Kennedy

GESTIÓN SOCIAL

REGISTRO DE ASISTENCIA

AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN PARA CERTIFICAR QUE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD. LOS DATOS SOLO SE UTILIZAN PARA ESTE FIN

Fecha 03-03-2020 N° de Contrato CDP-328-2019 Contratista: Arq. Ever Jose Salgado
Tipo de evento: Reunion Inicio de obra L1 - Metro/
Nombre Profesional Social: Alexandra Diaz

En Constancia de lo Anterior:

N°	Nombre y apellido	Dirección	teléfono	Firma
156	Yeny Padra Aldana		3142544404	Yeny Padra
157	Sandra Milena Cabos Páez	Calle 49 sur #89B-44	9056734-3214240770	Sandra M Cabos P.
158	Juliana Ospina Gonzalez	Calle 49 sur #88 G 38	3156626540	
159	Maria Paz Deña	Cra 88A #42F-92 sur	3202147276	Maria Paz
160	Eliana Alexandra Bastidas G.	cll 49 sur 88c-50 casa	3007379909	ELICUCA
161	Sol Milena Perez Riaño	Cll 49A sur # 88c-24	314 3712324	Sol Perez
162	Angie Sofia Gonzalez Cardo	Cll 49A sur # 87-29.	3107568693	Angie G.
163	Deisy Páez Molina	cll 49A sur #87-29	3144218013	Deisy Páez
164	Lakey Bermudez		350 387 6315	
165	YEIMY ALEXANDRA PARRA RAMIREZ	Cll 45 SUR #88C 98	3214152935	YEIMY PARRA
166	John Pablo Ramirez	Cll 42F sur # 82 1/2 - 18	3209473192	John Ramirez

Vo.Bo. Interventoría Social

Firma de la interventor(a)

EVER JOSE SALGADO SALGADO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ
Alcaldía Local de Kennedy

GESTIÓN SOCIAL

REGISTRO DE ASISTENCIA

AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN PARA CERTIFICAR QUE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD.
LOS DATOS SOLO SE UTILIZAN PARA ESTE FIN

Fecha 03-Marzo-2020 **N° de Contrato** Cop 328-2019 **Contratista:** Arq. Ever José Salgado
Tipo de evento: Reunión Inicio de obra J.I Metro
Nombre Profesional Social: Alexandra Diaz

En Constancia de lo Anterior:

N°	Nombre y apellido	Dirección	teléfono	Firma
167	Yuri Yesenia Ballestero Portilla	cr 89a #45a sur 38	3229437007	Yuri Ballestero
168	Ariel Estefania Ortiz R.	cr 88i #44o4	3017027274	Ariel Ortiz R.
169	Fabio Ruedo Angel	c/ 49 #87 A 51	3157436425	
170	Gabriel Orlando Lasso R.	Cll 45A # 88C 98	3138975528	
171	Oswaldo Rojas Balderas	cll 48B sur #88c 10	3174748447	
172	OSCAR TERRA	Las conquista 4 casa 237	3134679435	
173	Yaddy Tatiana Zabala Sicuanza	cr 87 Bis 42 F 63 sur	3203600627	Tatiana Zabala.
174	Johanna Garzón Forero	Cll 42 G sur # 86-65	313 3916492	

Vo.Bo. Interventoría Social _____ **Firma de la interventor (a)**

EVER JOSE SALGADO SALGADO

Anexo 2:

Volante y carta de invitación

1765

EVER JOSE SALGADO SALGADO
GERENCIA & CONSTRUCCION DE PROYECTOS

Bogotá D.C febrero 26 de 2020

Doctora.
Johanna Torres

Secretaria Distrital de Integración Social
Carrera 74 N° 42C-80 sur

RAD:E2020010339 Fecha: 2020-02-26 10:54:24 Codigo Dep:
Remite: EVER JOSE SALGADO SALGADO
Destino: SUBDIRECCIÓN LOCAL KENNEDY
Asunto: INVITACION
Fol 1 Anexos:

REF: CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA ADECUAR Y/O REPARAR LA ESTRUCTURA FISICA DE CINCO (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO

ASUNTO: Reunión de Inicio de obra Jardin Infantil Metro

Respetada señora:

Atentamente nos permitimos invitarla a participar de la reunión de inicio de obra del contrato de la referencia, donde explicaremos las actividades que se ejecutaran, las cuales beneficiará a los niños, niñas y las familias habitantes del sur- occidente de la ciudad de Bogotá D.C. Esta se llevará a cabo de la siguiente manera.

Fecha: 03 de marzo de 2020
Hora: 07:00 am
Lugar: Kra 88C # 43-53 sur Colegio Las margaritas IED (Auditorio)

Para cualquier información comunicarse con la Profesional Social Alexandra Díaz al número telefónico 3229013545, de lunes a viernes en horario de 8:00 a 5:00pm.
Agradecemos su atención, y esperamos contar con su asistencia o la de un representante de su familia.

Sin otro particular, nos suscribimos con atento saludo.

Cordialmente

ALEXANDRA DIAZ NUVAN
Profesional Social

1766

EVER JOSE SALGADO SALGADO

114

Bogotá D.C febrero 26 de 2020

RAD:E2020010342
BOGOTÁ Fecha: 2020-02-26 10:56:49
Codigo Dep
Remite: EVER JOSE SALGADO SALGADO
Destino: SUBDIRECCION LOCAL FERIAS
Asunto: INVITACION
Fol: 1 Anexos:

Doctora.
Liliana Torres

Secretaria Distrital de Integración Social
Carrera 74 N° 42C-80 sur

REF: CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA ADECUAR Y/O REPARAR LA ESTRUCTURA FISICA DE CINCO (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO

ASUNTO: Reunión de Inicio de obra Jardin Infantil Metro

Respetada señora:

Atentamente nos permitimos invitarla a participar de la reunión de inicio de obra del contrato de la referencia, donde explicaremos las actividades que se ejecutaran, las cuales beneficiara a los niños, niñas y las familias habitantes del sur- occidente de la ciudad de Bogotá D C Esta se llevará a cabo de la siguiente manera.

Fecha: 03 de marzo de 2020
Hora: 07.00 am
Lugar: Kra 88C # 43-53 sur Colegio Las margaritas IED (Auditorio)

Para cualquier información comunicarse con la Profesional Social Alexandra Diaz al número telefónico 3229013545, de lunes a viernes en horario de 8:00 a 5:00pm.
Agradecemos su atención, y esperamos contar con su asistencia o la de un representante de su familia

Sin otro particular, nos suscribimos con atento saludo.

Cordialmente

ALEXANDRA DIAZ NUVAN
Profesional Social

BOGOTÁ

115

1767

EVER JOSE SALGADO SALGADO

CONTRATO DE CONSULTORIA

Bogotá D.C Febrero 26 de 2020

Señores

JAC Barrió Las Margaritas

REF: CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA ADECUAR Y/O REPARAR LA ESTRUCTURA FISICA DE CINCO (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO

ASUNTO: Reunión de Inicio de obra Jardín Infantil Metro

Respetados señores:

Atentamente nos permitimos invitarlo a participar de la reunión de inicio de obra del contrato de la referencia, donde explicaremos las actividades que se ejecutaran, las cuales beneficiará a los niños, niñas y las familias habitantes del sur- occidente de la ciudad de Bogotá D.C. Esta se llevará a cabo de la siguiente manera.

Fecha: 03 de marzo de 2020
Hora: 07:00 am
Lugar: Kra 88C # 43-53 sur Colegio Las margaritas IED (Auditorio)

Para cualquier información comunicarse con la Profesional Social Alexandra Díaz al número telefónico 3229013545, de lunes a viernes en horario de 8:00 a 5:00pm.
Agradecemos su atención y esperamos contar con su asistencia o la de un representante de su familia.

Sin otro particular, nos suscribimos con atento saludo.

Cordialmente

ALEXANDRA DIAZ NUVAN
Profesional Social

146

1768

EVER JOSE SALGADO SALGADO
GERENCIA DE CONSTRUCCION DE PROYECTOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ADMINISTRADORA LOCAL DE KENNEDY SECRETARÍA DE GOBIERNO I.A.I. CIUDAD KENNEDY

Bogotá D.C. febrero 26 de 2020

Señor
Diego Fernando Angulo
Presidente JAL –Kennedy
Transversal 78 K No. 41 A-04 Sur

RECIBIDO 28 FEB 2020

REF: CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA ADECUAR Y/O REPARAR LA ESTRUCTURA FISICA DE CINCO (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO

ASUNTO: Reunión de Inicio de obra Jardín Infantil Metro

Respetado señor:

Atentamente nos permitimos invitarlo a participar de la reunión de inicio de obra del contrato de la referencia, donde explicaremos las actividades que se ejecutaran, las cuales beneficiará a los niños, niñas y las familias habitantes del sur- occidente de la ciudad de Bogotá D.C. Esta se llevará a cabo de la siguiente manera.

Fecha: 03 de marzo de 2020
Hora: 07:00 am
Lugar: Kra 88C # 43-53 sur Colegio Las margaritas IED (Auditorio)

Para cualquier información comunicarse con la Profesional Social Alexandra Díaz al número telefónico 3229013545, de lunes a viernes en horario de 8:00 a 5:00pm.
Agradecemos su atención, y esperamos contar con su asistencia o la de un representante de su familia.

Sin otro particular, nos suscribimos con atento saludo.

Cordialmente

Alexandra Diaz N
ALEXANDRA DIAZ NUVAN
Profesional Social

1769

EVER JOSE SALGADO SALGADO
GERENCIA A CONSTRUCCION DE PROYECTOS

Bogotá D.C febrero 26 de 2020 20. 117

Doctor.
Leonardo Alexander Rodriguez López
Alcalde Local de Kennedy
Transversal 78 K No. 41 A-04 Sur

REF: CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA ADECUAR Y/O REPARAR LA ESTRUCTURA FISICA DE CINCO (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO

ASUNTO: Reunión de Inicio de obra Jardin Infantil Metro

Respetado señor:

Atentamente nos permitimos invitarlo a participar de la reunión de inicio de obra del contrato de la referencia, donde explicaremos las actividades que se ejecutaran, las cuales beneficiará a los niños, niñas y las familias habitantes del sur- occidente de la ciudad de Bogotá D.C. Esta se llevará a cabo de la siguiente manera.

Fecha: 03 de marzo de 2020
Hora: 07:00 am
Lugar: Kra 88C # 43-53 sur Colegio Las margaritas IED (Auditorio)

Para cualquier información comunicarse con la Profesional Social Alexandra Diaz al número telefónico 3229013545, de lunes a viernes en horario de 8:00 a 5:00pm.
Agradecemos su atención, y esperamos contar con su asistencia o la de un representante de su familia.

Sin otro particular, nos suscribimos con atento saludo.

Cordialmente

ALEXANDRA DIAZ NUVAN
Profesional Social

26/2/2020 Sticker web
Alcaldía Local de Kennedy
R No. 2020-581-004258-2
2020-02-26 12:48 - Folios: 1 Anexos: 0 F
Destino: Area de Gestion de Desar
https://app.gobiernobogota.gov.c... 1/2

148

1770

EVER JOSE SALGADO SALGADO
GERENCIA & CONSTRUCCION DE PROYECTOS

936 118

Bogotá D.C febrero 26 de 2020

Señor.
Yaneth Echeverría
Supervisora del Contrato
Alcaldía Local de Kennedy
Transversal 78 K No. 41 A-04 Sur

REF: CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA ADECUAR Y/O REPARAR LA ESTRUCTURA FISICA DE CINCO (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO

ASUNTO: Reunión de Inicio de obra Jardín Infantil Metro

Respetada señora:

Atentamente nos permitimos invitarla a participar de la reunión de inicio de obra del contrato de la referencia, donde explicaremos las actividades que se ejecutaran, las cuales beneficiará a los niños, niñas y las familias habitantes del sur- occidente de la ciudad de Bogotá D.C. Esta se llevará a cabo de la siguiente manera.

Fecha: 03 de marzo de 2020
Hora: 07:00 am
Lugar: Kra 88C # 43-53 sur Colegio Las margaritas IRD (Auditorio)

Para cualquier información comunicarse con la Profesional Social Alexandra Díaz al número telefónico 3229013545, de lunes a viernes en horario de 8:00 a 5:00pm.
Agradecemos su atención, y esperamos contar con su asistencia o la de un representante de su familia.

Sin otro particular, nos suscribimos con atento saludo

Cordialmente

Alexandra Diaz N

ALEXANDRA DIAZ NIVAN
Profesional Social

26/2/2020 Sticker web
Alcaldía Local de Kennedy
R No. 2020-581-004259-2
2020-02-26 12:50 - Folios: 1 Anexos: 0 F
Destino: Despacho - ALCALDIA LOCAL
https://app.gobiernobogota.gov.c... 1/2

119

EVER JOSE SALGADO SALGADO
NIT: 7.917.558-1

Anexo 3:

Acta de vecindad J.I Metro


1772

CODIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Participación Ciudadana	VERSION 3.0

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Alcaldía Local de Kennedy

FECHA			ACTA No 01	APERTURA [X]
				CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

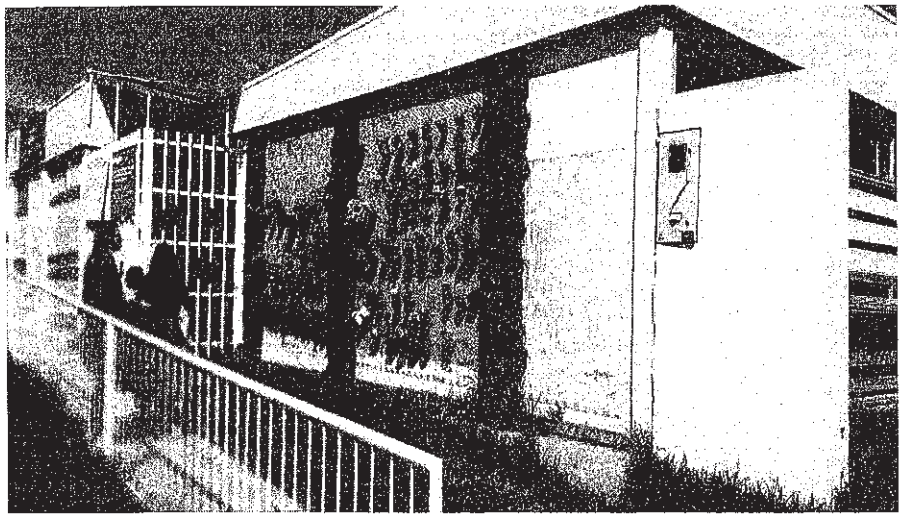

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: SECRETRIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Teléfono
No de CC propietario
Dirección: KARRERA 88 C # 43- 37
No. de pisos: 1
Long. del frente (mts)
Estrato: 3

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☑	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☑ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☑

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

ZONA DE ACCESO Y CONTORNO EXTERNO : aproximadamente 2 metros se encuentra en tierra y materia vegetal, presencia de llantas , actualmente hay poli sombra blanca de cerramiento ya que se esta realizando la construcción del cerramiento perimetral del jardín infantil, con presencia de bigas en concreto y tubos metálicos a una altura de 2mts, existencia de rampa de acceso con presencia de tableta en concreto algunas de estas se presentan hundidas y/o desprendidas, presencia de bordillo en regular estado, hay desprendimiento del mimo y hay uno roto, hay presencia de baranda metálica con desgaste natural en pintura.

Sobre el costado sur oriental hay presencia un cultivo de flores con materas desechables y artificiales. Puerta de acceso, en reja y marcos metálicos en desgaste natural en pintura, con presencia de bisagras en buen estado, presencia de una ventana y marcos en aluminio con vidrios y película de seguridad en desgaste natural por el uso.

hay presencia de 03 puertas en rejas metálicas en desgaste natural, presencia de rejilla plástica de ventilación , presencia de tanque de agua con pisos en concreto, y cerramiento en reja metálica en desgaste natural

presencia de ventanas con marcos en aluminio y vidrios con película de seguridad en desgaste natural

Estructura de la estación eléctrica: con muros en concreto y pintura con presencia de fisuras en varios sitios, puerta y marcos metálicos, chapas metálicas y candado

Caseta de vigilancia: estructura metálica, pisos en tierra y presencia de vegetación, cubierta metálica en desgaste natural por el uso. Vidrios de ventaneria en buen estado.

Muro de caja eléctrica: con estructura en concreto, y caja de luz con su respectivo contador en buen estado y reja metálica.

Muro de cerramiento en concreto con presencia de fisuras y desprendimiento del mismo

INTERIOR:

SALON 1: PORTERÍA: piso laminado en buen estado, muros en PVC con pintura en desgaste natural, techo en lamina PVC en desgaste natural, se encuentra sucio, estructura metálica y pintura en desgaste natural por el uso, presencia de puerta con estructura en aluminio y vidrio templado con película de seguridad en mal estado .

SALON : ÁREA ADMINISTRATIVA: piso laminado en buen estado, muros en PVC con pintura en desgaste natural, techo en lamina metálica y estructura metálica en desgaste natural, se encuentra sucio, estructura metálica y pintura en desgaste natural por el uso, presencia de puerta con estructura en aluminio y vidrio templado con película de seguridad en mal estado .

SALON 1 y 2 (pre jardín 2): piso laminado en buen estado, muros en PVC con pintura en desgaste natural, techo en lamina PVC en desgaste natural, se encuentra sucio, estructura metálica y pintura en desgaste natural por el uso, presencia de puerta con estructura el aluminio y vidrio templado con película de seguridad en mal estado, Baño de niños y niñas con batería de baño completa en buen estado, lavacolas en PVC con llave y ducha en buen estado y funcionando.

BODEGA: cuarto con muros de cerramiento en estructura PVC con pintura en regular estado, piso en PVC en buen estado, placa de cubrimiento metálica con estructura metálica.


Baños: presencia de dos(2) sanitarios en buen estado, dos (2) lavamanos con su correspondiente mueble en PVC, y llaves de agua en buen estado,, puertas con chapas en regulara estado,


1773

CODIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Participación Ciudadana	VERSIÓN 3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Alcalde Local de Kennedy

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.

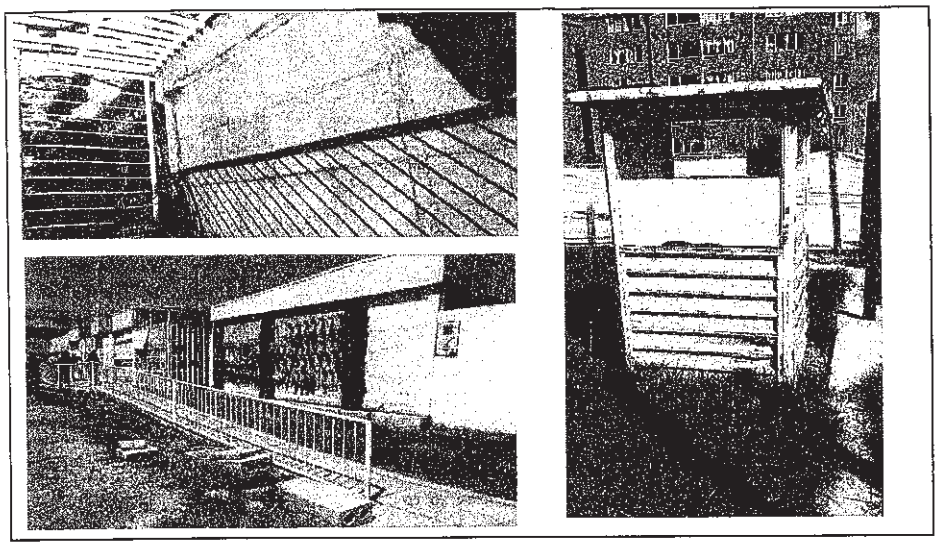

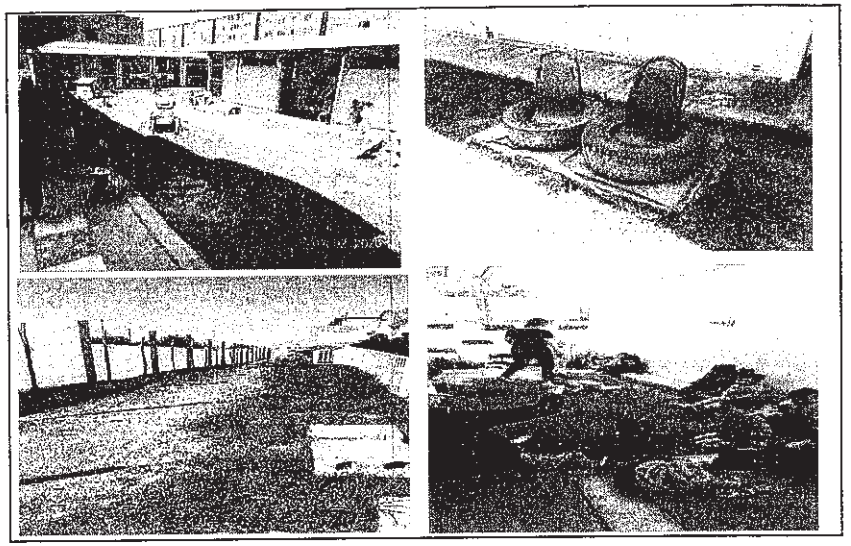

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los _____ días del mes de _____ de _____

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) _____

Residente Técnico - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) _____

Residente Social - Contratista

REVISO:

(Firma) _____

(Nombre) _____

Residente Técnico - Interventoría

(Firma) _____

(Nombre) _____

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) _____

Residente Social-Interventoría

Original: Interventoría
1° copia: Propietario
2° copia: Contratista

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

1774

CODIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Participación Ciudadana	VERSIÓN 3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Atención Local de Kennedy

3.1 CONTINUACIÓN - DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO -

SALON 3 y 4 (pre jardín 1): piso laminado en buen estado, muros en PVC con pintura en desgaste natural, techo en lamina PVC en desgaste natural, se encuentra sucio, estructura metálica y pintura en desgaste natural por el uso, presencia de puerta con estructura el aluminio y vidrio templado con película de seguridad en mal estado, Baño de niños y niñas con bateria de baño completa en buen estado, lavacolas en PVC con llave y ducha en buen estado y funcionando.

COCINA Y COMEDOR: Muros en PVC, los cuales se encuentran sucios por el uso. Se encuentra estructura metálica en desgaste natural que funciona como soporte, ventaneria y puertas con marcos en PVC, puerta corrediza en buen estado, ventaneria con vidrios de seguridad y película con desprendimiento de la misma

SALON 5 Y 6 (pre jardín): piso laminado en buen estado, muros en PVC con pintura en desgaste natural, techo en lamina PVC en desgaste natural, se encuentra sucio, estructura metálica y pintura en desgaste natural por el uso, presencia de puerta con estructura el aluminio y vidrio templado con película de seguridad en mal estado, Baño de niños y niñas con bateria de baño completa en buen estado, lavacolas en PVC con llave y ducha en buen estado y funcionando.

Zona verde: pisos en tierra y vegetación, con presencia de llantas y juego infantiles para niños y niñas,

CUBIERTA: Con presencia de estructura metálica, cunetas en aluminio de las cuales varias se encuentran deterioradas y oxidadas, bigas metálicas en desgate natural , presencia de lámparas tubulares y tomacorrientes, en buen estado, bajantes de aguas lluvias con pintura en regular estado, piso de contorno con tableta en concreto algunas de estas en deterioro

EVER JOSE SALGADO SALGADO
NIT: 7.917.558-1

Anexo 4
Listado de personal de obra

1776

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ
Alcaldía Local de Kennedy

GESTIÓN SOCIAL

REPORTE DE CONTRATACIÓN MANO DE OBRA NO CALIFICADA

N° de Contrato: COP 328-2019 **Contratista:** ARQ EVER SALGADO

Responsable de la información: T. S: ALEXANDRA DIAZ **Teléfono** 3229013545

Informe correspondiente al mes de 17 de febrero de 2020 **al** 06 de marzo **de** 2020

N°	Nombre y apellido	Dirección	teléfono	Localidad / barrio
1	MANUEL EDISON HERRERA FORERO	Cll 40 sur # 39B-40	3117532261	KENNEDY
2	NORBEY MUÑOZ ORDOÑEZ	Santa Cecilia	3114330154	SUBA
3	PABLO ANDRES CASTAÑEDA	TRASV. 48 b # 69 f-11 SUR	3213123211	KENNEDY
4	JUAN CARLOS HERRERA	Kra 9 este # 60-36	3214186507	SOACHA
5	ARBEY MASABUEL	Trasv 97ª # 2-70	32309970350	KENNEDY
6	DERIAN MERCADO VISBAL	Kra 7 # 183-	3157041383	USAQUÉN
7	WILMAN HERNANDO CORDON MEJIA	Cll 116 a # 2B-40	3202738421	USAQUÉN
8	JUAN JOSE MAECHA	Cra 82 # 3-25	3125035583	KENNEDY
9	MAXIMILIANO PARRAGA TORRES	Cra 80 # 65-17	3007272535	BOSA
10	WILSON ARIEL GOMEZ MEDINA	Cll 38 sur # 97c- 10	3005068455	KENNEDY
11	MANUEL HERNANDEZ	Kra 81G # 66ª-14	3103793924	KENNEDY
12	FABIAN ALEXIS RODRIGUEZ	DIAG, 64 #73-51 SUR	3114615297	KENNEDY
13	JOSE LIBARDO PERDOMO	KRA 3 A # 30ª-16 SUR	3213940409	PUENTE ARANDA
14	JORGE ENRIQUE PEDRAZA	Cll 114 A # 8B este	3144535228	USAQUEN
15	ERMIDES OME	KRA 88 c SUR # 7-49	3202878752	CHAPINERO
16	JOHAN MOSQUERA	Cll 114 A # 8B este	3144535228	USAQUEN
17	ALEX OME			
18	JOSE BERARDO MAECHA	Cll 130 # 153-11	3208137735	SUBA
19	FABIO VILLALBA	KRA 3 A # 30ª-16 SUR	3213940409	PUENTE ARANDA
20	LUIS CARLOS MARTINEZ	CLL 94 # 93-28	3012698644	FONTIBON
21	CARLOS ALBERTO MARTINEZ		3124289356	RAFAEL URIBE URIBE
22	VICTOR BAQUERO	Calle 57 A # 80B- 41	3128950042	KENNEDY

EVER JOSE SALGADO SALGADO
GERENCIA A CONSTRUCCION DE PROYECTOS

1777

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
Alcaldía Local de Kennedy

GESTIÓN SOCIAL
REPORTE DE CONTRATACIÓN MANO DE OBRA NO CALIFICADA

N° de Contrato: COP 328-2019 **Contratista:** ARQ EVER SALGADO
Responsable de la información: T. S: ALEXANDRA DIAZ **Teléfono** 3229013545
Informe correspondiente al mes de 17 de febrero de 2020 **al** 06 de marzo **de** 2020

N°	Nombre y apellido	Dirección	teléfono	Localidad / barrio
23	JUAN CARLOS ZABALA	KRA 81g # 66ª-14	3103793924	KENNEDY
24	DANIEL DAVID OME CHILITO	Calle 47B # 84-21	3125035583	USME
25	JEISON FABIAN RUEDA	Cll 60 sur # 18-31	3163442843	USME
26	FABIO NELSON CAICEDO MALES	Kra 44 A- # 78- 66	3104374083	KENNEDY
27	MARCO AURELIO PALENCIA	Kra 77 C # 69B-97 sur	3219060016	Bosa
28	JAVIER MEJIA HERNANDEZ	Kra 81G # 66ª-14	3103793924	KENNEDY
29	YEYSON CIFUENTES HUERFANO	Trasv 68D # 44- 72	3143432846	KENNEDY
30	CARLOS ENRIQUE MARTINEZ BARRERA	KRA 160 # 134-11	3008108670	SUBA
31	FERNANDO GONZALEZ	KRA 3 A # 30ª-16 SUR	3213940409	PUENTE ARANDA
32	EDELFONSO GONZALEZ	CLL 181c # 13-91 INT 40 APT. 303	3112591948	USAQUEN
33	WILMER CARDOMA	KRA 5 D # 9ª -21	3194980809	SUBA
34	JOSE ANIBAL QUINTERO MONROY	KRA 81g # 66ª-14	3103793924	KENNEDY
35	BELARMINO RIAÑO PALENCIA	Calle 47B # 84-21	3125035583	USME

Vo.Bo. Interventoría Social _____

Firma de la interventor (a)

EVER JOSE SALGADO SALGADO
GERENCIA & CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

1778

GEAGOR
CONSORCIO GEBAL

Bogotá D.C., 16 de Marzo de 2020

Señores:
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
Ing. Leonardo Alexander RodríguezLópez
Alcalde local de Kennedy
Transversal 78 K No. 41 A-04 Sur
Bogotá D.C

GEBAL-KEN-080

Ref. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 329-2019.
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA ADECUACIÓN DE CINCO (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PARA LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

Asunto: validación Informe SST Seguridad y Salud en el Trabajo mensual Nº2.

Por medio de la presente esta interventoría revisa y da visto bueno al informe de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO mensual Nº2 donde se evidencian seguimiento a actividades SST realizadas por el contratista.

Cordialmente,

Juan Diego Rodriguez A

Ing. JUAN DIEGO RODRIGUEZ AGUIRRE
Residente en Salud Ocupacional
CONSORCIO GEBAL


-120-

1779

126

EVER JOSE SALGADO SALGADO
GERENCIA & CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

INFORME MES 2 SST



ELABORADO POR: ING. CINDY KATHERINE ORTIZ ZAMBRANO

CONTRATISTA:
EVER JOSE SALGADO SALGADO

BOGOTÁ D.C
2020

jardinesksalgado@gmail.com

128

1780

000127

EVER JOSE SALGADO SALGADO
GERENCIA & CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

INFORME MENSUAL

Del 17 enero al 16 de febrero de 2020

CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP - 328 DE 2019

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA ADECUAR Y/O REPARAR LA ESTRUCTURA FISICA DE CINCO (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.

INTERVENTORIA BALER INGENIERIA
Nombre representante legal

SUPERVISOR: ING. YANETH ESPERANZA ECHEVERRIA BECERRA

Laboró	Revisó y Aprobó	Fecha
Cindy Katherine Ortiz Cambrano		

EVER JOSE SALGADO SALGADO
GERENCIA & CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

INTRODUCCIÓN

El presente documento hace referencia al informe semanal de las actividades de seguridad y salud en el trabajo realizadas del 17 de enero al 16 de febrero de los corrientes alusivas al contrato de obra pública **COP-328 DE 2019** a cargo del Arq. **EVER JOSE SALGADO SALGADO** Nit: 7.917.558-1 en sinergia con la entidad **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY,** con quien se suscribió el presente contrato de obra cuyo objeto es "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA ADECUAR Y/O REPARAR LA ESTRUCTURA FISICA DE CINCO (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO."

Para la ejecución del contrato de obra civil se otorgó un plazo inicial de seis (6) meses y se firmó acta de inicio el 17 de enero de 2020 bajo la supervisión del Ing. Yaneth Esperanza Echeverria Becerra del **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY**; con la Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y sst por parte de BALER Ingeniería.

EVER JOSE SALGADO SALGADO
GERENCIA & CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

1. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Fecha	Actividades realizadas	Compromisos
17/02/2020 al 16/03/2020	Verificación del uso correcto de los elementos de protección personal de acuerdo a las actividades realizadas (anexo formato de verificación). Capacitación de las bases del SG-SST, responsabilidades y roles, reglamento de higiene y seguridad, factores de riesgo, procedimiento para tareas de alto riesgo(adjunta asistencia) Acompañamiento en la actividad de trabajo en alturas de pintura de la estructura interna y la instalación de la estructura de la cubierta (adjunto evidencia fotográfica y permisos). Verificación de herramienta y equipos utilizados en las diferentes actividades evidenciando que se encuentran en buen estado, acorde para la actividad. Realización de pausas activas durante la jornada laboral que sirven para recuperar energía, mejorar el desempeño y eficiencia en el trabajo, a través de diferentes técnicas y ejercicios que ayudan a reducir la fatiga laboral, trastornos osteomusculares y prevenir el estrés (anexo evidencia fotográfica).	Verificación en sitio del uso correcto de los elementos de protección personal de todo el personal de acuerdo a la actividad desarrollado. Verificar que las actividades se realicen de acuerdo a los parámetros de seguridad y autocuidado por parte de los trabajadores teniendo claro los riesgos a los cuales están expuestos en cada una de ellas. Garantizar que todos los materiales, equipos y herramientas cumplan con las condiciones de seguridad requeridas para el desarrollo de cada actividad. Continuar con la realización de las pausas activas, capacitaciones del personal.

EVER JOSE SALGADO SALGADO
GERENCIA & CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

	Socialización de los riesgos a los cuales están expuestos en cada una de las actividades al personal nuevo. (anexo asistencia). Socialización de los riesgos, plan de emergencias y SG-SST al personal administrativo de la obra. (adjunta asistencia y evidencia fotográfica) Inspección del sistema de emergencias existente en el lugar (anexo formato). Realización de la Inspección locativa (anexo formato). Verificación de la documentación del nuevo personal que ingreso a la obra EPS, Pensión, Arl, examen de ingreso. Socialización de los riesgos a los cuales están expuestos en cada una de las actividades al personal nuevo. Entrega de elementos de protección al personal nuevo. En el periodo comprendido de 17 de febrero de 2020 al 16 de marzo no se presentaron incidentes o accidentes laborales el indicador se encuentra en 0. (Se adjunta Excel)	

EVER JOSE SALGADO SALGADO


GERENCIA & CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

-	Al presente informe se adjuntan las evidencias de las capacitaciones, inspecciones, entrega de EPP..	

EVER JOSE SALGADO SALGADO


GERENCIA & CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

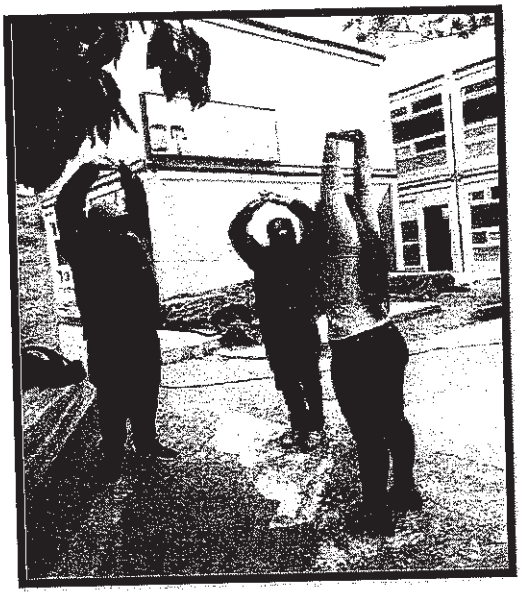





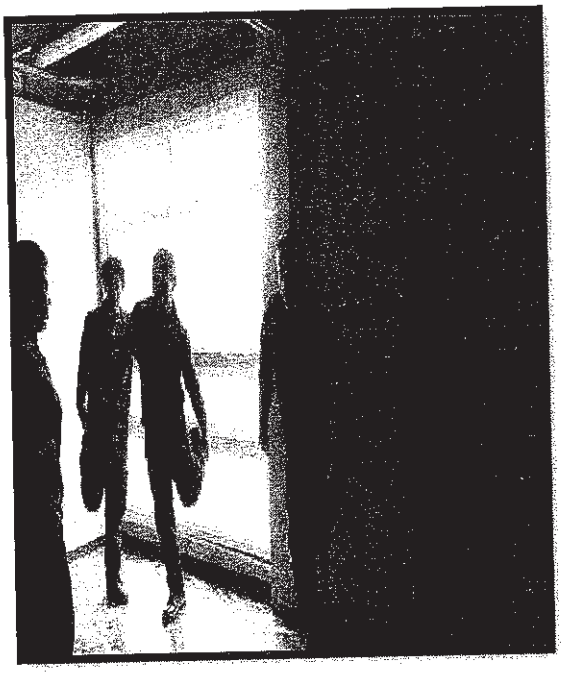


EVER JOSE SALGADO SALGADO

GERENCIA & CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS





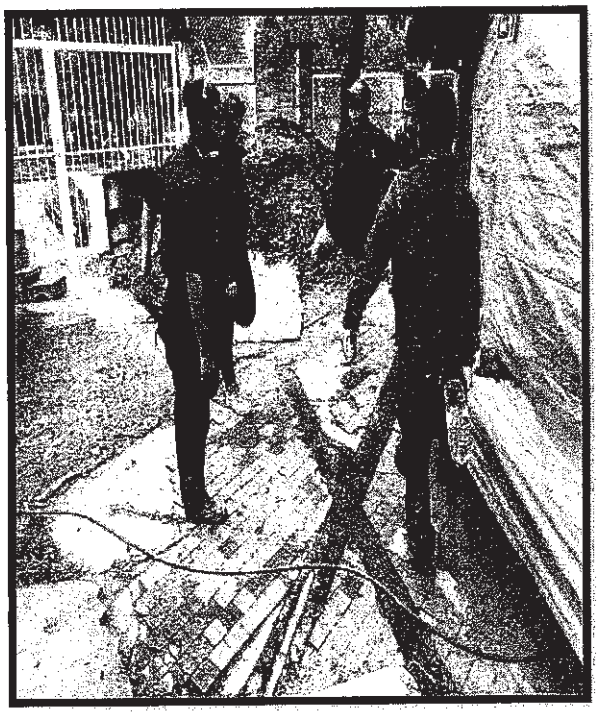




1787


EVER JOSE SALGADO SALGADO


GERENCIA & CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

~~134~~



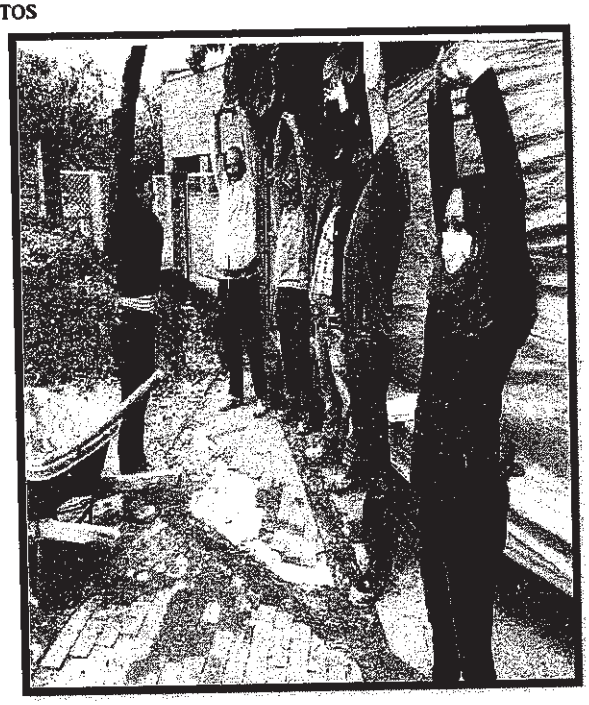


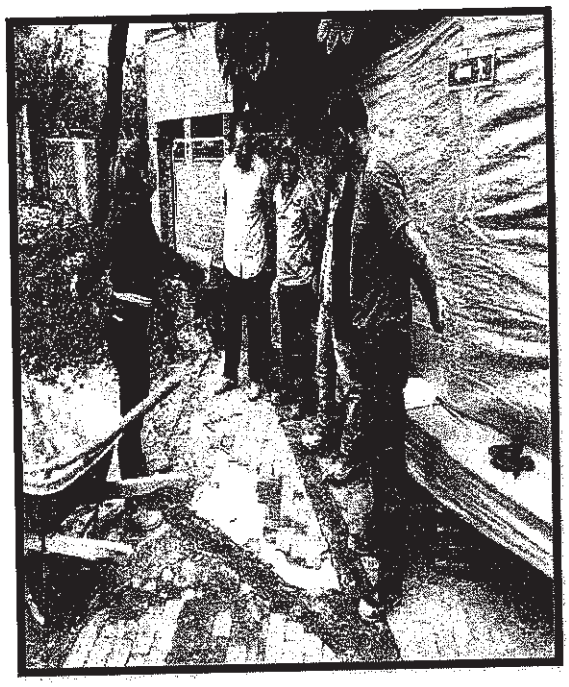

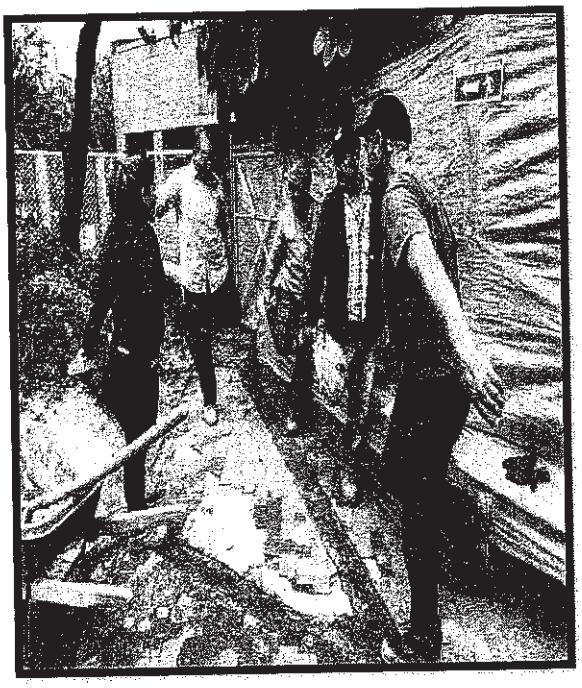

EVER JOSE SALGADO SALGADO
GERENCIA & CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS



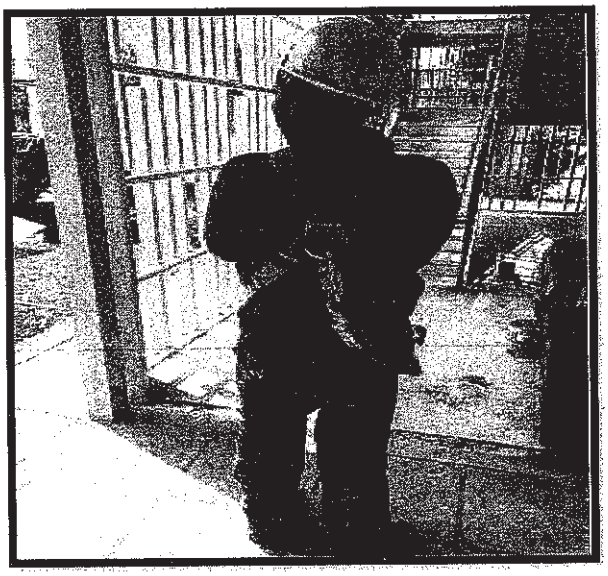



EVER JOSE SALGADO SALGADO
GERENCIA & CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS








1790


EVER JOSE SALGADO SALGADO


GERENCIA & CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS


93 -137-



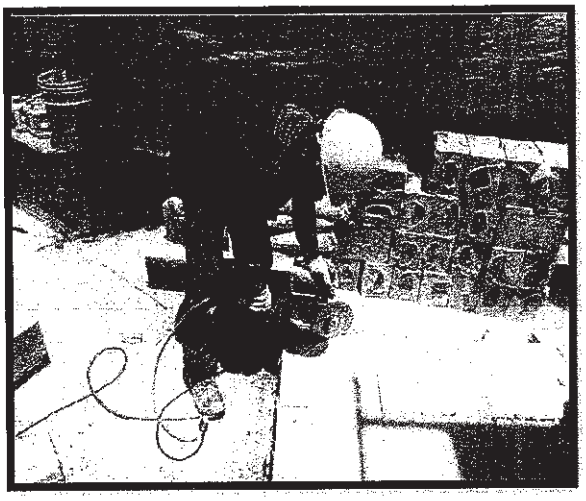

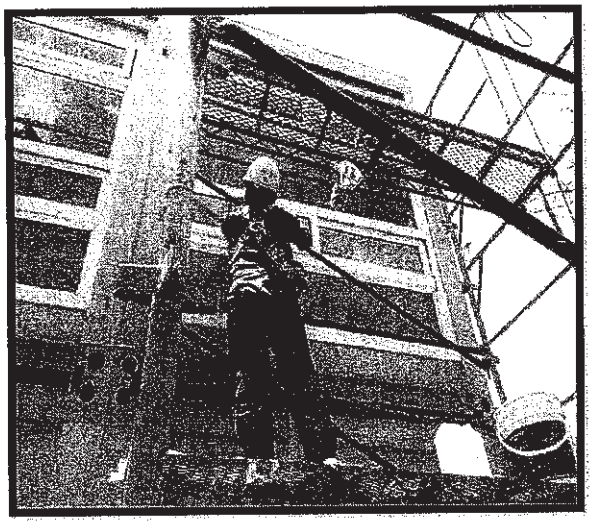

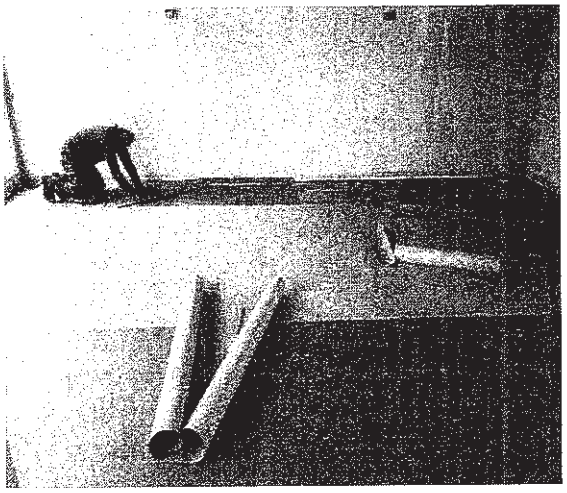

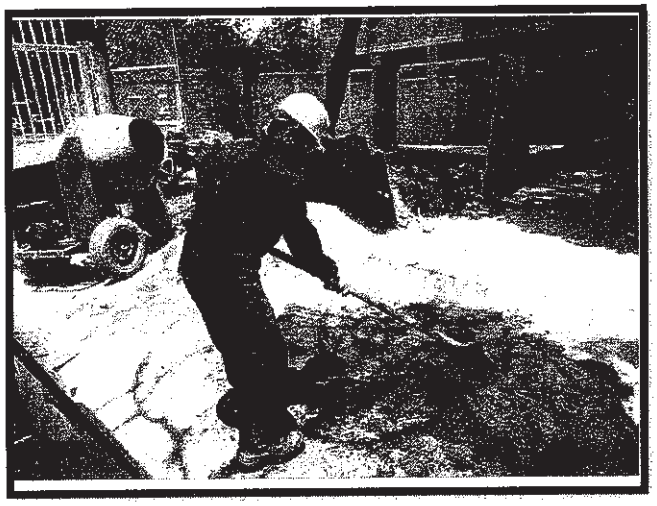

-10-

-39-

1791


EVER JOSE SALGADO SALGADO
GERENCIA & CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS


138

Pausas activas





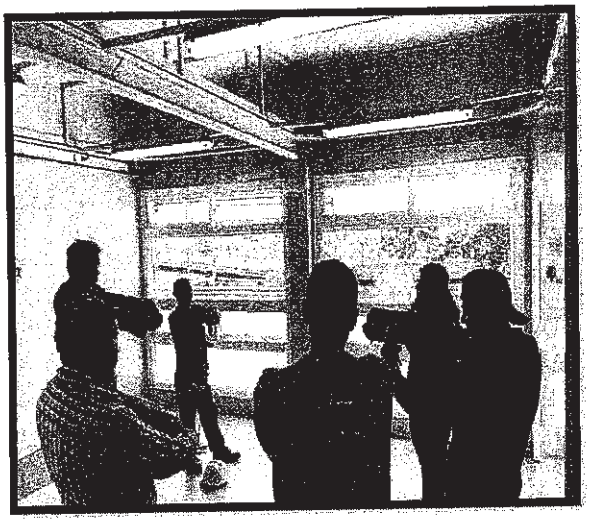


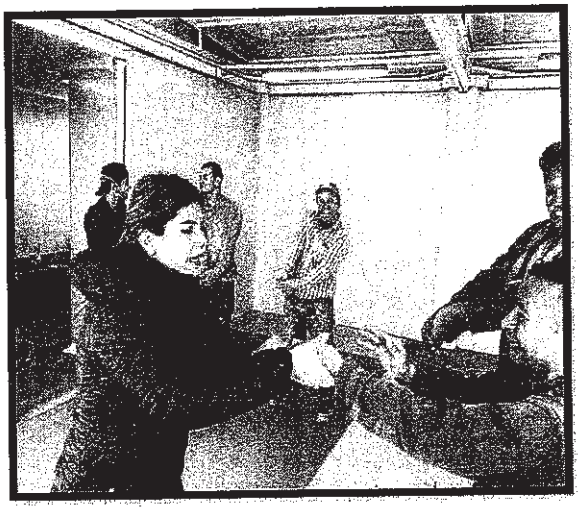

EVER JOSE SALGADO SALGADO
GERENCIA & CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

Verificación de equipos y herramientas



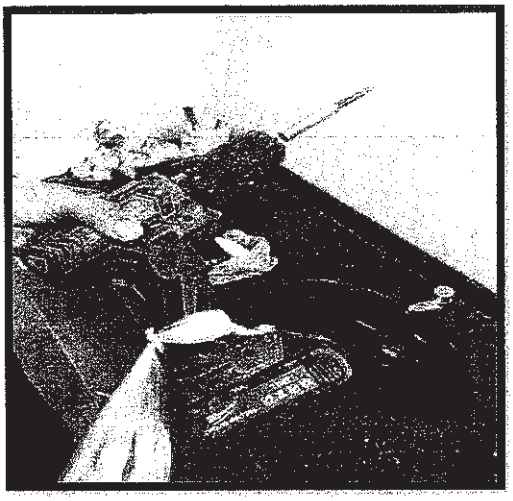










EVER JOSE SALGADO SALGADO
GERENCIA & CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

Verificación del uso correcto de los elementos de protección personal y desarrollo de actividades de acuerdo a las normas de seguridad



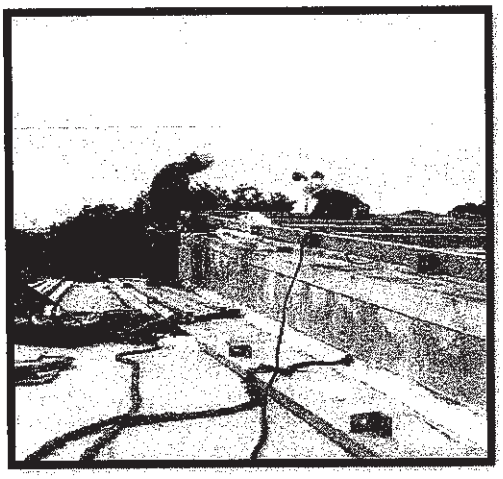

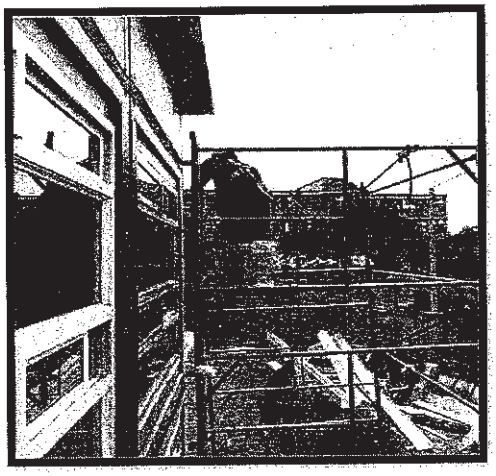

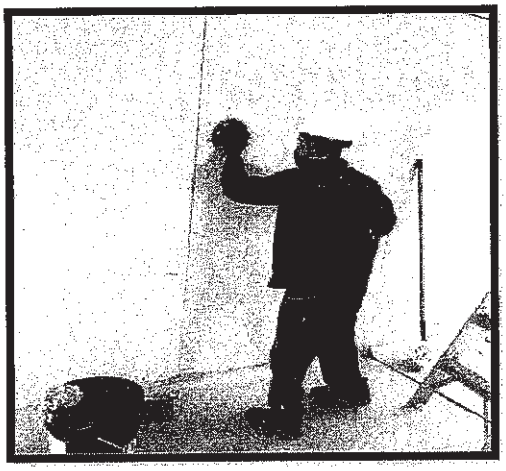

1999

144

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7:	FORMATO N°: FT-SST-003
	SG-SST	
FORMATO PERMISO TRABAJOS EN ALTURAS		Version 001
		Fecha 01/01/2019
		Pagina 1 de 2

Fecha de Inicio 28/02/2020
Fecha de terminacion 29/02/2020
Permiso consedido a:

Permiso N°
Altura a trabajar 6m 75

Descripción de la tarea a realizar:
Pintura de estructura

PERSONAL A EJECUTAR LA LABOR

Nombre y Apellido	N° Cedula	Firma DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6
Arbey mazabell	76357307						

IDENTIFICACION DE PELIGROS

FISICOS			QUIMICOS			BIOLOGICOS		
Iluminacion	SI	NO	Polvos organicos e inorganicos	SI	NO	Virus	SI	NO
Vibraciones	SI	NO	Fibras	SI	NO	Bacterias	SI	NO
Radiacion ionizante	SI	NO	Liquidos	SI	NO	Hongos	SI	NO
Radiacion no ionizante	SI	NO	Gases y Vapores	SI	NO	Parasitos	SI	NO
Ruido	SI	NO	Humos metalicos y no metalicos	SI	NO	Picaduras	SI	NO
Temperatura extrema (frio)	SI	NO	Material particulado	SI	NO	Mordeduras	SI	NO
Temperatura extrema (calor)	SI	NO	CONDICIONES DE SEGURIDAD			Fluidos o excrementos	SI	NO
PSICOSOCIAL			Mecanico	SI	NO	**FENOMENOS NATURALES**		
Gestion organizacional	SI	NO	Electrico	SI	NO	Sismo	SI	NO
Caracteristicas del trabajo	SI	NO	Locativo	SI	NO	Terremoto	SI	NO
Caracteristicas sociales	SI	NO	Tecnologico	SI	NO	Vendaval	SI	NO
Condiciones de la tarea	SI	NO	Publico	SI	NO	Inundacion	SI	NO
Interfase de la persona	SI	NO	Trabajo en Altura	SI	NO	Derrumbe	SI	NO
Jornada de Trabajo	SI	NO	Trabajo en espacios confinados	SI	NO	Precipitaciones	SI	NO

BIOMECANICO

Posturas	SI	NO	Esfuerzo	SI	NO	Movimiento repetitivo	SI	NO	Manipulacion de cargas	SI	NO

Descripcion de maquinas y herramientas a utilizar: Andamio

EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS A UTILIZAR

Casco con barbuquejo	SI	NO	Eslingas de posicionamiento	SI	NO	Ascendedor	SI	NO			
Gafas de seguridad	SI	NO	Linea de vida vertical portátil	SI	NO	Mosquetones	SI	NO			
Guantes	SI	NO	Linea de vida vertical fija	SI	NO	Tapones auditivos	SI	NO			
Overol	SI	NO	Linea de vida horizontal portátil	SI	NO	Protección respiratoria	SI	NO			
Botas de seguridad	SI	NO	Linea de vida horizontal fija	SI	NO	Andamios certificados	SI	NO			
Arnés de cuerpo completo	SI	NO	Adaptador de anclaje	SI	NO	Escaleras	SI	NO			
Eslingas de protección contra caidas	SI	NO	Descendedor	SI	NO	OTROS:					

AUTORIZACIONES DEL DIA DE TRABAJO (coordinador de T.S.A. y Mestro o residente de obra)

DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6
		COORDINADOR	COORDINADOR	COORDINADOR	COORDINADOR
MAESTRO	MAESTRO	MAESTRO	MAESTRO	MAESTRO	MAESTRO
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE OBRA	RESIDENTE OBRA	RESIDENTE OBRA	RESIDENTE OBRA	RESIDENTE OBRA
HORA INICIO	HORA INICIO	HORA INICIO	HORA INICIO	HORA INICIO	HORA INICIO
HORA FINALIZACION	HORA FINALIZACION	HORA FINALIZACION	HORA FINALIZACION	HORA FINALIZACION	HORA FINALIZACION
FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA

1795

142

LISTA DE VERIFICACION

CHEQUEO DIARIO	DIA 1 SI / NO	DIA 2 SI / NO	DIA 3 SI / NO	DIA 4 SI / NO	DIA 5 SI / NO	DIA 6 SI / NO
Los trabajadores tienen el pago vigente de la seguridad social?	SI	SI				
Los trabajadores tienen el certificado de aptitud médico para trabajo en alturas?	SI	SI				
Los trabajadores tienen la constancia de capacitación o certificado de la competencia laboral para prevención de caídas en trabajo en alturas?	SI	SI				
El trabajador ha inspeccionado y revisado el estado de los elementos del sistema de contra caídas a utilizar?	SI	SI				
El trabajador a inspeccionado el sistema de acceso (andamios certificados, escaleras, elevadores de personal, grúas con canasta) para trabajo en alturas?	SI	SI				
Se ha revisado el estado de la estructura antes de iniciar el trabajo?	SI	SI				
Se encuentran los equipos y/o herramientas revisadas y en buen estado?	SI	SI				
Se han instalado el arnés de cuerpo completo?	SI	SI				
Se cuenta con línea de vida con la resistencia adecuada?	SI	SI				
Se cuenta con puntos de anclaje con la resistencia adecuada?	SI	SI				
Al personal se le ha instruido en relación a los riesgos que pueden presentarse durante este trabajo?	SI	SI				
El area de trabajo se ha delimitado y aislado convenientemente?	SI	SI				
El trabajador tiene puesto todos los elementos de protección personal de acuerdo a los riesgos que se expondrá?	SI	SI				
Permiten factores externos (condiciones atmosféricas) que el trabajo se haga con seguridad?	SI	SI				
Los trabajadores han diligenciado la ficha de salud para trabajos en altura	SI	SI				
Al personal se le ha instruido en relación a la utilización de los equipos para trabajar en alturas (arnés, mosquetones, cuerdas, etc.)	SI	SI				
El supervisor si está enterado del trabajo y verificó las condiciones de seguridad en el sitio antes de darle el permiso	SI	SI				

Observaciones:

CIERRE DEL PERMISO

Nombre coordinador de alturas	Cindy Ortiz
Cedula	60.449.747
Firma	
Fecha y hora de cirre	29/02/2020


Novedades en el cierre del permiso		
cancelacion del permiso	SI	NO
reporte de actos y condiciones inseguros	SI	NO
se reportan accidentes durante la ejecucion	SI	NO

1796

143


ANEXO FOTOGRAFICO

PAUSAS ACTIVAS

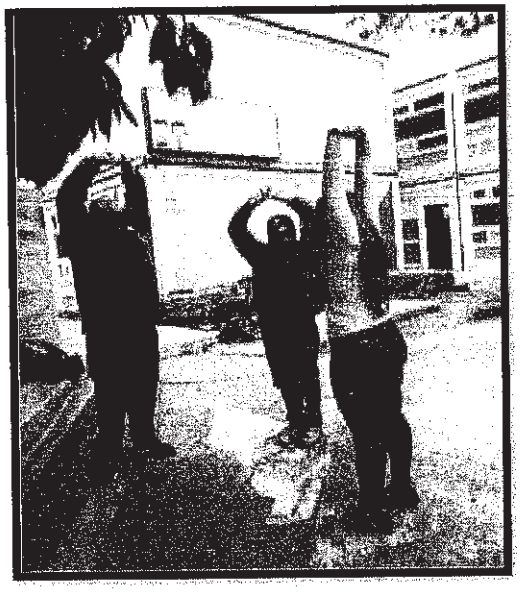






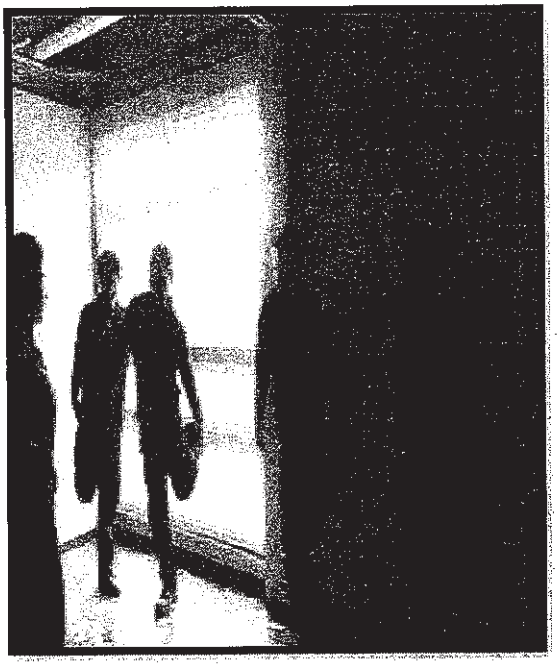

1797

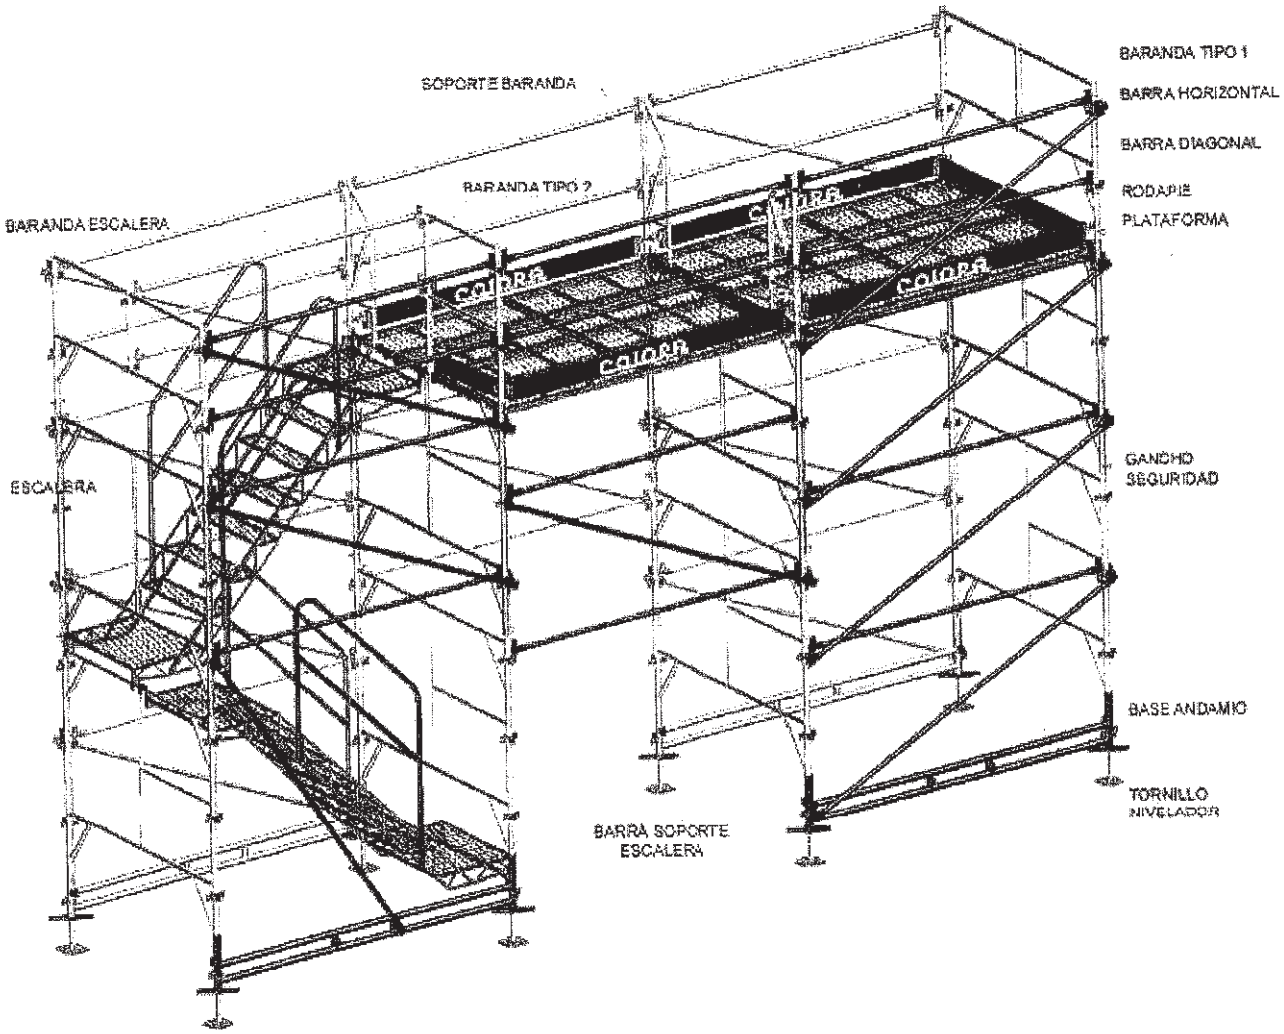


PROCEDIMIENTO DE ARMADO ANDAMIO ORTOGONAL

colora SAS

icontec ISO 9001


IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

Cód.: R-CM-004
Versión: 3
Fecha: Diciembre *2017*




MARCO ANDAMIO.

PESO: 23.4Kg.
LONGITUD: 1.54m.
ALTURA: 1.50 m.



MARCO BARANDA TIPO 1.

PESO: 18.0Kg.
LONGITUD: 1.54m.
ALTURA: 0.98 m.



MARCO BARANDA TIPO 2

PESO: 12.0Kg
LONGITUD: 0.69m.
ALTURA: 0.98 m.



BASTON BARANDA.

PESO: 8.0Kg.
LONGITUD: 0.20m.
ALTURA: 0.95m.



BASE TIPO 1.

PESO: 16.0Kg.
LONGITUD: 1.54m.

TOI




BASE TIPO 2.

PESO: 22.0Kg
LONGITUD:2.224m

1798


ARMADO ANDAMIO ORTOGONAL

1.




Colocación bases en paralelo a 1.50m con las margaritas centrales hacia afuera.
NOTA. Para torres cuya altura no supere 4 secciones su uso será opcional

2.

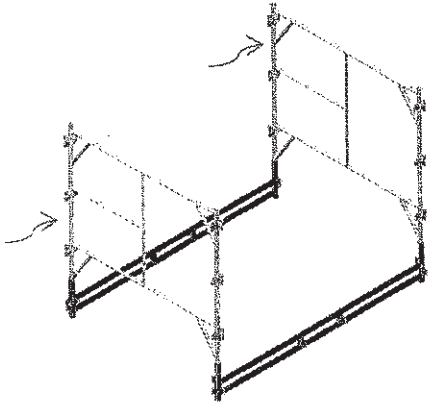


Instalación marcos sobre las bases. Salvo nota punto anterior

3.

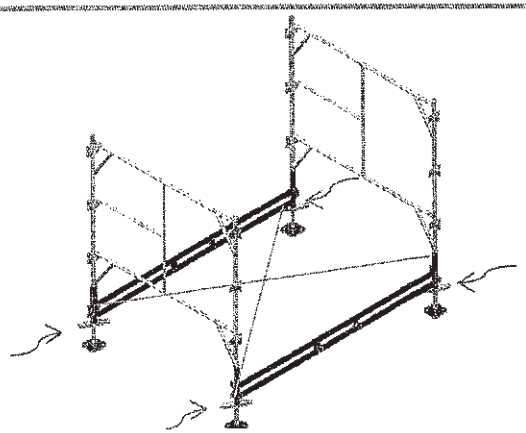


Instalación tornillos niveladores o ruedas. Si el terreno no está nivelado procederemos a nivelar el marco y la base. Las distancias diagonales deben ser las mismas en la base (línearoja).

4.

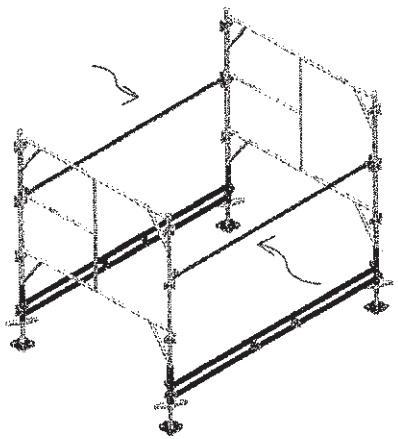

Instalaciones horizontales. Sin ajustarlas.


5.

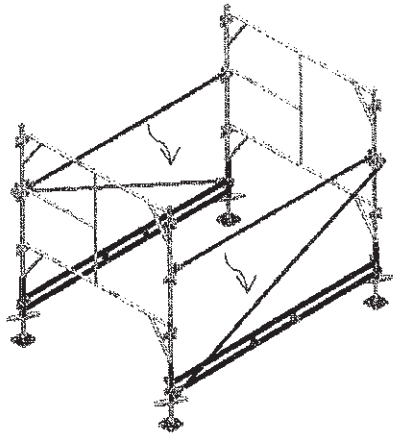

Instalaciones diagonales con sentidos diferentes en cada lado. Sin ajustarlas


Cód.: R-CM-004
Versión: 3
Fecha: Diciembre 2017

6.

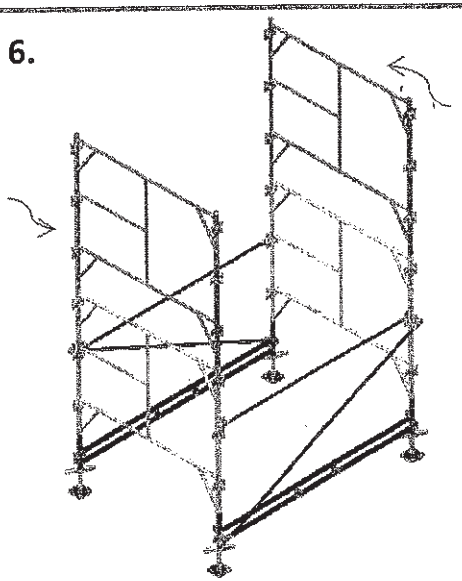

-Ajustar horizontales y diagonales.-
Instalación marcos sección 2.

8.

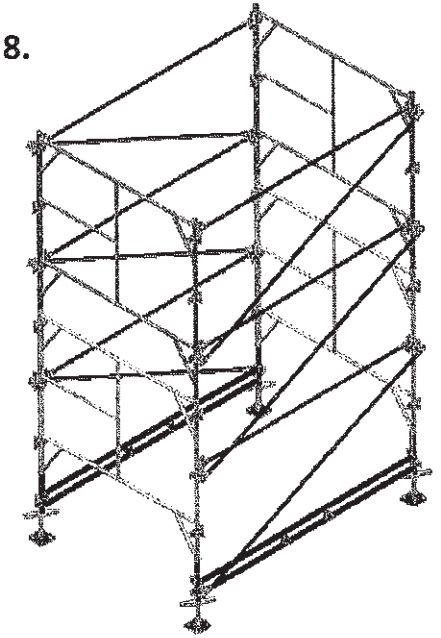

Repetir pasos 4-5-6- y 7. Según altura requerida.

7.

En la un
segurida

9.




- instala
horizon
-instala
–Instala

1799


ARMADO ANDAMIO OR. GONAL CON ES .LERA DE ACCESO

1.




Colocación bases en paralelo a 1.50m con las margaritas centrales hacia afuera.

2.

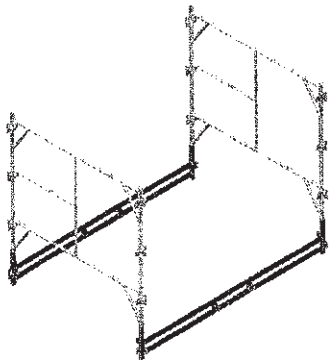


Instalación marcos sobre las bases.

3.

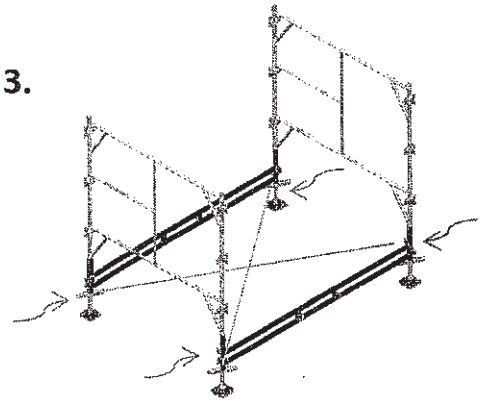


Instalación tornillos niveladores o ruedas. Si el terreno no está nivelado procederemos a nivelar el marco y la base. Las distancias diagonales deben ser las mismas en la base (línea roja).

4.

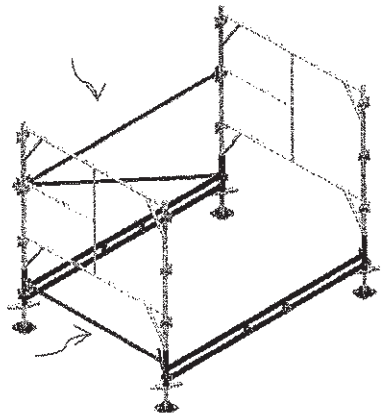


-Instalación horizontal y vertical en un costado lateral.
– Instalación horizontal L =1.54 m para inicio de escalera.

5.

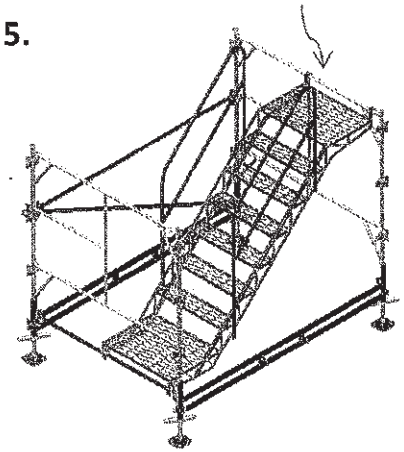


-Instalación de Escalera.

6.

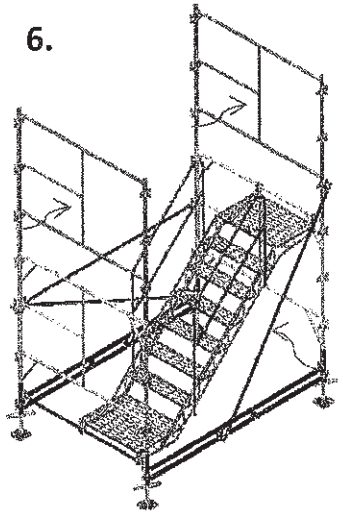


-Instalación Marcos sección 2 y diagonal desde margarita central.

7.

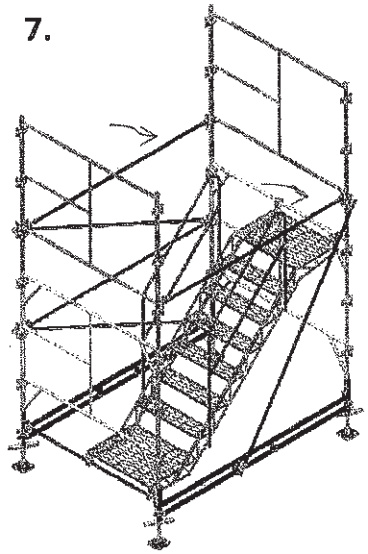


-Instalación Horizontales.

8.

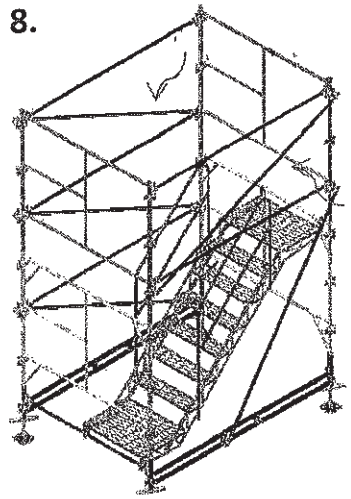

Instalaciones diagonales con sentidos diferentes en cada lado.

9.

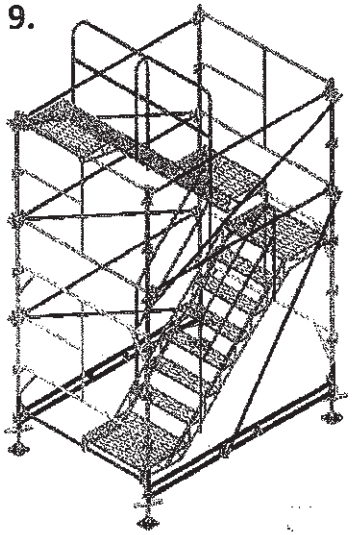

-Instalación de Escalera2.

145

1800

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: **FORMATO N°:**	FT-SST-027
	SG-SST	

FORMATO CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE CAMPO

Fecha:	01 Enero 2019
Versión:	001
	Pagina 1 de 1

MATERIAL ENTREGADO: CARTILLAS ___ DIAPOSITIVAS ___ FOLLETOS ___ OTROS ___
CHARLA DIARIA ___ CAPACITACION X DIVULGACION ___

DIRIJIDO POR: Cindy Katherine Ortiz G.

TEMA: 36-55+

CONTENIDO: - Brigada del 36 55+ = Responsabilidades grales
- Reglamento de Higiene y Seguridad
- Factores de Riesgo
- Procedimientos Para tareas de alto Riesgo

ALCANCE:

No.	NOMBRES	APELLIDOS	CARGO	N° CEDULA	FIRMA	CAPACITACION	PAUSAS ACTIVAS	DIVULGACION	DURACION
1	maximiliano	Paruago	Andenes	19370315		X			
2	Alex	ome	instalación Basculillo	83.211.617		X			
3	Fernander	ome	instalación Basculillo	83232282		X			
4	manuel	Herrera		1024574049		X			
5	[redacted]	[redacted]		[redacted]		X			
6	Juan Carlos	Herrera		1024560857		X			
7	Denan mercado			79 549.286		X			
8	Anbal mazabuel			76.357.307		X			
9	Wilson	Gonzalez Medina	Andenes	79.595.070		X			
10	Jose Bernardo	Mecha	Andenes	80.501.816		X			
11	Juan Noe	mecha	Andenes	3079919		X			
12	Fabio	Villalba	capataz instalación	19270931		X			
13	Luis Carlos	Martinez	instalación Basculillo	19197253		X			
14	Carlos Alberto	Martinez	instalación de Pozos	79760151		X			
15									

1801

146

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo			
NIVEL 7:	FORMATO N°:	FT-SST-093	
SG-SST			
FORMATO PERMISO TRABAJOS EN ALTURAS		Versión. 001	
		Fecha 01-01/2019	
		Pagina 1 de 2	

Fecha de inicio 08-03-2020
Fecha de terminacion 13-03-2020
Permiso consedido a:

Permiso N°
Altura a trabajar 6 mts

Descripción de la tarea a realizar:
Instalacion estructura cubierta

PERSONAL A EJECUTAR LA LABOR

Nombre y Apellido	N° Cedula	Firma DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6
Fabio Villalba	19.270.931	fvc	fvc	fvc	fvc	fvc	fvc
Luis Carlos martinez	19.187.253	LCM	LCM	LCM	LCM	LCM	LCM
Carlos Alberto martinez	79.760.157	CAM	CAM	CAM	CAM	CAM	CAM

IDENTIFICACION DE PELIGROS

FISICOS			QUIMICOS			BIOLOGICOS		
Iluminacion	SI	no	Polvos organicos e inorganicos	Si	NO	Virus	SI	NO
Vibraciones	SI	NO	Fibras	SI	NO	Bacterias	SI	NO
Radiacion ionizante	SI	NO	Liquidos	SI	NO	Hongos	SI	NO
Radiacion no ionizante	SI	NO	Gases y Vapores	SI	NO	Parasitos	SI	NO
Ruido	SI	x	Humos metalicos y no metalicos	SI	NO	Picaduras	SI	NO
Temperatura extremar (frio)	SI	NO	material particulado	SI	NO	Mordeduras	SI	NO
Temperatura extremar (calor)	SI	NO	**CONDICIONES DE SEGURIDAD**			fluidos o excrementos	SI	NO
PSICOSOCIAL			Mecanico	SI	NO	**FENOMENOS NATURALES**		
Gestion organiacional	SI	NO	Electrico	SI	NO	Sismo	SI	NO
Caracteristicas del trabajo	SI	NO	Locativo	SI	NO	Terremoto	SI	NO
Caracteristicas sociales	SI	NO	Tecnologico	SI	NO	Vendaval	SI	NO
Condiciones de la tarea	SI	NO	Publico	SI	NO	Inundacion	SI	NO
Interfase de la persona	SI	NO	Trabajo en Altrua	SI	NO	Derrumbe	SI	NO
Jornada de Trabajo	SI	NO	Trabaj en espacios confinados	SI	NO	Percipitaciones	SI	NO

BIOMECANICO

Posturas	SI	NO	Esfuerzo	SI	NO	Movimiento repetitivo	SI	NO	Manipulacion de cargas	SI

Descripcion de maquinas y herramientas a utilizar: Equipo de Soldadura, Polidura, Taladro Fijas

EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS A UTILIZAR

Casco con barbuquejo	SI X	NO	Eslingas de posicionamiento	SI	NO	Ascendedor	SI	X NO
Gafas de seguridad	SI X	NO	Linea de vida vertical portátil	SI	NO	Mosquetones	SI X	NO
Guantes	SI X	NO	Linea de vida vertical fija	SI	NO	Tapones auditivos	SI	X NO
Overol	SI X	NO	Linea de vida horizontal portátil	SI	NO	Protección respiratoria	SI	X NO
Botas de seguridad	SI X	NO	Linea de vida horizontal fija	SI	NO	Andamios certificados	SI	X NO
Arnés de cuerpo completo	SI X	NO	Adaptador de anclaje	SI	NO	Escaleras	SI	NO
Eslingas de protección contra caidas	SI X	NO	Descendedor	SI	NO X	OTROS:		

AUTORIZACIONES DEL DIA DE TRABAJO (coordinador de T.S.A. y Mestro o residente de obra)

DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6
COORDINADOR	COORDINADOR	COORDINADOR	COORDINADOR	COORDINADOR	COORDINADOR
MAESTRO	MAESTRO	MAESTRO	MAESTRO	MAESTRO	MAESTRO
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE OBRA	RESIDENTE OBRA	RESIDENTE OBRA	RESIDENTE OBRA	RESIDENTE OBRA
HORA INICIO 8:00 AM	HORA INICIO 8:00 AM	HORA INICIO 8:00 AM	HORA INICIO 8:00 AM	HORA INICIO 8:00 AM	HORA INICIO 8:00 AM
HORA FINALIZACION 5:00 PM	HORA FINALIZACION 5:00 PM	HORA FINALIZACION 5:00 PM	HORA FINALIZACION 5:00 PM	HORA FINALIZACION 5:00 PM	HORA FINALIZACION 5:00 PM
FECHA 09/03/2020	FECHA 09/03/2020	FECHA 10/03/2020	FECHA 10/03/2020	FECHA 11/03/2020	FECHA 13/03/2020

60

1802

-149

LISTA DE VERIFICACION						
CHEQUEO DIARIO	DIA 1 SI / NO	DIA 2 SI / NO	DIA 3 SI / NO	DIA 4 SI / NO	DIA 5 SI / NO	DIA 6 SI / NO
Los trabajadores tienen el pago vigente de la seguridad social?	SI SI	SI	SI	SI	SI	SI
Los trabajadores tienen el certificado de aptitud médico para trabajo en alturas?	SI SI	SI	SI	SI	SI	SI
Los trabajadores tienen la constancia de capacitación o certificado de la competencia laboral para prevención de caídas en trabajo en alturas?	SI SI	SI	SI	SI	SI	SI
El trabajador ha inspeccionado y revisado el estado de los elementos del sistema de contra caídas a utilizar?	SI SI	SI	SI	SI	SI	SI
El trabajador a inspeccionado el sistema de acceso (andamios certificados, escaleras, elevadores de personal, grúas con canasta) para trabajo en alturas?	SI SI	SI	SI	SI	SI	SI
Se ha revisado el estado de la estructura antes de iniciar el trabajo?	SI SI	SI	SI	SI	SI	SI
Se encuentran los equipos y/o herramientas revisadas y en buen estado?	SI SI	SI	SI	SI	SI	SI
Se han instalado el arnés de cuerpo completo?	SI SI	SI	SI	SI	SI	SI
Se cuenta con línea de vida con la resistencia adecuada?	SI SI	SI	SI	SI	SI	SI
Se cuenta con puntos de anclaje con la resistencia adecuada?	SI SI	SI	SI	SI	SI	SI
Al personal se le ha instruido en relación a los riesgos que puedan presentarse durante este trabajo?	SI SI	SI	SI	SI	SI	SI
El área de trabajo se ha delimitado y aislado convenientemente?	SI SI	SI	SI	SI	SI	SI
El trabajador tiene puesto todos los elementos de protección personal de acuerdo a los riesgos que se expondrá?	SI SI	SI	SI	SI	SI	SI
Permiten factores externos (condiciones atmosféricas) que el trabajo se haga con seguridad?	SI SI	SI	SI	SI	SI	SI
Los trabajadores han diligenciado la ficha de salud para trabajos en altura	SI SI	SI	SI	SI	SI	SI
Al personal se le ha instruido en relación a la utilización de los equipos para trabajar en alturas (arnés, mosquetones, cuerdas, etc.)	SI SI	SI	SI	SI	SI	SI
El supervisor si está enterado del trabajo y verificó las condiciones de seguridad en el sitio antes de darle el permiso	SI SI	SI	SI	SI	SI	SI
Observaciones:						

CIERRE DEL PERMISO				
Nombre coordinador de alturas	Cindy Ortiz Zambrano	Novedades en el cierre del permiso		
Cedula	60449747	cancelacion del permiso	SI	NO
Firma		reporte de actos y condiciones inseguras	SI	NO
Fecha y hora de cirre	13/03/2020 5:00PM	se reportan accidentes durante la ejecucion	SI	NO

-150 1823

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		
	NIVEL 7:	FORMATO N°:	FT-SST-093
	SG-SST		
FORMATO PERMISO TRABAJOS EN ALTURAS	Versión: 001	Fecha 01/01/2019	Pagina 1 de 2

Fecha de Inicio 09/03/2020
Fecha de terminacion 14/03/2020
Permiso consedido a:

Permiso N°
Altura a trabajar 4 MTS

Descripción de la tarea a realizar:
Pintura de la estructura

PERSONAL A EJECUTAR LA LABOR

Nombre y Apellido	N° Cedula	Firma DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6
Arbey mazabel	76.357.307	Arbey	Arbey	Arbey	Arbey	Arbey	Arbey

IDENTIFICACION DE PELIGROS

FISICOS			QUIMICOS			BIOLOGICOS		
Iluminacion	SI	NO X	Polvos organicos e inorganicos	SI	NO X	Virus	SI	NO X
Vibraciones	SI	NO X	Fibras	SI	NO X	Bacterias	SI	NO X
Radiacion ionizante	SI	NO X	Liquidos	SI	NO X	Hongos	SI	NO X
Radiacion no ionizante	SI	NO X	Gases y Vapores	SI	NO X	Parásitos	SI	NO X
Ruido	SI	X	Humos metalicos y no metalicos	SI	NO X	Picaduras	SI	NO X
Temperatura extremar (frio)	SI	NO X	material particulado	SI	NO X	Mordeduras	SI	NO X
Temperatura extremar (calor)	SI	NO X	CONDICIONES DE SEGURIDAD			fluidos o excrementos	SI	NO X

PSICOSOCIAL			Mecanico	SI	NO X	FENOMENOS NATURALES		
Gestion organiacional	SI	NO X	Electrico	SI	NO X	Sismo	SI X	NO
Caracteristicas del trabajo	SI	NO X	Locativo	SI	NO X	Terremoto	SI X	NO
Caracteristicas sociales	SI	NO X	Tecnologico	SI	NO X	Vendaval	SI X	NO
Condiciones de la tarea	SI	NO X	Publico	SI	NO X	Inundacion	SI	NO X
Interfase de la persóna	SI	NO X	Trabajo en Altrua	SI X	NO	Derrumbe	SI	NO X
Jornada de Trabajo	SI	NO X	Trabaj en espacios confinados	SI	NO X	Percipitaciones	SI X	NO

BIOMECANICO

Posturas	SI X	NO	Esfuerzo	SI	NO X	Movimiento repetitivo	SI X	NO	Manipulacion de cargas	SI

Descripcion de maquinas y herramientas a utilizar: Brocha - pintura

EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS A UTILIZAR

Casco con barbuquejo	SI X	NO	Eslingas de posicionamiento	SI X	NO	Ascendedor	SI	NO X
Gafas de seguridad	SI X	NO	Linea de vida vertical portátil	SI	NO X	Mosquetones	SI X	NO
Guantes	SI X	NO	Linea de vida vertical fija	SI	NO X	Tapones auditivos	SI	NO X
Overol	SI X	NO	Linea de vida horizontal portátil	SI	NO X	Protección respiratoria	SI X	NO
Botas de seguridad	SI X	NO	Linea de vida horizontal fija	SI	NO X	Andamios certificados	SI X	NO
Arnés de cuerpo completo	SI X	NO	Adaptador de anclaje	SI X	NO	Escaleras	SI	NO X
Eslingas de protección contra caidas	SI X	NO	Descendedor	SI	NO X	OTROS:		

AUTORIZACIONES DEL DIA DE TRABAJO (coordinador de T.S.A. y Mestro o residente de obra)

	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6
COORDINADOR	Cindy Ortiz	Cindy Ortiz	Cindy Ortiz	Cindy Ortiz	Cindy Ortiz	Cindy Ortiz
NOMBRE DEL MAESTRO	Silvio Perez	Silvio Perez	Silvio Perez	Silvio Perez	Silvio Perez	Silvio Perez
MAESTRO	RESIDENTE	RESIDENTE	RESIDENTE	RESIDENTE	RESIDENTE	RESIDENTE
HORA INICIO	8:00 AM	8:00 AM	8:00 AM	8:00 AM	8:00 AM	8:00 AM
HORA FINALIZACION	5:00 PM	5:00 PM	5:00 PM	5:00 PM	5:00 PM	5:00 PM
FECHA	09/03/2020	10/03/2020	11/03/2020	12/03/2020	13/03/2020	14/03/2020

-62

1804

~~15~~

LISTA DE VERIFICACION

CHEQUEO DIARIO	DIA 1 SI / NO	DIA 2 SI / NO	DIA 3 SI / NO	DIA 4 SI / NO	DIA 5 SI / NO	DIA 6 SI / NO
Los trabajadores tienen el pago vigente de la seguridad social?	SI SI	SI	SI	SI	SI	SI
Los trabajadores tienen el certificado de aptitud médico para trabajo en alturas?	SI SI	SI	SI	SI	SI	SI
Los trabajadores tienen la constancia de capacitación o certificado de la competencia laboral para prevención de caídas en trabajo en alturas?	SI SI	SI	SI	SI	SI	SI
El trabajador ha inspeccionado y revisado el estado de los elementos del sistema de contra caídas a utilizar?	SI SI	SI	SI	SI	SI	SI
El trabajador a inspeccionado el sistema de acceso (andamios certificados, escaleras, elevadores de personal, grúas con canasta) para trabajo en alturas?	SI SI	SI	SI	SI	SI	SI
Se ha revisado el estado de la estructura antes de iniciar el trabajo?	SI SI	SI	SI	SI	SI	SI
Se encuentran los equipos y/o herramientas revisadas y en buen estado?	SI SI	SI	SI	SI	SI	SI
Se han instalado el arnés de cuerpo completo?	SI SI	SI	SI	SI	SI	SI
Se cuenta con línea de vida con la resistencia adecuada?	SI SI	SI	SI	SI	SI	SI
Se cuenta con puntos de anclaje con la resistencia adecuada?	SI SI	SI	SI	SI	SI	SI
Al personal se le ha instruido en relación a los riesgos que puedan presentarse durante este trabajo?	SI SI	SI	SI	SI	SI	SI
El área de trabajo se ha delimitado y aislado convenientemente?	SI SI	SI	SI	SI	SI	SI
El trabajador tiene puesto todos los elementos de protección personal de acuerdo a los riesgos que se expondrá?	SI SI	SI	SI	SI	SI	SI
Permiten factores externos (condiciones atmosféricas) que el trabajo se haga con seguridad?	SI SI	SI	SI	SI	SI	SI
Los trabajadores han diligenciado la ficha de salud para trabajos en altura	SI SI	SI	SI	SI	SI	SI
Al personal se le ha instruido en relación a la utilización de los equipos para trabajar en alturas (arnés, mosquetones, cuerdas, etc.)	SI SI	SI	SI	SI	SI	SI
El supervisor si está enterado del trabajo y verificó las condiciones de seguridad en el sitio antes de darle el permiso	SI S	SI	SI	SI	SI	SI

Observaciones:

CIERRE DEL PERMISO

Nombre coordinador de alturas	Cindy Ortiz Zambrano	Novedades en el cierre del permiso		
Cedula	604497471	cancelacion del permiso	SI	NO
Firma		reporte de actos y condiciones inseguras	SI	NO
Fecha y hora de cirre	14/02/2020	se reportan accidentes durante la ejecucion	SI	NO

~~53~~

1805

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

NIVEL 7: **FORMATO N°:** FT-SST-027

SG-SST

Fecha:	01 Enero 2019
Versión:	001
	Pagina 1 de 1

FORMATO CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE CAMPO

MATERIAL ENTREGADO: CARTILLAS ___ DIAPOSITIVAS ___ FOLLETOS ___ OTROS ___
CHARLA DIARIA ___ CAPACITACION X DIVULGACION ___

DIRIJIDO POR: Cindy Katherine Ortiz S

TEMA: Riesgos laborales

CONTENIDO: Riesgos laborales, físicos, ergonómicos biomecánicos, uso correcto de los epp

ALCANCE:

No.	NOMBRES	APELLIDOS	CARGO	Nº CEDULA	FIRMA	CAPACITACION	PAUSAS ACTIVAS	DIVULGACION	DURACION
1	Andres Castañeda		obrero	1031.129891		✓			
2	Maximiliano Zuñiga		obrero	1.570.315		✓			
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

1806

153

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		
	NIVEL 7:	FORMATO N°:	FT-SST-093
	SG-SST		
FORMATO PERMISO TRABAJOS EN ALTURAS			Versión: 001 Fecha: 01/01/2019 Página 1 de 2

Fecha de Inicio 2 - Marzo 2020
Fecha de terminacion 6 - marzo 2020.
Permiso consedido a:

Permiso N°
Altura a trabajar 6.00 mts

Descripción de la tarea a realizar:
Pintura estructura interna

PERSONAL A EJECUTAR LA LABOR

Nombre y Apellido	N° Cedula	Firma DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6
Norbey Muñoz	1193545340						
Arbey Mejia	76357307						

IDENTIFICACION DE PELIGROS

FISICOS			QUIMICOS			BIOLOGICOS		
Iluminacion	SI	NO X	Polvos organicos e inorganicos	SI	NO X	Virus	SI	NO X
Vibraciones	SI	NO X	Fibras	SI	NO X	Bacterias	SI	NO X
Radiacion ionizante	SI	NO X	Liquidos	SI	NO X	Hongos	SI	NO X
Radiacion no ionizante	SI	NO X	Gases y Vapores	SI	NO X	Parasitos	SI	NO X
Ruido	SI	NO X	Humos metalicos y no metalicos	SI	NO X	Picaduras	SI	NO X
Temperatura extremas (frio)	SI	NO X	material particulado	SI	NO X	Mordeduras	SI	NO X
Temperatura extremas (calor)	SI	NO X	**CONDICIONES DE SEGURIDAD**			fluidos o excrementos	SI	NO X
PSICOSOCIAL			Mecanico	SI	NO X	**FENOMENOS NATURALES**		
Gestion organizacional	SI	NO X	Electrico	SI	NO X	Sismo	SI	NO X
Caracteristicas del trabajo	SI	NO X	Locativo	SI	NO X	Terremoto	SI	NO X
Caracteristicas sociales	SI	NO X	Tecnologico	SI	NO X	Vendaval	SI	NO X
Condiciones de la tarea	SI	NO X	Publico	SI	NO X	Inundacion	SI	NO X
Interfase de la persona	SI	NO X	Trabajo en Altrua	SI X	NO	Derrumbe	SI	NO X
Jornada de Trabajo	SI	NO X	Trabaj en espacios confinados	SI	NO X	Precipitaciones	SI X	NO

BIOMECANICO

Posturas	SI	NO X	Esfuerzo	SI	NO X	Movimiento repetitivo	SI X	NO	Manipulacion de cargas	SI	NO X

Descripcion de maquinas y herramientas a utilizar: Compresor - Rodillos - Pulidora

EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS A UTILIZAR

Casco con barbuquejo	SI X	NO	Eslingas de posicionamiento	SI X	NO	Ascendedor	SI X	NO
Gafas de seguridad	SI X	NO	Linea de vida vertical portátil	SI X	NO	Mosquetones	SI X	NO
Guantes	SI X	NO	Linea de vida vertical fija	SI	NO X	Tapones auditivos	SI X	NO
Overol	SI X	NO	Linea de vida horizontal portátil	SI	NO X	Protección respiratoria	SI X	NO
Botas de seguridad	SI X	NO	Linea de vida horizontal fija	SI	NO X	Andamios certificados	SI	NO X
Arnés de cuerpo completo	SI X	NO	Adaptador de anclaje	SI	NO X	Escaleras	SI	NO X
Eslingas de protección contra caidas	SI X	NO	Descendedor	SI X	NO	OTROS:		

AUTORIZACIONES DEL DIA DE TRABAJO (coordinador de T.S.A. y Maestro o residente de obra)

DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6
	COORDINADOR	COORDINADOR	COORDINADOR	COORDINADOR	COORDINADOR
	MAESTRO	MAESTRO	MAESTRO	MAESTRO	MAESTRO
	RESIDENTE OBRA	RESIDENTE OBRA	RESIDENTE OBRA	RESIDENTE OBRA	RESIDENTE OBRA
8:00	HORA INICIO	HORA INICIO	HORA INICIO	HORA INICIO	HORA INICIO
HORA FINALIZACION	HORA FINALIZACION	HORA FINALIZACION	HORA FINALIZACION	HORA FINALIZACION	HORA FINALIZACION
2 - Marzo 2020	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA

1807

154

LISTA DE VERIFICACION

CHEQUEO DIARIO	DIA 1 SI / NO	DIA 2 SI / NO	DIA 3 SI / NO	DIA 4 SI / NO	DIA 5 SI / NO	DIA 6 SI / NO
Los trabajadores tienen el pago vigente de la seguridad social?	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Los trabajadores tienen el certificado de aptitud médico para trabajo en alturas?	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Los trabajadores tienen la constancia de capacitación o certificado de la competencia laboral para prevención de caídas en trabajo en alturas?	SI	SI	SI	SI	SI	SI
El trabajador ha inspeccionado y revisado el estado de los elementos del sistema de contra caídas a utilizar?	SI	SI	SI	SI	SI	SI
El trabajador a inspeccionado el sistema de acceso (andamios certificados, escaleras, elevadores de personal, grúas con canasta) para trabajo en alturas?	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Se ha revisado el estado de la estructura antes de iniciar el trabajo?	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Se encuentran los equipos y/o herramientas revisadas y en buen estado?	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Se han instalado el arnés de cuerpo completo?	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Se cuenta con línea de vida con la resistencia adecuada?	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Se cuenta con puntos de anclaje con la resistencia adecuada?	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Al personal se le ha instruido en relación a los riesgos que pueden presentarse durante este trabajo?	SI	SI	SI	SI	SI	SI
El área de trabajo se ha delimitado y aislado convenientemente?	SI	SI	SI	SI	SI	SI
El trabajador tiene puesto todos los elementos de protección personal de acuerdo a los riesgos que se expondrá?	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Permiten factores externos (condiciones atmosféricas) que el trabajo se haga con seguridad?	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Los trabajadores han diligenciado la ficha de salud para trabajos en altura	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Al personal se le ha instruido en relación a la utilización de los equipos para trabajar en alturas (arnés, mosquetones, cuerdas, etc.)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
El supervisor si está enterado del trabajo y verificó las condiciones de seguridad en el sitio antes de darlo el permiso	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Observaciones:						

CIERRE DEL PERMISO

		Novedades en el cierre del permiso		
Nombre coordinador de alturas	Andy Ortiz			
Cedula	6041497478	cancelacion del permiso	SI	NO
Firma		reporte de actos y condiciones inseguras	SI	NO
Fecha y hora de cirre		se reportan accidentes durante la ejecucion	SI	NO

56

1808

155

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

NIVEL 7: **FORMATO N°:** FT-SST-027

SG-SST

FORMATO CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE CAMPO

Fecha:	01 Enero 2019
Versión:	001
	Pagina 1 de 1

MATERIAL ENTREGADO: CARTILLAS ___ DIAPOSITIVAS ___ FOLLETOS ___ OTROS ___

CHARLA DIARIA ___ CAPACITACION X DIVULGACION ___

DIRIJIDO POR: Cindy Ortiz

TEMA: Capacitacion Riesgos Laborales - Plan de emergencia

CONTENIDO: Clases de Riesgos
GG-SST
Plan de emergencias

ALCANCE:

NOMBRES	APELLIDOS	CARGO	Nº CEDULA	FIRMA	CAPACITACION	PAUSAS ACTIVAS	DIVULGACION	DURACION
Miller Arley	Marin Coste	Auxiliar AA	1233405366		X			
Alexandra Diaz	Diaz Nuvan	Residente Social	52312461		X			
Silvia Reppek	Perez Garcia	Residente	1030623156		X			

1809

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

NIVEL 7: **FORMATO N°:** FT-SST-027

SG-SST

FORMATO CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE CAMPO

Fecha:	01 Enero 2019
Versión:	001
	Pagina 1 de 1

MATERIAL ENTREGADO: CARTILLAS ___ DIAPOSITIVAS ___ FOLLETOS ___ OTROS ___

CHARLA DIARIA ___ **CAPACITACION** X **DIVULGACION** ___

DIRIJIDO POR: Cindy Ortiz

TEMA: Capacitacion Riesgos Laborales - Plan de emergencia

CONTENIDO:
Clases de Riesgos
36-55
Plan de emergencias

ALCANCE:

NOMBRES	APELLIDOS	CARGO	Nº CEDULA	FIRMA	CAPACITACION	PAUSAS ACTIVAS	DIVULGACION	DURACION
Miller Arley	Marin Coste	Auxiliar AA	1233405366		X			
Alexandra Diaz	Diaz Nuvan	Residente Sand	52312461		X			
Silvia Reppek	Perez Garcia	Residente	1030623156		X			

15 Min

1810

BUREAU VERITAS
Certification

CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

157

CO18.00567
Certificación Continua
(Esquema Tipo 5 ISO/IEC 17067:2013)

This certifies that the products:
Se certifica que los productos:

ANDAMIOS ORTOGONAL PARA TRABAJO EN ALTURAS Y SUS COMPONENTES
Referencias certificadas: 15. Ver anexo

Manufactured by:
Fabricado por:

COLORA LTDA
CRA 23 NO. 78 -31
COLOMBIA

Satisfies the requirements of the Standard
Satisface los requerimientos del estándar

NTC 1642:1981 "Requisitos generales de seguridad para los andamios utilizados en la construcción"
Made in:
Hecho en:

COLOMBIA

This certificate is under the continuous compliance of BUREAU VERITAS CERTIFICATION general conditions, and is valid until
Este certificado está sujeto al continuo cumplimiento de las Condiciones Generales de BUREAU VERITAS CERTIFICATION y es válido hasta:

Febrero 27 de 2021
At / on
Emitido en:

Versión: No. 00 Fecha de revisión: Febrero 28 de 2018

ACREDITADO ONAC
ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-008

Luis Carlos Rodriguez
BUREAU VERITAS CERTIFICATION

150

1811

158

ANEXO DE REFERENCIAS CERTIFICADAS

ITEM	PRODUCTO	REFERENCIA
1	BASE MARCO	AND.-005
2	HORIZONTAL TIPO 1	AND.-006
3	HORIZONTAL TIPO 2	AND.-007
4	MARCO ANADAMIO	AND.-001
5	ESCALERA	AND.-011
6	BASTON BARANDA	AND.-004
7	TORNILLO NIVELADOR	AND.-010
8	PLATAFORMA	AND.-009
9	MARCO BARANDA	AND.-002
10	RUEDA	AND.-013
11	DIAGONAL	AND.-008
12	MARCO BARANDA TIPO 2	AND.-003
14	RODAPIE TIPO 1	AND.-014
15	RODAPIE TIPO 2	AND.-015

BUREAU VERITAS
Certification

1812

NOTA: Registre la entrega inicial (antes de iniciar labores) y de reposición de los EPPs

FECHA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO/ACTIVIDAD	DOTACIÓN ENTREGADA			ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS																								TIPO DE ENTREGA		FIRMA DEL TRABAJADOR Nota: Recibo los elementos y me responsabilizo del cuidado y uso de los mismos	OBSERVACIONES (otras especificaciones del EPP)
						CABEZA	VISUAL			AUDITIVA		RESPIRATORIA		MANOS					PIES			ALTURAS		PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS		OTROS (chaleco en vía, para identificarse)						
			Camisa	Pantalón	Overol	Casco	Gafas de seguridad	Gafas para soldador	Careta para soldar	Protector auditivo de inserción	Protector Auditivo de copa	Mascarillas	Respirador con filtro	Guantes de carnaza	Guantes de vaqueta	Guantes de Nitrilo	Guantes dieléctricos	Guantes de Nitrilo Cacho	Botas de seguridad en cuero con puntera	Calzado de seguridad en cuero con puntera	Calzado de seguridad dieléctrico	Arnés	Eslingas	Capa en PVC	Overol impermeable en PVC	Chaleco reflectivo	OTRO ¿CUÁL?		INICIAL	REPOSICIÓN		
10/2/20	Juan Carlos Herra	oficial										X				X		X											X			
10/2/20	Aibey Nasabel	oficial										X		X															X			
2/2/20	Denar Mercado	oficial										X		X																		
7/2/20	Aibey Nasabel																															
7/2/20	Juan carlos																															
8/2/20	Denar Mercado																															
8/2/20	Manuel H													X																		
1/2/20	Norbey.											X			X																	
1/2/20	Pablo andres.																															
1/2/20	Juan carlos																															
9/2/20	Norbey											X																				
9/2/20	Norbey Muñoz															X																
1/3/20	Denar Mercado											X				X																
3/20	Aibey Nasabel											X				X																
3/20	Manuel. Herrera.															X																
3/20	Maximiliano Fonseca																	X														
3/20	Derian Mercado											X																				
3/20	Manuel Herrera											X																				

7813

S. ma de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

NIVEL 7: **FORMATO N°:** FT-SST-027

SG-SST

FORMATO CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE CAMPO

Fecha:	01 Enero 2019
Versión:	001
	Pagina 1 de 1

MATERIAL ENTREGADO: CARTILLAS ___ DIAPOSITIVAS ___ FOLLETOS ___ OTROS ___
CHARLA DIARIA ___ CAPACITACION X DIVULGACION

DIRIJIDO POR: Cindy Katherine Ortiz B

TEMA: Riesgos laborales

CONTENIDO: Riesgos laborales, físicos, ergonomicos biomecanicos, uso correcto de los epp

ALCANCE:

No.	NOMBRES	APELLIDOS	CARGO	Nº CEDULA	FIRMA	CAPACITACION	PAUSAS ACTIVAS	DIVULGACION	DURACION
1	Andres Castañeda		obrero	1031.129891		✓			
2	Maximiliano Arango		obrero	41370315		✓			
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

1814

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS N°:	FT-SST-058
	SG-SST	
FORMATO DE VERIFICACIÓN DE EMERGENCIAS	Fecha:	01 Enero de
	Versión:	001
		Página 1 de 1

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE EMERGENCIAS

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION: Cindy Katherine OAB Zamboruno

FECHA:

N°	SISTEMAS DE SEGURIDAD EMERGENCIAS	MANTENIMIENTO REALIZADO		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		SI	NO		
1	Alarmas o Sirenas	X			
2	Detectores de humo	N.A			
3	Escaleras y barandales	X			
4	Puertas de Emergencia	X			
6	Pulsadores Manuales contra incendio	N.A			
5	Señalización preventiva e informativa de Emergencia	X			
6	Sistema de iluminación de emergencia	N.A			
7	Sistema eléctrico	X			
8	Sistema Hidráulico	X			
9	Sistemas de comunicación interna	X			
10	Sistemas de Sanitarios y aguas lluvias	X			

Firma de quien realiza la inspección:

7815

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		
	NIVEL 7:	**FORMATOS N°:**	FT-SST-061
	SG-SST		
FORMATO INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL		Fecha:	01 Enero de 2019
		Versión:	001
		Pagina 1 de 1	

FECHA: 21/02/2020

AREA INSPECCIONADA: Jardin Cometa

NOMBRE DE QUIEN REPORTA: Cindy K Ortiz Zambrano

No.	NOMBRE	CARGO	DEBE USAR								USA		ESTADO			NO USA POR			MEDIDAS DE CONTROL				
			O	C	G	B	PR	PA	PV	OT	SI	NO	B	R	M	N	NS	NQ	1	2	3	4	5
1	Wilmar Cardon Mejia		X	X	X	X	X		X		X		X						X				
2	Jhon C. Herrera		X	X	X	X	X		X		X		X						X				
3	Pablo Castañeda		X	X	X	X	X		X		X		X						X				
4	Narbey Muñoz		X	X	X	X	X		X		X		X						X				
5	Manuel Herrera		X	X	X	X	X		X		X		X						X				
6	Maximiliano Pareja		X	X	X	X	X		X		X		X						X				
7	Jhon Hoecha Bello		X	X	X	X	X		X		X		X						X				
8	Denar Hercudo		X	X	X	X	X		X		X		X						X				
9	Arbey Mazabel		X	X	X	X	X		X		X		X						X				
10	Fabian Rodriguez		X	X	X	X	X		X		X		X						X				

EPP FALTANTE POR PERSONA										
No	CARGO	A	B	C	D	E	F	G	H
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

DEBE USAR	ESTADO	NO USA POR	MEDIDAS DE CONTROL
O- OVEROL	B- BUENO	N- NO SABE	1. INSTRUCCIÓN
C- CASCO			2. MOTIVACION
G- GUANTES			3. CAMBIO DE EPP
B- BOTAS			4. MEDIDAS PENDIENTES
PR- PROTECCION RESPIRATORIA			5. OTRAS
PA- PROTECTORES AUDITIVOS	R- REGULAR	NS- NO SUMINISTRAN	Cual?
PV- GAFAS PROTECTORAS			
OT- OTRO			
Cual?	M- MALO	NQ- NO QUIERE	

OBSERVACIONES

Cindy K Ortiz

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

FIRMA

Cindy K Ortiz Zambrano

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SG-SST

1816

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS N°:	FT-SST-056
	SG-SST	103

FORMATO INSPECCIÓN LOCATIVA	Fecha:	01 Enero de 2019
	Versión:	001
		Página 1 de 2

Fecha de Inspección: 19/02/2020	**Area / Unidad operativa:** Jardín Arneta	**Localidad:**	Kennedy
Inspección realizada por: Cindy Ortiz	**Nombre responsable unidad:**	Alfonso Reyes Director obra	
Dirección: Carrera 74A #42G-52Sur	**Telefono:**		

LISTA DE CHEQUEO

No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE NA	OBSERVACIONES
1	**PELIGROS FISICOS**				
1.1	Existe buena iluminación artificial y natural.	X			
1.2	Las luminarias están en buen estado.	X			
1.3	Hay buena ventilación en el área.	X			
1.4	El nivel de ruido es adecuado (Condiciones Normales inferiores a 85 db).	X			
1.5	Existen controles de ruido (control en la fuente, en el medio de propagacion, en el trabajador).			—	
1.6	La temperatura es confortable.	X			
	PELIGROS LOCATIVOS				
	Los muros están en buen estado (Sin grietas, sin humedad, pintura buen estado).			—	
2.2	Escaleras en buen estado (paso manos, antideslizantes).	X			
2.3	Pisos en buen estado.	X			
2.4	Ventanas, puertas en buen estado (manijas, chapas).	X			
2.5	Techos en buen estado (Sin goteras).	X			
2.6	Areas de circulación despejadas (escaleras, zonas de tránsito en almacen, etc).	X			
2.7	Están claramente demarcadas las areas de trabajo y rutas de tránsito.	X			
	En general se observan las sillas en buen estado?			—	
	Las divisiones modulares, escritorio y cajones se encuentran en buenas condiciones.			—	
3	**PELIGROS ELÉCTRICOS**				
3.1	Cables eléctricos debidamente entubados.	X			
3.2	Los empalmes o conexiones estan en buen estado.	X			
3.3	Tomas e interuptores en buen estado	X			
3.4	Se observa cajas o toma corriente sin sobrecarga.	X			
3.5	Cables en buen estado.	X			
3.6	Los tableros, cajas y circuitos estan identificados.	X			
3.7	Los tableros y cajas estan libres de obstáculos.	X			
3.8	Existe señalización de peligros.	X			
4	**PELIGROS DE SEGURIDAD**				
4.1	Los extintores son los adecuados al tipo de peligros del área.	X			
	Extintores de carga vigente.	X			
	Extintores libre de obstaculos.	X			
4.4	Existe señalización de extintores.	X			
4.5	Existe señalización en todas las instalaciones y en las salidas de emergencia.	X			
4.6	Las áreas de salida de emergencia y punto de encuentro se encuentran despejadas	X			
4.7	El personal cuenta con los elementos de protección personal (EPP).	X			
4.8	Hay camilla en el área. (Solo si es necesaria).	X			
	Hay botiquín y control de consumo.	X			
	Se tiene la lista de teléfonos de emergencia a la mano?.	X			
4.11	Se tiene la lista de centros de salud u hospitales de referencia cercanos?	X			
5	**PELIGROS BIOLOGICOS**				
5.1	El area esta libre de insectos y roedores.	X			
6	**PELIGROS BIOMECANICO**				
6.1	Espacio de trabajo adecuado (para miembros inferiores, desplazamientos y salidas del puesto de trabajo)	X			
6.2	Altura adecuada de la pantalla del computador respecto a la horizontal (el borde superior de la pantalla se encuentra a la misma altura de los ojos del trabajador)			—	
6.3	Silla en buenas condiciones, espaldar, asiento, patas o base			—	
6.4	El peso de los objetos que levanta o almacena están dentro de los límites permisibles	X			
7	**ORDEN Y ASEO**				
7.1	El área se encuentra organizada.	X			
7.2	Se realiza la clasificación de residuos sólidos en forma correcta.	X			
7.3	Los residuos peligrosos se separan y disponen con empresas autorizadas.	X			

105

1817

7,4	El sitio inspeccionado se encuentra en buen estado de aseo y mantenimiento.	X			
8	**SANEAMIENTO BASICO**				
8,1	Servicios higiénicos en buen estado y limpieza.	X			
8,2	Luminarias de baños en buen estado.	X			
8,3	Hay papel higiénico, jabón, toallas y papeleras con pedal y tapa.	X			
8,4	Estan los tageros limpios en buen estado.	X			
8,5	Se tienen reguladores o ahorradores de agua en los lavamanos y sanitarios.			—	
9	**PELIGRO MECANICO (HERRAMIENTAS DE OFICINA)**				
9,1	Equipos y herramientas de oficina en buen estado			—	
9,2	Archivo rodante en buen estado			—	
10	**PREGUNTAS Y OBSERVACION DE TAREAS (Hacer verificación a través de la observación de los trabajadores)**				
10,1	Los funcionarios cumplen con las normas de seguridad de su actividad.	X			
10,2	Los funcionarios conocen los peligros a los que están expuestos.	X			
10,3	El personal tiene claro que hacer en caso de un incidente , Accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral.	X			
10,4	Los funcionarios conocen la Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo.	X			
10,5	Los funcionarios saben como usar y cuidar sus EPP.	X			

11	**MEDIO AMBIENTE**	**BUEN ESTADO**	**REGULAR ESTADO**	**MAL ESTADO**	**OBSERVACIONES**
11,1 Agua y energía	Horno microondas. (Si aplica)				
	Nevera. (Si aplica)				
	Cafetera. (Si aplica)				
	Aire Acondicionado. (Si aplica)				
	Impresora / fotocopiadora. (Si aplica)	X			
	Computador. (Si aplica)	X			
	Otro.				
11,2 Sustancias químicas	El area cuenta con las tarjetas de emergencia.				
	El area cuenta con las Hojas de seguridad.				
	Otro.				

OBSERVACIONES

Firma Responsable Inspección

Firma Responsable del SG-SST

1818

165

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7:	FORMATO N°: FT-SST-093
	SG-SST	
FORMATO PERMISO TRABAJOS EN ALTURAS		Versión. 001 Fecha 01/01/2019 Pagina 1 de 2

Fecha de inicio 03-03-2020
Fecha de terminacion 13-03-2020
Permiso consedido a:

Permiso N°
Altura a trabajar 6.00 m/s

Descripción de la tarea a realizar:
Instalacion estructura cubierta

PERSONAL A EJECUTAR LA LABOR

Nombre y Apellido	Nº Cedula	Firma DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6
Fabio Villalba	19.270.931	fve	fve	fve	fve		
Luis Carlos martinez	19.187.253	LCM	LCM	LCM	LCM		
Carlos Alberto martinez	79.760.157	CAM	CAM	CAM	CAM		

IDENTIFICACION DE PELIGROS

FISICOS			QUIMICOS			BIOLOGICOS		
Iluminacion	SI	no	Polvos organicos e inorganicos	SI	NO	Virus	SI	NO
Vibraciones	SI	NO	Fibras	SI	NO	Bacterias	SI	NO
Radiacion ionizante	SI	NO	Liquidos	SI	NO	Hongos	SI	NO
Radiacion no ionizante	SI	NO	Gases y Vapores	SI	NO	Parasitos	SI	NO
Ruido	SI	x	Humos metalicos y no metalicos	SI	NO	Picaduras	SI	NO
Temperatura extremar (frio)	SI	NO	material particulado	SI	NO	Mordeduras	SI	NO
Temperatura extremar (calor)	SI	NO	CONDICIONES DE SEGURIDAD			fluidos o excrementos	SI	NO
PSICOSOCIAL			Mecanico	SI	NO	FENOMENOS NATURALES		
Gestion organizacional	SI	NO	Electrico	SI	NO	Sismo	SI	NO
Caracteristicas del trabajo	SI	NO	Locativo	SI	NO	Terremoto	SI	NO
Caracteristicas sociales	SI	NO	Tecnologico	SI	NO	Vendaval	SI	NO
Condiciones de la tarea	SI	NO	Publico	SI	NO	Inundacion	SI	NO
Interfase de la persona	SI	NO	Trabajo en Altrua	SI	NO	Derrumbe	SI	NO
Jornada de Trabajo	SI	NO	Trabaj en espacios confinados	SI	NO	Percipitaciones	SI	NO

BIOMECANICO

Posturas	SI	NO	Esfuerzo	SI	NO	Movimiento repetitivo	SI	NO	Manipulacion de cargas	SI	

Descripcion de maquinas y herramientas a utilizar: Equipo de soldadura, Polidura, Taladro Fijas

EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS A UTILIZAR

Casco con barbuquejo	SI	NO	Eslingas de posicionamiento	SI	NO	Ascendedor	SI	NO
Gafas de seguridad	SI	NO	Linea de vida vertical portátil	SI	NO	Mosquetones	SI	NO
Guantes	SI	NO	Linea de vida vertical fija	SI	NO	Tapones audilivos	SI	NO
Overol	SI	NO	Linea de vida horizontal portátil	SI	NO	Protección respiratoria	SI	NO
Botas de seguridad	SI	NO	Linea de vida horizontal fija	SI	NO	Andamios certificados	SI	NO
Arnés de cuerpo completo	SI	NO	Adaptador de anclaje	SI	NO	Escaleras	SI	NO
Eslingas de protección contra caídas	SI	NO	Descendedor	SI	NO	OTROS:		

AUTORIZACIONES DEL DIA DE TRABAJO (coordinador de T.S.A. y Mestro o residente de obra)

DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6
COORDINADOR	COORDINADOR	COORDINADOR	COORDINADOR	COORDINADOR	COORDINADOR
MAESTRO	MAESTRO	MAESTRO	MAESTRO	MAESTRO	MAESTRO
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE OBRA	RESIDENTE OBRA	RESIDENTE OBRA	RESIDENTE OBRA	RESIDENTE OBRA
HORA INICIO 8:00 AM	HORA INICIO 8:00 AM	HORA INICIO 8:00 AM	HORA INICIO 8:00 AM	HORA INICIO	HORA INICIO
HORA FINALIZACION 5:00 PM	HORA FINALIZACION 5:00 PM	HORA FINALIZACION 5:00 PM	HORA FINALIZACION	HORA FINALIZACION	HORA FINALIZACION
FEHCA 03/03/2020	FEHCA 04/03/2020	FEHCA 10/03/2020	FEHCA	FEHCA	FEHCA

1819

166

LISTA DE VERIFICACION				
CHEQUEO DIARIO	DIA 1 SI / NO	DIA 2 SI / NO	DIA 3 SI / NO	DIA 4 SI / NO
Los trabajadores tienen el pago vigente de la seguridad social?	SI SI	SI	SI	SI
Los trabajadores tienen el certificado de aptitud médico para trabajo en alturas?	SI SI	SI	SI	SI
Los trabajadores tienen la constancia de capacitación o certificado de la competencia laboral para prevención de caídas en trabajo en alturas?	SI SI	SI	SI	SI
El trabajador ha inspeccionado y revisado el estado de los elementos del sistema de contra caídas a utilizar?	SI SI	SI	SI	SI
El trabajador a inspeccionado el sistema de acceso (andamios certificados, escaleras, elevadores de personal, grúas con canasta) para trabajo en alturas?	SI SI	SI	SI	SI
Se ha revisado el estado de la estructura antes de iniciar el trabajo?	SI SI	SI	SI	SI
Se encuentran los equipos y/o herramientas revisadas y en buen estado?	SI SI	SI	SI	SI
Se han instalado el arnés de cuerpo completo?	SI SI	SI	SI	SI
Se cuenta con linea de vida con la resistencia adecuada?	SI SI	SI	SI	SI
Se cuenta con puntos de anclaje con la resistencia adecuada?	SI SI	SI	SI	SI
Al personal se le ha instruido en relación a los riesgos que puedan presentarse durante este trabajo?	SI SI	SI	SI	SI
El área de trabajo se ha delimitado y aislado convenientemente?	SI SI	SI	SI	SI
El trabajador tiene puesto todos los elementos de protección personal de acuerdo a los riesgos que se expondrá?	SI SI	SI	SI	SI
Permiten factores externos (condiciones atmosféricas) que el trabajo se haga con seguridad?	SI SI	SI	SI	SI
Los trabajadores han diligenciado la ficha de salud para trabajos en altura	SI SI	SI	SI	SI
Al personal se le ha instruido en relación a la utilización de los equipos para trabajar en alturas (arnés, mosquetones, cuerdas, etc.)	SI SI	SI	SI	SI
El supervisor si está enterado del trabajo y verificó las condiciones de seguridad en el sitio antes de darle el permiso	SI SI	SI	SI	SI

Observaciones:

CIERRE DEL PERMISO		Novedades e
Nombre coordinador de alturas		cancelacion del permiso
Cedula		reporte de actos y condiciones inseguras
Firma		se reportan accidentes durante la ejecucion
Fecha y hora de cirre		

NOMBRE DEL INDICADOR:	Variación del Indice de Lesiones Incapacitantes (ILI)		
OBJETIVO TÁCTICO:	Prevenir y controlar los Riesgos que puedan generar incidentes a los trabajadores, al medio ambiente, la comunidad y/o daños a la propiedad.		
OBJETIVO OPERATIVO:	Reducir el índice de lesiones incapacitantes por Accidentes Laborales y Enfermedades Laborales		
META:	-5%	FRECUENCIA DE ANÁLISIS:	Mensual
FÓRMULA:	% Variación Indice de Lesiones Incapacitantes= (ILI 2020 - ILI 2019)/ ILI 2019		
TIPO DE INDICADOR:	Efectividad	ORIGEN DE DATOS:	Estadisticas de accidentalidad
CARGO RESPONSABLE DEL CÁLCULO:	Responsable SG-SST	CARGO RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:	Gerencia y Responsable SG-SST


2. MEDICIÓN DEL INDICADOR

PERIODO DE ANALISIS	2020	VR. ACUMULADO	0%

DATOS

VARIABLES	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ACUM.
N° Accidentes	0	0	0										0
N° Dias de Incapacidad	0	0	0										0
Horas Hombre trabajadas	100	100	60										260
ILI 2020	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
N° Accidentes	0	0	0										0
N° Dias de Incapacidad	0	0	0										0
Horas Hombre trabajadas	100	100	60										260
ILI 2020	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VALOR REAL	**0%**	**0%**	**0%**										**0%**
META	**-5%**	**-5%**	**-5%**	**-5%**	**-5%**	**-5%**	**-5%**	**-5%**	**-5%**	**-5%**	**-5%**	**-5%**	**-5%**

3. GRÁFICA



4. ANALISIS DE DATOS

5. SEGUIMIENTODEL INDICADOR -PLAN DE ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	CAUSA RAÍZ	ACCIONES A SEGUIR	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	FECHA PROGRAMADA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

7827


	Sistema de Gestión de la Seguric	Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS N°:	FT-SST-054	
	SG-SST		
FORMATO TABLA DE INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO LABORAL		Fecha:	#¡REF!
		Versión:	1
		Pagina 1 de 1	

Proceso:
Obra:
Indicador: Accidentalidad.
Responsable:
Constante "K": 240000
Constante para calcular el índice de las lesiones incapacitantes: 1000


Datos	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	Consolidado
Total de horas hombre													260
Σ de accidentes de trabajo													0
Σ de días perdidos por accidente de trabajo													0
Σ de accidentes de trabajo con incapacidad													0
Σ de accidentes de trabajo mortales													0
Total de investigaciones de accidentes de trabajo realizadas y enviadas por correo electrónico al Coordinador SISO													0

Formula	Nivel de Desagregación	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	Consolidado
Σ de accidentes de trabajo * K / Total de horas hombre	Índice de frecuencia de accidente de trabajo.	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,0
(Σ de accidentes de trabajo con incapacidad * K / Total de horas hombre)	Índice de frecuencia de accidente de trabajo con incapacidad.	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,0
Σ de días perdidos por accidentes de trabajo * K / Total de horas hombre	Índice de Severidad de accidentes de trabajo	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,0
(Índice de frecuencia de accidente de trabajo * Índice de Severidad de accidentes de trabajo) / 1000	Índice de lesiones incapacitantes de accidente de trabajo	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,0
Σ de accidentes de trabajo / Total de accidentes de trabajo	Investigaciones de Accidentes de Trabajo	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!


Índice de frecuencia de accidente de trabajo.




Índice de frecuencia de accidente de trabajo con incapacidad.



Índice de lesiones incapacitantes de accidente de trabajo



Índice de Severidad de accidentes de trabajo

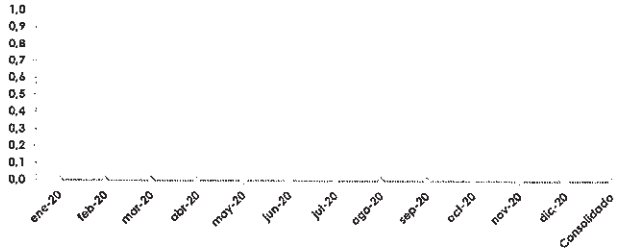

1822

	SISTEMA DE GESTIÓN		
	FORMATO INGRESO DE PERSONAL-SST		

CONTRATISTA | FECHA

No.	FECHA INGRESO	CEDULA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	ENTIDAD EPS	ENTIDAD ARL	ENTIDAD PENSION	FECHA RETIRO
		Administrativos						
1	16/01/2020	19.339.117	ALFONSO REYES SANMIGUEL	DIRECTOR OBRA	FAMISANAR	POSITIVA		VIGENTE
2	16/01/2020	1.030.623.156	SILVIA PEREZ	RESIDENTE	COMPENSAR	POSITIVA		VIGENTE
3	16/01/2020		VIVIANA ORDONEZ	ING AMBIENTAL				VIGENTE
4	16/01/2020	52.312.461	ALEXANDRA DIAZ	TRABAJADORA SOCIAL				VIGENTE
5	16/01/2020	60.449.747	CINDY ORTIZ	ING SST	MEDIMAS	POSITIVA	PORVENIR	VIGENTE
6	16/01/2020	1.030.623.156	MILLER MARIN	APOYO OBRA	SALUD TOTAL	POSITIVA		VIGENTE
		Pisos, pintura enchape y varios						
7	31/01/2020	1.024.560.857	JUAN CARLOS HERRERA FORERO	OBRERO	MEDIMAS	POSITIVA	PORVENIR	VIGENTE
8	31/01/2020	76.357.307	ARBEY MASABUEL SANCHO	OBRERO	NUEVA EPS	POSITIVA	COLPENSIONES	VIGENTE
9	31/01/2020	74.423.546	WILMAN HERNANDO CORDON MEJIA	OBRERO	COOMEVA	POSITIVA	PROTECCION	VIGENTE
10	11/02/2020	79.549.286	DERIAN MERCADO VISBAL	OBRERO	COMPENSAR	POSITIVA	PORVENIR	VIGENTE
12	17/02/2020	1.024.574.049	MANUEL EDISON HERRERA FORERO	OBRERO	FAMISANAR	POSITIVA	COLPENSIONES	VIGENTE
11	26/02/2020	1.193.545.340	NORBEY MUÑOZ ORDOÑEZ	OBRERO	NUEVA EPS	POSITIVA	COLPENSIONES	VIGENTE

compensar | miplanilla.cor

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

7823

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	7917558	EVER JOSE SALGADO SALGADO	CALLE 23 D N. 31 - 74	2754848	everjsal2006@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		SUCRE	SINCELEJO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-02	2020-02	I	16/03/2020	41338275	$3.350.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.391.700	0		0		0	3	3.100	0	1.394.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.781.300	0	0	55.700	55.700	3	3.900	400	1.897.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	860903790-5	58.200				58.200	3	200	58.400			582	58.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	1.391.700	1.394.800
Pensión	1	1.892.700	1.897.000
Riesgos Laborales	1	58.200	58.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	3.342.600	3.350.200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.co

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	7917558	EVER JOSE SALGADO SALGADO		CALLE 23 D N. 31 - 74	2754848	everjsal2006@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			SUCRE	SINCELEJO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-02	2020-02	1	16/03/2020	41338275	$3.350.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Residente	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	7917558	SALGADO SALGADO EVER JOSE	59	0			N								X									25-14	11.133.000	1.781.300	0	0	55.700	55.700	EPS037	11.133.000	1.381.700	14-11	11.133.000	1	58.200		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.co

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

1825

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	7917558	EVER JOSE SALGADO SALGADO		CALLE 23 D N. 31 - 74	2754848	everjsal2006@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			SUCRE	SINCELEJO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-01	2020-01	I	14/02/2020	40580058	$522.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	225.000	0		0		0	0	0	0	225.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	288.000	0	0	0	0	0	0		288.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	860507378-5	9.400				9.400	0	0	9.400			94	9.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	225.000	225.000
Pensión	1	288.000	288.000
Riesgos Laborales	1	9.400	9.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	522.400	522.400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

7826

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	7917558	EVER JOSE SALGADO SALGADO		CALLE 23 D N. 31 - 74	2754848	everjsal2006@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			SUCRE	SINCELEJO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-01	2020-01	I	14/02/2020	40580058	$522.400	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Extranjero	IGE	IRL	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	7917558	SALGADO SALGADO EVER JOSE	59	0			N																	25-14	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS037	1.800.000	225.000	14-11	1.800.000	1	9.400		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.co

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

7829

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	7917558-1	EVER JOSE SALGADO SALGADO	CARRERA 52 A No 123 B 10	7038345	info@salgado.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	JARDINES KENNE	006	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-03	2020-02	E		41041678	$2.315.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	100.000	0		0		0	0	0	0	100.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	160.000	0		0		0	0	0	0	160.000	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	34.000	0		0		0	0	0	0	34.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	640.000	0	0	20.000	20.000	0	0		680.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	535.800	0	0	0	0	0	0		535.800	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	511.500				511.500	0	0	511.500			5.115	511.500	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	294.000	0	0	294.000	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	294.000	294.000
Pensión	2	1.215.800	1.215.800
Riesgos Laborales	1	511.500	511.500
CCF	1	294.000	294.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	2.315.300	2.315.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.co

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

1828

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	7917558-1	EVER JOSE SALGADO SALGADO	CARRERA 52 A No 123 B 10	7038345	info@salgado.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B -- menos de 200 c	JARDINES KENNE	006	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-03	2020-02	E		41041678	$2.315.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Depto	Municipio	Extranjero	Salario Integral	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	ISC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1030623155	PEREZ GARCIA SILVIA RAQUEL	1	0				S																	23030*	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS008	2.500.000	100.000	14-23	2.500.000	5	174.000	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
CC	1233495366	MARIN CASTELLANOS MILLER ARLEY	1	0				S	X																23030*	848.543	135.880	0	0	0	0	EPSC34	848.543	34.000	14-23	848.543	5	59.100	CCF24	848.543	34.000	0	0	0	0	0
CC	19339117	REYES SANMIGUEL ALFONSO	1	0				S																	23020*	4.000.000	640.000	0	0	20.000	20.000	EPS017	4.000.000	160.000	14-23	4.000.000	5	278.400	CCF24	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.co

PLANILLA INTEGRADA DE AU LIQUIDACION DE APORTES

1829

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	7917558-1	EVER JOSE SALGADO SALGADO	CARRERA 52 A No 123 B 10	7038345	info@salgado.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	JARDINES KENNE	006	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-02	2020-01	E	14/02/2020	40503757	$1.073.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	53.400	0		0		0	0	0	0	53.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	85.400	0		0		0	0	0	0	85.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	341.400	0	0	0	0	0	0		341.400	1
230301	Porvenir	800224808-8	213.400	0	0	0	0	0	0		213.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	241.400				241.400	0	0	241.400			2.414	241.400	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	138.800	0	0	138.800	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	138.800	138.800
Pensión	2	554.800	554.800
Riesgos Laborales	1	241.400	241.400
CCF	1	138.800	138.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.073.800	1.073.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.co

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

1830

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	7917568-1	EVER JOSE SALGADO SALGADO		CARRERA 52 A No 123 B 10	7038345	info@salgado.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	JARDINES KENNE	006	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-02	2020-01	E	14/02/2020	40503757	$1.073.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Subtipo	Extranjero	Colom. residente	Mensajero	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1030623159	PEREZ GARCIA SILVIA RAQUEL	1	0			S	X																230301	1.333.334	213.400	0	0	0	0	EPS008	1.333.334	53.400	14-23	1.333.334	5	92.900	CCF24	1.333.334	53.400	0	0	0	0	0
CC	19339117	REYES SANMIGUEL ALFONSO	1	0			S	X																230201	2.133.334	341.400	0	0	0	0	EPS017	2.133.334	85.400	14-23	2.133.334	5	148.500	CCF24	2.133.334	85.400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que MAB SERVICIOS S.A.S identificado(a) con NI 900787019 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para NUBIA VIVIANA ORDOÑEZ ESPINEL identificado(a) con CC 52909751

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																		IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9403554685	573029789	E	2020-03-03	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-03	30									X										$3,117,917	4%	$124,800
9403554685	573029789	E	2020-03-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-02	30									X										$3,117,917	16%	$498,900
9403554685	573029789	E	2020-03-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-02	30									X										$3,117,917		$0
9403554685	573029789	E	2020-03-03	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-02	30									X										$3,117,917		$0
9403554685	573029789	E	2020-03-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-02	30									X										$0	0%	$0
9403554685	573029789	E	2020-03-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2020-02	30									X										$0	0%	$0
9403554685	573029789	E	2020-03-03	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-02	30									X										$3,117,917	6.96%	$217,100
9403554685	573029789	E	2020-03-03	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-02	30									X										$3,117,917	4%	$124,800

Este certificado se expide el día 2020-03-04 a las 09:57.

1832

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	80449747
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CINDY KATHERINE ORTIZ ZAMBRANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	ABREGO	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 25 4 19 SAN MATEO	TELÉFONO:	5784836
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	1724997502	TIPO DE PLANILLA:						I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO	2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2020
DÍAS DE MORA:	0							
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2020/03/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:						9999304371

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 140,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140,500	$ 0	$ 140,500
SUBTOTALES:										$ 140,500	$ 0	$ 140,500

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS044	EPS044-MEDIMÁS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 109,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 109,800	$ 0	$ 0	$ 109,800
SUBTOTALES:													$ 109,800	$ 0	$ 0	$ 109,800

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES					
																												PENSIÓN							SALUD							ARP							CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CDM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 80449747	CINDY KATHERINE ORTIZ ZAMBRANO	INDEPEND		$ 877,803				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 877,803	$ 140,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140,500	EPS044-MEDIMÁS	30	$ 877,803	$ 109,800	$ 0	$ 109,800			$ 0		$ 0	$ 0	$ 0							

TOTAL	$ 250.300

Planilla Pagada

1833

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2020-03-06, 08:41:32 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1028008815

Periodo Cotización: febrero de 2020 **Periodo Servicio:** marzo de 2020

PAGADO 03/03/2020 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DCL MANTENIMIENTOS S A S		
Documento	NI900502875	**Direcclón**	cra 8 #180-69
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3096842
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	CORDON LOPEZ DIEGO	**Identificación**	CC 4238711
Total Afiliados	15	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1014181208	JAVIER EDUARDO MEJIA HERNANDEZ	01	00	X																	0	27	27	27	27	(25-14) COLPENSIONES	$ 790,023	$ 126,500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 790,023	$ 31,700	6,960	$ 790,023	$ 55,000	(CCF26) COMFACUNDI	$ 790,023	$ 31,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 244,800
CC 1014217546	JUAN CARLOS CARREÑO ARIAS	01	00																		0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,000,000	$ 160,000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1,000,000	$ 40,000	6,960	$ 1,000,000	$ 69,600	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1,000,000	$ 40,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309,600
CC 1019041410	DARWIN YOBANY BURGOS PINZON	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 877,803	$ 140,500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 877,803	$ 35,200	6,960	$ 877,803	$ 61,100	(CCF26) COMFACUNDI	$ 877,803	$ 35,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272,000
CC 1024580857	JUAN CARLOS HERRERA FORERO	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 877,803	$ 140,500	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 877,803	$ 35,200	6,960	$ 877,803	$ 61,100	(CCF26) COMFACUNDI	$ 877,803	$ 35,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272,000
CC 1024674049	MANUEL EDISON HERRERA FORERO	01	00	X																	0	27	27	27	27	(25-14) COLPENSIONES	$ 790,023	$ 126,500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 790,023	$ 31,700	6,960	$ 790,023	$ 55,000	(CCF26) COMFACUNDI	$ 790,023	$ 31,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 244,800
CC 1032362013	WILMAR LEONARDO CORDON JAIME	01	00																		0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,000,000	$ 160,000	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1,000,000	$ 40,000	6,960	$ 1,000,000	$ 69,600	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1,000,000	$ 40,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309,600
CC 1054226584	DEIBY JHON JAIRO GOMEZ PALENCIA	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1,000,000	$ 160,000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1,000,000	$ 40,000	6,960	$ 1,000,000	$ 69,600	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1,000,000	$ 40,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309,600
CC 1193545340	NORBEY MUÑOZ ORDOÑEZ	01	00	X																	0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 87,781	$ 14,100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 87,781	$ 3,600	6,960	$ 87,781	$ 6,200	(CCF26) COMFACUNDI	$ 87,781	$ 3,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27,500
CC 4061009	PEDRO ANTONIO BOLIVAR LIZARAZO	01	00																		0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 877,803	$ 140,500	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 877,803	$ 35,200	6,960	$ 877,803	$ 61,100	(CCF26) COMFACUNDI	$ 877,803	$ 35,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272,000
CC 4238838	MARCO AURELIO JAIME PALENCIA	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1,000,000	$ 160,000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1,000,000	$ 40,000	6,960	$ 1,000,000	$ 69,600	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1,000,000	$ 40,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309,600
CC 74423505	JOSE MIGUEL MEJIA HERNANDEZ	01	00	X																	0	27	27	27	27	(25-14) COLPENSIONES	$ 790,023	$ 126,500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 790,023	$ 31,700	6,960	$ 790,023	$ 55,000	(CCF26) COMFACUNDI	$ 790,023	$ 31,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 244,800
CC 74423546	WILMAN HERNANDO CORDON MEJIA	01	00																		0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 877,803	$ 140,500	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 877,803	$ 35,200	6,960	$ 877,803	$ 61,100	(CCF26) COMFACUNDI	$ 877,803	$ 35,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272,000
CC 76357307	ARBEY MAZABUEL SANCHO	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1,000,000	$ 160,000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1,000,000	$ 40,000	6,960	$ 1,000,000	$ 69,600	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1,000,000	$ 40,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309,600
CC 76849286	DERIAN MERCADO VISBAL	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 877,803	$ 140,500	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 877,803	$ 35,200	6,960	$ 877,803	$ 61,100	(CCF26) COMFACUNDI	$ 877,803	$ 35,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272,000
CC 79864440	BELARMINO RIAÑO PALENCIA	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 877,803	$ 140,500	(EPS010) EPS SURA	$ 877,803	$ 35,200	6,960	$ 877,803	$ 61,100	(CCF26) COMFACUNDI	$ 877,803	$ 35,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272,000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

1834

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52312461	ALEXANDRA DIAZ NUVAN	CALLE 38B 72J 09	2735468	aleadinu@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2020-02	2020-02	I	27/02/2020	40911175	TOTAL A PAGAR	
					$280.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	115.000	0		0		0	0	0	0	115.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	147.200	0	0	0	0	0	0		147.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	18.400	0	0	18.400	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	115.000	115.000
Pensión	1	147.200	147.200
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	1	18.400	18.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	280.600	280.600

40911175

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

1835.

EVER JOSE SALGADO SALGADO

GERENCIA & CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

Bogotá D.C, 17 de Marzo de 2020

FDLK-55-17-03-2020

CONSORCIO GEBAL
FIRMA INTERVENTORA
ING. LADY AGUIRRE ORTIZ
TRANSVERSAL 19 A # 98-28 OFICINA 502
EDIFICIO TORRE EMPRESARIAL 98
PBX (1) 703 17 26
La Ciudad

Asunto: DECLARACION JURAMENTADA

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 328 DE 2019 cuyo objeto es "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA ADECUAR Y/O REPARAR LA ESTRUCTURA FISICA DE CINCO (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO"

Respetados señores

Estamos eximiendo a la entidad y la interventoría, por el no pago de la planilla correspondiente al mes de marzo, toda vez que la profesional Siso la ingeniera Cindy Katherine Ortiz Zambrano identificada con C.C No. 60.449.747, esta en proceso de entrega de cargo. Y no estará laborando con nosotros en la modalidad de contrato de prestación de servicios

Atentamente,

ARQ. EVER JOSÉ SALGADO SALGADO
C.C. No. 7´917.558 Cartagena

REVISO: EJS
ELABORO:LMG
Folios 1

1836

20205810066012

GEAGOR
CONSORCIO GEBAL

Bogotá D.C., 21 de Abril de 2020

Señores:
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
Dr. Leonardo Alexander Rodríguez
Alcalde Local
Transversal 78 K No. 41 A-04 Sur
Bogotá D.C

GEBAL-KEN-104

Ref. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CIN-329-2019.
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA ADECUACIÓN DE CINCO (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PARA LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

Tema: Acta Parcial 2 del 17 de Febrero al 16 de Marzo del Contrato de Obra CIN-329-2019.

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito adjuntar acta parcial 2 contrato de obra CIN-329-2019 que contempla el periodo de 17 de febrero hasta el 16 de marzo.

- INFORME DE ACTIVIDADES
- PAGO DE SEGURIDAD DEL PERSONAL
- RECIBO A SATISFACCION
- CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTOS
- FACTURA #001
- ACTA 2 INCLUYE MEMORIAS
- HOJA DE RUTA

Cordialmente,

Ing. LADY AGUIRRE ORTIZ
Representante Legal
CONSORCIO GEBAL
NIT. 901.351.342-8

1837

EVER JOSE SALGADO SALGADO

GERENCIA & CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

Bogotá D.C, 16 de Abril de 2020

FDLK-64-16-04-2020

CONSORCIO GEBAL
FIRMA INTERVENTORA
ING. LADY AGUIRRE ORTIZ
TRANSVERSAL 19 A # 98-28 OFICINA 502
EDIFICIO TORRE EMPRESARIAL 98
PBX (1) 703 17 26
La Ciudad

CONSORCIO
16/Abril/2020

Asunto: CORTE 2

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 328 DE 2019 cuyo objeto es "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA ADECUAR Y/O REPARAR LA ESTRUCTURA FISICA DE CINCO (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO"

Respetados señores

Estamos enviando para los fines pertinentes los documentos correspondientes al corte No. 2 asi

-FACTURA No. 171 $ 139.323.092
-RESOLUCION DE FACTURACION
-CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PERSONA NATURAL
-INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
-HOJA DE RUTA PARA REPROGRAMACION DE PAC Y PAGO
-RECIBO A SATISFACCION PERSONA NATURAL
-CERTIFICADO DE PAGOS PARAFISCALES Y LABORALES
-CORTE DE OBRA
-MEMORIAS DE CALCULO

Atentamente,

ARQ. EVER JOSÉ SALGADO SALGADO
C.C. No. 7´917.558 Cartagena

REVISO: EJS
ELABORO:LMG

EVER JOSÉ SALGADO SALGADO

ARQUITECTO

NIT. 7.917.558 - 1 Régimen Común

Diseño
Construcción
Consultoría de Proyectos
y Obras Civiles

Carrera 20 No. 18-39 - Edificio Bemons - Oficina 304
Teléfono: (5) 275 48 48 - Celular: 314 588 29 39
E-mail: everjsal2006@yahoo.es - Sincelejo - Sucre

DIA	MES	AÑO
4	5	2020

FACTURA DE VENTA Nº 171

SEÑOR(ES) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY — C.C./NIT. 899,999,061-9

DIRECCION TRANSVERSAL 78K # 41 A-04 SUR — TEL. PBX 4481400 — CIUDAD BOGOTA D.C.

DESCRIPCION			VR. UNITARIO	VR. TOTAL
CORTE No. 2 CONTRATO DE OBRA No 328 DE 2019 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA ADECUAR Y/O REPARAR LA ESTRUCTURA FISICA DE CINCO (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGUN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO"				
1. OBRA CIVIL Y MATERIALES				
COSTO DIRECTO			**106.627.914**	**106.627.914**
ADMINISTRACION	20,16%		**21.496.187**	**21.496.187**
IMPREVISTOS	1,0%		**1.066.279**	**1.066.279**
UTILIDAD	5,0%		5.331.396	**5.331.396**
		SUB TOTAL	134.521.776	
INVERSION GESTION SOCIAL			15.000	
	15,40%		2.310	
		SUBTOTAL	**17.310**	**17.310**
INVERSION GESTION AMBIENTAL			**1.661.887**	
	14,78%		**245.627**	
		SUBTOTAL	**1.907.514**	**1.907.514**
VALOR BASICO PARA AJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRA				
SEGÚN AVANCE CORTE DE OBRA No. 1 NO COBRADO EN ACTA ANTERIOR				**1.596.999**
SEGÚN AVANCE CORTE DE OBRA No. 2 PRESENTE ACTA				**1.279.493**

SON: **CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL NOVENTA Y DOS PESOS**

SUBTOTAL $	139.323.092
IVA % $	-
TOTAL $	139.323.092

VENDEDOR

ACEPTADA COMPRADOR

CONSORCIO

Si pasados diez (10) días calendario el Comprador o Beneficiario del servicio no reclamare el contenido de esta factura se considera irrevocablemente Aceptada.
Causa interés del 3% a partir de su fecha de vencimiento. Se hace constar que la firma de una persona distinta a la del comprador implica que dicha persona se entiende autorizada por el comprador para firmar.

DIAN - Resolución No. 18762011007010 de Fecha 2018/10/30 Habilitada del No. 128 al No. 500

Impreso por: Hernando Torres. RUT: 79303724-1 / Cel: 312 529 7549

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretaría de Gobierno

ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No 2 PERÍODO: 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DE 2020	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. CONTRATO Y FECHA	No. COP-328 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2019
NOMBRE DEL CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	C.C. 7.917.558 DE CARTAGENA
PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (6) MESES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.359.307.248
VALOR DEL PERIODO DE COBRO	**$139.323.092**
No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
FECHA ACTA DE INICIO	17 DE ENERO DE 2020
PRÓRROGA[1]	N/A
ADICIÓN	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	16 DE JULIO DE 2020
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MDIENTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA ADECUAR Y/O REPARAR LA ESTRUCTURA FISICA DE CINCO (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGUN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO«TRANSCRIBIR EL OBJETO CONTRACTUAL»

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretaría de Gobierno

ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
9.4 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA	ETAPA 1 ADECUACION Y REPARACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DEL JARDIN LA COMETA	ADECUACION DEL MISMO	CARRERA 74 A#42G-52 SUR CENTRO DE INTEGRACION LAGOS DE TIMIZA
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.	Se cumplen a cabalidad	Se firma contrato con la entidad	
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación.	Se cumple con lo requerido en el contrato Se entregó la Etapa 1 Jardín La Cometa	Acta de entrega realizada por Interventoría	
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.	Se cumple con lo requerido en el contrato	Se entregan dichas técnicas y garantías de los materiales y equipos utilizados	
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.	Cuando haya lugar a realizarlo	N/A	
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).	Se cumple con lo requerido en el contrato	N/A	
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.	Se cumple con lo requerido en el contrato	Se firma contrato con la entidad	
7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.	Se cumple con lo requerido en el contrato	Se informa a la comunidad en la reunión de socialización de las obras	
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.	Se cumple con lo requerido en el contrato	Se están empleando (3) operarios que viven en la localidad	

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretaría de Gobierno

ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.	Se cumple con lo requerido en el contrato		
10. Informar cualquier cambio en la composición del capital social del contratista, el de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, así como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial.	NO APLICA		
11. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existente al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.	NO APLICA		
12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.	Se informo oportunamente la contingencia que se presenta con el COVID-19	Se enviaron oficios a la interventoria acogiéndonos al aislamiento obligatorio decretado	FDLK-61-19-03-2020 FDLK-63-20-03-2020
13. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).	Se cumple con lo requerido en el contrato	Se dictan inducciones al respecto y se evidencian en informes semanales y mensuales	FDLK-08-28-01-2020 FDLK-10-28-01-2020 FDLK-11-28-01-2020 FDLK-18-05-02-2020 FDLK-23-06-02-2020 FDLK-26-10-02-2020 FDLK-29-18-02-2020 FDLK-33-24-02-2020 FDLK-35-24-02-2020 FDLK-44-04-03-2020 FDLK-52-13-03-2020 FDLK-53-16-03-2020 FDLK-55-17-03-2020 FDLK-56-18-03-2020

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretaría de Gobierno

ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.	NO APLICA		
15. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una modificación del estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.	NO APLICA		
16. Suscribir oportunamente el acta de Inicio y el acta de liquidación del contrato, conjuntamente con el/la supervisor/a del mismo, cuando corresponda.	Se cumple con lo requerido en el contrato	Se suscribió en conjunto con la interventoría del contrato	Acta de Iniciación de fecha 17 de enero de 2020
17. Entregar al interventor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución del mismo.	Se cumple con lo requerido en el contrato	Se enviaron los documentos para la legalización del contrato. Se aprueban en comité de obra los precios No previstos por la interventoría y la supervisión, se entrega la documentación APUS y tres cotizaciones de cada insumo, se envían a gestión documental y finalmente fueron aprobados el día 8 de abril de 2020, mediante Acta de fijación de precios no previstos.	FDLK-01-08-01-2020 FDLK-02-13-01-2020 FDLK-03-15-01-2020 FDLK-04-22-01-2020 FDLK-05-22-01-2020
18. Dar aplicación a los subsistemas que componen el Sistema Integrado de Gestión adoptados por la Secretaría Distrital de Gobierno.	Se cumple con lo requerido en el contrato		
19. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato.	Se cumple con lo requerido en el contrato		FDLK-60-19-03-2020
20. Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del	Se cumple con lo requerido en el contrato		

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretaría de Gobierno

ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Distrito expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., así como a todas las normas que en materia de ética y valores expedida la Secretaria Distrital de Gobierno en la ejecución del contrato.			
21. Cuando se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, en proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del contrato para cada pago.	Se cumple con lo requerido en el contrato se entregan planillas de todo el personal administrativo y operativo a la interventoría para verificar su cumplimiento		
22. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente.	NO APLICA		
23. Vincular o contratar para la ejecución del contrato personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad, de acuerdo a lo expuesto en la Directiva 001 del 31 de enero de 2011 "democratización de las oportunidades económicas en el Distrito capital y promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad".	Se cumple con lo requerido en el contrato		

ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
9.5.1. Obligaciones en materia de elementos, equipos, materiales y personal: Serán de cargo del CONTRATISTA: 1) La adquisición, transporte, utilización, reparación, conservación y mantenimiento de todas las máquinas, equipos, herramientas, repuestos, materiales y demás elementos necesarios para la realización de las obras objeto del presente contrato, cumpliendo las normas de seguridad y procedimientos establecidos en los pliegos de condiciones. 2) La adquisición de los materiales requeridos y el pago de los servicios de disposición de escombros serán por cuenta del CONTRATISTA. En virtud de lo dispuesto por las Leyes 509 de 2000, 685 de 2001, la Resolución 991 de 2001 del DAMA y el Código Nacional de Tránsito Ley 769 de 2002 y demás que las modifiquen y/o reformen, los materiales de construcción (agregados pétreos, recebo, ladrillo, concreto y demás.) sólo pueden ser adquiridos en sitios o plantas que cumplan con las normas ambientales y mineras vigentes. Por lo tanto, el CONTRATISTA se obliga a anexar todos los documentos que acrediten la legalidad de sus proveedores y de quienes les presten los servicios de disposición final de escombros o informar que los mismos se encuentran inscritos en el Directorio de Proveedores de Materiales de Construcción y Servicios de Disposición Final de Escombros que lleva el IDU, de conformidad con la Resolución 5772 de 2004 del IDU y demás que la modifiquen.	**Obligaciones en materia de elementos, equipos, materiales y personal:** Se cumple con lo requerido en el contrato, manteniendo los equipos en condiciones de operatividad. Se cumple con lo requerido en el contrato y con la legislación vigente en el Distrito. Se hizo creación del Pin ambiental conjuntamente con supervisor encargado de la Alcaldía Local	Se documenta mediante los informes mensuales del componente ambiental donde se anexan los siguientes documentos: -FICHAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS INSTALADOS EN OBRA -FORMATO DE APROVECHAMIENTO RCD -PIN AMBIENTAL -RECIBOS ESCOMBRERA	FDLK-35-24-02-2020 FDLK-53-16-03-2020

ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
3) El material que se suministre deberá ser de óptima calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas que sobre la materia estén vigentes en Colombia. Para tal fin la interventoría y/o supervisor llevarán a cabo ensayos de laboratorio adicionales a los que debe presentar el CONTRATISTA.	Se cumple con lo requerido en el contrato entregando a la Interventoría las fichas técnicas y garantías de los materiales e insumos utilizados	Se documenta mediante los informes mensuales del componente ambiental donde se anexan: FICHAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS INSTALADOS EN OBRA	FDLK-35-24-02-2020 FDLK-53-16-03-2020
4) El CONTRATISTA deberá certificar y cumplir las especificaciones técnicas de los insumos de acuerdo con las normas vigentes en Colombia aplicables a los diferentes materiales utilizados durante la Obra, mediante los respectivos ensayos de laboratorio de los materiales utilizados o suministrados. Una vez iniciada la ejecución del contrato, el CONTRATISTA deberá enviar periódicamente o cada vez que lo solicite el Interventor y/o supervisor del contrato los ensayos de laboratorio de tal manera que se cumpla con las especificaciones técnicas exigidas en el anexo de especificaciones técnicas del Pliego de Condiciones.	Se cumple con lo requerido en el contrato y se realizan cuando son necesarios: Ensayos de Densidades y Proctor de Compactación y Toma de cilindros a los concretos preparados en obra	Se entregaron ensayos de densidades en rellenos realizados para andenes perimetrales.	FDLK-43-04-03-2020
5) Mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios para el normal y completo desarrollo del objeto contractual y tener disponible y emplear en la ejecución de las obras el personal requerido para la cumplida ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones. Si durante la ejecución del contrato se requiere el cambio de alguno de los profesionales, deberá reemplazarse por otro de iguales o de mayores calidades, previamente aprobado por el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy.	Se cumple con lo requerido en el contrato	Se evidencia el cumplimiento con los informes de cada componente	FDLK-08-28-01-2020 FDLK-10-28-01-2020 FDLK-11-28-01-2020 FDLK-18-05-02-2020 FDLK-23-06-02-2020
6) Mantener en los lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad industrial y salud ocupacional convenientes para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, tanto en relación con su personal como de terceros; además deberá tomar todas las precauciones	Se cumple con lo requerido en el contrato	Se documenta mediante los informes semanales y mensuales tanto del componente ambiental como el de SISO y la	FDLK-08-28-01-2020 FDLK-10-28-01-2020 FDLK-11-28-01-2020 FDLK-18-05-02-2020 FDLK-23-06-02-2020

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretaría de Gobierno

ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
del caso para garantizar la higiene de las instalaciones en los lugares de trabajo y áreas aferentes, si la importancia de éstos lo justifica, especialmente mediante el establecimiento de redes viales, suministro de agua potable y saneamiento.		entrega del manual SG-SST	FDLK-26-10-02-2020 FDLK-29-18-02-2020 FDLK-33-24-02-2020 FDLK-35-24-02-2020 FDLK-44-04-03-2020 FDLK-52-13-03-2020 FDLK-53-16-03-2020 FDLK-55-17-03-2020 FDLK-56-18-03-2020
7) EL CONTRATISTA asumirá las obligaciones y gastos que se generen por concepto de vigilancia, hasta la entrega final de las obras, construcción, dotación, mantenimiento y desmonte de campamentos y otras instalaciones provisionales que fueren necesarias para administrar la obra, hasta la entrega final de la misma.	Se cumple con lo requerido en el contrato		
8) El Contratista será responsable de dar cumplimiento a los Programas de Ejecución de Obra, pagos por servicios profesionales, suministros de materiales, alquiler de equipos e impuestos de ley por parte del contratista, sean oportunos y transparentes, por la permanencia durante el proceso constructivo de un nivel adecuado de seguridad industrial, impacto ambiental y señalización de acuerdo con los manuales de mínimas implicaciones ambientales, y por el mantenimiento del flujo peatonal y vehicular seguro por las zonas de influencia de las obras durante la ejecución de los trabajos.	Se cumple con lo requerido en el contrato	Se radica ante la interventoría todas las programaciones de obra y las solicitudes de ajuste al cronograma de obra cuando se requiera	FDLK-18-05-02-2020 FDLK-28-03-03-2020 FDLK-42-10-02-2020 FDLK-60-19-03-2020
9) Es obligación del Contratista culminar las obras dentro del plazo contractual establecido en el pliego de condiciones, acatando las instrucciones y/o especificaciones técnicas referidas en cualquiera de los documentos que forman parte integral del presente proceso Licitatorio, y de acuerdo al cronograma presentado a la interventoría para su aprobación y al Fondo de Desarrollo Local de Kennedy para su posterior aceptación. En caso de presentarse cualquier irregularidad, hecho, acción u omisión	Se cumple con lo requerido en el contrato Ya se culminó la primera etapa en el jardín Infantil La Cometa de acuerdo al cronograma actualizado	Se radica ante la interventoría las programaciones de obra y las solicitudes de ajuste al cronograma de obra	FDLK-18-05-02-2020 FDLK-28-03-03-2020 FDLK-42-10-02-2020 FDLK-60-19-03-2020

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
por parte del contratista procederá la Interventoría a notificar al FDLK del presunto incumplimiento ya sea de las obligaciones específicas, del anexo técnico o de cualquier otro condicionamiento que se encuentre dentro del Pliego de Condiciones y demás documentos que hacen parte integral de la presente licitación pública.			
10) El Contratista debe cumplir con el personal que oferta dentro del Proceso Licitatorio, el cual debe ser previamente verificado y requerirá acompañamiento constantemente por parte de la Interventoría; la cual notificara en debida forma al FDLK en caso de encontrar que las hojas de vida del personal presentadas en la oferta, no corresponden o no cumplen los mismos requisitos académicos solicitados previamente, así mismo si no tienen los mismos porcentajes de dedicación solicitados por la entidad.	Se cumple con lo requerido en el contrato. Se aprobaron las hojas de vida por parte de la Interventoría y la supervisión	Se radican las hojas de vida del personal profesional que participara en el contrato	FDLK-03-15-01-2020 FDLK-09-28-01-2020 FDLK-16-30-01-2020
11) Las demás que estén consignadas en el Anexo técnico.	CUANDO SEA NECESARIO		
9.5.2. Obligaciones en materia de obligaciones laborales, seguridad social y parafiscales:			
El CONTRATISTA asumirá el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución de las obras, lo mismo que el pago de los impuestos, gravámenes, aportes parafiscales y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas.	Se Cumple con lo requerido en el contrato	Se anexa para el pago del primer corte y segundo corte según lo dispuesto	FDLK-54-06-03-2020 FDLK-64-16-04-2020
En virtud de lo anterior, el CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, para lo cual deberá aportar al Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, certificación expedida por el revisor fiscal cuando exista de acuerdo con los requerimientos de la ley, o por el Representante Legal cuando no se requiera de revisor fiscal, del cumplimiento de sus obligaciones con	Se cumple con lo requerido en el contrato	Se radica documentación ante la interventoría	FDLK-03-15-01-2020 FDLK-17-31-01-2020 FDLK-27-11-02-2020 FDLK-28-14-02-2020 FDLK-30-18-02-2020 FDLK-31-19-02-2020 FDLK-31-21-02-2020

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretaría de Gobierno

ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
el Sistema de Seguridad Social Integral (sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales), y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje e ICBF, cuando a ello hubiere lugar, obligación que deberá adjuntarse al informe del interventor y deberá ser verificada por éste.			FDLK-36-26-02-2020 FDLK-39-28-02-2020 FDLK-41-03-03-2020
Adicionalmente a la liquidación del contrato el interventor del mismo, deberá verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA frente a los aportes y obligaciones antes señaladas, durante la vigencia del contrato.	CUANDO APLIQUE		
De conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, la acreditación del cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y aportes a las Cajas de Compensación familiar, Sena e ICBF, será requisito indispensable para la realización de cada pago derivado del presente contrato.	Se cumple con lo requerido en el contrato	Se radica documentación ante la interventoría	FDLK-54-06-03-2020
9.5.3. Obligaciones en materia ambiental y social y en materia de seguridad industrial y salud ocupacional	**Obligaciones en materia de obligaciones laborales, seguridad social y parafiscales:**		
1) Dar estricto cumplimiento a lo establecido en la Resolución IDU 6210 DE 2017 *"Por el cual se Actualiza el Manual Único de Control y Seguimiento Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST del IDU"*; La "Guía de Manejo Ambiental para el Sector de la Construcción" de la Secretaria Distrital de Ambiente y las demás que aplique, con el propósito de garantizar la adecuada gestión de residuos, así como la implementación de buenas prácticas ambientales en el proceso y demás condiciones dispuestas en el anexo técnico y en las normas vigentes en materia ambiental y social.	Se cumple con lo requerido en el contrato	Se radica documentación ante la interventoría -FICHAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS INSTALADOS EN OBRA -FORMATO DE APROVECHAMIENTO RCD -PIN AMBIENTAL -RECIBOS ESCOMBRERA	FDLK-35-24-02-2020 FDLK-53-16-03-2020
2) Dar estricto cumplimiento a la normatividad en la materia y a los lineamientos para salud ocupacional y seguridad industrial para contratación de obras vigentes, en especial con	Se cumple con lo requerido en el contrato	Se radica documentación ante la interventoría Se radica ante la interventoría las medidas de mitigación de contagio	FDLK-03-15-01-2020 FDLK-10-28-01-2020 FDLK-63-20-03-2020

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretaría de Gobierno

ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
las resoluciones 1016 de 1989, DECRETO 614 DE 1984, CST Art 349, RESOLUCION 2413 DE 1979 R.H.S para el sector construcción, Resolución 2013 de 1986 y el Art 63 del Decreto 1295 de 1994.			
3) Implementar un "Plan de Gestión Integral de Residuos Aprovechables, Ordinarios y Peligrosos".	Se cumple con lo requerido en el contrato	Se radica ante la interventoría	FDLK-51-13-03-2020
4) Contar con el registro ante el IDEAM como "Generador de Residuos Peligrosos" cuando genere más de 10 Kg mes	Se cumple con lo requerido en el contrato		
5) Cumplir con lo establecido en la Resolución Secretaria Distrital de Ambiente 1115 de 2012 "Por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnico - ambientales para las actividades de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y demolición en el Distrito Capital"; Resolución 932 de 2015 "Por la cual se modifica y adiciona la Resolución 1115 de 2012" y la "Guía para la elaboración del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en obra".	Se cumple con lo requerido en el contrato	Se radica ante la interventoría	FDLK-37-27-02-2020 FDLK-51-13-03-2020
Para lo cual el contratista deberá seguir los lineamientos impartidos por el Fondo de Desarrollo Local y/o la interventoría en lo que respecta al cargue de información en el aplicativo RDC de la Secretaria Distrital de Ambiente. Observarlo lo normado en los Decretos Distritales 442 DE 2015 "Por medio del cual se crea el Programa de aprovechamiento y/o valorización de llantas usadas en el Distrito Capital y se adoptan otras disposiciones" 265 de 2016 "Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 442 de 2015 y se adoptan otras disposiciones" en lo que respecta a el aprovechamiento de llantas usadas en obras de infraestructura del transporte en el Distrito Capital.	Se cumple con lo requerido en el contrato	Se radica ante la interventoría el RCD aprobado	FDLK-51-13-03-2020

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Los informes de cumplimiento de este artículo, deberán ser reportados con la periodicidad que determine el FDLK y/o la interventoría en el formato que para tal fin disponga la Secretaría Distrital de Ambiente. Atender las inspecciones ambientales realizadas por la Secretaría Distrital de Ambiente y/o Fondo de Desarrollo Local Kennedy, permitiendo el recorrido por las instalaciones, realizar entrevistas al personal y obtener registro documental y fotográfico. Ejecutar el programa de seguimiento y monitoreo ambiental, con indicadores de gestión y presentar los reportes mensuales a la interventoría. Tomar los correctivos que sean necesarios cuando los resultados del monitoreo establezcan la necesidad de prevenir, mitigar o corregir los impactos ambientales ocasionados por el proyecto. Acatar los llamados de atención, recomendaciones y sugerencias de la Interventoría en los tiempos y condiciones que ella defina, en relación con el cumplimiento ambiental. Prever y solucionar todos los eventos de contingencia que se llegasen a presentar durante el desarrollo y vigencia del contrato.	Se cumple con lo requerido en el contrato	Se radica ante la interventoría	FDLK-08-28-01-2020 FDLK-10-28-01-2020 FDLK-11-28-01-2020 FDLK-18-05-02-2020 FDLK-23-06-02-2020 FDLK-26-10-02-2020 FDLK-29-18-02-2020 FDLK-33-24-02-2020 FDLK-35-24-02-2020 FDLK-44-04-03-2020 FDLK-52-13-03-2020 FDLK-53-16-03-2020 FDLK-55-17-03-2020 FDLK-56-18-03-2020
9.5.4. Obligaciones en materia de documentos:			
1) Presentar en los tiempos establecidos para el control de la ejecución de la obra, los documentos señalados en el Pliego de Condiciones y en el Anexo técnico, en especial: Información sobre el personal del proyecto, enfoque y metodología de la obra, análisis del A.I.U. y programa de trabajo, programa de implementación del plan de manejo ambiental (PIPMA).	Se cumple con lo requerido en el contrato	Se radica ante la interventoría	FDLK-04-22-01-2020 FDLK-14-29-01-2020 FDLK-37-27-02-2020 FDLK-51-13-03-2020
2) Presentar mensualmente a la Interventoría un reporte o planilla sobre los escombros generados y depositados, así mismo una certificación original del volumen del material dispuesto durante el mes, expedido por el responsable de la escombrera o nivelación	Se cumple con lo requerido en el contrato	Se radica ante la interventoría los informes mensuales	FDLK-35-24-02-2020 FDLK-53-16-03-2020

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
topográfica, así como de los proveedores de materiales (agregados pétreos, concreto, mezclas asfálticas, ladrillo y producto de arcilla para la obra). EL CONTRATISTA deberá cubrir los costos de acarreo a las escombreras autorizadas.			
3) Presentar los informes sobre su gestión técnica, ambiental y social y demás informes de ejecución contractual requeridos, con la periodicidad y contenido que le exija el anexo técnico, el FONDO y la interventoría.	Se cumple con lo requerido en el contrato	Se radica ante la interventoria los informes tanto semanales como mensuales según lo establecido.	FDLK-08-28-01-2020 FDLK-10-28-01-2020 FDLK-11-28-01-2020 FDLK-18-05-02-2020 FDLK-23-06-02-2020 FDLK-26-10-02-2020 FDLK-29-18-02-2020 FDLK-33-24-02-2020 FDLK-35-24-02-2020 FDLK-44-04-03-2020 FDLK-52-13-03-2020 FDLK-53-16-03-2020 FDLK-55-17-03-2020 FDLK-56-18-03-2020
4) Elaboración y entrega de las Memorias Técnicas de la Obra, debidamente empastadas con tapa dura y con sus páginas foliadas.	Se cumple con lo requerido en el contrato. Con la elaboración de todas las memorias numéricas y sus esquemas de localización de cada uno de los ítems contractuales y No previstos aprobados	Se radica en cada corte las memorias previamente autorizadas por las partes en cada corte de obra	FDLK-54-16-03-2020 FDLK-64-17-04-2020
5) Las demás obligaciones de entrega de documentos que estén en el Anexo técnico.	Se cumple con lo requerido en el contrato		
9.5.5. Obligaciones en materia de aspectos financieros			
EL CONTRATISTA de obra será responsable por los costos de las prórrogas y/o adiciones del contrato de Interventoría, cuando quiera que estas se generen por causas imputables al contratista de obra. Obligaciones Adicionales:		N/A	
1) EL CONTRATISTA deberá dar cabal cumplimiento a cada una de las obligaciones,	Se cumple con lo requerido en el contrato		

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretaría de Gobierno

ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
responsabilidades y labores o trabajos a los cuales se haya comprometido en la Propuesta presentada, así como los demás requerimientos de la Administración Local, manifestados en el Pliego de Condiciones que gobernó el proceso de selección.			
2) En los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993 el CONTRATISTA será civilmente responsable frente al FONDO de los perjuicios originados por el deficiente desempeño de sus funciones y obligaciones previstas en este contrato, además de las sanciones penales a que hubiere lugar.	Se cumple con lo requerido en el contrato		
3) El contratista deberá realizar mensualmente el control financiero estricto y controlar el presupuesto de obra tal manera que no sobrepase el presupuesto oficial.	Se cumple con lo requerido en el contrato		
4) Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago, acompañando los cortes de obra.	Se cumple con lo requerido en el contrato	Se presenta mediante el informe mensual # 2 Corte de Obra	FDLK-53-16-03-2020

INFORMACIÓN ADICIONAL			
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL:	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE SALUD	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE ARL	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PENSIÓN
	NUEVA EPS	ARL SURA	COLPENSIONES

FIRMAS	
DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades	**CONTRATISTA**

ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.			**Firma:** **Nombre: EVER JOSE SALGADO SALGADO** **Cédula: 7.917.558**
DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados por el contratista manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato.			**SUPERVISOR/INTERVENTOR** **Firma: CONSORCIO GEBAL** **Nombre: LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ** **Cargo: REPRESENTANTE LEGAL** **Firma:** **APOYO A LA SUPERVISIÓN (CUANDO APLIQUE)** **Nombre: YANETH ESPERANZA ECHEVERRIA BECERRA** **Cargo: PROFESIONAL DE APOYO** **Firma:**

EVER JOSE SALGADO SALGADO
GERENCIA & CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

1855

CERTIFICACIÓN

El suscrito, ARQ EVER JOSE SALGADO SALGADO, *bajo juramento certifico que de acuerdo a las* normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de aportes correspondiente a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) Lo anterior que se refiere el artículo 50 de la ley 789 de 2002 .

Doy fe que se ha cumplido a cabalidad con este artículo y que en razón de esto firmo como consta.

Se expide en Bogotá D.C. **MARZO 16 DE 2020** .

Sin otro particular

Atentamente,

Firma: _____
Nombre: **EVER JOSÉ SALGADO SALGADO**
C.C. No. **7.917.558 de Cartagena**
Cargo: **REPRESENTANTE LEGAL**

Firma: _____
Nombre: **ROBINSON DEL CRISTO URANGO PAYARES**
C.C. No. **92.496.116**
T.P. No. **71250-T**
Cargo: **CONTADOR PÚBLICO**

1856

EVER JOSE SALGADO SALGADO

GERENCIA & CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

CERTIFICACIÓN

El suscrito, ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO, se permite certificar que la compañía ha cumplido dentro de los últimos seis (6) meses en el pago de las obligaciones laborales del personal que trabaja en la obra, según lo determinado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Doy fe que se ha cumplido a cabalidad con este artículo y que en razón de esto firmo como consta.

Se expide en Bogotá D.C **MARZO 16 DE 2020** .

Sin otro particular

Atentamente,

Firma:
Nombre: **EVER JOSÉ SALGADO SALGADO**
C.C. No. **7.917.558 de Cartagena**
Cargo: **REPRESENTANTE LEGAL**

Firma:
Nombre: **ROBINSON DEL CRISTO URANGO PAYARES**
C.C. No. **92.496.116**
T.P. No. **71250-T**
Cargo: **CONTADOR PÚBLICO**

24

Dirección: Carrera 52A # 123B -10
PBX: 57 (1) 7038345
www.salgado.com.co
Bogotá D.C. - Colombia.

1817

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A 7 9 C 1 C 0 F 4 B E 8 0 A E E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ROBINSON DEL CRISTO URANGO PAYARES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 92496116 de SINCELEJO (SUCRE) Y Tarjeta Profesional No 71250-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Mayo de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

25

1858

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 4 1 2 1 5 D C 0 A 9 3 E B C 7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ROBINSON DEL CRISTO URANGO PAYARES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 92496116 de SINCELEJO (SUCRE) Y Tarjeta Profesional No 71250-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NOREGISTRAANTECEDENTESDISCIPLINARIOS***

1859




República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

71250-T

ROBINSON DEL CRISTO
URANGO PAVARES
C.C. 92496116
RESOLUCION INSCRIPCION 50 FECHA 09/03/2000
UNIVERSIDAD CORPORACION UNIV. DEL CARIBE "

Presidente

00079596

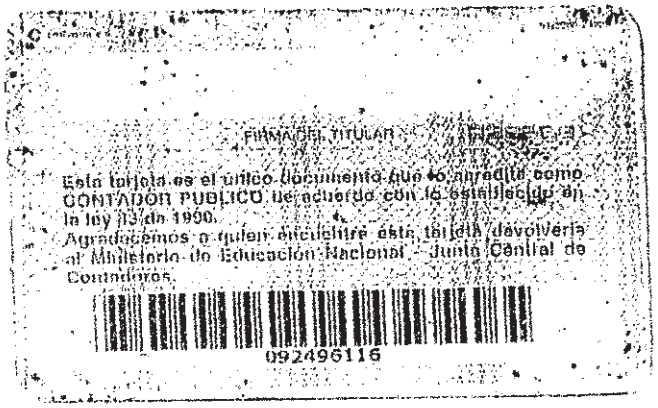

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

092496116

28

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
92.496.116
NUMERO

URANGO PAYARES
APELLIDOS

ROBINSON DEL CRISTO
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 14-NOV-1958
SINCELEJO
(SUCRE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA | A- G.S. RH | M SEXO

26-SEP-1977 SINCELEJO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

A-2800100-62155041-M-0092496116-20070214 04308 07044A 02 230965604

1961

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	7917558	EVER JOSE SALGADO SALGADO	CALLE 23 D N. 31 - 74	2754848	everjsal2006@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I – Independiente		SUCRE	SINCELEJO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-02	2020-02	I	16/03/2020	41338275	$3.350.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.391.700	0		0		0	3	3.100	0	1.394.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.781.300	0	0	55.700	55.700	3	3.900	400	1.897.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	58.200				58.200	3	200	58.400			582	58.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	1.391.700	1.394.800
Pensión	1	1.892.700	1.897.000
Riesgos Laborales	1	58.200	58.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	3.342.600	3.350.200

41338275

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	7917558	EVER JOSE SALGADO SALGADO	CALLE 23 D N. 31 - 74	2754848	everjsal2006@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			SUCRE	SINCELEJO	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-02	2020-02	I	16/03/2020	41336875	$3.350.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Residente	IGE	RET	ETOS	TDE	TAE	TDP	FAC	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	DIRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	7917558	SALGADO SALGADO EVER JOSE	59	0			N									X									25-14	11.133.000	1.781.300	0	0	55.700	55.700	EPS037	11.133.000	1.391.700	14-11	11.133.000	1	58.200		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

1863

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	7917558-1	EVER JOSE SALGADO SALGADO	CARRERA 32 A No 123 B 10	7038345	info@salgado.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B - menos de 200 c	JARDINES KENNE	006	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-03	2020-02	E	12/03/2020	41041678	$2.315.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	100.000	0		0		0	0	0	0	100.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	160.000	0		0		0	0	0	0	160.000	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-3	34.000	0		0		0	0	0	0	34.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (ING + Proteccion)	800229739-0	640.000	0	0	20.000	20.000	0	0		660.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	535.800	0	0	0	0	0	0		535.800	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	511.500				511.500	0	0	511.500			5.115	511.500	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	294.000	0	0	294.000	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	294.000	294.000
Pensión	2	1.215.800	1.215.800
Riesgos Laborales	1	511.500	511.500
CCF	1	294.000	294.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	2.315.300	2.315.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	7917558-1	EVER JOSE SALGADO SALGADO	CARRERA 52 A No 123 B 10	7038345	info@salgado.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	JARDINES KENNE	006	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-03	2020-02	E	12/03/2020	41041678	$2.315.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Bolívar	Extranjero	Colom. retornado del exterior	Estudiante	IGE	IRT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1058823158	PEREZ GARCIA SILVIA RAQUEL	1	0			S																230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS008	2.500.000	100.000	14-23	2.500.000	5	174.000	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
2	CC	1233495365	MARIN CASTELLANOS MILLER ARLEY	1	0			S	X															230301	848.543	136.000	0	0	0	0	EPSC34	848.543	34.000	14-23	848.543	5	59.100	CCF24	848.543	34.000	0	0	0	0	0
3	CC	19339117	REYES SANMIGUEL ALFONSO	1	0			S																230201	4.000.000	640.000	0	0	20.000	20.000	EPS017	4.000.000	160.000	14-23	4.000.000	5	278.400	CCF24	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

1865

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	7917558-1	EVER JOSE SALGADO SALGADO	CARRERA 62 A No 123 B 10	7038345	info@salgado.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-02	2020-02	Y	27/03/2020	41533299	$314.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	109.800	0		0		0	14	1.200	0	111.000	1

TOTALES PENSIÓN											
Código APP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	140.500	0	0	0	0	14	1.500	0	142.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	61.100				61.100	14	700	61.800			611	61.800	1

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	109.800	111.000
Pensión	1	140.500	142.000
Riesgos Laborales	1	61.100	61.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	311.400	314.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

1 PG 2

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	7917558-1	EVER JOSE SALGADO SALGADO	CARRERA 52 A No 123 B 10	7036345	info@salgado.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2020-02	2020-02	Y	27/03/2020	41533298	$344.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Ciudad	Salario	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Extranjero	ING	VSP	TDE	TAE	TDP	TAP	AVP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52906751	ORDOÑEZ ESPINEL NUBIA VIVIANA	59	0			N																25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS008	877.803	109.800	14-23	877.803	5	61.100		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52312461	ALEXANDRA DIAZ NUVAN	CALLE 38B 72J 09	2735468	aleadnu@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	1 -- Independiente		BOGOTA D. C.	BOGOTA, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2020-02	2020-02	1	27/02/2020	40911175	TOTAL A PAGAR	
					$280.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	115.000	0		0		0	0	0	0	115.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	147.200	0	0	0	0	0	0		147.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	18.400	0	0	18.400	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	115.000	115.000
Pensión	1	147.200	147.200
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	1	18.400	18.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	280.600	280.600

40911175

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

1P6P

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52312451	ALEXANDRA DIAZ NUVAN	CALLE 388 72J 09	2735468	aleadinu@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2020-03	2020-02	1	27/02/2020	40911175	TOTAL A PAGAR	
					$260.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombiano	Sueldo	Extranjero	Cotizante Exonerado	IGE	ATE	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52312451	DIAZ NUVAN ALEXANDRA	3	0		N																	231001	920.000	147.200	0	0	0	0	EPS008	920.000	115.000		0		0	CCF24	920.000	18.400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

1869

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	60449747
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CINDY KATHERINE ORTIZ ZAMBRANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	ABREGO	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 25 4 19 SAN MATEO	TELÉFONO:	5764836
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**1724997502**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2020	SALUD:	AÑO:	2020
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2020/03/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9999304371

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 140.500
SUBTOTAL:			1	**$ 140.500**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
901097473	EPS044	EPS044-MEDIMÁS	1	$ 109.800
SUBTOTAL:			1	**$ 109.800**

TOTAL PAGADO:	**$ 250.300**

Planilla Pagada

37

1870

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18762011007010

5. Número de identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

7 9 1 7 5 5 8 | 1 | SALGADO | SALGADO | EVER | JOSE

11. Razón social

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Sincelejo | Cod. 2 3

24. Dirección

CR 20 1825 ED BEMCN OF 202

25. País | 26. Departamento | 27. Municipio

Colombia | Sucre | Sincelejo

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado. Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente, por una vigencia de 24 meses, contados a partir de la fecha formalización de éste documento y descritos en la hoja 2 y subsiguientes. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación, podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de estos rangos.

Colombia, un compromiso que no podemos evadir

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E. T.

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

2018-10-30 09:28:11 AM
Fecha Acuse de Recibo

1001. Apellidos y nombres: SALGADO SALGADO EVER JOSE
1002. Tipo doc: Cédula 1003. No Identif: 7917558 1004. DV: 1
1005. Cod. Representación
1006. Organizacion: SALGADO SALGADO EVER JOSE

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia: Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
990. Lugar administrativo
991. Organización: U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Area
993. Establecimiento

997. Fecha formalización: 2 0 1 8-1 0-3 0 0 9:2 8:1 1

8

1871

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Página 2 de 2 Hoja No. 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18762011007010

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
79175581	1	SALGADO	SALGADO	EVER	JOSE

11. Razón social

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
1	SALGADO SALGADO EVER JOSE CR 20 1823 ED BEMON OF 202	PAPEL	1		128	500	HABILITACIÓN	2
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								

1872

BOGOTÁ

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A : 17 DE FEBRERO DE 2020 AL 16 DE MARZO DE 2020

CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP-328 DE 2019

OBJETO: CONTRATAR MDIENTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA ADECUAR Y/O REPARAR LA ESTRUCTURA FISICA DE CINCO (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGUN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO

CONTRATISTA: EVER JOSE SALGADO SALGADO

PLAZO : 6 MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS

INTERVENTOR: CONSORCIO GEBAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 1.359.307.248

FECHA DE INICIACION: E ENERO DE 2020 FECHA DE TERMINACION: 16 DE JULIO DE 2020

CONDICIONES CONTRACTUALES						UNIDAD OPERATIVA JARDIN INFANTIL LA COMETA					
						CORTE 01		CORTE 02		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	V/UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	PRELIMINARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
1.1.4	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, ETC, CORRIDOS, POYOS, MESONES, PREFABRICADOS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS	M	$ 29.917,00	15	$ 448.755	0	$ -		$ -	0,00	$ -
1.1.6	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., INCLUYE DISPOSICIÓN, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UN	$ 21.158,00	18	$ 380.844	5	$ 105.790		$ -	5,00	$ 105.790
1.1.7	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO (MADERA - METÁLICAS), (INCLUYE MARCO, DISPOSICIÓN, RETIRO Y CARGUE)	UN	$ 27.907,00	19	$ 530.233	0	$ -		$ -	0,00	$ -
1.1.9	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO DEL RELLENO, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS)	M	$ 14.408,00	102	$ 1.469.616	3	$ 43.224		$ -	3,00	$ 43.224
1.1.12	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS)	M2	$ 19.246,00	104	$ 2.001.584	0	$ -		$ -	0,00	$ -
1.1.13	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0,20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS)	M2	$ 43.820,00	310	$ 13.584.200	2	$ 87.640		$ -	2,00	$ 87.640
1.1.20	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	UN	$ 12.446,00	15	$ 186.690	0	$ -		$ -	0,00	$ -
1.1.21	RETIRO DE PELICULA DE SEGURIDAD EXISTENTES EN MAL ESTADO	M2	$ 8.516,00	130	$ 1.120.080	14,11	$ 121.572		$ -	14,11	$ 121.572
1.1.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN TUBO METÁLICO REDONDO 1-1/2 H=1,35 M, NO INCLUYE CONCRETO NI ACERO DE REFUERZO	M	$ 228.718,00	17	$ 3.854.206	0	$ -		$ -	0,00	$ -
2,1	EXCAVACIONES										
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS)	M3	$ 40.212,00	40	$ 1.608.480	29,19	$ 1.173.788		$ -	29,19	$ 1.173.788
2,2	CONCRETOS										
2.2.1	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI (NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 310.437,00	7	$ 2.095.450	0	$ -		$ -	0,00	$ -
2,4	REFUERZOS										
2.4.1	MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0,15 X 0,15 M	KG	$ 3.178,00	98	$ 311.444	71,57	$ 227.449		$ -	71,57	$ 227.449
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
4.1.2	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 44.467,00	16	$ 667.005	5,50	$ 244.569		$ -	5,50	$ 244.569
4.1.4	TUBERIA PVCP RDE 21 DE 3" INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 49.233,00	35	$ 1.723.155	0	$ -		$ -	0,00	$ -
4.1.11	TUBERIA PVCP RDE 9 DE ½" INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 7.604,00	8	$ 60.832	3	$ 22.812		$ -	3,00	$ 22.812
4.1.15	PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS ½"	UN	$ 26.372,00	8	$ 210.976	1	$ 26.372		$ -	1,00	$ 26.372
4.1.26	REGISTRO CORTINA 1/2"	UN	$ 44.526,00	1	$ 44.526	0	$ -		$ -	0,00	$ -
4.1.38	CHEQUE HIDRO 3/4"	UN	$ 39.344,00	4	$ 157.376	0	$ -		$ -	0,00	$ -
4.1.39	CHEQUE HIDRO 1/2"	UN	$ 30.900,00	2	$ 61.800	0	$ -		$ -	0,00	$ -

BOGOTÁ

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A : 17 DE FEBRERO DE 2020 AL 16 DE MARZO DE 2020

CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP-328 DE 2019

OBJETO: CONTRATAR MDIENTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA ADECUAR Y/O REPARAR LA ESTRUCTURA FISICA DE CINCO (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGUN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO

CONTRATISTA: EVER JOSE SALGADO SALGADO

PLAZO : 6 MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS

INTERVENTOR: CONSORCIO GEBAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 1.359.307.248

FECHA DE INICIACION: E ENERO DE 2020

FECHA DE TERMINACION: 16 DE JULIO DE 2020

UNIDAD OPERATIVA JARDIN INFANTIL LA COMETA											
CONDICIONES CONTRACTUALES						CORTE 01		CORTE 02		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	V/UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
4.1.57	PUNTO SANITARIO 4"	UN	$ 62.984,00	1	$ 62.984	5	$ 314.920		$ -	5,00	$ 314.920
4.1.67	SIFON DE PISO 4"	UN	$ 68.433,00	2	$ 136.866	1	$ 68.433		$ -	1,00	$ 68.433
4.1.68	SIFON DE PISO 3"	UN	$ 48.567,00	1	$ 48.567	0	$ -		$ -	0,00	$ -
4.1.83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFON PLASTICO FLEXIBLE	UN	$ 36.497,00	2	$ 72.994	15	$ 547.455		$ -	15,00	$ 547.455
4.1.84	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS, LIMPIEZA DE TUBERIAS Y CAJAS DE INSPECCION	UN	$ 96.631,00	16	$ 1.546.096	13	$ 1.256.203		$ -	13,00	$ 1.256.203
4,2	CAJAS DE INSPECCIÓN										
4.2.1	CAJA DE INSPECCION 60X60	UN	$ 417.016,00	1	$ 417.016	1	$ 417.016		$ -	1,00	$ 417.016
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	$ 68.846,00	10	$ 688.460	2	$ 137.698		$ -	2,00	$ 137.698
5.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 3X40A 50 KA	UN	$ 347.121,00	1	$ 347.121	0	$ -		$ -	0,00	$ -
5.1.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	$ 34.314,00	100	$ 3.431.400	0	$ -		$ -	0,00	$ -
5.1.58	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA CAJA DE MEDIDA EN BAJA TENSIÓN. INCLUYE VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4M, CONECTOR DE TORNILLO PARA VARILLA-CABLE, CAJA DE 30X30CM CON TAPA, TUBERÍA Y TERMINAL PVC CONDUIT DE 1/2" Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	GLOBAL	$ 313.978,00	1	$ 313.978	0	$ -		$ -	0,00	$ -
5.1.59	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 6X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, TAPA DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA. CONECTORES, SOPORTES. ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. NO INCLUYE CABLEADO.	UN	$ 55.924,00	15	$ 838.860	0	$ -		$ -	0,00	$ -
5.1.66	SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED. CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 7M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA OCTAGONAL, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	$ 88.358,00	4	$ 353.432	0	$ -		$ -	0,00	$ -
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. INCLUYE DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES, RETIRO Y DISPISICION FINAL	UN	$ 157.134,00	64	$ 10.056.576	10	$ 1.571.340		$ -	10,00	$ 1.571.340
5.1.73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	$ 139.597,00	4	$ 558.388	9	$ 1.256.373		$ -	9,00	$ 1.256.373
5.1.75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 4 X 6 CM TROQUELADA	M	$ 30.328,00	10	$ 303.280	0	$ -		$ -	0,00	$ -
7,2	ACABADOS DE PISOS, (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
7.2.16	CINTA ANTIDESLIZANTE A= 2 CM	M	$ 10.262,00	99	$ 1.015.938	0	$ -		$ -	0,00	$ -
7.2.17	PISO EN DUROPISO o REFERENCIA MOKONOS 33,8 X 33,8 CMS, ANTIDESLIZANTE E= 5MM TIPO TRAFICO PESADO	M2	$ 54.513,00	98	$ 5.342.274	34,74	$ 1.893.782		$ -	34,74	$ 1.893.782
7.2.24	MEDIA CAÑA EN FIBRA DE VIDRIO	M	$ 69.694,00	92	$ 6.319.848	0	$ -		$ -	0,00	$ -

1824

BOGOTÁ

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A : 17 DE FEBRERO DE 2020 AL 16 DE MARZO DE 2020

CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP-328 DE 2019

OBJETO: CONTRATAR MDIENTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA ADECUAR Y/O REPARAR LA ESTRUCTURA FISICA DE CINCO (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGUN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO

CONTRATISTA: EVER JOSE SALGADO SALGADO

PLAZO : 6 MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS

INTERVENTOR: CONSORCIO GEBAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 1.359.397.246

FECHA DE INICIACION: E ENERO DE 2020

FECHA DE TERMINACION: 18 DE JULIO DE 2020

UNIDAD OPERATIVA JARDIN INFANTIL LA COMETA												
CONDICIONES CONTRACTUALES						CORTE 01		CORTE 02		ACUMULADO ACTUAL		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	VUNITARIO	CANTIDAD	TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	
7.2.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 3 CM PARA EXTERIORES	M2	$ 378.478,00	37	$ 14.040.686	0	$ -		$ -	0,00	$ -	
7.2.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EROSSION 50 X 50 6MM COLORES	M2	$ 101.502,00	310	$ 31.465.620	0	$ -		$ -	0,00	$ -	
7.2.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN BALDOSA TIPO PIZARRA 51 X 51 CM, ANTIDESLIZANTE, COLOR MATE.	M2	$ 46.121,00	124	$ 5.719.004	0	$ -		$ -	0,00	$ -	
7.2.32	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS A NIVEL DE PISO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M	$ 11.458,00	102	$ 1.168.716	236,15	$ 2.705.807		$ -	236,15	$ 2.705.807	
8	MUROS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
8.1.5	ESQUINERO EN ESPUMA 10 cm x 10 cm largo 1,40 m. INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION.	M	$ 9.908,00	62	$ 614.296	0	$ -		$ -	0,00	$ -	
9	CARPINTERIA METALICA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO											
9.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA. INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD COLORES, HERRAJES Y CERRADURA INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. CONANTIMACHUCON A AMBOS COSTADOS SI SE REQUIERE	M2	$ 370.753,00	61	$ 22.615.933	0	$ -		$ -	0,00	$ -	
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), INCLUYE ANGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	$ 60.947,00	5	$ 304.735	1,05	$ 63.994		$ -	1,05	$ 63.994	
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
11.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA Y GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	$ 322.537,00	3	$ 967.611	0	$ -		$ -	0,00	$ -	
11.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE PEDESTAL COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA, GRIFERÍA TIPO PUSH Y SELLANTE)	UN	$ 279.200,00	1	$ 279.200	2	$ 558.400		$ -	2,00	$ 558.400	
11.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	$ 289.449,00	2	$ 578.898	0	$ -		$ -	0,00	$ -	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO DE DOS CUERPOS, BICIOLOR, Boton superior con diseño moderno e innovador, de una sola descarga. Consumo de 4,8lts, perfil redondo con asiento cierre suave (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	$ 476.077,00	3	$ 1.428.231	2	$ 952.154		$ -	2,00	$ 952.154	
11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	$ 316.830,00	1	$ 316.830	1	$ 316.830		$ -	1,00	$ 316.830	
11.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTL COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	$ 212.190,00	3	$ 636.570	0	$ -		$ -	0,00	$ -	
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TELEDUCHA (INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN, MANGUERA Y SOPORTES)	UN	$ 115.953,00	3	$ 347.859	0	$ -		$ -	0,00	$ -	
11.1.10	DUCHAS CON GRIFERÍA	UN	$ 178.247,00	3	$ 534.741	0	$ -		$ -	0,00	$ -	
11.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	$ 172.406,00	2	$ 344.812	10	$ 1.724.060		$ -	10,00	$ 1.724.060	
11.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA AHORRADORA COMPLETA PARA SANITARIO ADULTO	UN	$ 69.035,00	1	$ 69.035	0	$ -		$ -	0,00	$ -	
11.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA TIPO PUSH PARA ORINAL LÍNEA INFANTIL	UN	$ 59.699,00	4	$ 238.796	1	$ 59.699		$ -	1,00	$ 59.699	
11.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLADORES TIPO CUELLO DE GANSO DE 8" SENCILLOS PARA LAVAPLATOS	UN	$ 78.862,00	2	$ 157.724	0	$ -		$ -	0,00	$ -	

BOGOTA

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A : 17 DE FEBRERO DE 2020 AL 16 DE MARZO DE 2020

CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP-328 DE 2019

OBJETO: CONTRATAR MDIENTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA ADECUAR Y/O REPARAR LA ESTRUCTURA FISICA DE CINCO (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGUN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO

CONTRATISTA: EVER JOSE SALGADO SALGADO

PLAZO : 6 MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS

INTERVENTOR: CONSORCIO GEBAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 1.359.307.248

FECHA DE INICIACION: E ENERO DE 2020 **FECHA DE TERMINACION:** 16 DE JULIO DE 2020

		UNIDAD OPERATIVA JARDIN INFANTIL LA COMETA									
CONDICIONES CONTRACTUALES						CORTE 01		CORTE 02		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	V/UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
11.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20	UN	$ 16.225,00	2	$ 32.450	3	$ 48.675		$ -	3,00	$ 48.675
11.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 5" A 4"	UN	$ 23.624,00	2	$ 47.248	0	$ -		$ -	0,00	$ -
11.1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA TANQUE DE RESERVA INCLUYE CONEXIONES Y ACCESORIOS	UN	$ 306.106,00	2	$ 612.212	0	$ -		$ -	0,00	$ -
11.1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR ELÉCTRICO, CAPACIDAD MAYOR O IGUAL A 5 LT, 220 V, 9.5 KW O SUPERIOR	UN	$ 727.960,00	2	$ 1.455.920	1	$ 727.960		$ -	1,00	$ 727.960
12	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
12.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE GABINETE EN ACERO INOXIDABLE. ALTURA: 0,70 M, CON ENTREPAÑO Y PUERTA. INCLUYE INSTALACIÓN.70*35, CALIBRE 20 REF 304. ANTIÁCIDO Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACION	M	$ 1.432.531,00	2	$ 2.865.062	0	$ -		$ -	0,00	$ -
12.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIMSIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS	M2	$ 748.572,00	3	$ 2.246.716	0,65	$ 486.572		$ -	0,65	$ 486.572
13	PAÑETE Y PINTURA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
13,2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS										
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA	M2	$ 15.881,00	86	$ 1.338.248	353,85	$ 5.506.260		$ -	353,85	$ 5.506.260
13.2.5	PINTURA REPELENTE DE HUMEDAD	M2	$ 17.803,00	200	$ 3.560.600	0	$ -		$ -	0,00	$ -
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS)	M2	$ 20.754,00	354	$ 7.346.916	0	$ -		$ -	0,00	$ -
13.2.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA PISO TRÁFICO PESADO	M2	$ 20.150,00	100	$ 2.015.000	0	$ -		$ -	0,00	$ -
13,4	PINTURA SOBRE METAL										
13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS	M2	$ 16.583,00	11	$ 179.096	0	$ -		$ -	0,00	$ -
13.4.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	$ 14.807,00	102	$ 1.510.314	17,57	$ 260.159		$ -	17,57	$ 260.159
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA	M	$ 16.231,00	20	$ 324.620	1132,42	$ 18.380.309		$ -	1.132,42	$ 18.380.309
13.4.4	ESMALTE SOBRE CANAL METÁLICA EN ACERO GALVANIZADO	M2	$ 14.713,00	45	$ 662.085	49,95	$ 734.914		$ -	49,95	$ 734.914
14	CIELOS RASOS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
14.1.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM)	M2	$ 73.499,00	50	$ 3.674.950	50,78	$ 3.732.279		$ -	50,78	$ 3.732.279
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO FALSO EN PANEL SUPERBOARD DE 6 MM - INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA MASILLA	M2	$ 98.165,00	35	$ 3.365.425	24,55	$ 2.360.605		$ -	24,55	$ 2.360.605
14.1.5	INSTALACION LÁMINA DE FIBROCEMENTO 20 MM, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, DESMONTE , RETIRO Y DIPOSICION	M2	$ 130.601,00	310	$ 40.486.310	205,46	$ 26.833.281		$ -	205,46	$ 26.833.281
15,2	VIDRIOS Y ESPEJOS										
15.2.1	ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E=4MM	M2	$ 80.053,00	5	$ 400.265	0	$ -		$ -	0,00	$ -

BOGOTÁ

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A : 17 DE FEBRERO DE 2020 AL 16 DE MARZO DE 2020

CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP-328 DE 2019

OBJETO: CONTRATAR MDIENTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA ADECUAR Y/O REPARAR LA ESTRUCTURA FISICA DE CINCO (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGUN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO

CONTRATISTA: EVER JOSE SALGADO SALGADO

PLAZO : 6 MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS

INTERVENTOR: CONSORCIO GEBAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 1.359.307.248

FECHA DE INICIACION: E ENERO DE 2020 FECHA DE TERMINACION: 18 DE JULIO DE 2020

CONDICIONES CONTRACTUALES						UNIDAD OPERATIVA JARDIN INFANTIL LA COMETA					
						CORTE 01		CORTE 02		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	V/UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
15.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELÍCULA DE SEGURIDAD 4 MICRAS (AMBAS CARAS)	M2	$ 31.384,00	10	$ 313.840	0	$ -		$ -	0,00	$ -
15.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANDBLASTING COLOR OPAL SÓLIDO O TIPO PERSIANA (AMBAS CARAS)	M2	$ 47.637,00	10	$ 476.370	14,11	$ 672.158		$ -	14,11	$ 672.158
16	OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
16.1.11	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE CUNETAS EXISTENTES (INCLUYE RESANES, ESMALTADA Y CORRECCIÓN DE PENDIENTES) ANCHO < 80 CM	M	$ 24.894,00	50	$ 1.244.700	0	$ -		$ -	0,00	$ -
16.1.12	RELLENO CON RECEBO COMPACTADO B600 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	$ 97.341,00	2	$ 219.017	26,63	$ 2.592.191		$ -	26,63	$ 2.592.191
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
17.1.2	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 45.416,00	124	$ 5.631.832	0	$ -		$ -	0,00	$ -
17.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO	M	$ 36.656,00	30	$ 1.099.680	0	$ -		$ -	0,00	$ -
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	$ 120.834,00	364	$ 43.983.576	294,04	$ 35.530.029	5,53	$ 668.212	299,57	$ 36.198.241
17.1.17	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA	M2	$ 41.454,00	46	$ 1.915.175	294,04	$ 12.189.134		$ -	294,04	$ 12.189.134
	ITEMS IMPORTADOS DE LOS OTROS JARDINES										
1,1,1	CERRAMIENTO EN LONA BLANCA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 m (J.I. VISION COLOMBIA)	M	$ 20.483,00			21,30	$ 436.288		$ -	21,30	$ 436.288
1,1,5	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS (J.I. VISION COLOMBIA)	M2	$ 10.627,00			24,55	$ 260.893		$ -	24,55	$ 260.893
13.2.2	PINTURA EPOXICA (J.I.METRO)	M2	$ 15.273,00			82,19	$ 1.255.288		$ -	82,19	$ 1.255.288
17.1.6	INSTALACION DE POLICARBONATO EN COLORES VARIOS CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM,INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (J. I. VISION COLOMBIA)	M2	$ 116.191,00			44,61	$ 5.183.281		$ -	44,61	$ 5.183.281
	PRECIOS NO PREVISTOS										
NP-1	LIMPIEZA INTERIOR PANELES EN PVC DE MUROS Y TECHOS INCLUYE RETIRO DE FIGURAS EN VINILO, PEGANTES ETC	M2	$ 6.355,00					1.356,37	$ 8.619.731	1.356,37	$ 8.619.731
NP-2	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=.10	M2	$ 68.750,00					2,00	$ 137.500	2,00	$ 137.500
NP-3	PISO EN ROLLO REF DELIGHT HETEROGENEO UNICOLOR CON NANOPLATA- TRAFICO INDUSTRIAL E=2.2,MM IMPORTADO LG FLOORS	M2	$ 106.120,00					163,50	$ 17.350.620	163,50	$ 17.350.620
NP-4	REINSTALACION DE PUERTAS EXISTENTES	UN	$ 28.800,00					4,00	$ 115.200	4,00	$ 115.200
NP-5	ANDEN EN CONCRETO E=.10 ACABADO LLANA DE MADERA ANCHO 0.60	ML	$ 54.280,00					69,61	$ 3.778.431	69,61	$ 3.778.431
NP-6	SUMINISTRO E ISTALACION DE PISO EN TABLETA GRES TIPO ROJO RUSTICA 10X10 INCLUYE PICADO DE LA SUPERFICIE Y ALISTADO CON MORTERO DE REPARACION DEL AREA A INSTALAR	M2	$ 197.012,00					22,65	$ 4.462.322	22,65	$ 4.462.322
NP-7	DESMONTE DE FLANCHE DE CUBIERTA	ML	$ 15.300,00					120,43	$ 1.842.579	120,43	$ 1.842.579
NP-8	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA PASA BANDEJAS EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 DE 1.20*0.47	UN	$ 1.234.500,00					0,00	$ -	0,00	$ -
NP-9	SUM E INSTALACION DE LAMPARAS HERMETICAS LED DE 2X18 WATTS COCINA	UN	$ 127.280,00					5,00	$ 636.400	5,00	$ 636.400
NP-10	DESMONTE, LIMPIEZA, NIVELACION Y REINSTALACION DE TABLETAS PREFABRICADAS EN CONCRETO PARA ANDENES	M2	$ 26.160,00					15,90	$ 415.944	15,90	$ 415.944

BOGOTÁ

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A : 17 DE FEBRERO DE 2020 AL 16 DE MARZO DE 2020

CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP-328 DE 2019

OBJETO: CONTRATAR MDIENTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA ADECUAR Y/O REPARAR LA ESTRUCTURA FISICA DE CINCO (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGUN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO

CONTRATISTA: EVER JOSE SALGADO SALGADO

PLAZO : 6 MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS

INTERVENTOR: CONSORCIO GEBAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 1.359.307.248

FECHA DE INICIACION: E ENERO DE 2020 FECHA DE TERMINACION: 16 DE JULIO DE 2020

CONDICIONES CONTRACTUALES						UNIDAD OPERATIVA JARDIN INFANTIL LA COMETA					
						CORTE 01		CORTE 02		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	V/UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
NP-11	APLICACIÓN DE ESMALTE 3 EN 1 SOBRE ESTRUCTURAS METALICAS INCLUYE LIJADO	ML	$ 11.980,00					2.575,34	$ 30.852.573	2.575,34	$ 30.852.573
NP-12	DESMONTE DE GUARDAESCOBAS Y/O MEDIACAÑAS EN PVC EXISTENTE	ML	$ 4.800,00					199,76	$ 958.848	199,76	$ 958.848
NP-13	REINSTALACION DE GUARADEASCOBAS EN PVC CON MATERIAL RETIRADO	ML	$ 4.664,00					3,00	$ 13.992	3,00	$ 13.992
NP-14	DESMONTE Y REINSTALACION DE DUCTOS METALICOS EXISTENTES	ML	$ 9.328,00					12,50	$ 116.600	12,50	$ 116.600
NP-15	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJAS EXTERIORES EN LAMINA GALV CAL 18 DE 35 A 50 CM DE DESARROLLO.	ML	$ 108.109,00					0,00	$ -	0,00	$ -
NP-16	RETIRO DE PISO VINILICO EXISTENTE	M2	$ 7.800,00					147,14	$ 1.147.692	147,14	$ 1.147.692
NP-17	RETIRO DE LAMINAS EN MADERA AGLOMERADA EN PISOS EXISTENTES	M2	$ 8.000,00					175,97	$ 1.407.760	175,97	$ 1.407.760
NP-18	DESMONTE DE BAJANTES EXISTENTES	ML	$ 6.500,00					13,92	$ 90.480	13,92	$ 90.480
NP-19	DESMONTE DE LAMINAS DE POLICARBONATO EXISTENTES AREA ESCALERA	M2	$ 8.900,00					44,61	$ 397.029	44,61	$ 397.029
NP-20	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES EN TUBERIA PVC SANITARIA DE 3"	ML	$ 35.852,00					0,00	$ -	0,00	$ -
NP-21	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIACAÑAS PVC DE 6 CM	ML	$ 15.889,00					95,79	$ 1.522.007	95,79	$ 1.522.007
NP-22	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIACAÑAS PVC DE 9 CM	ML	$ 19.521,00					317,47	$ 6.197.332	317,47	$ 6.197.332
NP-23	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 DE 60 CM DE DESARROLLO	ML	$ 109.428,00					41,62	$ 4.554.393	41,62	$ 4.554.393
NP-24	APLICACIÓN DE WASH PRIMER SOBRE PERFILES EXISTENTES DE LAMINA GALVANIZADA DE MUROS Y TECHOS (CANAL)	ML	$ 13.490,00					536,45	$ 7.236.711	536,45	$ 7.236.711
NP-25	LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE VENTANERIA EN PVC	M2	$ 5.599,00					285,63	$ 1.599.242	285,63	$ 1.599.242
NP-26	LIMPIEZA Y REEMBOQUILLADO CON ARENA DE ANDENES EXISTENTES	M2	$ 7.920,00					61,04	$ 483.437	61,04	$ 483.437
NP-27	SUM E INSTALACION DE BORDILLO CONCRETO PREFABRICADO DE 10 X 20 CM	ML	$ 28.870,00					125,61	$ 3.626.361	125,61	$ 3.626.361
NP-28	SUM E INSTALACION DE CAÑUELA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 30 X20 CM	ML	$ 39.395,00					7,00	$ 275.765	7,00	$ 275.765
NP-29	REVISION GENERAL DE PUNTOS Y SALIDAS ELECTRICAS	UN	$ 440.000,00					1,00	$ 440.000	1,00	$ 440.000
NP-30	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA EN PVC IMITACION MADERA	ML	$ 11.371,00					0,00	$ -	0,00	$ -
NP-31	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENEFAS EN GRAVILLA MONA LAVADA A=10 CM	ML	$ 25.155,00					46,58	$ 1.171.720	46,58	$ 1.171.720
NP-32	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESQUINEROS EN LONA VERANO DE COLORES ACOLCHADOS EN JUMBOLENE DE 1.20 X 10 CM	UN	$ 23.863,00					102,00	$ 2.434.026	102,00	$ 2.434.026
NP-33	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA PVC EN ROLLO DE 8 DE CM INCLUYE PEGANTE	ML	$ 8.669,00					118,50	$ 1.027.277	118,50	$ 1.027.277
NP-34	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJAS INTERIORES EN LAMINA PARA CANALES DETERIORADAS DESARROLLO 0,35 CM	ML	$ 75.402,00					26,84	$ 2.023.790	26,84	$ 2.023.790
NP-35	SUM E INST DE MARCO PERIMETRAL CON MALLA PLASTICA ANTIPAJAROS	ML	$ 80.592,00					0,00	$ -	0,00	$ -
NP-36	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS QUIRURGICO CON GRIFERIA DE PEDAL EN ACERO INOXIDABLE DE 60X40 CMS	UN	$ 1.023.940,00					1,00	$ 1.023.940	1,00	$ 1.023.940

BOGOTÁ

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A : 17 DE FEBRERO DE 2020 AL 16 DE MARZO DE 2020

CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP-328 DE 2019

OBJETO: CONTRATAR MDIENTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA ADECUAR Y/O REPARAR LA ESTRUCTURA FISICA DE CINCO (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGUN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO

CONTRATISTA: EVER JOSE SALGADO SALGADO

INTERVENTOR: CONSORCIO GEBAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 1.359.307.248

PLAZO : 6 MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS

FECHA DE INICIACIÓN: E ENERO DE 2020 FECHA DE TERMINACION: 16 DE JULIO DE 2020

CONDICIONES CONTRACTUALES					UNIDAD OPERATIVA JARDIN INFANTIL LA COMETA					
					CORTE 01		CORTE 02		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	V/UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
				SUB-TOTAL	$ 271.207.282	SUB-TOTAL	$ 133.087.656	SUB-TOTAL	$ 106.627.914	SUB-TOTAL	$ 239.715.570
	ADMINISTRACION	20,16%			$ 54.675.388		$ 26.830.471		$ 21.496.187		$ 48.326.658
	IMPREVISTOS	1,00%			$ 2.712.073		$ 1.330.877		$ 1.066.279		$ 2.397.156
	UTILIDAD	5,00%			$ 13.560.364		$ 6.654.383		$ 5.331.396		$ 11.985.779
	TOTAL				$ 342.155.107		$ 167.903.387		$ 134.521.776		$ 302.426.163
	INVERSION GESTION SOCIAL PARA LA OBRA (Ver Anexo)				$ 1.731.264		$ 168.100		$ 15.000		$ 183.100
	AIU	15,40%			$ 266.583		$ 25.887		$ 2.310		$ 28.197
	SUB-TOTAL				$ 1.997.867		$ 193.987		$ 17.310		$ 211.297
	INVERSION GESTION AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA OBRA				$ 15.603.456		$ 4.623.529		$ 1.661.887		$ 6.285.416
	(Ver Anexo) AIU	14,76%			$ 2.454.372		$ 683.358		$ 245.627		$ 928.985
	SUB-TOTAL				$ 19.057.828		$ 5.306.887		$ 1.907.514		$ 7.214.401
	VALOR TOTAL CONTRACTUAL DE OBRA DIRECTOS + A.I.U.				$ 1.325.642.810						
	VALOR BASICO PARA AJUTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRA				$ 12.608.743						
	SEGÚN AVANCE CORTE DE OBRA No. 1 NO COBRADO EN ACTA ANTERIOR							12,67%	$ 1.596.999		$ 1.596.999
	SEGÚN AVANCE CORTE DE OBRA No. 2 PRESENTE ACTA							10,15%	$ 1.279.493		$ 1.279.493
	VALOR TOTAL PRESENTE CORTE						$ 173.404.261		$ 139.323.092		$ 312.727.353

POR EL CONTRATISTA

ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL
Director de Obra Arq.Ever José Salgado Salgado

POR LA INTERVENTORIA

ING. LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ
Representante Legal Consorcio GEBAL

POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ
Supervisora FDLK

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

CONTROL DE INVERSIÓN GESTION SOCIAL PARA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA ADECUAR Y/O REPARAR LA ESTRUCTURA FISICA EN LOS JARDINES INFANTILES LA COMETA, METRO, LOS NIETOS DEL TRUENO, VISION DE COLOMBIA Y PIO XII DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO

Componente A. Plan de Gestión Social

	COMPONENTE	Unidad	Valor Unitario	Cantidad Obra	Subtotal	CORTE 01	VALOR TOTAL	CORTE 02	VALOR TOTAL
A.1	**Programa de Información**								
A.1.1	VIDEO BEAM - ALQUILER POR DIA	DIA	$ 59.900	4,0	$ 239.600,0	2	$ 119.800	0	$ 0
				SubTotal programa de información	**$ 239.600,0**		**$ 119.800**		**$ 0**
A.2	**Programa de Divulgación al ciudadano**								
A.2.1	PLEGABLES DE SOSTENIBILIDAD EN TRES CUERPOS TAMAÑO CARTA A 4X4 TINTAS EN PROPALCOTE.	UN	$ 333	500,0	$ 166.500,0	100	$ 33.300	0	$ 0
A.2.2	IMPRESIÓN HOJA CARTA, A 1X0 TINTAS EN PAPEL BOND DE 75 GR.	UN	$ 150	500,0	$ 75.000,0	100	$ 15.000	100	$ 15.000
A.2.3	VALLA 3.0 M X 6.0 M CON ESTRUCTURA METALICA	M2	$ 208.364	6,0	$ 1.250.184,0			0	$ 0
				SubTotal programa de divulgación al ciudadano	**$ 1.491.684,00**		**$ 48.300**		**$ 15.000**
	SUBTOTAL COSTO DEL PLAN DE GESTION SOCIAL				**$ 1.731.284,0**		**$ 168.100**		**$ 15.000**
	AIU			**15,40%**	**$ 266.583,0**		$ 25.887		$ 2.310
	TOTAL COSTO DEL PLAN DE GESTION SOCIAL				**$ 1.997.867,0**		**$ 193.987**		**$ 17.310**

NOTA: LOS PRECIOS PARA ESTE CONTROL DE INVERSION FUERON TOMADOS DEL IDU, PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA 2018 Y MANO DE OBRA 2019

1880

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

CONTROL DE INVERSIÓN GESTION AMBIENTAL, SEGUIRDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA ADECUAR Y/O REPARAR LA ESTRUCTURA FISICA EN LOS JARDINES INFANTILES LA COMETA, METRO, LOS NIETOS DEL TRUENO, VISION DE COLOMBIA Y PIO XII DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO

COMPONENTE A - PERSONAL

EJECUCIÓN DE OBRAS

ÍTEMS		UN.	CAT	CANT	DEDIC H/MES	TOTAL DEDIC H/PROY	TARIFA	F.P	TOTAL ACTIVIDAD	CORTE 01	VALOR TOTAL	CORTE 02	VALOR TOTAL
A.1	BRIGADA DE ORDEN, ASEO Y LIMPIEZ												
1,1	Tarifa MES - PERSONAL DE OBRA- AYUDANTE SIN PRESTACIONES	MES	1	1	1,00	10,00	$ 781.242	1,6479	$ 12.874.087,0	2	$ 2.574.817,38	1	$ 1.287.408,69
	SUBTOTAL COMPONENTE A								$ 12.874.087,0	COMP A	$ 2.574.817,38	COMP A	$ 1.287.408,69

COMPONENTE B. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

ÍTEMS		ESPECIFICACIÓN	UN.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
B 1	MANEJO DE CAMPAMENTOS Y CENTROS DE ACOPIO									
1,1	CANECAS PARA CAMPAMENTOS Y FRENTES DE OBRA	CANECA PLASTICA NEGRA DE 55 GALONES CON TAPA PLANA	UN	2,0	$ 26.180,00	$ 52.360,0	1	$ 26.180,00	0	$ 0,00
		SUBTOTAL DEL PROGRAMA				$ 52.360,0		$ 26.180,00		$ 0,00
B 2	MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN									
2,1	PUNTO DE ACOPIO DE MATERIALES	PLASTICO NEGRO CALIBRE 6	M2	10,0	$ 1.155,00	$ 11.550,0	10	$ 11.550,00	0	$ 0,00
		SEÑALIZACION TUBULAR COLOMBINA PLASTICA	UN	4,0	$ 24.990,00	$ 99.960,0	2	$ 49.980,00	0	$ 0,00
		CINTA PARA SEÑALIZACION DE 500MT X 4" PELIGRO. CALIBRE 3,5	ROLLO	2,0	$ 15.470,00	$ 30.940,0	1	$ 15.470,00	0	$ 0,00
		SUBTOTAL DEL PROGRAMA				$ 142.450,0		$ 77.600,00		$ 0,00
B 3	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS									
3,1	KIT BRIGADA DE ASEO Y LIMPIEZA	CARRETRILLA RUEDA NEUMATICO PLATON METALICO CAPACIDAD CINCO PIES CUBICOS MANGO MADERA TIPO BUGGY	UN	1,0	$ 107.100,00	$ 107.100,0	1	$ 107.100,00	0	$ 0,00
		PALA REDONDA 2 CON CABO	UN	1,0	$ 10.252,00	$ 10.252,0	1	$ 10.252,00	0	$ 0,00
		CEPILLO INDUSTRIAL DE NYLON CON CABO DE 35 CM A 42 CM X 9CM X 17 CM	UN	1,0	$ 12.000,00	$ 12.000,0	1	$ 12.000,00	0	$ 0,00
		BARRA DE 18LB CON PUNTA Y PALA 150CM X 10CM	UN	1,0	$ 48.300,00	$ 48.300,0	1	$ 48.300,00	0	$ 0,00
		SERRUCHO DE 20" DIENTE ENDURECIDO	UN	1,0	$ 15.990,00	$ 15.990,0	1	$ 15.990,00	0	$ 0,00
		MARTILLO DE BPOLA DE 2LB	UN	1,0	$ 27.100,00	$ 27.100,0	1	$ 27.100,00	0	$ 0,00
		BOLSA PARA BASURA TIPO INDUSTRIAL NEGRA DE 60X90 CM CALIBRE 2 (PAQUETE DE 30 UNIDADES)	UN	4,0	$ 9.990,00	$ 39.960,0	4	$ 39.960,00	0	$ 0,00
		SUBTOTAL DEL PROGRAMA				$ 260.702,0		$ 260.702,00		$ 0,00
		SUBTOTAL COMPONENTE B				$ 455.512,0	COMP B	$ 363.882,0	COMP B	$ 0,0

COMPONENTE C. GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
ÍTEMS		UN.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CORTE 01	VALOR TOTAL	CORTE 02	VALOR TOTAL
C1	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO								
1,01	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS CON MEDICAMENTO DE 22CM X 27CM	UN	2,0	$ 49.900,00	$ 99.800,0	1	$ 49.900,00	0	$ 0,00
1,02	CAMILLA MADERA PRIMEROS AUXILIOS INMOVILIZADOR CABEZA	UN	2,0	$ 190.400,00	$ 380.800,0	1	$ 190.400,00	0	$ 0,00
1,03	EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO DE 20 LB TIPO ABC METALICO CON GANCHO Y AVISO	UN	2,0	$ 51.170,00	$ 102.340,0	1	$ 51.170,00	0	$ 0,00
1,04	BOTA CUERO LISA NEGRA SEGURIDAD PUNTERA DE ACERO	PAR	5,0	$ 29.750,00	$ 148.750,0	2	$ 59.500,00	2	$ 59.500,00
1,05	BOTA DE CAUCHO, CINTA AMARILLA , PUNTERA Y PLANTILLA EN ACERO.	PAR	5,0	$ 77.653,00	$ 388.265,0	2	$ 155.306,00	2	$ 155.306,00
1,06	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON INSERCION EN SILICONA CON CORDEL EN ESTUCHO 25DB	PAR	10,0	$ 1.298,00	$ 12.980,0	2	$ 2.592,00	2	$ 2.592,00
1,07	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA	UN	2,0	$ 14.280,00	$ 28.560,0	1	$ 14.280,00	1	$ 14.280,00
1,08	MASCARILLA DESECHABLE CONTRA POLVOS Y PARTICULAS NO TOXICAS	UN	22,0	$ 1.785,00	$ 39.270,0	4	$ 7.140,00	6	$ 10.710,00
1,09	CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO	UN	10,0	$ 14.280,00	$ 142.800,0	4	$ 57.120,00	2	$ 28.560,00
1,10	BARBUQUEJO EN REATA CON MENTONERA CON TRES APOYOS PARA CASCO	UN	10,0	$ 4.760,00	$ 47.600,0	4	$ 19.040,00	2	$ 9.520,00
1,11	GAFAS DE SEGURIDAD	UN	10,0	$ 3.570,00	$ 35.700,0	4	$ 14.280,00	2	$ 7.140,00
1,12	ARNES MULTIPROPOSITO CON ESLINGA - ANILLOS - PARA RESTRICCION Y DETECCION DE CAIDAS CON PUNTO FIJO	UN	2,0	$ 116.620,00	$ 233.240,0	2	$ 233.240,00	0	$ 0,00
1,13	OVEROL EN DRILL DOS PIEZAS, CAMISA Y PANTALON	UN	6,0	$ 39.270,00	$ 235.620,0	2	$ 78.540,00	2	$ 78.540,00
1,14	OVEROL IMPERMEABLE INDUSTRIAL AMARILLO 2 PIEZAS CON CAPUCHA	UN	2,0	$ 27.900,00	$ 55.800,0	0	$ 0,00	0	$ 0,00
1,15	GUANTE CARNAZA REFORZADO EN CARNAZA LARGO	PAR	6,0	$ 9.000,00	$ 54.000,0	6	$ 54.000,00	0	$ 0,00
1,16	GUANTE DE VAQUETA	UN	6,0	$ 8.092,00	$ 48.552,0	6	$ 48.552,00	0	$ 0,00
1,17	GUANTE CAUCHO NEGRO CORRUGADO CALIBRE 35	PAR	6,0	$ 4.165,00	$ 24.990,0	0	$ 0,00	2	$ 8.330,00
1,18	GUANTE NITRILO 13" RESISTENTE CONTRA QUIMICOS COMBUSTIBLES SOLVENTES GRASAS	PAR	6,0	$ 5.355,00	$ 32.130,0	4	$ 21.420,00	0	$ 0,00
C2	EXÁMENES OCUPACIONALES								
1,19	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO O RETIRO	UN	10,0	$ 24.000,00	$ 240.000,0	6	$ 144.000,00	0	$ 0,00
1,20	EXAMEN DE AUDIOMETRIA DE INGRESO O EGRESO	UN	10,0	$ 16.000,00	$ 160.000,0	6	$ 96.000,00	0	$ 0,00
1,21	EXAMEN DE OPTOMETRIA DE INGRESO O EGRESO	UN	10,0	$ 16.000,00	$ 160.000,0	6	$ 96.000,00	0	$ 0,00
1,22	EXAMEN DE ESPIROMETRIA DE INGRESO O EGRESO	UN	10,0	$ 16.000,00	$ 160.000,0	6	$ 96.000,00	0	$ 0,00
			SUBTOTAL DEL PROGRAMA		$ 2.831.177,0				
			SUBTOTAL COMPONENTE C		$ 2.831.177,0	COMP C	$ 1.488.480,00	COMP C	$ 374.478,00

Nota: Los costos de elementos de protección y de exámenes médicos ocupacionales para los cargos relacionados con las actividades de estructuras metálicas (Montadores, Soldadores y Pintores) están incluidos en el costo de kilogramo de acero de estructura.

COMPONENTE D. PLAN DE SEÑALIZACIÓN										
ÍTEMS		ESPECIFICACIÓN	UN.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
D 1	MANEJO SEÑALIZACIÓN FRENTE DE OBRA									
1,1	SEÑALIZACIÓN INTERNA DE EXCAVACIONES, POZOS, VACÍOS	SEÑALIZACION TUBULAR COLOMBINA PLASTICA	UN.	6,0	$ 24.990,00	$ 149.940,00	2	$ 49.980,00	0	$ 0,00
		CINTA PARA SEÑALIZACION DE 500MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3,5	ROLLO	2,0	$ 15.470,00	$ 30.940,00	1	$ 15.470,00	0	$ 0,00
1,2	SEÑALES DE CAMPAMENTO Y FRENTES DE OBRA	SEÑAL EN POLIESTRENO (30CM X 20CM) - FOTOLUMINISCENTES - NORMA NTC - ISO	UND	4,0	$ 11.900,00	$ 47.600,00	2	$ 23.800,00	0	$ 0,00
		SEÑAL EN POLIESTRIENO (30CM X 20CM) - REFLECTIVO GRAD.INGENIERIA-NORMA ISO	UND	4,0	$ 53.550,00	$ 214.200,00	2	$ 107.100,00	0	$ 0,00
			SUBTOTAL DEL PROGRAMA			$ 442.680,0	COMP D	$ 196.350,00	COMP D	$ 0,00
			SUBTOTAL COMPONENTE D			$ 442.680,0				

SUBTOTAL COMPONENTES A+B+C+D		$ 16.603.456,00		$ 4.623.529,38		$ 1.661.886,69
A.I.U.	14,76%	$ 2.454.372,00		$ 683.357,64		$ 245.626,85
VALOR GLOBAL AMBIENTAL CON AIU : TOTAL COMPONENTES A+B+C+D		$ 19.057.828,00	TOTAL	$ 5.306.887,03	TOTAL	$ 1.907.513,54

NOTA: LOS PRECIOS PARA ESTE CONTROL DE INVERSION FUERON TOMADOS DEL IDU, PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA 2018 Y MANO DE OBRA 2019

BOGOTÁ

CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP-328 DE 2019

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A : 17 DE FEBRERO DE 2020 AL 16 DE MARZO DE 2020

OBJETO: CONTRATAR MDIENTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA ADECUAR Y/O REPARAR LA ESTRUCTURA FISICA DE CINCO (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGUN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO

CONTRATISTA: EVER JOSE SALGADO SALGADO

INTERVENTOR: CONSORCIO GEBAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 1.359.307.248

PLAZO : 6 MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS

FECHA DE INICIACION: 17 DE ENERO DE 2020

FECHA DE TERMINACION: 16 DE JULIO DE 2020

RESUMEN PRESUPUESTAL DE CADA JARDIN INTERVENIDO

ETAPA	UNIDAD OPERATIVA		COSTO DIRECTO	CORTE 01	CORTE 02	CORTE 03	CORTE 04	CORTE 05	ACUMULADO
1	J.I. LA COMETA		$ 271.207.282	$ 133.087.656	$ 106.627.914				$ 239.715.570
2	J.I. METRO		$ 258.589.293						$ 0
3	J.I. NIETOS DEL TRUENO		$ 212.114.843						$ 0
4	J.I. PIO XII		$ 73.386.050						$ 0
5	J.I. VISION DE COLOMBIA		$ 217.253.834						$ 0
	SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS		$ 1.032.551.303	$ 133.087.656	$ 106.627.914				$ 239.715.570
	ADMINISTRACION	20,16%	$ 208.162.343	$ 26.830.471	$ 21.496.187				$ 48.326.659
	IMPREVISTOS	1%	$ 10.325.513	$ 1.330.877	$ 1.066.279				$ 2.397.156
	UTILIDAD	5%	$ 51.627.565	$ 6.654.383	$ 5.331.396				$ 11.985.779
	SUBTOTAL OBRAS		**$ 1.302.666.723**	**$ 167.903.387**	**$ 134.521.776**				**$ 302.425.163**
	PRESUPUESTO COMPONENTE SOCIAL								
	COSTO DIRECTO COMPONENTE SOCIAL		$ 1.997.867	$ 193.987	$ 17.310				$ 211.297
	PRESUPUESTO COMPONENTE AMBIENTAL								
	COSTO DIRECTO COMPONENTE AMBIENTAL		$ 19.057.828	$ 5.306.887	$ 1.907.514				$ 7.214.401
	PROVISION PARA AJUSTES								
	VALOR BASICO PARA AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRA		$ 12.608.743	$ 0	$ 2.876.492				$ 2.876.492
	VALOR TOTAL		**$ 1.336.331.161**	**$ 173.404.261**	**$ 139.323.092**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 312.727.353**

POR EL CONTRATISTA

ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL
Director de Obra Arq.Ever José Salgado Salgado

POR LA INTERVENTORIA

ING. LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ
Representante Legal Consorcio GEBAL

CONSORCIO

POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ
Supervisora FDLK

1895

BOGOTÁ


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO			
FECHA ELABORACION	17 de abril de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	1	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.						
CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917558-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901351342-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		

ITEM	17.1.14	DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	UNIDAD	M2	CANTIDAD		TOTAL
								5,53

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO

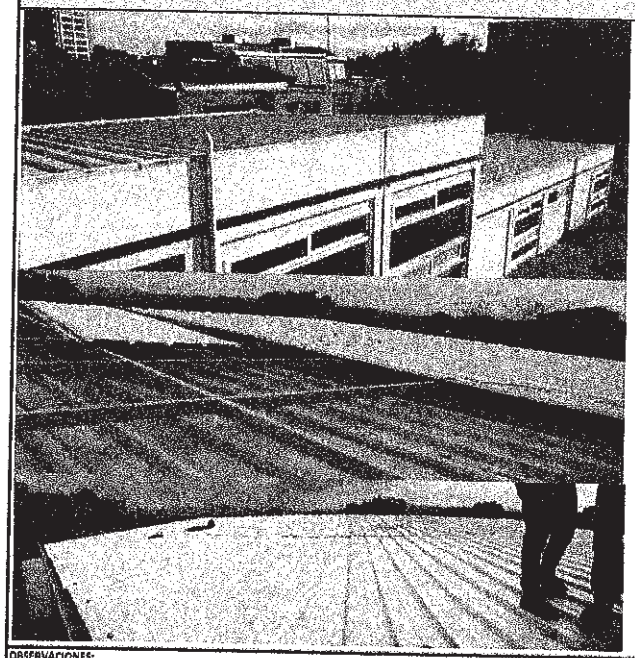

Elemento	DIMENSIONES				TOTAL	
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad		
Modulo 1	15,50	7,90		1,00	122,45	
Modulo 2	13,00	6,43		1,00	83,59	
Modulo 3 Segundo Piso	10,50	6,43		1,00	67,52	
Puente conector	2,60	2,60		1,00	6,76	
Modulo 3 primer piso	3,05	6,43		1,00	19,61	
SUBTOTAL					299,93	
Menos cantidad pagadas en Acta No. 1					294,40	
Total en la presente acta					5,53	

OBSERVACIONES:

FIRMA
ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL
DIRECTOR DE OBRA
EVER JOSE SALGADO SALGADO

FIRMA
ING. LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GEBAL

1884

BOGOTÁ

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CODIGO			
FECHA ELABORACION	17 de abril de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	2	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTÉGRAL DEL PROCESO.						
CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917558-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901351342-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		


ITEM	17.1.14	DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECORDOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	UNIDAD	M2	CANTIDAD		TOTAL
								5,53

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO	Elemento	DIMENSIONES				TOTAL	
		Largo	Ancho	Alto	Cantidad		


MODULO 2




MODULO 3
SEGUNDO PISO

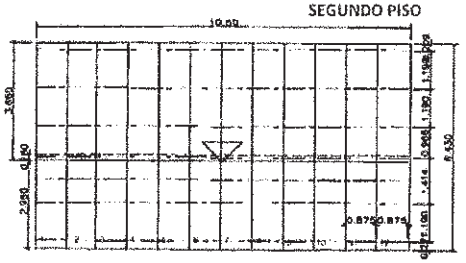


MODULO 1

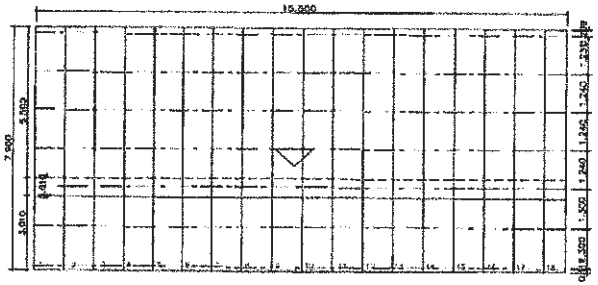

MODULO 3
PRIMER PISO



PUENTE
AF CONECTOR



OBSERVACIONES:

FIRMA
ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL
DIRECTOR DE OBRA
EVER JOSE SALGADO SALGADO

ING. LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GEBAL

1882

BOGOTÁ

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CODIGO			
FECHA ELABORACION	17 de abril de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	1	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.

CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917558-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901351342-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		


ITEM	NP-1	DESCRIPCION	LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE PANELES EN PVC INCLUYE RETIRO DE FIGURAS EN VINILO, PEGANTES ETC	UNIDAD	M2	CANTIDAD		TOTAL
								1356,37

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO







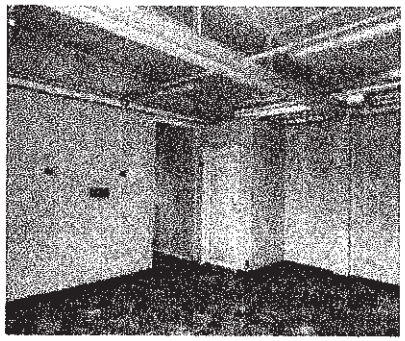

Elemento	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	Cantidad	TOTAL	
MODULO 1 FRONTAL	14,64		2,96	2,00	86,67	
MENOS VENTANAS Y ACCESOS	-7,25		2,13	2,00	-30,89	
MODULO 1 LATERAL DERECHO	6,05		3,25	2,00	39,33	
MENOS PUERTA DE ACCESO	-1,76		2,10	2,00	-7,39	
MODULO 1 LATERAL IZQUIERDO	6,05		3,25	2,00	39,33	
MODULO 1 TRASERO	14,64		3,36	2,00	98,38	
MENOS VENTANAS	-5,26		2,13	2,00	-22,41	
MODULO 1 DIVISIONES BAÑO	4,93		2,66	4,00	52,46	
MODULO 1 DIVISIONES BAÑO LATERALES	0,66		2,66	4,00	7,02	
MODULO 1 DIVISIONES CUARTO DEPTO	2,73		2,66	1,00	7,26	
MODULO 1 CUBIERTA	14,44	5,85		1,00	84,47	
MODULO 2 FRONTAL	12,20		5,71	2,00	139,32	
MENOS VENTANAS Y ACCESOS	-7,52		2,13	2,00	-32,04	
MODULO 2 LATERAL DERECHO	6,05		6,10	2,00	73,81	
MODULO 2 LATERAL IZQUIERDO	6,05		6,10	2,00	73,81	
MODULO 2 TRASERO	12,20		6,13	2,00	149,57	
MENOS VENTANAS	-12,32		2,13	2,00	-52,48	
MODULO 2 DIVISIONES BAÑO 1er piso	5,85		2,10	4,00	49,14	
MODULO 2 DIVIS INTERNAS BAÑO 1er P	0,60		2,10	8,00	10,08	
MODULO 2 DIVISIONES BAÑO 2o. P	4,71		2,10	4,00	39,56	
MODULO 2 DIVIS INTERNAS BAÑO 2o P	0,60		2,10	8,00	10,08	
MODULO 2 CUBIERTA Y CIELORASO	12,00	5,85		2,00	140,40	
MODULO 3 FRONTAL PISO 1	9,76		2,66	2,00	51,92	
MODULO 3 FRONTAL PISO 2	7,32		3,10	2,00	45,38	
MENOS VENTANAS Y ACCESOS	-9,80		3,13	2,00	-61,35	
MODULO 3 LATERAL DERECHO	6,05		6,10	2,00	73,81	
MENOS VENTANAS	-4,26		2,13	2,00	-18,15	
MODULO 3 LATERAL IZQUIERDO	6,05		6,10	2,00	73,81	
MODULO 3 TRASERO	9,76		2,66	2,00	51,92	
MODULO 3 TRASERO	7,32		3,10	2,00	45,38	
MENOS VENTANAS	-8,54		2,13	2,00	-36,38	
MODULO 3 DIVISION	4,55		2,66	4,00	48,41	
MODULO 3 DIVISION LATERAL	2,24		2,66	2,00	11,92	
MODULO 3 CUBIERTA Y CIELORASO	9,76	5,85		2,00	114,19	
Total en la presente acto					1.356,37	

OBSERVACIONES:

FIRMA

ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL

DIRECTOR DE OBRA

Ever Jose Salgado Salgado

FIRMA

ING. LEIDY AGUIRRE

DIRECCION DE INTERVENTORIA

CONSORCIO GEBAL

BOGOTÁ


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO			
FECHA ELABORACION	17 de abril de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	2	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.						
CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917556-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901351342-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		

ITEM	NP-1	DESCRIPCION	LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE PANELES EN PVC INCLUYE RETIRO DE FIGURAS EN VINILO, PEGANTES ETC	UNIDAD	M2	CANTIDAD		TOTAL
								1356,37

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO	Elemento	DIMENSIONES				TOTAL	
		Largo	Ancho	Alto	Cantidad		

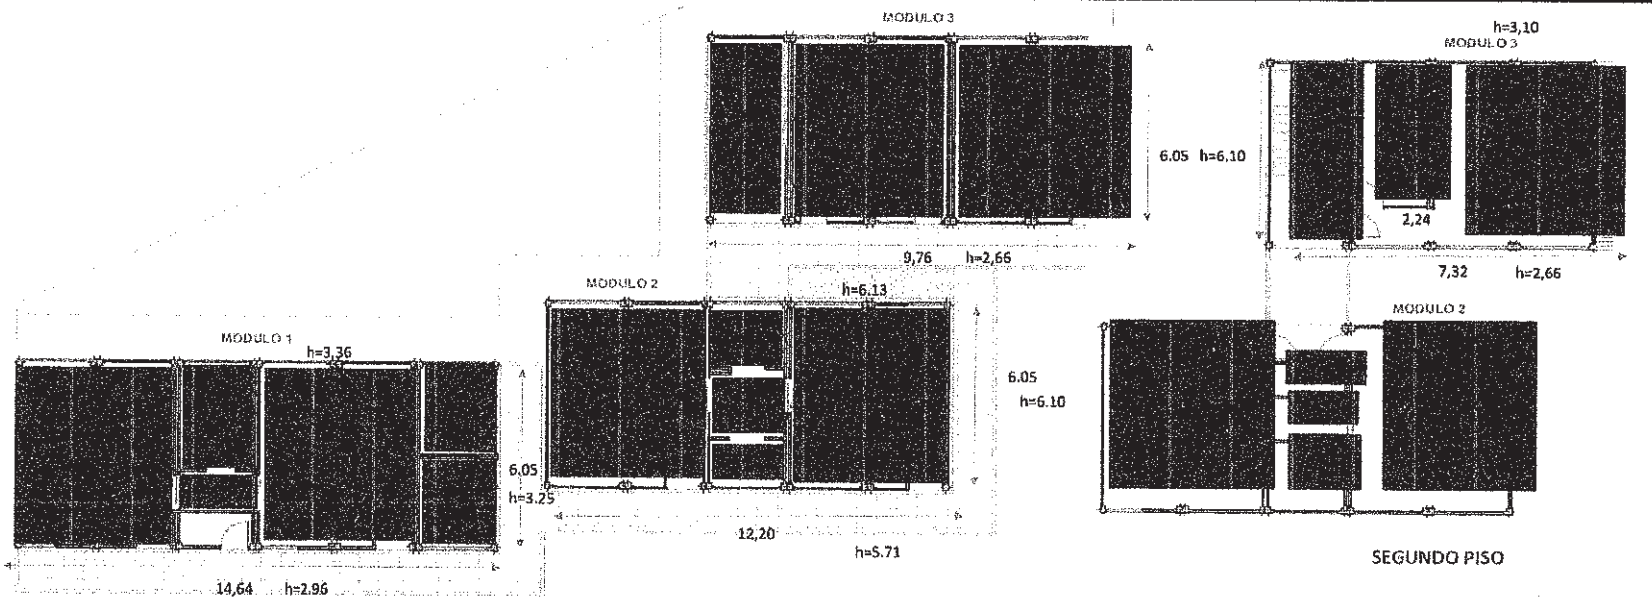

OBSERVACIONES:

FIRMA
ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL
DIRECTOR DE OBRA
Ever Jose Salgado Salgado

INTERVENTORIA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GEBAL

1882

BOGOTÁ


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CODIGO			
FECHA ELABORACION	17 de abril de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	1	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.						
CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917558-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901351342-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		

ITEM	NP-2	DESCRIPCION	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=.10	UNIDAD	M2	CANTIDAD		TOTAL
								2,00

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO

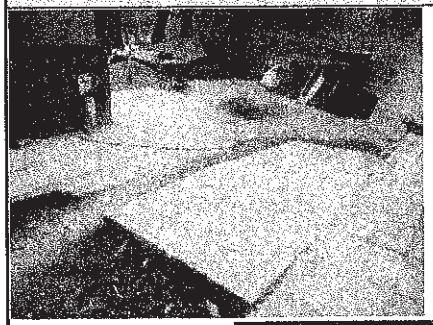

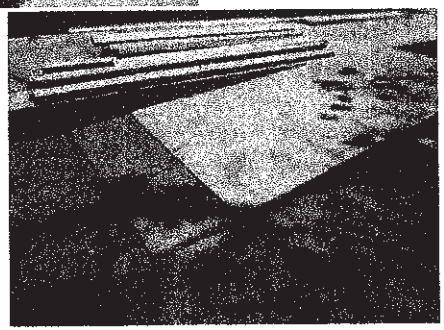

Elemento	DIMENSIONES				TOTAL	
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad		
rampa acceso	2,00	1,00		1,00	2,00	

1888

BOGOTÁ


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO			
FECHA ELABORACION	17 de abril de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	2	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.						
CONTRATISTA	EVER IOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917558-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTEAVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901351342-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		

ITEM	NP-2	DESCRIPCION	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=.10	UNIDAD	M2	CANTIDAD		TOTAL
								2,00

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO	Elemento	DIMENSIONES				TOTAL	
		Largo	Ancho	Alto	Cantidad		

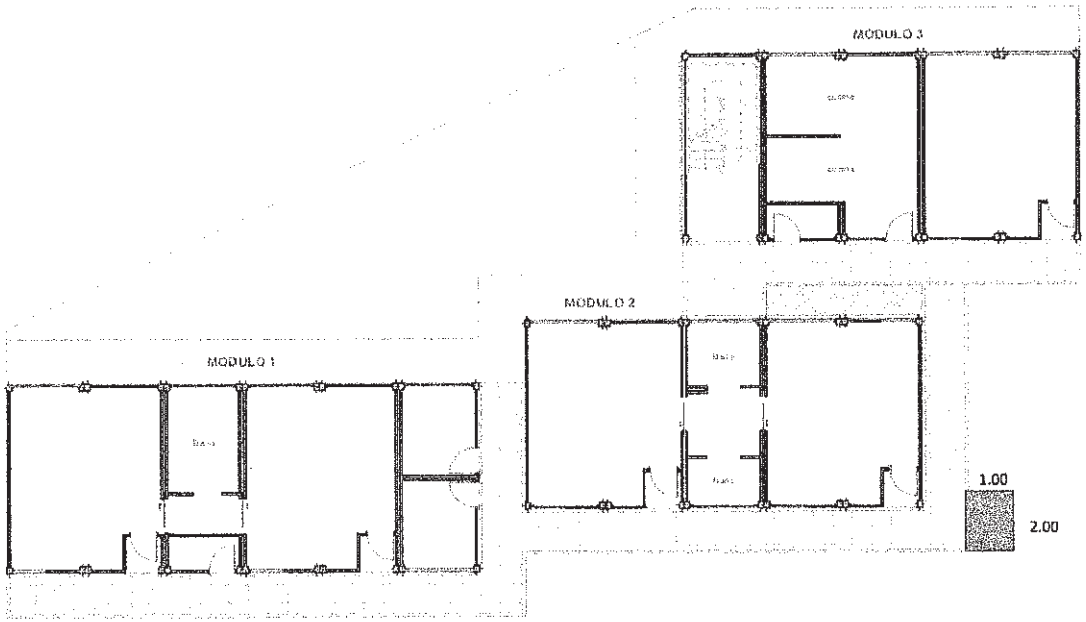

OBSERVACIONES:

FIRMA	FIRMA
ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL	ING. LEIDY AGUIRRE
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Ever Jose Salgado Salgado	CONSORCIO GEBAL

BOGOTÁ

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CODIGO			
FECHA ELABORACION	17 de abril de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	1	DE	2


OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.

CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917558-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901351342-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		

ITEM	NP-3	DESCRIPCION	PISO EN ROLLO REF DELIGHT HETEROGENEO UNICOLOR CON NANOPLATA- TRAFICO INDUSTRIAL E=2.2.MM IMPORTADO LG FLOORS	UNIDAD	M2	CANTIDAD		TOTAL
								163,50

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO



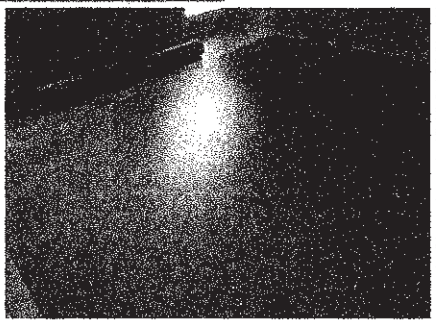

Elemento	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	Cantidad	TOTAL	
Salon 4 modulo 2 - primer nivel	5,85	4,68		1,00	27,38	
Salon 5 modulo 2 - segundo nivel	5,85	4,68		1,00	27,38	
Salon 6 modulo 2 - segundo nivel	5,85	4,68		1,00	27,38	
Comedor modulo 3	5,85	4,68		1,00	27,38	
Oficina profesores modulo 3	5,85	4,68		1,00	27,38	
Area escalera modulo 3	6,01	2,36		1,00	14,18	
Acceso salon 5 y 6	1,18	2,36		1,00	2,78	
escaleras 2 piso	2,72	2,36		1,00	6,42	
Pasillo oficina	2,37	1,35		1,00	3,22	
Total en la presente acta					163,50	

OBSERVACIONES:

FIRMA	FIRMA
ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL	ING. LEIDY AGUIRRE
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Ever Jose Salgado Salgado	CONSORCIO GEBAL

1890

BOGOTÁ


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO			
FECHA ELABORACION	17 de abril de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	2	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUYA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.						
CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917558-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901351842-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		

ITEM	NP-3	DESCRIPCION	PISO EN ROLLO REF DELIGHT HETEROGENEO UNICOLOR CON NANOPLATA- TRAFICO INDUSTRIAL E=2.2.MM IMPORTADO LG FLOORS	UNIDAD	M2	CANTIDAD		TOTAL
								163,50

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO	Elemento	DIMENSIONES				TOTAL	
		Largo	Ancho	Alto	Cantidad		

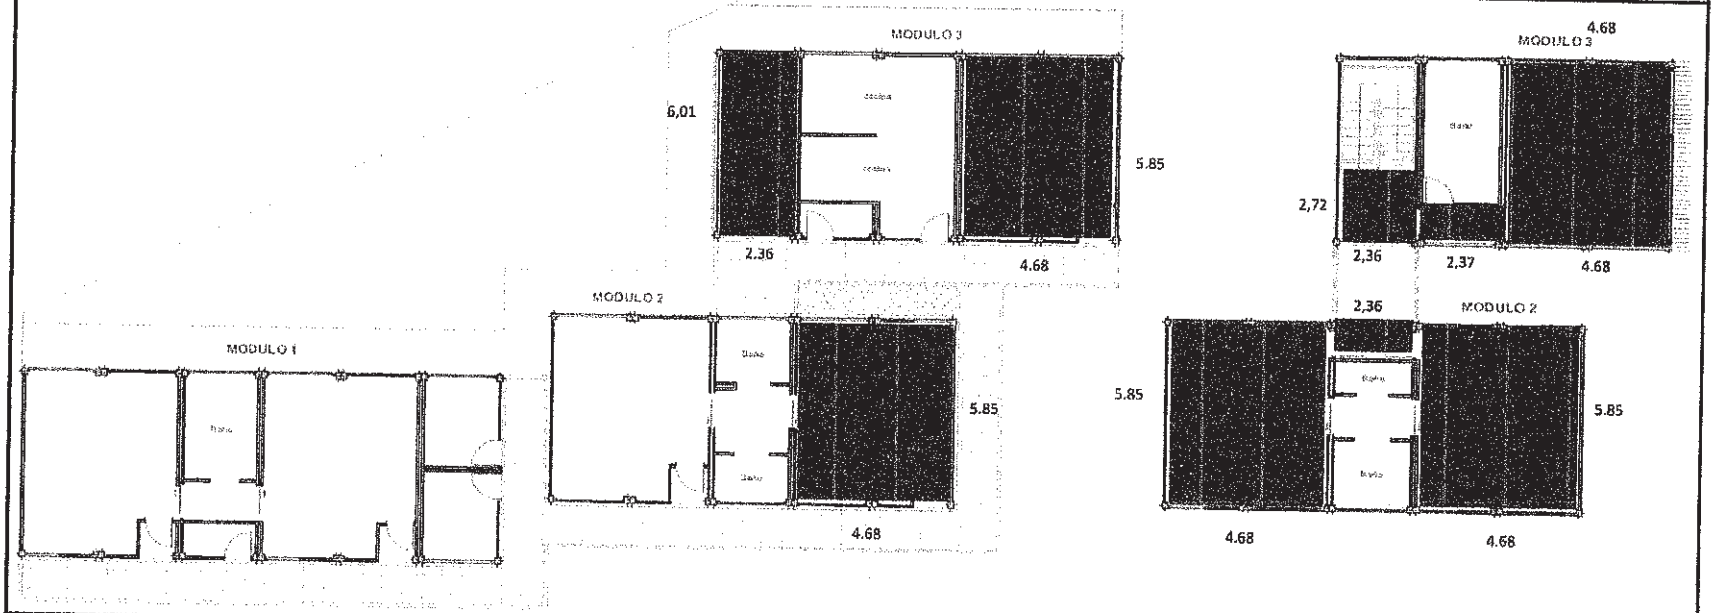

OBSERVACIONES:

FIRMA	FIRMA
ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL	ING. LEIBY AGUIRRE
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Ever Jose Salgado Salgado	CONSORCIO GEBAL

BOGOTÁ


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO			
FECHA ELABORACION	17 de abril de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	1	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.						
CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917558-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901351342-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		

ITEM	NP-4	DESCRIPCION	REINSTALACION DE PUERTAS EXISTENTES	UNIDAD	UN	CANTIDAD		TOTAL
								4,00

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO

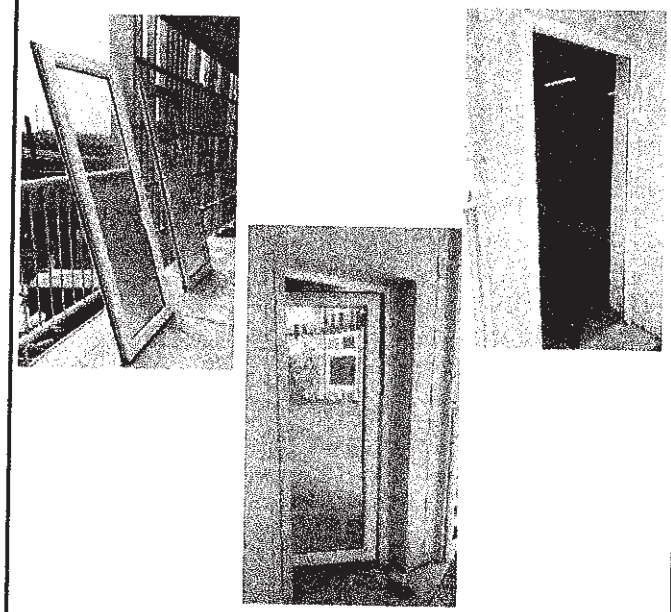

Elemento	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	Cantidad	TOTAL	
Modulo 2 primer nivel				2,00	2,00	
Modulo 2 segundo nivel				1,00	1,00	
Modulo 3 segundo nivel				1,00	1,00	
Total en la presente acta					4,00	

OBSERVACIONES:

FIRMA ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL DIRECTOR DE OBRA Ever Jose Salgado Salgado	FIRMA INGENIERO AGUIRRE DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO GEBAL

1892

BOGOTÁ


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO	
FECHA ELABORACION	17 de abril de 2020
FECHA DE REVISIÓN	
HOJA	2 DE 2

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PUEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.						
CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917558-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901351842-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		

ITEM	NP-4	DESCRIPCION	REINSTALACION DE PUERTAS EXISTENTES	UNIDAD	UN	CANTIDAD		TOTAL
								4,00

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO	Elemento	DIMENSIONES				TOTAL	
		Largo	Ancho	Alto	Cantidad		

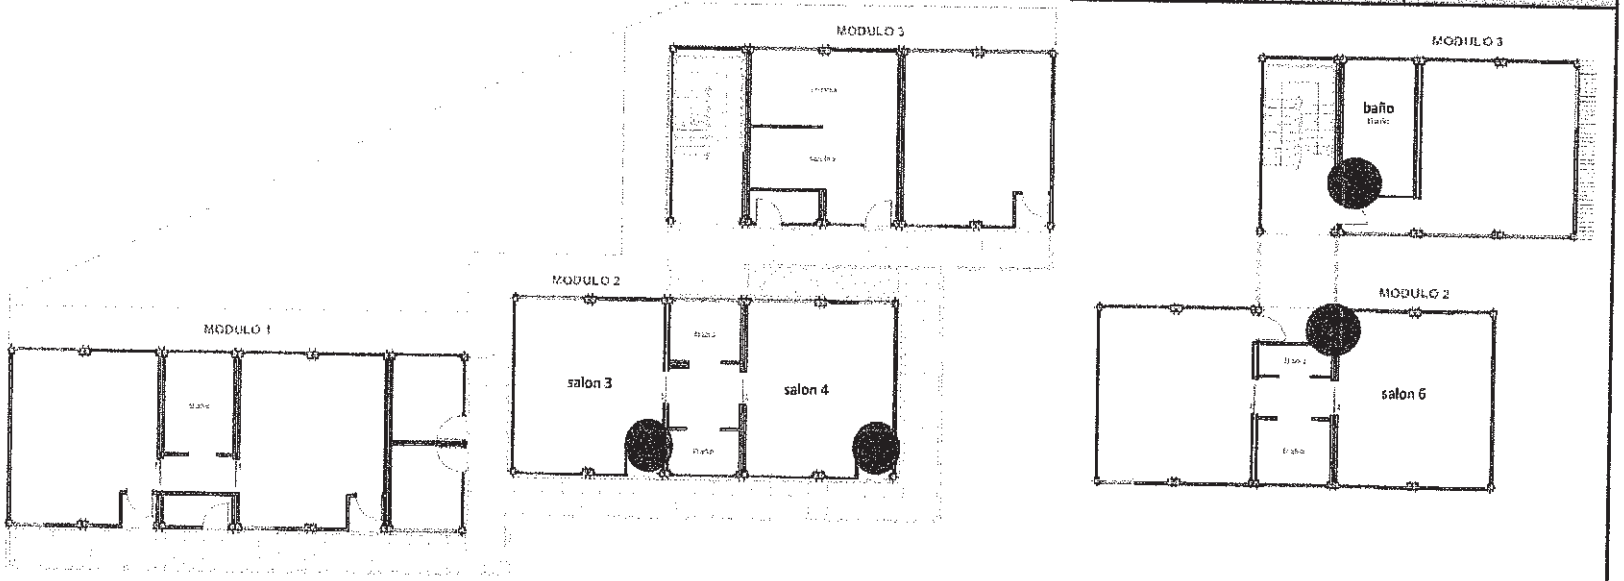

OBSERVACIONES:

FIRMA
ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL
DIRECTOR DE OBRA
Ever Jose Salgado Salgado

FIRMA
CONSORCIO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GEBAL

BOGOTÁ


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CODIGO			
FECHA ELABORACION	17 de abril de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	1	DE	2


OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.						
CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917558-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901351342-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		

ITEM	NP-5	DESCRIPCION	ANDEN EN CONCRETO E=.10 ACABADO LLANA DE MADERA ANCHO 0.60	UNIDAD	ML	CANTIDAD		TOTAL
								69,61

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO

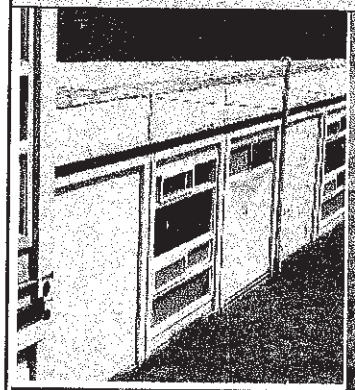

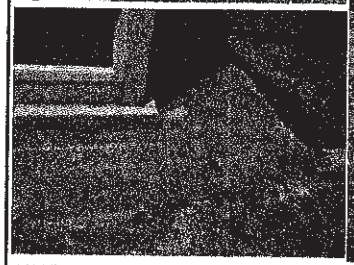

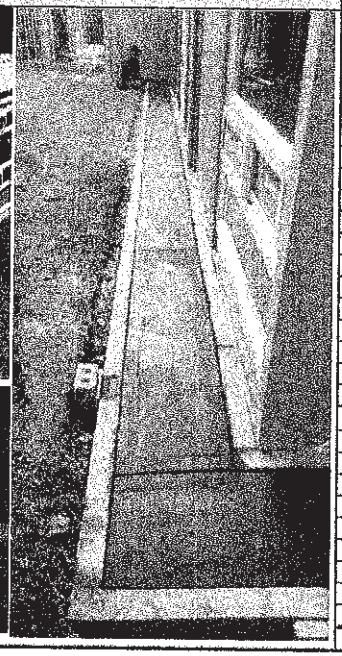

Elemento	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	Cantidad	TOTAL	
Tramo 1 anden peatonal	7,73			1,00	7,73	
Tramo 2 anden peatonal	13,73			1,00	13,73	
Tramo 3 anden peatonal	8,76			1,00	8,76	
Tramo 4 anden peatonal	4,15			1,00	4,15	
Tramo 5 anden peatonal	2,86			1,00	2,86	
Tramo 6 anden peatonal	14,68			1,00	14,68	
Tramo 7 anden peatonal	8,30			1,00	8,30	
Tramo 8 anden garita	9,40			1,00	9,40	
Total en la presente acta					69,61	

OBSERVACIONES:

FIRMA
ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL
DIRECTOR DE OBRA
Ever Jose Salgado Salgado

FIRMA
CONSORCIO
INGENIERO AGUIRRE
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GEBAL

1894

BOGOTÁ


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO			
FECHA ELABORACION	17 de abril de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	2	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.						
CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917558-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901351842-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		

ITEM	NP-5	DESCRIPCION	ANDEN EN CONCRETO E=.10 ACABADO LLANA DE MADERA ANCHO 0.60	UNIDAD	ML	CANTIDAD		TOTAL
								69,61

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO	Elemento	DIMENSIONES				TOTAL
		Largo	Ancho	Alto	Cantidad	

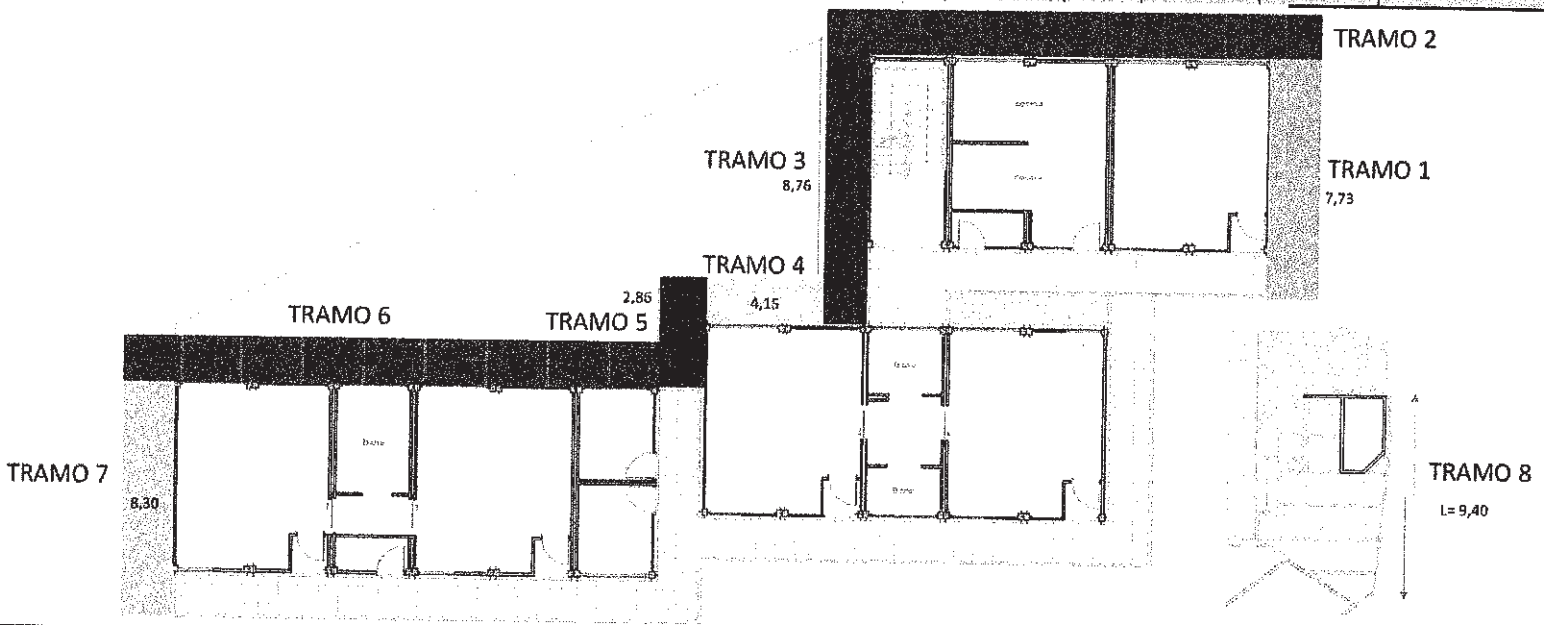

OBSERVACIONES:

FIRMA
ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL
DIRECTOR DE OBRA
Ever Jose Salgado Salgado

FIRMA
CONSORCIO
ING. LEIDY AGUIRRE
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GEBAL

1895

BOGOTÁ

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CODIGO			
FECHA ELABORACION	17 de abril de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	1	DE	2


OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.


CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917558-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901361342-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		

ITEM	NP-5	DESCRIPCION	PISO EN TABLETA GRES TIPO ROJO RUSTICA 10X10	UNIDAD	M2	CANTIDAD		TOTAL
								22,65

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO





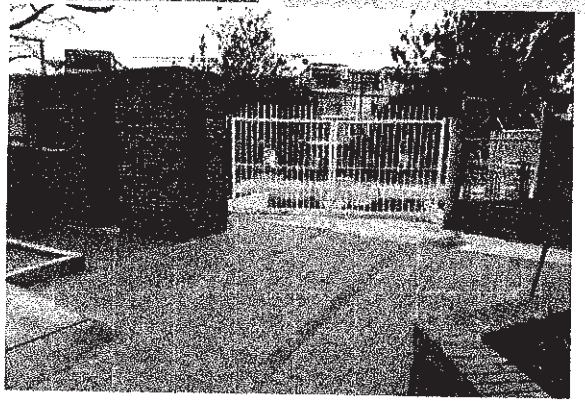

Elemento	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	Cantidad	TOTAL	
Tramo acceso peatonal 1	1,47	1,24		1,00	1,82	
Tramo acceso peatonal 2	1,45	1,24		1,00	1,80	
Tramo acceso peatonal 3	1,21	4,36		1,00	5,28	
Tramo acceso peatonal 4	1,32	5,05		1,00	6,67	
Tramo acceso peatonal 5	1,24	3,76		1,00	4,66	
Tramo acceso peatonal 6	1,14	1,73		1,00	1,97	
Tramo acceso peatonal 7	1,09	0,42		1,00	0,46	
Total en la presente acta					22,65	

OBSERVACIONES:

FIRMA
ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL
DIRECTOR DE OBRA
Ever Jose Salgado Salgado

FIRMA
ING. LEIDY AGUIRRE
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GEBAL

1896

BOGOTÁ


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO			
FECHA ELABORACION	17 de abril de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	2	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.						
CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917558-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901351342-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		

ITEM	NP-6	DESCRIPCION	PISO EN TABLETA GRES TIPO ROJO RUSTICA 10X10	UNIDAD	M2	CANTIDAD		TOTAL
								22,65

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO	Elemento	DIMENSIONES				TOTAL	
		Largo	Ancho	Alto	Cantidad		

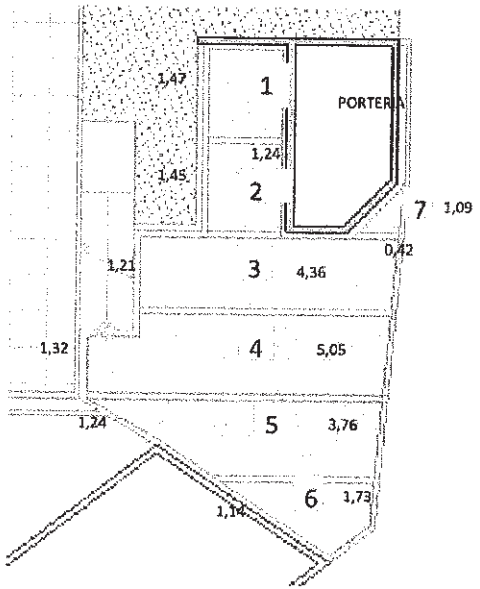

OBSERVACIONES:

FIRMA ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL DIRECTOR DE OBRA Ever Jose Salgado Salgado	FIRMA CONSORCIO ING. LEIDY AGUIRRE DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO GEBAL

2

1P92

BOGOTÁ


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO			
FECHA ELABORACION	17 de abril de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	1	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.

CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917556-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901353342-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		

ITEM	NP-7	DESCRIPCION	DESMONTE DE FLANCHE DE CUBIERTA	UNIDAD	ML	CANTIDAD		TOTAL
								120,43

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO	Elemento	DIMENSIONES				TOTAL	
		Largo	Ancho	Alto	Cantidad		
 	Modulo 1 (largo)	14,64			2,00	29,28	
	Modulo 1 (ancho)		6,05		2,00	12,10	
	Modulo 2 (largo)	12,20			2,00	24,40	
	Modulo 2 (ancho)		6,05		2,00	12,10	
	modulo 3 (largo segundo piso)	9,76			2,00	19,52	
	modulo 3 (ancho segundo piso)		6,05		2,00	12,10	
	modulo 3 (largo primer piso)	2,44			2,00	4,88	
	modulo 3 (ancho primer piso)		6,05		1,00	6,05	
	Total en la presente acta					120,43	

OBSERVACIONES:

FIRMA	FIRMA
ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL	ING. LEIDY AGUIRRE
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Ever Jose Salgado Salgado	CONSORCIO GEBAL

1

1890

BOGOTÁ


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO			
FECHA ELABORACION	17 de abril de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	2	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.						
CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917558-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901351342-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		

ITEM	NP-7	DESCRIPCION	DESMONTE DE FLANCHE DE CUBIERTA	UNIDAD	ML	CANTIDAD		TOTAL
								120,43

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO	Elemento	DIMENSIONES				TOTAL
		Largo	Ancho	Alto	Cantidad	

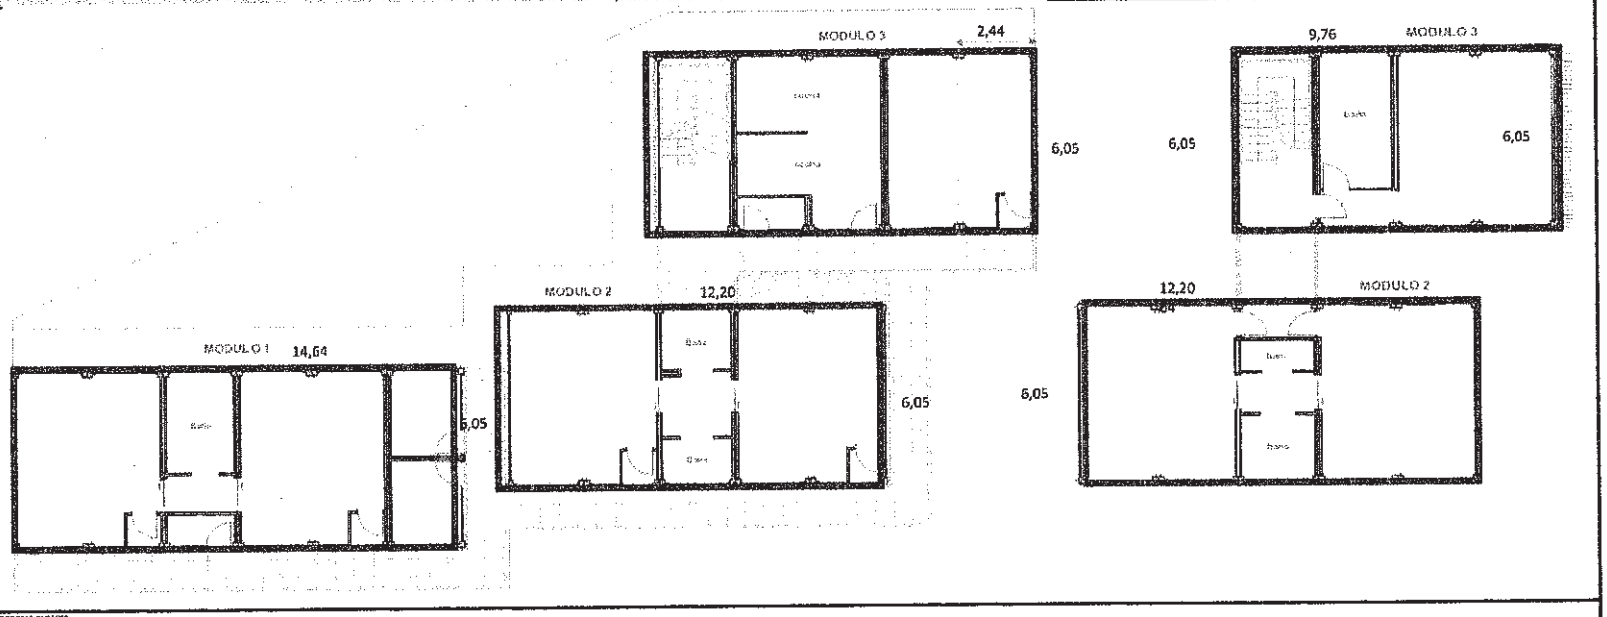

OBSERVACIONES:

FIRMA
ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL
DIRECTOR DE OBRA
Ever Jose Salgado Salgado

FIRMA
DEIDY AGUIRRE
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GEBAL

1899

BOGOTÁ

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CODIGO			
FECHA ELABORACION	19 de abril de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	1	DE	2


OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFAINTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.

CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917558-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901351342-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		

ITEM	NP-9	DESCRIPCION	SUM E INSTALACION DE LAMPARAS HERMETICAS LED DE 2X18 WATTS COCINA	UNIDAD	UN	CANTIDAD		TOTAL
								5,00

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO

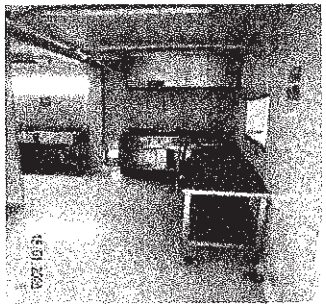



Elemento	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	Cantidad	TOTAL	
COCINA				5,00	5,00	
Total en la presente acta					5,00	

OBSERVACIONES:

FIRMA	
ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL	
DIRECTOR DE OBRA Ever Jose Salgado Salgado	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO GEBAL

1900

BOGOTÁ

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CODIGO			
FECHA ELABORACION	19 de abril de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	2	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.

CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917558-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901351347-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		

ITEM	NP-9	DESCRIPCION	SUM E INSTALACION DE LAMPARAS HERMETICAS LED DE 2X18 WATTS COCINA	UNIDAD	#¡REF!	CANTIDAD		TOTAL
								5,00

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO	Elemento	DIMENSIONES				TOTAL	
		Largo	Ancho	Alto	Cantidad		

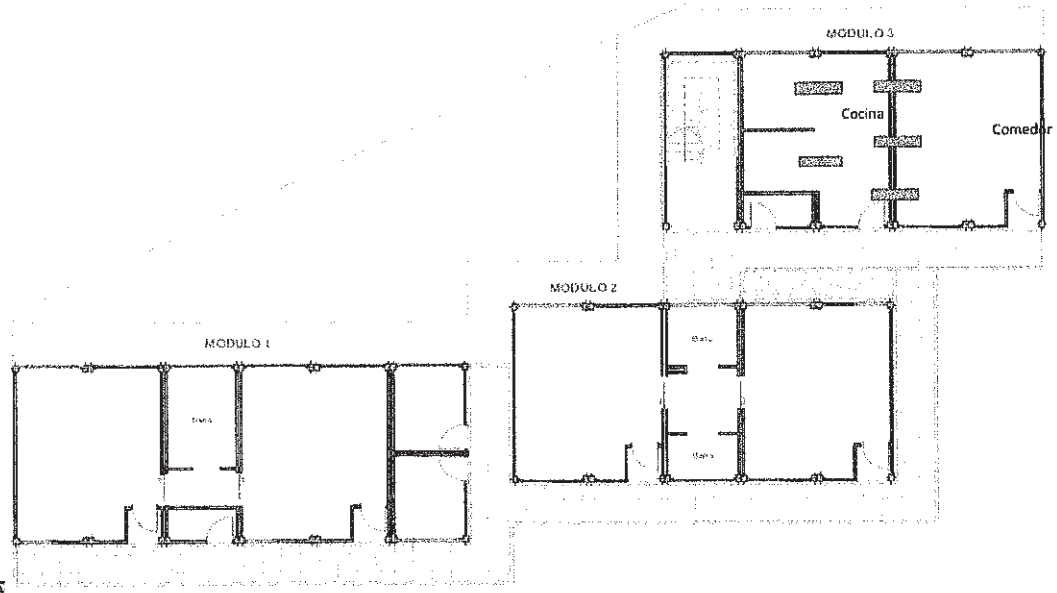

OBSERVA

FIRMA	
ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL	ING. LUIS FIGUEIRE
DIRECTOR DE OBRA Ever Jose Salgado Salgado	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO GEBAL

1901

BOGOTÁ

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CODIGO			
FECHA ELABORACION	19 de abril de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	1	DE	2


OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.

CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917558-1	CONTRATO N°	COP-318 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901351342-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		

ITEM	NP-10	DESCRIPCION	DESMONTE, LIMPIEZA, NIVELACION Y REINSTALACION DE TABLETAS PREFABRICADAS EN CONCRETO PARA ANDENES	UNIDAD	M2	CANTIDAD		TOTAL
								15,90

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO



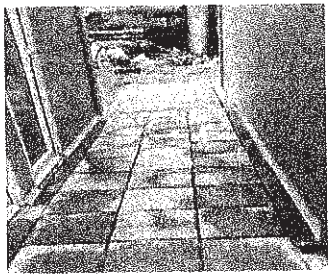Elemento	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	Cantidad	TOTAL	
Anden entre modulo 1 y 2	4,98	1,22		1,00	6,08	
Anden modulo 1	4,00	1,22		1,00	4,88	
Anden modulo 3	4,05	1,22		1,00	4,94	
Total en la presente acta					15,90	

OBSERVACIONES:

FIRMA
ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL
DIRECTOR DE OBRA
Ever Jose Salgado Salgado

FIRMA
INGLEIDY AGUIRRE
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GEBAL

1902

BOGOTÁ


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO			
FECHA ELABORACION	19 de abril de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	2	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.						
CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917558-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901351342-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		

ITEM	NP-10	DESCRIPCION	DESMONTE, LIMPIEZA, NIVELACION Y REINSTALACION DE TABLETAS PREFABRICADAS EN CONCRETO PARA ANDENES	UNIDAD	M2	CANTIDAD		TOTAL
								15,90

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO	Elemento	DIMENSIONES				TOTAL	
		Largo	Ancho	Alto	Cantidad		

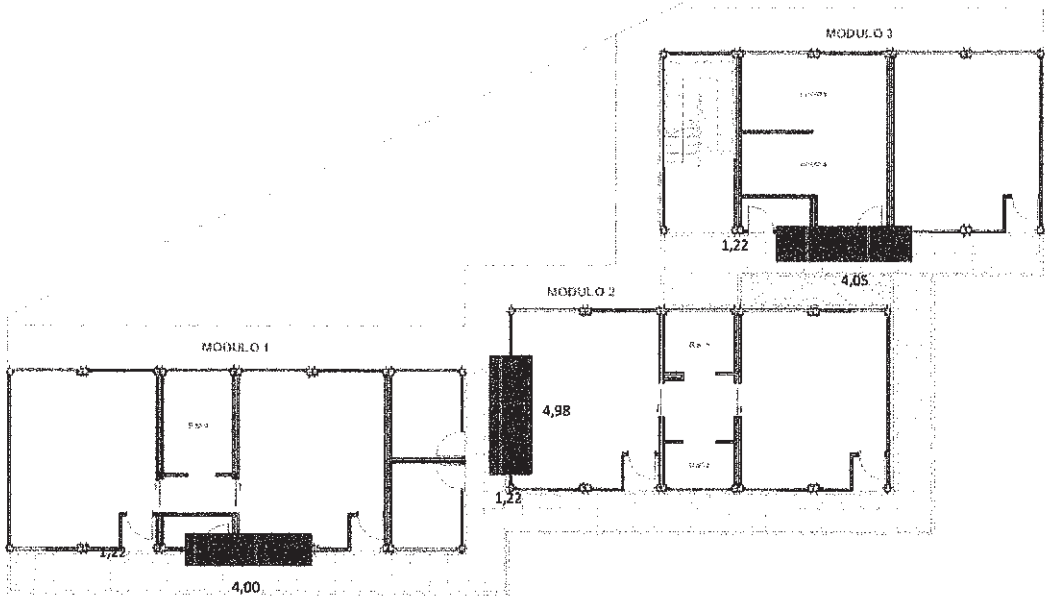

OBSERVACIONES:

ARQ. ALFONSO BENAVIDES SANMIGUEL
DIRECTOR DE OBRA
Ever Jose Salgado Salgado

FIRMA DIGITAL
ING. FREDY AGUIRRE
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GEBAL

BOGOTÁ

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CODIGO			
FECHA ELABORACION	19 de abril de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	1	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.

CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917558-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901351342-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		

ITEM	NP-11	DESCRIPCION	APLICACIÓN DE ESMALTE 3 EN 1 SOBRE ESTRUCTURAS METALICAS INCLUYE LIJADO	UNIDAD	ML	CANTIDAD		TOTAL
								2575,34

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO

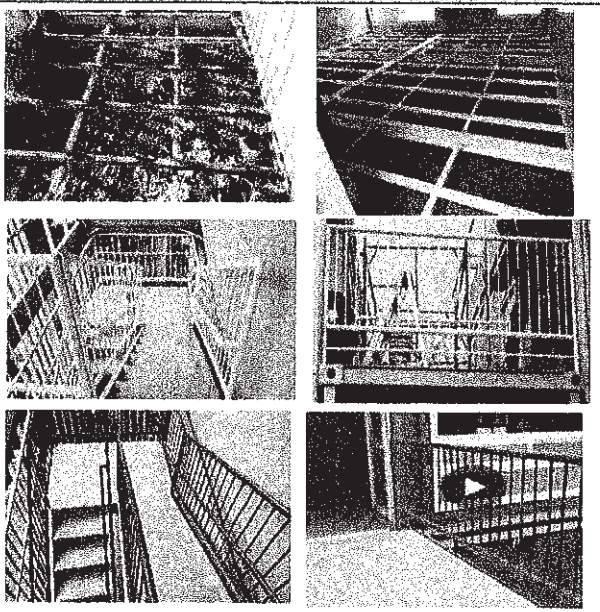

Elemento	DIMENSIONES Largo	Cares	Alto	Cantidad	TOTAL	
SALON 4 MODULACION 1 VERTICALES	5,85	3,00		7,00	122,85	
SALON 4 MODULACION 1 HORIZONTALES	4,25	3,00		16,00	204,00	
SALON 5 MODULACION 1 VERTICALES	5,85	3,00		7,00	122,85	
SALON 5 MODULACION 1 HORIZONTALES	4,25	3,00		16,00	204,00	
SALON 6 MODULACION 1 VERTICALES	5,85	3,00		7,00	122,85	
SALON 6 MODULACION 1 HORIZONTALES	4,25	3,00		16,00	204,00	
ESCALERAS PISO 2 M VERTICAL	2,72	2,00		4,00	21,76	
ESCALERAS PISO 2 M HORIZONTAL	2,30	1,00		7,00	16,10	
COCINA MODULACION 1 VERTICALES	5,85	3,00		7,00	122,85	
COCINA MODULACION 1 HORIZONTALES	4,25	3,00		13,00	165,75	
COMEDOR MODULACION 1 VERTICALES	5,85	3,00		7,00	122,85	
COMEDOR MODULACION 1 HORIZONTALES	4,25	3,00		16,00	204,00	
ESCALERA MODULACION 1 VERTICALES	5,85	2,00		4,00	46,80	
ESCALERA MODULACION 1 HORIZONTALES	2,30	1,00		16,00	36,80	
OFICINA- BAÑO PROFESORES MODULACION 1 VERTICALES	5,85	3,00		10,00	175,50	
OFICINA- BAÑO PROFESORES MODULACION 1 HORIZONTALES	7,12	3,00		16,00	341,76	
BAJO CUBIERTA MODULO 1	1,30	4,00		7,00	36,40	
COLUMNAS ESTRUCTURA PUENTE	2,66	4,00		8,00	85,12	
VERTICALES BARANDA PUENTE	0,80	1,00		52,00	41,60	
HORIZONTALES BARANDA PUENTE	2,50	1,00		5,00	12,50	
VERTICALES ESCALERA	0,90	1,00		108,00	97,20	
HORIZONTALES ESCALERA ANTEPECHO	1,10	1,00		2,00	2,20	
HORIZONTALES ESCALERA PARAMANOS	5,10	1,00		12,00	61,20	
HORIZONTALES ESCALERA DESCANSO	2,20	1,00		2,00	4,40	
Total en la presente acta					2,575,34	

OBSERVACIONES:

FIRMA
ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL
DIRECTOR DE OBRA
Ever Jose Salgado Salgado

ING. LEIDY ANDRADE
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GEBAL

1904

BOGOTÁ


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO			
FECHA ELABORACION	19 de abril de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	2	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PUEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.						
CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917558-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901351342-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		

ITEM	NP-11	DESCRIPCION	APLICACIÓN DE ESMALTE 3 EN 1 SOBRE ESTRUCTURAS METALICAS INCLUYE LIJADO	UNIDAD	ML	CANTIDAD		TOTAL
								1217,01

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO	Elemento	DIMENSIONES				TOTAL	
		Largo	Ancho	Alto	Cantidad		

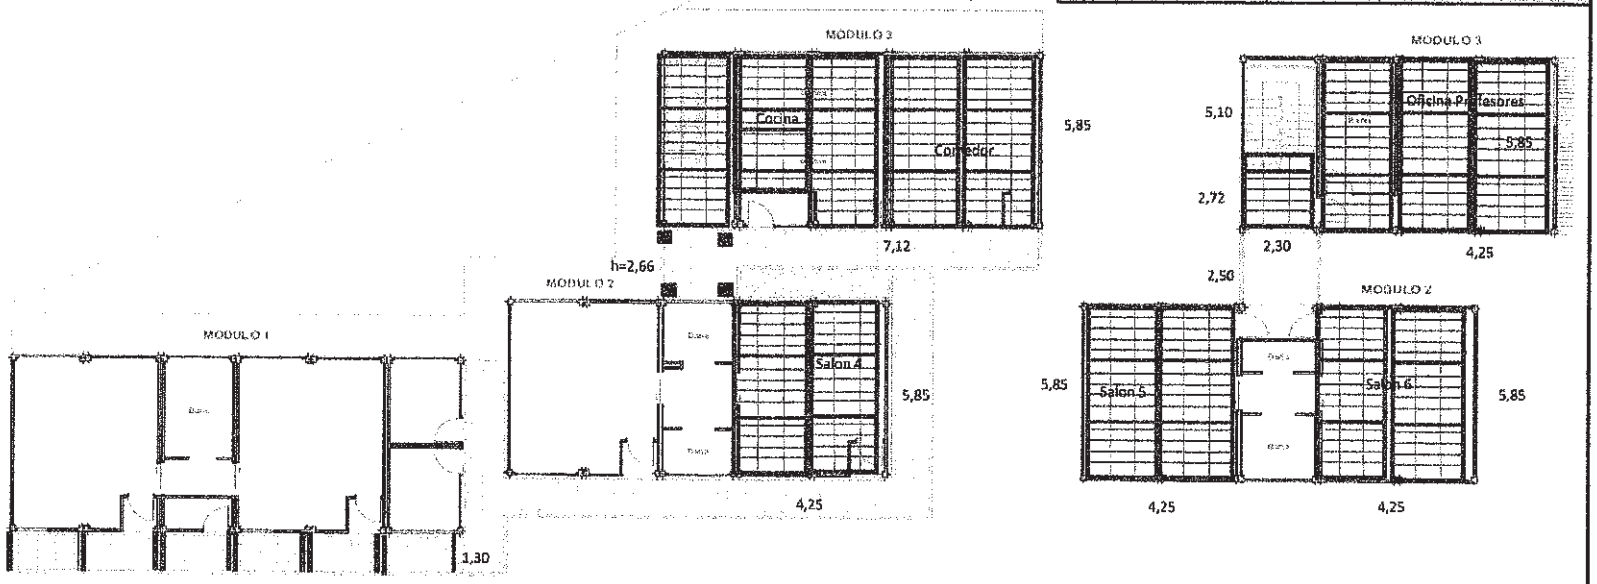

OBSERVACIONES:

FIRMA	CONTRATO
Nombre : ALFONSO REYES SANMIGUEL	Nombre : LEIDY GUTIERRE
ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA Ever Jose Salgado Salgado	INGENIERA DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO GEBAL




1921-

BOGOTÁ	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO			
		FECHA ELABORACION	19 de abril de 2020		
		FECHA DE REVISIÓN			
		HOJA	1	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.

CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917558-1	CONTRATO N°.	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901351343-8	CONTRATO N°.	COP-328 DE 2019		

ITEM	NP-12	DESCRIPCION	DESMONTE DE GUARDAESCOBAS Y/O MEDIACAÑAS EN PVC EXISTENTE	UNIDAD	ML	CANTIDAD		TOTAL
								199,76

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO	Elemento	DIMENSIONES				TOTAL	
		Largo	Ancho	Alto	Cantidad		
	Salon 5 Modulo 2 Primer Piso (5,85+4,68+4,68+2,34+1,23+,06+,06)	18,90			1,00	18,90	
	Salon 6 Modulo 2 Primer Piso (5,85+4,68+4,68+2,34+1,23+,06+,06)	18,90			1,00	18,90	
	Baño Modulo 2 Primer piso (2,24+1,03+1,03+,6+,6+,06+,6+,6+,06+,6+,6+,6+,6+,12+2,2+2,2+2,24)	15,98			1,00	15,98	
	Baño profesores Modulo 3 Segundo Piso (4,55+4,55+2,24+1,3+,09)	12,73			1,00	12,73	
	Cocina Modulo 3 Primer piso (5,85+4,68+2,55+2,31+2,31+,06+2,08+2,44+1,16+1,24+,06)	24,74			1,00	24,74	
	Comedor Modulo 3 Primer Piso (5,85+4,68+5,85+3,51+1,16+,25+,06+,19+1,16)	22,71			1,00	22,71	
	Oficina Profesores Modulo 3 Segundo Piso (4,68+5,85+4,65+7,18+1,5)	23,87			1,00	23,87	
	Lactancia Modulo 1 (2,88+2,24+2,24+1,94)	9,30			1,00	9,30	
	Escalera Modulo 3 piso uno (6,1)	6,10			1,00	6,10	
	Escalera Modulo 3 piso dos (1,30)	1,30			1,00	1,30	
	Acceso salon 5 y 6 Modulo 2 Segundo piso (2,82)	2,82			1,00	2,82	
	Baño modulo 1 (3,39+3,39+2,24+,81+,81+,06+,53+,53+,06+2,24+,06+,06+,06+,26+,26)	14,76			1,00	14,76	
	Aseo Modulo 1 (2,88+2,24+2,24+2,94)	9,30			1,00	9,30	
	Baño Modulo 2 Primer Piso (2,24+2,02+2,02+,6+,6+,6+,06+,23+,8+,8+,6+,6+,6+,6+,06+,06+2,24+1,51+,151)	18,35			1,00	18,35	
	Total en la presente acta					199,76	

OBSERVACIONES:

FIRMA	FIRMA
ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL	ING. LEIDY ASLUPPO
DIRECTOR DE OBRA Ever Jose Salgado Salgado	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO GEBAL


1906

BOGOTÁ	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO			
		FECHA ELABORACION	10 de abril de 2020		
		FECHA DE REVISIÓN			
		HOJA	2	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.						
CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC	7917558-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC	901351342-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		

ITEM	NP-12	DESCRIPCION	DESMONTE DE GUARDAESCOBAS Y/O MEDIACAÑAS EN PVC EXISTENTE	UNIDAD	ML	CANTIDAD		TOTAL
								199,76

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO	Elemento	DIMENSIONES				TOTAL	
		Largo	Ancho	Alto	Cantidad		

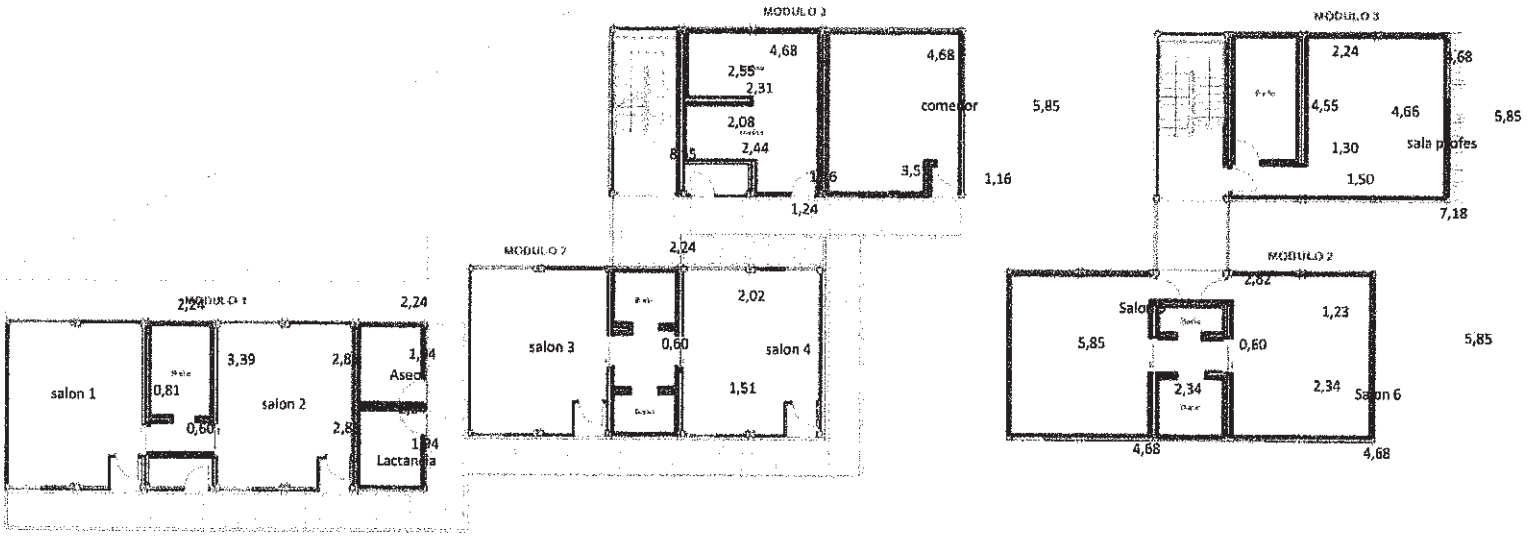

OBSERVACIONES:

FIRMA	FIRMADO
ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL	ING. LEIDY AGUIRRE
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Ever Jose Salgado Salgado	CONSORCIO GEBAL

1907


BOGOTÁ

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO			
FECHA ELABORACION	19 de abril de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	1	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.						
CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917558-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901351342-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		

ITEM	NP-13	DESCRIPCION	REINSTALACION DE GUARDAESCOBAS EN PVC	UNIDAD	ml	CANTIDAD		TOTAL
								3,00

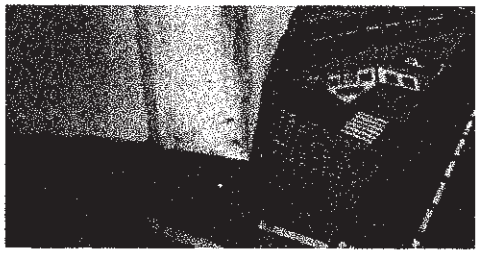ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO	Elemento	DIMENSIONES				TOTAL	
		Largo	Ancho	Alto	Cantidad		
	Modulo 1 Salon 2	3,00			1,00	3,00	
							
	Total en la presente acta					3,00	

OBSERVACIONES:

FIRMA	FIRMA
ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL	ING. LEIDY AGUIRRE
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Ever Jose Salgado Salgado	CONSORCIO GEBAL

1908

BOGOTÁ


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO			
FECHA ELABORACION	19 de abril de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	2	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.						
CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	79175S8-1	CONTRATO N°	COP-318 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901351342-8	CONTRATO N°	COP-319 DE 2019		

ITEM	NP-13	DESCRIPCION	REINSTALACION DE GUARDAESCOBAS EN PVC	UNIDAD	ml	CANTIDAD		TOTAL
								3,00

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO	Elemento	DIMENSIONES				TOTAL	
		Largo	Ancho	Alto	Cantidad		

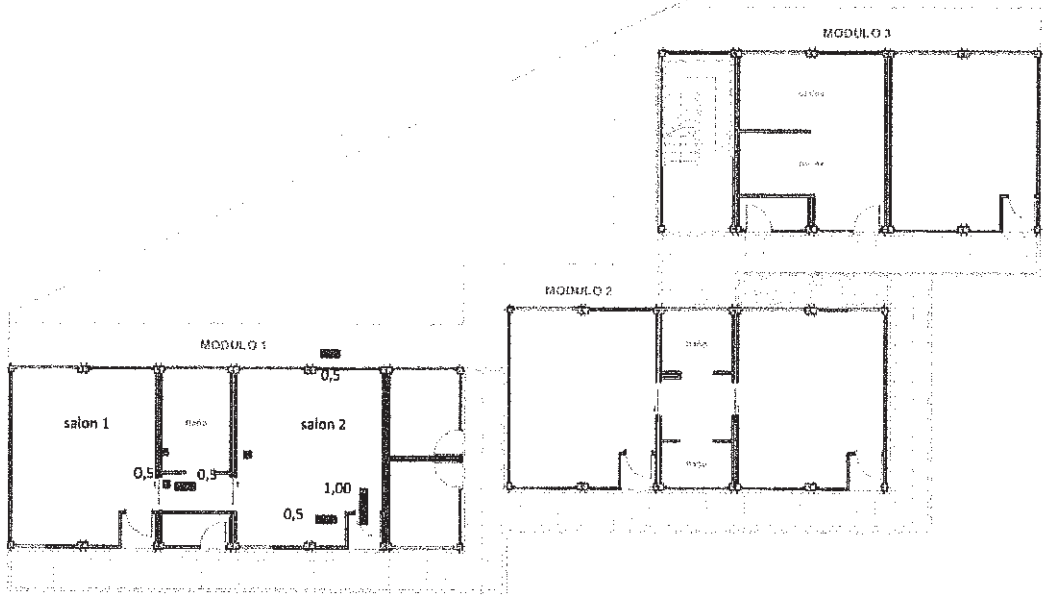

OBSERVACIONES:

FIRMA
ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL
DIRECTOR DE OBRA
Ever Jose Salgado Salgado

ING. [illegible]
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GEBAL

1909

BOGOTÁ

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CODIGO			
FECHA ELABORACION	19 de abril de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	1	DE	2


OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (9) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.


CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917558-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901351342-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		

ITEM	NP-14	DESCRIPCION	DESMONTE Y REINSTALACION DE DUCTOS METALICOS EXISTENTES	UNIDAD	ML	CANTIDAD		TOTAL
								12,50

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO

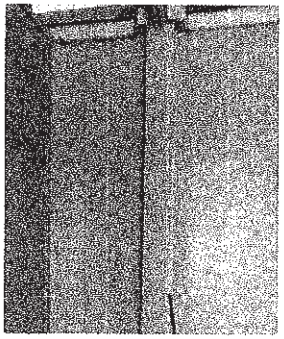



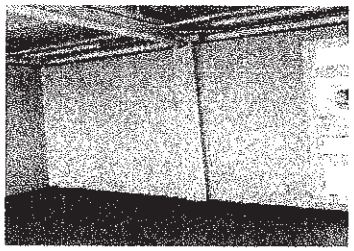

Elemento	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	Cantidad	TOTAL	
Salon 4 Modulo 2 Primer piso	2,50			2,00	5,00	
Salon 5 Modulo 2 Segundo piso	2,50			1,00	2,50	
Salon 6 Modulo 2 Segundo piso	2,50			1,00	2,50	
Oficina Profesores Modulo 3 segundo piso	2,50			1,00	2,50	
Total en la presente acta					12,50	

OBSERVACIONES:

FIRMA	FIRMA
ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL	ING. LEIDY AGUIRRE
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Ever Jose Salgado Salgado	CONSORCIO GEBAL

BOGOTÁ


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO			
FECHA ELABORACION	19 de abril de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	2	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.						
CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917558-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901351342-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		

ITEM	NP-14	DESCRIPCION	DESMONTE Y REINSTALACION DE DUCTOS METALICOS EXISTENTES	UNIDAD	ML	CANTIDAD		TOTAL
								12,50

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO	Elemento	DIMENSIONES				TOTAL	
		Largo	Ancho	Alto	Cantidad		

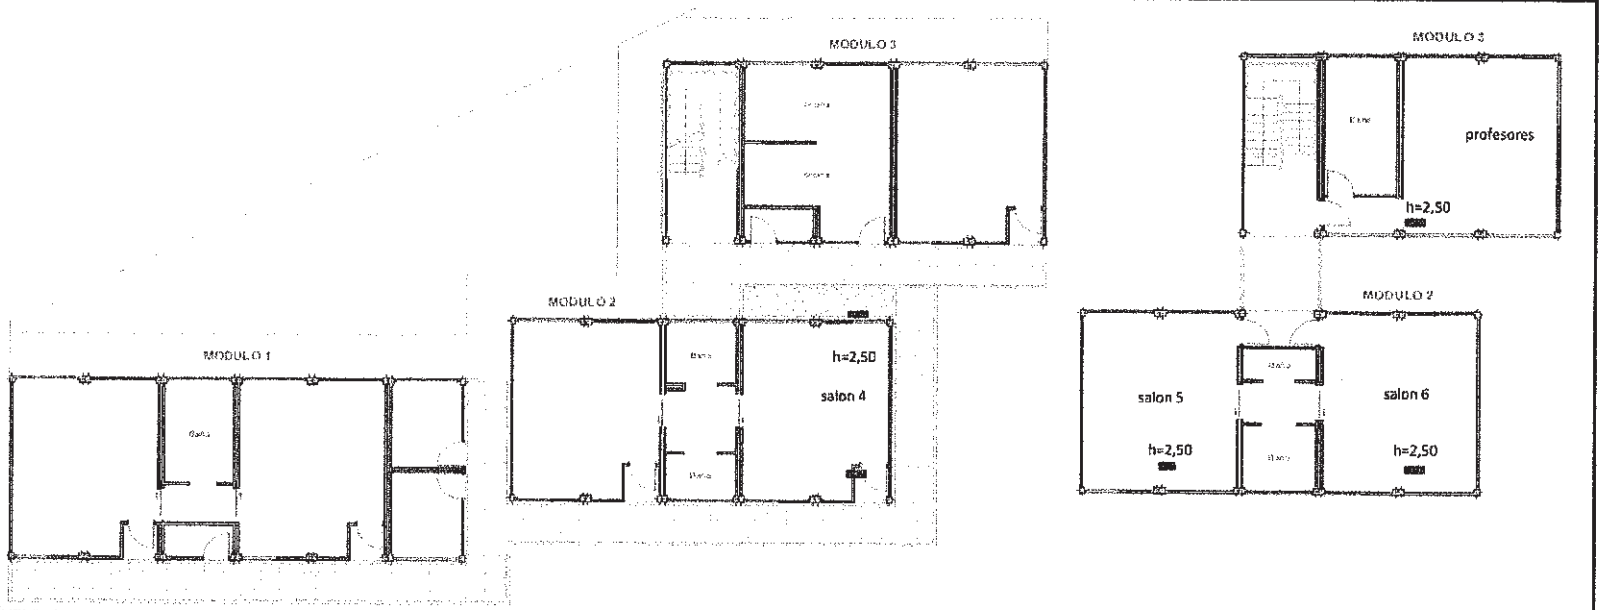

OBSERVACIONES:

FIRMA
ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL
DIRECTOR DE OBRA
Ever Jose Salgado Salgado

ING. LEIDY SOLARE
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GEBAL

BOGOTÁ

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA




CODIGO			
FECHA ELABORACIÓN	19 de abril de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	1	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.

CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917550-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901351342-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		

ITEM	NP-16	DESCRIPCION	RETIRO DE PISO VINILICO EXISTENTE	UNIDAD	M2	CANTIDAD		TOTAL
								147,14

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO

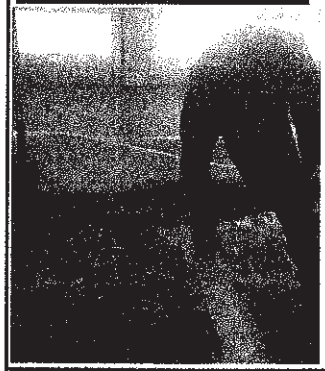
Elemento	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	Cantidad	TOTAL	
Salon 5 modulo 2 - segundo nivel	5,85	4,68		1,00	27,38	
Salon 6 modulo 2 - segundo nivel	5,85	4,68		1,00	27,38	
Comedor modulo 3	5,85	4,68		1,00	27,38	
Oficina modulo 3	5,85	4,68		1,00	27,38	
Area escalera modulo 3	6,01	2,36		1,00	14,18	
Acceso salon 5 y 6	1,18	2,36		1,00	2,78	
escaleras 2 piso	2,72	2,36		1,00	6,42	
Pasillo profesores	2,37	1,36		1,00	3,22	
Baño profesores	4,67	2,36		1,00	11,02	
Total en la presente acta					147,14	

OBSERVACIONES:

FIRMA
ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL
DIRECTOR DE OBRA
Ever Jose Salgado Salgado

FIRMA
INGRID PATRICIA AGUIRRE
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GEBAL

BOGOTÁ


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO			
FECHA ELABORACION	19 de abril de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	2	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (S) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.						
CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917558-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901351342-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		

ITEM	NP-16	DESCRIPCION	RETIRO DE PISO VINILICO EXISTENTE	UNIDAD	M2	CANTIDAD		TOTAL
								147,14

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO	Elemento	DIMENSIONES				TOTAL	
		Largo	Ancho	Alto	Cantidad		

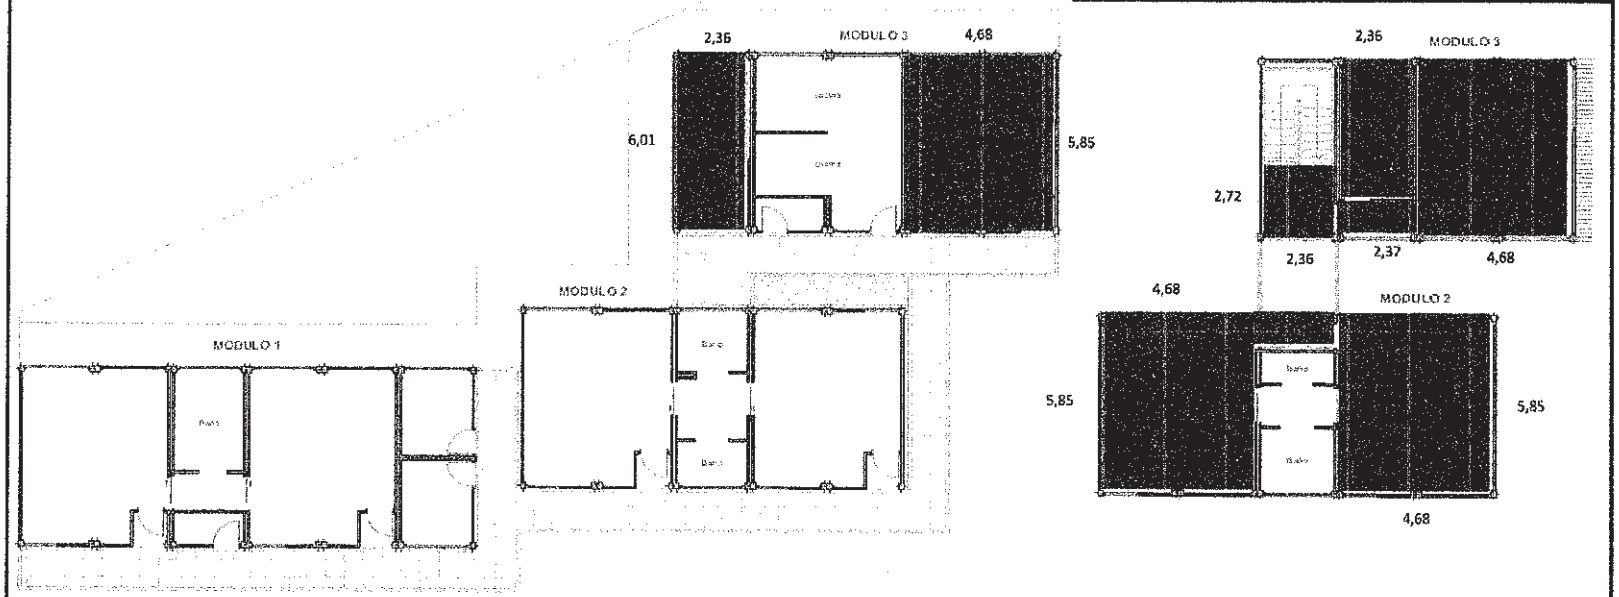

OBSERVACIONES:

FIRMA	FIRMA
ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL	ING. LEIDY AGUIRRE
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Ever Jose Salgado Salgado	CONSORCIO GEBAL

BOGOTÁ

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CODIGO			
FECHA ELABORACION	19 de abril de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	1	DE	2


OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCAUDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.

CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917558-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901351342-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		

ITEM	NP-17	DESCRIPCION	RETIRO DE LAMINAS EN MADERA AGLOMERADA EN PISOS EXISTENTES	UNIDAD	M2	CANTIDAD		TOTAL
								175,97

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO

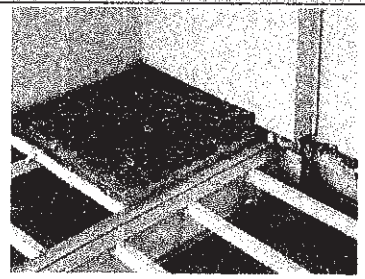

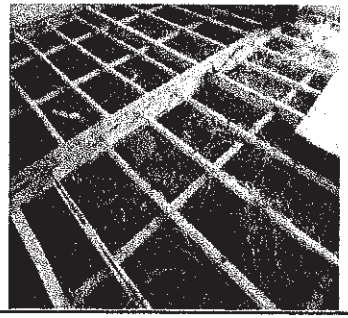Elemento	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	Cantidad	TOTAL	
Salon 5 modulo 2 - segundo Piso	5,97	4,80		1,00	28,66	
Salon 6 modulo 2 - segundo piso	5,97	4,80		1,00	28,66	
Comedor modulo 3 primer piso	5,97	4,80		1,00	28,66	
Oficina modulo 3 segundo piso	5,97	4,80		1,00	28,66	
Area escalera modulo 3 primer piso	6,01	2,36		1,00	14,18	
Escaleras Modulo 3 segundo piso	2,72	2,36		1,00	6,42	
Pasillo oficina Modulo 3 segundo piso	2,37	1,36		1,00	3,22	
Baño profesores Modulo 3 segundo piso	2,24	4,55		1,00	10,19	
Cocina Modulo 3 primer piso	4,68	4,69		1,00	21,95	
Cocina Modulo 3 primer piso	2,24	1,16		1,00	2,60	
Acceso salon 5 y 6 Modulo 2 segundo piso	2,36	1,18		1,00	2,78	
Total en la presente acta					176,97	

OBSERVACIONES:

FIRMA ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL DIRECTOR DE OBRA Ever Jose Salgado Salgado	FIRMA ING. LEIDY AGUIRRE DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO GEBAL

1914

BOGOTÁ

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CODIGO			
FECHA ELABORACION	19 de abril de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	1	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.

CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o C.C.	79175581-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o C.C.	901351342-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		

ITEM	NP-17	DESCRIPCION	RETIRO DE LAMINAS EN MADERA AGLOMERADA EN PISOS EXISTENTES	UNIDAD	M2	CANTIDAD		TOTAL
								175,97

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO	Elemento	DIMENSIONES				TOTAL
		Largo	Ancho	Alto	Cantidad	

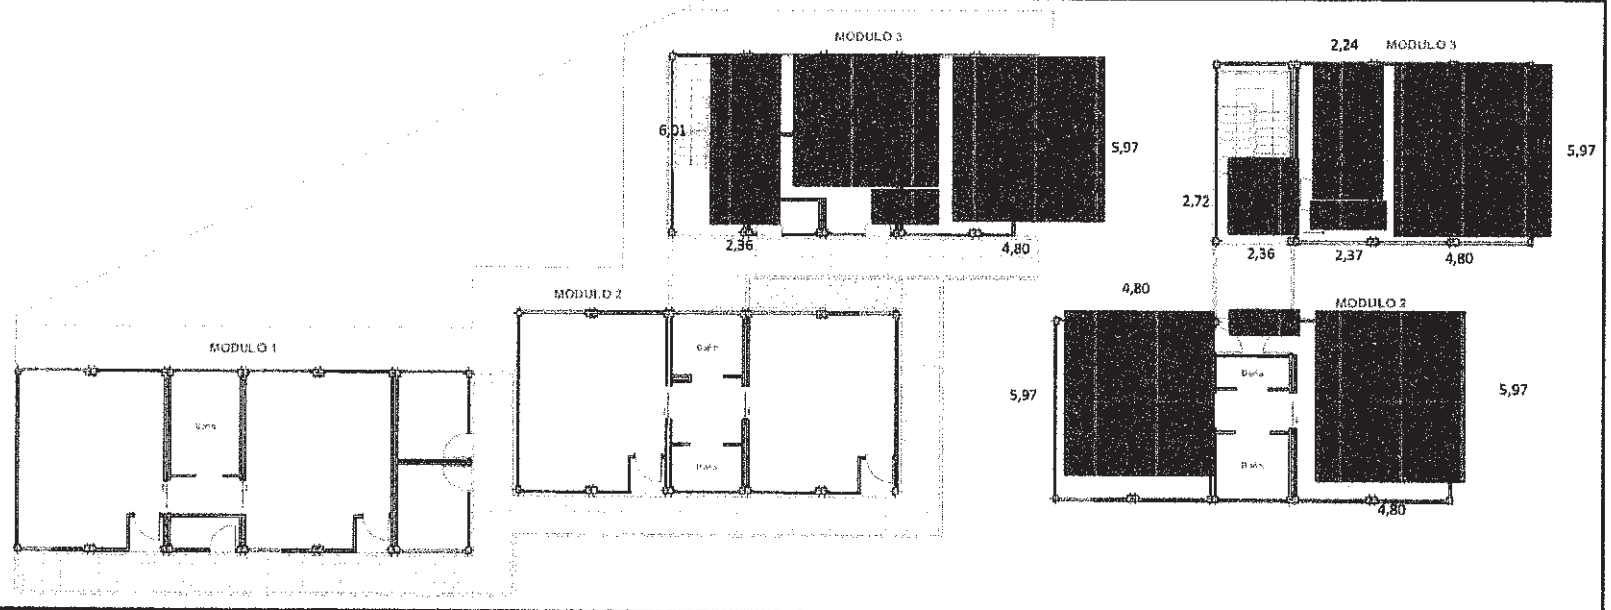

OBSERVACIONES:

FIRMA
ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL
DIRECTOR DE OBRA
Ever Jose Salgado Salgado

ING. JHON FIGUEROA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GEBAL

BOGOTÁ

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CODIGO			
FECHA ELABORACION	19 de abril de 2020		
FECHA DE REVISION			
HOJA	1	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.


CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917558-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901351342-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		

ITEM	NP-18	DESCRIPCION	DESMONTE DE BAJANTES EXISTENTES	UNIDAD	Ml.	CANTIDAD		TOTAL
								13,92

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO





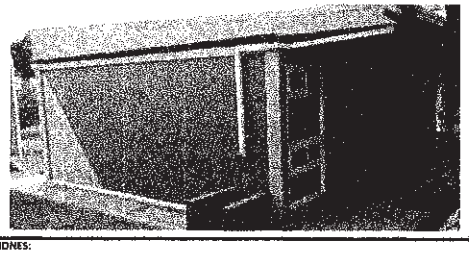

Elemento	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	Cantidad	TOTAL	
Modulo 1	3,00			1,00	3,00	
Modulo 2	5,46			1,00	5,46	
Modulo 3	5,46			1,00	5,46	
Total en la presente acta					13,92	

OBSERVACIONES:

FIRMA
ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL
DIRECTOR DE OBRA
Ever Jose Salgado Salgado

FIRMA
ING. LEIDY AGUIRRE
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GEBAL

BOGOTÁ


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO			
FECHA ELABORACION	19 de abril de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	2	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.						
CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917558-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901351342-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		

ITEM	NP-18	DESCRIPCION	DESMONTE DE BAJANTES EXISTENTES	UNIDAD	ML	CANTIDAD		TOTAL
								13,92

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO	Elemento	DIMENSIONES				TOTAL	
		Largo	Ancho	Alto	Cantidad		

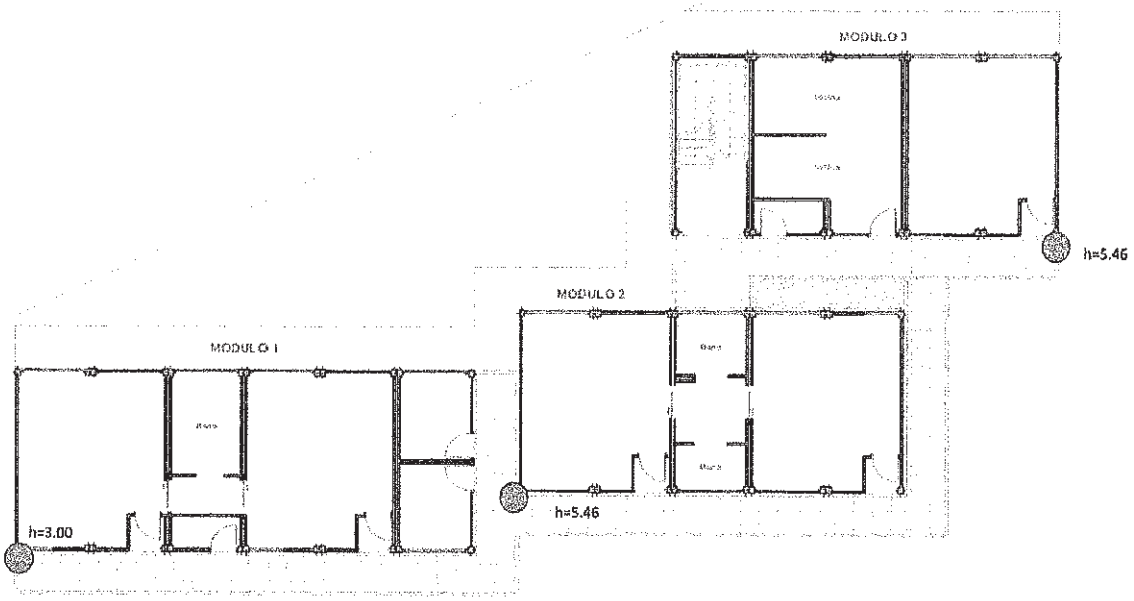



OBSERVACIONES:

FIRMA ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL DIRECTOR DE OBRA Ever Jose Salgado Salgado	DIRECTO INGENIERO AGUIRRE DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO GEBAL

BOGOTÁ	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	CODIGO						
		FECHA ELABORACION	19 de abril de 2020					
		FECHA DE REVISIÓN						
		HOJA	1	DE	2			

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (9) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.						
CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917558-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901351342-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		

ITEM	NP-19	DESCRIPCION	DESMONTE DE LAMINAS DE POLICARBONATO EXISTENTES AREA ESCALERA	UNIDAD	M2	CANTIDAD		TOTAL
								44,61

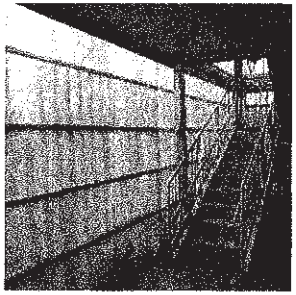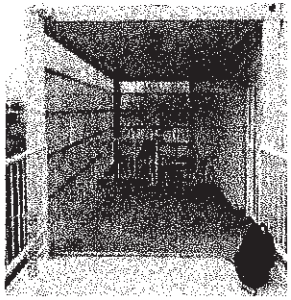ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO	Elemento	DIMENSIONES				TOTAL	
		Largo	Ancho	Alto	Cantidad		
  	Fachada lateral izquierda modulo 3		6,05	5,46	1,00	33,03	
	Fachada posterior modulo 3		2,12	5,46	1,00	11,58	
	Total en la presente acta					44,61	

OBSERVACIONES:

FIRMA	FIRMA
ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL	ING. LEIDY AGUIRRE
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Ever Jose Salgado Salgado	CONSORCIO GEBAL

BOGOTÁ

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO			
FECHA ELABORACION	19 de abril de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	1	DE	2


OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIDS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.

CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917558-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901351342-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		


ITEM	NP-19	DESCRIPCION	DESMONTE DE LAMINAS DE POLICARBONATO EXISTENTES AREA ESCALERA	UNIDAD	M2	CANTIDAD		TOTAL
								44,61

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO	Elemento	DIMENSIONES				TOTAL
		Largo	Ancho	Alto	Cantidad	

MODULO 3

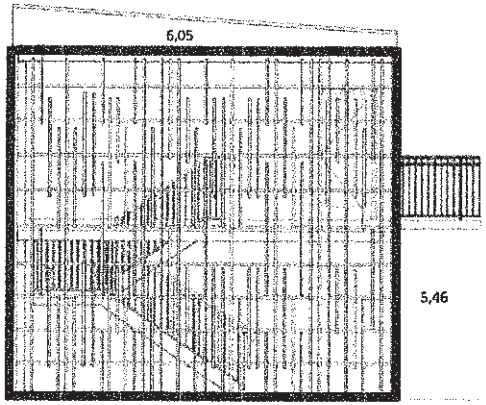

A-1 DERECHO

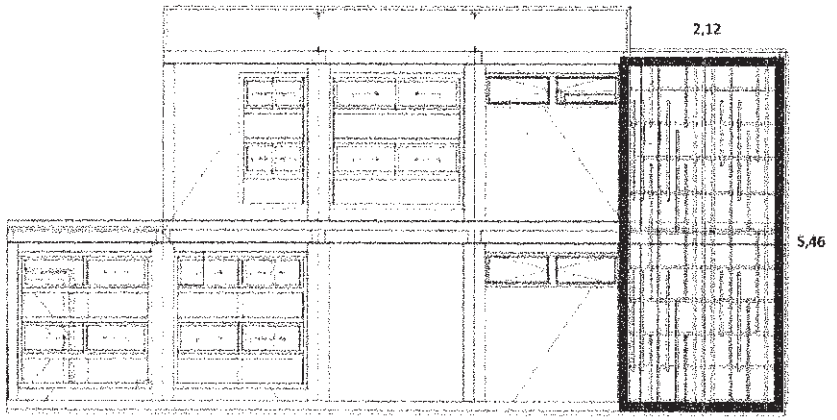

A-1 POSTERIOR

OBSERVACIONES:

FIRMA	FIRMA
ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL	ING. LEIDY AGUIRRE
DIRECTOR DE OBRA Ever Jose Salgado Salgado	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO GEBAL

BOGOTÁ

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO			
FECHA ELABORACION	19 de abril de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	1	DE	2


OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.


CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917558-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901351342-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		

ITEM	NP-21	DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIACAÑAS PVC DE 6 CM	UNIDAD	ML	CANTIDAD		TOTAL
								95,79

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO



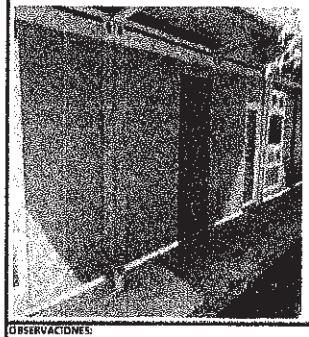

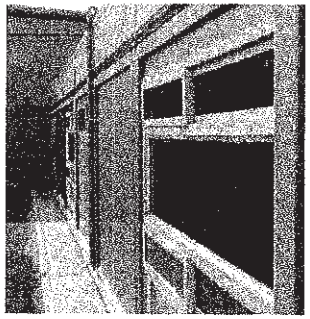

Elemento	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	Cantidad	TOTAL	
Modulo 1 (14,64+14,64+6,05+6,05) menos puertas (,80*5)	37,38			1,00	37,38	
Modulo 2 (12,2+12,2+6,05+6,05) -(2*0,8)	34,90			1,00	34,90	
Modulo 3 (9,93+9,93+6,05)-(,8*3)	23,51			1,00	23,51	
Total en la presente acta					95,79	

OBSERVACIONES:

FIRMA	
ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL	
DIRECTOR DE OBRA Ever Jose Salgado Salgado	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO GEBAL

95

1920

BOGOTÁ


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO			
FECHA ELABORACION	19 de abril de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	1	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.						
CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917558-1	CONTRATO N°	COP-318 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901351342-8	CONTRATO N°	COP-319 DE 2019		

ITEM	NP-21	DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIACAÑAS PVC DE 6 CM	UNIDAD	ML	CANTIDAD		TOTAL
								95,79

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO	Elemento	DIMENSIONES				TOTAL
		Largo	Ancho	Alto	Cantidad	

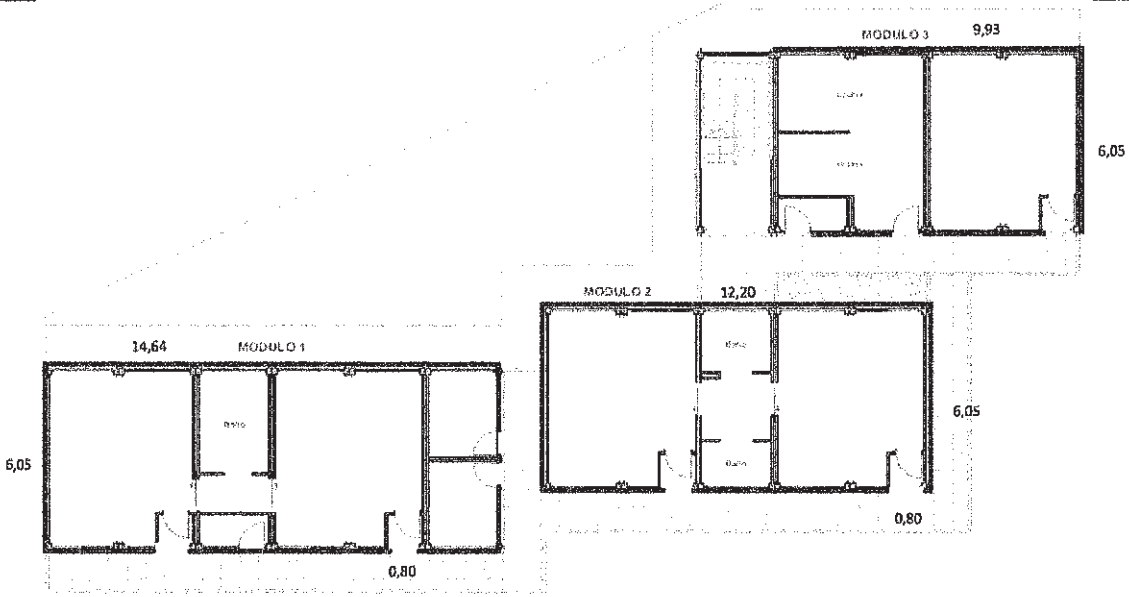

OBSERVACIONES:

FIRMA	
ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL	
DIRECTOR DE OBRA Ever Jose Salgado Salgado	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO GEBAL

BOGOTÁ




MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CODIGO				
FECHA ELABORACION	19 de abril de 2020			
FECHA DE REVISIÓN				
HOJA	1	DE	2	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.						
CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT, o CC.	7917558-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT, o CC.	901351342-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		

ITEM	NP-22	DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIACAÑAS PVC DE 9 CM	UNIDAD	ML	CANTIDAD		TOTAL
								317,47

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO

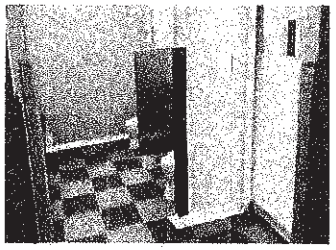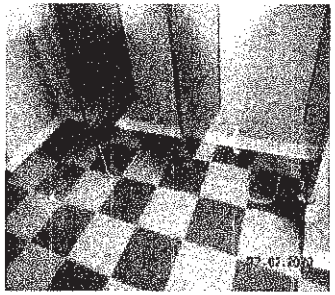

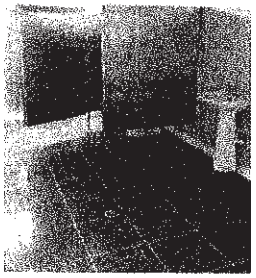Elemento	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	Cantidad	TOTAL	
Baño Modulo 2 Primer piso (piso y techo) (2,24+1,03+1,03+,6+,6+,06+,6+,6+,06+,6+,6+,6+,6+,12+2,2+2,2+2,24)	15,98			2,00	31,96	
Baño profesores Modulo 3 Segundo Piso (piso y techo) (4,55+4,55+2,24+1,3+,09)	12,73			2,00	25,46	
Cocina Modulo 3 Primer piso (piso y techo) (5,85+4,68+2,55+2,31+2,31+,06+2,08+2,44+1,16+1,24+,06)	24,74			2,00	49,48	
Lactancia Modulo 1 (piso y techo) (2,88+2,24+2,24+1,94)	9,30			2,00	18,60	
Baño modulo 1 (piso y techo) (3,39+3,39+2,24+,81+,81+,06+,53+,53+,06+2,24+,06+,06+,06+,26+,26)	14,76			2,00	29,52	
Baño Modulo 2 segundo Piso (piso y techo) (2,24+2,02+2,02+,6+,6+,6+,6+,06+,23+,8+,8+,6+,6+,6+,6+,06+,06+2,24+1,51+,151)	18,35			2,00	36,70	
Baño Modulo 1 verticales			2,66	6,00	15,96	
Baño Modulo 2 Primer piso verticales			2,10	14,00	29,40	
Baño Modulo 2 segundo piso verticales			2,10	12,00	25,20	
Baño profesores Modulo 3 segundo piso verticales			2,66	4,00	10,64	
Cocina Modulo 3 primer piso verticales			2,35	9,00	21,15	
Lactancia Modulo 1 verticales			2,35	6,00	14,10	
Aseo Modulo 1 Piso (2,88+2,24+2,24+1,94)	9,30			1,00	9,30	
Total en la presente acta					317,47	

OBSERVACIONES:

FIRMA
ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL
DIRECTOR DE OBRA
Ever Jose Salgado Salgado

ING. LEIDY AGUIRRE
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GEBAL

1922

BOGOTÁ


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO			
FECHA ELABORACION	19 de abril de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	1	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.						
CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917554-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901351342-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		

ITEM	NP-22	DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIACAÑAS PVC DE 9 CM	UNIDAD	ML	CANTIDAD		TOTAL
								317,47

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO	Elemento	DIMENSIONES				TOTAL	
		Largo	Ancho	Alto	Cantidad		

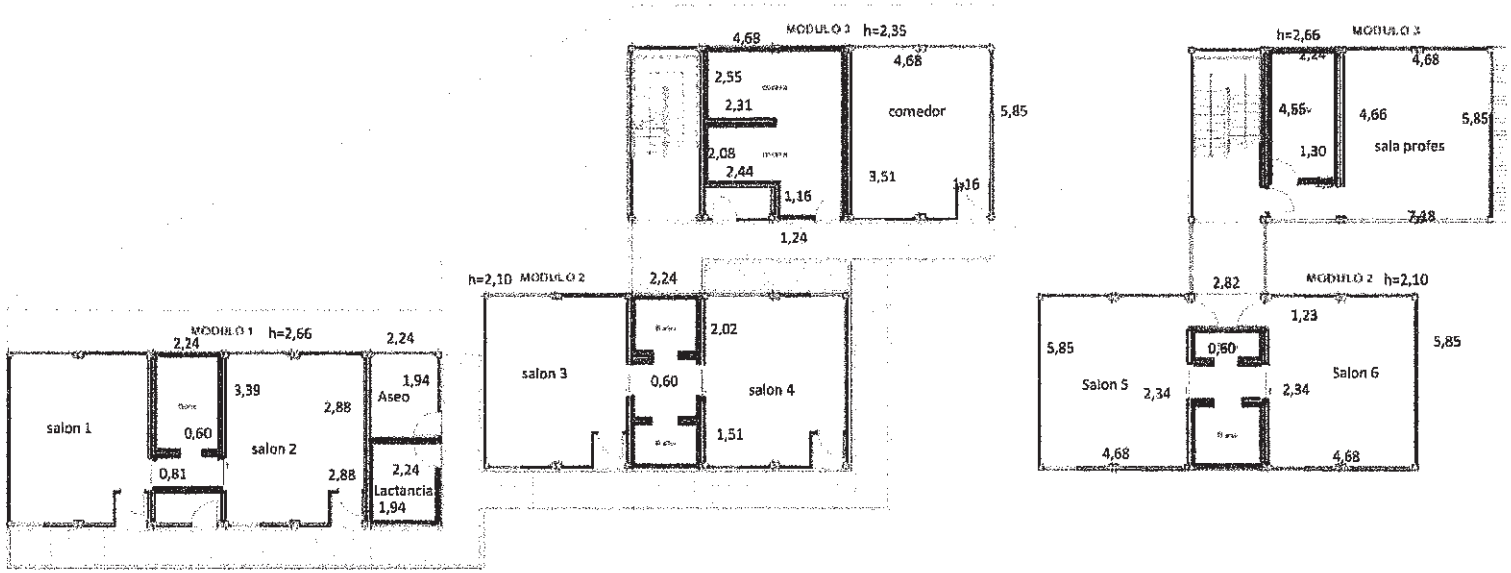

OBSERVACIONES:

FIRMA	FIRMA
ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL	ING. LEIDY AGUIRRE
DIRECTOR DE OBRA Ever Jose Salgado Salgado	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO GEBAL

1923

BOGOTÁ

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA





CODIGO			
FECHA ELABORACION	19 de abril de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	1	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PUEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.

CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917558-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901351342-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		

ITEM	NP-23	DESCRIPCION	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 DE 60 CM DE DESARROLLO	UNIDAD	ML	CANTIDAD		TOTAL
								41,62

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO

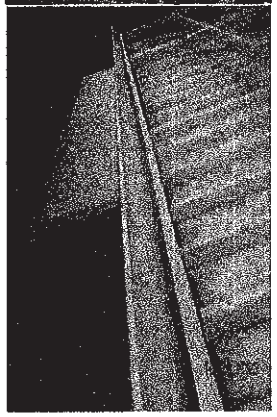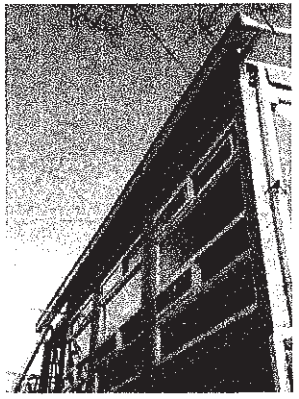Elemento	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	Cantidad	TOTAL	
Modulo 1	15,30			1,00	15,30	
Modulo 2	12,84			1,00	12,84	
Modulo 3	10,44			1,00	10,44	
Modulo 3 cubierta primer nivel	3,04			1,00	3,04	
Total en la presente acta					41,62	

OBSERVACIONES:

FIRMA

ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL

DIRECTOR DE OBRA

Ever Jose Salgado Salgado

CONSORCIO

INGENIO AGUIRRE

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO GEBAL

1924

BOGOTÁ


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO			
FECHA ELABORACION	19 de abril de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	2	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.						
CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917558-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901351842-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		

ITEM	NP-23	DESCRIPCION	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 DE 60 CM DE DESARROLLO	UNIDAD	ML	CANTIDAD		TOTAL
								41,62

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO	Elemento	DIMENSIONES				TOTAL	
		Largo	Ancho	Alto	Cantidad		

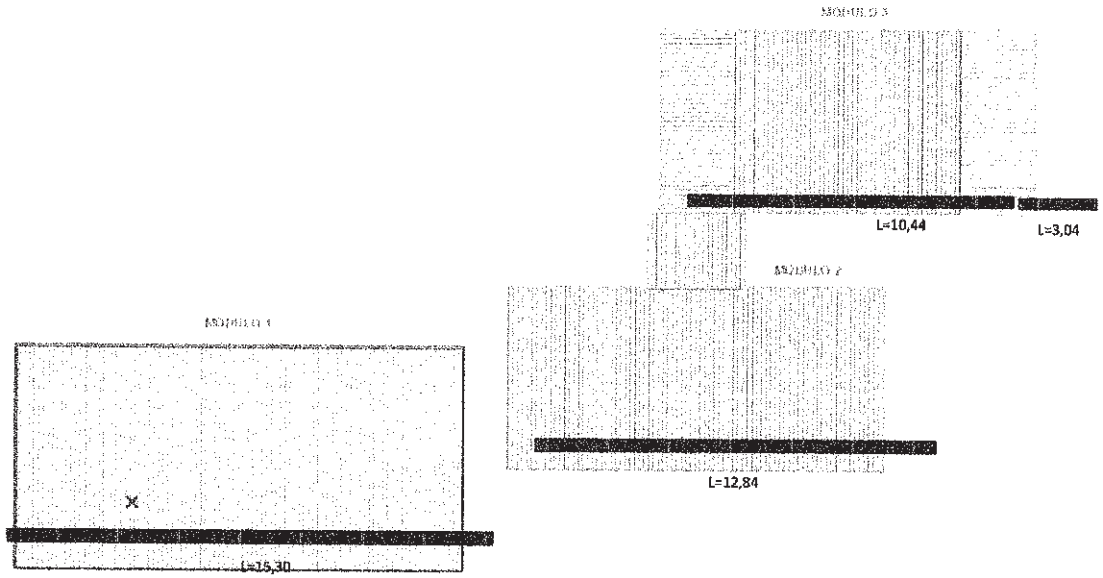

OBSERVACIONES:

FIRMA	FIRMA
ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL	ING. LEIDY AGUDELO
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Ever Jose Salgado Salgado	CONSORCIO GEBAL

1925

BOGOTÁ

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CODIGO			
FECHA ELABORACION	19 de abril de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	1	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PUEGO DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.


CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917558-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901351342-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		


ITEM	NP-24	DESCRIPCION	APLICACIÓN DE WASH PRIMER SOBRE PERFILES EXISTENTES DE LAMINA GALVANIZADA DE MUROS Y TECHOS (CANAL)	UNIDAD	ML	CANTIDAD		TOTAL
								536,45

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO





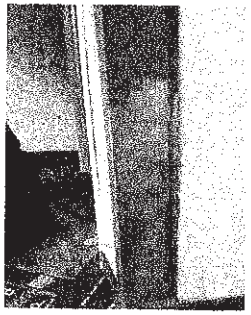

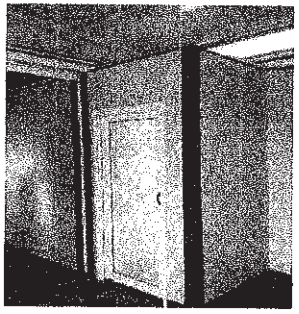

Elemento	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	Cantidad	TOTAL
Salones 1 y 2 modulo 1 horizontales (5,85+4,68+3,57+1,31+1,16+3,51)	20,08			2,00	40,16
Salones 3 y 4 modulo 2 primer piso (5,85+4,68+3,57+1,31+1,16+3,51)	20,08			2,00	40,16
Comedor Modulo 3 primer piso (5,85+4,68+3,57+1,31+1,16+3,51)	20,08			1,00	20,08
Salones 5 y 6 modulo 2 Segundo piso (5,85+5,85+4,68+4,68)	21,06			2,00	42,12
Salon Profesores Modulo 3 segundo piso (5,85+4,68+7,18+4,66+2,44)	24,81			1,00	24,81
Salon 1 modulo 1 (verticales)			2,66	10,00	26,60
Salon 2 modulo 1 (verticales)			2,66	10,00	26,60
Salon 3 modulo 2 (verticales)			2,10	7,00	14,70
Salon 4 modulo 2 (verticales)			2,10	7,00	14,70
Salon 5 modulo 3 (verticales)			2,66	7,00	18,62
Salon 6 modulo 3 (verticales)			2,66	4,00	10,64
Salon profesores modulo 3 (verticales)			2,66	4,00	10,64
Baño profesores modulo 3 (verticales)			2,66	4,00	10,64
Cocina Modulo 3 (verticales)			2,66	4,00	10,64
Aseo Modulo 1 (verticales)			2,66	4,00	10,64
VERTICALES BARANDA PUENTE	0,80	1,00		52,00	41,60
HORIZONTALES BARANDA PUENTE	2,50	1,00		5,00	12,50
VERTICALES ESCALERA	0,90	1,00		108,00	97,20
HORIZONTALES ESCALERA ANTEPECHO	1,10	1,00		2,00	2,20
HORIZONTALES ESCALERA PARAMANOS	5,10	1,00		12,00	61,20
Total en la presente acta					536,45

OBSERVACIONES:

FIRMA
ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL
DIRECTOR DE OBRA
Ever Jose Salgado Salgado

ING. LUIS AGUIRRE
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GEBAL

1926

BOGOTÁ


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO			
FECHA ELABORACION	19 de abril de 2020		
FECHA DE REVISION			
HOJA	2	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE SA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.						
CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917558-1	CONTRATO N°	COP-318 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901351342-8	CONTRATO N°	COP-319 DE 2019		

ITEM	NP-24	DESCRIPCION	APLICACIÓN DE WASH PRIMER SOBRE PERFILES EXISTENTES DE LAMINA GALVANIZADA DE MUROS Y TECHOS (CANAL)	UNIDAD	Ml.	CANTIDAD		TOTAL
								536,45

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO	Elemento	DIMENSIONES				TOTAL	
		Largo	Ancho	Alto	Cantidad		

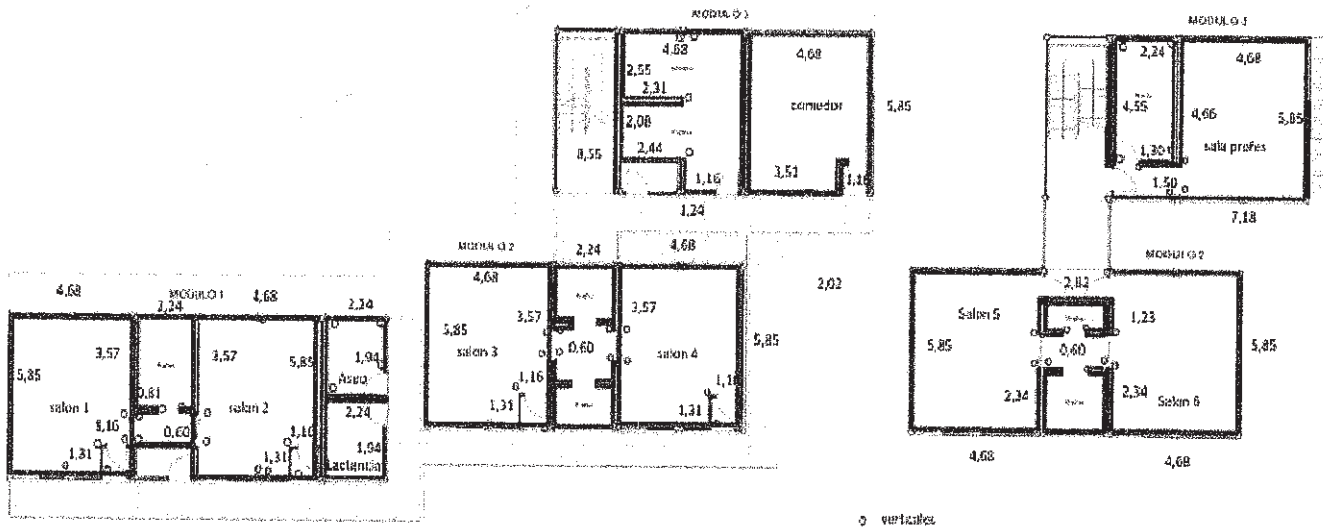

OBSERVACIONES:

FIRMA	FIRMADO
ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL	ING. LEIDY AGUIRRE
DIRECTOR DE OBRA Ever Jose Salgado Salgado	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO GEBAL

82

1929

BOGOTÁ

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CODIGO			
FECHA ELABORACION	19 de abril de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	1	DE	2


OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.

CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917558-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901351342-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		

ITEM	NP-25	DESCRIPCION	LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE VENTANERIA EN PVC	UNIDAD	M2	CANTIDAD		TOTAL
								285,63

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO

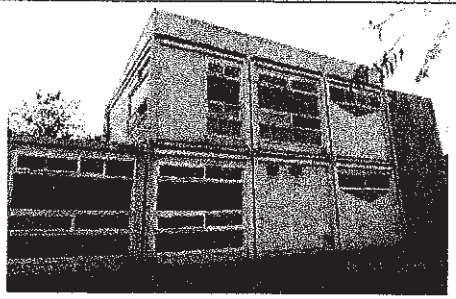

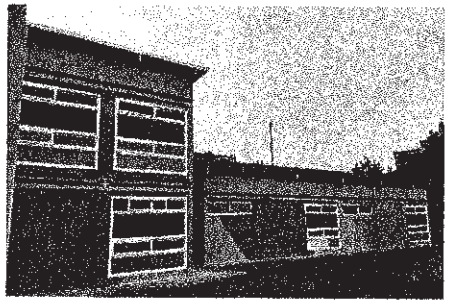

Elemento	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	Cantidad	TOTAL	
Ventana grande cara exterior		2,13	2,13	15,00	68,05	
Ventana mediana cara exterior		1,09	2,13	12,00	27,86	
Ventana pequeña cara exterior		0,53	2,13	7,00	7,90	
Ventana grande cara interior		2,13	2,13	15,00	68,05	
Ventana mediana cara interior		1,09	2,13	12,00	27,86	
Ventana pequeña cara interior		0,53	2,13	7,00	7,90	
Puertas de acceso cara exterior		0,88	2,01	14,00	24,76	
Puertas corredera cara exterior		1,13	2,10	6,00	14,24	
Puertas de acceso cara interior		0,88	2,01	14,00	24,76	
Puertas corredera cara interior		1,13	2,10	6,00	14,24	
Total en la presente acta					285,63	

OBSERVACIONES:

FIRMA
ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL
DIRECTOR DE OBRA
Ever Jose Salgado Salgado

FIRMA
ING. LEIDY AGUIRRE
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GEBAL

1928

BOGOTÁ


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO			
FECHA ELABORACION	19 de abril de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	2	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.						
CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917558-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901351347-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		

ITEM	NP-25	DESCRIPCION	LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE VENTANERIA EN PVC	UNIDAD	M2	CANTIDAD		TOTAL
								285,63

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO	Elemento	DIMENSIONES				TOTAL	
		Largo	Ancho	Alto	Cantidad		

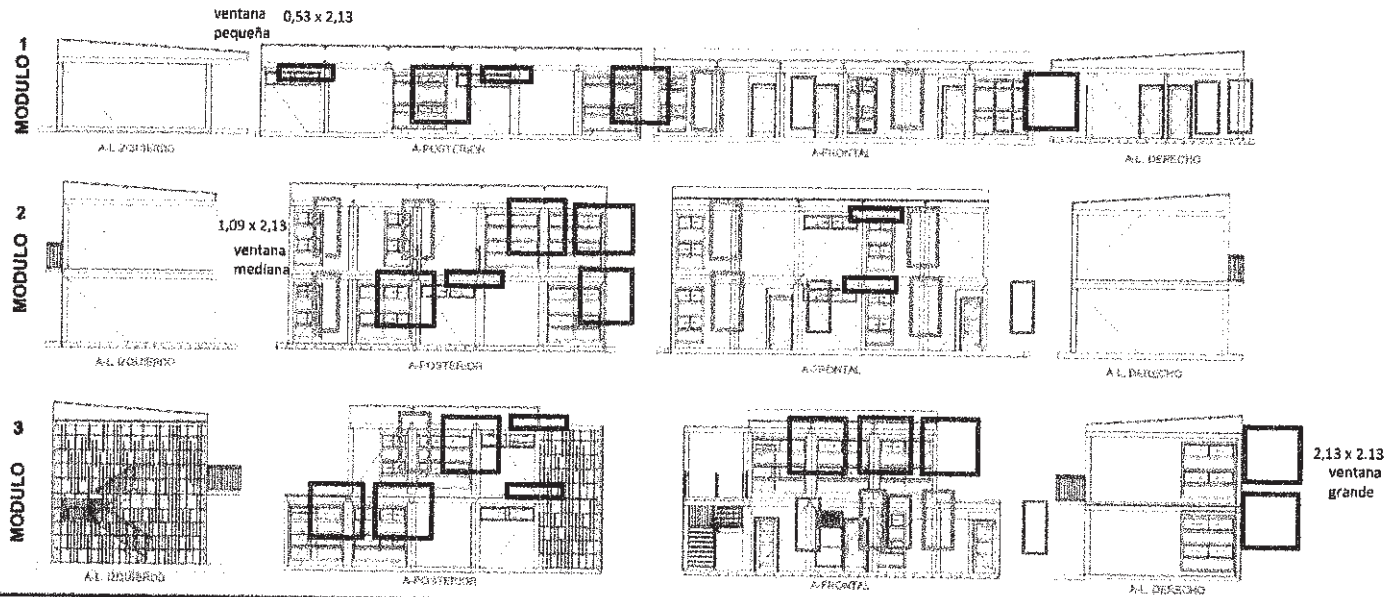

OBSERVACIONES:

FIRMA	
ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL	
DIRECTOR DE OBRA	
Ever Jose Salgado Salgado	INGENIERO CIVIL DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO GEBAL

1929

BOGOTÁ

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO			
FECHA ELABORACION	19 de abril de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	1	DE	2


OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PUEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.

CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917558-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901391342-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		

ITEM	NP-26	DESCRIPCION	LIMPIEZA Y REEMBOQUILLADO CON ARENA DE ANDENES EXISTENTES	UNIDAD	M2	CANTIDAD	TOTAL
							61,04

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO



Elemento	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	Cantidad	TOTAL	
Anden modulo 1	18,55	1,42		1,00	26,34	
Anden modulo 2	22,14	1,42		1,00	31,44	
Anden modulo 3	5,61	1,42		1,00	7,97	
Anden acceso escalera	2,53	2,47		1,00	6,25	
Menos area desmontada en Modulo 1	4,00	1,22		-1,00	-4,88	
Menos area desmontada en Modulo 2	4,98	1,22		-1,00	-6,08	
Total en la presente acta					61,04	

OBSERVACIONES:

FIRMA
ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL
DIRECTOR DE OBRA
Ever Jose Salgado Salgado

CONSORCIO
INGRID T AGUIRRE
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GEBAL

1930

BOGOTÁ


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO			
FECHA ELABORACION	19 de abril de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	2	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PUEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.						
CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917558-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901351342-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		

ITEM	NP-26	DESCRIPCION	LIMPIEZA Y REEMBOQUILLADO CON ARENA DE ANDENES EXISTENTES	UNIDAD	M2	CANTIDAD		TOTAL
								61,04

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO	Elemento	DIMENSIONES				TOTAL	
		Largo	Ancho	Alto	Cantidad		

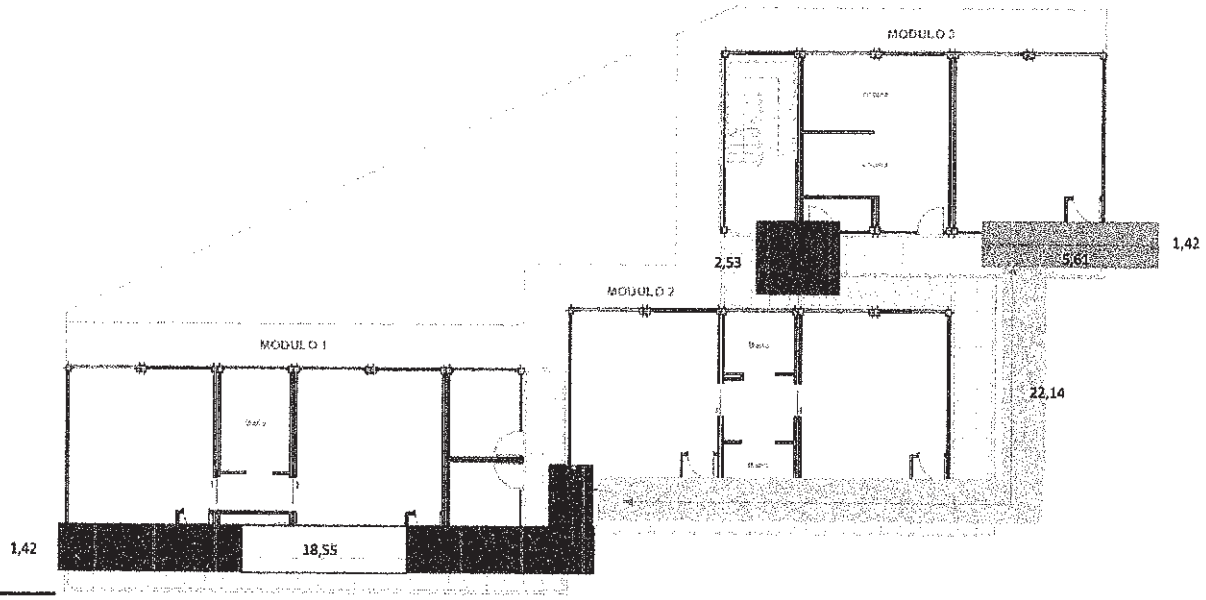

OBSERVACIONES:

FIRMA	FIRMA
ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL	ING. LEIDY AGUIRRE
DIRECTOR DE OBRA Ever Jose Salgado Salgado	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO GEBAL

BOGOTÁ

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CODIGO				
FECHA ELABORACION	19 de abril de 2020			
FECHA DE REVISIÓN				
HOJA	1	DE	2	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.


CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917558-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901351942-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		

ITEM	NP-27	DESCRIPCION	SUM E INSTALACION DE BORDILLO CONCRETO PREFABRICADO DE 10 X 20 CM	UNIDAD	ML	CANTIDAD		TOTAL
								125,61

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO

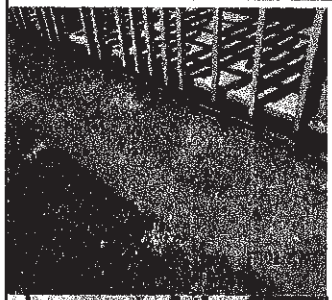



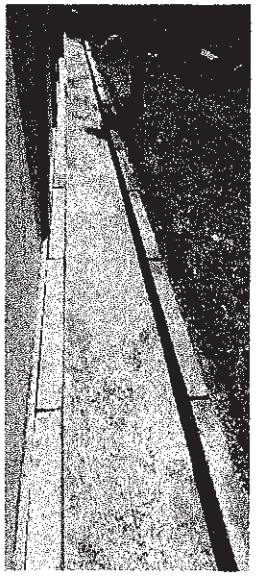

Elemento	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	Cantidad	TOTAL	
Tramo 1 bordillo	14,22			1,00	14,22	
Tramo 2 bordillo	25,80			1,00	25,80	
Tramo 3 bordillo	17,74			1,00	17,74	
Tramo 4 bordillo	8,28			1,00	8,28	
Tramo 5 bordillo	6,12			1,00	6,12	
Traino 6 bordillo	29,98			1,00	29,98	
Tramo 7 bordillo	16,47			1,00	16,47	
Rampas acceso	7,00			1,00	7,00	
Total en la presente acta					125,61	

OBSERVACIONES:

FIRMA	
ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL	CONSORCIO INGENIERIA AGUIRRE
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Ever Jose Salgado Salgado	CONSORCIO GEBAL

1932

BOGOTÁ

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CODIGO			
FECHA ELABORACION	19 de abril de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	2	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.

CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917558-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901351342-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		

ITEM	NP-27	DESCRIPCION	SUM E INSTALACION DE BORDILLO CONCRETO PREFABRICADO DE 10 X 20 CM	UNIDAD	ML	CANTIDAD		TOTAL
								125,61

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO	Elemento	DIMENSIONES				TOTAL
		Largo	Ancho	Alto	Cantidad	

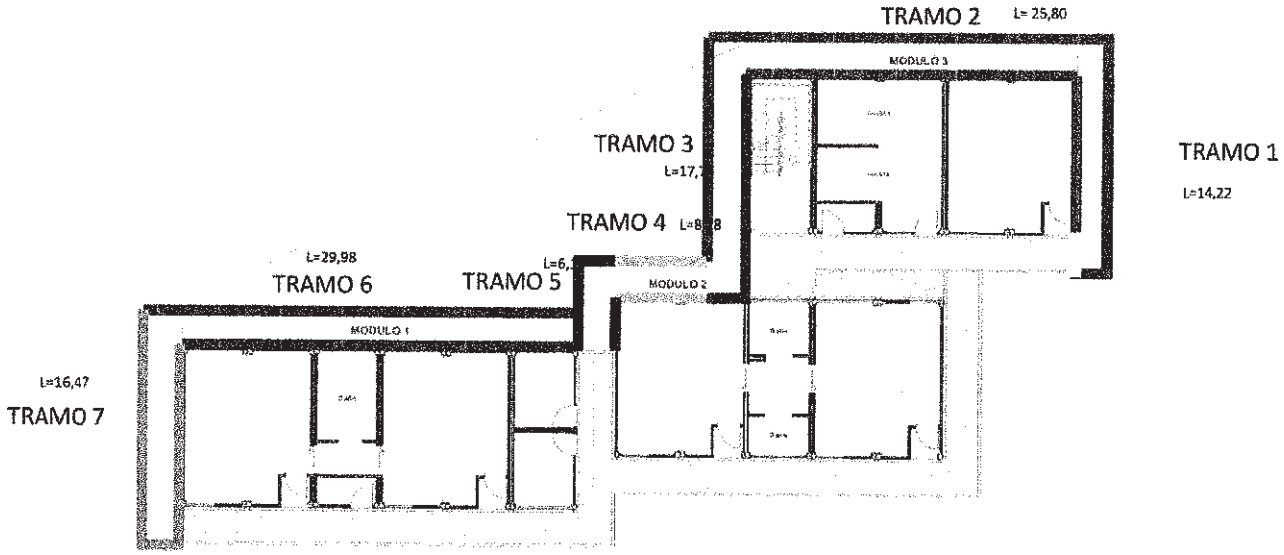

OBSERVACIONES:

FIRMA

ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL
DIRECTOR DE OBRA

Ever Jose Salgado Salgado

ING. [illegible]
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GEBAL

1933

BOGOTÁ


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO			
FECHA ELABORACION	19 de abril de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	1	DE	2


OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.						
CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917558-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901351342-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		

ITEM	NP-28	DESCRIPCION	SUM E INSTALACION DE CAÑUELA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 30 X20 CM	UNIDAD	ML	CANTIDAD		TOTAL
								7,00

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO

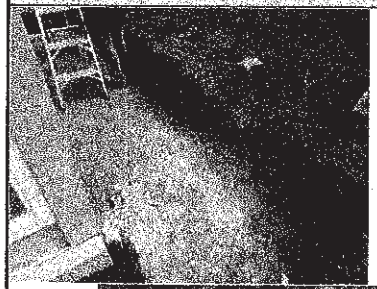



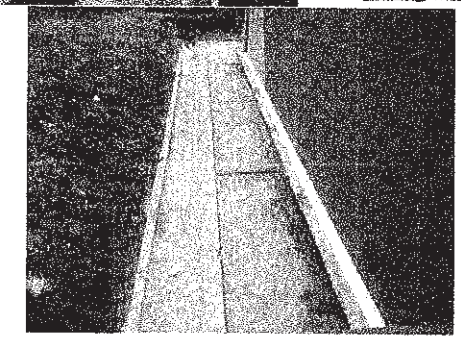

Elemento	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	Cantidad	TOTAL	
Cañuela area lateral izquierda modulo 1	7,00			1,00	7,00	
Total en la presente acta					7,00	

OBSERVACIONES:

FIRMA
ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL
DIRECTOR DE OBRA
Ever Jose Salgado Salgado

FIRMA
INGELDY AGUIRRE
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GEBAL

1934

BOGOTÁ

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CODIGO			
FECHA ELABORACION	19 de abril de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	2	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.

CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917558-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901351342-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		

ITEM	NP-28	DESCRIPCION	SUM E INSTALACION DE CAÑUELA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 30 X20 CM	UNIDAD	ML	CANTIDAD		TOTAL
								7,00

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO	Elemento	DIMENSIONES				TOTAL	
		Largo	Ancho	Alto	Cantidad		

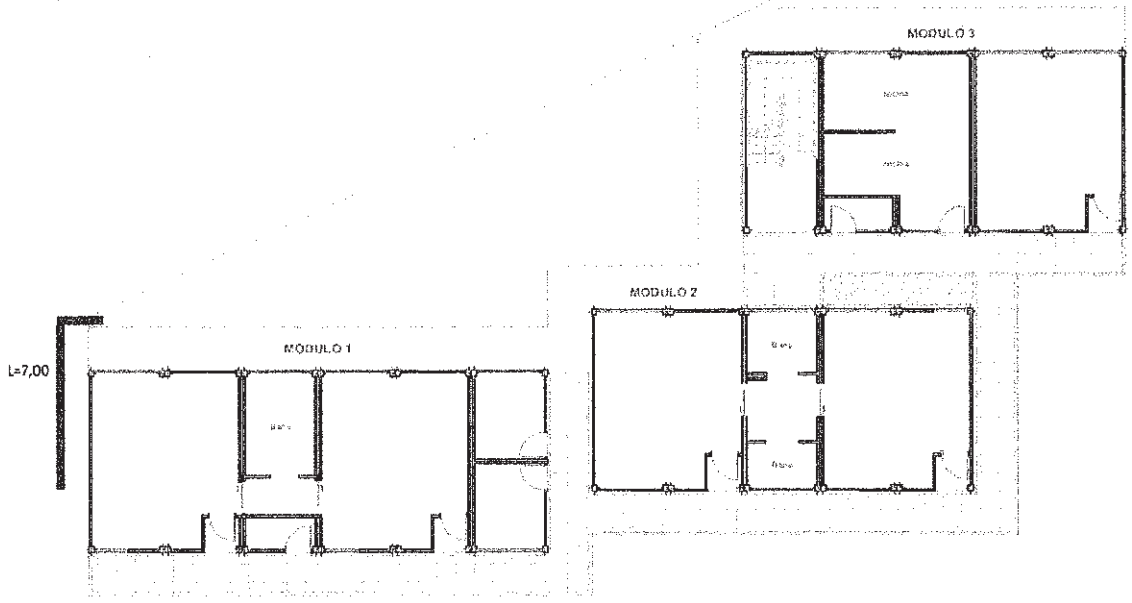

OBSERVACIONES:

FIRMA	
ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL	
DIRECTOR DE OBRA Ever Jose Salgado Salgado	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA CONSORCIO GEBAL

1 de 1

1935

BOGOTÁ

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CODIGO			
FECHA ELABORACION	19 de abril de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	1	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.

CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917558-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901351342-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		

ITEM	NP-29	DESCRIPCION	REVISION GENERAL DE PUNTOS Y SALIDAS ELECTRICAS	UNIDAD	UN	CANTIDAD		TOTAL
								1,00

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO

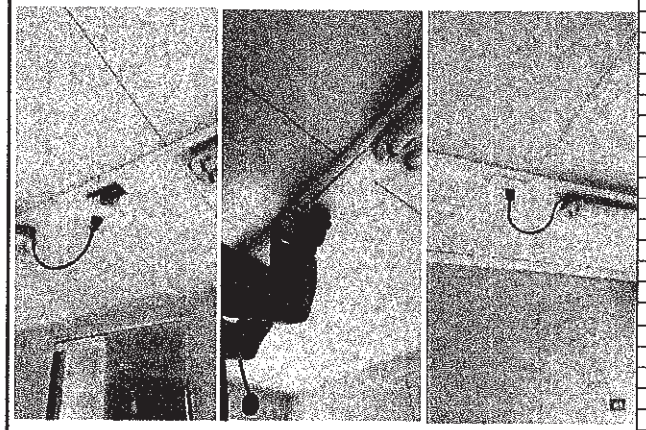

Elemento	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	Cantidad	TOTAL	
Revision general				1,00	1,00	
Total en la presente acta					1,00	

OBSERVACIONES:

FIRMA	
ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL	
DIRECTOR DE OBRA Ever Jose Salgado Salgado	CONSORCIO INGENIERIA ASCURRE DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO GEBAL

1936

BOGOTÁ


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO			
FECHA ELABORACION	19 de abril de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	2	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.						
CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917556-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901351942-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		

ITEM	NP-29	DESCRIPCION	REVISION GENERAL DE PUNTOS Y SALIDAS ELECTRICAS	UNIDAD	UN	CANTIDAD		TOTAL
								1,00

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO	Elemento	DIMENSIONES				TOTAL	
		Largo	Ancho	Alto	Cantidad		

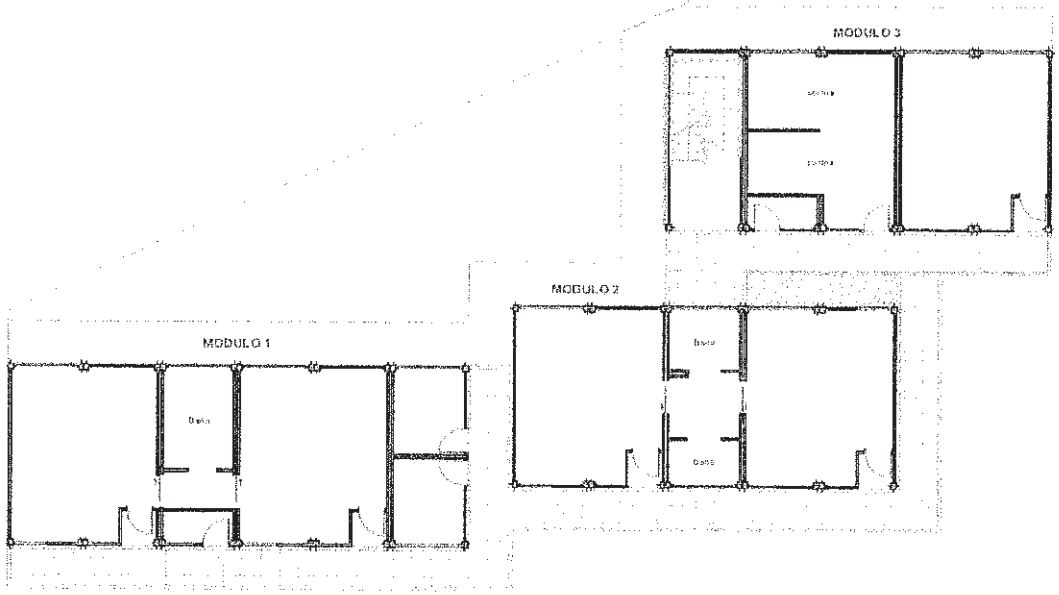

OBSERVACIONES:

FIRMA	
ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL	
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Ever Jose Salgado Salgado	CONSORCIO GEBAL

2

1932

BOGOTÁ

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CODIGO			
FECHA ELABORACION	19 de abril de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	1	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS RIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.

CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917556-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAI	NIT. o CC.	901351342-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		

ITEM	NP-31	DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENEFAS EN GRAVILLA MONA LAVADA A=10 CM	UNIDAD	ML	CANTIDAD		TOTAL
								46,58

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO

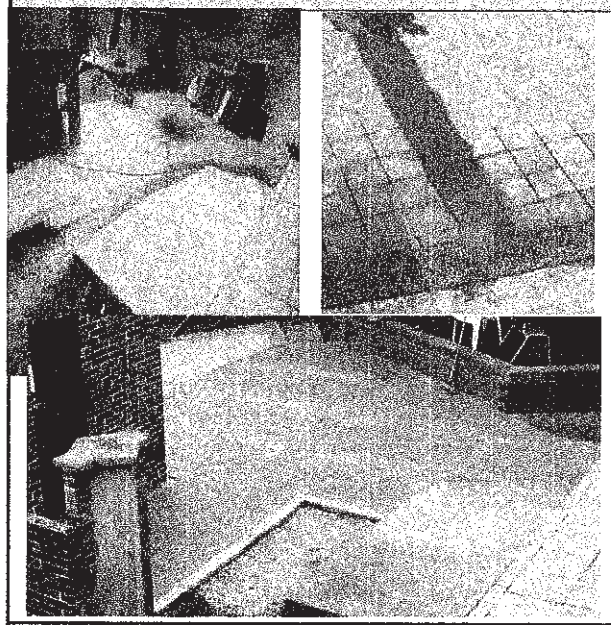

Elemento	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	Cantidad	TOTAL	
Cenefas en gravilla mona horizontales	1,24			2,00	2,48	
	4,36			2,00	8,72	
	5,05			1,00	5,05	
	3,76			1,00	3,76	
Cenefas en gravilla mona verticales	1,47			2,00	2,94	
	1,45			2,00	2,90	
	1,21			2,00	2,42	
	1,32			2,00	2,64	
	1,24			2,00	2,48	
	1,14			2,00	2,28	
	1,09			2,00	2,18	
	0,42			1,00	0,42	
	1,90			1,00	1,90	
	0,10			14,00	1,40	
Cenefas diagonales triangulos	1,24			1,00	1,24	
	2,15			1,00	2,15	
	1,62			1,00	1,62	
Total en la presente acta					46,58	

OBSERVACIONES:

FIRMA
ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL
DIRECTOR DE OBRA
Ever Jose Salgado Salgado

ING. LEIDY CASTRE
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GEBAI

2/3

1932

BOGOTÁ

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CODIGO			
FECHA ELABORACION	19 de abril de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	1	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PUEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.

CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917598-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901151347-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		

ITEM	NP-31	DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENEFAS EN GRAVILLA MONA LAVADA A=10 CM	UNIDAD	ML	CANTIDAD		TOTAL
								46,58

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO	Elemento	DIMENSIONES				TOTAL	
		Largo	Ancho	Alto	Cantidad		

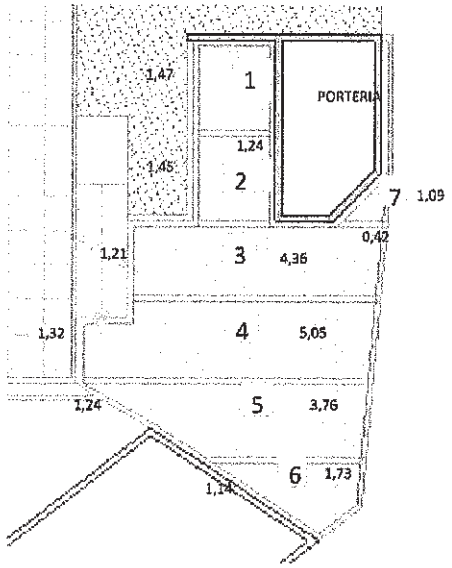

OBSERVACIONES:

FIRMA	
ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL	
DIRECTOR DE OBRA Ever Jose Salgado Salgado	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO GEBAL

1940

BOGOTÁ

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CODIGO			
FECHA ELABORACION	19 de abril de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	1	DE	2


OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÙN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.


CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917558-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901351342-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		


ITEM	NP-32	DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESQUINEROS EN LONA VERANO DE COLORES ACOLCHADOS EN JUMBOLENE DE 1.20 X 10 CM	UNIDAD	UN	CANTIDAD		TOTAL
								102,00

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO

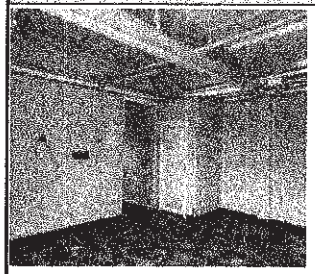

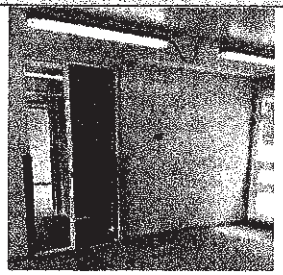



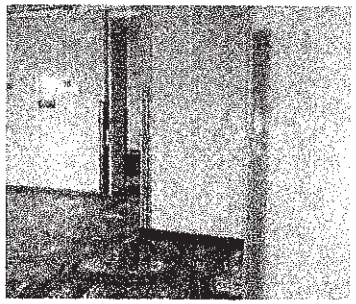

Elemento	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	Cantidad	TOTAL	
Salon 1 Modulo 1				8,00	8,00	
Salon 2 Modulo 1				9,00	9,00	
Salon 3 Modulo 2 primer piso				9,00	9,00	
Salon 4 Modulo 2 primer piso				9,00	9,00	
Salon 5 Modulo 3 segundo piso				8,00	8,00	
Salon 6 Modulo 3 segundo piso				8,00	8,00	
Baño Modulo 1				10,00	10,00	
Baño Modulo 2 primer piso				12,00	12,00	
Baño Modulee 2 segundo piso				12,00	12,00	
Comedor Modulo 3				7,00	7,00	
Salon profesores Modulo 3 segundo piso				10,00	10,00	
Total en la presente acta					102,00	

OBSERVACIONES:

FIRMA
ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL
DIRECTOR DE OBRA
Ever Jose Salgado Salgado

CONSORCIO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GEBAL

165

BOGOTÁ


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO			
FECHA ELABORACION	19 de abril de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	2	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUYA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PUEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.						
CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917558-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901351342-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		

ITEM	NP-32	DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESQUINEROS EN LONA VERANO DE COLORES ACOLCHADOS EN JUMBOLENE DE 1.20 X 10 CM	UNIDAD	UN	CANTIDAD		TOTAL
								102,00

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO	Elemento	DIMENSIONES				TOTAL	
		Largo	Ancho	Alto	Cantidad		

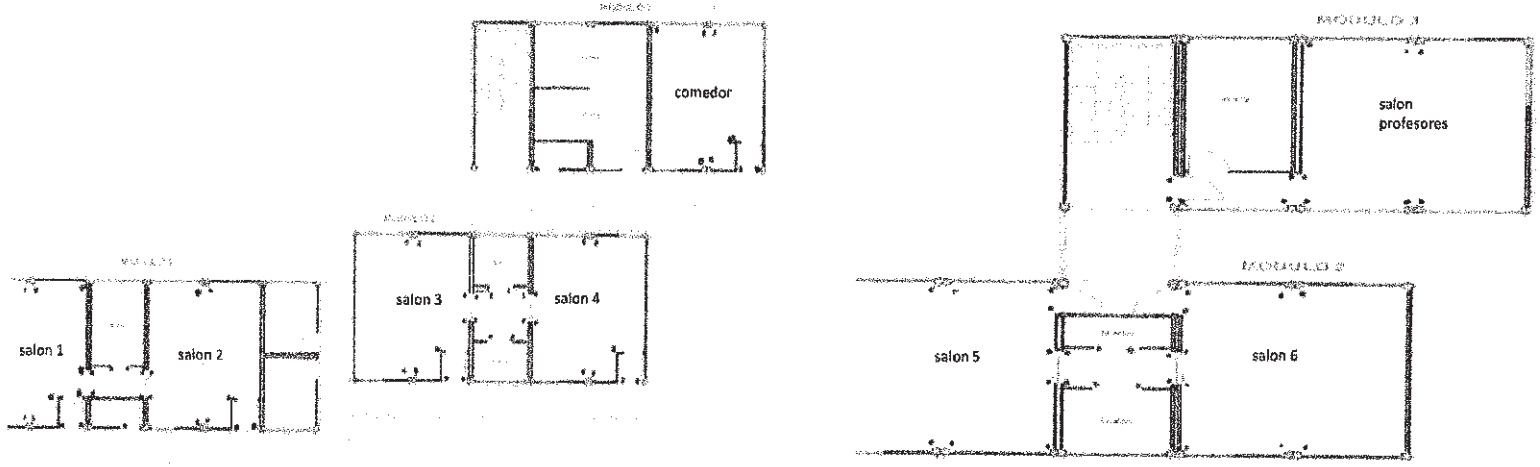

OBSERVACIONES:

FIRMA	FIRMA
ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL	ING. LEIDY AGUIRRE
DIRECTOR DE OBRA Ever Jose Salgado Salgado	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO GEBAL

BOGOTÁ

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CODIGO				
FECHA ELABORACIÓN	19 de abril de 2020			
FECHA DE REVISIÓN				
HOJA	1	DE	2	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.

CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917558-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901351342-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		

ITEM	NP-33	DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA PVC EN ROLLO DE 8 DE CM INCLUYE PEGANTE	UNIDAD	Ml	CANTIDAD		TOTAL
								118,50

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO

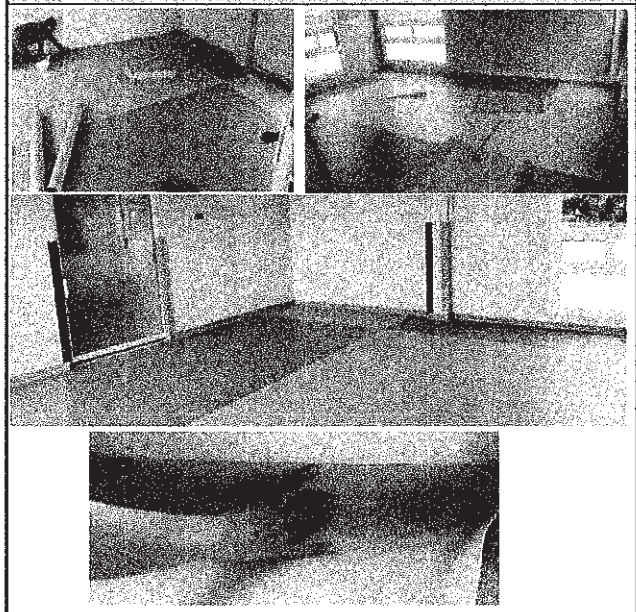

Elemento	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	Cantidad	TOTAL	
Salon 4 Modulo 2 Primer Piso (5,85+4,68+2,37+2,37+3,51+1,16+,25+,06+,19+1,16)	21,60			1,00	21,60	
Salon 5 Modulo 2 segundo Piso (5,85+4,68+4,68+2,34+1,23+,06+,06)	18,90			1,00	18,90	
Salon 6 Modulo 2 segundo Piso (5,85+4,68+4,68+2,34+1,23+,06+,06)	18,90			1,00	18,90	
Comedor Modulo 3 Primer Piso (5,85+4,68+5,85+3,51+1,16+,25+,06+,19+1,16)	22,71			1,00	22,71	
Oficina Profesores Modulo 3 Segundo Piso (4,68+5,85+4,66+7,18+1,5)	23,87			1,00	23,87	
Escalera Modulo 3 piso uno (6,1+2,3)	8,40			1,00	8,40	
Escalera Modulo 3 piso dos (1,30)	1,30			1,00	1,30	
Acceso salon 5 y 6 Modulo 2 Segundo piso (2,82)	2,82			1,00	2,82	
Total en la presente acta					118,50	

OBSERVACIONES:

FIRMA
ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL
DIRECTOR DE OBRA
Ever Jose Salgado Salgado

CONSORCIO GEBAL
INGENIERO AGUIRRE
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GEBAL

1943

BOGOTÁ


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO			
FECHA ELABORACION	19 de abril de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	2	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.						
CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917558-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901351342-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		

ITEM	NP-33	DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA PVC EN ROLLO DE 8 DE CM INCLUYE PEGANTE	UNIDAD	ML	CANTIDAD		TOTAL
								118,50

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO	Elemento	DIMENSIONES				TOTAL
		Largo	Ancho	Alto	Cantidad	

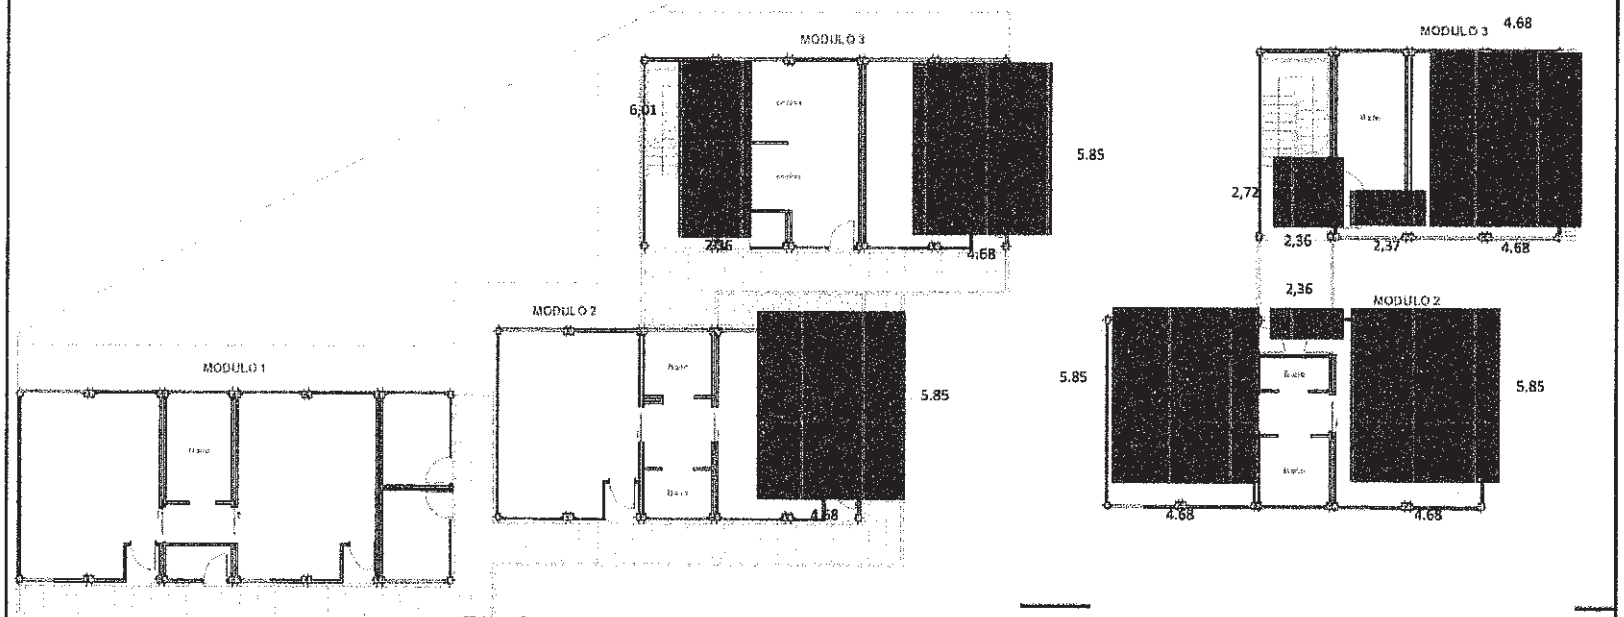

ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL
DIRECTOR DE OBRA
Ever Jose Salgado Salgado

ING. LUIS BARRERA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO GEBAL

1944

BOGOTÁ

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO			
FECHA ELABORACION	19 de abril de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	1	DE	2


OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUYA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCAUDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.

CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917558-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901351342-8	CONTRATO N°	COP-319 DE 2019		

ITEM	NP-34	DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJAS INTERIORES EN LAMINA PARA CANALES DETERIDRADAS DESARROLLO ,35 CM	UNIDAD	ML	CANTIDAD		TOTAL
								26,84

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO









Elemento	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	Cantidad	TOTAL	
Modulo 1	14,64			1,00	14,64	
Modulo 2	12,20			1,00	12,20	
Total en la presente acta					26,84	

OBSERVACIONES:

FIRMA

ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL

DIRECTOR DE OBRA

Ever Jose Salgado Salgado

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO GEBAL

194

BOGOTÁ

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CODIGO			
FECHA ELABORACION	19 de abril de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	2	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTIBES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.

CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917558-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901351342-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		

ITEM	NP-34	DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJAS INTERIORES EN LAMINA PARA CANALES DETERIORADAS DESARROLLO ,35 CM	UNIDAD	ML	CANTIDAD		TOTAL
								26,84

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO	Elemento	DIMENSIONES				TOTAL	
		Largo	Ancho	Alto	Cantidad		

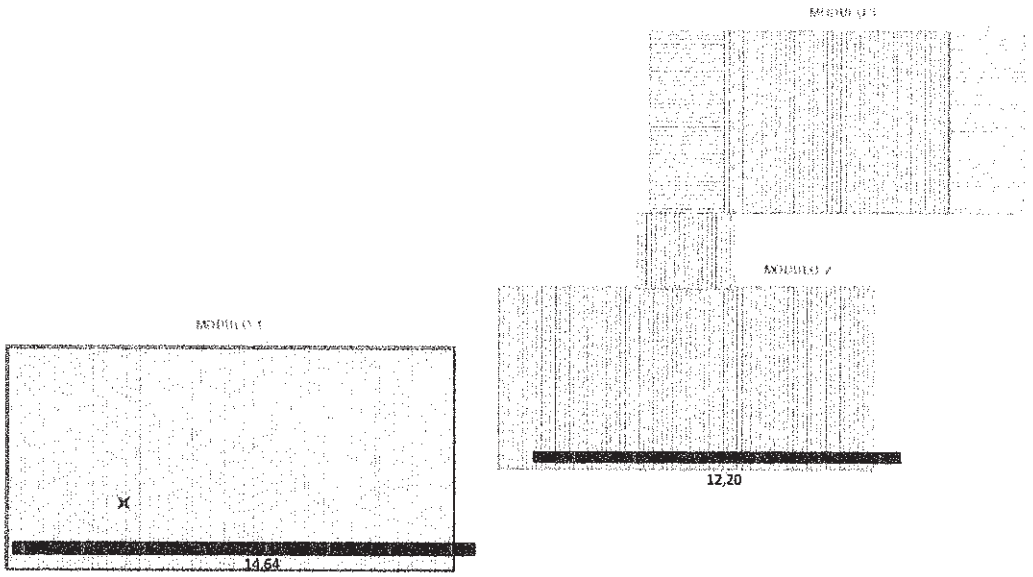

OBSERVACIONES:

FIRMA	
ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL	INGRID AGUIRRE
DIRECTOR DE OBRA Ever Jose Salgado Salgado	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO GEBAL

1946

BOGOTÁ


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CODIGO			
FECHA ELABORACION	19 de abril de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	1	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.						
CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917558-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901351842-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		

ITEM	NP-36	DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS QUIRURGICO CON GRIFERIA DE PEDAL EN ACERO INOXIDABLE DE 50X40 CM	UNIDAD	UN	CANTIDAD		TOTAL
								1,00

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO

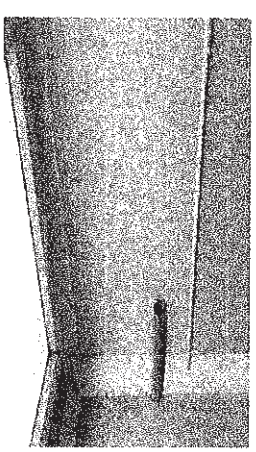

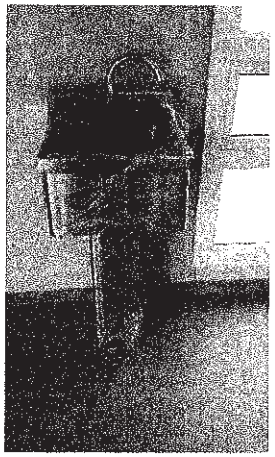

Elemento	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	Cantidad	TOTAL	
COCINA				1,00	1,00	
Total en la presente acta					1,00	

OBSERVACIONES:

FIRMA	FIRMA
ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL	CARGO
DIRECTOR DE OBRA	ING. LEIDY AGUIRRE
Ever Jose Salgado Salgado	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
	CONSORCIO GEBAL

1947

BOGOTÁ


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO			
FECHA ELABORACION	19 de abril de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	2	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.						
CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917558-1	CONTRATO N°	COP-378 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901351342-8	CONTRATO N°	COP-319 DE 2019		

ITEM	NP-36	DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS QUIRURGICO CON GRIFERIA DE PEDAL EN ACERO INOXIDABLE DE 50X40 CM	UNIDAD	UN	CANTIDAD		TOTAL
								1,00

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO	Elemento	DIMENSIONES				TOTAL	
		Largo	Ancho	Alto	Cantidad		

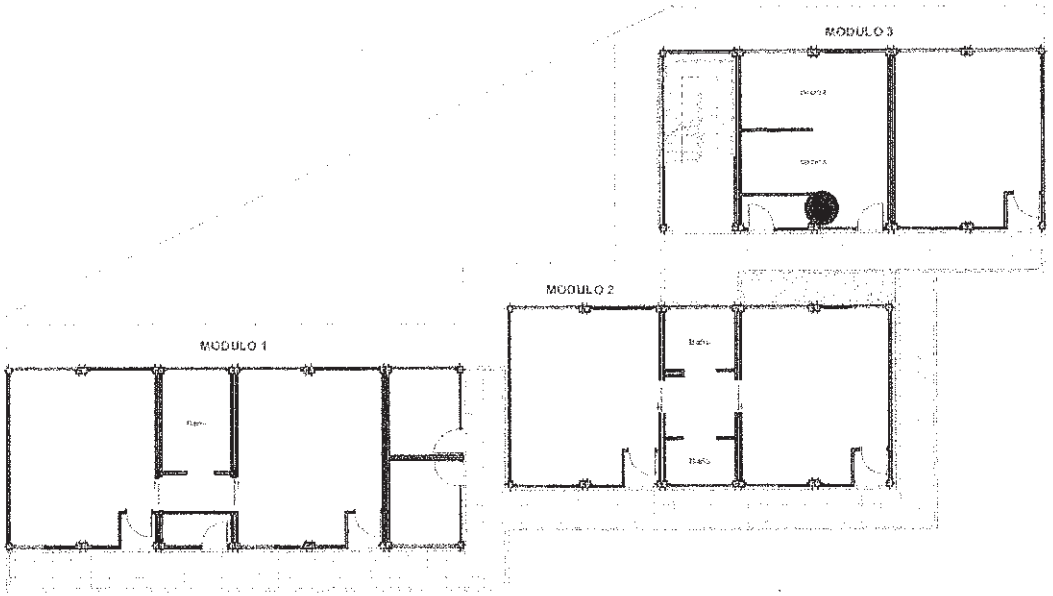

OBSERVACIONES:

FIRMA	
ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL	ING. LEIDY VIVIANA [illegible]
DIRECTOR DE OBRA Ever Jose Salgado Salgado	POR DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO GEBAL

2 de 2

1948

BOGOTÁ

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CODIGO			
FECHA ELABORACION	16 de marzo de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.

CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917558-1	CONTRATO N°	COP-338 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901331342-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		

ITEM	A.2.2	DESCRIPCION	IMPRESIÓN HOJA CARTA A 1X0 TINTAS EN PAPEL BOND 75 GR	UNIDAD	UN	CANTIDAD		TOTAL
								100,00

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO

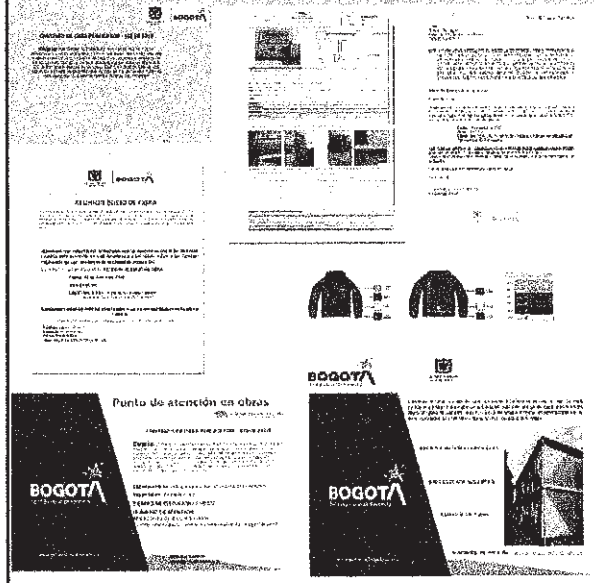

Elemento	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	Cantidad	TOTAL	
IMPRESIONES INFORMES GESTION SOCIAL				100	100	
Total en la presente acta					100,00	

OBSERVACIONES:

FIRMA
ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL
DIRECTOR DE OBRA
Ever Jose Salgado Salgado

FIRMA
INGCELDY AGUIRRE
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GEBAL

1949

BOGOTÁ

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO			
FECHA ELABORACION	16 de marzo de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.

CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917558-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEDAL	NIT. o CC.	901351342-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		

ITEM	1,1	DESCRIPCION	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE SIN PRESTACIONES	UNIDAD	UN	CANTIDAD		TOTAL
								1,00

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO



Elemento	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	Cantidad	TOTAL	
TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE SIN PRESTACIONES				1	1	
Total en la presente acta					1,00	

OBSERVACIONES:

FIRMA
ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL
DIRECTOR DE OBRA
Ever Jose Salgado Salgado

ING. LEIDY ARDILA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GEDAL

4444

1950

BOGOTÁ

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO			
FECHA ELABORACION	16 de marzo de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.

CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917588-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901351342-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		

ITEM	1,04	DESCRIPCION	BOTA CUERO LISA NEGRA SEGURIDAD PUNTERA DE ACERO	UNIDAD	UN	CANTIDAD		TOTAL
								2,00

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO



Elemento	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	Cantidad	TOTAL	
BOTA CUERO LISA NEGRA SEGURIDAD PUNTERA DE ACERO				2	2	
Total en la presente acta					2,00	

OBSERVACIONES:

FIRMA	
ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL	ING. FIDEL AGUIRRE
DIRECTOR DE OBRA Ever Jose Salgado Salgado	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO GEBAL

1951

BOGOTÁ

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO			
FECHA ELABORACION	16 de marzo de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.						
CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917558-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901351342-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		

ITEM	1,06	DESCRIPCION	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON INSERCION EN SILICONA CON CORDEL EN ESTUCHE 25DB	UNIDAD	UN	CANTIDAD		TOTAL
								2,00

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO





Elemento	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	Cantidad	TOTAL	
1.06 PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON INSERCION EN SILICONA CON CORDEL EN ESTUCHE 25DB				2	2	
Total en la presente acta					2,00	

OBSERVACIONES:

FIRMA
ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL
DIRECTOR DE OBRA
Ever Jose Salgado Salgado

INGRID PAGUIRRE
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO GEBAL

446

1953

BOGOTÁ

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO			
FECHA ELABORACION	16 de marzo de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (3) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.

CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC	7917558-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC	901351342-8	CONTRATO N°	COP-323 DE 2019		

ITEM	1,05	DESCRIPCION	BOTA DE CAUCHO, CINTA AMARILLA , PUNTERA Y PLANTILLA EN ACERO	UNIDAD	UN	CANTIDAD		TOTAL
								2,00

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO



Elemento	DIMENSIONES				TOTAL	
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad		
BOTA DE CAUCHO, CINTA AMARILLA , PUNTERA Y PLANTILLA EN ACERO.				2	2	
Total en la presente acta					2,00	

OBSERVACIONES:

FIRMA	
ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL	
DIRECTOR DE OBRA	
Ever Jose Salgado Salgado	
	ING. LEO BARRERA
	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
	CONSORCIO GEBAL

447

BOGOTÁ

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO			
FECHA ELABORACION	16 de marzo de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.

CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917558-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901351342-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		

ITEM	1,07	DESCRIPCION	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA	UNIDAD	UN	CANTIDAD		TOTAL
								1,00

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO



Elemento	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	Cantidad	TOTAL	
1,07 PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA				1	1	
Total en la presente acta					1,00	

OBSERVACIONES:

FIRMA
ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL
DIRECTOR DE OBRA
Ever Jose Salgado Salgado

FIRMA
INGENIERO AGUIRRE
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GEBAL

1955

BOGOTÁ


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CODISO			
FECHA ELABORACION	16 de marzo de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.						
CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7937558-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901351342-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		

ITEM	1,08	DESCRIPCION	MASCARILLA DESECHABLE CONTRA POLVOS Y PARTICULAS NO TOXICAS	UNIDAD	UN	CANTIDAD		TOTAL
								6,00

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO

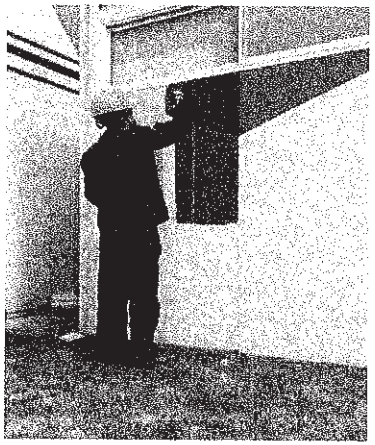

Elemento	DIMENSIONES				TOTAL	
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad		
1,08 MASCARILLA DESECHABLE CONTRA POLVOS Y PARTICULAS NO TOXICAS				6	6	
Total en la presente acta					6,00	

OBSERVACIONES:

FIRMA
ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL
DIRECTOR DE OBRA
Ever Jose Salgado Salgado

FIRMA
INGCEBOY AGUIRRE
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GEBAL

1944

19JC

BOGOTÁ

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO			
FECHA ELABORACION	16 de marzo de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.

CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917358-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901351342-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		

ITEM	1,09	DESCRIPCION	1,09 CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO	UNIDAD	UN	CANTIDAD		TOTAL
								2,00

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO



Elemento	DIMENSIONES				TOTAL	
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad		
1,09 CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO				2	2	
Total en la presente acta					2,00	

OBSERVACIONES:

FIRMA
ARCL. ALFONSO REYES SANMIGUEL
DIRECTOR DE OBRA
Ever Jose Salgado Salgado

FIRMA
INGRID Y AGUIRRE
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GEBAL

420

1957

BOGOTÁ

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO			
FECHA ELABORACION	16 de marzo de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.

CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917558-1	CONTRATO Nº	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901351342-8	CONTRATO Nº	COP-328 DE 2019		

ITEM	1,10	DESCRIPCION	BARBUQUEJO EN REATA CON MENTONERA CON TRES APOYOS PARA CASCO	UNIDAD	UN	CANTIDAD		TOTAL
								2,00

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO



Elemento	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	Cantidad	TOTAL	
1,10 BARBUQUEJO EN REATA CON MENTONERA CON TRES APOYOS PARA CASCO				2	2	
Total en la presente acta					2,00	

OBSERVACIONES:

FIRMA
ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL
DIRECTOR DE OBRA
Ever Jose Salgado Salgado

FIRMA
INGRID DIAZ AGUIRRE
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GEBAL

1958

BOGOTÁ


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO			
FECHA ELABORACION	16 de marzo de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.						
CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7957858-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEDAL	NIT. o CC.	901352342-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		

ITEM	1,11	DESCRIPCION	GAFAS DE SEGURIDAD	UNIDAD	UN	CANTIDAD		TOTAL
								2,00

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO





Elemento	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	Cantidad	TOTAL	
1,11 GAFAS DE SEGURIDAD				2	2	
Total en la presente acta					2,00	

OBSERVACIONES:

FIRMA
ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL
DIRECTOR DE OBRA
Ever Jose Salgado Salgado

FIRMA
CONSORCIO
ING. LEIDY AGUIRRE
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GEDAL

1958

1957

BOGOTÁ

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO			
FECHA ELABORACION	16 de marzo de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.						
CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917558-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901851342-8	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		

ITEM	1,13	DESCRIPCION	OVEROL EN DRILL DOS PIEZAS, CAMISA Y PANTALON	UNIDAD	UN	CANTIDAD		TOTAL
								2,00

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO



Elemento	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	Cantidad	TOTAL	
1,13 OVEROL EN DRILL DOS PIEZAS, CAMISA Y PANTALON				2	2	
Total en la presente acta					2,00	

OBSERVACIONES:

FIRMA
ARQ. ALFONSO REYES SANMIQUEL
DIRECTOR DE OBRA
Ever Jose Salgado Salgado

FIRMA
INGENIERO AGUIRRE
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GEBAL

123

1960

BOGOTÁ

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO			
FECHA ELABORACION	16 de marzo de 2020		
FECHA DE REVISIÓN			
HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.

CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO	NIT. o CC.	7917558-1	CONTRATO N°	COP-328 DE 2019	JARDIN	LA COMETA
INTERVENTORIA	CONSORCIO GEBAL	NIT. o CC.	901351342-0	CONTRATO N°	COP-329 DE 2019		

ITEM	1,17	DESCRIPCION	GUANTE CARNAZA REFORZADO EN CARNAZA LARGO	UNIDAD	UN	CANTIDAD		TOTAL
								2,00

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO



Elemento	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	Cantidad	TOTAL	
1,17 GUANTE CAUCHO NEGRO CORRUGADO CALIBRE 35				2	2	
Total en la presente acta					2,00	

OBSERVACIONES:

FIRMA	
ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL	INGENIERO AGUIRRE
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Ever Jose Salgado Salgado	CONSORCIO GEBAL

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD KENNEDY
FONDO DE DESARROLLO LOCAL

RECIBO A SATISFACCION PERSONA NATURAL No. 2 — PARCIAL X — FINAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	DD	MM	AA		DD	MM	AA
	17	de FEBRERO	de 2020		16	de MARZO	de 2020

CLASE DE CONTRATO OBRA — **No.** 328 — **VIGENCIA** 2019

1. INFORMACION DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO			NIT. No:	7.917.558-1
DIRECCION:	Carrera 52 A # 123 B 10	TELEFONO	703 83 45	CORREO ELECTRONICO	licitaciones@salgado.com.co
CEDENTE (Si hubo cesión escriba el nombre del cesionario)					
NIT O C.C. CONTRATISTA QUE CEDIO EL CONTRATO					

INFORMACION BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA	CLASE DE CUENTA	No. CUENTA
BANCO COMERCIAL AV VILLAS	CORRIENTE	726000136

2. INFORMACION DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA ADECUAR Y/O REPARAR LA ESTRUCTURA FISICA DE CINCO (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGUN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO

FORMA DE PAGO:

El Fondo de Desarrollo Local, pagará el valor del contrato mediante actas parciales hasta completar el Noventa (90%) del valor de la Interventoría, así: A. Hasta el noventa (90%) del valor de interventoría, distribuidos en pagos mensuales. Los pagos serán causados mes vencido y se cancelarán contra el avance financiero y registrado de la consultoría y se cancelarán bajo la condición de haberse cumplido la programación de actividades y la aprobación del informe mensual por parte del supervisor y/o apoyo a la supervisión. B. Un pago equivalente al diez (10%) del valor del contrato de Interventoría se pagará previo cumplimiento de los siguientes requisitos: (i) Recibo a satisfacción de la obra con visto bueno del supervisor y/o apoyo a la supervisión. (ii) Aprobación de la garantía de calidad del servicio. (iii) Liquidación del contrato de obra y el de Interventoría.

VALOR	
VALOR INICIAL	1,359,307,248
ADICIONES	
VALOR ADICION 1	
VALOR ADICION 2	
VALOR ADICION 3	
VALOR ADICION 4	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	1,359,307,248

FECHAS	
FECHA DE INICIO	17/01/2020
TERMINACION INICIAL	16/07/2020
PRORROGAS	
FECHA PRORROGA 1	NA
FECHA PRORROGA 2	NA
FECHA PRORROGA 3	NA
FECHA PRORROGA 4	NA
TERMINACION CON PRORROGA(S)	

EJECUCION EN	No. DE MESES
PLAZO INICIAL	6.0
No. MESES O DIAS PRORROGA 1	
No. MESES O DIAS PRORROGA 2	
No. MESES O DIAS PRORROGA 3	
TOTAL EN MESES O DIAS	6.00

FECHA CESION		FECHA SUSPENSION		FECHA REINICIO	

3. INFORMACION DEL INTERVENTOR, SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISION

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL	SUPERVISOR(A)	VINCULACION	NUMERO Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORIA O SUPERVISION
YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ		FUNCIONARIO DE PLANTA	329-2019

4. CONTROL PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL

BASE NOR. COTIZACION DEL PERIODO A PAGAR		11,133,000
VALOR APORTE A SALUD		1,301,700
VALOR APORTE A PENSION	SI	1,892,700
VALOR APORTE A R.L.		58,200
TOTAL APORTE SEGURIDAD SOCIAL		VER PLANILLAS ANEXAS

Bajo la gravedad de juramento el Contratista con su firma en el informe de actividades certifica que los recibos de pago de aportes a salud, perisión y ARL ,anexos a este documento corresponden a ingresos provenientes del contrato materia de este pago sujeto a Retención en la fuente y Reteica. (ART.23 LEY 1150/2007,RESOLUCION 1195/2009 S.H.D.)

5. CONTROL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO INICIAL	VALOR ANTICIPO POR ADICION	TOTAL ANTICIPO	AMORTIZACION PRESENTE RECIBO A SATISFACCION	SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO
0			0	0

6. CONTROL RETENCION EN GARANTIA

SALDO ANTERIOR	VALOR RETENCION EN ESTA PRESENTE CORTE	ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA
	-	

7. INFORMACION PARA EL PAGO

ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES PAGO PARCIAL Y/O FINAL	
VALOR TOTAL CONTRATADO	1,359,307,248
ACUMULADO CORTES PARCIALES	
SALDO POR EJECUTAR	1,359,307,248
PAGO PARCIAL PRESENTE CORTE (SUB-TOTAL ANTES DE IVA)	139,323,092
IVA	
SUB-TOTAL PAGO PARCIAL	139,323,092
MENOS: AMORTIZACION ANTICIPO	-
MENOS: RETENCION EN GARANTIA	-
MENOS: OTROS DESCUENTOS	-
NETO A PAGAR PRESENTE CORTE	139,323,092

INFORMACION PRESUPUESTAL

No. REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR REGISTRO PRTAL	GIROS (DETALLE GIROS) ACUMULADO ANTERIOR	VR. A AFECTAR EN ESTE CORTE	ACUMULADO GIROS	SALDO REGISTRO PRTAL
1044	6-nov.-19	1,359,307,248	173,404,261	139,323,092	312,727,353	1,046,579,895
					-	-
					-	-
					-	-
	TOTALES	1,359,307,248	173,404,261	139,323,092	312,727,353	1,046,579,895

SON (VALOR EN LETRAS DEL NETO A PAGAR): CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE Y TRES MIL NOVENTA Y DOS PESOS

1925

PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE CORTE	10.25%

PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL INCLUIDO ESTE CORTE	23.01%

8. RESUMEN PAGOS REALIZADOS A LA FECHA (POR EL CONTRATO)

No	FECHA	CONCEPTO	VALOR
1	16-03-20	1er recibo parcial	173,404,261
2		2do recibo parcial	139,323,092
3		3er recibo parcial	
4		4to recibo parcial	
5		5to recibo parcial	
6		6to recibo parcial	
7		7mo recibo parcial	
8		8vo recibo parcial	
9		9no recibo parcial	
10		10mo recibo parcial	
11		11mo recibo parcial	
12		12mo recibo parcial	
13		13ro recibo parcial	
14		14to recibo parcial	
15		15to recibo parcial	
16		16to recibo parcial	
17		17mo recibo parcial	
18		18vo recibo parcial	
19		19no recibo parcial	
20		20mo recibo parcial	
21		21ro recibo parcial	
22		22do recibo parcial	
23		23ro recibo parcial	
24		24to recibo parcial	
VALOR EJECUTADO ACUMULADO			312,727,353
NUEVO SALDO POR EJECUTAR			1,046,579,895

VALIDACION DE SALDOS

SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL	1,046,579,895
+ (MAS): SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO	0
(-) MENOS: SALDO ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA	
SALDO POR EJECUTAR	1,046,579,895

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE	10.25%
PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA ACUMULADO	23.01%

9. INFORMACION DEL PROYECTO

No.PROYECTO	No. DE UPZ	TIPO DE POBLACIÓN BENEFICIADA		CANTIDAD POBLACION BENEFICIADA		
		DIRECTA	INDIRECTA	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	TOTAL
03-03-01-15-01-02-1365-00				-		-
				-		-
				TOTAL -	-	-

10. POLIZAS

CLASE	No.	%	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	3000244	30.00%	$ 407,792,174.00	17 de enero de 2020	17 de enero de 2021
ANTICIPO		0%			
PRESTACIONES SOCIALES	3000244	10.00%	$ 135,930,725.00	8 de enero de 2020	8 de noviembre de 2023
RESPONSABILIDAD CIVIL	1000093	100.00%	$ 263,340,900.00	17 de enero de 2020	17 de enero de 2021
CALIDAD		0.00%	$ -		
ESTABILIDAD	3000244	10.00%	$ 135,930,725.00	8 de enero de 2020	8 de noviembre de 2026

En Bogotá D.C, el 16-abr.-20 YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ recibe a satisfaccion el informe presentado por el contratista con el fin de gestionar el pago DOS (1)

en cumplimiento de la Cláusula QUINTA del contrato OBRA 28 de 2019

CERTIFICANDO que se cumplió con el objeto del contrato, las obligaciones establecidas, el plazo previsto y el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social [illegible] y Pensión [illegible] de acuerdo con los documentos presentados por el contratista y anexos al presente documento.

YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ
SUPERVISOR

Vo.Bo. Profesional de Planeación
Nombre
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Vo.Bo. AUTORIZACION GIRO

YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ
ALCALDE LOCAL

1963

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Natural)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista EVER JOSE SALGADO SALGADO sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los términos contratados y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se autoriza el pago correspondiente al:

Periodo comprendido entre el 17 de febrero de 2020 y el 16 de marzo de 2020

Contrato:	No. COP-328 de 2019
Tipo de Contrato:	Contrato de Obra Pública
Contratista:	Ever José Salgado Salgado
Cédula o NIT	No. 7.917.558
Objeto:	Contratar mediante el sistema de precios fijos unitarios y a monto agotable las actividades para adecuar y/o reparar la estructura física de cinco (5) jardines infantiles de la Secretaria Distrital de Integración Social para la atención de la primera infancia en la localidad de Kennedy, según los estudios previos, anexo técnico, pliego de condiciones y demás documentos que hacen parte integral del proceso.
Plazo del contrato:	6 MESES
Fecha iniciación:	17 de Enero de 2020
Fecha de terminación:	16 de Julio de 2020
Prórroga(s)	N/A
Valor inicial pactado:	$ 1.359.307.248
Valor adicional:	N/A
Valor a pagar:	$ 139.323.092 (No. de pago: 2)
Numero de PIN:	NA
Periodo cotizado.	17 de febrero de 2020 y el 16 de marzo de 2020

Se verificó el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales relativos a SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y ARL (Administradora de riesgos laborales) y al Sistema de Seguridad Social Integral) por parte del contratista, de conformidad con el Parágrafo 1 del Art. 23 la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.

En constancia se firma a los 16 días del mes de Junio de dos mil veinte (2020).

Interventor o Supervisor,

LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ
C.C. No. 1.022.347.445 de Bogotá

YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ
C.C. No. 1.026.269.831 de Bogotá

196

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY

HOJA DE RUTA PARA REPROGRAMACION DE PAC Y PAGO

No Radicación: 507 Fecha: 16 de abril de 2020 Clase de contrato: Obra

No. de Pago: 0 2 de marzo 16 de 2020 Contrato No. COP-328 de 2019

Nombre del Contratista: Ever José Salgado Salgado

ACTIVIDAD	TRAMITE			
	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA TRAMITE	FECHA DE RECIBIDO	FECHA DE SALIDA
RECIBIR Y REVISAR LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA: ➢ Carta dirigida al supervisor del contrato ➢ Informe de gestión o avance ➢ Factura o documento equivalente ➢ Certificación de aporte de pagos parafiscales y seguridad social ➢ Y los demás requisitos pactados	Supervisor o interventor	CONSORCIO GEBAL LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ	20/04/2020	23/04/2020
ELABORA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	Supervisor o interventor	CONSORCIO GEBAL LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ	20/04/2020	23/04/2020
RECIBIR Y REVISAR LOS DOCUMENTOS SOPORTES PARA REPROGRAMACIÓN DEL PAC Y PAGO REALIZAR CONSOLIDACIÓN	Coordinador(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	MARIA DEL PILAR MUÑOZ		
RECIBIR Y REVISAR DOCUMENTOS ➢ Acta de recibo parcial y/o certificación de cumplimiento o de Liquidación ➢ Factura o documento equivalente ➢ Elabora Cálculo de impuestos RELIZAR CAUSACIÓN	Profesional con funciones de Contador	LUZ MYRIAM ORTEGA WALTEROS		
EFECTUAR LA REPROGRAMACION DEL PAC Y REGISTRAR PARA PAGO EN EL APLICATIVO. ➢ Recibe y verifica el listado de los documentos ➢ Reprograma PAC ➢ Elabora y aprueba Orden de Pago ➢ Revisa y valida Planilla ➢ Firma digital	Profesional con funciones de Presupuesto	ANDREA CASAS DURAN		
➢ Revisa Planilla ➢ Firma digital	Alcalde(sa) Local EDIS	YEIMY CA[illegible]A AGUDELO HERNANDEZ		
Recibe y archiva en el **Expediente Único** los documentos soporte del pago	Profesional con funciones de abogado del FDL	JOHN PEN[illegible]GOS		

Observaciones o Aclaraciones:

1963

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

GESTIÓN CORPORATIVA
GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL
ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY

FORMATO CÁLCULO DE IMPUESTOS

CONTRATO No. ___CPS 22019328 **FECHA: 10/07/2020**
CONTRATISTA : EVER JOSE SALGADO SALGADO **NIT. o C.C. 7.917.558**
PERIODO: _17 DE FEBRERO_DEL ___2020___ **AL 16 DE MARZO 2020**
PAGO No._2____ DOCUMENTO 171

PAGO	CODIGO	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	**1-7-05-05**	**139.323.092,00**		**139.323.092,00**
RETEFUENTE HONORARIOS	**2-4-36-03**	**0,00**	**6,00%**	**0,00**
RETEFUENTE SERVICIOS	**2-4-36-05**	**0,00**	**6,00%**	**0,00**
RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS		**0,00**	**0,00%**	**0,00**
RETEFUENTE COMPRAS		**0,00**	**2,50%**	**0,00**
RETEFUENTE - C.O.P.	**2-4-36-26**	**139.323.092,00**	**2,00%**	**2.786.462,00**
RETEFUENTE	**2-4-36-15-02**	**0,00**	**0,69%**	**0,00**
RETEIVA	**2-4-36-25**	**0,00**	**15,00%**	**0,00**
RETEICA	**2-4-36-27**	**139.323.092,00**	**0,690%**	**961.329,00**
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	**2-4-36-90-04**	**139.323.092,00**	**5,00%**	**6.966.155,00**
AMORTIZACIÓN ANTICIPOS				**0,00**
OTROS AJUSTES DE RETENCIÓN				**0,00**
ESTAMPILLA UNIV. PEDAGOGICA	**2-4-36-90-06**	**139.323.092,00**	**0,50%**	**696.615,00**
TOTAL DESCUENTOS				**11.410.561,00**
NETO A PAGAR	**2-4-01-02**			**127.912.531,00**

Contador F.D.L

Responsable de Presupuesto F.D.L.

OBSERVACIONES Y/O NOTAS: parques

1365 → obligaciones

LOS PAGOS SE ESTAN REALIZANDO CON DOCUMENTOS IMPRESOS DE PDF DE ACUERDO A LAS ORIENTACIONES GENERALES DE TRABAJO EN CASA Y DE CONTINUIDAD DE PROCESOS MISIONALES EN LAS ALCALDÍAS LOCALES DE BOGOTÁ D.C. EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA CAUSADA POR EL COVID-19 ENVIADAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOCAL- DIRECCION PARA LA GESTION DEL DESARROLLO LOCAL NUMRAL 2.3.2. PROCEDIMIENTO DE PAGO DE OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR LA ALCALDÍAS LOCALES A PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS. DE CONFORMIDAD CON LOS DECRETOS 417, 418, 419, 420, 435, 439,440, 441,457,458,460,461 DE 2020 DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA; EL DECRETO 081 084,090 091,093 DE 2020 DE LA ALCALIDA MAYOR DE BOGOTA; Y LA CIRCULAR 07,024, DE 2020 DE LA SECRETARIA DE GOBIENO; RESOLUCION 401 DE 2020 DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO

BASE PARA PAGO DE SALUD, PENSIÓN Y ARL	0,00
APORTE OBLIGATORIO PARA SALUD 12,5%	0,00
APORTE OBLIGATORIO PARA PENSIÓN 16%	0,00
APORTE OBLIGATORIO ARL	0,00
TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN	0,00

1961

FUENTES

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

ORDEN DE PAGO

No. : 1639

Usuario Dilig. : ACASAS
Fecha de Impresión 13-07-2020
Estado 111111010

Entidad:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY						
Código:	008	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JULIO 10 de 2020	Consec.Ent	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	EVER JOSE SALGADO SALGADO				Régimen	
Dirección:	CR 20 18 23			Teléfono y Fax	7038345	
C.C o NIT:	7917558	Banco/Sucursal	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S A	Cuenta No/Clase	726000136	C

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA	No.:	2019328	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor		YEIMY CAROLINA AGUDELO	

Detalle

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA ADECUAR Y/O REPARAR LA ESTRUCTURA FISICA DE CINCO (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO. REMPLAZA CDP NUMERO 1044 Y CRP 1158. OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIA 2019

Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-3-6-15-01-02-1365-000	01	102	$139,323,092.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
760	3.3.6.15.01.02.1365.000	826	Fortalecimiento pedagógico y estructural a jardines infantiles y prevención de violencia infantil y promoción del buen trato	$139,323,092.00

Fuente
01 Recursos del Distrito

Detalle
102 Recursos del Balance FDL

VR BRUTO: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL NOVENTA Y DOS PESOS — $139,323,092.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			1-9-08-01-01	$139,323,092.00
RETEFUENTE CONTRATO DE OBR	2	$139,323,092.00	2-4-36-25	$2,786,462.00
RETEICA 6.9 X MIL	.69	$139,323,092.00	2-4-36-27	$961,329.00
CONTRIBUCION ESPECIAL	5	$139,323,092.00	2-4-36-90-010	$6,966,155.00
ESTAMPILLA UNIV. PEDAGOGICA	.5	$139,323,092.00	2-4-36-90-009	$696,615.00

TOTAL DESCUENTOS: $11,410,561.00

VALOR NETO a Girar: CIENTO VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS — **$127,912,531.00**

Código Contable: 2-4-01-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
	Nombre
	Cédula / Firma

Ordenador del Gasto

Firmado Digitalmente por:
Yeimy Carolina Agudelo Hernandez
Viernes, Julio 10 de 2020 04:36 PM
Planilla No.123

Responsable Presupuesto

Firmado Digitalmente por:
Andrea Casas Duran
Viernes, Julio 10 de 2020 02:23 PM
Planilla No.123
