ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
TRANSMILENIO S.A.

CONTRATO 1380 DE 2025 - REALIZAR LA ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA FORTALECER EL SISTEMA, MEJORAR LA EXPERIENCIA DEL USUARIO Y RENOVAR SUS CONDICIONES FÍSICAS, LAS CUALES SE REALIZARÁN SOBRE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO -TRANSMILENIO S.A. LOTE 1

INFORME EJECUTIVO MENSUAL No 02

PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONSORCIO MYE BOGOTÁ


OCTUBRE 01 DE 2025

Versión 1



CONTROL DE REVISIONES Y CAMBIOS

VERSIÓN N°.	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FOLIOS
0	01/10/2025	VERSION INICIAL	24

EMPRESA CONTRATISTA

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
		
ING. VILMA ZARATE	ARQ. ANGELICA SIERRA	ARQ. ANGELICA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA	**DIRECTORA DE OBRA**	**DIRECTORA DE OBRA**

EMPRESA INTERVENTORA

Revisado por:	Aprobado por:
	
ING. SEBASTIAN BETANCOURT	ARQ. EDUARDO ANDRES ACERO CAJIGAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACIÓN LEGAL DE LOS CONTRATOS DE CONTRATISTA E INTERVENTORÍA 5
1.1. Datos Generales, Fecha de Suscripción, Legalización, Iniciación y Terminación 5
1.2. Valor Inicial del Contrato y Adiciones 6
1.3. Garantías, Certificados de Modificación y Vigencias. 6
2. ASPECTOS TECNICOS 7
2.1. Actividades Realizadas Durante el Periodo 7
2.1.1. MET 02 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICIÓN EN ESTACIONES 8
2.1.2. MET 03 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO TIPO ONDA .10
2.1.3. MET 05 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA EN CERRAMIENTO PARA DIVISION OPERATIVA DE PLATAFORMAS DE PORTALES 11
2.1.4. MET 06 - SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CERRAMIENTO PARA DIVISION OPERATIVA DE PLATAFORMAS DE PORTALES .12
2.1.5. MET 08 - SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CERRAMIENTO PARA DIVISION OPERATIVA DE PLATAFORMAS DE PORTALES .13
2.2. Componente de Calidad 14
2.2.1. Inspección de Calidad de los Elementos Durante el Periodo 14
3. RESUMEN EJECUTIVO AREA SST 19
3.1. Personal del proyecto 19
3.1.1. Personal SST 19
3.1.2. Personal de Plantilla Mínima y administración 20
3.2. Gestión SST Durante el Periodo 20
4. RESUMEN EJECUTIVO AREA AMBIENTAL 21
5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GENERAL 23
6. VALIDACION DE INFORME CONSORCIO MYE BOGOTA 24

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Datos Generales 5
Tabla 2. Valor del Contrato 6
Tabla 3. Garantías del contrato. 6
Tabla 4. Actividades Realizadas durante el Periodo .....**¡Error! Marcador no definido.**

CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

Tabla 5. Personal Calidad y SST.....**¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 6. Personal Profesionales y Plantilla Mínima .....**¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 7. Ejecución presupuestal general del contrato 23

INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Verificación de medidas en celosías MET -02 15
Ilustración 2. Montaje de celosía en matriz MET 05 17
Ilustración 3. Verificación medidas, después de resoldada la celosía MET 05 17
Ilustración 4. Alineación y Nivelación de Collarines para MET 05 y MET 06.....17
Ilustración 5. Mediciones de espesor de pintura en elementos Metálicos en taller 18
Ilustración 6. Mediciones de espesor de pintura en elementos Metálicos en obra.....18
Ilustración 7. Indicadores SGSST.....21
Ilustración 8. Ejecución Presupuestal por troncal 24

CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

1. INFORMACIÓN LEGAL DE LOS CONTRATOS DE CONTRATISTA E INTERVENTORÍA

1.1. Datos Generales, Fecha de Suscripción, Legalización, Iniciación y Terminación

Tabla 1. *Datos Generales*

INFORMACIÓN	CONSULTOR		INTERVENTOR	
No. DEL CONTRATO	***1380-2025***		***1369 - 2025***	
OBJETO	REALIZAR LA ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA FORTALECER EL SISTEMA, MEJORAR LA EXPERIENCIA DEL USUARIO Y RENOVAR SUS CONDICIONES FÍSICAS, LAS CUALES SE REALIZARÁN SOBRE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO -TRANSMILENIO S.A. LOTE 1		REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA) DE LOS CONTRATOS RESULTANTES DE LA RESPECTIVA LICITACIÓN (LOTE 1 Y LOTE 2), CUYO OBJETO ES: REALIZAR LA ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA FORTALECER EL SISTEMA, MEJORAR LA EXPERIENCIA DEL USUARIO Y RENOVAR SUS CONDICIONES FÍSICAS, LAS CUALES SE REALIZARÁN SOBRE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A. .	
CONTRATISTA CONFORMACIÓN CONSORCIO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	**CONSORCIO MYE BOGOTA**	**Participación**	**CONSORCIO ALIANZA XXI**	**Participación**
	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS EFRS S.A.S	45.00%	DAIMCO S.A.S	99.90%
	MR GROUP COL S.A.S	45.00%	DIBENEM S.A.S	0.10%
	COLPETROLEUM SERVICES S.A.S	10.00%		
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCIÓN		EN EJECUCIÓN	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	19 DE JUNIO DE 2025		16 DE JUNIO DE 2025	
FECHA DE INICIO:	21 DE JULIO DE 2025		21 DE JULIO DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	**20 DE MAYO DE 2026**		**20 DE MAYO DE 2026**	

CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

1.2. Valor Inicial del Contrato y Adiciones

Tabla 2. *Valor del Contrato*

CONSULTORÍA	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$13,750,000,000.00 COP
VALOR ADICIONES	*No Aplica*
VALOR TOTAL CONTRACTUAL DEL CONTRATO	$13,750,000,000.00 COP

1.3. Garantías, Certificados de Modificación y Vigencias.

Tabla 3. *Garantías del contrato.*

Compañía de Seguros	Póliza No.	Causa de la Modificación (indicar documento soporte)	Amparo	Vigencia		Valor Asegurado
				Desde	Hasta	
SEGUROS MUNDIAL	**BCH-100044568** De Cumplimiento	Emisión de Pólizas de garantía al contrato 1380-2025	*Cumplimiento del Contrato*	21/07/2025	21/11/2026	$4,125,000,000.00
			Prestaciones Sociales e Indemnizaciones	21/07/2025	21/05/2029	$1,375,000,000.00
			Estabilidad de la obra	21/05/2026	21/05/2031	$4,125,000,000.00
	BCH-100009725 Responsabilidad Civil Extracontractual derivada de cumplimiento		*Amparo básico*	21/07/2025	21/05/2026	$685,500,000.00
			Contratistas y subcontratistas	21/07/2025	21/05/2026	$685,500,000.00
			Vehículos propios y no propios	21/07/2025	21/05/2026	$685,500,000.00
			Patronal	21/07/2025	21/05/2026	$685,500,000.00
			R.C. Cruzada	21/07/2025	21/05/2026	$685,500,000.00

CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

2. ASPECTOS TECNICOS

2.1. Actividades Realizadas Durante el Periodo

Durante este periodo se realizó la intervención de las siguientes estaciones:

Tabla 4. *Actividades Realizadas durante el Periodo*

N° DE ORDEN DE TRABAJO	TRONCAL	ESTACIÓN	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1380-L1-001	CALLE 26	CORFERIAS	MET-03 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO TIPO ONDA	SE EJECUTA LA ACTIVIDAD TOTAL DURANTE EL PERIODO
1380-L1-002	CALLE 26	CIUDAD UNIVERSITARIA	MET-03 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO TIPO ONDA	SE EJECUTA LA ACTIVIDAD TOTAL DURANTE EL PERIODO
1380-L1-005	NORTE	CALLE 146	MET-02 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA METALICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICION EN ESTACIONES	SE EJECUTA LA ACTIVIDAD TOTAL DURANTE EL PERIODO
1380-L1-006	NORTE	MAZURÉN	MET-02 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA METALICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICION EN ESTACIONES	SE EJECUTA LA ACTIVIDAD TOTAL DURANTE EL PERIODO
1380-L1-007	NORTE	CALLE 161	MET-02 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA METALICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICION EN ESTACIONES	SE EJECUTA LA ACTIVIDAD TOTAL DURANTE EL PERIODO
1380-L1-008	NORTE	TOBERIN	MET-02 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA METALICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICION EN ESTACIONES	SE EJECUTA LA ACTIVIDAD TOTAL DURANTE EL PERIODO
1380-L1-011	NORTE	MAZURÉN	MET-08 - CAMBIO DE MODULACIÓN DE VAGÓN ARTICULADO A BIARTICULADO EN UN VAGÓN SENCILLO INCLUYE ESTRUCTURA DE APROXIMACIÓN CINTAS Y CELOSÍAS NECESARIAS	SE EJECUTA LA ACTIVIDAD TOTAL DURANTE EL PERIODO
1380-L1-012	NORTE	CALLE 146	MET-08 - CAMBIO DE MODULACIÓN DE VAGÓN ARTICULADO A BIARTICULADO EN UN VAGÓN SENCILLO INCLUYE ESTRUCTURA DE APROXIMACIÓN CINTAS Y CELOSÍAS NECESARIAS	SE EJECUTA LA ACTIVIDAD TOTAL DURANTE EL PERIODO

CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

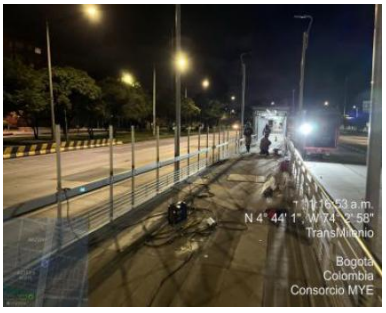
N° DE ORDEN DE TRABAJO	TRONCAL	ESTACIÓN	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1380-L1-013	NORTE	CALLE 161	MET-08 - CAMBIO DE MODULACIÓN DE VAGÓN ARTICULADO A BIARTICULADO EN UN VAGÓN SENCILLO INCLUYE ESTRUCTURA DE APROXIMACIÓN CINTAS Y CELOSÍAS NECESARIAS	SE EJECUTA LA ACTIVIDAD TOTAL DURANTE EL PERIODO
1380-L1-014	AMERICAS	PORTAL AMERICAS	MET-05 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA EN CERRAMIENTO PARA DIVISION OPERATIVA DE PLATAFORMAS DE PORTALES	SE EJECUTA LA ACTIVIDAD TOTAL DURANTE EL PERIODO
1380-L1-015	AMERICAS	PORTAL AMERICAS	MET-06 - SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CERRAMIENTO PARA DIVISION OPERATIVA DE PLATAFORMAS DE PORTALES	SE EJECUTA LA ACTIVIDAD TOTAL DURANTE EL PERIODO
1380-L1-016	AMERICAS	PORTAL AMERICAS	MET-05 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA EN CERRAMIENTO PARA DIVISION OPERATIVA DE PLATAFORMAS DE PORTALES	ORDEN ACTIVA
1380-L1-017	AMERICAS	PORTAL AMERICAS	MET-06 - SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CERRAMIENTO PARA DIVISION OPERATIVA DE PLATAFORMAS DE PORTALES	ORDEN ACTIVA
1380-L1-018	NQS SUR	PERDOMO	MET-03 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO TIPO ONDA	SE EJECUTA LA ACTIVIDAD TOTAL DURANTE EL PERIODO

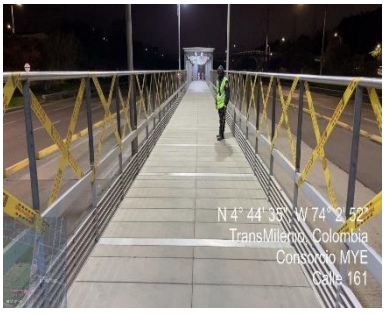
2.1.1. MET 02 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICIÓN EN ESTACIONES

Dentro de las actividades desarrolladas en el periodo se, iniciaron y terminaron al 100% las estaciones CALLE 146, MAZUREN, CALLE 161, TOBERIN, como se muestra a continuación:

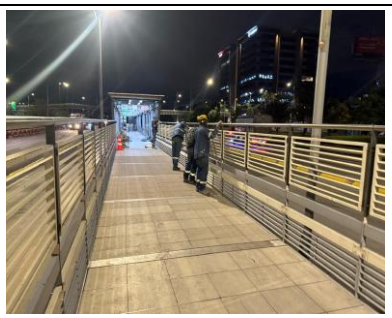
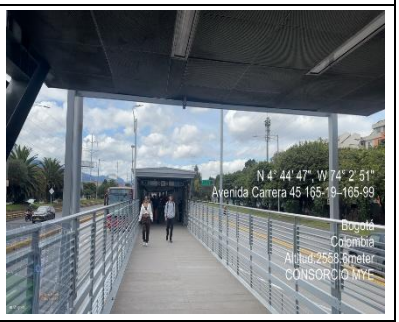
CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

TRONCAL	ESTACION	DESCRIPCION
NORTE	CALLE 146	OT-1380-L1-005 MET 02 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICIÓN EN ESTACIONES
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		

TRONCAL	ESTACION	DESCRIPCION
NORTE	MAZUREN	OT-1380-L1-006 MET 02 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICIÓN EN ESTACIONES
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		

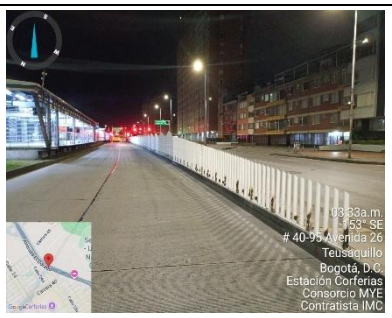
TRONCAL	ESTACION	DESCRIPCION
NORTE	CALLE 161	OT-1380-L1-007 MET 02 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICIÓN EN ESTACIONES
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		

CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

TRONCAL	ESTACION	DESCRIPCION
NORTE	TOBERIN	OT-1380-L1-008 MET 02 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICIÓN EN ESTACIONES
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		

2.1.2. MET 03 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO TIPO ONDA

Dentro de las actividades desarrolladas en el periodo se, iniciaron y terminaron al 100% las estaciones CORFERIAS, CIUDAD UNIVERSITARIA Y PERDOMO, como se muestra a continuación:

TRONCAL	ESTACION	DESCRIPCION
CALLE 26	CORFERIAS	OT-1380-L1-001 MET 03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO TIPO ONDA
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		

CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

TRONCAL	ESTACION	DESCRIPCION
CALLE 26	CIUDAD UNIVERSITARIA	OT-1380-L1-002 MET 03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO TIPO ONDA
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		

TRONCAL	ESTACION	DESCRIPCION
NQS SUR	PERDOMO	OT-1380-L1-018 MET 03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO TIPO ONDA
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		

2.1.3. MET 05 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA EN CERRAMIENTO PARA DIVISION OPERATIVA DE PLATAFORMAS DE PORTALES

Dentro de las actividades desarrolladas en el periodo se, iniciaron y terminaron al 100% en el PORTAL AMERICAS PLATAFORMA 3, como se muestra a continuación:

CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

TRONCAL	ESTACION	DESCRIPCION
AMERICAS	PORTAL AMERICAS	OT-1380-L1-014 MET 05 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA EN CERRAMIENTO PARA DIVISION OPERATIVA DE PLATAFORMAS DE PORTALES
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		

2.1.4. MET 06 - SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CERRAMIENTO PARA DIVISION OPERATIVA DE PLATAFORMAS DE PORTALES

Dentro de las actividades desarrolladas en el periodo se, iniciaron y terminaron al 100% en el PORTAL AMERICAS PLATAFORMA 3, como se muestra a continuación:

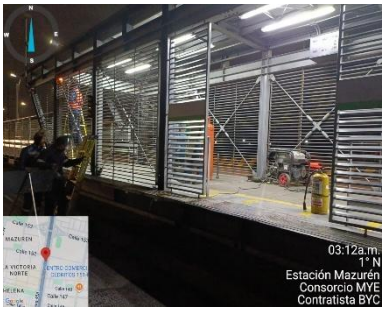
TRONCAL	ESTACION	DESCRIPCION
AMERICAS	PORTAL AMERICAS	OT-1380-L1-015 MET 06 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CERRAMIENTO PARA DIVISION OPERATIVA DE PLATAFORMAS DE PORTALES
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		

CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

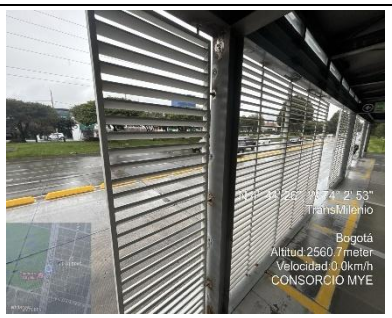
2.1.5. MET 08 - SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CERRAMIENTO PARA DIVISION OPERATIVA DE PLATAFORMAS DE PORTALES

Dentro de las actividades desarrolladas en el periodo se, iniciaron y terminaron al 100% las estaciones CALLE 146, MAZUREN, CALLE 161, como se muestra a continuación:

TRONCAL	ESTACION	DESCRIPCION
NORTE	CALLE 146	OT-1380-L1-011 MET 08 CAMBIO DE MODULACIÓN DE VAGON ARTICULADO A BIARTICULADO EN UN VAGON SENCILLO INCLUYE ESTRUCTURA DE APROXIMACIÓN CINTAS Y CELOSIAS NECESARIAS
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		

TRONCAL	ESTACION	DESCRIPCION
NORTE	MAZUREN	OT-1380-L1-012 MET 08 CAMBIO DE MODULACIÓN DE VAGON ARTICULADO A BIARTICULADO EN UN VAGON SENCILLO INCLUYE ESTRUCTURA DE APROXIMACIÓN CINTAS Y CELOSIAS NECESARIAS
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		

CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

TRONCAL	ESTACION	DESCRIPCION
NORTE	CALLE 161	OT-1380-L1-013 MET 08 CAMBIO DE MODULACIÓN DE VAGON ARTICULADO A BIARTICULADO EN UN VAGON SENCILLO INCLUYE ESTRUCTURA DE APROXIMACIÓN CINTAS Y CELOSIAS NECESARIAS
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		

2.2. Componente de Calidad

De acuerdo a plan de Inspección y Calidad presentado a interventoría, tomamos los registros correspondientes a los ítems de las actividades ejecutadas en el mes.

2.2.1. Inspección de Calidad de los Elementos Durante el Periodo

Dentro de las actividades desarrolladas en el periodo, se siguen los lineamentos presentados en el plan de inspección y calidad presentado, y haciendo pruebas en taller y en la ejecución de las actividades, haciendo el respectivo seguimiento a diario de los avances de obra.

Para el caso particular de todos los ítems ejecutados en el periodo, se siguieron tres aspectos de control de calidad:

1. Verificación visual, en donde se debe validar que cada uno de los cordones de soldadura de la reja en celosía este correctamente soldada y sobre todo que no falte ningún cordón en las diferentes uniones del elemento.

2. Valida la dimensionalidad de los elementos fabricados, se valida la ortogonalidad de las celosías, en donde, se toman las medidas longitudinales y transversales las cuales deben coincidir en cada sentido, luego se debe tomar la medida de las dos diagonales, las cuales deben coincidir y de tal manera certificar que el elemento cumple dimensionalmente.

3. Medición del espesor en la pintura aplicada sobre los elementos metálicos, e inmediatamente después de secado se hace la verificación de los espesores mínimos

CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

permitidos según lo definido en el Plan de inspección de calidad y la normativa establecida vigente.

A continuación, se comparte la evidencia fotográfica de la muestra y el consolidado de la toma de las lecturas realizadas.

Ilustración 1. *Verificación de medidas en celosías MET -02*

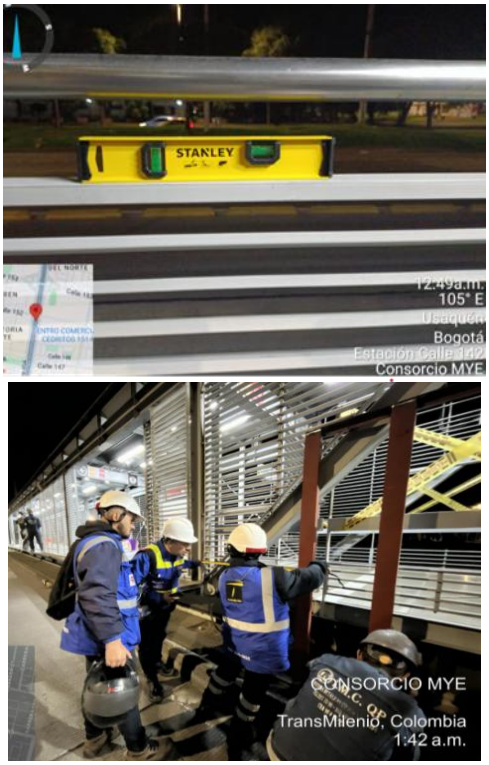




Ilustración 3. *Verificación de medidas, plomos y niveles en MET 03 en obra*





CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.







Para el caso particular del MET-05: Se realiza visita técnica a la planta de B&C, proveedor nuestro, el día 5 de septiembre del año en curso, en donde se revisó y valido el proceso constructivo para la fabricación de los diferentes tipos de celosías y el paso a paso de la ejecución de la actividad

CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

Ilustración 2. *Montaje de celosía en matriz MET 05*





Ilustración 3. Verificación medidas, después de resoldada la celosía MET 05

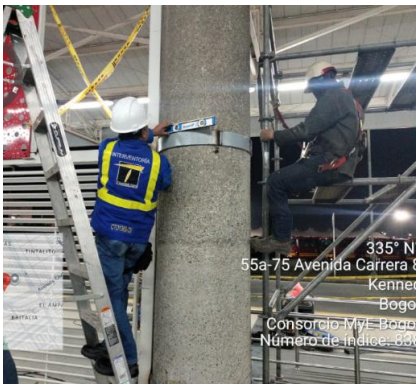






Con respecto a los Ítem del MET 05 y MET 06, actividades simultaneas y paralelas, se realizan las siguientes validaciones en obra:

Ilustración 4. *Alineación y Nivelación de Collarines para MET 05 y MET 06*







CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

Ilustración 5. *Mediciones de espesor de pintura en elementos Metálicos en taller*













Ilustración 6. Mediciones de espesor de pintura en elementos Metálicos en obra





Como conclusión se valida que los espesores de pintura requeridos de acuerdo a la especificación cumplen.

CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

Por otra parte, para validar el cumplimiento del Plan de Inspección y Calidad, se presentan en el informe mensual, los registros correspondientes de las fichas técnicas y de los certificados de calidad, de los materiales o insumos con los cuales se desarrollan las ordenes de trabajo asignadas al proyecto, de acuerdo a la siguiente tabla:

4.3.13 Certificados de calidad de los materiales Y fichas tecnicas:		
AACERO	BARRA DE ACEROC ORRUGADO DE 1/2"	
TUBERIAS	TUBO COLD ROLLED 50 (50X15X1,5 MM).	LA CAMPANA
	TUBO ESTRUCTURAL HR 50 (50X25X1,5MM).	LA CAMPANA
	PLATINAS DE 3/16".	250115Z01053
	PLATINAS DE 7/16"x2".	76960
	TUBO A.N. 2 1/2".	
	PEH1.4SUP 160.60	
	TUBO REDONDO 2	LA CAMPANA
	TUBO A.N. 2 1/2".	LA CAMPANA
	TUBO CERRAMIENTO NEGRO 2 CAL 0,59 10X10	COLMENA
	TUBO CR RECTANGULAR 2X1X6	AGOFER
	TUBO CR RECTANGULAR 3 X 1.12	AGOFER
PINTURA	SUPER EPOXI IMPRIMANTE FOSFATO DE ZINC	PRIME EXCELENCIA EN PINTURAS
	AUTOIMPRIMANTE FOSFATO DE ZINC	PRIME EXCELENCIA EN PINTURAS
	PINTURA	PRIME EXCELENCIA EN PINTURAS
	AJUSTADOR 21-06	SIGMAFAST 278
LAMINAS	LAMINA GALVANIZADA CAL 18.	
	LAMINA ALFAJOR	3.00 X1.00 X 3
	LAMINA ALFAJOR	3.00 X1.20 X 3
SOLDADURA	SOLDADURA 6010	WEST ARCO
	SOLDADURA 7018	

3. RESUMEN EJECUTIVO AREA SST

El Consorcio MYE implementa el Sistema de Gestión de SST (SG-SST) conforme a la normatividad legal y contractual, priorizando la prevención de riesgos laborales, la protección de los trabajadores y la garantía de entornos seguros, dando cumplimiento al 812% el plan de trabajo del SGSST.

3.1. Personal del proyecto

El equipo cuenta con ingenieros de SST, ambientales, inspectores, residentes de obra y personal administrativo, con organigrama y estructura definida para la ejecución del contrato.

3.1.1. Personal SST

CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

Tabla 5. Personal Calidad y SST

PROFESIONAL	CARGO
Oscar Ciendua Torres	Ing. de Calidad Y SST – interventoría
Catherine Duque Botero	Ing. de Calidad Y SST
Miguel Ángel Briceño Velosa	Ing. de Calidad Y SST
Carlos Javier Mancilla Banguera	Inspector Calidad Y SST
Tatiana Rocío Ricardo Torres	Inspector Calidad Y SST

3.1.2. Personal de Plantilla Mínima y administración

Tabla 6. Personal Profesionales y Plantilla Mínima

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO
1	Daniel Antonio Ávila Navarro	1.020.795.956	Coordinador De Proyecto - Apoyo
2	Jeny Angelica Sierra Mayorga	52.027.642	Director De Proyecto
3	Vilma Zulay Zarate Pérez	68.298.776	Residente De Obra
4	Edward Fabian Martínez Palomino	1.019.104.383	Residente De Obra
5	Miguel Ángel Briceño Velosa	80.029.706	Ing. Calidad SST
6	Katherine Duque Botero	52.849.283	Ing. Calidad SST
7	Jorge Eduardo Rodríguez Martínez	1.032.362.166	Ing. Ambiental
8	Jennifer Astrid Capera Sánchez	1.136.880.609	Ing. Ambiental
9	Carlos Javier Mancilla Banguera	1.085.545.560	Inspector De Calidad Y SST
10	Tatiana Rocio Ricardo Torres	1067845626	Inspector De Calidad y SST
11	Liseth Katherine Márquez Ochoa	1.030.599.549	Inspector Ambiental
12	Robert Andrés Torres Rojas	1.024.501.619	Inspector De Obra
13	Sergio Hernán Mateus Useche	1.016.097.191	Inspector De Obra
14	Juan Felipe Cornejo Nieto	1.015.484.496	Auxiliar Administrativo
15	Martha Lucia Coronado Bedoya	32.666.194	Almacenista
16	Anderson Esneyder García Quintero	1.015.476.931	Auxiliar Administrativo

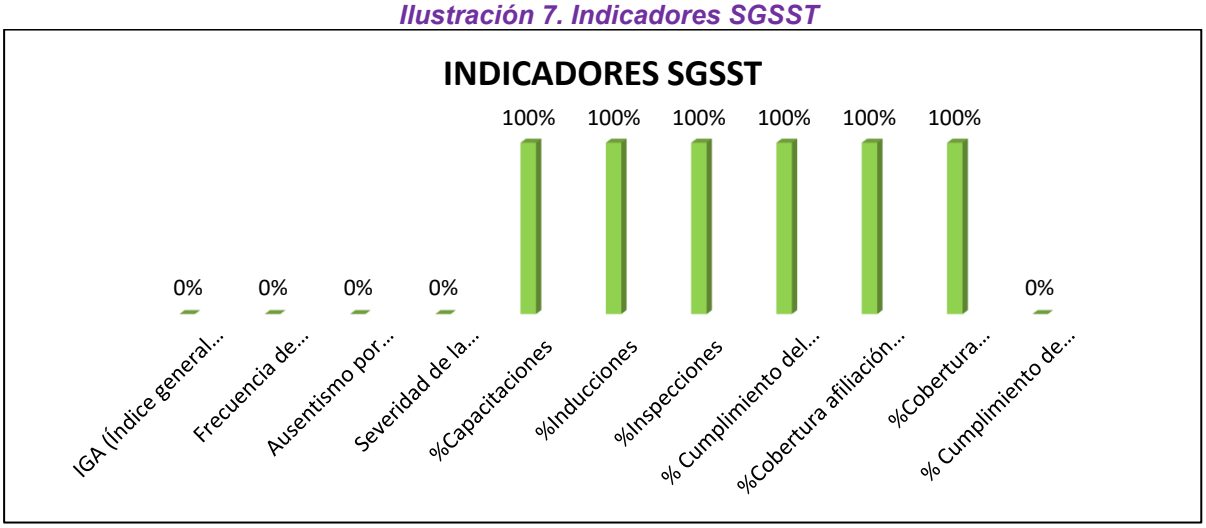
3.2. Gestión SST Durante el Periodo

- Inducción y notificación de riesgos: 100% del personal cumplió – Total 41 ingresos.
- Afiliación a seguridad social: soportada para todo el personal.

CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

- Comités: COPASST y de Convivencia Laboral constituidos y con acta de reunión mensual.
- Entrega de EPP: realizada con soportes.
- Capacitaciones e inspecciones: ejecutadas según cronograma de capacitación, 3 temas programados ejecutados al 100%.
- Exámenes médicos ocupacionales: aplicados a los 41 ingresos.
- Accidentalidad: no se reportaron accidentes, ni incidentes de trabajo0.
- Indicadores SG-SST: cumplimiento satisfactorio, en accidentalidad a 0% y cumplimientos al 100%.
- Afectación a usuarios: no se presentaron eventos.

Ilustración 7. Indicadores SGSST



En conclusión, el Consorcio MYE cumple con la implementación del SG-SST, garantizando condiciones de seguridad y salud adecuadas para el personal.

Así mismo, se evidencian controles efectivos en afiliaciones, inducciones, comités, entrega de EPP, capacitaciones y exámenes médicos.

Finalmente, No se presentaron accidentes, incidentes laborales ni afectaciones a usuarios y las actividades técnicas avanzan conforme al cronograma establecido.

4. RESUMEN EJECUTIVO AREA AMBIENTAL

Durante el periodo comprendido entre el 21 de agosto y el 20 de septiembre de 2025, se adelantaron actividades de gestión y seguimiento orientadas al manejo de residuos y a la implementación de medidas de protección en las estaciones asignadas de TransMilenio. Estas acciones se enmarcaron en los lineamientos establecidos para garantizar un desarrollo de las obras bajo parámetros de sostenibilidad, seguridad y responsabilidad ambiental.

CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

En relación con los residuos peligrosos (RESPEL), se efectuó la entrega a los gestores debidamente autorizados, lo que asegura la trazabilidad de su disposición final y el cumplimiento de la normativa aplicable. Dichos residuos fueron clasificados, rotulados y almacenados temporalmente en condiciones seguras mientras se adelantaban las gestiones de recolección. Como parte de las acciones de mejora, se presentó a la interventoría la documentación correspondiente a dos nuevos gestores autorizados, ampliando así las alternativas disponibles para la disposición final de este tipo de residuos y fortaleciendo la gestión integral implementada en el proyecto.

Respecto a los residuos de construcción y demolición (RCD), estos fueron entregados de manera directa a las empresas Greco y Reciclados Industriales, ambas con autorización vigente para la recepción y tratamiento de este tipo de materiales. Esta práctica permitió dar cumplimiento a los requisitos normativos, asegurando un manejo ágil y controlado que contribuye a la optimización de procesos y a la reducción de riesgos ambientales.

En el desarrollo de las actividades de campo, se implementaron diversas medidas preventivas y de control, tales como la instalación de cubrimientos en pisos y estructuras durante los trabajos de pintura para evitar deterioro o contaminación de superficies, la colocación de barreras en sumideros durante las fundidas de concreto con el fin de impedir el ingreso de sedimentos a la red de alcantarillado, y la verificación del cumplimiento de los parámetros relacionados con emisiones atmosféricas y generación de ruidos, garantizando que estos no representaran molestias o afectaciones a la comunidad ni al entorno cercano.

De manera complementaria, se llevaron a cabo inspecciones periódicas a los kits de control de derrames, constatando su disponibilidad y buen estado en todos los frentes de trabajo. No fue necesario su uso, dado que durante el periodo no se registraron incidentes de este tipo, lo cual refleja la eficacia de las medidas preventivas aplicadas en el manejo de sustancias peligrosas.

Se efectuó el cargue de la información ambiental correspondiente al mes de julio en la plataforma WEB de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), cumpliendo con los plazos establecidos por la entidad. Así mismo, se realizaron jornadas de capacitación ambiental dirigidas al personal operativo, enfocadas específicamente en los cómo proceder en caso de un derrame, incluyendo la activación de protocolos, uso adecuado de kits de emergencia y comunicación inmediata al responsable ambiental. Esta capacitación refuerza la capacidad de respuesta del equipo frente a eventualidades que puedan comprometer la seguridad o el ambiente.

Finalmente, se consolidó un registro fotográfico que documenta y respalda todas las actividades ejecutadas, constituyendo evidencia verificable del cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental y de la correcta implementación de las medidas establecidas durante el periodo presentado.

CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GENERAL

La ejecución presupuestal que se presenta a continuación corresponde a las órdenes de trabajo finalizadas y debidamente recibidas por la interventoría, las cuales constituyen la base para el cálculo de los valores aquí reportados. La información consignada puede ser verificada en el acta de costos, documento en el que se registran y validan los montos asociados a cada una de las actividades ejecutadas.

Tabla 7. *Ejecución presupuestal general del contrato*

CONCEPTO		VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PENDIENTE POR EJECUTAR	
			%	VALOR EJECUTADO	%	VALOR PENDIENTE
VALOR PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN		$ 11,059,277,729.00	23.61%	$ 2,611,378,513.00	76.39%	$ 8,447,899,216.00
VALOR DEL AIU PARA LAS OBRAS DE ADECUACION	24.33%	$ 2,690,722,271.00	22.64%	$ 609,234,607.00	77.36%	$ 2,081,487,664.00
VALOR TOTAL OBRAS DE ADECUACIÓN - INCLUIDO EL AIU:		$ 13,750,000,000.00	23.42%	$ 3,220,613,120.00	76.58%	$ 10,529,386,880.00

Como se observa en la tabla anterior, a la fecha se ha ejecutado el **23.42%** del valor total del contrato, correspondiente a $3,220,540,026.00, quedando un saldo pendiente por ejecutar de $10,529,459,974.00, equivalente al **76.58%** del valor contractual.

Tabla 8. *Ejecución Presupuestal por Troncal*

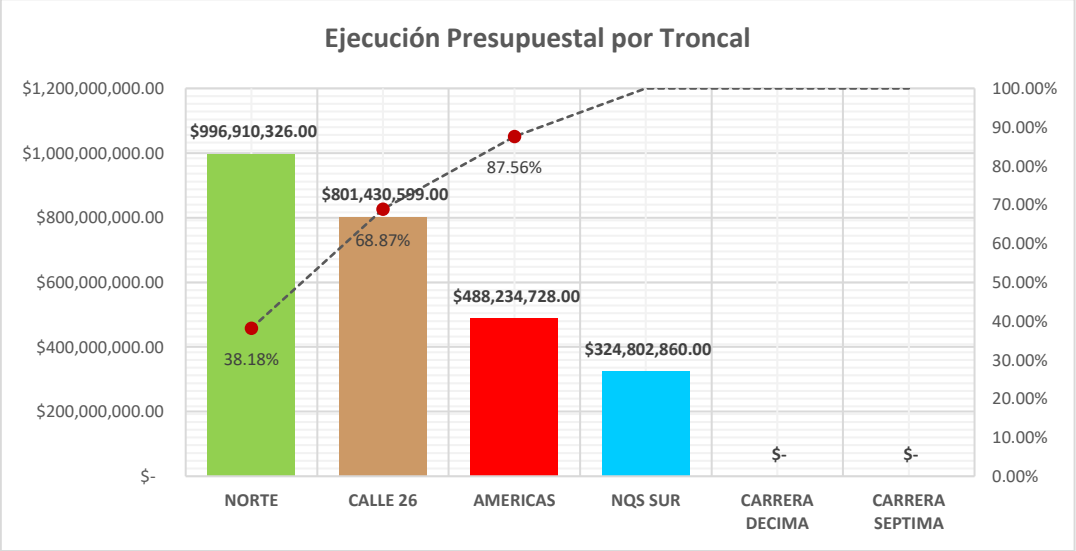
TRONCAL	VALOR EJECUTADO	%	% ACUMULADO
NORTE	$ 996,910,326.00	38.18%	38.18%
CALLE 26	$ 801,430,599.00	30.69%	68.87%
AMERICAS	$ 488,234,728.00	18.70%	87.56%
NQS SUR	$ 324,802,860.00	12.44%	100.00%
CARRERA DECIMA	$ -	0.00%	100.00%
CARRERA SEPTIMA	$ -	0.00%	100.00%

De igual manera, se puede observar que, a la fecha de corte, la troncal con mayor inversión corresponde a la troncal NORTE, con una inversión de **$996,124,031.00**, equivalente al 38,15% del valor total ejecutado. En segundo lugar, se encuentra la troncal CALLE 26, con **$802,182,956.00** (30,72 %), seguida la troncal AMÉRICAS, con **$488,209,399.00**, y finalmente la troncal NQS SUR, con **$324,802,860.00**. De esta manera, el valor total de la ejecución presupuestal asciende a **$2,611,319,246.00.**

CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

Cabe destacar que, a la fecha, no se han adelantado actividades en las troncales CARRERA DÉCIMA y CARRERA SÉPTIMA, toda vez que no se han emitido órdenes de trabajo para dichos corredores.

Ilustración 8. *Ejecución Presupuestal por troncal*



6. VALIDACION DE INFORME CONSORCIO MYE BOGOTA

Este informe corresponde al Informe Ejecutivo correspondiente **al Periodo No. 02, entre el 21 de agosto al 20 de septiembre de 2025,** como resumen del Informe Mensual presentado y que se encuentra en los documentos relacionados con el Contrato 1380 de 2025.

Adicionalmente todos los documentos relacionados con el informe Mensual del Contratista Consorcio MYE Bogotá, correspondiente al Periodo No. 02, entre el 21 de agosto al 20 de septiembre de 2025, se encuentran alojados en la plataforma SECOP II, en los Documentos de Ejecución del contrato 1380 de 2025.

La Interventoría, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.
