ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA		**FORMATO**							**CÓDIGO**	MS-GP-FR-34
		GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA							**VERSIÓN**	0
		INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA							**FECHA**	22/02/2023
PERIODO DE INFORME SEMANAL										
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**27-sep-25**	**SEMANA No.**	**24**	DEL	**20-sep-25**	AL	**26-sep-25**	

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	PROVINCIAS DE: MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

0
8
22

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**	
CONTRATO No.:	ICCU-219-2025	**CONTRATO No.:**	ICCU-138-2025
PLAZO INICIAL:	31/12/2025	**PLAZO INICIAL:**	31/12/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO SOFAN C-031
FECHA DE INICIACIÓN:	09/04/2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	09/04/2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	-	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	-
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	-	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	-
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	31/12/2025
PLAZO ACTUALIZADO:	267	**PLAZO ACTUALIZADO:**	267
PLAZO TRANSCURRIDO:	171 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	171 días
VALOR INICIAL :	$ 3.865.474.620	**VALOR INICIAL :**	$ 35.350.235.228
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.865.474.620	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 35.350.235.228
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.865.474.620	**VALOR POR PAGAR:**	$ 35.350.235.228
VALOR ANTICIPO:	$ 773.094.924	**VALOR ANTICIPO:**	$ 10.605.070.568
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN SÁNCHEZ ESTRADA	**SUPERVISOR:**	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

2.1. FASE I - DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN VIAL:

PROVINCIA DE ORIENTE:

FÓMEQUE (FÓMEQUE CAQUEZA)

- LEVANTAMIENTO DE CAPAS GEOGRÁFICAS

2.2. FASE II - CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y PROPUESTA DE INTERVENCIONES:

PROVINCIA DE MEDINA:

PARATEBUENO (BUENAVISTA ALTOREDONDO - ENGAÑO)

- ENSAYOS DE LABORATORIO A LAS MUESTRAS TOMADAS EN EL TRAMO

PROVINCIA DE ORIENTE:

FÓMEQUE (FÓMEQUE CAQUEZA)

- ENSAYOS DE LABORATORIO A LAS MUESTRAS TOMADAS EN EL TRAMO

2.3. FASE III - INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS:

PROVINCIA DEL GUAVIO:

UBALÁ (CASA ROSADA - SAN LUIS - LAGUNA AZUL)

- ROCERÍA
- INSTALACIÓN DE TUBERÍAS EN CONCRETO DE 36"
- CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS DE ENCOLE Y DESCOLE

JUNÍN (SUEVA - SAN GFRANCISCO - VALLE JUNÍN)

- FABRICACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO DE 36"

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1.	FASE I - DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN VIAL	10-abr-25	8-jul-25	90	10-abr-25	27-sep-25	171	0	-81
2.	FASE II - CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y PROPUESTA DE INTERVENCIONES	17-abr-25	20-ago-25	126	10-abr-25	27-sep-25	171	7	-38
3.	FASE III - INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS	9-jul-25	31-dic-25	176	1-sep-25	27-sep-25	27	-54	95

Plazo del proyecto: 266 días

** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION


AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	32,78%	6,50%	-26,28%
Durante el periodo	2,65%	0,05%	-2,60%
Acumulado Actual	35,44%	6,55%	-28,88%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
267	171,00	96	-77,12

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO

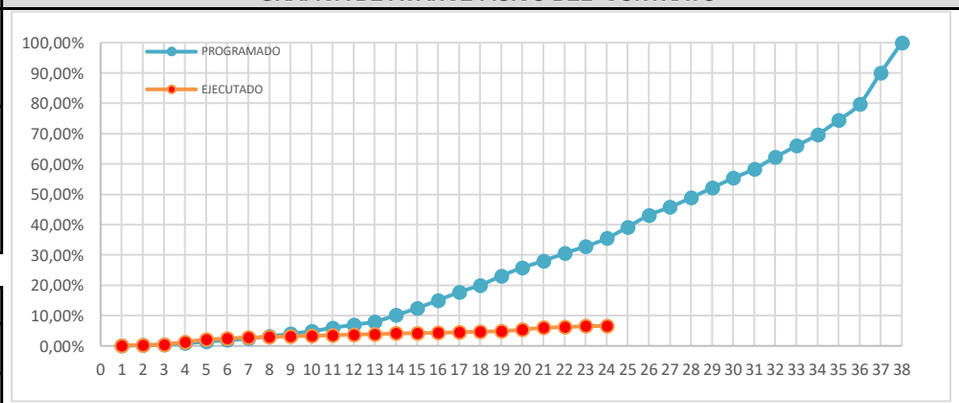

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	FECHA	27-sep-25	SEMANA No.	24	DEL	20-sep-25	AL	26-sep-25

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 11.588.877.551	$ 2.297.261.579	20%
Durante el periodo	$ 937.875.311	$ 18.968.807	2%
Acumulado Actual	$ 12.526.752.862	$ 2.316.230.386	18%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$ 10.210.522.476

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO

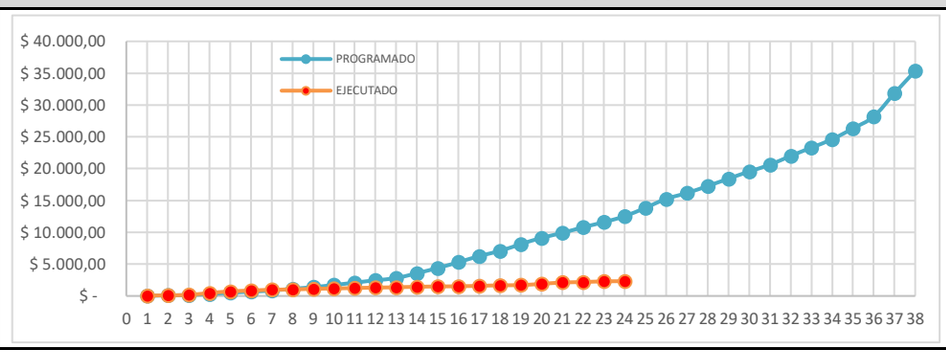


AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 10.605.070.568	$ -	0,00%
Durante el periodo	$ -	$ -	0,00%
Acumulado Actual	$ 10.605.070.568	$ -	0,00%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN %

-28,88%

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

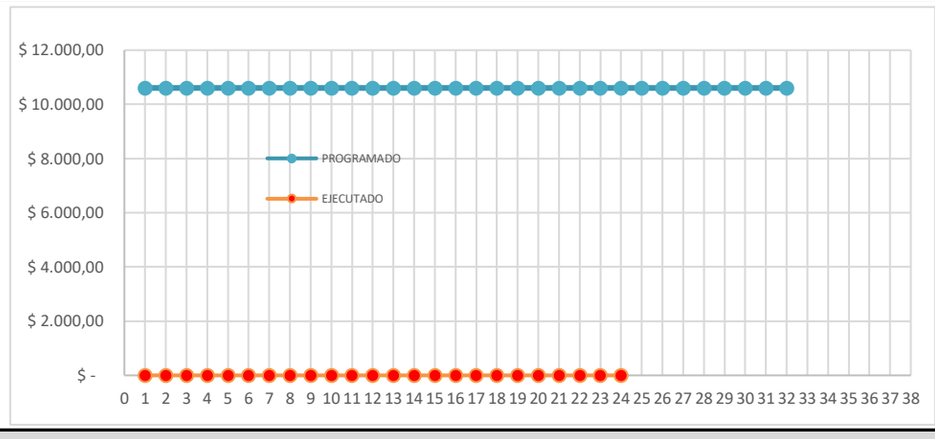

4. GESTIÓN DE SEGUIMIENTO POR COMPONENTE

4.1 GESTIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

El Domingo 21 de septiembre mediante comunicado 766-231-ICCU Aprobación Individual de Informe Gerencial mensual No. 3 CTO-138 de 2025. Respuesta oficios SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-131 y SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-208 se aprueba el informe gerencial mensual N° 3 del contrato de obra ICCU-138-2025, el cual fue revisado y observado por la interventoría y subsanado por el contratista Consorcio Sofan C-31.

El lunes 22 de septiembre mediante comunicado 766-232-ICCU RESPUESTA SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-238- informes geoposicionamientos Fómeque, Fosca y Chipaque. APROBACIÓN FOSCA Y CHIPAQUE – PENDIENTES FOMEQUE se da por entregados y avalados estos productos para los tramos mencionados y se aclara que aún faltan para el tramo de Fómeque el geoposicionamiento de los vértices GPS intermedios.

El lunes 22 de septiembre mediante comunicado 766-233-ICCU se envían observaciones a las actividades de la alcantarilla N°4 ubicada en el PR 7+780 del Municipio de Ubalá tramo Casa Rosada - Laguna Azul.

El lunes 22 de septiembre mediante comunicado 766-234-ICCU se da Respuesta oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-248-Respuesta al oficio 766-225 – Traslado de requerimientos y solicitud de la Entidad ICCU (Oficio ICCU-S-2025-0006490) y se realizan precisiones sobre: 1. Restitución de tramos intervenidos, 2. Alcance de las observaciones, 3. Transporte de materiales e insumos y 4. Obligaciones contractuales, y además se solicita al contratista atender las observaciones planteadas, con el fin de dar cumplimiento a las cláusulas contractuales y asegurar la adecuada movilidad de la comunidad y de los usuarios en los tramos intervenidos.

El lunes 22 de septiembre mediante comunicado 766-235-ICCU se remiten las actas de comité del N° 10 al 17-Respuesta Oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-241 para firma y archivo; y una vez suscritas las actas se solicita sean remitidas a la Interventoría.

El lunes 22 de septiembre mediante comunicado 766-236-ICCU se envía al ICCU la subsanación del informe mensual N° 4 Mes de Julio Interventoría dando Respuesta Oficio ICCU-S-2025-0006315 en el cual se incluyeron los ajustes y aclaraciones solicitadas, con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos establecidos y garantizar la conformidad técnica y administrativa de los documentos.

El martes 23 de septiembre mediante comunicado 766-237-ICCU se realiza la aprobación de los PMT de las provincias de Medina y Soacha dando Respuesta oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-252 y Respuesta a Oficio No. 766-213-ICCU en el cual se remite el documento firmado por la interventoría y se solicita realizar la radicación ante el ICCU.

El martes 23 de septiembre mediante comunicado 766-238-ICCU se notifica al ICCU sobre la aprobación PMT Medina y Soacha-Respuesta oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-252 producto de las observaciones previamente remitidas en los oficios 766-171-ICCU, 766-186 y 766-213-ICCU y que fueron atendidas por el contratista en su totalidad mediante oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-252 y recibidas a conformidad.

El martes 23 de septiembre mediante comunicado 766-239-ICCU se da RESPUESTA SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-250 – Observaciones a Informe de Topografía – Tramo Junín tercera revisión y se solicita que se solicita que si algún elemento se dio por recibido y avalado anteriormente (ejemplo carteras) se vuelvan a incluir en lo que se envía, ya que por trazabilidad deben estar las carpetas con la información completa.

El martes 23 de septiembre mediante comunicado 766-241-ICCU se realiza la aprobación condicionada al Informe de laboratorio de los municipios de Choachí y Junín dando Respuesta a la comunicación SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-226 y a la comunicación SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-229 respectivamente.

El martes 23 de septiembre mediante comunicado 766-242-ICCU se da RESPUESTA AL COMUNICADO SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-190. PAGA SOACHA donde se solicita que se cumpla las observaciones realizadas y se le recuerda que este es un documento inicial de soporte para el desarrollo de las actividades ambientales a ejecutar durante el contrato.

El martes 23 de septiembre mediante comunicado 766-243-ICCU se da RESPUESTA AL COMUNICADO SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-187. PAGA GUAVIO donde se solicita que se cumpla las observaciones realizadas y se le recuerda que este es un documento inicial de soporte para el desarrollo de las actividades ambientales a ejecutar durante el contrato.

El martes 23 de septiembre mediante comunicado 766-244-ICCU se da RESPUESTA AL COMUNICADO SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-221. PAGA ORIENTE donde se solicita que se cumpla las observaciones realizadas y se le recuerda que este es un documento inicial de soporte para el desarrollo de las actividades ambientales a ejecutar durante el contrato.

El martes 23 de septiembre mediante comunicado 766-245-ICCU se dan Respuestas Radicación Esquemas de Zona de Intervención Junín y Ubalá-oficios SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-249 y SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-255 en el cual se realizan observaciones a la información de intervención de los municipios de Junín y Ubalá.

El martes 23 de septiembre mediante comunicado 766-247-ICCU se da Respuesta al comunicado SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-251 APROBACIÓN GIRO 3 Anticipo Contrato de obra ICCU-138-2025 en el cual se notifica que se encuentran de conformidad y por tanto se emite la APROBACIÓN DEL GIRO 3 del anticipo por valor de $341.671.075,03, conforme al listado.

El miércoles 24 de septiembre mediante comunicado 766-240-ICCU se notifica al ICCU de la aprobación condicionada al Informe de laboratorio de los municipios de Choachí y Junín dando Respuesta a la comunicación SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-226 y a la comunicación SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-229 respectivamente.

El miércoles 24 de septiembre mediante comunicado 766-249-ICCU se da RESPUESTA A SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-256 OBSERVACIONES TOPOGRAFÍA Y CAPAS GEOGRÁFICAS CHIPAQUE en el cual se realizan observaciones y se reitera que antes de enviar de nuevo los productos con las subsanaciones correspondientes a las observaciones revisarlos concienzudamente, puesto se siguen cometiendo los mismos errores de entregas anteriores con otros productos.

En comité de seguimiento del 24/09/2025 se resaltarón los incumplimientos de las entregas de los prodcutos topograficos de los municipios de Gama, Junin, Chipaque, Choachí, Fosca, Sibate, Medina y Paratebueno; estos son reprogramados nuevamente PARA EL 24 y 25 de septiembre. Se solicitó al contratista remitir las subsanaciones de los informes mensuales de Julio y Agosto.Asimimos, se realizó la solicitud del informe geotecnico de Choachí y Junín Subsanado para el 26 de septiembre. Se recordó al contratista la remisión del analisis integral tecnico, juridico y financiero para la aprobación de la redistribucuón de las actividades de obra a fecha del 31 de diciembre del 2025. Tambien, se solicitó la subsanación de los presupyestos preliminares y perfiles de intervencioón de los municipios anteriores para el 24 y 25 de septiembre. Se insistió al contratista la necesidad de realizar el abscisado del levantamiento y replanteo topografico antes de las intervenciones programadas para el 1 y 6 de octubre del 2025.

El jueves 25 de septiembre mediante comunicado 766-246-ICCU se da Respuesta oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-259-Notificación cierre de la vía al llano e interior de Choachí, afectaciones en actividades preliminares y levantamiento de actas de vecindad en el cual se le recuerda al contratista el cumplimiento de los compromisos adquiridos en mesas de trabajo con la entidad sobre la urgente de necesidad de iniciar con las intervenciones sobre la rasante programadas para el 1 y 6 de octubre en los municipios de Choachí y Junín, respectivamente y además se solicita que se atiendan las observaciones realizadas en aras de terminar las fases I y II del contrato ICCU-138-2025, vencidas del el 08 de julio y el 20 de agosto que se presentan un retraso de 54 días en el inicio de la fase III y que debe ser mitigado con las intervenciones de obra simultaneas en cinco municipios como lo establece el anexo técnico del contrato.

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**27-sep-25**	**SEMANA No.**	**24**	DEL	**20-sep-25**	AL	**26-sep-25**

El jueves 25 de septiembre mediante comunicado 766-250-ICCU se envía al ICCU el Acta de cobro No. 1 del Contrato de Interventoría No. ICCU- 219-2025 y se adjunta el link del drive con la información para su correspondiente consulta y descarga.

El jueves 25 de septiembre mediante comunicado 766-253-ICCU se envían observaciones al informe del diseño de estabilización y estructura de pavimento de la provincia del Guavio tramo – Casa Rosada-San Luis – Ubalá en versión 3-Respuesta SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-227 el cual se solicita subsanar las observaciones señaladas y complementar el informe, acompañada de la documentación soporte.

El jueves 25 de septiembre mediante comunicado 766-255-ICCU se realiza la solicitud de preaviso de inicio de actividades por parte del contratista de obra para la construcción de alcantarillas en el municipio de Ubalá. Tramo: Casa rosada - Laguna azul y desde la interventoría se reitera la disposición para acompañar técnicamente las actividades de verificación y asistencia en campo que el contratista requiera, con el propósito de contribuir a una ejecución segura y eficiente del contrato y se agradece la atención prestada y se reitera la necesidad de información oportuna sobre las próximas intervenciones a realizarse lo cual permitirá un seguimiento continuo, evitando posibles reprocesos que afectaría el proceso constructivo.

El jueves 25 de septiembre mediante comunicado 766-257-ICCU se da Respuesta al comunicado SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-260 (Notificación de incidente por pérdida de banca en el PR4+960, tramo Casa Rosada – Laguna Azul) en el cual se informa que realizó la revisión del lugar donde se presentó el accidente notificado por el contratista mediante comunicado SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-260 y observó el vehículo que cayó, el pasado lunes , 22 de septiembre, al cauce de la quebrada en el sector donde se está presentando pérdida de la banca de la vía-PR4+960 y que además, este sector fue reconocido como punto crítico en el recorrido realizado conjuntamente con la Supervisión del ICCU el pasado 13 de agosto en el K4+960 del tramo Casa Rosada-Laguna Azul del municipio de Ubalá, y ratificado por la entidad a través del oficio ICCU-S-2025-0006668-(Respuesta al oficio de notificación No. 766-219 - pérdida de banca cerca del PR 4+960, provincia del Guavio, municipio de Ubalá tramo 1: Casa rosada -Laguna azul- Respuesta Oficial.), donde se señala que sobre el punto de referencia no se realizarán actividades de mejoramiento de la rasante, por la necesidad de construcción de las obras de contención no implícitas contractualmente en el contrato de obra ICCU-138 del 2025; y además se solicita señalar el punto crítico con delineadores tubulares y cinta plástica reflectiva en la zona, que permita alertar a los conductores de las condiciones inseguras en este punto de la vía, tal cual como se contempló en el Plan de Manejo de Transito aprobado por la interventoría.

El jueves 25 de septiembre mediante comunicado 766-258-ICCU se da Respuesta al comunicado SOFÁN- FOR-CO-03-ICCU031-261 (Notificación pérdida de banca en el tramo vial vereda Chatasuga, Municipio de Choachí, Provincia de Oriente) en el cual se informa que realizará el traslado de la información al ICCU de la afectación a la vía notificada por el contratista mediante comunicado SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-261 en el cual se observa a partir del registro fotográfico compartido que corresponde a un fenómeno de remoción en masa en el k9+000 aproximadamente, del tramo vial del municipio de Choachí, Vereda Chatasuga; y además se ratifica quede acuerdo con los recorridos realizados en conjunto con el Consorcio Sofan C-031 se puede tomar la vía alterna saliendo por los Termales de Santa Mónica hacia el final del tramo vial en la Vereda El Rosario, con el fin de contemplar dentro de su logística accesos alternativos para el ingreso de recursos físicos al lugar de la obra previo al inicio de actividades de obra en este municipio.

El jueves 25 de septiembre mediante comunicado 766-259-ICCU se notifica al ICCU sobre la pérdida de banca en el tramo vial vereda Chatasuga, Municipio de Choachí, Provincia de Oriente-Respuesta oficio- comunicado SOFÁN- FOR-CO-03-ICCU031-261 y se sugiere a la entidad, incluir la ejecución de obras de contención o estabilización en algún programa o proyecto específico orientado a mitigar el riesgo de fenómenos de remoción en masa. Lo anterior, con el fin de evitar que un eventual deslizamiento obstruya el tránsito de maquinaria y materiales requeridos por el contratista para el desarrollo de la Fase 3, situación que pondría en riesgo la continuidad y cumplimiento de las actividades de obra.

El jueves 25 de septiembre mediante comunicado 766-260-ICCU se da Respuesta al comunicado SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-265-Respuesta oficio 766-233 y de acuerdo con el comunicado SPI-301-2025 recibido vía correo electrónico tanto a la interventoría como al Consorcio Sofan C-031 enviado el día 24 de septiembre por el Ingeniero Helberth Fabián Peña Pérez, Secretario de Planeación e Infraestructura del Municipio de Ubalá, en el cual informa que: “De acuerdo a los compromisos pactados en la pasada visita, nos permitimos informarle que la Administración Municipal en cabeza de su Alcalde y en coordinación con la Secretaría de Planeación e Infraestructura está presta a realizar proceso de instalación de tubería de descole en la alcantarilla tramo-Casa Rosada- Laguna Azul”; el Consorcio Sofan C-031 debe realizar la coordinación de las actividades a realizar para la instalación de dicha tubería en el K7+780 en el Tramo vial de Casa Rosada – San Luis – Laguna Azul y además debe presentar una justificación técnica solicitada en el comunicado 766-233-(Observaciones actividades alcantarilla N°4 PR 7+780, Municipio de Ubalá tramo Casa Rosada - Laguna Azul) de la interventoría que respalde la decisión de implementar la estructura en pantalla y no mediante aletas laterales, así como el procedimiento definido para la ejecución del relleno correspondiente.

El jueves 25 de septiembre mediante comunicado 766-261-ICCU se da Respuesta al comunicado SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-266-Respuesta oficio 766-234 en el cual se realizan precisiones sobre: 1. Restitución de tramos intervenidos, 2. Alcance de las observaciones y 3. Trabajos adelantados por la Alcaldía de Ubalá; y se solicita informar a la Interventoría la coordinación requerida para realizar una mesa de trabajo y, de ser necesario, un recorrido conjunto con el Ing. Fabián Peña, secretario de Planeación de Ubalá, a fin de revisar de manera articulada la ejecución de dichos trabajos y garantizar la calidad y funcionalidad del corredor vial.

El viernes 26 de septiembre mediante comunicado 766-263-ICCU se da Respuesta a oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-269-Respuesta Oficio No. 766-224-ICCU – Presupuesto Preliminar Ubalá en el cual se tienen consideraciones con respecto a las observaciones del oficio 766-224 y mesa de trabajo del 19 de septiembre del 2025 en conjunto con el contratista y se solicita al contratista remitir la corrección de estas observaciones en el término de un día calendario una vez recibida esta comunicación.

El viernes 26 de septiembre mediante comunicado 766-264-ICCU se da Respuesta a oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-262- Contestación a observaciones Oficio No. 766-202-ICCU – Informe Técnico Mensual No. 5. y requiere al contratista atender y subsanar de manera oportuna las observaciones señaladas en un plazo no mayor a 2 días a partir de la entrega del oficio, de modo que las actividades ejecutadas puedan ser avaladas por la interventoría y se asegure el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la correcta ejecución del proyecto.

El viernes 26 de septiembre mediante comunicado 766-265-ICCU se da Respuesta a oficio A SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-239 TOPOGRAFÍA GAMA SEGUNDA REVISIÓN en el cual se presentan las siguientes observaciones y se solicita que entreguen de manera completa y en el término de un día calendario los productos requeridos.

El viernes 26 de septiembre mediante comunicado 766-266-ICCU se da Respuesta a oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-270-Radicación Presupuesto Preliminar – Tramo Junín en el cual se solicita remitir la corrección de estas observaciones en el término de un día calendario una vez recibida esta comunicación.

El viernes 26 de septiembre mediante comunicado 766-267-ICCU se da Alcance oficio 766-247 APROBACIÓN GIRO 3 Anticipo Contrato de obra ICCU-138-2025 y se recuerda que es obligación del CONSORCIO SOFÁN C-031, la presentación de informe mensual de inversión y buen manejo del anticipo, conforme lo ya indicado en el oficio 766-139, junto con el informe del Contrato Fiduciario 124317 Emitido por Patrimonio Autónomos Fiduciaria Bogotá.

Con respecto a actividades de topografía y caracterización del suelo se realizó lo siguiente:

- El levantamiento de capas geográficas: en el tramo de Fómeque 0,80 km.

- Ensayos de laboratorio realizados a las muestras tomadas: en el tramo de Paratebueno 1,46 km de la provincia de Medina y en el tramo de Fómeque 1,90 km en la provincia de Oriente.

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**27-sep-25**	**SEMANA No.**	**24**	DEL	**20-sep-25**	AL	**26-sep-25**

4.2 GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

INFORME AMBIENTAL - SEMANAL
DEL 22 AL 26 SEPTIEMBRE 2025

1.El día 23 de septiembre del 2025, el contratista realizó visita al municipio de Choachí donde solicitó a la Alcaldía Municipal la venta de agua en bloque para uso en el frente de obra.
2.El día 24 de septiembre del 2025, el contratista realizó visita al municipio de Junín donde solicitó a la Alcaldía Municipal la venta de agua en bloque para uso en el frente de obra.
3. Se asiste a comité integral el día 24 de septiembre el 2025. Allí se presenta observaciones a los PAGA de las provincias y se programa mesa de trabajo para el viernes 26 de septiembre d 2025.
4.Durante la semana se realizó actividades de orden y aseo en el frente de obra habilitado.
5.Se realiza inspección a las baterías sanitarias alquiladas en el municipio de Ubalá.
6.En la parte administrativa, el contratista realizó subsanación de las observaciones al informe No. 4 del mes de Julio y la interventoría estaba en revisión de las mismas.
7. El día 26 de septiembre del 2025, se realiza mesa de trabajo del componente ambiental desde las 2:40pm hasta las 4:50Pm donde se realiza revisión del PAGA del Guavio, se resuelve inquietudes y se solicita al contratista cronograma de posibles visitas de inspección a las zonas de intervención para poder definir si es necesario solicitar o no permisos ambientales a la autoridad ambiental competente.

4.3. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

El 22 de septiembre, desde la Interventoría se envió a través de correo electrónico el Visto Bueno de la Información Contractual del PDF adjunto para la solicitud del diseño de vallas al ICCU, no obstante, se reiteran observaciones sobre las fotografías.

EL 22 de septiembre, se remitió a la Supervisión Social del ICCU el volante No. 12. Notificación del levantamiento de actas de vecindad para el municipio de Junín, con el Visto Bueno de la Interventoría para revisión de la Entidad.

El 22 de septiembre, se remitió a la Supervisión Social del ICCU el volante No 11. Contratación de Mano de Obra No Calificada para el municipio de Junín, con el Visto Bueno de la Interventoría para revisión de la Entidad.

El 22 de septiembre, se remitió a la Supervisión Social del ICCU el volante No 9 Notificación del levantamiento de actas de vecindad para el municipio de Choachí, provincia de Oriente con el Visto Bueno de la Interventoría para su respectiva revisión. A través del mismo medio y en la misma fecha, la Entidad manifestó no tener observaciones del volante No. 9.

El 22 de septiembre, se remitió a la Supervisión Social del ICCU el volante No 10 Contratación de Mano de Obra No Calificada para el municipio de Choachí, provincia de Oriente con el Visto Bueno de la Interventoría para su respectiva revisión. A través del mismo medio y en la misma fecha, la Entidad manifestó no tener observaciones del volante No. 10.

El 22 de septiembre, el Contratista remitió mediante correo electrónico el acta de la reunión preliminar No. 2, realizada en el municipio de Paratebueno, provincia de Medina, con la subsanación de las observaciones realizadas desde la Interventoría el 8 de septiembre.

El 22 de septiembre, el Contratista remitió mediante correo electrónico el acta de la reunión preliminar No. 3, realizada en el municipio de Medina, provincia de Medina, con la subsanación de las observaciones realizadas desde la Interventoría el 9 de septiembre.

El 22 de septiembre, el Contratista remitió mediante correo electrónico el acta de la reunión preliminar No. 4, realizada en el municipio de Soacha, provincia de Sibaté, con la subsanación de las observaciones realizadas desde la Interventoría el 9 de septiembre.

El 22 de septiembre, el Contratista radicó el comunicado SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-258, con la subsanación de observaciones del informe mensual No. 5.

El 22 de septiembre, la Interventoría remitió mediante correo electrónico el acta de la mesa de trabajo No. 23 para revisión y firma del Contratista. A través del mismo medio y en la misma fecha, el Contratista remitió el acta mencionada debidamente firmada.

El 22 de septiembre, el Contratista radicó el comunicado SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-259 notificando cierre de la vía al llano e interior de Choachí, afectaciones en actividades preliminares y levantamiento de actas de vecindad.

El 22 de septiembre, el Contratista radicó el comunicado SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-259 notificando cierre de la vía al llano e interior de Choachí, afectaciones en actividades preliminares y levantamiento de actas de vecindad.

El 22 de septiembre, la Interventoría remitió mediante correo electrónico el Visto Bueno de la información contractual compartida para la solicitud de las vallas, sin embargo, se envió una observación referente a las fotografías.

El 23 de septiembre, se notificó al Contratista a través de correo electrónico de la aprobación del volante No. 9. Notificación del levantamiento de actas de vecindad para el municipio de Choachí, por lo que se autoriza la distribución de este.

El 23 de septiembre, se notificó al Contratista a través de correo electrónico de la aprobación del volante No. 10. Contratación de Mano de Obra No Calificada para el municipio de Choachí, por lo que se autoriza la distribución de este.

El 23 de septiembre, el Contratista remitió mediante correo electrónico el acta de la reunión preliminar No. 5 realizada en Choachí, para revisión de la Interventoría

El 23 de septiembre, el Contratista remitió mediante correo electrónico el acta de la reunión extraordinaria No. 2, para revisión de la Interventoría.

El 23 de septiembre, el Contratista remitió mediante correo electrónico el acta del recorrido No. 1 con la comunidad de Ubalá, con la subsanación de las observaciones realizadas desde la Interventoría el 9 de septiembre.

El 23 de septiembre, desde la Interventoría se remitieron observaciones a la carta personalizada No. 17. Notificación de inicio de actividades de obra y PMT - Municipio de Choachí. A través del mismo medio y en la misma fecha, el Contratista remitió la carta No. 17 subsanada. A través del mismo medio y en la misma fecha, desde la Interventoría se remitió la carta No. 17 con Visto Bueno de la Interventoría a la Supervisión social del ICCU para su revisión. A través del mismo medio y en la misma fecha, la Supervisión Social del ICCU manifestó no tener observaciones de la carta No. 17. A través del mismo medio y en la misma fecha, se notificó al Contratista el aval para la radicación de la carta.

El 23 de septiembre, la Interventoría remitió mediante correo electrónico el folleto No. 3. Notificación de inicio de actividades técnicas - municipio de Choachí, a revisión de la Supervisión Social del ICCU. A través del mismo medio y en la misma fecha, la Supervisión Social del ICCU indicó que no tenía observaciones de las piezas compartidas. A través del mismo medio y en la misma fecha, la Interventoría notificó al Contratista el aval para la distribución del folleto No. 3.

El 24 de septiembre, la Interventoría radicó al Consorcio SOFAN C-031 el comunicado 766-248-ICCU - llamado de atención por incumplimiento a los requerimientos para la radicación de actas de vecindad.

El 24 de septiembre, el Contratista radicó el comunicado SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-263 como respuesta oficio 766-208-ICCU relacionado con oficio SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-212 – Radicación Hoja de Vida Auxiliar Social.

El 24 de septiembre, la supervisión social del ICCU indicó mediante correo electrónico que no tenía observaciones de la carta personalizada No. 17. Notificación de inicio de actividades de obra y PMT - Municipio de Choachí. A través del mismo medio y en la misma fecha, se remitió al Contratista la aprobación de la carta No. 1, reiterando que esta se debe radicar a Instituciones o Entidades del área de influencia directa, no sólo a la alcaldía.

El 24 de septiembre, el componente social del Contratista y la Interventoría asistieron al comité de seguimiento semanal No. 19.

El 25 de septiembre, la Interventoría remitió acuso recibido del acta de la mesa de trabajo No. 23 debidamente firmada.

El 25 de septiembre, desde la Interventoría se radicó al Contratista el comunicado 766-246-ICCU como respuesta oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-259-Notificación cierre de la vía al llano e interior de Choachí, afectaciones en actividades preliminares y levantamiento de actas de vecindad.

El 25 de septiembre, desde la Interventoría se radicó al Contratista el comunicado 766-252-ICCU como respuesta a los comunicados SOFAN-FOR-CO-03-228 y SOFAN-FOR-CO-03-233. – aprobación profesional social Kimberly Mendoza Moreno.

El 25 de septiembre, desde la Interventoría se radicó al Contratista el comunicado 766-254-ICCU como respuesta al comunicado SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-236 -Respuesta oficio 766-177-ICCU.

El 25 de septiembre, desde la Interventoría se radicó al Contratista el comunicado 766-255-ICCU solicitando el preaviso de inicio de actividades por parte del contratista de obra para la construcción de alcantarillas en el municipio de Ubalá. Tramo: Casa rosada - Laguna azul.

El 25 de septiembre, desde la Interventoría se radicó al Contratista el comunicado 766-256-ICCU como respuesta al comunicado SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-243 (Respuesta al oficio No. 766 209-ICCU respuesta FOR-CO-03-ICCU031-214-Respuesta 766-184-ICCU - traslado del instructivo ICCU para la solicitud del diseño de las vallas).

El 25 de septiembre, desde la Interventoría se radicó al Contratista el comunicado 766-262-ICCU, notificación de cambio en la dinámica de las reuniones de inicio.

El 25 de septiembre, desde la Interventoría se remitió al Contratista mediante correo electrónico el acuso recibido del informe semanal No. 13.

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**27-sep-25**	**SEMANA No.**	**24**	DEL	**20-sep-25**	AL	**26-sep-25**

El 26 de septiembre, el Contratista remitió mediante correo electrónico la carta personalizada No. 6, de invitación a la reunión de inicio dirigida a la alcaldía de Choachí. A través del mismo medio y en la misma fecha, la Interventoría remitió mediante correo electrónico observaciones de la carta, corrigiendo el consecutivo (No. 18). A través del mismo medio y en la misma fecha, el Contratista remitió la carta No. 18 subsanada. A través del mismo medio y en la misma fecha, se remitió la carta No. 18 a revisión de la supervisión social del ICCU. A través del mismo medio y en la misma fecha, la supervisión social del ICCU indició que no tenía observaciones de la carta. A través del mismo medio y en la misma fecha, desde la Interventoría se remite Visto Bueno de la carta No. 18 para su radicación.

El 26 de septiembre, el Contratista remitió mediante correo electrónico la carta personalizada No. 7, de invitación a la reunión de inicio dirigida a ASOJUNTAS del municipio de Choachí. A través del mismo medio y en la misma fecha, la Interventoría remitió observaciones de la carta, corrigiendo el consecutivo por el No. 19. A través del mismo medio y en la misma fecha, el Contratista remitió la carta No. 19 subsanada. A través del mismo medio y en la misma fecha, se remitió la carta No. 19 a revisión de la supervisión social del ICCU.

El 26 de septiembre, el Contratista remitió mediante correo electrónico la carta personalizada No. 8, de invitación a la reunión de inicio dirigida a secretaria de Planeación del municipio de Choachí. A través del mismo medio y en la misma fecha, la Interventoría remitió observaciones de la carta, corrigiendo el consecutivo (No. 20). A través del mismo medio y en la misma fecha, el Contratista remitió la carta No. 20 subsanada. A través del mismo medio y en la misma fecha, la Interventoría remitió la carta No. 20 a revisión de la Supervisión Social del ICCU. A través del mismo medio y en la misma fecha, la Supervisión Social del ICCU indicó que no tenía observaciones a la pieza. A través del mismo medio y en la misma fecha, se remitió aval al Contratista para radicar la carta No. 20.

El 26 de septiembre, se radicó por parte de la Interventoría al Contratista el comunicado 766-268-ICCU reiterando los parámetros a seguir para la entrega de material proveniente de las actividades de obra a la comunidad.

El 26 de septiembre, el Contratista remitió mediante correo electrónico el informe semanal No. 14 reportando las actividades realizadas en la semana del 20 al 26 de septiembre.

El 26 de septiembre, se realizó la mesa de trabajo No. 25 del componente social, con el fin de revisar los pendientes y definir una ruta a seguir para poner al día el área.

El 26 de septiembre, se brindó atención en el horario establecido en el Punto SAU de la provincia del Guavio, ubicado en el municipio de Ubalá.

El 26 de septiembre, el Contratista inició el arreglo de los buzones satelitales de la provincia del Guavio.

4.4 GESTION SST DEL PROYECTO

INFORME SST - SEMANAL
DEL 20 AL 26 SEPTIEMBRE 2025

1.Se participa en comité externo:
Externo el día 24/09/2025 con la participación de todos los componentes de la Interventoría y consorcio SOFAN al igual que del ICCU.
Interno el día 23/09/2025 con la participación de todos los componentes del consorcio SOFAN

2.Se realiza supervisión y acompañamiento en actividades de cargue de material, corte – figurado y amarre de hierro, vaciado de concreto, excavación y rocería en campo sector San Luis

Verificación de delimitación y señalización en sitio de obra y campamento 20/09/25.
Supervisión y acompañamiento en obra 21/09/25.
Orden y aseo de batería Sanitaria 20/09/25.
Jornada de Orden y aseo 20/09/25.
Reposición de EPP según necesidad de cada colaborador 22/09/25
Inspección de Kit de emergencia de Retro 23/09/25

CHARLA DIARIA

22/09/2025 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD DE ROCERIA
23/09/2025 KIT DE EMERGENCIA - USO DE ESTE
24/09/2025 SEGURIDAD VIAL - RECONOCIMIENTO DEL AREA
25/09/2025 DILIGENCIAMIENTO DOCUMENTAL - ATS-PERMISOS DE TRABAJO-PREOPERACIONALES-CHARLAS
26/09/2025 RIESGO ERGONOMICO - ACTIVIDADES DIARIAS

3.Se continua con la entrega de 2da Dotación

4.Gestión y apoyo administrativo.
Recepción de hojas de vida sector sueva Junín
Se realiza apoyo al cierre de las observaciones del informe mes de agosto 2025

4.5 SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

De acuerdo con el plan de calidad del contratista de obra para la Fase I se continuaron desarrollando las actividades de topografía de los tramos viales con una perspectiva positiva que conllevará hacia el aseguramiento de la calidad, proyectando que la información recolectada en campo cumpla con los estándares esperados para generar las cantidades de obra requeridas y para la Fase II se continuó con la ejecución de los ensayos de laboratorio encaminados a conseguir el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos en el contrato de obra, dichas actividades se han enfocado en el análisis físico, químico y mecánico de las mezclas realizadas con las muestras de suelo recolectadas con el propósito de determinar la fórmula de trabajo para las intervenciones de los tramos viales.

4.6 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Se realizó los requerimientos de la documentación tecnica, ambiental y de SST necesaria para el inicio de las intervenciones en los municipios de Choachí y Junín mediante el oficio 766-234. Se realizó la aprobación del PMT de Medina y Soacha, y aprobación condicionada de los Informes Geotecnicos de Choachí y Junin, conforme el memorandos tecnico N°MT-2649-CM467-2025 y MT-2653-CM467-2025.

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

5.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Se reporta un atraso del -28,88%, ya que el avance programado era del 35,44% y solo se ha ejecutado el 6,55%. La Interventoría constató en las páginas del IDEAM los incrementos en los picos pluviométricos de acuerdo a lo informado por el contratista de obra que, para las actividades de caracterización, en las Provincias del Guavio y Oriente se han presentado lluvias fuertes y constantes que han impedido el desarrollo normal de las labores. Además, en la Provincia de Medina se han iniciado con retraso las etapas de caracterización debido al fuerte sismo ocurrido el pasado 8 de junio, lo que dificultó la logística para el ingreso del personal a la zona.

5.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Se realizó la aprobación del Giro 3 del anticipo del contrato de obra ICCU-138-2025 por valor de $341.671.075,03.

5.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

El Contratista Consorcio Sofan C-031 se encuentra en tramite del pago del primer 25%- Contrato Iccu-138 de 2025, donde se incluyó el oficio 766-197 de interventoría para la aprobación y certificación de Plan de campo, Metodología de trabajo y cronograma de actividades junto con el acta de costos de obra N° 01 (primer 25%).

5.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

No se presentan situaciones problemáticas en este aspecto.

5.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

Se evidencia en el periodo de reporte que, el contratista realizó visitas a los municipios de Junín y Choachí con el fin de solicitar suminsitro de agua en bloque para utilizar en los frentes de obra de los municipios mencionados anteriormente. Adicionalmente, el día 26 de septiembre se realizo mesa de trabajo para revisión del cálculo de la sensibilidad ambiental y nivel de complejidad del proyecto, se solicitó al contratista cronograma de posibles visitas para identificación de permisos ambientales a solicitar ante las Autoridades Ambientales Competentes.

5.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**27-sep-25**	**SEMANA No.**	**24**	DEL	**20-sep-25**	AL	**26-sep-25**

El subcontratista no presenta las planillas de seguridad social a tiempo.

5.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

En este aspecto no se presentan situaciones problemáticas.

5.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

Una de las situaciones identificadas dentro del periodo reportado en el presente informe es el no uso de los conductos regulares por parte de la comunidad para gestionar sus preguntas, quejas o reclamos, por el desarrollo del proyecto, en ese sentido, se hará seguimiento al Contratista para que realice el refuerzo de los canales de atención. Lo anterior, teniendo en cuenta que en los comités de seguimiento el área técnica reporta situaciones sociales en campo como la inconformidad de la comunidad frente al deterioro de la vía por el paso de maquinaria del proyecto y la interferencia en el desarrollo de las actividades técnicas producto del paro en el municipio de Ubalá. En ese sentido, no hay reporte de las gestiones y el acompañamiento del componente social para la resolución de conflictos, debido a que la comunidad no expresa su malestar o inquietudes a través del Punto SAU (físico o virtual).

6. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Plan de contingencia, reprogramación y análisis integral técnico, jurídico y financiero	Consorcio Sofan C-031	Inmediata
Subsanación de productos topograficos de los municipios de Gama, Chipaque, Choachí, Fosca, Sibaté, Junín	Consorcio Sofan C-031	25/09/2025
Subsanación de informes geotecnicos de Junín y Choachí	Consorcio Sofan C-031	26/09/2025
Subsanación de presupuestos de intervención de Choachí, Junín	Consorcio Sofan C-031	25/09/2025

7. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Para el presente informe semanal no se contemplará este capítulo, toda vez que, el proyecto se encuentra en las fases de caracterización de las vías que se van a intervenir y por ahora el contratista no ha presentado las posibles soluciones para el mejoramiento del estado de las vías y/o actividades no previstas ni mayores cantidades.

8. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR


*El contratista de obra consorcio SOFAN C-031 continúa con actividades de las fases I y II de caracterización en el municipio de Fómeque en la provincia de oriente y en el municipio de Paratebueno en la provincia de Medina. Se continúa con la rocería, la instalación de tubería de concreto de 36" y la construcción de las alcantarillas de encole y descole en los K7+779 y K13+521 en el tramo Casa Rosada – San Luis - Laguna Azul en el municipio de Ubalá y se continúa la fabricación de tuberías de concreto de 36" para las alcantarillas que se van a construir en el tramo del municipio de Junín en la provincia del Guavio.
*Para la Fase I el Contratista de obra ha completado el levantamiento topográfico en 10 de los 11 tramos viales, en el municipio de Fómeque las actividades se encuentran en ejecución después de superar las restricciones de acceso a la zona por la afectación de la ola invernal.
La interventoría reitera la preocupación por los continuos incumplimientos en las entregas de los productos topográficos y documentos técnicos requeridos, los cuales han sido objeto de múltiples reprogramaciones sin evidencia de avances significativos. Se hace un llamado al contratista para fortalecer la planeación y el cumplimiento oportuno de los compromisos adquiridos, especialmente en lo relacionado con las subsanaciones pendientes, la entrega de los informes geotécnicos y presupuestos preliminares, así como la presentación del análisis integral técnico, jurídico y financiero. El cumplimiento de estos requerimientos es fundamental para garantizar la adecuada ejecución de las actividades programadas y evitar afectaciones en el cronograma general del proyecto.


9. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

9.1. FASE I - DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN VIAL:

PROVINCIA DE ORIENTE:

FÓMEQUE (FÓMEQUE CAQUEZA)

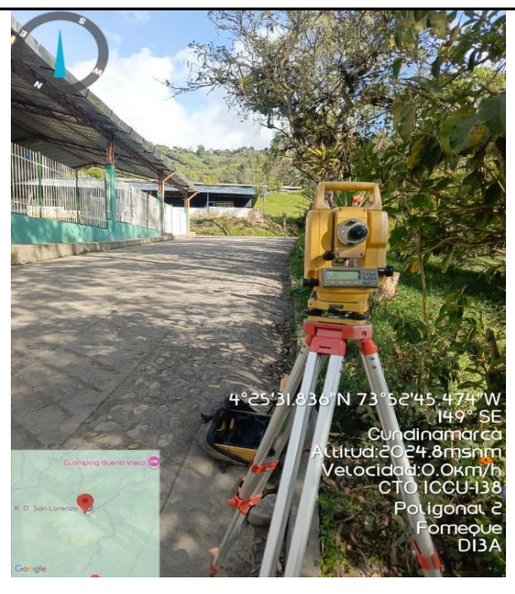

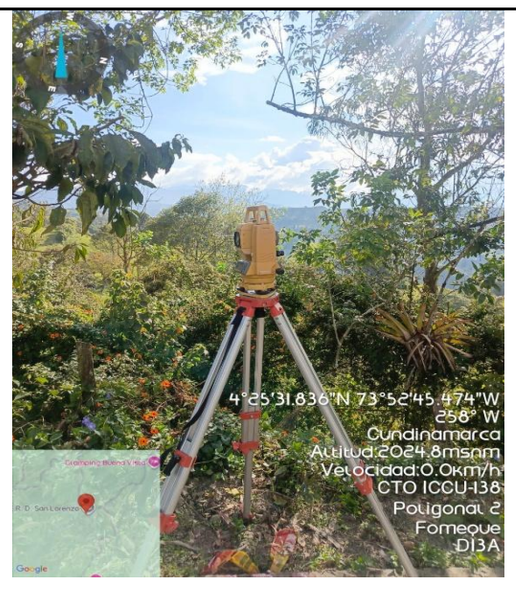

ICCU	**FORMATO**							**CÓDIGO**	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA							**VERSIÓN**	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA							**FECHA**	22/02/2023
PERIODO DE INFORME SEMANAL									
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**27-sep-25**	**SEMANA No.**	**24**	DEL	**20-sep-25**	AL	**26-sep-25**

9.2. FASE II - CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y PROPUESTA DE INTERVENCIONES:

PROVINCIA DE MEDINA:

PARATEBUENO (BUENAVISTA ALTOREDONDO - ENGAÑO)







PROVINCIA DE ORIENTE:

FÓMEQUE (FÓMEQUE CAQUEZA)







9.3. FASE III - INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS:

SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE UBALÁ TRAMO: CASA ROSADA - SAN LUIS - LAGUNA AZUL

VERIFICACIÓN DE ROCERÍA HASTA EL K0+500





VERIFIC





ICCU	**FORMATO**							**CÓDIGO**	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA							**VERSIÓN**	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA							**FECHA**	22/02/2023
PERIODO DE INFORME SEMANAL									
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**27-sep-25**	**SEMANA No.**	**24**	DEL	**20-sep-25**	AL	**26-sep-25**

VERIFICACIÓN DE COTAS DE NIVEL EN TUBERÍA INSTALADA PARA ALCANTARILLAS K13+521





VERIFICACIÓN DE REFUERZO, ENCOFRADO Y EXCAVACIÓN DE CANAL EN DESCOLE DE ALCANTARILLA K13+521





SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN TRAMO: SUEVA - SAN FRANCISCO - VALLE JUNÍN

RECORRIDO CONJUNTO CONTRATISTA E INTERVENTORÍA PARA DEFINICIÓN DE PUNTOS PARA LIMPIEZA O INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS





VERIFIC







COMITÉ DE SEGUIMIENTO SEMANAL No. 19 - 24 DE SEPTIEMBRE

PERIODO DE INFORME SEMANAL


CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**27-sep-25**	**SEMANA No.**	**24**	DEL	**20-sep-25**	AL	**26-sep-25**

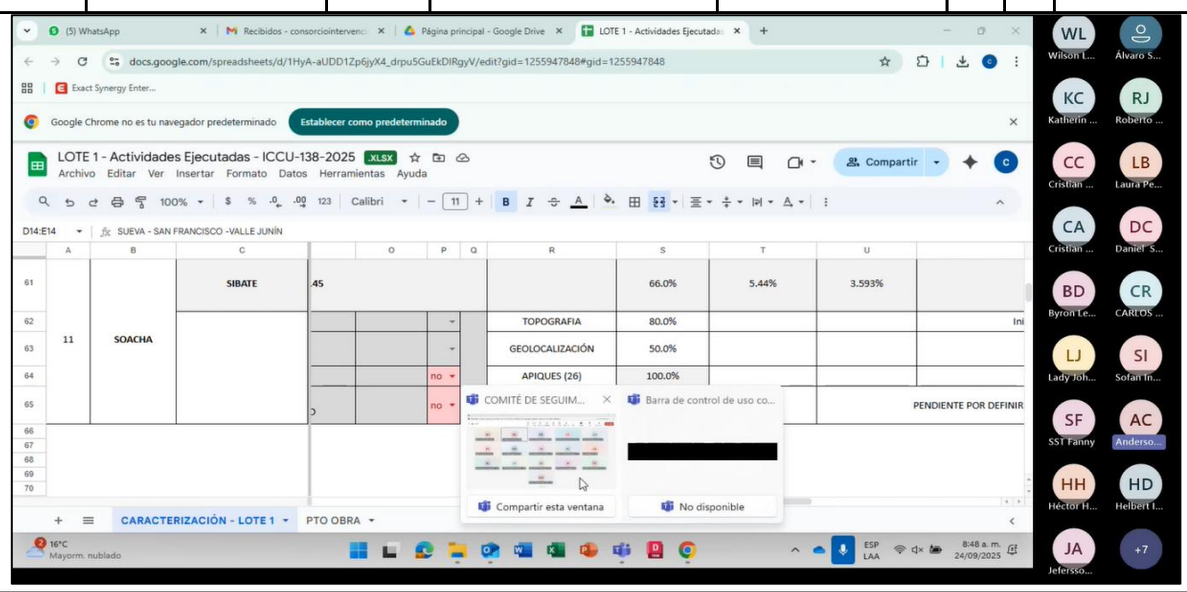


ARREGLO DE BUZONES SATELITALES - MUNICIPIO DE UBALÁ

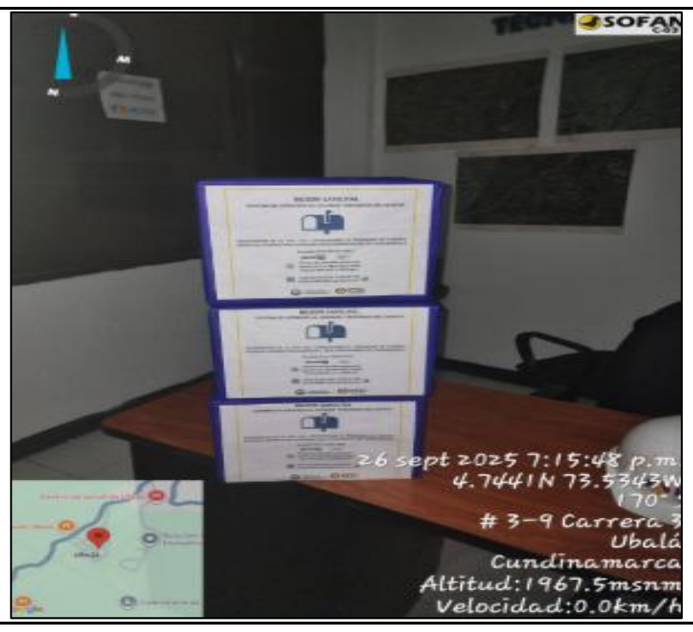

ATENCIÓN PUNTO SAU - PROVINCIA DEL GUAVIO

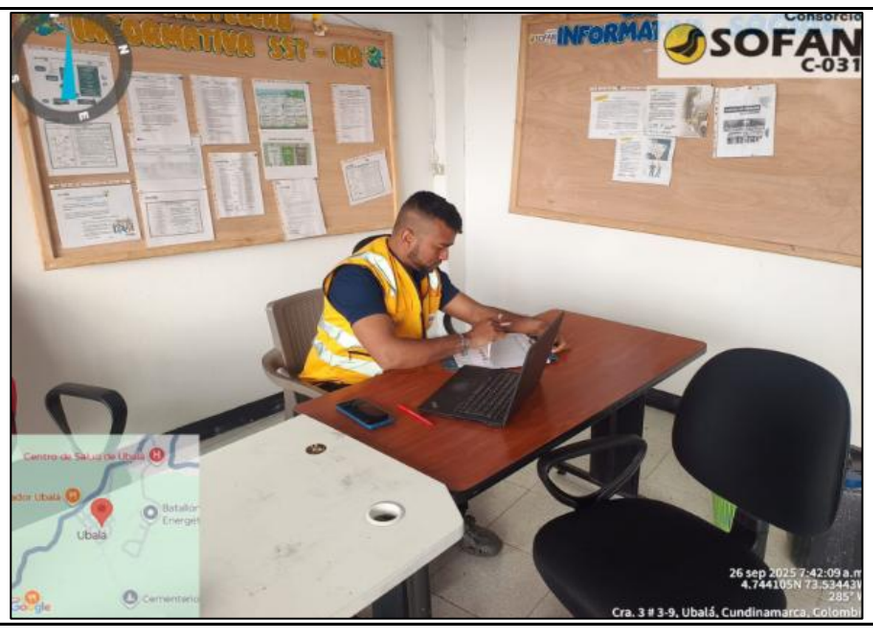

MESA DE TRABAJO No. 25. COMPONENTE SOCIAL - 26 DE SEPTIEMBRE

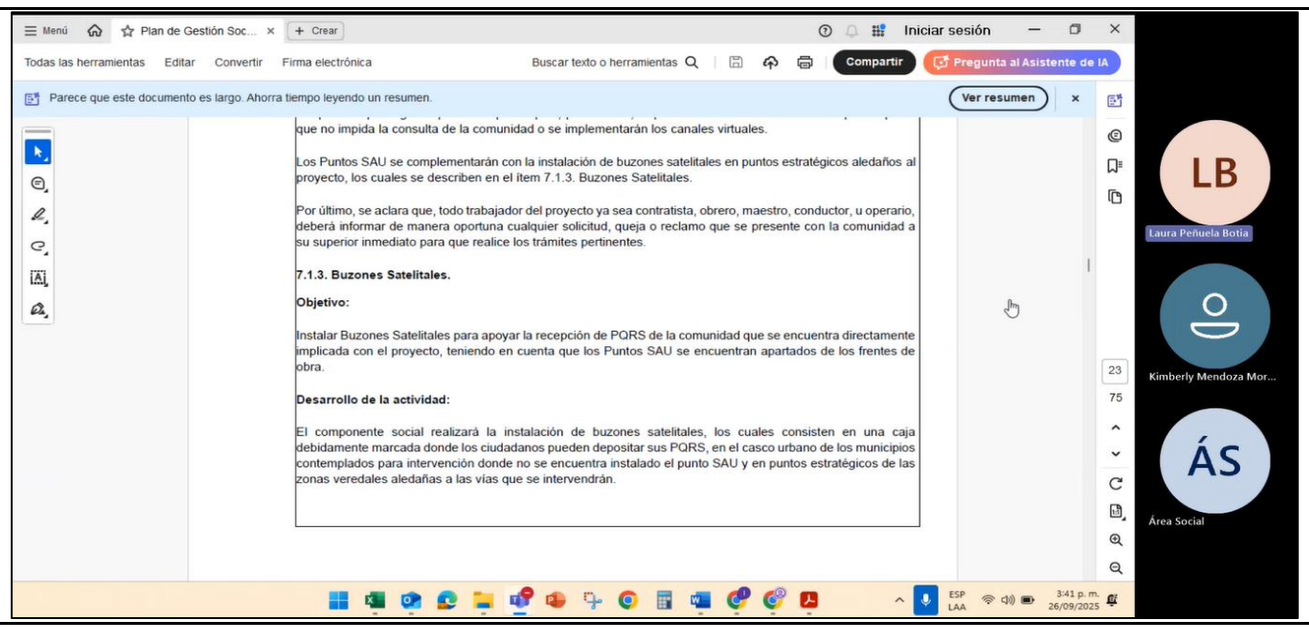

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Nombre: CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
