LM

ED-E-20251111-1228
Bello, 11 de noviembre de 2025

20251112101267341432106456
Comunicaciones Recibidas-Entidades Gubernamen
Noviembre 12, 2025 10:12
Radicado 20251106456

Doctor:
JOHN FREDY RUEDA BLANDÓN
Director de logística - Supervisor contrato 1483
Servicios administrativos - Municipio de Bello

Asunto: solicitud de prórroga al contrato interadministrativo 1483-2025 cuyo objeto es: *"ADMINISTRACIÓN DELEGADA RE RECURSOS; PARA DAR EJECUCIÓN AL PLAN DE DESARROLLO "JUNTOS CONSTRUIMOS, 2024-2027" EN SU INDICADOR DE PRODUCTO DENOMINADO "SEDES MANTENIDAS", E IGUALMENTE DANDO CUMPLIMIENTO A LA LEY 1811 DE 2016, SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE BICI PARQUEADEROS, (SEGÚN FICHA TÉCNICA).*

Cordial saludo,

Mediante la presente comunicación nos permitimos solicitar prórroga al contrato interadministrativo 1483-2025, la solicitud del tiempo adicional se justifica en las siguientes consideraciones:

- Según las fechas contractuales de la plataforma SECOP II, se evidencia que el contrato interadministrativo tuvo fecha de inicio el día 8 de octubre de 2025. Sin embargo, el contrato 382-CD-2025 suscrito por EduNorte para cumplimiento de las obras físicas tuvo acta de inicio con fecha 24 de octubre de 2025, marcando así una diferencia de 16 días entre sí, esto justificado en los tiempos necesarios para la suscripción y legalización del contrato derivado.

- Para la ejecución de los bici parqueaderos, los proveedores de insumos requieren de 20 a 25 días para la fabricación y entrega de los mismos, esta gestión ya ha sido iniciada por el contratista seleccionado, (se adjunta cotización con fecha de entrega del insumo).

En virtud de lo anterior, desde el punto de vista administrativo y técnico consideramos prudente solicitar una prórroga por un período de 35 días calendario (cronograma adjunto), es decir hasta el 26 de diciembre de 2025, en aras de dar cabal cumplimiento a las cláusulas del contrato, y llevar a feliz término el objeto y aspectos administrativos del mismo.

Agradecemos de antemano su diligente gestión,

YENIA RIVAS RENTERÍA
Gerente EduNorte

	NOMBRE - CARGO	FIRMA	FECHA (D/M/A)
Elaboró:	**Juan David Urrutia López** *Profesional universitario*		11-11-2025
Revisó:	**Yuliana Ríos Yepes** *Sugerente técnica de proyectos*		11-11-2025
Aprobó:	**Oscar Agudelo Gil** Jefe de contratación		11-11-2025
Nota: Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma			

6 Fol.

Ambientes y Espacios

CALIDAD E INNOVACIÓN

COTIZACION N°100114

Pereira, octubre 30 2025

Señores
Técnica Constructiva sas

Reciba un cordial saludo y los mejores deseos de éxito en sus actividades.
A continuación, realizamos cotización de los productos y servicios solicitados, la cual colocamos para su apreciación y evaluación.

ARTICULO	DESCRIPCION	IMAGEN
REFERENCIA PP-AYE-0007 BICICLETERO SEMI TRIANGULO	Bicicletero semi triángulo. Fabricado en tubo inoxidable redondo de 2" CAL 18. Soporte para fijación a piso con escudo. Platina en lámina transversal. Dimensiones: 60 cm de altura x 60 cm de ancho Se necesita un tubo por bicicleta. Precio por tubo.	

Condiciones comerciales:

Lugar de entrega: **Medellín. Flete por fuera es por cuenta del cliente.**
Forma de Pago: 70 % anticipo y 30% aviso despacho
Valores: **No incluyen instalación.**
Tiempo de entrega: 15 a 25 días dependiendo la referencia y sobre contratación y pago de anticipo.
Garantía: Doce meses sobre defectos de fabricación.
Validez de la oferta: 15 días

Esperamos cumplir con sus expectativas, gustosamente estamos dispuestos a entregar toda la información adicional que se requiera para responder a sus inquietudes.

Atentamente,
DIEGO TRIANA ASKAR
División Comercial

ayespacios@gmail.com
Tel 311 7223914 3002088639 -3006107600
www.ambientesyespacios.com.co


LIDER DEL PROYECTO: JUAN FERNANDO RUIZ

NOMBRE DEL PROYECTO: BICIPARQUEADEROS BELLO

FECHA DE CONTROL: 26/10/2025

mar, 21/10/2025


	TAREA	UND	CANT.	RESPONSABLE	INICIO	DURACION	FIN
	SECRETARIA CALLO						
1.01	Localizacion, trazado y replanteo de edificaciones y urbanismo, Medido como area construida. Incluye herramienta y señalizacion necesaria.	da	1	Tecnico Constructivo	24/11/2025	1.00	25/11/2025
1.02	Cerramiento provisional en tela verde h. 2.10m. Incluye estructura de madera comun, anclajes de parales al piso y tela verde.	ML	22	Tecnico Constructivo	24/11/2025	13.00	09/12/2025
1.03	Demolicion mecanica de anclajes o pisos en concreto, cargue, transporte y botada de escombros. Ademas recuperación de los materiales aprovechables o sus transporte hasta el sitio que lo indique la interventoria. (PLACA EN BUEN ESTADO)	M2	7,5	Tecnico Constructivo	25/11/2025	1.00	25/11/2025
1.04	Excavación Manual de material heterogeneo 0-2 m (pozos 0.35m2) bajo cualquier grado de humedad. Incluye acarreo dentro del sitio de excavación hasta el sitio de cargue. Botada en sitio	m3	1,2	Tecnico Constructivo	26/11/2025	1.00	26/11/2025
1.05	Suministro, transporte e instalación de Acero de Refuerzo Figurado FY= 420 Mpa- 60000 PSI,corrugado Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	KG	10	Tecnico Constructivo	27/11/2025	1.00	28/11/2025
1.06	Anclaje en loza existente	UND	10	Tecnico Constructivo	27/11/2025	1.00	28/11/2025
1.07	Construcción de PLACA en concreto de 21 Mpa, espesor de 0.10 m., pendientado y acabado escobillado, vaciado alternado (en cuadros no superiores de 1.5 x 1.5 m). Incluye suministro y transporte de los materiales, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, entresuelo en piedra (e=0,15 m.), arenda compactada (e=0.05 m.), malla electrosoldada D-84, curado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. Las inconsistencias o cotas erradas se corregirán en su	M2	15	Tecnico Constructivo	30/11/2025	2.00	02/12/2025
1.08	FABRICACIÓN de CICLOPARQUEADEROS EN ACERO INOXIDABLE de ancho 700mm, altura variable de 105mm, y 657mm, empotrado 30 cm, en tubería redonda de 2" de diámetro, doblado con arcos de 20 cm, calibre 14, Incluye platina de anclaje De 1/4 de 2" , cordón de soldadura, corte con pulidora en piso de asfalto o concreto, demolición, excavación, botada de material, dado en concreto de 20x20x40 cm de 21 Mpa con acelerante, anticorrosivo epóxico, pintura, y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento según diseño.	und	4	Tecnico Constructivo	01/12/2025	13.00	16/12/2025
1.09	INSTALACIÓN de CICLOPARQUEADEROS EN ACERO INOXIDABLE de ancho 700mm, altura variable de 105mm, y 657mm, empotrado 30 cm, en tubería redonda de 2" de diámetro, doblado con arcos de 20 cm, calibre 14, Incluye platina de anclaje De 1/4 de 2" , cordón de soldadura, corte con pulidora en piso de asfalto o concreto, demolición, excavación, botada de material, dado en concreto de 20x20x40 cm de 21 Mpa con acelerante, anticorrosivo epóxico, pintura, y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento según diseño.	und	4	Tecnico Constructivo	03/12/2025	2.00	04/12/2025
1.10	FABRICACIÓN de señalización vertical Ciclorruta tipo SI - informativa de 0.45 x 0.45m, tablero elaborado en lamina galvanizada calibre 16 y recubierto en reflectivo tipo XI (Grado Diamante DG3), estructura tipo pedestal (Prof. 0,80 m y D=0,3 m) elaborado en tubería de 2", recubierta por pintura electrostática según normas y especificaciones del ministerio de vias y transportes, Incluye suministro, transporte, pernos, arco y anclajes, previa aprobación por parte de la interventoria. Y todo lo necesario para su correcta instalación	und	1	Tecnico Constructivo	01/12/2025	12.00	12/12/2025

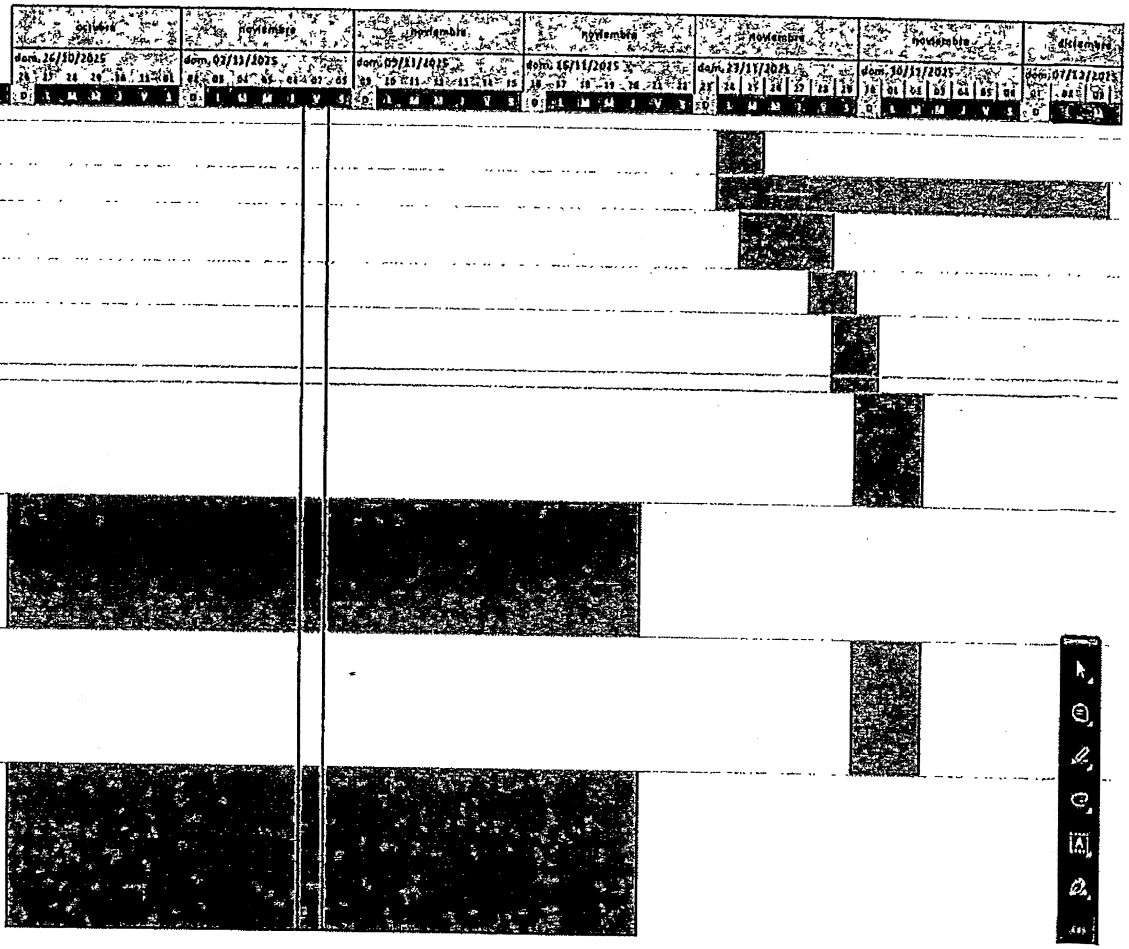

1.11	INSTALACIÓN de señalización vertical Ciclorruta tipo SI - Informativa de 0.45 x 0.45m, tablero elaborado en lamina galvanizada calibre 16 y recubierto en reflectivo tipo XI (Grado Diamante DG3), estructura tipo pedestal (Prof. 0,80 m y D=0,3 m) elaborada en tubería de 2", recubierta por pintura electrostática según normas y especificaciones del ministerio de vias y transportes, incluye suministro, transporte, pernos, aviso y anclajes, previa aprobación por parte de la interventoría. Y todo lo necesario para su correcta instalación	Und	1	Tecnia Constructiva	11/11/2025	2,00	02/12/2025
1.12	Suministro, transporte e instalación de PINTURA PARA DEMARCACIONES ZONAS, Incluye todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, Según diseño.	m2	11,05	Tecnia Constructiva	04/11/2025	2,00	07/11/2025
1.13	Aplicación de pintura de ALTA VISIBILIDAD, DE GRAN ADHERENCIA Y RESISTENCIA tipo tráfico para demarcación de sistemas de discapacidad o tiflicitta que proporciona perfecta adherencia sobre superficies en concreto y asfalto, Incluye el suministro y el transporte del material y todo lo necesario para su correcta aplicación y funcionamiento.	UNID	1	Tecnia Constructiva	04/11/2025	2,00	06/11/2025
1.14	Aseo durante la obra y final	gl	1	Tecnia Constructiva	07/11/2025	1,00	08/11/2025
1.15	Cargue, acarreo y retiro de escombros	Vje	1	Tecnia Constructiva	08/11/2025	1,00	09/11/2025
2.01	Localización, trazado y replanteo de edificaciones y urbanismo, Medido como area construida. Incluye hiladeros y señalizacion necesaria.	m2	1	Tecnia Constructiva	10/11/2025	1,00	11/11/2025
2.02	FABRICACIÓN de CICLOPARQUEADEROS EN ACERO INOXIDABLE de ancho 700mm, altura variable de 105mm, y 657mm, empotrado 30 cm, en tubería redonda de 2" de diámetro, doblado con arcos de 20 cm, calibre 14, incluye platina de anclaje De 1/4 de 2" , cordón de soldadura, corte con pulidora en piso de asfalto o concreto, demolición, excavación, Lotada de material, dado en concreto de 20x20x40 cm de 21 M/pa con acelerante, anticorrosivo epóxico, pintura, y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento según diseño.	und	4	Tecnia Constructiva	11/11/2025	12,00	26/11/2025
2.03	INSTALACIÓN de CICLOPARQUEADEROS EN ACERO INOXIDABLE de ancho 700mm, altura variable de 105mm, y 657mm, empotrado 30 cm, en tubería redonda de 2" de diámetro, doblado con arcos de 20 cm, calibre 14, incluye platina de anclaje De 1/4 de 2" , cordón de soldadura, corte con pulidora en piso de asfalto o concreto, demolición, excavación, Lotada de material, dado en concreto de 20x20x40 cm de 21 M/pa con acelerante, anticorrosivo epóxico, pintura, y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento según diseño.	und	4	Tecnia Constructiva	13/11/2025	2,00	27/11/2025
2.04	FABRICACIÓN de SEÑALIZACIÓN Vertical Ciclorruta tipo SI - Informativa de 0.45 x 0.45m, tablero elaborado en lamina galvanizada calibre 16 y recubierto en reflectivo tipo XI (Grado Diamante DG3), estructura tipo pedestal (Prof. 0,80 m y D=0,3 m) elaborada en tubería de 2", recubierta por pintura electrostática según normas y especificaciones del ministerio de vias y transportes, incluye suministro, transporte, pernos, aviso y anclajes, previa aprobación por parte de la interventoría. Y todo lo necesario para su correcta instalación	und	1	Tecnia Constructiva	21/11/2025	12,00	26/11/2025
2.05	INSTALACIÓN de señalización vertical Ciclorruta tipo SI - Informativa de 0.45 x 0.45m, tablero elaborado en lamina galvanizada calibre 16 y recubierto en reflectivo tipo XI (Grado Diamante DG3), estructura tipo pedestal (Prof. 0,80 m y D=0,3 m) elaborada en tubería de 2", recubierta por pintura electrostática según normas y especificaciones del ministerio de vias y transportes, incluye suministro, transporte, pernos, aviso y anclajes, previa aprobación por parte de la interventoría. Y todo lo necesario para su correcta instalación	und	1	Tecnia Constructiva	21/11/2025	2,00	27/11/2025
2.06	Suministro, transporte e instalación de PINTURA PARA DEMARCACIONES ZONAS, Incluye todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, Según	m2	11,05	Tecnia Constructiva	21/11/2025	2,00	24/11/2025

SECRETARIA MEDIO AMBIENTE PIAMONTE

3.07	Aplicación de pintura de ALTA VISIBILIDAD, DE GRAN ADHERENCIA Y RESISTENCIA tipo tráfico para demarcación de símbolos de discapacidad o bicicleta que proporciona perfecta adherencia sobre superficies en concreto y asfalto, incluye el suministro y el transporte del material y todo lo necesario para su correcta aplicación y funcionamiento.	und	1	Tecnico Constructivo	02/12/2023	2.00	04/12/2023
3.08	Aseo durante la obra y final	gl	1	Tecnico Constructivo	04/12/2023	1.00	05/12/2023
3.09	Empacado y retiro de escombros	vjs	1	Tecnico Constructivo	02/12/2023	1.00	04/12/2023
4	CASPARIS RODAS						
4.01	Localizacion, trazado y replanteo de edificaciones y urbanismo. Medido como área construida. Incluye hitaderia y señalización necesaria.	m2	1	Tecnico Constructivo	01/12/2023	1.00	04/12/2023
4.02	Cerramiento provisional en tela verde h:2.10m, incluye estructura de madera comun, anclajes de postes al piso y tela verde.	ML	21,7	Tecnico Constructivo	01/12/2023	12.00	13/12/2023
4.03	FABRICACION DE CAJUELAS PARA CONTADORES DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE de ancho 700mm, altura variable de 105mm, y 657mm, empotrado 30 cm, en tubería redonda de 2" de diámetro, doblado con arcos de 20 cm, calibre 14, incluye platina de anclaje De 1/4 de 2" , cordón de soldadura, corte con pulidora en piso de asfalto o concreto, demolición, excavación, botada de material, dado en concreto de 20x20x40 cm de 21 kpa con acelerante, anticorrosivo epóxico, pintura, y todos los elementos necesarios	und	4	Tecnico Constructivo	21/12/2023	12.00	03/01/2024
4.04	FABRICACION DE CAJUELAS PARA CONTADORES DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE de ancho 700mm, altura variable de 105mm, y 657mm, empotrado 30 cm, en tubería redonda de 2" de diámetro, doblado con arcos de 20 cm, calibre 14, incluye platina de anclaje De 1/4 de 2" , cordón de soldadura, corte con pulidora en piso de asfalto o concreto, demolición, excavación, botada de material, dado en concreto de 20x20x40 cm de 21 kpa con acelerante, anticorrosivo epóxico, pintura, y todos los elementos necesarios	und	4	Tecnico Constructivo	04/12/2023	2.00	04/12/2023
4.05	FABRICACIÓN de señalización vertical Ciclovía tipo SI - informativa de 0.45 x 0.45m, tablero elaborado en lamina galvanizada calibre 18 y recubierto en reflectivo tipo XI (Grado Diamante DG3), estructura tipo pedestal (Prof. 0,80 m y D=0,3 m) elaborada en tubería de 2", recubierta por pintura electrostática según normas y especificaciones del ministerio de vias y transportes. Incluye suministro, transporte, paralex, aviso y anclajes, previa aprobación por parte de la interventoría. Y todo lo necesario para su correcta instalación.	und	1	Tecnico Constructivo	21/12/2023	24.00	26/12/2023
4.06	INSTALACIÓN de señalización vertical Ciclovía tipo SI - informativa de 0.45 x 0.45m, tablero elaborado en lamina galvanizada calibre 18 y recubierto en reflectivo tipo XI (Grado Diamante DG3), estructura tipo pedestal (Prof. 0,80 m y D=0,3 m) elaborada en tubería de 2", recubierta por pintura electrostática según normas y especificaciones del ministerio de vias y transportes. Incluye suministro, transporte, paralex, aviso y anclajes, previa aprobación por parte de la interventoría. Y todo lo necesario para su correcta instalación.	und	1	Tecnico Constructivo	04/12/2023	2.00	05/12/2023
4.07	Suministro, transporte e instalación de PINTURA PARA DEMARCACIONES ZONAS, incluye todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, Según diseño.	m2	11	Tecnico Constructivo	01/12/2023	3.00	11/12/2023
4.08	Aplicación de pintura de ALTA VISIBILIDAD, DE GRAN ADHERENCIA Y RESISTENCIA tipo tráfico para demarcación de símbolos de discapacidad o bicicleta que proporciona perfecta adherencia sobre superficies en concreto y asfalto, incluye el suministro y el transporte del material y todo lo necesario para su correcta aplicación y funcionamiento.	und	1	Tecnico Constructivo	08/12/2023	3.00	12/12/2023
4.09	Aseo durante la obra y final	gl	1	Tecnico Constructivo	11/12/2023	3.00	13/12/2023
4.10	Empacado y retiro de escombros	vjs	1	Tecnico Constructivo	11/12/2023	3.00	13/12/2023

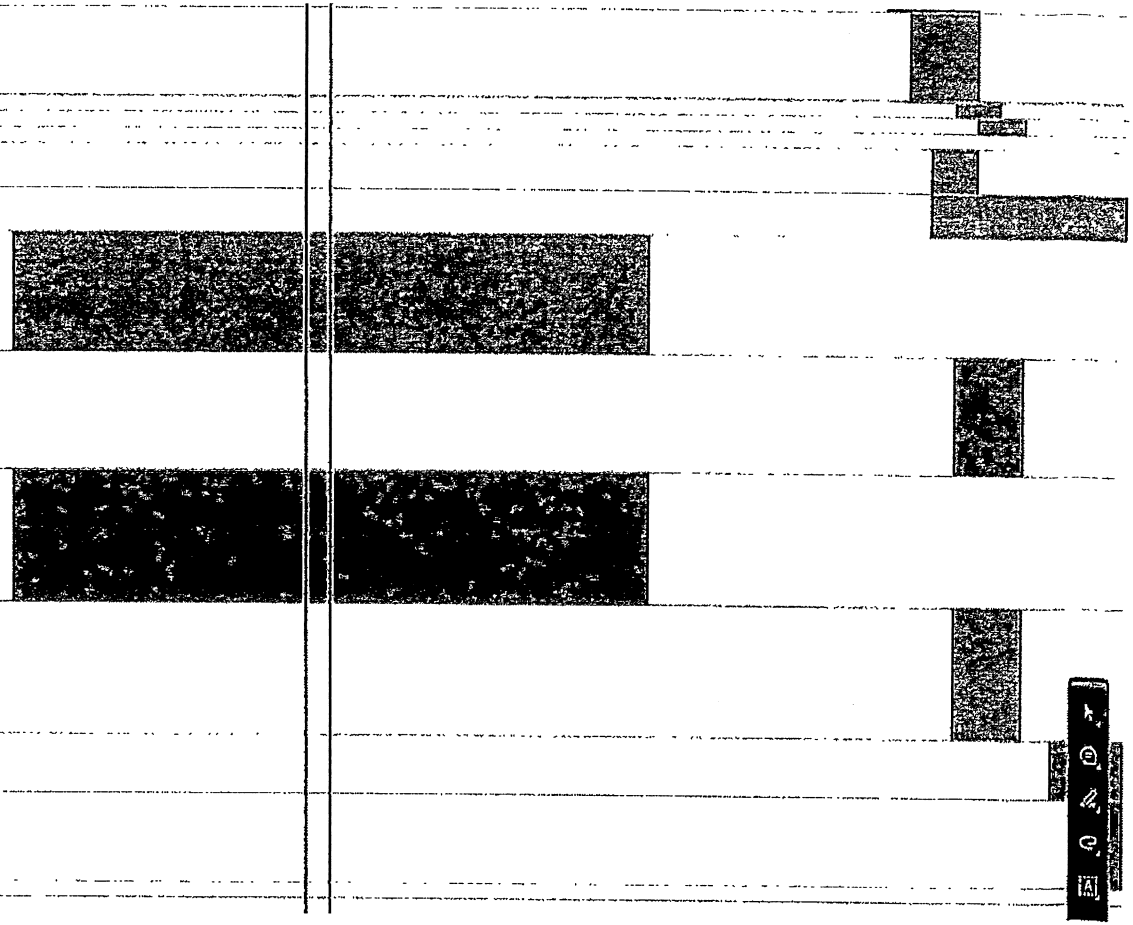

	CASA DE LA CULTURA						
6.01	Localizacion, trazado y replanteo de edificaciones y urbanismo, Medido como area construida. Incluye biladeros y señalizacion necesarios.	gl	1	Tecnico Constructivo	13/12/2023	1.00	14/12/2023
6.02	Cerramiento provisional en tela verde h; 2.10m. incluye estructura de madera comun, anclajes de parales al piso y tela verde.	ml	21,7	Tecnico Constructivo	13/12/2023	12.00	13/12/2023
6.03	FABRICACION de CICLOPARQUEADEROS EN ACERO INOXIDABLE de ancho 700mm, altura variable de 105mm, y 657mm, empotrado 30 cm, en tuberia redonda de 2" de diametro, doblado con arcos de 20 cm. calibre 14, incluye platina de anclaje De 1/4 de 2" , cordon de soldadura, corte con pulidora en piso de asfalto o concreto, demolición, excavación, botada de material, dado en concreto de 20x20x40 cm de 21 Mpa con acelerante, antioorrosivo epóxico, pintura, y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento según diseño.	Und	4	Tecnico Constructivo	21/12/2023	33.00	22/12/2023
6.04	INSTALACIÓN de CICLOPARQUEADEROS EN ACERO INOXIDABLE de ancho 700mm, altura variable de 105mm, y 657mm, empotrado 30 cm, en tuberia redonda de 2" de diametro, doblado con arcos de 20 cm. calibre 14, incluye platina de anclaje De 1/4 de 2" , cordon de soldadura, corte con pulidora en piso de asfalto o concreto, demolición, excavación, botada de material, dado en concreto de 20x20x40 cm de 21 Mpa con acelerante, antioorrosivo epóxico, pintura, y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento según diseño.		4	Tecnico Constructivo	04/12/2023	1.00	04/12/2023
6.04	FABRICACIÓN de señalización vertical Ciclorruta tipo SI - Informativa de 0.45 x 0.45m, tablero elaborado en lamina galvanizada calibre 16 y recubierto en reflectivo tipo XI (Grado Diamante DG3), estructura tipo pedestal (Prof. 0.80 m y D=0,3 m) elaborada en Liberia de 2", recubierta por pintura electrostática según normas y especificaciones del ministerio de Vias y transportes, incluye suministro, transporte, parales, aviso y anclajes, previa aprobación por parte de la interventoria. Y todo lo necesario para su correcta instalación.	Und	1	Tecnico Constructivo	21/12/2023	13.00	26/12/2023
	INSTALACIÓN de señalización vertical Ciclorruta tipo SI - Informativa de 0.45 x 0.45m, tablero elaborado en lamina galvanizada calibre 16 y recubierto en reflectivo tipo XI (Grado Diamante DG3), estructura tipo pedestal (Prof. 0.80 m y D=0,3 m) elaborada en Liberia de 2", recubierta por pintura electrostática según normas y especificaciones del ministerio de Vias y transportes, incluye suministro, transporte, parales, aviso y anclajes, previa aprobación por parte de la interventoria. Y todo lo necesario para su correcta instalación.		1	Tecnico Constructivo	04/12/2023	1.00	04/12/2023
6.05	Suministro, transporte e instalación de PINTURA PARA DEMARCACIONES ZONAS, incluye todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, Según diseño.	m2	11,05	Tecnico Constructivo	04/12/2023	1.00	04/12/2023
6.06	Aplicación de pintura de ALTA VISIBILIDAD, DE GRAN ADHERENCIA Y RESISTENCIA tipo tráfico para demarcación de símbolos de discapacidad o bicicleta que proporciona perfecta adherencia sobre superficies en concreto y asfalto, incluye el suministro y el transporte del material y todo lo necesario para su correcta aplicación y funcionamiento.	Und	1	Tecnico Constructivo	04/12/2023	1.00	11/12/2023
6.07	Aseo durante la obra y final	gl	1	Tecnico Constructivo	13/12/2023	1.00	13/12/2023
6.08	Empacada y retiro de escombros	Viaj	1	Tecnico Constructivo	13/12/2023	1.00	13/12/2023

	OFICINA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS							
7.01	Construcción de muro en dry wall doble cara para división interna de oficina. Incluye perfilería en lámina galvanizada, placa de yeso de 1/2", tornillos, masilla y pintura de acabado tipo I, color blanco.	m2	9,5	Tecnia Constructiva	14/11/2023	3.00	17/11/2023	
7.02	Suministro e instalación de puerta entamborada de 0,80x2,10 mtrs, en fórmica y pintura similar a las existentes. Incluye cerradura tipo pomo y rejilla de ventilación inferior en el mismo material de la puerta.	und	1	Tecnia Constructiva	14/11/2023	1.00	17/11/2023	
7.03	Suministro e instalación de zocalos en MDF o plastico, similar a los existentes	ml	5	Tecnia Constructiva	15/11/2023	1.00	19/11/2023	
7.04	Suministro e instalación de rejilla en aluminio anodizado mate de 30x50 cm, en muro, para recirculación de aire entre oficinas	und	1	Tecnia Constructiva	16/11/2023	1.00	17/11/2023	
7.05	Pintura de muros y cielos en vinilo tipo 1 para nueva oficina	m2	25,6	Tecnia Constructiva	15/11/2023	3.00	17/11/2023	
7.06	Construcción de cielo falso en baño de oficina, área de ingreso y área de baño. Incluye perfilería en lámina galvanizada, placa de yeso de 1/2", tornillos, masilla y pintura de acabado tipo 2, color blanco. Area aprox. 2,5 m2.	und	1	Tecnia Constructiva	15/11/2023	2.50	17/11/2023	
7.07	Suministro e instalación de extractor de olor axhelicoidal extraplano en cielo de baño. Incluye ducto de extracción para salida al exterior en muro lateral y conexión para funcionamiento con la iluminación del baño.	und	1	Tecnia Constructiva	17/11/2023	1.00	18/11/2023	
7.08	Reubicación de puntos eléctricos y puntos de red existentes en oficina	gl	1	Tecnia Constructiva	17/11/2023	0.50	17/11/2023	
7.09	Suministro e instalación de panelas LED de incrustar de 12W para área de baño. Incluye conexión de salida a punto de iluminación actual cercano.	und	2	Tecnia Constructiva	17/11/2023	0.50	17/11/2023	
7.10	Aseo durante la obra y final	gl	1	Tecnia Constructiva	14/11/2023	3.00	16/11/2023	
7.11	Transporte interno de material	gl	1	Tecnia Constructiva	14/11/2023	3.00	16/11/2023	
7.12	Retiro y botada de basura y sobrantes de obra	Vje	1	Tecnia Constructiva	13/11/2023	0.50	13/11/2023	

