ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01 DEL CONTRATO DE OBRA No. 029-2025

OBJETO: CONTRATACION DE OBRA Y MANTENIMIENTOS VARIOS DE TECHOS, CUBIERTAS, BATERIAS SANITARIAS Y ADECUACIONDE CIELO EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDE A Y SEDE ANEXA B DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE PRUDENCIO PADILLA CASO

VALOR INICIAL: SETENTA MILLONES SETECIENTOS DECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS MCTE ($70.716.759,19)

VALOR ACTUALIZADO: OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE ($84.286.448,99)

CONTRATISTA : SERVICIVIL S.A.S.

SUPERVISOR:

PERIODO A PAGAR: **DEL** 25 DE SEPTIEMBRE 2025 **AL** 18 DE NOVIEMBRE DE 2025

FECHA DE INICIO: 9/06/2025

FECHA FINAL: 5/10/2025

PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA 89,92%

PORCENTAJE ACUMULADO TOTAL 89,92%

A los DIECIOCHO (18) días del mes de Noviembre del año 2025 se reunieron JORGE TRUJILLO NIÑO en calidad de representante de la firma contratista y el señor WALTER RODRIGUEZ RODRIGUEZ supervisor del contrato, para realizar la presente acta de corte de las siguiente actividades según las siguientes consideraciones y las condiciones que se detallan a continuación

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO			CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO			CANTIDADES EJECUTADAS			VALORES EJECUTADOS			SALDOS	
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA No.01	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA No.01	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
	ITEMS CONTRACTUALES															
1,0	Mantenimiento de cubiertas en general, impermeabilización de 220 M2 de placas de las sedes A y B.	m2	220,00	$ 86.146,00	$ 18.952.120,00	253,00	$ 86.146,00	$ 21.794.938,00		253,00	253,00	$ -	$ 21.794.938,00	$ 21.794.938,00	-	$ -
2,0	Mantenimiento y adecuación de cielo raso en las aulas 33, 34, 42 y 43 del segundo nivel del bloque 14 de aulas en la sede A.	m2	224,00	$ 86.615,00	$ 19.401.760,00	-	$ 86.615,00	$ -		-	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
3,0	Mantenimiento de las baterías sanitarias de las sedes A y B.	glb	1,00	$ 3.255.450,00	$ 3.255.450,00	-	$ 3.255.450,00	$ -		-	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
4,0	Mantenimiento y adecuación del cielo raso en el corredor del segundo nivel del bloque 14 de aulas en la sede A.	m2	220,00	$ 86.615,00	$ 19.055.300,00	12,00	$ 86.615,00	$ 1.039.380,00		12,00	12,00	$ -	$ 1.039.380,00	$ 1.039.380,00	-	$ -
	ITEMS NO PREVISTOS															
5,0	Instalación de mortero de nivelación impermeabilizado incluye aditivo de adherencia a placa en concreto existente.	m2		$ 72.145,00	$ -	200,00	$ 72.145,00	$ 14.429.000,00		200,00	200,00	$ -	$ 14.429.000,00	$ 14.429.000,00	-	$ -
6,0	Limpieza, Retiro y Disposición final de escombros y desechos.	global		$ 397.642,00	$ -	1,00	$ 397.642,00	$ 397.642,00		-	-	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 397.642,00
7,0	Manejo y control de vectores en parte superior externa de los salones del segundo piso del bloque nuevo, realce de muro y sellos contracubierta incluye(ladrillos, mortero, espuma expansiva, icopor y cinta sellante)	ml		$ 158.258,06	$ -	45,50	$ 158.258,06	$ 7.200.742,64		45,50	45,50	$ -	$ 7.200.742,64	$ 7.200.742,64	-	$ -
8,0	Manejo y control de vectores en parte superior interna (que colindan con el pasillo) de los salones del segundo piso del bloque nuevo, realce de muro incluye con material superboard o similar, perfiles galvanizados y cinta sellante	m2		$ 86.615,00	$ -	6,48	$ 86.615,00	$ 561.265,00		6,48	6,48	$ -	$ 561.265,00	$ 561.265,00	-	$ -
9,0	Desmonte de cielo raso en corredor del segundo nivel en bloque nuevo sede A	m2		$ 19.994,70	$ -	168,00	$ 19.994,70	$ 3.359.109,60		168,00	168,00	$ -	$ 3.359.109,60	$ 3.359.109,60	-	$ -
10,0	Mantenimiento y adecuacion de cielo raso en las aulas 41, 42, 43 y 44 del segundo nivel del bloque nuevo de aulas en la sede A	m2		$ 86.615,00	$ -	234,00	$ 86.615,00	$ 20.267.910,00		192,00	192,00	$ -	$ 16.630.080,00	$ 16.630.080,00	42,00	$ 3.637.830,00
11,0	Adecuacion de baños en sede B. Incluye suministro e instalacion de sanitario y orinal.	glb		$ 3.255.450,00	$ -	1,00	$ 3.255.450,00	$ 3.255.450,00		-	-	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 3.255.450,00
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 60.664.630,00			$ 73.305.437,00				$ -	$ 65.014.515,00	$ 65.014.515,00		$ 7.290.922,00
	VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS				$ 9.706.340,80			$ 11.568.870,00				$ -	$ 10.402.322,00	$ 10.402.322,00		$ 1.166.548,00
	ADMINISTRACIÓN	11%			$ 8.673.109,30			$ 7.953.586,00				$ -	$ 7.151.597,00	$ 7.151.597,00		$ 802.001,00
	IMPREVISTOS	2%			$ 1.213.292,60			$ 1.446.109,00				$ -	$ 1.300.290,00	$ 1.300.290,00		$ 145.819,00
	UTILIDAD	3%			$ 1.819.938,90			$ 2.169.163,00				$ -	$ 1.950.435,00	$ 1.950.435,00		$ 218.728,00
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS				$ 70.370.970,80			$ 83.874.307,00				$ -	$ 75.416.837,00	$ 75.416.837,00		$ 8.457.470,00
	VALOR DEL IVA SOBRE UTILIDAD	19%			345.788,39			412.141,00				$ -	$ 370.583,00	$ 370.583,00		$ 41.558,00
	VALOR A PAGAR				$ 70.716.759,19			$ 84.286.448,00				$ -	$ 75.787.420,00	$ 75.787.420,00		$ 8.499.028,00

SON: SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MCTE ($75,787,420.00)

El recibo por parte de la supervisión de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta de parcial de obra los que en ella intervinieron.

Firma:
Nombre: **JORGE TRUJILLO NIÑO**
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA

Firma:
Nombre: **WALTER RODRIGUEZ RODRIGUEZ**
SUPERVISOR
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CASO JOSE PRUDENCIO PADILLA

NOTA. Se informa que la presente acta, se puede cancelar teniendo como base el principio de confiabilidad y responsabilidad del supervisor y el contratista.
Las mediciones en campo y las revisiones documentales que deberán hacerse por parte del supervisor(a).
Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del supervisor y el contratista.

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01 DEL CONTRATO DE OBRA No. 029-2025

OBJETO: CONTRATACION DE OBRA Y MANTENIMIENTOS VARIOS DE TECHOS, CUBIERTAS, BATERIAS SANITARIAS Y ADECUACIONDE CIELO EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDE A Y SEDE ANEXA B DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE PRUDENCIO PADILLA CASD.

VALOR INICIAL: SETENTA MILLONES SETECIENTOS DECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS MCTE ($70.716.759,19)

VALOR ACTUALIZADO: OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE ($84.286.448,00)

CONTRATISTA : SERVICIVIL S.A.S.

SUPERVISOR:

PERIODO A PAGAR: **DEL** 25 DE SEPTIEMBRE 2025 **AL** 18 DE NOVIEMBRE DE 2025

FECHA DE INICIO: 6/08/2025

FECHA FINAL: 5/10/2025

PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA 89,92%

PORCENTAJE ACUMULADO TOTAL 89,92%

A los DIECIOCHO (18) días del mes de Noviembre del año 2025 se reunieron JORGE TRUJILLO NIÑO en calidad de representante de la firma contratista y el señor WALTER RODRIGUEZ RODRIGUEZ supervisor del contrato, para realizar la presente acta de corte de las siguiente actividades según los siguientes considerandos y las condiciones que se detallan a continuación.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO			CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO			CANTIDADES EJECUTADAS			VALORES EJECUTADOS			SALDOS	
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA No.01	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA No.01	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
	ITEMS CONTRACTUALES															
1,0	Mantenimiento de cubiertas en general, impermeabilización de 220 M2 de placas de las sedes A y B.	m2	220,00	$ 86.146,00	$ 18.952.120,00	253,00	$ 86.146,00	$ 21.794.938,00		253,00	253,00	$ -	$ 21.794.938,00	$ 21.794.938,00	-	$ -
2,0	Mantenimiento y adecuación de cielo raso en las aulas 33, 34, 42 y 43 del segundo nivel del bloque 14 de aulas en la sede A.	m2	224,00	$ 86.615,00	$ 19.401.760,00	-	$ 86.615,00	$ -		-	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
3,0	Mantenimiento de las baterías sanitarias de las sedes A y B.	glb	1,00	$ 3.255.450,00	$ 3.255.450,00	-	$ 3.255.450,00	$ -		-	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
4,0	Mantenimiento y adecuación del cielo raso en el corredor del segundo nivel del bloque 14 de aulas en la sede A.	m2	220,00	$ 86.615,00	$ 19.055.300,00	12,00	$ 86.615,00	$ 1.039.380,00		12,00	12,00	$ -	$ 1.039.380,00	$ 1.039.380,00	-	$ -
	ITEMS NO PREVISTOS															
5,0	Instalación de mortero de nivelación impermeabilizado incluya aditivo de adherencia a placa en concreto existente.	m2		$ 72.145,00	$ -	200,00	$ 72.145,00	$ 14.429.000,00		200,00	200,00	$ -	$ 14.429.000,00	$ 14.429.000,00	-	$ -
6,0	Limpieza, Retiro y Disposición final de escombros y desechos.	global		$ 397.642,00	$ -	1,00	$ 397.642,00	$ 397.642,00		-	-	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 397.642,00
7,0	Manejo y control de vectores en parte superior externa de los salones del segundo piso del bloque nuevo, realce de muro y sellos contracubierta incluye(ladrillos, mortero, espuma expansiva, icopor y cinta sellante)	ml		$ 158.258,08	$ -	45,50	$ 158.258,08	$ 7.200.742,64		45,50	45,50	$ -	$ 7.200.742,64	$ 7.200.742,64	-	$ -
8,0	Manejo y control de vectores en parte superior interna (que colindan con el pasillo) de los salones del segundo piso del bloqun nuevo, realce de muro incluye con material superboard o similar, perfiles galvanizados y cinta sellante	m2		$ 86.615,00	$ -	6,48	$ 86.615,00	$ 561.265,00		6,48	6,48	$ -	$ 561.265,00	$ 561.265,00	-	$ -
9,0	Desmonte de cielo raso en corredor del segundo nivel en bloque nuevo sede A	m2		$ 19.994,70	$ -	168,00	$ 19.994,70	$ 3.359.109,60		168,00	168,00	$ -	$ 3.359.109,60	$ 3.359.109,60	-	$ -
10,0	Mantenimiento y adecuacion de cielo raso en las aulas 41, 42, 43 y 44 del segundo nivel del bloque nuevo de aulas en la sede A	m2		$ 86.615,00	$ -	234,00	$ 86.615,00	$ 20.267.910,00		192,00	192,00	$ -	$ 16.630.080,00	$ 16.630.080,00	42,00	$ 3.637.830,00
11,0	Adecuacion de baños en sede B. incluye suministro e instalacion de sanitario y orinal.	glb		$ 3.255.450,00	$ -	1,00	$ 3.255.450,00	$ 3.255.450,00		-	-	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 3.255.450,00
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 60.664.630,00			$ 72.305.437,00				$ -	$ 65.014.515,00	$ 65.014.515,00		$ 7.290.922,00
	VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS				$ 9.706.340,80			$ 11.568.870,00				$ -	$ 10.402.322,00	$ 10.402.322,00		$ 1.166.548,00
	ADMINISTRACIÓN	11%			$ 6.673.109,30			$ 7.953.588,00				$ -	$ 7.151.597,00	$ 7.151.597,00		$ 802.001,00
	IMPREVISTOS	2%			$ 1.213.292,60			$ 1.446.109,00				$ -	$ 1.300.290,00	$ 1.300.290,00		$ 145.819,00
	UTILIDAD	3%			$ 1.819.938,90			$ 2.169.163,00				$ -	$ 1.950.435,00	$ 1.950.435,00		$ 218.728,00
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS				$ 70.370.970,80			$ 83.874.307,00				$ -	$ 75.416.837,00	$ 75.416.837,00		$ 8.457.470,00
	VALOR DEL IVA SOBRE UTILIDAD	19%			345.788,39			412.141,00				$ -	$ 370.583,00	$ 370.583,00		$ 41.558,00
	VALOR A PAGAR				$ 70.716.759,19			$ 84.286.448,00				$ -	$ 75.787.420,00	$ 75.787.420,00		$ 8.499.028,00

SON: SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MCTE ($75,787,420.00)

El recibo por parte de la supervisión de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra.
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta de parcial de obra los que en ella intervienen.

Firma:
Nombre: **JORGE TRUJILLO NIÑO**
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA

Firma:
Nombre: **WALTER RODRIGUEZ RODRIGUEZ**
SUPERVISOR
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CASD JOSE PRUDENCIO PADILLA

NOTA: Se informa que la presente acta, se puede cancelar tomando como base el principio de confiabilidad y responsabilidad del supervisor y el contratista.
Las inexactitudes en campo y las revisiones documentales que deberán hacerse por parte del supervisor(a).
Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del supervisor y el contratista.

SERVICIVIL SAS	**CONTRATACION DE OBRA Y MANTENIMIENTOS VARIOS DE TECHOS, CUBIERTAS, BATERIAS SANITARIAS Y ADECUACIONDE CIELO EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDE A Y SEDE ANEXA B DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE PRUDENCIO PADILLA CASD.**	CASD

CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	**NIT**	800.147.909-3	**CTO OBRA PUBLICA N°**	029-2025

FECHA	**DIA**	18	**MES**	11	**AÑO**	2025	**ACTA N°**	ACTA PARCIAL No.01	**ELABORÓ**	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	**8,0**	**DESCRIPCIÓN**	Manejo y control de vectores en parte superior interna (que colindan con el pasillo) de los salones del segundo piso del bloque nuevo, realce de muro incluye con material superboard o similar, perfiles galvalzados y cinta sellante	**UNIDAD**	m2

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO



Observaciones:

Contratista Residente de Obra Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO	Supervisor Arq. WALTER RODRIGUEZ RODRIGUEZ

SERVICIVIL SAS	**CONTRATACION DE OBRA Y MANTENIMIENTOS VARIOS DE TECHOS, CUBIERTAS, BATERIAS SANITARIAS Y ADECUACIONDE CIELO EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDE A Y SEDE ANEXA B DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE PRUDENCIO PADILLA CASD.**	CASD

CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	**NIT**	800.147.909-3	**CTO OBRA PUBLICA N°**	029-2025		

FECHA	**DIA**	18	**MES**	11	**AÑO**	2025	**ACTA N°**	ACTA PARCIAL No.01	**ELABORÓ**	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	**8,0**	**DESCRIPCIÓN**	Manejo y control de vectores en parte superior interna (que colindan con el pasillo) de los salones del segundo piso del bloque nuevo, realce de muro incluye con material superboard o similar, perfiles galvalzados y cinta sellante	**UNIDAD**	m2

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO







Observaciones:

Contratista Residente de Obra Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO	Supervisor Arq. WALTER RODRIGUEZ RODRIGUEZ


SERVICIVIL SAS	**CONTRATACION DE OBRA Y MANTENIMIENTOS VARIOS DE TECHOS, CUBIERTAS, BATERIAS SANITARIAS Y ADECUACIONDE CIELO EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDE A Y SEDE ANEXA B DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE PRUDENCIO PADILLA CASD.**	CASD

CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	**NIT**	800.147.909-3	**CTO OBRA PUBLICA N°**	029-2025

FECHA	**DIA**	18	**MES**	11	**AÑO**	2025	**ACTA N°**	ACTA PARCIAL No.01	**ELABORÓ**	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	**8,0**	**DESCRIPCIÓN**	Desmonte de cielo raso en corredor del segundo nivel en bloque nuevo sede A	**UNIDAD**	m2

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO

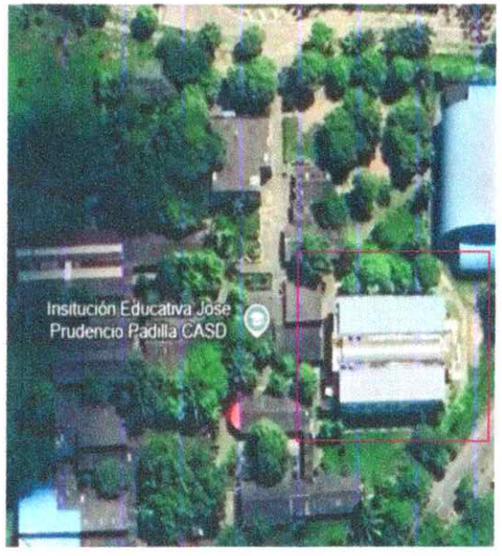





OPERACIONES MATEMATICAS

Desmonte de cielo raso en corredor del segundo nivel en bloque nuevo sede A

RESUMEN DE CÁLCULOS

ÁREA TOTAL A DESMONTAR CORREDOR SEGUNDO NIVEL

AREA TOTAL	168	M2

CANTIDAD TOTAL	**168,00**	**M2**

Observaciones:

Contratista Residente de Obra Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO	Supervisor Arq. WALTER RODRIGUEZ RODRIGUEZ

SERVICIVIL SAS	**CONTRATACION DE OBRA Y MANTENIMIENTOS VARIOS DE TECHOS, CUBIERTAS, BATERIAS SANITARIAS Y ADECUACIONDE CIELO EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDE A Y SEDE ANEXA B DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE PRUDENCIO PADILLA CASD.**	CASD

CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	**NIT**	800.147.909-3	**CTO OBRA PUBLICA N°**	029-2025

FECHA	**DIA**	18	**MES**	11	**AÑO**	2025	**ACTA N°**	ACTA PARCIAL No.01	**ELABORÓ**	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	**8,0**	**DESCRIPCIÓN**	Desmonte de cielo raso en corredor del segundo nivel en bloque nuevo sede A	**UNIDAD**	m2

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO	**OPERACIONES MATEMATICAS**



Observaciones:

Contratista Residente de Obra Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO	Supervisor Arq. WALTER RODRIGUEZ RODRIGUEZ

SERVICIVIL SAS	**CONTRATACION DE OBRA Y MANTENIMIENTOS VARIOS DE TECHOS, CUBIERTAS, BATERIAS SANITARIAS Y ADECUACIONDE CIELO EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDE A Y SEDE ANEXA B DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE PRUDENCIO PADILLA CASD.**	CASD

CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	**NIT**	800.147.909-3	**CTO OBRA PUBLICA N°**	029-2025

FECHA	**DIA**	18	**MES**	11	**AÑO**	2025	**ACTA N°**	ACTA PARCIAL No.01	**ELABORÓ**	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	**8,0**	**DESCRIPCIÓN**	Desmonte de cielo raso en corredor del segundo nivel en bloque nuevo sede A	**UNIDAD**	m2

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO	**OPERACIONES MATEMATICAS**



Observaciones:

Contratista Residente de Obra Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO	Supervisor Arq. WALTER RODRIGUEZ RODRIGUEZ

SERVICIVIL SAS	**CONTRATACION DE OBRA Y MANTENIMIENTOS VARIOS DE TECHOS, CUBIERTAS, BATERIAS SANITARIAS Y ADECUACIONDE CIELO EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDE A Y SEDE ANEXA B DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE PRUDENCIO PADILLA CASD.**	CASD

CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	**NIT**	800.147.909-3	**CTO OBRA PUBLICA N°**	029-2025

FECHA	**DIA**	18	**MES**	11	**AÑO**	2025	**ACTA N°**	ACTA PARCIAL No.01	**ELABORÓ**	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	**8,0**	**DESCRIPCIÓN**	Mantenimiento y adecuacion de cielo raso en las aulas 41, 42, 43 y 44 del segundo nivel del bloque nuevo de aulas en la sede A	**UNIDAD**	m2

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO







OPERACIONES MATEMATICAS

Mantenimiento y adecuacion de cielo raso en las aulas 41, 42, 43 y 44 del segundo nivel del bloque nuevo de aulas en la sede A

RESUMEN DE CÁLCULOS

	ANCHO		LARGO		TOTAL	
ÁREA POR SALON	7,8	*	7,5	=	58,5	M2
NUMERO DE SALONES INTERVENIDOS				=	3,2821	UND
TOTAL ÁREA INTERVENIDA				=	192	M2

CANTIDAD TOTAL	**192,00**	**M2**

Observaciones:

Contratista Residente de Obra Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO	Supervisor Arq. WALTER RODRIGUEZ RODRIGUEZ

SERVICIVIL SAS	**CONTRATACION DE OBRA Y MANTENIMIENTOS VARIOS DE TECHOS, CUBIERTAS, BATERIAS SANITARIAS Y ADECUACIONDE CIELO EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDE A Y SEDE ANEXA B DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE PRUDENCIO PADILLA CASD.**	CASD

CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	**NIT**	800.147.909-3	**CTO OBRA PUBLICA N°**	029-2025

FECHA	**DIA**	18	**MES**	11	**AÑO**	2025	**ACTA N°**	ACTA PARCIAL No.01	**ELABORÓ**	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	**8,0**	**DESCRIPCIÓN**	Mantenimiento y adecuacion de cielo raso en las aulas 41, 42, 43 y 44 del segundo nivel del bloque nuevo de aulas en la sede A	**UNIDAD**	m2

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO	**OPERACIONES MATEMATICAS**



Observaciones:

Contratista Residente de Obra Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO	Supervisor Arq. WALTER RODRIGUEZ RODRIGUEZ
