
SEGUIMIENTO FINAL PLAN DE CHOQUE PROYECTO SIES CCTV-NUSE 123 LETICIA, AMAZONAS

PROYECTO SIES CCTV-NUSE 123 LETICIA-AMAZONAS

						VALOR PLANEADO									VALOR EJECUTADO								
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CAN	VR/UNIT	VR/TOTAL	07-jul-25	13-jul-25	20-jul-25	27-jul-25	31-jul-25	03-ago-25	10-ago-25	18-ago-25	31-ago-25	07-jul-25	13-jul-25	20-jul-25	27-jul-25	31-jul-25	03-ago-25	10-ago-25	18-ago-25	31-ago-25
PROYECTO SIES CCTV-NUSE 123 LETICIA-AMAZONAS					$ 6.903.004.242,00	77,41%	87,57%	89,81%	90,39%	91,89%	91,89%	99,10%	100,00%	100,00%	77,41%	88,00%	90,35%	91,79%	91,99%	92,40%	94,30%	96,12%	100,00%
1.1	ESTUDIOS Y DISEÑOS	GLB	1	$ 208.226.891,00	$ 208.226.891,00	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,02%	3,02%	3,02%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,02%	3,02%	3,02%
2.1.A	ESTACION DE TRABAJO OPERADOR 123 WORKSTATION TIPO 1	UND	9	$ 31.214.590,00	$ 280.931.310,00	2,43%	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%	4,07%	4,07%	4,07%	2,43%	2,56%	2,59%	2,59%	2,59%	2,59%	3,39%	2,71%	4,07%
2.2.A	MODULOS- PUESTOS DE TRABAJO (Puestos de trabajo, sillas, gaveta, porta cpu)	UND	9	$ 5.806.390,00	$ 52.257.510,00	0,45%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,76%	0,76%	0,76%	0,45%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,76%	0,76%	0,76%
2.03	PLANTA TELEFÓNICA SOLUCION TELEFONICA + TEL IP	UND	1	$ 57.170.316,00	$ 57.170.316,00	0,49%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,83%	0,83%	0,83%	0,49%	0,74%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,79%	0,83%	0,83%
2.04	GRABADORA DE VOZ	UND	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	1,30%	1,45%	1,45%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,87%	0,87%	1,45%
2.05	SERVIDOR SUBSISTEMA 123	UND	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	1,30%	1,45%	1,45%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,87%	0,87%	1,45%
	LICENCIA ORACLE	UND	0	$ 36.211.924,00	$ -	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.06	EQUIPO DE ADMINISTRACION TIPO RACK DESLIZANTE	UND	1	$ 19.330.807,00	$ 19.330.807,00	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,28%	0,28%	0,28%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,28%	0,28%
2.07	SWITCH KVM	UND	1	$ 7.182.300,00	$ 7.182.300,00	0,06%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,10%	0,10%	0,10%	0,06%	0,09%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
2.08	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UND	1	$ 10.639.880,00	$ 10.639.880,00	0,09%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,15%	0,15%	0,15%	0,09%	0,14%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%
2.09	MUEBLE PARA IMPRESORA	UND	1	$ 1.094.519,00	$ 1.094.519,00	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
2.10	REMOTIZACION DE AUDIO (HARDWARE Y SOFTWARE)	UND	4	$ 1.062.200,00	$ 4.248.800,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	0,06%	0,06%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%
2.11	MANOS LIBRES Y/O DIADEMAS PROFESIONALES	UND	50	$ 1.956.450,00	$ 97.822.500,00	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	1,41%	1,41%	1,42%	1,42%	1,42%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	1,41%	1,42%	1,42%	1,42%
2.12	SWITCH TIPO 6	UND	1	$ 35.743.200,00	$ 35.743.200,00	0,31%	0,46%	0,46%	0,49%	0,49%	0,49%	0,52%	0,52%	0,52%	0,31%	0,46%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,52%	0,52%
2.01.B	ESTACION DE TRABAJO OPERADOR CCTV WORKSTATION TIPO 1	UND	3	$ 31.214.590,00	$ 93.643.770,00	0,81%	1,21%	1,28%	1,28%	1,28%	1,28%	1,36%	1,36%	1,36%	0,81%	1,21%	1,28%	1,28%	1,28%	1,28%	1,29%	1,36%	1,36%
2.02.B	MODULOS- PUESTOS DE TRABAJO (Puestos de trabajo, sillas, gaveta, porta cpu)	UND	3	$ 5.806.390,00	$ 17.419.170,00	0,15%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,15%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%
3.01	CÁMARAS PTZ TIPO DOMO (TIPO 2)	UND	50	$ 17.023.500,00	$ 851.175.000,00	11,04%	11,04%	11,04%	11,04%	11,65%	11,65%	12,33%	12,33%	12,33%	11,04%	11,04%	11,11%	11,49%	11,55%	11,55%	11,84%	12,06%	12,33%
3.02	CÁMARAS FIJAS TIPO 1	UND	40	$ 5.900.120,00	$ 236.004.800,00	3,06%	3,06%	3,06%	3,06%	3,23%	3,23%	3,42%	3,42%	3,42%	3,06%	3,06%	3,09%	3,18%	3,21%	3,21%	3,27%	3,32%	3,42%
3.03	FIBRA ÓPTICA MONOMODO + FUSION	ML	31200	$ 36.232,00	$ 1.130.438.400,00	15,44%	15,44%	15,48%	15,48%	15,48%	15,48%	16,38%	16,38%	16,38%	15,44%	15,44%	15,75%	16,11%	16,11%	16,11%	16,19%	16,38%	16,38%
3.04	SWITCH TIPO 1	UN	50	$ 4.810.200,00	$ 240.510.000,00	2,08%	2,70%	3,15%	3,29%	3,29%	3,29%	3,48%	3,48%	3,48%	2,08%	2,98%	3,00%	3,11%	3,13%	3,13%	3,21%	3,41%	3,48%
3.05	SWITCH TIPO 6	UND	1	$ 35.743.200,00	$ 35.743.200,00	0,31%	0,46%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,52%	0,52%	0,52%	0,31%	0,46%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,52%	0,52%
3.06	SISTEMA DE VISUALIZACION	UND	1	$ 85.223.788,00	$ 85.223.788,00	0,74%	1,11%	1,17%	1,17%	1,17%	1,17%	1,23%	1,23%	1,23%	0,74%	1,11%	1,17%	1,17%	1,17%	1,17%	1,17%	1,23%	1,23%
3.07	MONITOR DE VISUALIZACION	UND	8	$ 24.834.359,00	$ 198.674.872,00	2,00%	2,58%	2,72%	2,72%	2,72%	2,72%	2,88%	2,88%	2,88%	2,00%	2,58%	2,88%	2,88%	2,88%	2,72%	2,73%	2,88%	2,88%
3.08	JOYSTICK DE OPERACIÓN	UND	4	$ 6.092.565,00	$ 24.370.260,00	0,25%	0,32%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,35%	0,35%	0,35%	0,25%	0,32%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,34%	0,35%	0,35%
3.09	UPS DE 2KVA	UND	50	$ 5.211.492,00	$ 260.574.600,00	3,38%	3,38%	3,42%	3,57%	3,57%	3,57%	3,77%	3,77%	3,77%	3,38%	3,38%	3,40%	3,52%	3,52%	3,52%	3,62%	3,77%	3,77%
3.10	UPS DE 15KVA	UND	1	$ 59.021.172,00	$ 59.021.172,00	0,60%	0,77%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,86%	0,86%	0,86%	0,60%	0,77%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,86%	0,86%
3.11	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO POR CAMARA	UND	90	$ 10.341.887,00	$ 930.769.830,00	8,05%	12,07%	12,74%	12,74%	12,74%	12,74%	13,48%	13,48%	13,48%	8,05%	12,07%	12,74%	12,74%	12,74%	12,74%	12,81%	13,48%	13,48%
3.12	SERVIDOR VMS	UND	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00	1,01%	1,29%	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	1,45%	1,45%	1,45%	1,01%	1,29%	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	1,45%	1,45%
3.13	SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTOL Y ADMINISTRACION	UND	1	$ 48.516.369,00	$ 48.516.369,00	0,42%	0,63%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,70%	0,70%	0,70%	0,42%	0,63%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,67%	0,70%	0,70%
3.14	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTU	UND	1	$ 13.178.300,00	$ 13.178.300,00	0,11%	0,17%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,19%	0,19%	0,19%	0,11%	0,17%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,19%	0,19%
3.15	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 36000 BTU	UND	1	$ 18.366.395,00	$ 18.366.395,00	0,16%	0,24%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,27%	0,27%	0,27%	0,16%	0,24%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,27%	0,27%
4.01	GABINETES DE POSTE/FACHADA	UND	50	$ 3.672.337,00	$ 183.616.850,00	2,65%	2,65%	2,65%	2,65%	2,65%	2,65%	2,66%	2,66%	2,66%	2,65%	2,65%	2,65%	2,65%	2,65%	2,65%	2,66%	2,66%	2,66%
4.02	CORONAS ANTIESCALATORIAS	UND	50	$ 413.346,00	$ 20.667.300,00	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%
4.03	ALIMENTACION Y DISTRIBUCION ELECTRICA CENTRO DE CONTROL	GL	1	$ 54.393.250,00	$ 54.393.250,00	0,47%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,79%	0,79%	0,79%	0,47%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,79%	0,79%	0,79%
4.04	BRAZOS SOPORTE PARA CAMARAS	UND	50	$ 557.288,00	$ 27.864.400,00	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%
4.05	SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (Puntos de cámara y sala de control y nodo) TIPO 2	UND	51	$ 3.651.535,00	$ 186.228.285,00	1,88%	2,16%	2,45%	2,54%	2,62%	2,62%	2,70%	2,70%	2,70%	1,88%	2,20%	2,45%	2,54%	2,62%	2,62%	2,65%	2,70%	2,70%
4.06	CANALIZACION ELECTRICA DE CAMARAS Y NODOS	UND	50	$ 3.655.292,00	$ 182.764.600,00	2,10%	2,33%	2,51%	2,57%	2,60%	2,60%	2,65%	2,65%	2,65%	2,10%	2,46%	2,55%	2,59%	2,60%	2,61%	2,64%	2,65%	2,65%
4.07	GABINETES EQUIPOS CUARTO DE EQUIPOS	UND	3	$ 3.966.492,00	$ 11.899.476,00	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%
4.08	PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO	UND	19	$ 1.278.587,00	$ 24.293.153,00	0,21%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,21%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%
4.09	CONTROL DE ACCESO FACIAL A SALA DE CONTROL	UND	2	$ 18.300.500,00	$ 36.601.000,00	0,37%	0,47%	0,47%	0,50%	0,50%	0,50%	0,53%	0,53%	0,53%	0,37%	0,47%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,53%	0,53%
4.10	SISTEMA DE APERTURA	UND	2	$ 6.537.886,00	$ 13.075.772,00	0,11%	0,17%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,19%	0,19%	0,19%	0,11%	0,17%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,19%	0,19%
4.11	SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS, ESTACION MANUAL EXTINTOR, LUZ ESTROBOSCOPICA Y CONTROL DE ACCESO	UND	1	$ 31.160.358,00	$ 31.160.358,00	0,27%	0,40%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,45%	0,45%	0,45%	0,27%	0,40%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,45%	0,45%
4.12	LOCKER METALICO DE DOBLE COMPARTIMIENTO	UND	2	$ 1.633.269,00	$ 3.266.538,00	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,05%	0,05%	0,05%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,05%	0,05%
4.13	ARCHIVADORES RODANTES	UND	1	$ 8.785.000,00	$ 8.785.000,00	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,13%	0,13%	0,13%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,13%
5.01	**ADAPTACION CENTRO DE MONITOREO Y CUARTO DE EQUIPOS**	GL	1	$ 80.371.084,00	$ 80.371.084,00	0,83%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	1,16%	1,16%	1,16%	0,83%	0,97%	0,97%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,16%	1,16%
6.01	**KIT SEGURIDAD CAI's Y/O ESTACIONES DE POLICÍA**	KIT	3	$ 40.126.892,00	$ 120.380.676,00	1,35%	1,56%	1,56%	1,65%	1,65%	1,65%	1,74%	1,74%	1,74%	1,35%	1,56%	1,56%	1,68%	1,68%	1,68%	1,69%	1,74%	1,74%
7.01	PLANTA ELECTRICA DE 40KVA Y TRANSFERENCIA	UND	1	$ 106.009.646,00	$ 106.009.646,00	0,92%	0,92%	0,92%	0,92%	0,92%	0,92%	0,92%	1,54%	1,54%	0,92%	0,92%	0,92%	0,92%	0,92%	0,92%	0,92%	0,92%	1,54%
7.02	AIRE ACONDICIONADO DE 2 CASSETTE 24BTU	UND	2	$ 26.483.515,00	$ 52.967.030,00	0,46%	0,69%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,77%	0,77%	0,77%	0,46%	0,69%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,77%	0,77%
7.03	POSTES TIPO 3 E INSTALACION	UND	50	$ 7.446.459,00	$ 372.322.950,00	5,04%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,39%	5,39%	5,39%	5,04%	5,20%	5,21%	5,21%	5,21%	5,21%	5,27%	5,39%	5,39%
7.04	MONITOR ESTACION OPERADOR	UND	24	$ 2.860.297,00	$ 68.647.128,00	0,59%	0,69%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,99%	0,99%	0,99%	0,59%	0,69%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,86%	0,75%	0,99%

CURVA S (VALOR PLANEADO x VALOR EJECUTADO PLAN CHOQUE 7 DE JULIO)
PROYECTO SIES CCTV-NUSE 123 LETICIA

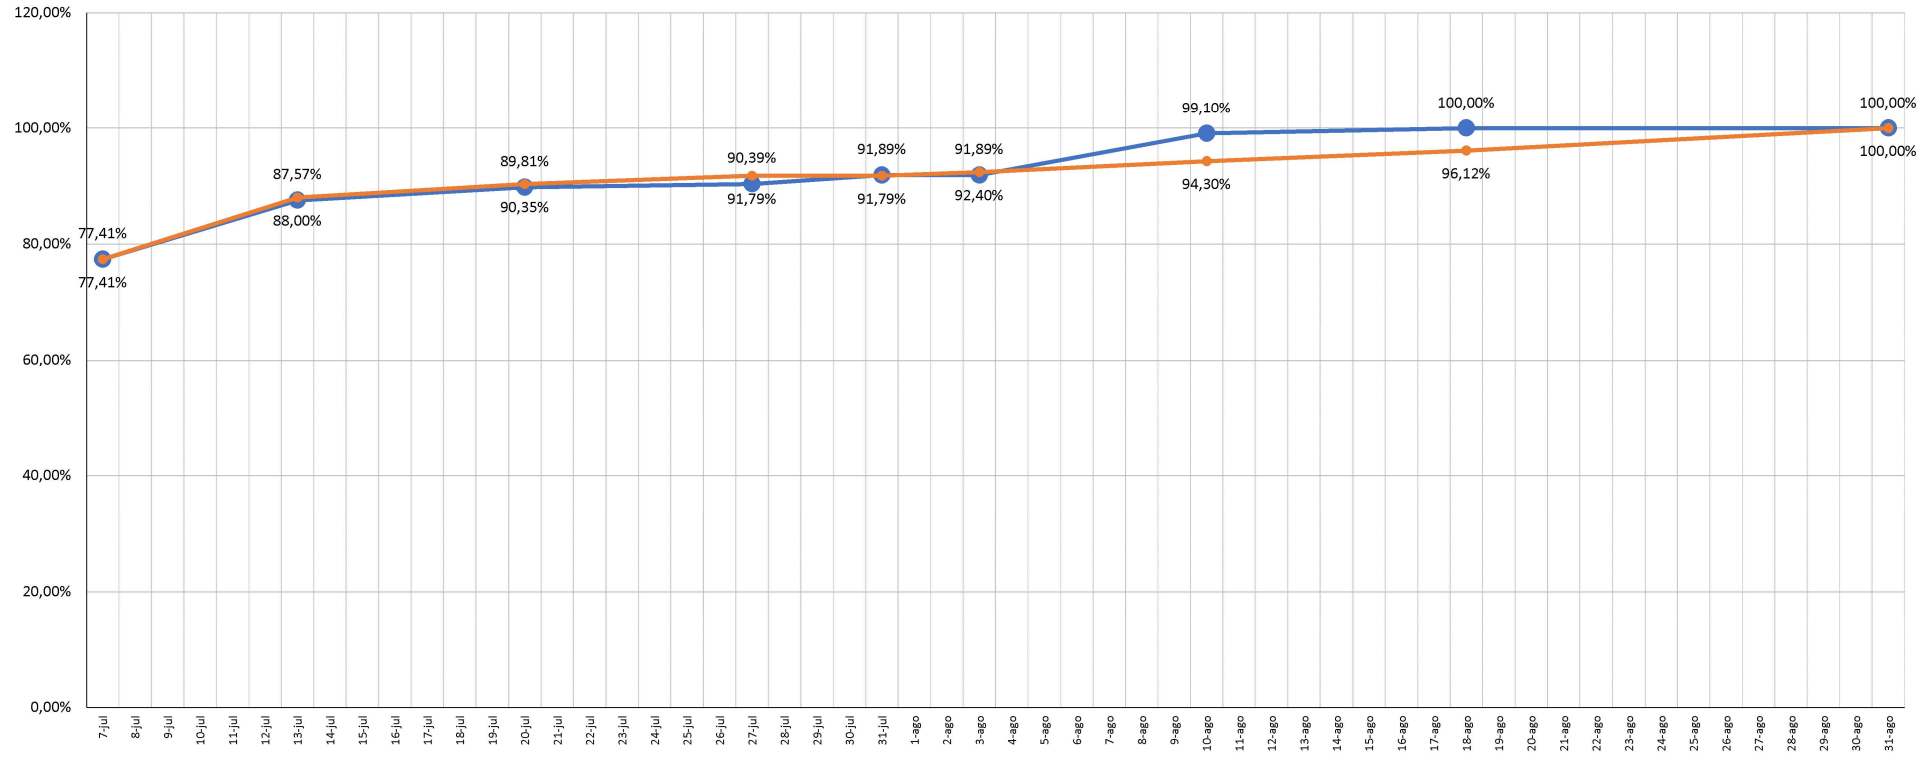

	7-jul	13-jul	20-jul	27-jul	31-jul	3-ago	10-ago	18-ago	31-ago
VALOR PLANEADO	77,41%	87,57%	89,81%	90,39%	91,89%	91,89%	99,10%	100,00%	100,00%
VALOR EJECUTADO	77,41%	88,00%	90,35%	91,79%	91,79%	92,40%	94,30%	96,12%	100,00%

	7-jul	13-jul	20-jul	27-jul	31-jul	3-ago	10-ago	18-ago	31-ago
VALOR PLANEADO	77,41%	87,57%	89,81%	90,39%	91,89%	91,89%	99,10%	100,00%	100,00%
VALOR EJECUTADO	77,41%	88,00%	90,35%	91,79%	91,79%	92,40%	94,30%	96,12%	100,00%

FABIAN GUZMAN SOTO
GERENTE GENERAL
MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGÍA SAS

JULIAN A. LOZANO F.
GERENTE DE PROYECTO
MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGÍA SAS
