	Proceso: Gestión Contractual	
	FORMATO DE INFORME CONTRATISTA	

INFORME 1 SEMANA	**x**

INFORMACIÓN BÁSICA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA PRINCIPAL									
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME							13	09	25
PERIODO DE REPORTE DEL INFORME	Del 08 de Septiembre de 2025 hasta el 13 de Septiembre de 2025								
TIPO DE CONTRATO	*Proceso mínima cuantía MC-DG-DAF-003-2025.*								
No. CONTRATO o CONVENIO o ACEPTACIÓN DE OFERTA	CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8177083 DE 2025								
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JAIME YAMIL SANCHEZ HERNANDEZ								
C.C.	14.229.717								
OBJETO DEL CONTRATO o CONVENIO o ACEPTACIÓN DE OFERTA	CONTRATAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DIRECCIÓN GENERAL, SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL Y CASA TEUSAQUILLO DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA								
ACTA DE INICIO	**SI**	x	**N/A**		**FECHA SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO**		02	09	25
FECHA DE INICIO	02	09	25	**FECHA DE TERMINACIÓN**			16	10	25
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$40.323.105			**FORMA DE PAGO**					
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.				**REGISTRO PRESUPUESTAL No.**			No. 631225 del 19 de agosto de 2025		
Supervisión o Interventor									
NOMBRE DEL SUPERVISOR	HECTOR DANIEL MENJUREN VEGA								
CARGO	SUPERVISOR								

INFORME FOTOGRAFICO

ACTIVIDAD 3
Resane, suministro y aplicación de pintura blanca tipo vinilo, dos manos en paredes definidas por la supervisión.

SE INICIARON ACTIVIDADES DE RESANE TECHOS



FOTO TECHO SALON PRINCIPAL
13 DE SEPTIEMBRE DE 2025



FOTO CORREDOR FINAL SALON PRINCIPAL
13 DE SEPTIEMBRE DE 2025



FOTO TECHO OFICINAS MODULOS VARIOS
13 DE SEPTIEMBRE DE 2025

AVANCE : 0% DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA INICIAL LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA ATRASADA PERO NO INTERFIERE CON LA PROGRAMACION DE LAS DEMAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 5
Suministro e instalación de mediacaña para complementar el existente. Debidamente sellado con poliuretano y pintado con pintura epoxica, paredes consultorio médico.

OBSERVACION: LA ACTIVIDAD SE INICIO CON LA COMPRA DE LA MEDIACAÑA.

AVANCE: 0% con respecto al cronograma inicial. EL MATERIAL SE ENCUENTRA EN OBRA LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA ATRASADA PERO NO INTERFIERE CON LA PROGRAMACION INICIAL

ACTIVIDAD 6

Ajuste de mediacaña en PVC instalada, complementación de perfil de soporte, accesorios, aplicación de sello en poliuretano y pintura epoxica.

NOS ENCONTRAMOS COMPRANDO EL MATERIAL.

AVANCE: 0% con respecto al cronograma de actividades inicial. LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA ATRASADA PERO NO INTERFIERE CON LA PROGRAMACION INICIAL

ACTIVIDAD 7

Pintura de guardaescoba en madera e instalación de las que están desprendidas de la pared.

EL MATERIAL SE CANCELO
AVANCE: 0% con respecto al cronograma DE ACTIVIDADES INICIAL. LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA ATRASADA PERO NO INTERFIERE CON LA PROGRAMACION INICIAL

ACTIVIDAD 18

Detección y corrección de posibles goteras en cubierta.

NOS ENCONTRAMOS EN LA BUSQUEDA DE POSIBLES GOTERAS NO HA SIDO FACIL PORQUE NO SE HAN PRESENTADO LLUVIAS. ESPERAMOS QUE LLUEVA PARA QUE SE PUEDA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD SOLO HEMOS DETACTADO UNA GOTERA

AVANCE: 0% CON RESPECTO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INICIAL. LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA ATRASADA PERO NO INTERFIERE CON LA PROGRAMACION INICIAL

ACTIVIDAD 23

Aseo general.

ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLARA AL EL FINAL DEL CONTRATO EN EL QUE SE REALIZARA UN ASEO GENERAL SIN INTERFERIR CON LA PROGRAMACION INICIAL

AVANCE: 0% CON RESPECTO AL CRONOGRAMA DE PROGRAMACION INICIAL

OBSERVACIONES

Las actividades que no se han cumplido según el cronograma no afectaran para nada el desarrollo y cumplimiento del cronograma.

No se presentaron novedades técnicas, administrativas o ambientales, así como tampoco situaciones imprevistas

No se han presentado accidentes de trabajo y el contrato se desarrolla con normalidad.

PARALA SEMANA ENTRANTE SE TIENE PROGRAMADO DESARROLLAR TRABAJOS EN LOS ITEM 2,3,5,6,7,9,11,18,19 Y 23

Jaime Yamil Sánchez Hernández

RESIDENTE

Linda Lux Valencia

PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD

	Proceso: Gestión Contractual	
	FORMATO DE INFORME CONTRATISTA	

INFORME 2 SEMANA	**x**

INFORMACIÓN BÁSICA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA PRINCIPAL										
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME								19	09	25
PERIODO DE REPORTE DEL INFORME	Del 15 de Septiembre de 2025 hasta el 20 de Septiembre de 2025									
TIPO DE CONTRATO	*Proceso mínima cuantía MC-DG-DAF-003-2025.*									
No. CONTRATO o CONVENIO o ACEPTACIÓN DE OFERTA	CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8177083 DE 2025									
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JAIME YAMIL SANCHEZ HERNANDEZ									
C.C.	14.229.717									
OBJETO DEL CONTRATO o CONVENIO o ACEPTACIÓN DE OFERTA	CONTRATAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DIRECCIÓN GENERAL, SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL Y CASA TEUSAQUILLO DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA									
ACTA DE INICIO	**SI**	x	**N/A**		**FECHA SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO**			02	09	25
FECHA DE INICIO	02	09	25	**FECHA DE TERMINACIÓN**				16	10	25
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$40.323.105				**FORMA DE PAGO**					
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.					**REGISTRO PRESUPUESTAL No.**			No. 631225 del 19 de agosto de 2025		
Supervisión o Interventor										
NOMBRE DEL SUPERVISOR	HECTOR DANIEL MENJUREN VEGA									
CARGO	SUPERVISOR									

ACTIVIDAD 2

SUMINISTRO E INSTALACION COMPRESOR

Suministro e instalación de compresor odontológico, incluye red eléctrica y red de aire.

ESTA ACTIVIDAD NO SE HA PODIDO REALIZAR PORQUE EL COMPRESOR NO CAVE EN EL ESPACIO ASIGNADO HAY QUE MODIFICAR LA PUERTA PARA QUE QUEDE ABRIENDO HACIA AFUERA



FOTO COMPRESOR

13 DE SEPTIEMBRE DE 2025

AVANCE: 0% CON RESPECTO AL CRONOGRAMA DE PROGRAMACION INICIAL. EL COMPRESOR SE ENCUENTRA EN OBRA. En espera del arreglo de la puerta. LA ACTIVIDAD NO RETRASA LA PROGRAMACION INICIAL AL SER ACTIVIDADES INDEPENDIENTES.

ACTIVIDAD 3

Resane, suministro y aplicación de pintura blanca tipo vinilo, dos manos en paredes definidas por la supervisión.



FOTO TECHO ENTRADA PRINCIPAL
20 DE SEPTIEMBRE DE 2025

AVANCE: 0% CON RESPECTO AL CRONOGRAMA DE PROGRAMACION INICIAL

ACTIVIDAD 5

Suministro e instalación de mediacaña para complementar el existente. Debidamente sellado con poliuretano y pintado con pintura epoxica, paredes consultorio médico.

CANTIDAD EJECUTADA: 55,56 ML

área intervenida	alto	cantidad	sub total
consultorio 1			
paredes	30	1	30
Consultorio 2			
Paredes	25,56	1	25,56
TOTAL			55,56






20 DE SEPTIEMBRE DE 2025
AVANCE 100% CON RESPECTO AL CRONOGRAMA DE PROGRAMACION INICIAL

ACTIVIDAD 6
Ajuste de mediacaña en PVC instalada, complementación de perfil de soporte, accesorios, aplicación de sello en poliuretano y pintura epoxica.

CANTIDAD EJECUTADA: 41,89 ML

Área intervenida	Long	cantidad	subtotal
Consultorio 1			
Cubierta, pisos, paredes	17	1	17
Consultorio 2			
Cubierta, pisos, paredes	17	1	17
Área de servicios			
Cubierta, pisos, paredes	7,89	1	7,89
TOTAL			41,89

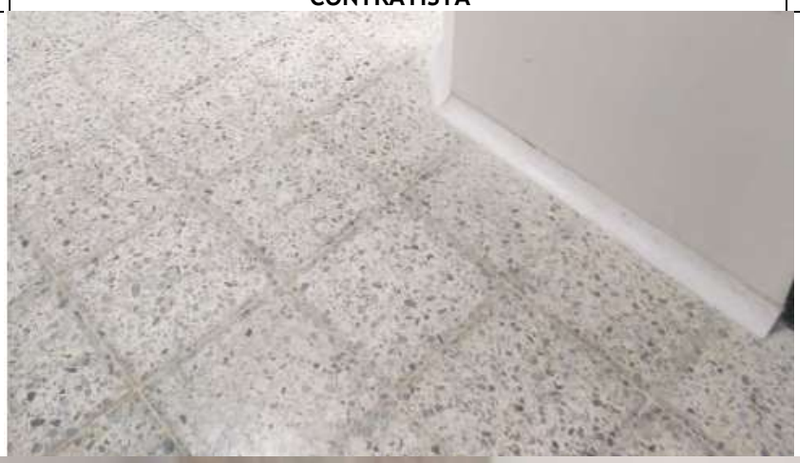





20 DE SEPTIEMBRE DE 2025

AVANCE: 100% CON RESPECTO AL CRONOGRAMA DE PROGRAMACION INICIAL

ACTIVIDAD 7

Pintura de guardaescoba en madera e instalación de las que están desprendidas de la pared.

AVANCE: 0% CON RESPECTO AL CRONOGRAMA DE PROGRAMACION INICIAL. SE DETERMINO DEJAR ESTA ACTIVIDAD PARA CUANDO SE TERMINE LA PINTURA.

ACTIVIDAD 9

Suministro e instalación de logo institucional, similar al actualmente instalado en color institucional.
SUMINISTRO E INSTALACION DE LOGO

AVANCE 0% CON RESPECTO AL CRONOGRAMA DE PROGRAMACION INICIAL. YA SE MANDARON A HACER LOS LOGOS.

ACTIVIDAD 11

Suministro e instalación de botón de alarma baño persona con movilidad reducida, incluye cableado, canaleta de 1 x 1 cm.

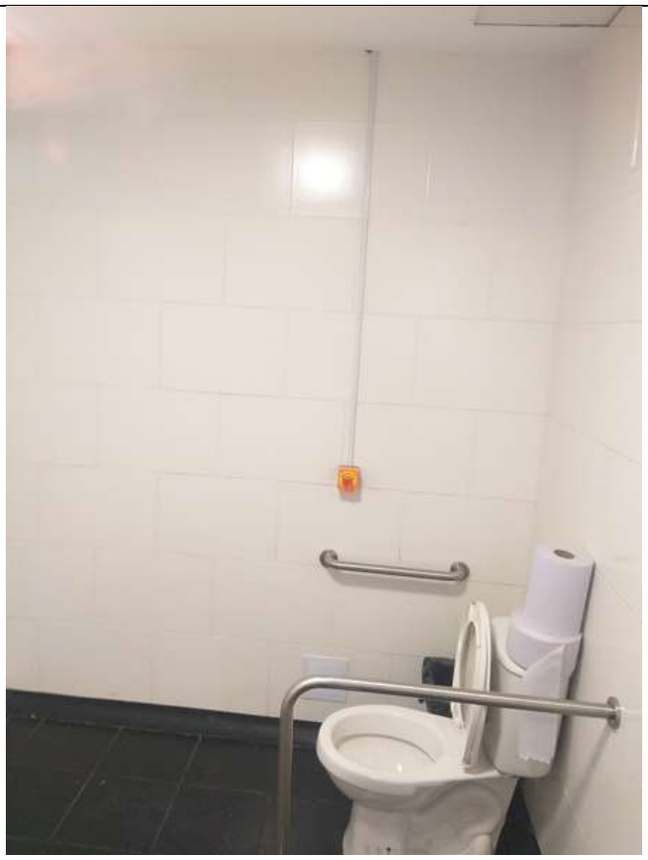


FOTO BOTON DE ALARMA
20 DE SEPTIEMBRE DE 2025

AVANCE: 100% CON RESPECTO AL CRONOGRAMA INICIAL DE PROGRAMACION SE SUMINISTRO E INSTALO.

ACTIVIDAD 18

Detección y corrección de posibles goteras en cubierta.

CONTINUAMOS EN LA BUSQUEDA DE POSIBLES GOTERAS NO HA SIDO FACIL PORQUE NO SE HAN PRESENTADO LLUVIAS. ESPERAMOS LA LLUVIA PARA QUE SE PUEDA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD SOLO HEMOS DETACTADO

UNA GOTERA

AVANCE: 0% CON RESPECTO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INICIAL NO INTERFIERE LA PROGRACION INICIAL

ACTIVIDAD 19

Desmonte, suministro e instalación de luminarias led de 30 x 30 cm. Tipo (Panel Led Empotrado Cuadrado 1800 Lúmenes 24w Luz Fría).

instalacion luminarias led	cantidad		sub total
recepcion	5		5
zona de servicios	1		1
consultorio 3	1		1
bloque de oficinas	**1**		**3**
TOTAL			**10**







20 DE SEPTIEMBRE DE 2025

AVANCE: 100%. CON RESPECTO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INICIAL.

ACTIVIDAD 23

Aseo general.

AVANCE: 0% CON RESPECTO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INICIAL. ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ UNA VEZ TERMINEN TODAS LAS ACTIVIDADES SIN INTERFERIR CON EL CRONOGRAMA INICIAL

OBSERVACIONES

Las actividades que no se han cumplido según el cronograma no afectaran para nada el desarrollo y cumplimiento del cronograma.

No se presentaron novedades técnicas, administrativas o ambientales, así como tampoco situaciones imprevistas

No se han presentado accidentes de trabajo y el contrato se desarrolla con normalidad.

PARA LA SEMANA ENTRANTE SE TIENE PROGRAMADO DESARROLLAR TRABAJOS EN LOS ITEM 1,2,3,7,8,18,19,23 Y 2



RESIDENTE



PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD

	Proceso: Gestión Contractual	
	FORMATO DE INFORME CONTRATISTA	

INFORME 3 SEMANA	**x**

INFORMACIÓN BÁSICA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA PRINCIPAL										
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME								27	09	25
PERIODO DE REPORTE DEL INFORME	Del 22 de Septiembre de 2025 hasta el 27 de Septiembre de 2025									
TIPO DE CONTRATO	*Proceso mínima cuantía MC-DG-DAF-003-2025.*									
No. CONTRATO o CONVENIO o ACEPTACIÓN DE OFERTA	CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8177083 DE 2025									
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JAIME YAMIL SANCHEZ HERNANDEZ									
C.C.	14.229.717									
OBJETO DEL CONTRATO o CONVENIO o ACEPTACIÓN DE OFERTA	CONTRATAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DIRECCIÓN GENERAL, SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL Y CASA TEUSAQUILLO DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA									
ACTA DE INICIO	**SI**	x	**N/A**		**FECHA SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO**			02	09	25
FECHA DE INICIO	02	09	25	**FECHA DE TERMINACIÓN**				16	10	25
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$40.323.105				**FORMA DE PAGO**					
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.					**REGISTRO PRESUPUESTAL No.**			No. 631225 del 19 de agosto de 2025		
Supervisión o Interventor										
NOMBRE DEL SUPERVISOR	HECTOR DANIEL MENJUREN VEGA									

ACTIVIDAD 1

Suministro e instalación de puertas plegables lavables para consultorio médico.

las puertas se encuentran en la obra, pero falta definir altura de la puerta y material que queda en la parte superior

Avance 0%. CON RESPECTO AL CRONOGRAMA DE PROGRAMACION INICIAL.

ACTIVIDAD 2

Suministro e instalación de compresor odontológico, incluye red eléctrica y red de aire. el compresor se encuentra en la obra

ESTA ACTIVIDAD NO SE HA PODIDO REALIZAR PORQUE EL COMPRESOR NO CAVE EN EL ESPACIO ASIGNADO HAY QUE MODIFICAR LA PUERTA

AVANCE: 0% CON RESPECTO AL CRONOGRAMA DE PROGRAMACION INICIAL. EL COMPRESOR SE ENCUENTRA EN OBRA.



Foto 13 de septiembre 202

ACTIVIDAD 3

Resane, suministro y aplicación de pintura blanca tipo vinilo, dos manos en paredes definidas por la supervisión. Actividad terminada.

Avance 100%. CON RESPECTO AL CRONOGRAMA DE PROGRAMACION INICIAL.

área intervenida	cant	área	subtotal
recepción	1,0	18	5
corredor consultorios	1,0	15	11
corredor bloque de oficinas	1,0	29	42
consultorio 3	1,0	29	12
bloque de oficinas	1,0	30	36
zona de servicios	1,0	36	30
cielo raso	1,0	105	105
TOTAL			252 M2



Foto 25 de septiembre de 2025

ACTIVIDAD 4

Suministro e instalación de mediacaña en resina poliéster de 5 x 5 cm en muros y pisos centro médico, incluye accesorios, pegante sellador de poliuretano.
No se realizó la actividad porque en caso de incendio su humo puede ser toxico y su uso puede provocar riesgos de seguridad.

Avance 0%
CON RESPECTO AL CRONOGRAMA DE PROGRAMACION INICIAL

ACTIVIDAD 5

Suministro e instalación de mediacaña para complementar el existente. Debidamente sellado con poliuretano y pintado con pintura epoxica, paredes consultorio médico.

Actividad en ejecución
Avance 15 ML



Foto 25 de septiembre de 2025

ACTIVIDAD 6

Ajuste de mediacaña en PVC instalada, complementación de perfil de soporte, accesorios, aplicación de sello en poliuretano y pintura epoxica.

Actividad en ejecución
Avance 15 ML



Foto 25 de septiembre de 2025

ACTIVIDAD 7

Pintura de guardaescoba en madera e instalación de las que están desprendidas de la pared.

Avance 20 ML



Foto 25 de septiembre de 2025

ACTIVIDAD 8

Construcción de rampa de acceso al servicio médico en gravilla lavada, con bordillo; pendiente máxima del 10%; se debe adherir a la superficie existente sin perforar, mediante la utilización de material epoxica y suministro e instalación de baranda el material se encuentra en obra. NO SE HA PODIDO INICIAR LA EJECUCION PORQUE FALTAN DETALLES DE UBICACIÓN.

Avance 0% CON RESPECTO AL CRONOGRAMA DE PROGRAMACION INICIAL



Foto 25 de septiembre de 2025

ACTIVIDAD 9

Suministro e instalación de logo institucional, similar al actualmente instalado en color institucional.
Actividad terminada.
Avance 100% CON RESPECTO AL CRONOGRAMA DE PROGRAMACION INICIAL

logo instalado	cantidad	sub total
FRENTE NORTE	1	1
FRENTE SUR	1	1
FRENTE OCCIDENTE	1	1
FRENTE ORIENTE	1	1
TOTAL	4	

ACTIVIDAD 8



Foto 25 de septiembre de 2025

ACTIVIDAD 10

Instalación de angeo en puertas con su respectivo marco y empaque.
Avance 0%

ACTIVIDAD 11

Suministro e instalación de botón de alarma baño persona con movilidad reducida, incluye cableado, canaleta de 1 x 1 cm.
Actividad terminada.
Avance 100% **CON RESPECTO AL CRONOGRAMA DE PROGRAMACION INICIAL**



Foto 20 de septiembre de 2025

ACTIVIDAD 12

Construcción de poceta en área de esterilización, en mampostería y enchape.
Avance 100% CON RESPECTO AL CRONOGRAMA DE PROGRAMACION INICIAL



Foto 25 de septiembre de 2025

ACTIVIDAD 13

Instalación película tipo samblasting puertas y ventanas.

Actividad terminada.

Avance 100% CON RESPECTO AL CRONOGRAMA DE PROGRAMACION INICIAL

31 M2

instalación película samblasting	cantidad	área	subtotal
Zona norte	1	10	10
Zona sur	1	5	5
Zona oriente	1	6	6
Zona occidente	1	10	10
TOTAL			31



Foto 25 de septiembre de 2025

ACTIVIDAD 14

Suministro e instalación válvula de pedal, grifería economizadora manos libres grande.

Actividad terminada.

Avance 100% CON RESPECTO AL CRONOGRAMA DE PROGRAMACION INICIAL

CANTIDAD EJECUTADA: 2 UND

AREA	CANTIDAD
Consultorio 2	2
TOTAL	2



FOTO 27 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ACTIVIDAD 15

Desmonte, suministro e instalación de piezas frontales del mueble de odontología. EXISTE INCONVENIENTE PARA EL PROCESO DE TRABAJO DE PIEZAS FRONTALES NO SE HA ENCONTRADO UNA FORMA PRECISA PARA SU DESMONTE.

Avance 0% CON RESPECTO AL CRONOGRAMA DE PROGRAMACION INICIAL



FOTO 27 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ACTIVIDAD 16

Suministro e instalación pieza complemento del mesón de odontología en acero inoxidable; incluye separación entre lavaplatos, en acero inoxidable.

Avance 0%

CON RESPECTO AL CRONOGRAMA DE PROGRAMACION INICIAL

ACTIVIDAD 17

Desmonte, suministro e instalación de cerraduras servicio

médico.

Actividad terminada.

Avance 100% CON RESPECTO AL CRONOGRAMA DE PROGRAMACION INICIAL

UBICACIÓN	CANTIDAD
ENTRADA ZONA DE SERVICIOS	1
ENTRADA NUEVA UBICACIÓN COMPRESOR	1
TOTAL	2

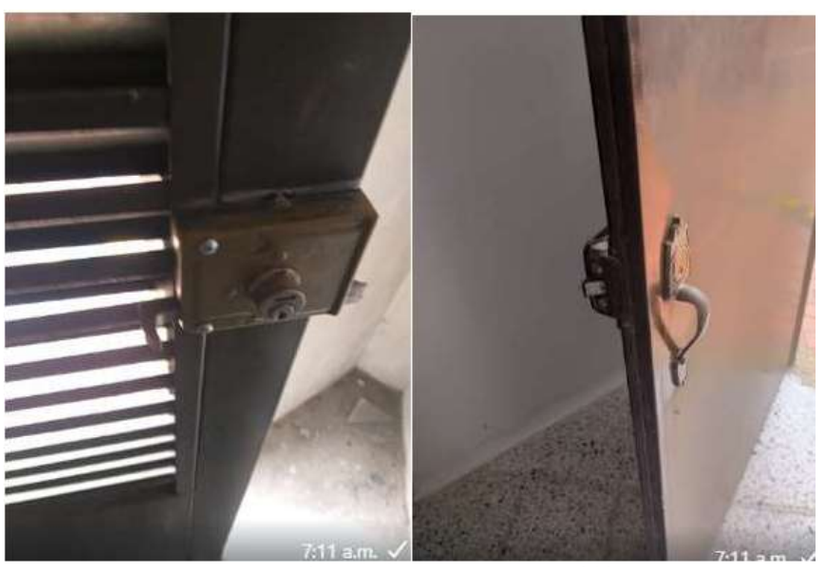


FOTO 27 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ACTIVIDAD 18

Detección y corrección de posibles goteras en cubierta.

Actividad terminada.

Avance 100% CON RESPECTO AL CRONOGRAMA DE PROGRAMACION INICIAL

Área de gotera corregida	cantidad
Zona de cubierta entrada servicios generales	1
Zona de cubierta área bloque de oficinas 1	1



Foto 25 de septiembre de 2025

ACTIVIDAD 19

Desmonte, suministro e instalación de luminarias led de 30 x 30 cm. Tipo (Panel Led Empotrado Cuadrado 1800 Lúmenes 24w Luz Fría).

Actividad terminada.

Avance 100%

CON RESPECTO AL CRONOGRAMA DE PROGRAMACION INICIAL

instalacion luminarias led	cantidad		sub total
recepcion	5		5
zona de servicios	1		1
consultorio 3	1		1
bloque de oficinas	1		3
TOTAL			10



Foto 25 de septiembre de 2025

ACTIVIDAD 20

Suministro e instalación de mueble para lavamanos en consultorio médico tipo Vera 40 72.8x40x35.1cm Manzano Capri Sensi Dacqua.

Actividad terminada.

Avance 100%

CON RESPECTO AL CRONOGRAMA DE PROGRAMACION INICIAL





Foto 25 de septiembre de 2025

ACTIVIDAD 21

Retiro y disposición final de angeo instalado en ventanas del servicio médico de la Dirección General.

Avance 0% CON RESPECTO AL CRONOGRAMA DE PROGRAMACION INICIAL

ACTIVIDAD 22

Desmonte de puerta y generación de persiana con angeo. Dimensiones de la cortina 77 x 88 cmm; incluye sello del espacio mientras se realiza la actividad.

Avance 0%
CON RESPECTO AL CRONOGRAMA DE PROGRAMACION INICIAL

Esta actividad se realizara en conjunto con la baranda de la rampa por ser trabajo de ornamentación.

ACTIVIDAD 23

Aseo general.

ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ UNA VEZ TERMINEN TODAS LAS ACTIVIDADES SIN INTERFERIR CON EL CRONOGRAMA INICIAL Avance 0%



Foto 25 de septiembre de 2025

ACTIVIDAD 24

Tala de dos individuos arbóreos en la casa a cargo de la Dirección General, localizada en la Cra. 17 #39A-30, barrio Teusaquillo, incluye apuntalamiento del cerramiento de la vivienda, y relleno con grava de 1/2" en el espacio dejado por la raíz evacuada.

Actividad terminada.

Avance 100%

CON RESPECTO AL CRONOGRAMA DE PROGRAMACION INICIAL





Foto 25 de septiembre de 2025



FOTO 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025

NOTA: LOS TECNICOS RECOMIENDAN NO EXTRAER LA RAIZ DEL ARBOL DE URAPAN POR EL PELIGRO DE VOLCAMIENTO DEL MURO, EN SU LUGAR SE APLICA HERBICIDA.

Jaime Yamil Sanchez Hernandez
CC 14.229.717
Proponente

OBSERVACIONES

Las actividades que no se han cumplido según el cronograma no afectaran para nada el desarrollo y cumplimiento del cronograma.

No se presentaron novedades técnicas, administrativas o ambientales, así como tampoco situaciones imprevistas

No se han presentado accidentes de trabajo y el contrato se desarrolla con normalidad.

PARA LA SEMANA ENTRANTE SE TIENE PROGRAMADO DESARROLLAR TRABAJOS EN LOS ITEM 1,2,5,6,7,8,10,12,15,16,21,22,23

Jaime Yamil Sánchez Hernández

RESIDENTE

Linda Lux Valencia

PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD

INFORME 4 SEMANA	**x**

INFORMACIÓN BÁSICA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA PRINCIPAL										
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME								4	10	25
PERIODO DE REPORTE DEL INFORME	Del 29 de Septiembre de 2025 hasta el 04 de Octubre de 2025									
TIPO DE CONTRATO	*Proceso mínima cuantía MC-DG-DAF-003-2025.*									
No. CONTRATO o CONVENIO o ACEPTACIÓN DE OFERTA	CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8177083 DE 2025									
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JAIME YAMIL SANCHEZ HERNANDEZ									
C.C.	14.229.717									
OBJETO DEL CONTRATO o CONVENIO o ACEPTACIÓN DE OFERTA	CONTRATAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DIRECCIÓN GENERAL, SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL Y CASA TEUSAQUILLO DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA									
ACTA DE INICIO	**SI**	X	**N/A**		**FECHA SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO**			02	09	25
FECHA DE INICIO	02	09	25	**FECHA DE TERMINACIÓN**				16	10	25
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$40.323.105				**FORMA DE PAGO**					
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.					**REGISTRO PRESUPUESTAL No.**			No. 631225 del 19 de agosto de 2025		
Supervisión o Interventor										
NOMBRE DEL SUPERVISOR	HECTOR DANIEL MENJUREN VEGA									
CARGO	SUPERVISOR									

INFORME FOTOGRAFICO Y DE EJECUCION ACTIVIDAD 1

Suministro e instalación de puertas plegables lavables para consultorio médico.



Foto 4 de octubre de 2025

las puertas se encuentran en la obra Avance 0%. CON RESPECTO AL CRONOGRAMA INICIAL PRESENTADO

CAUSAS DEL ATRASO: hasta esta semana se llegó a un acuerdo para el lugar y forma de instalación.

ACTIVIDAD 2

Suministro e instalación de compresor odontológico, incluye red eléctrica y red de aire. el compresor se encuentra en la obra Avance 0% CON RESPECTO AL CRONOGRAMA INICIAL PRESENTADO

CAUSAS DEL ATRASO: hay que acondicionar el espacio donde se va a instalar el compresor



Foto 13 de septiembre 2025

ACTIVIDAD 3

Resane, suministro y aplicación de pintura blanca tipo vinilo, dos manos en paredes definidas por la supervisión.
Actividad terminada.
Avance 100%.
CANTIDAD EJECUTADA: 260 M2 CON RESPECTO AL CRONOGRAMA INICIAL PRESENTADO


área intervenida	cant	área	subtotal
recepción	1,0	18	5
corredor consultorios	1,0	15	11
corredor bloque de oficinas	1,0	29	42
consultorio 3	1,0	29	12
bloque de oficinas	1,0	30	36
zona de servicios	1,0	36	30
cielo raso	1,0	105	105
TOTAL			252





Foto 25 de septiembre de 2025


8:02 a.m.



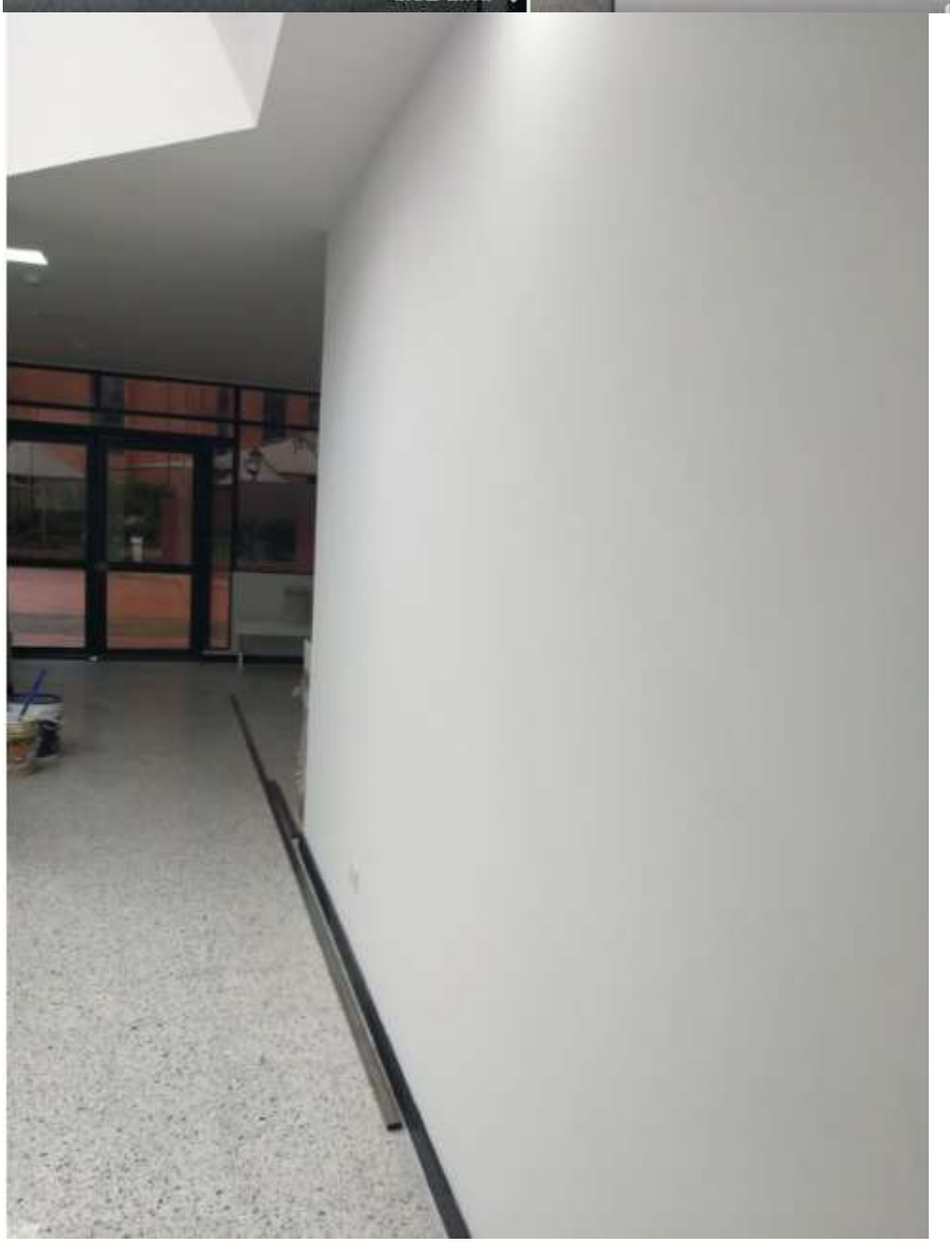

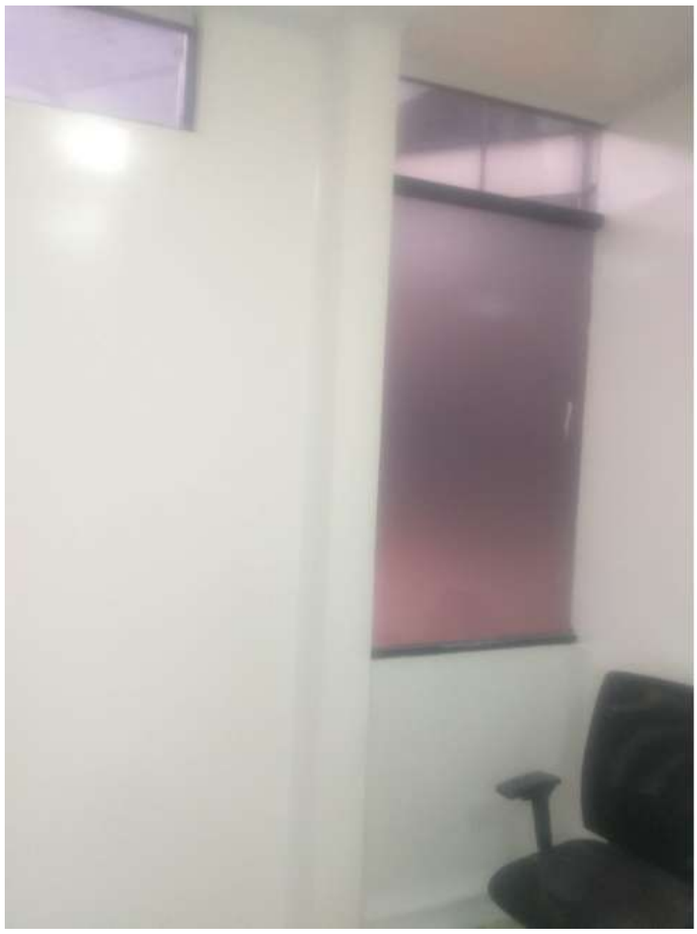

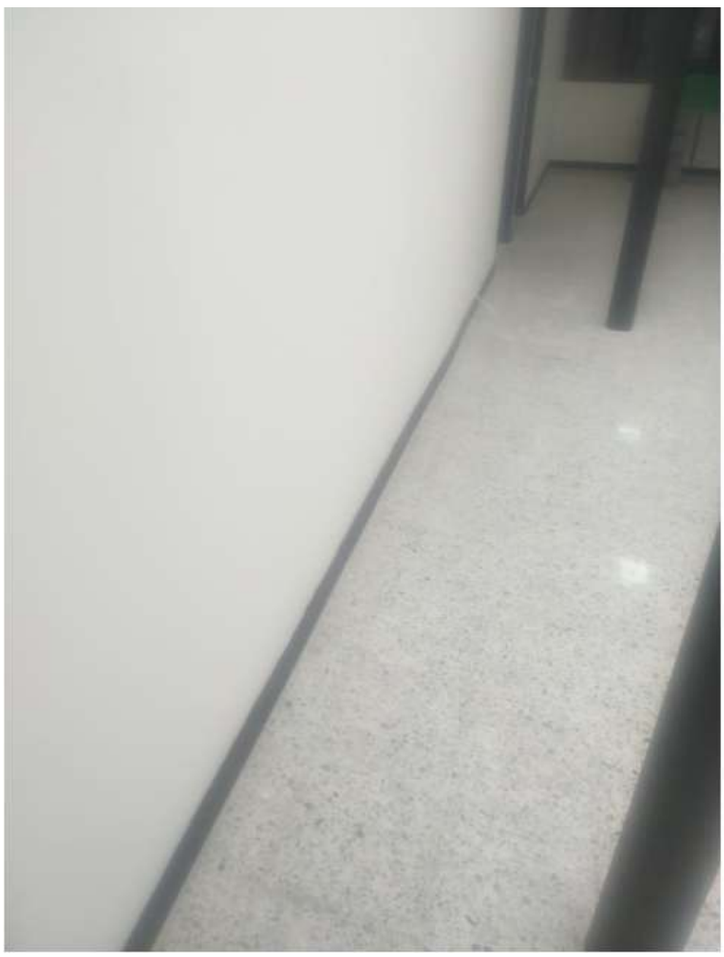











Fotos 4 de octubre de 2025

ACTIVIDAD 4

Suministro e instalación de mediacaña en resina poliéster de 5 x 5 cm en muros y pisos centro médico, incluye accesorios, pegante sellador de poliuretano.

No se realizó la actividad porque en caso de incendio su humo puede ser toxico y su uso puede provocar riesgos de seguridad

Avance 0%

CANTIDAD EJECUTADA: 0 ML

ACTIVIDAD 5

Suministro e instalación de mediacaña para complementar el existente. Debidamente sellado con poliuretano y pintado con pintura epoxica, paredes consultorio médico.

Avance 100% CON RESPECTO AL CRONOGRAMA INICIAL

CANTIDAD EJECUTADA: 55,56 ML

área intervenida	Alto	cantidad	sub total
consultorio 1			
paredes	30	1	30
Consultorio 2			
Paredes	25,56	1	25,56
TOTAL			55,56







PAREDES CONSULTORIO MEDICO Foto 4 de octubre de 2025

ACTIVIDAD 6

Ajuste de mediacaña en PVC instalada, complementación de perfil de soporte, accesorios, aplicación de sello en poliuretano y pintura epoxica.



ACTIVIDAD TERMINADA AVANCE 100% CON RESPECTO AL CRONOGRAMA INICIAL

CANTIDAD EJECUTADA: 41,89 ML

Área intervenida	Long	cantidad	subtotal
Consultorio 1			
Cubierta, pisos, paredes	**17**	**1**	**17**
Consultorio 2			
Cubierta, pisos, paredes	**17**	**1**	**17**
Área de servicios			
Cubierta, pisos, paredes	**7,89**	**1**	**7,89**
TOTAL			**41,89**




8:53 a.m.


8:51 a.m.


8:51 a.m.



PISOS AJUSTADOS Foto 4 de octubre de 2025

ACTIVIDAD 7

Pintura de guardaescoba en madera e instalación de las que están desprendidas de la pared.
Actividad terminada
Avance 100% CON RESPECTO AL CRONOGRAMA INICIAL
CANTIDAD EJECUTADA: 63,69 ML

área intervenida	Long	cantidad	Subtotal
resección	17	1	17
corredor área de consultorios	16	1	16
consultorio 3	7	1	7
bloque de oficinas	23,69	1	23,69
TOTAL			63,69









Foto 4 de octubre de 2025

ACTIVIDAD 8

Construcción de rampa de acceso al servicio médico en gravilla lavada, con bordillo; pendiente máxima del 10%; se debe adherir a la superficie existente sin perforar, mediante la utilización de material epoxica y suministro e instalación de baranda.
no se pudo iniciar la construcción por inconvenientes en otros frentes de trabajo sin que interfiera para su iniciación ni perturbar el cronograma, el material se encuentra en obra. Avance 0%

CON RESPECTO AL CRONOGRAMA INICIAL



Foto 4 de octubre de 2025

ACTIVIDAD 9

Suministro e instalación de logo institucional, similar al actualmente instalado en color institucional.
Actividad terminada.
Avance 100% CON RESPECTO AL CRONOGRAMA INICIAL
CANTIDAD EJECUTADA: 4 UND.

logo instalado	long	cantidad	sub total
FRENTE NORTE	0	1	1
FRENTE SUR	0	1	1
FRENTE OCCIDENTE	0	1	1
FRENTE ORIENTE	0	1	1
TOTAL			4

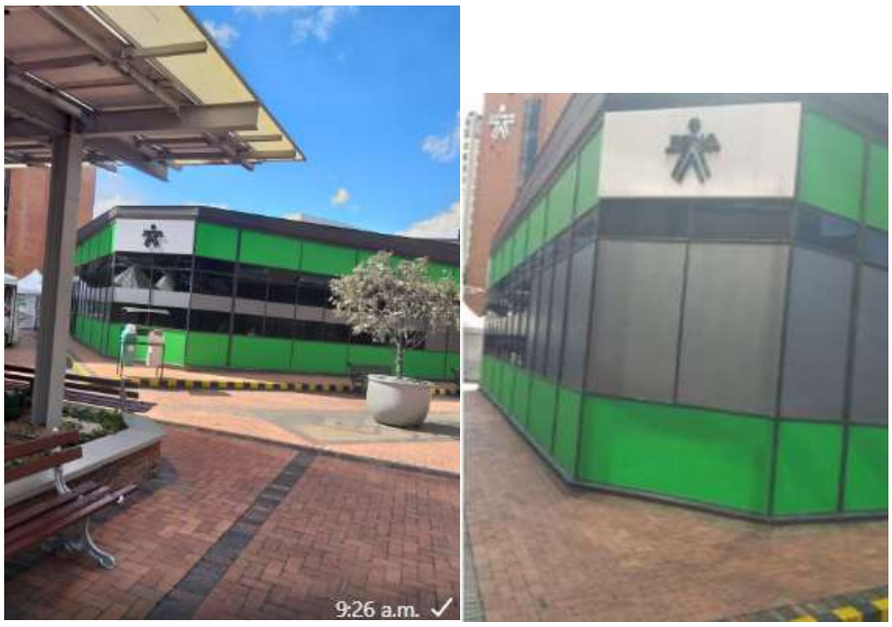


Foto 25 de septiembre de 2025

ACTIVIDAD 10

Instalación de angeo en puertas con su respectivo marco y empaque.
Actividad que no represente cambios o modificaciones en el cronograma de ejecución, el material se encuentra en obra Avance 0%
CANTIDAD EJECUTADA: 0% CON RESPECTO AL CRONOGRAMA INICIAL



Foto 4 de octubre de 2025

ACTIVIDAD 11

Suministro e instalación de botón de alarma baño persona con movilidad reducida, incluye cableado, canaleta de 1 x 1 cm.
Actividad terminada.
Avance 100% CON RERSPECTO AL CRONOGRAMA INICIAL
CANTIDAD EJECUTADA: 1 UND

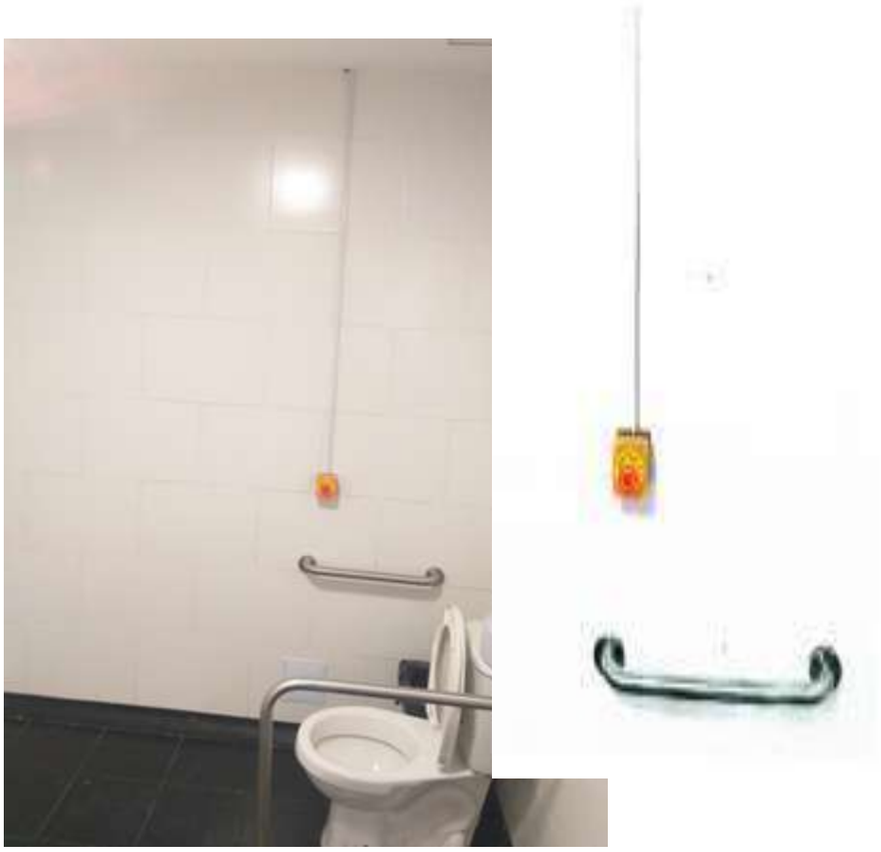


Foto 13 de septiembre de 2025

ACTIVIDAD 12

Construcción de poceta en área de esterilización, en mampostería y enchape.
Avance 100% CON RESPECTO AL CRONOGRAMA INICIAL



Foto 4 de octubre de 2025

ACTIVIDAD 13

Instalación película tipo samblasting puertas y ventanas.
Actividad terminada.
Avance 100% CON RESPECTO AL CRONOGRAMA INICIAL
CANTIDAD EJECUTADA: 150 M2

instalación película samblasting	cantidad	área	subtotal
Zona norte	1	10	10
Zona sur	1	5	5
Zona oriente	1	6	6
Zona occidente	1	10	10
TOTAL			31




Foto 4 de octubre de 2025

ACTIVIDAD 14

Suministro e instalación válvula de pedal, grifería economizadora manos libres grande.
Actividad terminada.
Avance 100% CON RESPECTO AL CRONOGRAMA INICIAL
CANTIDAD EJECUTADA: 2 UND

AREA	CANTIDAD
Consultorio 2	2
TOTAL	2



Foto 4 de octubre de 2025

ACTIVIDAD 15

Desmonte, suministro e instalación de piezas frontales del mueble de odontología.
Actividad por definir su ejecución al presentar dificultad para extracción de los frentes de los cajones. LA ACTIVIDAD NO INTERFIERE LA PROGRAMACION INICIAL DEL CRONOGRAMA
CANTIDAD EJECUTADA: GL 0,0 % **CON RESPECTO AL CRONOGRAMA INICIAL**



Foto 4 de octubre de 2025

ACTIVIDAD 16

Suministro e instalación pieza complemento del mesón de odontología en acero inoxidable; incluye separación entre lavaplatos, en acero inoxidable.
Avance 0%
LA ACTIVIDAD NO INTERFIERE EL CRONOGRAMA DE PROGRAMACION INICIAL

ACTIVIDAD 17

Desmonte, suministro e instalación de cerraduras servicio médico.

Actividad terminada.
Avance 100% CON RESPECTO AL CRONOGRAMA DE PROGRAMACION INICIAL
CANTIDAD EJECUTADA: 2 UNID

UBICACIÓN	CANTIDAD
ENTRADA ZONA DE SERVICIOS	1
ENTRADA NUEVA UBICACIÓN COMPRESOR	1
TOTAL	2



Foto 4 de octubre de 2025

ACTIVIDAD 18

Detección y corrección de posibles goteras en cubierta.
Actividad terminada. Se identificaron 2 goteras en la cubierta que fueron corregidas
Avance 100% CON RESPECTO A LA PROGRAMACION DEL CRONOGRAMA INICIAL
CANTIDAD EJECUTADA: GL 1



Foto 25 de septiembre de 2025

ACTIVIDAD 19

Desmonte, suministro e instalación de luminarias led de 30 x 30 cm. Tipo (Panel Led Empotrado Cuadrado 1800 Lúmenes 24w Luz fría).

Actividad terminada.

Avance 100%

CON RESPECTO AL CRONOGRAMA INICIAL PRESENTADO

CANTIDAD EJECUTADA: 10 UND

INSTALACION LUMINARIAS LED	CANTIDAD	SUBTOTAL
RECEPCION	5	5
ZONA DE SERVICIOS	1	1
CONSULTORIO 3	1	1
BLOQUE DE OFICINAS	3	3
TOTAL		10







Foto 4 de octubre de 2025

ACTIVIDAD 20

Suministro e instalación de mueble para lavamanos en consultorio médico tipo Vera 40 72.8x40x35.1cm Manzano Capri Sensi Dacqua.

Actividad terminada.

Avance 100%

CANTIDAD EJECUTADA: 1





Foto 25 de septiembre de 2025

ACTIVIDAD 21


Retiro y disposición final de angeo instalado en ventanas del servicio médico de la Dirección General.

NOTA: se realizó la entrega a los gestores del Sena para su disposición final.

Avance 100%

CANTIDAD EJECUTADA: 15 UND

retiro de angeo instalado	cantidad		sub total	
recepcion	4		4	
zona de servicios	1		1	
consultorio 3	2		2	
bloque de oficinas	8		8	
TOTAL			15	

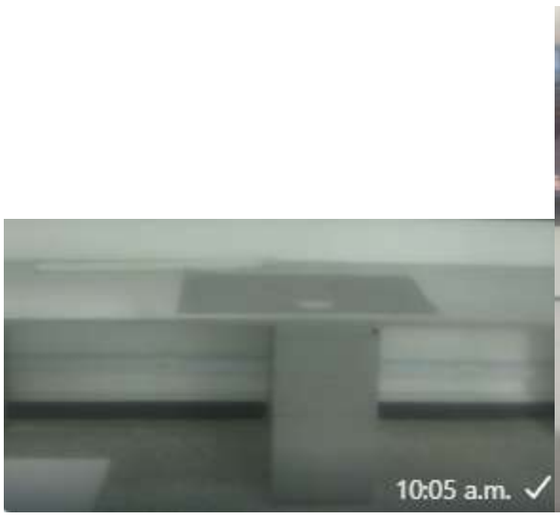




7:14 a.m.







Foto 4 de octubre de 2025

ACTIVIDAD 22

Desmonte de puerta y generación de persiana con angeo. Dimensiones de la cortina 77 x 88 mm; incluye sello del espacio mientras se realiza la actividad.

no se ha realizado porque el ornamentador viene hacer un solo trabajo instalación baranda rampa y arreglo puerta.

Avance 0%

No se afecta la programación y el cronograma se cumplirá a cabalidad.

ACTIVIDAD 23

Aseo general.

Avance 0%

CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA: 0 M2 la actividad se realizará en su totalidad en los últimos dias de la prorroga





Foto 4 de octubre de 2025

ACTIVIDAD 24

Tala de dos individuos arbóreos en la casa a cargo de la Dirección General, localizada en la Cra. 17 #39A-30, barrio Teusaquillo, incluye apuntalamiento del cerramiento de la vivienda, y relleno con grava de 1/2" en el espacio dejado por la raíz evacuada.

NOTA: se talaron 1 árboles fénix y 1 árbol de urapan.en cuanto a la extracción de la raíz de uno de los árboles, no se pudo extraer porque su extracción posibilitaba el volcamiento del muro exterior del antejardín, para subsanar esta falencia se suministró herbicida para evitar la posibilidad que la raíz vuelva a germinar.

Avance 100%

CON RESPECTO AL CRONOGRAMA INICIAL PRESENTADO



Foto 25 de septiembre de 2025



FOTO 4 DE OCTUBRE DE 2025

OBSERVACIONES

No se presentaron novedades técnicas, administrativas o ambientales, así como tampoco situaciones imprevistas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPRESOR



ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Potencia: 2.5h/p
- Flujo max a 0 psi: 9.0 cfm
- Flujo max a 90 psi: 3.2 cfm
- Decibeles: 53 db
- Garantía: 1 año
- Dimensiones: 81cm Alto x 45cm Ancho x 45cm Largo
- Capacidad: 42l
- Flujo max a 40 psi: 4.2 cfm
- Presión max: 125 psi
- Uso: profesional / médico
- Peso: 38 Kg

FOTOS 4 DE OCTUBRE DE 2025



RESIDENTE



PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD

	Proceso: Gestión Contractual	
	FORMATO DE INFORME CONTRATISTA	

INFORME 5 SEMANA	**x**

INFORMACIÓN BÁSICA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA PRINCIPAL										
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME								11	10	25
PERIODO DE REPORTE DEL INFORME	Del 6 de octubre de 2025 hasta el 11 de Octubre de 2025									
TIPO DE CONTRATO	*Proceso mínima cuantía MC-DG-DAF-003-2025.*									
No. CONTRATO o CONVENIO o ACEPTACIÓN DE OFERTA	CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8177083 DE 2025									
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JAIME YAMIL SANCHEZ HERNANDEZ									
C.C.	14.229.717									
OBJETO DEL CONTRATO o CONVENIO o ACEPTACIÓN DE OFERTA	CONTRATAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DIRECCIÓN GENERAL, SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL Y CASA TEUSAQUILLO DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA									
ACTA DE INICIO	**SI**	X	**N/A**		**FECHA SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO**			02	09	25
FECHA DE INICIO	02	09	25	**FECHA DE TERMINACIÓN**				16	10	25
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$40.323.105				**FORMA DE PAGO**					
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.					**REGISTRO PRESUPUESTAL No.**			No. 631225 del 19 de agosto de 2025		
Supervisión o Interventor										
NOMBRE DEL SUPERVISOR	HECTOR DANIEL MENJUREN VEGA									
CARGO	SUPERVISOR									

INFORME FOTOGRAFICO Y DE EJECUCION

ACTIVIDAD 1

Suministro e instalación de puertas plegables lavables para consultorio médico.







Foto 4 de octubre de 2025

actividad no afecta las demás actividades por ser independiente su instalación, las puertas se instalaron

area intervenida	cantidad
consultorio 1	1
consultorio 2	1

Avance 100%. CON RESPECTO AL CRONOGRAMA INICIAL PROGRAMADO

ACTIVIDAD 2

Suministro e instalación de compresor odontológico, incluye red eléctrica y red de aire. Actividad no afecta las demás actividades al ser una actividad independiente, el compresor se encuentra en la obra Avance 0% CON RESPECTO AL APU PRESENTADO



CAUSAS DEL ATRASO: hay que acondicionar el espacio donde se va a instalar el compresor

Foto 13 de septiembre 2025

ACTIVIDAD 3

Resane, suministro y aplicación de pintura blanca tipo vinilo, dos manos en paredes definidas por la supervisión.
Actividad terminada.
Avance 100%.
CANTIDAD EJECUTADA: 252 M2


área intervenida	cant	área	subtotal
recepción	1,0	18	5
corredor consultorios	1,0	15	11
corredor bloque de oficinas	1,0	29	42
consultorio 3	1,0	29	12
bloque de oficinas	1,0	30	36
zona de servicios	1,0	36	30
cielo raso	1,0	105	105
TOTAL			252




Foto 25 de septiembre de 2025






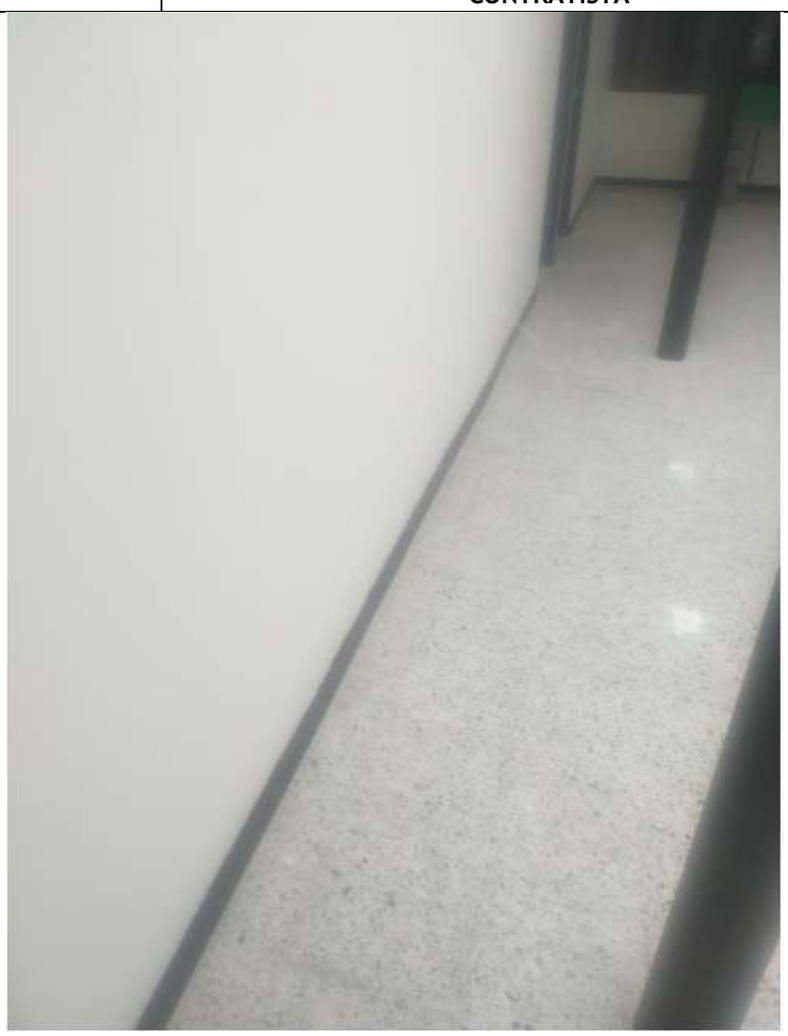



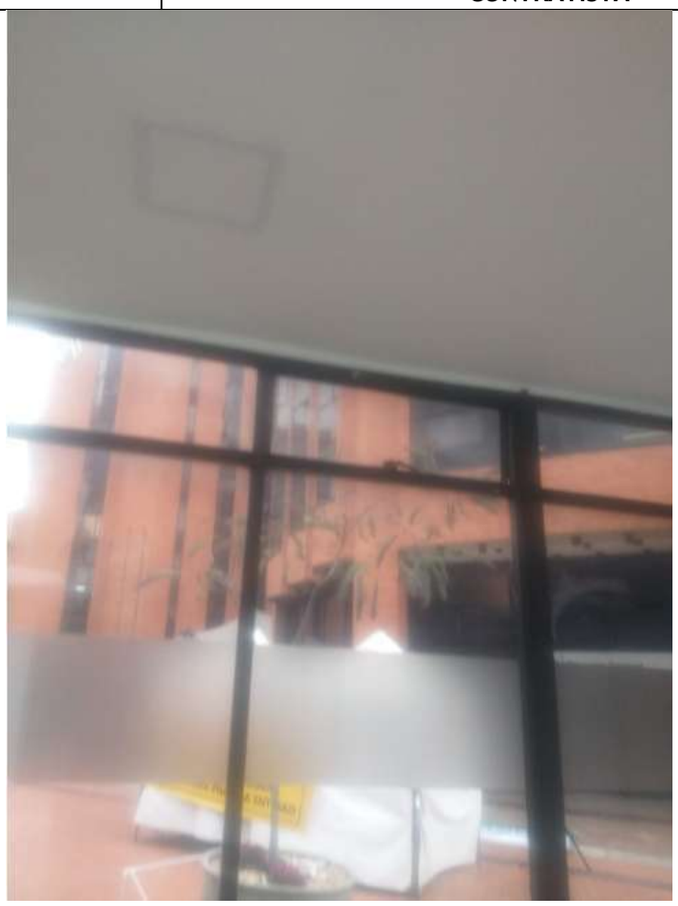



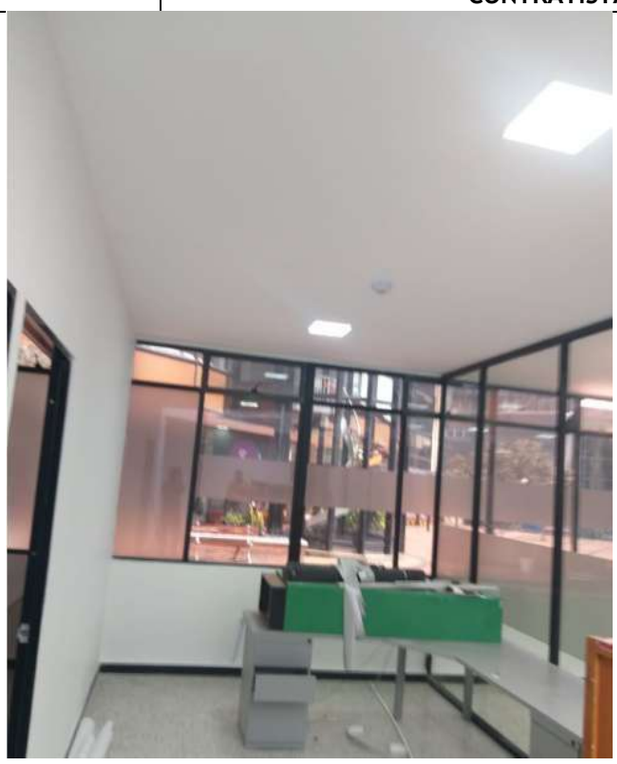

Fotos 4 de octubre de 2025

ACTIVIDAD 4

Suministro e instalación de mediacaña en resina poliéster de 5 x 5 cm en muros y pisos centro médico, incluye accesorios, pegante sellador de poliuretano.

Avance 0%

No se realizó la actividad porque en caso de incendio su humo puede ser toxico y su uso puede provocar riesgos de seguridad.

Avance 0%

CANTIDAD EJECUTADA: 0 ML

ACTIVIDAD 5

Suministro e instalación de mediacaña para complementar el existente. Debidamente sellado con poliuretano y pintado con pintura epoxica, paredes consultorio médico.

Avance 100%

CANTIDAD EJECUTADA: 55,56 ML

área intervenida	Alto	cantidad	sub total
consultorio 1			
paredes	30	1	30
Consultorio 2			
Paredes	25,56	1	25,56
TOTAL			55,56



PAREDES CONSULTORIO MEDICO Foto 4 de octubre de 2025

ACTIVIDAD 6

Ajuste de mediacaña en PVC instalada, complementación de perfil de soporte, accesorios, aplicación de sello en poliuretano y pintura epoxica.

Actividad terminada

Avance

100%

CANTIDAD EJECUTADA: 41,89 ML

Área intervenida	Long	cantidad	subtotal
Consultorio 1			
Cubierta, pisos, paredes	**17**	**1**	**17**
Consultorio 2			
Cubierta, pisos, paredes	**17**	**1**	**17**
Área de servicios			
Cubierta, pisos, paredes	**7,89**	**1**	**7,89**
TOTAL			**41,89**




8:52 a.m.


8:53 a.m.


8:51 a.m.


8:51 a.m.


8:52 a.m.



PISOS AJUSTADOS Foto 4 de octubre de 2025

ACTIVIDAD 7

Pintura de guardaescoba en madera e instalación de las que están desprendidas de la pared.

Actividad terminada

Avance 100%

CANTIDAD EJECUTADA: 63,69 ML

área intervenida	Long	cantidad	Subtotal
resección	17	1	17
corredor área de consultorios	16	1	16
consultorio 3	7	1	7
bloque de oficinas	23,69	1	23,69
TOTAL			63,69









Foto 4 de octubre de 2025

ACTIVIDAD 8

Construcción de rampa de acceso al servicio médico en gravilla lavada, con bordillo; pendiente máxima del 10%; se debe adherir a la superficie existente sin perforar, mediante la utilización de material epoxica y suministro e instalación de baranda

Actividad iniciada el 8 de octubre de 2025

Avance 0% **CON RESPECTO AL CRONOGRAMA APROBADO INICIALMENTE**


2:08 p.m.


2:08 p.m.


2:09 p.m.









Foto 10 de octubre de 2025



ACTIVIDAD 9

Suministro e instalación de logo institucional, similar al actualmente instalado en color institucional.
Actividad terminada.
Avance 100%

logo instalado	long	cantidad	sub total
FRENTE NORTE	0	1	1
FRENTE SUR	0	1	1
FRENTE OCCIDENTE	0	1	1
FRENTE ORIENTE	0	1	1
TOTAL			4

CANTIDAD EJECUTADA: 4 UND





ACTIVIDAD 10

Instalación de angeo en puertas con su respectivo marco y empaque.
Avance 100% **CANTIDAD EJECUTADA: 100% CON RESPECTO AL APU PRESENTADO**
5 UNIDADES

angeo instalado	long	cantidad	sub total
zona de baños	0	2	2
area de servicios	0	3	3
TOTAL			5



Foto 4 de octubre de 2025











ACTIVIDAD 11

Suministro e instalación de botón de alarma baño persona con movilidad reducida, incluye cableado, canaleta de 1 x 1 cm.
Actividad terminada.
Avance 100%
CANTIDAD EJECUTADA: 1 UND

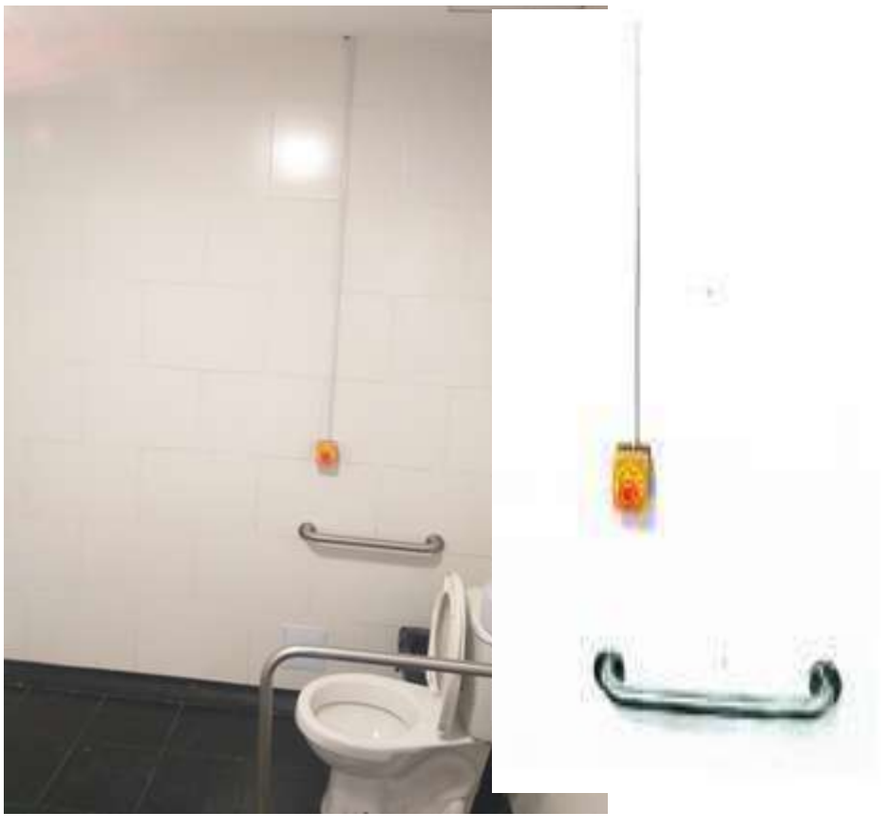


Foto 13 de septiembre de 2025

ACTIVIDAD 12

Construcción de poceta en área de esterilización, en mampostería y enchape.
Avance 100%
CANTIDAD EJECUTADA: GL 1



Foto 4 de octubre de 2025

ACTIVIDAD 13

Instalación película tipo samblasting puertas y ventanas.

Actividad terminada.

Avance 100%

instalación película samblasting	cantidad	área	subtotal
Zona norte	1	10	10
Zona sur	1	5	5
Zona oriente	1	6	6
Zona occidente	1	10	10
TOTAL			31

CANTIDAD EJECUTADA: 31 M2



Foto 4 de octubre de 2025

ACTIVIDAD 14

Suministro e instalación válvula de pedal, grifería economizadora manos libres grande.
Actividad terminada.
Avance 100%
CANTIDAD EJECUTADA: 2 UND

AREA	CANTIDAD
Consultorio 2	2
TOTAL	2




Foto 4 de octubre de 2025

ACTIVIDAD 16

Desmonte, suministro e instalación de piezas frontales del mueble de odontología.
Actividad por definir su ejecución al presentar dificultad para extracción de los frentes de los cajones y muy seguramente dañar parte o todo el cajón.
CANTIDAD EJECUTADA: GL 0,0 % **CON RESPECTO AL APU PRESENTADO**



Foto 4 de octubre de 2025

ACTIVIDAD 16

Suministro e instalación pieza complemento del mesón de odontología en acero inoxidable; incluye separación entre lavaplatos, en acero inoxidable.
Avance 0%

ACTIVIDAD 17

Desmonte, suministro e instalación de cerraduras servicio médico.

Actividad terminada.
Avance 100%
CANTIDAD EJECUTADA: 2 UNID

UBICACIÓN	CANTIDAD
ENTRADA ZONA DE SERVICIOS	1
ENTRADA NUEVA UBICACIÓN COMPRESOR	1
TOTAL	2



Foto 4 de octubre de 2025

ACTIVIDAD 18

Detección y corrección de posibles goteras en cubierta.
Actividad terminada. Se identificaron 2 goteras en la cubierta que fueron corregidas
Avance 100%
CANTIDAD EJECUTADA: GL 1



Foto 25 de septiembre de 2025

ACTIVIDAD 19

Desmonte, suministro e instalación de luminarias led de 30 x 30 cm. Tipo (Panel Led Empotrado Cuadrado 1800 Lúmenes 24w Luz fría).

Actividad terminada.

Avance 100%

instalacion luminarias led	cantidad		sub total
recepcion	5		5
zona de servicios	1		1
consultorio 3	1		1
bloque de oficinas	3		3
TOTAL			10

CANTIDAD EJECUTADA: 10 UND









Foto 4 de octubre de 2025

ACTIVIDAD 20

Suministro e instalación de mueble para lavamanos en consultorio médico tipo Vera 40 72.8x40x35.1cm Manzano Capri Sensi Dacqua.

Actividad terminada.

Avance 100%

CANTIDAD EJECUTADA: 1





Foto 25 de septiembre de 2025

ACTIVIDAD 21

ACTIVIDAD 21

Retiro y disposición final de angeo instalado en ventanas del servicio médico de la Dirección General.
NOTA: se realizó la entrega a los gestores del Sena para su disposición final.
Avance 100%

CANTIDAD EJECUTADA: 15 UND

retiro de angeo instalado	cantidad		sub total	
recepcion	4		4	
zona de servicios	1		1	
consultorio 3	2		2	
bloque de oficinas	8		8	
TOTAL			15	






7:14 a.m.







ACTIVIDAD 22

Desmonte de puerta y generación de persiana con angeo. Dimensiones de la cortina 77 x 88 mm; incluye sello del espacio mientras se realiza la actividad.

no se ha realizado porque el ornamentador viene hacer un solo trabajo instalación baranda rampa y arreglo puerta.

Avance 0%

No se afecta la programación y el cronograma se cumplirá a cabalidad.

ACTIVIDAD 23

Aseo general.

Actividad en constante ejecución

Avance 0%

CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA: 0 M2 la actividad se realizará en su totalidad en los últimos dias

ACTIVIDAD 24

Tala de dos individuos arbóreos en la casa a cargo de la Dirección General, localizada en la Cra. 17 #39A-30, barrio Teusaquillo, incluye apuntalamiento del cerramiento de la vivienda, y relleno con grava de 1/2" en el espacio dejado por la raíz evacuada.

NOTA: se talaron 1 árboles fénix y 1 árbol de urapan.en cuanto a la extracción de la raíz del, árbol de urapan no se pudo extraer porque su extracción posibilitaba el volcamiento del muro exterior del antejardín, para subsanar esta falencia se suministró herbicida para evitar la posibilidad que la raíz vuelva a germinar..

Actividad terminada.

Avance 100%

Foto 25 de septiembre de 2025



OBSERVACIONES

No se presentaron novedades técnicas, administrativas o ambientales, así como tampoco situaciones imprevistas.

Se cumplió con la entrega de elementos de seguridad y aseo en obra

ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPRESOR



ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Potencia: 2.5h/p
- Capacidad: 42l
- Flujo max a 0 psi: 9.0 cfm
- Flujo max a 40 psi: 4.2 cfm
- Flujo max a 90 psi: 3.2 cfm
- Presión max: 125 psi
- Decibeles: 53 db
- Uso: profesional / médico
- Garantía: 1 año
- Peso: 38 Kg
- Dimensiones: 81cm Alto x 45cm Ancho x 45cm Largo

FOTOS 4 DE OCTUBRE DE 2025



RESIDENTE



PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD
