FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	RAMA JUDICIAL COORDINACION ADMINISTRATIVA-FLORENCIA	**Fecha del informe:**	21/11/2025
Unidad responsable:	AREA ADMINISTRATIVA	**Contrato No.**	043 de 2025
Supervisor (es):	ELIANA ARTUNDUAGA AGUDELO	**Fecha de suscripción:**	10/10/2025
		Valor total:	$ 236.176.380,00
Interventor :	N/A	**Plazo total:**	03 meses
Contratista:	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA S.A.S "SERVITEHD S.A.S"	**Fecha de terminacion:**	31/12/2024
Nit:	900.196.409-4	**Lugar de ejecución:**	DESPACHOS JUDICIALES DEL CAQUETA
Modalidad de Selección	Selección Abreviada Menor Cuantia (SA-06-2025)	**Porcentaje avance:**	**10,38**
Pertenece al Plan Operativo:		**Estado actual:**	EJECUCION

Objeto de contratación:

Contratar, por el sistema de precios unitarios, el mantenimiento preventivo y/o correctivo y reparación (incluye insumos, repuestos, piezas, accesorios y mano de obra) de los aires acondicionados instalados en las sedes judiciales y palacios de justicia a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Neiva, para el Distrito Judicial de Florencia.

PLAZOS Y PRORROGAS

Fecha de inicio:	27/10/2025
Plazo inicial:	03 MESES
Fecha vencimiento inicial:	26/01/2026
Fecha terminación:	

Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Suspension	NA			
Reinicio	NA			
Prorroga	1			

Adicionales de Valor

Número	**Fecha**	**Valor**
	Valor Total Adiciones:	$ -

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 236.176.380,00			**Valor Total:**	$ 236.176.380,00
Con anticipo: ☐		**Valor Anticipo:**	$ -	**Saldo por pagar:**	$ 211.668.724,00

Forma de Pago:		**Descripción condiciones de pago**
Porcentaje	**Valor**	
10,38	24.507.656	Pago Parcial No. 001 - **Factura FV6650** del 21 de noviembre de 2025 - correspondiente a la ejecucion contractutal del Mantenimiento de Aires Acondicionados Caquetá,
10,38		
10,38		
	24.507.656	

PAGOS REALIZADOS					
No. O.P.	**Fecha**	**Valor**	**No. O.P.**	**Fecha**	**Valor**

AVANCE DE EJECUCIÓN			
Fecha Reporte de Avance	**Avance en Tiempo**	**% Avance en Ejecución**	**Actividad Realizada**
21/11/2025	25,00	10,38	Mantenimiento Preventivo a los equipos de aire acondiconado ubicados en los Despachos Judiciales que se describen en la relacion **PREVENTIVOS** - **Adjuntos en el presente informe.** Mantenimiento Correctivo a los equipos de aire acondiconado ubicados en los Despachos Judiciales que se describen en la relacion **CORRECTIVOS** - **Adjuntos en el presente informe.**

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	
Fecha De Recibido	**Descripción del Bien o Servicio Recibido**
10/12/2024	Mantenimiento preventivo y/o correctivo y reparación (incluye insumos, repuestos, piezas, accesorios, mano de obra) para los Aires Acondicionados instalados en las Sedes Judiciales y Palacios de Justicia a cargo de la Coordinación Administrativa de Florencia en el Departamento del Caquetá.

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
Fecha De Requerimiento	**Descripción (Incluír Si dio respuesta satisfactoria o no)**

CONCEPTO DEL SUPERVISOR		
El contrato se está ejecutando normalmente?	**El contrato presenta retraso?**	**La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?**
SI **X** NO ☐	SI ☐ NO ☒	SI ☒ NO ☐

Resumen ejecución del contrato:
Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los equipos de aire acondiconado ubicados en los Despachos Judiciales que se describen en las **Ordenes de Trabajo** aportadas por el contratista

Se adjunta certificado de parafiscales de fecha **20 de noviembre de 2025.** Asi mismo, aporta pllanilla de la seguridad social del contratista y su personal.

Resumen pendientes del contratista:

N/A

Observaciones:

El contrato se ha ejecutado con normalidad, previa revisión del cumplimiento de las obligaciones contractuales que dan origen a la aprobación del pago de las actividades ejecutadas para un primer informe de avance de ejecución por parte del contratista SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA S.A.S -SERVITEDH.

Respecto al manejo de los **residuos generados** durante la ejecución del presente vínculo contractual se adjunta certificación expedida por la empresa **Sur Ambiental S.A.S** de fecha 20 de noviembre de 2025.

FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD
Equivalente en las Direcciones Seccionales de Administración Judicial

FIRMA DEL SUPERVISOR

ELIANA ARTUNDUAGA AGUDELO

Directora (A) Coordinación Administrativa Florencia
DESAJNER25-3937
Contrato 039 de 2025

servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FV6650
Fecha y Hora de Generación: 2025-11-21 09:16:42
Fecha validación: 2025-11-21 09:21:44-05:00

Nº Resolución: 18764087766813 **Prefijo:** FV **Consecutivo:** 6360 hasta 7000 **Fecha:** 2025-01-27 **hasta** 2026-01-27

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA S.A.S SERVITEDH S.A.S. **NIT:** 900196409-4 **Actividad Económica:** 4322 **Responsabilidad:** Agente de retención en el impuesto sobre las ventas - **Dirección:** CALLE 27 #8-06 - NEIVA - Huila - CO **Teléfonos:** 6088642204 **Contacto:** SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA SAS **E-mail:** servitedh@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA **NIT:** 800165866-1 **Actividad Económica:** 8424 **Dirección:** ED PALACIO DE JUSTICIA OF 105 - NEIVA - Huila - CO **Teléfonos:** 3013983014 **E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	1	9.0	94	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO AIRE ACONDICIONADO - TIPO MINISPLIT	123,766.0	IVA 19.00	211,640.0		1,325,534.0
2	1	7.0	94	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO AIRE ACONDICIONADO - TIPO MINISPLIT	136,972.0	IVA 19.00	182,173.0		1,140,977.0
3	2	8.0	94	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO AIRE ACONDICIONADO - TIPO PISO TECHO	165,625.0	IVA 19.00	251,750.0		1,576,750.0
4	43	2.0	94	TARJETA ELETRONICA UNIDAD EVAPORADORA - TIPO CASSETTE	2,318,839.0	IVA 19.00	881,159.0		5,518,837.0
5	66	2.0	94	SUMINISTRO Y AJUSTE DE GAS REFRIGERANTE R410	34,122.0	IVA 19.00	12,966.0		81,210.0
6	432	1.0	94	BOMBA DE CONDESADO TIPO TANQUE	558,358.0	IVA 19.00	106,088.0		664,446.0
7	490	1.0	94	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE HASTA 60,000 BTU	1,382,417.0	IVA 19.00	262,659.0		1,645,076.0
8	70	1.0	94	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO-PISO TECHO	162,530.0	IVA 19.00	30,881.0		193,411.0
9	48	19.0	94	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE)3/8	31,383.0	IVA 19.00	113,293.0		709,570.0
10	49	15.0	94	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE)5/8	60,256.0	IVA 19.00	171,730.0		1,075,570.0
11	59	76.0	94	AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	18,612.0	IVA 19.00	268,757.0		1,683,269.0
12	51	43.0	94	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4x14	20,085.0	IVA 19.00	164,094.0		1,027,749.0
13	139	2.0	94	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 24000-36000	1,081,083.0	IVA 19.00	410,812.0		2,572,978.0
14	142	2.0	94	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE METALICO UNIDAD CONDENSADORA 24000	125,923.0	IVA 19.00	47,851.0		299,697.0
15	45	15.0	94	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE)1/2	42,681.0	IVA 19.00	121,641.0		761,856.0
16	50	28.0	94	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	17,884.0	IVA 19.00	95,143.0		595,895.0
17	46	19.0	94	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE)1/4	22,596.0	IVA 19.00	81,572.0		510,896.0
18	64	3.0	94	INSTALACION BASICA DE AIRE ACONDICIONADO- 9000-18000	840,842.0	IVA 19.00	479,280.0		3,001,806.0

servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FV6650
Fecha y Hora de Generación: 2025-11-21 09:16:42
Fecha validación: 2025-11-21 09:21:44-05:00

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
19	78	1.0	94	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE METALICO UNIDAD CONDENSADORA 9000 A 18000	102,629.0	IVA 19.00	19,500.0		122,129.0
Total Items			19						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	20,594,667.0	3,912,989.0

Totales	
SUBTOTAL:	20,594,667.0
TOTAL Base Imponible:	20,594,667.0
IVA	3,912,989.0
TOTAL:	24,507,656.0
TOTAL en letras: Veinticuatro Millones Quinientos Siete Mil Seiscientos Cincuenta Y Seis Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.0

Información Adicional

#$27-01-01-812;043de2025;bmendezc@cendoj.ramajudicial.gov.co#$

CORTE 1

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Transferencia Débito		1						

servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FV6650
Fecha y Hora de Generación: 2025-11-21 09:16:42
Fecha validación: 2025-11-21 09:21:44-05:00

Nº Resolución: 18764087766813 **Prefijo:** FV **Consecutivo:** 6360 hasta 7000 **Fecha:** 2025-01-27 **hasta** 2026-01-27

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA S.A.S SERVITEDH S.A.S. **NIT:** 900196409-4 **Actividad Económica:** 4322 **Responsabilidad:** Agente de retención en el impuesto sobre las ventas - **Dirección:** CALLE 27 #8-06 - NEIVA - Huila - CO **Teléfonos:** 6088642204 **Contacto:** SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA SAS **E-mail:** servitedh@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA **NIT:** 800165866-1 **Actividad Económica:** 8424 **Dirección:** ED PALACIO DE JUSTICIA OF 105 - NEIVA - Huila - CO **Teléfonos:** 3013983014 **E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	1	9.0	94	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO AIRE ACONDICIONADO - TIPO MINISPLIT	123,766.0	IVA 19.00	211,640.0		1,325,534.0
2	1	7.0	94	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO AIRE ACONDICIONADO - TIPO MINISPLIT	136,972.0	IVA 19.00	182,173.0		1,140,977.0
3	2	8.0	94	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO AIRE ACONDICIONADO - TIPO PISO TECHO	165,625.0	IVA 19.00	251,750.0		1,576,750.0
4	43	2.0	94	TARJETA ELETRONICA UNIDAD EVAPORADORA - TIPO CASSETTE	2,318,839.0	IVA 19.00	881,159.0		5,518,837.0
5	66	2.0	94	SUMINISTRO Y AJUSTE DE GAS REFRIGERANTE R410	34,122.0	IVA 19.00	12,966.0		81,210.0
6	432	1.0	94	BOMBA DE CONDESADO TIPO TANQUE	558,358.0	IVA 19.00	106,088.0		664,446.0
7	490	1.0	94	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE HASTA 60,000 BTU	1,382,417.0	IVA 19.00	262,659.0		1,645,076.0
8	70	1.0	94	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO-PISO TECHO	162,530.0	IVA 19.00	30,881.0		193,411.0
9	48	19.0	94	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE)3/8	31,383.0	IVA 19.00	113,293.0		709,570.0
10	49	15.0	94	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE)5/8	60,256.0	IVA 19.00	171,730.0		1,075,570.0
11	59	76.0	94	AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	18,612.0	IVA 19.00	268,757.0		1,683,269.0
12	51	43.0	94	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4x14	20,085.0	IVA 19.00	164,094.0		1,027,749.0
13	139	2.0	94	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 24000-36000	1,081,083.0	IVA 19.00	410,812.0		2,572,978.0
14	142	2.0	94	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE METALICO UNIDAD CONDENSADORA 24000	125,923.0	IVA 19.00	47,851.0		299,697.0
15	45	15.0	94	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE)1/2	42,681.0	IVA 19.00	121,641.0		761,856.0
16	50	28.0	94	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	17,884.0	IVA 19.00	95,143.0		595,895.0
17	46	19.0	94	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE)1/4	22,596.0	IVA 19.00	81,572.0		510,896.0
18	64	3.0	94	INSTALACION BASICA DE AIRE ACONDICIONADO- 9000-18000	840,842.0	IVA 19.00	479,280.0		3,001,806.0

servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FV6650
Fecha y Hora de Generación: 2025-11-21 09:16:42
Fecha validación: 2025-11-21 09:21:44-05:00

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
19	78	1.0	94	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE METALICO UNIDAD CONDENSADORA 9000 A 18000	102,629.0	IVA 19.00	19,500.0		122,129.0
Total Items			19						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	20,594,667.0	3,912,989.0

Totales	
SUBTOTAL:	20,594,667.0
TOTAL Base Imponible:	20,594,667.0
IVA	3,912,989.0
TOTAL:	24,507,656.0
TOTAL en letras: Veinticuatro Millones Quinientos Siete Mil Seiscientos Cincuenta Y Seis Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.0

Información Adicional

#$27-01-01-812;043de2025;bmendezc@cendoj.ramajudicial.gov.co#$

CORTE 1

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Transferencia Débito		1						

servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN


Neiva, Noviembre 20 de 2025

Señores
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial

Referencia: **INFORME RUTINA UNO CONTRATO 043 DE 2025- FLORENCIA**

Se dio inicio a las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado de la Direccion Seccional de Administracion Judicial DESAJ del Distrito Judicial de Florencia. Teniendo en cuenta las prioridades manifestadas por la entidad, y las necesidades de algunos despachos por la instalacion de aires en las nuevas sedes, se va desarrollando lo perteneciente a la primera rutina.A continuaccion se anexa el registro fotografico de los mantenimientos correctivos y preventivos ejecutados hasta el momento, en cada una de las sede intervenidas:


- SALA DE AUDIENCIAS 1-BELEN DE LOS ANDAQUIES

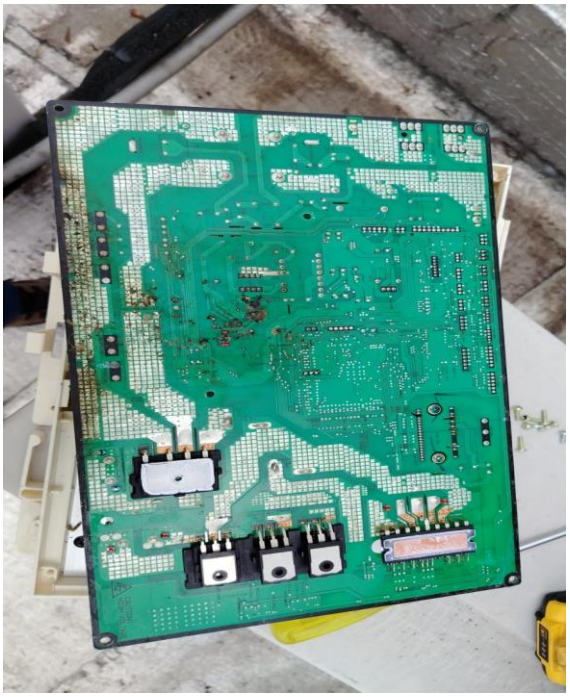



servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA


SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN

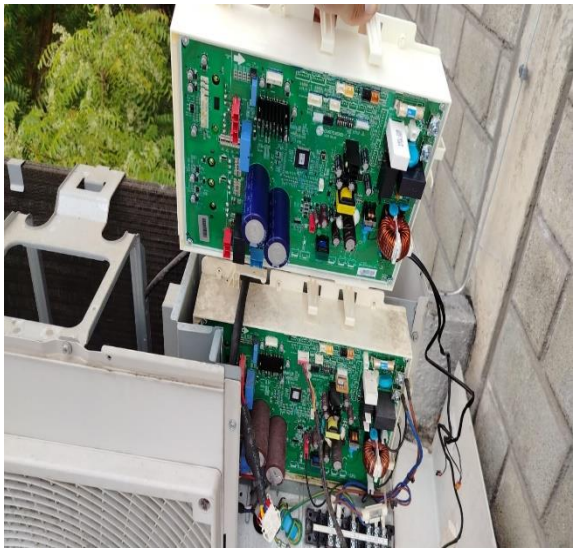



- SALA DE AUDIENCIAS 2- BELEN DE LOS ANDAQUIES




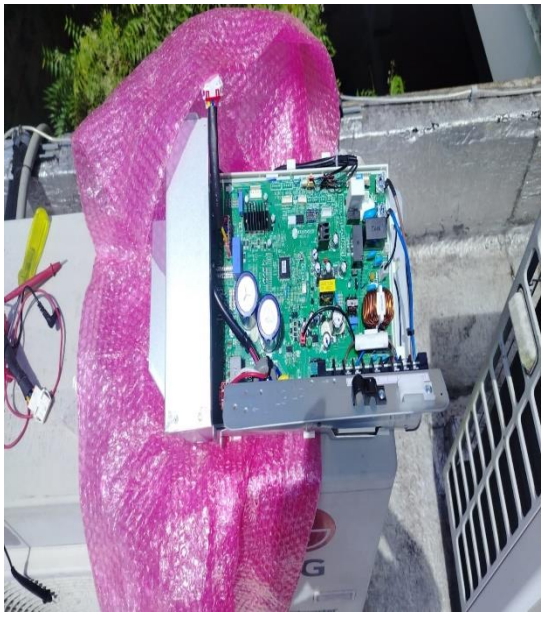


servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN



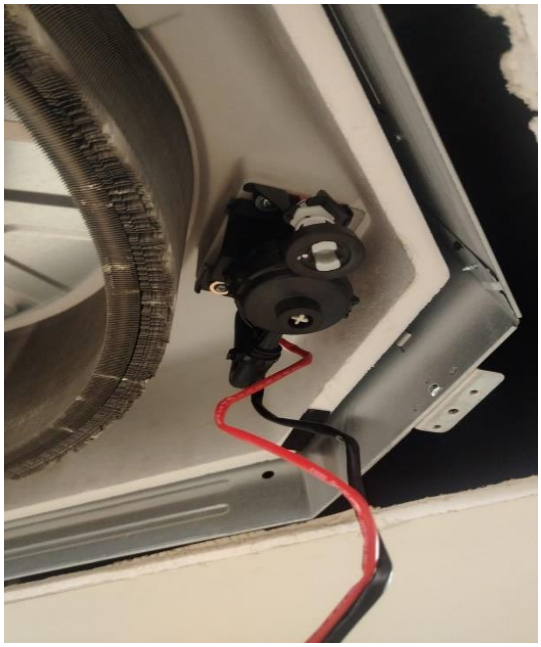

- AUDITORIO-BELEN DE LOS ANDAQUIES

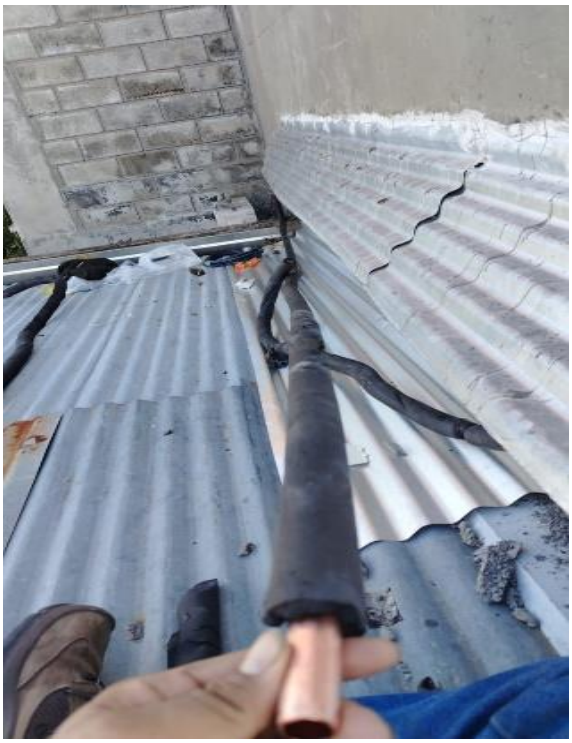




servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN



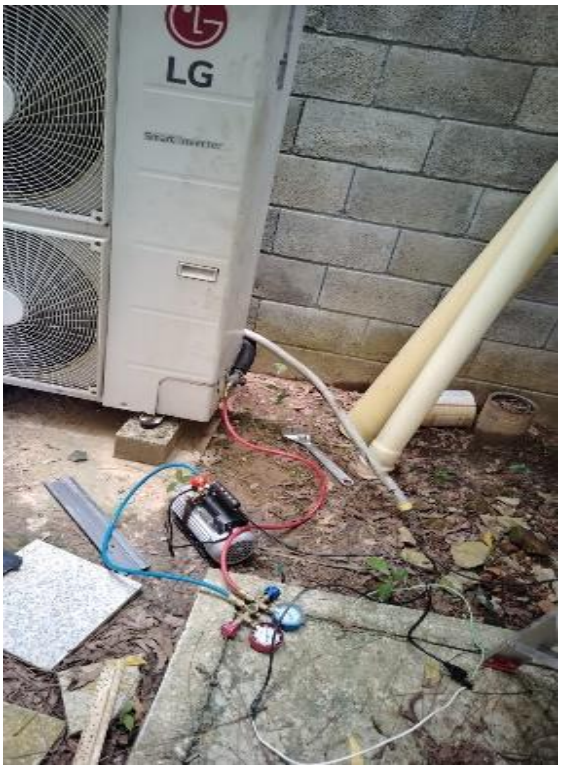



servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN

- JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL- SAN VICENTE





- OFICINA JUEZ PRIMERO-SAN VICENTE





servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN

- OFICINA JUEZ SEGUNDO-SAN VICENTE





- JUZGADO 1° PROMISCUO -SAN VICENTE





servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN

- SALA DE AUDIENCIA -JUZGADO 1° PROMISCUO-SAN VICENTE





servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN

RUTINA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS


- JUZGADO 1°N EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD









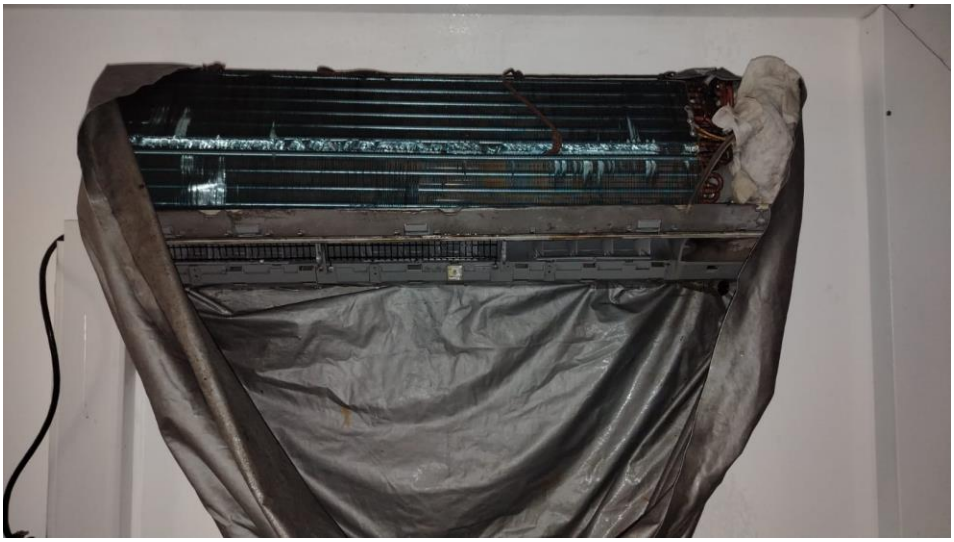

servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN

- JUZGADO 2° EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD










servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN

- SALA DE LACTANCIA



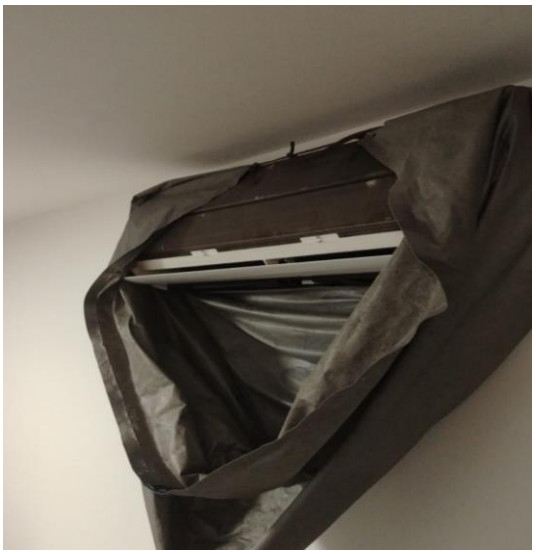

- OFICINA CUSTODIA POLICIA





servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN

- JUZGADO 4° EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD









servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA


SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN

- CUARTO RACK- PISO 1 BELEN DE LOS ANDAQUIES





- SALA DE AUDIENCIA 2 – BELEN DE LOS ANDAQUIES

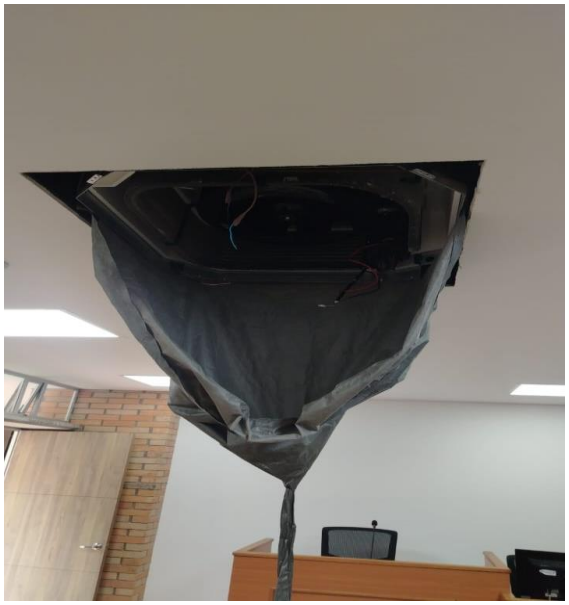



servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN

- SALA DE AUDIENCIA 1 – BELEN DE LOS ANDAQUIES





- SALA DE AUDIENCIA 3 – BELEN DE LOS ANDAQUIES





servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN

- LACTANCIA-BELEN DE LOS ANDAQUIES





- JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA -BELEN DE LOS ANDAQUIES





servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN









servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN

- JUZGADO 1° PROMISCUO MUNICIPAL DE BELEN









servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN









servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN

- JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO-BELEN DE LOS ANDAQUIES









servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN

Los equipos intervenidos durante esta rutina, Se encuentran operando con normalidad. Se recomienda al personal de la entidad configurar temperaturas en sus aires acondicionados entre 22°C y 24°C.

Cordialmente



FERNANDO DANIEL FAJARDO NÚÑEZ
C.C.79.461.245 de Bogotá
Representante Legal
Servitedh S.A.S

servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN

RELACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONTRATO No. 043 DE 2025

DESAJ- FLORENCIA

FECHA	MUNICIPIO	ORDEN DE TRABAJO No.	ZONA DE CLIMATIZACIÓN	EQUIPO	MARCA	CAPACIDAD BTU	DETALLE	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
11/11/2025	BELEN	25367	SALA DE AUDIENCIA N°1	CASSETTE	LG	40000	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA PARA TIPO CASETE DE 60000 BTU	1	UND	$ 2.318.839	$ 2.318.839
							SUMINSTRO Y AJUSTE DE CARGA REFRIGERANTE R-410 PARA EQUIPOS ECOLOGICOS Y TECNOLOGIA INVERTER	0,5	UND	$ 68.244	$ 34.122
11/11/2025	BELEN	25368	SALA DE AUDIENCIA N°2	CASSETTE	LG	40000	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA PARA TIPO CASETE DE 60000 BTU	1	UND	$ 2.318.839	$ 2.318.839
							SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE CONDENSADO	1	UND	$ 558.358	$ 558.358
13/11/2025	BELEN	25370	AUDITORIO	CASSETTE	LG	40000	INSTALACION BASICA EQUIPO 60000 BTU (MANO DE OBRA)	1	UND	$ 1.382.417	$ 1.382.417
							DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPOS MINI SPLIT DE 24000 HASTA 60000 BTU (MANO DE OBRA)	1	UND	$ 162.530	$ 162.530
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 3/8 PULGADA	15	ML	$ 31.383	$ 470.745
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE REFRIGERACION (COBRE) 5/8 PULGADA	15	ML	$ 60.256	$ 903.840
							SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	30	ML	$ 18.612	$ 558.360
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14	15	ML	$ 20.085	$ 301.275
							SUMINSTRO Y AJUSTE DE CARGA REFRIGERANTE R-410 PARA EQUIPOS ECOLOGICOS Y TECNOLOGIA INVERTER	0,5	LB	$ 68.244	$ 34.122
13/11/2025	SAN VICENTE	25355	JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL	MINISPLIT	LG	24000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU (MANO DE OBRA)	1	UND	$ 1.081.083	$ 1.081.083
							SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE METALICO EN PIE DE AMIGO PARA CONDENSADORA DE 24000 BTU	1	UND	$ 125.923	$ 125.923
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/2 PULGADA	6	ML	$ 42.681	$ 256.086
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/4 PULGADA	6	ML	$ 22.596	$ 135.576
							SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	12	ML	$ 18.612	$ 223.344
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	7	ML	$ 17.884	$ 125.188
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14	7	ML	$ 20.085	$ 140.595

servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN

13/11/2025	SAN VICENTE	25353	OFICINA JUEZ PRIMERO	MINISPLIT	YORK	12000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (MANO DE OBRA)	1	UND	$ 840.842	$ 840.842
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/4 PULGADA	4	ML	$ 22.596	$ 90.384
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 3/8 PULGADA	4	ML	$ 31.383	$ 125.532
							SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	8	ML	$ 18.612	$ 148.896
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14	5	ML	$ 20.085	$ 100.425
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	5	ML	$ 17.884	$ 89.420
13/11/2025	SAN VICENTE	25356	OFICINA JUEZ SEGUNDO	MINISPLIT	HACEB	12000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (MANO DE OBRA)	1	UND	$ 840.842	$ 840.842
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14	5	ML	$ 20.085	$ 100.425
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	5	ML	$ 17.884	$ 89.420
							SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	8	ML	$ 18.612	$ 148.896
13/11/2025	SAN VICENTE	25352	JUZGADO PRIMERO PROMISCUO	MINISPLIT	TRANE	24000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU (MANO DE OBRA)	1	UND	$ 1.081.083	$ 1.081.083
							SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE METALICO EN PIE DE AMIGO PARA CONDENSADORA DE 24000 BTU	1	UND	$ 125.923	$ 125.923
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/4 PULGADA	6	ML	$ 22.596	$ 135.578
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/2 PULGADA	6	ML	$ 42.681	$ 256.086
							SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	12	ML	$ 18.612	$ 223.344
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14	7	ML	$ 20.085	$ 140.595
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	7	ML	$ 17.884	$ 125.188

servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN

13/11/2025	SAN VICENTE	25354	JUZGADO PRIMERO PROMISCUO - SALA DE AUDIENCIA	MINISPLIT	LG	18000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (MANO DE OBRA)	1	UND	$ 840.842	$ 840.842
							SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE METALICO EN PIE DE AMIGO PARA CONDENSADORA DE 9000 A 18000 BTU	1	UND	$ 102.629	$ 102.629
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/4 PULGADA	3	ML	$ 22.596	$ 67.788
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/2 PULGADA	3	ML	$ 42.681	$ 128.043
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	4	ML	$ 17.884	$ 71.536
							SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	6	ML	$ 18.612	$ 111.672
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14	4	ML	$ 20.085	$ 80.340
SUBTOTAL											**$ 17.196.971**
IVA											**$ 3.267.424**
TOTAL											**$ 20.464.395**

ORDEN DE TRABAJO

servitedh sas
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25367

MPP ☐ MC ☑ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Belen

CIUDAD: Belen - Caquetá

ZONA DE CLIMATIZACIÓN:

UBICACIÓN: Sede de audiencias # 7

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: ATNG4106NLA4 | MODELO CONDENSADOR: AOU60F4Y

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 40.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☑
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

FOTOS ENVIADAS

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R-410
Voltaje operación	218 V
Presión de baja (PSI)	130 Psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☑	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☑	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza Cambio de tarjeta, de unidad. Condensadora reajuste de gas refrigerante. R-410A.
Equipo en Operación

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Tarjeta de unidad condensadora.	1
Reajuste de gas R-410A.	0.5

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 11-11-25	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Juan Cantin.		7717552726
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25368

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia- Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Belen

CIUDAD: Belen - Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN:

UBICACIÓN: Sala audiencias AS.

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: ATNQ40FLAY	MODELO CONDENSADOR: ARNQ40F AY
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG.	
CAPACIDAD: 40.000	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☑
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FOTOS ENVIADAS

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R-410
Voltaje operación	215 V
Presión de baja (PSI)	150 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☑	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☑	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza cambio de tarjeta unidad condensadora y suministro he instalación de bomba de condensado.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 11-11-25.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Juan Elkin. Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	Anderson Carrillo Samboni NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HULA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25370

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Belen

CIUDAD: Belen - Cequeta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Auditorio.

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: ATNQ60FMLH4	MODELO CONDENSADOR: AVNQ60FBH4
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR
MARCA: LG.	
CAPACIDAD: 60.000 Btu.	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☑
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

TOTOS ENVIADAS

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R-410
Voltaje operación	215v
Presión de baja (PSI)	125.PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	7.5°
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se Realiza Desmonte de Aire acondicionado, he Instalación de. Aire acondicionado, (Reubicación) con 15 metros de tuberia cobre. 5 3/4 y 3/8, cable señal 4 X 14 15 mts, recarga de gas refrigerante.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 13-11-25.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan Elias. Nombre del técnico:	Revisado por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

servitedh S.A.S
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25355

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑ MON

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial San Vicente

TELEFONO:

DIRECCIÓN: San Vicente Juzgados

CIUDAD: San Vicente

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado Segundo

UBICACIÓN: Premisco Municipal

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM242CE	MODELO CONDENSADOR: 2
SERIAL EVAPORADOR: ~	SERIAL CONDENSADOR: ~
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 24000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ / ___ (V1 / V2) L2 ___ / ___ (V1 / V2) L3 ___ / ___ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ / ___ (V1 / V2) L2 ___ / ___ (V1 / V2) L3 ___ / ___ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 7.7 / A (COMP1 / COMP2) L2 ___ / ___ (COMP1 / COMP2) L3 ___ / ___ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de un aire acondicionado Equipo en normal funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
* Soporte	
* Tubaria de cobre de 1/4 y 1/2 6MTS encauchetada 3x12 7MTS	
* Tubalex de 1/2 y 1/4 3+3 Rasa de 5/8	
* Señal 4x14 7MTS	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 13/11/25	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Daniel Ll / Leo Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25353

MPP [X] MC [ ] OTRO [/] MON

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama judicial San Vicente

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Juzgado San Vicente

CIUDAD: San Vicente

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juez primero

UBICACIÓN: oficina

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: ~	MODELO CONDENSADOR: ~
SERIAL EVAPORADOR: ~	SERIAL CONDENSADOR: ~
MARCA: YORK	
CAPACIDAD: 12000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

	SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE [ ]
	EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT [/]
	FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO [ ]
	CHILLER	[ ]	CASSETTE [ ]
	NEVERA	[ ]	OTRO [ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 5.1 / 1 (COMP1 COMP2) L2 ___/___ (COMP1 COMP2) L3 ___/___ (COMP1 COMP2)

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	~
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[/]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[/]	6. Reparación	[ ]	[/]
2. Montaje / Desmontaje	[/]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[/]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[/]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalación de un aire acondicionado Equipo en noimal funcionamiento
No tiene Control remoto

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
* Tubería de 1/4 Y 3/8	4 Mts
* Tiras de Rubatex	2 + 2
* Señal 4X1	5 Mts
* encauchetado 3X12	5 Mts

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 13/11/25	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Daniel H / Leo Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	Amanda Castillo NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

servitedh S.A.S
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25356

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑ MON

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial San Vicente

TELEFONO:

DIRECCIÓN: San Vicente Juzgado

CIUDAD: San Vicente

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Oficina Juez

UBICACIÓN: Segundo

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	~	MODELO CONDENSADOR:	~
SERIAL EVAPORADOR:	~	SERIAL CONDENSADOR:	~
MARCA: Haceel			
CAPACIDAD: 12000 BTU			

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___	L2 ___/___	L3 ___/___
V1 V2	V1 V2	V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___	L2 ___/___	L3 ___/___
V1 V2	V1 V2	V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 5.1 / F	L2 ___/___	L3 ___/___
COMP1 COMP2	COMP1 COMP2	COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R22
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	65 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de un aire acondicionado Equipo en normal funcionamiento
No tiene Control remoto

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
* Tubería de Cobre 3/8 4 1/2 4Mts	
v Señal 4x14 5Mts	
v encauchetado 5Mts	
v Rubaleo 2 1/2 1/2	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 13/11/25	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Daniel 21/60 Nombre del técnico:	Revisado por Jefe	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Powered by CamScanner

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25352

MPP [•] MC [ ] OTRO [/] MON

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial San Vicente

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Juzgados San Vicente

CIUDAD: San vicente

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado

UBICACIÓN: Primero Primusevo

E-MAIL: Municipal

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	~	MODELO CONDENSADOR:	~
SERIAL EVAPORADOR:	~	SERIAL CONDENSADOR:	~
MARCA: Tian			
CAPACIDAD: 24000BTU			

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[/]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
7.2	A				
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	~
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[/]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[/]	6. Reparación	[ ]	[/]
2. Montaje / Desmontaje	[/]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[/]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[/]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de un aire acondicionado quedando en normal funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS		CANTIDAD
* Soporte 1	Señal 4X14 7MTS	
* Placa de 5/8 1	Encauchetado 3X12 7MTS	
* Tubería de 1/2 y 1/4	6MTS	
* Rubatex de 1/2 y 1/4	3/4 3/4	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 13/11/25	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Daniel H/leo		Amanda Castillo.
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25354

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑ MON

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial San Vicente

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Juzgado San Vicente

CIUDAD: San Vicente

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala de Audiencias

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: MH18C2	MODELO CONDENSADOR: ~
SERIAL EVAPORADOR: ~	SERIAL CONDENSADOR: ~
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 18000BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 6.2 / A L2 ___/___ L3 ___/___

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	121 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	16°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de un aire acondicionado Equipo en normal funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
* Soporte 1	
* Tubaria de 1/2 Y 1/4 aislada 3MTS encauchetado 3X12 4MTS	
* Rubaleras de 2 1/2 + 2 1/4	
* Señal 4X14 4MTS	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 13/11/25	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Daniel H / Leo Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

servitedh SAS
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN

RELACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONTRATO No. 043 DE 2025

DESAJ- FLORENCIA

N°	FECHA	MUNICIPIO	ORDEN DE TRABAJO No.	ZONA DE CLIMATIZACIÓN	EQUIPO	MARCA	CAPACIDAD BTU	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	08/11/2025	FLORENCIA	25173	JUZGADO 1 EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	MINISPLIT	MIRAGE	18.000	1	$ 123.766	$ 123.766
2	08/11/2025	FLORENCIA	25174	JUZGADO 1 EJECUCION DE PENASS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	MINISPLIT	MIRAGE	12.000	1	$ 123.766	$ 123.766
3	08/11/2025	FLORENCIA	25172	JUZGADO 1 EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	MINISPLIT	MIRAGE	18.000	1	$ 123.766	$ 123.766
4	08/11/2025	FLORENCIA	25170	JUZGADO 2 EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	MINISPLIT	MIRAGE	18.000	1	$ 123.766	$ 123.766
5	08/11/2025	FLORENCIA	25171	JUZGADO 2 EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	MINISPLIT	MIRAGE	18.000	1	$ 123.766	$ 123.766
6	09/11/2025	FLORENCIA	25261	SALA DE LACTANCIA	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 123.766	$ 123.766
7	08/11/2025	FLORENCIA	25175	OFICINA - CUSTODIA POLICIA	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 123.766	$ 123.766
8	09/11/2025	FLORENCIA	25176	JUZGADO 4 EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - SECRETARIA	MINISPLIT	LG	18.000	1	$ 123.766	$ 123.766
9	09/11/2025	FLORENCIA	25177	JUZGADO 4 DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DESPACHO	MINISPLIT	MIDEA	12.000	1	$ 123.766	$ 123.766
10	05/11/2025	BELEN	25157	CUARTO RACK PISO 1	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 136.972	$ 136.972
11	05/11/2025	BELEN	25158	SALA DE AUDIENCIA N°2	CASSETTE	LG	40.000	1	$ 165.625	$ 165.625
12	05/11/2025	BELEN	25159	SALA DE AUDIENCIA N°1	CASSETTE	LG	40.000	1	$ 165.625	$ 165.625
13	06/11/2025	BELEN	25160	SALA DE AUDIENCIA N°3	CASSETTE	LG	40.000	1	$ 165.625	$ 165.625
14	06/11/2025	BELEN	25161	LACTANCIA	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 136.972	$ 136.972
15	06/11/2025	BELEN	25162	JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA - SECRETARIA	CASSETTE	LG	40.000	1	$ 165.625	$ 165.625
16	07/11/2025	BELEN	25163	JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA - DESPACHO	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 136.972	$ 136.972
17	07/11/2025	BELEN	25164	JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 136.972	$ 136.972
18	07/11/2025	BELEN	25165	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - N°1 - OFICINA 1	CASSETTE	LG	40.000	1	$ 165.625	$ 165.625

servitedh SAS
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN

19	07/11/2025	BELEN	25166	JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO - DESPACHO JUEZ	MINISPLIT	LG	12.000	1	$	136.972	$ 136.972
20	07/11/2025	BELEN	25167	JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO - SECRETARIA	CASSETTE	LG	40.000	1	$	165.625	$ 165.625
21	07/11/2025	BELEN	25168	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - N°1 - OFICINA 1 - SECRETARIA	MINISPLIT	LG	12.000	1	$	136.972	$ 136.972
22	07/11/2025	BELEN	25169	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL SECRETARIA - OF N°2	CASSETTE	LG	40.000	1	$	165.625	$ 165.625
23	07/11/2025	BELEN	25366	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - DESPACHO	MINISPLIT	LG	12.000	1	$	136.972	$ 136.972
24	07/11/2025	BELEN	25369	AUDITORIO	CASSETTE	LG	40.000	1	$	165.625	$ 165.625
SUB-TOTAL											**$ 3.397.698**
IVA											**$ 645.563**
TOTAL											**$ 4.043.261**

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HULA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25173

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia

TELEFONO: 3134810009.

DIRECCIÓN: Florencia.

CIUDAD: Florencia - Caqueta.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN:

UBICACIÓN: Juzgado 1 Ejecución de Penas

E-MAIL: medidas de seguridad.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: 2mxf1812	MODELO CONDENSADOR: 2mxf1812
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Mirage.	
CAPACIDAD: 18.000. Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

FOTOS ENVIADAS

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R-410
Voltaje operación	215v
Presión de baja (PSI)	135 Psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	6°
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza Mantenimiento Preventivo

Equipo en Operación

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 08-11-25.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Juan Erikson. Nombre del técnico:	Revisado por Jefe:	Laura Camila Mosquera C. NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25174

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia

TELEFONO: 3134810009.

DIRECCIÓN: Florencia

CIUDAD: Florencia- caqueta.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Despacho.

UBICACIÓN: Juzgado 1 ejecución de Penas.

E-MAIL: Medidas de Seguridad.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: ¿mF1212. MODELO CONDENSADOR: EmF12iE

SERIAL EVAPORADOR: SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: Mirage.

CAPACIDAD: 15,000 Btu

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

FOTOS ENVIADAS

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R-410
Voltaje operación	218 V
Presión de baja (PSI)	120 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑
4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑
5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑
6. Reparación	☐	☑
7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo Mantenimiento Preventivo

Equipo en operación

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCION DEL TRABAJO

Fecha: 08-11-23.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan - Elkin. Nombre del técnico:	Revisado por Jefe	Laura Camila Mosquera C. NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

CALLE 27 #08-06 Teléfono: (608) 8642204
e-mail: servitedh@hotmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25172

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia.

TELEFONO: 3134810009.

DIRECCIÓN: Florencia.

CIUDAD: Florencia - caquetá.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Entrada.

UBICACIÓN: Juzgado 1 ejecución de Penas y medidas de Seguridad.

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: cmf18tc. | MODELO CONDENSADOR: cmf1812.

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: mirage.

CAPACIDAD: 18.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

FOTOS ENVIADAS

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R-410
Voltaje operación	217v
Presión de baja (PSI)	175 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo Mantenimiento Preventivo

Equipo en Operación

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 08-11-25.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan Erazo. Nombre del técnico:	Revisado por: efe:	Laura Camila Mosquera C. NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HULA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25170

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia-

TELEFONO: 3134810009.

DIRECCIÓN: Florencia

CIUDAD: Florencia - Caquetá

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretaria

UBICACIÓN: Juzgado 9 Ejecución de Penas

E-MAIL: y medidas de seguridad

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: ¿MF18N	MODELO CONDENSADOR: ¿MF18N
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Mirage.	
CAPACIDAD: 18.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

Fotos enviadas

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R-410
Voltaje operación	218V
Presión de baja (PSI)	120 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	9°
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo Mantenimiento Preventivo
Equipo en Operación.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 08-11-25.	Hora Inicio del servicio:	Hora Fin del servicio:
Ivan - Elkin.		Andres Polania.
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HULA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25171

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de. Justicia.

TELEFONO: 3134810009.

DIRECCIÓN: Florencia

CIUDAD: Florencia- caqueta.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN:

UBICACIÓN: Juzgado 2 Ejecucion de Penas

E-MAIL: y medidas de Seguridad.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: ¿mxt18?	MODELO CONDENSADOR: ¿mxt18?
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Mirage.	
CAPACIDAD: 18.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

FOTOS ENVIADAS

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ (COMP1 COMP2) L2 ____/____ (COMP1 COMP2) L3 ____/____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refigerante	R-410
Voltaje operación	215v
Presión de baja (PSI)	120 Psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo Mantenimiento Preventivo

¿Equipo en operación.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 08-11-25.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Juan - Cliente. Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	Andres Bolaños. NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25261

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia.

TELEFONO: 3134810009.

DIRECCIÓN: Florencia

CIUDAD: Florencia. - caquetá

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Cafetería.

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VS15.2C7 | MODELO CONDENSADOR:

SERIAL EVAPORADOR: CV665. | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG.

CAPACIDAD: 12.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

FOTOS ENVIADAS

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R-410
Voltaje operación	118V
Presión de baja (PSI)	125 Psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo Mantenimiento Preventivo

Equipo en Operación

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 09 - 11 - 25.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan - Cliente. Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	JAIRO RODRIGUEZ NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25175

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia.

TELEFONO: 3134810009

DIRECCIÓN: Florencia

CIUDAD: Florencia - Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN:

UBICACIÓN: Oficina. de los custodios

E-MAIL: Policia

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: SJ24CD.	MODELO CONDENSADOR: SJ24FCD
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 24.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

FOTOS ENVIADAS

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R-410
Voltaje operación	217V
Presión de baja (PSI)	120 Psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	cf
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza Mantenimiento Preventivo.

Equipo en Operación

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 08-11-25.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Juan Pinzon.		AG: Frank Jurro Hernandez
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25176

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia.

TELEFONO: 3134810009.

DIRECCIÓN: Florencia.

CIUDAD: Florencia- Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretaria

UBICACIÓN: Juzgado 4 de ejecución J.

E-MAIL: Penas y medidas de Seguridad.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: Vm18gc7	MODELO CONDENSADOR: Vm18gc7.
SERIAL EVAPORADOR: c2531	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG.	
CAPACIDAD: 18.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

FOTOS ENVIADAS

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410
Voltaje operación	218v
Presión de baja (PSI)	120 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo Mantenimiento Preventivo

Equipo en operación

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 09-11-25.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del técnico: Jhon Elkin.	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: Caitlin Penagos 1064135458

Powered by CamScanner

Código: ST-IM-F-001

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25177

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia.

TELEFONO: 3134810009.

DIRECCIÓN: Florencia

CIUDAD: Florencia - Caquetá

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Despacho.

UBICACIÓN: Juzgado 4 descripción de

E-MAIL: Penas y medidas de seguridad.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: RSA9B-15CRM-RAC0 MODELO CONDENSADOR: MOB30-11

SERIAL EVAPORADOR: SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: 12.000 BTU Midea.

CAPACIDAD: 12.000 Btu.

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

FOTOS ENVIADAS

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R-410 410
Voltaje operación	218 v
Presión de baja (PSI)	120 psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza Mantenimiento Preventivo

Equipo en operación

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 09 - 11 - 25.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan Erikin Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	Cristian Pinzon NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25157

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Belen.

CIUDAD: Belén - caqueta.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Cuarto Rack. 1P50.

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: Vm122c7	MODELO CONDENSADOR: Vm152c7
SERIAL EVAPORADOR: 2C718	SERIAL CONDENSADOR
MARCA: LG.	
CAPACIDAD: 12.000.	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

FOTOS ENVIADAS

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R-410.
Voltaje operación	218v
Presión de baja (PSI)	120 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo Mantenimiento Preventivo

Equipo en operación

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 05-11-25.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan Zikin.		IVER RODRIGUEZ
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

servitedh S.A.S
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25158

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Belen.

CIUDAD: Belen - Caqueta.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala audiencias 1 y 2.

UBICACIÓN: Plancha

E-MAIL: [illegible]

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: ATNQ406GNCA4.	MODELO CONDENSADOR: AWNQ406HA4
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 40.000 Btu.	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☑
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

TODOS ENVIADAS

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R-410
Voltaje operación	215 v
Presión de baja (PSI)	150 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo Mantenimiento Preventivo

Equipo en Operación

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 05-11-25.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan - Elkin. Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	Anderson Garavito S. NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 PODIO

NUMERO DE ORDEN: 25159

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Belen

CIUDAD: Belen - Caquetá.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala audiencia A.P.

UBICACIÓN: terraza.

E-MAIL: circuito.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: ATNG40GNLA4	MODELO CONDENSADOR: AUUG40GHV4
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG.	
CAPACIDAD: 40.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☑
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

FOTOS ENVIADOS

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R-410
Voltaje operación	216 v
Presión de baja (PSI)	125 psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo Mantenimiento Preventivo

Equipo en operación

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 05-11-25	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Juan - Cliente.	Revisado por jefe:	CC-1117552726
Nombre del técnico:		NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HULA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25160

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Belen.

CIUDAD: Belen - caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala Audiencia 703

UBICACIÓN: terraza.

E-MAIL: Familia

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: ATNQ406NLA9	MODELO CONDENSADOR: AUUQ406HA4
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG.	
CAPACIDAD: 40.000. Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☑
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

FOTOS ENVIADAS

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R-410
Voltaje operación	218v
Presión de baja (PSI)	145 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo Mantenimiento Preventivo

Equipo en operación

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 06-11-25.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del técnico: Juan Elkin.	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: Carolina

Powered by CamScanner

servitedh S.A.S
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25161	**DATOS DEL EQUIPO**
MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐	MODELO EVAPORADOR: Vm155c7 / MODELO CONDENSADOR: Vm152C7
NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial	SERIAL EVAPORADOR: 2C883 / SERIAL CONDENSADOR:
	MARCA: LG.
TELEFONO:	CAPACIDAD: 15.000
DIRECCIÓN: Belen	**TIPO DE EQUIPO**
	SISTEMA VRF ☐ / TIPO PAQUETE ☐
CIUDAD: Belen - Caqueta	EQUIPO CENTRAL ☐ / MURAL O SPLIT ☑
ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Lactancia.	FAN COIL ☐ / PISO - TECHO ☐
UBICACIÓN: Terraza.	CHILLER ☐ / CASSETTE ☐
E-MAIL:	NEVERA ☐ / OTRO ☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

Fotos Enviadas

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R-410
Voltaje operación	218 V
Presión de baja (PSI)	120 Psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza Mantenimiento Preventivo. Equipo en Operación

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 06 - 11 - 25	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Yuun - Eikin Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	JAVIER RODRIGUEZ NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25162

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Belen.

CIUDAD: Belen- Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretaria.

UBICACIÓN: Juzgado Promiscuo de

E-MAIL: Familia.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: ATNQ406GVLA4	MODELO CONDENSADOR: AMQ406HA4.
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG.	
CAPACIDAD: 40.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☑
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

FOTOS ENVIADAS

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R-410
Voltaje operación	215 v
Presión de baja (PSI)	125 Psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza Mantenimiento Preventivo

Equipo en operación

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 06-11-25.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del técnico: Juan Ellen.	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

servitedh SAS
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25163

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Ble Belen.

CIUDAD: Belen - caqueta.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Despacho.

UBICACIÓN: Juzgado Promiscuo de.

E-MAIL: Familia.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: Amnw18GSJA	MODELO CONDENSADOR: Amnw18GJ.
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 18.000c.Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

FOTOS ENVIADAS

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ (COMP1 / COMP2) L2 ____/____ (COMP1 / COMP2) L3 ____/____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refigerante	R-410
Voltaje operación	218v
Presión de baja (PSI)	120
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	16°
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑
4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑
5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑
6. Reparación	☐	☑
7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza Mantenimiento Preventivo

Equipo en operación

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 07 - 11 /2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Juan - Elkin Nombre del técnico:	Revisado por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HULA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25164

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Belen.

CIUDAD: Belen- Caqueta.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Asistente social

UBICACIÓN: Juzgado Promiscuo de Familia

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: Vm192C7	MODELO CONDENSADOR: Vm195C7
SERIAL EVAPORADOR: C885.	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 12.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☑
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

FOTOS ENVIADAS

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R-410
Voltaje operación	215v
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	9.2°
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo Mantenimiento Preventivo

Equipo en Operación

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 07-11-2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Juan - Elkin Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

CALLE 27 #08-06 Teléfono: (608) 8642204
e-mail: servitedh@hotmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25165

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Belen.

CIUDAD: Belen- Caquetá.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretaria

UBICACIÓN: Juzgado Promiscuo municipal

E-MAIL: oficina 1

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: ATNQ40GNLA4	MODELO CONDENSADOR: AUNQ40LFA4
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 40.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☑
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

FOTOS ENVIADAS

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ (COMP1 COMP2) L2 ____/____ (COMP1 COMP2) L3 ____/____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refigerante	R-410
Voltaje operación	215 v
Presión de baja (PSI)	121 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo Mantenimiento Preventivo

Equipo en Operación

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 07-11-25.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan Erikson.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 002

NUMERO DE ORDEN: 25166

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Belen.

CIUDAD: Belen - Caqueta.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Despacho Juez.

UBICACIÓN: Juzgado Promiscuo del Circuito

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AMNW12C3AA	MODELO CONDENSADOR: AMNW12C3A
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR
MARCA: LG.	
CAPACIDAD: 12.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

FOTOS ENVIADAS

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R-410
Voltaje operación	216 V
Presión de baja (PSI)	120 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo Mantenimiento Preventivo

Equipo en operación

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 07-11-25.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan - Elkin. Nombre del técnico:	Revisado por Jefe:	CC. 1.117.552.726 NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

servitedh S.A.S
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25167

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Belen.

CIUDAD: Belen - neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretaria.

UBICACIÓN: Juzgado Promiscuo del

E-MAIL: ccrcuito

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR	ATNQ406GNLA1	MODELO CONDENSADOR	AUUQ406HA4
SERIAL EVAPORADOR		SERIAL CONDENSADOR	
MARCA	LG		
CAPACIDAD	40.000 Btu		

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☑
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

FOTOS ENVIADAS

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R-410
Voltaje operación	215v
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza Mantenimiento Preventivo

Equipo en operación

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 07-11-25.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Juan - Elkin Nombre del técnico:	Revisado por jefe	CC 7177552726 NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Powered by CamScanner

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25168

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Belen

CIUDAD: Belen - Caquetá.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Despacho

UBICACIÓN: Juzgado Promiscuo

E-MAIL: mvalen01 - Ofic 107.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AMNW18G5D4A4	MODELO CONDENSADOR: AMNW18G5T.
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 12.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

FOTOS ENVIADAS

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R-410
Voltaje operación	218v
Presión de baja (PSI)	120 Psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	9°
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo Mantenimiento Preventivo

Equipo en operación

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 07-11-25.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Juan Elkin. Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

servitedh S.A.S
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25169

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Ramo Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Belen.

CIUDAD: Belen - Caqueta.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretaria.

UBICACIÓN: Juzgado Promiscuo

E-MAIL: municipal - ofc. 42.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: 42NQ406N1CA9	MODELO CONDENSADOR: 42NQ406N1CA
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG.	
CAPACIDAD: 40.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☑
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

FOTOS ENVIADAS

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R-410
Voltaje operación	215v
Presión de baja (PSI)	120 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	9°
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza Mantenimiento Preventivo

Equipo en Operación

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 07-11-25.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del técnico: Juan Zuñiga.	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: Javier Rodriguez

CALLE 27 #08-06 Teléfono: (608) 8642204
e-mail: servitedh@hotmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

servitedh S.A.S
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HULA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25366

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Belén

CIUDAD: Belen. - Cerrete

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Despacho.

UBICACIÓN: Juzgado Promiscuo

E-MAIL: Municipal

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: [illegible]	MODELO CONDENSADOR: [illegible]
SERIAL EVAPORADOR	SERIAL CONDENSADOR
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 12.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

FOTOS ENVIADAS

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R-410
Voltaje operación	215
Presión de baja (PSI)	120
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	9°
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza Mantenimiento Preventivo

Equipo en Operación

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 7-11-25.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Evair Cerón	Revisado por jefe:	JAVIER RODRIGUEZ
Nombre del técnico:		NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HULA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25369

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Belen

CIUDAD: Belen - cgfuete.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Auditorio

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: RTNQ60E3M/AEP	MODELO CONDENSADOR: ARNQ60GHV
SERIAL EVAPORADOR	SERIAL CONDENSADOR
MARCA: LG.	
CAPACIDAD: 60.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☑
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

FOTOS ENVIADAS

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R-410
Voltaje operación	218v
Presión de baja (PSI)	128.9 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo Mantenimiento Preventivo
Equipo en Operación

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 7 - 11 - 25.	Hora Inicio del servicio	Hora fin del servicio:
Juan Cifuentes. Nombre del técnico:	Revisado por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Neiva, 20 de noviembre 2025

Señores
Ciudad

El suscrito **FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.461.245 de Bogotá D.C., actuando en representación legal de **SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA S.A.S.**, bajo la gravedad de juramento, me permito **CERTIFICAR** que hemos cumplido con el requisito establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 1150 de 2007 y nos encontramos a **PAZ Y SALVO** con el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje en los últimos seis (6) meses.



FERNANDO DANIEL FAJARDO N.
C.C. 79.461.245 de Bogotá D.C.
R/L SERVITEDH S.A.S.



IGNACIO RAMIREZ CHARRY
C.C. 12.110.812
Contador Público

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900196409	4	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFAMILIAR HUILA	CALLE 27 #8-06	NEIVA-HUILA	8642204	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1178172063	9479983678	E	2025/11/06	2025/11/04	BANCOLOMBIA	0	$6,210,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFAMILIAR HUILA (15 Afiliados)																						$20,863,150	$3,338,800			$20,863,150	$835,300			$20,436,100	$818,200			$20,863,150		$1,218,100		$0	$0		$6,210,400
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300
1	CC	1075304126	LINARES MONICA																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (1 Afiliados)																						$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000		$60,900		$0	$0		$660,900
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)																						$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000		$60,900		$0	$0		$660,900
2	CC	79461245	FAJARDO FERNANDO																		23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS017	30	$2,500,000	$100,000	CCF32	30	$2,500,000	$100,000	14-7	30	$2,500,000	2.436%	$60,900	30	$0	$0	Si	$660,900
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (13 Afiliados)																						$16,939,650	$2,711,000			$16,939,650	$678,300			$16,512,600	$661,200			$16,939,650		$1,149,700		$0	$0		$5,200,200
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (13 Afiliados)																						$16,939,650	$2,711,000			$16,939,650	$678,300			$16,512,600	$661,200			$16,939,650		$1,149,700		$0	$0		$5,200,200
3	CC	1079179247	CAVIEDES JULIAN																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
4	CC	7724635	CHAMBO JORGE																		23100 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
5	CC	1081514629	CHICUE ALEX																		23100 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
6	CC	1081156592	HERNANDEZ DANIEL	X																	23100 1	11	$521,950	$83,600	EPS037	11	$521,950	$20,900	CCF32	11	$521,950	$20,900	14-7	11	$521,950	6.960%	$36,400	11	$0	$0	Si	$161,800
7	CC	1076905704	LOPEZ BAYRON																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
8	CC	1075264295	MENDEZ OSCAR																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
9	CC	1075269433	OYOLA HENRY																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
10	CC	1080296438	PERDOMO ELKIN																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
11	CC	1075274160	PINZON IVAN											X							23030 1	9	$427,050	$68,400	EPS017	9	$427,050	$17,100	CCF32	0	$0	$0	14-7	9	$427,050	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$85,500
12	CC	1075274160	PINZON IVAN																		23030 1	21	$996,450	$159,500	EPS017	21	$996,450	$39,900	CCF32	21	$996,450	$39,900	14-7	21	$996,450	6.960%	$69,400	21	$0	$0	Si	$308,700
13	CC	8852783	PRIETO HENRY																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
14	CC	1075264121	RODRIGUEZ WILLIAM																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
15	CC	1075311993	RODRIGUEZ YOHJAN																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
16	CC	1075265699	VARGAS CARLOS	X																	23030 1	16	$759,200	$121,500	EPS005	16	$759,200	$30,400	CCF32	16	$759,200	$30,400	14-7	16	$759,200	6.960%	$52,900	16	$0	$0	Si	$235,200
Total			**Afiliados(15)**																				$20,863,150	$3,338,800			$20,863,150	$835,300			$20,436,100	$818,200			$20,863,150		$1,218,100		$0	$0		$6,210,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900196409	4	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFAMILIAR HUILA	CALLE 27 #8-06	NEIVA-HUILA	8642204	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1178172063	9479983678	E	2025/11/06	2025/11/04	BANCOLOMBIA	0	$6,210,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				15	$3,338,800	$0	$0	$3,338,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$539,200	$0	$0	$539,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$2,344,000	$0	$0	$2,344,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,218,100	$0	$0	$1,218,100
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	15	$1,218,100	$0	$0	$1,218,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$818,200	$0	$0	$818,200
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	15	$818,200	$0	$0	$818,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				15	$835,300	$0	$0	$835,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$214,000	$0	$0	$214,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$362,900	$0	$0	$362,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$201,400	$0	$0	$201,400
TOTAL				**15**	**$6,210,400**	**$0**	**$0**	**$6,210,400**

Neiva - Huila, 20 de noviembre del 2025.

CERTIFICA

Que la empresa **SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA SERVITEDH SAS** Nit **900.196.409**, sostiene relaciones comerciales en la prestación del **SERVICIO RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS INDUSTRIALES** a la fecha.

La anterior certificación se expide a petición de la parte interesada.

Cualquier información con gusto será atendida a nuestros números (8) 874 41 41 Ext:5002 ó 317 365 20000

DANIELA MACIAS ESCOBAR
Jefe de Negocios y Proyectos

ADVERTENCIA: Se recuerda que cualquier modificación, enmendadura, tacha, supresión o alteración del texto del presente certificado para su uso, se considera falsificación de documento privado de conformidad con el artículo 289 del Código Penal, y que la Compañía está en la obligación de denunciar conforme al artículo 67 del Código de Procedimiento Penal

Código de Autenticación: 063

ACTA DE GESTIóN INTEGRAL DE RESIDUOS No. 8a4ba4762nj8526

CTD-F-001 I Versión: 7 I 1-09-2020

SERVIAMBIENTAL S.A. E.S.P. certifica el Almacenamiento, Tratamiento y/o Disposición Final de los residuos relacionados a continuación, conforme a lo establecido en la licencia ambiental otorgada por la **CORPORACIóN AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA "CAM"** Resolución número 0753 del 08 de abril de 2011, modificada por la Resolución 1727 del 27 de agosto de 2014, renovada mediante Resolución 0952 del 15 de abril de 2016 y modificada nuevamente mendiante Resolución 1442 del 7 de junio de 2019.

EMPRESA	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA SERVITEDH S.A.S
NIT	900196409
CAMPO/BASE	NEIVA- CLL 27 #8-06 - NEIVA
PERIODO	2025-10-01 al 2025-10-31

RESIDUOS RECEPCIONADOS	CORRIENTE	SUBCORRIENTE ANEX0 II	CANTIDAD	UNIDAD	OBSERVACIóN	PROCESO Y/O DISPOSICIóN FINAL	DISPOSITOR FINAL
OTROS INCINERABLES			9.00	KILOGRAMO	Pastas y papas de aire acondicionado	TRATAMIENTO TERMICO (INCINERACIóN)	SERVIAMBIENTAL EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A E

TOTAL KILOGRAMOS	9.00	**Kg**
TOTAL METROS CUBICOS		**m3**
TOTAL BARRILES		**Bbl**
TOTAL GALONES		**Gl**
Según reportes N°	119580-	

De acuerdo a lo anterior **SERVIAMBIENTAL S.A.E.S.P.** se hace responsable del almacenamiento de los residuos mencionados anteriormente hasta la entrega a los diferentes dispositores para su aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final; dicha entrega se hace efectiva en periodos mínimos de tres a cuatro meses luego de recepcionados los residuos.

DESCRIPCIóN DE LOS PROCESOS INDICADOS

El tratamiento térmico (Incineración) consiste en la combustión completa del residuo, este proceso es realizado en el horno incinerador instalado en nuestra Planta de Incineración registrando temperaturas entre 800º C y 1100º C en las cámaras de combustión y postcombustión respectivamente, con sistema anti polución, por medio del cual se elimina la emisión de gases/humos tóxicos y partículas contaminantes al exterior, evitando así la contaminación ambiental.

Para constancia se firma en NEIVA el 2025-11-04

El presente certificado se expide y entrega por unica vez de manera fisica o digital por lo que la copia o replica del mismo generara un costo adicional.



BRYAN STEVEN FAJARDO SALAMANCA
JEFE DE BASE ZONA SUR

EL SUSCRITO DIRECTOR DE LA OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA DE FLORENCIA – CAQUETA

H A C E C O N S T AR

Que dentro del Contrato de prestación de servicios No.043 de 2025, suscrito con la firma "Servicios Técnicos del Huila" SERVITEHD S.A.S Nit. 900196409-4, bajo el objeto "Contratar, por el sistema de precios unitarios, el mantenimiento preventivo y/o correctivo y reparación (incluye insumos, repuestos, piezas, accesorios y mano de obra) de los aires acondicionados instalados en las sedes judiciales y palacios de justicia a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Neiva, para el Distrito Judicial de Florencia.", el cual se adjudicó mediante Resolución **DESAJNER25-3908** el 07 de octubre de 2025 en lotes, correspondiéndole al Distrito Judicial de Florencia el Lote No. 002 por la suma de **$ 236.176.380,00**

Se reciben a entera satisfacción la ejecución de las actividades correspondientes a un **Primer Informe** de cumplimiento en el Distrito Judicial de Florencia, las cuales conllevan a un **primer pago** del contrato en mención, según Factura No. **FV6650** del 21 de noviembre de 2025, por la suma de $ 24.507.656.

Se expide en la cuidad de Florencia – Caquetá, a los (21) días del mes de noviembre de 2025.

ELIANA ARTUNDUAGA AGUDELO
Directora Administrativa (A)
