
**ACTA No. 1/3**

| | |
|---|---|
| **FECHA DE RADICACIÓN** | ALCALDIA MUNICIPAL DURANIA NORTE DE SANTANDER Radicado: Fecha: 30 ABR 2025 Hora: 4:56 Folios: Recibidos: |

| | |
|---|---|
| **NÚMERO DEL CONTRATO:** | 064 DE 2025 |
| **PERIODO DEL REPORTE:** | 10 DE ABRIL DE 2025 HASTA EL 25 DE ABRIL DE 2025 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | AUNAR ESFUERZOS CONJUNTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE DURANIA (NS) |
| **CONTRATISTA:** | OBRAS CIVILES, SERVICIOS Y CONSULTORIAS – OBSECON - SAS |

## 1. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

### 1.1 LOCALIZACIÓN

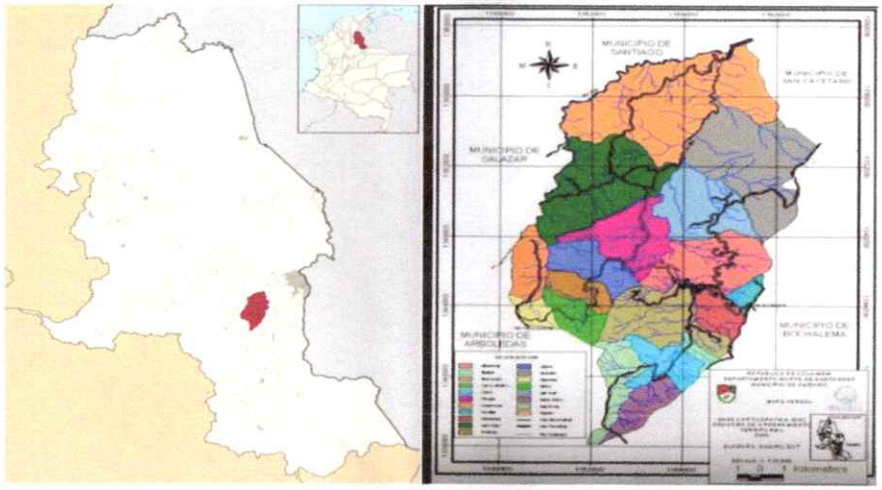


**ACTA No. 1/3**

Las actividades se desarrollan en las vías terciarias que comunican el casco urbano del Municipio de Durania con las siguientes Veredas: hacia el occidente se encuentran las veredas La Platanala y Cuajadoras cuya vía terciaria es conocida como LA TIENDA – CUAJADORAS.




Hacia el Noroccidente las Veredas de La Chuspa, Hato Viejo y Tejarito cuya vía terciaria se identifica como VIA LA CHUSPA – HATO VIEJO – PUENTE OSPINA.

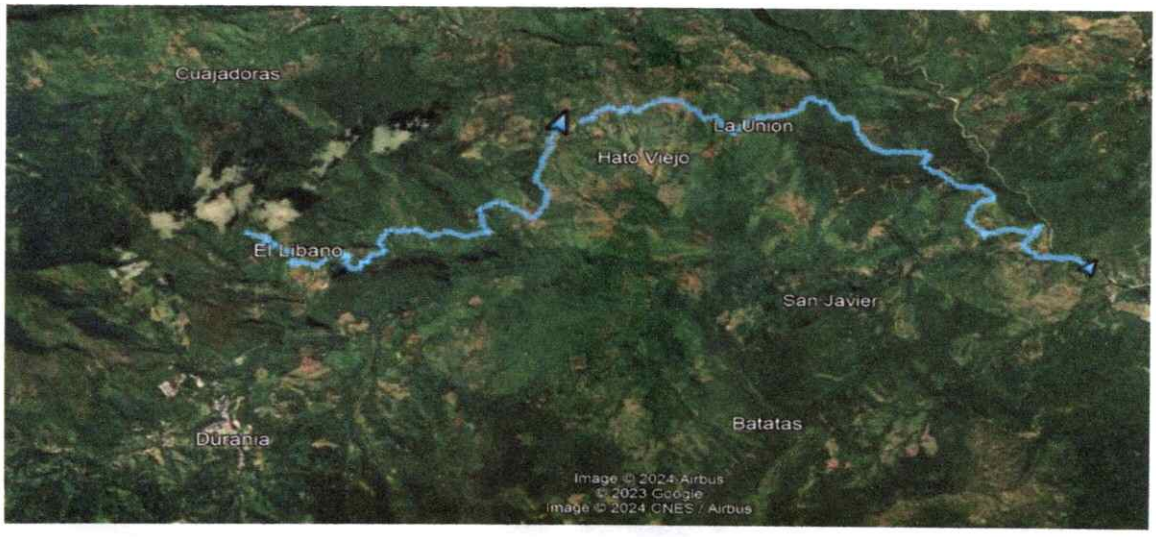


**ACTA No. 1/3**


Hacia el Suroccidente las veredas Buena vista, El Cedro, Santa Elena y Sepulturas cuya vía terciaria se identifica como BUENA VISTA – SANTA ELENA – SEPULTURAS.




Hacia el Occidente también se encuentra la vereda Buena Vista y los sectores conocidos como las Aguadas y Naranjales, dicha vía terciaria se identifica como NARANJALES - LAS AGUADAS – MIRAFLORES.




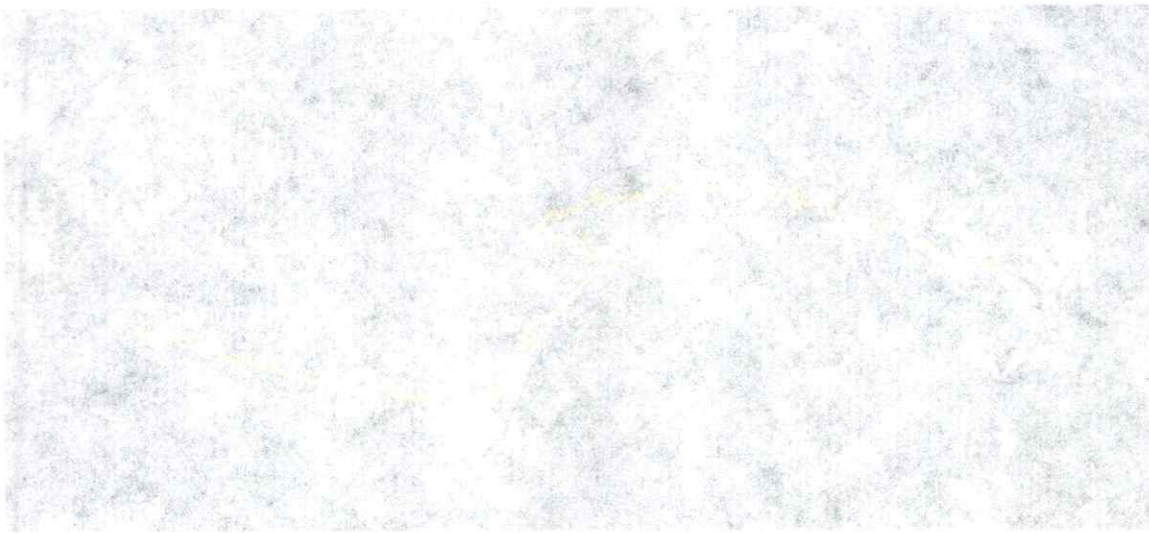

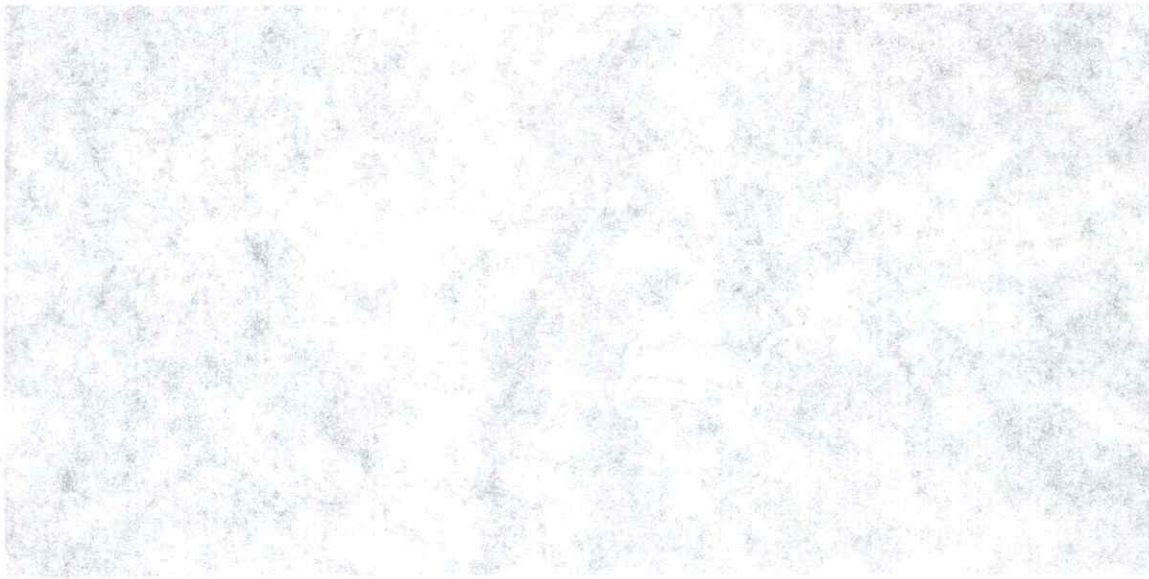

**ACTA No. 1/3**

Hacia el Nororiente las Veredas de El Almendral, San Juan y Morreton, vía terciaria identificada como DURANIA – SAN JUAN – MORRETON.

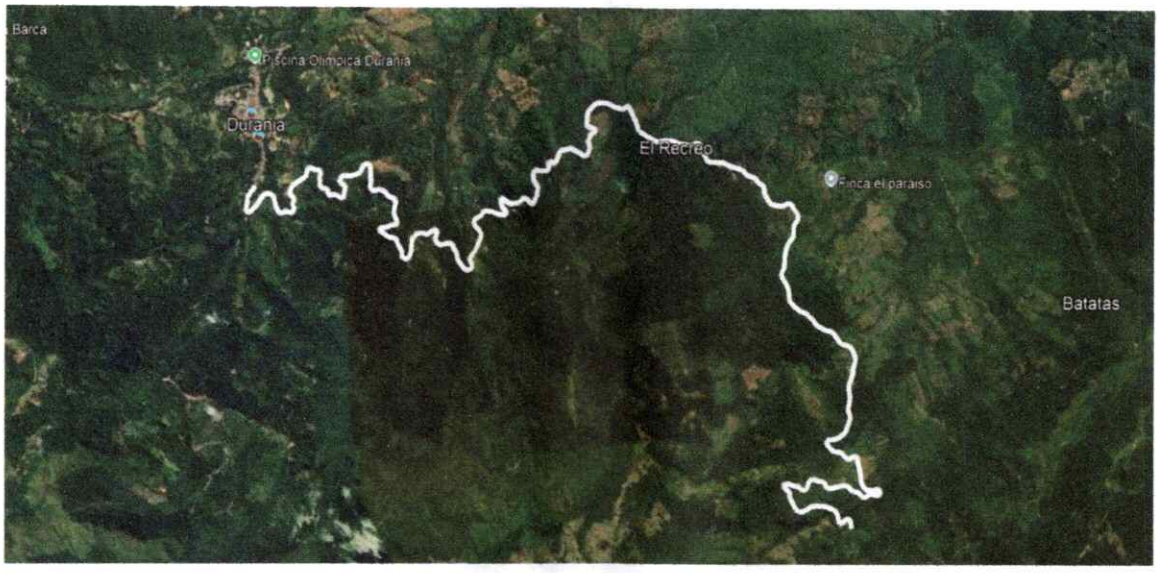



## 2. OBJETO DEL CONTRATO

En el presente informe, se describen las actividades desarrolladas durante el periodo de labores comprendido entre el 10 DE ABRIL AL 25 DE ABRIL DE 2025 del proyecto AUNAR ESFUERZOS CONJUNTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE DURANIA (NS), contratado a través del municipio de Durania, mediante convenio realizado con la Gobernación del departamento Norte de Santander.

La realización del objeto contractual incluye la ejecución de las siguientes actividades:

• Perfilado Reconformación / Cuneteo

• Mejoramiento De La Subrasante Empleando Únicamente Material Compactado Adicionado

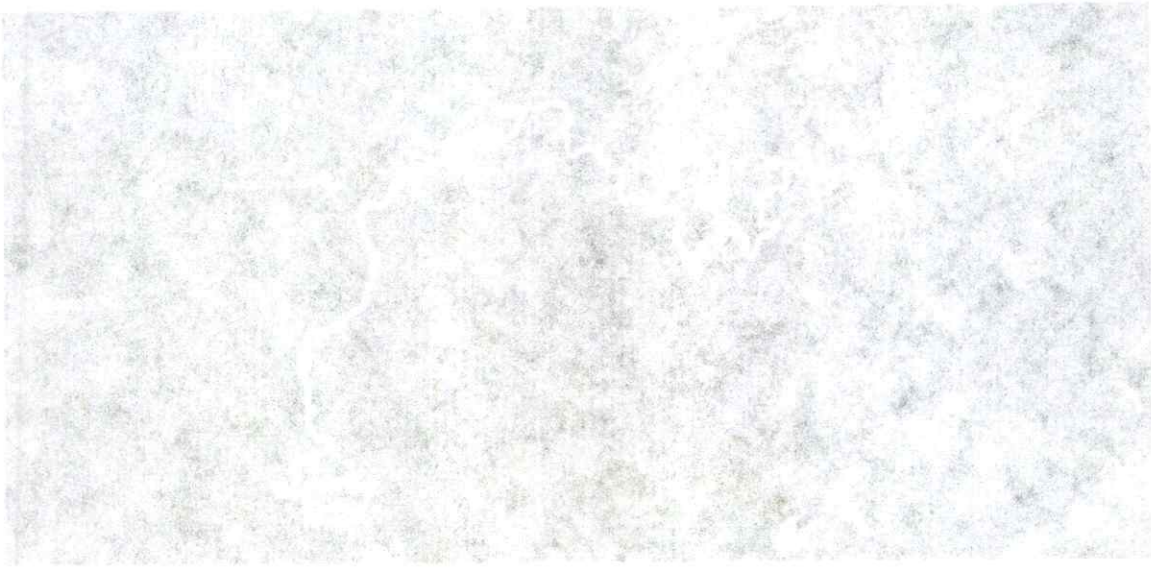

**ACTA No. 1/3**

## 3. FICHA TECNICA

| | |
|---|---|
| ***ENTIDAD CONTRATANTE:*** | *MUNICIPIO DE DURANIA - NDS* |
| ***OBJETO DEL CONTRATO:*** | *AUNAR ESFUERZOS CONJUNTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE DURANIA (NS)* |
| ***CONTRATO NO:*** | *064/2025* |
| ***CONTRATISTA:*** | *OBRAS CIVILES, SERVICIOS Y CONSULTORIAS – OBSECON - SAS* |
| ***REPRESENTANTE LEGAL*** | *MIGUEL ANGEL LOPEZ PABON* |
| ***VALOR INICIAL DEL CONTRATO:*** | *CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS ($199.560.000,00) M /CTE.* |
| ***VALOR FINAL DEL CONTRATO:*** | *CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS ($199.560.000,00) M /CTE.* |
| ***FECHA DE INICIO:*** | *ABRIL 10 DE 2025* |
| ***PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL*** | *UN (01) MES* |
| ***FECHA DE TERMINACIÓN:*** | *MAYO 09 DE 2025* |

**ACTA No. 1/3**

## 4. ESTADO DE LA OBRA.

***CUADRO DE ACTAS SUSCRITAS***

| *ACTAS SUSCRITAS* | |
|---|---|
| *ACTA DE INICIO* | *ABRIL 10 DE 2025* |
| *ACTA PARCIAL N°1* | *ABRIL 25 DE 2025* |

***PERSONAL EMPLEADO***

| *PERSONAL EMPLEADO* | *CANTIDAD* |
|---|---|
| *INGENIERO DIRECTOR DE OBRA* | *01* |
| *INGENIERO RESIDENTE* | *01* |
| *OPERARIO DE MAQUINARIA PESADA* | *02* |
| *CHOFER* | *02* |
| | |

***EQUIPO UTILIZADO***

| *EQUIPO* | *CANTIDAD* |
|---|---|
| *RETROEXCAVADORA* | *02* |
| *VIBRO COMPACTADOR* | *01* |
| *VOLQUETA* | *02* |

## 5. ACTIVIDADES CONTRATADAS

El siguiente cuadro de actividades corresponde al plasmado en el contrato de obra numero 064 DE 2025, suscrito el día 08 del mes de marzo del año 2025.

| N° | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES | | DESCRIPCION | UND | CANT | V. UNIT | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GENERAL | PARTICULAR | | | | | |
| 1 | | | | PERFILADO RECONFORMACION / CUNETEO | km | 32 | $3,920,000 | $125,440,000 |

**ACTA No. 1/3**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | | | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE EMPLEANDO UNICAMENTE MATERIAL COMPACTADO ADICIONADO | m3 | 850 | $87,200 | $74,120,000 |
| | | | | | | | **SUBTOTAL OBRAS** | **$199,560,000** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOTA 1:** se debe tener en cuenta que el **PRECIO UNITARIO** incluye el valor de **A.I.U.** | **DESCRIPCION** | | **PORCENTAJE** |
| **NOTA 2:** Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. | **ADMINIS.** | **A=** | 30% |
| **NOTA 3:** El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). | **IMPREV.** | **I=** | 1% |
| | **UTIL.** | **U=** | 4% |
| | **TOTAL** | **A.I.U.=** | 35% |

## 6. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA A LA FECHA

Según las condiciones Técnicas y para el desarrollo del contrato se llevó a cabo las siguientes actividades:

Las actividades ejecutadas por el contratista a la fecha son las que se relacionan en el acta parcial N°1 adjunta al presente informe.

## 7. VERIFICACION DE POLIZAS DE OBRA

| CONTRATO DE OBRA | COMPAÑÍA DE SEGUROS | POLIZAS N° | AMPARO | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO | ESTADO DE LAS POLIZAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESDE | HASTA | | |
| Cumplimiento | Aseguradora solidaria de Colombia | 460-47-994000084703 ANEXO 0 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 08/03/2025 | 08/08/2025 | $19.956.000,00 | **VIGENTE** |
| Estabilidad | Aseguradora solidaria de Colombia | 460-47-994000084703 ANEXO 0 | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 09/05/2025 | POR SEIS MESES | $19.956.000,00 | **VIGENTE** |
| Extracontractual | Aseguradora solidaria de Colombia | 460-74-994000008582 ANEXO 0 | PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 08/03/2025 | 08/04/2025 | $284.700.000,00 | **VIGENTE** |
| Salarios | Aseguradora solidaria de Colombia | 460-47-994000084703 ANEXO 0 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 08/03/2025 | 08/04/2028 | $9.978.000,00 | **VIGENTE** |

**Póliza según contrato de obra**

## ACTA No. 1/3

| CONTRATO DE OBRA | COMPAÑÍA DE SEGUROS | POLIZAS Nº | AMPARO | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO | ESTADO DE LAS POLIZAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESDE | HASTA | | |
| Cumplimiento | Aseguradora solidaria de Colombia | 460-47-994000084703 ANEXO 1 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 10/04/2025 | 09/09/2025 | $19.956.000,00 | VIGENTE |
| Estabilidad | Aseguradora solidaria de Colombia | 460-47-994000084703 ANEXO 1 | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 09/05/2025 | POR SEIS MESES | $19.956.000,00 | VIGENTE |
| Extracontractual | Aseguradora solidaria de Colombia | 460-74-994000008582 ANEXO 1 | PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 10/04/2025 | 09/05/2025 | $284.700.000,00 | VIGENTE |
| Salarios | Aseguradora solidaria de Colombia | 460-47-994000084703 ANEXO 1 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 10/04/2025 | 09/05/2028 | $9.978.000,00 | VIGENTE |

**Póliza según modificación**

**MIGUEL ANGEL LOPEZ PABON**
C.C. No. 1.094.426.101 DE DURANIA

**ACTA No. 1/3**

**ANEXOS:**


**ACTA No. 1/3**

## 8. MEMORIAS DE CALCULO

# ACTA No. 1/3

**MEMORIAS DE OBRA**

| OBRA | AUNAR ESFUERZOS CONJUNTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE DURANIA (NS) | LOCALIZACION | DIMENSIONES | | | CANT. | MEDIDA | UND. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | PERFILADO RECONFORMACION / CUNETEO | DURANIA - VIA LA TIENDA - CUAJADORAS | LONGITUD | ANCHO | ESPESOR | | | |

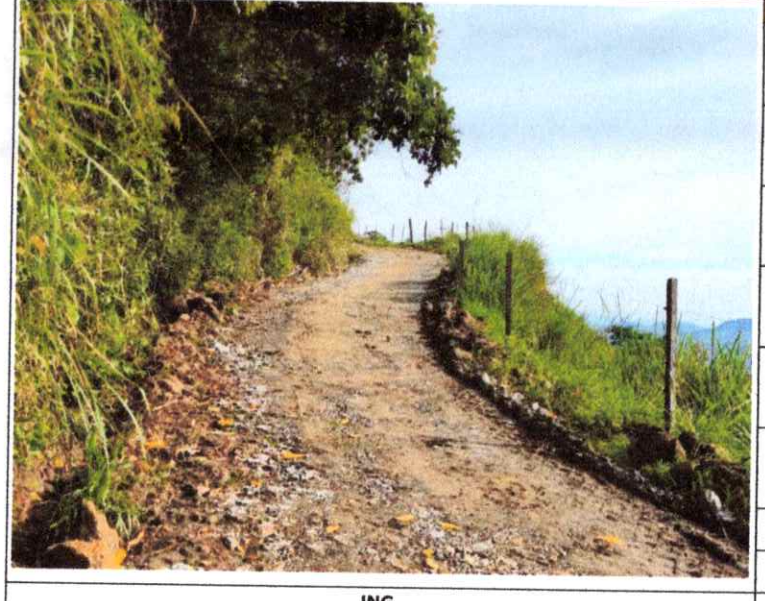

| PERFILADO RECONFORMACION / CUNETEO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PR 0+000 PR 2+770 | 2263.00 | | | 1.00 | 2.263 | Km |
| PR 2+942 PR 3+539 | 597.00 | | | 1.00 | 0.597 | Km |
| PR 3+963 PR 4+594 | 595.00 | | | 1.00 | 0.595 | Km |
| PR 4+826 PR 5+192 | 366.00 | | | 1.00 | 0.366 | Km |
| PR 5+472 PR 5+812 | 340.00 | | | 1.00 | 0.34 | Km |
| PR 6+750 PR 7+022 | 272.00 | | | 1.00 | 0.272 | Km |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| OBSERVACIONES | | | SUMAN | | 4.433 | Km |

| ING. | OBSERVACIONES |
|---|---|
| ING. ROGER HUMBERTO ALVAREZ | |


# ACTA No. 1/3

**MEMORIAS DE OBRA**

| OBRA | AUNAR ESFUERZOS CONJUNTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE DURANIA (NS) | LOCALIZACION | DIMENSIONES | | | CANT. | MEDIDA | UND. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE EMPLEANDO UNICAMENTE MATERIAL COMPACTADO ADICIONADO | DURANIA - VIA LA TIENDA - CUAJADORAS | LONGITUD | ANCHO | ESPESOR | | | |



| MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE EMPLEANDO UNICAMENTE MATERIAL COMPACTADO ADICIONADO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PR 1+948 PR 2+121 | 173.00 | 4.00 | 0.15 | 1.00 | 104 | m3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ING. | OBSERVACIONES | | SUMAN | | 104 | m3 |
| ING. ROGER HUMBERTO ALVAREZ | | | | | | |

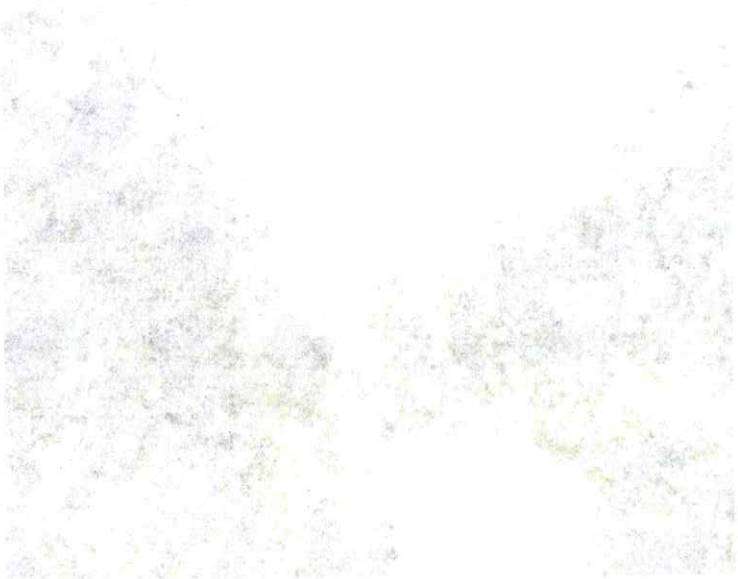

## ACTA No. 1/3

**MEMORIAS DE OBRA**

| OBRA | AUNAR ESFUERZOS CONJUNTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE DURANIA (NS) |
|---|---|
| 1.0 | PERFILADO RECONFORMACION / CUNETEO |



| LOCALIZACION | DIMENSIONES | | | CANT. | MEDIDA | UND. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DURANIA - VIA LA CHUSPA - HATO VIEJO | LONGITUD | ANCHO | ESPESOR | | | |
| **PERFILADO RECONFORMACION / CUNETEO** | | | | | | |
| PR 3+220 PR 3+972 | 538.00 | | | 1.00 | 0.538 | Km |
| PR 4+427 PR 5+319 | 892.00 | | | 1.00 | 0.892 | Km |
| PR 6+181 PR 6+493 | 312.00 | | | 1.00 | 0.312 | Km |
| PR 6+834 PR 7+294 | 460.00 | | | 1.00 | 0.46 | Km |
| PR 7+610 PR 8+132 | 522.00 | | | 1.00 | 0.522 | Km |
| PR 9+691 PR 10+007 | 316.00 | | | 1.00 | 0.316 | Km |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| OBSERVACIONES | | | SUMAN | | 3.04 | Km |

| ING. |
|---|
| ING. ROGER HUMBERTO ALVAREZ |

# ACTA No. 1/3

**MEMORIAS DE OBRA**

| OBRA | AUNAR ESFUERZOS CONJUNTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE DURANIA (NS) | LOCALIZACION | DIMENSIONES | | | CANT. | MEDIDA | UND. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE EMPLEANDO UNICAMENTE MATERIAL COMPACTADO ADICIONADO | DURANIA - VIA LA CHUSPA - HATO VIEJO | LONGITUD | ANCHO | ESPESOR | | | |



| MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE EMPLEANDO UNICAMENTE MATERIAL COMPACTADO ADICIONADO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PR 4+427 PR 4+597 | 170.00 | 4.00 | 0.15 | 1.00 | 102 | m3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| ING. | OBSERVACIONES | SUMAN | | 102 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|
| ING. ROGER HUMBERTO ALVAREZ | | | | | |

**ACTA No. 1/3**


## 9. REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

## ACTA No. 1/3


**PERFILADO RECONFORMACION / CUNETEO**

En este item se llevaron a cabo los trabajos necesarios para el cuneteo, perfilado y reconformación de la subrasante de la via dejandola nivelada y compactada.




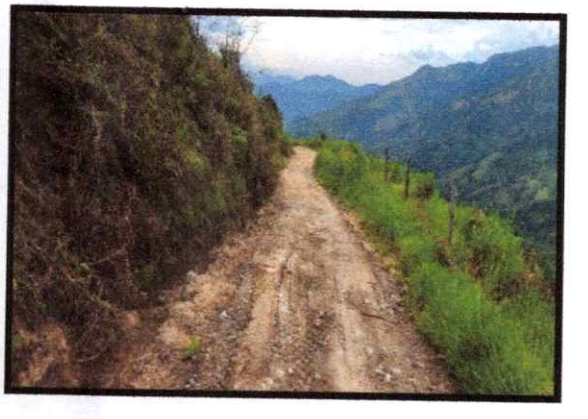



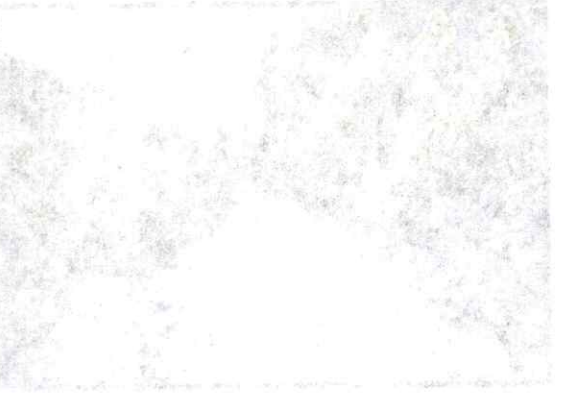


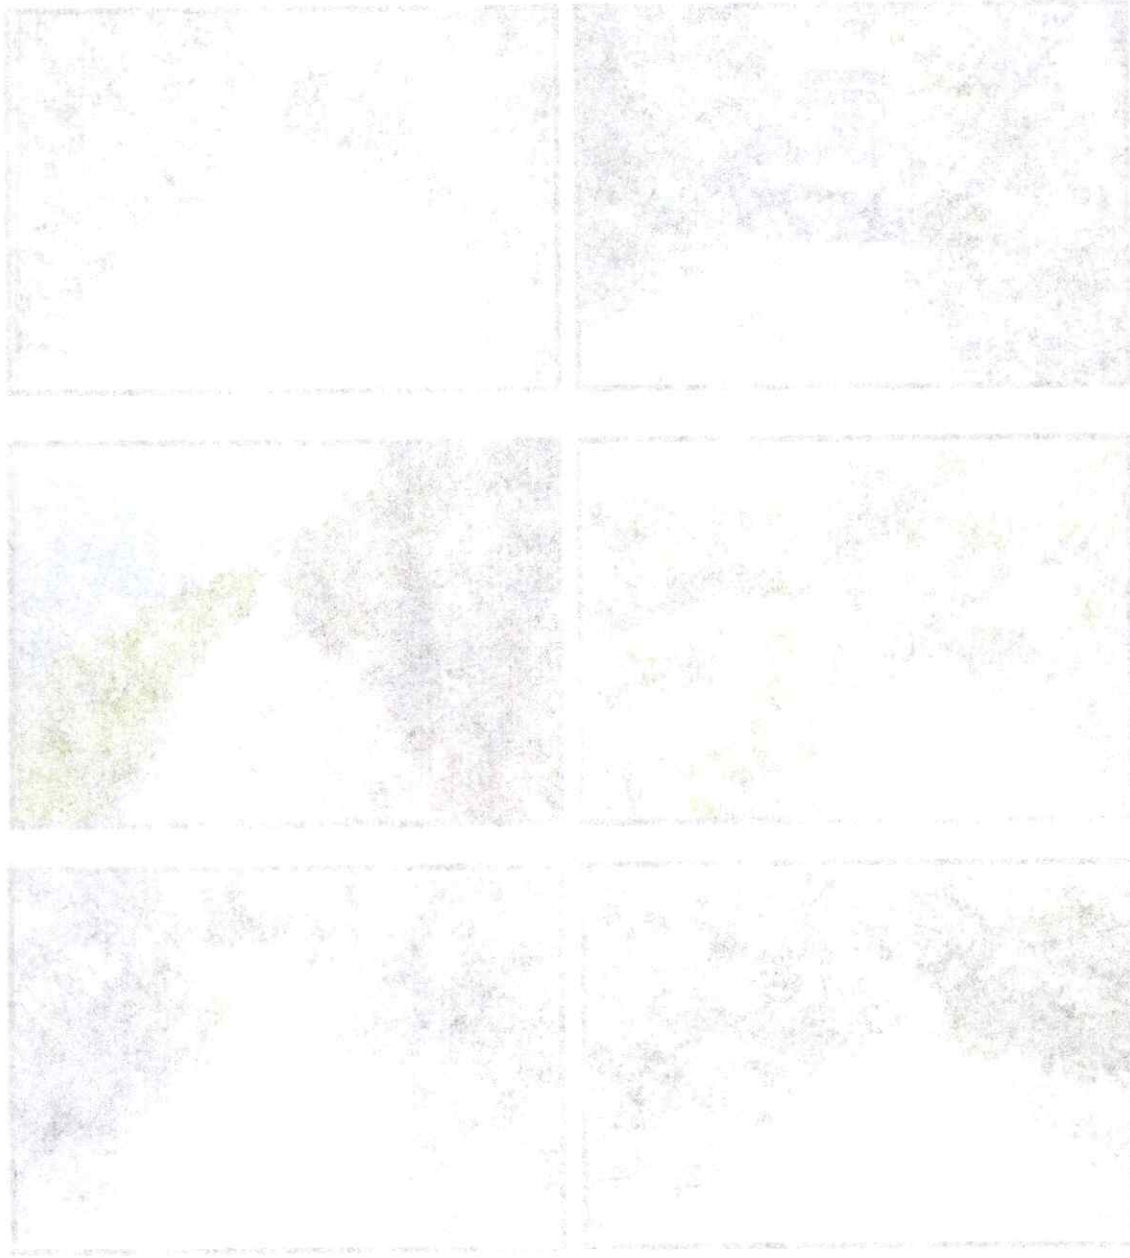


**ACTA No. 1/3**




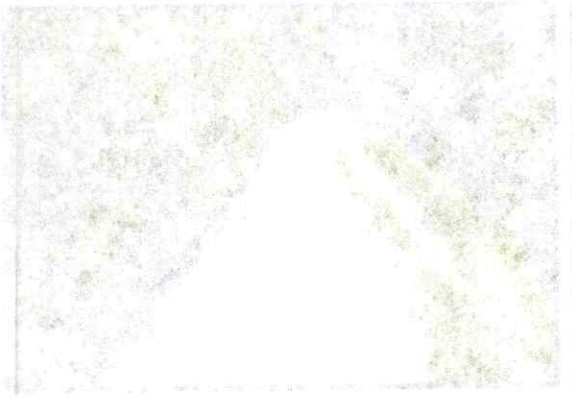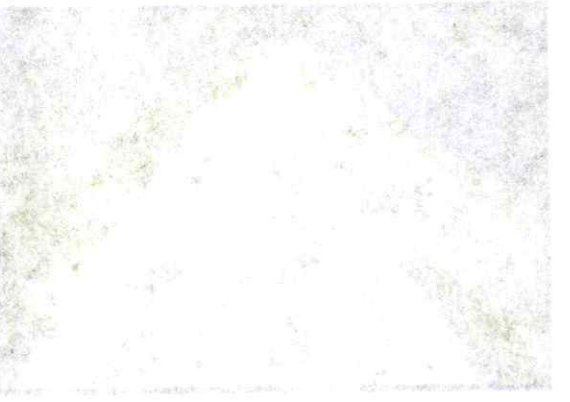

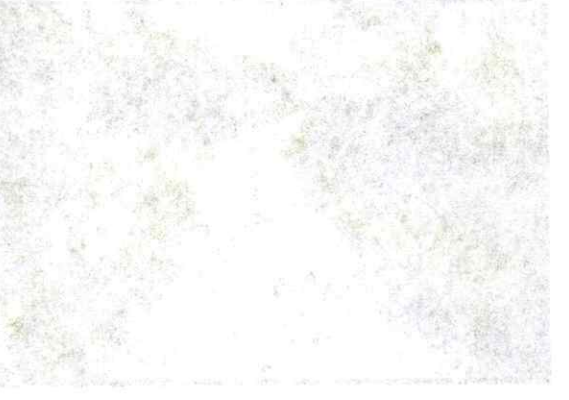


**ACTA No. 1/3**



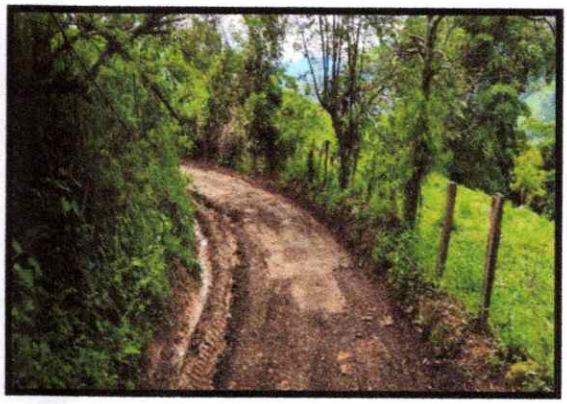



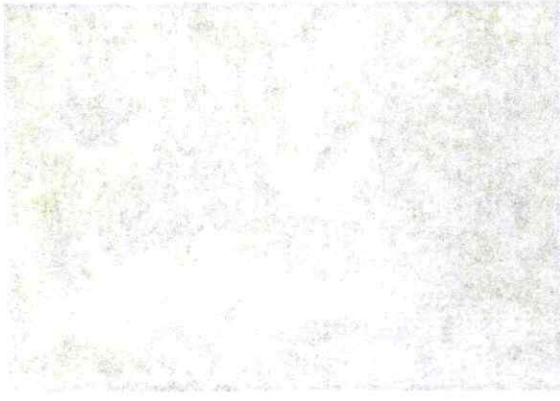





**ACTA No. 1/3**

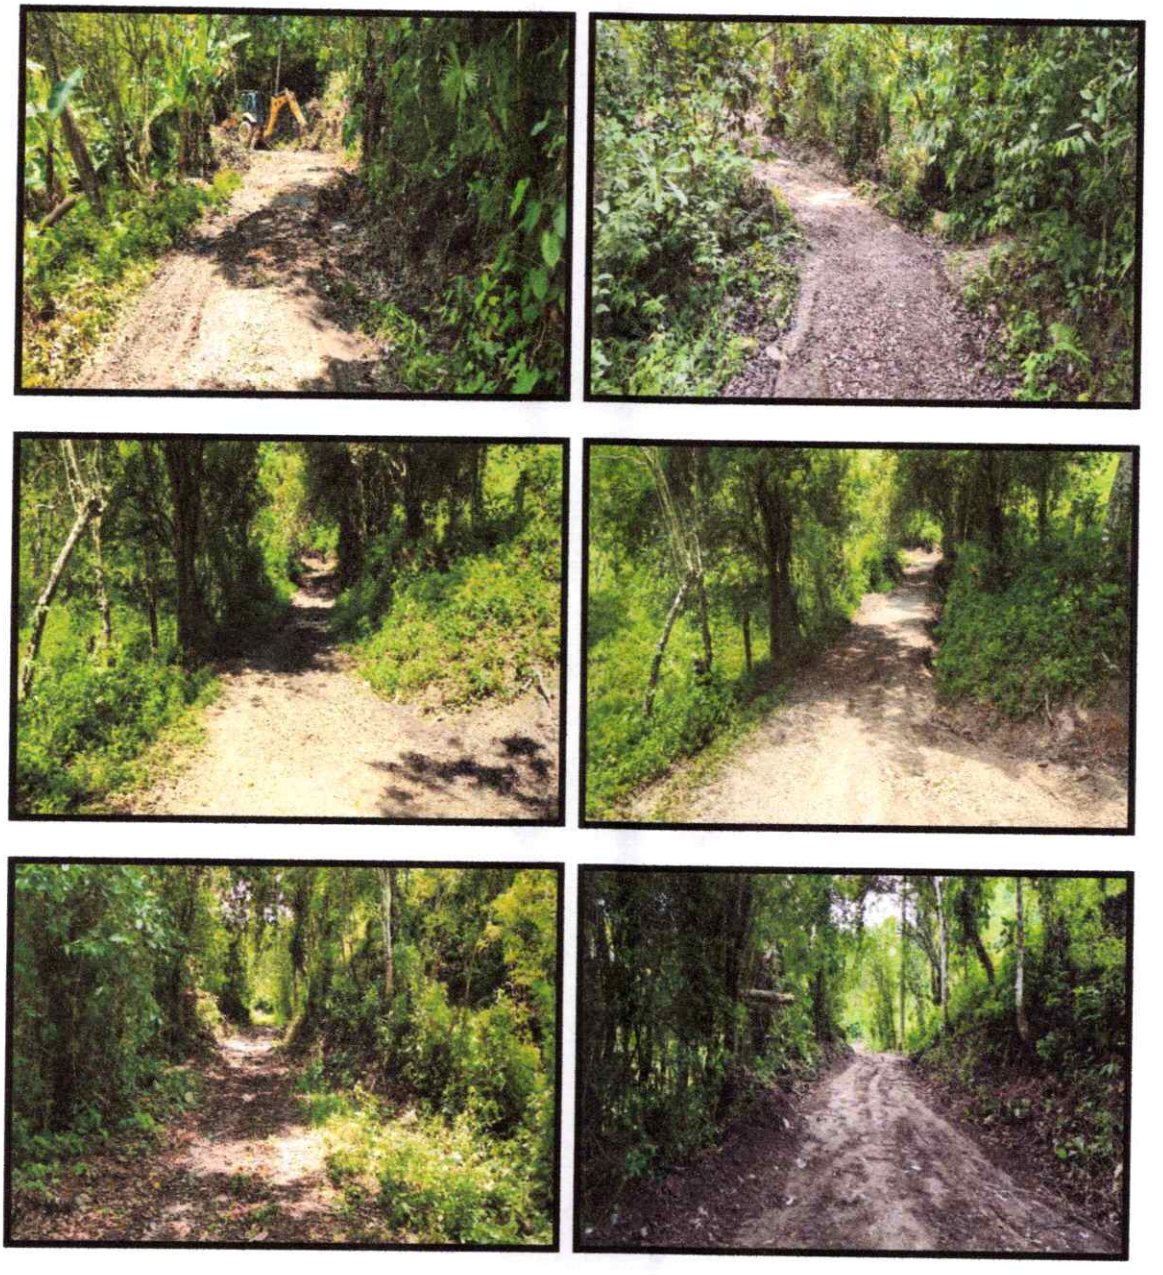

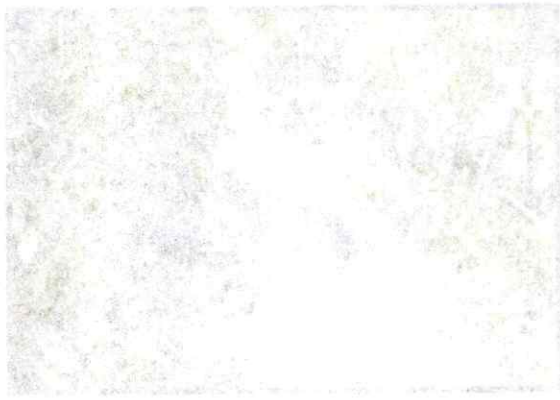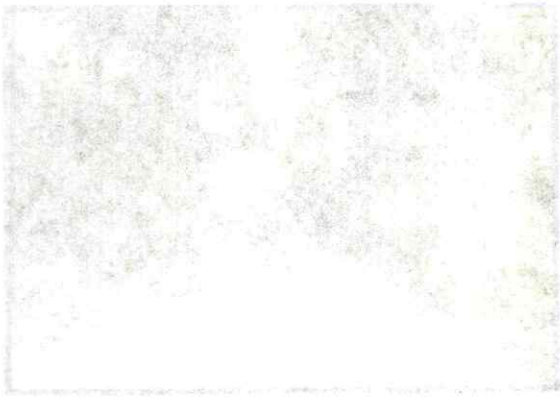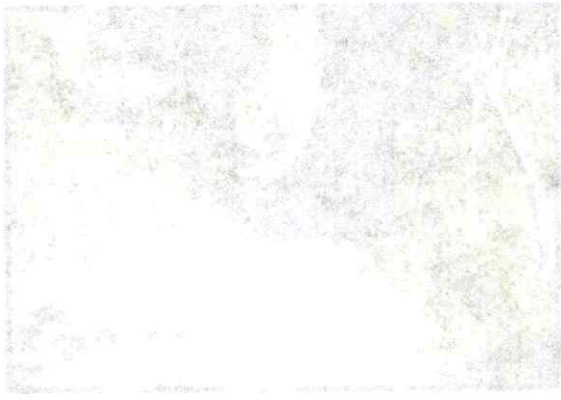

## ACTA No. 1/3

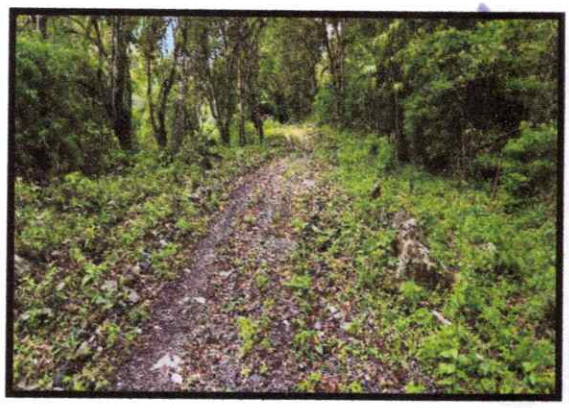


**MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE EMPLEANDO UNICAMENTE MATERIAL COMPACTADO ADICIONADO**

En este item se llevaron a cabo los trabajos necesarios para mejorar la subrsante adicionando material y extendiendoo por medio de la retroexcavadora para posteriormente compactarlo con el vibrocompactador.






**ACTA No. 1/3**

## REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS


## ACTA No. 1/3

**PERFILADO RECONFORMACION / CUNETEO**

En este item se llevaron a cabo los trabajos necesarios para el cuneteo, perfilado y reconformación de la subrasante de la via dejandola nivelada y compactada.



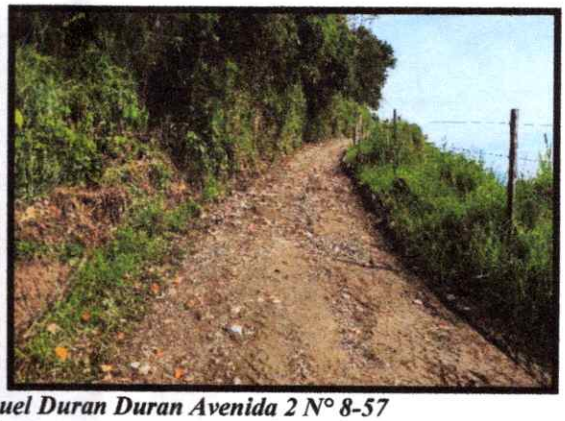

**ACTA No. 1/3**









**ACTA No. 1/3**



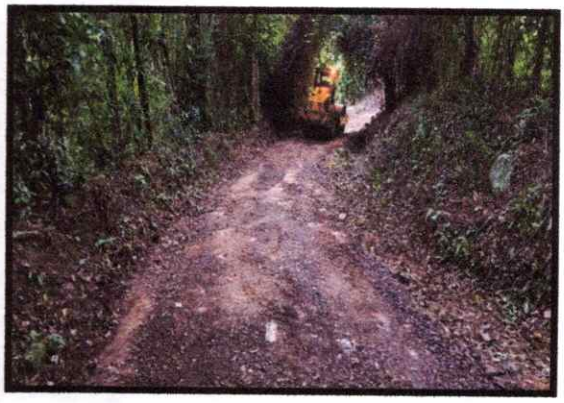

**ACTA No. 1/3**




**MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE EMPLEANDO UNICAMENTE MATERIAL COMPACTADO ADICIONADO**

En este item se llevaron a cabo los trabajos necesarios para mejorar la subrsante adicionando material y extendiendoo por medio de la retroexcavadora para posteriormente compactarlo con el vibrocompactador.






## RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| NI 900947633 | 1 | OBRAS CIVILES SERVICIOS Y CONSULTORIAS OBSECON SAS | B | 0 | POSITIVA - 14-23 | SUCURSAL | 4290 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 54-239 | CALLE 6 5 25 BRR SAN MIGUEL | | 3115603592 | | | OBSECON@GMAIL.COM | | S |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2025-04 | 2025-05 | 33245348 | E | 2025-04-25 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 1.646.300 | 0 | BANCOLOMBIA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 5 | 33245348 | 2025-05-09 | Pagada | | | | | | | |

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | DÍAS | | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | | | Total | Exento de Parafiscales | Actividad Económica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | ID | EMPLEADO | SALARIO | MODALIDAD DE SALARIO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | EPST | AFPT | AFP | EPS | CCF | ARL | NOMBRE | IBC | Cot | FNSOL | FNSUB | NOMBRE | IBC | Cot | NOMBRE | IBC | Cot | IBC | Cot. | ARL | IBC | Cot. | Cot. | Cot. | Cot. | Cot. | Tipo Cot. | Sub. Tipo Cot. | | | |
| 1 | CC 13412433 | CARVAJAL RINCON JOSE JAVIER | 1.423.500 | F | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 12 | 12 | 12 | 12 | COLPENSIONES-25-14 | 569.400 | 91.200 | 0 | 0 | COMFAORIENTE-CCFC50 | 569.400 | 22.800 | COMFANORTE-CCF37 | 569.400 | 22.800 | 569.400 | 39.700 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 176.500 | S | 5421001 |
| 2 | CC 88226228 | MEZA VEGA JESUS FERNANDO | 1.423.500 | F | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 29 | 29 | 29 | 29 | PROTECCION-230201 | 1.376.050 | 220.200 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 1.376.050 | 55.100 | COMFANORTE-CCF37 | 1.376.050 | 55.100 | 1.376.050 | 95.800 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 426.200 | S | 5429001 |
| 3 | CC 88264149 | ALVAREZ JAIMES ROGER HUMBERTO | 1.423.500 | F | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 1.423.500 | 57.000 | COMFANORTE-CCF37 | 1.423.500 | 57.000 | 1.423.500 | 99.100 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 440.900 | S | 5429001 |
| 4 | CC 1090517959 | LOPEZ RAMIREZ CARLOS MARIO | 1.423.500 | F | X | X | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 11 | 11 | 11 | 11 | PORVENIR-230301 | 521.950 | 83.600 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 521.950 | 20.900 | COMFANORTE-CCF37 | 521.950 | 20.900 | 521.950 | 36.400 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 161.800 | S | 5421001 |
| 5 | CC 1094426101 | LOPEZ PABON MIGUEL ANGEL | 1.423.500 | F | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 1.423.500 | 57.000 | COMFANORTE-CCF37 | 1.423.500 | 57.000 | 1.423.500 | 99.100 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 440.900 | S | 5421001 |


## RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| NI 900947633 | 1 | OBRAS CIVILES SERVICIOS Y CONSULTORIAS OBSECON SAS | B | 0 | POSITIVA - 14-23 | SUCURSAL | 4290 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 54-239 | CALLE 6 5 25 BRR SAN MIGUEL | | 3115603592 | | | OBSECON@GMAIL.COM | | S |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2025-04 | 2025-05 | 33245348 | E | 2025-04-25 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 1.646.300 | 0 | BANCOLOMBIA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 5 | 33245348 | 2025-05-09 | Pagada | | | | | | | |


| TOTALES IBC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
| 5.314.400 | 5.314.400 | 5.314.400 | 5.314.400 | 0 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP(Administradoras: 3) | | | | 5 | 850.600 | 0 | 0 | 0 | 850.600 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900336004 | 7 | 1 | 91.200 | 0 | 0 | 0 | 91.200 |
| PORVENIR | 230301 | 800224808 | 8 | 3 | 539.200 | 0 | 0 | 0 | 539.200 |
| PROTECCION | 230201 | 800229739 | 0 | 1 | 220.200 | 0 | 0 | 0 | 220.200 |
| EPS(Administradoras: 3) | | | | 5 | 212.800 | 0 | 0 | 0 | 212.800 |
| COMFAORIENTE | CCFC50 | 890500675 | 6 | 1 | 22.800 | 0 | 0 | 0 | 22.800 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANITAS | EPS005 | 800251440 | 6 | 3 | 169.100 | 0 | 0 | 0 | 169.100 |
| NUEVA E.P.S. S.A. | EPS037 | 900156264 | 2 | 1 | 20.900 | 0 | 0 | 0 | 20.900 |
| ARP(Administradoras: 1) | | | | 5 | 370.100 | 0 | 0 | 0 | 370.100 |
| POSITIVA | 14-23 | 860011153 | 6 | 5 | 370.100 | 0 | 0 | 0 | 370.100 |
| CCF(Administradoras: 1) | | | | 5 | 212.800 | 0 | 0 | 0 | 212.800 |
| COMFANORTE | CCF37 | 890500516 | 3 | 5 | 212.800 | 0 | 0 | 0 | 212.800 |
| Gran Total | | | | | 1.646.300 | 0 | 0 | 0 | 1.646.300 |

PAGADO
