	Proceso: Gestión Contractual	
	FORMATO DE INFORME CONTRATISTA	

INFORME 2 SEMANA	**x**

INFORMACIÓN BÁSICA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA PRINCIPAL										
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME								19	09	25
PERIODO DE REPORTE DEL INFORME	Del 15 de Septiembre de 2025 hasta el 20 de Septiembre de 2025									
TIPO DE CONTRATO	*Proceso mínima cuantía MC-DG-DAF-003-2025.*									
No. CONTRATO o CONVENIO o ACEPTACIÓN DE OFERTA	CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8177083 DE 2025									
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JAIME YAMIL SANCHEZ HERNANDEZ									
C.C.	14.229.717									
OBJETO DEL CONTRATO o CONVENIO o ACEPTACIÓN DE OFERTA	CONTRATAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DIRECCIÓN GENERAL, SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL Y CASA TEUSAQUILLO DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA									
ACTA DE INICIO	**SI**	x	**N/A**		**FECHA SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO**			02	09	25
FECHA DE INICIO	02	09	25	**FECHA DE TERMINACIÓN**				16	10	25
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$40.323.105				**FORMA DE PAGO**					
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.					**REGISTRO PRESUPUESTAL No.**			No. 631225 del 19 de agosto de 2025		
Supervisión o Interventor										
NOMBRE DEL SUPERVISOR	HECTOR DANIEL MENJUREN VEGA									
CARGO	SUPERVISOR									

ACTIVIDAD 2

SUMINISTRO E INSTALACION COMPRESOR

Suministro e instalación de compresor odontológico, incluye red eléctrica y red de aire.

ESTA ACTIVIDAD NO SE HA PODIDO REALIZAR PORQUE EL COMPRESOR NO CAVE EN EL ESPACIO ASIGNADO HAY QUE MODIFICAR LA PUERTA PARA QUE QUEDE ABRIENDO HACIA AFUERA



FOTO COMPRESOR

13 DE SEPTIEMBRE DE 2025

AVANCE: 0% CON RESPECTO AL CRONOGRAMA DE PROGRAMACION INICIAL. EL COMPRESOR SE ENCUENTRA EN OBRA. En espera del arreglo de la puerta. LA ACTIVIDAD NO RETRASA LA PROGRAMACION INICIAL AL SER ACTIVIDADES INDEPENDIENTES.

ACTIVIDAD 3

Resane, suministro y aplicación de pintura blanca tipo vinilo, dos manos en paredes definidas por la supervisión.



FOTO TECHO ENTRADA PRINCIPAL
20 DE SEPTIEMBRE DE 2025

AVANCE: 0% CON RESPECTO AL CRONOGRAMA DE PROGRAMACION INICIAL

ACTIVIDAD 5

Suministro e instalación de mediacaña para complementar el existente. Debidamente sellado con poliuretano y pintado con pintura epoxica, paredes consultorio médico.

CANTIDAD EJECUTADA: 55,56 ML

área intervenida	alto	cantidad	sub total
consultorio 1			
paredes	30	1	30
Consultorio 2			
Paredes	25,56	1	25,56
TOTAL			55,56






20 DE SEPTIEMBRE DE 2025
AVANCE 100% CON RESPECTO AL CRONOGRAMA DE PROGRAMACION INICIAL

ACTIVIDAD 6
Ajuste de mediacaña en PVC instalada, complementación de perfil de soporte, accesorios, aplicación de sello en poliuretano y pintura epoxica.

CANTIDAD EJECUTADA: 41,89 ML

Área intervenida	Long	cantidad	subtotal
Consultorio 1			
Cubierta, pisos, paredes	17	1	17
Consultorio 2			
Cubierta, pisos, paredes	17	1	17
Área de servicios			
Cubierta, pisos, paredes	7,89	1	7,89
TOTAL			41,89

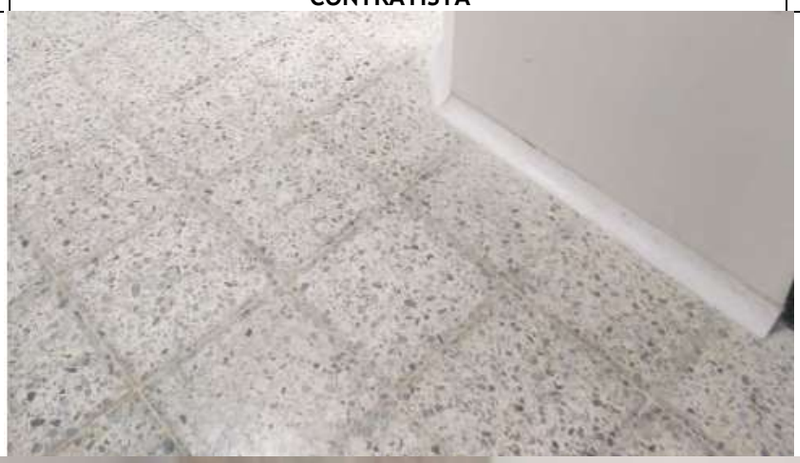





20 DE SEPTIEMBRE DE 2025

AVANCE: 100% CON RESPECTO AL CRONOGRAMA DE PROGRAMACION INICIAL

ACTIVIDAD 7

Pintura de guardaescoba en madera e instalación de las que están desprendidas de la pared.

AVANCE: 0% CON RESPECTO AL CRONOGRAMA DE PROGRAMACION INICIAL. SE DETERMINO DEJAR ESTA ACTIVIDAD PARA CUANDO SE TERMINE LA PINTURA.

ACTIVIDAD 9

Suministro e instalación de logo institucional, similar al actualmente instalado en color institucional.
SUMINISTRO E INSTALACION DE LOGO

AVANCE 0% CON RESPECTO AL CRONOGRAMA DE PROGRAMACION INICIAL. YA SE MANDARON A HACER LOS LOGOS.

ACTIVIDAD 11

Suministro e instalación de botón de alarma baño persona con movilidad reducida, incluye cableado, canaleta de 1 x 1 cm.

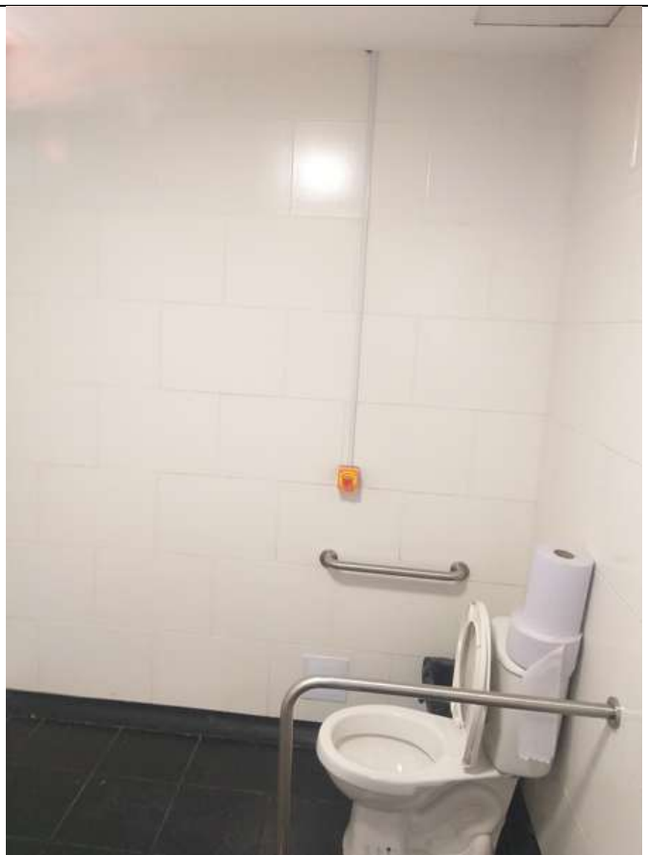


FOTO BOTON DE ALARMA
20 DE SEPTIEMBRE DE 2025

AVANCE: 100% CON RESPECTO AL CRONOGRAMA INICIAL DE PROGRAMACION SE SUMINISTRO E INSTALO.

ACTIVIDAD 18

Detección y corrección de posibles goteras en cubierta.

CONTINUAMOS EN LA BUSQUEDA DE POSIBLES GOTERAS NO HA SIDO FACIL PORQUE NO SE HAN PRESENTADO LLUVIAS. ESPERAMOS LA LLUVIA PARA QUE SE PUEDA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD SOLO HEMOS DETACTADO

UNA GOTERA

AVANCE: 0% CON RESPECTO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INICIAL NO INTERFIERE LA PROGRACION INICIAL

ACTIVIDAD 19

Desmonte, suministro e instalación de luminarias led de 30 x 30 cm. Tipo (Panel Led Empotrado Cuadrado 1800 Lúmenes 24w Luz Fría).

instalacion luminarias led	cantidad		sub total
recepcion	5		5
zona de servicios	1		1
consultorio 3	1		1
bloque de oficinas	**1**		**3**
TOTAL			**10**







20 DE SEPTIEMBRE DE 2025

AVANCE: 100%. CON RESPECTO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INICIAL.

ACTIVIDAD 23

Aseo general.

AVANCE: 0% CON RESPECTO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INICIAL. ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ UNA VEZ TERMINEN TODAS LAS ACTIVIDADES SIN INTERFERIR CON EL CRONOGRAMA INICIAL

OBSERVACIONES

Las actividades que no se han cumplido según el cronograma no afectaran para nada el desarrollo y cumplimiento del cronograma.

No se presentaron novedades técnicas, administrativas o ambientales, así como tampoco situaciones imprevistas

No se han presentado accidentes de trabajo y el contrato se desarrolla con normalidad.

PARA LA SEMANA ENTRANTE SE TIENE PROGRAMADO DESARROLLAR TRABAJOS EN LOS ITEM 1,2,3,7,8,18,19,23 Y 2



RESIDENTE



PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD
