
Lugar	Comunidad de Cuidado La Macarena
Fecha	31/10/2025 14:00 a 15: 00
Tema	Soporte Plan Mantenimiento Preventivo y Correctivo.
Desarrollo	**Actividades realizadas**: **PLAN MANTENIMIENTO PREVENTIVO FOR-PSS-417** • Realizar las actividades de mantenimiento preventivo para garantizar la mejor prestación del servicio. FOR-PSS-417 Para el formato preventivo, se realizaron inspecciones visuales, además del mantenimiento habitual necesario para los equipos y espacios designados en este periodo, los cuales se reportan en el formato FOR-PSS-417. Para el periodo que se reporta se definen 11 actividades que se distribuyen en diferentes áreas del hogar. Las actividades realizadas se hicieron entre la persona de mantenimiento, personal especializado y la responsable ambiental a cargo de toda la gestión del mantenimiento locativo del hogar. De este modo, se reporta la ejecución: 1. Actividad 2.2.3 Trampas de grasa. 2. Actividad 2.2.4 Tanques de agua (certificación y funcionamiento). 3. Actividad 2.2.5 Cuarto de máquinas. 4. Actividad 2.3.2 Equipos de Gas y gasodomésticos. 5. Actividad 2.4.6 Media cañas (Pintura, emboquillado, limpieza, sin grietas, rompimientos ni fisuras). 6. Actividad 2.5.4 Circuito de cámaras en funcionamiento. 7. Actividad 2.5.5 Sistema de llamado continuo en funcionamiento (timbres alámbricos, inalámbricos, tablero de control). 8. Actividad 2.5.6 Sistema de detección de incendios en funcionamiento (detectores de humo, luz estroboscópica, alarma sonora). 9. Actividad 2.5.7 Sistema de red de Internet en funcionamiento (debe garantizar conectividad). 10. Actividad 2.7.2 Ayudas técnicas (sillas de ruedas, sillas patos y caminadores). 11. Actividad 2.7.7 Fumigación y control de plagas. **REGISTROS FOTOGRÁFICOS** 1. **Actividad 2.2.3 Trampas de grasa:** Se realizó limpieza y desinfección de la trampa de grasa.








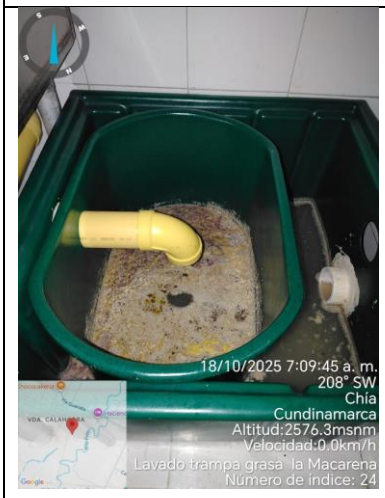


2. **Actividad 2.2.4 Tanques de agua (certificación y funcionamiento):** Se realizó limpieza y desinfección de 5 tanques aéreos y del tanque subterráneo. Por parte de ACER FUMIGACIONES S.A.S. Se Anexa certificado.

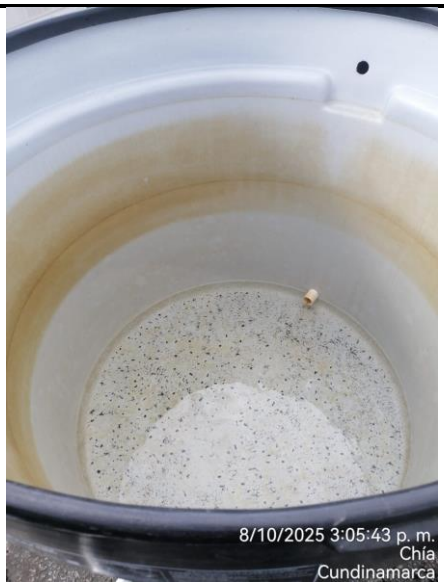
8/10/2025 3:05:43 p. m.
Chía
Cundinamarca


8/10/2025 4:29:23 p. m.
Vía Sin Nombre
Chía
Cundinamarca


10/10/2025 9:28:56 a. m.
Chía
Cundinamarca


10/10/2025 10:12:36 a. m.
Finca Veraguas
Chía
Cundinamarca

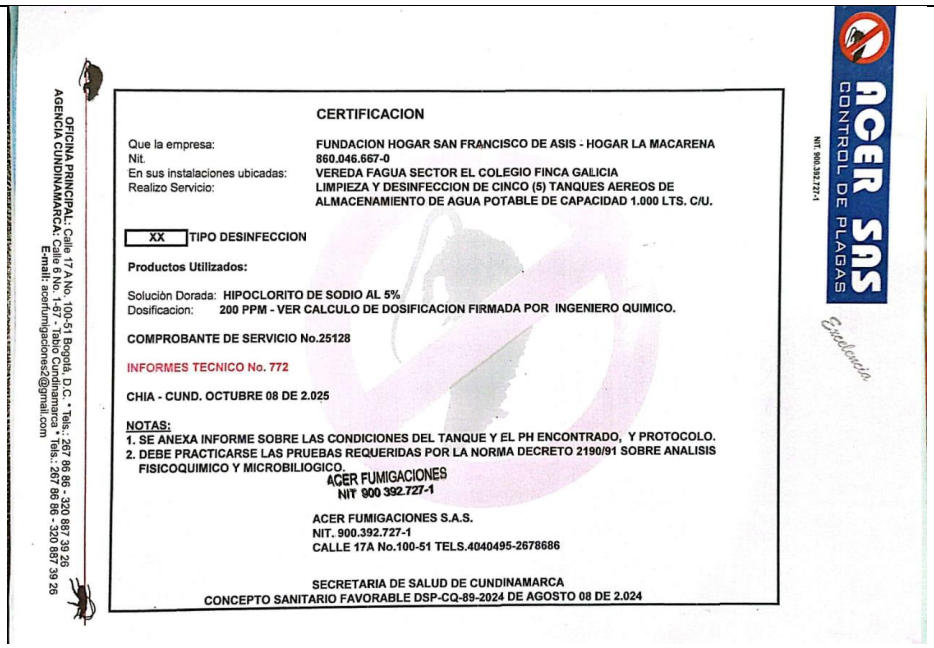

OFICINA PRINCIPAL: Calle 17 A No. 100-51 Bogotá, D.C. • Tels.: 267 86 86 - 320 887 39 26
AGENCIA CUNDINAMARCA: Calle 6 No. 1-67 - Tabio Cundinamarca • Tels.: 267 86 86 - 320 887 39 26
E-mail: acerfumigaciones@gmail.com

ACER SAS CONTROL DE PLAGAS
NIT. 900.392.727-1
Excelencia

CERTIFICACION

Que la empresa:	FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS - HOGAR LA MACARENA
Nit.	860.046.667-0
En sus instalaciones ubicadas:	VEREDA FAGUA SECTOR EL COLEGIO FINCA GALICIA
Realizo Servicio:	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CINCO (5) TANQUES AEREOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE CAPACIDAD 1.000 LTS. C/U.

XX TIPO DESINFECCION

Productos Utilizados:

Solución Dorada: **HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%**
Dosificacion: **200 PPM - VER CALCULO DE DOSIFICACION FIRMADA POR INGENIERO QUIMICO.**

COMPROBANTE DE SERVICIO No.25128

INFORMES TECNICO No. 772


CHIA - CUND. OCTUBRE 08 DE 2.025

NOTAS:
1. SE ANEXA INFORME SOBRE LAS CONDICIONES DEL TANQUE Y EL PH ENCONTRADO, Y PROTOCOLO.
2. DEBE PRACTICARSE LAS PRUEBAS REQUERIDAS POR LA NORMA DECRETO 2190/91 SOBRE ANALISIS FISICOQUIMICO Y MICROBILIOGICO.

ACER FUMIGACIONES
NIT 900 392.727-1

ACER FUMIGACIONES S.A.S.
NIT. 900.392.727-1
CALLE 17A No.100-51 TELS.4040495-2678686

SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA
CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE DSP-CQ-89-2024 DE AGOSTO 08 DE 2.024

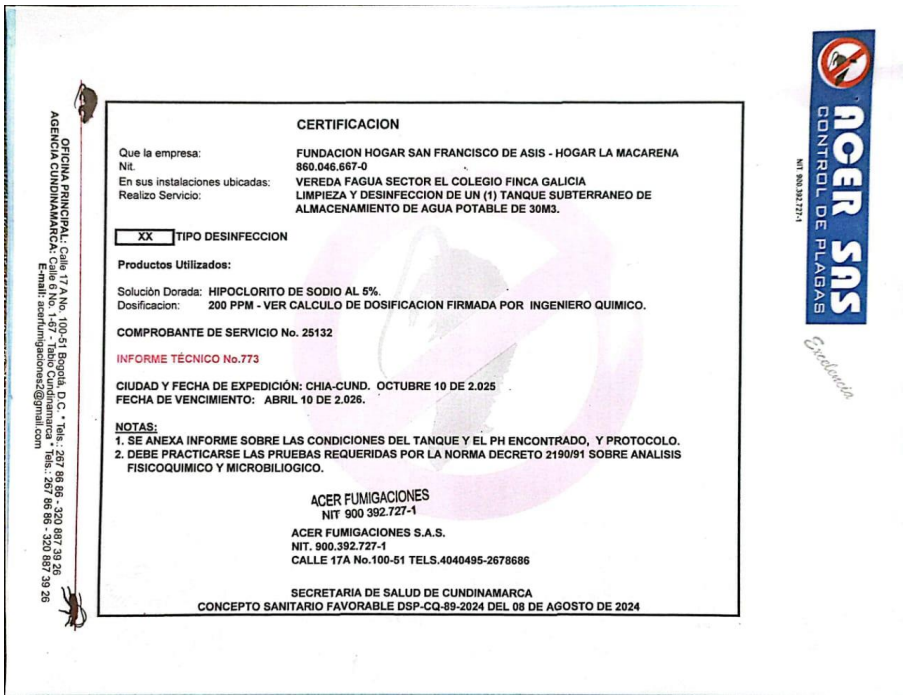

OFICINA PRINCIPAL: Calle 17 A No. 100-51 Bogotá, D.C. • Tels.: 267 86 86 - 320 887 39 26
AGENCIA CUNDINAMARCA: Calle 6 No. 1-67 - Tabio Cundinamarca • Tels.: 267 86 86 - 320 887 39 26
E-mail: acerfumigaciones@gmail.com

ACER SAS CONTROL DE PLAGAS
NIT. 900.392.727-1
Excelencia

CERTIFICACION

Que la empresa:	FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS - HOGAR LA MACARENA
Nit.	860.046.667-0
En sus instalaciones ubicadas:	VEREDA FAGUA SECTOR EL COLEGIO FINCA GALICIA
Realizo Servicio:	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE UN (1) TANQUE SUBTERRANEO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 30M3.

XX TIPO DESINFECCION

Productos Utilizados:

Solución Dorada: **HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%.**
Dosificacion: **200 PPM - VER CALCULO DE DOSIFICACION FIRMADA POR INGENIERO QUIMICO.**

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 25132

INFORME TÉCNICO No.773

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN: CHIA-CUND. OCTUBRE 10 DE 2.025
FECHA DE VENCIMIENTO: ABRIL 10 DE 2.026.

NOTAS:
1. SE ANEXA INFORME SOBRE LAS CONDICIONES DEL TANQUE Y EL PH ENCONTRADO, Y PROTOCOLO.
2. DEBE PRACTICARSE LAS PRUEBAS REQUERIDAS POR LA NORMA DECRETO 2190/91 SOBRE ANALISIS FISICOQUIMICO Y MICROBILIOGICO.

ACER FUMIGACIONES
NIT 900 392.727-1

ACER FUMIGACIONES S.A.S.
NIT. 900.392.727-1
CALLE 17A No.100-51 TELS.4040495-2678686

SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA
CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE DSP-CQ-89-2024 DEL 08 DE AGOSTO DE 2024

3. **Actividad 2.2.5 Cuarto de máquinas:** Se realizó limpieza del cuarto de bombeo, el equipo se encuentra funcionando correctamente. Se anexa certificado del ultimo mantenimiento.





25/9/25, 3:14 p.m. Factura - iSiigo

RICDE SOLUCIONES TECNICAS
NIT 900.756.892-2
Calle 14 # 11 - 47
Tel: (031) 3153625190
Chia - Colombia
ricdesoluciones@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. RIC 39

Señores	FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS		
NIT	860.046.667-0	**Teléfono**	(601) 7039504 - Ext. 000
Dirección	CL 117 # 6A-22	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/05/2025, 11:40
Expedición	07/05/2025, 11:40
Vencimiento	07/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	REPARACION DE BOMBA HIDRONEOMATICA, CAMBIO DE FLANCHE , CAMBIO DE MEMBRANA PUESTA A PUNTO Y CORRECCION DE INSTALACION	1,00	
2		1,00	
3		1,00	
4		1,00	

Total items: 4

Valor en Letras:
Dos millones trescientos diez mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia

Total Bruto	
IVA 19%	
Total a Pagar	

Observaciones:
Comunidad de Cuidado la Macarena convenio 9583-2024
Favor consignar a la cuenta de ahorros DAMAS DAVIVIENDA NUMERO 055000410021211 9


A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764080794942 aprobado en 20241002 prefijo RIC desde el número 27 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 4a41ab6d3a38fda2d23081b1792db9242d1f96cc41513bccb00c4a47c9295fcb8202568573ece92c1ea7f3f68049e0ac

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

4. **Actividad 2.3.2 Equipos de Gas y gasodomésticos:** Se realizó revisión y mantenimiento de los calentadores, cambio de 3 flautas del horno industrial y calibración de 13 fistones de la estufa industrial. Por parte de la empresa FERRIELECTROGAS. Se anexa certificación.


17 oct 2025 9:05:49 a. m.
Chía, Cundinamarca
Comunidad de Cuidado La Macarena.
Mantenimiento de calentador.


17 oct 2025 9:26:22 a. m.
Chía, Cundinamarca.
Comunidad de Cuidado La Macarena.

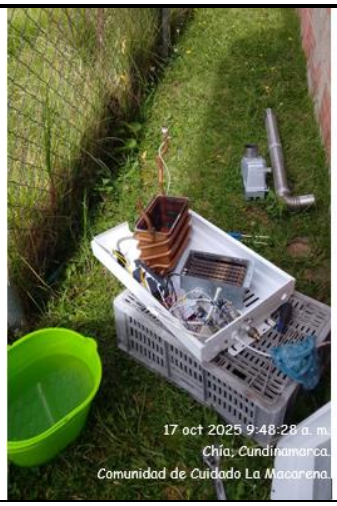
17 oct 2025 9:48:28 a. m.
Chía, Cundinamarca.
Comunidad de Cuidado La Macarena.


18/10/2025 8:30:19 a. m.
14° N
Chía
Cundinamarca
Altitud:2574.5msnm
Velocidad:0.0km/h
Mantenimiento equipos la Macarena
Número de índice: 31



18/10/2025 8:49:51 a. m.
351° N
Chía
Cundinamarca
Altitud:2574.5msnm
Velocidad:0.0km/h
Mantenimiento equipos la Macarena
Número de índice: 33


18/10/2025 8:49:46 a. m.
32° NE
Chía
Cundinamarca
Altitud:2574.5msnm
Velocidad:0.0km/h
Mantenimiento equipos la Macarena
Número de índice: 32


18/10/2025 8:57:49 a. m.
71° E
Chía
Cundinamarca
Altitud:2578.7msnm
Velocidad:8.7km/h
Mantenimiento equipos la Macarena
Número de índice: 34


18/10/2025 8:59:02 a. m.
81° E
Vía Sin Nombre
Chía
Cundinamarca
Altitud:2579.3msnm
Velocidad:0.0km/h
Mantenimiento equipos la Macarena
Número de índice: 37


18/10/2025 9:10:03 a. m.
345° N
Chía
Cundinamarca
Altitud:2574.6msnm
Velocidad:0.0km/h
Mantenimiento equipos la Macarena
Número de índice: 39

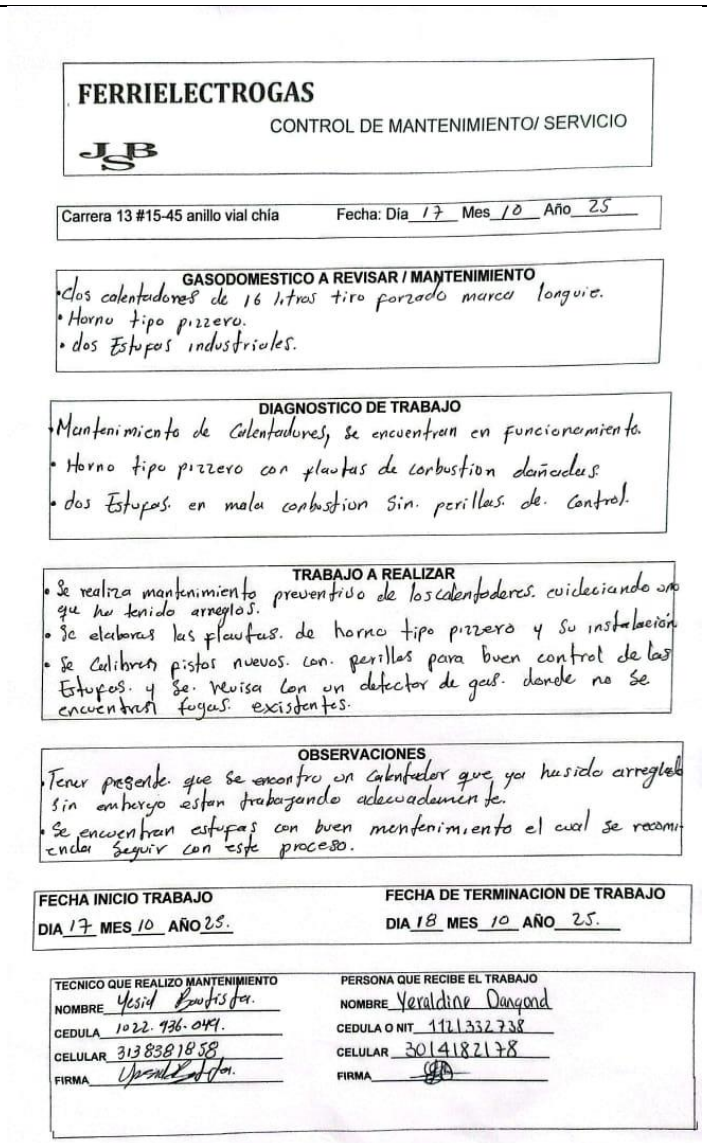

FERRIELECTROGAS

CONTROL DE MANTENIMIENTO/ SERVICIO

JSB

Carrera 13 #15-45 anillo vial chía Fecha: Día 17 Mes 10 Año 25

GASODOMESTICO A REVISAR / MANTENIMIENTO

- dos calentadores de 16 litros tiro forzado marca longvie.
- Horno tipo pizzero.
- dos Estufas industriales.

DIAGNOSTICO DE TRABAJO

- Mantenimiento de Calentadores, se encuentran en funcionamiento.
- Horno tipo pizzero con flautas de combustion dañadas
- dos Estufas en mala combustion sin perillas de control.

TRABAJO A REALIZAR

- Se realiza mantenimiento preventivo de los calentadores cuidadando que no tenido arreglos.
- Se elaboras las flautas de horno tipo pizzero y su instalación
- Se Calibres pistas nuevos con perillas para buen control de las Estufas y se revisa con un detector de gas donde no se encuentres fugas existentes.

OBSERVACIONES

- Tener presente que se encontro un Calentador que ya hasido arreglek sin embargo estan trabajando adecuadamente.
- Se encuentran estufas con buen mantenimiento el cual se recomi- endar seguir con este proceso.

FECHA INICIO TRABAJO DIA 17 MES 10 AÑO 25.

FECHA DE TERMINACION DE TRABAJO DIA 18 MES 10 AÑO 25.

TECNICO QUE REALIZO MANTENIMIENTO
NOMBRE Yesid Bautista.
CEDULA 1022.936.049.
CELULAR 3138381858
FIRMA

PERSONA QUE RECIBE EL TRABAJO
NOMBRE Yeraldine Dangond
CEDULA O NIT 1121332738
CELULAR 3014182178
FIRMA

5. **Actividad 2.4.6 Media cañas (Pintura, emboquillado, limpieza, sin grietas, rompimientos ni fisuras):** Se realizó limpieza y desinfección de la cocina y de la media caña.





6. **Actividad 2.5.4 Circuito de cámaras en funcionamiento:** El circuito de cámara se encuentra funcionando.
7. **Actividad 2.5.5 Sistema de llamado continúo en funcionamiento (timbres alámbricos, inalámbricos, tablero de control):** Se hizo revisión del tablero, el sistema de llamado continuo se encuentra funcionando.





8. **Actividad 2.5.6 Sistema de detección de incendios en funcionamiento (detectores de humo, luz estroboscópica, alarma sonora):** La comunidad cuenta con todos los detectores de humo en las diferentes áreas; Se adquirió la luz estroboscópica quedamos pendiente de su instalación, ya que el voltaje actual no corresponde con el requerido para realizarla.





9. **Actividad 2.5.7 Sistema de red de Internet en funcionamiento (debe garantizar conectividad):** El sistema de internet se encuentra funcionando.

10. **Actividad 2.7.2 Ayudas técnicas (sillas de ruedas, sillas pato y caminadores):** Se hizo mantenimiento de sillas de ruedas y sillas de pato.














11. **Actividad 2.7.7 Fumigación y control de plagas:** Se realizó fumigación y control de plagas, Se anexa certificación.

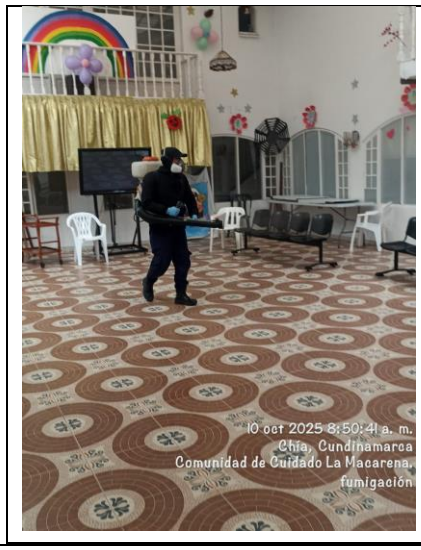

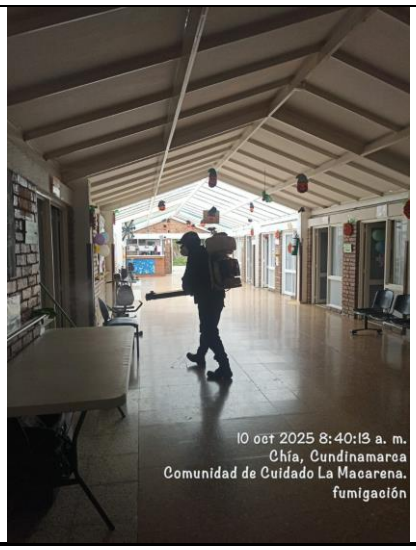





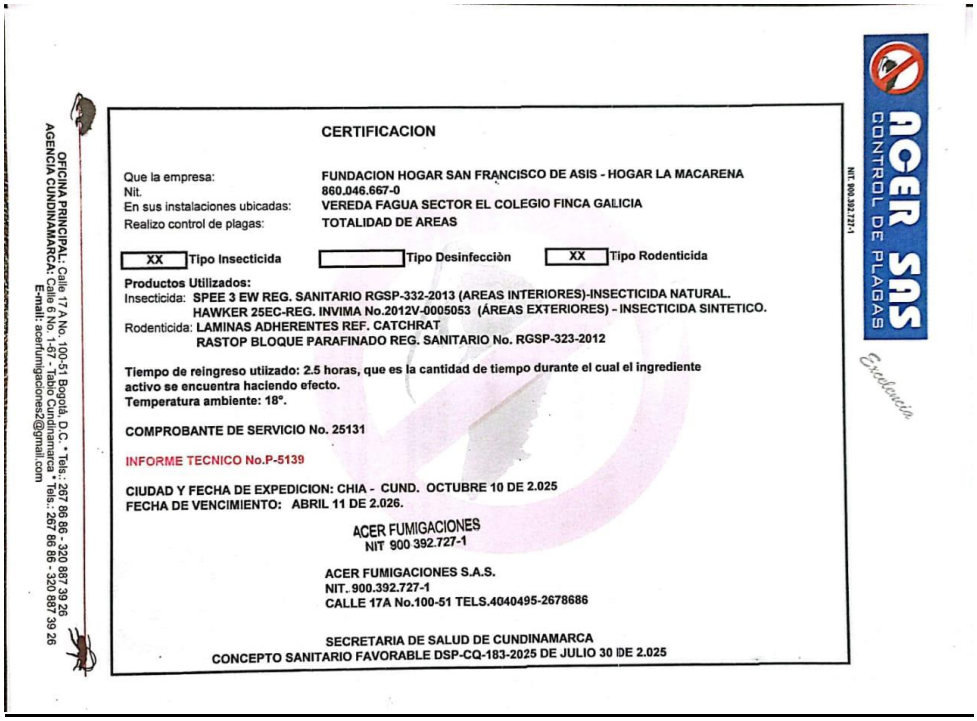

ACER SAS CONTROL DE PLAGAS
NIT 900.392.727-1
Excelencia

OFICINA PRINCIPAL: Calle 17 A No. 100-51 Bogotá. D.C. * Tels.: 267 86 86 - 320 887 39 26
AGENCIA CUNDINAMARCA: Calle 6 No. 1-57 - Tabio Cundinamarca * Tels.: 267 86 86 - 320 887 39 26
E-mail: acerfumigaciones@gmail.com

CERTIFICACION

Que la empresa: **FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS - HOGAR LA MACARENA**
Nit. **860.046.667-0**
En sus instalaciones ubicadas: **VEREDA FAGUA SECTOR EL COLEGIO FINCA GALICIA**
Realizo control de plagas: **TOTALIDAD DE AREAS**

[XX] Tipo Insecticida [ ] Tipo Desinfecciòn [XX] Tipo Rodenticida

Productos Utilizados:
Insecticida: **SPEE 3 EW REG. SANITARIO RGSP-332-2013 (AREAS INTERIORES)-INSECTICIDA NATURAL.**
HAWKER 25EC-REG. INVIMA No.2012V-0005053 (ÁREAS EXTERIORES) - INSECTICIDA SINTETICO.
Rodenticida: **LAMINAS ADHERENTES REF. CATCHRAT**
RASTOP BLOQUE PARAFINADO REG. SANITARIO No. RGSP-323-2012

Tiempo de reingreso utilizado: 2.5 horas, que es la cantidad de tiempo durante el cual el ingrediente activo se encuentra haciendo efecto.
Temperatura ambiente: 18°.

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 25131

INFORME TECNICO No.P-5139

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICION: CHIA - CUND. OCTUBRE 10 DE 2.025
FECHA DE VENCIMIENTO: ABRIL 11 DE 2.026.

ACER FUMIGACIONES
NIT 900 392.727-1

ACER FUMIGACIONES S.A.S.
NIT. 900.392.727-1
CALLE 17A No.100-51 TELS.4040495-2678686

SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA
CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE DSP-CQ-183-2025 DE JULIO 30 DE 2.025

PLAN MANTENIMIENTO CORRECTIVO FOR-PSS-418

- Se presentan las actividades de mantenimiento correctivo en el periodo reportado, estas son documentada en el FOR-PSS-418.

1. Sistema de llamado continuo.
2. Mantenimiento al cerramiento y fachadas.
3. Detectores de humo en todos los espacios de permanencia de las personas mayores (habitaciones, comedor, salones de actividades) y espacios de permanencia de talento humano (oficinas, salas de reuniones).


4. Presentar certificado de último mantenimiento por mano de obra calificada a los calentadores de gas.
5. En el mes en curso se realizó revisión en general de las redes eléctricas.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

1. **Sistema de llamado continuo:** Se hizo arreglo de los timbres, el sistema de llamado continuo se encuentra funcionando al 100 por ciento. Se anexa certificación.





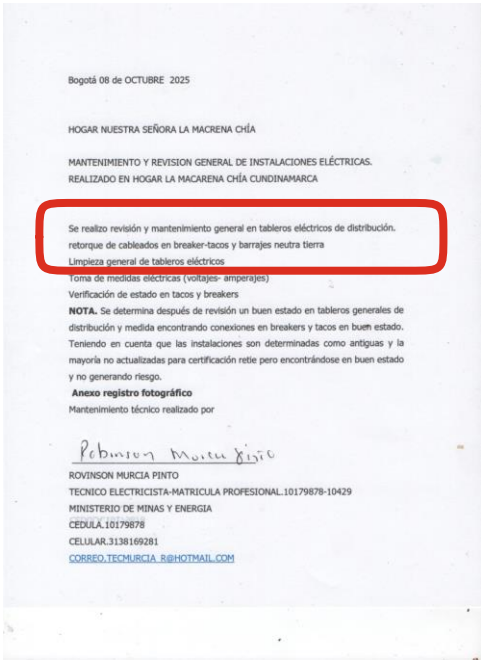

Bogotá 08 de OCTUBRE 2025

HOGAR NUESTRA SEÑORA LA MACRENA CHÍA

MANTENIMIENTO Y REVISION GENERAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS.
REALIZADO EN HOGAR LA MACARENA CHÍA CUNDINAMARCA

Se realizo revisión y mantenimiento general en tableros eléctricos de distribución.
retorque de cableados en breaker-tacos y barrajes neutra tierra
Limpieza general de tableros eléctricos
Toma de medidas eléctricas (voltajes- amperajes)
Verificación de estado en tacos y breakers
NOTA. Se determina después de revisión un buen estado en tableros generales de distribución y medida encontrando conexiones en breakers y tacos en buen estado. Teniendo en cuenta que las instalaciones son determinadas como antiguas y la mayoría no actualizadas para certificación retie pero encontrándose en buen estado y no generando riesgo.
Anexo registro fotográfico
Mantenimiento técnico realizado por

ROVINSON MURCIA PINTO
TECNICO ELECTRICISTA-MATRICULA PROFESIONAL.10179878-10429
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
CEDULA.10179878
CELULAR.3138169281
CORREO.TECMURCIA_R@HOTMAIL.COM

2. **Mantenimiento de Cerramiento y fachadas (Impermeabilización, pañete, estuco, pintura, enchapes, emboquillado, humedades):** Se realizó el arreglo de humedades en las fachadas de la zona de jardinería. Esta actividad corresponde al mes de septiembre, aunque estaba programada para ejecutarse en octubre, debido a que durante septiembre se llevó a cabo la instalación de media caña en todos los baños de la comunidad.














3. **Detectores de humo en todos los espacios de permanencia de las personas mayores (habitaciones, comedor, salones de actividades) y espacios de permanencia de talento humano (oficinas, salas de reuniones).** La comunidad cuenta con todos los detectores de humos en las diferentes áreas.
4. **Presentar certificado de último mantenimiento por mano de obra calificada a los calentadores de gas:** En el mes en curso se realizó mantenimiento de dos calentadores. Se anexa certificado de mantenimiento.

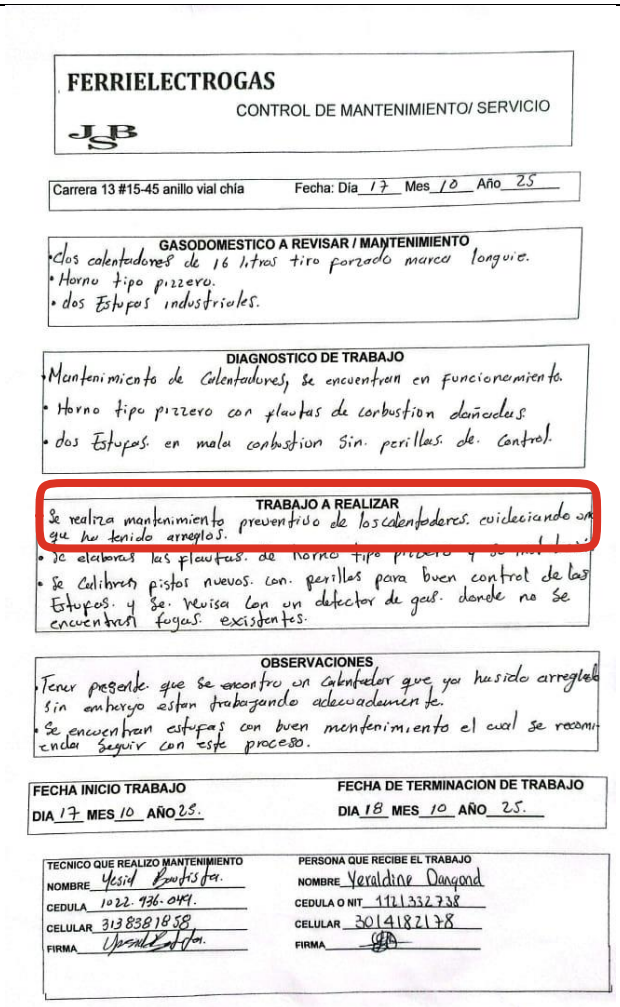

FERRIELECTROGAS

CONTROL DE MANTENIMIENTO/ SERVICIO

JB

Carrera 13 #15-45 anillo vial chía Fecha: Día 17 Mes 10 Año 25

GASODOMESTICO A REVISAR / MANTENIMIENTO

- dos calentadores de 16 litros tiro porzado marca longvie.
- Horno tipo pizzero.
- dos Estufas industriales.

DIAGNOSTICO DE TRABAJO

- Mantenimiento de Calentadores, se encuentran en funcionamiento.
- Horno tipo pizzero con plantas de corbustion dañadas
- dos Estufas. en mala corbustion Sin. perillas. de. Control.

TRABAJO A REALIZAR

- Se realiza mantenimiento preventivo de los calentadores. evidenciando qu que ha tenido arreglos.
- se elaboras las plantas. de horno tipo pizzero y se
- Se calibran pistas nuevos. con. perillas para buen control de las Estufas. y se. revisa con un detector de gas. donde no se encuentras fugas. existentes.

OBSERVACIONES

- Tener presente. que se encontro un Calentador que ya hasido arreglado sin embargo estan trabajando adecuadamente.
- Se encuentran estufas con buen mantenimiento el cual se recomi endar seguir con este proceso.


FECHA INICIO TRABAJO DIA 17 MES 10 AÑO 25.

FECHA DE TERMINACION DE TRABAJO DIA 18 MES 10 AÑO 25.

TECNICO QUE REALIZO MANTENIMIENTO
NOMBRE Yesid Bautista.
CEDULA 1022.936.041.
CELULAR 3138381858
FIRMA

PERSONA QUE RECIBE EL TRABAJO
NOMBRE Yeraldine Dangond
CEDULA O NIT 1121332738
CELULAR 3014182178
FIRMA


5. En el mes en curso se realizó revisión en general de las redes eléctricas. Se anexa informe.

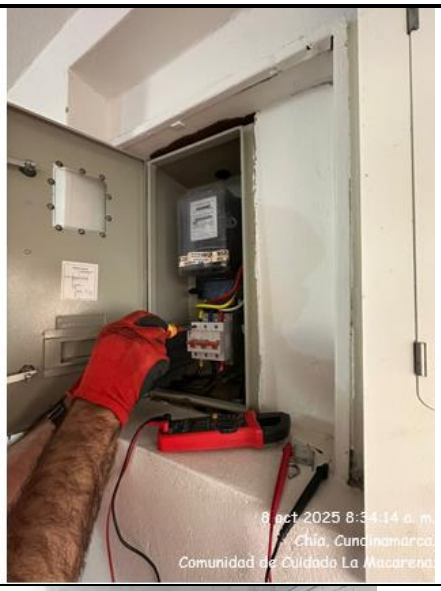
8 oct 2025 8:34:14 a. m.
Chía, Cundinamarca
Comunidad de Cuidado La Macarena


8 oct 2025 8:55:22 a. m.
Chía, Cundinamarca
Comunidad de Cuidado La Macarena


8 oct 2025 9:37:25 a. m.
Chía, Cundinamarca
Comunidad de Cuidado La Macarena


8 oct 2025 9:45:32 a. m.
Chía, Cundinamarca
Comunidad de Cuidado La Macarena

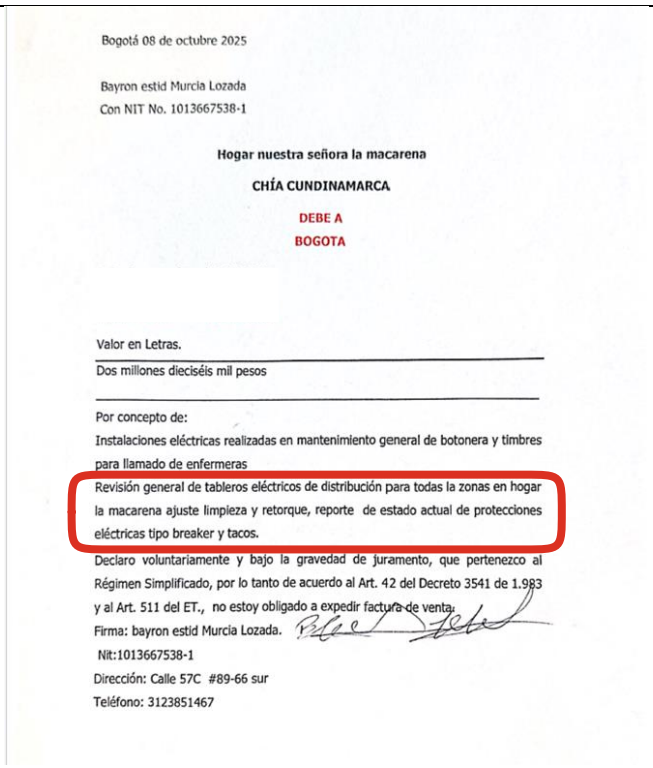

Bogotá 08 de octubre 2025

Bayron estid Murcia Lozada
Con NIT No. 1013667538-1

Hogar nuestra señora la macarena

CHÍA CUNDINAMARCA

DEBE A

BOGOTA

Valor en Letras.
Dos millones dieciséis mil pesos

Por concepto de:
Instalaciones eléctricas realizadas en mantenimiento general de botonera y timbres para llamado de enfermeras
Revisión general de tableros eléctricos de distribución para todas la zonas en hogar la macarena ajuste limpieza y retorque, reporte de estado actual de protecciones eléctricas tipo breaker y tacos.
Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento, que pertenezco al Régimen Simplificado, por lo tanto de acuerdo al Art. 42 del Decreto 3541 de 1.983 y al Art. 511 del ET., no estoy obligado a expedir factura de venta.
Firma: bayron estid Murcia Lozada.
Nit:1013667538-1
Dirección: Calle 57C #89-66 sur
Teléfono: 3123851467

Nota: Se anexa FOR –GA-031 y el FOR-PSS-071.

	Nombre	Cargo/Rol	Dependencia
Asistentes	Ana Paulina Forero Velásquez	Coordinadora	Comunidad de Cuidado La Macarena.
	Yeraldine Dangond Rodríguez	Responsable ambiental	Comunidad de Cuidado La Macarena.

	Actividad	Responsable	Fecha límite
Compromisos			
Próxima reunión	Según necesidad y cronograma.		
Elaboró	Yeraldine Dangond Rodriguez – Responsable ambiental		

PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL

FORMATO REGISTRO Y CONTROL LIMPIEZA/MANTENIMIENTO DE TRAMPAS DE GRASA Y SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUAS LLUVIAS (SCALL)

Código FOR-GA-031
Versión 0
Fecha de emisión 2021-01-18 - 21-10-2021
Página 1 de 1

TIPO DE SERVICIO SOCIAL	Comunidad de Cuidado
NOMBRE UNIDAD OPERATIVA	La Macarena
LOCALIDAD	Fuera de Bogotá
DIRECCIÓN	Vereda Fagua - Finca Galicia - Chia, Cundinamarca

FECHA	ACTIVIDAD (marque con una X el tipo de actividad a realizar Limpieza o Mantenimiento)		TIPO DE SISTEMA (Marque con una X a cuál sistema se le realizará Limpieza o Mantenimiento)			RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	DEPENDENCIA DEL RESPONSABLE	FIRMA	OBSERVACIONES	RESPONSABLE O DELEGADO AMBIENTAL DE LA UNIDAD OPERATIVA	FIRMA
	LIMPIEZA	MANTENIMIENTO	TRAMPA DE GRASAS		SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUAS LLUVIAS						
			EXTERNA	INTERNA							
22/03/25	X			X		Ferneys Chamba	macarena		Ninguna	Yeraldine O.	
29/03/25	X			X		Ferneys Chamba	macarena		Ninguna	Yeraldine O.	
05/04/25	X			X		Jun C. Ruiz	macarena		Ninguna	Yeraldine O.	
12/04/25	X			X		Jun C. Ruiz	macarena		Ninguna	Yeraldine O.	
19/04/25	X			X		Jun C. Ruiz	macarena		Ninguna	Yeraldine O.	
26/04/25	X			X		Jun C. Ruiz	macarena		Ninguna	Yeraldine O.	
03/05/25	X			X		Jun C. Ruiz	macarena		Ninguna	Yeraldine O.	
10/05/25	X			X		Jun C. Ruiz	macarena		Ninguna	Yeraldine O.	
17/05/25	X			X		Jun C. Ruiz	macarena		Ninguna	Yeraldine O.	
24/05/25	X			X		Jun C. Ruiz	macarena		Ninguna	Yeraldine O.	
31/05/25	X			X		Jun C. Ruiz	macarena		Ninguna	Yeraldine O.	
06/06/25	X			X		Jun C. Ruiz	macarena		Ninguna	Yeraldine O	
13/06/25	X			X		Jun C. Ruiz	macarena		Ninguna	Yeraldine O.	
20/06/25	X			X		Jun C. Ruiz	macarena		Ninguna	Yeraldine O.	
27/06/25	X			X		Jun C. Ruiz	macarena		Ninguna	Yeraldine O.	
04/07/25	X			X		Jun C. Ruiz	macarena		Ninguna	Yeraldine O	
11/07/25	X			X		Jun C. Ruiz	macarena		Ninguna	Yeraldine O	
18/07/25	X			X		Jun C. Ruiz	macarena		Ninguna	Yeraldine O	
25/07/25	X			X		Jun C. Ruiz	macarena		Ninguna	Yeraldine O	
01/08/25	X			X		Jun C. Ruiz	macarena		Ninguna	Yeraldine O	
08/08/25	X			X		Jun C. Ruiz	macarena		Ninguna	Yeraldine O	
15/08/25	X			X		Jun C. Ruiz	macarena		Ninguna	Yeraldine O	

Nota: "Tratamiento de datos personales. Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la Secretaría Distrital de Integración Social no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013."

Powered by CamScanner

PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL

FORMATO REGISTRO Y CONTROL LIMPIEZA/MANTENIMIENTO DE TRAMPAS DE GRASA Y SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUAS LLUVIAS (SCALL)

Código: FOR-GA-031
Versión: 0
Fecha: 20210318 - 21/03/2021
Página: 1 de 1

TIPO DE SERVICIO SOCIAL	Comunidad de Cuidado
NOMBRE UNIDAD OPERATIVA	La Macarena
LOCALIDAD	Fuera de Bogotá
DIRECCIÓN	Vereda Fagua - Sector el colegio - Chia, Cundinamarca.

FECHA	ACTIVIDAD (marque con una X el tipo de actividad a realizar Limpieza o Mantenimiento)		TIPO DE SISTEMA (Marque con una X a cuál sistema se le realizará Limpieza o Mantenimiento)			RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	DEPENDENCIA DEL RESPONSABLE	FIRMA	OBSERVACIONES	RESPONSABLE O DELEGADO AMBIENTAL DE LA UNIDAD OPERATIVA	FIRMA
	LIMPIEZA	MANTENIMIENTO	TRAMPA DE GRASAS		SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUAS LLUVIAS						
			EXTERNA	INTERNA							
22/08/25	X			X		Juan C. Ruiz Mar	La macarena		Ninguna	Yeraldine D	
29/08/25	X			X		Juan C. Ruiz Mar	la macarena		Ninguna	Yeraldine D.	
05/09/25	X			X		Juan C Ruiz Mar	la macarena		Ninguna	Yeraldine D.	
12/09/25	X			X		Juan C. Ruiz Mar	la macarena		Ninguna	Yeraldine D	
19/09/25	X			X		Juan C. Ruiz Mar	la macarena		Ninguna	Yeraldine D.	
26/09/25	X			X		Juan C. Ruiz Mar	la macarena		Ninguna	Yeraldine D.	
03/10/25	X			X		Juan C. Ruiz Mar	la macarena		Ninguna	Yeraldine D.	
10/10/25	X			X		Juan C. Ruiz Mar	la macarena		Ninguna	Yeraldine D.	
18/10/25	X			X		Juan C. Ruiz Mar	la macarena		Ninguna	Yeraldine D.	
24/10/25	X			X		Juan C. Ruiz Mar	la macarena		Ninguna	Yeraldine D.	
31/10/25	X			X		Juan C. Ruiz Mar	la macarena		Ninguna	Yeraldine D.	

Nota: "Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la Secretaría Distrital de Integración Social no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013."

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO VERIFICACIÓN DE HERMETICIDAD	Código: FOR-PSS-071 Versión: 0 Fecha: Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 2

Comunidad de Cuidado la Macarena

1. RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN: Yeraldine Oangond. 2.FECHA: 30/10/2025

3.ASPECTO Y ÁREA A VERIFICAR		4. CALIFICACIÓN	5. ACTIVIDAD POR IMPLEMENTAR
3.A	AREA DE COCINA		
A.1	Aberturas entre puertas y piso (exteriores)	1	
A.2	Aberturas entre puertas y piso (interiores)	1	
A.3	Estado de los anjeos (mallas) de las ventanas de la cocina	1	
A.4	Los marcos de puertas y ventanas son herméticos.	1	
A.5	Paredes y techos de la cocina están libres de agujeros.	1	
A.6	Los techos de la cocina acoplan herméticamente con los muros.	1	
A.7	Estado de las rejillas de los sifones de la cocina.	1	
3.B	AREA DE BODEGA DE ALIMENTOS		
B.1	Estado de los anjeos (mallas) de las ventanas de la bodega de alimentos.	1	
B.2	Los marcos de puertas y ventanas son herméticos.	1	
B.3	Paredes y techos de la bodega están libres de agujeros.	1	
B.4	Los techos de la bodega de alimentos acoplan herméticamente con los muros.	1	
3.C	OTRAS AREAS		
C.1	Los techos de las demás áreas acoplan herméticamente con los muros.	1	
C.2	Empalmes de pisos y paredes libres de agujeros.	1	
C.3	Paredes interiores lisas libres de ranuras	1	
3.D	Nota: Incluir todas las áreas de la unidad operativa		

La calificación de la verificación es: 1 = ACEPTABLE 2 = NO ACEPTABLE

Powered by CamScanner

6. OBSERVACIONES	7. ACCIONES CORRECTIVAS (TIEMPO PROPUESTO)	8. RESPONSABLE(S)
La cc la Macarena cuenta con la Hermeticidad en las Áreas.	N. A	N. A

Powered by CamScanner
