NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO: GERENCIA GRUPO CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO: SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO. INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3668 DE 2024
Periodo:	Del 01 al 31 del mes de octubre de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 2038 del 11 de junio de 2025 comunicada mediante memorando 2025I-VBOG-041152 del 16 de junio de 2025

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:

Los proyectos objeto de intervención se encuentran en las vías que comunican las diferentes veredas de los municipios de Buenavista, Calarcá, Circasia, Filandia, Génova, La Tebaida, Montenegro, Pijao y Salento en el departamento de Quindío, conforme a lo establecido en cada uno de los convenios solidarios e interadministrativos pertenecientes al programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	2235-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA TOPACIA ALTA DEL MUNICIPIO DE GÉNOVA DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA TOPACIA ALTA DEL MUNICIPIO DE GENOVA, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	07/10/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-072805
VALOR INICIAL:	$ 200.718.769,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 200.718.769,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	2,8 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	3		
PRÓRROGA No. 1:	3 meses		
PRÓRROGA No. 2:	3 meses		
PRÓRROGA No. 3:	1 mes		
TOTAL SUSPENSIONES:	1		
SUSPENSIÓN No. 1	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No. 1	3 meses		
REANUDACIÓN:	25/04/2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUALIZADA:	30 de noviembre de 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	2385-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MARIELA DEL MUNICIPIO DE PIJAO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MARIELA DEL MUNICIPIO DE PIJAO, QUINDIO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	30/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-070688
VALOR INICIAL:	$200.958.562,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$200.958.562,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	3 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	3		
PRÓRROGA No. 1:	3 meses		
PRÓRROGA No. 2:	3 meses		
PRÓRROGA No. 3:	1,5 meses		
TOTAL SUSPENSIONES:	1		
SUSPENSIÓN No. 1	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No. 1	3 meses		
REANUDACIÓN:	25/04/2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUALIZADA:	15 de diciembre de 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	2388-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA TOPACIA Y RIOLEJOS		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA TOPACIA Y RIOLEJOS DEL MUNICIPIO DE GÉNOVA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	06/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-063289
VALOR INICIAL:	$202.346.274,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$202.346.274,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	3,7 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA No. 1:	3 meses		
PRÓRROGA No. 2:	3 meses		
TOTAL SUSPENSIONES:	1		
SUSPENSIÓN No. 1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 1:	3 meses		
REANUDACIÓN:	25/04/2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUALIZADA:	31 DE OCTUBRE DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	2454-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENAVISTA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "BUENAVISTA" DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	30/08/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-060853
VALOR INICIAL:	$201.274.445,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$201.274.445,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	3		
PRÓRROGA No. 1:	4 meses		
PRÓRROGA No. 2:	3 meses		
PRORROGA No. 3:	3 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUALIZADA:	31 DE OCTUBRE DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	2470-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA VENADA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA VENADA DEL MUNICIPIO DE GENOVA, DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	04/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-061996

VALOR INICIAL:	$201.319.133,00
VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	$201.319.133,00
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00
PLAZO INICIAL:	3.9 meses
TOTAL PRÓRROGAS:	3
PRÓRROGA No. 1:	4 meses
PRÓRROGA No. 2:	3 meses
PRORROGA No. 3	3 meses
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUALIZADA:	31 DE OCTUBRE DE 2025

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	2474-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL DORADO ALTO LAS CAMELIAS		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL DORADO ALTO LAS CAMELIAS DEL MUNICIPIO DE GENOVA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	19/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-066979
VALOR INICIAL:	$ 200.768.774,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 200.768.774,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	3.4 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	3		
PRÓRROGA No. 1:	02 de junio de 2025		
PRÓRROGA No. 2:	3 meses		
PRÓRROGA No. 3:	1,5 meses		
TOTAL SUSPENSIONES:	1		
SUSPENSIÓN No. 1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 1:	3 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 2	1 mes		
REANUDACIÓN:	20/06/2025		
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	15 de diciembre de 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	2479-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA COQUETA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA COQUETA DEL MUNICIPIO DE GENOVA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	02/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-061373

VALOR INICIAL:	$ 201.168.973,00
VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 201.168.973,00
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00
PLAZO INICIAL:	31/12/2024
TOTAL PRÓRROGAS:	4
PRÓRROGA No. 1:	4 meses
PRÓRROGA No. 2:	3 meses
PRORROGA No. 3:	3 meses
PRORROGA No. 4:	1,5 meses
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUALIZADA:	15 de diciembre de 2025

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	2552-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BARCELONA ALTA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "BARCELONA ALTA" DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	02/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-061326
VALOR INICIAL:	$201.827.810,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$201.827.810,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	3,9 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	3		
PRÓRROGA No. 1:	4 meses		
PRÓRROGA No. 2:	3 meses		
PRORROGA No. 3:	3 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUALIZADA:	31 DE OCTUBRE DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	2638-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PATIO BONITO		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE PIJAO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	16/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-065730
VALOR INICIAL:	$201.181.068,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$201.181.068,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	3		
PRÓRROGA No. 1:	3 meses		
PRÓRROGA No. 2:	1 mes		
PRÓRROGA No. 3	2 meses		
TOTAL SUSPENSIONES:	1		
SUSPENSIÓN No. 1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 1:	3 meses		
REANUDACIÓN:	25/04/2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUALIZADA:	31 DE OCTUBRE DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	2664-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PINOS		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS PINOS DEL MUNICIPIO DE SALENTO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	06/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-063259
VALOR INICIAL:	$199.037.878,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$199.037.878,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	3		
PRÓRROGA No. 1:	3 meses		
PRÓRROGA No. 2:	3 meses		
PRÓRROGA No. 3:	1 meses		
TOTAL SUSPENSIONES:	1		
SUSPENSIÓN No. 1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 1:	3 meses		
REANUDACIÓN:	25/04/2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN PRÓRROGA NO. 1:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		
PRÓRROGA No. 2:	3 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUALIZADA:	30 de noviembre de 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	2695-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ARENALES DEL MUNICIPIO DE PIJAO, QUINDIO		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ARENALES DEL MUNICIPIO DE PIJAO, QUINDIO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	07/10/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-072952
VALOR INICIAL:	$201.216.055,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$201.216.055,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	3		
PRÓRROGA No. 1:	3 meses		
PRÓRROGA No. 2:	3 meses		
PRÓRROGA No. 3:	1,5 meses		
TOTAL SUSPENSIONES:	1		
SUSPENSIÓN No. 1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 1:	3 meses		
REANUDACIÓN:	25/04/2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUALIZADA:	15 de diciembre de 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	2703-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ARGENTINA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ARGENTINA DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	20/12/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-090429
VALOR INICIAL:	$ 200.911.887,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 200.911.887,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL SUSPENSIONES:	1		
TOTAL PRÓRROGAS:	3		
PRÓRROGA No. 1:	3 meses		
PRÓRROGA No. 2:	3 meses		
PRÓRROGA No. 3:	1 mes		
TOTAL SUSPENSIONES:	1		
SUSPENSIÓN No. 1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 1:	3 meses		
REANUDACIÓN:	25/04/2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUALIZADA:	30 de noviembre de 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	2728-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CHAGUALA DEL MUNICIPIO DE SALENTO, QUINDIO		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CHAGUALA DEL MUNICIPIO DE SALENTO, QUINDIO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DE PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	02/10/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-071625

VALOR INICIAL:	$201.409.039,00
VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	$201.409.039,00
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00
PLAZO INICIAL:	31/12/2024
TOTAL PRÓRROGAS:	3
PRÓRROGA No. 1:	3 meses
PRÓRROGA No. 2:	3 meses
PRÓRROGA No. 3:	1,5 meses
TOTAL SUSPENSIONES:	1
SUSPENSIÓN No. 1:	2 meses
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 1:	3 meses
REANUDACIÓN:	25/04/2025
TOTAL PRÓRROGAS:	2
PRÓRROGA No. 1:	3 meses
PRÓRROGA No. 2:	3 meses
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUALIZADA:	15 de diciembre de 2025

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	2764-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS JUANES		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS JUANES DEL MUNICIPIO DE PIJAO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	19/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-067322
VALOR INICIAL:	$201.219.785,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$201.219.785,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	3		
PRÓRROGA No. 1:	3 meses		
PRÓRROGA No. 2:	3 meses		
PRÓRROGA No. 3:	1 mes		
TOTAL SUSPENSIONES:	1		
SUSPENSIÓN No. 1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 1:	3 meses		
REANUDACIÓN:	25/04/2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUALIZADA:	30 de noviembre de 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	2767-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS BALSOS		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS BALSOS DEL MUNICIPIO DE PIJAO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	18/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-066496
VALOR INICIAL:	$201.613.472,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$201.613.472,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	3		
PRÓRROGA No. 1:	3 meses		
PRÓRROGA No. 2:	3 meses		
PRÓRROGA No. 3:	1 mes		
TOTAL SUSPENSIONES:	1		
SUSPENSIÓN No. 1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 1:	3 meses		
REANUDACIÓN:	25/04/2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUALIZADA:	30 de noviembre de 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	2956-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL AGRADO.		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL AGRADO DEL MUNICIPIO DE SALENTO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	07/10/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-072966
VALOR INICIAL:	$200.826.136,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$200.826.136,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA No. 1:	3 meses		
PRÓRROGA No. 2:	1,5 meses		
TOTAL SUSPENSIONES:	2		
SUSPENSIÓN No. 1:	2 meses		
AMPLIACIÓN No. 1 A SUSPENSIÓN No. 1:	3 meses		
REANUDACIÓN:	25/04/2025		
SUSPENSIÓN No. 2:	1 mes		
AMPLIACIÓN No. 1 A SUSPENSION No. 2	2 meses		
REANUDACIÓN:	21/10/2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUALIZADA:	15 de diciembre de 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	2968-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MARAVELEZ.		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MARAVELEZ DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	13/12/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-094784
VALOR INICIAL:	$201.094.305,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$201.094.305,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA No. 1:	3 meses		
PRÓRROGA No. 2:	3 meses		
TOTAL SUSPENSIONES:	1		
SUSPENSIÓN No. 1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 1:	3 meses		
REANUDACIÓN:	25/04/2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUALIZADA:	31 DE OCTUBRE DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	2996-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MONTAÑA.		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	13/12/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-090429
VALOR INICIAL:	$201.494.569,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$201.494.569,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	3		
PRÓRROGA No. 1:	3 meses		
PRÓRROGA No. 2:	3 meses		
PRÓRROGA No. 3:	1 mes		
TOTAL SUSPENSIONES:	1		
SUSPENSIÓN No. 1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 1:	3 meses		
REANUDACIÓN:	25/04/2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUALIZADA:	30 de noviembre de 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	3156-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PAVAS		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PAVAS EN EL MUNICIPIO DE FILANDIA, QUINDÍO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	27/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-070075
VALOR INICIAL:	$201.479.284,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$201.479.284,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	3		
PRÓRROGA No. 1:	3 meses		
PRÓRROGA No. 2:	3 meses		
PRÓRROGA No. 3:	1 mes		
TOTAL SUSPENSIONES:	1		
SUSPENSIÓN No. 1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 1:	3 meses		
REANUDACIÓN:	25/04/2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUALIZADA:	30 de noviembre de 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	3160-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE PIAMONTE		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE PIAMONTE, DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	05/10/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-072627

VALOR INICIAL:	$199.251.083,00
VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	$199.251.083,00
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00
PLAZO INICIAL:	31/12/2024
TOTAL PRÓRROGAS:	2
PRÓRROGA No. 1:	3 meses
PRÓRROGA No. 2:	3 meses
TOTAL SUSPENSIONES:	1
SUSPENSIÓN No. 1:	2 meses
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 1:	3 meses
REANUDACIÓN:	25/04/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUALIZADA:	31 DE OCTUBRE DE 2025

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	3347-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CANAAN		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CANAAN DEL MUNICIPIO DE SALENTO, DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	19/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-067320
VALOR INICIAL:	$199.872.012,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$199.872.012,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	3		
PRÓRROGA No. 1:	3 meses		
PRÓRROGA No. 2:	3 meses		
PRÓRROGA No. 3:	1 mes		
TOTAL SUSPENSIONES:	1		
SUSPENSIÓN No. 1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 1:	3 meses		
REANUDACIÓN:	25/04/2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUALIZADA:	30 de noviembre de 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	3419-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS VEREDAS DE RIO VERDE BAJO Y PARAGUAICITO DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS VEREDAS DE RIO VERDE BAJO Y PARAGUAICITO DEL MUNICIPIO BUENAVISTA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-090429
VALOR INICIAL:	$200.017.550,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$200.017.550,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	3		
PRÓRROGA No. 1:	3 meses		
PRÓRROGA No. 2:	3 meses		
PRÓRROGA No. 3:	1 mes		
TOTAL SUSPENSIONES:	1		
SUSPENSIÓN No. 1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 1:	3 meses		
REANUDACIÓN:	25/04/2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUALIZADA:	30 de noviembre de 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	3539-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CANTORES DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO, DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CANTORES DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	20/12/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-096975
VALOR INICIAL:	$200.870.871,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$200.870.871,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA No. 1:	3 meses		
PRÓRROGA No. 2:	3 meses		
TOTAL SUSPENSIONES:	1		
SUSPENSIÓN No. 1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 1:	3 meses		
REANUDACIÓN:	25/04/2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUALIZADA:	31 DE OCTUBRE DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	3628-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE CALARCA DEL MUNICIPIO DE CALARCA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE CALARCA DEL MUNICIPIO DE CALARCA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	11/10/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-074622
VALOR INICIAL:	$201.450.698,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$201.450.698,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	3		
PRÓRROGA No. 1:	2 meses		
PRÓRROGA No. 2:	3 meses		
PRÓRROGA No. 3:	1,5 meses		
TOTAL SUSPENSIONES:	1		
SUSPENSIÓN No. 1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 1:	3 meses		
REANUDACIÓN:	20/05/2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUALIZADA:	15 de diciembre de 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	3777-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN JUAN DE CAROLINA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JUAN DE CAROLINA DEL MUNICIPIO DE SALENTO, DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	11/10/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-074619
VALOR INICIAL:	$200.097.710,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$200.097.710,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	3		
PRÓRROGA No. 1:	3 meses		
PRÓRROGA No. 2:	3 meses		
PRÓRROGA No. 3:	1,5 meses		
TOTAL SUSPENSIONES:	1		
SUSPENSIÓN No. 1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 1:	3 meses		
REANUDACIÓN:	25/04/2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUALIZADA:	15 de diciembre de 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	3922-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA POPA DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, QUINDIO		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA POPA DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-094232

VALOR INICIAL:	$201.790.879,00
VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	$201.790.879,00
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00
PLAZO INICIAL:	31/12/2024
TOTAL PRÓRROGAS:	3
PRÓRROGA No. 1:	3 meses
PRÓRROGA No. 2:	3 meses
PRÓRROGA No. 3:	1 mes
TOTAL SUSPENSIONES:	1
SUSPENSIÓN No. 1:	2 meses
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 1:	3 meses
REANUDACIÓN:	25/04/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUALIZADA:	30 de noviembre de 2025

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	4006-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PADILLA DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA DEPARTAMENTO DEL QUINDIO		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PADILLA DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	13/12/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-094966
VALOR INICIAL:	$201.059.653,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$201.059.653,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA No. 1:	3 meses		
PRÓRROGA No. 2:	3 meses		
TOTAL SUSPENSIONES:	1		
SUSPENSIÓN No. 1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 1:	3 meses		
REANUDACIÓN:	25/04/2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUALIZADA:	31 DE OCTUBRE DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	4100-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	RESGUARDO INDIGENA DACHI AGORE DRUA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA DACHI AGORE DRUA DEL MUNICIPIO DE CALARCA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE CALARCA DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	08/10/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-093897
VALOR INICIAL:	$213.775.667,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$213.775.667,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	3		
PRÓRROGA No. 1:	3 meses		
PRÓRROGA No. 2:	3 meses		
PRÓRROGA No. 3:	1,5 meses		
TOTAL SUSPENSIONES:	1		
SUSPENSIÓN No. 1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 1:	3 meses		
REANUDACIÓN:	25/04/2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUALIZADA:	15 de diciembre de 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	4272-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DEVIVIENDA COMUNITARIA VILLA ÉXITO DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA VILLA ÉXITO DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	23/12/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-097606
VALOR INICIAL:	$202.213.132,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$202.213.132,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA No. 1:	3 meses		
PRÓRROGA No. 2:	3 meses		
TOTAL SUSPENSIONES:	1		
SUSPENSIÓN No. 1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 1:	3 meses		
REANUDACIÓN:	25/04/2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUALIZADA:	31 DE OCTUBRE DE 2025		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

CONVENIO 2235-2024						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
639624	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199.718.769,00	$157.914.722,57	$41.804.046,43
TOTAL					$157.914.722,57	$41.804.046,43

CONVENIO 2385-2024						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
644624	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199.958.562,00	$118.093.986,05	$81.864.575,95
TOTAL					$118.093.986,05	$81.864.575,95

CONVENIO 2388-2024						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
644424	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$201.346.274,00	$174.879.531,14	$26.466.742,86
TOTAL					$174.879.531,14	$26.466.742,86

CONVENIO 2454-2024						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
652124	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.274.445,00	$177.070.878,63	$ 23.203.566,37
TOTAL					$177.070.878,63	$ 23.203.566,37

CONVENIO 2470-2024						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
652724	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.319.133,00	$160.236.266,30	$ 40.082.866,70
TOTAL					$160.236.266,30	$ 40.082.866,70

CONVENIO 2474-2024						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
652824	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199.768.774,00	$9.690.562,46	$190.078.211,54
TOTAL					$9.690.562,46	$190.078.211,54

CONVENIO 2479-2024						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
652224	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.168.973,00	$113.792.192,58	$86.376.780,42
TOTAL					$113.792.192,58	$86.376.780,42

CONVENIO 2552-2024						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
677224	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.827.810,00	$175.485.232,85	$ 25.342.577,15
TOTAL					$175.485.232,85	$ 25.342.577,15

CONVENIO 2638-2024						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
699824	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.181.068,00	$ 171.656.873,21	$ 28.524.194,79
TOTAL					$ 171.656.873,21	$ 28.524.194,79

CONVENIO 2664-2024						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
698424	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$198.037.878,00	$135.364.091,92	$ 62.673.786,08
TOTAL					$135.364.091,92	$ 62.673.786,08

CONVENIO 2695-2024						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
701224	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.216.055,00	$74.426.261,16	$ 125.789.793,84
TOTAL					$74.426.261,16	$ 125.789.793,84

CONVENIO 2703-2024						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
697324	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199.911.887,00	$157.297.763,99	$ 42.614.123,01
TOTAL					$157.297.763,99	$ 42.614.123,01

CONVENIO 2728-2024						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
698624	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.409.039,00	$142.894.459,90	$57.514.579,10
TOTAL					$142.894.459,90	$57.514.579,10

CONVENIO 2764-2024						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
700024	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.219.785,00	$113.885.303,56	$ 86.334.481,44
TOTAL					$113.885.303,56	$ 86.334.481,44

CONVENIO 2767-2024						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
697524	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.613.472,00	$ 130.396.710,93	$ 70.216.761,07
TOTAL					$ 130.396.710,93	$ 70.216.761,07

CONVENIO 2956-2024						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
845124	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199.826.136,00	$0,00	$199.826.136,00
TOTAL					$0,00	$199.826.136,00

CONVENIO 2968-2024						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1041724	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.094.305,00	$ 178.253.985,64	$ 21.840.319,36
TOTAL					$ 178.253.985,64	$ 21.840.319,36

CONVENIO 2996-2024						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1016224	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.494.569,00	$132.101.249,20	$ 68.393.319,8
TOTAL					$132.101.249,20	$ 68.393.319,8

CONVENIO 3156-2024						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
806324	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.479.284,00	$ 94.468.130,52	$ 106.011.153,48
TOTAL					$ 94.468.130,52	$ 106.011.153,48

CONVENIO 3160-2024						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
816724	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$198.251.083,00	$ 172.444.021,00	$ 25.807.062,00
TOTAL					$ 172.444.021,00	$ 25.807.062,00

CONVENIO 3347-2024						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
847324	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$198.872.012,00	$ 164.876.975,61	$ 33.995.036,39
TOTAL					$ 164.876.975,61	$ 33.995.036,39

CONVENIO 3419-2024						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
891924	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199.017.550,00	$78.259.888,21	$120.757.661,79
TOTAL					$78.259.888,21	$120.757.661,79

CONVENIO 3539-2024						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
892024	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199.870.871,00	$178.808.418,43	$ 21.062.452,57
TOTAL					$178.808.418,43	$ 21.062.452,57

CONVENIO 3628-2024						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
927724	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.450.698,00	$ 43.970.799,67	$ 156.479.898,33
TOTAL					$ 43.970.799,67	$ 156.479.898,33

CONVENIO 3777-2024						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
961224	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199.097.710,00	$100.104.905,39	$ 98.992.804,61
TOTAL					$100.104.905,39	$ 98.992.804,61

CONVENIO 3922-2024						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
968624	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.790.879,00	$ 163.432.246,72	$ 37.358.632,28
TOTAL					$ 163.432.246,72	$ 37.358.632,28

CONVENIO 4006-2024						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1023124	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.059.653,00	$ 166.449.360,04	$ 33.610.292,96
TOTAL					$ 166.449.360,04	$ 33.610.292,96

CONVENIO 4100-2024						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1032124	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$212.775.667,00	$87.522.070,17	$125.253.596,83
TOTAL					$87.522.070,17	$125.253.596,83

CONVENIO 4272-2024						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1123924	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$201.213.132,00	$ 155.834.773,45	$ 45.378.358,55
TOTAL					$ 155.834.773,45	$ 45.378.358,55

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 12, para el periodo de octubre de 2025, se reporta avance en veintiocho (28) convenios están realizando la ejecución de obra.

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

CONVENIO 2235-2024 TOPACIA ALTA		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$151.116.701,00	75,66%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$151.116.700,74	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$135.899.492,57	89,93%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$22.015.230,00	11,02%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$157.914.722,57	79,07%

CONVENIO 2385 LA MARIELA		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$151.348.610,00	75,69%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$151.348.609,42	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$92.493.661,05	61,11%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$25.600.325,00	12,80%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$118.093.986,05	59,06%

CONVENIO 2388 LA TOPACIA Y RIOLEJOS		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$153.445.043,00	76,21%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$153.445.043,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$149.511.379,14	97,44%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$25.368.152,00	12,60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$174.879.531,14	86,86%

CONVENIO 2454 BUENAVISTA		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$151.654.106,00	75,35%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$151.654.106,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$151.950.278,63	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$25.120.600,00	12,48%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$177.070.878,63	87,97%

CONVENIO 2470 LA VENADA		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$151.697.324,00	75,73%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$151.697.324,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$135.675.066,30	89,44%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$24.561.200,00	12,26%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$160.236.266,30	79,99%

CONVENIO 2474 DORADO ALTO DE LAS CAMELIAS		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$151.165.062,00	75,67%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$19.452.397,00	12,87%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$9.690.562,46	6,41%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$9.690.562,46	4,85%

CONVENIO 2479 LA COQUETA		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$152.674.925,00	76,37%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$152.674.924,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$88.191.867,58	57,76%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$25.600.325,00	12,81%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$113.792.192,58	56,92%

CONVENIO 2552 BARCELONA ALTA		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$152.189.275,00	75,41%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$152.189.275,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$152.683.882,85	100,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$22.801.350,00	11,30%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$175.485.232,85	86,95%

CONVENIO 2638 PATIO BONITO		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$151.563.799,00	75,34%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$151.563.799,02	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$147.093.721,21	97,05%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$24.563.152,00	12,21%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$171.656.873,21	85,32%

CONVENIO 2664 LOS PINOS		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$149.491.082,00	75,11%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$149.491.083,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$109.763.766,92	73,42%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$25.600.325,00	12,86%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$135.364.091,92	68,01%

CONVENIO 2695 ARENALES		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$151.597.635,00	75,72%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$151.597.634,68	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$48.825.936,16	32,21%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$25.600.325,00	12,79%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$74.426.261,16	37,17%

CONVENIO 2703 LA ARGENTINA		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$151.303.469,00	75,25%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$151.303.469,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$131.697.438,99	87,04%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$25.600.325,00	12,73%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$157.297.763,99	78,23%

CONVENIO 2728 CHAGUALA		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$151.784.274,00	75,36%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$151.784.274,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$117.294.134,90	77,28%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$25.600.325,00	12,71%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$142.894.459,90	70,95%

CONVENIO 2764 LOS JUANES		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$151.601.243,00	75,34%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$151.601.241,82	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$88.284.978,56	58,23%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$25.600.325,00	12,72%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$113.885.303,56	56,60%

CONVENIO 2767 LOS BALSOS		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$151.627.846,00	75,21%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$151.627.844,92	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$104.796.385,93	69,11%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$25.600.325,00	12,70%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$130.396.710,93	64,68%

CONVENIO 2956 EL AGRADO		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$151.220.538,00	75,30%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 2968 MARAVELEZ		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$151.479.888,00	75,33%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$151.479.888,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$151.403.985,64	99,95%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$26.850.000,00	13,35%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$178.253.985,64	88,64%

CONVENIO 2996 LA MONTAÑA		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$151.866.991,00	75,37%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$151.866.991,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$113.225.663,20	74,56%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$18.875.586,00	9,37%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$132.101.249,20	65,56%

CONVENIO 3156 PAVAS		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$151.852.209,00	75,37%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$151.852.209,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$71.666.780,52	47,20%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$22.801.350,00	11,32%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$94.468.130,52	46,89%

CONVENIO 3160 PIAMONTE		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$149.523.497,00	75,04%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$149.621.318,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$149.642.671,00	100,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$22.801.350,00	11,44%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$172.444.021,00	86,55%

CONVENIO 3347 CANAAN		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$150.297.787,00	75,20%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$150.297.788,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$139.276.650,61	92,67%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$25.600.325,00	12,81%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$164.876.975,61	82,49%

CONVENIO 3419 RIO VERDE Y PARAGUAICITO		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$150.438.540,00	75,59%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$150.438.540,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$52.659.563,21	35,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$25.600.325,00	12,86%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$78.259.888,21	39,32%

CONVENIO 3539 CANTORES		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$151.263.802,00	75,30%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$151.263.802,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$151.258.418,43	100,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$27.550.000,00	13,72%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$178.808.418,43	89,02%

CONVENIO 3628 ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$151.824.563,00	75,37%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$151.824.562,68	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$18.370.474,67	12,10%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$25.600.325,00	12,71%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$43.970.799,67	21,83%

CONVENIO 3777 SAN JUAN DE CAROLINA		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$150.516.064,00	75,22%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$150.516.065,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$74.504.580,39	49,50%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$25.600.325,00	12,79%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$100.104.905,39	50,03%

CONVENIO 3922 LA POPA		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$152.153.558,00	75.40%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$152.153.558,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$139.931.794,72	91,97%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$23.500.452,00	11,65%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$163.432.246,72	80,99%

CONVENIO 4006 PADILLA		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$151.446.376,00	75,32%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$151.446.376,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$140.849.035,04	93,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$25.600.325,00	12,73%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$166.449.360,04	82,79%

CONVENIO 4100 RESGUARDO INDIGENA DACHI AGORE DRUA		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$150.840.929,00	70,89%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$150.840.929,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$61.921.745,17	41,05%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$25.600.325,00	12,03%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$87.522.070,17	41,13%

CONVENIO 4272 VILLA EXITO		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$152.561.926,00	75,45%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$152.561.926,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$132.384.573,45	86,77%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$23.450.200,00	11,60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$155.834.773,45	77,06%

1.4.2. ANTICIPO

Cabe resaltar que ninguno de los convenios celebrados ha contado con la entrega de anticipos.

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

CONVENIO 2235-2024 TOPACIA ALTA
Meta física programada %: 100,00 %
Meta física ejecutada %: 89,93 %

CONVENIO 2385-2024 LA MARIELA
Meta física programada %: 100,00 %
Meta física ejecutada %: 61,11 %

CONVENIO 2388-2024 LA TOPACIA Y RIOLEJOS
Meta física programada %: 100,00 %
Meta física ejecutada %: 97,44 %

CONVENIO 2454-2024 BUENAVISTA
Meta física programada %: 100,00 %
Meta física ejecutada %: 100,00 %

CONVENIO 2470-2024 LA VENADA
Meta física programada %: 100,00 %
Meta física ejecutada %: 89,44 %

CONVENIO 2474-2024 DORADO ALTO DE LAS CAMELIAS
Meta física programada %: 12,87 %
Meta física ejecutada %: 6,41 %

CONVENIO 2479-2024 LA COQUETA
Meta física programada %: 100,00 %
Meta física ejecutada %: 57,76 %

CONVENIO 2552-2024 BARCELONA ALTA
Meta física programada %: 100,00 %
Meta física ejecutada %: 100,00 %

CONVENIO 2638-2024 PATIO BONITO
Meta física programada %: 100,00 %
Meta física ejecutada %: 97,05 %

CONVENIO 2664-2024 LOS PINOS
Meta física programada %: 100,00 %
Meta física ejecutada %: 73,42 %

CONVENIO 2695-2024 ARENALES
Meta física programada %: 100,00 %
Meta física ejecutada %: 32,21 %

CONVENIO 2703-2024 LA ARGENTINA
Meta física programada %: 100,00%
Meta física ejecutada %: 87,04 %

CONVENIO 2728-2024 CHAGUALÁ
Meta física programada %: 100,00 %
Meta física ejecutada %: 77,28 %

CONVENIO 2764-2024 LOS JUANES
Meta física programada %: 100,00 %
Meta física ejecutada %: 58,23 %

CONVENIO 2767-2024 LOS BALSOS
Meta física programada %: 100,00 %
Meta física ejecutada %: 69,11 %

CONVENIO 2956-2024 EL AGRADO
Meta física programada %: 0 %
Meta física ejecutada %: 0 %

CONVENIO 2968-2024 MARAVELEZ
Meta física programada %: 100,00 %
Meta física ejecutada %: 99,95 %

CONVENIO 2996-2024 LA MONTAÑA
Meta física programada %: 100,00 %
Meta física ejecutada %: 74,56 %

CONVENIO 3156-2024 PAVAS
Meta física programada %: 100,00 %
Meta física ejecutada %: 47,20 %

CONVENIO 3160-2024 PIAMONTE
Meta física programada %: 100,00 %
Meta física ejecutada %: 100,00 %

CONVENIO 3347-2024 CANAÁN
Meta física programada %: 100,00 %
Meta física ejecutada %: 92,67 %

CONVENIO 3419-2024 RÍO VERDE Y PARAGUAICITO
Meta física programada %: 100,00 %
Meta física ejecutada %: 35,00 %

CONVENIO 3539-2024 CANTORES
Meta física programada %: 100,00 %
Meta física ejecutada %: 100,00 %

CONVENIO 3628-2024 ASOJAC
Meta física programada %: 100,00 %
Meta física ejecutada %: 12,10 %

CONVENIO 3777-2024 SAN JUAN DE CAROLINA
Meta física programada %: 100,00 %
Meta física ejecutada %: 49,50 %

CONVENIO 3922-2024 LA POPA
Meta física programada %: 100,00 %
Meta física ejecutada %: 91,97 %

CONVENIO 4006-2024 PADILLA
Meta física programada %: 100,00 %
Meta física ejecutada %: 93,00 %

CONVENIO 4100-2024 DACHI AGORE DRUA
Meta física programada %: 100,00 %
Meta física ejecutada %: 41,05 %

CONVENIO 4272-2024 VILLA ÉXITO
Meta física programada %: 100,00 %
Meta física ejecutada %: 86,77 %

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

A la fecha no se han generado actas de fijación de precios no previstos.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

A la fecha de corte del presente informe no se han presentado actas de modificación de cantidades de obra.

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

CONVENIO	FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

CONVENIO	FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA PRÓRROGA No.	FECHA DE FINALIZACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 03
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/10/2025
MEMORANDO APROBACIÓN ACTUALIZACION AMPAROS Y GARANTIAS: En trámite
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: En trámite
POLIZAS ACTUALIZADAS: En trámite

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL							
OAC	**CONVENIO**	**PÓLIZA No.**	**ANEXO**	**AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA TOPACIA ALTA	2235-2024	NB-100332968	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.071.877,00	05/07/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.035.939,00	05/07/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.143.754,00	31/12/2024	31/12/2029
		NB-100084127		RCE	$ 260.000.000,00	05/07/2024	31/12/2024
		NB-100332968	1	CUMPLIMIENTO	$ 20.071.877,00	25/04/2025	31/07/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.035.939,00	25/04/2025	31/07/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.143.754,00	31/07/2025	31/07/2030
		NB-100084127		RCE	$ 284.700.000,00	05/07/2024	31/07/2025
		NB-100332968	2	CUMPLIMIENTO	$ 20.071.877,00	07/10/2025	31/10/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.035.939,00	07/10/2025	31/10/2028
		NB-100084127		ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.143.754,00	31/10/2025	31/10/2030
				RCE	$ 284.700.000,00	05/07/2024	31/10/2025

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 03
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/10/2025
MEMORANDO APROBACIÓN ACTUALIZACION AMPAROS Y GARANTIAS: En trámite
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: En trámite
POLIZAS ACTUALIZADAS: En trámite

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL							
OAC	**CONVENIO**	**PÓLIZA No.**	**ANEXO**	**AMPARO**	**SUMA ASEGURADA**	**VIGENCIA**	
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MARIELA	2385-2024	NB-100333219	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.095.857,00	16/07/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.047.929,00	16/07/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.191.713,00	31/12/2024	31/12/2029
		NB-100084187		RCE	$ 260.000.000,00	16/07/2024	31/12/2024
		NB-100333219	1	CUMPLIMIENTO	$ 20.095.857,00	16/07/2024	31/07/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.047.929,00	16/07/2024	31/07/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.191.713,00	31/07/2025	31/07/2030
		NB-100084187		RCE	$ 284.700.000,00	16/07/2024	31/07/2025
		NB-100333219	3	CUMPLIMIENTO	$ 20.095.857,00	30/09/2024	31/10/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.047.929,00	30/09/2024	31/10/2028
		NB-100084187		ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.191.713,00	31/10/2025	31/10/2030
				RCE	$ 284.700.000,00	16/07/2024	31/10/2025

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 02
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/07/2025
MEMORANDO APROBACIÓN ACTUALIZACION AMPAROS Y GARANTIAS: SI
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 02/09/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: PENDIENTE MODIFICACION DE POLIZAS POR ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL CONVENIO

CONTROL DE GARANTIAS

TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro

NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL

OAC	CONVENIO	PÓLIZA No.	ANEXO	AMPARO	SUMA ASEGURADA	VIGENCIA	
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TOPACIA RIO LEJOS	2388-2024	NB-100332967	1	CUMPLIMIENTO	$ 20.234.628,00	25/07/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.117.314,00	25/07/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.469.255,00	31/12/2024	31/12/2029
		NB-100084126	0	RCE	$ 260.000.000,00	16/07/2024	31/12/2024
		NB-100332967	2	CUMPLIMIENTO	$ 20.234.628,00	25/04/2025	31/07/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.117.314,00	25/04/2025	31/07/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.469.255,00	31/07/2025	31/07/2030
		NB-100084126	1	RCE	$ 284.700.000,00	16/07/2024	31/07/2025
		NB-100332967	4	CUMPLIMIENTO	$ 20.234.628,00	25/04/2025	31/10/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.117.314,00	25/04/2025	31/10/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.469.255,00	31/07/2025	31/10/2030
		NB-100084126	3	RCE	$ 284.700.000,00	16/07/2024	31/10/2025

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 03
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/07/2025
MEMORANDO APROBACIÓN ACTUALIZACION AMPAROS Y GARANTIAS: SI
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 02/09/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: PENDIENTE MODIFICACION DE POLIZAS POR ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL CONVENIO

CONTROL DE GARANTIAS

TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro

NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL

OAC	CONVENIO	PÓLIZA No.	ANEXO	AMPARO	SUMA ASEGURADA	VIGENCIA	
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENAVISTA	2454-2024	NB-100335223	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.127.445,00	18/07/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.063.723,00	18/07/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.254.889,00	31/12/2024	31/12/2029
		NB-100084772		RCE	$ 260.000.000,00	18/07/2024	31/12/2024
		NB-00335223	1	CUMPLIMIENTO	$ 20.127.445,00	18/07/2024	31/07/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.063.723,00	18/07/2024	31/07/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.254.889,00	31/07/2025	31/07/2030
		NB-100084772		RCE	$ 284.700.000,00	18/07/2024	31/07/2025
		NB-100335223	3	CUMPLIMIENTO	$ 20.127.445,00	30/08/2024	31/10/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.063.723,00	30/08/2024	31/10/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.254.889,00	31/07/2025	31/10/2030
		NB-100084772		RCE	$ 284.700.000,00	18/07/2024	31/10/2025

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 03
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/07/2025
MEMORANDO APROBACIÓN ACTUALIZACION AMPAROS Y GARANTIAS: SI
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 11/08/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: PENDIENTE MODIFICACION DE POLIZAS POR ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL CONVENIO

CONTROL DE GARANTIAS

TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro

NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL

OAC	CONVENIO	PÓLIZA No.	ANEXO	AMPARO	SUMA ASEGURADA	VIGENCIA	
JUNTA ACCIÓN COMUNAL VENADA BAJA	2470-2024	NB-100335049	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.131.914,00	18/07/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.065.957,00	18/07/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.263.827,00	31/12/2024	31/12/2029
		NB-100084721		RCE	$ 260.000.000,00	18/07/2024	31/12/2024
		NB-100335049	1	CUMPLIMIENTO	$ 20.131.914,00	31/12/2025	31/07/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.065.957,00	31/12/2025	31/07/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.263.827,00	31/07/2025	31/07/2030
		NB-100084721		RCE	$ 284.700.000,00	18/07/2024	31/07/2025
		NB-100335049	2	CUMPLIMIENTO	$ 20.131.914,00	04/09/2025	31/10/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.065.957,00	04/09/2025	31/10/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.263.827,00	31/10/2025	31/10/2030
		NB-100084721		RCE	$ 284.700.000,00	18/07/2024	31/10/2025

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 03
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/10/2025
MEMORANDO APROBACIÓN ACTUALIZACION AMPAROS Y GARANTIAS: En trámite
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: En trámite
POLIZAS ACTUALIZADAS: En trámite

CONTROL DE GARANTIAS

TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro

NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL

OAC	CONVENIO	PÓLIZA No.	ANEXO	AMPARO	SUMA ASEGURADA	VIGENCIA	
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL DORADO ALTO LAS CAMELIAS	2474-2024	NB-100335205	1	CUMPLIMIENTO	$ 20.076.878,00	18/07/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.038.439,00	18/07/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.153.755,00	31/12/2024	31/12/2029
		NB-100084763	0	RCE	$ 260.000.000,00	18/07/2024	31/12/2024

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 04
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/10/2025
MEMORANDO APROBACIÓN ACTUALIZACION AMPAROS Y GARANTIAS: En trámite
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: En trámite
POLIZAS ACTUALIZADAS: En trámite

CONTROL DE GARANTIAS

TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro

NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL

OAC	CONVENIO	PÓLIZA No.	ANEXO	AMPARO	SUMA ASEGURADA	VIGENCIA	
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA COQUETA	2479-2024	NB-100335130	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.116.898,00	18/07/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.058.449,00	18/07/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.233.795,00	31/12/2024	31/12/2029
		NB-100084745		RCE	$ 260.000.000,00	18/07/2024	31/12/2024
		NB-100335130	1	CUMPLIMIENTO	$ 20.116.898,00	31/12/2024	31/07/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.058.449,00	31/12/2024	31/07/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.233.795,00	31/07/2025	31/07/2030
		NB-100084745		RCE	$ 284.700.000,00	18/07/2024	31/07/2025
		NB-100335130	2	CUMPLIMIENTO	$ 20.116.898,00	02/09/2024	31/10/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.058.449,00	02/09/2024	31/10/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.233.795,00	31/10/2025	31/10/2030
		NB-100084745		RCE	$ 284.700.000,00	18/07/2024	31/10/2025

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 03
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/07/2025
MEMORANDO APROBACIÓN ACTUALIZACION AMPAROS Y GARANTIAS: SI
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 11/08/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: PENDIENTE MODIFICACION POLIZAS POR ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL CONVENIO

CONTROL DE GARANTIAS

TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro

NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL

OAC	CONVENIO	PÓLIZA No.	ANEXO	AMPARO	SUMA ASEGURADA	VIGENCIA	
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BARCELONA ALTA	2552-2024	NB-100335385	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.182.781,00	22/07/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.091.391,00	22/07/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.365.562,00	31/12/2024	31/12/2029
		NB-100084816		RCE	$ 260.000.000,00	22/07/2024	31/12/2024
		NB-100335385	1	CUMPLIMIENTO	$ 20.182.781,00	22/07/2024	31/07/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.091.391,00	22/07/2024	31/07/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.365.562,00	31/07/2025	31/07/2030
		NB-100084816		RCE	$ 284.700.000,00	22/07/2024	31/07/2025
		NB-100335385	2	CUMPLIMIENTO	$ 20.182.781,00	22/07/2024	31/10/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.091.391,00	22/07/2024	31/10/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.365.562,00	31/07/2025	31/10/2030
		NB-100084816		RCE	$ 284.700.000,00	22/07/2024	31/10/2025

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 03
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/08/2025
MEMORANDO APROBACIÓN ACTUALIZACION AMPAROS Y GARANTIAS: SI
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 11/09/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: PENDIENTE MODIFICACION DE POLIZAS POR ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL CONVENIO

CONTROL DE GARANTIAS

TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro

NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL

OAC	CONVENIO	PÓLIZA No.	ANEXO	AMPARO	SUMA ASEGURADA	VIGENCIA	
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO	2638-2024	NB-100335626	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.118.107,00	24/07/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.059.054,00	24/07/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.236.214,00	31/12/2024	31/12/2029
		NB-100084897		RCE	$ 260.000.000,00	24/07/2024	31/12/2024
		NB-100335626	1	CUMPLIMIENTO	$ 20.118.107,00	24/07/2024	31/08/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.059.054,00	24/07/2024	31/08/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.236.214,00	31/07/2025	31/08/2030
		NB-100084897		RCE	$ 284.700.000,00	24/07/2024	31/07/2025
		NB-100335626	2	CUMPLIMIENTO	$ 20.118.107,00	16/09/2024	31/08/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.059.054,00	16/09/2024	31/08/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.236.214,00	31/08/2025	31/08/2030
		NB-100084897		RCE	$ 284.700.000,00	24/07/2024	31/08/2025
		NB-1003356263	3	CUMPLIMIENTO	$ 20.118.107,00	16/09/2024	31/10/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.059.054,00	16/09/2024	31/10/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.236.214,00	31/10/2025	31/10/2030
		NB-100084897		RCE	$ 284.700.000,00	24/07/2024	31/10/2025

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 03
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/10/2025
MEMORANDO APROBACIÓN ACTUALIZACION AMPAROS Y GARANTIAS: En trámite
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: En trámite
POLIZAS ACTUALIZADAS: En trámite

CONTROL DE GARANTIAS

TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro

NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL

OAC	CONVENIO	PÓLIZA No.	ANEXO	AMPARO	SUMA ASEGURADA	VIGENCIA	
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PINOS	2664-2024	NB-100337082	0	CUMPLIMIENTO	$ 19.903.788,00	24/07/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 9.951.894,00	24/07/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 39.807.576,00	31/12/2024	31/12/2029
		NB-100085381		RCE	$ 260.000.000,00	24/07/2024	31/12/2024
		NB-100337082	1	CUMPLIMIENTO	$ 19.903.788,00	24/07/2024	31/07/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 9.951.894,00	24/07/2024	31/07/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 39.807.576,00	31/07/2025	31/07/2030
		NB-100085381		RCE	$ 284.700.000,00	24/07/2024	31/07/2025
		NB-100337082	2	CUMPLIMIENTO	$ 19.903.788,00	24/07/2024	31/10/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 9.951.894,00	24/07/2024	31/10/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 39.807.576,00	31/10/2025	31/10/2030
		NB-100085381		RCE	$ 284.700.000,00	24/07/2024	31/10/2025

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 03
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/10/2025
MEMORANDO APROBACIÓN ACTUALIZACION AMPAROS Y GARANTIAS: En trámite
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: En trámite
POLIZAS ACTUALIZADAS: En trámite

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL							
OAC	**CONVENIO**	**PÓLIZA No.**	**ANEXO**	**AMPARO**	**SUMA ASEGURADA**	**VIGENCIA**	
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ARENALES	2695-2024	NB-100338897	2	CUMPLIMIENTO	$ 20.121.606,00	26/07/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.060.803,00	26/07/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.243.211,00	31/12/2024	31/12/2029
		NB-100085961	0	RCE	$ 260.000.000,00	26/07/2024	31/12/2024
		NB-100338897	3	CUMPLIMIENTO	$ 20.121.606,00	26/07/2024	31/07/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.060.803,00	26/07/2024	31/07/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.243.211,00	31/07/2025	31/07/2030
		NB-100085961	1	RCE	$ 284.700.000,00	26/07/2024	31/07/2025
		NB-100338897	4	CUMPLIMIENTO	$ 20.121.606,00	26/07/2024	31/10/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.060.803,00	26/07/2024	31/10/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.243.211,00	31/07/2025	31/10/2030
		NB-100085961	2	RCE	$ 284.700.000,00	26/07/2024	31/10/2025

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 03
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/10/2025
MEMORANDO APROBACIÓN ACTUALIZACION AMPAROS Y GARANTIAS: En trámite
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: En trámite
POLIZAS ACTUALIZADAS: En trámite

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL							
OAC	**CONVENIO**	**PÓLIZA No.**	**ANEXO**	**AMPARO**	**SUMA ASEGURADA**	**VIGENCIA**	
JUNTA ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ARGENTINA	2703-2024	NB-1003373208	1	CUMPLIMIENTO	$ 20.091.189,00	11/09/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.045.595,00	11/09/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.182.378,00	31/12/2024	31/12/2029
		NB-100085488	0	RCE	$ 260.000.000,00	25/07/2024	31/12/2024
		NB-100337328	2	CUMPLIMIENTO	$ 20.091.189,00	11/09/2024	31/07/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.045.595,00	11/09/2024	31/07/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.182.378,00	31/07/2025	31/07/2030
		NB-100085488	1	RCE	$ 284.700.000,00	25/07/2024	31/07/2025
		NB-100337328	3	CUMPLIMIENTO	$ 20.091.189,00	11/09/2024	31/10/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.045.595,00	11/09/2024	31/10/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.182.378,00	31/07/2025	31/10/2030
		NB-100085488	2	RCE	$ 284.700.000,00	25/07/2024	31/10/2025

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 03
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/10/2025
MEMORANDO APROBACIÓN ACTUALIZACION AMPAROS Y GARANTIAS: En trámite
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: En trámite
POLIZAS ACTUALIZADAS: En trámite

CONTROL DE GARANTIAS

TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro

NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL

OAC	CONVENIO	PÓLIZA No.	ANEXO	AMPARO	SUMA ASEGURADA	VIGENCIA	
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CHAGUALA	2728-2024	NB-100337390	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.140.904,00	25/07/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.070.452,00	25/07/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.281.808,00	31/12/2024	31/12/2029
		NB-100085506		RCE	$ 260.000.000,00	25/07/2024	31/12/2024
		NB-100337390	1	CUMPLIMIENTO	$ 20.140.904,00	25/07/2024	31/07/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.070.452,00	25/07/2024	31/07/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.281.808,00	31/07/2025	31/07/2030
		NB-100085506		RCE	$ 284.700.000,00	25/07/2024	31/07/2025
		NB-100337390	2	CUMPLIMIENTO	$ 20.140.903,00	25/07/2024	31/10/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.070.451,00	25/07/2024	31/10/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.281.807,00	31/07/2025	31/10/2030
		NB-100085506		RCE	$ 284.700.000,00	25/07/2024	31/10/2025

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 03
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/10/2025
MEMORANDO APROBACIÓN ACTUALIZACION AMPAROS Y GARANTIAS: En trámite
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: En trámite
POLIZAS ACTUALIZADAS: En trámite

CONTROL DE GARANTIAS

TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro

NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL

OAC	CONVENIO	PÓLIZA No.	ANEXO	AMPARO	SUMA ASEGURADA	VIGENCIA	
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS JUANES DEL DE PIJAO QUINDÍO	2764-2024	NB-100336143	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.121.979,00	26/07/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.060.990,00	26/07/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.243.957,00	31/12/2024	31/12/2029
		NB-100085073		RCE	$ 260.000.000,00	26/07/2024	31/12/2024
		NB-100336143	1	CUMPLIMIENTO	$ 20.121.979,00	26/07/2024	31/07/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.060.990,00	26/07/2024	31/07/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.243.957,00	31/07/2025	31/07/2030
		NB-100085073		RCE	$ 284.700.000,00	26/07/2024	31/07/2025
		NB-100336143	3	CUMPLIMIENTO	$ 20.121.979,00	19/09/2024	31/10/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.060.990,00	19/09/2024	31/10/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.243.957,00	31/10/2025	31/10/2030
		NB-100085073		RCE	$ 284.700.000,00	26/07/2024	31/10/2025

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 03
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/10/2025
MEMORANDO APROBACIÓN ACTUALIZACION AMPAROS Y GARANTIAS: En trámite
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: En trámite
POLIZAS ACTUALIZADAS: En trámite

CONTROL DE GARANTIAS

TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro

NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL

OAC	CONVENIO	PÓLIZA No.	ANEXO	AMPARO	SUMA ASEGURADA	VIGENCIA	
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS BALSOS	2767-2024	NB-100335721	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.161.348,00	26/07/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.080.674,00	26/07/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.322.695,00	31/12/2024	31/12/2029
		NB-100084926		RCE	$ 260.000.000,00	26/07/2024	31/12/2024
		NB-100335721	1	CUMPLIMIENTO	$ 20.161.348,00	26/07/2024	31/07/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.080.674,00	26/07/2024	31/07/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.322.695,00	31/07/2025	31/07/2030
		NB-100084926		RCE	$ 284.700.000,00	26/07/2024	31/07/2025
		NB-100335721	2	CUMPLIMIENTO	$ 20.161.348,00	18/09/2024	31/07/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.080.674,00	18/09/2024	31/07/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.322.695,00	31/07/2025	31/07/2030
		NB-100084926		RCE	$ 284.700.000,00	26/07/2024	31/07/2025
		NB-100335721	4	CUMPLIMIENTO	$ 20.161.348,00	18/09/2024	31/10/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.080.674,00	18/09/2024	31/10/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.322.695,00	31/07/2025	31/10/2030
		NB-100084926		RCE	$ 284.700.000,00	26/07/2024	31/10/2025

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 02
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/10/2025
MEMORANDO APROBACIÓN ACTUALIZACION AMPAROS Y GARANTIAS: En trámite
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: En trámite
POLIZAS ACTUALIZADAS: En trámite

CONTROL DE GARANTIAS

TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro

NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL

OAC	CONVENIO	PÓLIZA No.	ANEXO	AMPARO	SUMA ASEGURADA	VIGENCIA	
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL AGRADO	2956-2024	NB-100337927	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.082.614,00	05/08/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.041.307,00	05/08/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.165.228,00	31/12/2024	31/12/2029
		NB-100085665		RCE	$ 260.000.000,00	05/08/2024	31/12/2024
		NB-100337927	1	CUMPLIMIENTO	$ 20.082.614,00	25/04/2025	31/07/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.041.307,00	25/04/2025	31/07/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.165.228,00	31/07/2025	31/07/2030
		NB-100085665		RCE	$ 284.700.000,00	05/08/2024	31/07/2025

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 02
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/07/2025
MEMORANDO APROBACIÓN ACTUALIZACION AMPAROS Y GARANTIAS: SI
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 13/08/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: PENDIENTE MODIFICACION DE POLIZAS POR ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL CONVENIO

CONTROL DE GARANTIAS

TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro

NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL

OAC	CONVENIO	PÓLIZA No.	ANEXO	AMPARO	SUMA ASEGURADA	VIGENCIA	
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MARAVELEZ	2968-2024	NB-100337747	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.109.431,00	5/08/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.054.716,00	5/08/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.218.861,00	31/12/2024	31/12/2029
		NB-100085610		RCE	$ 260.000.000,00	5/08/2024	31/12/2024
		NB-100337747	1	CUMPLIMIENTO	$ 20.109.431,00	5/08/2024	31/07/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.054.716,00	5/08/2024	31/07/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.218.861,00	31/07/2025	31/07/2030
		NB-100085610		RCE	$ 284.700.000,00	5/08/2024	31/07/2025
		NB-100337747	2	CUMPLIMIENTO	$ 20.109.431,00	05/08/2024	31/10/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.054.716,00	05/08/2024	31/10/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.218.861,00	31/10/2025	31/10/2030
		NB-100085610		RCE	$ 284.700.000,00	5/08/2024	31/10/2025

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 03
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/10/2025
MEMORANDO APROBACIÓN ACTUALIZACION AMPAROS Y GARANTIAS: En trámite
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: En trámite
POLIZAS ACTUALIZADAS: En trámite

CONTROL DE GARANTIAS

TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro

NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL

OAC	CONVENIO	PÓLIZA No.	ANEXO	AMPARO	SUMA ASEGURADA	VIGENCIA	
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MONTAÑA	2996-2024	NB-100337956	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.149.457,00	6/08/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.074.729,00	6/08/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.298.914,00	31/12/2024	31/12/2029
		NB-100085674		RCE	$ 260.000.000,00	6/08/2024	31/12/2024
		NB-100337956	1	CUMPLIMIENTO	$ 20.149.457,00	25/04/2025	31/07/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.074.729,00	25/04/2025	31/07/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.298.914,00	31/07/2025	31/07/2030
		NB-100085674		RCE	$ 284.700.000,00	6/08/2024	31/07/2025
		NB-100337956	2	CUMPLIMIENTO	$ 20.149.457,00	25/04/2025	31/07/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.074.729,00	25/04/2025	31/07/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.298.914,00	31/07/2025	31/07/2030
		NB-100085674		RCE	$ 284.700.000,00	6/08/2024	31/07/2025
		NB-100337956	3	CUMPLIMIENTO	$ 20.149.457,00	25/04/2025	31/10/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.074.729,00	25/04/2025	31/10/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.298.914,00	31/07/2025	31/10/2030
		NB-100085674		RCE	$ 284.700.000,00	6/08/2024	31/10/2025

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 03
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/10/2025
MEMORANDO APROBACIÓN ACTUALIZACION AMPAROS Y GARANTIAS: En trámite
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: En trámite
POLIZAS ACTUALIZADAS: En trámite

CONTROL DE GARANTIAS

TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro

NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL

OAC	CONVENIO	PÓLIZA No.	ANEXO	AMPARO	SUMA ASEGURADA	VIGENCIA	
JUNTA DE ACCON COMUNAL DE LA VEREDA PAVAS	3156-2024	NB-100340120	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.147.928,00	15/08/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.073.964,20	15/08/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.295.857,00	31/12/2024	31/12/2029
		NB-100086356		RCE	$ 260.000.000,00	15/08/2024	31/12/2024
		NB-100340120	1	CUMPLIMIENTO	$ 20.147.928,00	25/04/2025	31/07/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.073.964,20	25/04/2025	31/07/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.295.857,00	31/07/2025	31/07/2030
		NB-100086356		RCE	$ 284.700.000,00	15/08/2024	31/07/2025
		NB-100340120	2	CUMPLIMIENTO	$ 20.147.928,00	25/04/2025	31/10/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.073.964,20	25/04/2025	31/10/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.295.857,00	31/10/2025	31/10/2030
		NB-100086356		RCE	$ 284.700.000,00	15/08/2024	31/10/2025

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 02
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 25/07/2025
MEMORANDO APROBACIÓN ACTUALIZACION AMPAROS Y GARANTIAS: SI
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 11/08/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: PENDIENTE MODIFICACION DE POLIZAS POR ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL CONVENIO

CONTROL DE GARANTIAS

TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro

NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL

OAC	CONVENIO	PÓLIZA No.	ANEXO	AMPARO	SUMA ASEGURADA	VIGENCIA	
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PIAMONTE	3160-2024	NB-100340121	0	CUMPLIMIENTO	$ 19.925.108,30	16/08/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 9.962.554,15	16/08/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 39.850.217,00	31/12/2024	31/12/2029
		NB-100086357		RCE	$ 260.000.000,00	16/08/2024	31/12/2024
		NB-100340121	1	CUMPLIMIENTO	$ 19.925.108,30	16/08/2024	31/07/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 9.962.554,15	16/08/2024	31/07/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 39.850.217,00	31/07/2025	31/07/2030
		NB-100086357		RCE	$ 284.700.000,00	16/08/2024	31/07/2025
		NB-100340121	2	CUMPLIMIENTO	$ 19.925.108,30	16/08/2024	31/10/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 9.962.554,15	16/08/2024	31/10/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 39.850.217,00	31/07/2025	31/10/2030
		NB-100086357		RCE	$ 284.700.000,00	16/08/2024	31/10/2025

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 03
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/10/2025
MEMORANDO APROBACIÓN ACTUALIZACION AMPAROS Y GARANTIAS: En trámite
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: En trámite
POLIZAS ACTUALIZADAS: En trámite

CONTROL DE GARANTIAS

TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro

NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL

OAC	CONVENIO	PÓLIZA No.	ANEXO	AMPARO	SUMA ASEGURADA	VIGENCIA	
VEREDA CANAAN - SALENTO QUINDÍO	3347-2024	NB-100341890	0	CUMPLIMIENTO	$ 19.987.201,20	27/08/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 9.993.601,00	27/08/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 39.974.402,40	31/12/2024	31/12/2029
		NB-100086888		RCE	$ 260.000.000,00	27/08/2024	31/12/2024
		NB-100341890	1	CUMPLIMIENTO	$ 19.987.201,20	31/12/2024	31/07/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 9.993.601,00	31/12/2024	31/07/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 39.974.402,40	31/07/2025	31/07/2030
		NB-100086888		RCE	$ 284.700.000,00	27/08/2024	31/07/2025
		NB-100341890	2	CUMPLIMIENTO	$ 19.987.201,20	31/12/2024	31/10/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 9.993.601,00	31/12/2024	31/10/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 39.974.402,40	31/10/2025	31/10/2030
		NB-100086888		RCE	$ 284.700.000,00	27/08/2024	31/10/2025
		NB-100341890	3	CUMPLIMIENTO	$ 19.987.201,20	31/12/2024	31/10/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 9.993.601,00	31/12/2024	31/10/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 39.974.402,40	31/10/2025	31/10/2030
		NB-100086888		RCE	$ 284.700.000,00	27/08/2024	31/10/2025

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 03
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/10/2025
MEMORANDO APROBACIÓN ACTUALIZACION AMPAROS Y GARANTIAS: En trámite
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: En trámite
POLIZAS ACTUALIZADAS: En trámite

CONTROL DE GARANTIAS

TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro

NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL

OAC	CONVENIO	PÓLIZA No.	ANEXO	AMPARO	SUMA ASEGURADA	VIGENCIA	
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL RIO VERDE BAJO Y PARAGUAICITO	3419-2024	NB-100347142	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.001.755,00	5/09/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.000.877,00	5/09/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.003.510,00	31/12/2024	31/12/2029
		NB-100088487		RCE	$ 260.000.000,00	5/09/2024	31/12/2024
		NB-100347142	1	CUMPLIMIENTO	$ 20.001.755,00	25/04/2025	31/07/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.000.877,00	25/04/2025	31/07/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.003.510,00	31/07/2025	31/07/2030
		NB-100088487	2	RCE	$ 284.700.000,00	5/09/2024	31/07/2025
		NB-100347142	2	CUMPLIMIENTO	$ 20.001.755,00	11/12/2024	31/10/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.000.877,00	11/12/2024	31/10/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.003.510,00	31/10/2025	31/10/2030
		NB-100088487	3	RCE	$ 284.700.000,00	05/09/2024	31/10/2025

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 02
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/07/2025
MEMORANDO APROBACIÓN ACTUALIZACION AMPAROS Y GARANTIAS: SI
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 13/08/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: PENDIENTE MODIFICACION DE POLIZAS POR ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL CONVENIO

CONTROL DE GARANTIAS

TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro

NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL

OAC	CONVENIO	PÓLIZA No.	ANEXO	AMPARO	SUMA ASEGURADA	VIGENCIA	
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CANTORES	3539-2024	NB-100344210	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.087.087,10	5/09/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.043.544,00	5/09/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.174.174,20	31/12/2024	31/12/2029
		NB-100087536		RCE	$ 260.000.000,00	5/09/2024	31/12/2024
		NB-100344210	1	CUMPLIMIENTO	$ 20.087.087,10	25/04/2025	31/07/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.043.544,00	25/04/2025	31/07/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.174.174,20	31/07/2025	31/07/2030
		NB-100087536	2	RCE	$ 284.700.000,00	5/09/2024	31/07/2025
		NB-100344210	3	CUMPLIMIENTO	$ 20.087.087,10	25/04/2025	31/10/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.043.544,00	25/04/2025	31/10/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.174.174,20	31/10/2025	31/10/2030
		NB-100087536	4	RCE	$ 284.700.000,00	5/09/2024	31/10/2025

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 03
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/10/2025
MEMORANDO APROBACIÓN ACTUALIZACION AMPAROS Y GARANTIAS: En trámite
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: En trámite
POLIZAS ACTUALIZADAS: En trámite

CONTROL DE GARANTIAS

TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro

NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL

OAC	CONVENIO	PÓLIZA No.	ANEXO	AMPARO	SUMA ASEGURADA	VIGENCIA	
ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE CALARCÁ	3628-2024	NB-100344815	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.145.070,00	12/09/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.072.535,00	12/09/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.290.140,00	31/12/2024	31/12/2029
		NB-100087723		RCE	$ 260.000.000,00	12/09/2024	31/12/2024
		NB-100344815	1	CUMPLIMIENTO	$ 20.145.070,00	12/09/2024	31/07/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.072.535,00	12/09/2024	31/07/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.290.140,00	31/07/2025	31/07/2030
		NB-100087723		RCE	$ 284.700.000,00	12/09/2024	31/07/2025
		NB-100344815	2	CUMPLIMIENTO	$ 20.145.070,00	12/09/2024	31/10/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.072.535,00	12/09/2024	31/10/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.290.139,60	31/10/2025	31/10/2030
		NB-100087723		RCE	$ 284.700.000,00	12/09/2024	31/10/2025

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 03
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/10/2025
MEMORANDO APROBACIÓN ACTUALIZACION AMPAROS Y GARANTIAS: En trámite
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: En trámite
POLIZAS ACTUALIZADAS: En trámite

CONTROL DE GARANTIAS

TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro

NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL

OAC	CONVENIO	PÓLIZA No.	ANEXO	AMPARO	SUMA ASEGURADA	VIGENCIA	
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JUAN DE CAROLINA	3777-2024	NB-10034688	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.009.771,00	20/09/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.004.886,00	20/09/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.019.542,00	31/12/2024	31/12/2029
		NB-100088401		RCE	$ 260.000.000,00	20/09/2024	31/12/2024
		NB-10034688	1	CUMPLIMIENTO	$ 20.009.771,00	20/09/2024	31/07/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.004.886,00	20/09/2024	31/07/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.019.542,00	31/07/2025	31/07/2028
		NB-100088401		RCE	$ 284.700.000,00	20/09/2024	31/07/2025
		NB-10034688	2	CUMPLIMIENTO	$ 20.009.771,00	20/09/2024	31/10/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.004.886,00	20/09/2024	31/10/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.019.542,00	31/10/2025	31/10/2028
		NB-100088401		RCE	$ 284.700.000,00	20/09/2024	31/10/2025

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 03
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/10/2025
MEMORANDO APROBACIÓN ACTUALIZACION AMPAROS Y GARANTIAS: En trámite
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: En trámite
POLIZAS ACTUALIZADAS: En trámite

CONTROL DE GARANTIAS

TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro

NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL

OAC	CONVENIO	PÓLIZA No.	ANEXO	AMPARO	SUMA ASEGURADA	VIGENCIA	
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNAL DE LA VEREDA LA POPA	3922-2024	NB-100347646	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.179.088,00	24/09/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.089.544,00	24/09/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.358.176,00	31/12/2024	31/12/2029
		NB-100088610		RCE	$ 260.000.000,00	24/09/2024	31/12/2024
		NB-100347646	1	CUMPLIMIENTO	$ 20.179.088,00	24/09/2024	31/07/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.089.544,00	24/09/2024	31/07/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.358.176,00	31/07/2025	31/07/2030
		NB-100088610		RCE	$ 284.700.000,00	24/09/2024	31/07/2025
		NB-100347646	3	CUMPLIMIENTO	$ 20.179.088,00	24/09/2024	31/10/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.089.544,00	24/09/2024	31/10/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.358.176,00	31/07/2025	31/10/2030
		NB-100088610		RCE	$ 284.700.000,00	24/09/2024	31/10/2025
		NB-100347646	4	CUMPLIMIENTO	$ 20.179.088,00	11/12/2024	31/10/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.089.544,00	11/12/2024	31/10/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.358.176,00	31/07/2025	31/10/2030
		NB-100088610		RCE	$ 284.700.000,00	24/09/2024	31/10/2025

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 02
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/07/2025
MEMORANDO APROBACIÓN ACTUALIZACION AMPAROS Y GARANTIAS: SI
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 08/08/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: PENDIENTE MODIFICACION DE POLIZAS POR ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL CONVENIO

CONTROL DE GARANTIAS

TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro

NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL

OAC	CONVENIO	PÓLIZA No.	ANEXO	AMPARO	SUMA ASEGURADA	VIGENCIA	
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PADILLA DE LA TEBAIDA, QUINDÍO	4006-2024	NB-100348788	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.105.966,00	1/10/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.052.983,00	1/10/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.211.931,00	31/12/2024	31/12/2029
		NB-100088942		RCE	$ 260.000.000,00	1/10/2024	31/12/2024
		NB-100348788	2	CUMPLIMIENTO	$ 20.105.966,00	1/10/2024	31/07/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.052.983,00	1/10/2024	31/07/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.211.931,00	31/07/2025	31/07/2030
		NB-100088942	1	RCE	$ 284.700.000,00	1/10/2024	31/07/2025
		NB-100348788	3	CUMPLIMIENTO	$ 20.105.966,00	1/10/2024	31/07/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.052.983,00	1/10/2024	31/07/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.211.931,00	31/07/2025	31/07/2030
		NB-100088942	2	RCE	$ 284.700.000,00	1/10/2024	31/07/2025
		NB-100348788	4	CUMPLIMIENTO	$ 20.105.966,00	1/10/2024	31/10/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.052.983,00	1/10/2024	31/10/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.211.931,00	31/10/2025	31/10/2030
		NB-100088942	3	RCE	$ 284.700.000,00	1/10/2024	31/10/2025

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 03
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/10/2025
MEMORANDO APROBACIÓN ACTUALIZACION AMPAROS Y GARANTIAS: En trámite
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: En trámite
POLIZAS ACTUALIZADAS: En trámite

CONTROL DE GARANTIAS

TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro

NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL

OAC	CONVENIO	PÓLIZA No.	ANEXO	AMPARO	SUMA ASEGURADA	VIGENCIA	
CABILDO MAYOR INDÍGENA DEL RESGUARDO DACHI AGORE DRUA	4100-2024	NB-100350741	0	CUMPLIMIENTO	$ 21.377.567,00	11/10/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.688.784,00	11/10/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 42.755.134,00	31/12/2024	31/12/2029
		NB-100089588		RCE	$ 260.000.000,00	11/10/2024	31/12/2024
		NB-100350741	1	CUMPLIMIENTO	$ 21.377.567,00	11/10/2024	31/07/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.688.784,00	11/10/2024	31/07/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 42.755.134,00	31/07/2025	31/07/2030
		NB-100089588		RCE	$ 284.700.000,00	11/10/2024	31/07/2025
		NB-100350741	2	CUMPLIMIENTO	$ 21.377.567,00	11/10/2024	31/10/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.688.784,00	11/10/2024	31/10/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 42.755.134,00	31/10/2025	31/10/2030
		NB-100089588		RCE	$ 284.700.000,00	11/10/2024	31/10/2025

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 02
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/07/2025
MEMORANDO APROBACIÓN ACTUALIZACION AMPAROS Y GARANTIAS: SI
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 13/08/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: PENDIENTE MODIFICACION DE POLIZAS POR ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL CONVENIO

CONTROL DE GARANTIAS

TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro

NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL

OAC	CONVENIO	PÓLIZA No.	ANEXO	AMPARO	SUMA ASEGURADA	VIGENCIA	
JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA VILLA ÉXITO	4272-2024	NB-100357497	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.221.314,00	12/11/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.110.657,00	12/11/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.442.627,00	31/12/2024	31/12/2029
		NB-100091703		RCE	$ 260.000.000,00	12/11/2024	31/12/2024
		NB-100357497	1	CUMPLIMIENTO	$ 20.221.314,00	25/04/2025	31/07/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.110.657,00	25/04/2025	31/07/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.442.627,00	31/07/2025	31/07/2030
		NB-100091703		RCE	$ 284.700.000,00	12/11/2024	31/07/2025
		NB-100357497	2	CUMPLIMIENTO	$ 20.221.314,00	23/12/2024	31/10/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.110.657,00	23/12/2024	31/10/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.442.627,00	31/10/2025	31/10/2030
		NB-100091703		RCE	$ 284.700.000,00	12/11/2024	31/10/2025
		NB-100357497	3	CUMPLIMIENTO	$ 20.221.314,00	23/12/2024	31/10/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.110.657,00	23/12/2024	31/10/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.442.627,00	31/10/2025	31/10/2030
		NB-100091703		RCE	$ 284.700.000,00	12/11/2024	31/10/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

Durante el actual periodo no se ha presentado procesos sancionatorios.

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	3668-2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T	NIT:	901867048
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA SAS - TECNUMEC SAS NIT. 830.018.821-0 Participación 50%; TNM INGENIERIA S.A.S. NIT. 901.133.072-1 Participación 50%		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 6.		
FECHA DE INICIO:	27/11/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-089556
VALOR INICIAL:	$1.264.100.957,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$1.264.100.957,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2024		
PRÓRROGA No. 1:	4 meses		
PRÓRROGA No. 2:	3 meses		
PRÓRROGA No. 3:	3 meses		
PRÓRROGA No. 4:	1,5 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 15 de diciembre de 2025		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
944224	2024	10 (nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$1.264.100.957,00	$934.379.131,73	$329.721.825,27

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTU4RADO
Acta de Costos de Interventoría No. 01 Periodo del 27 al 30 de Noviembre de 2024	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
Acta de Costos de Interventoría No. 02 Periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2024	$6.028.030,00	$1.145.326,00	$0,00	$7.173.356,00
Acta de Costos de Interventoría No. 03 Periodo del 01 al 31 de Enero de 2025	$10.794.730,00	$2.050.999,00	$0,00	$12.845.729,00
Acta de Costos de Interventoría No. 04 Periodo del 01 al 28 de Febrero de 2025	$12.139.930,00	$2.306.587,00	$0,00	$14.446.517,00
Acta de Costos de Interventoría No. 05 Periodo del 01 al 31 de Marzo de 2025	$15.981.602,00	$3.036.504,00	$0,00	$19.018.106,00
Acta de Costos de Interventoría No. 06 Periodo del 01 al 30 de Abril de 2025	$28.869.880,00	$5.485.277,00	$0,00	$34.355.157,00
Acta de Costos de Interventoría No. 07 Periodo 01 al 31 de Mayo de 2025	$51.896.400,00	$9.860.316,00	$0,00	$61.756.716,00

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de Costos de Interventoría No. 08 Periodo del 01 al 30 de Junio de 2025	$74.523.182,02	$14.159.404,58	$0,00	$88.682.586,60
Acta de Costos de Interventoría No. 09 Periodo del 01 al 31 de Julio de 2025	$110.305.438,30	$20.958.033,28	$0,00	$131.263.471,58
Acta de Costos de Interventoría No. 10 Periodo del 01 al 31 de agosto de 2025	$124.120.459,40	$23.582.887,29	$0,00	$147.703.346,69
Acta de Costos de Interventoría No. 11 Periodo del 01 al 30 de septiembre de 2025	$150.128.861,82	$28.524.483,75	$0,00	$178.653.345,57
Acta de Costos de Interventoría No. 12 Periodo del 01 al 31 de octubre de 2025	$200.404.033,86	$38.076.766,43	$ 0,00	$238.480.800,29

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 12 De fecha de octubre de 2025, contrato reporta un avance de 88,25%, conforme a la prórroga No. 04.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 73,21%
Total inversión ejecutada: 73,92%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

A la fecha no se han realizado actas de suspensión del contrato de interventoría.

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE PRÓRROGA No.	FECHA DE FINALIZACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA No. 04
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/10/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: En trámite.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 04/11/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: En trámite.

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTÍA: Contrato de Seguro
NOMBRE: Seguros del Estado S.A.
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 126,410,095.70	65-44 101233358 ANEXO 01	17-09-2024	30-06-2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 252,820,191.40		17-09-2024	31-12-2027
Calidad del Servicio	$ 379,230,287.10		31-12-2024	31-12-2029
Buen Manejo del Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	$ 126,410,095.70	65-44 101233358 ANEXO 03	17-09-2024	30-10-2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 252,820,191.40		17-09-2024	30-04-2028
Calidad del Servicio	$ 379,230,287.10		31-12-2024	30-04-2030
Buen Manejo del Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	$ 126,410,095.70	65-44 101233358 ANEXO 04	17-09-2024	31-01-2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 252,820,191.40		17-09-2024	31-07-2028
Calidad del Servicio	$ 379,230,287.10		31-12-2024	31-07-2030
Buen Manejo del Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	$ 126,410,095.70	65-44 101233358 ANEXO 08	17-09-2024	30-04-2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 252,820,191.40		17-09-2024	31-10-2028
Calidad del Servicio	$ 379,230,287.10		31-12-2024	31-10-2030
Buen Manejo del Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	$ 126,410,095.70	65-44 101233358 ANEXO 11	17-09-2024	15-06-2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 252,820,191.40		17-09-2024	15-12-2028
Calidad del Servicio	$ 379,230,287.10		31-12-2024	15-12-2030
Buen Manejo del Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo no se han tramitado procesos sancionatorios.

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.10 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2025S-VQUI-074125	03/10/2025	SEÑOR(A): JOSE ANGEL PETICIONARIO	Resp E1029390 PQRSD Jose Angel
2025S-VQUI-074744	06/10/2025	ING. EMILIA DE LA OSSA CONTRERAS REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T	Solicitud de gestiones para el pago de pólizas de los contratos 2996-2024 y 2474-2024
2025S-VQUI-074809	06/10/2025	ING. EMILIA DE LA OSSA CONTRERAS REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T	Observaciones Ejecución de Obras a Cargo de la Interventoria C3668
2025S-VQUI-074739	06/10/2025	ING. EMILIA DE LA OSSA CONTRERAS REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T	C3668 Reiteración sobre la Presentación Actas de Costos e Informes Mensuales de Interventoria
2025S-VQUI-075151	07/10/2025	ING. EMILIA DE LA OSSA CONTRERAS REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-112443 Autorización Ingreso Reemplazo Inspector SST
2025I-VQUI-075353	07/10/2025	Dra. LAURA MARCELA MARTÍN LEYES LÓPEZ. SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS	Reiteración solicitud de aprobación de pólizas Convenios Solidarios Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total Vigencia 2024
2025S-VQUI-075577	08/10/2025	ING. EMILIA DE LA OSSA CONTRERAS REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-112394 Devolución del Acta de Costos y del Informe Mensual Interventoria Agosto de 2025
2025I-VQUI-078944	09/10/2025	ING. SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ SUBGERENCIA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ	Reiteración solicitud de información del cuatro por mil a las cuentas de los convenios 2024 - Dirección Territorial Quindío
2025S-VQUI-077122	14/10/2025	ING. EMILIA DE LA OSSA CONTRERAS REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T	Proceso de liquidación y cierre del componente social de los convenios solidarios e interadministrativos de la vigencia 2024 -
2025I-VQUI-080326	14/10/2025	ING. SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ SUBGERENCIA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ	Solicitud pronunciamiento comunicado por parte de la Alcaldía Municipal de Salento - Convenios Solidarios 2024 PCCPT - Dirección Territorial Quindío

2025S-VQUI-077124	14/10/2025	ING. EMILIA DE LA OSSA CONTRERAS REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T	Reiteración solicitud de registro fotográfico de la instalación de las vallas informativas - Convenios 2024
2025S-VQUI-076664	10/10/2025	ING. EMILIA DE LA OSSA CONTRERAS REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T	Cierre Operaciones Contables y Financieras 2025
2025S-VQUI-077983	16/10/2025	ING. EMILIA DE LA OSSA CONTRERAS REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T	OBSERVACIONES DE EJECUCION DE OBRAS A CARGO DE LA INTERVENTORIA CTO 3668 CONVENIOS SOLIDARIOS QUINDIO 2024 V
2025I-VQUI-081981	17/10/2025	ARQ. MARTHA HELENA ROMERO MORENO SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD	Sol Resp 1er Radicación PGAs Convenios 2024
2025I-VQUI-081631	17/10/2025	ING. SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ SUBGERENCIA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ	Contrato de Interventoria 3668-2024 - Remisión Acta Costos e Informe Mensual interventoría 10 Agosto
2025S-VQUI-079606	22/10/2025	ING. EMILIA DE LA OSSA CONTRERAS REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T	Posible Incumplimiento Conv2638
2025S-VQUI-079608	22/10/2025	ING. EMILIA DE LA OSSA CONTRERAS REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T	Posible Incumplimiento Conv2470
2025S-VQUI-079676	22/10/2025	ING. EMILIA DE LA OSSA CONTRERAS REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T	DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS CONVENIOS A CARGO
2025I-VQUI-083643	22/10/2025	ARQ. MARTHA HELENA ROMERO MORENO SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD	Alcance a memorando No. 2025I-VQUI-057119 Solicitud de información profesionales designados como apoyo a la supervisión del C3668
2025S-VQUI-079606	22/10/2025	YAQUELINE GUZMAN CONDE PRESIDENTA JAC PATIO BONITO	Posible Incumplimiento Conv2638 OAC
2025S-VQUI-079608	22/10/2025	FREDY ALEXANDER ARBELAEZ GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL JAC LA VENADA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA VENADA	Posible Incumplimiento Conv2470 OAC
2025I-VQUI-085379	28/10/2025	ING. SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ SUBGERENCIA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ	Contrato de Interventoria 3668-2024 - Remisión Acta Costos e Informe Mensual Interventoria 11 Septiembre
2025S-VQUI-081955	29/10/2025	ELSI OCAMPO ORTIZ PRESIDENTA JUNTA DE ACCION COMUNAL VDA RIO VERDE BAJO PARAGUAICITO	Resp E119591 PQRSD Convenio 3419

Correo electrónico	29/10/2025	Ing. Juan Sebastian Neira Cubides apoyo a la supervisión Gerencia Caminos Comunitarios de la Paz Total - SVR	Contrato de interventoría 3668-2024 - Envio Informe Mensual del Supervisor Septiembre de 2025
2025S-VQUI-082423	30/10/2025	ING. EMILIA DE LA OSSA CONTRERAS REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T	C3668 Solicitud Actualización Pólizas y Otros Documentos por Prorroga 04
2025S-VQUI-082399	30/10/2025	ING. EMILIA DE LA OSSA CONTRERAS REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T	C3668 Solicitud de Verificación de la Actualización de Pólizas por las Prórrogas a Convenios PCCPT
2025S-VQUI-083229	04/11/2025	ING. EMILIA DE LA OSSA CONTRERAS REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T	Reiteración Radicación oportuna actas de costos e Informes Mensuales
2025I-VQUI-087239	31/10/2025	ING. SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ SUBGERENCIA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ	Solicitud presencial de la profesional contable - CCPT - Dirección Territorial Quindío

2.11 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se ha presentado novedades.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se ha presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se ha presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se ha presentado novedades.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

RESOLUCION / AUTORIZACIÓN N° SIN RESOLUCION
FECHA DE INICIO 01/10/2025 FECHA DE TERMINACIÓN 01/10/2025
LUGAR DE LA COMISIÓN ARMENIA

OBJETO DE LA COMISIÓN INGRESO NUEVO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Actividades realizadas *(relacionadas por cada día, especialmente las desarrolladas durante fines de semana y festivos)*

-. Antecedentes técnicos.
-. Presencia de personal profesional de la interventoría en obra.
-. Logística de transporte.
-. Información componente financiero.
-. Presentación actas de costos e informes mensuales de interventoría.
-. Posibles prórrogas a los convenios y al contrato de interventoría."

DESARROLLO
Se sostiene reunión con el nuevo Director de Interventoría Ing. Victor Guayambuco, donde desde la Supervisión del Contrato de Interventoría en conjunto con los profesionales de apoyo a la supervisión del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total de la Dirección Territorial Quindío del Invias se le exponen los siguientes temas:

-. Se le manifiestan antecedentes relacionados con el desarrollo del contrato de interventoría relacionados con dificultades presentadas durante la ejecución del contrato en los componentes técnicos y financieros principalmente, así como en los aspectos jurídicos, sociales y ambientales.
-. Desde la Supervisión del Contrato de Interventoría se recalca al Director de Interventoría entrante la necesidad imperiosa de que los profesionales (Director, Residentes y Auxiliares) hagan presencia permanentemente en obra, toda vez que esto permitiría superar las dificultades de índole técnico que se han evidenciado en los diferentes frentes de obra.
-. Para lo anterior tambien se requiere que la interventoría fortalezca la logística de transporte implementada, para que los profesionales (Director, residentes y auxiliares) puedan desplazarse a los diferentes sitios de localización de las obras.
-. Es necesario que la interventoría tome todas las acciones necesarias para contar con el auxiliar de ingeniería que falta por vincular, así como tambien vincular a la persona que ocupara el cargo vacante de inspector SST.
-. En el aspecto financiero se reitera a la interventoría que se requiere el cumplimiento estricto en los plazos de entrega de la información financiera, incluyendo soportes y anexos. El director de interventoría solicita una reunión en este importante aspecto, por lo que desde la Dirección

Territorial se logra coordinar reunión virtual con la profesional financiera Nelfi Yazmin Torres Ruales de la Gerencia Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total para el día de hoy a las 3:40 pm

-. Se solicita al nuevo director de interventoría que se imprima la celeridad, buscando los mecanismos que garanticen brindar rápida gestión a todos los requerimientos que se eleven desde la Territorial desde los Organismos de Acción Comunal, que ha sido una falencia que se ha detectado desde hace un tiempo atrás en la interventoría a cargo del consorcio Desarrollo Vial 2T. Tambien se indica al director de interventoría que es necesario realizar el adecuado seguimiento a los Balances Generales de las obras, también realizar el riguroso control y seguimiento a los plazos y cronogramas de ejecución.

-. Con relación a las actas de costos e informes mensuales de interventoría, se requiere que la interventoría presente de forma inmediata lo correspondiente al acta de costos e informe mensual del periodo de agosto de 2025, Igualmente se recuerda que para el acta de costos e informe mensual del periodo de septiembre de 2025 debe ser presentado a más tardar el día 05 de octubre de 2025.

-. Se presenta en la mesa de trabajo la posibilidad y la necesidad de solicitar prorrogas a varios convenios solidarios y/o interadministrativos y prorroga al contrato de interventoría para que pueda seguir su labor de seguimiento, supervisión y control de los convenios a su cargo. Para lo anterior desde la interventoría se debe analizar las justificaciones de estos actos contractuales en sus componentes técnicos, jurídicos y financieros, de forma tal que puedan presentarse ante la unidad ejecutora en el nivel central del Invias las diferentes solicitudes de prorrogas a más tardar el día 08 de octubre de 2025 debidamente completos y suscritos por todas las partes, con entre otros la siguiente información:

Solicitud de Prorrogas Convenios: Oficio del OAC y/o comunidad étnica dirigida a la interventoría solicitando prorroga, oficio de la interventoría con el aval de la solicitud de la prórroga, formato MEPI de solicitud de prórroga, formato MEPI reprogramación de la programación de inversiones, certificados de antecedentes, redam, etc.

Solicitud de Prorroga del contrato de interventoría: Oficio de la interventoría solicitando prorroga, formato MEPI de solicitud de prórroga, proyecto MEPI reprogramación del Plan de Cargas, certificados de antecedentes, redam, etc.

-. Se programa próxima reunión de seguimiento del contrato de interventoría para el miércoles 8 de octubre de 2025.

RESOLUCION / AUTORIZACIÓN N° SIN RESOLUCION
FECHA DE INICIO 08/10/2025 FECHA DE TERMINACIÓN 08/10/2025
LUGAR DE LA COMISIÓN ARMENIA

OBJETO DE LA COMISIÓN Reunión de seguimiento No. 22 al contrato de Interventoría No. 3668 de 2024 en sus funciones de verificación, supervisión y control a la ejecución de los convenios de la vigencia 2024 del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total en la Dirección Territorial Quindío – INVÍAS.

Actividades realizadas *(relacionadas por cada día, especialmente las desarrolladas durante fines de semana y festivos)*

TEMA 1: Saludo inicial

Se da bienvenida al equipo de Interventoría al comité de seguimiento No. 22, donde se realiza la presentación de cada uno de los asistentes por parte de la Dirección Territorial Quindío y la Interventoría No. 3668 de 2024. En primer lugar, el director de la Interventoría No. 3668 de 2024 explica que una vez realizado un barrido al estado de la ejecución de los convenios 2024 y la interventoría, logró observar la necesidad de reestructurar el proyecto desde el punto de vista de manejo interno de la interventoría. Asimismo, se determinó la importancia de tener un balance desde el inicio del proyecto a la ejecución actual, en ese sentido, se realizó una reunión con el componente técnico y ambiental por parte de la Interventoría y con los representantes legales de los Organismos de Acción Comunal con el propósito de realizar dicho balance.

En coherencia a lo anterior, también se presentaron posibles incumplimientos por parte de los profesionales técnico y contable por parte de las OAC, ya que, a la fecha, hay profesionales que no responden. Asimismo, la Interventoría reconoce que en ocasiones también se presentan falencia por parte de su personal en campo, para lo cual, expresa que tomará las medidas necesarias para subsanar dicha situación.

La Interventoría a su vez, manifiesta que se está evaluando la posibilidad de solicitar la prórroga hasta el 15 de diciembre de 2025 con el ánimo de poder culminar y liquidar el proyecto. Por otro lado, se expresa que la Interventoría carece de recursos para cubrir las observaciones y correcciones técnicas, por lo cual, la Interventoría expresa que, al momento de recibir las obras, anexarán dichas observaciones a las actas.

Finalmente, la Interventoría expresa que realizó una matriz macro, donde se relacionan todas las características y particularidades de cada proyecto; al igual que, manifiesta que se han tomado actuaciones para mejorar las situaciones que han sucedido en campo, tanto en lo técnico como en lo financiero.

Por parte de la Dirección Territorial Quindío, se resalta la labor y las actuaciones que ha tomado la Interventoría en todo lo mencionado con anterioridad. A su vez, se resalta que precisamente eso que la interventoría menciona, ya se había planteado con anterioridad y que, a la fecha, no se trata de partir desde cero, sino de examinar los recursos que se tienen a la fecha para lograr culminar la ejecución de los proyectos a satisfacción.

Por otro lado, se le recuerda a la Interventoría que los contratistas pertenecientes a las Juntas de Acción Comunal no son unos contratistas convencionales, por lo cual, es importante propiciarle un manejo diferente. Por otro lado, se reitera a la Interventoría la necesidad de ser más cautelosos al momento de emitir un pago y se le sugiere posibles soluciones para los profesionales que no aparecen en las obras con las JAC.

TEMA 2: Prórrogas de los convenios.

Con el ánimo de mencionar las prórrogas de los convenios, la Interventoría expondrá la presentación del avance técnico y paralelamente se mencionará la posibilidad de prórroga

COMPONENTE TECNICO

CONTRATISTA	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	ATRASO EJECUCIÓN
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL RIO VERDE BAJO Y PARAGUAICITO	48,3%	15,5%	-32,77%
ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE CALARCÁ	46,4%	8,2%	-38,20%
CABILDO MAYOR INDÍGENA DEL RESGUARDO DACHI AGORE DRUA	43,0%	17,4%	-25,61%
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENAVISTA	87,4%	95,5%	8,12%
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BARCELONA ALTA	93,3%	92,2%	-1,07%
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PIAMONTE	80,6%	80,6%	-0,01%
JUNTA DE ACCON COMUNAL DE LA VEREDA PAVAS	54,2%	30,7%	-23,48%
JUNTA DE ACCIO COMUNAL DE LA VEREDA LA TOPACIA ALTA	83,3%	78,3%	-5,08%
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TOPACIA RIO LEJOS	84,9%	97,4%	12,50%
JUNTA ACCIÓN COMUNAL VENADA BAJA	88,2%	89,4%	1,20%

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

Para todos los convenios, la supervisión por parte de la DT Quindío le expresa a la Interventoría los documentos y trámites para realizar el proceso de prórroga para los convenios 2024 y la Interventoría, se hace énfasis en la justificación y responsabilidades que asumen los interesados ante el retraso de la obra y la necesidad de realizar dicha prórroga. Ahora bien, con relación a las fechas se prórrogas, se procede a exponer lo siguiente:

1. JAC Río Verde Bajo y Paraguaicito: 30 de noviembre de 2025. Esta fecha debe contemplar la liquidación y cierre del convenio solidario.
2. JAC Buenavista y JAC Barcelona Alta, ambos pertenecientes a Circasia: 31 de octubre de 2025. Se resaltan las obras que están pendientes por ejecutar.
3. JAC Piamonte: 31 de octubre de 2025. Se aclara que se tienen 15 días posteriores al finalizar la obra para realizar la liquidación.
4. JAC Dorado Alto Las Camelias: No se ha tenido avances en la obra a causa de los profesionales y representante legal de los convenios, por lo cual, la Interventoría ha realizado múltiples labores para poder subsanar esta situación. Por lo tanto, desde la DT Quindío se propone realizar una reunión presencial con el equipo de trabajo para el día 9 de octubre del año en curso a las 10:00Am. La prórroga se extenderá para el 15 de diciembre de 2025.
5. JAC El Agrado: Se menciona que hay pendiente por llegar una carta en aras de poder definir el estado actual con relación a la ley segunda, para ello, el ingeniero ambiental de la Interventoría expresa que es posible que la respuesta sea positiva, toda vez que el proyecto no incluye mejoramiento.
6. JAC San de Juan Carolina: 15 de diciembre de 2025. Se menciona la situación que acontece con la representante legal debido a cambio de residencia temporal a la ciudad de Bogotá D.C.

CONTRATISTA	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	ATRASO EJECUCIÓN
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL DORADO ALTO LAS CAMELIAS	0,0%	0,0%	0,00%
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA COQUETA	26,6%	1,8%	-24,75%
JUNTA ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ARGENTINA	44,2%	40,3%	-3,90%
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MARAVELEZ	81,5%	71,7%	-9,78%
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNAL DE LA VEREDA LA POPA	73,1%	51,8%	-21,29%
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PADILLA DE LA TEBAIDA, QUINDÍO	53,8%	79,5%	25,68%
JVC BARRIO VILLA ÉXITO	93,2%	85,2%	-7,96%
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MONTAÑA	78,6%	53,2%	-25,40%
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CANTORES	81,9%	83,4%	1,51%
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MARIELA	73,0%	38,1%	-34,92%
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO	83,4%	95,2%	11,74%

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

En paralelo a la Interventoría, se acordaron estas fecha relacionadas con las prórrogas:

CONVENIO	CONTRATISTA	ESTADO	EJECUTADO (%	COMENTARIO
3628-2024	ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE CALARCÁ	EN EJECUCIÓN	8,2%	Se prorroga, hasta el 15 de diciembre
2474-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL DORADO ALTO LAS CAMELIAS	EN EJECUCIÓN	0,0%	Se prorroga, hasta el 15 de diciembre
2479-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA COQUETA	EN EJECUCIÓN	1,8%	Se prorroga, hasta el 15 de diciembre
2385-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MARIELA	EN EJECUCIÓN	38,1%	Se prorroga, hasta el 15 de diciembre
2695-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ARENALES	EN EJECUCIÓN	15,1%	Se prorroga, hasta el 15 de diciembre
2728-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CHAGUALA	EN EJECUCIÓN	19,7%	Se prorroga, hasta el 15 de diciembre
3777-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JUAN DE CAROLINA	EN EJECUCIÓN	32,9%	Se prorroga, hasta el 15 de diciembre

CONTRATISTA	ESTADO	EJECUTADO (%	COMENTARIO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL RIO VERDE BAJO Y PARAGUAICITO	EN EJECUCIÓN	15,5%	Se prorroga, hasta el 30 de noviembre
CABILDO MAYOR INDÍGENA DEL RESGUARDO DACHI AGORE DRUA	EN EJECUCIÓN	17,4%	Se prorroga, hasta el 30 de noviembre
JUNTA DE ACCON COMUNAL DE LA VEREDA PAVAS	EN EJECUCIÓN	30,7%	Se prorroga, hasta el 30 de noviembre
JUNTA ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ARGENTINA	EN EJECUCIÓN	40,3%	Se prorroga, hasta el 30 de noviembre
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNAL DE LA VEREDA LA POPA	EN EJECUCIÓN	51,8%	Se prorroga, hasta el 30 de noviembre
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MONTAÑA	EN EJECUCIÓN	53,2%	Se prorroga, hasta el 30 de noviembre
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS JUANES DEL DE PIJAO	EN EJECUCIÓN	40,6%	Se prorroga, hasta el 30 de noviembre
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS BALSOS	EN EJECUCIÓN	44,4%	Se prorroga, hasta el 30 de noviembre
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PINOS	EN EJECUCIÓN	49,0%	Se prorroga, hasta el 30 de noviembre
VEREDA CANAAN - SALENTO QUINDÍO	EN EJECUCIÓN	45,4%	Se prorroga, hasta el 30 de noviembre

CONTRATISTA	ESTADO	EJECUTADO (%	COMENTARIO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENAVISTA	EN EJECUCIÓN	95,5%	Termina el 31 de octubre (24 de oct terminación obra 100%)
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BARCELONA ALTA	EN EJECUCIÓN	92,2%	Termina el 31 de octubre (24 de oct terminación obra 100%)
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PIAMONTE	EN EJECUCIÓN	80,6%	Termina el 31 de octubre
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA TOPACIA ALTA	EN EJECUCIÓN	78,3%	Termina el 31 de octubre
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TOPACIA RIO LEJOS	EN EJECUCIÓN	94,7%	Termina el 31 de octubre
JUNTA ACCIÓN COMUNAL VENADA BAJA	EN EJECUCIÓN	89,4%	Termina el 31 de octubre
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MARAVELEZ	EN EJECUCIÓN	71,7%	Termina el 31 de octubre
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PADILLA DE LA TEBAIDA, QUINDÍO	EN EJECUCIÓN	79,5%	Termina el 31 de octubre
JVC BARRIO VILLA ÉXITO	EN EJECUCIÓN	85,2%	Termina el 31 de octubre
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CANTORES	EN EJECUCIÓN	82,2%	Termina el 31 de octubre
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO	EN EJECUCIÓN	95,2%	Termina el 31 de octubre

TEMA 3: Aclaraciones y extras.
La DT Quindío le expresa a la Interventoría diferentes situaciones relacionadas con la calidad y procesos constructivos que se presentan en las obras. Asimismo, se le reitera el cumplimiento de las recomendaciones y requerimientos de la Unidad Ejecutora y conforme a lo establecido en el Manual de Interventoría vigente del Instituto, esta Dirección Territorial del Invias realizó la revisión aritmética y documental al Acta Mensual de Costos No. 10 y se hace devolución de esta. Continuamente, se menciona las observaciones relacionadas con las planillas de seguridad social y el MEPI que está adjunto a esto.

RESOLUCION / AUTORIZACIÓN N° SIN RESOLUCION
FECHA DE INICIO 14/10/2025 FECHA DE TERMINACIÓN 14/10/2025
LUGAR DE LA COMISIÓN ARMENIA

OBJETO DE LA COMISIÓN Reunión de seguimiento No. 23 al contrato de Interventoría No. 3668 de 2024 en sus funciones de verificación, supervisión y control a la ejecución de los convenios de la vigencia 2024 del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total en la Dirección Territorial Quindío – INVÍAS.

Actividades realizadas *(relacionadas por cada día, especialmente las desarrolladas durante fines de semana y festivos)*

TEMA 1: Saludo inicial y componente jurídico
Se da bienvenida al equipo de Interventoría al comité de seguimiento No. 23, donde se realiza la presentación de cada uno de los asistentes por parte de la Dirección Territorial Quindío y la

Interventoría No. 3668 de 2024. En primer lugar, se aborda el proceso de las prórrogas de acuerdo con el compromiso adquirido en el comité No. 22, por lo cual, la Interventoría a la fecha aún se encuentran trabajando en ello y lo esperan presentar hoy 14 de octubre del presente año.

TEMA 2: Componente ambiental

Con relación a la Junta de Acción Comunal de la vereda El Agrado, se expresa que el ingeniero Fabián Velásquez Henao que hoy 14 de octubre de 2025 tendrá una socialización con la gerencia del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total y la Subdirección de Sostenibilidad, lo anterior en aras de poder analizar y tomar decisiones sobre la respuesta por parte de la Corporación Autónoma Regional del Quindío – CRQ con relación al DRMI. Asimismo, el ingeniero Fabián Velásquez Henao expresa que le solicitaron realizar una justificación y socialización similar a lo que se realizó con la ley segunda de otros convenios.

Por otro lado, la Interventoría manifiesta que están a la espera de poder subsanar la situación con la JAC El Agrado para poder iniciar. En ese sentido, la Dirección Territorial Quindío expresa que la sugerencia ante esta situación es debe tomar una decisión entorno al proceder de este convenio.

Teniendo en cuenta que, a la fecha la Interventoría No. 3668 de 2024 ya realizó veintiocho (28) radicaciones iniciales ante la Subdirección de Sostenibilidad del componente ambiental y no se ha obtenido respuesta, por lo cual, la DT Quindío le sugiere a la Interventoría realizar lo siguiente:

1. Enviar oficios semanales a la Subdirección de Sostenibilidad, reiterando solicitud de respuesta a los radicados pendientes.
2. Enviar a más tardar el 15 de octubre de 2025 a la DT Quindío un oficio donde se manifieste:
   2.2. Número de convenio, nombre de OAC, radicado y fecha emitida por el Instituto ante la primera radicación.
   2.3. Trazabilidad de las comunicaciones que se le han enviado a la SS.

TEMA 3: Componente social

Por parte de la Dirección Territorial Quindío, desde el componente social y teniendo en cuentas las socializaciones de cierre, se expresa:

1. Se resalta la labor por parte de la Interventoría con relación a la gestión de los sitios de socialización, convocatoria de personas, manejo de público, etc.
2. Se le recuerda a la Interventoría que dos de los componentes más importantes en el programa es el técnico y contable, por lo cual, es necesario que dentro de las diapositivas se contemple información relacionada con estos dos componentes. Por lo tanto, se le solicita a la Interventoría enviar las diapositivas a la DT Quindío antes de ser expuestas a la comunidad, lo anterior, en aras de poder ser revisada y verificada por parte del Instituto Nacional de Vías – INVÍAS.
3. Se manifiesta a la Interventoría la necesidad de empezar a hacer la radicación de cierre o balance social ante la Subdirección de Sostenibilidad, lo anterior, en aras de poder liquidar los convenios en el componente social. En ese sentido, se solicita la Interventoría adelantar

estos trámites con los convenios que ya tienen socialización de cierre, asimismo, se le recuerda al equipo social tener en cuenta los certificados y formatos que se deben enviar.

4. Se brindan recomendaciones y sugerencias entorno a las socializaciones de cierre que se van a realizar en el futuro.


Se verifica la presentación que se realizará en la socialización de cierre en la Junta de Acción Comunal de la vereda Padilla, por lo cual, se sugiere ceñirse a este orden en las futuras socializaciones.

TEMA 4: Componente técnico

Con relación a la Junta de Vivienda Comunitaria Villa Éxito y la Junta de Acción Comunal La Venada, la Interventoría se compromete a realizar un análisis con relaciona la necesidad de realizar intervenciones complementarias a las obras. Este compromiso se debe cumplir el 15 de octubre de 2025.


Ahora bien, se procede a exponer la presentación semanal del estado de los convenios:

1. JAC La Venada Baja:

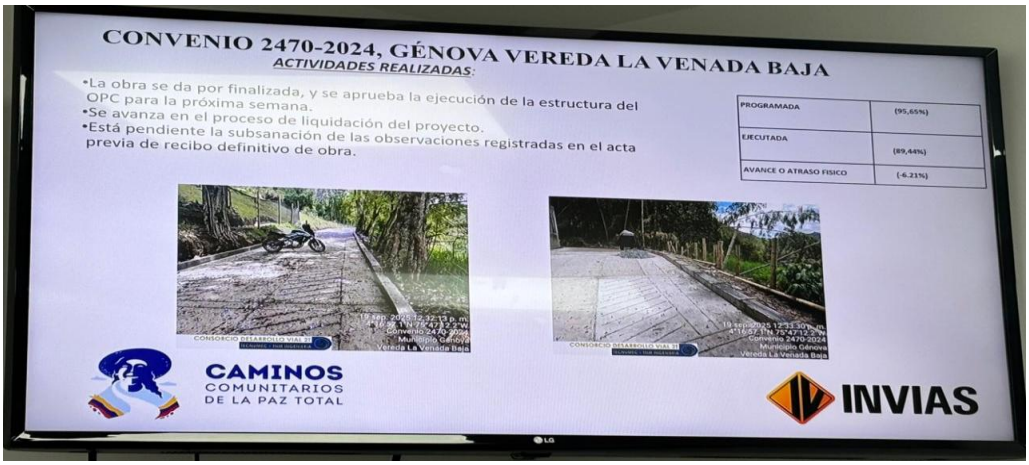

- Se sugiere a la Interventoría anexarles a las diapositivas las fechas de cronogramas enviados a la DT Quindío, tales como: final de la obra, socialización de cierre, radicación balances ambientales y sociales, etc.

2. JAC Buenavista:

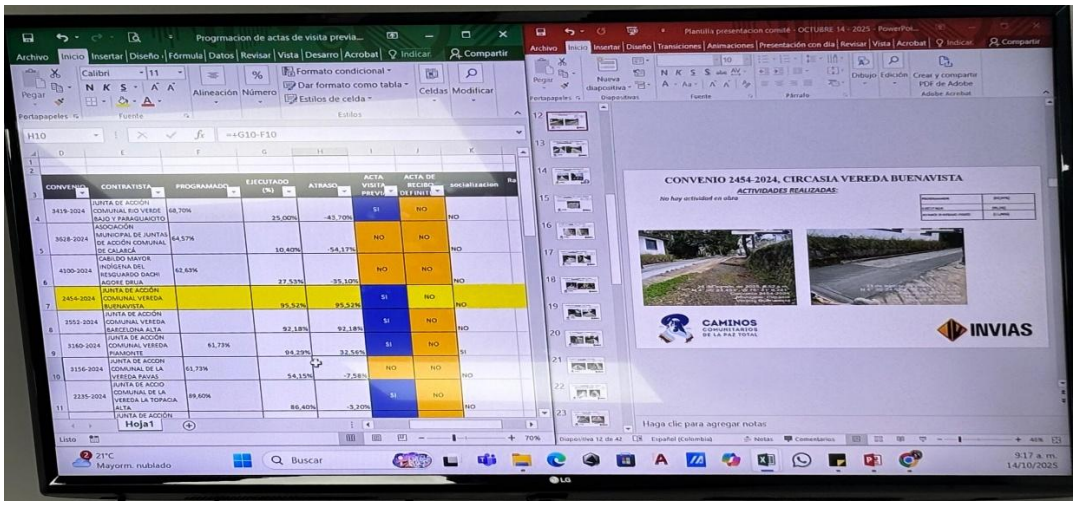

3. JAC Barcelona Alta:




4. JAC Villa Éxito:



- Se le recuerda a la Interventoría realizar el acta de entrega y recibido definitivo de obra.


5. JAC La Topacia y Río Lejos:

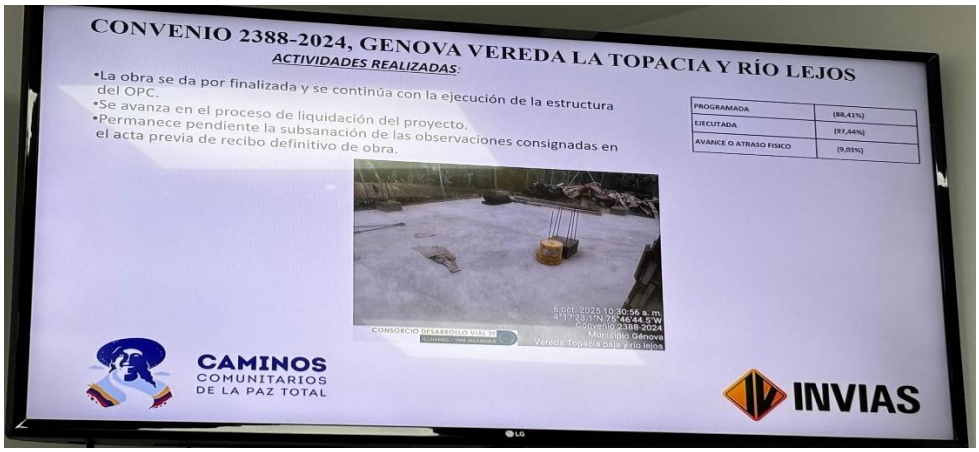

6. JAC La Topacia Alta:




7. JAC Patio Bonito:

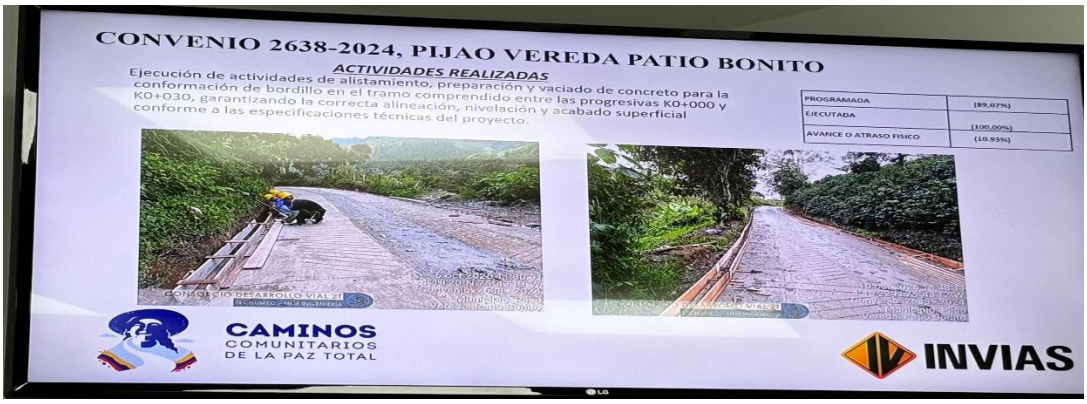

8. JAC Cantores:



9. JAC Padilla:

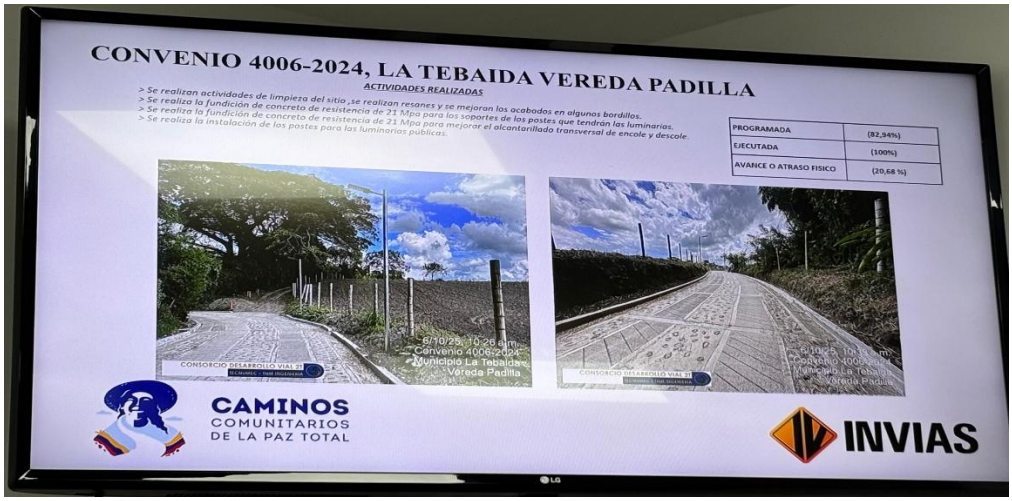

10. JAC Maravelez:




11. JAC La Popa:




12. JAC La montaña:



13. JAC Los Balsos:

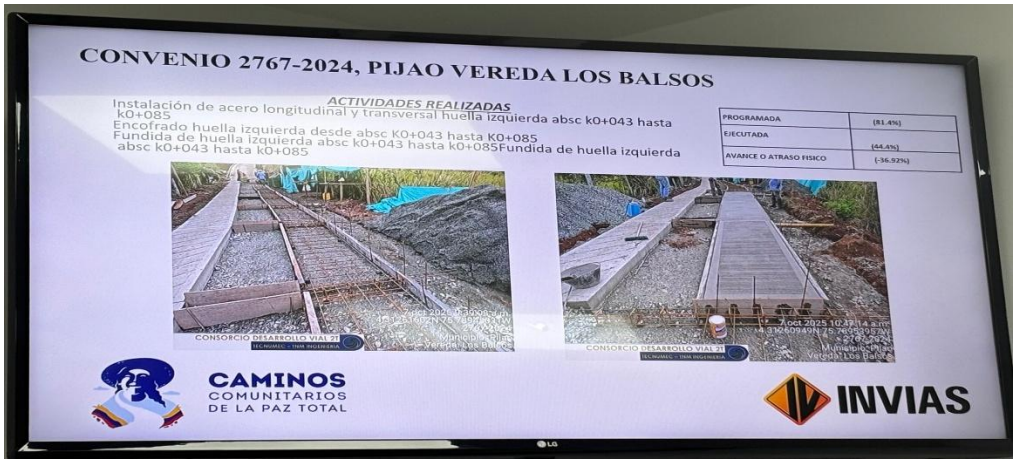


14. JAC Los Juanes:

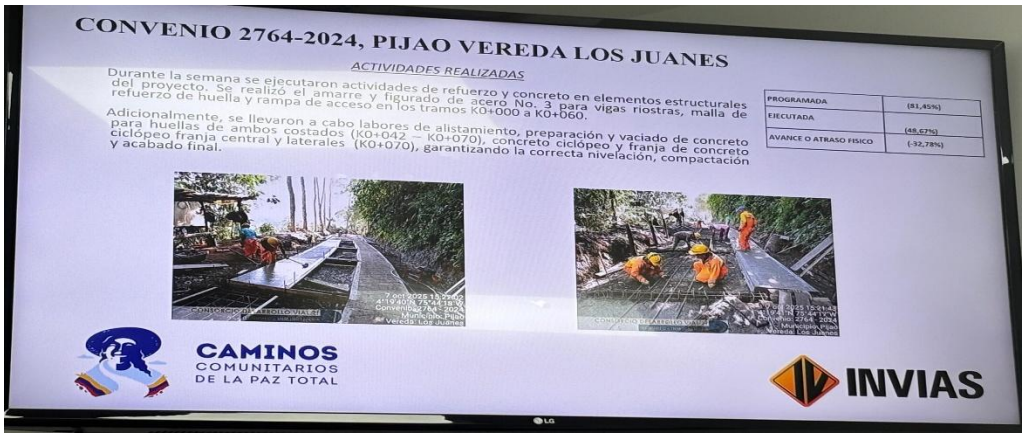


15. JAC Mariela:




16. JAC Río Verde Bajo y Paraguacito:

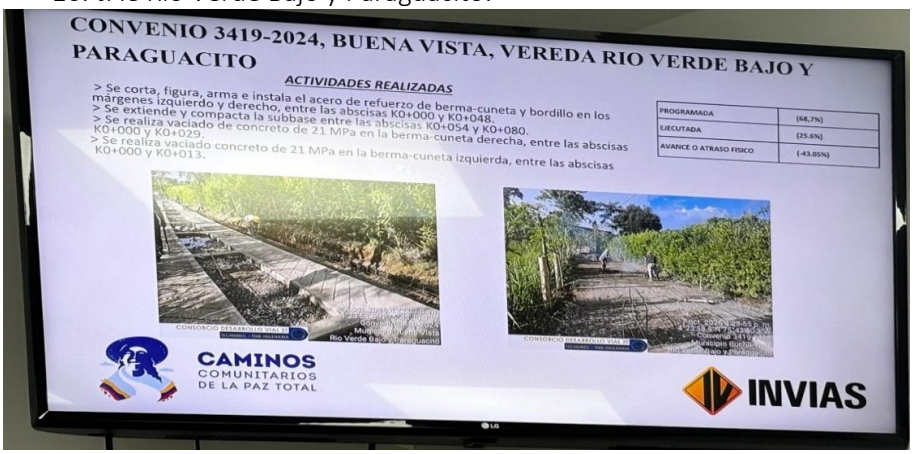


17. JAC Canaán:

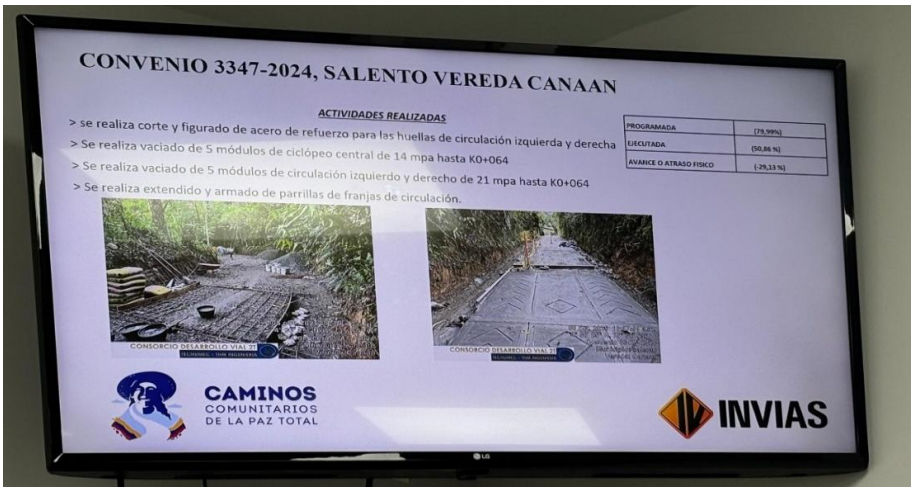

18. JAC Los Pinos:

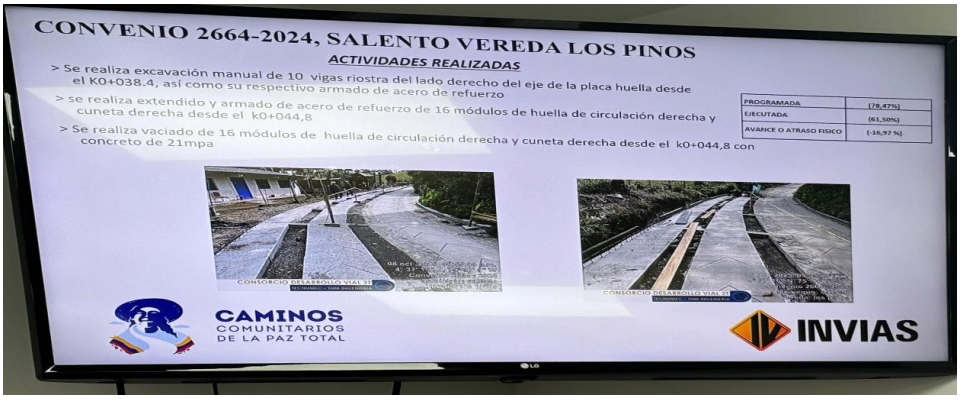

19. JAC Chagualá:

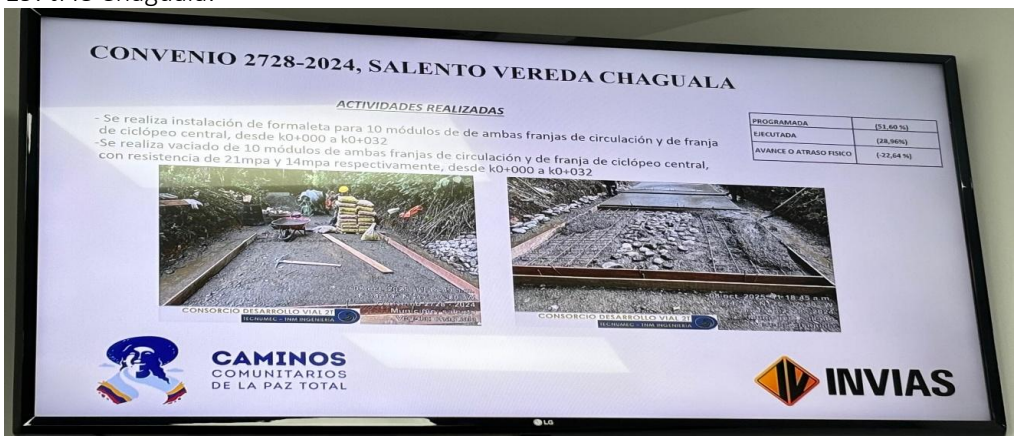


20. JAC Piamonte:



21. JAC San Juan de Carolina:



22. JAC La Argentina:

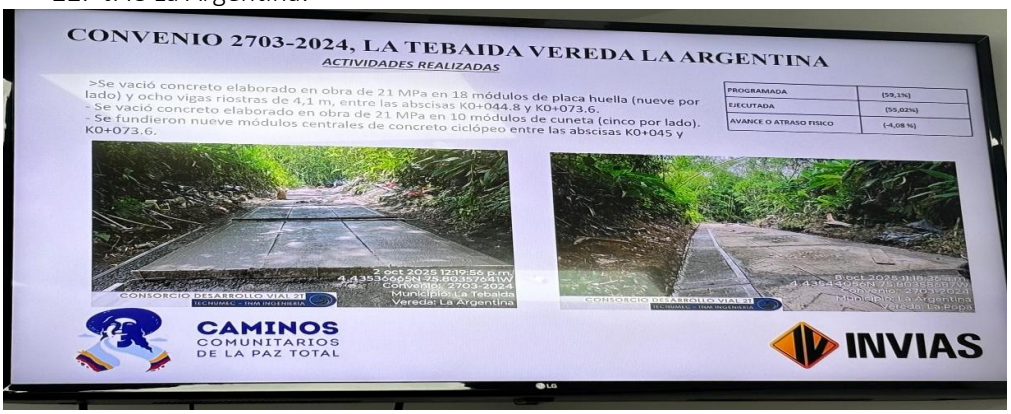


23. Resguardo Indígena Dachi Agore Drua:



La Interventoría No. 3668 de 2024, sugiere a la DT Quindío extender la prórroga hasta el día 15 de diciembre de 2025.

24. JAC Arenales:

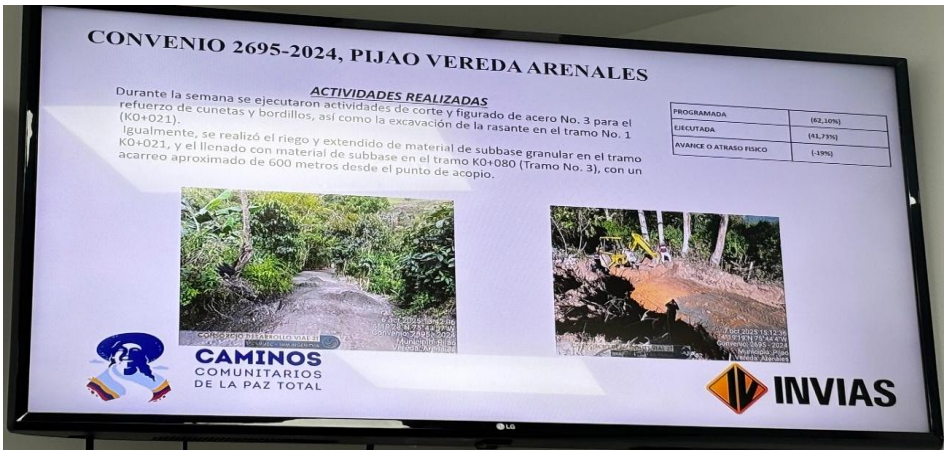


- Se solicita a la interventoría revisar la información expresada en la diapositiva y compartir la situación esclarecida a la DT Quindío.

25. JAC Asociación de Juntas de Acción Comunal de Calarcá:



26. JAC La Coqueta:

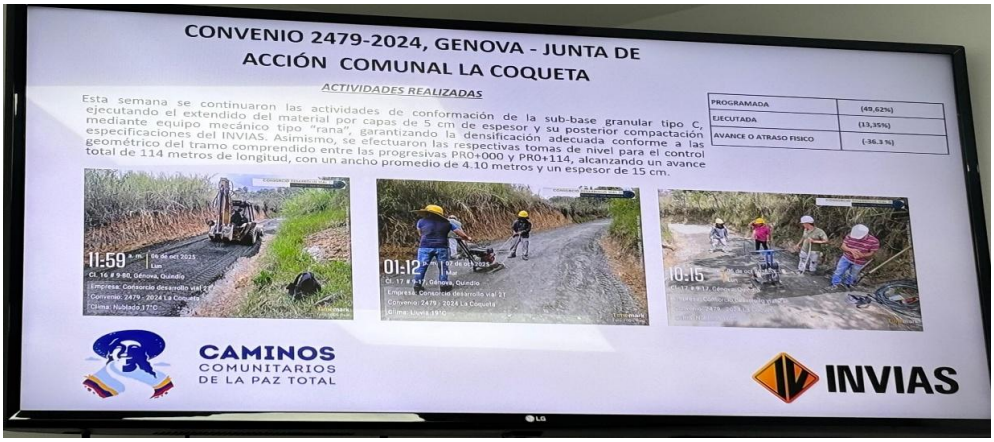

La Interventoría No. 3668 de 2024 expresa el compromiso por parte de su equipo de trabajo para lograr culminar a satisfacción los procesos de liquidación de los convenios que ya están pronto por terminar. Por otro lado, se expresa mejoría por parte del componente financiero, no obstante, se menciona que la profesional contable presenta mucho flujo de trabajo con el tema de los balances.

Para finalizar y con relación a los compromisos adquiridos en el comité No. 22, se tiene:

4. COMPROMISO* (Descripción puntual el compromiso)	4.1 RESPONSABLE		4.2 FECHA DE CUMPLIMIENTO
	NOMBRE SERVIDOR / CONTRATISTA	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	
Entrega documentos prórrogas de los convenios e Interventoría	Victor Julio Guayambuco Quintero	Interventoría No. 3668 de 2024	10/10/2025
Realizar subsanaciones del informe correspondiente al periodo de agosto	Victor Julio Guayambuco Quintero	Interventoría No. 3668 de 2024	09/10/2025
Presentar informe y acta del periodo de septiembre	Victor Julio Guayambuco Quintero	Interventoría No. 3668 de 2024	14/10/2025
Programación de visitas previas a la entrega definitiva	Victor Julio Guayambuco Quintero	Interventoría No. 3668 de 2024	08/10/2025
Programación de visitas para entrega y recibido definitivo	Victor Julio Guayambuco Quintero	Interventoría No. 3668 de 2024	08/10/2025

- Se mencionó sobre la entrega de documentos de prórrogas que la Interventoría está adelantando los trámites referentes a ello.
- La Interventoría solicita más tiempo para realizar las subsanaciones para el mes de agosto, por lo cual, se comprometen a entregarlo hoy.
- Con relación al informa y acta de septiembre, la Interventoría menciona que para este mes se nivelarán con la entrega de esta información.
- Ya se entregó la programación de visitas.

RESOLUCION / AUTORIZACIÓN N° RESOLUCION No. 188 DEL 16/10/2025
FECHA DE INICIO 18/10/2025 FECHA DE TERMINACIÓN 18/10/2025
LUGAR DE LA COMISIÓN ARMENIA - CIRCASIA (VEREDAS BARCELONA ALTA – BUENAVISTA - PIAMONTE) - LA TEBAIDA (VEREDA PADILLA) – FILANDIA (VEREDA PAVAS)

OBJETO DE LA COMISIÓN REALIZAR VISITA TÉCNICA DE INSPECCIÓN Y COORDINACIÓN CON LOS PRESIDENTES Y MIEMBROS DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS VEREDAS BARCELONA ALTA (CIRCASIA, Q.), BUENAVISTA (CIRCASIA, Q.), PIAMONTE (CIRCASIA, Q.), PADILLA (LA TEBAIDA, Q.) Y PAVAS (FILANDIA, Q.), EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, PARA VERIFICAR AVANCES Y COORDINAR ASPECTOS RELACIONADOS CON LA ENTREGA Y CIERRE DE LAS OBRAS EJECUTADAS, EN UN RECORRIDO APROXIMADO DE 75.7 KM..
TEMAS TRATADOS Recorrido por las vías que se encuentran dentro de los alcances de los convenios interadministrativos 2552-2024, 2454-2024, 3160-2024, 4006-2024, 3922-2024, 2996-2024 y 3777-2024

Actividades realizadas *(relacionadas por cada día, especialmente las desarrolladas durante fines de semana y festivos)*

De acuerdo con lo ordenado en la comisión concedida mediante la Resolución No. 188 del 16/08/2025, el sábado 18 de octubre de 2025, se efectuaron las siguientes actividades: Se realiza desplazamiento con el propósito de revisar ejecución de actividades de los convenios interadministrativos No. 2552 de 2024, No. 2454 de 2024, No. 3160 de 2024, No. 4006 de 2024, No. 3922 de 2024, No. 2996 de 2024 y No. 3777 de 2024 supervisados por la interventoría Consorcio Desarrollo Vial 2T.

En cada una de las visitas se registraron los temas tratados, de la siguiente manera:

Convenio No. 4006 de 2024 OAC Vereda Padilla







Se observa y verifica las Obras de Participación Comunitaria - OPC realizadas por la comunidad de vereda Padilla consistentes en la colocación de luminarias con paneles solares.







Se le requiere a la Interventoria solicitar el retiro del material sobrante tipo granular, así como tambie se solicita retirar cualquier tipo de sobrante o escombro de obra, residuos sólidos y/o basur producto de las obras ejecutadas.

Convenio No. 3922 de 2024 OAC Vereda La Popa



Se recomienda que cuando se observe clima con lluvias, proteger los concretos recién fundidos pa evitar la perdida de material fino en superficie.

Convenio No. 2996 de 2024 OAC Vereda La Montaña



Se recomienda realizar la dilatación en el bordillo concordante con la junta de dilatación de la vi riostra.











La placa de aproximación es completamente reforzada y concreto de 3000 PSI

Convenio No. 2454 de 2024 OAC Vereda Buenavista





Se solicita a la interventoría verificar la continuidad al bordillo para que no se presente socavacion por detrás del bordillo construido.





Terminación viga de empalme con vía principal Montenegro - La Tebaida.





Terminados de las placas-huellas, entrada a la zona de la escuela.



Se solicita verificar la realización de cortes para generar las juntas de las dilataciones y así para evitar Futuras apariciones de fisuras en los bordillos.

Convenio No. 3160 de 2024 OAC Vereda Piamonte







Convenio No. 2552 de 2024 OAC Vereda Barcelona Alta



Se solicita a la interventoría informar la culminación a satisfacción de la totalidad de las obras.

Convenio No. 3777 de 2024 OAC Vereda San Juan de Carolina







Se solicita a la interventoría verificar el avance de las obras y dar terminación a lo faltante.

RESOLUCION / AUTORIZACIÓN N° SIN RESOLUCION
FECHA DE INICIO 20/10/2025 FECHA DE TERMINACIÓN 20/10/2025
LUGAR DE LA COMISIÓN ARMENIA

OBJETO DE LA COMISIÓN Reunión de seguimiento No. 24 al contrato de Interventoría No. 3668 de 2024 en sus funciones de verificación, supervisión y control a la ejecución de los convenios de la vigencia 2024 del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total en la Dirección Territorial Quindío – INVÍAS.

Actividades realizadas *(relacionadas por cada día, especialmente las desarrolladas durante fines de semana y festivos)*

TEMA 1: Saludo inicial y componente jurídico
Se da bienvenida al equipo de Interventoría al comité de seguimiento No. 24, donde se realiza la presentación de cada uno de los asistentes por parte de la Dirección Territorial Quindío y la Interventoría No. 3668 de 2024. En primer lugar, se aborda el proceso de las prórrogas por lo cual, la Interventoría a la fecha aún se encuentran trabajando en ello recogiendo las firmas de los RL de las Juntas de acción comunal.

TEMA 2: Componente técnico
Con respecto a la solicitud de acciones a tomar frente al convenio de La Mariela, la interventoría manifiesta que no es viable debido a que la placa huella existente se encuentra en garantía, y no se puede afectar; sin embargo, se trasladó concepto al especialista de la interventoría.

Por otro lado, con referencia a la obra de circasia Barcelona Alta de Circasia se realizó comité de compras para el material.

Ahora bien, se procede a exponer la presentación semanal del estado de los convenios:

1. JAC La Venada Baja:




- La obra ya fue terminada. Está pendiente subsanar observaciones de acta previa de recibo definitivo de la obra.
- Pendiente dilatación de bordillos y la placa de transición
- Pendiente recogida de material sobrante.
- La OPC está para entregar el 24 de octubre.

2. JAC Buenavista:



- Ya entrego plan de compras, está pendiente el recibo de dinero.
- Falta bordillo.
- Ya realizaron la OPC son 2 en la escuela y otro por fuera de escuela.

3. JAC Barcelona Alta:

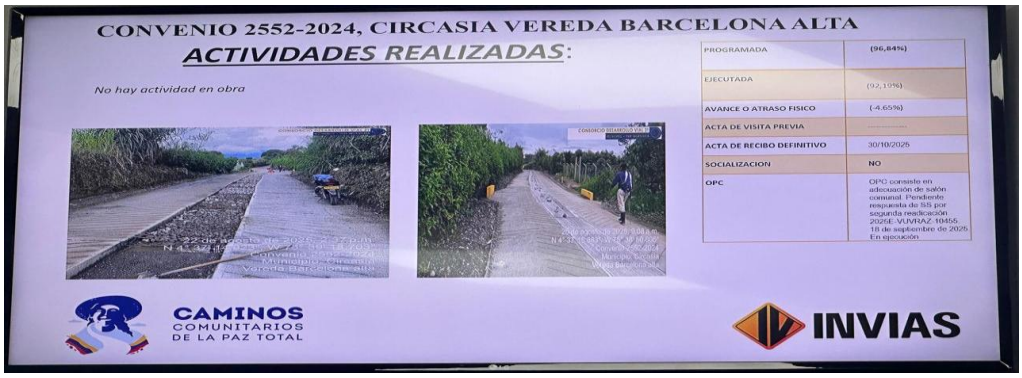


4. JAC Villa Éxito:



- Mañana inician con la elaboración de un disipador.
- Pendiente bordillos.

5. JAC La Topacia y Río Lejos:

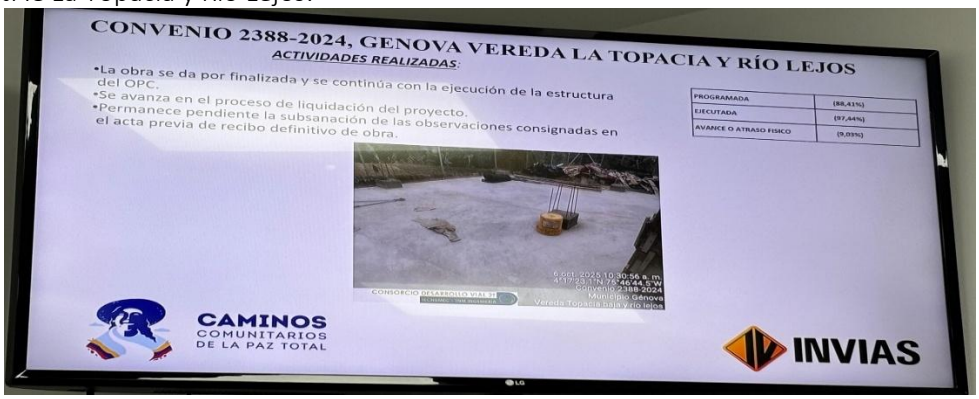

6. JAC La Topacia Alta:



Está pendiente una alternativa de trabajo para finalizar, ya que han tenido dificultades por las condiciones climáticas.

7. JAC Patio Bonito:



8. JAC Cantores:

CONVENIO 3539-2024, MONTENEGRO VEREDA CANTORES

ACTIVIDADES REALIZADAS

➢ *Posterior a la finalización del proyecto el día 27 de septiembre del 2025, el día jueves 9 de octubre del 2025 se realizó la entrega oficial del convenio 3539 – 2024 , asimismo, se realizó la respectiva socialización de la obra, tanto de la placa huella como de los OPC*



PROGRAMADA	(90.81%)
EJECUTADA	(83.45%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-7.36%)
ACTA DE VISITA PREVIA	----------
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	28-11-25
SOCIALIZACION	SI
OPC	OPC Shut ejecutada

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

- Finalizaron y realizaron todas las recomendaciones del acta de visita previa

9. JAC Padilla:

CONVENIO 4006-2024, LA TEBAIDA VEREDA PADILLA

ACTIVIDADES REALIZADAS

➢ *No se realizaron actividades en obra.*





PROGRAMADA	(88,19%)
EJECUTADA	(79,73%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-8,46%)
ACTA DE VISITA PREVIA	----------
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	30/10/2025
SOCIALIZACION	SI
OPC	OPC consiste en la instalación de 8 luminarias y 8 postes. Ejecutada.

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

- Ya finalizaron hay varias recomendaciones en el acta de visita previa, se recomienda a la interventoría no dejar hasta el último para que subsanen.

10. JAC Maravelez:



- Están en el último tramo.

11. JAC La Popa:



- Finalizan en 15 días, se han realizado varias correcciones.


12. JAC La montaña:



13. JAC Los Balsos:



14. JAC Los Juanes:

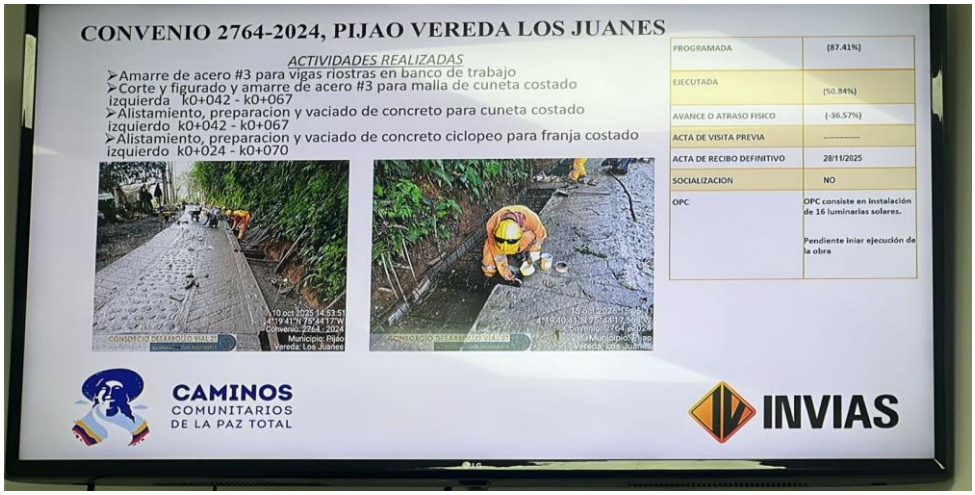


15. JAC Mariela:




- Se hace observación de que deben dejar recubrimientos en bordillos y viga riostra.

16. JAC Río Verde Bajo y Paraguacito:

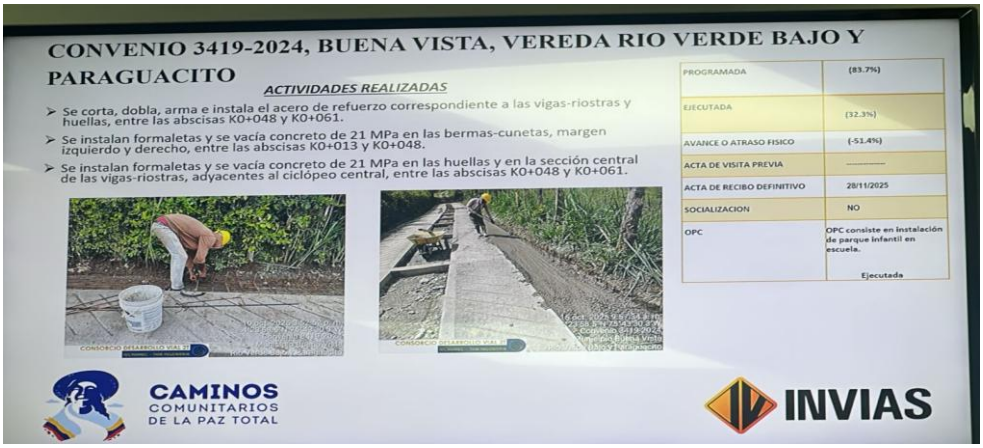


- Pendiente sacar el tema de densidad, por temas climáticos no ha sido posible.

17. JAC Canaán:

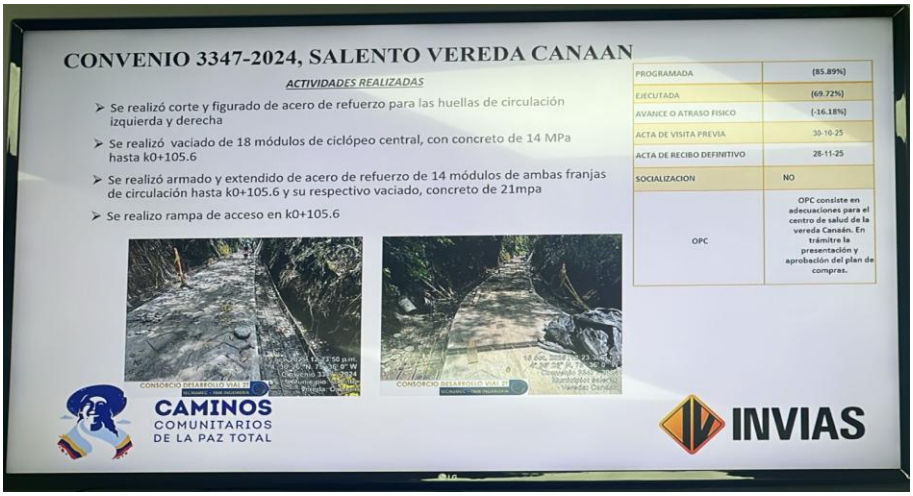

18. JAC Los Pinos:

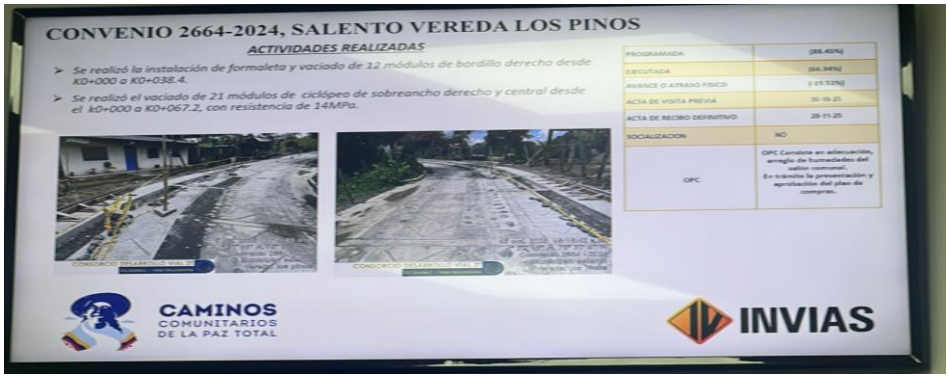

19. JAC Chagualá:




20. JAC Pavas



21. JAC Piamonte:



22. JAC San Juan de Carolina:

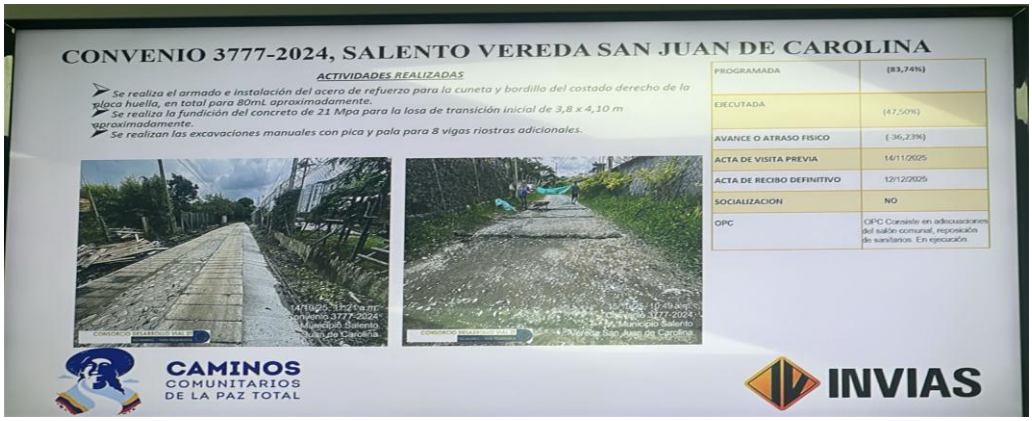

- El ingeniero renuncio, por el momento no hay personal en la obra, esta semana inician de nuevo las labores de obra.

23. JAC La Argentina:




24. Resguardo Indígena Dachi Agore Drua:



- El material de la OPC ya está en el sitio, va a hacer un parque infantil.


25. JAC Arenales:

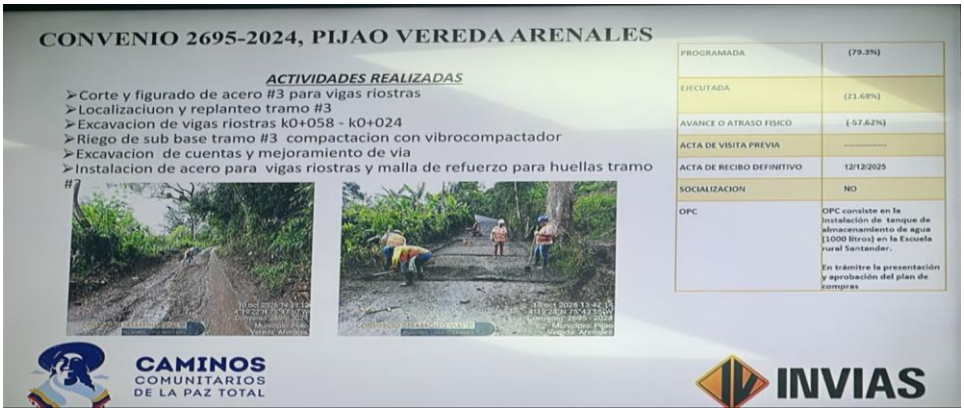


26. JAC Asociación de Juntas de Acción Comunal de Calarcá:



27. JAC La Coqueta:

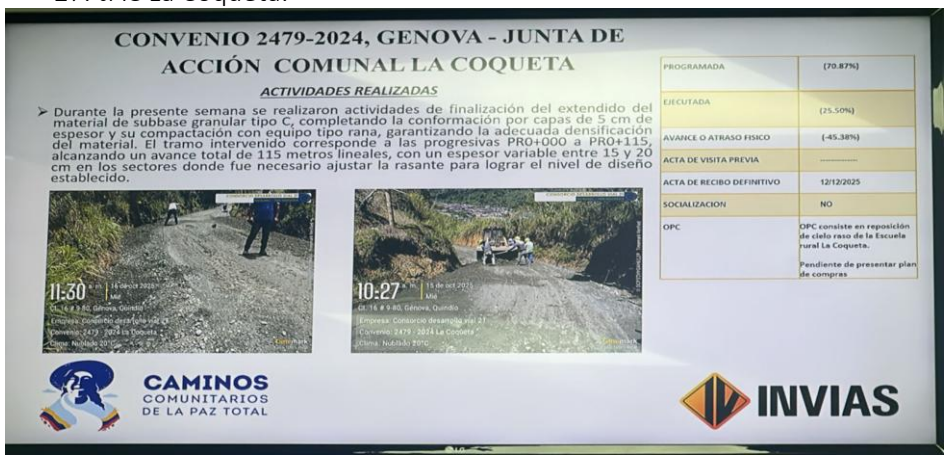

- Avance general de obra e interventoría mes de septiembre

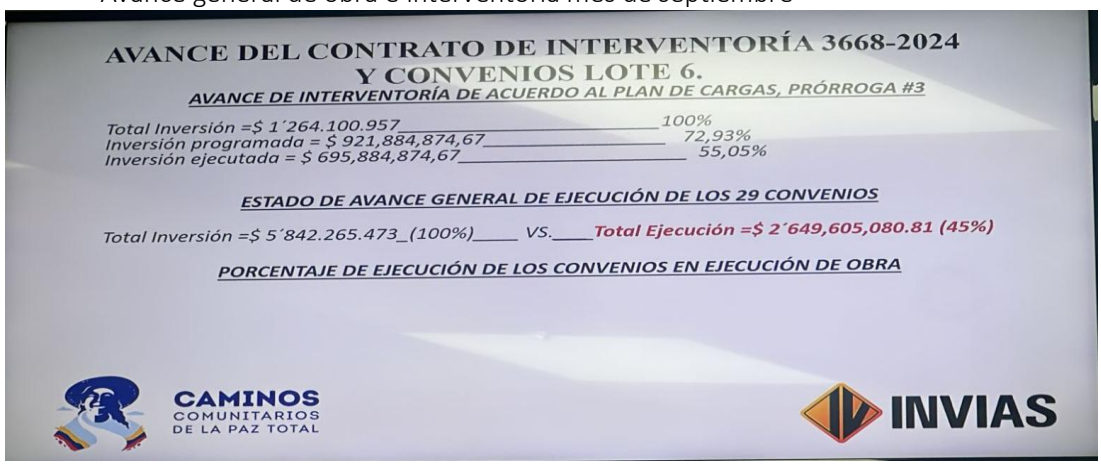

- Se le solicita a la interventoría celeridad en el seguimiento y tramite de los aspectos relacionados con las obras, así como en lo correspondiente a la parte financiera. La interventoría manifiesta que durante la presente semana se estará organizando el tema financiero y se iniciará la revisión de obra, teniendo en cuenta las actividades que corresponder al inspector.
- Se pregunta a la interventoría por el convenio con el OAC El Agrado, en lo que indican que apenas van a iniciar con el plan de compras para iniciar la obra.
- Se le insta a la interventoría a acompañar permanentemente a los OAC El Agrado y Dorado Alto - Las Camelias para poder llevar a cabo en el tiempo estipulado la finalización de las obras.

RESOLUCION / AUTORIZACIÓN N° SIN RESOLUCION
FECHA DE INICIO 27/10/2025 FECHA DE TERMINACIÓN 27/10/2025
LUGAR DE LA COMISIÓN ARMENIA

OBJETO DE LA COMISIÓN Reunión de seguimiento No. 25 al contrato de Interventoría No. 3668 de 2024 en sus funciones de verificación, supervisión y control a la ejecución de los convenios de la vigencia 2024 del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total en la Dirección Territorial Quindío – INVÍAS.

Actividades realizadas *(relacionadas por cada día, especialmente las desarrolladas durante fines de semana y festivos)*

TEMA 1: Saludo inicial y varios.
Se da bienvenida al equipo de Interventoría al comité de seguimiento No. 25, donde se realiza la presentación de cada uno de los asistentes por parte de la Dirección Territorial Quindío y la Interventoría No. 3668 de 2024. En primer lugar, la Interventoría No. 3668 de 2024 expresa diversas situaciones que han acontecido con la ausencia de personal en la ejecución del convenio solidario con la Junta de Acción Comunal de la vereda La Topacia Alta del municipio de Génova (Quindío); para lo cual, la Dirección Territorial Quindío le reitera la figura que tiene como supervisor del contrato de Interventoría, no de los convenios solidarios e interadministrativos; la Interventoría es precisamente la figura que debe ejercer la supervisión a los convenios solidarios e interadministrativos, ejerciendo el control, el seguimiento y la verificación de la ejecución de los convenios, situación que en múltiples ocasiones no se evidencia adecuadamente.

La interventoría expresa diferentes actuaciones que ha realizado a lo largo de esta situación, no obstante, la DT Quindío manifiesta que esta situación ya se ha presentado de manera similar con otros convenios, asimismo se expresa la preocupación y la necesidad de que las obras del convenio con Topacia Alta culminen a satisfacción, al igual que, se le recuerda a la Interventoría la necesidad de ser participativa con la comunidad objeto de los convenios, lo anterior considerando la falta de

experiencia de las juntas. Por otro lado, se le expresa a la Interventoría la necesidad de tomar actuaciones en torno a los contratistas que se tienen y no limitarse al envío únicamente de oficios, al igual que, se le recuerda los procesos sancionatorios relacionados con los incumplimientos. Ante lo anterior, la Interventoría expresa que ha realizado todas las actuaciones que han estado en su mano, al igual que manifiesta que los acompañara en la medida que les sea posible.


Ahora bien, la DT Quindío manifiesta el derecho de petición que instauró el convenio solidario No. 3419 de 2024 con la Junta de Acción Comunal de la vereda Ríoverde Bajo y Paraguaicito concerniente al municipio de Buenavista (Quindío), donde la representante legal de la JAC solicita la contratación de sus familiares que son miembros y habitantes de la Junta. En ese sentido, la DT Quindío realizó las consultas legales pertinentes para poder responder dicho requerimiento, en ese sentido, se le expresa a la Interventoría la respuesta jurídica y las acciones a realizar para ejecutar y acoplarse a dicha postura.

Por otro lado, con relación a la JAC Barcelona Alta, la interventoría manifiesta que se reanudarán las actividades en campo que estima tomarse un tiempo de tres días de ejecución. Asimismo, se expresa que hoy 27 de octubre del año en curso, el personal estará en obra. Ahora bien, con relación a la JAC La Coqueta, se expresa la necesidad de revisar minuciosamente los acabados relacionados con la placa huella.

Con relación a la JAC San Juan de Carolina, la Interventoría menciona que hubo un cambio de ingeniero residente, por lo cual, las actividades en obra sufrieron retrasos considerables por la ausencia de personal en obra. No obstante, a la fecha, se expresa que ya hay personal nuevamente trabajando y que ya se tienen los insumos necesarios para ejecutar. En ese sentido, la DT Quindío expresa la problemática relacionada con la OPC, reiterando la ausencia de la supervisión a la planificación y ejecución desde el componente técnico y ambiental, por lo cual, se le reitera el trabajo mancomunado que debe tener la interventoría con sus diferentes componentes.

En cuanto a la JAC Dorado Alto Las Camelias, la interventoría expresa la situación relacionada con el material que se estropeó en obra y con los pagos de insumos necesarios para garantizar la seguridad vial en la vía. La Interventoría expresa que ya se subsano esta situación y que ya se están trabajando en torno a la vía. Con relación a la Obra de Participación Comunitaria, se expresa que ya se cuenta con la propuesta, los permisos y una (01) cotización de las tres (03), se espera radicar entre hoy y mañana.

TEMA 2: Componente técnico
La Interventoría en aras de organizar y tener los estados reales del componente financiero de los convenios solidarios e interadministrativo, realizó un documento Excel con varias hojas que incluyen: Plan de compras, presupuesto, cotizaciones, balance de obra, nóminas, etc.

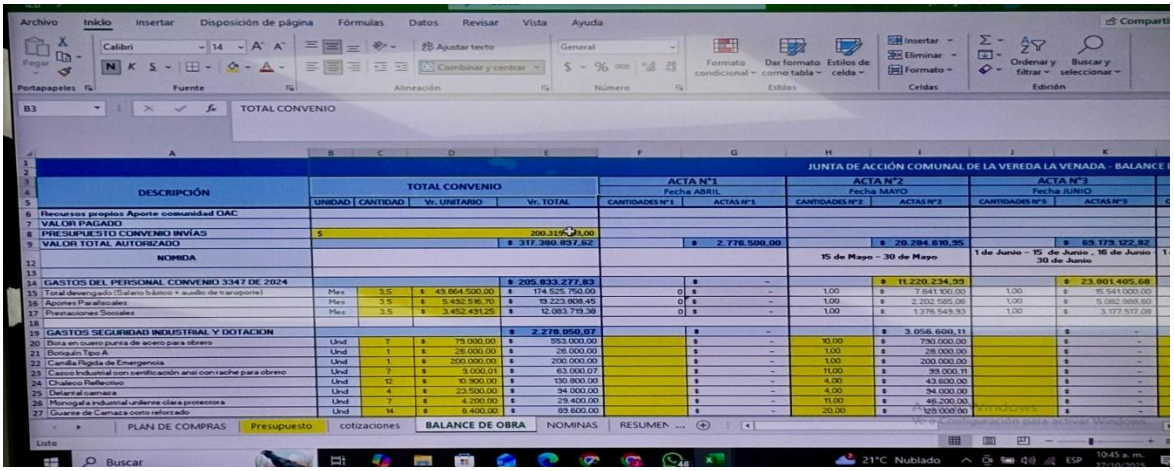

Desde la DT Quindío, se brindan recomendaciones, sugerencias y observaciones en torno al proceso que la Interventoría No. 3668 de 2024 ha realizado, al igual que se brindaron observaciones en torno a los procesos de liquidación que serán subyacentes toda vez que los convenios culminen su ejecución.

Por otro lado, se procede con la presentación de los avances presentados en la interventoría No. 3668 de 2024:

En cuanto al avance de los convenios solidarios e interadministrativo:

1. Convenio 2470 de 2024: JAC La Venada

CONVENIO 2470-2024, GÉNOVA VEREDA LA VENADA BAJA

ACTIVIDADES REALIZADAS:

•La obra ha sido dada por terminada, se realizan actividades en caseta comunal. está pendiente subsanar observaciones del acta previa de recibo definitivo de obra





PROGRAMADA	(99.34%)
EJECUTADA	(89.44%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-9.90%)
ACTA DE VISITA PREVIA	----------
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	30/10/2025
SOCIALIZACION	
OPC	OPC consiste en cerramiento con malla para la cancha de la escuela La Venada. En ejecución. Con compromiso de entrega el 24 de octubre

2. Convenio 2454 de 2024: JAC Buenavista:

CONVENIO 2454-2024, CIRCASIA VEREDA BUENAVISTA

ACTIVIDADES REALIZADAS:

>No hay actividad en obra

PROGRAMADA	(97,32%)
EJECUTADA	(95,50%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-1,81%)
ACTA DE VISITA PREVIA	----------
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	30/10/2025
SOCIALIZACION	
OPC	OPC consiste en la adecuación de un Shut. En ejecución





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

3. Convenio 2552 de 2024: JAC Barcelona Alta:

CONVENIO 2552-2024, CIRCASIA VEREDA BARCELONA ALTA

ACTIVIDADES REALIZADAS:

No hay actividad en obra

PROGRAMADA	(97,78%)
EJECUTADA	(92,19%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-5,59%)
ACTA DE VISITA PREVIA	----------
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	30/10/2025
SOCIALIZACION	
OPC	OPC consiste en adecuación de salón comunal. Pendiente respuesta de SS por segunda readicción 2025E-VUVRAZ-10455. 18 de septiembre de 2025. En ejecución





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

4. Convenio 4272 de 2024: JVC Vereda Villa Éxito:

CONVENIO 4272-2024, LA TEBAIDA VEREDA VILLA ÉXITO

ACTIVIDADES REALIZADAS:

➢ *Se construye un disipador de energía con el fin de garantizar la durabilidad de la obra, evitando filtraciones y procesos de socavación. La estructura está conformada por ocho escalones con una huella de 50 cm y una contrahuella de 27 cm, un escalón adicional de 50 cm x 50 cm, y una zanja de disipación de 2.80 m de longitud, 1.40 m de ancho y 1.40 m de profundidad.*





PROGRAMADA	(98,88%)
EJECUTADA	(85,33%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-13,54%)
ACTA DE VISITA PREVIA	----------
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	30/10/2025
SOCIALIZACION	
OPC	OPC carpa movil, placa en concreto y pedestales. Ejecutada.

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

5. Convenio 2388 de 2024: JAC La Topacia y Río Lejos:

CONVENIO 2388-2024, GENOVA VEREDA LA TOPACIA Y RIO LEJOS

ACTIVIDADES REALIZADAS:

➢ La obra ha sido dada por terminada, se realizan actividades en caseta comunal. está pendiente subsanar observaciones del acta previa de recibo definitivo de obra.





PROGRAMADA	(96.10%)
EJECUTADA	(97.44%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(1.34%)
ACTA DE VISITA PREVIA	----------
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	30/10/2025
SOCIALIZACION	
OPC	OPC consiste en construcción de placa en concreto, pedestales, estructura en guadua y cubierta en zinc. En ejecución, con compromiso de entrega el 24 de octubre

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

6. Convenio 2235 de 2024: JAC Topacia Alta:

CONVENIO 2235-2024, GENOVA VEREDA TOPACIA ALTA

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se instalan formaletas y se vacía concreto de 21 MPa para la construcción del bordillo derecho del tramo 2, comprendido entre las abscisas K0+029 y K0+048.
- Asimismo, se instalan formaletas y se vacía concreto de 21 MPa en la sección central de las vigas riostras, en los puntos de encuentro con el concreto ciclópeo, para un total de siete (7) vigas riostras ubicadas entre las abscisas K0+019 y K0+039.
- Adicionalmente, se vacía concreto ciclópeo de 14 MPa en once (11) unidades centrales, localizadas entre las abscisas K0+003 y K0+038.
- Se utiliza sikadur 32 prime como puente de adherencia entre concreto de diferente edades, previo a la fundida de la riostra central en la zona del ciclópeo





PROGRAMADA	(99.24%)
EJECUTADA	(83.93%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-9.31%)
ACTA DE VISITA PREVIA	----------
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	30/10/2025
SOCIALIZACION	
OPC	OPC consiste en adecuación de salón comunal (muro en sistema liviano, puerta metálica, ventana en aluminio, puntos eléctricos. En ejecución. con compromiso de entrega el 24 de octubre

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

7. Convenio 2638 de 2024: JAC Patio Bonito

CONVENIO 2638-2024, PIJAO VEREDA PATIO BONITO

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Acopio de agregados arena - piedra de mano
- Alistamiento, preparación y vaciado de concreto para bordillo costado derecho - k0+039





PROGRAMADA	(96.92%)
EJECUTADA	(96.61%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-0.31%)
ACTA DE VISITA PREVIA	----------
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	30/10/2025
SOCIALIZACION	
OPC	OPC consiste en la instalación de 16 luminarias solares. Terminada

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

8. Convenio 3539 de 2024: JAC Cantores

CONVENIO 3539-2024, MONTENEGRO VEREDA CANTORES

ACTIVIDADES REALIZADAS

➢ *Posterior a la finalización del proyecto el día 27 de septiembre del 2025, el día jueves 9 de octubre del 2025 se realizó la entrega oficial del convenio 3539 – 2024 , asimismo, se realizó la respectiva socialización de la obra, tanto de la placa huella como de los OPC*



PROGRAMADA	(94,95%)
EJECUTADA	(83.45%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-11,95%)
ACTA DE VISITA PREVIA	----------
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	28-11-25
SOCIALIZACION	----------
OPC	OPC Shut ejecutada

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

9. Convenio 4006 de 2024: JAC Padilla

CONVENIO 4006-2024, LA TEBAIDA VEREDA PADILLA

ACTIVIDADES REALIZADAS

➢ *No se realizaron actividades en obra.*





PROGRAMADA	(94,95%)
EJECUTADA	(79,73%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-15,22%)
ACTA DE VISITA PREVIA	----------
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	30/10/2025
SOCIALIZACION	
OPC	OPC consiste en la instalación de 8 luminarias y 8 postes. Ejecutada.

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

10. Convenio 2968 de 2024: JAC Maravelez

CONVENIO 2968-2024, LA TEBAIDA VEREDA MARAVELEZ

ACTIVIDADES REALIZADAS

- *Se realiza la fundición del concreto de 14 Mpa del concreto ciclópeo de 19 módulos en total para el sobreancho del costado derecho de la placa huella.*
- *Se realiza la fundición de concreto de 21 Mpa de huellas, cunetas y vigas para los 7 módulos faltantes y completar 19 en total, del costado derecho de la placa huella del primer tramo.*





PROGRAMADA	(96.,6%)
EJECUTADA	(92.38%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-4.57%)
ACTA DE VISITA PREVIA	--------
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	30-10-25
SOCIALIZACION	----------
OPC	OPC consiste en la instalación de 20 luminarias. En ejecución

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

11. Convenio 3922 de 2024: JAC La Popa

CONVENIO 3922-2024, LA TEBAIDA VEREDA LA POPA

ACTIVIDADES REALIZADAS

- *Se realiza el vaciado de concreto premezclado de resistencia de 21 mpa dividido en tres fundidas, en catorce módulos de placa huella, siete a cada lado de la via, en ocho vigas riostras de 4.1 m , diez módulos, cinco a cada costado de la via.*
- *Además se funden 13 módulos de concreto ciclópeo en las abscisas K0+045 a K0+073.6*
- *En el tramo 2 se completan 73.6 ml de construcción de placa huella completa, exceptuando bordillo a cada costado, entre las abscisas K0+000 a K0+073.6 y 8 módulos de placa más entre las abscisas K0+073.6 a K0+086.4*





PROGRAMADA	(94,2%)
EJECUTADA	(82,4%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-11,82%)
ACTA DE VISITA PREVIA	30-10.25
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	28-11-25
SOCIALIZACION	----------
OPC	OPC consiste en la instalación de 20 luminarias. En ejecución

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

12. Convenio 2996 de 2024: JAC La Montaña

CONVENIO 2996-2024, MONTENEGRO VEREDA LA MONTAÑA

ACTIVIDADES REALIZADAS

- *Se ejecutó el vaciado de trece (13) módulos de placa huella en el costado izquierdo, correspondientes al tramo 2, entre las abscisas K0+000 y K0+039, utilizando concreto con una resistencia especificada de 21 MPa. Adicionalmente, se realizó el vaciado de diez (10) módulos de concreto ciclópeo en la cinta lateral izquierda del mismo tramo, entre las abscisas K0+000 y K0+030, empleando concreto de 14 MPa. Finalmente, se llevó a cabo la instalación del encofrado lateral izquierdo del tramo 1, destinado a la conformación de cuneta y bordillo.*





PROGRAMADA	(95,5%)
EJECUTADA	(71,8%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-23,65%)
ACTA DE VISITA PREVIA	30-10.25
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	28-11-25
SOCIALIZACION	----------
OPC	OPC consiste en la instalación de gimnasio. Pendiente aprobación de desembolso En ejecución

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

13. Convenio 2767 de 2024: JAC Los Balsos

CONVENIO 2767-2024, PIJAO VEREDA LOS BALSOS

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Instalación de acero longitudinal y transversal cuneta izquierda desde la absc k0+043 hasta k0+085
- Instalación de acero del bordillo izquierdo desde la absc k0+043 hasta k0+085
- Instalación de acero del bordillo izquierdo desde la absc k0+043 hasta k0+085
- Terminación completa de 12 vigas riostras





PROGRAMADA	(93.05%)
EJECUTADA	(53.66%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-33.54%)
ACTA DE VISITA PREVIA	----------
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	28-11-25
SOCIALIZACION	
OPC	OPC consiste en instalación de 16 luminarias solares. Ejecutada

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

14. Convenio 2764 de 2024: JAC Los Juanes

CONVENIO 2764-2024, PIJAO VEREDA LOS JUANES

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Amarre de acero #3 para malla de refuerzo cuenta costado derecho k0+042-k0+070
- Fabricacion de aisladores para acero
- Alistamiento, preparacion y vaciado de concreto para cuneta costado derecho k0+042 - k0+070
- Alistamiento, preparacion y vaciado de concreto ciclopeo para franja costado derecho k0+027- k0+045





PROGRAMADA	(93.38%)
EJECUTADA	(54.16%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-39.22%)
ACTA DE VISITA PREVIA	----------
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	28/11/2025
SOCIALIZACION	
OPC	OPC consiste en instalación de 16 luminarias solares. Pendiente iniar ejecución de la obra

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

15. Convenio 2385 de 2024: JAC La Mariela

CONVENIO 2385-2024, PIJAO VEREDA LA MARIELA

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Instalacion de acero de 13 vigas riostras desde la absc k0+066 hasta k0+106
- Instalacion de acero longitudinal y transversal desde la absc k0+066 hasta k0+106
- Encofrado huella izquierda y derecha desde k0+045 hasta k0+066
- Fundida de huella izquierda y derecha desde k0+045 hasta k0+066





PROGRAMADA	(92.16%)
EJECUTADA	(57.17%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-38.99%)
ACTA DE VISITA PREVIA	----------
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	12/12/2025
SOCIALIZACION	
OPC	OPC consiste en adecuación del salón comunal con la reposicion de la red eléctrica. En trámitre la presentación y aprobación del plan de compras.

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

16. Convenio 3419 de 2024: JAC Rioverde Bajo y Paraguaicito

CONVENIO 3419-2024, BUENA VISTA, VEREDA RIO VERDE BAJO Y PARAGUACITO

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Avance en la fundición de bordillos en concreto de 21 MPa, costado izquierdo de la placa huella, abscisa K0+022
- Avance en el armado de acero de refuerzo de berma-cuneta, costado derecho de la placa huella, abscisa K0+054.





PROGRAMADA	(95.2%)
EJECUTADA	(35%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-60.15%)
ACTA DE VISITA PREVIA	----------
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	28/11/2025
SOCIALIZACION	
OPC	OPC consiste en instalación de parque infantil en escuela. Ejecutada

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

17. Convenio 3347 de 2024: JAC Canaán

CONVENIO 3347-2024, SALENTO VEREDA CANAAN

ACTIVIDADES REALIZADAS

- *Se realizó vaciado de 19 módulos de cuneta izquierda, con concreto de 21 mpa hasta k0+105.6*
- *Se realizó vaciado de 23 módulos de cuneta derecha, con concreto de 21 mpa hasta k0+105.6*





PROGRAMADA	(93,03%)
EJECUTADA	(81,69%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-11,34%)
ACTA DE VISITA PREVIA	30-10-25
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	28-11-25
SOCIALIZACION	
OPC	OPC consiste en adecuaciones para el centro de salud de la vereda Canaán. En trámitre la presentación y aprobación del plan de compras.

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

18. Convenio 2664 de 2024: JAC Los Pinos

CONVENIO 2664-2024, SALENTO VEREDA LOS PINOS

ACTIVIDADES REALIZADAS

- *Se realizó la instalación de formaleta y vaciado de 5 módulos de bordillo derecho desde K0+080.*
- *Se realizó el vaciado de 5 módulos de ciclópeo de sobreancho derecho y central desde el k0+080 a K0+096, con resistencia de 14MPa.*





PROGRAMADA	(93,6%)
EJECUTADA	(68,1%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-25,52%)
ACTA DE VISITA PREVIA	30-10-25
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	28-11-25
SOCIALIZACION	
OPC	OPC Consiste en adecuación, arreglo de humedades del salón comunal. En trámite la presentación y aprobación del plan de compras.

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

19. Convenio 2728 de 2024: JAC Chagualá

CONVENIO 2728-2024, SALENTO VEREDA CHAGUALA

ACTIVIDADES REALIZADAS

- *Se realiza vaciado de 10 módulos de franja de ciclópeo central, con concreto de 14MPa, desde k0+064 a k0+096.*
- *> Se realiza instalación de formaletas, armado de acero de refuerzo y vaciado de 10 módulos, de ambas franjas de circulación, con concreto de 21MPa desde K0+064 a K0+096.*
- *> Se realiza instalación de formaletas, armado de acero de refuerzo y vaciado de 20 módulos, de ambas cunetas, con concreto de 21MPa desde K0+032 a K0+096.*
- *> Se realiza vaciado de 20 vigas riostra , con concreto de 21MPa, desde k0+032.*





PROGRAMADA	(88,9%)
EJECUTADA	(76,1%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-12,8%)
ACTA DE VISITA PREVIA	14-11-25
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	12-12-25
SOCIALIZACION	
OPC	OPC Consiste en instalación de baranda y pintura para las locaciones de la Escuela Santísima Trinidad. En trámite la presentación y aprobación del plan de compras.

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

20. Convenio 3156 de 2024: JAC Pavas

CONVENIO 3156-2024, FILANDIA VEREDA PAVAS

ACTIVIDADES REALIZADAS

➢ *Alistamiento, preparación y vaciado de concreto en la franja central ciclópeo, entre los abscisados K0+027 - K0+040, además en la cuneta costado derecho e izquierdo, entre los abscisados K0+040 - K0+050.*





PROGRAMADA	(84,84%)
EJECUTADA	(38,9%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-1.14%)
ACTA DE VISITA PREVIA	30/10/2025
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	28/11/2025
SOCIALIZACION	
OPC	OPC consiste en la instalación de un parque infantil en la escuela rural. Pte de respuesta a la segunda radicación por la SS. En trámite la presentación y aprobación del plan de compras.

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

21. Convenio 3160 de 2024: JAC Piamonte

CONVENIO 3160-2024, CIRCASIA VEREDA PIAMONTE

ACTIVIDADES REALIZADAS

➢ *Tramo 2 - Alistamiento, preparación y vaciado de concreto en la franja huella costado derecho e izquierdo y franja central ciclópeo en el abscisado K0+076 - K0+083.*

➢ *Vaciado de concreto en cuneta costado derecho e izquierdo, entre los abscisados K0+061 - K0+083 y bordillo costado izquierdo abscisado K0+000 - K0+083.*





PROGRAMADA	(89,58%)
EJECUTADA	(96,85%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(7,27%)
ACTA DE VISITA PREVIA	----------
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	30/10/2025
SOCIALIZACION	
OPC	OPC consiste en instalacion de luminarias solares. En ejecución

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

22. Convenio 3777 de 2024: JAC San Juan de Carolina

CONVENIO 3777-2024, SALENTO VEREDA SAN JUAN DE CAROLINA

ACTIVIDADES REALIZADAS

➢ *Esta semana se detuvieron las actividades en la obra por el cambio de ingeniero residente y su nueva orden para ponerse al tanto de la obra y además realizar la reestructuración del personal.*





PROGRAMADA	(90,9%)
EJECUTADA	(47,50%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-43,36%)
ACTA DE VISITA PREVIA	14/11/2025
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	12/12/2025
SOCIALIZACION	
OPC	OPC Consiste en adecuaciones del salón comunal, reposición de sanitarios. En ejecución.

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

23. Convenio 2703 de 2024: JAC La Argentina

CONVENIO 2703-2024, LA TEBAIDA VEREDA LA ARGENTINA

ACTIVIDADES REALIZADAS

- *Se ejecuta el vaciado de concreto elaborado en obra, con resistencia de 21 MPa, en 8 módulos de placa huella, distribuidos en 4 a cada costado de la vía. Trabajo realizado entre las abscisas a K0+108.8 a K0+ 121.4*
- *Se ejecuta vaciado de concreto elaborado en obra, con resistencia de 21 Mpa, en 51.2 ml de bordillo en el costado derecho entre las abscisas K0+ 006.4 a K0+057.8*
- *Se ejecuta el vaciado de concreto elaborado en obra, con resistencia de 21 MPa, en 16 módulos de cuneta, distribuidos en 8 a cada costado de la vía. Trabajo realizado entre las abscisas a K0+057.6 a K0+ 083.2*
- *Se ejecuta vaciado de concreto elaborado en obra, con resistencia de 21 Mpa, en 16 ml de bordillo en el costado izquierdo entre las abscisas K0+ 022.6 a K0+38.6*





PROGRAMADA	(85,5%)
EJECUTADA	(76,43%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-9,06%)
ACTA DE VISITA PREVIA	30-10-25
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	28-11-25
SOCIALIZACION	
OPC	OPC consiste en la reposición del cielo raso de la escuela Rural El Ocaso.

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

24. Convenio 4100 de 2024: CIM Resguardo Dachi Agore Drua

CONVENIO 4100-2024, CALARCA CABILDO MAYOR INDIGENA DACHI AGORE DRUA

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se realizo la fundición de la cuneta lateral derecha y la rampa de acceso para el tramo 1.
- Se finaliza con la fundida de las vigas riostras en este tramo aplicando sikadur 32 para las juntas frías
- Se realizó el encofrado y vaciado de 5 modulos de concreto ciclópeo en el tramo 2





PROGRAMADA	(89.54%)
EJECUTADA	(35.64%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-53.90%)
ACTA DE VISITA PREVIA	30/10/2025
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	28/11/2025
SOCIALIZACION	
OPC	OPC consiste en en la instalación de un parque infantil en el resguardo indígena. En ejecución

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

25. Convenio 2695 de 2024: JAC Arenales

CONVENIO 2695-2024, PIJAO VEREDA ARENALES

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Amarre , Corte y figurado de acero #3 para huellas y cunetas
- Localizaciuon y replanteo tramo #3
- Encofrado de huellas ambos costados k0+000 - k0+021
- Instalacion de acero para vigas riostras y malla de refuerzo para huellas k0+000 - k0+021





PROGRAMADA	(89.88%)
EJECUTADA	(24.94%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-64.95%)
ACTA DE VISITA PREVIA	----------
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	12/12/2025
SOCIALIZACION	
OPC	OPC consiste en la instalación de tanque de almacenamiento de agua (1000 litros) en la Escuela rural Santander. En trámitre la presentación y aprobación del plan de compras

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

26. Convenio 3628 de 2024: Asociación de Juntas de Acción Comunal de Calarcá

CONVENIO 3628-2024, CALARCA ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE CALARCA

ACTIVIDADES REALIZADAS

- No se llevaron a cabo actividades en la semana
- El contratista no entregó oportunamente la relación de los pagos de nómina, por tal motivo los desembolsos no fueron realizados dentro de los tiempos establecidos para el pago de los mismos.





PROGRAMADA	(93.22%)
EJECUTADA	(11.42%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-81.80%)
ACTA DE VISITA PREVIA	14/11/2025
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	12/12/2025
SOCIALIZACION	
OPC	OPC consiste en la construcción de un paradero Público en la entrada al ramal Pela carriel, área de influencia de la obra. Pendiente respuesta de SS. En trámite la presentación y aprobación del plan de compras.

27. Convenio 2479 de 2024: JAC La Coqueta

CONVENIO 2479-2024, GENOVA - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA COQUETA

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se realizó la toma de densidades sobre la subrasante previamente alistada para verificar la adecuada compactación del material. Posteriormente, se ejecutó la excavación de las vigas y la instalación del acero de refuerzo de la placa huella. Se fundieron en forma de "H" cuatro (4) módulos con sus cinco (5) vigas respectivas, las cuales fueron vaciadas completamente para conformar la estructura de la placa huella.





PROGRAMADA	(87.58%)
EJECUTADA	(40.27%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-47.31%)
ACTA DE VISITA PREVIA	----------
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	12/12/2025
SOCIALIZACION	
OPC	OPC consiste en reposición de cielo raso de la Escuela rural La Coqueta. Pendiente de presentar plan de compras

Para finalizar, se procede a exponer el avance general del contrato de Interventoría No. 3668 de 2024 y de los convenios solidarios e interadministrativos:

AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 3668-2024 Y CONVENIOS LOTE 6.

AVANCE DE INTERVENTORÍA DE ACUERDO AL PLAN DE CARGAS, PRÓRROGA #3

Total Inversión =$ 1´264.100.957_____100%
Inversión programada = $ 921,884,874,67_____ 72,93%
Inversión ejecutada = $ 695,884,874,67_____ 55,05%

ESTADO DE AVANCE GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS 29 CONVENIOS

Total Inversión =$ 5´842.265.473_(100%)_____ VS.____Total Ejecución =$ 2´848.278.842,40 (49%)

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS EN EJECUCIÓN DE OBRA

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se ejerce el vigilancia, control, seguimiento y verificación sobre la ejecución contractual, mediante las siguientes actividades:

-. Revisión y trámite del acta mensual de costos, de los informes semanales y del informe mensual de la interventoría.
-. Se elabora y se presenta informe mensual del supervisor.
-. Se vela por el cumplimiento del contrato en términos de plazos y cronograma, así como tambien se vigila el cumplimiento de calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos del contrato.
-. Se verifica que el interventor suministre y mantenga todos los recursos ofrecidos (personal, equipos e implementos), con las condiciones e idoneidad pactadas.
-. Se solicitó a la interventoría estricto cumplimiento en la presentación oportuna tanto de actas de costos como de informes semanales y mensuales de la interventoría.
-. Se participa en reuniones de seguimiento y comités para verificar la adecuada ejecución del contrato.
-. Se suscriben las actas que se generan durante la ejecución del contrato, documentando las reuniones de seguimiento y comités, también se revisan los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, documentando los pagos realizados al contrato y controlando el balance presupuestal del contrato para efecto de pagos y de liquidación de este.
-. Se verifican los sistemas de información de forma tal que estén debidamente alimentados y actualizados, para garantizar la publicación de los documentos de ejecución del contrato.
-. Se vela porque el expediente del contrato se encuentre completo y actualizado constantemente.
-. Se verifica el cumplimiento de las obligaciones del interventor en materia de salud ocupacional, seguridad social integral y pago de aportes parafiscales.
-. Se efectúa seguimiento de las garantías del contrato de interventoría durante la ejecución y se verifica su remisión a la oficina correspondiente para su aprobación.
-. Se realiza seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contrato de interventoría vigilado en sus aspectos ambientales y sociales.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se realizan las siguientes recomendaciones para la correcta ejecución del contrato de interventoría vigilado:

-. Se solicita a la parte técnica de la Interventoría dar celeridad a la presentación, revisión, chequeo, ajuste y aprobación necesaria de soportes técnicos, que permitan contar con el perfeccionamiento técnico de los convenios a su cargo, generando aprobación de cotizaciones sobre el material proyectado, así como realizar los comités operativos en cada zona de ejecución o tramo ubicado con finalidad de dar inicio para vaciado de concreto para la próxima semana.
-. Se recomienda continuar con las reuniones periódicas entre la Supervisión e Interventoría para revisar avances, resolver dudas y tomar decisiones oportunas que permitan cumplir con los cronogramas de obra establecidos.
-. Se recomienda a la Interventoría mantener monitoreos constantes sobre el cumplimiento de las actividades programadas, identificando posibles desviaciones del normal desarrollo del contrato y proponiendo medidas correctivas inmediatas.
-. Se solicita a la Interventoría un control riguroso sobre la entrega de los documentos técnicos garantizando que estos cumplan con los requisitos establecidos en el contrato y en los convenios suscritos.
-. Se debe continuar con la verificación por parte de Interventoría para que las OAC mantengan la disponibilidad de equipos, herramientas, personal y materiales necesarios para ejecutar las actividades sin retrasos.

Cordialmente,



NOMBRE FUNCIONARIO: FERNANDO GARCIA GIRALDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3668 DE 2024
IDENTIFICACION: MATRÍCULA PROFESIONAL No. 63202 - 086232 QND
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO, CODIGO: 2028, GRADO: 20
DEPENDENCIA: DIRECCION TERRITORIAL QUINDIO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
