45

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS PATIOS

C E R T I F I C A:

Que, ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A S.A.S identificado (a) con NIT número 901221652-9, representante legalmente por **ADRIANA CAROLINA LIZARAZO,** identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 60396923, expedida en Cúcuta ejecutó satisfactoriamente las actividades del contrato celebrado cuyo objeto es **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA, CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO DE VIAS MEDIANTE LA MODALIDAD BACHEO EN LA ZONA SUR, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER",** en el periodo laborado relacionado.

Registro Presupuestal:	RP 1629 – 13 agosto 2025
Certificado Disponibilidad Presupuestal:	CDP 0245 – 24 de abril 2025
Contrato de Interventoría:	PATIOS-MC-SI-46-2025
Término inicial del contrato:	4 MESES
Valor del contrato:	$ 27.931.326,57
Valor a cobrar:	$ 11.809.442,19
Periodo laborado:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 21 DE OCTUBRE DE 2025

Que, así mismo certifico que he verificado documentalmente y a través de la certificación expedida por el contador del contratista, que el contratista si canceló su seguridad social conforme a lo preceptuado en la ley, y por los montos mínimos al que está obligado por el presente pago, y por todos los pagos que ha obtenido de la Alcaldía de Los Patios por prestación de servicios de la presente vigencia (anexo soporte).

Que: El contrato y/o proceso LICITACION PUBLICA No. PATIOS-MC-SI-46-2025 se encuentra publicado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II), y el estado es en **EJECUCIÓN**, según constancia de publicación N° CO1.PCCNTR.8178406.

Se expide la presente a solicitud de la Interesada a los dieciocho (18) días del mes noviembre del año 2025, para efectos de cobro.

CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON
Secretario de infraestructura - Supervisor

	Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
Aprobó:	Carlos Alfredo Muñoz Pinzón	Secretario de infraestructura	
Revisó:	Carlos Alfredo Muñoz Pinzón	Secretario de infraestructura	
Elaboró:	Claudia Karime Rodriguez Peña	Profesional de apoyo a supervisión	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la Firma del Remitente.			

ALCALDIA
DE LOS PATIOS

SECRETARIA DE HACIENDA

FECHA: 25/11/25

HORA: 3:33 pm

ASUNTO: 2952

FUNCIONARIO

ACTA PARCIAL No. 02 DE 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA PATIOS-MC-SI-46-2025

Fecha de contrato 11 DE AGOSTO DE 2025

Contratista **ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A S.A.S**

Objeto **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA, CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO VIAS MEDIANTE LA MODALIDAD DE BACHEO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER."**

Termino **CUATRO (04) MESES**

Fecha de inicio **22 de agosto de 2025**

En la secretaria de Infraestructura a los cinco (05) días del mes de noviembre de 2025, se reunieron: el Ing. CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON secretario de Infraestructura – Supervisor del contrato de interventoría No PATIOS-MC-SI-46-2025, ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A S.A.S R/L ADRIANA CAROLINA LIZARAZO HIGUERA, en calidad de interventor, con el fin de realizar el acta parcial No 2 del contrato de interventoría en mención, así:

BALANCE		
Valor Contrato	$ 27.931.326,57	
Valor acta parcial No. 01 (DEL 22 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2025)		$ 12.047.442,19
Valor acta parcial No. 02 (DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2025)		$ 11.809.442,19
Valor no ejecutado		$ 4.074.442,19
Sumas iguales	**$ 27.931.326,57**	**$ 27.931.326,57**

El valor a pagar de la presente **ACTA PARCIAL No. 02** es de la suma de: **ONCE MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE $11.809.442,19**

En constancia del anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON
Secretaria de Infraestructura
Supervisor del Contrato

ADRIANA CAROLINA LIZARAZO HIGUERA
Contratista

ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A SAS	CONTRATO PATIOS-MC-SI-46-2025
	ACTA PARCIAL N°2
	asesorandocontratos@gmail.com

San José de Cúcuta, 22 de octubre de 2025

SEÑORES
ALCALDIA DE LOS PATIOS
Cl. 35 #3 80 B, Los Patios, Norte de Santander

Contrato N.° PATIOS-MC-SI-46-2025 DEL 08 DE AGOSTO DE 2025

Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA, CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO VIAS MEDIANTE LA MODALIDAD DE BACHEO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER.

En cumplimiento de lo establecido en la propuesta presentada por el contratista y aceptada dentro del proceso contractual, se presenta a continuación la relación de los gastos técnicos y administrativos asociados a la ejecución del contrato de interventoría, de acuerdo con el presupuesto contractual.

RELACIÓN DE GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS

ACTA PARCIAL N° 02				
VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA				$ 27.931.326,57
VALOR DE LA PRESENTE ACTA PARCIAL N° 01				$ 12.047.442,19
DESCRIPCIÓN	%	COSTO DIRECTO	IVA	TOTAL
ADMINISTRATIVO	12,57%	$ 1.247.000,00	$ 236.930,00	$ 1.483.930,00
TECNICO	69,51%	$ 6.897.870,00	$ 1.310.595,30	$ 8.208.465,30
GASTOS LEGALIZACION, RETENCIONES Y DESCUENTOS	17,92%	$ 1.779.031,00	$ 338.015,89	$ 2.117.046,89
VALOR TOTAL ACTA PARCIAL N° 2				**$ 11.809.442,19**

ADRIANA CAROLINA LIZARAZO HIGUERA
RL ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A S.A.S.
CC 60396923

MUNICIPIO DE LOS PATIOS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: 00 000077

25/11/2025

COMPRADO A	: ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A S.A.S	NIT	: 901221652-9
CON DESTINO A	: ALMACEN		
FACTURA No	: FE-86	FECHA	: 18/11/2025
ORDEN COMPRA	:	FECHA	:

DISPONIBILIDAD	: CDP0245 de 24/04/2025	REGISTRO	: RP1629 de 13/08/2025
MODALIDAD	: MINIMA CUANTIA		
RESUMEN	: CONTRATO LICITACION PUBLICA N°. PATIOS-MC-SI-46-2025, REGISTRO PRESUPUESTAL RP-1629, CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP-0245, SEGUN CONSTANCIA DE PUBLICACION NºC01.PCCNTR.8178406, CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA, CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO DE VIAS MEDIANTE LA MODALIDAD DE BACHEO EN LA ZONA SUR , DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER/r/n		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
511179.01	**Honorarios**						
C00536	INTERVENTORIA TÉCNICA,ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA, CUYO OBJETO MANTENIMIENTO DE VIAS MEDIANTE LA MODALIDAD DE BACHEO EN LA ZONA SUR, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS	unidad	19.0%	1.00	9,923,901.19	9,923,901.19	00
					9,923,901.19	**9,923,901.19**	

SUBTOTAL	9,923,901.19
IVA	1,885,541.00
TOTAL FACTURA	11,809,442.19
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	11,809,442.19

SON: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 19 CENTAVOS.

CARLOS ALFREDO ROJAS SIERRA
C.C 1090400829 - Almacenista

ELABORO AGALVIS

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

CUCUTA, NORTE DE SANTANDER, 09/10/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES CA S A S** con NIT **901.221.652-9** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 108969928861

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS PATIOS
NIT : 800044113-5

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. CDP 0245

Fecha: abr-24/2025 1 - 1

EL JEFE DE OFICINA DE PRESUPUESTO CERTIFICA:

QUE EN EL LIBRO DE PRESUPUESTO DE GASTOS HA SIDO REGISTRADO EL PRESENTE VALOR EN EL (LOS) RUBRO (S) QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN (N):

MANTENIMIENTO DE VIAS MEDIANTE LA MODALIDAD DE BACHEO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR
1	2.3.2.02.02.005.24.08	Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura vial en el municipio de Los Patios, Norte de Santander	130,000,000.00
Fuente Recurso:	671-REC. BALANCE RECURSOS PROPIOS		
Producto MGA:	2402115 -VÍA URBANA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO		
Código BPIN:	2024544050015 - Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura vial en el municipio de Los Patios, Norte de Santander		
1	2.3.2.02.02.005.24.09	Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura vial en el municipio de Los Patios, Norte de Santander	429,841,650.00
Fuente Recurso:	103-RECURSOS BALANCE PLUSVALIA		
Producto MGA:	2402115 - VÍA URBANA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO		
Código BPIN:	2024544050015 - Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura vial en el municipio de Los Patios, Norte de Santander		
		TOTALES	**559,841,650.00**

VIGENCIA: 2025
VALOR: QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS.

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE:

FUNCIONARIO: CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON
CARGO: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DOCUMENTO DE SOLICITUD: OFICIO

JESUS ANTONIO RINCON LOZANO
Secretario de Hacienda Municipal

ELABORÓ:
FRANCISCO JAVIER PABON GUERRERO

ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS PATIOS
NIT : 800044113-5

REGISTRO PRESUPUESTAL No. RP 1629

FECHA : ago-13/2025
A FAVOR DE : ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A S.A.S NIT: 901221652-9
COMPROMISO : INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA, CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO VIAS MEDIANTE LA MODALIDAD DE BACHEO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER . 4 Meses
DISPONIBILIDAD : CDP 0245 -- abr-24/2025
DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Nº. CONTRATO : PATIOS-MC-SI-46-2025
Nº. SECOP : CO1.PCCNTR.8178406
TIPO CONTRATO : 006 - CONTRATO DE INTERVENTORIA
DURACION : 04 MESES

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	DISPONIBILIDAD	VALOR
1	2.3.2.02.02.005.24.08	Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura vial en el municipio de Los Patios, Norte de Santander	0245 - abr-24/2025	27,931,326.57

Fuente Recurso: 671-REC. BALANCE RECURSOS PROPIOS
Producto MGA: 2402115 - VÍA URBANA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO
Código BPIN: 2024544050015 - Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura vial en el municipio de Los Patios, Norte de Santander

TOTALES **27,931,326.57**

VIGENCIA : 2025
VALOR : VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON 57 CENTAVOS.

JESUS ANTONIO RINCON LOZANO
Secretario de Hacienda Municipal

ELABORÓ:
FRANCISCO JAVIER PABON GUERRERO

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8178406
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	13 días de tiempo transcurrido *(8/08/2025 12:26:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	PATIOS-MC-SI-46-2025
Objeto del contrato	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA, CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO VIAS MEDIANTE LA MODALIDAD DE BACHEO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	40 minutos para terminar *(22/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	21/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	2/01/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA DE LOS PATIOS

COLOMBIA, Los Patios

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A SAS

COLOMBIA, Cúcuta
Número de documento 901221652

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	82000012604

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: ADRIANA CAROLINA LIZARAZO HIGUERA *Fecha de aprobación:* 11/08/2025 8:26:21 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: ALEXI ALLENDE VALENCIA LIZCANO *Fecha de aprobación:* 11/08/2025 11:18:48 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8178406_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Si ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Si ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Si ☑No

Seriedad de la oferta ☐Si ☑No

Cumplimiento ☑Si ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00 Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(8/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía	Fecha de vigencia (hasta)	8/03/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	

☑ Pago de salarios

☑% del valor del contrato	10,00 Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(8/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía	Fecha de vigencia (hasta)	8/11/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	

☑ Calidad del servicio

☑% del valor del contrato	20,00 Fecha de vigencia (desde)	8/11/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía	Fecha de vigencia (hasta)	8/11/2030 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐Si ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 8 días de tiempo transcurrido *(13/08/2025 2:43:50 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17672497	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	11.172.532,00 COP	Seguros del Estado	8/11/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Si ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8178406
Proveedor ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cl. 35 #N 3 80 B, Los Patios, Norte de Santander
Ubicación CO-NSA-54405 - Los Patios
País COLOMBIA
Departamento Norte de Santander
Municipio Los Patios
Dirección Cl. 35 #N 3 80 B, Los Patios, Norte de Santander
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1 CLL 35 #3-80 DOCE DE OCTUBRE COLOMBIA > Norte de Santander > Los Patios

1 CO1.PCCNTR.8178406

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 27.998.372,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 27.931.326,57
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	INTERCEBTORIA BACHEO	1,00	UN	27.998.372,00	27.931.326,57	27.998.372,00	27.931.326,57

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
MC 46 ACEPTACION DE LA OFERTA.pdf	MC 46 ACEPTACION DE LA OFERTA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ALEXI ALLENDE VALEN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	13741628	Guardar y notificar
Supervisor	CARLOS ALFREDO MU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	88222914	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	ALEXI ALLENDE VALENCIA LIZCANO	11 días de tiempo transcurrido (11/08/2025 11:18:48 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	ALEXI ALLENDE VALENCIA LIZCANO
Supervisor	CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZÓN	11 días de tiempo transcurrido (11/08/2025 11:18:48 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	ALEXI ALLENDE VALENCIA LIZCANO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalías - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	27.931.326,57
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		27.931.326,57

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024544050015	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	0245	CDP	No se ha iniciado				-	Editar

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐								

1629	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	27.931.326,57 COP	27.931.326,57 COP	-	-	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 27.931.326,57 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 27.931.326,57 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

DOCUMENTO ACEPTACIÓN DE OFERTA

Los Patios, Ocho (08) días de Agosto de 2025

Señor:
ADRIANA CAROLINA LIZARAZO HIGUERA
ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A S.A.S
CL 11 AN # 11 AE -220
E.S.D

De conformidad con los literales c) y d) del Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, y una vez agotado el procedimiento descrito en la Modalidad de Mínima Cuantía, en concordancia con la normatividad de la Contratación Estatal, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y en especial lo señalado en el Articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, una vez cumplidas y agotadas las etapas previas en la verificación de la Evaluación Económica de las propuestas y de la capacidad Jurídica - Técnica de la que presentó el menor valor a la Administración Municipal, me permito manifestarle que la propuesta presentada por Usted fue la oferta declarada hábil para llevar a cabo el objeto contractual de la Invitación Publica No. PATIOS-MC-SI-46-2025.

Por tanto, la presente Aceptación y la Propuesta por usted presentada constituyen el Contrato, de conformidad con lo establecido en el numeral 9 del Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, razón por la cual, bajo su responsabilidad y riesgo deberá ejecutar el siguiente objeto y cumplir con lo reseñado en cada uno de los Acápites del presente documento:

Cláusula 1. - Clase de Contrato
1.1. INTERVENTORIA
Cláusula 2. - Contratista
2.1 ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A S.A.S R.L ADRIANA CAROLINA LIZARAZO HIGUERA
Cláusula 3 – Identificación
3.1. NIT NO. 901221652 -9 C.C. 60.396.923
Cláusula 4 – Objeto
4.1. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA, CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO VIAS MEDIANTE LA MODALIDAD DE BACHEO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER
Cláusula 5 - Especificaciones Técnicas
EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, da a conocer las Especificaciones Técnicas requeridas las cuales deberán cumplirse bajo establecido en la invitación pública , propuesta y estudios previos

Cláusula 6 –Valor

6.1. Para todos los efectos legales y fiscales el valor del contrato será hasta por la suma de **VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTI SEIS PESOS CON CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE ($** 27.931.326,57**,00).,** y los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del contrato, junto con todos los impuestos, gravámenes y retenciones a que haya lugar.

Cláusula 7 - Forma de Pago

EL MUNICIPIO a través de la Secretaría de Infraestructura cancelará el valor del contrato resultante del presente proceso, de la siguiente manera:
PAGOS PARCIALES → Previa presentación de los siguientes documentos: (a) Factura correspondiente; (b) Certificación de Cumplimiento del objeto contractual expedida por el Supervisor designado y/o Interventor Contratado; (c) Copia de las Planillas de Pago donde se pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista con el Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales; (d) la acreditación del Pago de las estampillas correspondientes.
PARÁGRAFO 1: La contratación objeto de la presente invitación no genera relación laboral entre El Municipio y el contratista, ni con las personas que éste vincule para la ejecución del contrato.
PARÁGRAFO 2: Para proceder con el pago el contratista, deberá allegar la factura, conforme con los requisitos mínimos establecidos en los artículos 621 y 774 del Código del Comercio y el artículo 617 del Estatuto Tributario.
PARÁGRAFO 3: Los pagos que efectúe el MUNICIPIO en virtud del/los contratos del presente proceso estarán sujetos a la programación de los recursos del Programa Anual de Caja — PAC y a los recursos disponibles.
PARÁGRAFO 4: La cancelación del valor del/los contrato/s, por parte del MUNICIPIO al Contratista, se hará realizando consignaciones en las cuentas que posea el contratista en una entidad financiera, de acuerdo a la información suministrada por el contratista, certificado de debe presentar junto con su oferta.

Cláusula 8 - Imputación Presupuestal

8.1. El presente contrato cuenta con los Certificado de Disponibilidad Presupuestal, previa solicitud de expedición, como se indica a continuación:

Existe viabilidad financiera para adelantar el proceso contractual según disponibilidades No. CDP 0245 de Abril 24 de 2025

Cláusula 9 – Plazo

9.1. El plazo de ejecución del presente Contrato será 4 MESES, contado a partir del Acta de Inicio entre las partes contratantes, con el visto bueno del supervisor designado, previo cumplimiento de los Requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución del mismo.

Cláusula 10 - Obligaciones del Municipio

10.1. Cancelar el valor de la Aceptación de Oferta en la forma y términos establecidos en el Estudio Previo, y/o Anexo Técnico, y/o Invitación Pública.
10.2. Permitir el desarrollo y la ejecución de la Aceptación de Oferta por parte del CONTRATISTA.
10.3. Las demás que correspondan para el cumplimiento del objeto contratado y de acuerdo con la naturaleza del mismo.
10.4. Designar al Supervisor del Contrato.
10.5. Hacer las recomendaciones pertinentes a través Supervisor designado para un efectivo cumplimiento del contrato.
10.6. Permitir el desarrollo y la ejecución de la aceptación de oferta por parte del CONTRATISTA.

Cláusula 11 - Obligaciones del Contratista

11.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1. Presentar informe mensual de la prestación del servicio con el fin de verificar que la ejecución se esté llevando a cabo conforme a las normas especiales del servicio.

2. Atender las recomendaciones que el Municipio le efectúe, por intermedio del funcionario designado para ejercer la vigilancia y control del contrato, para la correcta y eficaz ejecución del contrato exigiendo evidencias fotográficas y reporte de actividades.
3. El contratista deberá constituir las garantías exigidas para la ejecución del presente contrato., a que hubiere lugar.
4. De conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 que modificó el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, el oferente que resulte seleccionado deberá efectuar los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y el pago de los aportes parafiscales, si a estos últimos hubiere lugar. Para verificar el cumplimiento de dicha obligación, deberá presentar mensualmente, el recibo de pago de dichos aportes.
5. El contratista seleccionado deberá mantener indemne a la entidad contratante de cualquier perjuicio que se derive de la ejecución del contrato. (art. 6 del D. 4828 de 2008).

Cláusula 12 - Garantías y Mecanismos de Cobertura del Riesgo

12.1. EL CONTRATISTA deberá constituir a favor de la **Alcaldía de Los Patios,** y a satisfacción de la misma, de conformidad con lo establecido en el Artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015 y teniendo en cuenta la naturaleza, condiciones y forma de pago del contrato se considera que de acuerdo a los riegos que se pueda originar en el presente proceso de selección se exigirán las siguientes garantías:

Según contrato electrónico del Secop II

No obstante, lo anterior, en cualquier evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue su vigencia deberá ampliarse o prorrogarse las correspondientes garantías.

Cláusula 13 – Supervisión

13.1. La Supervisión del presente contrato la ejercerá La Secretaría de Infraestructura. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato, para lo cual, deberá realizar la evaluación y verificación de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones dentro del término de ejecución contractual pactado y en los artículos 83 y siguientes de la Ley 1474 de 2011 y lo dispuesto en el Manual de Contratación de la Alcaldía Municipal.

PARÁGRAFO PRIMERO: El supervisor ejercerá la labor encomendada de acuerdo con lo establecido en los documentos del Manual de Contratación de la Alcaldía y en particular con los relacionados, con la ejecución, supervisión y liquidación de la aceptación de oferta.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El supervisor verificará el cumplimiento de los requisitos para la ejecución de la comunicación de aceptación de oferta derivada del presente proceso y ejercerá todas las obligaciones propias de la supervisión.

PARÁGRAFO TERCERO: El Supervisor del Contrato, deberá expedir el Certificado de Cumplimiento a entera Satisfacción para que se pueda efectuar por parte de esta Entidad el pago correspondiente al contratista por haber ejecutado el objeto contractual.

PARÁGRAFO CUARTO: Este funcionario ejercerá estricta supervisión y control del cumplimiento del objeto contractual y estará en contacto con el contratista, para dar soluciones a los problemas presentados en un momento determinado, velando siempre por la calidad de la prestación del servicio y ejercerá su función acorde a lo señalado en los artículos 82 y 83 de la Ley 1474 de 2011.

Cláusula 14 - Anexos del Contrato

14.1. La Invitación Pública, el Estudio Previo y el Análisis del Sector.
14.2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
14.3. La Oferta presentada por el Contratista.
14.4. Los Informes de actividades presentados por el Contratista.

Cláusula 15 - Perfeccionamiento y Ejecución

15.1. El presente contrato se perfecciona con las firmas de las partes. Para su ejecución requiere de los siguientes documentos: **(i)** El registro presupuestal; **(ii)** De la aprobación de la garantía de que trata la Cláusula 12 del presente Contrato y **(iii)** De la suscripción del acta de inicio del contrato celebrado.

Cláusula 16 – Liquidación

1.1. El presente contrato será objeto de liquidación de conformidad con lo establecido en el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Cláusula 17 - Lugar de Ejecución y Domicilio Contractual

17.1. Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollará de acuerdo a las indicaciones del Supervisor del Contrato y el domicilio contractual es el Municipio de Los Patios, con todos los protocolos de bioseguridad que sea necesarios, para la entrega adecuada de los ítems aquí requeridos.

Para constancia, se firma en el Municipio de Los Patios.

ALEXI ALLENDE VALENCIA LIZCANO
Alcalde Municipal
Municipio Los patios

	Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
Aprobó:	CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
Revisó:	JONATHAN CONTRERAS ROLON	JEFE OFICINA JYC	
Elaboró:	CLAUDIA ALEXANDRA MOROS FONTALVO	ASESORA JURIDICA EXTERNA	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la Firma del Remitente.			

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-44-101036826	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	10	2025	22	08	2025	00:00	22	11	2030	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A S.A.S.	NIT: 901.221.652-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 11 AN NRO. 11 AE - 220 TOR DE CENTENARIO BR GUAIMARAL	CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	3005596915

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE LOS PATIOS	NIT: 800.044.113-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 35 3 80 BRR DOCE DE OCTUBRE	LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER	5808317

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PATIOS-MC-SI-46-2025, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA, CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO VIAS MEDIANTE LA MODALIDAD DE BACHEO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER.
LA GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO SE OTORGA POR CINCO (5) AÑOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DE LAS OBRAS Y SU VIGENCIA SE AJUSTA CON LA PRESENTACION DEL ACTA RESPECTIVA.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/08/2025	22/03/2026	$2,793,132.66	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	22/08/2025	22/11/2028	$2,793,132.66	
CALIDAD DEL SERVICIO	22/11/2025	22/11/2030	$5,586,265.31	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA DEL 22/08/25, SE ACLARA LA VIGENCIA DE LA POLIZA ARRIBA CITADA.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****159,059.00	$ *******8,000.00	$ *****31,741.00	$ **********198,801.00	$ *******11,172,530.63	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GUTIERREZ Y ASOCIADOS LTDA ASESORES	205075	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

49-44-101036826

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-44-101036826	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	10	2025	22	08	2025	00:00	22	11	2030	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A S.A.S.	IDENTIFICACIÓN	NIT: 901.221.652-9
DIRECCIÓN: CL 11 AN NRO. 11 AE - 220 TOR DE CENTENARIO BR GUAIMARAL	CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	TELÉFONO:	3005596915

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE LOS PATIOS	IDENTIFICACIÓN	NIT: 800.044.113-5
DIRECCIÓN: CL 35 3 80 BRR DOCE DE OCTUBRE	CIUDAD: LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER	TELÉFONO	5808317

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB · pse · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · éxito · MOVIIRED

Gana Gana · SURTIMAX · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****159,059.00	$ *******8,000.00	$ ******31,741.00	$ **********198,801.00	$ *******11,172,530.63	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GUTIERREZ Y ASOCIADOS LTDA ASESORES	205075	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)1101540218636 1(3900)0000001988 01(96)20260822

REFERENCIA PAGO: 1101540218636-1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-44-101036826	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	10	2025	22	08	2025	00:00	22	11	2030	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A S.A.S.		**NIT: 901.221.652-9**
DIRECCIÓN: CL 11 AN NRO. 11 AE - 220 TOR DE CENTENARIO BR GUAIMARAL		**CIUDAD:** CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	**TELÉFONO:** 3005596915

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE LOS PATIOS		**NIT: 800.044.113-5**
DIRECCIÓN: CL 35 3 80 BRR DOCE DE OCTUBRE		**CIUDAD:** LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER	**TELÉFONO:** 5808317

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

49-44-101036826

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ación financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? (•) Sí ( ) No

Garantías por lotes, grupos o etapas ( ) Sí (•) No

Seriedad de la oferta ( ) Sí (•) No

Cumplimiento ( ) Sí (•) No

Cumplimiento del contrato

% del valor del contrato	10,000000	Fecha de vigencia (desde)	8/08/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/03/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Pago de salarios

% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	8/08/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/11/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Calidad del servicio

% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	23 días para terminar *(8/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/11/2030 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ( ) Sí (•) No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido *(9/10/2025 4:40:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

s del proveedor:

de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Detalle	Acciones
01.WRT.18115233	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	11.172.430,63 COP	SEGUROS DEL ESTADO	22/11/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aceptada	Detalle	
01.WRT.17672497	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	11.172.532,00 COP	Seguros del Estado	8/11/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aceptada	Detalle	

Dando cumplimiento a lo establecido en el Articulo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción de 2011", el Secretario de Infraestructura **CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZÓN** en mi condición de supervisor del **CONTRATO DE INTERVENTORÍA PATIOS-MC-SI-46-2025**, me permito presentar informe de supervisión en los términos establecidos en la norma antes transcrita:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	x	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	PATIOS-MC-SI-46-2025	de	11 DE AGOSTO DE 2025		
Objeto del contrato: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA, CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO VIAS MEDIANTE LA MODALIDAD DE BACHEO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER					

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Supervisor:	**Ingeniero Carlos Alfredo Muñoz Pinzón – Secretario de Infraestructura**
Por parte del contratista:	Adriana Carolina Lizarazo Higuera
Otros asistentes:	No hay otros asistentes

Lugar donde se realiza la reunión	**Secretaría de Infraestructura**		
Hora de inicio (a.m./p.m.)	**09:00 am**	**Hora de finalización (a.m./p.m.)**	**11:30 am**

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

SE REUNEN EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, LAS PERSONAS ANTERIORMENTE NOMBRADAS CON EL MOTIVO DE REALIZAR INFORME DE OBRA EJECUTADA A LA FECHA DEL 21 DE OCTUBRE DE 2.025, CONTRATO DE INTERVENTORÍA PATIOS-MC-SI-46-2025 DEL 11 DE AGOSTO DE 2025.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad /Compromiso	Se relacionan las actividades realizadas durante el periodo 22 de septiembre de 2025 al 21 de octubre de 2025 a continuación:

Se realiza seguimiento y verificación a las actividades realizadas en obras para el acta final, en la obra se desarrollaron las siguientes actividades:

Se inicia la obra, la Secretaria de Infraestructura entrega a LA INTERVENTORIA la información del proyecto.

El contratista efectúa la contratación del personal calificado, se realiza la afiliación de ARL y salud del personal, se realiza recorrido de la obra en compañía del contratista de obra, interventoría y supervisor, con el fin de corroborar las dimensiones de las cajas a intervenir y las adiciones realizadas.

Durante el segundo mes de ejecución del contrato de obra, la Supervisión realizó el seguimiento a la gestión de la Interventoría en relación con las actividades de mantenimiento vial mediante la modalidad de bacheo, ejecutadas en la zona sur del Municipio de Los Patios, Norte de Santander.

La Supervisión verificó que la Interventoría efectuó control, inspección y registro de las siguientes actividades desarrolladas en obra:

Corte de pavimento existente, se constató la correcta ejecución del corte en las áreas definidas, con un área de 1314,52 m2

Demolición y excavación, se inspeccionó la demolición de acuerdo con las especificaciones técnicas que incluyeron el corte de 311,09 ml de pavimento, la demolición de 1.304,44 m2 de carpeta de rodadura existente, así como la excavación manual de 221,57 m3 de material sin clasificar.

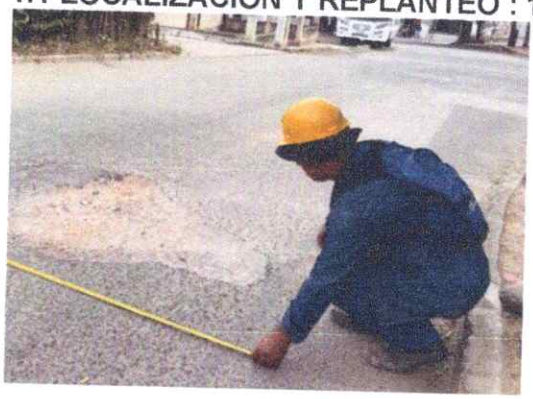
Con el desarrollo de estas actividades se avanzó al control de calidad de la conformación y compactación de 1.304,44 m2 de la subrasante estructural, sobre la cual se instaló una capa de 195,51 m3 de base granular, garantizando la estabilidad y soporte de las zonas intervenidas. Posteriormente, se aplicó riego de liga asfáltica en un área de 1.304,44 m2 y se efectuó la instalación de mezcla asfáltica tipo MDC-19 en un área total de 117.40 m2.

De igual manera, se realizó el retiro y disposición final de 419,07 m3 de material sobrante, los cuales fueron transportados y dispuestos en la escombrera Municipal de Los Patios, asegurando el cumplimiento de las medidas ambientales y el manejo adecuado de los residuos de construcción y demolición.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

1.0 PRELIMINARES

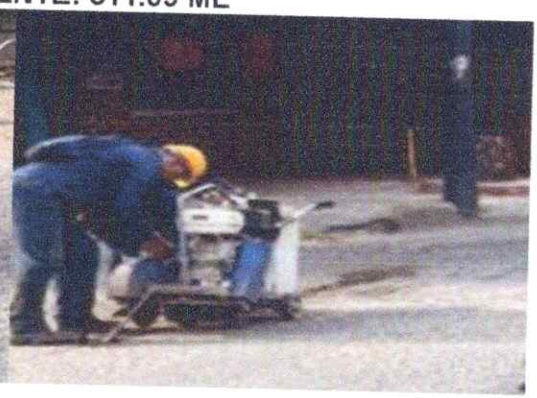
1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO : 1314.52 M2



2.0 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES

2.10 CORTE DE PAVIMENTO EXISTENTE: 311.09 ML





2.20 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE: 1304.44 M2



2.30 EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR: 221.57 M3



2.40 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE: 1304.44 M2



2.50 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR PARA BACHEO: 195.51 M3



3.00 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN
3.10 RIEGO DE LIGA: 1304.44 M2




3.20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA MDC-19 PARA BACHEO: 117.40 M3




4.00 VARIOS

4.10 RETIRO DE SOBRANTES (INCLUYE TRANSPORTE Y PAGO DE ESCOMBRERA) : 419.07 M3

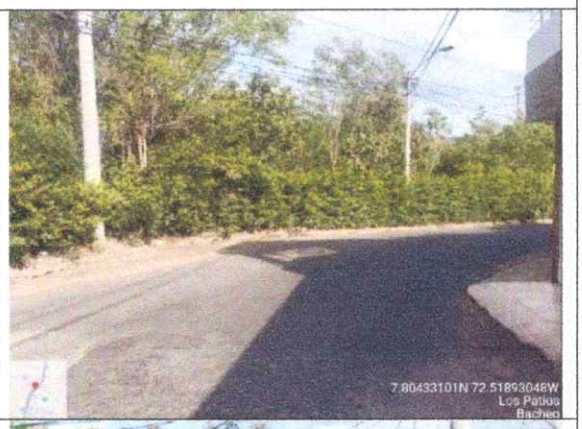


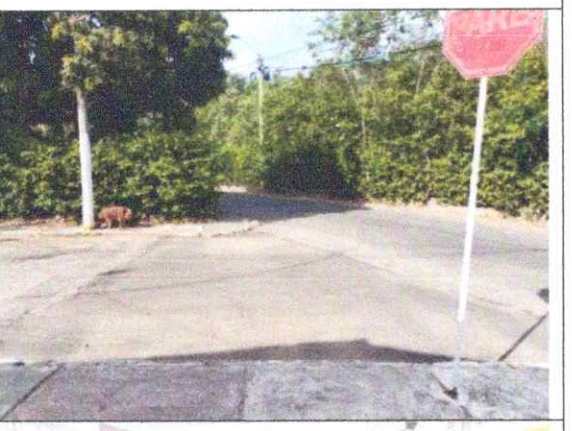

PMT PLAN DE MANEJO DE TRAFICO





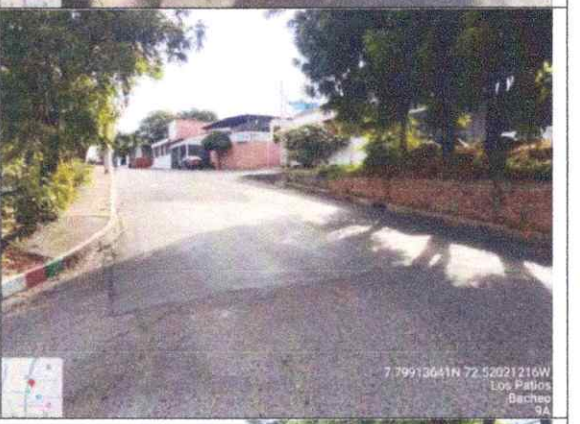
A continuación, se presentan las cajas intervenidas, indicando la nomenclatura asignada, la dirección correspondiente y el área intervenida, acompañadas de su respectivo registro fotográfico.

Caja	Dirección	Largo (m)	Ancho (m)	Área (m2)	Evidencia Fotográfica
1,0	AV 9F ENTRE CLL 12 Y 16 SUR	25,0	7,3	182,5	
2A	AV 9F ENTRE CLL 12 Y 16 SUR	3,7	6,9	25,5	
2B	AV 9F ENTRE CLL 12 Y 16 SUR	8,4	4,3	36,3	

Caja	Dirección	Largo (m)	Ancho (m)	Área (m2)	Evidencia Fotográfica
3,0	AV 9F ENTRE CLL 12 Y 16 SUR	4,2	6,0	24,9	
4A	AV 9F ENTRE CLL 12 Y 16 SUR	14,4	6,2	88,6	
4B	AV 9F ENTRE CLL 12 Y 16 SUR	41,5	4,1	170,2	

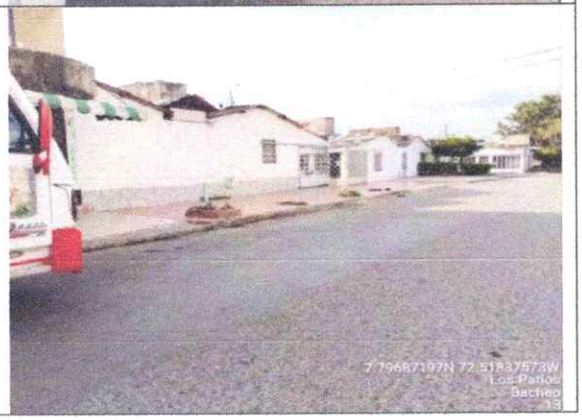
Caja	Dirección	Largo (m)	Ancho (m)	Área (m2)	Evidencia Fotográfica
4C	AV 9F ENTRE CLL 12 Y 16 SUR	6,0	2,0	12,0	
5A	AV 9F ENTRE CLL 21 Y 26	10,0	9,8	97,8	
5B	AV 9F ENTRE CLL 21 Y 26	8,6	1,6	13,8	

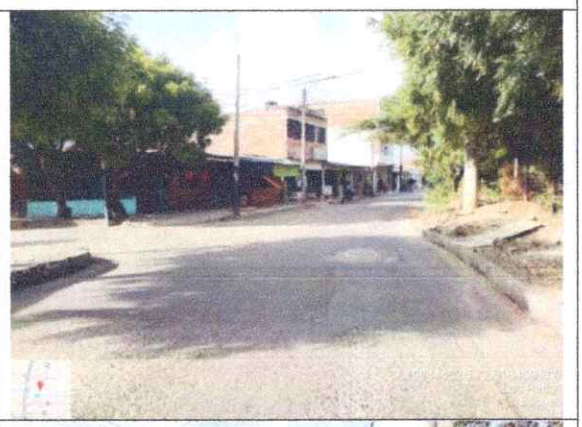
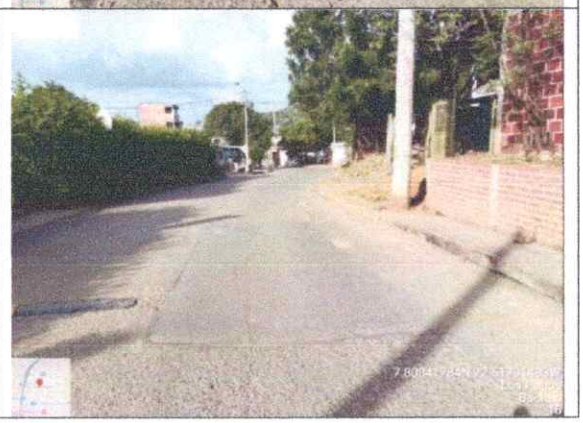
Caja	Dirección	Largo (m)	Ancho (m)	Área (m2)	Evidencia Fotográfica
6A	AV 9F ENTRE CLL 21 Y 26	9,8	9,0	88,1	
6B	AV 9F ENTRE CLL 21 Y 26	18,8	1,6	30,1	
7,0	AV 9F ENTRE CLL 21 Y 26	4,7	3,2	15,1	

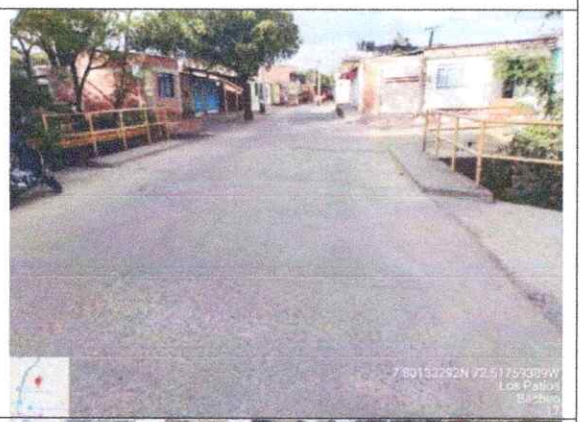
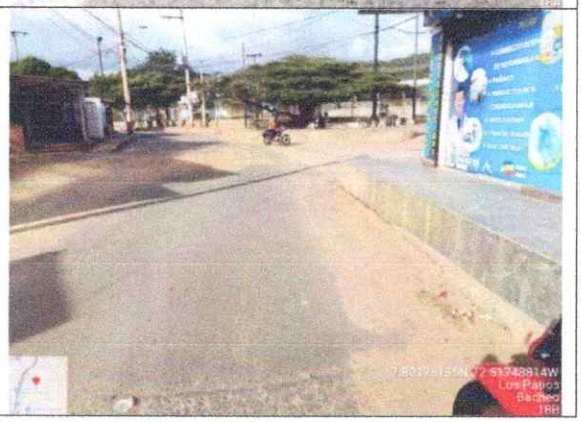
Caja	Dirección	Largo (m)	Ancho (m)	Área (m2)	Evidencia Fotográfica
8,0	AV 9F ENTRE CLL 21 Y 26	5,4	3,5	18,8	
9A	AV 9F ENTRE CLL 21 Y 26	6,7	11,1	74,5	
9B	AV 9F ENTRE CLL 21 Y 26	30,5	2,4	72,3	

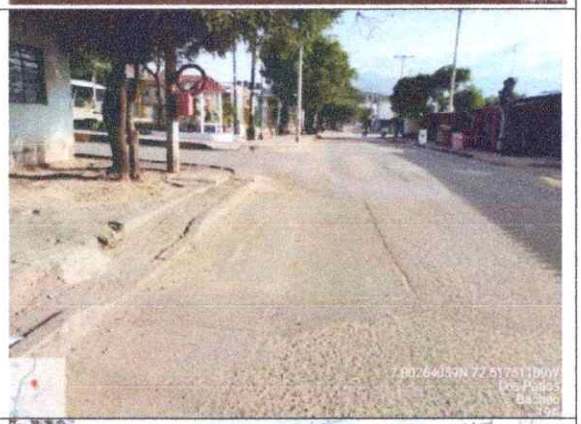
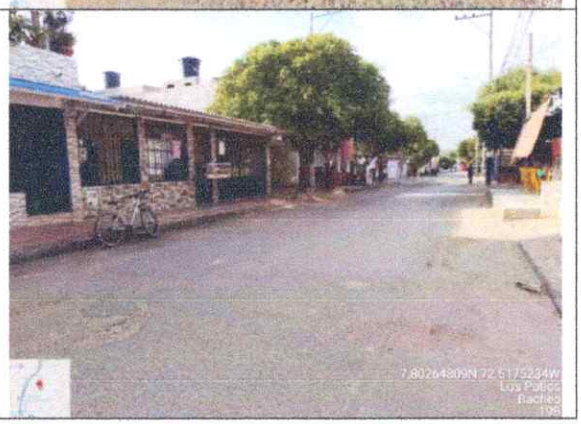
Caja	Dirección	Largo (m)	Ancho (m)	Área (m2)	Evidencia Fotográfica
9C	AV 9F ENTRE CLL 21 Y 26	8,9	2,9	25,5	
9D	AV 9F ENTRE CLL 21 Y 26	16,0	2,0	32,0	
10A	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	30,80	6,00	184,800	

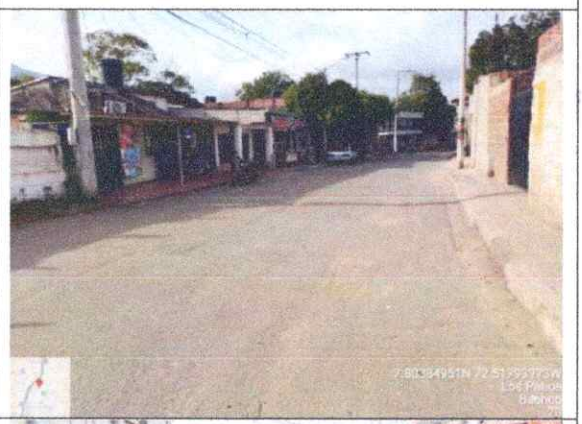
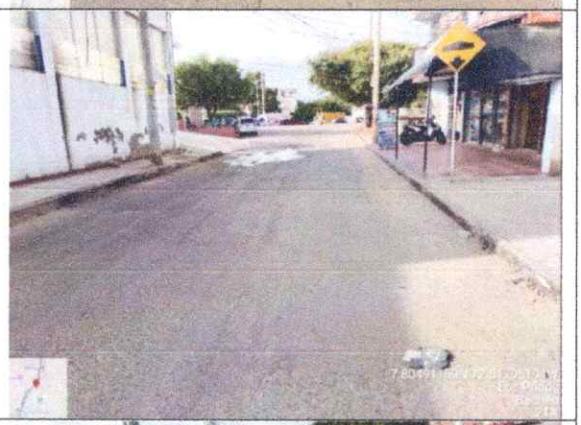
Caja	Dirección	Largo (m)	Ancho (m)	Área (m2)	Evidencia Fotográfica
10B	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	33,69	5,50	185,270	
10C	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	8,65	2,55	22,058	
10D	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	5,95	3,70	22,015	

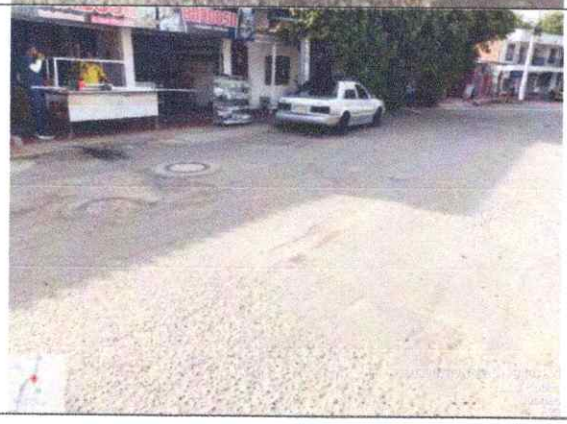
Caja	Dirección	Largo (m)	Ancho (m)	Área (m2)	Evidencia Fotográfica
11	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 5A Y AV 6	28,00	6,00	168,000	
12	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 5A Y AV 6	6,00	5,00	30,000	
13	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 5A Y AV 6	10,00	3,70	37,000	

Caja	Dirección	Largo (m)	Ancho (m)	Área (m2)	Evidencia Fotográfica
14	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	8,80	6,70	58,960	
15	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	2,80	2,3	6,440	
16	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	5,30	4,25	22,504	

Caja	Dirección	Largo (m)	Ancho (m)	Área (m2)	Evidencia Fotográfica
17	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	5,18	5,0	25,880	
18A	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10 LLANITOS	18,84	9,2	172,800	
18B	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10 LLANITOS	6,90	2,2	14,835	

Caja	Dirección	Largo (m)	Ancho (m)	Área (m2)	Evidencia Fotográfica
18C	AVENIDA 10 LLANITOS	10,60	4,5	47,190	
19A	AVENIDA 10 LLANITOS	3,70	2,2	8,150	
19B	AVENIDA 10 LLANITOS	28,75	4,3	123,625	

Caja	Dirección	Largo (m)	Ancho (m)	Área (m2)	Evidencia Fotográfica
20	AVENIDA 10 LLANITOS	2,85	4,0	11,260	
21A	AVENIDA 10 LLANITOS	3,30	4,7	15,50	
21B	AVENIDA 10 LLANITOS	25,00	6,0	150,00	

Caja	Dirección	Largo (m)	Ancho (m)	Área (m2)	Evidencia Fotográfica
22	AVENIDA 10 LLANITOS	1,66	0,6	1,030	
23	AVENIDA 10 LLANITOS	4,24	1,7	7,208	

CANTIDADES EJECUTADAS MES 2					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	1314,52	$ 8.900	$ 11.699.228,00
2	**DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES**				
2,1	CORTE DE PAVIMENTO EXISTENTE	ML	311,09	$ 8.700	$ 2.706.483,00
2,2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE	M2	1304,44	$ 33.000	$ 43.046.520,00
2,3	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	221,57	$ 89.700	$ 19.874.829,00
2,4	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE	M2	1304,44	$ 14.600	$ 19.044.824,00
2,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR PARA BACHEO	M3	195,51	$ 170.100	$ 33.256.251,00
3	**OBRAS DE PAVIMENTACIÓN**				
3,1	RIEGO DE LIGA	M2	1304,44	$ 7.500	$ 9.783.300,00
3,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA MDC-19 PARA BACHEO	M3	117,40	$ 1.087.800	$ 127.707.720,00
4	**VARIOS**				
4,10	RETIRO DE SOBRANTES (INCLUYE TRANSPORTE Y PAGO DE ESCOMBRERA)	M3	419,07	$ 64.400	$ 26.988.108,00

PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT)		$ 0,00
ADMINISTRACIÓN	**29%**	$ 85.291.106,00
IMPREVISTOS	**0%**	$ 0,00
UTILIDAD	**6%**	$ 17.646.436,00
VALOR TOTAL CON AIU		**$ 397.044.805,00**

En conclusión, la Supervisión confirma que la Interventoría realizó el seguimiento técnico correspondiente a las actividades ejecutadas en este primer mes, garantizando que los procesos constructivos se ajustaran a las especificaciones del contrato y a las normas aplicables.

ALCALDIA DE LOS PATIOS	GESTION ADMINISTRATIVA	Código: GA-F-08
	INFORME DE SUPERVISION	Versión: 03
	FORMATO	Aprobación: 01/11/2022

Compromisos adquiridos		
Compromiso	**Fecha de entrega**	**Responsable**
Entregar informe de avance	24/11/2025	Contratista

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto	**Valor**
Valor inicial del contrato	**$ 27.931.326,57**
Valor Adiciones	**$ 0**
Valor Total del Contrato	**$ 27.931.326,57**
Valor pagado	**$ 12.047.442,19**
Valor causado que no se ha pagado	**$ 11.809.442,19**
Valor total ejecutado	**$ 23.856.884,38**
Valor no ejecutado	**$ 4.074.442,19**

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Valor
ACTA PARCIAL 1	$ 12.047.442,19

Fecha de la próxima reunión 24 de Noviembre de 2025

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 23 días del mes de Octubre de 2025

CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON
Supervisor(a) del Contrato

ADRIANA LIZARAZO HIGUERA
Contratista

ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A SAS	CONTRATO PATIOS-MC-SI-46-2025
	INFORME DE INTERVENTORIA ACTA PARCIAL N°1
	asesorandocontratos@gmail.com

22 de octubre de 2025
San José de Cúcuta, Norte de Santander

SEÑORES
ALCALDIA DE LOS PATIOS

Según Propuesta del Proceso Contractual

Contrato N.° PATIOS-MC-SI-46-2025 DEL 08 DE AGOSTO DE 2025

Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA, CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO VIAS MEDIANTE LA MODALIDAD DE BACHEO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER.

En cumplimiento de lo establecido en la propuesta presentada por el contratista y aceptada dentro del proceso contractual, se relaciona el personal de nómina asignado para la ejecución del contrato:

RELACIÓN DEL PERSONAL

CARGO	NOMBRE	C.C.	TARIFA SALARIO MES $
DIRECTOR DE INTERVENTORIA INGENIERO CIVIL	PEDRO DAVID GALNDO GUTIERREZ	88.228.531	1.423.500,00
INGENIERO RESIDENTE	JUAN MANUEL ANGARITA BAUTISTA	1.094.506.307	3.000.000,00
TECNOLOGO EN SST	PAOLA ANDREA ROMAN HERNANDEZ	1.090.363.860	1.423.500,00
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	MARUAN JHOSUA DIAZ PEÑARANDA	1.090.512.933	2.000.000,00

ADRIANA LIZARAZO HIGUERA
RL ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A S.A.S.
CC 60396923

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901221652	9	ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cl 11 an # 11ae-220	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5712511	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1806592581	9492519939	E	2025/09/11	2025/09/29	BANCO DAVIVIENDA	18	$4,644,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (7 Afiliados)						$9,124,971	$1,460,100			$9,124,971	$365,100			$9,124,971	$365,100			$9,124,971	$193,200		$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVO (4 Afiliados)						$2,254,971	$360,900			$2,254,971	$90,300			$2,254,971	$90,300			$2,254,971	$157,200		$0	$0
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (4 Afiliados)						$2,254,971	$360,900			$2,254,971	$90,300			$2,254,971	$90,300			$2,254,971	$157,200		$0	$0
1	CC	1090396712	BALLESTEROS CELIS LUIS ANDRES	230301	2	$94,904	$15,200	EPS037	2	$94,904	$3,800	CCF36	2	$94,904	$3,800	14-11	2	$94,904	$6,700	2	$0	$0
2	CC	5455984	DIAZ FUENTES WILSON ROLANDO	230301	30	$1,423,500	$227,800	CCFC50	30	$1,423,500	$57,000	CCF36	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
3	CC	1094506379	FERNANDEZ BAUTISTA RENSON ENRIQUE	230301	5	$641,667	$102,700	EPS005	5	$641,667	$25,700	CCF36	5	$641,667	$25,700	14-11	5	$641,667	$44,700	5	$0	$0
4	CC	1090532629	PATIÑO SERNA DAYNE ALEJANDRA	230301	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF36	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	$6,700	2	$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (3 Afiliados)						$6,870,000	$1,099,200			$6,870,000	$274,800			$6,870,000	$274,800			$6,870,000	$36,000		$0	$0
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (3 Afiliados)						$6,870,000	$1,099,200			$6,870,000	$274,800			$6,870,000	$274,800			$6,870,000	$36,000		$0	$0
5	CC	60396923	LIZARAZO HIGUERA ADRIANA CAROLINA	25-14	30	$2,600,000	$416,000	EPS005	30	$2,600,000	$104,000	CCF36	30	$2,600,000	$104,000	14-11	30	$2,600,000	$13,600	30	$0	$0
6	CC	1092358834	MENDEZ JAIME ANYI YOULIN	25-14	30	$2,600,000	$416,000	EPS037	30	$2,600,000	$104,000	CCF36	30	$2,600,000	$104,000	14-11	30	$2,600,000	$13,600	30	$0	$0
7	CC	1090481226	SEPULVEDA QUINTERO PAOLA ANDREA	230201	30	$1,670,000	$267,200	EPS037	30	$1,670,000	$66,800	CCF36	30	$1,670,000	$66,800	14-11	30	$1,670,000	$8,800	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: INTERVENTORIAS (6 Afiliados)						$7,132,517	$1,141,300			$7,132,517	$285,400			$7,132,517	$285,400			$7,132,517	$496,800		$0	$0
Centro de Trabajo: INTERVENTORIAS (6 Afiliados)						$7,132,517	$1,141,300			$7,132,517	$285,400			$7,132,517	$285,400			$7,132,517	$496,800		$0	$0
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (6 Afiliados)						$7,132,517	$1,141,300			$7,132,517	$285,400			$7,132,517	$285,400			$7,132,517	$496,800		$0	$0
8	CC	1094506307	ANGARITA BAUTISTA JUAN MANUEL	25-14	15	$1,900,000	$304,000	EPS037	15	$1,900,000	$76,000	CCF36	15	$1,900,000	$76,000	14-11	15	$1,900,000	$132,300	15	$0	$0
9	CC	1090512933	DIAZ PEÑARANDA MARIAN JHOSUA	25-14	10	$666,667	$106,700	EPS005	10	$666,667	$26,700	CCF36	10	$666,667	$26,700	14-11	10	$666,667	$46,500	10	$0	$0
10	CC	1098639093	FRANCO PEREZ DANIEL ERNESTO	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF36	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
11	CC	88228531	GALINDO GUTIERREZ PEDRO DAVID	230201	15	$711,750	$113,900	EPS005	15	$711,750	$28,500	CCF36	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0
12	CC	88246705	PATIÑO ARROYAVE JHONNY ELVER	230201	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF36	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	$10,000	3	$0	$0
13	CC	1090363860	ROMAN HERNANDEZ PAOLA ANDREA	25-14	15	$711,750	$113,900	EPS037	15	$711,750	$28,500	CCF36	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0
Total	**Afiliados(13)**					$16,257,488	$2,601,400			$16,257,488	$650,500			$16,257,488	$650,500			$16,257,488	$690,000		$0	$0

2025/11/05 04:25 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901221652	9	ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cl 11 an # 11ae-220	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5712511	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1806592581	9492519939	E	2025/09/11	2025/09/29	BANCO DAVIVIENDA	18	$4,644,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$2,601,400	$29,600	$0	$2,631,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,356,600	$15,400	$0	$1,372,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$840,900	$9,600	$0	$850,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$403,900	$4,600	$0	$408,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$690,000	$7,900	$0	$697,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	$690,000	$7,900	$0	$697,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$650,500	$7,400	$0	$657,900
COMFAORIENTE	CCF36	890,500,675	6	13	$650,500	$7,400	$0	$657,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$650,500	$7,500	$0	$658,000
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	$57,000	$700	$0	$57,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$408,600	$4,700	$0	$413,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$184,900	$2,100	$0	$187,000
TOTAL				13	$4,592,400	$52,400	$0	$4,644,800

2025/11/05 04:25 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901221652	9	ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cl 11 an # 11ae-220	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5712511	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1875141212	9493748086	E	2025/10/14	2025/10/24	BANCO DAVIVIENDA	10	$6,573,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (6 Afiliados)						$10,634,850	$1,701,700			$10,634,850	$425,500			$10,634,850	$425,500			$10,634,850	$374,000		$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVO (3 Afiliados)						$4,941,350	$790,700			$4,941,350	$197,700			$4,941,350	$197,700			$4,941,350	$344,100		$0	$0
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (3 Afiliados)						$4,941,350	$790,700			$4,941,350	$197,700			$4,941,350	$197,700			$4,941,350	$344,100		$0	$0
1	CC	5455840	DIAZ FUENTES WILMER ADRIAN	230301	8	$379,600	$60,800	CCFC50	8	$379,600	$15,200	CCF36	8	$379,600	$15,200	14-11	8	$379,600	$26,500	8	$0	$0
2	CC	5455984	DIAZ FUENTES WILSON ROLANDO	230301	15	$711,750	$113,900	CCFC50	15	$711,750	$28,500	CCF36	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0
3	CC	1094506379	FERNANDEZ BAUTISTA RENSON ENRIQUE	230301	30	$3,850,000	$616,000	EPS005	30	$3,850,000	$154,000	CCF36	30	$3,850,000	$154,000	14-11	30	$3,850,000	$268,000	30	$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (3 Afiliados)						$5,693,500	$911,000			$5,693,500	$227,800			$5,693,500	$227,800			$5,693,500	$29,900		$0	$0
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (3 Afiliados)						$5,693,500	$911,000			$5,693,500	$227,800			$5,693,500	$227,800			$5,693,500	$29,900		$0	$0
4	CC	60396923	LIZARAZO HIGUERA ADRIANA CAROLINA	25-14	30	$2,600,000	$416,000	EPS005	30	$2,600,000	$104,000	CCF36	30	$2,600,000	$104,000	14-11	30	$2,600,000	$13,600	30	$0	$0
5	CC	1092358834	MENDEZ JAIME ANYI YOULIN	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF36	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
6	CC	1090481226	SEPULVEDA QUINTERO PAOLA ANDREA	230201	30	$1,670,000	$267,200	EPS005	30	$1,670,000	$66,800	CCF36	30	$1,670,000	$66,800	14-11	30	$1,670,000	$8,800	30	$0	$0

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: INTERVENTORIAS (6 Afiliados)						$13,070,500	$1,998,600			$13,070,500	$429,900			$13,070,500	$429,900			$13,070,500	$748,100		$0	$0
Centro de Trabajo: INTERVENTORIAS (6 Afiliados)						$13,070,500	$1,998,600			$13,070,500	$429,900			$13,070,500	$429,900			$13,070,500	$748,100		$0	$0
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (6 Afiliados)						$13,070,500	$1,998,600			$13,070,500	$429,900			$13,070,500	$429,900			$13,070,500	$748,100		$0	$0
7	CC	1094506307	ANGARITA BAUTISTA JUAN MANUEL	25-14	30	$3,800,000	$608,000	EPS037	30	$3,800,000	$152,000	CCF36	30	$3,800,000	$152,000	14-11	30	$3,800,000	$264,500	30	$0	$0
8	CC	1090512933	DIAZ PEÑARANDA MARIAN JHOSUA	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF36	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
9	CC	1098639093	FRANCO PEREZ DANIEL ERNESTO	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF36	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
10	CC	88228531	GALINDO GUTIERREZ PEDRO DAVID	230201	15	$711,750	$85,500	EPS005	15	$711,750	$0	CCF36	15	$711,750	$0	14-11	15	$711,750	$0	15	$0	$0
11	CC	88228531	GALINDO GUTIERREZ PEDRO DAVID	230201	15	$711,750	$113,900	EPS005	15	$711,750	$28,500	CCF36	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0
12	CC	88246705	PATIÑO ARROYAVE JHONNY ELVER	230201	20	$949,000	$151,900	EPS037	20	$949,000	$38,000	CCF36	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0
13	CC	88246705	PATIÑO ARROYAVE JHONNY ELVER	230201	10	$474,500	$57,000	EPS037	10	$474,500	$0	CCF36	10	$474,500	$0	14-11	10	$474,500	$0	10	$0	$0
14	CC	1090363860	ROMAN HERNANDEZ PAOLA ANDREA	25-14	6	$284,700	$45,600	EPS037	6	$284,700	$11,400	CCF36	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
15	CC	1090363860	ROMAN HERNANDEZ PAOLA ANDREA	25-14	24	$1,138,800	$136,700	EPS037	24	$1,138,800	$0	CCF36	24	$1,138,800	$0	14-11	24	$1,138,800	$0	24	$0	$0
Total	**Afiliados(12)**					$23,705,350	$3,700,300			$23,705,350	$855,400			$23,705,350	$855,400			$23,705,350	$1,122,100		$0	$0

2025/11/05 04:27 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901221652	9	ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cl 11 an # 11ae-220	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5712511	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1875141212	9493748086	E	2025/10/14	2025/10/24	BANCO DAVIVIENDA	10	$6,573,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$3,700,300	$22,800	$0	$3,723,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,754,100	$10,800	$0	$1,764,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,270,700	$7,800	$0	$1,278,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$675,500	$4,200	$0	$679,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$1,122,100	$6,900	$0	$1,129,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	$1,122,100	$6,900	$0	$1,129,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$855,400	$5,300	$0	$860,700
COMFAORIENTE	CCF36	890,500,675	6	12	$855,400	$5,300	$0	$860,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$855,400	$5,400	$0	$860,800
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	2	$43,700	$300	$0	$44,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$378,400	$2,400	$0	$380,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$433,300	$2,700	$0	$436,000
TOTAL				12	$6,533,200	$40,400	$0	$6,573,600

2025/11/05 04:27 PM

CERTIFICACION PAGO DE PARAFISCALES CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la suscrita ANYI YOULIN MENDEZ JAIME, identificada con CC 1092358834 y con TARJETA PROFESIONAL 305559-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contadora de ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A SAS identificada con NIT 901221652-9, me permito certificar que la mencionada empresa ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje(SENA) correspondiente a la nómina del mes de septiembre del año en curso, razón por la cual ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A SAS se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

Lo anterior como soporte al acta de Recibo parcial 2 del contrato PATIOS-MC-SI-46-2025 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA, CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO DE VIAS MEDIANTE LA MODALIDAD DE BACHEO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO, DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER" cuyo periodo corresponde desde el 22 de septiembre al 21 de octubre del año 2025.

Dado en San José de Cúcuta a los cinco (05) días del mes de noviembre del 2025.

ANYI YOULIN MENDEZ JAIME
CONTADOR PUBLICO
ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A SAS
TARJETA PROFESIONAL No. 305559-T
C.C. No. 1.092.358.834 expedida en: VILLA DEL ROSARIO

Av 6 # 0-161 INT 702 A
Cúcuta (Norte de Santander)
Cel – 316 7919629 – 3183974976
Email: asesorandocontratos@gmail.com



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.092.358.834
MENDEZ JAIME
APELLIDOS
ANYI YOULIN
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 19-SEP-1995
CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.62 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
04-OCT-2013 VILLA ROSARIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-2510000-00795932-F-1092358834-20160301 0048723938A 1 6973809886

ANYI YOULIN MENDEZ JAIME



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

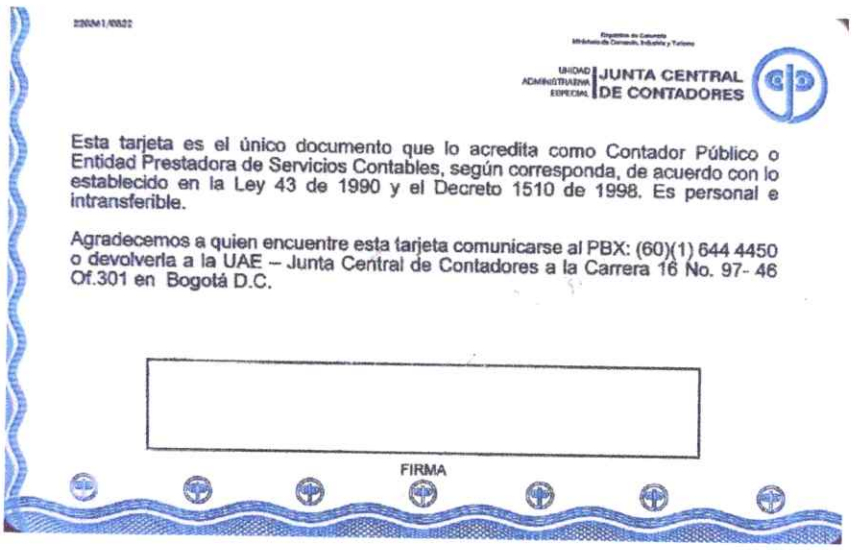
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

305559-T

ANYI YOULIN
MENDEZ JAIME
C.C. 1092358834
RES. INSCRIPCION 0001 DEL 31/01/2023
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

354450 355696



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8A6AE45965 0FCAB0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANYI YOULIN MENDEZ JAIME** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1092358834 de VILLA DEL ROSARIO (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 305559-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 05 de noviembre de 2025, a las 09:45:44, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	60396923
Código de Verificación	60396923251105094544

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 05 de noviembre de 2025, a las 09:46:01, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	9012216529
Código de Verificación	901221652925110509460 1

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 283777336

PIB
09:46:49

Bogotá DC, 05 de noviembre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ADRIANA CAROLINA LIZARAZO HIGUERA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 60396923:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 283777480

PIB
09:48:00

Bogotá DC, 05 de noviembre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A S.A.S identificado(a) con NIT número 9012216529:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141191672007

(415)7707212489984(8020) 000014119167200 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 2 2 1 6 5 2	9	Impuestos de Cúcuta	7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Norte de Santander 5 4	Los Patios 4 0 5

41. Dirección principal
TV 11 41 31 BRR MONTEBELLO 1

42. Correo electrónico asesorandocontratos@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 5 5 9 6 9 1 5	3 1 8 3 9 7 4 9 7 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 8 1 0 0 9	6 9 1 0	2 0 1 8 1 0 0 9		4 1 1 2	4 3 3 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	8	5	2	5	5																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre LIZARAZO HIGUERA ADRIANA CAROLINA
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 16-07-2025 02:31:17PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141191672007

(415)7707212489984(8020) 000014119167200 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 2 2 1 6 5 2	9	Impuestos de Cúcuta	7	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descapitalizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	
72. Número	0 0 0 1	
73. Fecha	2 0 1 8 1 0 1 0 4	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 8 1 0 1 0	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 3 3 8 2 4 7	
78. Departamento	5 4	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 8 1 0 1 0	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141191672007

(415)7707212489984(8020) 000014119167200 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 2 2 1 6 5 2	9	Impuestos de Cúcuta	7	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 8 1 0 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	6 0 3 9 6 9 2 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
LIZARAZO	HIGUERA	ADRIANA	CAROLINA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141191672007

(415)7707212489984(8020) 000014119167200 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 2 2 1 6 5 2	9	Impuestos de Cúcuta	7	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 2 3 5 8 8 3 4	9	3 0 5 5 5 9 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
MENDEZ	JAIME	ANYI	YOULIN

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 1 0 3

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **60.396.923**

LIZARAZO HIGUERA

APELLIDOS

ADRIANA CAROLINA

NOMBRES

Adriana Carolina Lizarazo Higuera.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-OCT-1979**

GRAMALOTE
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

10-NOV-1997 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2500100-00157689-F-0060396923-20090528 0011847327A 1 7020022211

ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A SAS	CONTRATO PATIOS-MC-SI-46-2025
	INFORME DE INTERVENTORIA
	asesorandocontratos@gmail.com









INFORME DE INTERVENTORIA

CONTRATO PATIOS-MC-SI-46-2025

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA, CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO VIAS MEDIANTE LA MODALIDAD DE BACHEO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER.

MUNICIPIO DE LOS PATIOS

2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION 5
2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 6
2.1 LOCALIZACION 6
3. INFORMACION CONTRATO DE OBRA 7
3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 7
3.1.1 Información contractual 7
3.1.2 Aspectos previstos para la ejecución del contrato 7
3.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE MES 7
REGISTRO FOTOGRÁFICO 10
3.3 AVANCE DE OBRA EJECUTADA 19
3.4 ACTIVIDADES NO PREVISTAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO 19
3.5 SEGUIMIENTO DE ITEMS NO PREVISTOS 19
3.6 MODIFICATORIOS PRORROGAS Y ADICIONES AL CONTRATO 19
3.7 ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 19
3.8 ESTADO DE POLIZA 19
4. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA 23
4.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 23
4.1.1 Aspectos legales del contrato 23
4.1.2 POLIZAS INTERVENTORIA 24
4.1.6 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 24
4.2 AVANCE DEL PROYECTO 24
CONCLUSIONES 25

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Información inicial del contrato de obra 3
Tabla 2 Información inicial del contrato de Interventoría. 4
Tabla 3 Actividades acumuladas al mes 9
Tabla 4 Información general de avance 19
Tabla 5 Póliza de cumplimiento – anexo 0 (obra) 20
Tabla 6 Póliza de Responsabilidad – anexo 0 (obra) 20
Tabla 7 Información contrato de interventoría actualizado 23
Tabla 8 Póliza de interventoría (Cumplimento Anexo 0) 24

LISTA DE IMÁGENES

Imagen 1 Localización del proyecto 6

Tabla 1 Información inicial del contrato de obra

DATOS INICIALES DEL CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO N°. FECHA	LP-SI-06-2025 DEL 15 DE AGOSTO DE 2025
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	ALCALDIA DE LOS PATIOS
CONTRATISTA	JAIRO JOSÉ BAUTISTA RAMÍREZ
NIT	13.472.612-1
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO DE VÍAS MEDIANTE LA MODALIDAD DE BACHEO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO	QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLONES VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MCTE. ($ 531.029.150,00)
PLAZO O DURACIÓN	2 (DOS) MESES
SUPERVISOR	CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON
INTERVENTOR	ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A S.A.S NIT 901.221.652-9
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP 0245
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP 1669
FECHA ACTA DE INICIO	22 de agosto de 2025
ACTA DE MODIFICACION	ADICIONAL EN RECURSO Y TIEMPO del 06 de octubre de 2025
VALOR ADICIONAL	CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($173.689.477,00)
VALOR TOTAL	SETECIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE SIETE PESOS M/CTE ($704.718.627,00)
PLAZO TOTAL	DOS (2) MESES y 20 DÍAS
FECHA TERMINACIÓN	10 de noviembre de 2025
ACTA PARCIAL No 1	21 de septiembre de 2025
VALOR ACTA PARCIAL No 1	$ 307.658.004,00

Tabla 2 Información inicial del contrato de Interventoría.

DATOS INICIALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATO N°. FECHA	PATIOS-MC-SI-46-2025 DEL 08 DE AGOSTO DE 2025
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	ALCALDIA DE LOS PATIOS
CONTRATISTA	ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A S.A.S
N.I.T.	NIT 901.221.652-9
REPRESENTANTE LEGAL	ADRIANA CAROLINA LIZARAZO HIGUERA C.C. 60.396.923
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA, CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO VIAS MEDIANTE LA MODALIDAD DE BACHEO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO	VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTO VEINTISEIS PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE ($ 27.931.326,57)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP 0245 de Abril 24 de 2025
PLAZO O DURACIÓN	4 (CUATRO) MESES
SUPERVISOR	CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON
FECHA ACTA DE INICIO	22 de agosto de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	21 de diciembre de 2025.
VALOR ACTA PARCIAL No 1	$ 12.047.442,19

1. INTRODUCCION

La ALCALDIA DE LOS PATIOS presentó el PROYECTO MANTENIMIENTO DE VÍAS MEDIANTE LA MODALIDAD DE BACHEO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER. de acuerdo con las condiciones, especificaciones, características, georreferenciación y demás elementos técnicos descritos en el proyecto.

Se imparte la orden de inicio para el Contrato de Interventoría **MC-SI-46-2025** a partir del 11 de agosto de 2025 y para el contrato de obra **LP-SI-06-2025** del 15 de agosto de 2025, se suscribió acta de inicio el 22 de agosto de 2025.

En el presente informe de interventoría se describen las actividades desarrolladas durante el periodo del presente informe del contrato de obra LP-SI-06-2025, en cumplimiento a lo establecido contractualmente, evaluando el avance real frente a lo programado, identificando cumplimientos y posibles desviaciones, y verificando la correcta aplicación de las especificaciones técnicas contempladas en el proyecto.

El documento se estructura en dos componentes principales:

- Componente relacionado con el contrato de obra, donde se presenta la información contractual, actividades ejecutadas, cantidades de obra, registros fotográficos, análisis de avance y verificación de garantías.

- Componente correspondiente al contrato de interventoría, donde se describen las gestiones técnicas, administrativas y financieras realizadas por el equipo interventor, así como el seguimiento y control efectuado al desarrollo de la obra.

Este informe refleja la trazabilidad del proceso constructivo y da cuenta del cumplimiento progresivo de las metas definidas para el periodo objeto de análisis, garantizando transparencia, eficiencia y calidad durante la ejecución del proyecto.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACION





Imagen 1 Localización del proyecto

Este proyecto se encuentra ubicado en la zona sur del municipio de Los Patios, departamento de Norte de Santander. El propósito es la ejecución de actividades de bacheo en las vías con mayor deterioro.

3. INFORMACION CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

3.1.1 Información contractual

La licitación pública No LP-SI-06-2025 para el proyecto MANTENIMIENTO DE VÍAS MEDIANTE LA MODALIDAD DE BACHEO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER fue adjudicada a JAIRO JOSÉ BAUTISTA RAMÍREZ por medio del Contrato de obra: LP-SI-06-2025 por un valor de $ 531.029.150,00 M/CTE. Se realizó adición en tiempo (20 días) y valor ($ 173.689.477,00) quedando el contrato por un valor total de SETECIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE SIETE PESOS M/CTE ($704.718.627,00)

3.1.2 Aspectos previstos para la ejecución del contrato

El contrato de obra N° LP-SI-06-2025 contempla el desarrollo del proyecto así:

1. Ejecución

- ✓ PRELIMINARES
- ✓ DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES
- ✓ OBRAS DE PAVIMENTACIÓN
- ✓ VARIOS

3.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE MES

En cumplimiento de lo establecido contractualmente y de acuerdo con el Acta de Inicio suscrita entre las partes, el contrato de obra LP-SI-06-2025 inició su etapa de ejecución, la cual tiene una duración total de dos (2) meses y veinte (20) días. Durante este período se proyecta el desarrollo de las actividades establecidas en el cronograma aprobado, en concordancia con los lineamientos técnicos, administrativos y financieros que rigen la ejecución del contrato.

Durante el segundo mes de ejecución, el contratista avanzó significativamente en el desarrollo de las actividades principales del proyecto, avanzando hacia la fase final de intervención.
Las principales acciones realizadas incluyen:

1. ***Actividades preliminares***

- Ejecución de localización y replanteo con base en la identificación de zonas deterioradas.
- Marcación de áreas de intervención y delimitación de zonas de trabajo.

2. ***Demoliciones y excavaciones***

- Corte de pavimento existente para definir límites de intervención.
- Demolición controlada de pavimento rígido y flexible según el estado encontrado.
- Excavación manual sin clasificar hasta la profundidad requerida para la conformación de la estructura de pavimento.
- Conformación y compactación de subrasante para garantizar soporte adecuado.

3. ***Obras de pavimentación***

- Extendido de base granular para bacheo con el espesor previsto en diseño.
- Aplicación de riego de liga para asegurar adherencia entre capas.
- Suministro e instalación de mezcla asfáltica MDC-19 siguiendo procedimientos de compactación establecidos.

4. ***Actividades varias***

- Retiro y disposición final de sobrantes en escombrera autorizada.
- Implementación y mantenimiento del Plan de Manejo de Tráfico (PMT).

Todas las actividades fueron ejecutadas bajo supervisión permanente, verificando el cumplimiento de los requisitos de calidad, técnicas de ejecución y seguridad laboral.

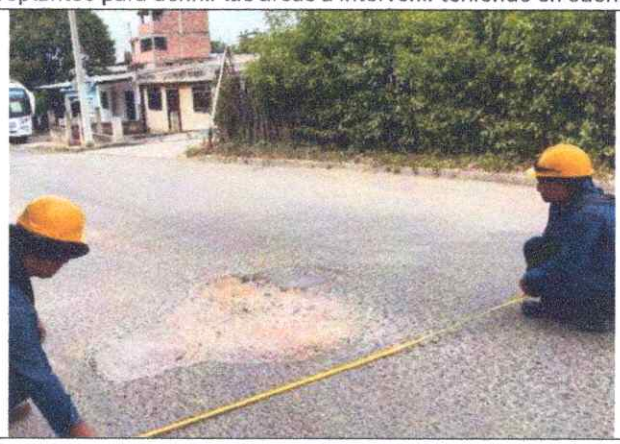
En la siguiente tabla se relacionan las actividades desarrolladas por parte del contratista durante el segundo mes, indicando las cantidades ejecutadas y los valores correspondientes a cada ítem, lo que permite evidenciar el avance físico y financiero del proyecto a la fecha:

Tabla 3 Actividades acumuladas al mes

CONDICIONES FINALES MODIFICADAS						EJECUTADO ACUMULADO		ACTA PARCIAL N°2		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL
1,00	**PRELIMINARES**										
1,10	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	2322,31	$ 8.900	$ 16.239.385,0	1007,77	$ 8.969.153,0	1314,52	$ 11.699.228,00	0,017	$ 150,0
2,00	**DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES**										
2,10	CORTE DE PAVIMENTO EXISTENTE	ML	631,75	$ 8.700	$ 11.562.300,0	320,66	$ 2.789.742,0	311,09	$ 2.706.483,00	0,005	$ 41,0
2,20	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE	M2	2307,91	$ 33.000	$ 53.952.690,0	1003,45	$ 33.113.850,0	1304,44	$ 43.046.520,00	0,016	$ 531,0
2,30	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	390,88	$ 89.700	$ 26.246.220,0	169,30	$ 15.186.210,0	221,57	$ 19.874.829,00	0,010	$ 872,00
2,40	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE	M2	2305,03	$ 14.600	$ 34.668.430,0	1000,57	$ 14.608.322,0	1304,44	$ 19.044.824,00	0,016	$ 235,0
2,50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR PARA BACHEO	M3	345,60	$ 170.100	$ 49.771.260,0	150,08	$ 25.528.608,0	195,51	$ 33.256.251,00	0,010	$ 1.622,0
3,00	**OBRAS DE PAVIMENTACIÓN**										
3,10	RIEGO DE LIGA	M2	2305,03	$ 7.500	$ 13.684.875,0	1000,57	$ 7.504.275,0	1304,44	$ 9.783.300,00	0,016	$ 121,0
3,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA MDC-19 PARA BACHEO	M3	208,30	$ 1.087.800	$ 138.933.816,0	90,90	$ 98.881.020,0	117,40	$ 127.707.720,00	0,005	$ 5.305,0
4,00	**VARIOS**										
4,10	RETIRO DE SOBRANTES (INCLUYE TRANSPORTE Y PAGO DE ESCOMBRERA)	M3	741,88	$ 64.400	$ 47.777.336,0	322,77	$ 20.786.388,0	419,07	$ 26.988.108,00	0,044	$ 2.840,0

PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT)		$ 711.787,00		$ 711.787,00		$ 0,00		$ 0,00
ADMINISTRACIÓN	**29 %**	$ 151.231.099				$ 85.291.106		$ 3.397,93
IMPREVISTOS	**0%**					$ 0,0		$ 0,00
UTILIDAD	**6%**	$ 31.289.193		$ 79.578.649		$ 17.646.436		$ 703,02
VALOR TOTAL CON AIU		**$ 704.718.627**		**$ 307.658.004,00**		**$ 397.044.805,00**		**$ 15.818,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

1,10 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO: 1314,52 M2
Se realizó localización y replanteo para definir las áreas a intervenir teniendo en cuenta los sitios más críticos.

2,10 CORTE DE PAVIMENTO EXISTENTE: 311,09 ML
Se verificó el corte de pavimento en las cajas definidas en la localización.

2,20 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE: 1304,44 M2
Se constató la demolición del pavimento existente, verificando las cantidades ejecutadas.


2,30 EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR: 221,57 M3

Se verificó la excavación manual sin clasificar de acuerdo con la profundidad establecida contractualmente





2,40 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE: 1304,44 M2

Se verificó la conformación y compactación de subrasante para posteriormente instalar la base granular



2,50 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR PARA BACHEO: 195,51 M3

Se inspeccionó la calidad y el cumplimiento granulométrico del material de base granular. Se supervisó su extensión uniforme y se controló el proceso de compactación

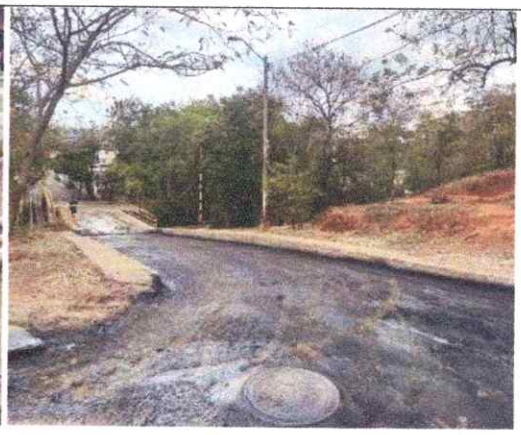




3,10 RIEGO DE LIGA: 1304,44 M2

Se comprobó la aplicación de la emulsión asfáltica (Riego de Liga) de manera uniforme sobre todas las superficies de contacto (bordes y fondo de la excavación)





3,20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA MDC-19 PARA BACHEO: 117,40 M3

Se supervisó el suministro e instalación de mezcla asfaltica MDC-19 verificando espesores





4,10 RETIRO DE SOBRANTES (INCLUYE TRANSPORTE Y PAGO DE ESCOMBRERA): 419,07 M3

Se verificó la cantidad de retiro de sobrantes y su destinación en la escombrera correspondiente



PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT)

Se revisó la implementación del PMT en cada uno de los frentes de trabajo



Durante el periodo evaluado, se llevó a cabo la implementación del Plan de Manejo de Tráfico (PMT) conforme a lo establecido en el diseño aprobado y a los lineamientos de seguridad vial exigidos por la normativa vigente. El contratista dispuso los recursos necesarios para la correcta operación del tránsito en las zonas intervenidas.

Las principales acciones ejecutadas fueron:

Señalización preventiva y reglamentaria:
Instalación de señales verticales temporales tales como "Obreros en la vía", "Reducción de calzada", "Inicio de Obra" y "Desvío", ubicadas a las distancias requeridas para garantizar la visibilidad de los usuarios.

Demarcación y canalización del tránsito:
Uso de conos, cintas de demarcación y barreras plásticas para delimitar adecuadamente las áreas de trabajo, asegurando el tránsito seguro de peatones y vehículos.

Control de flujo vehicular:
Implementación de paso alternado en sectores de calzada reducida y apoyo de paleteros en horas de mayor circulación, evitando congestiones y reduciendo riesgos de accidentalidad.

Iluminación y visibilidad:
En jornadas extendidas, se aseguraron elementos reflectivos y dispositivos luminosos que permitieron la correcta identificación del área de intervención durante horas nocturnas.

Seguimiento y ajustes:
El PMT fue monitoreado por la interventoría y personal del contratista, realizando ajustes cuando fue necesario, principalmente en horarios de alta demanda vehicular o en puntos críticos del sector.

Conclusión:
El Plan de Manejo de Tráfico se ejecutó de manera adecuada, garantizando la seguridad vial y minimizando el impacto de las actividades de obra sobre la movilidad. No se presentaron incidentes que comprometieran la integridad de los usuarios, y las medidas adoptadas fueron acordes a las condiciones del entorno y al desarrollo del proyecto.

1,10 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO: 1314,52 M2

ITEM	1,10	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO UNIDAD: M2		
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		
		LONG	ANCHO	ÁREA
10A	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	30,80	6,00	184,80
10B	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	33,69	5,50	185,27
10C	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	8,65	2,55	22,06
10D	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	5,95	3,70	22,02
11	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 5A Y AV 6	28,00	6,00	168,00
12	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 5A Y AV 6	6,00	5,00	30,00
13	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 5A Y AV 6	10,00	3,70	37,00
14	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	8,80	6,70	58,96
15	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	2,80	2,3	6,44
16	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	5,30	4,25	22,50
17	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	5,18	5,0	25,88
18A	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10 LLANITOS	18,84	9,2	172,80
18B	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10 LLANITOS	6,90	2,2	14,84
18C	AVENIDA 10 LLANITOS	10,60	4,5	47,19
19A	AVENIDA 10 LLANITOS	3,70	2,2	8,15
19B	AVENIDA 10 LLANITOS	28,75	4,3	123,63
20	AVENIDA 10 LLANITOS	2,85	4,0	11,26
21A	AVENIDA 10 LLANITOS	3,30	4,7	15,50
21B	AVENIDA 10 LLANITOS	25,00	6,0	150,00
22	AVENIDA 10 LLANITOS	1,66	0,6	1,03
23	AVENIDA 10 LLANITOS	4,24	1,7	7,21
TOTAL				1314,52

2,10 CORTE DE PAVIMENTO EXISTENTE: 311,09 ML

ITEM	2,10	CORTE DE PAVIMENTO EXISTENTE			UNIDAD	ML
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES				TOTAL
		LONGITUD	LONGITUD	LONGITUD	LONGITUD	
10A	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	0,00				0,00
10B	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	0,00				0,00
10C	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	5,50	5,70			11,20
10D	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	5,95				5,95
11	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 5A Y AV 6	6,00	6,00			12,00
12	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 5A Y AV 6	5,00	5,00	6,00		16,00
13	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 5A Y AV 6	3,70	3,70	10,00		17,40
14	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	6,30	6,70	6,70		19,70
15	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	2,80	2,80	2,30		7,90
16	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	7,20	10,60	4,28	3,2	25,28
17	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	10,19	9,00	8,00		27,19
18A	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	7,20	5,57			12,77
18B	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	6,90	2,15			9,05
18C	AVENIDA 10 LLANITOS	5,40				5,40
19A	AVENIDA 10 LLANITOS	6,50	6,80			13,30
19B	AVENIDA 10 LLANITOS	28,70	4,20	28,70	4,20	65,80
20	AVENIDA 10 LLANITOS	6,20	5,70	3,40	2,86	18,16
21A	AVENIDA 10 LLANITOS	5,80	3,20	4,10	3,40	16,50
21B	AVENIDA 10 LLANITOS	12,00				12,00
22	AVENIDA 10 LLANITOS	3,65				3,65
23	AVENIDA 10 LLANITOS	2,60	2,00	7,24		11,84
TOTAL						311,09

2,20 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE: 1304,44 M2

ITEM	2,20	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE - M2		
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		
		LARGO	ANCHO	AREA
10A	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	30,8	6,0	184,8
10B	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	33,7	5,5	185,3
10C	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	8,7	2,6	22,1
10D	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	6,0	3,7	22,0
11	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 5A Y AV 6	28,0	6,0	168,0
11	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2	-1,4
12	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 5A Y AV 6	6,0	5,0	30,0
13	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 5A Y AV 6	10,0	3,7	37,0
14	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	8,80	6,70	58,96
14	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2	-1,44
15	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	2,80	2,30	6,44
16	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	5,3	4,2	22,50
17	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	5,18	5,00	25,88
17	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2	-1,44
18A	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	24,00	7,20	172,80
18A	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2	-1,44
18A	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2	-1,44
18B	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	6,90	2,15	14,84
18C	AVENIDA 10 LLANITOS	10,60	4,45	47,19
19A	AVENIDA 10 LLANITOS	3,70	2,2	8,15
19B	AVENIDA 10 LLANITOS	28,75	4,30	123,63
20	AVENIDA 10 LLANITOS	2,85	4,0	11,26
21A	AVENIDA 10 LLANITOS	3,30	4,7	15,50
21B	AVENIDA 10 LLANITOS	25,00	6,0	150,00
21B	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2	-1,44
21B	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2	-1,44
22	AVENIDA 10 LLANITOS	1,66	0,62	1,03
23	AVENIDA 10 LLANITOS	4,24	1,7	7,21
TOTAL				1304,44

2,30 EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR: 221,57 M3

ITEM	2,30	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR UNIDAD: M3					
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES				ALTO	VOLUMEN
		LARGO	ANCHO		AREA		
10A	CLL 26 ENTR	30,8	6,0		184,80	0,17	31,42
10B	CLL 26 ENTR	33,7	5,5		185,27	0,17	31,50
10C	CLL 26 ENTR	8,7	2,6		22,06	0,17	3,75
10D	CLL 26 ENTR	6,0	3,7		22,02	0,17	3,74
11	VALLES DEL I	28,0	6,0		168,00	0,17	28,56
11	POZO DE INS	-1,2	1,2		-1,44	0,17	-0,24
12	VALLES DEL I	6,0	5,0		30,00	0,17	5,10
13	VALLES DEL I	10,0	3,7		37,00	0,17	6,29
14	VALLES DEL I	8,80	6,70		58,96	0,17	10,02
14	POZO DE INS	-1,2	1,2		-1,44	0,17	-0,24
15	VALLES DEL I	2,80	2,30		6,44	0,17	1,09
16	VALLES DEL I	5,3	4,2		22,50	0,17	3,83
17	VALLES DEL I	5,18	5,00		25,88	0,17	4,40
17	POZO DE INS	-1,2	1,2		-1,44	0,17	-0,24
18A	VALLES DEL I	24,00	7,20		172,80	0,17	29,38
18A	POZO DE INS	-1,2	1,2		-1,44	0,17	-0,24
18A	POZO DE INS	-1,2	1,2		-1,44	0,17	-0,24
18B	VALLES DEL I	6,90	2,15		14,84	0,17	2,52
18C	AVENIDA 10 L	10,60	4,45		47,19	0,17	8,02
19A	AVENIDA 10 L	3,70	2,2		8,15	0,17	1,39
19B	AVENIDA 10 L	28,75	4,30		123,63	0,17	21,02
20	AVENIDA 10 L	2,84	4,0		11,20	0,17	1,90
21A	AVENIDA 10 L	3,30	4,7		15,50	0,17	2,63
21B	AVENIDA 10 L	25,00	6,0		150,00	0,17	25,50
21B	POZO DE INS	-1,2	1,2		-1,44	0,17	-0,24
21B	POZO DE INS	-1,2	1,2		-1,44	0,17	-0,24
22	AVENIDA 10 L	0,0	0,0		0,00	0,00	0,00
23	AVENIDA 10 L	4,24	1,7		7,21	0,17	1,23
TOTAL							221,57

2,40 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE: 1304,44 M2

ITEM	2,40	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE UNIDA: M2		
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		
		LARGO	ANCHO	AREA
10A	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	30,8	6,0	184,80
10B	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	33,7	5,5	185,27
10C	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	8,7	2,6	22,06
10D	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	6,0	3,7	22,02
11	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 5A Y AV 6	28,0	6,0	168,00
11	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2	-1,44
12	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 5A Y AV 6	6,0	5,0	30,00
13	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 5A Y AV 6	10,0	3,7	37,00
14	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	8,80	6,70	58,96
14	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2	-1,44
15	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	2,80	2,30	6,44
16	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	5,3	4,2	22,50
17	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	5,18	5,00	25,88
17	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2	-1,44
18A	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	24,00	7,20	172,80
18A	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2	-1,44
18A	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2	-1,44
18B	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	6,90	2,15	14,84
18C	AVENIDA 10 LLANITOS	10,60	4,45	47,19
19A	AVENIDA 10 LLANITOS	3,70	2,2	8,15
19B	AVENIDA 10 LLANITOS	28,75	4,30	123,63
20	AVENIDA 10 LLANITOS	2,85	4,0	11,26
21A	AVENIDA 10 LLANITOS	3,30	4,7	15,50
21B	AVENIDA 10 LLANITOS	25,00	6,0	150,00
21B	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2	-1,44
21B	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2	-1,44
22	AVENIDA 10 LLANITOS	1,66	0,62	1,03
23	AVENIDA 10 LLANITOS	4,24	1,70	7,21
TOTAL				1304,44

2,50 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR PARA BACHEO: 195,51 M3

ITEM	2,50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR PARA BACHEO UNIDAD: M3				
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			ESPESOR	VOLUMEN
		LARGO	ANCHO	AREA		
10A	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	30,8	6,0	184,80	0,15	27,72
10B	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	33,7	5,5	185,27	0,15	27,79
10C	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	8,7	2,6	22,06	0,15	3,31
10D	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	6,0	3,7	22,02	0,15	3,30
11	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 5A Y AV 6	28,0	6,0	168,00	0,15	25,20
11	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2	-1,44	0,15	-0,22
12	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 5A Y AV 6	6,0	5,0	30,00	0,15	4,50
13	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 5A Y AV 6	10,0	3,7	37,00	0,15	5,55
14	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	8,80	6,70	58,96	0,15	8,84
14	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2	-1,44	0,15	-0,22
15	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	2,80	2,30	6,44	0,15	0,97
16	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	5,3	4,2	22,50	0,15	3,38
17	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	5,18	5,00	25,88	0,15	3,88
17	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2	-1,44	0,15	-0,22
18A	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	24,00	7,20	172,80	0,15	25,92
18A	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2	-1,44	0,15	-0,22
18A	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2	-1,44	0,15	-0,22
18B	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	6,90	2,15	14,84	0,15	2,23
18C	AVENIDA 10 LLANITOS	10,60	4,45	47,19	0,15	7,08
19A	AVENIDA 10 LLANITOS	3,70	2,2	8,15	0,15	1,22
19B	AVENIDA 10 LLANITOS	28,75	4,30	123,63	0,15	18,54
20	AVENIDA 10 LLANITOS	2,85	4,0	11,26	0,15	1,69
21A	AVENIDA 10 LLANITOS	3,30	4,7	15,50	0,15	2,33
21B	AVENIDA 10 LLANITOS	25,00	6,0	150,00	0,15	22,50
21B	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2	-1,44	0,15	-0,22
21B	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2	-1,44	0,15	-0,22
22	AVENIDA 10 LLANITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	AVENIDA 10 LLANITOS	1,70	4,2	7,21	0,15	1,08
TOTAL						195,51

3,10 RIEGO DE LIGA: 1304,44 M2

ITEM	3,10	RIEGO DE LIGA		UNIDAD	M2
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			
		LARGO	ANCHO		AREA
10A	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	30,8	6,0		184,80
10B	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	33,7	5,5		185,27
10C	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	8,7	2,6		22,06
10D	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	6,0	3,7		22,02
11	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 5A Y AV 6	28,0	6,0		168,00
11	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2		-1,44
12	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 5A Y AV 6	6,0	5,0		30,00
13	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 5A Y AV 6	10,0	3,7		37,00
14	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	8,80	6,70		58,96
14	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2		-1,44
15	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	2,80	2,30		6,44
16	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	5,3	4,2		22,50
17	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	5,18	5,00		25,88
17	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2		-1,44
18A	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	24,00	7,20		172,80
18A	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2		-1,44
18A	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2		-1,44
18B	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	6,90	2,15		14,84
18C	AVENIDA 10 LLANITOS	10,60	4,45		47,19
19A	AVENIDA 10 LLANITOS	3,70	2,2		8,15
19B	AVENIDA 10 LLANITOS	28,75	4,30		123,63
20	AVENIDA 10 LLANITOS	2,85	4,0		11,26
21A	AVENIDA 10 LLANITOS	3,30	4,7		15,50
21B	AVENIDA 10 LLANITOS	25,00	6,0		150,00
21B	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2		-1,44
21B	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2		-1,44
22	AVENIDA 10 LLANITOS	1,66	0,62		1,03
23	AVENIDA 10 LLANITOS	4,24	1,70		7,21
TOTAL					1.304,44

3,20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA MDC-19 PARA BACHEO: 117,40 M3

ITEM	3,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA MDC-19 PARA BACHEO				
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			ESPESOR	VOLUMEN
		LARGO	ANCHO	AREA		
10A	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	30,8	6,0	184,80	0,09	16,6
10B	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	33,7	5,5	185,27	0,09	16,7
10C	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	8,7	2,6	22,06	0,09	2,0
10D	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	6,0	3,7	22,02	0,09	2,0
11	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 5A Y AV 6	28,0	6,0	168,00	0,09	15,1
11	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2	-1,44	0,09	-0,1
12	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 5A Y AV 6	6,0	5,0	30,00	0,09	2,7
13	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 5A Y AV 6	10,0	3,7	37,00	0,09	3,3
14	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	8,80	6,70	58,96	0,09	5,3
14	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2	-1,44	0,09	-0,1
15	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	2,80	2,30	6,44	0,09	0,6
16	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	5,3	4,2	22,50	0,09	2,0
17	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	5,18	5,00	25,88	0,09	2,3
17	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2	-1,44	0,09	-0,1
18A	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	24,00	7,20	172,80	0,09	15,6
18A	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2	-1,44	0,09	-0,1
18A	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2	-1,44	0,09	-0,1
18B	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	6,90	2,15	14,84	0,09	1,3
18C	AVENIDA 10 LLANITOS	10,60	4,45	47,19	0,09	4,2
19A	AVENIDA 10 LLANITOS	3,70	2,2	8,15	0,09	0,7
19B	AVENIDA 10 LLANITOS	28,75	4,30	123,63	0,09	11,1
20	AVENIDA 10 LLANITOS	2,85	4,0	11,26	0,09	1,0
21A	AVENIDA 10 LLANITOS	3,30	4,7	15,50	0,09	1,4
21B	AVENIDA 10 LLANITOS	25,00	6,0	150,00	0,09	13,5
21B	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2	-1,44	0,09	-0,1
21B	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2	-1,44	0,09	-0,1
22	AVENIDA 10 LLANITOS	1,66	0,62	1,03	0,09	0,1
23	AVENIDA 10 LLANITOS	4,24	1,70	7,21	0,09	0,6
TOTAL						117,40

4,10 RETIRO DE SOBRANTES (INCLUYE TRANSPORTE Y PAGO DE ESCOMBRERA): 419,07 M3

ITEM	4,10	RETIRO DE SOBRANTES (INCLUYE TRANSPORTE Y PAGO DE ESCOMBRERA) UNIDAD: M3							
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES				VOL EXCAV	F. EXP	RETIRO	TOTAL
		ÁREA DEMOL	F. EXP	ESPESOR ASF	RETIRO				
10A	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	184,8	1,4	0,07	18,1	31,4	1,3	40,8	58,95
10B	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	185,3	1,4	0,07	18,2	31,5	1,3	40,9	59,10
10C	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	22,1	1,4	0,07	2,2	3,7	1,3	4,9	7,04
10D	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	22,0	1,4	0,07	2,2	3,7	1,3	4,9	7,02
11	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 5A Y AV 6	168,0	1,4	0,07	16,5	28,56	1,3	37,1	53,59
12	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 5A Y AV 6	30,0	1,4	0,07	2,9	5,10	1,3	6,6	9,57
13	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 5A Y AV 6	37,0	1,4	0,07	3,6	6,29	1,3	8,18	11,80
14	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	59,0	1,4	0,07	5,8	10,02	1,3	13,03	18,81
15	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	6,4	1,4	0,07	0,6	1,09	1,3	1,42	2,05
16	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	22,5	1,4	0,07	2,2	3,83	1,3	4,97	7,18
17	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	25,9	1,4	0,07	2,5	4,40	1,3	5,72	8,26
18A	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	172,8	1,4	0,07	16,9	29,38	1,3	38,19	55,12
18B	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	14,8	1,4	0,07	1,5	2,52	1,3	3,28	4,73
18C	AVENIDA 10 LLANITOS	47,2	1,4	0,07	4,6	8,02	1,3	10,43	15,05
19A	AVENIDA 10 LLANITOS	8,2	1,4	0,07	0,8	1,39	1,3	1,80	2,60
19B	AVENIDA 10 LLANITOS	123,6	1,4	0,07	12,1	21,02	1,3	27,32	39,44
20	AVENIDA 10 LLANITOS	11,3	1,4	0,07	1,1	1,91	1,3	2,48	3,58
21A	AVENIDA 10 LLANITOS	15,5	1,4	0,07	1,5	2,64	1,3	3,43	4,95
21B	AVENIDA 10 LLANITOS	150,0	1,4	0,07	14,7	25,50	1,3	33,15	47,85
22	AVENIDA 10 LLANITOS	1,0	1,4	0,07	0,1	0,00	1,3	0,00	0,10
23	AVENIDA 10 LLANITOS	7,2	1,4	0,07	0,7	1,20	1,3	1,56	2,27
TOTAL									419,07

ID	FECHA	CONSECUTIVO DEL RECIBO	METROS CUBICOS (M3)
1	9/15/2025	24247	6
2	9/16/2025	24249	6
3	9/16/2025	24250	6
4	9/16/2025	25901	6
5	9/16/2025	25902	6
6	9/16/2025	25903	6
7	9/16/2025	25904	6
8	9/16/2025	25905	6
9	9/17/2025	25906	6
10	9/17/2025	25907	6
11	9/18/2025	25909	6
12	9/18/2025	25910	6
13	9/18/2025	25911	6
14	9/18/2025	25912	6
15	9/18/2025	25913	6
16	9/19/2025	25914	6
17	9/19/2025	25915	6
18	9/19/2025	25917	6
19	9/19/2025	25919	6
20	9/20/2025	25920	6
21	9/20/2025	25922	6
22	9/23/2025	25930	6
23	9/23/2025	25931	6
24	9/23/2025	25933	6
25	9/23/2025	25934	6
26	9/23/2025	25935	6
27	9/23/2025	25937	6
28	9/23/2025	25938	6
29	9/23/2025	25939	6
30	9/23/2025	25940	6
31	9/23/2025	25941	6
32	9/24/2025	25943	6
33	9/24/2025	25945	6
34	9/24/2025	25946	6
35	9/24/2025	25948	6
36	9/24/2025	25949	6
37	9/25/2025	25951	6
38	9/25/2025	25952	6
39	9/25/2025	25954	6
40	9/25/2025	25956	6
41	9/25/2025	25957	6
42	9/26/2025	25960	6
43	9/26/2025	25961	6
44	9/26/2025	25962	6
45	9/26/2025	25963	6
46	9/27/2025	25966	6
47	9/27/2025	25967	6
48	9/27/2025	25969	6
49	9/29/2025	25972	6
50	9/29/2025	25973	6
51	9/29/2025	25975	6
52	9/29/2025	25974	6
53	9/29/2025	25977	6
54	9/30/2025	25979	6
55	9/30/2025	25981	6
56	9/30/2025	25982	6
57	9/30/2025	25983	6
58	9/30/2025	25984	6
59	10/03/2025	25993	6
60	10/03/2025	25994	6
61	10/03/2025	25995	6
62	10/03/2025	25996	6
63	10/29/2025	24693	6
64	10/29/2025	24694	6
65	10/29/2025	24695	6
66	10/29/2025	24696	6
67	10/29/2025	24697	6
68	10/30/2025	24699	6
69	10/30/2025	24700	6
70	10/30/2025	24777	6
TOTAL, VOLUMEN DE RETIRO (M3)			420

PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT)

De acuerdo con las cantidades ejecutadas del Plan de Manejo de Tráfico (PMT) es importante mencionar que la cantidad total presupuestada para este componente se ejecutó en los meses anteriores, sin embargo se agrantizó durante toda la obra la instalación del manejo de tráficoSe revisó la implementación del PMT en cada uno de los frentes de trabajo.

3.3 AVANCE DE OBRA EJECUTADA

Tabla 4 Información general de avance

OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (%)	100.00%	VALOR OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**$ 704.718.627,00**
OBRA EJECUTADA ACUMULADA (%)	99.99%	**VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA**	**$ 704.702.809,00**

A la fecha de corte del presente informe y teniendo en cuenta la programación y cronograma de actividades, se reporta el 99.99% real ejecutado equivalente a **$ 704.702.809,00** contra una programación proyectada de 100.00% equivalente a **$ 704.718.627,00**, encontrándose en su ejecución total, con un saldo a favor de la entidad de $ 15.818,00.

3.4 ACTIVIDADES NO PREVISTAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

En este periodo no se generaron ítems no previstos.

3.5 SEGUIMIENTO DE ITEMS NO PREVISTOS

En este periodo no se generaron ítems no previstos.

3.6 MODIFICATORIOS PRORROGAS Y ADICIONES AL CONTRATO

En este periodo se realizó adicional en recurso y tiempo con fecha del 06 de octubre de 2025, el valor adicional corresponde a: ciento setenta y tres millones seiscientos ochenta y nueve cuatrocientos setenta y siete pesos m/cte. ($173.689.477,00), quedando un valor total de setecientos cuatro millones setecientos dieciocho mil seiscientos veinte siete pesos m/cte. ($704.718.627,00), el tiempo adicional es de veinte (20) días, quedando un total de dos (2) meses con veinte (20) días para la ejecución de la obra.

3.7 ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

A la fecha se ha realizado el trámite del ACTA PARCIAL No. 1 del 16 de septiembre de 2025, donde se evidencian las actividades ejecutadas a la fecha.

3.8 ESTADO DE POLIZA

De acuerdo con lo estipulado en el contrato de obra, el contratista de obra presentó la póliza de cumplimiento No 49-44-101036864 expedida por SEGUROS DEL ESTADO expedida el mes de agosto del 2025, A continuación, se relacionan los amparos iniciales de esta póliza.

Tabla 5 Póliza de cumplimiento – anexo 0 (obra)

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO					
GARANTÍAS	**NOMBRE DEL ASEGURADOR**	**N° DE POLIZA**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	49-44-101036864	15/08/2025	15/02/2026	$53.102.915,00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	49-44-101036864	15/08/2025	15/10/2028	$2.793.132,66
ESTABILIDAD DE OBRA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	49-44-101036864	SI AMPARA 5 AÑOS	SI AMPARA 5 AÑOS	$106.205.830,00

Tabla 6 Póliza de Responsabilidad – anexo 0 (obra)

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO					
GARANTÍAS	**NOMBRE DEL ASEGURADOR**	**N° DE POLIZA**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	49-40-101011756	15/08/2025	15/10/2026	$284.700.000,00

3.8 SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA

Durante la ejecución de las actividades se implementó el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) conforme a la normatividad vigente, con el fin de garantizar la seguridad de los trabajadores, peatones y usuarios de la vía. Para la correcta canalización del tránsito y la delimitación del área de intervención se instalaron los siguientes elementos de señalización preventiva y reglamentaria:

- **Señal de "Obreros en la vía"**
  advirtiendo a los usuarios sobre la presencia de personal ejecutando labores en el frente de obra.



TRABAJOS EN LA VÍA

- **Señal de "Inicio de Obra"**
  ubicada al acceso del tramo intervenido.



- **Señal de "Fin de Obra"**
  instalada al finalizar el tramo de intervención.



- **Señal de "Reducción de Calzada"**
  utilizada para informar sobre la restricción temporal del carril disponible para circulación.



- **Maletines y/o barreras plásticas**
  empleados para el cerramiento, canalización y contención del área de trabajo, garantizando la seguridad operativa y visibilidad del corredor vial.



- **Colombinas reflectivas**
  Utilizadas como dispositivos de canalización a lo largo del corredor vial, delimitar áreas de trabajo y reforzar la reducción de calzada. Estas colombinas cuentan con material reflectivo de alta visibilidad, permitiendo su adecuada percepción durante el día y la noche, y fueron distribuidas manteniendo las distancias reglamentarias.



- **Cinta de peligro**
  Empleada para delimitar áreas específicas de intervención, restringir el acceso a zonas inseguras o de excavación y alertar a los usuarios sobre la presencia de riesgo. La cinta se instaló de forma visible sobre estacas, maletines o elementos de soporte, manteniendo continuidad y altura adecuada para asegurar su percepción.



La señalización se mantuvo instalada, visible y en adecuado estado durante todo el periodo de intervención, realizando los ajustes necesarios según las condiciones operativas y de avance de la obra.

3.9 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

- ✓ El personal operativo utilizó casco de seguridad tipo industrial. Este EPP permitió mitigar riesgos derivados de posibles impactos por objetos en altura, caídas de material y manipulación de maquinaria pesada.

- ✓ Se emplearon guantes de seguridad de vaqueta y/o materiales resistentes a la abrasión, garantizando la protección frente a cortes, raspaduras, contacto con superficies calientes y manejo de herramientas manuales durante el proceso de bacheo y operación de equipos.

- ✓ Los trabajadores contaron con botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante, aptas para superficies húmedas e irregulares. Este EPP redujo el riesgo de torceduras, resbalones y exposición a materiales calientes durante la aplicación de mezcla asfáltica.

- ✓ Se hizo uso de dotación industrial de alta resistencia (camisa y pantalón), adecuada para actividades de obra civil.

- ✓ En actividades con mayor proximidad a maquinaria pesada, se verificó el uso complementario de gafas de seguridad contra partículas y protectores auditivos tipo inserción, atendiendo a los niveles de ruido generados por equipo asfaltador y vehículos de apoyo.

VERIFICACIÓN Y CONTROL DEL USO DE EPP

La interventoría SST realizó inspecciones continuas para asegurar la correcta colocación, ajuste y mantenimiento del EPP. Se registró conformidad en el cumplimiento de los requisitos mínimos de seguridad establecidos en el plan del proyecto.



3.10 PAUSAS ACTIVAS

Durante la jornada laboral se llevaron a cabo pausas activas dirigidas para el personal operativo, con el objetivo de reducir la fatiga muscular. La actividad fue realizada en un área segura del frente de obra, previamente delimitada y alejada de la operación de maquinaria.

Las pausas activas estuvieron enfocadas en los siguientes componentes:

Se ejecutaron ejercicios suaves de movilidad en cuello, hombros, codos, muñecas, cadera y rodillas, mejorando la amplitud de movimiento antes de retomar labores de esfuerzo físico.

El equipo realizó estiramientos orientados a los principales grupos musculares involucrados en la actividad (espalda baja, zona lumbar, extremidades superiores e inferiores), con el fin de disminuir la tensión muscular y prevenir lesiones.

Se implementaron ejercicios de activación leve como marcha en el sitio y movimientos controlados de brazos, promoviendo la circulación sanguínea y aumentando el nivel de alerta del trabajador.

Durante las pausas activas los trabajadores conservaron el uso de los EPP requeridos (casco, botas de seguridad), garantizando condiciones seguras durante el desarrollo de la actividad.
Adicionalmente, se verificó que la zona estuviera libre de obstáculos, superficies irregulares o riesgos asociados a tránsito de equipos.

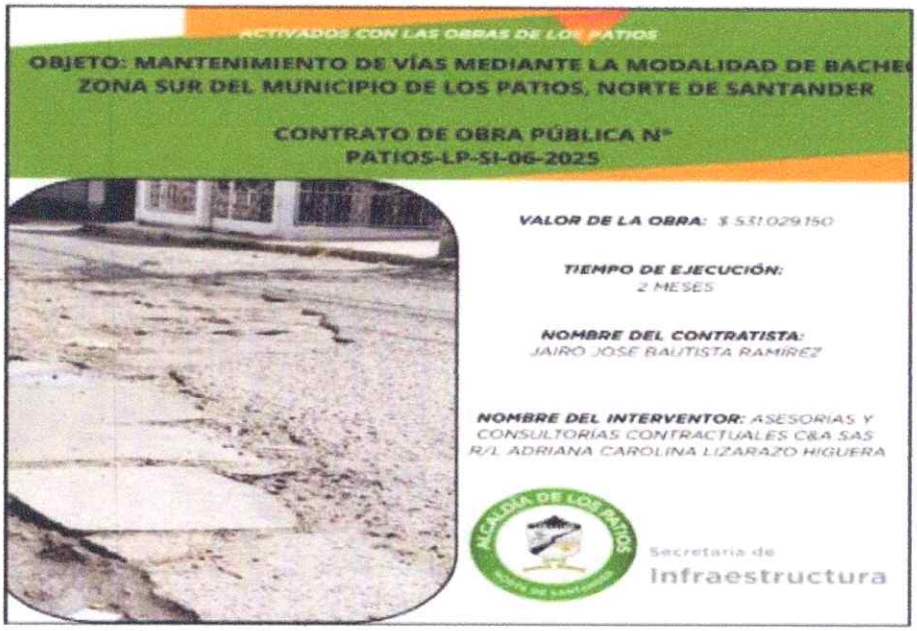


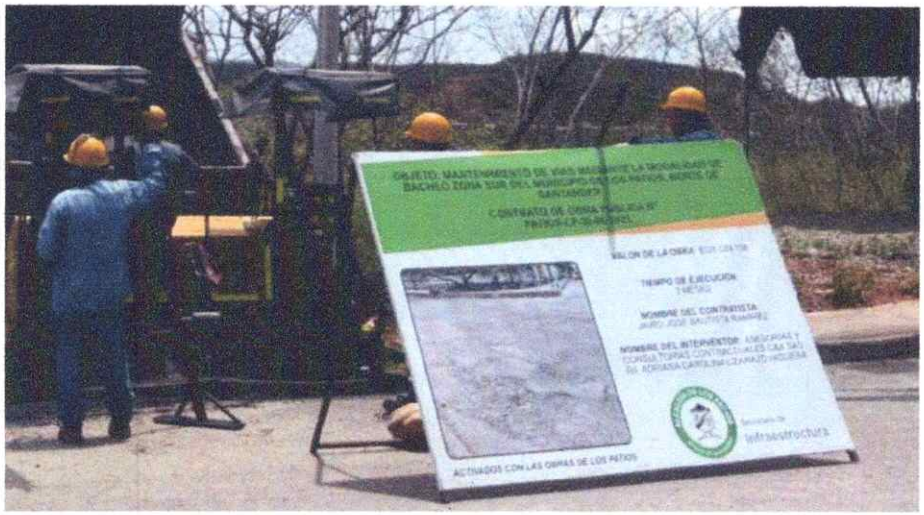




3.11 VALLA PUBLICITARIA

Durante la ejecución de las actividades de mantenimiento vial, se instaló una valla informativa en un área visible y segura, ubicada en la zona de acceso a la maquinaria y al frente de trabajo. La valla contiene la información del contrato, alcance de la obra, tiempo de ejecución y responsables del proyecto, garantizando la comunicación efectiva hacia trabajadores y comunidad. Su ubicación no interfiere con la operación de la maquinaria y cumple con los lineamientos de señalización establecidos para la obra.





4. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

4.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

4.1.1 Aspectos legales del contrato

PROCESO DE LICITACION PUBLICA MC-SI-46-2025 para la interventoría técnica, administrativa, financiera del contrato MC-SI-46-2025 cuyo objeto es **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA, CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO VIAS MEDIANTE LA MODALIDAD DE BACHEO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER**. fue adjudicada a ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A S.A.S por medio del Contrato MC-SI-46-2025 por valor de $ 27.931.326,57

Las actividades de control y seguimiento se llevan bajo las regulaciones del Contrato MC-SI-46-2025 cuyas condiciones generales se presentan a continuación.

Tabla 7 Información contrato de interventoría actualizado

DATOS INICIALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATO N°. FECHA	PATIOS-MC-SI-46-2025 DEL 08 DE AGOSTO DE 2025
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	ALCALDIA DE LOS PATIOS
CONTRATISTA	ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A -
N.I.T.	NIT 901.221.652-9
REPRESENTANTE LEGAL	ADRIANA CAROLINA LIZARAZO HIGUERA C.C. 60.396.923
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA, CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO VIAS MEDIANTE LA MODALIDAD DE BACHEO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO	VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTO VEINTISEIS PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE ($ 27.931.326,57)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP 0245 de Abril 24 de 2025
PLAZO O DURACIÓN	4 (CUATRO) MESES
SUPERVISOR	CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON
FECHA ACTA DE INICIO	22 de agosto de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	21 de diciembre de 2025.

4.1.2 POLIZAS INTERVENTORIA

Tabla 8 Póliza de interventoría (Cumplimento Anexo 2)

CONDICIONES SEGÚN ACTA DE INICIO DEL CONTRATO					
GARANTÍAS	**NOMBRE DEL ASEGURADOR**	**N° DE POLIZA**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
Calidad del servicio	SEGUROS DEL ESTADO	**49-44-101036826**	22/08/2025	22/03/2026	$ 2.793.132,66
Cumplimiento del servicio	SEGUROS DEL ESTADO	**49-44-101036826**	22/08/2025	22/11/2028	$ 2.793.132,66
Pago de salarios, prestaciones sociales	SEGUROS DEL ESTADO	**49-44-101036826**	22/11/2025	23/11/2030	$ 5.586.265,31

4.1.6 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

Durante el periodo del correspondiente informe del proyecto la interventoría realizo las siguientes actividades:

Actividades realizadas por la interventoría

- ✓ Control de las actividades de localización y replanteo.
- ✓ Se constató el corte del pavimento existente.
- ✓ Inspección de la demolición de pavimento existente.
- ✓ Se corroboró la ejecución de la excavación manual sin clasificar.
- ✓ Se realizó la supervisión de la conformación y compactación de la subrasante.
- ✓ Inspección del suministro e instalación de base granular para bacheo.
- ✓ Se verificó el riego de liga.
- ✓ Control de la instalación de mezcla asfáltica MDC-19para bacheo.
- ✓ Se verificó el retiro adecuado de los sobrantes generados durante la ejecución de las actividades.

4.2 AVANCE DEL PROYECTO

De acuerdo con las actividades ejecutas por el contratista en el presente informe de interventoría el contratista ejecutó **$ 397.044.805,00** en el segundo mes para un ejecutado acumulado de **$ 704.702.809,00 equivalente a 99.99%** en total, quedando un saldo a favor de la entidad de **$ 15.818,00**.

CONCLUSIONES

- Las actividades ejecutas acumuladas por el contratista en el presente informe de interventoría el contratista ejecutó **de $ 704.702.809,00 equivalente a 99.99%**

- De acuerdo con las actividades ejecutas a la fecha se presenta un avance acumulado del **99.99%** equivalente a **$ 704.702.809,00** frente a un programado de **100.00%**

- Queda un saldo a favor de la entidad de $ 15.818,00.

OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (%)	100.00%	VALOR OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**$ 704.718.627,00**
OBRA EJECUTADA ACUMULADA (%)	99.99%	**VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA**	**$ 704.702.809,00**

ADRIANA CAROLINA LIZARAZO HIGUERA
RL ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A S.A.S.
CC 60396923

EMA

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA
Nº 24247

FECHA
17 | 9 | 25

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR: Hnos Pinzón
RECIBIDOR:
VEHICULO PLACA: F D P 0 7 2
MEDIDAS DEL VOLTEO: 3 Mts
METROS CÚBICOS: 6 mts
FIRMA RECIBIDOR:

HORA DE ENTRADA: 4:25 PM
HORA DE SALIDA: 4:30 PM
OBRA: Contrato 1 barrio INC. San batista Bl Betania

EMA

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA
Nº 24249

FECHA
16 | 9 | 25

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR: Hnos Pinzón
RECIBIDOR:
VEHICULO PLACA: F D P 0 7 2
MEDIDAS DEL VOLTEO: 3 Mts
METROS CÚBICOS: 6 mts
FIRMA RECIBIDOR:

HORA DE ENTRADA: 9:45 AM
HORA DE SALIDA: 9:50 AM
OBRA: Contrato 1 barrio INC. San batista Bl Betania

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA

Nº 24250

FECHA		
16	9	25

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR: Hernan Parra

RECIBIDOR:

VEHICULO PLACA: F D P 0 7 2

MEDIDAS DEL VOLTEO: 6 m3

METROS CÚBICOS: 6 m3

FIRMA RECIBIDOR:

HORA DE ENTRADA: 10:25 AM

HORA DE SALIDA: 10:30 AM

OBRA: Contrato 3 bache INC Bo Bache B/ Lotus

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA

Nº 25901

FECHA		
16	9	25

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR: Hernan Parra

RECIBIDOR:

VEHICULO PLACA: F D P 0 7 2

MEDIDAS DEL VOLTEO: 6 m3

METROS CÚBICOS: 6 m3

FIRMA RECIBIDOR:

HORA DE ENTRADA: 11:00 AM

HORA DE SALIDA: 11:05 AM

OBRA: Contrato 3 bache INC Bo Bache B/ Lotus

EMA

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA

Nº 25902

FECHA		
16	9	25

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR: Hmer Pardo	HORA DE ENTRADA: 11:40AM
RECIBIDOR: [illegible]	HORA DE SALIDA: 11:45AM
VEHICULO PLACA: F D P 0 7 2	OBRA: Contrato d Lechuga ZNG La Loma Bx Bolero
MEDIDAS DEL VOLTEO: 3 Mts	
METROS CÚBICOS: 1y5	
FIRMA RECIBIDOR: [illegible]	

EMA

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA

Nº 25903

FECHA		
16	9	25

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR: Hmer Pardo	HORA DE ENTRADA: 1:40 PM
RECIBIDOR: [illegible]	HORA DE SALIDA: 1:45 PM
VEHICULO PLACA: F D P 0 7 2	OBRA: Contrato d Lechuga ZNG Dos hermanos B/ Bolero
MEDIDAS DEL VOLTEO: 3 Mts	
METROS CÚBICOS: 1y5	
FIRMA RECIBIDOR: [illegible]	

EMA

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA

Nº 25904

FECHA		
16	9	24

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR: Hmon Parada	HORA DE ENTRADA: 2:21 PM
RECIBIDOR: [illegible]	HORA DE SALIDA: 2.30 PM
VEHICULO PLACA: F D 7 0 7 2	OBRA: Contrato de Barba INC Dayne Patiño R/ Belmo
MEDIDAS DEL VOLTEO: 6 m3	
METROS CÚBICOS: [illegible]	
FIRMA RECIBIDOR: [illegible]	

EMA

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA

Nº 25905

FECHA		
16	9	24

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR: Hmon Parada	HORA DE ENTRADA: 3:10 PM
RECIBIDOR: [illegible]	HORA DE SALIDA: 3:15 PM
VEHICULO PLACA: F D P 0 7 2	OBRA: Contrato de Barba INC Dayne Patiño R/ Belmo
MEDIDAS DEL VOLTEO: 6 m3	
METROS CÚBICOS: [illegible]	
FIRMA RECIBIDOR: [illegible]	



Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA

Nº 25906

FECHA		
17	9	25

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR: Hernan Parra	HORA DE ENTRADA: 8:15 AM
RECIBIDOR: [illegible]	HORA DE SALIDA: 8:20 AM
VEHICULO PLACA: F D P 0 7 2	OBRA: [illegible]
MEDIDAS DEL VOLTEO: 6 Mts	
METROS CÚBICOS: 14	
FIRMA RECIBIDOR: [illegible]	



Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA

Nº 25907

FECHA		
17	9	25

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR: Hernan Parra	HORA DE ENTRADA: 8:55 AM
RECIBIDOR: [illegible]	HORA DE SALIDA: 9:00 AM
VEHICULO PLACA: F D P 0 7 2	OBRA: [illegible]
MEDIDAS DEL VOLTEO: 6 Mts	
METROS CÚBICOS: 14	
FIRMA RECIBIDOR: [illegible]	

EMA

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA

Nº 25909

FECHA		
16	9	25

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR: [illegible]

RECIBIDOR:

VEHICULO PLACA						
	W	F	J	5	3	0

MEDIDAS DEL VOLTEO: 6 M3

METROS CÚBICOS: 6 M3

FIRMA RECIBIDOR:

HORA DE ENTRADA: 10:40 AM

HORA DE SALIDA: 10:45 AM

OBRA: Contrato de barbra INC Dayra Patiño

EMA

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA

Nº 25910

FECHA		
16	9	25

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR: Armando Rodriguez

RECIBIDOR:

VEHICULO PLACA						
	W	F	J	5	3	0

MEDIDAS DEL VOLTEO: 6 M3

METROS CÚBICOS: 6 M3

FIRMA RECIBIDOR:

HORA DE ENTRADA: 11:40 AM

HORA DE SALIDA: 11:45 AM

OBRA: Contrato de barbra INC Dayra Patiño Pl batonia

EMA

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA

Nº 25911

FECHA		
15	9	25

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR: Armando Pabón	HORA DE ENTRADA: 12:10 PM
RECIBIDOR:	HORA DE SALIDA: 12:15 PM
VEHICULO PLACA: W F J 5 3 E	OBRA: Contrato de bordes INC. Dique Patio Reforma
MEDIDAS DEL VOLTEO: 6 Mts	
METROS CÚBICOS: 11yds	
FIRMA RECIBIDOR:	

EMA

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA

Nº 25912

FECHA		
16	9	25

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR: Armando Pabón	HORA DE ENTRADA: 1:55 PM
RECIBIDOR:	HORA DE SALIDA: 2:00 PM
VEHICULO PLACA: W F J 5 3 0	OBRA: Contrato de bordes INC. Dique Patio Reforma
MEDIDAS DEL VOLTEO: 6 Mts	
METROS CÚBICOS: 11yds	
FIRMA RECIBIDOR:	

EMA

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA
Nº 25913

FECHA		
14	9	25

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR: Jhonatan Rodriguez	HORA DE ENTRADA: 3.00 PM
RECIBIDOR:	HORA DE SALIDA: 3:05 PM
VEHICULO PLACA: WFJ 530	OBRA: Contrato 1 Barbo INC Doyre Patios B/ Bolivarios
MEDIDAS DEL VOLTEO: C Mts	
METROS CÚBICOS: 6yd	
FIRMA RECIBIDOR:	

EMA

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA
Nº 25914

FECHA		
19	9	25

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR: Hernan Prueba	HORA DE ENTRADA: 9:15 AM
RECIBIDOR:	HORA DE SALIDA: 9:20 AM
VEHICULO PLACA: FDP 072	OBRA: Contrato 1 Barbo INC Doyre Patios B/ Bolivarios
MEDIDAS DEL VOLTEO: C Mts	
METROS CÚBICOS: 6yd	
FIRMA RECIBIDOR:	

EMA

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA
Nº 25915

FECHA		
19	9	25

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR: Hnos. Pardo	HORA DE ENTRADA: 10:25 AM
RECIBIDOR:	HORA DE SALIDA: 10:30 AM
VEHICULO PLACA: F D P 0 7 2	OBRA: Contrato a Fabio INC Dpto Patria Bl Bolero
MEDIDAS DEL VOLTEO: 3 Mts	
METROS CÚBICOS: 3 Mts	
FIRMA RECIBIDOR:	

EMA

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA
Nº 25917

FECHA		
19	9	25

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR: Hnos. Pardo	HORA DE ENTRADA: 2:40 PM
RECIBIDOR:	HORA DE SALIDA: 2:45 PM
VEHICULO PLACA: F D P 0 7 2	OBRA: Contrato a Fabio INC Dpto P. Bl Bolero
MEDIDAS DEL VOLTEO: 3 Mts	
METROS CÚBICOS: 3 Mts	
FIRMA RECIBIDOR:	

EMA

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA

Nº 25919

FECHA		
19	9	25

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR: Hernan Pardo

RECIBIDOR:

VEHICULO PLACA: F D P 0 7 2

MEDIDAS DEL VOLTEO: 6 m³

METROS CÚBICOS: 7 m³

FIRMA RECIBIDOR:

HORA DE ENTRADA: 4:40 PM

HORA DE SALIDA: 4:45 PM

OBRA: Contrato 2 bache UNE Dayra patiño B/ Bolonia

EMA

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA

Nº 25920

FECHA		
20	9	25

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR: Hernan Pardo

RECIBIDOR:

VEHICULO PLACA: F D P 0 7 2

MEDIDAS DEL VOLTEO: 6 m³

METROS CÚBICOS: 7 m³

FIRMA RECIBIDOR:

HORA DE ENTRADA: 9:40 AM

HORA DE SALIDA: 9:45 AM

OBRA: Contrato 2 bache UNE Dayra patiño B/ Bolonia

EMA

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA
Nº 25922

FECHA

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR:
RECIBIDOR:
VEHICULO PLACA
MEDIDAS DEL VOLTEO:
METROS CÚBICOS:
FIRMA RECIBIDOR:

HORA DE ENTRADA: 10:40 AM
HORA DE SALIDA: 10:45 AM
OBRA:

EMA

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA
Nº 25930

FECHA 13 | 9 | 24

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR: Hernan prueba
RECIBIDOR:
VEHICULO PLACA: F | D | P | 0 | 7 | 2
MEDIDAS DEL VOLTEO: 6 m3
METROS CÚBICOS: 3 m3
FIRMA RECIBIDOR:

HORA DE ENTRADA: 12:00 PM
HORA DE SALIDA: 12:05 PM
OBRA: Contab d

EMA

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA
Nº 25931

FECHA

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR: Miguel Sanabria
RECIBIDOR:
VEHICULO PLACA: S B K 0 5 9
MEDIDAS DEL VOLTEO: 6 m3
METROS CÚBICOS: 7 m3
FIRMA RECIBIDOR:

HORA DE ENTRADA: 12
HORA DE SALIDA: 12:05 PM
OBRA: Contrato de bordeo ING Dayra patiño B/ bolonia

EMA

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA
Nº 25933

FECHA

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR: Hernan Parada
RECIBIDOR:
VEHICULO PLACA: F D P 0 7 2
MEDIDAS DEL VOLTEO: 8 m3
METROS CÚBICOS:
FIRMA RECIBIDOR:

HORA DE ENTRADA: 1:30 PM
HORA DE SALIDA: 1:35 PM
OBRA: Contrato de bordeo ING Dayra patiño B/ bolonia

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA

Nº 25934

FECHA		
23	9	24

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR: Miguel Sanab...	HORA DE ENTRADA: 1:10 pm
RECIBIDOR: [signature]	HORA DE SALIDA: 1:45 pm
VEHICULO PLACA: S B K 0 5 F	OBRA: Portal...
MEDIDAS DEL VOLTEO: 6m3	
METROS CÚBICOS: 7	
FIRMA RECIBIDOR: [signature]	

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA

Nº 25935

FECHA		
23	9	24

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR: [illegible]	HORA DE ENTRADA: 2.10 pm
RECIBIDOR: [signature]	HORA DE SALIDA: 2.15 pm
VEHICULO PLACA: I D P 0 [illegible]	OBRA: [illegible]
MEDIDAS DEL VOLTEO: 6m3	
METROS CÚBICOS: 7	
FIRMA RECIBIDOR: [signature]	

EMA

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA
Nº 25937

FECHA

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR:
RECIBIDOR:
VEHICULO PLACA: B K O S 9
MEDIDAS DEL VOLTEO: 6 m³
METROS CÚBICOS:
FIRMA RECIBIDOR:

HORA DE ENTRADA: 2:15 PM
HORA DE SALIDA: 2:30 PM
OBRA: Contrato de hab. ING. Daniel Patiño B/ Betoria

EMA

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA
Nº 25938

FECHA

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR:
RECIBIDOR:
VEHICULO PLACA: F D P 0 7 2
MEDIDAS DEL VOLTEO: 6 m³
METROS CÚBICOS: 7 viajes
FIRMA RECIBIDOR:

HORA DE ENTRADA:
HORA DE SALIDA: 2:55 PM
OBRA: Contrato a hab. ING. Daniel Patiño B/ Betoria.

EMA

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA

Nº 25939

FECHA

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR: [illegible] Bomba

RECIBIDOR: [illegible]

VEHICULO PLACA: [illegible] B L 0 5 7

MEDIDAS DEL VOLTEO: 6m3

METROS CÚBICOS: 3y5

FIRMA RECIBIDOR: [illegible]

HORA DE ENTRADA: 2:5[illegible]

HORA DE SALIDA: 2:55 PM

OBRA: Contrato a
bachco IVG
Dyne Polito
El betano

EMA

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA

Nº 25940

FECHA 23 9 24

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR: Hnos pardo

RECIBIDOR: [illegible]

VEHICULO PLACA: F D P [illegible] 1 2

MEDIDAS DEL VOLTEO: 6m3

METROS CÚBICOS: 3y5

FIRMA RECIBIDOR: [illegible]

HORA DE ENTRADA: 3.35 PM

HORA DE SALIDA: 3 40PM

OBRA: Contrato d
Pachco IVC
Dyne Polito
El Betano

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA

Nº 25941

FECHA

[illegible]	9	24

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR: [illegible]	HORA DE ENTRADA: 3:50 PM
RECIBIDOR: [illegible]	HORA DE SALIDA: 3:55 PM
VEHICULO PLACA: [illegible]	OBRA: [illegible]
MEDIDAS DEL VOLTEO: [illegible]	
METROS CÚBICOS: 1 viaje	
FIRMA RECIBIDOR: [illegible]	

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA

Nº 25943

FECHA

24	9	24

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR: Hernan Pulido	HORA DE ENTRADA: 9:50 AM
RECIBIDOR: [illegible]	HORA DE SALIDA: 9:55 AM
VEHICULO PLACA: FDP079	OBRA: Contado a Bonhia INC Dique Patios Bl Bolivar
MEDIDAS DEL VOLTEO: GN3	
METROS CÚBICOS: 1 viaje	
FIRMA RECIBIDOR: [illegible]	

EMA

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA
Nº 25945

FECHA		
24	9	25

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR: Hamer Pardo	HORA DE ENTRADA: 1:40 PM
RECIBIDOR:	HORA DE SALIDA: 1:45 PM
VEHICULO PLACA: F D P 0 7 2	OBRA: Contrato de bache LVG Deyni Polo Bl Jardin
MEDIDAS DEL VOLTEO: 6 M³	
METROS CÚBICOS: 3 Viajes	
FIRMA RECIBIDOR:	

EMA

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA
Nº 25946

FECHA		
24	9	25

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR: Hamer pardo	HORA DE ENTRADA: 2:15 PM
RECIBIDOR:	HORA DE SALIDA: 2:20 PM
VEHICULO PLACA: F D P 0 7 2	OBRA: Contrato de bache LVG Deyni Polo Bl Jardin
MEDIDAS DEL VOLTEO: 6 M³	
METROS CÚBICOS: 3 Viajes	
FIRMA RECIBIDOR:	

EMA

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA
Nº 25948

FECHA 7 / 9 / 25

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR: Hernan Pulido
RECIBIDOR: [signature]
VEHICULO PLACA: F D P 0 7 2
MEDIDAS DEL VOLTEO: 6 m³
METROS CÚBICOS: Image
FIRMA RECIBIDOR: [signature]

HORA DE ENTRADA: 3:00 PM
HORA DE SALIDA: 3:05 PM
OBRA: Concreto de Bache TNG Donde Pulido El Bolero

EMA

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA
Nº 25949

FECHA 7 / 9 / 25

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR: Hernan Pulido
RECIBIDOR: [signature]
VEHICULO PLACA: F D P 0 7 2
MEDIDAS DEL VOLTEO: 6 m³
METROS CÚBICOS: Image
FIRMA RECIBIDOR: [signature]

HORA DE ENTRADA: 3:45 PM
HORA DE SALIDA: 3:50 PM
OBRA: Concreto de Bache TNG Donde Pulido El Bolero

EMA

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA
Nº 25951

FECHA		
29	7	25

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR:	Hern- pard
RECIBIDOR:	
VEHICULO PLACA	T D P 0 7 2
MEDIDAS DEL VOLTEO:	Gn
METROS CÚBICOS:	7 m
FIRMA RECIBIDOR:	

HORA DE ENTRADA: 9:49 am
HORA DE SALIDA: 9:50 am

OBRA: Construct
Barrio JAC
Dosquebradas
RP Bolsa

EMA

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA
Nº 25952

FECHA		
29	7	25

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR:	Hern pard
RECIBIDOR:	
VEHICULO PLACA	T D P 0 7 2
MEDIDAS DEL VOLTEO:	Gn
METROS CÚBICOS:	7m
FIRMA RECIBIDOR:	

HORA DE ENTRADA: 10:40 am
HORA DE SALIDA: 10:45 am

OBRA: Construc
Barrio JAC
Dosquebradas
RP Bolsa

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA

Nº 25954

FECHA		
25	9	25

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR: Hernan Pardo	HORA DE ENTRADA: 12:00 PM
RECIBIDOR: J	HORA DE SALIDA: 2:00 PM
VEHICULO PLACA: F D P D 7 2	OBRA: Conjunto d Portal 4 NC Dayro Polan BL Polan
MEDIDAS DEL VOLTEO: 6m3	
METROS CÚBICOS: 1 viaje	
FIRMA RECIBIDOR: J	

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA

Nº 25956

FECHA		
25	9	25

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR: Hernan Polan	HORA DE ENTRADA: 3:40 PM
RECIBIDOR: J	HORA DE SALIDA: 3:45 PM
VEHICULO PLACA: F D P O 7 2	OBRA: Conjunto cer Portal 4NC Dayro Polan BL Polan
MEDIDAS DEL VOLTEO: 6m3	
METROS CÚBICOS: 1 viaje	
FIRMA RECIBIDOR: J	

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA

Nº 25957

FECHA 21 | 9 | 25

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR: Hitor Pardo

RECIBIDOR: -E

VEHICULO PLACA: T | D | P | 0 | 7 | 2

MEDIDAS DEL VOLTEO: 6m³

METROS CÚBICOS: 6m³

FIRMA RECIBIDOR: E

HORA DE ENTRADA: 4.10PM

HORA DE SALIDA: 4:45 PM

OBRA: Parque de Patios IVS Dique Patio Bl bolsos

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA

Nº 25960

FECHA 26 | 9 | 25

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR: Hno pardo

RECIBIDOR: -E

VEHICULO PLACA: T | D | P | 0 | 7 | 2

MEDIDAS DEL VOLTEO: 6m³

METROS CÚBICOS: 6m³

FIRMA RECIBIDOR: E

HORA DE ENTRADA: 2.15PM

HORA DE SALIDA: 2.20PM

OBRA: Parque de Patios INC Dique P Bl bolsas

EMA

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA
Nº 25961

FECHA		
26	9	24

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR: Jose Contreras	HORA DE ENTRADA: 2:15 PM
RECIBIDOR:	HORA DE SALIDA: 2:20 PM
VEHICULO PLACA: C U E 0 9 8	OBRA: Contrato 1 Portal ZNG Dayra P B/ Porton
MEDIDAS DEL VOLTEO: GM3	
METROS CUBICOS: 1/4	
FIRMA RECIBIDOR:	

EMA

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA
Nº 25962

FECHA		
26	9	25

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR: Jose Contreras	HORA DE ENTRADA: 7:50 PM
RECIBIDOR:	HORA DE SALIDA: 7:55 PM
VEHICULO PLACA: C U E 0 9 8	OBRA: Contrato 1 Portal ZNG Dayra P B/ Porton
MEDIDAS DEL VOLTEO: GM3	
METROS CUBICOS: 1/4	
FIRMA RECIBIDOR:	

EMA

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA
Nº 25963

FECHA		
21	9	24

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR: Hnos Pardo	HORA DE ENTRADA: 7:50 PM
RECIBIDOR:	HORA DE SALIDA: 2:55 PM
VEHICULO PLACA: F D P 0 7 2	OBRA: Contrato 0' Bocha ING Dayne P. B/ bolsa
MEDIDAS DEL VOLTEO: Gm³	
METROS CÚBICOS: bgs	
FIRMA RECIBIDOR:	

EMA

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA
Nº 25966

FECHA		
24	9	24

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR: Hnos Pardo	HORA DE ENTRADA: 7:40 AM
RECIBIDOR:	HORA DE SALIDA: 7:45 AM
VEHICULO PLACA: F D P 0 7 R	OBRA: Contrato a Bocheo INC Dayne P. B/ bolsa
MEDIDAS DEL VOLTEO: Gm³	
METROS CÚBICOS: Luego	
FIRMA RECIBIDOR:	

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA

Nº 25967

FECHA		
27	9	24

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR: Heron Parra

RECIBIDOR:

VEHICULO PLACA: F D P 0 7 2

MEDIDAS DEL VOLTEO: 6m³

METROS CÚBICOS:

FIRMA RECIBIDOR:

HORA DE ENTRADA: 8:30 AM

HORA DE SALIDA: 8:39 AM

OBRA: Contrato 2 Bocheo ±NG. Dayne P. B/ Bolívar

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA

Nº 25969

FECHA		
27	9	24

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR: Heron Parra

RECIBIDOR:

VEHICULO PLACA: F D P 0 7 2

MEDIDAS DEL VOLTEO: 6m³

METROS CÚBICOS:

FIRMA RECIBIDOR:

HORA DE ENTRADA: 9:45 AM

HORA DE SALIDA: 9:50 AM

OBRA: Contrato 2 Bocheo ±NG. Dayne P. B/ Bolívar

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA

Nº 25972

FECHA		
29	9	25

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR: Hernan Parada

RECIBIDOR: [illegible]

VEHICULO PLACA: F D P 0 7 P

MEDIDAS DEL VOLTEO: 6m³

METROS CÚBICOS: 10.8

FIRMA RECIBIDOR: [illegible]

HORA DE ENTRADA: 1:35 PM

HORA DE SALIDA: 1:35 PM

OBRA: Parhotel a Bordo JNC Dapre P. El bataon

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA

Nº 25973

FECHA		
29	9	25

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR: Hernan Parada

RECIBIDOR: [illegible]

VEHICULO PLACA: F D P 0 7 2

MEDIDAS DEL VOLTEO: 6m³

METROS CÚBICOS: 10.8

FIRMA RECIBIDOR: [illegible]

HORA DE ENTRADA: 7:50 PM

HORA DE SALIDA: 7:55 PM

OBRA: Contrato de bordeo JNC DP el batoma

EMA

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA

Nº 25975

FECHA		
29	9	25

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR: Hernan Pardo

RECIBIDOR: [illegible]

VEHICULO PLACA: T D P 0 7 2

MEDIDAS DEL VOLTEO: 6 m3

METROS CÚBICOS: 7 m3

FIRMA RECIBIDOR: [illegible]

HORA DE ENTRADA: 3:30 PM

HORA DE SALIDA: 3:35 PM

OBRA: Contrato a todo costo ENC Jorge Pulido B/ Bolivar

EMA

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA

Nº 25974

FECHA		
29	9	25

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR: Hernan Pardo

RECIBIDOR: [illegible]

VEHICULO PLACA: T D P 0 7 2

MEDIDAS DEL VOLTEO: 6 m3

METROS CÚBICOS: 7 m3

FIRMA RECIBIDOR: [illegible]

HORA DE ENTRADA: 2:50 PM

HORA DE SALIDA: 2:55 PM

OBRA: Contrato a todo costo ENC Jorge Pulido B/ Bolivar

EMA

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA
Nº 25977

FECHA		
29	9	24

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR: Hnos. Pardo	HORA DE ENTRADA: 4.25 PM
RECIBIDOR: J	HORA DE SALIDA: 4:30 PM
VEHICULO PLACA: F D P 0 7 2	OBRA: Control de bache. ENG Dorne P. B/ bolon.
MEDIDAS DEL VOLTEO: Cm^3	
METROS CÚBICOS: Jrge	
FIRMA RECIBIDOR:	

EMA

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA
Nº 25979

FECHA		
30	9	24

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR: Hnos Pardo	HORA DE ENTRADA: 9:05 AM
RECIBIDOR: Jo	HORA DE SALIDA: 9.10 AM
VEHICULO PLACA: F D 7 0 7 2	OBRA: Control E. d bache ENG Dorne P. B/ bolon
MEDIDAS DEL VOLTEO: Cm^3	
METROS CÚBICOS: Jrge	
FIRMA RECIBIDOR:	

EMA

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA

Nº 25981

FECHA: 30 | 09 | 22

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR: Hernan Pineda

RECIBIDOR: [signature]

VEHICULO PLACA: F D P 0 7 2

MEDIDAS DEL VOLTEO: Gm3

METROS CÚBICOS: 7 Mts3

FIRMA RECIBIDOR: [signature]

HORA DE ENTRADA: 9:50 AM

HORA DE SALIDA: 9:55 AM

OBRA: Contrato de Hecho ING Dayne Patiño Bl Bretonia

EMA

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA

Nº 25982

FECHA: 30 | 09 | 2022

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR: Hernan Pineda

RECIBIDOR: [signature]

VEHICULO PLACA: F D P 0 7 2

MEDIDAS DEL VOLTEO: Gm3

METROS CÚBICOS: 7 Mts3

FIRMA RECIBIDOR: [signature]

HORA DE ENTRADA: 10:28 AM

HORA DE SALIDA: 10:30 AM

OBRA: Contrato de Hecho ING Dayne P. Bl Bretonia

EMA

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA

Nº 25983

FECHA: 30 | 9 | 25

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR: Hermo pinto

RECIBIDOR:

VEHICULO PLACA: F D P 0 7 2

MEDIDAS DEL VOLTEO: 6m³

METROS CÚBICOS:

FIRMA RECIBIDOR:

HORA DE ENTRADA: 11:00 AM

HORA DE SALIDA: 11:05 AM

OBRA: Bombeo de hocho INC Dpto P. Bl bloque

EMA

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA

Nº 25984

FECHA:

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR:

RECIBIDOR:

VEHICULO PLACA:

MEDIDAS DEL VOLTEO:

METROS CÚBICOS:

FIRMA RECIBIDOR:

HORA DE ENTRADA: 11:50

HORA DE SALIDA: 11:55 AM

OBRA:

EMA

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA

Nº 25993

FECHA		
3	10	24

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR: Hugo pardo

RECIBIDOR:

VEHICULO PLACA: F O P 0 7 2

MEDIDAS DEL VOLTEO:

METROS CÚBICOS: Cm3

FIRMA RECIBIDOR:

HORA DE ENTRADA: 9:45 AM

HORA DE SALIDA: 1:50 PM

OBRA: Contra a Barbosa ENG Dayne Polo Bylot

EMA

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA

Nº 25994

FECHA		
3	10	24

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR: Miguel Cortes

RECIBIDOR:

VEHICULO PLACA: S U T 0 5 7

MEDIDAS DEL VOLTEO:

METROS CÚBICOS: Cm3

FIRMA RECIBIDOR:

HORA DE ENTRADA: 9:45 AM

HORA DE SALIDA: 10:00 AM

OBRA: Contrato del Derecho ENG Dayne P. Bylot

EMA

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA

Nº 25995

FECHA		
3	10	24

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR: Hernan [illegible]

RECIBIDOR:

VEHICULO PLACA: F U R O 7 2

MEDIDAS DEL VOLTEO:

METROS CÚBICOS: 6 m3

FIRMA RECIBIDOR:

HORA DE ENTRADA: 10:30 AM

HORA DE SALIDA: 10:35 AM

OBRA:

EMA

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA

Nº 25996

FECHA		
[illegible]	[illegible]	[illegible]

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR: [illegible]

RECIBIDOR:

VEHICULO PLACA: [illegible]

MEDIDAS DEL VOLTEO:

METROS CÚBICOS: 6 m3

FIRMA RECIBIDOR:

HORA DE ENTRADA: 10:40 AM

HORA DE SALIDA: 10:45 AM

OBRA:

EMA

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA
Nº 24693

FECHA		
29	10	21

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR: Shanson Fajardo

RECIBIDOR: [signature]

VEHICULO PLACA: R C G 1 4 7

MEDIDAS DEL VOLTEO:

METROS CÚBICOS: 6 m3

FIRMA RECIBIDOR: [signature]

HORA DE ENTRADA: 10:45 AM

HORA DE SALIDA: 10:50 AM

OBRA: Contrato bacheo Clorito pat.s

EMA

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA
Nº 24694

FECHA		
29	10	21

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR: Shanson Fajardo

RECIBIDOR: [signature]

VEHICULO PLACA: R C G 1 4 7

MEDIDAS DEL VOLTEO:

METROS CÚBICOS: 6 m3

FIRMA RECIBIDOR: [signature]

HORA DE ENTRADA: 11:15 AM

HORA DE SALIDA: 11:20 AM

OBRA: Contrato de bacheo B/ Hamilos

EMA

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA
Nº 24695

FECHA		
19	10	25

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR: Jhonson Franco	HORA DE ENTRADA: 12:05 PM
RECIBIDOR: [signature]	HORA DE SALIDA: 12:10 PM
VEHICULO PLACA: R C G 1 4 7	OBRA: Contrato de barrido Bl Manila
MEDIDAS DEL VOLTEO:	
METROS CÚBICOS: 6 m³	
FIRMA RECIBIDOR: [signature]	

EMA

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA
Nº 24696

FECHA		
19	10	25

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR: Jhonson Franco	HORA DE ENTRADA: 1:20 PM
RECIBIDOR: [signature]	HORA DE SALIDA: 1:25 PM
VEHICULO PLACA: R C G 1 4 7	OBRA: Contrato de barrido. Bl Manila
MEDIDAS DEL VOLTEO:	
METROS CÚBICOS: 6 m³	
FIRMA RECIBIDOR: [signature]	

EMA

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA
Nº 24697

FECHA		
29	10	25

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR:	Shanson Fonce
RECIBIDOR:	Jo
VEHICULO PLACA	P C G 1 4 7
MEDIDAS DEL VOLTEO:	
METROS CÚBICOS:	6 m3
FIRMA RECIBIDOR:	

HORA DE ENTRADA:	1:55 PM
HORA DE SALIDA:	2:00 PM
OBRA:	Contrato o bache B/ Manila

EMA

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA
Nº 24699

FECHA		
30	10	25

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR:	Shanson Fonce.
RECIBIDOR:	J
VEHICULO PLACA	P C C 1 4 7
MEDIDAS DEL VOLTEO:	
METROS CÚBICOS:	6 m3
FIRMA RECIBIDOR:	

HORA DE ENTRADA:	3:30 PM
HORA DE SALIDA:	3:35 PM
OBRA:	Contrato d bache B/ Manila polo

EMA

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA
Nº 24700

FECHA		
30	10	24

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR: Jhonson Fonn	HORA DE ENTRADA: 4:03 PM
RECIBIDOR:	HORA DE SALIDA: 4:10 PM
VEHICULO PLACA: T C G 1 4 7	OBRA: Contrato de bacheo B/ Llanitos
MEDIDAS DEL VOLTEO:	
METROS CÚBICOS: $6m^3$	
FIRMA RECIBIDOR:	

EMA

Escombrera Metropolitana
Agualinda S.A.S.
NIT. 900309269-7

CONTROL DE INGRESO DE VOLQUETA
Nº 24777

FECHA		
30	10	24

Avenida 5 #33-95 Edif. San Jose, Br. La Sabana
Los Patios, N. de S. - Tel. 5725009
E-mail: escombreralospatios@gmail.com

CONTROL DE RECIBO DE ESCOMBROS

CONDUCTOR: Jhonson Fonn	HORA DE ENTRADA: 11:15 AM
RECIBIDOR:	HORA DE SALIDA: 4:50 PM
VEHICULO PLACA: T C G 1 4 7	OBRA: Contrato de bacheo B/ Llanitos patio
MEDIDAS DEL VOLTEO:	
METROS CÚBICOS: $6m^3$	
FIRMA RECIBIDOR:	

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									
	ALCALDIA DE LOS PATIOS									
OBJETO	OBJETO: MANTENIMIENTO DE VIAS MEDIANTE LA MODALIDAD DE BACEHO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER									
CONTRATO No	LP-SI-006-2025				APOYO A LA SUPERVISIÓN			CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON		
CONTRATISTA	JAIRO JOSÉ BAUTISTA RAMÍREZ				CONTRATANTE			MUNICIPIO DE LOS PATIOS		
Interventoría	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS CONTRACTUALES C&A SAS									HOJA 1 DE 10
ITEM	1,10	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO							UNIDAD	M2

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES					CANTIDAD	VOLUMEN	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		LONG	ANCHO	ALTO	ÁREA					
10A	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	30,80	6,00		184,800				184,80	
10B	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	33,69	5,50		185,270				185,27	
10C	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	8,65	2,55		22,058				22,06	
10D	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	5,95	3,70		22,015				22,02	
11	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 5A Y AV 6	28,00	6,00		168,000				168,00	
12	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 5A Y AV 6	6,00	5,00		30,000				30,00	
13	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 5A Y AV 6	10,00	3,70		37,000				37,00	
14	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	8,80	6,70		58,960				58,96	
15	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	2,80	2,3		6,440				6,44	
16	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	5,30	4,25		22,504				22,50	
17	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	5,18	5,0		25,880				25,88	
18A	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10 LLANITOS	18,84	9,2		172,800				172,80	
18B	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10 LLANITOS	6,90	2,2		14,835				14,84	
18C	AVENIDA 10 LLANITOS	10,60	4,5		47,190				47,19	
19A	AVENIDA 10 LLANITOS	3,70	2,2		8,150				8,15	
19B	AVENIDA 10 LLANITOS	28,75	4,3		123,625				123,63	
20	AVENIDA 10 LLANITOS	2,85	4,0		11,260				11,26	
21A	AVENIDA 10 LLANITOS	3,30	4,7		15,50				15,50	
21B	AVENIDA 10 LLANITOS	25,00	6,0		150,00				150,00	
22	AVENIDA 10 LLANITOS	1,66	0,6		1,030				1,03	
23	AVENIDA 10 LLANITOS	4,24	1,7		7,208				7,21	
					TOTAL				1314,52	





OBSERVACIONES: Cantidades cuantificadas en obra junto con interventoría

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									
	ALCALDIA DE LOS PATIOS									
OBJETO	OBJETO: MANTENIMIENTO DE VIAS MEDIANTE LA MODALIDAD DE BACEHO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER									
CONTRATO No	LP-SI-006-2025				APOYO A LA SUPERVISIÓN		CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON			
CONTRATISTA	JAIRO JOSÉ BAUTISTA RAMÍREZ				CONTRATANTE		MUNICIPIO DE LOS PATIOS			
Interventoria	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS CONTRACTUALES C&A SAS									HOJA 2 DE 10
ITEM	2,10	CORTE DE PAVIMENTO EXISTENTE						UNIDAD	ML	

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES					CANTIDAD	VOLUMEN	TOTAL
		LONGITUD	LONGITUD	LONGITUD	LONGITUD				
10A	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	0,00							0,00
10B	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	0,00							0,00
10C	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	5,50	5,70						11,20
10D	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	5,95							5,95
11	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 5A Y AV 6	6,00	6,00						12,00
12	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 5A Y AV 6	5,00	5,00	6,00					16,00
13	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 5A Y AV 6	3,70	3,70	10,00					17,40
14	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	6,30	6,70	6,70					19,70
15	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	2,80	2,80	2,30					7,90
16	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	7,20	10,60	4,28	3,2				25,28
17	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	10,19	9,00	8,00					27,19
18A	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	7,20	5,57						12,77
18B	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	6,90	2,15						9,05
18C	AVENIDA 10 LLANITOS	5,40							5,40
19A	AVENIDA 10 LLANITOS	6,50	6,80						13,30
19B	AVENIDA 10 LLANITOS	28,70	4,20	28,70	4,20				65,80
20	AVENIDA 10 LLANITOS	6,20	5,70	3,40	2,86				18,16
21A	AVENIDA 10 LLANITOS	5,80	3,20	4,10	3,40				16,50
21B	AVENIDA 10 LLANITOS	12,00							12,00
22	AVENIDA 10 LLANITOS	3,65							3,65
23	AVENIDA 10 LLANITOS	2,60	2,00	7,24					11,84
					TOTAL				311,09

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES: Cantidades cuantificadas en obra junto con Interventoría

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									
	ALCALDIA DE LOS PATIOS									
OBJETO	OBJETO: MANTENIMIENTO DE VIAS MEDIANTE LA MODALIDAD DE BACEHO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER									
CONTRATO No	LP-SI-006-2025				APOYO A LA SUPERVISIÓN			CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON		
CONTRATISTA	JAIRO JOSÉ BAUTISTA RAMÍREZ				CONTRATANTE			MUNICIPIO DE LOS PATIOS		
Interventoría	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS CONTRACTUALES C&A SAS								HOJA 3 DE 10	
ITEM	2,20	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE							UNIDAD	M2

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES					CANTIDAD	VOLUMEN	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	ALTO	ANCHO	AREA					
10A	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	30,8	6,0		184,8				184,80	
10B	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	33,7	5,5		185,3				185,27	
10C	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	8,7	2,6		22,1				22,06	
10D	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	6,0	3,7		22,0				22,02	
11	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 5A Y AV 6	28,0	6,0		168,0				168,00	
11	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2		-1,4				-1,44	
12	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 5A Y AV 6	6,0	5,0		30,0				30,00	
13	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 5A Y AV 6	10,0	3,7		37,0				37,00	
14	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	8,80	6,70		58,96				58,96	
14	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2		-1,44				-1,44	
15	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	2,80	2,30		6,44				6,44	
16	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	5,3	4,2		22,50				22,50	
17	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	5,18	5,00		25,88				25,88	
17	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2		-1,44				-1,44	
18A	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	24,00	7,20		172,80				172,80	
18A	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2		-1,44				-1,44	
18A	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2		-1,44				-1,44	
18B	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	6,90	2,15		14,84				14,84	
18C	AVENIDA 10 LLANITOS	10,60	4,45		47,19				47,19	
19A	AVENIDA 10 LLANITOS	3,70	2,2		8,15				8,15	
19B	AVENIDA 10 LLANITOS	28,75	4,30		123,63				123,63	
20	AVENIDA 10 LLANITOS	2,85	4,0		11,26				11,26	
21A	AVENIDA 10 LLANITOS	3,30	4,7		15,50				15,50	
21B	AVENIDA 10 LLANITOS	25,00	6,0		150,00				150,00	
21B	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2		-1,44				-1,44	
21B	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2		-1,44				-1,44	
22	AVENIDA 10 LLANITOS	1,66	0,62		1,03				1,03	
23	AVENIDA 10 LLANITOS	4,24	1,7		7,21				7,21	
					TOTAL				1304,44	





OBSERVACIONES: Cantidades cuantificadas en obra junto con Interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ALCALDIA DE LOS PATIOS

OBJETO	OBJETO: MANTENIMIENTO DE VIAS MEDIANTE LA MODALIDAD DE BACEHO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER		
CONTRATO No	LP-SI-006-2025	APOYO A LA SUPERVISIÓN	CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON
CONTRATISTA	JAIRO JOSÉ BAUTISTA RAMÍREZ	CONTRATANTE	MUNICIPIO DE LOS PATIOS
Interventoria	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS CONTRACTUALES C&A SAS		HOJA 4 DE 10
ITEM	2,30	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR	UNIDAD M3

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES								REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	ANCHO		AREA	ALTO	CANTIDAD	VOLUMEN	TOTAL	
10A	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	30,8	6,0		184,80	0,17		31,42	31,42	
10B	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	33,7	5,5		185,27	0,17		31,50	31,50	
10C	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	8,7	2,6		22,06	0,17		3,75	3,75	
10D	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	6,0	3,7		22,02	0,17		3,74	3,74	
11	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 5A Y AV 6	28,0	6,0		168,00	0,17		28,56	28,56	
11	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2		-1,44	0,17		-0,24	-0,24	
12	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 5A Y AV 6	6,0	5,0		30,00	0,17		5,10	5,10	
13	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 5A Y AV 6	10,0	3,7		37,00	0,17		6,29	6,29	
14	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	8,80	6,70		58,96	0,17		10,02	10,02	
14	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2		-1,44	0,17		-0,24	-0,24	
15	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	2,80	2,30		6,44	0,17		1,09	1,09	
16	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	5,3	4,2		22,50	0,17		3,83	3,83	
17	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	5,18	5,00		25,88	0,17		4,40	4,40	
17	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2		-1,44	0,17		-0,24	-0,24	
18A	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	24,00	7,20		172,80	0,17		29,38	29,38	
18A	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2		-1,44	0,17		-0,24	-0,24	
18A	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2		-1,44	0,17		-0,24	-0,24	
18B	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	6,90	2,15		14,84	0,17		2,52	2,52	
18C	AVENIDA 10 LLANITOS	10,60	4,45		47,19	0,17		8,02	8,02	
19A	AVENIDA 10 LLANITOS	3,70	2,2		8,15	0,17		1,39	1,39	
19B	AVENIDA 10 LLANITOS	28,75	4,30		123,63	0,17		21,02	21,02	
20	AVENIDA 10 LLANITOS	2,84	4,0		11,20	0,17		1,90	1,90	
21A	AVENIDA 10 LLANITOS	3,30	4,7		15,50	0,17		2,63	2,63	
21B	AVENIDA 10 LLANITOS	25,00	6,0		150,00	0,17		25,50	25,50	
21B	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2		-1,44	0,17		-0,24	-0,24	
21B	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2		-1,44	0,17		-0,24	-0,24	
22	AVENIDA 10 LLANITOS	0,0	0,0		0,00	0,00		0,00	0,00	
23	AVENIDA 10 LLANITOS	4,24	1,7		7,21	0,17		1,23	1,23	
					TOTAL				221,57	





OBSERVACIONES: Cantidades cuantificadas en obra junto con Interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ALCALDIA DE LOS PATIOS

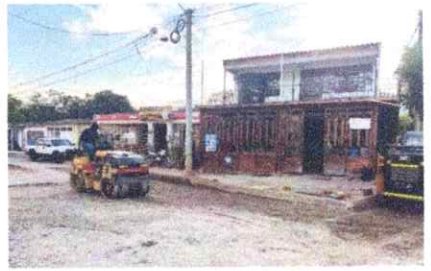
OBJETO	OBJETO: MANTENIMIENTO DE VIAS MEDIANTE LA MODALIDAD DE BACEHO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER
CONTRATO No	LP-SI-006-2025
CONTRATISTA	JAIRO JOSÉ BAUTISTA RAMÍREZ
Interventoría	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS CONTRACTUALES C&A SAS
ITEM	2,40

APOYO A LA SUPERVISIÓN	CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE LOS PATIOS

CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE — UNIDAD: M2

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES					CANTIDAD	VOLUMEN	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA				
10A	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	30,8	6,0		184,80				184,80
10B	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	33,7	5,5		185,27				185,27
10C	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	8,7	2,6		22,06				22,06
10D	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	6,0	3,7		22,02				22,02
11	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 5A Y AV 6	28,0	6,0		168,00				168,00
11	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2		-1,44				-1,44
12	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 5A Y AV 6	6,0	5,0		30,00				30,00
13	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 5A Y AV 6	10,0	3,7		37,00				37,00
14	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	8,80	6,70		58,96				58,96
14	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2		-1,44				-1,44
15	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	2,80	2,30		6,44				6,44
16	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	5,3	4,2		22,50				22,50
17	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	5,18	5,00		25,88				25,88
17	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2		-1,44				-1,44
18A	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	24,00	7,20		172,80				172,80
18A	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2		-1,44				-1,44
18A	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2		-1,44				-1,44
18B	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	6,90	2,15		14,84				14,84
18C	AVENIDA 10 LLANITOS	10,60	4,45		47,19				47,19
19A	AVENIDA 10 LLANITOS	3,70	2,2		8,15				8,15
19B	AVENIDA 10 LLANITOS	28,75	4,30		123,63				123,63
20	AVENIDA 10 LLANITOS	2,85	4,0		11,26				11,26
21A	AVENIDA 10 LLANITOS	3,30	4,7		15,50				15,50
21B	AVENIDA 10 LLANITOS	25,00	6,0		150,00				150,00
21B	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2		-1,44				-1,44
21B	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2		-1,44				-1,44
22	AVENIDA 10 LLANITOS	1,66	0,62		1,03				1,03
23	AVENIDA 10 LLANITOS	4,24	1,70		7,21				7,21
					TOTAL				1304,44

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES: Cantidades cuantificadas en obra junto con Interventoría

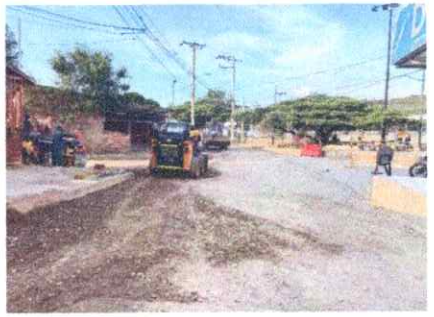
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ALCALDIA DE LOS PATIOS

OBJETO	OBJETO: MANTENIMIENTO DE VIAS MEDIANTE LA MODALIDAD DE BACEHO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER		
CONTRATO No	LP-SI-006-2025	APOYO A LA SUPERVISIÓN	CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON
CONTRATISTA	JAIRO JOSÉ BAUTISTA RAMÍREZ	CONTRATANTE	MUNICIPIO DE LOS PATIOS
Interventoría	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS CONTRACTUALES C&A SAS		HOJA 6 DE 10
ITEM	2,50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR PARA BACHEO	UNIDAD M3

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES				ESPESOR	CANTIDAD	VOLUMEN	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA				
10A	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	30,8	6,0		184,80	0,15		27,72	27,7
10B	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	33,7	5,5		185,27	0,15		27,79	27,8
10C	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	8,7	2,6		22,06	0,15		3,31	3,3
10D	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	6,0	3,7		22,02	0,15		3,30	3,3
11	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 5A Y AV 6	28,0	6,0		168,00	0,15		25,20	25,20
11	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2		-1,44	0,15		-0,22	-0,22
12	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 5A Y AV 6	6,0	5,0		30,00	0,15		4,50	4,50
13	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 5A Y AV 6	10,0	3,7		37,00	0,15		5,55	5,55
14	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	8,80	6,70		58,96	0,15		8,84	8,84
14	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2		-1,44	0,15		-0,22	-0,22
15	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	2,80	2,30		6,44	0,15		0,97	0,97
16	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	5,3	4,2		22,50	0,15		3,38	3,38
17	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	5,18	5,00		25,88	0,15		3,88	3,88
17	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2		-1,44	0,15		-0,22	-0,22
18A	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	24,00	7,20		172,80	0,15		25,92	25,92
18A	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2		-1,44	0,15		-0,22	-0,22
18A	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2		-1,44	0,15		-0,22	-0,22
18B	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	6,90	2,15		14,84	0,15		2,23	2,23
18C	AVENIDA 10 LLANITOS	10,60	4,45		47,19	0,15		7,08	7,08
19A	AVENIDA 10 LLANITOS	3,70	2,2		8,15	0,15		1,22	1,22
19B	AVENIDA 10 LLANITOS	28,75	4,30		123,63	0,15		18,54	18,54
20	AVENIDA 10 LLANITOS	2,85	4,0		11,26	0,15		1,69	1,69
21A	AVENIDA 10 LLANITOS	3,30	4,7		15,50	0,15		2,33	2,33
21B	AVENIDA 10 LLANITOS	25,00	6,0		150,00	0,15		22,50	22,50
21B	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2		-1,44	0,15		-0,22	-0,22
21B	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2		-1,44	0,15		-0,22	-0,22
22	AVENIDA 10 LLANITOS	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
23	AVENIDA 10 LLANITOS	1,70	4,2		7,21	0,15		1,08	1,08
					TOTAL				195,51

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES: Cantidades cuantificadas en obra junto con Interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ALCALDIA DE LOS PATIOS

OBJETO	OBJETO: MANTENIMIENTO DE VIAS MEDIANTE LA MODALIDAD DE BACEHO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER		
CONTRATO No	LP-SI-006-2025	APOYO A LA SUPERVISIÓN	CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON
CONTRATISTA	JAIRO JOSÉ BAUTISTA RAMÍREZ	CONTRATANTE	MUNICIPIO DE LOS PATIOS
Interventoría	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS CONTRACTUALES C&A SAS		HOJA 7 DE 10
ITEM	3,10	RIEGO DE LIGA	UNIDAD M2

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES				CANTIDAD			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA				
10A	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	30,8	6,0		184,80				184,80
10B	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	33,7	5,5		185,27				185,27
10C	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	8,7	2,6		22,06				22,06
10D	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	6,0	3,7		22,02				22,02
11	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 5A Y AV 6	28,0	6,0		168,00				168,00
11	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2		-1,44				-1,44
12	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 5A Y AV 6	6,0	5,0		30,00				30,00
13	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 5A Y AV 6	10,0	3,7		37,00				37,00
14	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	8,80	6,70		58,96				58,96
14	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2		-1,44				-1,44
15	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	2,80	2,30		6,44				6,44
16	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	5,3	4,2		22,50				22,50
17	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	5,18	5,00		25,88				25,88
17	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2		-1,44				-1,44
18A	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	24,00	7,20		172,80				172,80
18A	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2		-1,44				-1,44
18A	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2		-1,44				-1,44
18B	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	6,90	2,15		14,84				14,84
18C	AVENIDA 10 LLANITOS	10,60	4,45		47,19				47,19
19A	AVENIDA 10 LLANITOS	3,70	2,2		8,15				8,15
19B	AVENIDA 10 LLANITOS	28,75	4,30		123,63				123,63
20	AVENIDA 10 LLANITOS	2,85	4,0		11,26				11,26
21A	AVENIDA 10 LLANITOS	3,30	4,7		15,50				15,50
21B	AVENIDA 10 LLANITOS	25,00	6,0		150,00				150,00
21B	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2		-1,44				-1,44
21B	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2		-1,44				-1,44
22	AVENIDA 10 LLANITOS	1,66	0,62		1,03				1,03
23	AVENIDA 10 LLANITOS	4,24	1,70		7,21				7,21
					TOTAL				1.304,44

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES: Cantidades tomadas de plano estructural y verificadas en obra

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ALCALDIA DE LOS PATIOS

OBJETO	OBJETO: MANTENIMIENTO DE VIAS MEDIANTE LA MODALIDAD DE BACEHO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER		
CONTRATO No	LP-SI-006-2025	APOYO A LA SUPERVISION	CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON
CONTRATISTA	JAIRO JOSÉ BAUTISTA RAMÍREZ	CONTRATANTE	MUNICIPIO DE LOS PATIOS
Interventoria	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS CONTRACTUALES C&A SAS		HOJA 8 DE 10
ITEM	3,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA MDC-19 PARA BACHEO	UNIDAD M3

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES				ESPESOR	CANTIDAD	VOLUMEN	TOTAL
		LARGO	ANCHO		AREA				
10A	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	30,8	6,0		184,80	0,09		16,6	16,63
10B	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	33,7	5,5		185,27	0,09		16,7	16,67
10C	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	8,7	2,6		22,06	0,09		2,0	1,99
10D	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	6,0	3,7		22,02	0,09		2,0	1,98
11	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 5A Y AV 6	28,0	6,0		168,00	0,09		15,1	15,12
11	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2		-1,44	0,09		-0,1	-0,13
12	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 5A Y AV 6	6,0	5,0		30,00	0,09		2,7	2,70
13	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 5A Y AV 6	10,0	3,7		37,00	0,09		3,3	3,33
14	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	8,80	6,70		58,96	0,09		5,3	5,31
14	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2		-1,44	0,09		-0,1	-0,13
15	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	2,80	2,30		6,44	0,09		0,6	0,58
16	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	5,3	4,2		22,50	0,09		2,0	2,03
17	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	5,18	5,00		25,88	0,09		2,3	2,33
17	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2		-1,44	0,09		-0,1	-0,13
18A	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	24,00	7,20		172,80	0,09		15,6	15,55
18A	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2		-1,44	0,09		-0,1	-0,13
18A	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2		-1,44	0,09		-0,1	-0,13
18B	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	6,90	2,15		14,84	0,09		1,3	1,34
18C	AVENIDA 10 LLANITOS	10,60	4,45		47,19	0,09		4,2	4,25
19A	AVENIDA 10 LLANITOS	3,70	2,2		8,15	0,09		0,7	0,73
19B	AVENIDA 10 LLANITOS	28,75	4,30		123,63	0,09		11,1	11,13
20	AVENIDA 10 LLANITOS	2,85	4,0		11,26	0,09		1,0	1,01
21A	AVENIDA 10 LLANITOS	3,30	4,7		15,50	0,09		1,4	1,40
21B	AVENIDA 10 LLANITOS	25,00	6,0		150,00	0,09		13,5	13,50
21B	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2		-1,44	0,09		-0,1	-0,13
21B	POZO DE INSPECCIÓN	-1,2	1,2		-1,44	0,09		-0,1	-0,13
22	AVENIDA 10 LLANITOS	1,66	0,62		1,03	0,09		0,1	0,09
23	AVENIDA 10 LLANITOS	4,24	1,70		7,21	0,09		0,6	0,65
					TOTAL				117,40

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES: Cantidades cuantificadas en obra junto con Interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ALCALDIA DE LOS PATIOS

OBJETO	OBJETO: MANTENIMIENTO DE VIAS MEDIANTE LA MODALIDAD DE BACEHO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER		
CONTRATO No	LP-SI-006-2025	APOYO A LA SUPERVISION	CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON
CONTRATISTA	JAIRO JOSÉ BAUTISTA RAMÍREZ	CONTRATANTE	MUNICIPIO DE LOS PATIOS
Interventoría	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS CONTRACTUALES C&A SAS		HOJA 9 DE 10
ITEM	4,10	RETIRO DE SOBRANTES (INCLUYE TRANSPORTE Y PAGO DE ESCOMBRERA)	UNIDAD M3

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES				VOL EXCAV	F. EXP	RETIRO	TOTAL
		ÁREA DEMO	F. EXP	ESPESOR ASF	RETIRO				
10A	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	184,8	1,4	0,07	18,1	31,4	1,3	40,8	58,95
10B	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	185,3	1,4	0,07	18,2	31,5	1,3	40,9	59,10
10C	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	22,1	1,4	0,07	2,2	3,7	1,3	4,9	7,04
10D	CLL 26 ENTRE AV 9F Y 9B	22,0	1,4	0,07	2,2	3,7	1,3	4,9	7,02
11	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 5A Y AV 6	168,0	1,4	0,07	16,5	28,56	1,3	37,1	53,59
12	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 5A Y AV 6	30,0	1,4	0,07	2,9	5,10	1,3	6,6	9,57
13	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 5A Y AV 6	37,0	1,4	0,07	3,6	6,29	1,3	8,18	11,80
14	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	59,0	1,4	0,07	5,8	10,02	1,3	13,03	18,81
15	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	6,4	1,4	0,07	0,6	1,09	1,3	1,42	2,05
16	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	22,5	1,4	0,07	2,2	3,83	1,3	4,97	7,18
17	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	25,9	1,4	0,07	2,5	4,40	1,3	5,72	8,26
18A	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	172,8	1,4	0,07	16,9	29,38	1,3	38,19	55,12
18B	VALLES DEL MIRADOR ENTRE AV 6 Y AV 10	14,8	1,4	0,07	1,5	2,52	1,3	3,28	4,73
18C	AVENIDA 10 LLANITOS	47,2	1,4	0,07	4,6	8,02	1,3	10,43	15,05
19A	AVENIDA 10 LLANITOS	8,2	1,4	0,07	0,8	1,39	1,3	1,80	2,60
19B	AVENIDA 10 LLANITOS	123,6	1,4	0,07	12,1	21,02	1,3	27,32	39,44
20	AVENIDA 10 LLANITOS	11,3	1,4	0,07	1,1	1,91	1,3	2,48	3,58
21A	AVENIDA 10 LLANITOS	15,5	1,4	0,07	1,5	2,64	1,3	3,43	4,95
21B	AVENIDA 10 LLANITOS	150,0	1,4	0,07	14,7	25,50	1,3	33,15	47,85
22	AVENIDA 10 LLANITOS	1,0	1,4	0,07	0,1	0,00	1,3	0,00	0,10
23	AVENIDA 10 LLANITOS	7,2	1,4	0,07	0,7	1,20	1,3	1,56	2,27
					TOTAL				419,07

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES: Cantidades cuantificadas en obra junto con interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ALCALDIA DE LOS PATIOS

OBJETO	OBJETO: MANTENIMIENTO DE VIAS MEDIANTE LA MODALIDAD DE BACEHO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER		
CONTRATO No	LP-SI-006-2025	APOYO A LA SUPERVISION	CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON
CONTRATISTA	JAIRO JOSÉ BAUTISTA RAMÍREZ	CONTRATANTE	MUNICIPIO DE LOS PATIOS
Interventoría	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS CONTRACTUALES C&A SAS		HOJA 10 DE 10
ITEM	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT)	UNIDAD	

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					CANT	VOL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	LONG	ALT	ANCHO	AREA					
IMPLEMENTACIÓN DEL PMT						1,00		1,00	
				TOTAL				1,00	





OBSERVACIONES: Cantidades cuantificadas en obra junto con Interventoría
