INFORME DE GESTION No 6

PERIODO DEL INFORME
04 de octubre – 03 de noviembre de 2025



NOMBRE DEL PROYECTO

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

CONTRATO DE OBRA No:
No. LP-024-2024

CIUDAD:
BARRANQUILLA

DEPARTAMENTO:
ATLANTICO

CONTENIDO

I. INTRODUCCIÓN 4
1.1 RESUMEN DEL ESTADO DEL PROYECTO. 4
II. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 5
2.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 5
2.2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 5
2.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 6
2.4 CONTROL DE POLIZAS DE GARANTIA. 7
2.4.1CONTRATO DE OBRA No LP-024-2024 7
2.4.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA CD-12-2025 8
III. AVANCE DEL PROYECTO 8
3.1 ESTADO GENERAL DE LA CONSTRUCCION. 8
3.2 CRONOGRAMA DE EJECUCION. 9
3.3 HITOS ALCANZADOS. 11
3.4 PORCENTAJE DE AVANCE FISICO: 11
IV. GESTION FINANCIERA. 15
4.1 PRESUPUESTO ASIGANDO VS. EJECUTADO(PAGADO). 15
V. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE. 15
5.1 GESTION AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD. 15
5.1.1 LISTADO DE PERMISOS. 15
5.1.1 PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS. 16
5.1.2 ESTADO DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL. 16
5.2 CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 17
5.3 ACCIDENTES E INCIDENTES REPORTADOS. 17
VI. GESTION DE CALIDAD. 17
6.1. CONTROLES DE CALIDAD EJECUTADOS. 18
6.2. NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS. 18
6.3. AUDITORÍAS Y VERIFICACIONES 18
6.4. TRAZABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN 18
6.5. BENEFICIOS DE ESTA MEJORA: 18
VII. GESTION SOCIAL. 19
7.1. PRINCIPALES ACTIVIDADES. 19
7.1.1 DIVULGACION E INFORMACION A LA COMUNIDAD. 19
7.1.2 RESTITUCIÓN DE BIENES AFECTADOS. 19
7.1.3 ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA. 19
7.1.3 PEDAGOGÍA PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 19
7.1.4 VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL. 20

7.1.5 INFLUJO LABORAL Y EQUIDAD DE GÉNERO. 20
VIII. RECURSOS HUMANOS. 20
8.1 PERSONAL EN OBRA. 20
8.2 SUBCONTRATISTA Y PROVEEDORES. 21
IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 22
9.1 EVALUACION GENERAL DEL PROYECTO: 22

I. INTRODUCCIÓN

La entidad **MARÍA TERESA FERNÁNDEZ IGLESIAS**, identificada con cedula de ciudadanía 32.774.806, secretaria general del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, adjudicó a **ANDRES FELIPE LOPEZ JIMENEZ** identificado con cédula de ciudadanía **No.10.966.354** en calidad de representante legal del **CONSORCIO URBANO LP** identificado con **NIT 901.918.972-3**, integrada por LOPECA S.A.S. identificada con NIT. 891.001.419-1 con un porcentaje de participación del 80% y GRUPO PROYECTOS Y DESARROLLO S.A.S identificada con NIT. 901.778.580-8 con un porcentaje de participación del 20%, mediante Resolución No. 001 del ocho (08) de enero de 2025 la Entidad abrió el Proceso de Contratación número LP-024-2024 y Resolución No. 033 del 11 de febrero de 2025 la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista. el proyecto con objeto: "OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA" y se firmó el Contrato de obra No. LP-024-2024 el día 21 de febrero de 2025.

Este informe presenta el estado actual del proyecto de OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA calle 72 entre cras 38 y 60, en el cual se detallan la correcta ejecución de los avances físicos y financieros que se llevaron a cabo por el CONSORCIO URBANO LP, durante el periodo comprendido entre el 04 de octubre al 03 de noviembre de 2025.

1.1 RESUMEN DEL ESTADO DEL PROYECTO.

Durante el presente periodo se realizó un seguimiento riguroso al cumplimiento del cronograma de ejecución en conformidad con los requerimientos técnicos establecidos y control documental, incluyendo la revisión y trazabilidad de planos, especificaciones técnicas, memorias de cálculo y demás documentos contractuales.

A la fecha de este informe, el proyecto presenta un avance físico acumulado del 56.72%, se encuentra una desviación negativa de 4.24% durante este periodo, esto se debe a la suspensión de las actividades de obra desde el día 17 de octubre, en el tramo comprendido entre la carrera 47 y carrera 54, por directrices de la administración y solicitudes de los comerciantes, debido a la época de fin de año y temporada alta del comercio del sector, otros factores que afectaron esta disminución fuero la fuerte ola invernal durante el mes de octubre y un tercer factor de este retraso fue el trámite de captación de precios de los nuevos ítems de losetas, proceso que requiere tiempos definidos para su aprobación formal y la firma del acta correspondiente. Una vez culminado este trámite, es necesario considerar el plazo de fabricación de las losetas, estimado en aproximadamente 15 días, lo cual genera una ruta crítica en la cadena de suministro en el capítulo de urbanismo impactando directamente los tiempos de ejecución. A pesar de esto la obra se encuentra en un 56.72% en ejecución contra un 60.95% programado.

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	42.91%	43.58%	
Durante el periodo	18.05%	13.13%	-4.24%
Acumulado actual	60.95%	56.72%	

Fuente resumen ejecutivo de obra, archivo del contratista

El cuadro muestra que la obra ha sufrido un desfase en su ejecución durante el último mes. Aunque había un ligero adelanto previo, el bajo avance mensual ha revertido esa situación, dejando el proyecto con un retraso acumulado del 4.24%.

II. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

2.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO	
Nombre entidad Contratante:	MARÍA TERESA FERNÁNDEZ IGLESIAS - Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
Nombre del proyecto:	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
Contrato de obra N°:	LP-024-2024
Contratista:	CONSORCIO URBANO LP
Representante Legal:	ANDRES FELIPE LOPEZ JIMENEZ
Dirección oficina principal:	Calle 59 N° 12-45, Barrio la castellana, Montería-Córdoba.
Teléfono contratista:	604 7838295
Firma del contrato:	21 de febrero de 2025
Valor contratado inicial:	$20.849.779.050
Valor de anticipo:	N/A
Plazo inicial:	12 meses a partir de la firma del acta de inicio
Firma acta de inicio:	03/04/2025
Plazo de terminación final	Terminación final 31 de diciembre 2025

2.2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Nombre entidad Contratante:	DISTRITO DE BARRANQUILLA
Nombre del proyecto:	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
Contrato de obra N°:	CD-12-2025-1651
Contratista:	EDUBAR S.A.
Representante Legal:	ANGELLY CRIALES ANIBAL
Dirección oficina principal:	Via 40 #73-290, Nte. Centro Histórico, Barranquilla, Atlántico.
Teléfono contratista:	53605148
Firma del contrato:	21 de febrero de 2025
Valor contratado inicial:	$1.068.837.924
Plazo inicial:	12 meses a partir de la firma del acta de inicio
Firma acta de inicio:	3/04/2025
Plazo de terminación final	Terminación final 31 de diciembre 2025

2.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto se ejecutará en el Distrito de Barranquilla Departamento del atlántico, calle 72 entre las cras 38 a la 60.

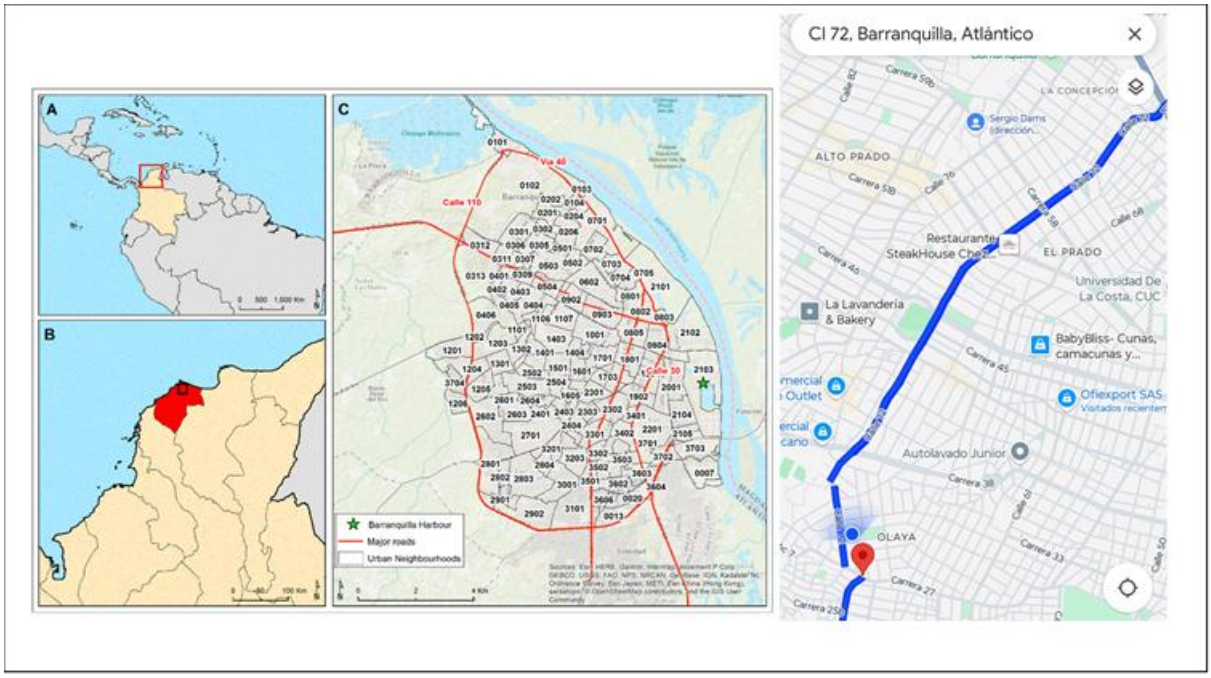


Imagen 1: Localización del proyecto.



Imagen 2: Puntos de referencia

2.4 CONTROL DE POLIZAS DE GARANTIA.

2.4.1CONTRATO DE OBRA No LP-024-2024

A la fecha se cuenta con las pólizas actualizadas conforme a la suscripción del contrato y acta de inicio

CONTRATO DE OBRA No.	N° LP-024-2024	**OBJETO DEL CONTRATO:**	"OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"			
INTERVENTOR:	EDUBAR S.A.		**CONTRATANTE:**	SECRETARIA GENERAL DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA		
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**POLIZA No.**	**AMPARO**	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**	**FECHA DE APROBACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE**
			DESDE LAS 00:00 HORAS	**HASTA LAS 24:00 HORAS**		
SEGUROS MUNDIAL	POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. CG-1062519	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/02/2025	30/04/2026	$ 4.169.955.810,00	14 de marzo de 2024
		PRESTACIONES SOCIALES	21/02/2025	31/12/2028	$ 2.084.977.905,00	
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	31/12/2025	31/12/2030	$ 4.169.955.810,00	
SEGUROS MUNDIAL	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No. CG-1014943	RESPONSABILIDAD CIVIL	21/02/2025	01/01/2026	$ 1.042.488.952,00	

Tabla 1: Control de pólizas del Contrato de obra No LP-024-2024 según contrato.

CONTRATO DE OBRA No.	No LP-024-2024	**OBJETO DEL CONTRATO:**	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			
INTERVENTOR:	EDUBAR S.A.		**CONTRATANTE:**	SECRETARIA GENERAL DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA		
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**POLIZA No.**	**AMPARO**	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**	**FECHA DE APROBACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE**
			DESDE LAS 00:00 HORAS	**HASTA LAS 24:00 HORAS**		
SEGUROS MUNDIAL	POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. CG-1062519	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/04/2025	10/06/2026	$ 4.169.955.810,00	13 de mayo 2025.
		PRESTACIONES SOCIALES	03/04/2025	10/02/2029	$ 2.084.977.905,00	
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	10/02/2026	10/02/2031	$ 4.169.955.810,00	
SEGUROS MUNDIAL	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No. CG-1014943	RESPONSABILIDAD CIVIL	03/04/2025	11/02/2026	$ 1.042.488.952,00	

Tabla 2: Control de pólizas del Contrato de obra No LP-024-2024 Actualizada según acta de inicio.

2.4.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA CD-12-2025

A la fecha se cuenta con las pólizas actualizadas conforme a la suscripción del contrato y acta de inicio

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	CD-12-2025-1651	**OBJETO DEL CONTRATO:**	"OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"			
INTERVENTOR:	EDUBAR S.A.		**CONTRATANTE:**	SECRETARIA GENERAL DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA		
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**POLIZA No.**	**AMPARO**	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**	**FECHA DE APROBACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE**
			DESDE LAS 00:00 HORAS	**HASTA LAS 24:00 HORAS**		
SEGUROS MUNDIAL	POLIZA DE CUMPLIMIENTO Nº BQ-100099270	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/02/2025	21/10/2025	$106.883.792,40	28 de febrero de 2025
		PRESTACIONES SOCIALES	21/02/2025	21/06/2028	$ 53.441.896,20	
		CALIDAD DEL SERVICIO	21/02/2025	21/10/2025	$106.883.792,40	

Tabla 3: Control de pólizas del Contrato de Interventoría N° CD-12-2025 según Firma de contrato

III. AVANCE DEL PROYECTO

3.1 ESTADO GENERAL DE LA CONSTRUCCION.

A continuación, se presentan los registros que permiten llevar una trazabilidad del proyecto durante la ejecución del contrato:

- El 21 de febrero de 2025 se suscribió entre la entidad y el contratista de obra la suscripción de la firma del contrato de obra No LP-024-2024.
- El 03 de abril de 2025 se suscribió entre la interventoría, la entidad contratante y el contratista, el acta de inicio al contrato de obra con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025.
- El 19 de marzo del 2025 se socializo el proyecto con la participación de la alcaldía de Barranquilla, la entidad contratante, interventoría, contratista y miembros de la comunidad. Se adjunta registro fotográfico.
- Durante este periodo se tiene trabajando cinco (5) frentes de obra distribuidos de la siguiente manera:
    - ✓ Primer frente comprendido entra las carreras 38 y 41B.
    - ✓ Segundo frente comprendido entre la carrera 54 y la carrera 60.
    - ✓ Tercer frente comprendido entre la carrera 41B y la carrera 43.
    - ✓ Cuarto frente comprendido entra la carrera 43 y la carrera 46.
    - ✓ Quinto frente comprendido entre la carrera 46 y la carrera 48.
- Durante la elaboración de este informe se evidencia la necesidad de realizar una nueva acta modificatoria dado que los siguientes ítems superan las cantidades contractuales y no se encuentran contempla la instalación de las losetas de colores, contempladas en los nuevos diseños:
    - ✓ Demolición de pavimento y retiro de material.
    - ✓ Relleno con material de sitio compactado.
    - ✓ Relleno en material seleccionado compactado.
    - ✓ Excavación manual y retiro de material.
    - ✓ Instalación de tubería PEAD PN 100 160 mm (6") (incluye accesorios).
    - ✓ Suministro e instalación de tubería PVC 2".
    - ✓ Sondeo de canalización instalada con guía.
    - ✓ Demolición de roca.
- En el desarrollo del proyecto y al evidenciar las diferentes actas de modificación que sea realizado

es necesario para el proyecto realizar una adición de recurso y tiempo para poder dar alcance físico del proyecto.

- Al sus pender la demolición del urbanismo por parte de la administración se afecta la programación y los rendimientos de los concretos y los rellenos, causando un impacto significativo en el presupuesto.
- La entrega de los suministros de las redes humadas no ha sido la mas optima por lo que ha causado retrasos en la instalación de estas redes en los diferentes frentes de obra, a la fecha de elaboración de este informe solo se ha entregado por la empresa prestadora del servicio la tubería correspondiente a agua potable, quedando pendiente por entregar la de alcantarillado.

3.2 CRONOGRAMA DE EJECUCION.


En desarrollo del Contrato LP-024-2024, se ha venido trabajando con base en la programación inicial aprobada desde el 3 de abril de 2025. No obstante, durante el periodo evaluado se han introducido ajustes al cronograma por tramos, derivados del nuevo balance presupuestal generado tras la suscripción del Acta Modificatoria No. 4 de mayores y menores cantidades.

Es importante destacar que, como consecuencia de dicha modificación, el contrato se encuentra desbalanceado afectado el alcance físico del mismo, lo que ha impactado significativamente la planificación financiera y operativa del proyecto.

El seguimiento al cumplimiento del cronograma se ha realizado mediante el control del porcentaje de avance físico ejecutado frente a lo programado. Sin embargo, la programación vigente para el Ítem 3 — correspondiente a urbanismo, en particular la instalación de losetas— no refleja las condiciones reales del proyecto, toda vez que su ejecución está condicionada a la aprobación por parte de la Entidad de los ítems no previstos generado por el cambio en los diseños.

En consecuencia, la responsabilidad por el retraso en la ejecución de las actividades no es responsabilidad del contratista ya que la entrega de los suministros de las redes húmedas recae en la entidad prestadora del servicio y la entidad contratante.

Hasta tanto no se reciban los insumos necesarios para la ejecución de las redes húmedas no es posible planificar ni ejecutar dichas actividades con garantías de calidad, trazabilidad ni cumplimiento normativo, por lo que solicitamos se tenga en cuenta esta situación al evaluar los avances del proyecto y se ajuste el cronograma en función de la entrega real de los insumos y los documentos técnicos pendientes.

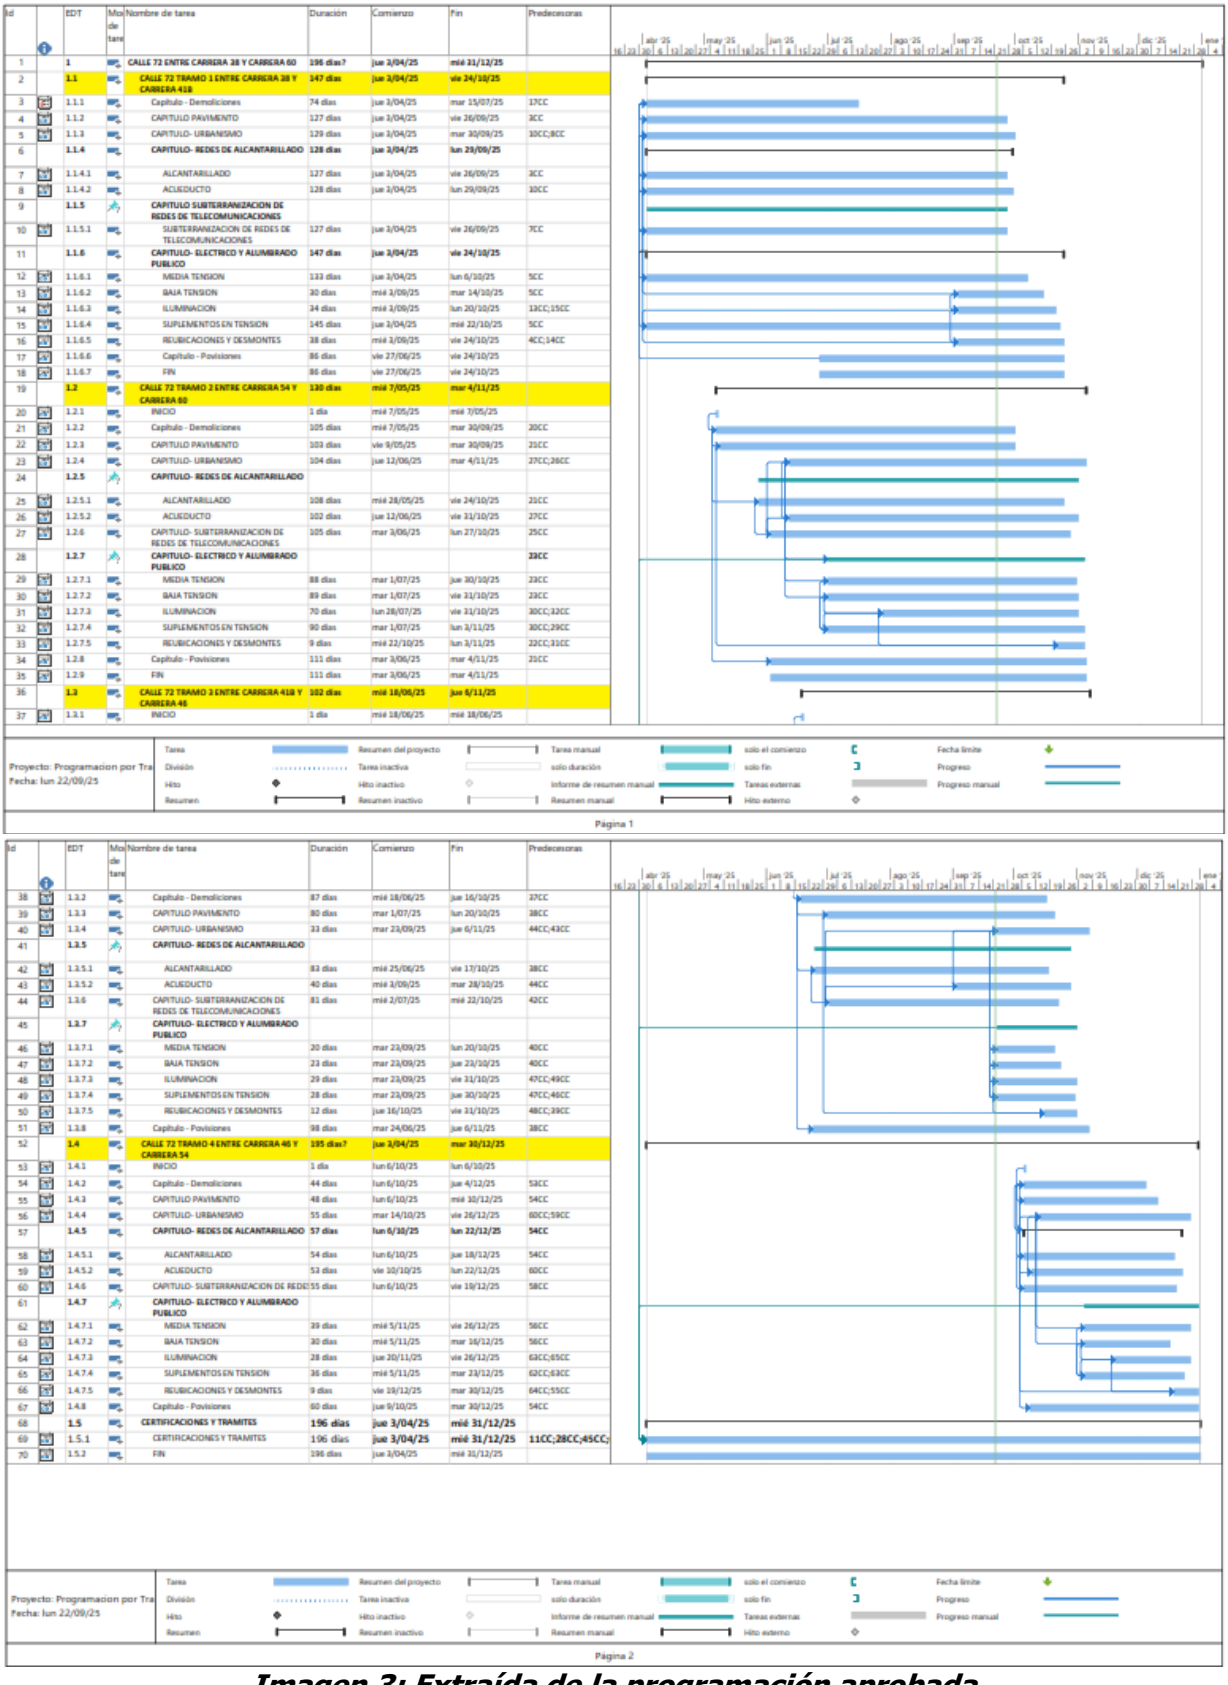

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1	1	CALLE 72 ENTRE CARRERA 38 Y CARRERA 60	196 días?	jue 3/04/25	mié 31/12/25	
2	1.1	CALLE 72 TRAMO 1 ENTRE CARRERA 38 Y CARRERA 41B	147 días	jue 3/04/25	vie 24/10/25	
3	1.1.1	Capitulo - Demoliciones	74 días	jue 3/04/25	mar 15/07/25	17CC
4	1.1.2	CAPITULO PAVIMENTO	127 días	jue 3/04/25	vie 26/09/25	3CC
5	1.1.3	CAPITULO- URBANISMO	129 días	jue 3/04/25	mar 30/09/25	10CC;8CC
6	1.1.4	CAPITULO- REDES DE ALCANTARILLADO	128 días	jue 3/04/25	lun 29/09/25	
7	1.1.4.1	ALCANTARILLADO	127 días	jue 3/04/25	vie 26/09/25	3CC
8	1.1.4.2	ACUEDUCTO	128 días	jue 3/04/25	lun 29/09/25	10CC
9	1.1.5	CAPITULO SUBTERRANIZACION DE REDES DE TELECOMUNICACIONES				
10	1.1.5.1	SUBTERRANIZACION DE REDES DE TELECOMUNICACIONES	127 días	jue 3/04/25	vie 26/09/25	7CC
11	1.1.6	CAPITULO- ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO	147 días	jue 3/04/25	vie 24/10/25	
12	1.1.6.1	MEDIA TENSION	133 días	jue 3/04/25	lun 6/10/25	5CC
13	1.1.6.2	BAJA TENSION	30 días	mié 3/09/25	mar 14/10/25	5CC
14	1.1.6.3	ILUMINACION	34 días	mié 3/09/25	lun 20/10/25	13CC;15CC
15	1.1.6.4	SUPLEMENTOS EN TENSION	145 días	jue 3/04/25	mié 22/10/25	5CC
16	1.1.6.5	REUBICACIONES Y DESMONTES	38 días	mié 3/09/25	vie 24/10/25	4CC;14CC
17	1.1.6.6	Capitulo - Povisiones	86 días	vie 27/06/25	vie 24/10/25	
18	1.1.6.7	FIN	86 días	vie 27/06/25	vie 24/10/25	
19	1.2	CALLE 72 TRAMO 2 ENTRE CARRERA 54 Y CARRERA 60	130 días	mié 7/05/25	mar 4/11/25	
20	1.2.1	INICIO	1 día	mié 7/05/25	mié 7/05/25	
21	1.2.2	Capitulo - Demoliciones	105 días	mié 7/05/25	mar 30/09/25	20CC
22	1.2.3	CAPITULO PAVIMENTO	103 días	vie 9/05/25	mar 30/09/25	21CC
23	1.2.4	CAPITULO- URBANISMO	104 días	jue 12/06/25	mar 4/11/25	27CC;26CC
24	1.2.5	CAPITULO- REDES DE ALCANTARILLADO				
25	1.2.5.1	ALCANTARILLADO	108 días	mié 28/05/25	vie 24/10/25	21CC
26	1.2.5.2	ACUEDUCTO	102 días	jue 12/06/25	vie 31/10/25	27CC
27	1.2.6	CAPITULO- SUBTERRANIZACION DE REDES DE TELECOMUNICACIONES	105 días	mar 3/06/25	lun 27/10/25	25CC
28	1.2.7	CAPITULO- ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO				23CC
29	1.2.7.1	MEDIA TENSION	88 días	mar 1/07/25	jue 30/10/25	23CC
30	1.2.7.2	BAJA TENSION	89 días	mar 1/07/25	vie 31/10/25	23CC
31	1.2.7.3	ILUMINACION	70 días	lun 28/07/25	vie 31/10/25	30CC;32CC
32	1.2.7.4	SUPLEMENTOS EN TENSION	90 días	mar 1/07/25	lun 3/11/25	30CC;29CC
33	1.2.7.5	REUBICACIONES Y DESMONTES	9 días	mié 22/10/25	lun 3/11/25	22CC;31CC
34	1.2.8	Capitulo - Povisiones	111 días	mar 3/06/25	mar 4/11/25	21CC
35	1.2.9	FIN	111 días	mar 3/06/25	mar 4/11/25	
36	1.3	CALLE 72 TRAMO 3 ENTRE CARRERA 41B Y CARRERA 46	102 días	mié 18/06/25	jue 6/11/25	
37	1.3.1	INICIO	1 día	mié 18/06/25	mié 18/06/25	

Proyecto: Programacion por Tra
Fecha: lun 22/09/25

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Progreso · Progreso manual

Página 1

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
38	1.3.2	Capitulo - Demoliciones	87 días	mié 18/06/25	jue 16/10/25	37CC
39	1.3.3	CAPITULO PAVIMENTO	80 días	mar 1/07/25	lun 20/10/25	38CC
40	1.3.4	CAPITULO- URBANISMO	33 días	mar 23/09/25	jue 6/11/25	44CC;43CC
41	1.3.5	CAPITULO- REDES DE ALCANTARILLADO				
42	1.3.5.1	ALCANTARILLADO	83 días	mié 25/06/25	vie 17/10/25	38CC
43	1.3.5.2	ACUEDUCTO	40 días	mié 3/09/25	mar 28/10/25	44CC
44	1.3.6	CAPITULO- SUBTERRANIZACION DE REDES DE TELECOMUNICACIONES	81 días	mié 2/07/25	mié 22/10/25	42CC
45	1.3.7	CAPITULO- ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO				
46	1.3.7.1	MEDIA TENSION	20 días	mar 23/09/25	lun 20/10/25	40CC
47	1.3.7.2	BAJA TENSION	23 días	mar 23/09/25	jue 23/10/25	40CC
48	1.3.7.3	ILUMINACION	29 días	mar 23/09/25	vie 31/10/25	47CC;49CC
49	1.3.7.4	SUPLEMENTOS EN TENSION	28 días	mar 23/09/25	jue 30/10/25	47CC;46CC
50	1.3.7.5	REUBICACIONES Y DESMONTES	12 días	jue 16/10/25	vie 31/10/25	48CC;39CC
51	1.3.8	Capitulo - Povisiones	98 días	mar 24/06/25	jue 6/11/25	38CC
52	1.4	CALLE 72 TRAMO 4 ENTRE CARRERA 46 Y CARRERA 54	105 días?	jue 3/04/25	mar 30/12/25	
53	1.4.1	INICIO	1 día	lun 6/10/25	lun 6/10/25	
54	1.4.2	Capitulo - Demoliciones	44 días	lun 6/10/25	jue 4/12/25	53CC
55	1.4.3	CAPITULO PAVIMENTO	48 días	lun 6/10/25	mié 10/12/25	54CC
56	1.4.4	CAPITULO- URBANISMO	55 días	mar 14/10/25	vie 26/12/25	60CC;59CC
57	1.4.5	CAPITULO- REDES DE ALCANTARILLADO	57 días	lun 6/10/25	lun 22/12/25	54CC
58	1.4.5.1	ALCANTARILLADO	54 días	lun 6/10/25	jue 18/12/25	54CC
59	1.4.5.2	ACUEDUCTO	53 días	vie 10/10/25	lun 22/12/25	60CC
60	1.4.6	CAPITULO- SUBTERRANIZACION DE REDES	55 días	lun 6/10/25	vie 19/12/25	58CC
61	1.4.7	CAPITULO- ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO				
62	1.4.7.1	MEDIA TENSION	39 días	mié 5/11/25	vie 26/12/25	56CC
63	1.4.7.2	BAJA TENSION	30 días	mié 5/11/25	mar 16/12/25	56CC
64	1.4.7.3	ILUMINACION	28 días	jue 20/11/25	vie 26/12/25	63CC;65CC
65	1.4.7.4	SUPLEMENTOS EN TENSION	36 días	mié 5/11/25	mar 23/12/25	62CC;63CC
66	1.4.7.5	REUBICACIONES Y DESMONTES	9 días	vie 19/12/25	mar 30/12/25	64CC;55CC
67	1.4.8	Capitulo - Povisiones	60 días	jue 9/10/25	mar 30/12/25	54CC
68	1.5	CERTIFICACIONES Y TRAMITES	196 días	jue 3/04/25	mié 31/12/25	
69	1.5.1	CERTIFICACIONES Y TRAMITES	196 días	jue 3/04/25	mié 31/12/25	11CC;28CC;45CC;
70	1.5.2	FIN	196 días	jue 3/04/25	mié 31/12/25	

Proyecto: Programacion por Tra
Fecha: lun 22/09/25

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Progreso · Progreso manual

Página 2

Imagen 3: Extraída de la programación aprobada

3.3 HITOS ALCANZADOS.

A continuación, se destacan los logros más relevantes alcanzados durante la ejecución del proyecto a corte del presente informe:

- Firma del Acta de Inicio (03 de abril de 2025).
- Socialización del proyecto con la comunidad (19 de marzo de 2025).
- Nivelación y replanteo.
- Demolición de espacio público.
- Demolición de espacio público incluye retiro de material.
- Demolición de pavimento y retiro de material.
- Demolición de bordillo y retiro de material.
- Excavaciones y rellenos.
- Instalación tubería alcantarillado
- Instalación tubería acueducto.
- Instalación tubería TDP 4” (banco de ductos).
- Construcciones de manjoles y registros.
- Instalación de Loseta Plana 400x400x60 Mm.
- Ajuste y/o complementación a los estudios y diseños.
- Demolición de roca.
- Suministro e instalación de tubo TDP de 4".
- Suministro e instalación de tubería PVC 2"

3.4 PORCENTAJE DE AVANCE FISICO:

En este componente del informe se presenta un resumen del estado de avance físico de la obra en función del cronograma de obra vigente y las condiciones programadas y ejecutadas durante el periodo del presente informe.

CONTROL Y SEGUMIENTO				
ITEM	DESCRIPCIÓN	% Programado	% Ejecutado	Desviación
1.1	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS	10.07%	8.40%	-1.66%
1.2	DEMOLICION DE SEPARADOR CENTRAL INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	14.81%	3.32%	-11.49%
1.3	DEMOLICION DE ESPACIO PUBLICO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	7.98%	3.98%	-4.00%
1.4	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL	19.25%	31.00%	11.74%
1.5	DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	18.50%	8.70%	-9.80%
2	CAPITULO PAVIMENTO			
2.1	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL	16.57%	10.30%	-6.27%
2.2	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	22.40%	8.83%	-13.57%
2.3	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS , ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	18.73%	13.12%	-5.61%
2.4	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 39 A LA FLEXION ,ESPESOR= 0.2 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D =1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" -LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL			
2.5	CONCRETO DE 1500 PSI PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO, E = 0.15 METROS	15.93%	15.62%	-0.31%
2.6	BORDILLO DE 0.15 X 0.20 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ANCLAJE CON SIKADUR (VER DISEÑO)	12.35%	11.75%	-0.60%
2.7	SELLO DE FISURAS ESTRUCTURALES, Y REFORZAMIENTO ANCLADO (INCLUYE, SIKADUR®-35 HI-MOD LV, SIKADUR® ANCHORFIX-4, ACERO DE REFUERZO DE 5/8¨ L=0,50 MTS @0,20			
2.8	SELLO DE FISURAS ESTRUCTURALES, Y REFORZAMIENTO ANCLADO (INCLUYE,			
3	CAPITULO- URBANISMO			
3.1	Loseta Plana de 400x400x60 Mm De Espesor Color Gris oscuro, Usada En Pavimento De La Franja De Circulacion Peatonal Y Esquinas Con Carreras Transversales, Colocada Sobre Capa De Mortero E= 3 Cms, Capa De Concreto de 3000 psi E= 10 Cms Y Capa De Subbase Granular E= 15cms	21.70%	9.45%	-12.25%
3.2	Loseta Plana 400x400x60 Mm De Espesor Color Gris claro, Usada En Pavimento De La Franja De Circulacion Peatonal Y Esquinas Con Carreras Transversales, Colocada Sobre Capa De Mortero E= 3 Cms, Capa De Concreto de 3000 psi E= 10 Cms Y Capa De Subbase Granular E= 15cms	21.70%	9.45%	-12.25%
3.3	Loseta Alerta 200x200x60 Mm De Espesor Color amarillo, Usada En La Franja De Alineacion Para Invidentes, y Loseta GUIA Colocada Sobre Capa De Mortero E= 3 Cms, Capa De Concreto de 3000 psi E= 10 Cms Y Capa De Subbase Granular E= 15cms	20.30%	0.00%	-20.30%
3.4	Viga de Confinamiento para Losetas de Espacio Publico en Concreto de 3000 Psi de 0.1 x 0.3 mt incluye 2 varillas de 1/2" estribos de 1/4" cada 0.3 mt	2.74%	0.00%	-2.74%
3.5	Rampa en Concreto de 3000 PSI E=0.12 mts, incluye malla electrosoldada XY-221	4.74%	0.00%	-4.74%
4	CAPITULO- REDES DE ALCANTARILLADO			
0	ALCANTARILLADO			
4,1,1	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL	11.95%	10.43%	-1.52%
4,1,2	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO COMPACTADO	22.86%	27.04%	4.18%
4,1,3	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	11.45%	49.96%	38.51%
4,1,4	EXCAVACION MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL	11.45%	0.00%	-11.45%
4,1,5	DESMONTE DE TUBERÍA DE ASBESTO CEMENTO DE 6" Y 8"	12.90%	0.00%	-12.90%
4,1,6	INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO PVC NOVAFORT 8"	13.86%	10.34%	-3.51%
4,1,7	INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO PVC NOVAFORT 10"	0.00%	0.00%	
4,1,8	CONSTRUCCION DE POZO DE INSPECCION 1.45M< H <=1.80M EN LADRILLO TOLETE, PAÑETADO E IMPERMEABILIZADO EN AMBAS CARAS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL OPERADOR	16.73%	16.18%	-0.56%
4,1,9	CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO PVC NOVAFORT 6" LONGITUD HASTA 6 M. INCLUYE EXCAVACIÓN	10.96%	16.14%	5.18%
4,1,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS TEE 8" X 6" Y SELLOS			
4,1,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRITURADO 3/4" PARA SOPORTE DE TUBERIA ALCANTARILLADO	21.99%	2.46%	-19.53%
4,1,12	CONSTRUCCION DE REGISTROS DOMICILIARIOS DE 60 X 60X 1M PAÑETADO E IMPERMEABILIZADO EN AMBAS CARAS INCLUYE TAPA EN CONCRETO	18.69%	10.94%	-7.75%
4,1,13	REPARACION DE FUGAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO	12.00%	6.82%	-5.18%
4,1,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS DE ALCANTARILLADO HD	11.89%	11.03%	-0.86%
4,1,15	MANEJO DE AGUA EN EXCAVACIONES	0.00%	25.91%	25.91%
4,1,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE 4"Y 6" PARA DESAGUES	12.60%	15.64%	3.04%
0	ACUEDUCTO			
4,2,1	RELLENO EN ARENA COMPACTADO	12.60%	6.40%	-6.20%
4,2,2	EXCAVACION MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL	12.60%	0.00%	-12.60%
4,2,3	INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA PEAD 20 MM PARA ACUEDCUTO	188.50%	16.65%	-171.85%
4,2,4	INSTALACION DE TUBERIA PEAD PN 100 160 MM (6") (INCLUYE ACCESORIOS)	18.14%	21.53%	3.39%
4,2,5	REPARACION DE DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO	11.72%	34.26%	22.54%

5	CAPITULO- SUBTERRANIZACION DE REDES DE TELECOMUNICACIONES			
5.1	REGISTROS DOMICILARIOS 0.6 X 0.6 M, MUROS EN LADRILLO TOLETE PAÑETADOS POR DENTRO Y POR FUERA, CON FONDO E = 0.10 M Y TAPA DE CONCRETO REFORZADO E = 0.07 M CON MARCO EN ANGULOS DE ACERO GALVANIZADO	12.60%	6.06%	-6.54%
5.2	CAMARAS COMUNES EN MAMPOSTERIA PARA REDES DE COMUNICACIONES 1,5 X 1,5 x 1,5CON PAÑETE IMPERMEABILIZADO INCLUYE TAPA EN HIERRO DUCTIL D=60 CM	12.00%	12.80%	0.80%
5.3	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL	21.07%	19.08%	-1.99%
5.4	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	18.65%	20.30%	1.65%
5.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TDP DE 4" INCLUYE SEPARADORES, INCLUYE 12 LINEAS DE TUBOS	20.20%	20.31%	0.11%
5.6	PROVISION - REDES DE GAS DOMICILIARIO	12.60%	0.00%	-12.60%
6	CAPITULO- ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO			
0	MEDIA TENSION			
6,1,1	Suministro Hora Brigada Diurna TET	50.00%	0.00%	-50.00%
6,1,2	Suministro Hora Grúa Hidráulica con Operador	0.00%	0.00%	
6,1,3	Construcción Registro Área Interna 0.49 M2 (F1) Concreto De 3000 Psi	25.00%	0.00%	-25.00%
6,1,4	Reubicacion de Postes de Media tension	16.67%	0.00%	-16.67%
0	BAJA TENSION			
6,2,1	Suministro Y Tendido De Ducteria Conduit Pvc 1 1/2"			
6,2,2	Canalización 0.30 X 0.50 En Zona Arena, Incluye: Excavación, Compactado Con Material Del Sitio Y Cinta De Seguridad	17.35%	20.82%	3.47%
6,2,3	Suministro e instalacion de Tapa antivandalica para registro de 50x50 EN PLATINA DE 2" CALIBRE 3/16"	21.08%	12.07%	-9.02%
6,2,4	Suministro e instalacion de Registro antivandalico de 50x50 EN PLATINA DE 2" CALIBRE 3/16"	20.68%	13.71%	-6.97%
6,2,5	Suministro e instalación de tubería PVC 2"	17.53%	31.09%	13.56%
6,2,6	Sondeo de Canalización instalada con guía	22.92%	78.13%	55.21%
0	ILUMINACION			
6,3,1	Suministro E Instalacion De Luminaria De Led 60-90 W, Incluye Brazo Ornamental De 2,50 Metros, Pernos Y Fotocelda	23.58%	27.18%	3.61%
6,3,2	Suministro E Instalacion De Cable Thw Aluminio Aislado 90º C-Awg 6	17.39%	23.66%	6.27%
6,3,3	Demolición de pedestal de poste de alumbrado público. Incluye retiro de material	17.39%	53.13%	35.73%
6,3,4	Pedestal para poste de alumbrado público	16.55%	16.61%	0.06%
6,3,5	Suministro e instalacion de transformador monofasico 25 KVA 13.2 kV/440-220V	0.00%	0.00%	
6,3,6	Bajante en tubería IMC 2"	100.00%	0.00%	-100.00%
6,3,7	Suministro E Instalacion De Poste De Acero Galvanizado En Caliente De 7.00 Metros De Altura, Tronco Conico Poligonal, En Lamina De Acero, Acabado Final En Pintura De Esmalte Para Exteriores, Incluye Base De Concreto	20.42%	21.75%	1.33%
6,3,8	Suministro E Instalacion De Luminaria De Led 50 W, Incluye Pernos Y Fotocelda	16.89%	21.75%	4.85%
6,3,9	Suministro E Instalacion De Cable Thw Cobre Forrado 90ºC-Awg 10	20.00%	14.66%	-5.34%
6,3,10	Suministro E Instalacion De Cable Encauchetado 3 X 14 Awg	20.00%	9.60%	-10.40%
6,3,11	Suministro E Instalacion De Varilla Polo A Tierra, Incluye Varilla, Conector	20.00%	21.82%	1.82%
6,3,12	Empalme Subterraneo De Baja Tension Acometida 14-4	30.00%	28.98%	-1.02%
6,3,13	Empalme Subterráneo De Baja Tensión Acometida 2-1/0	13.14%	0.00%	-13.14%
6,3,14	Suministro E Instalación De Cable Thw Cobre Aislado 90º C-Awg 1/0	0.00%	0.00%	
6,3,15	Suministro E Instalacion De Medidor Semidirecto, Incluye Tc, Protocolo, Bloque De Prueba, Cajas De Policarbonato	50.00%	0.00%	-50.00%
6,3,16	Diseños de iluminación y cálculos fotométricos	6.46%	10.00%	3.54%
6,3,17	Perforación horizontal con topo 2"	0.00%	0.00%	
6,3,18	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	19.05%	0.00%	-19.05%
6.4	SUPLEMENTOS EN TENSION			
6.4.1	Suplemento De Trabajo En Tensión Cruceta Auxiliar De Protecciones	18.18%	0.00%	-18.18%
6.4.2	Suplemento De Trabajo En Tensión de Cortacircuitos Nn Completo 13.2 Kv 100 A	18.18%	0.00%	-18.18%
6.5	REUBICACIONES Y DESMONTES			
6.5.1	Desmonte De Poste De Hormigón De 14.00 Metros	22.73%	25.86%	3.13%
6.5.2	Retiro De Luminaria Ap	22.73%	25.86%	3.13%
6.5.3	Desmonte De Linea Bt (Rt) Triplex 2 A 4/0	22.73%	25.91%	3.18%
6.6	CERTIFICACIONES Y TRAMITES			
6.6.1	Certificación Retie	0.00%	0.00%	
6.6.2	Certificación Retilap	0.00%	0.00%	
6.6.3	Gestiones Ante Electricaribe	12.00%	0.00%	-12.00%
6.6.4	Tramite Retie	12.60%	0.00%	-12.60%
6.6.5	Tramite Retilap	12.60%	0.00%	-12.60%
7	Capitulo - Provisiones			
7.1	RETIRO Y TRASLADO DE SEMAFOROS			
7.2	PROVISIÓN PERMISOS PMA, PMT, PGS.	0.00%	0.00%	
7.3	PROVISIÓN DESMONTE Y REUBICACIÓN DE PARADEROS DE BUSES INCLUYE (12 PARADEROS)			
7.4	PROVISION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	11.94%	0.00%	-11.94%
7.5	TALA DE AROBOLES INCLUYENDO RAIZ Y RETIRO DE MATERIAL	26.53%	0.00%	-26.53%
7.6	AJUSTE YIO COMPLEMETACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	0.00%	0.00%	
8	Capitulo - NO PREVISTOS			
NP 8.1	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 39 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS,ESPESOR= 0.2 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D =1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" -LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL	20.41%	7.53%	-12.88%
NP 8.2	Viga de Confinamiento para Losetas de Espacio Publico en Concreto de 3000 Psi de 0.10 x 0.10 mt	19.05%	0.00%	-19.05%
NP 8.3	Loseta Tope 200x200x60 Mm De Espesor Color Gris, Usada En Pavimento En Los Dos Extremos De La Franja de Circulación Peatonal, Colocada Sobre Capa De Mortero E= 3 Cms, Capa De Concreto de 3000 psi E= 10 Cms Y Capa De Subbase Granular E= 15cms	9.92%	0.00%	-9.92%
NP 8.4	INSTALACIÓN DE ACCESORIOS TEE 8" X 6" Y SELLOS	10.81%	9.67%	-1.14%
NP 8.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO TDP DE 4"	19.03%	18.52%	-0.51%
NP 8.6	ACERO DE REFUERZO	27.45%	6.38%	-21.07%
NP 8.7	DEMOLICIÓN DE ROCA	11.67%	0.00%	-11.67%
NP 8.8	CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO	24.13%	0.00%	-24.13%
NP 8.9	DEMOLICION DE POZOS DE INSPECCION 1.45M< H <=1.80M EN LADRILLO	25.00%	100.00%	75.00%
NP 8.10	CAMARA DE CAIDA DE 8"			
NP 8.11	PERFORACION DE POZO DE REGISTRO PARA ACOMETIDA PROVICIONAL	22.50%	16.67%	-5.83%
NP 8.12	DESMONTE Y RETIRO DE POSTE DE 7 MT DE TELECOMUNICACIONES (INCLUYE CUADRILLA PARA QUITAR CABLES ELÉCTRICOS SENCILLOS)	20.00%	0.00%	-20.00%
NP 8.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE 7 MT DE TELECOMUNICACIONES (INCLUYE CUADRILLA PARA QUITAR CABLES ELÉCTRICOS SENCILLOS)	25.00%	0.00%	-25.00%
NP 8.14	REUBICACIÓN DE POSTE DE 7 MT DE TELECOMUNICACIONES (QUITAR POSTE Y QUE UNA CUADRILLA ARME LOS CABLES QUE ESTÁN EN EL POSTE NUEVO)	20.00%	0.00%	-20.00%

Tabla 4: Actividades ejecutadas periodo 4 de agosto al 3 de septiembre del 2025.

Este desglose permite identificar con precisión los frentes donde se está cumpliendo e incluso superando la programación, así como aquellos que presentan retrasos significativos.

Se observa un buen desempeño en infraestructura subterránea: los capítulos de alcantarillado, acueducto y telecomunicaciones muestran avances superiores al programado, gracias a la gestión anticipada de interferencias y al trabajo continuo en excavaciones y colocación de redes por parte del consorcio.

Por el contrario, el capítulo de urbanismo específicamente la instalación de las losetas peatonales presenta un retraso crítico.

Este desfase no responde a una falta de gestión del contratista, sino a que los diseños definitivos de losetas (colores, distribución, especificaciones técnicas) fueron entregados parcialmente por la Entidad, el día 7 de octubre de 2025, para el tramo de la carrera 38 a la carrera 43 y de la carrera 54 a la carrera 60, posteriormente el día 01 de noviembre de 2025 fue entregado el tramo de la carrera 43 a la carrera 50, Con la información entrega el consorcio comenzó con la compra de las losetas.

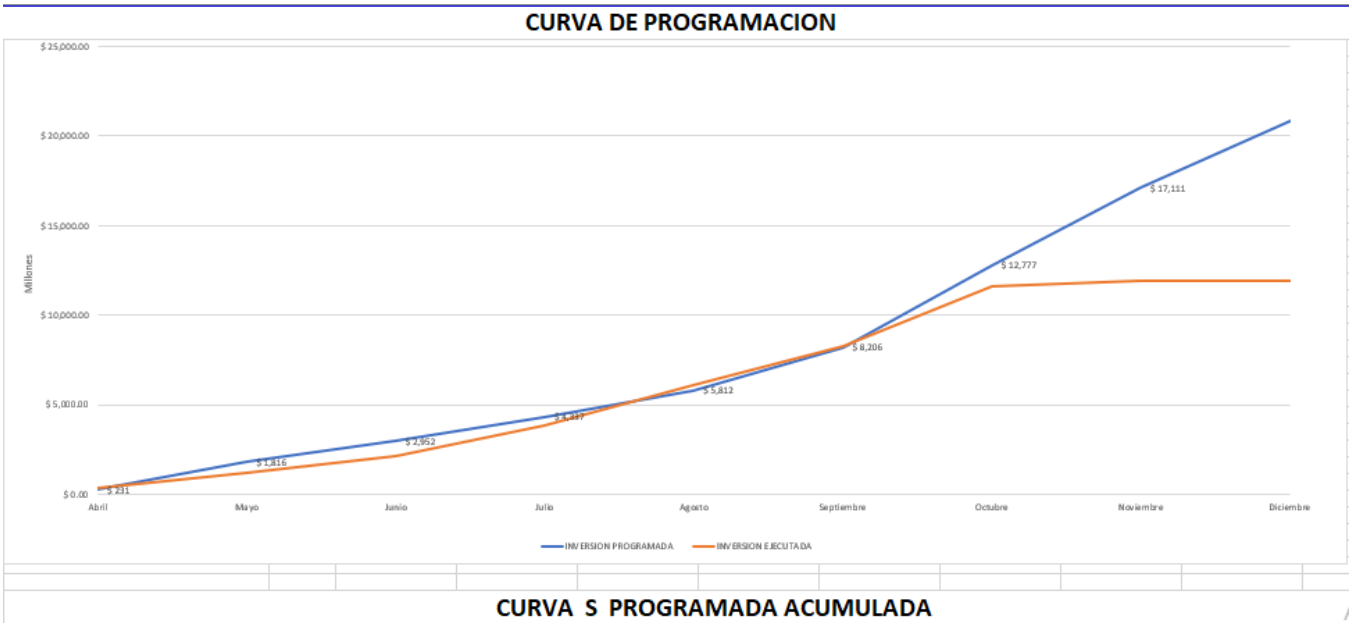


Imagen 4: Grafico curva "S"

La gráfica refleja que la inversión ejecutada esté por debajo de la programada, confirma que el proyecto está avanzando más lentamente de lo planificado, tanto en términos físicos como económicos.

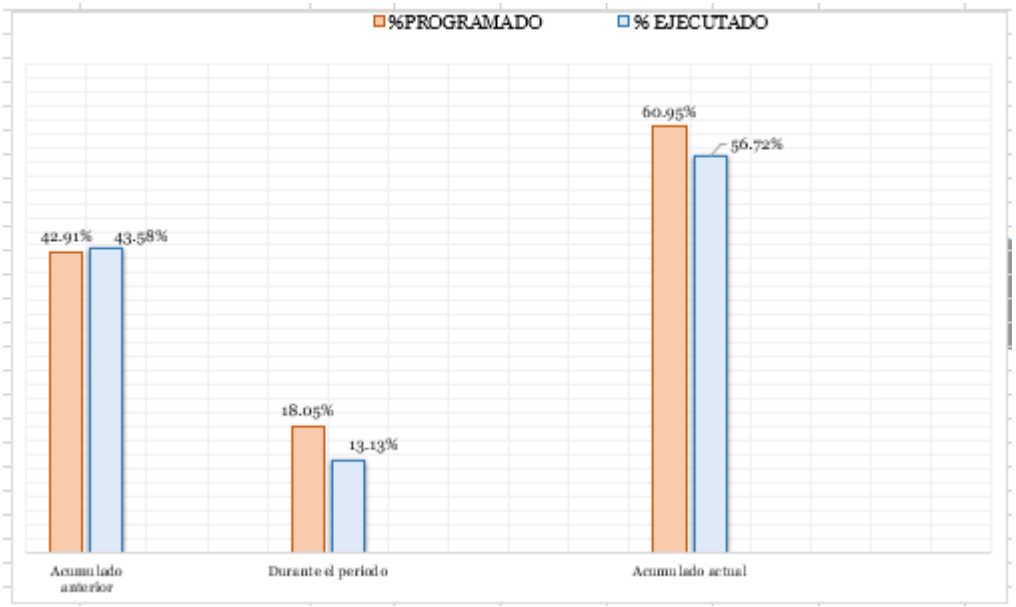


Imagen 5: Porcentaje avance de obra, archivo del consorcio urbano LP

Este gráfico muestra que, al cierre del mes de octubre, la obra se encuentra retrasada, con un avance físico acumulado del 56.72%, por debajo del 60.95% programado. Este desfase es más pronunciado en el mes reportado, donde solo se logró el 13.13% del 18.05% programado. Esta desaceleración se ve afectada por:

1. La falta de entrega oportuna de los diseños finales ha impactado directamente en la fabricación de elementos prefabricados, como las losetas, cuyo proceso de producción tiene un tiempo estimado de 15 días desde la confirmación del diseño.
2. La no entrega a tiempo de la tubería de alcantarillado por parte del proveedor ha paralizado

actividades críticas en este capítulo, como la instalación de tuberías y la realización de excavaciones manuales asociadas.

3. Las fuertes lluvias durante el periodo han dificultado significativamente las labores de campo, especialmente en actividades de excavación, relleno y pavimentación.

El análisis detallado revela que el retraso general de la obra se concentra en actividades críticas cuya ejecución depende directamente de factores externos al contratista, principalmente la demora en la entrega de diseños finales y la falta de materiales esenciales.

El Urbanismo presenta las desviaciones más críticas, que muestran un avance del 9.45% frente al 21.70% programado. Al no poder instalar la red de Alcantarillado que presenta unas desviaciones negativas significativas (-3.51% y -19.53% respectivamente). Afecta actividades como la excavación y el relleno, por consiguiente, incide directamente en el Urbanismo y en la instalación de redes secas.

Electricidad y Alumbrado. Aunque se observan buenos avances en la instalación de luminarias y postes, las actividades relacionadas con media tensión (construcción de registros, reubicación de postes) se encuentran totalmente detenidas (0.00% ejecutado). Esto se debe a la no entrega de la tubería de alcantarillado.

IV. GESTION FINANCIERA.

4.1 PRESUPUESTO ASIGANDO VS. EJECUTADO(PAGADO).

El presente contrato cuenta con un presupuesto asignado Veinte mil ochocientos cuarenta y nueve millones setecientos setenta y nueve mil cincuenta pesos mcte de $20.849.779.050, con soporte de certificado de disponibilidad presupuestal No. 202500001 expedido el 07 de enero de 2025 por la secretaria de Hacienda del Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla.
A corte del presente informe no se han generado actas de pago de ejecución.

A la fecha del presente informe se han presenta tres actas parciales de ejecución de obra y se encuentra en la elaboración del acta No.4 correspondiente al periodo del 10 de octubre al 10 de octubre de 2025.

4.2 ÍNDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO (IEFA):

$$IEFA = \frac{Valor\ acumulado\ ejecutado}{Valor\ acumulado\ programado} X\ 100$$

$$IEFA = \frac{11.896.134.265{,}01}{12.808.093.689{,}36} X\ 100 \approx 92{,}88\%$$

El índice de Ejecución Financiera Acumulado al mes de octubre de 2025 es de 92,88%.

Esto significa que, hasta el 1° de noviembre de 2025, se ha ejecutado financieramente el 92.88% de lo que estaba programado para ese periodo. Aunque el avance físico está rezagado (56.72% vs. 60.95%), el nivel de compromiso o gasto financiero respecto a lo planificado es relativamente alto.

V. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE.

5.1 GESTION AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD.

Durante el periodo comprendido entre el 03 de octubre al 04 de noviembre de 2025, el Consorcio Urbano LP adelantó las actividades de obra bajo un marco de cumplimiento ambiental. Se evidencia la implementación progresiva de las medidas del PMA y el control de impactos ambientales, no se reportan afectaciones significativas al entorno ni incumplimientos a la normatividad ambiental vigente.

5.1.1 LISTADO DE PERMISOS.

El proyecto cuenta con todos los permisos y planes vigentes dentro de estos se encuentra:

- Plan de manejo ambiental, plan de gestión de riesgo, plan de gestión y seguridad en el trabajo, plan de gestión social y plan de manejo de tránsito.
- Se encuentra en etapa de estructuración, la documentación requerida para la solicitud del permiso de aprovechamiento forestal.
- Permisos ambientales para explotación de materiales pétreos, relacionados en informe ambiental Nº 1.

- Se radico la solicitud ante Barranquilla verde el día 8 de abril 2025, para inscripción como generador de RCD, el cual emite factura y se paga el día 28 de abril de 2025.

5.1.1 PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS.

En el presente informe se describen las actividades realizadas en obra, en las cuales el componente ambiental realizo seguimiento a los posibles impactos ambientales negativos o positivos que se pudieron desencadenar por estos trabajos, durante el mes de abril, cuya área de influencia directa se localiza en la calle 72 entre carreras 38 y 60, en la ciudad de Barranquilla.

Durante el periodo informado se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Nivelación y replanteo.
- Demolición de espacio público.
- Demolición de espacio público incluye retiro de material.
- Demolición de pavimento y retiro de material.
- Demolición de bordillo y retiro de material.
- Excavaciones y rellenos.
- Instalación tubería alcantarillado
- Instalación tubería acueducto.
- Instalación tubería TDP 4” (banco de ductos).
- Construcciones de manjoles y registros.
- Instalación de Loseta Plana 400x400x60 Mm.
- Ajuste y/o complementación a los estudios y diseños.
- Demolición de roca.
- Suministro e instalación de tubo TDP de 4".
- Suministro e instalación de tubería PVC 2"
- Perforación de pozo de registro para acometida provisional.

5.1.2 ESTADO DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL.

Durante el periodo comprendido entre el 4 de septiembre y el 3 de octubre de 2025, el Consorcio Urbano LP mantuvo la implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) aprobado, con énfasis en la prevención, mitigación y monitoreo de los impactos ambientales asociados a las actividades de obra. Se garantizó el cumplimiento de los compromisos ambientales establecidos en el contrato y en la normatividad nacional, sin reporte de afectaciones significativas al entorno ni sanciones por incumplimiento ambiental.

Permisos y cumplimientos ambientales

El proyecto cuenta con los siguientes permisos y autorizaciones vigentes:

- Plan de Manejo Ambiental (PMA) aprobado por la autoridad ambiental competente.
- Inscripción como generador de RCD ante Barranquilla Verde (radicado el 8 de abril de 2025; factura pagada el 28 de abril de 2025).
- Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) conforme a la Resolución 0472 de 2017.
- Permisos para aprovechamiento forestal en vía de trámite, con documentación en revisión ante la autoridad ambiental.
- Certificación de disposición final de RCD en sitio autorizado (acreditada mediante manifiestos de transporte y copias de pesajes).

Actividades ambientales ejecutadas
Durante el mes de septiembre, se realizaron las siguientes acciones ambientales:

- Gestión integral de RCD. Se dispusieron 1.247 m³ de residuos de construcción y demolición en sitio autorizado, con trazabilidad completa mediante manifiestos y copias de pesaje.
- Se implementó la clasificación en origen en los frentes de obra, separando escombros, metales, plásticos y residuos peligrosos (aceites, baterías, etc.).
- Control de polvo y ruido. Se aplicaron medidas de supresión de polvo (riego diario en zonas de demolición y acarreo) y se monitoreó el nivel de ruido en horarios críticos, garantizando el cumplimiento del Decreto 838 de 2005.
- Manejo de aguas lluvias y escorrentía- Se mantuvieron operativos los canalones de desvío, zanjas de retención y barreras de control de sedimentos en todos los frentes activos, evitando la descarga de sólidos a la red de alcantarillado.
- Protección de árboles existentes. Se preservaron 12 árboles identificados en el inventario forestal inicial mediante cercas de protección y señalización perimetral, conforme al PMA.
- Capacitaciones ambientales. Se realizaron 3 charlas técnicas al personal de obra sobre manejo de RCD, prevención de derrames y buenas prácticas ambientales, con asistencia certificada.

Estado de cumplimiento ambiental

- 100 % de cumplimiento en los indicadores del PMA evaluados durante el mes.
- Cero no conformidades reportadas por la interventoría o autoridades ambientales.
- Actualización mensual de la matriz de aspectos e impactos ambientales.
- Inspecciones ambientales semanales con registro fotográfico y actas de seguimiento.

.

5.2 CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

El presente informe técnico expone los resultados de la inspección en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) realizada en el marco del proyecto de construcción durante el período comprendido entre el 04 de julio al 03 de agosto de 2025, con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas en materia de Seguridad y salud en el trabajo.

Dentro de los indicadores de gestión, se establecen los indicadores definidos en la Resolución 0312 de 2019.

5.3 ACCIDENTES E INCIDENTES REPORTADOS.

Durante el periodo en cuestión, no se registraron accidentes ni enfermedades laborales en la obra. Asimismo, no se reportaron eventos que comprometieran la integridad o el bienestar de los trabajadores durante la ejecución del proyecto. En consecuencia, no fue necesario realizar investigaciones de accidentes ni de enfermedades laborales, dado que no se presentaron casos que requirieran análisis o intervención. Este resultado refleja el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo establecidas para el proyecto.

VI. GESTION DE CALIDAD.

Durante el periodo comprendido entre el 4 de septiembre y el 3 de octubre de 2025, el Consorcio Urbano LP mantuvo la implementación del Plan de Aseguramiento de la Calidad, aprobado por la Interventoría mediante oficio del 15 de abril de 2025, el cual se alinea con los requisitos de la NTC-ISO 9001:2015 y las especificaciones técnicas del contrato LP-024-2024.

6.1. CONTROLES DE CALIDAD EJECUTADOS.

Se realizaron los siguientes controles técnicos y de laboratorio, con trazabilidad documental:

- Concreto rígido MR=45. Se tomaron las diferentes muestras para los ensayos de resistencia a la compresión a 3 días en obra, con resultados promedio de 48,2 MPa, superando el requisito mínimo de 45 MPa.
- Tubería de alcantarillado PVC NovaFort 8". Se verificó dimensionalmente el 100 % de los lotes recibidos (certificados de conformidad No. TC-2025-089 a TC-2025-094).
- Excavaciones y rellenos. Se ejecutaron 2 ensayos Proctor Modificado y 32 pruebas de densidad in situ (método cono de arena), logrando compactaciones promedio del 96,3 %, por encima del 95 % exigido.
- Losetas peatonales. Aunque su instalación está pendiente por la falta de diseños definitivos, se recibió una muestra de losetas grises y amarillas para validación de color, resistencia al desgaste (ensayo de abrasión Bohme) y absorción. Los resultados preliminares cumplen con la NTC 4720, pero su aprobación final está condicionada a la entrega del diseño por parte de la Entidad.

6.2. NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS.

Se identificaron 3 hallazgos menores durante inspecciones semanales:

- Desalineación en bordillo (carrera 41, lado par): corregido mediante demolición y reposición.
- Falta de compactación en relleno (tramo 54–55): se recompactó con equipo vibratorio y se verificó con nueva prueba de densidad.
- Desfase en junta de dilatación en pavimento: ajustado según especificaciones del diseño.

6.3. AUDITORÍAS Y VERIFICACIONES

El 18 de septiembre de 2025 se realizó una auditoría interna de calidad, con enfoque en los procesos de:

- Control de materiales, Ejecución de concreto, Gestión de no conformidades.
- El resultado fue satisfactorio, con un nivel de cumplimiento del 94 % de los indicadores del plan de calidad.
- La Interventoría (EDUBAR S.A.) realizó visitas técnicas de control de calidad durante el mes, sin reportar observaciones críticas.

6.4. TRAZABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN

Todo el control de calidad se respalda con:

- Registros de ensayos de laboratorio.
- Actas de inspección diaria.
- Certificados de materiales.
- Fotografías georreferenciadas.
- Bitácora de calidad (actualizada semanalmente).

6.5. BENEFICIOS DE ESTA MEJORA:

- Demuestra cumplimiento real, no solo declarativo.
- Vincula la calidad con datos técnicos y normativos.
- Justifica retrasos en urbanismo con base en la falta de entregables por parte de la Entidad.
- Refuerza la credibilidad técnica del contratista ante la Secretaría de Obras Públicas.

VII. GESTION SOCIAL.

Durante el mes de mayo, se continuó con la implementación y seguimiento del componente social asociado a la ejecución del contrato de OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. Las acciones desarrolladas se enmarcan en el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la normatividad vigente y en el Plan de Manejo Social del proyecto, con el objetivo de mitigar los impactos sociales, fomentar la participación ciudadana y garantizar el adecuado relacionamiento con la comunidad y demás actores del territorio.

7.1. PRINCIPALES ACTIVIDADES.

Durante el mes de septiembre, se intensificaron las acciones del componente social del contrato de obra, enfocadas en fortalecer la participación comunitaria y la articulación con los actores del territorio. A continuación, se presentan los avances más destacados.

7.1.1 DIVULGACION E INFORMACION A LA COMUNIDAD.

Se realizaron jornadas de socialización en diferentes puntos de la zona de influencia del proyecto, como

- Comité de participación ciudadana.
- Reuniones informativas
- Reunión de supervisión del contrato
- Solicitud de construcción de zonas verdes.

Estas actividades se complementaron con la entrega de material informativo y la habilitación de canales de comunicación activa (WhatsApp y correo electrónico), fortaleciendo así el relacionamiento con los residentes y comerciantes del sector.

7.1.2 RESTITUCIÓN DE BIENES AFECTADOS.

Durante septiembre, se continuó con la inspección técnica y levantamiento de información mediante actas de vecindad. Este proceso busca documentar el estado de los bienes antes de la intervención y garantizar su debida reposición, en coordinación con los propietarios afectados.

7.1.3 ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA.

La oficina de atención al ciudadano recibió y gestionó diversas solicitudes e inquietudes presentadas por la comunidad. Se mantuvo una interlocución activa con líderes comunitarios mediante reuniones periódicas en las que se abordaron temas relacionados con el avance del proyecto, afectaciones temporales y mecanismos de participación ciudadana. Durante el mes de mayo se atendieron 4 PQRS, siendo 3 quejas y 1 sugerencia las cuales se les realizó el debido tramite y gestión por parte del componente social del proyecto.

7.1.3 PEDAGOGÍA PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Se realizaron charlas comunitarias donde se socializaron temas como la importancia de la infraestructura urbana, el impacto positivo del proyecto en la movilidad y los derechos y deberes ciudadanos frente a la ejecución de obras públicas. Estas sesiones se enfocaron en fomentar el sentido de pertenencia y el cuidado del entorno.

7.1.4 VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL.

En coordinación con el contratista, se priorizó la contratación de personal residente en la zona de influencia, con el objetivo de generar oportunidades laborales locales. Se verificó el cumplimiento de estos compromisos a través del reporte mensual de nómina y visitas en campo.

7.1.5 INFLUJO LABORAL Y EQUIDAD DE GÉNERO.

Se promovió activamente la inclusión de mujeres y poblaciones vulnerables en las actividades de obra. Asimismo, se realizaron sesiones de sensibilización con los trabajadores sobre igualdad de oportunidades y no discriminación, como parte del compromiso social del proyecto.

VIII. RECURSOS HUMANOS.

El CONSORCIO URBANO LP, cuenta con un grupo de profesionales en cumplimiento de las exigencias y requerimientos exigidos en el pliego de condiciones y de acuerdo al perfil de asignación y responsabilidad indicado en el anexo técnico.

8.1 PERSONAL EN OBRA.

El contratista cuenta con un equipo de trabajo conformado por personal profesional y técnico, los cuales se encuentran vinculados directamente con la empresa y otros como independientes. En el siguiente cuadro se relacionan la planta de personal de los profesionales y técnicos que hacen parte del CONSORCIO URBANO LP.

							MES O PERIODO: **Octubre**																																		
	CONSORCIO URBANO LP						M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V
ITEMS	NOMBRE	CEDULA	EPS	ARL	PENSION	CARGO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	#	19	#	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Shirly Obredor Orduz	22478999	sura	sura	porvenir	RESIDENTE ADMINISTRATIVO	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
2	Francisco Rios Insignares	79558471	sura	sura	porvenir	RESIDENTE DE OBRA	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
3	Juan Martinez Mosquera	1042849042	cajacopi	sura		AUXILIAR DE RESIDENTE OBRA PRACTICANTE	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
4	Lilibeth Gutierrez Gomez	32865723	sanitas	sura	colpensiones	TRABAJADORA SOCIAL	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	x		x	x
5	Clara Diaz Imitola	1045233853	nueva eps	sura	porvenir	RESIDENTE SST	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
6	Danilo Hernandez Torres	1022373504	salud total	sura	colfondos	TOPOGRAO	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
7	Miguel Guzman Herrera	12642303	sura	sura	porvenir	ALMACENISTA	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
8	Josue Rodriguez Tapia	19873349	salud total	sura	proteccion	VIGILANTE		x	x	x		x	x	x	x	x	x									x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
9	Ever Utria Montero	3745969	sura	sura	colpensiones	VIGILANTE	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
10	Larissa Parra Vanegas	22515379	sura	sura	porvenir	AUXILIAR DE TRAICO	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
11	yeinis Badel Ruiz	22522750	mutual ser	sura	colpensiones	AUXILIAR DE TRAICO	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
12	Cindy Sanmartin Ochoa	1045677848	cajacopi	sura	porvenir	AUXILIAR DE TRAICO	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
13	Wilmer Polo Araque	8647404	salud total	sura	colfondos	INSPECTOR DE OBRA	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
14	Jonny samper barros	7239806	salud total	sura	proteccion	AUXILIAR DE TRAFICO	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
15	Mateo benites jimenez	1002013037	sanitas	sura	porvenir	ING ADMINISTRATIVO	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
16	yerifer ortiz peña	1045233156	coosalud	sura	porvenir	AUXILIAR DE TRAFICO	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
17	Yessenia ferrer	1095923835	nueva eps	sura	porvenir	AUXILIAR DE TRAFICO	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x																					
18	Luz bolivar	32606077	sura	sura	porvenir	AUXILIAR DE TRAFICO	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
19	Elkin lamadrid	72250863	mutual ser	sura	porvenir	BOAL	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
20	keyvis santana	1151473481	coosalud	sura	porvenir	BOAL	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x				x	x	x	x													
21	Alonso henriques rodriguez	8787463	salud total	sur	porvenir	BOAL	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
22	Samuel triana	1129508969	nueva eps	sura	porvenir	AUXILIAR DE TRAFICO	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
23	Ever utria castro	1044427445	cajacopi	sura	porvenir	BOAL	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x																					
24	Jovany Acosta Arevalo	72200647	salud total	sura	proteccion	AUXILIAR DE TRAFICO	x							x	x	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
25	Martina martinez	36454629	surra	sura	porvenir	AUXILIAR DE TRAFICO							x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
26	Rafael cassianis	1045307205	mutual ser	sura	porvenir	conductor							x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
27	Ramon campos herrera	1081920201	mutual ser	sura	porvenir	almacenista 60																	x	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
28	Mauro Pino Masilli	8798509	salud total	sura	porvenir	Maestro de obra	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x		x	x	x		x	x	x	x	x
29	Roberto Arroyo Rojano	1002184534	sura	sura	porvenir	ayudante	x	x	x	x																											
30	Jorge Marmol Bermudez	1048269945	coosalud	sura	colfondos	Ayudante	x	x	x	x			x	x	x	x	x				x	x	x	x				x		x	x		x	x	x	x	x
31	Nelson gomez marmol	1002229365	nueva eps	sura	porvenir	Ayudante	x		x			x		x		x	x						x	x													
32	Jorge luis sanchez	72284900	cajacopi	sura	colpensiones	oficial	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x				x		x	x		x	x	x	x	x
33	Sebastian caseres reyes	72273396	mutualser	sura	porvenir	ayudante	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x		x	x	x	x		x	x	x	x	x

			CONSORCIO URBANO LP				MES O PERIODO: **Octubre**																														
							M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V
ITEMS	NOMBRE	CEDULA	EPS	ARL	PENSION	CARGO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	#	19	#	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
34	Elkib maturana	72342607	nueva eps	sura	proteccion	oficial	X	x	x	x																											
35	Pompilio valencia lara	19592325	salud total	sura	colpensiones	oficial																														x	x
36	Ariel navarro navarro	8767004	nueva eps	sura	colpensiones	operador retro 60	X	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x									
37	Edgar hernandez marin	1053327569	salud total	positiva	porvenir	operador	X	x	x	x		x	x	x	x	x					x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
38	Samir jimenez realez	1128124466	Sanitas	positiva	colpension	operador bobcat	X	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x																	
39	Rafael martinez	1073998359	nueva eps	positiva	porvenir	operador bobcat	X	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
40	Carlos meza	72203138	sura	sura	porvenir	maestro	X	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x				x	x	x	x		x	x	x	x	x
41	Manuel de la cruz	3745879	nueva EPS	sura	colpensiones	ayudante	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x				x	x		x		x		x	x	x
42	Arturo Arango Ramorez	96124345	nueva EPS	sura	porvenir	oficial	X	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x				x	x	x	x		x	x	x	x	x
43	Elver patiño	1093801505	coosalud	sura	porvenir	ayudante	X	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x				x	x	x	x		x	x	x	x	x
44	Samir garrido	72247052	eps familiar de la costa	sur	proteccion	ayudante	X	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x				x	x	x	x		x	x	x	x	x
45	Emanuel correa	1044626243	salud total	sura	porvenir	ayudante	X	x	x	x		x	x	x																							
46	Janer rada	1044636599	nueva EPS	sura	porvenir	ayudante	X	x	x	x																											
47	Faider torres	1143262041	salud total	sura	porvenir	topografo	X	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
48	johan narvaez	1048276300	coosalud	sura	porvenir	ayudante	X	x	x	x		x	x	x	x	x	x				x	x	x	x													
49	john taboada	1143225810	nueva EPS	sura	porvenir	oficial	X	x	x	x		x	x	x	x	x	x				x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
50	rafael alcazar	8775956	nueva EPS	sura	colfondos	oficial	X	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
51	Bartolo madero	8730740	famisanar	sura	colfondos	maestro	X	x	x	x		x	x	x	x	x	x				x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
52	Ruben Zambrano	72434068	coosalud	sura	proteccon	ayudante	X	x	x	x		x	x	x	x	x	x				x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
53	Anival de la hoz	1042423123	coosalud	sura	porvenir	ayudante	X	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
54	Luis barrios	1042430051	nueva EPS	sura	porvenir	oficial	X	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
55	Alexander ramires	72192791	mutualser	sura	porvenir	ayudante	X	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x									
56	Alfonso zambrano del valle	8763026	mutualser	sura	porvenir	ayudante																													x	x	x
57	Yesid viloria gonzalez	79929048	salud total	sura	porvenir	operador bobcat 60	X	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
58	Edgar muñoz sanchez	8746192	sura	sura	colpensiones	oficial	X	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
59	Lugardo teran	9153206	mutualser	sura	porvenir	oficial	X	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
60	Breiner garcia gonzalez	1044433680	salud total	sura	proteccion	residente	X	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
61	Carlos urango	1044615662	sanitas	sura	colpensiones	Ayudante	X	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
62	Tilson herrera ruiz	19562236	salud total	sura	porvenir	operador bobcat 60	X	x	x	x											x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x		x	x
63	Aiel de la rosa pacheco	7598081	cajacopi	sura	proteccion	oficial	X	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
64	Robinson pedroza padilla	8676152	nueva EPS	sura	colpensiones	conductor de volqueta	X	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
65	Manuel Monjarrez	1042427747	mutualser	sura	porvenir	Ayudante			x	x		x	x	x	x	x	x				x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
66	Jesus barboza vides	1103115477	salud total	sura	porvenir	topografo	X	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
67	Yorlan otero vasquez	1044780654	salud total	sura	porvenir	Ayudante	X	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
68	Wilson ortega	72247064	nueva EPS	sura	porvenir	oficial	X	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x													
69	Jose alvarez	1002132952	nueva EPS	sura	porvenir	oficial	X	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x
70	Atilano mier	7642787	salud total	sura	colpensiones	oficial	X	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x
71	Cesar alvarez	72286500	salud total	sura	porvenir	operador pajarita 60	X	x	x	x																x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
72	Jair pacheco	1140893051	cajacopi	sura	porvenir	ENCARGADO DE MAUINAS	X	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
73	Jhon morales medrano	72198766	coosalud	sura	proteccion	oficial	x	x	x	x																											
74	Jovanis cantillo	1130266833	nueva EPS	sura	colpensiones	oficial	X	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
75	juan carlos navarro	8767375	salud total	sura	porvenir	ayudante	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
76	ismael arguelle nuez	1143463672	salud total	sura	proteccion	ayudante						x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
77	ismael arguelle ramirez	7478470	mutualser	sura	colpensiones	oficial						x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
78	miguel julio romero	4026833	coosalud	sura	porvenir	oficial						x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
79	Stiven de moya	1048303686	salud total	sura	porvenir	ayudante											x			x	x	x	x	x													
80	Miguel antonio jimenez	1044392089	sanitas	sura	colfondos	Operador bobcat 46																	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
81	Luis pallares	1052999971	salud total	sura	porvenir	operador 46	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
82	Edgardo gazcon estrada	8509497	salud total	sura	porvenir	operador 46	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
83	Belquis gonzalez	44152230	cajacopi	sura	porvenir	opraor 46																											x	x	x	x	x
84	Bredelin gonzalez altamiranda	73185650	sura	colmena	porvenir	operador miniretro 41B						x								x														x			
85	Aristides de la hoz romero	8717924	mutualser	colmena	proteccion	maestro																															
86	Reinaldo mercado	72250041	cajacopi	colmena	porvenir	ayudante			x											x														x			
87	Jainer martinez	1063279355	nueva eps	colmena	porvenir	sst						x																						x			
88	carlos perez acua	1129535993	coosalud	colmena	porvenir	ayudante			x											x														x			
89	marcos solano	1049534597	mutualser	colmena	porvenir	ayudante														x														x			
90	breyder neira	1193595399	Salud total	colmena	porvenir	ayudante			x			x								x														x			
91	Rafael chavarro	72170848	nueva eps	colmena	porvenir	topografo						x								x														x			
92	aramis de la hoz	1129568003	coosalud	colmena	porvenir	maertro			x			x								x														x			
93	Rafael barraza	72312371	sura	colmena	porvenir	ayudante			x			x								x														x			
94	Aldo mario ojeda	8772771	mutualser	colmena	proteccion	oficial			x											x														x			
95	Jonatan epiayu	1124411886	Salud total	colmena	proteccion	ayudante			x											x														x			
96	Gunter jimenez	1129497658	mutualser	colmena	proteccion	ayudante			x											x														x			
97	Jesus mendoza	1079911317	cajacopi	axa colpatria	porvenir	ayudante	x	x	x	x																											
98	Breiner anillo	1046698238	cajacopi	axa colpatria	porvenir	ayudante	x	x	x	x																											
99	Jhon fredy trujillo	1046270574	mutualser	axa colpatria	proteccion	operador	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x									
100	Orlando vargas bornaseli	1234092538	sura	axa colpatria	porvenir	residente	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x									
101	arlington carmona	1007964823	mutualser	axa colpatria	porvenir	ayudante							x	x	x	x				x	x	x	x	x			x	x									
102	cristofer narvaez	1010086669	cajacopi	axa colpatria	porvenir	aux de topografia	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x									
103	dario rafael mejia	8740682	sura	axa colpatria	porvenir	topografo	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x									
104	gabriel padilla torres	73291140	coosalud	axa colpatria	proteccion	ayudante							x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x									
105	Levington carmona	73144647	mutualser	axa colpatria	proteccion	oficial							x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x									
106	leminton carmona	1234088436	mutualser	axa colpatria	porvenir	ayudante								x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x									
107	Luis mejia	9876598	sura	axa colpatria	porvenir	ayudante								x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x									
108	martin martinez	72312917	salud total	axa colpatria	porvenir	oficial								x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x									
109	Jean pier ayala	1129513494	mutualser	axa colpatria	porvenir	ayudante																	x														
110	Julio garzon	72141025	cajacopi	axa colpatria	proteccion	ayudante																													x	x	x
111	Dennys dominguez	5074300	sura	axa colpatria	porvenir	oficial																													x	x	x
112	Ramiro torregroza	8602189	sanitas	axa colpatria	proteccion	maestro																													x	x	x
113	Ruben zambrano	72238105	nueva eps	axa colpatria	proteccion	oficial																													x	x	x
114	Rogel daza jimenez	72287216	salud total	Colmena	Proteccion	operador 46-48	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x													

Tabla 5: Profesionales del proyecto.

Teniendo en cuenta lo anterior, el consorcio se encuentra al día en el Pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales. Los registros asociados al personal se aportan en el informe del mes de mayo de implementación del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

8.2 SUBCONTRATISTA Y PROVEEDORES.

A continuación, se relaciona la lista de subcontratistas que se encuentran vinculados al CONSORCIO URBANO LP, a corte del presente informe:

N°	NOMBRE O RAZON SOCIAL	NIT/CEDULA	Nº CONTRATO
1	MAURO JESUS PINO MAZZILLI S.A.S	8.798.509-0	SUBCONTRATO DE OBRA No LP-012
2	CONSTRUCTORA CABASCO SAS	901.627.351-0	SUBCONTRATO DE OBRA No LP-011

3	TOPO-CONSTRUCCIONES J.M. S.A.S.	900.539.411-3	SUBCONTRATO DE OBRA CULP2503-2025
4	CONSTRUCTORA ELÉCTRICA DE LA COSTA S.A.S.	900.978.857-7	SUBCONTRATO DE OBRA LP-013
5	PACHECO CONSTRUCCIONES INGENIERIA S.A.S	900.924.643-6	SUBCONTRATO DE OBRA LP-020
6	ORLANDO CONTRERAS MANTILLA – INGENIEROS CIVILES S.A.S	900.940.322-4	SUBCONTRATO DE OBRA LP-023
7	GERENCIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	901.041.199-0	SUBCONTRATO DE OBRA LP-024
8	SKY GLOBAL	9024924	SUBCONTRATO DE OBRA LP-025

IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

9.1 EVALUACION GENERAL DEL PROYECTO:

El proyecto de "Obras de Pavimentación, Ampliación y/o Reconstrucción de Vías y Urbanismo" (Contrato LP-024-2024) se encuentra en una fase crítica de ejecución, con un avance físico acumulado del 56.72% al 1 de noviembre de 2025, lo que representa una desviación negativa de -4.24% respecto al cronograma programado (60.95%). Este retraso no es atribuible a una deficiencia en la gestión operativa del contratista, sino a factores externos e imprevistos fuera de su control directo.

Las principales causas del desfase son:

Demora en la entrega de diseños definitivos: La falta de aprobación oportuna de los diseños finales, especialmente para el urbanismo (colocación de losetas), ha impedido iniciar actividades clave. Dado que la fabricación de las losetas tiene un tiempo estimado de 15 días desde la confirmación del diseño, esta demora se traduce directamente en paralización de obras.

Falta de suministro de materiales críticos: La no entrega de la tubería de alcantarillado por parte de la entidad prestadora del servicio ha paralizado actividades fundamentales como las excavaciones, instalación de tuberías y rellenos, afectando así múltiples capítulos del proyecto.

Condiciones climáticas adversas: Las fuertes lluvias durante el mes de octubre dificultaron significativamente las labores de campo, especialmente en actividades de excavación, compactación y pavimentación.

Solicitud de suspensión por la administración: Se reportó una solicitud por parte de la administración y propietarios de predios para suspender la demolición del urbanismo hasta enero de 2026, lo cual impacta directamente en la planificación.

A pesar de estos obstáculos, el informe destaca un buen desempeño en otros frentes, como las redes de telecomunicaciones y acueducto, muestra un compromiso sólido con la calidad, la seguridad y el medio ambiente, sin incidentes laborales ni incumplimientos ambientales reportados.

9.2 RECOMENDACIONES:

:

- Se recomienda que la entidad contratante y la interventoría reconozcan las causas de fuerza mayor presentadas y procedan a realizar una modificación formal del cronograma base. Esta modificación debe ajustarse a la fecha real de entrega de los diseños definitivos y de los materiales faltantes (tubería de alcantarillado).
- La entidad contratante debe agilizar la entrega definitiva de todos los diseños pendientes y coordinar con el proveedor o la empresa prestadora del servicio para garantizar la entrega inmediata de la tubería de alcantarillado, desbloqueando así las actividades paralizadas.
- Dado que varias actividades ya han superado sus cantidades contractuales, se recomienda iniciar el proceso para la elaboración de actas modificatorias que adicionen recursos y tiempo al contrato, asegurando la finalización integral del proyecto.

como constancia de lo anterior, firma.

ELABORO	REVISO
FRNACISCO RIOS INSIGNARES RESIDENTE DE OBRA	REINALDO ROMERO MARTINEZ DIRECTOR DE OBRA.

ANEXOS

CONSORCIO URBANO LP

INFORME MENSUAL DE OBRA

Código Formato:

Pagina 1 de 1

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONSORCIO URBANO LP	**Contratista:**	EDUBAR
Nit:	901918972-3	**Nit:**	
Objeto:	Obras de pavimentación, ampliación y/o reconstrucción de vias y/o urbanismo y sus obras complementarias dentro del proyecto de mantenimiento y recuperación de la malla vial en el distrito de Barranquilla	**Objeto:**	
Contrato No.	LP-024-2024	**Contrato No.**	
Valor Inicial:	$ 20,849,779,050.00	**Valor Inicial:**	
Valor adicional		**Valor adicional :**	
Valor total:	$ 20,849,779,050	**Valor total:**	
Plazo Inicial:	283.00	**Plazo Inicial:**	
Plazo adicion:		**Plazo adicion:**	
Nueva fecaha de terminacion:		**Nueva fecaha de terminacion:**	
Fecha de Iniciación de obras:	23/03/2025	**Fecha de Iniciación:**	3/04/2025
Fecha de terminación:	31/12/2025	**Fecha de terminación:**	31/12/2025

Informe Anterior: 5 Del: 3/09/2025 Al: 2/10/2025

Informe Número: 6 Del: 3/10/2025 Al: 1/11/2025

Nombre del Supervisor

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 223 días

CONTROL Y SEGUIMIENTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	% Programado	% Ejecutado	Desviación
1.1	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS	10.07%	8.40%	-1.66%
1.2	DEMOLICION DE SEPARADOR CENTRAL INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	14.81%	3.32%	-11.49%
1.3	DEMOLICION DE ESPACIO PUBLICO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	7.98%	3.98%	-4.00%
1.4	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL	19.25%	31.00%	11.74%
1.5	DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	18.50%	8.70%	-9.80%
2	CAPITULO PAVIMENTO			
2.1	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL	16.57%	10.30%	-6.27%
2.2	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	22.40%	8.83%	-13.57%
2.3	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS , ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	18.73%	13.12%	-5.61%
2.4	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 39 A LA FLEXION ,ESPESOR= 0.2 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D =1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" -LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL			
2.5	CONCRETO DE 1500 PSI PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO, E = 0.15 METROS	15.93%	15.62%	-0.31%
2.6	BORDILLO DE 0.15 X 0.20 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ANCLAJE CON SIKADUR (VER DISEÑO)	12.35%	11.75%	-0.60%
2.7	SELLO DE FISURAS ESTRUCTURALES, Y REFORZAMIENTO ANCLADO (INCLUYE, SIKADUR®-35 HI-MOD LV, SIKADUR® ANCHORFIX-4, ACERO DE REFUERZO DE 5/8¨ L=0,50 MTS @0,20			
2.8	SELLO DE FISURAS ESTRUCTURALES, Y REFORZAMIENTO ANCLADO (INCLUYE,			
3	CAPITULO- URBANISMO			
3.1	Loseta Plana de 400x400x60 Mm De Espesor Color Gris oscuro, Usada En Pavimento De La Franja De Circulacion Peatonal Y Esquinas Con Carreras Transversales, Colocada Sobre Capa De Mortero E= 3 Cms, Capa De Concreto de 3000 psi E= 10 Cms Y Capa De Subbase Granular E= 15cms	21.70%	9.45%	-12.25%
3.2	Loseta Plana 400x400x60 Mm De Espesor Color Gris claro, Usada En Pavimento De La Franja De Circulacion Peatonal Y Esquinas Con Carreras Transversales, Colocada Sobre Capa De Mortero E= 3 Cms, Capa De Concreto de 3000 psi E= 10 Cms Y Capa De Subbase Granular E= 15cms	21.70%	9.45%	-12.25%
3.3	Loseta Alerta 200x200x60 Mm De Espesor Color amarillo, Usada En La Franja De Alineacion Para Invidentes, y Loseta GUIA Colocada Sobre Capa De Mortero E= 3 Cms, Capa De Concreto de 3000 psi E= 10 Cms Y Capa De Subbase Granular E= 15cms	20.30%	0.00%	-20.30%
3.4	Viga de Confinamiento para Losetas de Espacio Publico en Concreto de 3000 Psi de 0.1 x 0.3 mt incluye 2 varillas de 1/2" estribos de 1/4" cada 0.3 mt	2.74%	0.00%	-2.74%
3.5	Rampa en Concreto de 3000 PSI E=0.12 mts, incluye malla electrosoldada XY-221	4.74%	0.00%	-4.74%
4	CAPITULO- REDES DE ALCANTARILLADO			
0	ALCANTARILLADO			
4,1,1	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL	11.95%	10.43%	-1.52%
4,1,2	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO COMPACTADO	22.86%	27.04%	4.18%
4,1,3	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	11.45%	49.96%	38.51%
4,1,4	EXCAVACION MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL	11.45%	0.00%	-11.45%
4,1,5	DESMONTE DE TUBERÍA DE ASBESTO CEMENTO DE 6" Y 8"	12.90%	0.00%	-12.90%
4,1,6	INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO PVC NOVAFORT 8"	13.86%	10.34%	-3.51%
4,1,7	INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO PVC NOVAFORT 10"	0.00%	0.00%	
4,1,8	CONSTRUCCION DE POZO DE INSPECCION 1.45M< H <=1.80M EN LADRILLO TOLETE, PAÑETADO E IMPERMEABILIZADO EN AMBAS CARAS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL OPERADOR	16.73%	16.18%	-0.56%
4,1,9	CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO PVC NOVAFORT 6" LONGITUD HASTA 6 M. INCLUYE EXCAVACIÓN	10.96%	16.14%	5.18%
4,1,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS TEE 8" X 6" Y SELLOS			
4,1,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRITURADO 3/4" PARA SOPORTE DE TUBERIA ALCANTARILLADO	21.99%	2.46%	-19.53%
4,1,12	CONSTRUCCION DE REGISTROS DOMICILIARIOS DE 60 X 60X 1M PAÑETADO E IMPERMEABILIZADO EN AMBAS CARAS INCLUYE TAPA EN CONCRETO	18.69%	10.94%	-7.75%
4,1,13	REPARACION DE FUGAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO	12.00%	6.82%	-5.18%
4,1,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS DE ALCANTARILLADO HD	11.89%	11.03%	-0.86%
4,1,15	MANEJO DE AGUA EN EXCAVACIONES	0.00%	25.91%	25.91%
4,1,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE 4"Y 6" PARA DESAGUES	12.60%	15.64%	3.04%
0	ACUEDUCTO			
4,2,1	RELLENO EN ARENA COMPACTADO	12.60%	6.40%	-6.20%
4,2,2	EXCAVACION MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL	12.60%	0.00%	-12.60%
4,2,3	INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA PEAD 20 MM PARA ACUEDCUTO	188.50%	16.65%	-171.85%
4,2,4	INSTALACION DE TUBERIA PEAD PN 100 160 MM (6") (INCLUYE ACCESORIOS)	18.14%	21.53%	3.39%
4,2,5	REPARACION DE DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO	11.72%	34.26%	22.54%
5	CAPITULO- SUBTERRANIZACION DE REDES DE TELECOMUNICACIONES			
5.1	REGISTROS DOMICILARIOS 0.6 X 0.6 M, MUROS EN LADRILLO TOLETE PAÑETADOS POR DENTRO Y POR FUERA, CON FONDO E = 0.10 M Y TAPA DE CONCRETO REFORZADO E = 0.07 M CON MARCO EN ANGULOS DE ACERO GALVANIZADO	12.60%	6.06%	-6.54%
5.2	CAMARAS COMUNES EN MAMPOSTERIA PARA REDES DE COMUNICACIONES 1,5 X 1,5 x 1,5CON PAÑETE IMPERMEABILIZADO INCLUYE TAPA EN HIERRO DUCTIL D=60 CM	12.00%	12.80%	0.80%
5.3	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL	21.07%	19.08%	-1.99%
5.4	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	18.65%	20.30%	1.65%
5.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TDP DE 4" INCLUYE SEPARADORES, INCLUYE 12 LINEAS DE TUBOS	20.20%	20.31%	0.11%
5.6	PROVISION - REDES DE GAS DOMICILIARIO	12.60%	0.00%	-12.60%
6	CAPITULO- ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO			
0	MEDIA TENSION			
6,1,1	Suministro Hora Brigada Diurna TET	50.00%	0.00%	-50.00%
6,1,2	Suministro Hora Grúa Hidráulica con Operador	0.00%	0.00%	
6,1,3	Construcción Registro Área Interna 0.49 M2 (F1) Concreto De 3000 Psi	25.00%	0.00%	-25.00%
6,1,4	Reubicacion de Postes de Media tension	16.67%	0.00%	-16.67%
0	BAJA TENSION			
6,2,1	Suministro Y Tendido De Ducteria Conduit Pvc 1 1/2"			
6,2,2	Canalización 0.30 X 0.50 En Zona Arena, Incluye: Excavación, Compactado Con Material Del Sitio Y Cinta De Seguridad	17.35%	20.82%	3.47%
6,2,3	Suministro e instalacion de Tapa antivandalica para registro de 50x50 EN PLATINA DE 2" CALIBRE 3/16"	21.08%	12.07%	-9.02%
6,2,4	Suministro e instalacion de Registro antivandalico de 50x50 EN PLATINA DE 2" CALIBRE 3/16"	20.68%	13.71%	-6.97%
6,2,5	Suministro e instalación de tubería PVC 2"	17.53%	31.09%	13.56%
6,2,6	Sondeo de Canalización instalada con guía	22.92%	78.13%	55.21%
0	ILUMINACION			
6,3,1	Suministro E Instalacion De Luminaria De Led 60-90 W, Incluye Brazo Ornamental De 2,50 Metros, Pernos Y Fotocelda	23.58%	27.18%	3.61%
6,3,2	Suministro E Instalacion De Cable Thw Aluminio Aislado 90º C-Awg 6	17.39%	23.66%	6.27%
6,3,3	Demolición de pedestal de poste de alumbrado público. Incluye retiro de material	17.39%	53.13%	35.73%
6,3,4	Pedestal para poste de alumbrado público	16.55%	16.61%	0.06%
6,3,5	Suministro e instalacion de transformador monofasico 25 KVA 13.2 kV/440-220V	0.00%	0.00%	
6,3,6	Bajante en tuberia IMC 2"	100.00%	0.00%	-100.00%
6,3,7	Suministro E Instalacion De Poste De Acero Galvanizado En Caliente De 7.00 Metros De Altura, Tronco Conico Poligonal, En Lamina De Acero, Acabado Final En Pintura De Esmalte Para Exteriores, Incluye Base De Concreto	20.42%	21.75%	1.33%
6,3,8	Suministro E Instalacion De Luminaria De Led 50 W, Incluye Pernos Y Fotocelda	16.89%	21.75%	4.85%
6,3,9	Suministro E Instalacion De Cable Thw Cobre Forrado 90ºC-Awg 10	20.00%	14.66%	-5.34%
6,3,10	Suministro E Instalacion De Cable Encauchetado 3 X 14 Awg	20.00%	9.60%	-10.40%
6,3,11	Suministro E Instalacion De Varilla Polo A Tierra, Incluye Varilla, Conector	20.00%	21.82%	1.82%
6,3,12	Empalme Subterraneo De Baja Tension Acometida 14-4	30.00%	28.98%	-1.02%
6,3,13	Empalme Subterráneo De Baja Tensión Acometida 2-1/0	13.14%	0.00%	-13.14%
6,3,14	Suministro E Instalación De Cable Thw Cobre Aislado 90º C-Awg 1/0	0.00%	0.00%	
6,3,15	Suministro E Instalacion De Medidor Semidirecto, Incluye Tc, Protocolo, Bloque De Prueba, Cajas De Policarbonato	50.00%	0.00%	-50.00%
6,3,16	Diseños de iluminación y cálculos fotométricos	6.46%	10.00%	3.54%
6,3,17	Perforación horizontal con topo 2"	0.00%	0.00%	
6,3,18	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	19.05%	0.00%	-19.05%
6,4	SUPLEMENTOS EN TENSION			
6,4,1	Suplemento De Trabajo En Tensión Cruceta Auxiliar De Protecciones	18.18%	0.00%	-18.18%
6,4,2	Suplemento De Trabajo En Tensión de Cortacircuitos Nn Completo 13.2 Kv 100 A	18.18%	0.00%	-18.18%
6,5	REUBICACIONES Y DESMONTES			
6,5,1	Desmonte De Poste De Hormigón De 14.00 Metros	22.73%	25.86%	3.13%
6,5,2	Retiro De Luminaria Ap	22.73%	25.86%	3.13%
6,5,3	Desmonte De Línea Bt (Rt) Triplex 2 A 4/0	22.73%	25.91%	3.18%
6,6	CERTIFICACIONES Y TRAMITES			
6,6,1	Certificación Retie	0.00%	0.00%	
6,6,2	Certificación Retilap	0.00%	0.00%	
6,6,3	Gestiones Ante Electricaribe	12.00%	0.00%	-12.00%
6,6,4	Tramite Retie	12.60%	0.00%	-12.60%
6,6,5	Tramite Retilap	12.60%	0.00%	-12.60%
7	Capitulo - Provisiones			
7,1	RETIRO Y TRASLADO DE SEMAFOROS			
7,2	PROVISIÓN PERMISOS PMA, PMT, PGS.	0.00%	0.00%	
7,3	PROVISIÓN DESMONTE Y REUBICACIÓN DE PARADEROS DE BUSES INCLUYE (12 PARADEROS)			
7,4	PROVISION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	11.94%	0.00%	-11.94%
7,5	TALA DE ARBOLES INCLUYENDO RAIZ Y RETIRO DE MATERIAL	26.53%	0.00%	-26.53%
7,6	AJUSTE Y/O COMPLEMETACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	0.00%	0.00%	
8	Capitulo - NO PREVISTOS			
NP 8.1	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 39 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS,ESPESOR= 0.2 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D =1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" -LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL	20.41%	7.53%	-12.88%
NP 8.2	Viga de Confinamiento para Losetas de Espacio Publico en Concreto de 3000 Psi de 0.10 x 0.10 mt	19.05%	0.00%	-19.05%
NP 8.3	Loseta Tope 200x200x60 Mm De Espesor Color Gris, Usada En Pavimento En Los Dos Extremos De La Franja de Circulación Peatonal, Colocada Sobre Capa De Mortero E= 3 Cms, Capa De Concreto de 3000 psi E= 10 Cms Y Capa De Subbase Granular E= 15cms	9.92%	0.00%	-9.92%
NP 8.4	INSTALACIÓN DE ACCESORIOS TEE 8" X 6" Y SELLOS	10.81%	9.67%	-1.14%
NP 8.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO TDP DE 4"	19.03%	18.52%	-0.51%
NP 8.6	ACERO DE REFUERZO	27.45%	6.38%	-21.07%
NP 8.7	DEMOLICIÓN DE ROCA	11.67%	0.00%	-11.67%
NP 8.8	CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO	24.13%	0.00%	-24.13%
NP 8.9	DEMOLICION DE POZOS DE INSPECCION 1.45M< H <=1.80M EN LADRILLO	25.00%	100.00%	75.00%
NP 8.10	CAMARA DE CAIDA DE 8"			
NP 8.11	PERFORACION DE POZO DE REGISTRO PARA ACOMETIDA PROVICIONAL	22.50%	16.67%	-5.83%
NP 8.12	DESMONTE Y RETIRO DE POSTE DE 7 MT DE TELECOMUNICACIONES (INCLUYE CUADRILLA PARA QUITAR CABLES ELÉCTRICOS SENCILLOS)	20.00%	0.00%	-20.00%
NP 8.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE 7 MT DE TELECOMUNICACIONES (INCLUYE CUADRILLA PARA QUITAR CABLES ELÉCTRICOS SENCILLOS)	25.00%	0.00%	-25.00%
NP 8.14	REUBICACIÓN DE POSTE DE 7 MT DE TELECOMUNICACIONES (QUITAR POSTE Y QUE UNA CUADRILLA ARME LOS CABLES QUE ESTÁN EN EL POSTE NUEVO)	20.00%	0.00%	-20.00%

AVANCE DE LA OBRA

OBRA PROGRAMADA


	MENSUAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	18.05%	60.95%
Valor de la Obra programada:	$ 3,764,172,785.33	$ 12,808,093,689.36

OBRA EJECUTADA

	MENSUAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	13.13%	56.72%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 2,739,704,907.92	$ 11,896,134,265.01

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	42.91%	43.58%	-4.24%
Durante el periodo	18.05%	13.13%	
Acumulado actual	60.95%	56.72%	

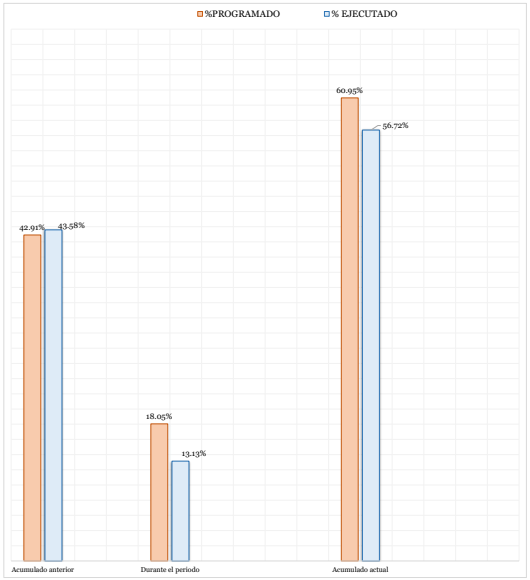

ACTIVIDADES PRESUPUESTALES EJECUTADAS EN EL PERIODO


ITEM	CAPITULO	VALOR PRESUPUESTO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO
	ARDIZ SOLUCIONES DE PROYECTOS			
1.10	NIVELACION, REPLANTEO Y SENALIZACIÓN VIAS	$ 60,675,057.00	$ 6,109,324.49	$ 5,099,110.67
1.20	DEMOLICION DE SEPARADOR CENTRAL INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	$ 98,407,998.00	$ 14,578,962.67	$ 3,271,038.50
1.30	DEMOLICION DE ESPACIO PUBLICO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	$ 826,540,609.00	$ 65,940,252.87	$ 32,856,328.23
1.40	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL	$ 449,484,973.00	$ 86,539,266.16	$ 139,324,794.57
1.50	DEMOLICION DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	$ 262,393,424.00	$ 48,540,367.29	$ 22,823,648.17
2.00	**CAPITULO PAVIMENTO**			
2.10	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL	$ 292,939,315.00	$ 48,540,367.29	$ 30,159,888.36
2.20	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	$ 224,249,310.00	$ 50,231,131.30	$ 19,806,383.56
2.30	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS , ESPES	$ 2,016,665,103.00	$ 377,622,679.62	$ 264,524,261.68
2.40	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 39 A LA FLEXION ,ESPESOR= 0.2 METROS, INCL	$ -	$ -	$ -
2.50	CONCRETO DE 1500 PSI PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO, E = 0.15 METROS	$ 588,639,151.00	$ 93,752,167.61	$ 91,943,700.14
2.60	BORDILLO DE 0.15 X 0.20 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ANCLAJE CON	$ 273,056,070.00	$ 33,718,793.41	$ 32,077,444.53
2.70	SELLO DE FISURAS ESTRUCTURALES, Y REFORZAMIENTO ANCLADO (INCLUYE, SIKADU	$ -	$ -	$ -
2.80	SELLO DE FISURAS ESTRUCTURALES, Y REFORZAMIENTO ANCLADO (INCLUYE,SIKADU	$ -	$ -	$ -
3.00	**CAPITULO- URBANISMO**			
3.10	Loseta Plana de 400x400x60 Mm De Espesor Color Gris oscuro, Usada En Pavimento De La F	$ 1,578,406,369.00	$ 342,548,868.86	$ 149,218,270.80
3.20	Loseta Plana 400x400x60 Mm De Espesor Color Gris claro, Usada En Pavimento De La Franja	$ 1,578,406,369.00	$ 342,548,868.86	$ 149,218,270.80
3.30	Loseta Aleta 200x200x60 Mm De Espesor Color amarillo, Usada En La Franja De Alineacion P	$ 419,180,410.00	$ 85,081,003.81	$ -
3.40	Viga de Confinamiento para Losetas de Espacio Publico en Concreto de 3000 Psi de 0.1 x 0.3	$ 315,927,696.00	$ 8,659,947.00	$ -
3.50	Rampa en Concreto de 3000 PSI E=0.12 mts, incluye malla electrosoldada XY-221	$ 86,344,632.00	$ 4,090,008.89	$ -
4.00	**CAPITULO- REDES DE ALCANTARILLADO**			
	ALCANTARILLADO			
4.1.1	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL	$ 459,576,351.00	$ 54,913,399.62	$ 47,928,005.50
4.1.2	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO COMPACTADO	$ 266,762,936.00	$ 60,977,804.11	$ 72,131,659.36
4.1.3	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	$ 68,432,122.00	$ 7,838,588.52	$ 34,189,110.43
4.1.4	EXCAVACION MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL	$ 116,732,744.00	$ 13,371,205.24	$ -
4.1.5	DESMONTE DE TUBERÍA DE ASBESTO CEMENTO DE 6" Y 8"	$ 50,314,570.00	$ 6,492,202.58	$ -
4.1.6	INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO PVC NOVAFORT 8"	$ 209,904,285.00	$ 29,090,010.31	$ 21,714,095.73
4.1.7	INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO PVC NOVAFORT 10"	$ 2,516,760.00	$ -	$ -
4.1.8	CONSTRUCCION DE POZO DE INSPECCION 1.45M< H <=1.80M EN LADRILLO TOLETE, PA	$ 341,905,836.00	$ 57,210,827.43	$ 55,308,297.00
4.1.9	CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO PVC NOVAFORT 6" LONGITUD HASTA 6 M	$ 84,015,888.00	$ 9,205,219.04	$ 13,557,109.20
4.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS TEE 8" X 6" Y SELLOS	$ -	$ -	$ -
4.1.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRITURADO 3/4" PARA SOPORTE DE TUBERIA ALCANTA	$ 203,817,219.00	$ 44,827,133.23	$ 5,013,684.57
4.1.12	CONSTRUCCION DE REGISTROS DOMICILIARIOS DE 60 X 60X 1M PAÑETADO E IMPERME	$ 155,360,304.00	$ 29,039,481.43	$ 16,992,533.25
4.1.13	REPARACION DE FUGAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO	$ 51,665,504.00	$ 6,199,860.48	$ 3,522,648.00
4.1.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS DE ALCANTARILLADO HD	$ 136,586,840.00	$ 16,235,794.20	$ 15,064,725.00
4.1.15	MANEJO DE AGUA EN EXCAVACIONES	$ 10,344,800.00	$ -	$ 2,680,000.00
4.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE 4"Y 6" PARA DESAGUES	$ 86,052,560.00	$ 10,842,622.56	$ 13,455,491.20
	ACUEDUCTO			
4.2.1	RELLENO EN ARENA COMPACTADO	$ 122,795,400.00	$ 15,472,220.40	$ 7,854,213.36
4.2.2	EXCAVACION MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL	$ 34,911,100.00	$ 4,398,798.60	$ -
4.2.3	INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA PEAD 20 MM PARA ACUEDCUTO	$ 16,134,800.00	$ 30,413,976.67	$ 2,686,077.50
4.2.4	INSTALACION DE TUBERIA PEAD PN 100 160 MM (6") (INCLUYE ACCESORIOS)	$ 167,658,500.00	$ 30,413,976.67	$ 36,097,603.68
4.2.5	REPARACION DE DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO	$ 10,297,232.00	$ 1,206,931.36	$ 3,527,972.10
	CAPITULO- SUBTERRANIZACION DE REDES DE TELECOMUNICACIONES			
5.10	REGISTROS DOMICILARIOS 0.6 X 0.6 M, MUROS EN LADRILLO TOLETE PAÑETADOS POR	$ 76,487,664.00	$ 9,637,445.68	$ 4,635,616.00
5.20	CAMARAS COMUNES EN MAMPOSTERIA PARA REDES DE COMUNICACIONES 1.5 X 1.5 x	$ 390,127,472.00	$ 46,815,296.64	$ 49,943,855.33
5.30	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL	$ 428,487,293.00	$ 90,270,225.76	$ 81,742,287.98
5.40	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	$ 189,310,025.00	$ 35,302,074.93	$ 38,427,280.62
5.50	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TDP DE 4" INCLUYE SEPARADORES, INCLUYE	$ 2,319,353,384.00	$ 468,620,184.00	$ 471,139,695.20
5.60	PROVISION - REDES DE GAS DOMICILIARIO	$ 60,950,500.00	$ 7,679,763.00	$ -
6.00	**CAPITULO- ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO**			
	MEDIA TENSION			
6.1.1	Suministro Hora Brigada Diurna TET	$ 8,264,672.00	$ 4,132,336.00	$ -
6.1.2	Suministro Hora Grúa Hidráulica con Operador	$ 4,965,432.00	$ -	$ -
6.1.3	Construcción Registro Área Interna 0.49 M2 (F1) Concreto De 3000 Psi	$ 13,392,336.00	$ 3,348,084.00	$ -
6.1.4	Reubicacion de Postes de Media tension	$ 592,730,820.00	$ 98,788,470.00	$ -
	BAJA TENSION			
6.2.1	Suministro Y Tendido De Ducteria Conduit Pvc 1 1/2"	$ -	$ -	$ -
6.2.2	Canalización 0.30 X 0.50 En Zona Arena, Incluye: Excavación, Compactado Con Material Del S	$ 112,829,200.00	$ 19,576,598.86	$ 23,488,987.50
6.2.3	Suministro e instalacion de Tapa antivandalica para registro de 50x50 EN PLATINA DE 2" CALI	$ 78,755,300.00	$ 16,604,859.71	$ 9,504,950.00
6.2.4	Suministro e instalacion de Registro antivandalico de 50x50 EN PLATINA DE 2" CALIBRE 3/16	$ 183,122,936.00	$ 37,866,507.71	$ 25,101,044.00
6.2.5	Suministro e instalación de tubería PVC 2"	$ 381,792,000.00	$ 66,931,437.13	$ 118,711,859.20
6.2.6	Sondeo de Canalización instalada con guía	$ 42,547,200.00	$ 9,750,400.00	$ 33,242,047.97
	ILUMINACION			
6.3.1	Suministro E Instalacion De Luminaria De Led 60-90 W, Incluye Brazo Ornamental De 2,50 Met	$ 377,111,428.00	$ 88,916,702.86	$ 102,515,728.00
6.3.2	Suministro E Instalacion De Cable Thw Aluminio Aislado 90° C-Awg 6	$ 139,189,600.00	$ 24,206,886.96	$ 32,935,422.44
6.3.3	Demolición de pedestal de poste de alumbrado público. Incluye retiro de material	$ 2,485,760.00	$ 432,306.09	$ 1,320,560.00
6.3.4	Pedestal para poste de alumbrado público	$ 9,945,062.00	$ 1,645,616.00	$ 1,651,756.00
6.3.5	Suministro e instalacion de transformador monofasico 25 KVA 13.2 kV/440-220V	$ 38,505,226.00	$ -	$ -
6.3.6	Bajante en tubería IMC 2"	$ 1,105,382.00	$ 1,105,382.00	$ -
6.3.7	Suministro E Instalacion De Poste De Acero Galvanizado En Caliente De 7.00 Metros De Altura	$ 681,283,612.00	$ 139,091,466.86	$ 148,162,649.60
6.3.8	Suministro E Instalacion De Luminaria De Led 50 W, Incluye Pernos Y Fotocelda	$ 251,360,994.00	$ 42,462,925.29	$ 54,664,915.20
6.3.9	Suministro E Instalacion De Cable Thw Cobre Forrado 90ºC-Awg 10	$ 73,999,200.00	$ 14,799,840.00	$ 10,849,964.88
6.3.10	Suministro E Instalacion De Cable Encauchetado 3 X 14 Awg	$ 79,160,400.00	$ 15,832,080.00	$ 7,596,200.00
6.3.11	Suministro E Instalacion De Varilla Polo A Tierra, Incluye Varilla, Conector	$ 15,289,296.00	$ 3,057,859.20	$ 3,335,846.40
6.3.12	Empalme Subterraneo De Baja Tension Acometida 14-4	$ 176,638,834.00	$ 52,991,650.20	$ 51,192,978.00
6.3.13	Empalme Subterraneo De Baja Tensión Acometida 2-1/0	$ 23,279,958.00	$ 3,057,859.20	$ -
6.3.14	Suministro E Instalación De Cable Thw Cobre Aislado 90º C-Awg 1/0	$ 21,983,016.00	$ -	$ -
6.3.15	Suministro E Instalacion De Medidor Semidirecto, Incluye Tc, Protocolo, Bloque De Prueba, Ca	$ 23,682,782.00	$ 11,841,391.00	$ -
6.3.16	Diseños de iluminación y cálculos fotométricos	$ 43,477,390.00	$ 2,809,308.28	$ 4,347,739.00
6.3.17	Perforación horizontal con topo 2"	$ 15,645,465.00	$ -	$ -
6.3.18	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	$ 9,994,600.00	$ 1,903,733.33	$ -
6.4	**SUPLEMENTOS EN TENSION**			
6.4.1	Suplemento De Trabajo En Tensión Cruceta Auxiliar De Protecciones	$ 578,880.00	$ 105,250.91	$ -
6.4.2	Suplemento De Trabajo En Tensión de Cortacircuitos Nn Completo 13.2 Kv 100 A	$ 1,008,336.00	$ 183,333.82	$ -
6.5	**REUBICACIONES Y DESMONTES**			
6.5.1	Desmonte De Poste De Hormigón De 14.00 Metros	$ 55,040,434.00	$ 12,509,189.55	$ 14,234,595.00
6.5.2	Retiro De Luminaria Ap	$ 15,599,680.00	$ 3,545,381.82	$ 4,034,400.00
6.5.3	Desmonte De Linea Bt (Rt) Triplex 2 A 4/0	$ 232,119,800.00	$ 52,754,500.00	$ 60,140,130.00
6.6	**CERTIFICACIONES Y TRAMITES**			
6.6.1	Certificación Retie	$ 10,140,000.00	$ -	$ -
6.6.2	Certificación Retilap	$ 33,150,000.00	$ -	$ -
6.6.3	Gestiones Ante Electricaribe	$ 5,655,000.00	$ 678,600.00	$ -
6.6.4	Tramite Retie	$ 5,169,945.00	$ 651,413.08	$ -
6.6.5	Tramite Retilap	$ 11,669,945.00	$ 1,470,413.08	$ -
7.00	**Capitulo - Provisiones**			
7.1	RETIRO Y TRASLADO DE SEMAFOROS	$ -	$ -	$ -
7.2	PROVISIÓN PERMISOS PMA, PMT, PGS.	$ 177,370,918.00	$ -	$ -
7.3	PROVISIÓN DESMONTE Y REUBICACIÓN DE PARADEROS DE BUSES INCLUYE (12 PARA	$ -	$ -	$ -
7.4	PROVISION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	$ 21,580,000.00	$ 2,577,327.00	$ -
7.5	TALA DE ARBOLES INCLUYENDO RAIZ Y RETIRO DE MATERIAL	$ 64,852,059.00	$ 17,202,861.96	$ -
7.6	AJUSTE Y/O COMPLEMETACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 87,657,677.00	$ -	$ -
8.00	**Capitulo - NO PREVISTOS**		**$ -**	**$ -**
NP 8.1	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 39 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS,ESPES	$ 225,176,250.00	$ 45,951,414.37	$ 16,958,023.06
NP 8.2	Viga de Confinamiento para Losetas de Espacio Publico en Concreto de 3000 Psi de 0.10 x 0.1	$ 5,538,000.00	$ 1,054,857.15	$ -
NP 8.3	Loseta Tope 200x200x60 Mm De Espesor Color Gris, Usada En Pavimento En Los Dos Extrem	$ 127,322,000.00	$ 12,630,780.67	$ -
NP 8.4	INSTALACIÓN DE ACCESORIOS TEE 8" X 6" Y SELLOS	$ 3,254,944.00	$ 351,885.84	$ 314,807.60
NP 8.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO TDP DE 4"	$ 252,122,216.00	$ 47,976,837.88	$ 46,684,658.60
NP 8.6	ACERO DE REFUERZO	$ 452,311,026.00	$ 124,165,894.33	$ 28,871,239.13
NP 8.7	DEMOLICIÓN DE ROCA	$ 269,574,200.00	$ 31,450,323.33	$ -
NP 8.8	CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO	$ 61,323,404.00	$ 14,797,388.86	$ -
NP 8.9	DEMOLICION DE POZOS DE INSPECCION 1.45M< H <=1.80M EN LADRILLO	$ 1,223,572.00	$ 305,893.00	$ 1,223,572.00
NP 8.10	CAMARA DE CAIDA DE 6"	$ 500,760.00	$ 125,190.00	$ -
NP 8.11	PERFORACION DE POZO DE REGISTRO PARA ACOMETIDA PROVICIONAL	$ 4,114,400.00	$ 925,740.00	$ 685,733.33
NP 8.12	DESMONTE Y RETIRO DE POSTE DE 7 MT DE TELECOMUNICACIONES (INCLUYE CUADR	$ 94,372,681.00	$ 18,874,536.20	$ -
NP 8.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE 7 MT DE TELECOMUNICACIONES (INCLUYE	$ 71,012,077.00	$ 17,753,019.25	$ -
NP 8.14	REUBICACIÓN DE POSTE DE 7 MT DE TELECOMUNICACIONES (QUITAR POSTE Y QUE UN	$ 35,978,970.00	$ 7,195,794.00	$ -
	COSTOS	**$ 20,859,773,651.10**	$ 3,764,172,785.33	$ 2,739,704,907.92
	TOTAL COSTO NETO OBRA	$ 20,859,773,651.10	$ 3,764,172,785.33	$ 2,739,704,907.92
	DIFERENCIAS VALORES	-$		1,024,467,877.40

OBSERVACIONES

FIRMAS

FRANCISCO RIOS INSIGNARES
M.P. 08202085493 ATL
RESIDENTE DE OBRA

CURVA DE PROGRAMACION

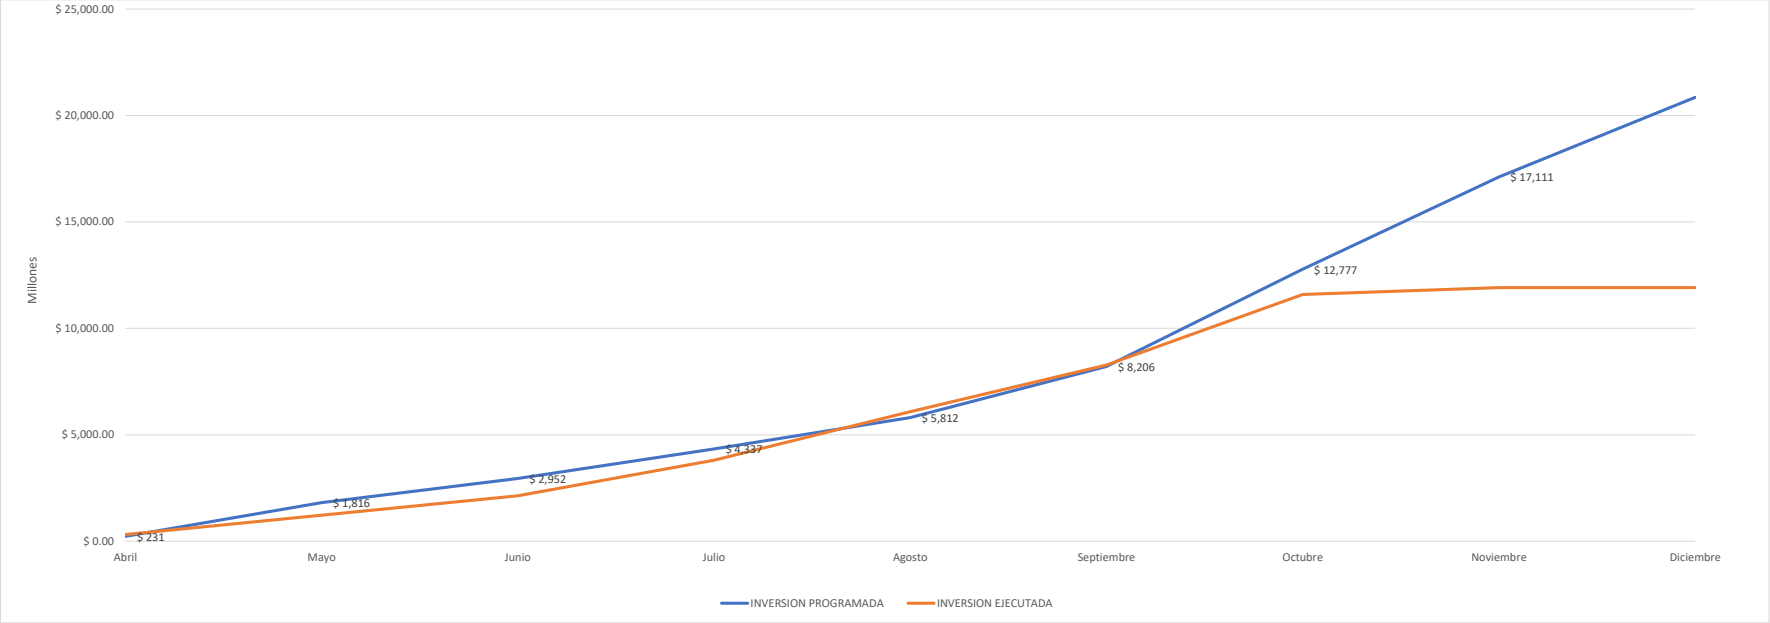

CURVA S PROGRAMADA ACUMULADA

SEMANAS		Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
FLUJO DE INVERSIÓN ACUMULADA PROGRAMADA $	0	$ 230,715,469	$ 1,816,443,369	$ 2,951,761,945	$ 4,337,420,464	$ 5,811,734,947	$ 8,205,721,067	$ 12,777,334,260	$ 17,110,529,869	$ 20,847,751,341
FLUJO DE INVERSIÓN ACUMULADA EJECUTADA $	0	$ 315,574,336	$ 1,220,200,460	$ 2,133,437,298	$ 3,809,616,706	$ 6,088,795,098	$ 8,276,044,178	$ 11,591,790,317	$ 11,914,767,493	$ 11,914,767,493

INVERSION SEMANAL

SEMANAS		SEMANA No.1	SEMANA No.2	SEMANA No.3	SEMANA No.4	SEMANA No.5	SEMANA No.6	SEMANA No.7	SEMANA No.8	SEMANA No.9
INVERSION PROGRAMADA SEMANAL $	0	$ 32,219,980.53	$ 42,404,766.30	$ 72,858,261.01	$ 83,232,461.66	$ 234,047,522.23	$ 313,841,294.51	$ 350,483,773.46	$ 429,335,700.02	$ 258,019,609.59
INVERSION EJECUTADA SEMANAL $	0	$ 51,746,440.95	$ 50,092,075.73	$ 110,026,926.76	$ 103,708,892.94	$ 175,609,256.71	$ 124,229,880.19	$ 139,479,091.55	$ 225,834,931.30	$ 239,472,964.24

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	% SOBRE VR. BASICO DEL CONTRATO	% EJECUTADO SOBRE ITEMS	% EJECUTADO SOBRE VALOR BASICO DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO	SEMANA No.23	SEMANA No.24	SEMANA No.25	SEMANA No.26	SEMANA No.27	SEMANA No.28	SEMANA No.29	SEMANA No.30	SEMANA No.31	SEMANA No.32	SEMANA No.33	SEMANA No.34	SEMANA No.35	SEMANA No.36	SEMANA No.37	SEMANA No.38	SEMANA No.39	SEMANA No.40
							Del 01-sep-25 Al 07-sep-25	Del 08-sep-25 Al 14-sep-25	Del 15-sep-25 Al 21-sep-25	Del 22-sep-25 Al 28-sep-25	Del 29-sep-25 Al 05-oct-25	Del 06-oct-25 Al 12-oct-25	Del 13-oct-25 Al 19-oct-25	Del 20-oct-25 Al 26-oct-25	Del 27-oct-25 Al 02-nov-25	Del 03-nov-25 Al 09-nov-25	Del 10-nov-25 Al 16-nov-25	Del 17-nov-25 Al 23-nov-25	Del 24-nov-25 Al 30-nov-25	Del 01-dic-25 Al 07-dic-25	Del 08-dic-25 Al 14-dic-25	Del 15-dic-25 Al 21-dic-25	Del 22-dic-25 Al 28-dic-25	Del 29-dic-25 Al 31-dic-25
1	**Capítulo - Demoliciones**	**$ 1,697,502,061.00**	**9.36%**	**17.31%**	**1.50%**																			
1.1		**$ 60,675,057.00**	**0.291%**	**4.488%**	**0.013%**																			
	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS	$ 60,675,057.00	0.291%			%P	0.007%	0.007%	0.007%	0.007%	0.007%	0.007%	0.007%	0.007%	0.007%	0.007%	0.007%	0.007%	0.007%	0.007%	0.007%	0.007%	0.002%	0.000%
						P	$ 1,527,331.12	$ 1,527,331.12	$ 1,527,331.12	$ 1,527,331.12	$ 1,527,331.12	$ 1,527,331.12	$ 1,527,331.12	$ 1,527,331.12	$ 1,527,331.12	$ 1,527,331.12	$ 1,527,331.12	$ 1,527,331.12	$ 1,527,331.12	$ 1,527,331.12	$ 1,527,331.12	$ 1,527,331.12	$ 448,950.00	$ 0.00
				4%	0.013%	E	$ 1,550,282.88	$ 1,550,282.88	$ 2,723,034.67	$ 2,723,034.67	$ 2,723,034.67	$ 2,723,034.67	$ 1,188,038.00	$ 1,188,038.00			$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
						%E	0.007%	0.007%	0.013%	0.013%	0.013%	0.013%	0.006%	0.006%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
1.2		**$ 98,407,998.00**	**0.472%**	**9.939%**	**0.047%**																			
	DEMOLICION DE SEPARADOR CENTRAL INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	$ 98,407,998.00	0.472%			%P	0.017%	0.017%	0.017%	0.017%	0.017%	0.017%	0.017%	0.017%	0.017%	0.017%	0.017%	0.017%	0.017%	0.017%	0.017%	0.000%	0.000%	0.000%
						P	$ 3,644,740.67	$ 3,644,740.67	$ 3,644,740.67	$ 3,644,740.67	$ 3,644,740.67	$ 3,644,740.67	$ 3,644,740.67	$ 3,644,740.67	$ 3,644,740.67	$ 3,644,740.67	$ 3,644,740.67	$ 3,644,740.67	$ 3,644,740.67	$ 3,644,740.67	$ 3,644,740.67		$ 0.00	$ 0.00
				10%	0.047%	E		$ 6,398,552.16					$ 3,271,038.50											
						%E	0.000%	0.031%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.016%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
1.3		**$ 826,540,609.00**	**3.962%**	**2.885%**	**0.114%**																			
	DEMOLICION DE ESPACIO PUBLICO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	$ 826,540,609.00	3.962%			%P	0.079%	0.079%	0.079%	0.079%	0.079%	0.079%	0.079%	0.079%	0.079%	0.079%	0.079%	0.079%	0.079%	0.079%	0.079%	0.079%	0.079%	0.000%
						P	$ 16,485,063.22	$ 16,485,063.22	$ 16,485,063.22	$ 16,485,063.22	$ 16,485,063.22	$ 16,485,063.22	$ 16,485,063.22	$ 16,485,063.22	$ 16,485,063.22	$ 16,485,063.22	$ 16,485,063.22	$ 16,485,063.22	$ 16,485,063.22	$ 16,485,063.22	$ 16,485,063.22	$ 16,485,063.22	$ 16,485,063.22	$ 0.00
				3%	0.114%	E		$ 22,553,437.71	$ 22,553,437.71	$ 22,553,437.71	$ 22,553,437.71	$ 22,553,437.71	$ 10,302,890.52											
						%E	0.000%	0.108%	0.108%	0.108%	0.108%	0.108%	0.049%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
1.4		**$ 449,484,973.00**	**2.155%**	**0.000%**	**0.000%**																			
	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL	$ 449,484,973.00	2.155%			%P	0.108%	0.108%	0.108%	0.072%	0.072%	0.072%	0.114%	0.114%	0.114%	0.114%	0.114%	0.114%	0.114%	0.114%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
						P	$ 22,502,556.06	$ 22,502,556.06	$ 22,502,556.06	$ 15,001,704.04	$ 15,001,704.04	$ 15,001,704.04	$ 23,845,854.04	$ 23,845,854.04	$ 23,845,854.04	$ 23,845,854.04	$ 23,845,854.04	$ 23,845,854.04	$ 23,845,854.04	$ 23,845,854.04				$ 0.00
						E	$ 31,946,080.56	$ 31,946,080.56	$ 32,193,242.97	$ 32,193,242.97	$ 32,193,242.97	$ 32,193,242.97	$ 35,710,517.20	$ 35,710,517.20	$ 35,710,517.20	$ 35,710,517.20								
						%E	0.153%	0.153%	0.154%	0.154%	0.154%	0.154%	0.171%	0.171%	0.171%	0.171%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
1.5		**$ 262,393,424.00**	**1.258%**	**0.000%**	**0.000%**																			
	DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	$ 262,393,424.00	1.258%			%P	0.033%	0.033%	0.033%	0.033%	0.033%	0.033%	0.033%	0.033%	0.033%	0.033%	0.033%	0.033%	0.033%	0.033%	0.033%	0.033%	0.033%	0.000%
						P	$ 6,904,962.28	$ 6,904,962.28	$ 6,904,962.28	$ 6,904,962.28	$ 6,904,962.28	$ 6,904,962.28	$ 6,904,962.28	$ 6,904,962.28	$ 6,904,962.28	$ 6,904,962.28	$ 6,904,962.28	$ 6,904,962.28	$ 6,904,962.28	$ 6,904,962.28	$ 6,904,962.28	$ 6,904,962.28	$ 6,904,962.28	$ 0.00
						E	$ 6,748,598.73	$ 6,748,598.73	$ 12,354,515.41	$ 12,354,515.41	$ 12,354,515.41	$ 12,354,515.41	$ 10,469,132.76											
						%E	0.032%	0.032%	0.059%	0.059%	0.059%	0.059%	0.050%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
2	**CAPITULO PAVIMENTO**	**$ 3,395,548,949.00**	**$ 0.16**	**$ 0.21**	**2.15%**																			
2.1		**$ 292,939,315.00**	**1.404%**	**0.000%**	**0.000%**																			
	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL	$ 292,939,315.00	1.404%			%P	0.041%	0.058%	0.058%	0.058%	0.058%	0.058%	0.058%	0.058%	0.058%	0.058%	0.058%	0.058%	0.058%	0.058%	0.058%	0.030%	0.000%	0.000%
						P	$ 8,464,193.25	$ 12,135,091.82	$ 12,135,091.82	$ 12,135,091.82	$ 12,135,091.82	$ 12,135,091.82	$ 12,135,091.82	$ 12,135,091.82	$ 12,135,091.82	$ 12,135,091.82	$ 12,135,091.82	$ 12,135,091.82	$ 12,135,091.82	$ 12,135,091.82	$ 12,135,091.82	$ 6,309,462.17	$ 0.00	$ 0.00
						E	$ 4,395,148.80	$ 4,395,148.80	$ 12,045,451.92	$ 12,045,451.92	$ 12,045,451.92	$ 10,053,296.12	$ 10,053,296.12	$ 10,053,296.12										
						%E	0.021%	0.021%	0.058%	0.058%	0.058%	0.048%	0.048%	0.048%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
2.2		**$ 224,249,310.00**	**1.075%**	**7.795%**	**1.330%**																			
	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	$ 224,249,310.00	1.075%			%P	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.077%	0.077%	0.077%	0.077%	0.077%	0.077%	0.077%	0.077%	0.077%	0.077%	0.000%	0.000%
						P	$ 1,847,913.55	$ 1,847,913.55	$ 1,847,913.55	$ 1,847,913.55	$ 1,847,913.55	$ 1,847,913.55	$ 16,127,739.25	$ 16,127,739.25	$ 16,127,739.25	$ 16,127,739.25	$ 16,127,739.25	$ 16,127,739.25	$ 16,127,739.25	$ 16,127,739.25	$ 16,127,739.25	$ 16,127,739.25	$ 0.00	$ 0.00
				8%	0.084%	E	$ 2,032,196.40	$ 2,032,196.40	$ 2,326,154.76	$ 2,326,154.76	$ 2,326,154.76	$ 2,326,154.76	$ 17,480,228.81	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
						%E	0.010%	0.010%	0.011%	0.011%	0.011%	0.011%	0.084%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
2.3		**$ 2,016,665,103.00**	**9.668%**	**4.372%**	**0.824%**																			
	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS , ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	$ 2,016,665,103.00	9.668%			%P	0.097%	0.097%	0.097%	0.097%	0.097%	0.477%	0.444%	0.444%	0.444%	0.708%	0.708%	0.708%	0.708%	0.580%	0.580%	0.580%	0.000%	0.000%
						P	$ 20,292,689.28	$ 20,292,689.28	$ 20,292,689.28	$ 20,292,689.28	$ 20,292,689.28	$ 99,599,677.87	$ 92,674,333.91	$ 92,674,333.91	$ 92,674,333.91	$ 147,734,824.95	$ 147,734,824.95	$ 147,734,824.95	$ 147,734,824.95	$ 120,929,267.32	$ 120,929,267.32	$ 120,929,267.32		$ 0.00
				4%	0.423%	E	$ 58,260,941.76	$ 58,260,941.76	$ 25,527,152.28	$ 25,527,152.28	$ 25,527,152.28	$ 88,174,753.89	$ 88,174,753.89	$ 88,174,753.89										
						%E	0.279%	0.279%	0.122%	0.122%	0.122%	0.423%	0.423%	0.423%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
2.4		**$ 0.00**	**0.000%**	**0.000%**	**0.000%**																			
	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 39 A LA FLEXION ,ESPESOR= 0.2 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D =1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" -LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL	$ 0.00	0.000%			%P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
						P																$ 0.00		$ 0.00
						E																		
						%E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
2.5		**$ 588,639,151.00**	**2.822%**	**5.207%**	**0.147%**																			
	CONCRETO DE 1500 PSI PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO, E = 0.15 METROS	$ 588,639,151.00	2.822%			%P	0.112%	0.112%	0.112%	0.112%	0.112%	0.112%	0.112%	0.112%	0.112%	0.112%	0.112%	0.112%	0.112%	0.112%	0.136%	0.136%	0.000%	0.000%
						P	$ 23,438,041.90	$ 23,438,041.90	$ 23,438,041.90	$ 23,438,041.90	$ 23,438,041.90	$ 23,438,041.90	$ 23,438,041.90	$ 23,438,041.90	$ 23,438,041.90	$ 23,438,041.90	$ 23,438,041.90	$ 23,438,041.90	$ 23,438,041.90	$ 23,438,041.90	$ 28,438,041.90	$ 28,438,041.90		$ 0.00
				5%	0.147%	E	$ 26,270,703.78	$ 26,270,703.78	$ 23,736,796.88	$ 23,736,796.88	$ 23,736,796.88	$ 30,647,900.05	$ 30,647,900.05	$ 30,647,900.05										
						%E	0.126%	0.126%	0.114%	0.114%	0.114%	0.147%	0.147%	0.147%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
2.6		**$ 273,056,070.00**	**1.309%**	**4.098%**	**0.054%**																			
	BORDILLO DE 0.15 X 0.20 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ANCLAJE CON SIKADUR (VER DISEÑO)	$ 273,056,070.00	1.309%			%P	0.026%	0.026%	0.026%	0.026%	0.026%	0.026%	0.026%	0.055%	0.055%	0.055%	0.055%	0.055%	0.055%	0.055%	0.055%	0.055%	0.055%	0.000%
						P	$ 5,368,523.08	$ 5,368,523.08	$ 5,368,523.08	$ 5,368,523.08	$ 5,368,523.08	$ 5,368,523.08	$ 5,368,523.08	$ 11,490,873.63	$ 11,490,873.63	$ 11,490,873.63	$ 11,490,873.63	$ 11,490,873.63	$ 11,490,873.63	$ 11,490,873.63	$ 11,490,873.63	$ 11,490,873.63	$ 11,490,873.63	$ 0.00
				4%	0.054%	E	$ 6,411,170.50	$ 6,411,170.50	$ 11,189,651.73	$ 11,189,651.73	$ 11,189,651.73	$ 11,189,651.73	$ 6,962,597.60	$ 6,962,597.60	$ 6,962,597.60									
						%E	0.031%	0.031%	0.054%	0.054%	0.054%	0.054%	0.033%	0.033%	0.033%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
2.7		**$ 0.00**	**0.000%**	**0.000%**	**0.000%**																			
	SELLO DE FISURAS ESTRUCTURALES, Y REFORZAMIENTO ANCLADO (INCLUYE, SIKADUR®-35 HI-MOD LV, SIKADUR® ANCHORFIX-4, ACERO DE REFUERZO DE 5/8¨ L=0,50 MTS @0,20	$ 0.00	0.000%			%P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
						P													$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
						E															$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
						%E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
2.8		**$ 0.00**	**0.000%**	**0.000%**	**0.000%**																			
	SELLO DE FISURAS ESTRUCTURALES, Y REFORZAMIENTO ANCLADO (INCLUYE, SIKADUR®-35 HI-MOD LV, SIKADUR®)	$ 0.00	0.000%			%P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
						P											$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
						E	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
						%E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
3	**CAPITULO- URBANISMO**	**$ 3,978,265,476.00**	**19.07%**	**10.96%**	**0.67%**																			
3.1		**$ 1,578,406,369.00**	**7.567%**	**4.092%**	**0.310%**																			
	Loseta Plana de 400x400x60 Mm De Espesor Color Gris oscuro, Usada En Pavimento De La Franja De Circulacion Peatonal Y Esquinas Con Carreras Transversales, Colocada Sobre Capa De Mortero E= 3 Cms, Capa De Concreto de 3000 psi E= 10 Cms Y Capa De Subbase Granular E= 15cms	$ 1,578,406,369.00	7.567%			%P	0.061%	0.061%	0.431%	0.431%	0.431%	0.431%	0.404%	0.404%	0.404%	0.404%	0.404%	0.404%	0.404%	0.404%	0.404%	0.404%	0.404%	0.000%
						P	$ 12,657,890.00	$ 12,657,890.00	$ 89,944,344.48	$ 89,944,344.48	$ 89,944,344.48	$ 89,944,344.48	$ 84,201,508.13	$ 84,201,508.13	$ 84,201,508.13	$ 84,201,508.13	$ 84,201,508.13	$ 84,201,508.13	$ 84,201,508.13	$ 84,201,508.13	$ 84,201,508.13	$ 84,201,508.13	$ 84,201,508.13	$ 0.00
				4%	0.310%	E	$ 40,674,040.54	$ 40,674,040.54	$ 20,033,166.80	$ 20,033,166.80	$ 20,033,166.80	$ 20,033,166.80	$ 64,592,552.00	$ 64,592,552.00										
						%E	0.195%	0.195%	0.096%	0.096%	0.096%	0.096%	0.310%	0.310%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
3.2		**$ 1,578,406,369.00**	**7.567%**	**4.092%**	**0.310%**																			
	Loseta Plana 400x400x60 Mm De Espesor Color Gris claro, Usada En Pavimento De La Franja De Circulacion Peatonal Y Esquinas Con Carreras Transversales, Colocada Sobre Capa De Mortero E= 3 Cms, Capa De Concreto de 3000 psi E= 10 Cms Y Capa De Subbase Granular E= 15cms	$ 1,578,406,369.00	7.567%			%P	0.061%	0.061%	0.431%	0.431%	0.431%	0.431%	0.404%	0.404%	0.404%	0.404%	0.404%	0.404%	0.404%	0.404%	0.404%	0.404%	0.404%	0.000%
						P	$ 12,657,890.00	$ 12,657,890.00	$ 89,944,344.48	$ 89,944,344.48	$ 89,944,344.48	$ 89,944,344.48	$ 84,201,508.13	$ 84,201,508.13	$ 84,201,508.13	$ 84,201,508.13	$ 84,201,508.13	$ 84,201,508.13	$ 84,201,508.13	$ 84,201,508.13	$ 84,201,508.13	$ 84,201,508.13	$ 84,201,508.13	$ 0.00
				4%	0.310%	E	$ 40,674,040.54	$ 40,674,040.54	$ 20,033,166.80	$ 20,033,166.80	$ 20,033,166.80	$ 20,033,166.80	$ 64,592,552.00	$ 64,592,552.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
						%E	0.195%	0.195%	0.096%	0.096%	0.096%	0.096%	0.310%	0.310%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
3.3		**$ 419,180,410.00**	**2.010%**	**1.370%**	**0.028%**																			
	Loseta Alerta 200x200x60 Mm De Espesor Color amarillo, Usada En La Franja De Alineacion Para Invidentes, y Loseta GUIA Colocada Sobre Capa De Mortero E= 3 Cms, Capa De Concreto de 3000 psi E= 10 Cms Y Capa De Subbase Granular E= 15cms	$ 419,180,410.00	2.010%			%P	0.026%	0.026%	0.102%	0.102%	0.102%	0.102%	0.102%	0.102%	0.102%	0.102%	0.102%	0.102%	0.102%	0.102%	0.102%	0.102%	0.102%	0.000%
						P	$ 5,360,390.93	$ 5,360,390.93	$ 21,270,250.95	$ 21,270,250.95	$ 21,270,250.95	$ 21,270,250.95	$ 21,270,250.95	$ 21,270,250.95	$ 21,270,250.95	$ 21,270,250.95	$ 21,270,250.95	$ 21,270,250.95	$ 21,270,250.95	$ 21,270,250.95	$ 21,270,250.95	$ 21,270,250.95	$ 21,270,250.95	$ 0.00
				1%	0.028%	E	$ 0.00	$ 2,683,311.15	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
						%E	0.000%	0.013%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
3.4		**$ 315,927,696.00**	**1.515%**	**1.410%**	**0.021%**																			
	Viga de Confinamiento para Losetas de Espacio Publico en Concreto de 3000 Psi de 0.1 x 0.3 mt incluye 2 varillas de 1/2" estribos de 1/4" cada 0.3 mt	$ 315,927,696.00	1.515%			%P	0.021%	0.021%	0.021%	0.081%	0.081%	0.081%	0.081%	0.081%	0.081%	0.081%	0.081%	0.081%	0.081%	0.081%	0.081%	0.081%	0.081%	0.000%
						P	$ 4,329,973.50	$ 4,329,973.50	$ 4,329,973.50	$ 16,999,155.21	$ 16,999,155.21	$ 16,999,155.21	$ 16,999,155.21	$ 16,999,155.21	$ 16,999,155.21	$ 16,999,155.21	$ 16,999,155.21	$ 16,999,155.21	$ 16,999,155.21	$ 16,999,155.21	$ 16,999,155.21	$ 16,999,155.21	$ 16,999,155.21	$ 0.00
				1%	0.021%	E		$ 3,142,689.48																
						%E	0.000%	0.015%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
3.5		**$ 86,344,632.00**	**0.414%**	**0.000%**	**0.000%**																			
	Rampa en Concreto de 3000 PSI E=0.12 mts, incluye malla electrosoldada XY-221	$ 86,344,632.00	0.414%			%P	0.014%	0.014%	0.014%	0.014%	0.014%	0.014%	0.014%	0.014%	0.014%	0.014%	0.014%	0.014%	0.014%	0.014%	0.014%	0.010%	0.000%	0.000%
						P	$ 2,863,006.22	$ 2,863,006.22	$ 2,863,006.22	$ 2,863,006.22	$ 2,863,006.22	$ 2,863,006.22	$ 2,863,006.22	$ 2,863,006.22	$ 2,863,006.22	$ 2,863,006.22	$ 2,863,006.22	$ 2,863,006.22	$ 2,863,006.22	$ 2,863,006.22	$ 2,863,006.22	$ 2,090,448.99	$ 0.00	$ 0.00
						E	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
						%E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
4	**ALCANTARILLADO**	**$ 2,243,988,719.00**	**3.94%**	**42.89%**	**0.23%**																			
4.1.1		**$ 459,576,351.00**	**2.203%**	**3.602%**	**0.079%**																			
	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL	$ 459,576,351.00	2.203%			%P	0.045%	0.045%	0.045%	0.045%	0.045%	0.045%	0.045%	0.045%	0.129%	0.129%	0.129%	0.129%	0.129%	0.129%	0.129%	0.129%	0.000%	0.000%
						P	$ 9,315,736.85	$ 9,315,736.85	$ 9,315,736.85	$ 9,315,736.85	$ 9,315,736.85	$ 9,315,736.85	$ 9,315,736.85	$ 9,315,736.85	$ 26,966,189.06	$ 26,966,189.06	$ 26,966,189.06	$ 26,966,189.06	$ 26,966,189.06	$ 26,966,189.06	$ 26,966,189.06	$ 26,966,189.06	$ 0.00	$ 0.00
				4%	0.079%	E	$ 10,418,620.80	$ 10,418,620.80	$ 16,552,997.50	$ 16,552,997.50	$ 16,552,997.50	$ 16,552,997.50	$ 10,458,336.00	$ 10,458,336.00	$ 10,458,336.00	$ 10,458,336.00								
						%E	0.050%	0.050%	0.079%	0.079%	0.079%	0.079%	0.050%	0.050%	0.050%	0.050%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
4.1.2		**$ 266,762,936.00**	**1.279%**	**9.472%**	**0.121%**																			
	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO COMPACTADO	$ 266,762,936.00	1.279%			%P	0.035%	0.035%	0.035%	0.035%	0.035%	0.035%	0.086%	0.086%	0.086%	0.086%	0.086%	0.086%	0.086%	0.086%	0.086%	0.086%	0.000%	0.000%
						P	$ 7,247,692.26	$ 7,247,692.26	$ 7,247,692.26	$ 7,247,692.26	$ 7,247,692.26	$ 7,247,692.26	$ 17,910,037.28	$ 17,910,037.28	$ 17,910,037.28	$ 17,910,037.28	$ 17,910,037.28	$ 17,910,037.28	$ 17,910,037.28	$ 17,910,037.28	$ 17,910,037.28	$ 17,910,037.28		$ 0.00
				9%	0.121%	E	$ 8,042,758.08	$ 8,042,758.08	$ 7,538,483.30	$ 7,538,483.30	$ 7,538,483.30	$ 7,538,483.30	$ 21,531,058.69	$ 21,531,058.69	$ 21,531,058.69									
						%E	0.039%	0.039%	0.036%	0.036%	0.036%	0.036%	0.103%	0.103%	0.103%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
4.1.3		**$ 68,432,122.00**	**0.328%**	**13.491%**	**0.044%**																			
	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	$ 68,432,122.00	0.328%			%P	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.003%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
						P	$ 1,959,647.13	$ 1,959,647.13	$ 1,959,647.13	$ 1,959,647.13	$ 1,959,647.13	$ 1,959,647.13	$ 1,959,647.13	$ 1,959,647.13	$ 1,959,647.13	$ 1,959,647.13	$ 1,959,647.13	$ 1,959,647.13	$ 1,959,647.13	$ 684,321.22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
				13%	0.044%	E		$ 9,231,947.41	$ 9,231,947.41	$ 9,231,947.41	$ 9,231,947.41	$ 9,231,947.41	$ 8,319,054.34	$ 8,319,054.34	$ 8,319,054.34	$ 8,319,054.34								
						%E	0.000%	0.044%	0.044%	0.044%	0.044%	0.044%	0.040%	0.040%	0.040%	0.040%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
4.1.4		**$ 116,732,744.00**	**0.560%**	**0.752%**	**0.004%**																			
	EXCAVACION MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL	$ 116,732,744.00	0.560%			%P	0.016%	0.016%	0.016%	0.016%	0.016%	0.016%	0.016%	0.016%	0.016%	0.016%	0.016%	0.016%	0.016%	0.006%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
						P	$ 3,342,801.31	$ 3,342,801.31	$ 3,342,801.31	$ 3,342,801.31	$ 3,342,801.31	$ 3,342,801.31	$ 3,342,801.31	$ 3,342,801.31	$ 3,342,801.31	$ 3,342,801.31	$ 3,342,801.31	$ 3,342,801.31	$ 3,342,801.31	$ 1,167,327.44	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
				1%	0.004%	E																		
						%E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
4.1.5		**$ 50,314,570.00**	**0.241%**	**0.000%**	**0.000%**																			
	DESMONTE DE TUBERÍA DE ASBESTO CEMENTO DE 6" Y 8"	$ 50,314,570.00	0.241%			%P	0.008%	0.008%	0.008%	0.008%	0.008%	0.008%	0.008%	0.008%	0.008%	0.008%	0.008%	0.008%	0.008%	0.008%	0.008%	0.008%	0.000%	0.000%
						P	$ 1,623,050.65	$ 1,623,050.65	$ 1,623,050.65	$ 1,623,050.65	$ 1,623,050.65	$ 1,623,050.65	$ 1,623,050.65	$ 1,623,050.65	$ 1,623,050.65	$ 1,623,050.65	$ 1,623,050.65	$ 1,623,050.65	$ 1,623,050.65	$ 1,623,050.65	$ 1,623,050.65	$ 1,623,050.65	$ 0.00	$ 0.00
						E		$ 1,195,052.40																
						%E	0.000%	0.006%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	% SOBRE VR. BASICO DEL CONTRATO	% EJECUTADO SOBRE ITEMS	% EJECUTADO SOBRE VALOR BASICO DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO	SEMANA No.23	SEMANA No.24	SEMANA No.25	SEMANA No.26	SEMANA No.27	SEMANA No.28	SEMANA No.29	SEMANA No.30	SEMANA No.31	SEMANA No.32	SEMANA No.33	SEMANA No.34	SEMANA No.35	SEMANA No.36	SEMANA No.37	SEMANA No.38	SEMANA No.39	SEMANA No.40
							Del 01-sep-25 Al 07-sep-25	Del 08-sep-25 Al 14-sep-25	Del 15-sep-25 Al 21-sep-25	Del 22-sep-25 Al 28-sep-25	Del 29-sep-25 Al 05-oct-25	Del 06-oct-25 Al 12-oct-25	Del 13-oct-25 Al 19-oct-25	Del 20-oct-25 Al 26-oct-25	Del 27-oct-25 Al 02-nov-25	Del 03-nov-25 Al 09-nov-25	Del 10-nov-25 Al 16-nov-25	Del 17-nov-25 Al 23-nov-25	Del 24-nov-25 Al 30-nov-25	Del 01-dic-25 Al 07-dic-25	Del 08-dic-25 Al 14-dic-25	Del 15-dic-25 Al 21-dic-25	Del 22-dic-25 Al 28-dic-25	Del 29-dic-25 Al 31-dic-25
4.1.6		**$ 209,904,285.00**	**1.006%**	**4.239%**	**0.043%**																			
	INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO PVC NOVAFORT 8"	$ 209,904,285.00	1.006%			%P	0.029%	0.029%	0.029%	0.029%	0.029%	0.029%	0.029%	0.029%	0.053%	0.053%	0.053%	0.053%	0.053%	0.053%	0.053%	0.000%	0.000%	0.000%
						P	$ 6,032,686.29	$ 6,032,686.29	$ 6,032,686.29	$ 6,032,686.29	$ 6,032,686.29	$ 6,032,686.29	$ 6,032,686.29	$ 6,032,686.29	$ 10,991,951.44	$ 10,991,951.44	$ 10,991,951.44	$ 10,991,951.44	$ 10,991,951.44	$ 10,991,951.44	$ 10,991,951.44	$ 10,991,951.44	$ 0.00	$ 0.00
				4%	0.043%	E	$ 7,101,444.84	$ 7,101,444.84	$ 8,897,171.93	$ 8,897,171.93	$ 8,897,171.93	$ 8,897,171.93	$ 6,408,461.90	$ 6,408,461.90	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00					
						%E	0.034%	0.034%	0.043%	0.043%	0.043%	0.043%	0.031%	0.031%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
4.1.7		**$ 2,516,760.00**	**0.012%**	**0.000%**	**0.000%**																			
	INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO PVC NOVAFORT 10"	$ 2,516,760.00	0.012%			%P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
						P	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
						E	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00					
						%E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
4.1.8		**$ 341,905,836.00**	**1.639%**	**5.882%**	**0.096%**																			
	CONSTRUCCION DE POZO DE INSPECCION 1.45M< H <=1.80M EN LADRILLO TOLETE, PAÑETADO E IMPERMEABILIZADO EN AMBAS CARAS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL OPERADOR	$ 341,905,836.00	1.639%			%P	0.024%	0.024%	0.024%	0.024%	0.069%	0.069%	0.069%	0.069%	0.069%	0.069%	0.069%	0.069%	0.069%	0.069%	0.069%	0.069%	0.069%	0.069%
						P	$ 5,028,027.00	$ 5,028,027.00	$ 5,028,027.00	$ 14,302,706.86	$ 14,302,706.86	$ 14,302,706.86	$ 14,302,706.86	$ 14,302,706.86	$ 14,302,706.86	$ 14,302,706.86	$ 14,302,706.86	$ 14,302,706.86	$ 14,302,706.86	$ 14,302,706.86	$ 14,302,706.86	$ 14,302,706.86	$ 14,302,706.86	$ 0.00
				5.882%	0.096%	E	$ 20,112,108.00	$ 20,112,108.00	$ 15,084,081.00	$ 15,084,081.00	$ 15,084,081.00	$ 15,084,081.00	$ 13,408,072.00	$ 13,408,072.00	$ 13,408,072.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00					
						%E	0.096%	0.096%	0.072%	0.072%	0.072%	0.072%	0.064%	0.064%	0.064%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
4.1.9		**$ 84,015,888.00**	**0.403%**	**4.205%**	**0.017%**																			
	CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO PVC NOVAFORT 6" LONGITUD HASTA 6 M. INCLUYE EXCAVACIÓN	$ 84,015,888.00	0.403%			%P	0.011%	0.011%	0.011%	0.011%	0.011%	0.011%	0.011%	0.011%	0.011%	0.011%	0.011%	0.011%	0.011%	0.011%	0.011%	0.011%	0.010%	0.000%
						P	$ 2,301,304.76	$ 2,301,304.76	$ 2,301,304.76	$ 2,301,304.76	$ 2,301,304.76	$ 2,301,304.76	$ 2,301,304.76	$ 2,301,304.76	$ 2,301,304.76	$ 2,301,304.76	$ 2,301,304.76	$ 2,301,304.76	$ 2,301,304.76	$ 2,301,304.76	$ 2,301,304.76	$ 2,301,304.76	$ 2,155,190.17	$ 0.00
				4.20%	0.017%	E	$ 0.00	$ 3,532,486.20	$ 3,532,486.20	$ 3,532,486.20	$ 3,532,486.20	$ 3,532,486.20	$ 3,341,541.00	$ 3,341,541.00	$ 3,341,541.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00					
						%E	0.000%	0.017%	0.017%	0.017%	0.017%	0.017%	0.016%	0.016%	0.016%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
4.1.10		**$ 0.00**	**0.000%**	**0.000%**	**0.000%**																			
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS TEE 8" X 6" Y SELLOS	$ 0.00	0.000%			%P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
						P																		$ 0.00
						E																		
						%E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
4.1.11		**$ 203,817,219.00**	**0.977%**	**2.460%**	**0.024%**																			
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRITURADO 3/4" PARA SOPORTE DE TUBERIA ALCANTARILLADO	$ 203,817,219.00	0.977%			%P	0.007%	0.007%	0.007%	0.007%	0.054%	0.054%	0.054%	0.054%	0.054%	0.054%	0.054%	0.054%	0.054%	0.054%	0.054%	0.054%	0.000%	0.000%
						P	$ 1,506,524.99	$ 1,506,524.99	$ 1,506,524.99	$ 11,206,783.31	$ 11,206,783.31	$ 11,206,783.31	$ 11,206,783.31	$ 11,206,783.31	$ 11,206,783.31	$ 11,206,783.31	$ 11,206,783.31	$ 11,206,783.31	$ 11,206,783.31	$ 11,206,783.31	$ 11,206,783.31	$ 11,206,783.31		$ 0.00
				2%	0.024%	E	$ 0.00	$ 5,013,684.57	$ 5,013,684.57	$ 5,013,684.57	$ 5,013,684.57	$ 5,013,684.57	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00					
						%E	0.000%	0.024%	0.024%	0.024%	0.024%	0.024%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
4.1.12		**$ 155,360,304.00**	**0.745%**	**5.682%**	**0.042%**																			
	CONSTRUCCION DE REGISTROS DOMICILIARIOS DE 60 X 60X 1M PAÑETADO E IMPERMEABILIZADO EN AMBAS CARAS INCLUYE TAPA EN CONCRETO	$ 155,360,304.00	0.745%			%P	0.008%	0.008%	0.008%	0.008%	0.035%	0.035%	0.035%	0.035%	0.035%	0.035%	0.035%	0.035%	0.035%	0.035%	0.035%	0.035%	0.035%	0.000%
						P	$ 1,765,458.00	$ 1,765,458.00	$ 1,765,458.00	$ 7,259,870.36	$ 7,259,870.36	$ 7,259,870.36	$ 7,259,870.36	$ 7,259,870.36	$ 7,259,870.36	$ 7,259,870.36	$ 7,259,870.36	$ 7,259,870.36	$ 7,259,870.36	$ 7,259,870.36	$ 7,259,870.36	$ 7,259,870.36	$ 7,259,870.36	$ 0.00
				6%	0.042%	E	$ 5,296,374.00	$ 5,296,374.00	$ 8,165,243.25	$ 8,165,243.25	$ 8,165,243.25	$ 8,165,243.25	$ 8,827,290.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00					
						%E	0.025%	0.025%	0.039%	0.039%	0.039%	0.039%	0.042%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
4.1.13		**$ 51,665,504.00**	**0.248%**	**3.409%**	**0.008%**																			
	REPARACION DE FUGAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO	$ 51,665,504.00	0.248%			%P	0.007%	0.007%	0.007%	0.007%	0.007%	0.007%	0.007%	0.007%	0.007%	0.007%	0.007%	0.007%	0.007%	0.006%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
						P	$ 1,549,965.12	$ 1,549,965.12	$ 1,549,965.12	$ 1,549,965.12	$ 1,549,965.12	$ 1,549,965.12	$ 1,549,965.12	$ 1,549,965.12	$ 1,549,965.12	$ 1,549,965.12	$ 1,549,965.12	$ 1,549,965.12	$ 1,549,965.12	$ 1,180,925.81	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
				3%	0.008%	E	$ 0.00	$ 1,687,935.50	$ 1,687,935.50	$ 1,687,935.50	$ 1,687,935.50	$ 1,761,324.00	$ 1,761,324.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00					
						%E	0.000%	0.008%	0.008%	0.008%	0.008%	0.008%	0.008%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
4.1.14		**$ 136,586,840.00**	**0.655%**	**3.676%**	**0.024%**																			
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS DE ALCANTARILLADO HD	$ 136,586,840.00	0.655%			%P	0.019%	0.019%	0.019%	0.019%	0.019%	0.019%	0.019%	0.019%	0.019%	0.019%	0.019%	0.019%	0.019%	0.019%	0.019%	0.019%	0.013%	0.000%
						P	$ 4,058,948.55	$ 4,058,948.55	$ 4,058,948.55	$ 4,058,948.55	$ 4,058,948.55	$ 4,058,948.55	$ 4,058,948.55	$ 4,058,948.55	$ 4,058,948.55	$ 4,058,948.55	$ 4,058,948.55	$ 4,058,948.55	$ 4,058,948.55	$ 4,058,948.55	$ 4,058,948.55	$ 4,058,948.55	$ 2,641,537.94	$ 0.00
				4%	0.024%	E	$ 2,008,630.00	$ 2,008,630.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 5,021,575.00	$ 5,021,575.00	$ 5,021,575.00	$ 5,021,575.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00					
						%E	0.010%	0.010%	0.000%	0.000%	0.024%	0.024%	0.024%	0.024%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
4.1.15		**$ 10,344,800.00**	**0.050%**	**25.907%**	**0.013%**																			
	MANEJO DE AGUA EN EXCAVACIONES	$ 10,344,800.00	0.050%			%P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
						P	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
				26%	0.013%	E	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,680,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00					
						%E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.013%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
4.1.16		**$ 86,052,560.00**	**0.413%**	**3.909%**	**0.016%**																			
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE 4"Y 6" PARA DESAGUES	$ 86,052,560.00	0.413%			%P	0.013%	0.013%	0.013%	0.013%	0.013%	0.013%	0.013%	0.013%	0.013%	0.013%	0.013%	0.013%	0.013%	0.013%	0.004%	0.000%	0.000%	0.000%
						P	$ 2,710,655.64	$ 2,710,655.64	$ 2,710,655.64	$ 2,710,655.64	$ 2,710,655.64	$ 2,710,655.64	$ 2,710,655.64	$ 2,710,655.64	$ 2,710,655.64	$ 2,710,655.64	$ 2,710,655.64	$ 2,710,655.64	$ 2,710,655.64	$ 2,710,655.64	$ 2,710,655.64	$ 860,525.60	$ 0.00	$ 0.00
				4%	0.016%	E	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00		$ 3,363,872.80	$ 3,363,872.80	$ 3,363,872.80	$ 3,363,872.80	$ 3,363,872.80	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
						%E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.016%	0.016%	0.016%	0.016%	0.016%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
	ACUEDUCTO	**$ 351,797,032.00**	**1.69%**	**32.59%**	**0.11%**																			
4.2.1		**$ 122,795,400.00**	**0.589%**	**5.916%**	**0.035%**																			
	RELLENO EN ARENA COMPACTADO	$ 122,795,400.00	0.589%			%P	0.019%	0.019%	0.019%	0.019%	0.019%	0.019%	0.019%	0.019%	0.019%	0.019%	0.019%	0.019%	0.014%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
						P	$ 3,868,055.10	$ 3,868,055.10	$ 3,868,055.10	$ 3,868,055.10	$ 3,868,055.10	$ 3,868,055.10	$ 3,868,055.10	$ 3,868,055.10	$ 3,868,055.10	$ 3,868,055.10	$ 3,868,055.10	$ 2,885,691.90	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
				6%	0.035%	E	$ 3,016,178.88	$ 3,016,178.88	$ 7,265,112.55	$ 7,265,112.55	$ 7,265,112.55	$ 3,927,106.68	$ 3,927,106.68											
						%E	0.014%	0.014%	0.035%	0.035%	0.035%	0.019%	0.019%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
4.2.2		**$ 34,911,100.00**	**0.167%**	**4.286%**	**0.007%**																			
	EXCAVACION MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL	$ 34,911,100.00	0.167%			%P	0.005%	0.005%	0.005%	0.005%	0.005%	0.005%	0.005%	0.005%	0.005%	0.005%	0.005%	0.005%	0.004%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
						P	$ 1,099,699.65	$ 1,099,699.65	$ 1,099,699.65	$ 1,099,699.65	$ 1,099,699.65	$ 1,099,699.65	$ 1,099,699.65	$ 1,099,699.65	$ 1,099,699.65	$ 1,099,699.65	$ 1,099,699.65	$ 820,410.85	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
				4%	0.007%	E		$ 1,406,190.00																
						%E	0.000%	0.007%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
4.2.3		**$ 16,134,800.00**	**0.077%**	**6.364%**	**0.005%**																			
	INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA PEAD 20 MM PARA ACUEDCUTO	$ 16,134,800.00	0.077%			%P	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.001%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
						P	$ 484,044.00	$ 484,044.00	$ 484,044.00	$ 484,044.00	$ 484,044.00	$ 484,044.00	$ 484,044.00	$ 484,044.00	$ 484,044.00	$ 484,044.00	$ 484,044.00	$ 484,044.00	$ 484,044.00	$ 161,348.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
				6%	0.005%	E		$ 623,390.00	$ 623,390.00	$ 623,390.00	$ 623,390.00	$ 623,390.00	$ 687,562.50	$ 687,562.50	$ 687,562.50	$ 687,562.50									
						%E	0.000%	0.003%	0.003%	0.003%	0.003%	0.003%	0.003%	0.003%	0.003%	0.003%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
4.2.4		**$ 167,658,500.00**	**0.804%**	**6.652%**	**0.053%**																			
	INSTALACION DE TUBERIA PEAD PN 100 160 MM (6") (INCLUYE ACCESORIOS)	$ 167,658,500.00	0.804%			%P	0.019%	0.019%	0.019%	0.019%	0.019%	0.019%	0.042%	0.042%	0.042%	0.042%	0.042%	0.042%	0.042%	0.042%	0.042%	0.000%	0.000%	0.000%
						P	$ 4,061,590.00	$ 4,061,590.00	$ 4,061,590.00	$ 4,061,590.00	$ 4,061,590.00	$ 4,061,590.00	$ 8,784,128.89	$ 8,784,128.89	$ 8,784,128.89	$ 8,784,128.89	$ 8,784,128.89	$ 8,784,128.89	$ 8,784,128.89	$ 8,784,128.89	$ 8,784,128.89	$ 8,784,128.89	$ 0.00	$ 0.00
				7%	0.053%	E	$ 5,834,515.80	$ 5,834,515.80	$ 11,152,935.00	$ 9,024,400.92	$ 9,024,400.92	$ 9,024,400.92	$ 9,024,400.92	$ 9,024,400.92	$ 9,024,400.92	$ 9,024,400.92								
						%E	0.028%	0.028%	0.053%	0.043%	0.043%	0.043%	0.043%	0.043%	0.043%	0.043%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
4.2.5		**$ 10,297,232.00**	**0.049%**	**9.375%**	**0.005%**																			
	REPARACION DE DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO	$ 10,297,232.00	0.049%			%P	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
						P	$ 301,732.84	$ 301,732.84	$ 301,732.84	$ 301,732.84	$ 301,732.84	$ 301,732.84	$ 301,732.84	$ 301,732.84	$ 301,732.84	$ 301,732.84	$ 301,732.84	$ 301,732.84	$ 301,732.84	$ 210,734.05	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
				9%	0.005%	E	$ 0.00	$ 631,875.60	$ 631,875.60	$ 631,875.60	$ 631,875.60	$ 631,875.60	$ 965,365.50	$ 965,365.50	$ 965,365.50	$ 965,365.50	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
						%E	0.000%	0.003%	0.003%	0.003%	0.003%	0.003%	0.005%	0.005%	0.005%	0.005%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
5	**CAPITULO- SUBTERRANIZACION DE REDES DE TELECOMUNICACIONES**	**$ 3,464,716,338.00**	**16.61%**	**29.51%**	**0.89%**																			
5.1		**$ 76,487,664.00**	**0.367%**	**3.030%**	**0.011%**																			
	REGISTROS DOMICILARIOS 0.6 X 0.6 M, MUROS EN LADRILLO TOLETE PAÑETADOS POR DENTRO Y POR FUERA, CON FONDO E = 0.10 M Y TAPA DE CONCRETO REFORZADO E = 0.07 M CON MARCO EN ANGULOS DE ACERO GALVANIZADO	$ 76,487,664.00	0.367%			%P	0.012%	0.012%	0.012%	0.012%	0.012%	0.012%	0.012%	0.012%	0.012%	0.012%	0.012%	0.012%	0.012%	0.012%	0.012%	0.010%	0.000%	0.000%
						P	$ 2,409,361.42	$ 2,409,361.42	$ 2,409,361.42	$ 2,409,361.42	$ 2,409,361.42	$ 2,409,361.42	$ 2,409,361.42	$ 2,409,361.42	$ 2,409,361.42	$ 2,409,361.42	$ 2,409,361.42	$ 2,409,361.42	$ 2,409,361.42	$ 2,409,361.42	$ 2,409,361.42	$ 2,141,654.59	$ 0.00	$ 0.00
				3%	0.011%	E		$ 1,545,205.33	$ 1,545,205.33	$ 1,545,205.33		$ 2,317,808.00	$ 2,317,808.00											
						%E	0.000%	0.007%	0.007%	0.007%	0.000%	0.011%	0.011%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
5.2		**$ 390,127,472.00**	**1.870%**	**5.072%**	**0.095%**																			
	CAMARAS COMUNES EN MAMPOSTERIA PARA REDES DE COMUNICACIONES 1,5 X 1,5 x 1,5CON PAÑETE IMPERMEABILIZADO INCLUYE TAPA EN HIERRO DUCTIL D=60 CM	$ 390,127,472.00	1.870%			%P	0.041%	0.056%	0.056%	0.056%	0.056%	0.056%	0.056%	0.056%	0.056%	0.056%	0.100%	0.100%	0.100%	0.100%	0.100%	0.000%	0.000%	0.000%
						P	$ 8,481,032.00	$ 11,703,824.16	$ 11,703,824.16	$ 11,703,824.16	$ 11,703,824.16	$ 11,703,824.16	$ 11,703,824.16	$ 11,703,824.16	$ 11,703,824.16	$ 11,703,824.16	$ 20,948,149.00	$ 20,948,149.00	$ 20,948,149.00	$ 20,948,149.00	$ 20,948,149.00	$ 20,948,149.00		$ 0.00
				5%	0.095%	E	$ 11,025,341.60	$ 11,025,341.60	$ 19,789,074.67	$ 19,789,074.67	$ 12,485,963.83	$ 12,485,963.83	$ 12,485,963.83	$ 12,485,963.83	$ 12,485,963.83	$ 12,485,963.83								
						%E	0.053%	0.053%	0.095%	0.095%	0.060%	0.060%	0.060%	0.060%	0.060%	0.060%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
5.3		**$ 428,487,293.00**	**2.054%**	**5.844%**	**0.120%**																			
	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL	$ 428,487,293.00	2.054%			%P	0.013%	0.013%	0.059%	0.059%	0.059%	0.059%	0.125%	0.125%	0.125%	0.125%	0.125%	0.125%	0.125%	0.125%	0.125%	0.125%	0.125%	0.000%
						P	$ 2,770,317.94	$ 2,770,317.94	$ 12,270,317.94	$ 12,270,317.94	$ 12,270,317.94	$ 12,270,317.94	$ 25,999,969.27	$ 25,999,969.27	$ 25,999,969.27	$ 25,999,969.27	$ 25,999,969.27	$ 25,999,969.27	$ 25,999,969.27	$ 25,999,969.27	$ 25,999,969.27	$ 25,999,969.27	$ 25,999,969.27	$ 0.00
				6%	0.120%	E	$ 14,274,437.18	$ 14,274,437.18	$ 6,619,200.00	$ 6,619,200.00	$ 6,619,200.00	$ 6,619,200.00	$ 25,041,029.33	$ 25,041,029.33	$ 25,041,029.33	$ 25,041,029.33								
						%E	0.068%	0.068%	0.032%	0.032%	0.032%	0.032%	0.120%	0.120%	0.120%	0.120%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
5.4		**$ 189,310,025.00**	**0.908%**	**10.481%**	**0.095%**																			
	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	$ 189,310,025.00	0.908%			%P	0.016%	0.016%	0.016%	0.026%	0.026%	0.042%	0.042%	0.042%	0.042%	0.042%	0.042%	0.042%	0.042%	0.042%	0.042%	0.042%	0.042%	0.000%
						P	$ 3,261,893.44	$ 3,261,893.44	$ 3,261,893.44	$ 5,452,018.77	$ 5,452,018.77	$ 8,825,518.73	$ 8,825,518.73	$ 8,825,518.73	$ 8,825,518.73	$ 8,825,518.73	$ 8,825,518.73	$ 8,825,518.73	$ 8,825,518.73	$ 8,825,518.73	$ 8,825,518.73	$ 8,825,518.73	$ 8,825,518.73	$ 0.00
				10%	0.095%	E	$ 19,841,577.60	$ 19,841,577.60	$ 4,048,200.00	$ 4,048,200.00	$ 4,048,200.00	$ 9,606,820.16	$ 9,606,820.16	$ 9,606,820.16	$ 9,606,820.16	$ 9,606,820.16								
						%E	0.095%	0.095%	0.019%	0.019%	0.019%	0.046%	0.046%	0.046%	0.046%	0.046%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%


PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	% SOBRE VR. BASICO DEL CONTRATO	% EJECUTADO SOBRE ITEMS	% EJECUTADO SOBRE VALOR BASICO DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO	SEMANA No.23	SEMANA No.24	SEMANA No.25	SEMANA No.26	SEMANA No.27	SEMANA No.28	SEMANA No.29	SEMANA No.30	SEMANA No.31	SEMANA No.32	SEMANA No.33	SEMANA No.34	SEMANA No.35	SEMANA No.36	SEMANA No.37	SEMANA No.38	SEMANA No.39	SEMANA No.40
							Del 01-sep-25 Al 07-sep-25	Del 08-sep-25 Al 14-sep-25	Del 15-sep-25 Al 21-sep-25	Del 22-sep-25 Al 28-sep-25	Del 29-sep-25 Al 05-oct-25	Del 06-oct-25 Al 12-oct-25	Del 13-oct-25 Al 19-oct-25	Del 20-oct-25 Al 26-oct-25	Del 27-oct-25 Al 02-nov-25	Del 03-nov-25 Al 09-nov-25	Del 10-nov-25 Al 16-nov-25	Del 17-nov-25 Al 23-nov-25	Del 24-nov-25 Al 30-nov-25	Del 01-dic-25 Al 07-dic-25	Del 08-dic-25 Al 14-dic-25	Del 15-dic-25 Al 21-dic-25	Del 22-dic-25 Al 28-dic-25	Del 29-dic-25 Al 31-dic-25
5.5		**$ 2,319,353,384.00**	**11.119%**	**5.078%**	**0.565%**																			
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TDP DE 4" INCLUYE SEPARADORES, INCLUYE 12 LINEAS DE TUBOS	$ 2,319,353,384.00	11.119%			%P	0.115%	0.115%	0.420%	0.420%	0.420%	0.562%	0.562%	0.562%	0.562%	0.562%	0.562%	0.562%	0.562%	0.562%	0.562%	0.562%	0.562%	0.000%
						P	$ 24,064,905.75	$ 24,064,905.75	$ 87,594,317.50	$ 87,594,317.50	$ 87,594,317.50	$ 117,155,046.00	$ 117,155,046.00	$ 117,155,046.00	$ 117,155,046.00	$ 117,155,046.00	$ 117,155,046.00	$ 117,155,046.00	$ 117,155,046.00	$ 117,155,046.00	$ 117,155,046.00	$ 117,155,046.00	$ 117,155,046.00	$ 0.00
				5%	0.565%	E	$ 25,645,905.00	$ 25,645,905.00	$ 91,957,317.74	$ 91,957,317.74	$ 91,957,317.74	$ 117,784,923.80	$ 117,784,923.80	$ 117,784,923.80	$ 117,784,923.80	$ 117,784,923.80								
						%E	0.123%	0.123%	0.441%	0.441%	0.441%	0.565%	0.565%	0.565%	0.565%	0.565%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
5.6		**$ 60,950,500.00**	**0.292%**	**0.000%**	**0.000%**																			
	PROVISION - REDES DE GAS DOMICILIARIO	$ 60,950,500.00	0.292%			%P	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.007%	0.000%	0.000%	0.000%
						P	$ 1,919,940.75	$ 1,919,940.75	$ 1,919,940.75	$ 1,919,940.75	$ 1,919,940.75	$ 1,919,940.75	$ 1,919,940.75	$ 1,919,940.75	$ 1,919,940.75	$ 1,919,940.75	$ 1,919,940.75	$ 1,919,940.75	$ 1,919,940.75	$ 1,919,940.75	$ 1,919,940.75	$ 1,432,336.75	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
						E																		
						%E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
6	**CAPITULO- ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO**	**$ 3,772,669,921.00**	**18.09%**	**402.03%**	**1.27%**																			
	MEDIA TENSION	**$ 619,353,260.00**	**2.97%**	**200.00%**	**0.06%**																			
6.1.1		**$ 8,264,672.00**	**0.040%**	**100.000%**	**0.040%**																			
	Suministro Hora Brigada Diurna TET	$ 8,264,672.00	0.040%			%P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.020%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
						P						$ 4,132,836.00											$ 0.00	$ 0.00
				100%	0.040%	E														$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
						%E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
6.1.2		**$ 4,965,432.00**	**0.024%**	**100.000%**	**0.024%**																			
	Suministro Hora Gróa Hidráulica con Operador	$ 4,965,432.00	0.024%			%P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.012%	0.000%	0.000%	0.000%
						P															$ 2,482,716.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
				100%	0.024%	E	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
						%E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
6.1.3		**$ 13,392,336.00**	**0.064%**	**0.000%**	**0.000%**																			
	Construcción Registro Área Interna 0.49 M2 (F1) Concreto De 3000 Psi	$ 13,392,336.00	0.064%			%P	0.000%	0.000%	0.016%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.016%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.016%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
						P			$ 3,348,084.00					$ 3,348,084.00					$ 3,348,084.00					$ 0.00
						E	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
						%E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
		$ 592,730,820.00	**2.842%**	**0.000%**	**0.000%**																			
6.1,4	Reubicacion de Postes de Media tension	$ 592,730,820.00	2.842%			%P	0.474%	0.000%	0.000%	0.474%	0.000%	0.000%	0.476%	0.000%	0.000%	0.474%	0.000%	0.000%	0.474%	0.000%	0.000%	0.474%	0.000%	0.000%
						P	$ 98,788,470.00			$ 98,788,470.00			$ 98,788,470.00			$ 98,788,470.00			$ 98,788,470.00			$ 98,788,470.00		$ 0.00
						E	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
						%E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
	BAJA TENSION	**$ 799,046,636.00**	**3.83%**	**43.46%**	**0.28%**																			
6.2.1		**$ 0.00**	**0.000%**	**0.000%**	**0.000%**																			
	Suministro Y Tendido De Ducteria Conduit Pvc 1 1/2"	$ 0.00	0.000%			%P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
						P																	$ 0.00	$ 0.00
						E																		
						%E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
6.2.2		**$ 112,829,200.00**	**0.541%**	**5.205%**	**0.028%**																			
	Canalización 0.30 X 0.50 En Zona Arena, Incluye: Excavación, Compactado Con Material Del Sitio Y Cinta De Seguridad	$ 112,829,200.00	0.541%			%P	0.013%	0.013%	0.013%	0.023%	0.023%	0.023%	0.023%	0.023%	0.023%	0.023%	0.023%	0.023%	0.023%	0.023%	0.023%	0.023%	0.023%	0.000%
						P	$ 2,769,444.00	$ 2,769,444.00	$ 2,769,444.00	$ 4,894,149.71	$ 4,894,149.71	$ 4,894,149.71	$ 4,894,149.71	$ 4,894,149.71	$ 4,894,149.71	$ 4,894,149.71	$ 4,894,149.71	$ 4,894,149.71	$ 4,894,149.71	$ 4,894,149.71	$ 4,894,149.71	$ 4,894,149.71	$ 4,894,149.71	$ 0.00
				5%	0.028%	E	$ 3,446,419.20	$ 3,446,419.20	$ 4,273,833.33	$ 4,273,833.33	$ 4,273,833.33	$ 5,872,246.88	$ 5,872,246.88	$ 5,872,246.88	$ 5,872,246.88	$ 5,872,246.88								
						%E	0.017%	0.017%	0.020%	0.020%	0.020%	0.028%	0.028%	0.028%	0.028%	0.028%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
6.2.3		**$ 78,755,300.00**	**0.378%**	**5.747%**	**0.022%**																			
	Suministro e instalacion de Tapa antivandalica para registro de 50x50 EN PLATINA DE 2" CALIBRE 3/16"	$ 78,755,300.00	0.378%			%P	0.012%	0.012%	0.012%	0.020%	0.020%	0.020%	0.020%	0.020%	0.020%	0.020%	0.020%	0.020%	0.020%	0.020%	0.020%	0.020%	0.020%	0.000%
						P	$ 2,579,786.36	$ 2,579,786.36	$ 2,579,786.36	$ 4,151,214.93	$ 4,151,214.93	$ 4,151,214.93	$ 4,151,214.93	$ 4,151,214.93	$ 4,151,214.93	$ 4,151,214.93	$ 4,151,214.93	$ 4,151,214.93	$ 4,151,214.93	$ 4,151,214.93	$ 4,151,214.93	$ 4,151,214.93	$ 4,151,214.93	$ 0.00
				6%	0.022%	E	$ 1,900,990.00	$ 1,900,990.00	$ 4,526,166.67	$ 4,526,166.67	$ 4,526,166.67	$ 2,376,237.50	$ 2,376,237.50	$ 2,376,237.50	$ 2,376,237.50	$ 2,376,237.50								
						%E	0.009%	0.009%	0.022%	0.022%	0.022%	0.011%	0.011%	0.011%	0.011%	0.011%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
6.2.4		**$ 183,122,936.00**	**0.878%**	**5.201%**	**0.046%**																			
	Suministro e instalacion de Registro antivandalico de 50x50 EN PLATINA DE 2" CALIBRE 3/16"	$ 183,122,936.00	0.878%			%P	0.030%	0.030%	0.030%	0.045%	0.045%	0.045%	0.045%	0.045%	0.045%	0.045%	0.045%	0.045%	0.045%	0.045%	0.045%	0.045%	0.045%	0.000%
						P	$ 6,323,769.82	$ 6,323,769.82	$ 6,323,769.82	$ 9,466,626.93	$ 9,466,626.93	$ 9,466,626.93	$ 9,466,626.93	$ 9,466,626.93	$ 9,466,626.93	$ 9,466,626.93	$ 9,466,626.93	$ 9,466,626.93	$ 9,466,626.93	$ 9,466,626.93	$ 9,466,626.93	$ 9,466,626.93	$ 9,466,626.93	$ 0.00
				5%	0.046%	E	$ 4,420,208.80	$ 4,420,208.80	$ 9,524,306.67	$ 9,524,306.67	$ 9,524,306.67	$ 6,275,261.00	$ 6,275,261.00	$ 6,275,261.00	$ 6,275,261.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
						%E	0.021%	0.021%	0.046%	0.046%	0.046%	0.030%	0.030%	0.030%	0.030%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
6.2.5		**$ 381,792,000.00**	**1.830%**	**7.773%**	**0.142%**																			
	Suministro e instalación de tubería PVC 2"	$ 381,792,000.00	1.830%			%P	0.045%	0.045%	0.045%	0.045%	0.045%	0.045%	0.045%	0.115%	0.115%	0.115%	0.115%	0.115%	0.115%	0.115%	0.115%	0.115%	0.115%	0.000%
						P	$ 9,426,962.96	$ 9,426,962.96	$ 9,426,962.96	$ 9,426,962.96	$ 9,426,962.96	$ 9,426,962.96	$ 9,426,962.96	$ 24,038,755.60	$ 24,038,755.60	$ 24,038,755.60	$ 24,038,755.60	$ 24,038,755.60	$ 24,038,755.60	$ 24,038,755.60	$ 24,038,755.60	$ 24,038,755.60	$ 24,038,755.60	$ 0.00
				8%	0.142%	E	$ 17,104,281.60	$ 17,104,281.60	$ 10,605,333.33	$ 10,605,333.33	$ 10,605,333.33	$ 29,677,964.80	$ 29,677,964.80	$ 29,677,964.80	$ 29,677,964.80	$ 29,677,964.80	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
						%E	0.082%	0.082%	0.051%	0.051%	0.051%	0.142%	0.142%	0.142%	0.142%	0.142%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
6.2.6		**$ 42,547,200.00**	**0.204%**	**19.532%**	**0.040%**																			
	Sondeo de Canalización instalada con guia	$ 42,547,200.00	0.204%			%P	0.006%	0.006%	0.006%	0.006%	0.006%	0.012%	0.012%	0.012%	0.012%	0.012%	0.012%	0.012%	0.012%	0.012%	0.012%	0.012%	0.012%	0.000%
						P	$ 1,329,600.00	$ 1,329,600.00	$ 1,329,600.00	$ 1,329,600.00	$ 1,329,600.00	$ 2,437,600.00	$ 2,437,600.00	$ 2,437,600.00	$ 2,437,600.00	$ 2,437,600.00	$ 2,437,600.00	$ 2,437,600.00	$ 2,437,600.00	$ 2,437,600.00	$ 2,437,600.00	$ 2,437,600.00	$ 2,437,600.00	$ 0.00
				20%	0.040%	E	$ 0.00	$ 921,579.00	$ 921,579.00	$ 921,579.00	$ 921,579.00	$ 8,310,511.99	$ 8,310,511.99	$ 8,310,511.99	$ 8,310,511.99	$ 8,310,511.99	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
						%E	0.000%	0.004%	0.004%	0.004%	0.004%	0.040%	0.040%	0.040%	0.040%	0.040%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
	ILUMINACION	**$ 1,984,138,005.00**	**9.51%**	**132.68%**	**0.78%**																			
6.3.1		**$ 377,111,428.00**	**1.808%**	**7.767%**	**0.140%**																			
	Suministro E Instalacion De Luminaria De Led 60-90 W, Incluye Brazo Ornamental De 2,50 Metros, Pernos Y Fotocelda	$ 377,111,428.00	1.808%			%P	0.035%	0.035%	0.035%	0.107%	0.107%	0.107%	0.107%	0.107%	0.107%	0.107%	0.107%	0.107%	0.107%	0.107%	0.107%	0.107%	0.107%	0.000%
						P	$ 7,322,552.00	$ 7,322,552.00	$ 7,322,552.00	$ 22,229,175.71	$ 22,229,175.71	$ 22,229,175.71	$ 22,229,175.71	$ 22,229,175.71	$ 22,229,175.71	$ 22,229,175.71	$ 22,229,175.71	$ 22,229,175.71	$ 22,229,175.71	$ 22,229,175.71	$ 22,229,175.71	$ 22,229,175.71	$ 22,229,175.71	$ 0.00
				8%	0.140%	E	$ 10,251,572.80	$ 10,251,572.80	$ 24,408,506.67	$ 24,408,506.67	$ 24,408,506.67	$ 25,628,932.00	$ 25,628,932.00	$ 25,628,932.00	$ 25,628,932.00	$ 25,628,932.00								
						%E	0.049%	0.049%	0.117%	0.117%	0.117%	0.123%	0.123%	0.123%	0.123%	0.123%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
6.3.2		**$ 139,189,600.00**	**0.667%**	**5.916%**	**0.039%**																			
	Suministro E Instalacion De Cable Thw Aluminio Aislado 90º C-Awg 6	$ 139,189,600.00	0.667%			%P	0.029%	0.029%	0.029%	0.029%	0.029%	0.029%	0.029%	0.029%	0.029%	0.029%	0.029%	0.029%	0.029%	0.029%	0.029%	0.029%	0.029%	0.000%
						P	$ 6,051,721.74	$ 6,051,721.74	$ 6,051,721.74	$ 6,051,721.74	$ 6,051,721.74	$ 6,051,721.74	$ 6,051,721.74	$ 6,051,721.74	$ 6,051,721.74	$ 6,051,721.74	$ 6,051,721.74	$ 6,051,721.74	$ 6,051,721.74	$ 6,051,721.74	$ 6,051,721.74	$ 6,051,721.74	$ 6,051,721.74	$ 0.00
				6%	0.039%	E						$ 8,233,855.61	$ 8,233,855.61	$ 8,233,855.61	$ 8,233,855.61									
						%E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.039%	0.039%	0.039%	0.039%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
6.3.3		**$ 2,485,760.00**	**0.012%**	**13.281%**	**0.002%**																			
	Demolición de pedestal de poste de alumbrado público. Incluye retiro de material	$ 2,485,760.00	0.012%			%P	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.000%
						P	$ 108,076.52	$ 108,076.52	$ 108,076.52	$ 108,076.52	$ 108,076.52	$ 108,076.52	$ 108,076.52	$ 108,076.52	$ 108,076.52	$ 108,076.52	$ 108,076.52	$ 108,076.52	$ 108,076.52	$ 108,076.52	$ 108,076.52	$ 108,076.52	$ 108,076.52	$ 0.00
				13%	0.002%	E						$ 330,140.00	$ 330,140.00	$ 330,140.00	$ 330,140.00									
						%E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
6.3.4		**$ 9,945,062.00**	**0.048%**	**7.767%**	**0.004%**																			
	Pedestal para poste de alumbrado público	$ 9,945,062.00	0.048%			%P	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.004%	0.000%
						P	$ 411,404.00	$ 411,404.00	$ 411,404.00	$ 411,404.00	$ 411,404.00	$ 411,404.00	$ 411,404.00	$ 411,404.00	$ 411,404.00	$ 411,404.00	$ 411,404.00	$ 411,404.00	$ 411,404.00	$ 411,404.00	$ 411,404.00	$ 411,404.00	$ 894,174.00	$ 0.00
				8%	0.004%	E	$ 270,351.20	$ 270,351.20	$ 543,693.33	$ 543,693.33	$ 543,693.33	$ 412,939.00	$ 412,939.00	$ 412,939.00	$ 412,939.00									
						%E	0.001%	0.001%	0.003%	0.003%	0.003%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
6.3.5		**$ 38,505,226.00**	**0.185%**	**0.000%**	**0.000%**																			
	Suministro e instalacion de transformador monofasico 25 KVA 13.2 kV/440-220V	$ 38,505,226.00	0.185%			%P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.092%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.092%	0.000%	0.000%
						P										$ 19,252,613.00						$ 19,252,613.00	$ 0.00	$ 0.00
						E																		
						%E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	% SOBRE VR. BASICO DEL CONTRATO	% EJECUTADO SOBRE ITEMS	% EJECUTADO SOBRE VALOR BASICO DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO	SEMANA No.23	SEMANA No.24	SEMANA No.25	SEMANA No.26	SEMANA No.27	SEMANA No.28	SEMANA No.29	SEMANA No.30	SEMANA No.31	SEMANA No.32	SEMANA No.33	SEMANA No.34	SEMANA No.35	SEMANA No.36	SEMANA No.37	SEMANA No.38	SEMANA No.39	SEMANA No.40
							Del 01-sep-25 Al 07-sep-25	Del 08-sep-25 Al 14-sep-25	Del 15-sep-25 Al 21-sep-25	Del 22-sep-25 Al 28-sep-25	Del 29-sep-25 Al 05-oct-25	Del 06-oct-25 Al 12-oct-25	Del 13-oct-25 Al 19-oct-25	Del 20-oct-25 Al 26-oct-25	Del 27-oct-25 Al 02-nov-25	Del 03-nov-25 Al 09-nov-25	Del 10-nov-25 Al 16-nov-25	Del 17-nov-25 Al 23-nov-25	Del 24-nov-25 Al 30-nov-25	Del 01-dic-25 Al 07-dic-25	Del 08-dic-25 Al 14-dic-25	Del 15-dic-25 Al 21-dic-25	Del 22-dic-25 Al 28-dic-25	Del 29-dic-25 Al 31-dic-25
6.3.6		**$ 1,105,382.00**	**0.005%**	**0.000%**	**0.000%**																			
	Bajante en tuberia IMC 2"	$ 1,105,382.00	0.005%			%P	0.003%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.003%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.003%	0.000%	0.000%
						P										$ 552,691.00						$ 552,691.00	$ 0.00	$ 0.00
						E																		
						%E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
6.3.7		**$ 681,283,612.00**	**3.266%**	**7.767%**	**0.254%**																			
	Suministro E Instalacion De Poste De Acero Galvanizado En Caliente De 7.00 Metros De Altura, Tronco Conico Poligonal, En Lamina De Acero, Acabado Final En Pintura De Esmalte Para Exteriores, Incluye Base De Concreto	$ 681,283,612.00	3.266%	8%	0.254%	%P	0.155%	0.155%	0.155%	0.167%	0.167%	0.167%	0.167%	0.167%	0.167%	0.167%	0.167%	0.167%	0.167%	0.167%	0.167%	0.167%	0.167%	0.000%
						P	$ 32,410,579.60	$ 32,410,579.60	$ 32,410,579.60	$ 34,772,866.71	$ 34,772,866.71	$ 34,772,866.71	$ 34,772,866.71	$ 34,772,866.71	$ 34,772,866.71	$ 34,772,866.71	$ 34,772,866.71	$ 34,772,866.71	$ 34,772,866.71	$ 34,772,866.71	$ 34,772,866.71	$ 34,772,866.71	$ 34,772,866.71	$ 0.00
						E	$ 18,520,331.20	$ 18,520,331.20	$ 44,096,026.67	$ 44,096,026.67	$ 44,096,026.67	$ 37,040,662.40	$ 37,040,662.40	$ 37,040,662.40	$ 37,040,662.40	$ 37,040,662.40								
						%E	0.089%	0.089%	0.211%	0.211%	0.211%	0.178%	0.178%	0.178%	0.178%	0.178%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
6.3.8		**$ 251,360,994.00**	**1.205%**	**6.472%**	**0.078%**																			
	Suministro E Instalacion De Luminaria De Led 50 W, Incluye Pernos Y Fotocelda	$ 251,360,994.00	1.205%	6%	0.078%	%P	0.049%	0.049%	0.049%	0.049%	0.049%	0.049%	0.049%	0.053%	0.053%	0.053%	0.053%	0.053%	0.053%	0.053%	0.053%	0.053%	0.053%	0.000%
						P	$ 10,123,132.44	$ 10,123,132.44	$ 10,123,132.44	$ 10,123,132.44	$ 10,123,132.44	$ 10,123,132.44	$ 10,123,132.44	$ 11,108,330.20	$ 11,108,330.20	$ 11,108,330.20	$ 11,108,330.20	$ 11,108,330.20	$ 11,108,330.20	$ 11,108,330.20	$ 11,108,330.20	$ 11,108,330.20	$ 11,108,330.20	$ 0.00
						E	$ 10,458,848.57	$ 10,458,848.57	$ 16,269,320.00	$ 16,269,320.00	$ 16,269,320.00	$ 13,666,228.80	$ 13,666,228.80	$ 13,666,228.80	$ 13,666,228.80	$ 13,666,228.80								
						%E	0.050%	0.050%	0.078%	0.078%	0.078%	0.066%	0.066%	0.066%	0.066%	0.066%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
6.3.9		**$ 73,999,200.00**	**0.355%**	**9.000%**	**0.032%**																			
	Suministro E Instalacion De Cable Thw Cobre Forrado 90ºC-Awg 10	$ 73,999,200.00	0.355%	9%	0.032%	%P	0.018%	0.018%	0.018%	0.018%	0.018%	0.018%	0.018%	0.018%	0.018%	0.018%	0.018%	0.018%	0.018%	0.018%	0.018%	0.018%	0.018%	0.000%
						P	$ 3,699,960.00	$ 3,699,960.00	$ 3,699,960.00	$ 3,699,960.00	$ 3,699,960.00	$ 3,699,960.00	$ 3,699,960.00	$ 3,699,960.00	$ 3,699,960.00	$ 3,699,960.00	$ 3,699,960.00	$ 3,699,960.00	$ 3,699,960.00	$ 3,699,960.00	$ 3,699,960.00	$ 3,699,960.00	$ 3,699,960.00	$ 0.00
						E					$ 6,659,928.00	$ 2,712,491.22	$ 2,712,491.22	$ 2,712,491.22	$ 2,712,491.22									
						%E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.032%	0.013%	0.013%	0.013%	0.013%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
6.3.10		**$ 79,160,400.00**	**0.379%**	**9.596%**	**0.036%**																			
	Suministro E Instalacion De Cable Encauchetado 3 X 14 Awg	$ 79,160,400.00	0.379%	10%	0.036%	%P	0.019%	0.019%	0.019%	0.019%	0.019%	0.019%	0.019%	0.019%	0.019%	0.019%	0.019%	0.019%	0.019%	0.019%	0.019%	0.019%	0.019%	0.000%
						P	$ 3,958,020.00	$ 3,958,020.00	$ 3,958,020.00	$ 3,958,020.00	$ 3,958,020.00	$ 3,958,020.00	$ 3,958,020.00	$ 3,958,020.00	$ 3,958,020.00	$ 3,958,020.00	$ 3,958,020.00	$ 3,958,020.00	$ 3,958,020.00	$ 3,958,020.00	$ 3,958,020.00	$ 3,958,020.00	$ 3,958,020.00	$ 0.00
						E					$ 5,597,200.00				$ 7,596,200.00									
						%E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.027%	0.000%	0.000%	0.000%	0.036%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
6.3.11		**$ 15,289,296.00**	**0.073%**	**5.455%**	**0.004%**																			
	Suministro E Instalacion De Varilla Polo A Tierra, Incluye Varilla, Conector	$ 15,289,296.00	0.073%	5%	0.004%	%P	0.004%	0.004%	0.004%	0.004%	0.004%	0.004%	0.004%	0.004%	0.004%	0.004%	0.004%	0.004%	0.004%	0.004%	0.004%	0.004%	0.004%	0.000%
						P	$ 764,464.80	$ 764,464.80	$ 764,464.80	$ 764,464.80	$ 764,464.80	$ 764,464.80	$ 764,464.80	$ 764,464.80	$ 764,464.80	$ 764,464.80	$ 764,464.80	$ 764,464.80	$ 764,464.80	$ 764,464.80	$ 764,464.80	$ 764,464.80	$ 764,464.80	$ 0.00
						E					$ 833,961.60	$ 833,961.60	$ 833,961.60	$ 833,961.60	$ 833,961.60	$ 833,961.60								
						%E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.004%	0.004%	0.004%	0.004%	0.004%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
6.3.12		**$ 176,638,834.00**	**0.847%**	**9.661%**	**0.082%**																			
	Empalme Subterraneo De Baja Tension Acometida 14-4	$ 176,638,834.00	0.847%	10%	0.082%	%P	0.000%	0.000%	0.000%	0.085%	0.000%	0.000%	0.000%	0.085%	0.085%	0.000%	0.085%	0.000%	0.085%	0.000%	0.085%	0.085%	0.085%	0.000%
						P			$ 17,663,883.40			$ 17,663,883.40		$ 17,663,883.40	$ 17,663,883.40		$ 17,663,883.40		$ 17,663,883.40		$ 17,663,883.40	$ 17,663,883.40	$ 17,663,883.40	$ 0.00
						E						$ 17,064,326.00		$ 17,064,326.00	$ 17,064,326.00									
						%E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.082%	0.000%	0.082%	0.082%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
6.3.13		**$ 23,279,958.00**	**0.112%**	**0.000%**	**0.000%**																			
	Empalme Subterráneo De Baja Tensión Acometida 2-1/0	$ 23,279,958.00	0.112%			%P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.028%	0.000%	0.000%	0.028%	0.000%	0.028%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.028%	0.000%	0.000%
						P					$ 5,819,989.50			$ 5,819,989.50		$ 5,819,989.50						$ 5,819,989.50		$ 0.00
						E																		
						%E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
6.3.14		**$ 21,983,016.00**	**0.105%**	**0.000%**	**0.000%**																			
	Suministro E Instalación De Cable Thw Cobre Aislado 90º C-Awg 1/0	$ 21,983,016.00	0.105%			%P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.026%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.026%	0.000%	0.000%	0.026%	0.000%	0.000%	0.026%	0.000%	0.000%
						P					$ 5,495,754.00					$ 5,495,754.00			$ 5,495,754.00			$ 5,495,754.00		$ 0.00
						E	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
						%E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
6.3.15		**$ 23,682,782.00**	**0.114%**	**0.000%**	**0.000%**																			
	Suministro E Instalacion De Medidor Semidirecto, Incluye Tc, Protocolo, Bloque De Prueba, Cajas De Policarbonato	$ 23,682,782.00	0.114%			%P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.057%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.057%	0.000%	0.000%
						P									$ 11,841,391.00							$ 11,841,391.00	$ 0.00	$ 0.00
						E	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
						%E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
6.3.16		**$ 43,477,390.00**	**0.208%**	**50.000%**	**0.104%**																			
	Diseños de Iluminación y cálculos fotométricos	$ 43,477,390.00	0.208%	50%	0.104%	%P	0.007%	0.007%	0.007%	0.007%	0.007%	0.007%	0.007%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
						P	$ 1,404,654.14	$ 1,404,654.14	$ 1,404,654.14	$ 1,404,654.14	$ 1,404,654.14	$ 1,404,654.14	$ 1,404,654.14										$ 0.00	$ 0.00
						E	$ 0.00	$ 4,347,739.00	$ 4,347,739.00	$ 4,347,739.00	$ 4,347,739.00	$ 4,347,739.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
						%E	0.000%	0.021%	0.021%	0.021%	0.021%	0.021%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
6.3.17		**$ 15,645,465.00**	**0.075%**	**0.000%**	**0.000%**																			
	Perforación horizontal con topo 2"	$ 15,645,465.00	0.075%			%P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.038%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.038%	0.000%	0.000%
						P										$ 7,822,732.50						$ 7,822,732.50	$ 0.00	$ 0.00
						E																		
						%E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
6.3.18		**$ 9,994,600.00**	**0.048%**	**0.000%**	**0.000%**																			
	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	$ 9,994,600.00	0.048%			%P	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.000%	0.000%
						P	$ 475,933.33	$ 475,933.33	$ 475,933.33	$ 475,933.33	$ 475,933.33	$ 475,933.33	$ 475,933.33	$ 475,933.33	$ 475,933.33	$ 475,933.33	$ 475,933.33	$ 475,933.33	$ 475,933.33	$ 475,933.33	$ 475,933.33	$ 475,933.33	$ 0.00	$ 0.00
						E																		
						%E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
	SUPLEMENTOS EN TENSION	**$ 1,587,216.00**	**0.01%**	**0.00%**	**0.00%**																			
6.4.1		**$ 578,880.00**	**0.003%**	**0.000%**	**0.000%**																			
	Suplemento De Trabajo En Tensión Cruceta Auxiliar De Protecciones	$ 578,880.00	0.003%			%P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
						P	$ 26,312.73	$ 26,312.73	$ 26,312.73	$ 26,312.73	$ 26,312.73	$ 26,312.73	$ 26,312.73	$ 26,312.73	$ 26,312.73	$ 26,312.73	$ 26,312.73	$ 26,312.73	$ 26,312.73	$ 26,312.73	$ 26,312.73	$ 26,312.73	$ 26,312.73	$ 0.00
						E																		
						%E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
6.4.2		**$ 1,008,336.00**	**0.005%**	**0.000%**	**0.000%**																			
	Suplemento De Trabajo En Tensión de Cortacircuitos Nn Completo 13.2 Kv 100 A	$ 1,008,336.00	0.005%			%P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
						P	$ 45,833.45	$ 45,833.45	$ 45,833.45	$ 45,833.45	$ 45,833.45	$ 45,833.45	$ 45,833.45	$ 45,833.45	$ 45,833.45	$ 45,833.45	$ 45,833.45	$ 45,833.45	$ 45,833.45	$ 45,833.45	$ 45,833.45	$ 45,833.45	$ 45,833.45	$ 0.00
						E																		
						%E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
	REUBICACIONES Y DESMONTES	**$ 302,759,914.00**	**1.45%**	**25.89%**	**0.15%**																			
6.5.1		**$ 55,040,434.00**	**0.264%**	**0.000%**	**0.000%**																			
	Desmonte De Poste De Hormigón De 14.00 Metros	$ 55,040,434.00	0.264%			%P	0.000%	0.000%	0.000%	0.030%	0.030%	0.000%	0.000%	0.030%	0.030%	0.000%	0.000%	0.030%	0.030%	0.000%	0.000%	0.030%	0.030%	0.000%
						P				$ 6,254,594.77	$ 6,254,594.77			$ 6,254,594.77	$ 6,254,594.77			$ 6,254,594.77	$ 6,254,594.77			$ 6,254,594.77	$ 6,254,594.77	$ 0.00
						E								$ 7,117,297.50	$ 7,117,297.50									
						%E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.034%	0.034%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
6.5.2		**$ 15,599,680.00**	**0.075%**	**12.931%**	**0.010%**																			
	Retiro De Luminaria Ap	$ 15,599,680.00	0.075%	13%	0.010%	%P	0.000%	0.000%	0.000%	0.008%	0.008%	0.000%	0.000%	0.008%	0.008%	0.000%	0.000%	0.008%	0.008%	0.000%	0.000%	0.008%	0.008%	0.000%
						P				$ 1,772,690.91	$ 1,772,690.91			$ 1,772,690.91	$ 1,772,690.91			$ 1,772,690.91	$ 1,772,690.91				$ 1,772,690.91	$ 0.00
						E								$ 2,017,200.00	$ 2,017,200.00									
						%E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.010%	0.010%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
6.5.3		**$ 232,119,800.00**	**1.113%**	**12.955%**	**0.144%**																			
	Desmonte De Línea Bt (Rt) Triplex 2 A 4/0	$ 232,119,800.00	1.113%	13%	0.144%	%P	0.000%	0.000%	0.000%	0.126%	0.126%	0.000%	0.000%	0.126%	0.126%	0.000%	0.000%	0.126%	0.126%	0.000%	0.000%	0.126%	0.126%	0.000%
						P				$ 26,377,250.00	$ 26,377,250.00			$ 26,377,250.00	$ 26,377,250.00			$ 26,377,250.00	$ 26,377,250.00			$ 26,377,250.00	$ 26,377,250.00	$ 0.00
						E								$ 30,070,065.00	$ 30,070,065.00									
						%E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.144%	0.144%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
	CERTIFICACIONES Y TRAMITES	**$ 65,784,890.00**	**0.32%**	**0.00%**	**0.00%**																			
6.6.1		**$ 10,140,000.00**	**0.049%**	**0.000%**	**0.000%**																			
	Certificación Retie	$ 10,140,000.00	0.049%			%P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.049%
						P																		$ 10,140,000.00
						E																		
						%E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
6.6.2		**$ 33,150,000.00**	**0.159%**	**0.000%**	**0.000%**																			
	Certificación Retilap	$ 33,150,000.00	0.159%			%P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.159%
						P																		$ 33,150,000.00
						E	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
						%E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
6.6.3		**$ 5,655,000.00**	**0.027%**	**0.000%**	**0.000%**																			
	Gestiones Ante Electricaribe	$ 5,655,000.00	0.027%			%P	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.000%
						P	$ 169,650.00	$ 169,650.00	$ 169,650.00	$ 169,650.00	$ 169,650.00	$ 169,650.00	$ 169,650.00	$ 169,650.00	$ 169,650.00	$ 169,650.00	$ 169,650.00	$ 169,650.00	$ 169,650.00	$ 169,650.00	$ 169,650.00	$ 169,650.00	$ 80,785.71	$ 0.00
						E	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
						%E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
6.6.4		**$ 5,169,945.00**	**0.025%**	**0.000%**	**0.000%**																			
	Tramite Retie	$ 5,169,945.00	0.025%			%P	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.000%
						P	$ 162,853.27	$ 162,853.27	$ 162,853.27	$ 162,853.27	$ 162,853.27	$ 162,853.27	$ 162,853.27	$ 162,853.27	$ 162,853.27	$ 162,853.27	$ 162,853.27	$ 162,853.27	$ 162,853.27	$ 162,853.27	$ 162,853.27	$ 162,853.27	$ 162,853.27	$ 69,794.26
						E	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
						%E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
6.6.5		**$ 11,669,945.00**	**0.056%**	**0.000%**	**0.000%**																			
	Tramite Retilap	$ 11,669,945.00	0.056%			%P	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.001%
						P	$ 367,603.27	$ 367,603.27	$ 367,603.27	$ 367,603.27	$ 367,603.27	$ 367,603.27	$ 367,603.27	$ 367,603.27	$ 367,603.27	$ 367,603.27	$ 367,603.27	$ 367,603.27	$ 367,603.27	$ 367,603.27	$ 367,603.27	$ 367,603.27	$ 367,603.27	$ 157,544.26
						E	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
						%E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	% SOBRE VR. BASICO DEL CONTRATO	% EJECUTADO SOBRE ITEMS	% EJECUTADO SOBRE VALOR BASICO DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO	SEMANA No.23	SEMANA No.24	SEMANA No.25	SEMANA No.26	SEMANA No.27	SEMANA No.28	SEMANA No.29	SEMANA No.30	SEMANA No.31	SEMANA No.32	SEMANA No.33	SEMANA No.34	SEMANA No.35	SEMANA No.36	SEMANA No.37	SEMANA No.38	SEMANA No.39	SEMANA No.40
							Del 01-sep-25 Al 07-sep-25	Del 08-sep-25 Al 14-sep-25	Del 15-sep-25 Al 21-sep-25	Del 22-sep-25 Al 28-sep-25	Del 29-sep-25 Al 05-oct-25	Del 06-oct-25 Al 12-oct-25	Del 13-oct-25 Al 19-oct-25	Del 20-oct-25 Al 26-oct-25	Del 27-oct-25 Al 02-nov-25	Del 03-nov-25 Al 09-nov-25	Del 10-nov-25 Al 16-nov-25	Del 17-nov-25 Al 23-nov-25	Del 24-nov-25 Al 30-nov-25	Del 01-dic-25 Al 07-dic-25	Del 08-dic-25 Al 14-dic-25	Del 15-dic-25 Al 21-dic-25	Del 22-dic-25 Al 28-dic-25	Del 29-dic-25 Al 31-dic-25
	Capitulo - Povisiones	**$ 351,460,654.00**	**1.68%**	**146.34%**	**0.36%**																			
7.1		**$ 0.00**	**0.000%**	**0.000%**	**0.000%**																			
	RETIRO Y TRASLADO DE SEMAFOROS	$ 0.00	0.000%			%P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
						P								$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
						E																		
						%E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
7.2		**$ 177,370,918.00**	**0.850%**	**0.000%**	**0.000%**																			
	PROVISIÓN PERMISOS PMA, PMT, PGS.	$ 177,370,918.00	0.850%			%P	0.000%	0.000%	0.000%	0.151%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.247%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
						P				$ 31,447,395.00									$ 51,581,338.00					
						E	$ 21,738,112.50	$ 21,738,112.50																
						%E	0.104%	0.104%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
7.3		**$ 0.00**	**0.000%**	**0.000%**	**0.000%**																			
	PROVISIÓN DESMONTE Y REUBICACIÓN DE PARADEROS DE BUSES INCLUYE (12 PARADEROS)	$ 0.00	0.000%			%P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
						P																$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
						E																		
						%E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
7.4		**$ 21,580,000.00**	**0.103%**	**46.339%**	**0.048%**																			
	PROVISION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	$ 21,580,000.00	0.103%			%P	0.003%	0.003%	0.003%	0.003%	0.003%	0.003%	0.003%	0.003%	0.003%	0.003%	0.003%	0.003%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
						P	$ 644,331.75	$ 644,331.75	$ 644,331.75	$ 644,331.75	$ 644,331.75	$ 644,331.75	$ 644,331.75	$ 644,331.75	$ 644,331.75	$ 644,331.75	$ 644,331.75	$ 593,194.31	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
				46%		E																		
						%E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
7.5		**$ 64,852,059.00**	**0.311%**	**100.000%**	**0.311%**																			
	TALA DE AROBOLES INCLUYENDO RAIZ Y RETIRO DE MATERIAL	$ 64,852,059.00	0.311%			%P	0.000%	0.000%	0.000%	0.022%	0.021%	0.021%	0.021%	0.021%	0.021%	0.021%	0.021%	0.021%	0.021%	0.021%	0.021%	0.021%	0.021%	0.021%
						P				$ 4,642,041.71	$ 4,300,715.49	$ 4,300,715.49	$ 4,300,715.49	$ 4,300,715.49	$ 4,300,715.49	$ 4,300,715.49	$ 4,300,715.49	$ 4,300,715.49	$ 4,300,715.49	$ 4,300,715.49	$ 4,300,715.49	$ 4,300,715.49	$ 4,300,715.49	$ 4,300,715.49
				100%	0.311%	E																		
						%E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
7.6		**$ 87,657,677.00**	**0.420%**	**0.000%**	**0.000%**																			
	AJUSTE Y/O COMPLEMETACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 87,657,677.00	0.420%			%P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
						P	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
						E																		
						%E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
8	**Item no previstos**	**$ 1,603,824,500.00**	**7.300%**	**213.000%**	**0.500%**																			
NP-8.1		**$ 225,176,250.00**	**1.079%**	**9.888%**	**0.107%**																			
	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 39 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS,ESPESOR= 0.2 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D =1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" -LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL	$ 225,176,250.00	1.079%			%P	0.040%	0.040%	0.040%	0.040%	0.040%	0.040%	0.060%	0.060%	0.060%	0.060%	0.060%	0.060%	0.060%	0.060%	0.060%	0.060%	0.060%	0.000%
						P	$ 8,417,268.37	$ 8,417,268.37	$ 8,417,268.37	$ 8,417,268.37	$ 8,417,268.37	$ 8,417,268.37	$ 12,511,382.00	$ 12,511,382.00	$ 12,511,382.00	$ 12,511,382.00	$ 12,511,382.00	$ 12,511,382.00	$ 12,511,382.00	$ 12,511,382.00	$ 12,511,382.00	$ 12,511,382.00	$ 12,511,382.00	$ 0.00
				10%	0.107%	E	$ 22,264,827.13	$ 22,264,827.13	$ 10,496,966.19	$ 10,496,966.19	$ 10,496,966.19	$ 10,496,966.19	$ 6,461,056.88												
						%E	0.107%	0.107%	0.050%	0.050%	0.050%	0.050%	0.031%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
NP-8.2		**$ 5,538,000.00**	**0.027%**	**0.000%**	**0.000%**																			
	Viga de Confinamiento para Losetas de Espacio Publico en Concreto de 3000 Psi de 0.10 x 0.10 mt	$ 5,538,000.00	0.027%			%P	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.000%
						P	$ 263,714.29	$ 263,714.29	$ 263,714.29	$ 263,714.29	$ 263,714.29	$ 263,714.29	$ 263,714.29	$ 263,714.29	$ 263,714.29	$ 263,714.29	$ 263,714.29	$ 263,714.29	$ 263,714.29	$ 263,714.29	$ 263,714.29	$ 263,714.29	$ 263,714.29	$ 0.00
						E																		
						%E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
NP-8.3		**$ 127,322,000.00**	**0.610%**	**5.060%**	**0.031%**																			
	Loseta Tope 200x200x60 Mm De Espesor Color Gris, Usada En Pavimento En Los Dos Extremos De La Franja de Circulación Peatonal, Colocada Sobre Capa De Mortero E= 3 Cms, Capa De Concreto de 3000 psi E= 10 Cms Y Capa De Subbase Granular E= 15cms	$ 127,322,000.00	0.610%			%P	0.015%	0.015%	0.015%	0.015%	0.015%	0.015%	0.015%	0.015%	0.015%	0.015%	0.015%	0.015%	0.015%	0.015%	0.015%	0.015%	0.015%	0.000%
						P	$ 3,157,695.17	$ 3,157,695.17	$ 3,157,695.17	$ 3,157,695.17	$ 3,157,695.17	$ 3,157,695.17	$ 3,157,695.17	$ 3,157,695.17	$ 3,157,695.17	$ 3,157,695.17	$ 3,157,695.17	$ 3,157,695.17	$ 3,157,695.17	$ 3,157,695.17	$ 3,157,695.17	$ 3,157,695.17	$ 3,157,695.17	$ 0.00
				5%	0.031%	E																		
						%E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
NP-8.4		**$ 3,254,944.00**	**0.016%**	**4.545%**	**0.001%**																			
	INSTALACIÓN DE ACCESORIOS TEE 8" X 6" Y SELLOS	$ 3,254,944.00	0.016%			%P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.000%
						P	$ 87,971.46	$ 87,971.46	$ 87,971.46	$ 87,971.46	$ 87,971.46	$ 87,971.46	$ 87,971.46	$ 87,971.46	$ 87,971.46	$ 87,971.46	$ 87,971.46	$ 87,971.46	$ 175,942.92	$ 175,942.92	$ 175,942.92	$ 175,942.92	$ 175,942.92	$ 0.00
				5%	0.001%	E		$ 136,855.60	$ 136,855.60	$ 136,855.60	$ 106,855.60	$ 106,855.60	$ 103,976.00	$ 103,976.00											
						%E	0.000%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
NP-8.5		**$ 252,122,216.00**	**1.209%**	**5.587%**	**0.068%**																			
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO TDP DE 4"	$ 252,122,216.00	1.209%			%P	0.022%	0.022%	0.022%	0.057%	0.057%	0.057%	0.057%	0.057%	0.057%	0.057%	0.057%	0.057%	0.057%	0.057%	0.057%	0.057%	0.057%	0.000%
						P	$ 4,677,960.20	$ 4,677,960.20	$ 4,677,960.20	$ 11,994,209.47	$ 11,994,209.47	$ 11,994,209.47	$ 11,994,209.47	$ 11,994,209.47	$ 11,994,209.47	$ 11,994,209.47	$ 11,994,209.47	$ 11,994,209.47	$ 11,994,209.47	$ 11,994,209.47	$ 11,994,209.47	$ 11,994,209.47	$ 11,994,209.47	$ 0.00
				6%	0.068%	E	$ 11,293,729.20	$ 11,293,729.20	$ 14,085,409.00	$ 14,085,409.00	$ 12,085,409.00	$ 12,085,409.00	$ 11,533,083.20	$ 11,533,083.20	$ 11,533,083.20									
						%E	0.054%	0.054%	0.068%	0.068%	0.058%	0.058%	0.055%	0.055%	0.055%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
NP-8.6		**$ 452,311,026.00**	**2.168%**	**3.075%**	**0.067%**																			
	ACERO DE REFUERZO	$ 452,311,026.00	2.168%			%P	0.005%	0.005%	0.005%	0.149%	0.149%	0.149%	0.149%	0.149%	0.149%	0.149%	0.149%	0.149%	0.149%	0.149%	0.149%	0.149%	0.149%	0.000%
						P	$ 985,022.00	$ 985,022.00	$ 985,022.00	$ 31,041,473.58	$ 31,041,473.58	$ 31,041,473.58	$ 31,041,473.58	$ 31,041,473.58	$ 31,041,473.58	$ 31,041,473.58	$ 31,041,473.58	$ 31,041,473.58	$ 31,041,473.58	$ 31,041,473.58	$ 31,041,473.58	$ 31,041,473.58	$ 31,041,473.58	$ 0.00
				3%	0.067%	E	$ 13,908,593.64	$ 13,908,593.64	$ 4,403,666.67	$ 4,403,666.67	$ 4,403,666.67	$ 4,403,666.67	$ 9,623,746.38	$ 9,623,746.38	$ 9,623,746.38									
						%E	0.067%	0.067%	0.021%	0.021%	0.021%	0.046%	0.046%	0.046%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
NP-8.7		**$ 269,574,200.00**	**1.292%**	**9.214%**	**0.119%**																			
	DEMOLICIÓN DE ROCA	$ 269,574,200.00	1.292%			%P	0.038%	0.038%	0.038%	0.038%	0.038%	0.038%	0.038%	0.038%	0.038%	0.038%	0.038%	0.038%	0.038%	0.038%	0.038%	0.038%	0.038%	0.000%
						P	$ 7,862,580.83	$ 7,862,580.83	$ 7,862,580.83	$ 7,862,580.83	$ 7,862,580.83	$ 7,862,580.83	$ 7,862,580.83	$ 7,862,580.83	$ 7,862,580.83	$ 7,862,580.83	$ 7,862,580.83	$ 7,862,580.83	$ 7,862,580.83	$ 7,862,580.83	$ 7,862,580.83	$ 7,862,580.83	$ 7,862,580.83	$ 0.00
				9%	0.119%	E																		
						%E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
NP-8.8		**$ 61,323,404.00**	**0.294%**	**1.008%**	**0.003%**																			
	CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO	$ 61,323,404.00	0.294%			%P	0.003%	0.003%	0.003%	0.018%	0.018%	0.018%	0.018%	0.018%	0.018%	0.018%	0.018%	0.018%	0.018%	0.018%	0.018%	0.018%	0.018%	0.000%
						P	$ 529,585.71	$ 529,585.71	$ 529,585.71	$ 3,699,347.21	$ 3,699,347.21	$ 3,699,347.21	$ 3,699,347.21	$ 3,699,347.21	$ 3,699,347.21	$ 3,699,347.21	$ 3,699,347.21	$ 3,699,347.21	$ 3,699,347.21	$ 3,699,347.21	$ 3,699,347.21	$ 3,699,347.21	$ 3,699,347.21	$ 0.00
				1%	0.003%	E		$ 617,850.00	$ 617,850.00															
						%E	0.000%	0.003%	0.003%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
NP-8.9		**$ 1,223,572.00**	**0.006%**	**100.000%**	**0.006%**																			
	DEMOLICION DE POZOS DE INSPECCION 1.45M< H <=1.80M EN LADRILLO	$ 1,223,572.00	0.006%			%P	0.000%	0.000%	0.000%	0.001%	0.000%	0.000%	0.000%	0.001%	0.000%	0.000%	0.001%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
						P				$ 305,893.00				$ 305,893.00			$ 305,893.00					$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
				100%	0.006%	E		$ 1,223,572.00	$ 1,223,572.00	$ 1,223,572.00	$ 1,223,572.00	$ 1,223,572.00	$ 1,223,572.00											
						%E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
NP-8.10		**$ 500,760.00**	**0.002%**	**25.000%**	**0.001%**																			
	CAMARA DE CAIDA DE 8"	$ 500,760.00	0.002%			%P	0.000%	0.000%	0.001%	0.000%	0.000%	0.000%	0.001%	0.000%	0.000%	0.000%	0.001%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
						P			$ 125,190.00				$ 125,190.00				$ 125,190.00					$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
				25%	0.001%	E			$ 125,190.00															
						%E	0.000%	0.000%	0.001%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
NP-8.11		**$ 4,114,400.00**	**0.020%**	**16.667%**	**0.003%**																			
	PERFORACION DE POZO DE REGISTRO PARA ACOMETIDA PROVICIONAL	$ 4,114,400.00	0.020%			%P	0.000%	0.001%	0.000%	0.001%	0.000%	0.001%	0.001%	0.001%	0.000%	0.001%	0.000%	0.001%	0.001%	0.000%	0.000%	0.001%	0.000%	0.000%
						P		$ 205,720.00		$ 308,580.00		$ 308,580.00	$ 308,580.00	$ 308,580.00		$ 308,580.00		$ 308,580.00	$ 308,580.00			$ 308,580.00		$ 0.00
				17%	0.003%	E		$ 685,733.33		$ 685,733.33		$ 685,733.33												
						%E	0.000%	0.003%	0.000%	0.003%	0.000%	0.003%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
NP-8.12		**$ 94,372,681.00**	**0.452%**	**18.919%**	**0.086%**																			
	DESMONTE Y RETIRO DE POSTE DE 7 MT DE TELECOMUNICACIONES (INCLUYE CUADRILLA PARA QUITAR CABLES ELÉCTRICOS SENCILLOS)	$ 94,372,681.00	0.452%			%P	0.045%	0.000%	0.000%	0.045%	0.045%	0.000%	0.000%	0.045%	0.045%	0.000%	0.000%	0.045%	0.045%	0.000%	0.000%	0.045%	0.045%	0.000%
						P	$ 9,437,268.10			$ 9,437,268.10	$ 9,437,268.10			$ 9,437,268.10	$ 9,437,268.10			$ 9,437,268.10	$ 9,437,268.10			$ 9,437,268.10	$ 9,437,268.10	$ 0.00
				19%	0.086%	E	$ 10,202,452.00			$ 17,854,291.00	$ 17,854,291.00													
						%E	0.049%	0.000%	0.000%	0.086%	0.086%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
NP-8.13		**$ 71,012,077.00**	**0.340%**	**0.000%**	**0.000%**																			
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE 7 MT DE TELECOMUNICACIONES (INCLUYE CUADRILLA PARA QUITAR CABLES ELÉCTRICOS SENCILLOS)	$ 71,012,077.00	0.340%			%P	0.000%	0.000%	0.000%	0.043%	0.043%	0.000%	0.000%	0.043%	0.043%	0.000%	0.000%	0.043%	0.043%	0.000%	0.000%	0.043%	0.043%	0.000%
						P				$ 8,876,509.63	$ 8,876,509.63			$ 8,876,509.63	$ 8,876,509.63			$ 8,876,509.63	$ 8,876,509.63			$ 8,876,509.63	$ 8,876,509.63	$ 0.00
						E																		
						%E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
NP-8.14		**$ 35,978,970.00**	**0.172%**	**14.000%**	**0.024%**																			
	REUBICACIÓN DE POSTE DE 7 MT DE TELECOMUNICACIONES (QUITAR POSTE Y QUE UNA CUADRILLA ARME LOS CABLES QUE ESTÁN EN EL POSTE NUEVO)	$ 35,978,970.00	0.172%			%P	0.000%	0.017%	0.000%	0.017%	0.000%	0.017%	0.000%	0.017%	0.000%	0.017%	0.000%	0.017%	0.000%	0.017%	0.000%	0.017%	0.000%	0.000%
						P		$ 3,597,897.00		$ 3,597,897.00		$ 3,597,897.00		$ 3,597,897.00		$ 3,597,897.00		$ 3,597,897.00		$ 3,597,897.00		$ 3,597,897.00		$ 0.00
				14%	0.024%	E	$ 5,037,055.80	$ 5,037,055.80																
						%E	0.024%	0.024%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
						%P							0.0%											
	TOTAL COSTO OBRA	**$ 20,859,773,651.00**	**0%**		**0.17%**	P							$ 967,746,502.77											
						E							$ 776,820,359.13											
						%E							3.9%											
	VALOR PROGRAMADO	**$ 20,847,751,341.41**			**57.15%**	P	**$474,847,109.82**	**$376,765,988.45**	**$637,611,709.58**	**$904,761,312.43**	**$781,287,494.71**	**$856,305,351.25**	**$967,746,502.77**	**$972,601,589.88**	**$993,672,254.74**	**$1,108,147,884.97**	**$993,848,449.21**	**$1,031,065,483.78**	**$1,200,133,790.58**	**$942,788,171.26**	**$957,905,765.56**	**$1,093,719,586.35**	**$694,989,893.94**	**$47,818,055.61**
	VALOR EJECUTADO	**$ 11,914,767,492.79**				E	**$502,398,869.93**	**$559,865,504.39**	**$554,658,127.59**	**$570,326,577.84**	**$576,041,231.34**	**$696,472,457.14**	**$776,820,359.13**	**$770,951,371.50**	**$495,460,720.16**	**$322,977,175.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

INVERSION MENSUAL	PROGRAMADA		11.500%						21.900%					20.800%					17.600%				
			2,393,986,120.28						4,571,613,193.35					4,333,195,608.55					$ 3,737,221,472.715				
	EJECUTADA		10.500%						15.900%					1.500%					0.000%				
			2,187,249,079.75						3,315,746,139.27					322,977,175.97					$ 0.000				
	ACUMULADO PROGRAMADA		39.600%						61.500%					82.300%					99.900%				
			8,205,721,066.80						12,777,334,260.14					17,110,529,868.69					20,847,751,341.41				
	ACUMULADO EJECUTADO		39.300%						55.200%					56.700%					56.700%				
			8,276,044,177.55						11,591,790,316.82					11,914,767,492.79					11,914,767,492.79				
INVERSION SEMANAL	PROGRAMADA		2.300%	1.800%	3.100%	4.300%	3.700%	4.100%	4.600%	4.700%	4.800%	5.300%	4.800%	4.900%	5.800%	4.500%	4.600%	5.200%	3.300%	0.200%				
			$ 474,847,109.82	$ 376,765,988.45	$ 637,611,709.58	$ 904,761,312.43	$ 781,287,494.71	$ 856,305,351.25	$ 967,746,502.77	$ 972,601,589.88	$ 993,672,254.74	$ 1,108,147,884.97	$ 993,848,449.21	$ 1,031,065,483.78	$ 1,200,133,790.58	$ 942,788,171.26	$ 957,905,765.56	$ 1,093,719,586.35	$ 694,989,893.94	$ 47,818,055.61				
	EJECUTADA		2.400%	2.700%	2.700%	2.700%	2.800%	3.300%	3.700%	3.700%	2.400%	1.500%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%				
			$ 502,398,869.93	$ 559,865,504.39	$ 554,658,127.59	$ 570,326,577.84	$ 576,041,231.34	$ 696,472,457.14	$ 776,820,359.13	$ 770,951,371.50	$ 495,460,720.16	$ 322,977,175.97	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00				
INVERSION ACUMULADA	PROGRAMADA		30.400%	32.200%	35.300%	39.600%	43.300%	47.400%	52.000%	56.700%	61.500%	66.800%	71.600%	76.500%	82.300%	86.800%	91.400%	96.600%	99.900%	100.100%				
			$ 6,286,582,056.34	$ 6,663,348,044.79	$ 7,300,959,754.37	$ 8,205,721,066.80	$ 8,987,008,561.50	$ 9,843,313,912.75	$ 10,811,060,415.52	$ 11,783,662,005.40	$ 12,277,334,260.14	$ 13,885,482,145.12	$ 14,879,330,594.33	$ 15,910,396,078.11	$ 17,110,529,868.69	$ 18,053,318,039.95	$ 19,011,223,805.51	$ 20,104,943,391.86	$ 20,799,933,285.80	$ 20,847,751,341.41				
	EJECUTADA		31.200%	33.900%	36.600%	39.300%	42.100%	45.400%	49.100%	52.800%	55.200%	56.700%	56.700%	56.700%	56.700%	56.700%	56.700%	56.700%	56.700%	56.700%				
			$ 6,591,193,967.73	$ 7,151,059,472.12	$ 7,705,717,599.71	$ 8,276,044,177.55	$ 8,852,085,408.90	$ 9,548,557,866.04	$ 10,325,378,225.17	$ 11,096,329,596.66	$ 11,591,790,316.82	$ 11,914,767,492.79	$ 11,914,767,492.79	$ 11,914,767,492.79	$ 11,914,767,492.79	$ 11,914,767,492.79	$ 11,914,767,492.79	$ 11,914,767,492.79	$ 11,914,767,492.79	$ 11,914,767,492.79				


Id	EDT	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**1**		**CALLE 72 ENTRE CARRERA 38 Y CARRERA 60**	**234 días?**	**vie 20/06/25**	**lun 20/04/26**
2	**1.1**		**CALLE 72 ENTRE CARRERA 39 Y CARRERA 41**	**152 días**	**vie 20/06/25**	**sáb 27/12/25**
3	1.1.1		INICIO	1 día	vie 20/06/25	vie 20/06/25
4	1.1.2		Capítulo - Demoliciones	122 días	vie 20/06/25	vie 21/11/25
5	1.1.3		CAPITULO PAVIMENTO	89 días	mié 6/08/25	lun 24/11/25
6	**1.1.4**		**CAPITULO- URBANISMO**	**117 días**	**mié 6/08/25**	**sáb 27/12/25**
7	1.1.4.1		Conformacion	78 días	mié 6/08/25	mar 11/11/25
8	1.1.4.2		Instalacion Losetas	34 días	mar 18/11/25	sáb 27/12/25
9	1.1.5		CAPITULO- REDES DE ALCANTARILLADO	116 días	jue 26/06/25	mié 19/11/25
10	1.1.5.1		ALCANTARILLADO	115 días	jue 26/06/25	mar 18/11/25
11	1.1.5.2		ACUEDUCTO	91 días	mar 29/07/25	mié 19/11/25
12	1.1.6		CAPITULO- SUBTERRANIZACION DE REDES DE TELECOMUNICACIONES	91 días	lun 28/07/25	mar 18/11/25
13	1.1.7		CAPITULO- ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO	15 días	mar 18/11/25	jue 4/12/25
14	1.1.7.1		MEDIA TENSION	15 días	mar 18/11/25	jue 4/12/25
15	1.1.7.2		BAJA TENSION	11 días	mar 18/11/25	sáb 29/11/25
16	1.1.7.3		ILUMINACION	10 días	mar 18/11/25	vie 28/11/25
17	1.1.7.4		SUPLEMENTOS EN TENSION	10 días	mar 18/11/25	vie 28/11/25
18	1.1.7.5		REUBICACIONES Y DESMONTES	11 días	mar 18/11/25	sáb 29/11/25
19	1.1.8		Capítulo - Povisiones	20 días	jue 6/11/25	vie 28/11/25
20	1.2		FIN	1 día	dom 28/12/25	dom 28/12/25
21	**1.3**		**CALLE 72 ENTRE CARRERA 41 Y CARRERA 41B**	**155 días**	**vie 20/06/25**	**mar 30/12/25**
22	1.3.1		INICIO	1 día	vie 20/06/25	vie 20/06/25
23	1.3.2		Capítulo - Demoliciones	106 días	mié 2/07/25	mié 12/11/25
24	1.3.3		CAPITULO PAVIMENTO	56 días	vie 5/09/25	vie 14/11/25
25	**1.3.4**		**CAPITULO- URBANISMO**	**125 días**	**jue 10/07/25**	**vie 12/12/25**
26	1.3.4.1		Conformacion	94 días	jue 10/07/25	jue 6/11/25
27	1.3.4.2		Instalacion Losetas	20 días	jue 20/11/25	vie 12/12/25
28	**1.3.5**		**CAPITULO- REDES DE ALCANTARILLADO**	**69 días**	**mié 2/07/25**	**sáb 27/09/25**
29	1.3.5.1		ALCANTARILLADO	48 días	mié 2/07/25	sáb 30/08/25
30	1.3.5.2		ACUEDUCTO	65 días	lun 7/07/25	sáb 27/09/25
31	1.3.6		CAPITULO- SUBTERRANIZACION DE REDES DE TELECOMUNICACIONES	86 días	lun 7/07/25	vie 24/10/25
32	**1.3.7**		**CAPITULO- ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO**	**35 días**	**jue 20/11/25**	**mar 30/12/25**
33	1.3.7.1		MEDIA TENSION	35 días	jue 20/11/25	mar 30/12/25
34	1.3.7.2		BAJA TENSION	35 días	jue 20/11/25	mar 30/12/25
35	1.3.7.3		ILUMINACION	13 días	jue 20/11/25	jue 4/12/25
36	1.3.7.4		SUPLEMENTOS EN TENSION	35 días	jue 20/11/25	mar 30/12/25
37	1.3.7.5		REUBICACIONES Y DESMONTES	13 días	jue 20/11/25	jue 4/12/25
38	1.3.8		Capítulo - Povisiones	74 días	vie 22/08/25	sáb 22/11/25

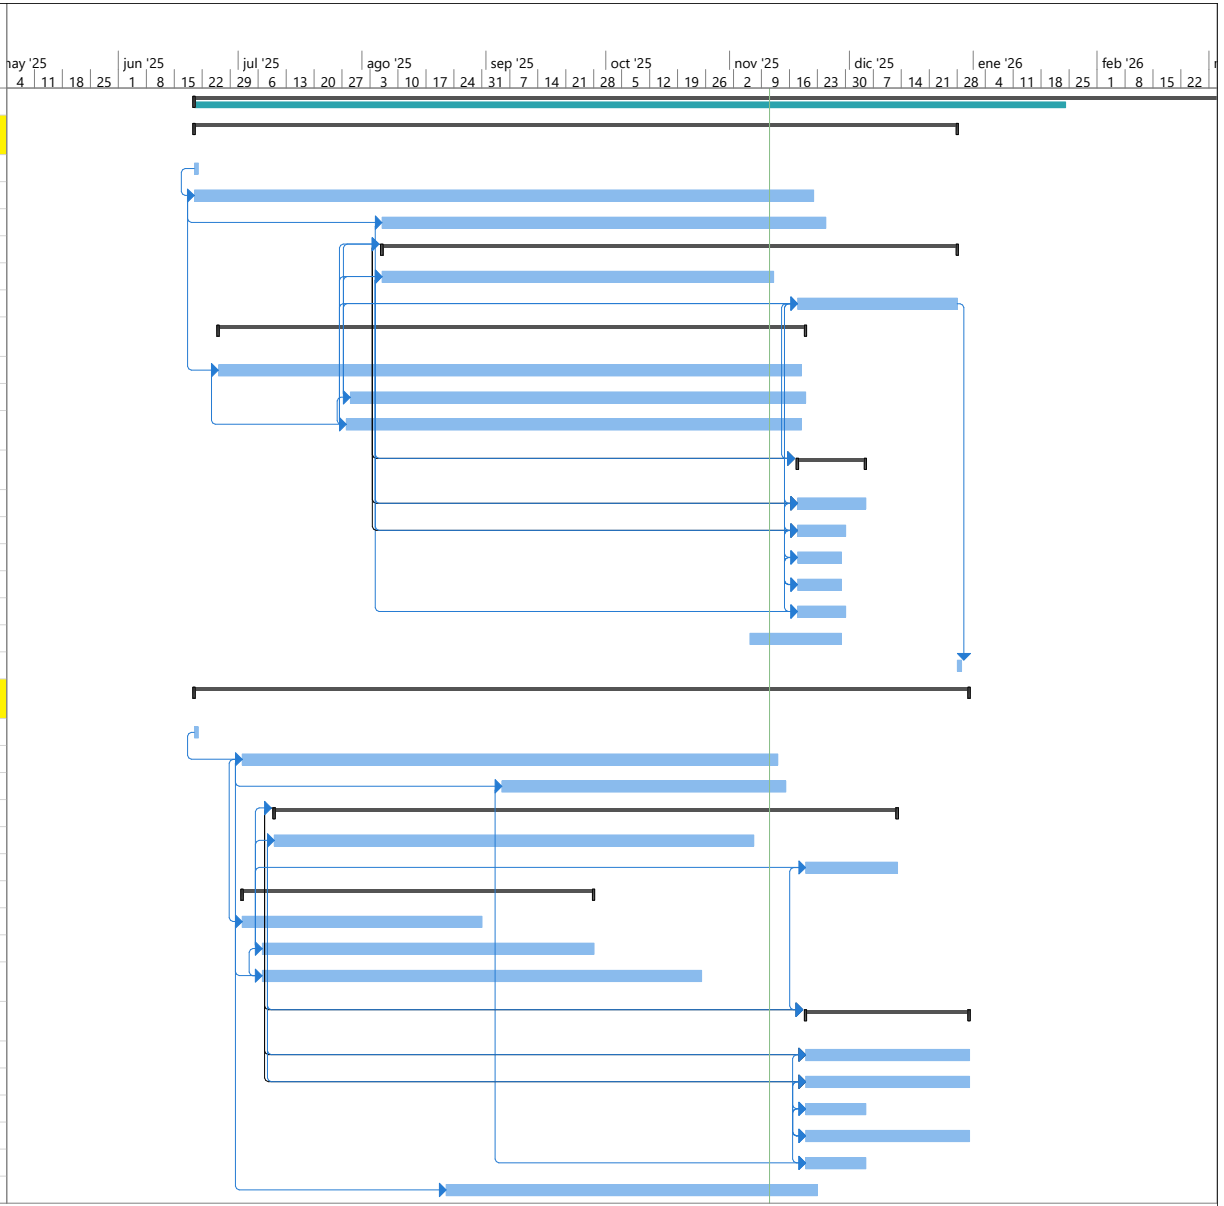

Proyecto: Programacion por Cu
Fecha: mar 11/11/25

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	

Id	EDT	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
39	**1.4**		**CALLE 72 ENTRE CARRERA 41B Y CARRERA 43**	**116 días**	**vie 8/08/25**	**dom 28/12/25**
40	1.4.1		INICIO	1 día	vie 8/08/25	vie 8/08/25
41	1.4.2		Capítulo - Demoliciones	91 días	vie 8/08/25	vie 28/11/25
42	1.4.3		CAPITULO PAVIMENTO	54 días	mar 16/09/25	jue 20/11/25
43	**1.4.4**		**CAPITULO- URBANISMO**	**96 días**	**mar 2/09/25**	**dom 28/12/25**
44	1.4.4.1		Conformacion	62 días	mar 2/09/25	mar 18/11/25
45	1.4.4.2		Instalacion Losetas	30 días	lun 24/11/25	dom 28/12/25
46	1.4.5		CAPITULO- REDES DE ALCANTARILLADO	74 días	lun 18/08/25	mar 18/11/25
47	1.4.5.1		ALCANTARILLADO	74 días	lun 18/08/25	mar 18/11/25
48	1.4.5.2		ACUEDUCTO	56 días	mar 2/09/25	mar 11/11/25
49	1.4.6		CAPITULO- SUBTERRANIZACION DE REDES DE TELECOMUNICACIONES	74 días	lun 18/08/25	mar 18/11/25
50	1.4.7		CAPITULO- ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO	27 días	lun 10/11/25	mié 10/12/25
51	1.4.7.1		MEDIA TENSION	15 días	mar 18/11/25	jue 4/12/25
52	1.4.7.2		BAJA TENSION	15 días	lun 10/11/25	mié 26/11/25
53	1.4.7.3		ILUMINACION	9 días	jue 27/11/25	sáb 6/12/25
54	1.4.7.4		SUPLEMENTOS EN TENSION	15 días	jue 20/11/25	sáb 6/12/25
55	1.4.7.5		REUBICACIONES Y DESMONTES	18 días	jue 20/11/25	mié 10/12/25
56	1.4.8		Capítulo - Povisiones	53 días	mar 2/09/25	vie 7/11/25
57	1.4.9		CERTIFICACIONES Y TRAMITES	1 día	vie 8/08/25	vie 8/08/25
58	1.5		FIN	1 día	sáb 6/12/25	sáb 6/12/25
59	**1.6**		**CALLE 72 ENTRE CARRERA 43 Y CARRERA 44**	**78 días?**	**mié 15/10/25**	**jue 15/01/26**
60	1.6.1		INICIO	1 día	mié 15/10/25	mié 15/10/25
61	1.6.2		Capítulo - Demoliciones	46 días	mar 21/10/25	vie 12/12/25
62	1.6.3		CAPITULO PAVIMENTO	17 días	mar 25/11/25	lun 15/12/25
63	**1.6.4**		**CAPITULO- URBANISMO**	**48 días**	**mié 19/11/25**	**jue 15/01/26**
64	1.6.4.1		Conformacion	30 días	mié 19/11/25	mié 24/12/25
65	1.6.4.2		Instalacion Losetas	40 días	vie 28/11/25	jue 15/01/26
66	1.6.5		CAPITULO- REDES DE ALCANTARILLADO	31 días	vie 24/10/25	vie 28/11/25
67	1.6.5.1		ALCANTARILLADO	27 días	vie 24/10/25	lun 24/11/25
68	1.6.5.2		ACUEDUCTO	28 días	mar 28/10/25	vie 28/11/25
69	1.6.6		CAPITULO- SUBTERRANIZACION DE REDES DE TELECOMUNICACIONES	40 días	vie 24/10/25	mar 9/12/25
70	1.6.7		CAPITULO- ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO			
71	1.6.7.1		MEDIA TENSION	15 días	lun 24/11/25	mié 10/12/25
72	1.6.7.2		BAJA TENSION	15 días	lun 24/11/25	mié 10/12/25
73	1.6.7.3		ILUMINACION	10 días	mar 25/11/25	vie 5/12/25
74	1.6.7.4		SUPLEMENTOS EN TENSION	1 día	lun 24/11/25	lun 24/11/25
75	1.6.7.5		REUBICACIONES Y DESMONTES	4 días	mar 25/11/25	vie 28/11/25
76	1.6.8		Capítulo - Povisiones	1 día	sáb 22/11/25	sáb 22/11/25

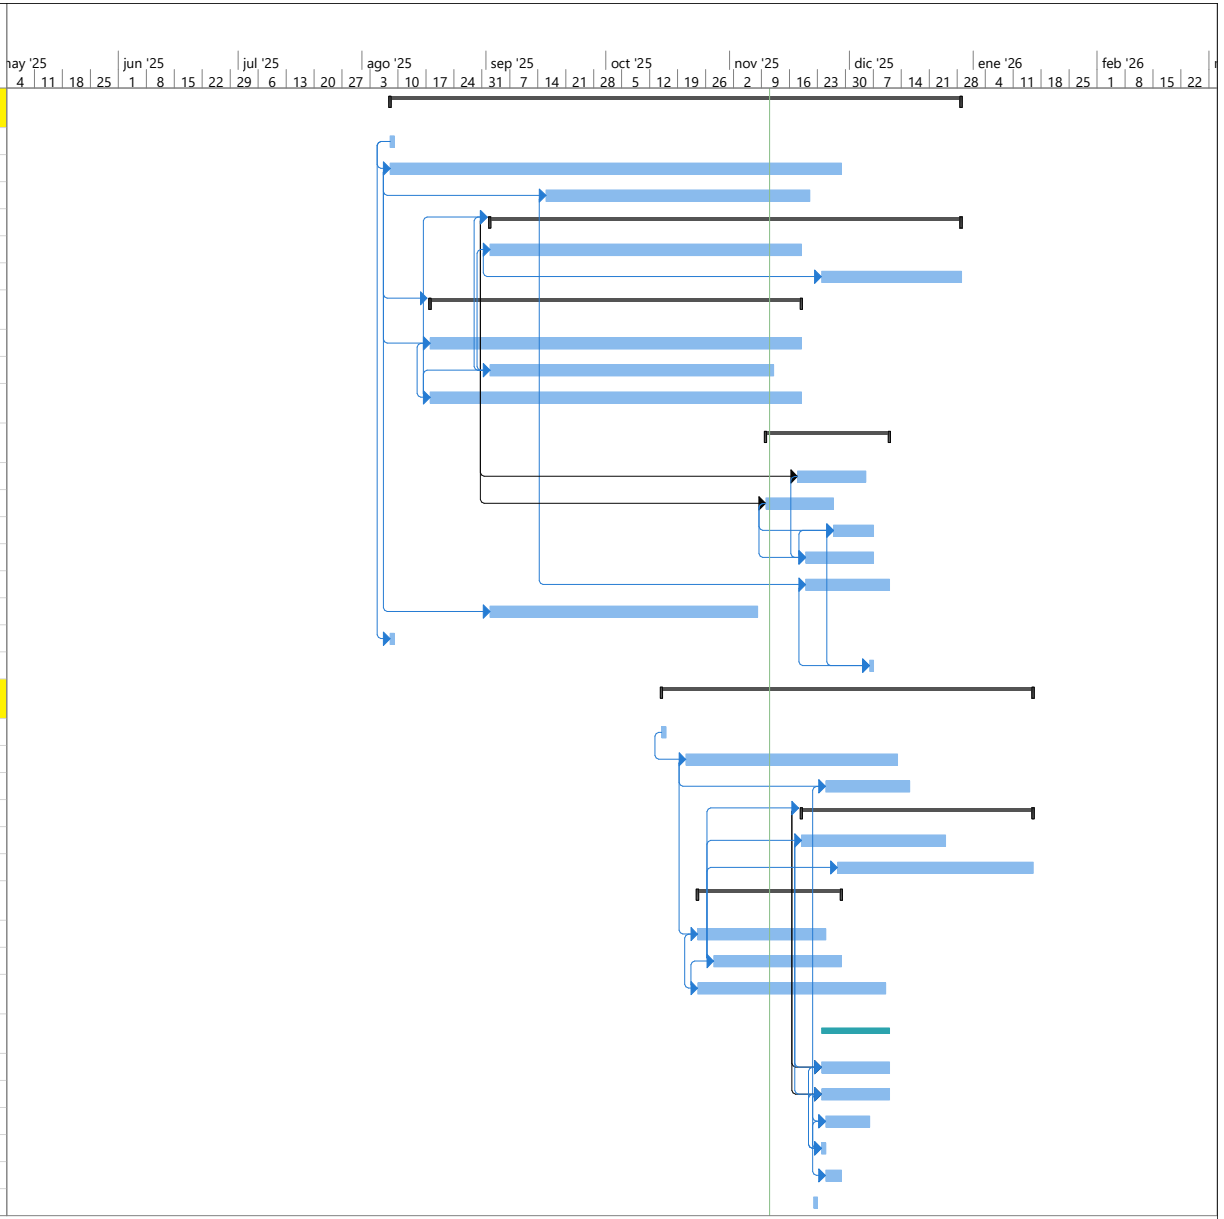

Proyecto: Programacion por Cu
Fecha: mar 11/11/25

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite			
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso			
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual			
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo				


Id	EDT	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
77	1.7		FIN	1 día	sáb 29/11/25	sáb 29/11/25
78	**1.8**		**CALLE 72 ENTRE CARRERA 44 Y CARRERA 46**	**119 días**	**mié 6/08/25**	**lun 29/12/25**
79	1.8.1		INICIO	1 día	mié 6/08/25	mié 6/08/25
80	1.8.2		Capítulo - Demoliciones	84 días	mié 13/08/25	mar 25/11/25
81	1.8.3		CAPITULO PAVIMENTO	73 días	mié 27/08/25	mar 25/11/25
82	**1.8.4**		**CAPITULO- URBANISMO**	**109 días**	**lun 18/08/25**	**lun 29/12/25**
83	1.8.4.1		Conformacion	57 días	lun 18/08/25	mié 29/10/25
84	1.8.4.2		Instalacion de losetas	40 días	jue 13/11/25	lun 29/12/25
85	**1.8.5**		**CAPITULO- REDES DE ALCANTARILLADO**	**54 días**	**lun 22/09/25**	**mar 25/11/25**
86	1.8.5.1		ALCANTARILLADO	54 días	lun 22/09/25	mar 25/11/25
87	1.8.5.2		ACUEDUCTO	52 días	mié 24/09/25	mar 25/11/25
88	**1.8.6**		**CAPITULO SUBTERRANIZACION DE REDES DE TELECOMUNICACIONES**	**58 días**	**lun 18/08/25**	**jue 30/10/25**
89	1.8.6.1		SUBTERRANIZACION DE REDES DE TELECOMUNICACIONES	58 días	lun 18/08/25	jue 30/10/25
90	**1.8.7**		**CAPITULO- ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO**	**96 días**	**mar 26/08/25**	**lun 22/12/25**
91	1.8.7.1		MEDIA TENSION	87 días	mié 3/09/25	vie 19/12/25
92	1.8.7.2		BAJA TENSION	94 días	mar 26/08/25	vie 19/12/25
93	1.8.7.3		ILUMINACION	43 días	sáb 1/11/25	lun 22/12/25
94	1.8.7.4		SUPLEMENTOS EN TENSION	43 días	mié 29/10/25	jue 18/12/25
95	1.8.7.5		REUBICACIONES Y DESMONTES	75 días	mar 23/09/25	lun 22/12/25
96	1.8.7.6		Capítulo - Povisiones	1 día	jue 28/08/25	jue 28/08/25
97	1.8.8		FIN	1 día	lun 22/12/25	lun 22/12/25
98	**1.9**		**CALLE 72 ENTRE CARRERA 46 Y CARRERA 47**	**84 días**	**lun 22/09/25**	**mar 30/12/25**
99	1.9.1		INICIO	1 día	lun 22/09/25	lun 22/09/25
100	1.9.2		Capítulo - Demoliciones	55 días	lun 22/09/25	mié 26/11/25
101	1.9.3		CAPITULO PAVIMENTO	12 días	vie 14/11/25	jue 27/11/25
102	**1.9.4**		**CAPITULO- URBANISMO**	**35 días**	**mié 19/11/25**	**lun 29/12/25**
103	1.9.4.1		Conformacion	20 días	mié 19/11/25	jue 11/12/25
104	1.9.4.2		Instalacion de losetas	20 días	sáb 6/12/25	lun 29/12/25
105	**1.9.5**		**CAPITULO- REDES DE ALCANTARILLADO**	**32 días**	**vie 17/10/25**	**sáb 22/11/25**
106	1.9.5.1		ALCANTARILLADO	32 días	vie 17/10/25	sáb 22/11/25
107	1.9.5.2		ACUEDUCTO	20 días	vie 31/10/25	sáb 22/11/25
108	**1.9.6**		**CAPITULO SUBTERRANIZACION DE REDES DE TELECOMUNICACIONES**	**42 días**	**vie 3/10/25**	**sáb 22/11/25**
109	1.9.6.1		SUBTERRANIZACION DE REDES DE TELECOMUNICACIONES	42 días	vie 3/10/25	sáb 22/11/25
110	**1.9.7**		**CAPITULO- ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO**	**37 días**	**mar 18/11/25**	**mar 30/12/25**
111	1.9.7.1		MEDIA TENSION	10 días	mié 19/11/25	sáb 29/11/25
112	1.9.7.2		BAJA TENSION	10 días	mié 19/11/25	sáb 29/11/25
113	1.9.7.3		ILUMINACION	4 días	mar 25/11/25	vie 28/11/25
114	1.9.7.4		SUPLEMENTOS EN TENSION	10 días	mié 19/11/25	sáb 29/11/25



Proyecto: Programacion por Cu
Fecha: mar 11/11/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	EDT	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
115	1.9.7.5		REUBICACIONES Y DESMONTES	37 días	mar 18/11/25	mar 30/12/25
116	1.9.8		Capítulo - Povisiones	55 días	vie 26/09/25	lun 1/12/25
117	1.9.9		FIN	1 día	mar 30/12/25	mar 30/12/25
118	**1.10**		**CALLE 72 ENTRE CARRERA 54 Y CARRERA 56**	**78 días**	**mié 22/10/25**	**vie 23/01/26**
119	1.10.1		INICIO	1 día	mié 22/10/25	mié 22/10/25
120	1.10.2		Capítulo - Demoliciones	22 días	sáb 25/10/25	mié 19/11/25
121	1.10.3		CAPITULO PAVIMENTO	29 días	lun 27/10/25	vie 28/11/25
122	**1.10.4**		**CAPITULO- URBANISMO**	**71 días**	**mié 29/10/25**	**jue 22/01/26**
123	1.10.4.1		Conformacion	32 días	mié 29/10/25	jue 4/12/25
124	1.10.4.2		Instalacion de losetas	40 días	jue 4/12/25	jue 22/01/26
125	**1.10.5**		**CAPITULO- REDES DE ALCANTARILLADO**	**29 días**	**sáb 25/10/25**	**jue 27/11/25**
126	1.10.5.1		ALCANTARILLADO	24 días	sáb 25/10/25	vie 21/11/25
127	1.10.5.2		ACUEDUCTO	27 días	mar 28/10/25	jue 27/11/25
128	**1.10.6**		**CAPITULO SUBTERRANIZACION DE REDES DE TELECOMUNICACIONES**	**27 días**	**sáb 25/10/25**	**mar 25/11/25**
129	1.10.6.1		SUBTERRANIZACION DE REDES DE TELECOMUNICACIONES	27 días	sáb 25/10/25	mar 25/11/25
130	**1.10.7**		**CAPITULO- ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO**	**35 días**	**mar 28/10/25**	**sáb 6/12/25**
131	1.10.7.1		MEDIA TENSION	30 días	mié 29/10/25	mar 2/12/25
132	1.10.7.2		BAJA TENSION	30 días	mié 29/10/25	mar 2/12/25
133	1.10.7.3		ILUMINACION	8 días	jue 27/11/25	vie 5/12/25
134	1.10.7.4		SUPLEMENTOS EN TENSION	33 días	mié 29/10/25	vie 5/12/25
135	1.10.7.5		REUBICACIONES Y DESMONTES	35 días	mar 28/10/25	sáb 6/12/25
136	1.10.7.6		Capítulo - Povisiones	1 día	lun 1/12/25	lun 1/12/25
137	1.10.8		FIN	1 día	vie 23/01/26	vie 23/01/26
138	**1.11**		**CALLE 72 ENTRE CARRERA 56 Y CARRERA 57**	**85 días**	**jue 18/09/25**	**lun 29/12/25**
139	1.11.1		INICIO	1 día	jue 18/09/25	jue 18/09/25
140	1.11.2		Capítulo - Demoliciones	28 días	vie 19/09/25	vie 24/10/25
141	1.11.3		CAPITULO PAVIMENTO	26 días	mié 24/09/25	sáb 25/10/25
142	**1.11.4**		**CAPITULO- URBANISMO**	**77 días**	**sáb 27/09/25**	**dom 28/12/25**
143	1.11.4.1		Conformacion	43 días	sáb 27/09/25	mar 18/11/25
144	1.11.4.2		Instalacion de losetas	27 días	jue 27/11/25	dom 28/12/25
145	**1.11.5**		**CAPITULO- REDES DE ALCANTARILLADO**	**52 días**	**mar 23/09/25**	**lun 24/11/25**
146	1.11.5.1		ALCANTARILLADO	27 días	mar 23/09/25	sáb 25/10/25
147	1.11.5.2		ACUEDUCTO	48 días	sáb 27/09/25	lun 24/11/25
148	**1.11.6**		**CAPITULO SUBTERRANIZACION DE REDES DE TELECOMUNICACIONES**	**27 días**	**vie 26/09/25**	**mié 29/10/25**
149	1.11.6.1		SUBTERRANIZACION DE REDES DE TELECOMUNICACIONES	27 días	vie 26/09/25	mié 29/10/25
150	**1.11.7**		**CAPITULO- ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO**	**64 días**	**jue 16/10/25**	**lun 29/12/25**
151	1.11.7.1		MEDIA TENSION	15 días	mar 28/10/25	jue 13/11/25

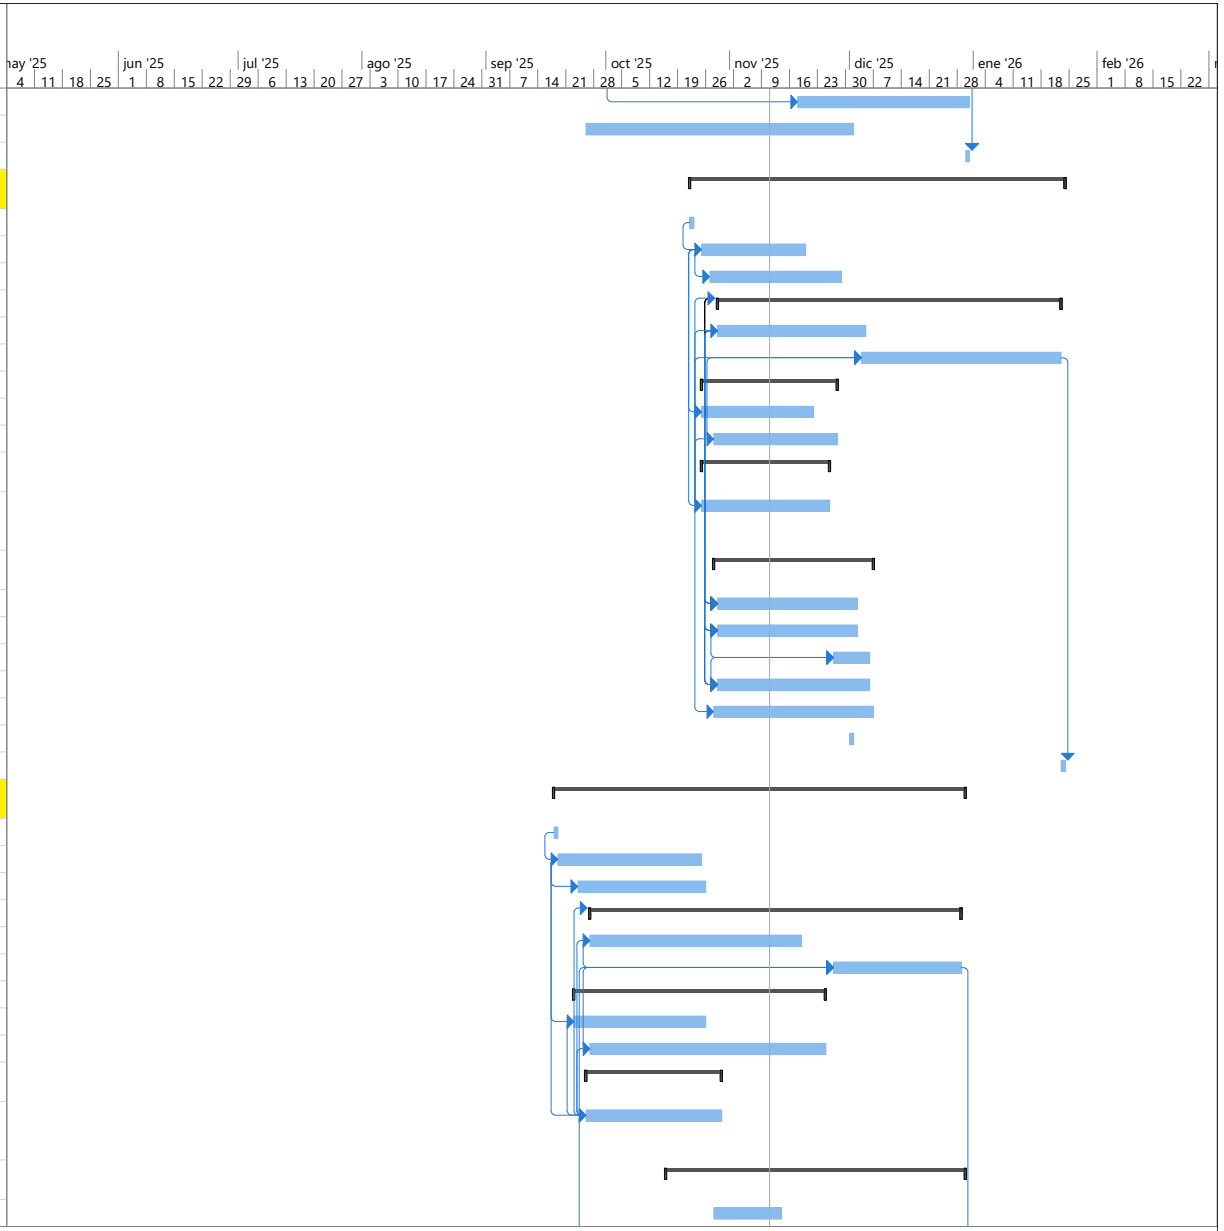

Proyecto: Programacion por Cu
Fecha: mar 11/11/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	EDT	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
152	1.11.7.2		BAJA TENSION	15 días	lun 27/10/25	mié 12/11/25
153	1.11.7.3		ILUMINACION	3 días	mar 11/11/25	jue 13/11/25
154	1.11.7.4		SUPLEMENTOS EN TENSION	15 días	mar 28/10/25	jue 13/11/25
155	1.11.7.5		REUBICACIONES Y DESMONTES	27 días	jue 16/10/25	sáb 15/11/25
156	1.11.7.6		Capítulo - Povisiones	1 día	lun 1/12/25	lun 1/12/25
157	1.11.7.7		FIN	1 día	lun 29/12/25	lun 29/12/25
158	**1.12**		**CALLE 72 ENTRE CARRERA 57 Y CARRERA 58**	**126 días**	**mié 30/07/25**	**mié 31/12/25**
159	1.12.1		INICIO	1 día	mié 30/07/25	mié 30/07/25
160	1.12.2		Capítulo - Demoliciones	83 días	lun 4/08/25	vie 14/11/25
161	1.12.3		CAPITULO PAVIMENTO	84 días	vie 15/08/25	jue 27/11/25
162	**1.12.4**		**CAPITULO- URBANISMO**	**89 días**	**lun 15/09/25**	**mar 30/12/25**
163	1.12.4.1		Conformacion	76 días	lun 15/09/25	mar 16/12/25
164	1.12.4.2		Instalacion de losetas	19 días	mar 9/12/25	mar 30/12/25
165	**1.12.5**		**CAPITULO- REDES DE ALCANTARILLADO**	**89 días**	**lun 4/08/25**	**vie 21/11/25**
166	1.12.5.1		ALCANTARILLADO	64 días	lun 4/08/25	jue 23/10/25
167	1.12.5.2		ACUEDUCTO	84 días	sáb 9/08/25	vie 21/11/25
168	**1.12.6**		**CAPITULO SUBTERRANIZACION DE REDES DE TELECOMUNICACIONES**	**59 días**	**sáb 9/08/25**	**jue 23/10/25**
169	1.12.6.1		SUBTERRANIZACION DE REDES DE TELECOMUNICACIONES	59 días	sáb 9/08/25	jue 23/10/25
170	**1.12.7**		**CAPITULO- ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO**	**44 días**	**vie 10/10/25**	**lun 1/12/25**
171	1.12.7.1		MEDIA TENSION	15 días	lun 13/10/25	mié 29/10/25
172	1.12.7.2		BAJA TENSION	15 días	lun 13/10/25	mié 29/10/25
173	1.12.7.3		ILUMINACION	9 días	mar 28/10/25	jue 6/11/25
174	1.12.7.4		SUPLEMENTOS EN TENSION	22 días	lun 13/10/25	jue 6/11/25
175	1.12.7.5		REUBICACIONES Y DESMONTES	26 días	vie 10/10/25	lun 10/11/25
176	1.12.7.6		Capítulo - Povisiones	1 día	lun 1/12/25	lun 1/12/25
177	1.12.8		FIN	1 día	mié 31/12/25	mié 31/12/25
178	**1.13**		**CALLE 72 ENTRE CARRERA 58 Y CARRERA 59**	**144 días**	**mar 1/07/25**	**vie 26/12/25**
179	1.13.1		INICIO	1 día	mar 1/07/25	mar 1/07/25
180	1.13.2		Capítulo - Demoliciones	113 días	jue 3/07/25	vie 21/11/25
181	1.13.3		CAPITULO PAVIMENTO	93 días	jue 17/07/25	mar 11/11/25
182	**1.13.4**		**CAPITULO- URBANISMO**	**111 días**	**lun 11/08/25**	**jue 25/12/25**
183	1.13.4.1		Conformacion	74 días	lun 11/08/25	mar 11/11/25
184	1.13.4.2		Instalacion de losetas	35 días	vie 14/11/25	jue 25/12/25
185	**1.13.5**		**CAPITULO- REDES DE ALCANTARILLADO**	**91 días**	**sáb 5/07/25**	**mié 29/10/25**
186	1.13.5.1		ALCANTARILLADO	58 días	sáb 5/07/25	mié 17/09/25
187	1.13.5.2		ACUEDUCTO	64 días	sáb 9/08/25	mié 29/10/25
188	**1.13.6**		**CAPITULO SUBTERRANIZACION DE REDES DE TELECOMUNICACIONES**	**59 días**	**sáb 9/08/25**	**jue 23/10/25**

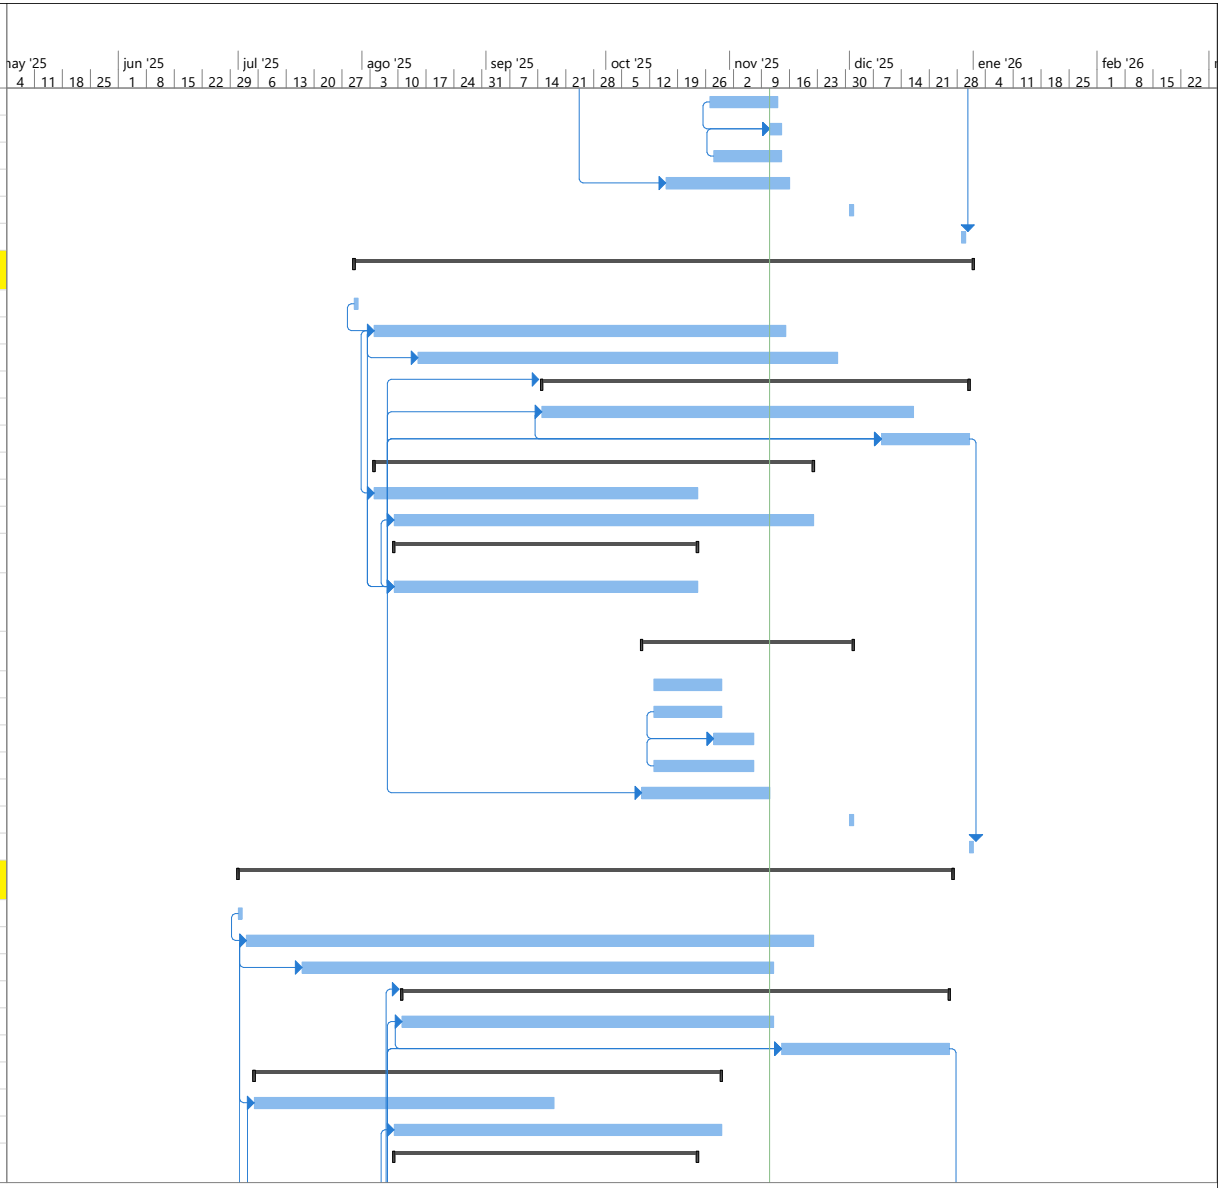

Proyecto: Programacion por Cu
Fecha: mar 11/11/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	EDT	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
189	1.13.6.1		SUBTERRANIZACION DE REDES DE TELECOMUNICACIONES	59 días	sáb 9/08/25	jue 23/10/25
190	**1.13.7**		**CAPITULO- ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO**	**111 días**	**mar 12/08/25**	**vie 26/12/25**
191	1.13.7.1		MEDIA TENSION	15 días	jue 25/09/25	mar 14/10/25
192	1.13.7.2		BAJA TENSION	15 días	jue 25/09/25	mar 14/10/25
193	1.13.7.3		ILUMINACION	7 días	sáb 27/09/25	lun 6/10/25
194	1.13.7.4		SUPLEMENTOS EN TENSION	35 días	jue 25/09/25	jue 6/11/25
195	1.13.7.5		REUBICACIONES Y DESMONTES	45 días	mar 12/08/25	mié 8/10/25
196	1.13.7.6		Capítulo - Povisiones	1 día	lun 1/12/25	lun 1/12/25
197	1.13.7.7		FIN	1 día	vie 26/12/25	vie 26/12/25
198	**1.14**		**CALLE 72 ENTRE CARRERA 59 Y CARRERA 60**	**147 días**	**vie 20/06/25**	**lun 22/12/25**
199	1.14.1		INICIO	1 día	vie 20/06/25	vie 20/06/25
200	1.14.2		Capítulo - Demoliciones	130 días	vie 20/06/25	lun 1/12/25
201	1.14.3		CAPITULO PAVIMENTO	30 días	vie 20/06/25	mar 29/07/25
202	**1.14.4**		**CAPITULO- URBANISMO**	**145 días**	**mar 24/06/25**	**lun 22/12/25**
203	1.14.4.1		Conformacion	119 días	mar 24/06/25	jue 20/11/25
204	1.14.4.2		Instalacion de losetas	35 días	mar 11/11/25	lun 22/12/25
205	**1.14.5**		**CAPITULO- REDES DE ALCANTARILLADO**	**35 días**	**vie 20/06/25**	**mar 5/08/25**
206	1.14.5.1		ALCANTARILLADO	35 días	vie 20/06/25	mar 5/08/25
207	1.14.5.2		ACUEDUCTO	30 días	lun 23/06/25	mié 30/07/25
208	**1.14.6**		**CAPITULO SUBTERRANIZACION DE REDES DE TELECOMUNICACIONES**	**25 días**	**lun 23/06/25**	**jue 24/07/25**
209	1.14.6.1		SUBTERRANIZACION DE REDES DE TELECOMUNICACIONES	25 días	lun 23/06/25	jue 24/07/25
210	**1.14.7**		**CAPITULO- ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO**	**109 días**	**vie 20/06/25**	**jue 6/11/25**
211	1.14.7.1		MEDIA TENSION	15 días	jue 25/09/25	mar 14/10/25
212	1.14.7.2		BAJA TENSION	15 días	jue 25/09/25	mar 14/10/25
213	1.14.7.3		ILUMINACION	7 días	sáb 27/09/25	lun 6/10/25
214	1.14.7.4		SUPLEMENTOS EN TENSION	35 días	jue 25/09/25	jue 6/11/25
215	1.14.7.5		REUBICACIONES Y DESMONTES	45 días	mar 12/08/25	mié 8/10/25
216	1.14.7.6		Capítulo - Povisiones	1 día	vie 20/06/25	vie 20/06/25
217	1.14.8		FIN	1 día	lun 1/12/25	lun 1/12/25

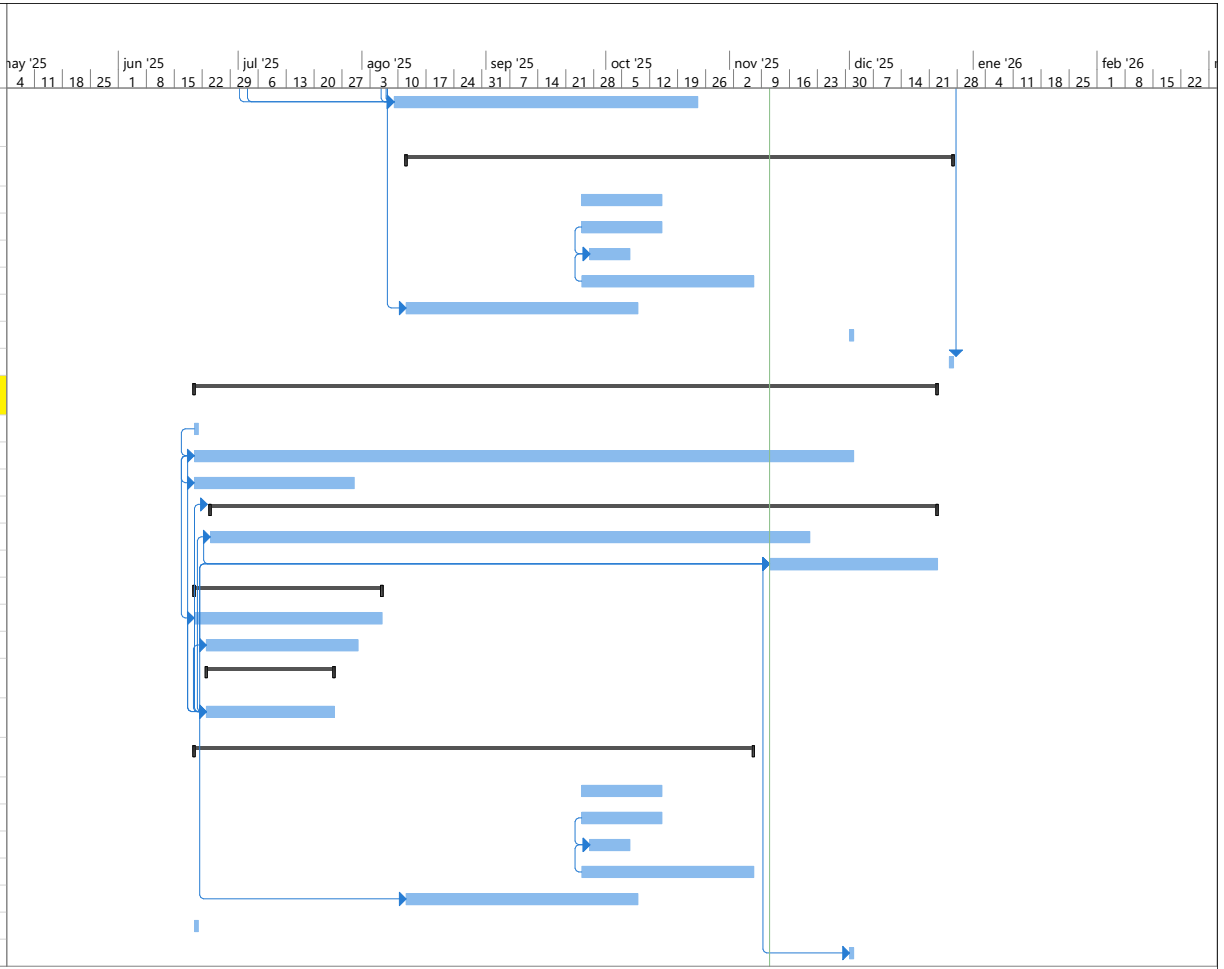

Proyecto: Programacion por Cu
Fecha: mar 11/11/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

LOGO DEL CONTRATISTA	INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL	Formato	15
		Versión	2
		Fecha	6/05/2022

Informe No	7	**Periodo**	03 de octubre al 03 de noviembre	**Proyecto**	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA,
Contrato de obra	LP-024-2024	**Contratista**	CONSORCIO URBABO L.P		

1. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS SST



Foto 1	DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS




Foto 2	SEÑALIZACION DE OBRA



Foto 3	FUNDIDA DE PLACA



Foto 4	USO CORRECTO DE EPP



Foto 5	INSTALACION DE RIELES



Foto 6	INSPECCION DE BOTIUIN



Foto 7	PALETERAS



Foto 8	ENTREGA DE EPP



Foto 9	EXCAVACION MANUAL



Foto 10	TRABAJO TOPOGRAFICO



Foto 11	INSTALACION DE TUBERIA



Foto 12	CHARLA DE SST

2. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS AMBIENTALES



Foto 1	CAPACITACIÓN AMBIENTAL



Foto 2	KIT ANTI DERRAME EN OBRA



Foto 3	CUBRIMIENTO DE MATERIAL EN OBRA



Foto 4	PROTECCIÓN COBERTURA ARBOREA



Foto 5	CAMPAMENTO EN OBRA




Foto 6	MAQUINARIA EN OBRA

LOGO DEL CONTRATISTA	INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL	Formato	15
		Versión	2
		Fecha	6/05/2022

Informe No	7	**Periodo**	03 de octubre al 03 de noviembre	**Proyecto**	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA,
Contrato de obra	LP-024-2024	**Contratista**	CONSORCIO URBABO L.P		



Foto 7	UNIDAD SANITARIA EN OBRA



Foto 8	ORDEN Y ASEO



Foto 9	PUNTO ECOLOGICO



Foto 10	MANEJO DE RCD EN OBRA



Foto 11	INGRESO DE MATERIALES PETREOS A OBRA

Foto 12	

2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES SST DESARROLLADAS

2.1 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

2.1.1 MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS

No	Peligros Identificados	Nivel de Riesgo	Controles Aplicados
1	FÍSICO: Ruido: Generado por los equipos en funcionamiento.	150	Charlas de seguridad sobre prevención del riesgo por exposición a ruidos.
2	BIOMECÁNICO: Esfuerzos: Manipulación de herramientas y materiales.	480	Asegurar la realizacion de pausas activas, fomentar el autocuidado,programa de prevencion osteomuscular , analisis de puestos de trabajo.
3	CONDICIONES DE SEGURIDAD: Accidente de tránsito (accidentes por viajes de desplazamiento a los centros de trabajo, maniobras de maquinaria).	600	Fomento del autocuidado, señalización del área de circulación.
4	CONDICIONES DE SEGURIDAD (Público: Robos, Atracos, Asaltos)	600	Capacitación sobre riesgo público (concientización del personal), Fomento del autocuidado.
5	CONDICIONES DE SEGURIDAD (Mecánico: Manejo inadecuado de Herramientas manuales - herramientas de trabajo).	150	Charla sobre autocuidado, inspecciones de seguridad y charlas de seguridad al personal.
6	CONDICIONES DE SEGURIDAD (Mecánico: Operación de maquinaria pesada, Grúa, Camiones, etc.) Operación del vehículo.	1140	Capacitación al trabajador sobre la operación segura de maquinaria pesada, fomento del autocuidado.
7	QUÍMICO: Material Particulado: polvos inorgánicos residuos de la construcción u obra	100	Fomentar el autocuidado, Capacitación sobre el uso seguro de sustancias químicas.
8	PSICOSOCIAL : Características de la organización del trabajo: Comunicación con el personal, demandas de liderazgo, organización del trabajo.	200	Implementar talleres de prevención estrés laboral, actividades con comité de convivencia laboral.
9	BIOLOGICO: Virus: propios del ambiente en general.	200	Jornadas de vacunacion
10	FENOMENOS NATURALES: Inumdaciones, fuertes lluvias, tormentas electricas.	450	Plan de emergencias y contingencias, entrenamiento en temas de plan de emergencias.
11	FENOMENOS NATURALES: Precipitaciones: Lluvias torrenciales.	50	Protocolos para actuar en caso de lluvias e inundaciones.
12	FISICO: Iluminación: Luz visible en exceso (Luz solar directa)	150	Plan de mantenimiento de infraestructura, Planeación de estudios de iluminación, visiometrias en exámenes médicos, Realización de pausas activas.
13	FISICO: Temperaturas extremas: exposición a luz solar directa.	300	Charlas sobre autocuidado.
14	CONDICIONES DE SEGURIDAD: Locativo: Superficies de Trabajo irregulares, deslizantes, con desnivel	100	Orden y aseo de las instalaciones, inspecciones locativas de seguridad, fomento del autocuidado, charlas de seguridad al personal, señalización
15	CONDICIONES DE SEGURIDAD: Accidente de Tránsito	2400	Capacitaciones en seguridad vial.
16			
Riesgo promedio dentro de la obra		**471.3333333**	

LOGO DEL CONTRATISTA	**INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL**	Formato	15
		Versión	2
		Fecha	6/05/2022

Informe No 7 **Periodo** 03 de octubre al 03 de noviembre **Proyecto** OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA,

Contrato de obra LP-024-2024 **Contratista** CONSORCIO URBABO L.P

No	Descripción de las principales actividades realizadas dentro del plan de emergencias de la obra	Fecha		
1	Se instalo Botiquin de primeros auxilios en los dierentes frentes de obra			
2	se instalo camilla para el traslado de lecionado	15	9	2025
3	Se instalo Extintor Multiproposito de 20 LB en los dierentes frentes de obra	15	9	2025
4		15	9	2025
5				
6				
7				
9				
10				
15				

2.1.2 PERSONAL EN OBRA

EMPRESA	Numero de empleados al finalizar el periodo											
		2025				2025						
	PERIODO 6 (3 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE											
CONSORCIO URBANO LP	27											
CABASCO	7											
LOPEQUIPO	3											
CANTILEVER	10											
ORLANDO CONTRERA MANTILLA	13											
MAURO PINO	8											
UNION TEMPORAL CINOG	1											
PACHECO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	23											
GERENCIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	4											
V Y G INGENIERIA	1											
SKY GLOBAL	17											
Total empleados en el proyecto	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total horas hombre de exposición		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Horas hombre acumulada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.1.3. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

Fecha			Tipo de actividad	Tema	No asistentes	Responsable
7	10	2025	Charlas de seguridad	Ergonomia	8	CLARA DIAZ
11	10	2025	Charlas de seguridad	Cambios de temperaturas	8	CLARA DIAZ
17	10	2025	Charlas de seguridad	uso de EPP	4	CLARA DIAZ
21	10	2025	Charlas de seguridad	seguridad vial ARL SURA	12	CLARA DIAZ
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
			Promedio de asistencia		3	

2.1.4 SEGURIDAD EN OBRA

Análisis de Seguridad en el Trabajo

Fecha			Lugar	Descripción de la tarea	Responsable
6/10/2025	al	11/10/2025	calle 72 avenida shakira	traslado de mainaria	CLARA DIAZ I
			calle 72 avenida shakira	excavacion manual	CLARA DIAZ I
			calle 72 avenida shakira	fundida	CLARA DIAZ I
			calle 72 avenida shakira	traslado e instalacion de rieles	CLARA DIAZ I
			calle 72 avenida shakira	operador de bobcat	
			calle 72 avenida shakira	operador de miniexcavadora	CLARA DIAZ I
				Orden y aseo de obra engeneral	
			calle 72 avenida shakira	topografia	CLARA DIAZ I
14--10-25	al	18/10/2025	calle 72 avenida shakira	operador de bobcat	CLARA DIAZ I
			calle 72 avenida shakira	Auxiliar de trafico	CLARA DIAZ I
			calle 72 avenida shakira	topografia	CLARA DIAZ I
			calle 72 avenida shakira	Orden y aseo de obra engeneral	CLARA DIAZ I
			calle 72 avenida shakira	operador de miniexcavadora	
			calle 72 avenida shakira	excavacion manual	
			calle 72 avenida shakira	traslado e instalacion de rieles	
			calle 72 avenida shakira		CLARA DIAZ I
20/10/2025	al	25/10/2025	calle 72 avenida shakira	topografia	CLARA DIAZ I
			calle 72 avenida shakira	Orden y aseo de obra engeneral	CLARA DIAZ I
			calle 72 avenida shakira	operador de bobcat	CLARA DIAZ I
			calle 72 avenida shakira	operador de miniexcavadora	CLARA DIAZ I
			calle 72 avenida shakira	traslado e instalacion de rieles	CLARA DIAZ I
			calle 72 avenida shakira	fundida	
				excavacion manual	
				traslado de maquinaria	
27/10/2025	al	1/11/2025	calle 72 avenida shakira	operador de miniexcavadora	CLARA DIAZ I
			calle 72 avenida shakira	operador de bobcat	CLARA DIAZ
			calle 72 avenida shakira	traslado e instalacion de rieles	CLARA DIAZ I
			calle 72 avenida shakira	excavacion manual	CLARA DIAZ
			calle 72 avenida shakira		

Trabajo en altura. Certificación de trabajo en altura

Lugar	Nombre del trabajador	No de Cedula	Empresa	Vigencia	No de Registro	Recomendaciones Medicas
PARA EL PERIODO NO SE REALIZARON TRABAJOS EN ALTURA.						

Permisos de trabajo de alto riesgo

Fecha	Lugar	Actividad	Tarea de Alto Riesgo	Nombre del trabajador	Inspector SST certificado

LOGO DEL CONTRATISTA	**INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL**	Formato	15
		Versión	2
		Fecha	6/05/2022

Informe No	7	**Periodo**	03 de octubre al 03 de noviembre	**Proyecto**	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA,
Contrato de obra	LP-024-2024	**Contratista**	CONSORCIO URBABO L.P		

Entrega de elementos de seguridad

Elemento	Unidad	Cantidad	Observaciones
Guantes	par	71	
Botas dieléctricas	par	0	
Gafas	und	46	
casco	Unidad	6	
pantalon	Unidad	7	
camisa	Unidad	3	
tapaboca	und	15	
protector auditivo	unid	1	
guante plastico	par	11	

Fecha	Lugar	Inspección Herramientas, Equipos y Maquinaria	Hallazgos
21/10/2025	avenida sakira	inspeccion de botiquin	ninguno
21/10/2025	avenida sakira	inspeccion de camilla	ninguno
7/10/2025	avenida sakira	inspeccion de EPP	ninguno
10/10/2025	avenida sakira	inspeccion de extintor	ninguno
20/10/2025	avenida sakira	inspeccion de conteccion de derrame	ninguno
20-10-25 al 25-10-25	avenida sakira	inspeccion de pajarita	ninguno
06-10-25 al 11-10-25 27-10-25 al 01-11-25	avenida sakira	inspeccion de planta electrica	ninguno
06-10-25 al 11-10-25 27-10-25 al 01-11-25	avenida sakira	inspeccion de taladro	ninguno
06-10-25 al 01-111-25	avenida sakira	inspeccion de bobcat	ninguno
06-10-25 al 01-111-25	avenida sakira	inspeccion de miniexcavadora	ninguno

9. COPASST y/o Vigia

17/09/2025	Reunion CCL	herramients para tener ambientes de trabajo saludables			
17/09/2025	Reunion COPASST	deberes y derechos de los trabajadores			

2.2.1 SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

EPS		FONDO DE PENSIONES		A.R.L.			
Razón social	Cant. Trab	Razón social	Cant. Trab	Razón social	Cant. Trab		
mutual ser	18	colfondos	5	sura	80		
salud total	27	porvenir	69	colpatria	0		
sanitas	6	proteccion	22	axa colpatria	17		
coosalud	12	colpensiones	17	positiva	3		
cajacopi	12	no aplica	1	colmena	14		
famisanar	1		0				
sura	16						
nueva eps	21						
EPS familiar de colombia	1						
Emp prom de salud indigena	0						
compensar							
EPS familiar de colombia	0						
eps-s cajacopi							
fosyga nueva eps-regimen movilidad							
vacias							
TOTAL	114	TOTAL	114	TOTAL	114	TOTAL	0

2.3 ESTADISTICAS DE ACCIDENTALIDAD

INDICADORES	TOTAL	PERIODO 4											
# de (FAT) Fatalidad	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
# de (HiPo) Accidente Alto Potencial	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
# de (LTI) Lesiones con Tiempo perdido	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
# de (RTA) Accidente vial/ transito	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
# de (AWPD) Accidente con daño a la propiedad	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
# de (EA) Accidente Ambiental	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
# de (NM) Incidente	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
# de Investigaciones de Incidentes	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LOGO DEL CONTRATISTA	**INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL**	Formato	15
		Versión	2
		Fecha	6/05/2022

Informe No 7 **Periodo** 03 de octubre al 03 de noviembre **Proyecto** OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA,

Contrato de obra LP-024-2024 **Contratista** CONSORCIO URBABO L.P

# de Investigaciones de Accidentes Laborales		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
# de Investigaciones de Enfermedad Laboral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
# de dias perdidos por AT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frecuencia de accidentalidad		0.0%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0
Severidad accidentalidad		0.0%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0
Indice de Lesion Incapacitante ILI		0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0
Prevalencia de Enfermedad Laboral		0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0
Incidencia de la Enfermedad Laboral		0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0
# de dias por Incapacidad laboral o Enfermedad comun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausentismo por Causa Medica	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0	0	0

2.4 SENALIZACION PLAN MANEJO DE TRAFICO

Descripción	TOTAL	PERIODO 2 (3 AL 3DE JUNIO	PERIODO 3 (3 JUNIO AL 3DE	PERIODO 4									
Señales Preventivas	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Señales Informativas	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Señales Reglamentarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Canalizadores de Transitorias	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Señales Institucionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.5. VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Lugar	Automotor	Placa	Modelo	Marca	Serie	Vencimiento SOAT	Vencimiento Tecno-Mecanica	Recolección y Transporte RCD
CA 72 avenida shakira	Mini- Cargador	N/A	2018	BOBCAT	B42812249	N/A	N/A	X
CA 72 avenida shakira	Compactador	N/A	2006	MULTIKIP	120507	N/A	N/A	X
CA 72 avenida shakira	Volqueta	SBV098	1995	KODIAK 156	CM95304819	14/03/2026	20/03/2026	X
CA 72 avenida shakira	Volqueta	GYK956	1984	CHEVROLET	BM452803	2/09/2025	2/09/2025	X
CA 72 avenida shakira	Volqueta	QGI737	1981	CHEVROLET	CM003902	17/02/2026	23/03/2026	X
CA 72 avenida shakira	Volqueta	GCD 990	1960	FORD	F60D0E33897	18/05/2026	9/02/2026	X
CA 72 avenida shakira	Mini- Cargador	N/A	2019	CATERPILLAR	CATO236DPF9C00503	N/A	N/A	X
CA 72 avenida shakira	Mini- Excavadora	N/A	2023	CATERPILLAR	CAT3055CG2501300	N/A	N/A	X
CA 72 avenida shakira	Mini- Cargador	N/A	2018	BOBCAT	B42812218	N/A	N/A	X
CA 72 avenida shakira	Mini- Excavadora	N/A	2016	HYUNDAY	HHKHMH03CG0001299	N/A	N/A	X
CA 72 avenida shakira	Retroexcavadora	N/A	2022	SANY	SY007SCC09258	N/A	N/A	X
CA 72 avenida shakira	Volqueta	EUW917	1998	CHEVROLET	9GD3CBMD7WB980712	31/08/2025	9/03/2025	X
CA 72 avenida shakira	Volqueta	WAA138	196'0	FORD	F6000E24889	22/03/2026	24/03/2026	X
CA 72 avenida shakira	Volqueta	CHC883	1990	CHEVROLET	CMA05816	26/05/2026	26/05/2026	X
CA 72 avenida shakira	Volqueta	RCD754	1977	DODGE	DT637609	14/11/2025	14/11/2025	X
CA 72 avenida shakira	Volqueta	UVT 712	1994	CHEVROLET		18/12/2025	18/12/2025	X
CA 72 avenida shakira	Volqueta	IND914	1981	CHEVROLET		3/04/2026	4/04/2026	X
CA 72 avenida shakira	Volqueta	NMA006	1961	INTERNATIONAL		19/07/2026	19/03/2026	X
CA 72 avenida shakira	Volqueta	OMG548	1989	CHEVROLET	CM906909	12/12/2025	13/12/2025	X
CA 72 avenida shakira	Retropajarita	N/A	2019	CATERPILLAR	CAT0416FLLBFF06937	N/A	N/A	X
CA 72 avenida shakira	Mini Excadora	N/A	2003	TEREX	358/ 3758	N/A	N/A	X
CA 72 avenida shakira	Minicargador	N/A	2014	CASE	JAFSR250CEM478620	N/A	N/A	X
CA 72 avenida shakira	Minicargador	N/A	2018	BOBCAT	B42812178	N/A	N/A	X
CA 72 avenida shakira	Retro excavadora	N/A	2012	CATERPILLAR	CAT0420FIJWJ0022	N/A	N/A	X
CA 72 avenida shakira	Minicargador	N/A	2013	CATERPILLAR	CAT0236BCA9H03959	N/A	N/A	X

3. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES DESARROLLADAS

3.1 CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES

3.1.1 FUENTES DE MATERIALES

No	Tipo de material	Proveedor	Acto Administrativo Ambiental	Vigencia	Título minero
1	Materiales Petreos	CANTERA LOS MANGUITO	LICENCIA AMBIENTAL N° 0000 851 POR CRA	6/11/2048	No. PBQ-16021
2	Materiales Petreos	CANTERAS MUNARRIZ	RESOLUCIÓN 000312 DEL 2003 CRA	28/01/2033	RM- GFQE-01

3.1.2 GESTORES EXTERNOS PRESTADORES DE SERVICIOS (Gestores aseo de baños, manejo de residuos sólidos, Respel, RCD, y otros)

No	Empresa	Actividad	Acto Administrativo Ambiental	Vigencia	Entidad otorgante
1	ESCOMBRERA EL TRIUNFO	Disposición Final de RCD	Resolución N°0000701 del 2021	29/08/2027	CRA
2	ESCOMBRERA ROYAL INGENIERIA	Disposición Final de RCD	Resolución 1463 del 12 de agosto del 2024	12/08/2025	Barranquilla Verde
3	ECONORTE EN CONVENIO CON MAKEN	Disposición Final de Residuos Liquidos- Unidad Sanitaria	Resolución 0080 del 16 de enero del 2019	19/01/2026	Barranquilla Verde
4	LADRILLERA BARRANQUILLA	Disposición Final de RCD	Resolucion 1387 de septiembre del 2016	Durante la ejecución del proyecto	DAMAB

LOGO DEL CONTRATISTA	**INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL**	Formato	15
		Versión	2
		Fecha	6/05/2022

Informe No 7 **Periodo** 03 de octubre al 03 de noviembre **Proyecto** OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA,

Contrato de obra LP-024-2024 **Contratista** CONSORCIO URBABO L.P

3.1.3 ACTOS ADMINISTRIVOS A NOMBRE DEL CONTRATISTA (Autorización de tala/poda, concesión de aguas, permiso de vertimientos y otros)

Tipo de permiso	Acto Administrativo Ambiental	Entidad otorgante	Medida compensatoria
APROVECHAMIENTO FORESTAL	Resolución N°2818 del 29 de julio del 2025	Barranquilla Verde	Siembra de Arboles

3.1.4 AUTORIZACIONES PMT

No de permiso	Vía a cerrar	Fecha de vencimiento		
SM-CVO-20250428-26295 EV- AAB YCR	CALLE 72 ENTRE CRA54 Y CRA 60	31	12	25
SM-CVO-20250331-26130 EV- AAB MGA YCR	CALLE 72 ENTRE CRA46Y CRA 54	31	12	25
SMCV0-20250708-26728-	CALLE72 ENTRE CR38 Y 43	31	12	25
SM-CVO-20250728-26866	CALLE 72 ENTRE ARRERA 43 Y 46	31	12	25

3.2 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, LIQUIDOS Y PELIGROSOS

TIPO DE RESIDUOS		TOTAL	PERIODO 1 (3 abril al 3 mayo	PERIODO 2 (3 mayo al 03 jun	PERIODO 3(3 jun al 03 jul	PERIODO 4 (3 jul al 03 agos	PERIODO 5(3 agos al 03 sep	PERIODO 6 (3 sep al 03 oct	PERIODO 7 (3 0ct al 03 nov	PERIODO 8 (3 nov al 03 dic	PERIODO 9 (3 dic 2025 al 03 enero 2026)	PERIODO 10(3 enero		Mes 10
Residuos Ordinadrios (Kg)		1873	210	250	280	305	308	320	200					
Reciclables	Papel (Kg)	23.2	1	1.2	1	5	4	10	1					
	Plastico (Kg)	19.3	4	1	1.3	2	3	5	3					
	Metal (Kg)	206	30	45	32	30	25	32	12					
Poda de Arboles (Kg)		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
Residuos Peligrosos RESPEL	Aceites (Kg)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	Plastico (Kg)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	Bolsas de Cemento (Kg)	0	0	0	0	0	0	0	0					
Aguas Residuales Domesticas (Gal)		1996.1	285.3	190.2	126.8	443.8	507	285	158		0	0	0	

3.3 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

			Factor de Expansión de Excavación						Fcator de Expansión de Demolición					
TIPO DE RESIDUOS m3		TOTAL	PERIODO 1 (3 abril al 3 mayo 2025)	PERIODO 2 (3 mayo al 03 jun 2025)	PERIODO 3(3 jun al 03 jul 2025)	PERIODO 4 (3 jul al 03 agos 2025)	PERIODO 5(3 agos al 03 sep 2025)	PERIODO 6 (3 sep al 03 oct 2025)	PERIODO 7 (3 0ct al 03 nov 2025)	PERIODO 8 (3 nov al 03 dic 2025)	PERIODO 9 (3 dic 2025 al 03 enero 2026)	PERIODO 10(3 enero al 03 feb		Mes 10
1.1 Volumen de excavación sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros		8595.41	423.56	611.12	660.08	776.3	1023.00	891.75	4209.60					
1.2 Volumen de cimentaciones y pilotajes: arcillas,bentonitas y demás.		N/A												
1.3 Volumen de Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos,pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques,cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros		3280.81	204	432	552.20	324.9	252.10	453.80	1061.81					
1.4 Volumen No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso		N/A												
Volumen Dispuesto en sitio autorizado		8669.31	627.56	734.12	1157.17	324.9	856.80	1045.95	3922.81	0	0	0	0.000	
Volumen Reutilizado		2907.31	0	309	55.11	776.3	418.3	299.6	1348.6	0	0	0	0	

3.4 MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y PRODUCTOS QUÍMICOS

TIPO DE MATERIAL	TOTAL	PERIODO 1 (3 abril al 3 mayo	PERIODO 2 (3 mayo al 03 jun	PERIODO 3(3 jun al 03 jul	PERIODO 4 (3 jul al 03 agos	PERIODO 5(3 agos al 03 sep	PERIODO 6 (3 sep al 03 oct	PERIODO 7 (3 0ct al 03 nov	PERIODO 8 (3 nov al 03 dic	PERIODO 9 (3 dic 2025 al 03 enero 2026)	PERIODO 10(3 enero		Mes 10
Concreto (m^3)	0												
Arena (m^3)	733.9		39.9	56	638	0	0	0					
Material Seleccionado (m^3)	2759.52	514.12	1092.8	48	154	80.00	0	870.6					
Triturado (m^3)	48					48.00	0	0					
Relleno (m^3)	0												
Suelo Cemento (m^3)	0												
Productos Quimicos	3	Gasolina, Acpm, Vulken	Gasolina, Acpm, Vulken	Gasolina, Acpm, Vulken	Gasolina, Acpm,	Gasolina, Acpm,	Gasolina, Acpm,	Gasolina, Acpm, Vulken	Gasolina, Acpm, Vulken	Gasolina, Acpm, Vulken	Gasolina, Acpm,	Gasolina, Acpm, Vulken	

Informe No	7	**Periodo**	03 de octubre al 03 de noviembre	**Proyecto**	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA,
Contrato de obra	LP-024-2024	**Contratista**	CONSORCIO URBABO L.P		

3.5 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS, VEHÍCULOS Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Descripción	TOTAL	PERIODO 1 (3 abril al 3 mayo 2025)	PERIODO 2 (3 mayo al 03 jun 2025)	PERIODO 3(3 jun al 03 jul 2025)	PERIODO 4 (3 jul al 03 agos 2025)	PERIODO 5(3 agos al 03 sep 2025)	PERIODO 6 (3 sep al 03 oct 2025)	PERIODO 7 (3 0ct al 03 nov 2025)	PERIODO 8 (3 nov al 03 dic 2025)	PERIODO 9 (3 dic 2025 al 03 enero 2026)	PERIODO 10(3 enero al 03 feb		Mes 10
Cantidad de puntos de acopio de materiales	2.571428571	1	1	4	2	4	3	3					
Humectación (m^3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cantidad de vehiculos en obra	7.714285714	3	3	7	6	11	12	12					
Cantidad de Vehiculos con Tecnomecanica y SOAT	7.714285714	3	3	7	6	11	12	12					
Cantidad de Maquinaria	8.142857143	4	4	8	9	12	10	10					
Cantidad de Mantenimiento a Maquinarias	0	0	0	0	0	0	0	0					

3.6 MANEJO ADECUADO DE VEGETACIÓN, PAISAJE Y FAUNA

Tipo de Especie	TOTAL	PERIODO 1 (3 abril al 3 mayo 2025)	PERIODO 2 (3 mayo al 03 jun 2025)	PERIODO 3(3 jun al 03 jul 2025)	PERIODO 4 (3 jul al 03 agos 2025)	PERIODO 5(3 agos al 03 sep 2025)	PERIODO 6 (3 sep al 03 oct 2025)	PERIODO 7 (3 0ct al 03 nov 2025)	PERIODO 8 (3 nov al 03 dic 2025)	PERIODO 9 (3 dic 2025 al 03 enero 2026)	PERIODO 10(3 enero al 03 feb 2026)		Mes 10
Árboles sembrados	0	0	0	0	0	0							
Tala de Arboles	55	0	0	0	0	55							
Poda de Arboles	0	0	0	0	0	0							

3.7 MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES

Descripción	TOTAL	PERIODO 1 (3 abril al 3 mayo 2025)	PERIODO 2 (3 mayo al 03 jun 2025)	PERIODO 3(3 jun al 03 jul 2025)	PERIODO 4 (3 jul al 03 agos 2025)	PERIODO 5(3 agos al 03 sep 2025)	PERIODO 6 (3 sep al 03 oct 2025)	PERIODO 7 (3 0ct al 03 nov 2025)	PERIODO 8 (3 nov al 03 dic 2025)	PERIODO 9 (3 dic 2025 al 03 enero 2026)	PERIODO 10(3 enero al 03 feb 2026)		Mes 10
Consumo de Agua (m^3)	0	0	0	0	0	0	0	0					
Consumo de Energia Electrica (Kw)	0	0	0	0	0	0	0	0					
Cantidad de baños en obra	3.428571429	2	2	4	4	4	4	4					
Cantidad de Aseos a baños portatiles	8.142857143	7	7	4	14	8	9	8					
Cantidad de Puntos Ecologicos	2.285714286	2	2	2	3	3	2	2					

LOGO DEL CONTRATISTA	**INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL**	Formato	15
		Versión	2
		Fecha	6/05/2022

Informe No 7 **Periodo** 03 de octubre al 03 de noviembre **Proyecto** OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA,

Contrato de obra LP-024-2024 **Contratista** CONSORCIO URBABO L.P

3.8 INDICADORES DE GESTION AMBIENTAL

INDICADORES		TOTAL		AÑO																					
Programa	Fórmula X 100	Acumulado	Promedio	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO											
Conformación de Grupo de Gestión Social y Ambiental	Número de profesionales contratados / Número de profesionales propuestos.	800	100.0	100	100	100	100	100	100	100															
	Número obligaciones emitidas / Número obligaciones cumplidas.	800	100.0	100	100	100	100	100	100	100															
	Conformación de Grupo de Gestión Social y Ambiental	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%															
Capacitación Ambiental	Número de capacitaciones ejecutadas / número de capacitaciones programadas	800	100.0	100	100	100	100	100	100	100															
	Número de personas con capacitación en el periodo / número de personas programadas	800	100.0	100	100	100	100	100	100	100															
	Manejo integral de materiales de construcción	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%															
Cumplimiento de requisitos legales	Número de permisos otorgados / Número de permisos requeridos.	697.1428571	87.1	70	70	70	100	100	100	100															
	Manejo de aguas superficiales	697%	871%	700%	700%	700%	1000%	1000%	1000%	1000%	0%	0%	0%	0%	0%										
Manejo integral de material en las construcciones	Número requerimientos por manejo de los materiales de	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0															
	Manejo integral de materiales de construcción	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%										
Proyecto de señalización frentes de obra y sitios	Número de frentes de trabajo señalizados / Numero de frentes de trabajo en las actividades de	40	5.0	5	5	5	5	5	5	5															
	Proyecto de señalización frentes de obra y sitios temporales.	4000%	500%	500%	500%	500%	500%	500%	500%	500%	0%	0%	0%	0%	0%										
Proyecto de Manejo y disposición final de RCD.	Número de requerimientos = 0 de la autoridad ambiental como de	0	0.0	0	0	0		0	0	0															
	Número de sitios utilizados / número de sitios aprobados.	800	100.0	100	100	100	100	100	100	100															
	Proyecto de Manejo y disposición final de RCD.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%															
Manejo de aguas superficiales	Número de actividades ejecutadas	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	Valor parámetros evaluados = valor parámetro norma vigente	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	Manejo de aguas superficiales																								
Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales	Numero de actividades ejecutadas / número de actividades	30.33333333	2.3	9	7	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0										
	Verificación de parámetros = o < la norma	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales																								
Proyecto de manejo de cobertura vegetal	Número de arboles protegidos/	0	0.0	0	0			0																	
	Numero de medidas propuestas / número de medidas ejecutadas	0	0.0	0	0																				
	Proyecto de manejo de cobertura vegetal y protección de arboles																								
Proyecto de protección de fauna	Número de reportes de afectación	0	0.0	0	0																				
	Numero de reportes de individuos afectados	0	0.0	0	0																				
	Proyecto de manejo de Maquinaria, Equipos y Vehiculos																								
Proyecto Instalación, funcionamiento	Numero de actividades ejecutadas / número de actividades	7	1.0	1	1	1	1	1	1																
	Numero de requerimientos evaluados / número de	7	1.0	1	1	1	1	1	1																
	Proyecto Instalación,	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%																
Proyecto Instalación, funcionamiento	Numero de actividades ejecutadas / número de actividades	0	0.0	0	0																				
	Numero de actividades por causas del manejo de maquinaria	0	0.0	0	0																				
	Proyecto de manejo de Maquinaria,																								

4. OBSERVACIONES

1. SE ADJUNTARAN LOS CERTIFICADOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD Y PROCEDENCIA DE MATERIAL DEL PERIODO DEL INFORME N°6

5. ANEXOS

No	Descripción	Folios
SST-1	Matriz de identificación de peligros y riesgos	
SST-2	Registros capacitación y entrenamiento realizado	
SST-3	Registros de ATS	
SST-4	Registro fotográfico	
SST-5	Registro entrega de elementos de seguridad	
SST-6	Registro de inspecciones realizadas en el periodo	
SST-7	Registro control de aportes en seguridad social	
SST-8	Planillas de aportes a la seguridad social	
SST-9	Otros anexos (Especificar cual)	

No	Descripción	Folios
AMB-1	Registro de Asistencia a Capacitación	
AMB-2	Documentación de Maquinaria y Vehiculos	
AMB-3	Certificado de Mantenimiento de Sanitarios en Obra	
AMB-4	Certificado de RCD periodo del Informe 5	
AMB-5		
AMB-6		
AMB-7		
AMB-8		
AMB-9		
AMB-10		

Firma
Nombre Hernando Marquez Hernandez
Responsable del área ambiental
Contratista

Firma
Nombre
Responsable del área SST
Contratista

Firma
Nombre
Responsable del área ambiental
Interventoría

Firma
Nombre
Responsable del área SST
Interventoría

LOGO DEL CONTRATISTA	INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL	Formato	15
		Versión	2
		Fecha	6/05/2022

Informe No	7	**Periodo**	03 de octubre al 03 de noviembre	**Proyecto**	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA,
Contrato de obra	LP-024-2024	**Contratista**	CONSORCIO URBABO L.P		

1. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS SST



Foto 1	DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS




Foto 2	SEÑALIZACION DE OBRA



Foto 3	FUNDIDA DE PLACA



Foto 4	USO CORRECTO DE EPP



Foto 5	INSTALACION DE RIELES



Foto 6	INSPECCION DE BOTIUIN



Foto 7	PALETERAS



Foto 8	ENTREGA DE EPP



Foto 9	EXCAVACION MANUAL



Foto 10	TRABAJO TOPOGRAFICO



Foto 11	INSTALACION DE TUBERIA



Foto 12	CHARLA DE SST

2. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS AMBIENTALES



Foto 1	CAPACITACIÓN AMBIENTAL



Foto 2	KIT ANTI DERRAME EN OBRA



Foto 3	CUBRIMIENTO DE MATERIAL EN OBRA



Foto 4	PROTECCIÓN COBERTURA ARBOREA



Foto 5	CAMPAMENTO EN OBRA




Foto 6	MAQUINARIA EN OBRA

LOGO DEL CONTRATISTA	INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL	Formato	15
		Versión	2
		Fecha	6/05/2022

Informe No	7	**Periodo**	03 de octubre al 03 de noviembre	**Proyecto**	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA,
Contrato de obra	LP-024-2024	**Contratista**	CONSORCIO URBABO L.P		



Foto 7	UNIDAD SANITARIA EN OBRA



Foto 8	ORDEN Y ASEO



Foto 9	PUNTO ECOLOGICO



Foto 10	MANEJO DE RCD EN OBRA



Foto 11	INGRESO DE MATERIALES PETREOS A OBRA

Foto 12	

2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES SST DESARROLLADAS

2.1 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

2.1.1 MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS

No	Peligros Identificados	Nivel de Riesgo	Controles Aplicados
1	FÍSICO: Ruido: Generado por los equipos en funcionamiento.	150	Charlas de seguridad sobre prevención del riesgo por exposición a ruidos.
2	BIOMECÁNICO: Esfuerzos: Manipulación de herramientas y materiales.	480	Asegurar la realizacion de pausas activas, fomentar el autocuidado,programa de prevencion osteomuscular , analisis de puestos de trabajo.
3	CONDICIONES DE SEGURIDAD: Accidente de tránsito (accidentes por viajes de desplazamiento a los centros de trabajo, maniobras de maquinaria).	600	Fomento del autocuidado, señalización del área de circulación.
4	CONDICIONES DE SEGURIDAD (Público: Robos, Atracos, Asaltos)	600	Capacitación sobre riesgo público (concientización del personal), Fomento del autocuidado.
5	CONDICIONES DE SEGURIDAD (Mecánico: Manejo inadecuado de Herramientas manuales - herramientas de trabajo).	150	Charla sobre autocuidado, inspecciones de seguridad y charlas de seguridad al personal.
6	CONDICIONES DE SEGURIDAD (Mecánico: Operación de maquinaria pesada, Grúa, Camiones, etc.) Operación del vehículo.	1140	Capacitación al trabajador sobre la operación segura de maquinaria pesada, fomento del autocuidado.
7	QUÍMICO: Material Particulado: polvos inorgánicos residuos de la construcción u obra	100	Fomentar el autocuidado, Capacitación sobre el uso seguro de sustancias químicas.
8	PSICOSOCIAL : Características de la organización del trabajo: Comunicación con el personal, demandas de liderazgo, organización del trabajo.	200	Implementar talleres de prevención estrés laboral, actividades con comité de convivencia laboral.
9	BIOLOGICO: Virus: propios del ambiente en general.	200	Jornadas de vacunacion
10	FENOMENOS NATURALES: Inumdaciones, fuertes lluvias, tormentas electricas.	450	Plan de emergencias y contingencias, entrenamiento en temas de plan de emergencias.
11	FENOMENOS NATURALES: Precipitaciones: Lluvias torrenciales.	50	Protocolos para actuar en caso de lluvias e inundaciones.
12	FISICO: Iluminación: Luz visible en exceso (Luz solar directa)	150	Plan de mantenimiento de infraestructura, Planeación de estudios de iluminación, visiometrias en exámenes médicos, Realización de pausas activas.
13	FISICO: Temperaturas extremas: exposición a luz solar directa.	300	Charlas sobre autocuidado.
14	CONDICIONES DE SEGURIDAD: Locativo: Superficies de Trabajo irregulares, deslizantes, con desnivel	100	Orden y aseo de las instalaciones, inspecciones locativas de seguridad, fomento del autocuidado, charlas de seguridad al personal, señalización
15	CONDICIONES DE SEGURIDAD: Accidente de Tránsito	2400	Capacitaciones en seguridad vial.
16			
Riesgo promedio dentro de la obra		**471.3333333**	

LOGO DEL CONTRATISTA	**INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL**	Formato	15
		Versión	2
		Fecha	6/05/2022

Informe No 7 **Periodo** 03 de octubre al 03 de noviembre **Proyecto** OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA,

Contrato de obra LP-024-2024 **Contratista** CONSORCIO URBABO L.P

No	Descripción de las principales actividades realizadas dentro del plan de emergencias de la obra	Fecha		
1	Se instalo Botiquin de primeros auxilios en los dierentes frentes de obra			
2	se instalo camilla para el traslado de lecionado	15	9	2025
3	Se instalo Extintor Multiproposito de 20 LB en los dierentes frentes de obra	15	9	2025
4		15	9	2025
5				
6				
7				
9				
10				
15				

2.1.2 PERSONAL EN OBRA

EMPRESA	Numero de empleados al finalizar el periodo											
		2025				2025						
	PERIODO 6 (3 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE											
CONSORCIO URBANO LP	27											
CABASCO	7											
LOPEQUIPO	3											
CANTILEVER	10											
ORLANDO CONTRERA MANTILLA	13											
MAURO PINO	8											
UNION TEMPORAL CINOG	1											
PACHECO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	23											
GERENCIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	4											
V Y G INGENIERIA	1											
SKY GLOBAL	17											
Total empleados en el proyecto	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total horas hombre de exposición		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Horas hombre acumulada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.1.3. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

Fecha			Tipo de actividad	Tema	No asistentes	Responsable
7	10	2025	Charlas de seguridad	Ergonomia	8	CLARA DIAZ
11	10	2025	Charlas de seguridad	Cambios de temperaturas	8	CLARA DIAZ
17	10	2025	Charlas de seguridad	uso de EPP	4	CLARA DIAZ
21	10	2025	Charlas de seguridad	seguridad vial ARL SURA	12	CLARA DIAZ
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
			Promedio de asistencia		3	

2.1.4 SEGURIDAD EN OBRA

Análisis de Seguridad en el Trabajo

Fecha			Lugar	Descripción de la tarea	Responsable
6/10/2025	al	11/10/2025	calle 72 avenida shakira	traslado de mainaria	CLARA DIAZ I
			calle 72 avenida shakira	excavacion manual	CLARA DIAZ I
			calle 72 avenida shakira	fundida	CLARA DIAZ I
			calle 72 avenida shakira	traslado e instalacion de rieles	CLARA DIAZ I
			calle 72 avenida shakira	operador de bobcat	
			calle 72 avenida shakira	operador de miniexcavadora	CLARA DIAZ I
				Orden y aseo de obra engeneral	
			calle 72 avenida shakira	topografia	CLARA DIAZ I
14--10-25	al	18/10/2025	calle 72 avenida shakira	operador de bobcat	CLARA DIAZ I
			calle 72 avenida shakira	Auxiliar de trafico	CLARA DIAZ I
			calle 72 avenida shakira	topografia	CLARA DIAZ I
			calle 72 avenida shakira	Orden y aseo de obra engeneral	CLARA DIAZ I
			calle 72 avenida shakira	operador de miniexcavadora	
			calle 72 avenida shakira	excavacion manual	
			calle 72 avenida shakira	traslado e instalacion de rieles	
			calle 72 avenida shakira		CLARA DIAZ I
20/10/2025	al	25/10/2025	calle 72 avenida shakira	topografia	CLARA DIAZ I
			calle 72 avenida shakira	Orden y aseo de obra engeneral	CLARA DIAZ I
			calle 72 avenida shakira	operador de bobcat	CLARA DIAZ I
			calle 72 avenida shakira	operador de miniexcavadora	CLARA DIAZ I
			calle 72 avenida shakira	traslado e instalacion de rieles	CLARA DIAZ I
			calle 72 avenida shakira	fundida	
				excavacion manual	
				traslado de maquinaria	
27/10/2025	al	1/11/2025	calle 72 avenida shakira	operador de miniexcavadora	CLARA DIAZ I
			calle 72 avenida shakira	operador de bobcat	CLARA DIAZ
			calle 72 avenida shakira	traslado e instalacion de rieles	CLARA DIAZ I
			calle 72 avenida shakira	excavacion manual	CLARA DIAZ
			calle 72 avenida shakira		

Trabajo en altura. Certificación de trabajo en altura

Lugar	Nombre del trabajador	No de Cedula	Empresa	Vigencia	No de Registro	Recomendaciones Medicas
PARA EL PERIODO NO SE REALIZARON TRABAJOS EN ALTURA.						

Permisos de trabajo de alto riesgo

Fecha	Lugar	Actividad	Tarea de Alto Riesgo	Nombre del trabajador	Inspector SST certificado

LOGO DEL CONTRATISTA	**INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL**	Formato	15
		Versión	2
		Fecha	6/05/2022

Informe No	7	**Periodo**	03 de octubre al 03 de noviembre	**Proyecto**	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA,
Contrato de obra	LP-024-2024	**Contratista**	CONSORCIO URBABO L.P		

Entrega de elementos de seguridad

Elemento	Unidad	Cantidad	Observaciones
Guantes	par	71	
Botas dieléctricas	par	0	
Gafas	und	46	
casco	Unidad	6	
pantalon	Unidad	7	
camisa	Unidad	3	
tapaboca	und	15	
protector auditivo	unid	1	
guante plastico	par	11	

Fecha	Lugar	Inspección Herramientas, Equipos y Maquinaria	Hallazgos
21/10/2025	avenida sakira	inspeccion de botiquin	ninguno
21/10/2025	avenida sakira	inspeccion de camilla	ninguno
7/10/2025	avenida sakira	inspeccion de EPP	ninguno
10/10/2025	avenida sakira	inspeccion de extintor	ninguno
20/10/2025	avenida sakira	inspeccion de conteccion de derrame	ninguno
20-10-25 al 25-10-25	avenida sakira	inspeccion de pajarita	ninguno
06-10-25 al 11-10-25 27-10-25 al 01-11-25	avenida sakira	inspeccion de planta electrica	ninguno
06-10-25 al 11-10-25 27-10-25 al 01-11-25	avenida sakira	inspeccion de taladro	ninguno
06-10-25 al 01-111-25	avenida sakira	inspeccion de bobcat	ninguno
06-10-25 al 01-111-25	avenida sakira	inspeccion de miniexcavadora	ninguno

9. COPASST y/o Vigia

17/09/2025	Reunion CCL	herramients para tener ambientes de trabajo saludables			
17/09/2025	Reunion COPASST	deberes y derechos de los trabajadores			

2.2.1 SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

EPS		FONDO DE PENSIONES		A.R.L.			
Razón social	Cant. Trab	Razón social	Cant. Trab	Razón social	Cant. Trab		
mutual ser	18	colfondos	5	sura	80		
salud total	27	porvenir	69	colpatria	0		
sanitas	6	proteccion	22	axa colpatria	17		
coosalud	12	colpensiones	17	positiva	3		
cajacopi	12	no aplica	1	colmena	14		
famisanar	1		0				
sura	16						
nueva eps	21						
EPS familiar de colombia	1						
Emp prom de salud indigena	0						
compensar							
EPS familiar de colombia	0						
eps-s cajacopi							
fosyga nueva eps-regimen movilidad							
vacias							
TOTAL	114	TOTAL	114	TOTAL	114	TOTAL	0

2.3 ESTADISTICAS DE ACCIDENTALIDAD

INDICADORES	TOTAL	PERIODO 4											
# de (FAT) Fatalidad	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
# de (HiPo) Accidente Alto Potencial	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
# de (LTI) Lesiones con Tiempo perdido	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
# de (RTA) Accidente vial/ transito	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
# de (AWPD) Accidente con daño a la propiedad	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
# de (EA) Accidente Ambiental	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
# de (NM) Incidente	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
# de Investigaciones de Incidentes	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LOGO DEL CONTRATISTA	**INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL**	Formato	15
		Versión	2
		Fecha	6/05/2022

Informe No 7 **Periodo** 03 de octubre al 03 de noviembre **Proyecto** OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA,

Contrato de obra LP-024-2024 **Contratista** CONSORCIO URBABO L.P

# de Investigaciones de Accidentes Laborales		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
# de Investigaciones de Enfermedad Laboral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
# de dias perdidos por AT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frecuencia de accidentalidad		0.0%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0
Severidad accidentalidad		0.0%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0
Indice de Lesion Incapacitante ILI		0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0
Prevalencia de Enfermedad Laboral		0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0
Incidencia de la Enfermedad Laboral		0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0
# de dias por Incapacidad laboral o Enfermedad comun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausentismo por Causa Medica	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0	0	0

2.4 SENALIZACION PLAN MANEJO DE TRAFICO

Descripción	TOTAL	PERIODO 2 (3 AL 3DE JUNIO	PERIODO 3 (3 JUNIO AL 3DE	PERIODO 4									
Señales Preventivas	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Señales Informativas	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Señales Reglamentarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Canalizadores de Transitorias	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Señales Institucionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.5. VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Lugar	Automotor	Placa	Modelo	Marca	Serie	Vencimiento SOAT	Vencimiento Tecno-Mecanica	Recolección y Transporte RCD
CA 72 avenida shakira	Mini- Cargador	N/A	2018	BOBCAT	B42812249	N/A	N/A	X
CA 72 avenida shakira	Compactador	N/A	2006	MULTIKIP	120507	N/A	N/A	X
CA 72 avenida shakira	Volqueta	SBV098	1995	KODIAK 156	CM95304819	14/03/2026	20/03/2026	X
CA 72 avenida shakira	Volqueta	GYK956	1984	CHEVROLET	BM452803	2/09/2025	2/09/2025	X
CA 72 avenida shakira	Volqueta	QGI737	1981	CHEVROLET	CM003902	17/02/2026	23/03/2026	X
CA 72 avenida shakira	Volqueta	GCD 990	1960	FORD	F60D0E33897	18/05/2026	9/02/2026	X
CA 72 avenida shakira	Mini- Cargador	N/A	2019	CATERPILLAR	CATO236DPF9C00503	N/A	N/A	X
CA 72 avenida shakira	Mini- Excavadora	N/A	2023	CATERPILLAR	CAT3055CG2501300	N/A	N/A	X
CA 72 avenida shakira	Mini- Cargador	N/A	2018	BOBCAT	B42812218	N/A	N/A	X
CA 72 avenida shakira	Mini- Excavadora	N/A	2016	HYUNDAY	HHKHMH03CG0001299	N/A	N/A	X
CA 72 avenida shakira	Retroexcavadora	N/A	2022	SANY	SY007SCC09258	N/A	N/A	X
CA 72 avenida shakira	Volqueta	EUW917	1998	CHEVROLET	9GD3CBMD7WB980712	31/08/2025	9/03/2025	X
CA 72 avenida shakira	Volqueta	WAA138	196'0	FORD	F6000E24889	22/03/2026	24/03/2026	X
CA 72 avenida shakira	Volqueta	CHC883	1990	CHEVROLET	CMA05816	26/05/2026	26/05/2026	X
CA 72 avenida shakira	Volqueta	RCD754	1977	DODGE	DT637609	14/11/2025	14/11/2025	X
CA 72 avenida shakira	Volqueta	UVT 712	1994	CHEVROLET		18/12/2025	18/12/2025	X
CA 72 avenida shakira	Volqueta	IND914	1981	CHEVROLET		3/04/2026	4/04/2026	X
CA 72 avenida shakira	Volqueta	NMA006	1961	INTERNATIONAL		19/07/2026	19/03/2026	X
CA 72 avenida shakira	Volqueta	OMG548	1989	CHEVROLET	CM906909	12/12/2025	13/12/2025	X
CA 72 avenida shakira	Retropajarita	N/A	2019	CATERPILLAR	CAT0416FLLBFF06937	N/A	N/A	X
CA 72 avenida shakira	Mini Excadora	N/A	2003	TEREX	358/ 3758	N/A	N/A	X
CA 72 avenida shakira	Minicargador	N/A	2014	CASE	JAFSR250CEM478620	N/A	N/A	X
CA 72 avenida shakira	Minicargador	N/A	2018	BOBCAT	B42812178	N/A	N/A	X
CA 72 avenida shakira	Retro excavadora	N/A	2012	CATERPILLAR	CAT0420FIJWJ0022	N/A	N/A	X
CA 72 avenida shakira	Minicargador	N/A	2013	CATERPILLAR	CAT0236BCA9H03959	N/A	N/A	X

3. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES DESARROLLADAS

3.1 CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES

3.1.1 FUENTES DE MATERIALES

No	Tipo de material	Proveedor	Acto Administrativo Ambiental	Vigencia	Título minero
1	Materiales Petreos	CANTERA LOS MANGUITO	LICENCIA AMBIENTAL N° 0000 851 POR CRA	6/11/2048	No. PBQ-16021
2	Materiales Petreos	CANTERAS MUNARRIZ	RESOLUCIÓN 000312 DEL 2003 CRA	28/01/2033	RM- GFQE-01

3.1.2 GESTORES EXTERNOS PRESTADORES DE SERVICIOS (Gestores aseo de baños, manejo de residuos sólidos, Respel, RCD, y otros)

No	Empresa	Actividad	Acto Administrativo Ambiental	Vigencia	Entidad otorgante
1	ESCOMBRERA EL TRIUNFO	Disposición Final de RCD	Resolución N°0000701 del 2021	29/08/2027	CRA
2	ESCOMBRERA ROYAL INGENIERIA	Disposición Final de RCD	Resolución 1463 del 12 de agosto del 2024	12/08/2025	Barranquilla Verde
3	ECONORTE EN CONVENIO CON MAKEN	Disposición Final de Residuos Liquidos- Unidad Sanitaria	Resolución 0080 del 16 de enero del 2019	19/01/2026	Barranquilla Verde
4	LADRILLERA BARRANQUILLA	Disposición Final de RCD	Resolucion 1387 de septiembre del 2016	Durante la ejecución del proyecto	DAMAB

LOGO DEL CONTRATISTA	**INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL**	Formato	15
		Versión	2
		Fecha	6/05/2022

Informe No 7 **Periodo** 03 de octubre al 03 de noviembre **Proyecto** OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA,

Contrato de obra LP-024-2024 **Contratista** CONSORCIO URBABO L.P

3.1.3 ACTOS ADMINISTRIVOS A NOMBRE DEL CONTRATISTA (Autorización de tala/poda, concesión de aguas, permiso de vertimientos y otros)

Tipo de permiso	Acto Administrativo Ambiental	Entidad otorgante	Medida compensatoria
APROVECHAMIENTO FORESTAL	Resolución N°2818 del 29 de julio del 2025	Barranquilla Verde	Siembra de Arboles

3.1.4 AUTORIZACIONES PMT

No de permiso	Vía a cerrar	Fecha de vencimiento		
SM-CVO-20250428-26295 EV- AAB YCR	CALLE 72 ENTRE CRA54 Y CRA 60	31	12	25
SM-CVO-20250331-26130 EV- AAB MGA YCR	CALLE 72 ENTRE CRA46Y CRA 54	31	12	25
SMCV0-20250708-26728-	CALLE72 ENTRE CR38 Y 43	31	12	25
SM-CVO-20250728-26866	CALLE 72 ENTRE ARRERA 43 Y 46	31	12	25

3.2 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, LIQUIDOS Y PELIGROSOS

TIPO DE RESIDUOS		TOTAL	PERIODO 1 (3 abril al 3 mayo	PERIODO 2 (3 mayo al 03 jun	PERIODO 3(3 jun al 03 jul	PERIODO 4 (3 jul al 03 agos	PERIODO 5(3 agos al 03 sep	PERIODO 6 (3 sep al 03 oct	PERIODO 7 (3 0ct al 03 nov	PERIODO 8 (3 nov al 03 dic	PERIODO 9 (3 dic 2025 al 03 enero 2026)	PERIODO 10(3 enero		Mes 10
Residuos Ordinadrios (Kg)		1873	210	250	280	305	308	320	200					
Reciclables	Papel (Kg)	23.2	1	1.2	1	5	4	10	1					
	Plastico (Kg)	19.3	4	1	1.3	2	3	5	3					
	Metal (Kg)	206	30	45	32	30	25	32	12					
Poda de Arboles (Kg)		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
Residuos Peligrosos RESPEL	Aceites (Kg)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	Plastico (Kg)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	Bolsas de Cemento (Kg)	0	0	0	0	0	0	0	0					
Aguas Residuales Domesticas (Gal)		1996.1	285.3	190.2	126.8	443.8	507	285	158		0	0	0	

3.3 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

			Factor de Expansión de Excavación						Fcator de Expansión de Demolición					
TIPO DE RESIDUOS m3		TOTAL	PERIODO 1 (3 abril al 3 mayo 2025)	PERIODO 2 (3 mayo al 03 jun 2025)	PERIODO 3(3 jun al 03 jul 2025)	PERIODO 4 (3 jul al 03 agos 2025)	PERIODO 5(3 agos al 03 sep 2025)	PERIODO 6 (3 sep al 03 oct 2025)	PERIODO 7 (3 0ct al 03 nov 2025)	PERIODO 8 (3 nov al 03 dic 2025)	PERIODO 9 (3 dic 2025 al 03 enero 2026)	PERIODO 10(3 enero al 03 feb		Mes 10
1.1 Volumen de excavación sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros		8595.41	423.56	611.12	660.08	776.3	1023.00	891.75	4209.60					
1.2 Volumen de cimentaciones y pilotajes: arcillas,bentonitas y demás.		N/A												
1.3 Volumen de Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos,pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques,cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros		3280.81	204	432	552.20	324.9	252.10	453.80	1061.81					
1.4 Volumen No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso		N/A												
Volumen Dispuesto en sitio autorizado		8669.31	627.56	734.12	1157.17	324.9	856.80	1045.95	3922.81	0	0	0	0.000	
Volumen Reutilizado		2907.31	0	309	55.11	776.3	418.3	299.6	1348.6	0	0	0	0	

3.4 MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y PRODUCTOS QUÍMICOS

TIPO DE MATERIAL	TOTAL	PERIODO 1 (3 abril al 3 mayo	PERIODO 2 (3 mayo al 03 jun	PERIODO 3(3 jun al 03 jul	PERIODO 4 (3 jul al 03 agos	PERIODO 5(3 agos al 03 sep	PERIODO 6 (3 sep al 03 oct	PERIODO 7 (3 0ct al 03 nov	PERIODO 8 (3 nov al 03 dic	PERIODO 9 (3 dic 2025 al 03 enero 2026)	PERIODO 10(3 enero		Mes 10
Concreto (m^3)	0												
Arena (m^3)	733.9		39.9	56	638	0	0	0					
Material Seleccionado (m^3)	2759.52	514.12	1092.8	48	154	80.00	0	870.6					
Triturado (m^3)	48					48.00	0	0					
Relleno (m^3)	0												
Suelo Cemento (m^3)	0												
Productos Quimicos	3	Gasolina, Acpm, Vulken	Gasolina, Acpm, Vulken	Gasolina, Acpm, Vulken	Gasolina, Acpm,	Gasolina, Acpm,	Gasolina, Acpm,	Gasolina, Acpm, Vulken	Gasolina, Acpm, Vulken	Gasolina, Acpm, Vulken	Gasolina, Acpm,	Gasolina, Acpm, Vulken	

Informe No	7	**Periodo**	03 de octubre al 03 de noviembre	**Proyecto**	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA,
Contrato de obra	LP-024-2024	**Contratista**	CONSORCIO URBABO L.P		

3.5 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS, VEHÍCULOS Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Descripción	TOTAL	PERIODO 1 (3 abril al 3 mayo 2025)	PERIODO 2 (3 mayo al 03 jun 2025)	PERIODO 3(3 jun al 03 jul 2025)	PERIODO 4 (3 jul al 03 agos 2025)	PERIODO 5(3 agos al 03 sep 2025)	PERIODO 6 (3 sep al 03 oct 2025)	PERIODO 7 (3 0ct al 03 nov 2025)	PERIODO 8 (3 nov al 03 dic 2025)	PERIODO 9 (3 dic 2025 al 03 enero 2026)	PERIODO 10(3 enero al 03 feb		Mes 10
Cantidad de puntos de acopio de materiales	2.571428571	1	1	4	2	4	3	3					
Humectación (m^3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cantidad de vehiculos en obra	7.714285714	3	3	7	6	11	12	12					
Cantidad de Vehiculos con Tecnomecanica y SOAT	7.714285714	3	3	7	6	11	12	12					
Cantidad de Maquinaria	8.142857143	4	4	8	9	12	10	10					
Cantidad de Mantenimiento a Maquinarias	0	0	0	0	0	0	0	0					

3.6 MANEJO ADECUADO DE VEGETACIÓN, PAISAJE Y FAUNA

Tipo de Especie	TOTAL	PERIODO 1 (3 abril al 3 mayo 2025)	PERIODO 2 (3 mayo al 03 jun 2025)	PERIODO 3(3 jun al 03 jul 2025)	PERIODO 4 (3 jul al 03 agos 2025)	PERIODO 5(3 agos al 03 sep 2025)	PERIODO 6 (3 sep al 03 oct 2025)	PERIODO 7 (3 0ct al 03 nov 2025)	PERIODO 8 (3 nov al 03 dic 2025)	PERIODO 9 (3 dic 2025 al 03 enero 2026)	PERIODO 10(3 enero al 03 feb 2026)		Mes 10
Árboles sembrados	0	0	0	0	0	0							
Tala de Arboles	55	0	0	0	0	55							
Poda de Arboles	0	0	0	0	0	0							

3.7 MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES

Descripción	TOTAL	PERIODO 1 (3 abril al 3 mayo 2025)	PERIODO 2 (3 mayo al 03 jun 2025)	PERIODO 3(3 jun al 03 jul 2025)	PERIODO 4 (3 jul al 03 agos 2025)	PERIODO 5(3 agos al 03 sep 2025)	PERIODO 6 (3 sep al 03 oct 2025)	PERIODO 7 (3 0ct al 03 nov 2025)	PERIODO 8 (3 nov al 03 dic 2025)	PERIODO 9 (3 dic 2025 al 03 enero 2026)	PERIODO 10(3 enero al 03 feb 2026)		Mes 10
Consumo de Agua (m^3)	0	0	0	0	0	0	0	0					
Consumo de Energia Electrica (Kw)	0	0	0	0	0	0	0	0					
Cantidad de baños en obra	3.428571429	2	2	4	4	4	4	4					
Cantidad de Aseos a baños portatiles	8.142857143	7	7	4	14	8	9	8					
Cantidad de Puntos Ecologicos	2.285714286	2	2	2	3	3	2	2					

LOGO DEL CONTRATISTA	**INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL**	Formato	15
		Versión	2
		Fecha	6/05/2022

Informe No 7 **Periodo** 03 de octubre al 03 de noviembre **Proyecto** OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA,

Contrato de obra LP-024-2024 **Contratista** CONSORCIO URBABO L.P

3.8 INDICADORES DE GESTION AMBIENTAL

INDICADORES		TOTAL		AÑO																					
Programa	Fórmula X 100	Acumulado	Promedio	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO											
Conformación de Grupo de Gestión Social y Ambiental	Número de profesionales contratados / Número de profesionales propuestos.	800	100.0	100	100	100	100	100	100	100															
	Número obligaciones emitidas / Número obligaciones cumplidas.	800	100.0	100	100	100	100	100	100	100															
	Conformación de Grupo de Gestión Social y Ambiental	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%															
Capacitación Ambiental	Número de capacitaciones ejecutadas / número de capacitaciones programadas	800	100.0	100	100	100	100	100	100	100															
	Número de personas con capacitación en el periodo / número de personas programadas	800	100.0	100	100	100	100	100	100	100															
	Manejo integral de materiales de construcción	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%															
Cumplimiento de requisitos legales	Número de permisos otorgados / Número de permisos requeridos.	697.1428571	87.1	70	70	70	100	100	100	100															
	Manejo de aguas superficiales	697%	871%	700%	700%	700%	1000%	1000%	1000%	1000%	0%	0%	0%	0%	0%										
Manejo integral de material en las construcciones	Número requerimientos por manejo de los materiales de	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0															
	Manejo integral de materiales de construcción	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%										
Proyecto de señalización frentes de obra y sitios	Número de frentes de trabajo señalizados / Numero de frentes de trabajo en las actividades de	40	5.0	5	5	5	5	5	5	5															
	Proyecto de señalización frentes de obra y sitios temporales.	4000%	500%	500%	500%	500%	500%	500%	500%	500%	0%	0%	0%	0%	0%										
Proyecto de Manejo y disposición final de RCD.	Número de requerimientos = 0 de la autoridad ambiental como de	0	0.0	0	0	0		0	0	0															
	Número de sitios utilizados / número de sitios aprobados.	800	100.0	100	100	100	100	100	100	100															
	Proyecto de Manejo y disposición final de RCD.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%															
Manejo de aguas superficiales	Número de actividades ejecutadas	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	Valor parámetros evaluados = valor parámetro norma vigente	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	Manejo de aguas superficiales																								
Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales	Numero de actividades ejecutadas / número de actividades	30.33333333	2.3	9	7	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0										
	Verificación de parámetros = o < la norma	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales																								
Proyecto de manejo de cobertura vegetal	Número de arboles protegidos/	0	0.0	0	0			0																	
	Numero de medidas propuestas / número de medidas ejecutadas	0	0.0	0	0																				
	Proyecto de manejo de cobertura vegetal y protección de arboles																								
Proyecto de protección de fauna	Número de reportes de afectación	0	0.0	0	0																				
	Numero de reportes de individuos afectados	0	0.0	0	0																				
	Proyecto de manejo de Maquinaria, Equipos y Vehiculos																								
Proyecto Instalación, funcionamiento	Numero de actividades ejecutadas / número de actividades	7	1.0	1	1	1	1	1	1																
	Numero de requerimientos evaluados / número de	7	1.0	1	1	1	1	1	1																
	Proyecto Instalación,	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%																
Proyecto Instalación, funcionamiento	Numero de actividades ejecutadas / número de actividades	0	0.0	0	0																				
	Numero de actividades por causas del manejo de maquinaria	0	0.0	0	0																				
	Proyecto de manejo de Maquinaria,																								

4. OBSERVACIONES

1. SE ADJUNTARAN LOS CERTIFICADOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD Y PROCEDENCIA DE MATERIAL DEL PERIODO DEL INFORME N°6

5. ANEXOS

No	Descripción	Folios
SST-1	Matriz de identificación de peligros y riesgos	
SST-2	Registros capacitación y entrenamiento realizado	
SST-3	Registros de ATS	
SST-4	Registro fotográfico	
SST-5	Registro entrega de elementos de seguridad	
SST-6	Registro de inspecciones realizadas en el periodo	
SST-7	Registro control de aportes en seguridad social	
SST-8	Planillas de aportes a la seguridad social	
SST-9	Otros anexos (Especificar cual)	

No	Descripción	Folios
AMB-1	Registro de Asistencia a Capacitación	
AMB-2	Documentación de Maquinaria y Vehiculos	
AMB-3	Certificado de Mantenimiento de Sanitarios en Obra	
AMB-4	Certificado de RCD periodo del Informe 5	
AMB-5		
AMB-6		
AMB-7		
AMB-8		
AMB-9		
AMB-10		

Firma
Nombre Hernando Marquez Hernandez
Responsable del área ambiental
Contratista

Firma
Nombre
Responsable del área SST
Contratista

Firma
Nombre
Responsable del área ambiental
Interventoría

Firma
Nombre
Responsable del área SST
Interventoría

CONSORCIO URBANO LP	**INFORME MENSUAL SOCIAL**	14 3 6/05/2022

Informe No	6	**Periodo**	1	**al**	30	**Octubre**
Contrato de obra		LP - 024 - 2024				
Contratista		CONSORCIO URBANO LP 2024				

Proyecto

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

1. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES REALIZADAS

1.1 INFORMACION, DIVULGACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

1.1.1 REUNIONES CON LA COMUNIDAD

Periodo	Fecha			Lugar	Tipo de reunión	No Asistentes	Anotaciones	Registros dejados
Octubre. 2 a Nov 3 de 2025	9	10	2025	Calle 72 # 41b-89 Oficinas del Contratista	Comite de Participacion Ciudadana	8	Socializacion de los avances de obra, que se han obtenido durante el mes de Octubre de 2025, se toca una vez mas el tema del estacionamiento de vehiculos y se plantea realizar un recorrido en obra con personal de Movilidad	Acta de reunión, registro de asistencia, registro fotogrrafico
Octubre. 2 a Nov 3 de 2025	14	10	2025	Calle 72 entre cra. 38 y cra-39	recorrido de obra	2	Se realiza recorridode obraa con funcionario de la oficina de movilidad, con el objetivo de dejar evidencias de las infracciones de los ciudadanos y tomar correctivos, ya que atentan contra la estabilidad y garantia de la obra	Acta de reunión, registro de asistencia, registro fotogrrafico
Octubre. 2 a Nov 3 de 2025	18	10	2025	SAC calle 72 #41b-89 Oficina del Contratista	Apertura de Buzon de Sugerencias	2	Se realiza apertura de buzon de sugerencia con el objetivo de revisar y registrar las manifestaciones ciudadanas presentaadas por la comunidad, para este periodo se constata que no se presento niguna pqr	Acta de reunión, registro de asistencia, registro fotogrrafico
Octubre. 2 a Nov 3 de 2025	24	10	2025	Calle 72 # 39 - 69 Edificio La Giralda	Reunion con el Edificio la Giralda	8	Se realiza reunion con el edificio la Giralda y sus administradores y dueños de locales con el objetivo de definir finalmente la construccion de una bahia de parqueadero	Acta de reunión, registro de asistencia, registro fotogrrafico
					Total	**20**		

1.1.2 DIVULGACION A LA COMUNIDAD

Periodo	Fecha			Mecanismo de divulgacion	Cantidad	Tema	Registros dejados
Octubre 2 a 3 noviembre 2025	6	10	2025	Entrega de Volantes	13	Socializacion mecanismos de comunicación	formato de entrega, modelo volante y registro fotogrrafico
Octubre 2 a 3 noviembre 2025	14	10	2025	Entrega de Volantes	12	Socializacion del Proyecto	formato de entrega, modelo volante y registro fotogrrafico
				Total	25		

1.2 POLITICA DE EMPLEO

2.2.1 INCLUSION DE PERSONAL

30% MANO DE OBRA NO CALIFICADA - HOMBRE Y 5% DEBEN SER MUJERES DE LA REGION

Nombre	Cedula	Cargo	Tipo de población
1. Larrisa Esther Parra Vanegas	225155379	Auxiliar de Transito	Monc - Mujer de la Region
2. Yeinis Patricia Badel Ruiz	22522750	Auxiliar de trafico	Monc - Mujer de la Region
3. Yenifer Ofelia Ortiz Peña	1045233156	Auxiliar de Trafico	Monc - Mujer de la Region
4. Cindy San Martin Ochoa	1045677848	Auxiliar de Trafico	Monc - Mujer de la Region
5. Luz Elena Bolivar	32606077	Auxiliar de Trafico	Monc - Mujer de la Region
6. Yessenia Ferrer Tellez	1095923835	Auxiliar de Trafico	Monc - Mujer de la Region
7. Martina Martinez Vasquez	36454629	Auxiliar de Trafico	Monc - Mujer de la Region
7. Jhonnys Samper Barros	72339806	Auxiliar de Trafico	Monc - Hombre de la Region
8. Josue Rodriguez Tapia	19873349	celador	Monc - Hombre de la Region
9.Ever Utria Montero	3745969	celador	Monc - Hombre de la Region
10. Elkin LaMadrid	72250863	Boal	Monc - Hombre de la Region
11. Keyvis Santana	1151473481	Boal	Monc - Hombre de la Region
12. Samuel Triana	1129508969	Boal	Monc - Hombre de la Region
13. Jovany Acosta Arevalo	72200647	Boal	Monc - Hombre de la Region
14.Mauro Pino Masilli	8798509	Ayudante de Obra	Monc - Hombre de la Region
15. Roberto Antonio Arroyo Rojano	1002184534	Ayudante de Obra	Monc - Hombre de la Region
16. Rafael Cassiani Cardenas	1045307205	Ayudante de Obra	Monc - Hombre de la Region
17. Sebastian Casseres Reyes	72273396	Ayudante de Obra	Monc - Hombre de la Region
18. Atilano Mier Diaz	7642787	Ayudante de Obra	Monc - Hombre de la Region
19. Ramiro Torregrosa	8602189	Ayudante de Obra	Monc - Hombre de la Region
20.Ismael Arguelle Nuñez		Ayudante de Obra	Monc - Hombre de la Region
21. Jovanis Cantillo Ortega	1130266833	Ayudante de Obra	Monc - Hombre de la Region
22. Carlos Manuel Meza Arroyo	72203138	Ayudante de Obra	Monc - Hombre de la Region
23. Manuel Esteban De la Cruz Orozco	3745879	Ayudante de Obra	Monc - Hombre de la Region
24. Elver Patiño Peñaloza	1093801505	Ayudante de Obra	Monc - Hombre de la Region
25. Samir Garrido Muñoz	72247052	Ayudante de Obra	Monc - Hombre de la Region
26. Lugardo Rafael Teran Diaz	9153206	Ayudante de Obra	Monc - Hombre de la Region
27. Carlos David Urango Peñaloza	1044615662	Ayudante de Obra	Monc - Hombre de la Region
28. Ariel David De la Rosa Pacheco	7598081	Ayudante de Obra	Monc - Hombre de la Region
29. Wilson Ortega Caro	72247064	Ayudante de Obra	Monc - Hombre de la Region
30. Enmanuel Jose Correa Fontalvo	1044626243.0	Ayudante de Obra	Monc - Hombre de la Region
31. Alexander Ramirez Viñas	72192791	Ayudante de Obra	Monc - Hombre de la Region
32. Jose Alvarez Chamorro	1002132952	Ayudante de Obra	Monc - Hombre de la Region
33.Jhon Morales Medrano	72198766	Ayudante de Obra	Monc - Hombre de la Region
34.Jovanis Cantillo Ortega	1130266833	Ayudante de Obra	Monc - Hombre de la Region

Cantidad de mano de obra no calificada MONC dentro del proyecto	34	DE BARRANQUILLA
Cantidad de mano de obra calificada MOC dentro del proyecto	114	

INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS

Barrio	Acta No	Ocupante / propietario	Dirección	Tipo de uso	Estado		Observaciones
					Inicio	Cierre	
San Francisco - Calle 72	1	Estadero San Francisco	calle 72 # 38 - 04	Comercial	x		
San Francisco - Calle 72	2	Predio Desocupado	calle 72 # 38 - 20	Comercial	p		Predio Cerrado
San Francisco - Calle 72	3	Academia de Conduccion	calle 72 # 38 - 32	Comercial	x		
San Francisco - Calle 72	4	Restaurante	calle 72 # 38 - 42	Comercial	x		
San Francisco - Calle 72	5	Grupo Alipar	calle 72 # 38 - 52	Comercial	x		
San Francisco - Calle 72	6	Monasterio Santa Clara	calle 72 # 38 - 80	intitucional	x		
San Francisco - Calle 72	7	Vivienda familiar 2 pisos	calle 72 # 38 - 160	Residencial	p		No permitio
San Francisco - Calle 72	8	Serviford	calle 72 # 38 - 172	Comercial	x		
San Francisco - Calle 72	9	Electronica Nippon	calle 72 # 38 - 178	Comercial	x		
San Francisco - Calle 72	10	Edificio Plaza de Las Palmeras	calle 72 # 38 - 186	Comercial	x		
San Francisco - Calle 72	11	Local Lg	calle 72 # 38 - 202	Comercial	x		
San Francisco - Calle 72	12	Notacia Doce	calle 72 # 38 - 212	Comercial	x		
San Francisco - Calle 72	13	Marlene Torres Osorio	calle 72 # 38 - 222	Residencial	x		
San Francisco - Calle 72	14	Esforzarte	calle 72 # 38 - 238	Educativo	x		
San Francisco - Calle 72	15	Sony Vision	calle 72 # 38 - 244	Comercial	x		
Acera Impar							
San Francisco - Calle 72	16	Drogas La Rebaja	calle 72 # 38 - 05	comercial	x		
San Francisco - Calle 72	17	Mensajeria Envia	calle 72 # 38 - 13 Lc 1	comercial	x		
San Francisco - Calle 72	18	Peluqueria Beauty Club	calle 72 # 38 - 13 Lc 2	comercial	x		
San Francisco - Calle 72	19	Estadero La Nuevecita	calle 72 # 38 - 23	comercial	x		
San Francisco - Calle 72	20	Peluqueria Carolina Romero	calle 72 # 38 - 37	comercial	x		
San Francisco - Calle 72	21	Atli Ltda	calle 72 # 38 - 39	comercial	x		
San Francisco - Calle 72	22	Marqueteria Suarez	calle 72 # 38 - 53	comercial	x		
San Francisco - Calle 72	23	Colegio Sagrada Familia	calle 72 # 38 - 79	comercial	x		
San Francisco - Calle 72	24	Servicio Tecnico	Cra. 38B #72-30 Lc15	Comercial	x		
San Francisco - Calle 72	25	Desocupado	Cra. 38B #72-24 Lc 14	comercial	p		
San Francisco - Calle 72	26	King Electronica Center	Cra. 38B #72-18 Lc 13	comercial	x		
San Francisco - Calle 72	27	El Sonido	calle 72 # 38B - Lc 12	comercial	x		
San Francisco - Calle 72	28	Salon de Belleza Celeste	calle 72 # 38B - Lc 11	comercial	x		
San Francisco - Calle 72	29	Unitronica La 72	Calle 72 # 38B - 20 Lc10	comercial	x		
San Francisco - Calle 72	30	Desocupado	Calle 72 # 38B - 20 Lc 9	comercial	p		
San Francisco - Calle 72	31	Electronica Ahlbrecht	Calle 72 # 38B - 33 Lc 8	comercial	x		

Informe No	**6**	**Periodo**	**1**	**al**	**30**
Contrato de obra	**LP - 024 - 2024**				
Contratista	**CONSORCIO URBANO LP 2024**				

Octubre **Proyecto**

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

San Francisco - Calle 72	32	Local LG &Sony	Calle 72 # 38B - 35 Lc 7	comercial	x		
San Francisco - Calle 72	33	Copiando	Calle 72 # 38B - 39 Lc 6	comercial	x		
San Francisco - Calle 72	34	Electronica Nuñez /copiado	Calle 72 # 38B - 39 Lc 6	comercial	x		
San Francisco - Calle 72	35	Sonaradio Bello y Florez Cia. Ltda	Calle 72 # 38B - 41 Lc 5	comercial	x		
San Francisco - Calle 72	36	Fix Store	Calle 72 # 38B - 61 Lc 4	comercial	x		
San Francisco - Calle 72	37	Efecty Giros	Calle 72 # 38B - 61 Lc 3	comercial	x		
San Francisco - Calle 72	38	Salon de Belleza Sonya Burgos	Calle 72 # 38B - 61 Lc 3-2	comercial	x		
San Francisco - Calle 72	39	Restaurante	Calle 72 # 38B - 61 Lc 2	comercial	x		
Acera ImPar							
San Francisco - Calle 72	40	Centro de Eventos Kahuama	Calle 72 # 39 - 09	comercial	x		
San Francisco - Calle 72	41	Edificio Dali	Calle 72 # 39 - 29	comercial	x		
San Francisco - Calle 72	42	Villas de Madrid	Calle 72 # 39 - 51	comercial	x		
San Francisco - Calle 72	43	Edificio Residencial La Giralda	Calle 72 # 39 - 67	comercial	x		
San Francisco - Calle 72	44	Electrochip	Calle 72 # 39 - 67 Lc 1	comercial	x		
San Francisco - Calle 72	45	Sharp Sony	Calle 72 # 39 - 67 Lc 2	comercial	x		
San Francisco - Calle 72	46	Oficentro 72	Calle 72 # 39 - 91	comercial	x		
San Francisco - Calle 72	47	Ruben Ojeda Villalobos	Calle 72 # 39 - 115	comercial	x		
San Francisco - Calle 72	48	Brenda Fadull	Calle 72 # 39 - 123	comercial	x		
San Francisco - Calle 72	49	Proteger Seguridad	Calle 72 # 39 - 123	comercial	x		
San Francisco - Calle 72	50	Angie Marcela Sabino	Calle 72 # 39 - 135	Mixto	x		
San Francisco - Calle 72	51	Patrimonio casa de Leones	Calle 72 # 39 - 155	comercial	x		
San Francisco - Calle 72	52	Karen Lezaman	Calle 72 # 39 - 153	comercial	x		
San Francisco - Calle 72	53	Andrea Gutierrez	Calle 72 # 39 - 135	comercial	x		
San Francisco - Calle 72	54	Local Comercial Desocupado	Calle 72 # 39 - 155	Comercial	x		
San Francisco - Calle 72	55	Edificio Los Portales/Gina Hoyos Redondo	Calle 73 # 39 -	Residencial	x		
San Francisco - Calle 72	56	Boracay	Calle 72 # 39 - 175	Mixto	x		
Acera Par							
San Francisco - Calle 72	57	David Pereira Patiño	Calle 72 # 39 - 08	comercial	x		
San Francisco - Calle 72	58	ACC de la Costa	Calle 72 # 39 - 10	comercial	x		
San Francisco - Calle 72	59	Mundo Mujer	Calle 72 # 39 - 20	comercial	x		
San Francisco - Calle 72	60	Tecnicenteer t2	Calle 72 # 39 - 25	comercial	x		
San Francisco - Calle 72	61	Casa residencial - no atendieron	Calle 72 # 39 - 46	comercial	x		
San Francisco - Calle 72	62	Iglesia Mormona	Calle 72 # 39 - 56	comercial	x		
San Francisco - Calle 72	63	Edificio Plaza 72	Calle 72 # 39 - 114	comercial	x		
San Francisco - Calle 72	64	Desocupado	Calle 72 # 39 - 136	comercial	x		
San Francisco - Calle 72	65	Renault	Calle 72 # 39 - 156	comercial	x		
San Francisco - Calle 72	66	Carmens Lenceria	Calle 72 # 39 - 192	comercial	x		
San Francisco - Calle 72	67	Odontologia Pedro	Calle 72 # 39 - 206	comercial	x		
San Francisco - Calle 72	68	Odontall	Calle 72 # 39 - 222 Lc 1	comercial	x		
San Francisco - Calle 72	69	Polarizados Atlantis Center	Calle 72 # 39 - 222 Lc 2	comercial	x		
San Francisco - Calle 72	70	Drogueria Viva	Calle 72 # 39 - 222 Lc 3	comercial	x		
San Francisco - Calle 72	71	Maria Lopez	Calle 72 # 39 - 222 Piso 2	comercial	x		
Acera Par							
Las Delicias - Calle 72	72	Hotel El Prado	Carrera 54 # 70 - 168-	Comercial	x		
Las Delicias - Calle 72	73	Sacudel - Leonardo Lopez Vasquez	Calle 72 # 56 - 18	Comercial	x		
Las Delicias - Calle 72	74	Curvash - Leonardo Lopez Vasquez	Calle 72 # 56 - 18	Comercial			
Las Delicias - Calle 72	75	Tu Optica - Leonardo Lopez Vasquez	Calle 72 # 56 - 18 Piso 2 lc1	Comercial	x		
Las Delicias - Calle 72	76	Local Desocupado	Calle 72 # 56 - 18 Piso 2 lc 2	Comercial	x		
Las Delicias - Calle 72	77	Local Desocupado	Calle 72 # 56 - 18 Piso 2 lc 3	Comercial	x		
Las Delicias - Calle 72	78	Veterinaria Therapet	Calle 72 # 56 - 18 Piso 2 lc 4	Comercial	x		
Las Delicias - Calle 72	79	Academia	Calle 72 # 56 - 18 Piso 2 lc 5	Comercial	x		
Las Delicias - Calle 72	80	Saloon In	Calle 72 # 56 - 18 Piso 2 lc 6	Mixto	x		
Las Delicias - Calle 72	81	Edificio Tekar	Calle 72 # 56 - 70	Comercial	x		
Las Delicias - Calle 72	82	Edificio Tekar Local 1 Piso1 Desocupado	Calle 72 # 56 - 70 Lc 1	Comercial	x		
Las Delicias - Calle 72	83	Edificio Tekar Envia	Calle 72 # 56 - 70 Lc 2	Comercial	x		
Las Delicias - Calle 72	84	Edificio Tekar Super Giros	Calle 72 # 56 - 70 Lc 3	Comercial	x		
Las Delicias - Calle 72	85	Edificio Tekar Gratitour	Calle 72 # 56 - 70 Lc 4	Comercial	x		
Las Delicias - Calle 72	86	Edificio Costa Prado	Cra 57 # 70 - 135	Comercial	x		
Las Delicias - Calle 72	87	Edificio Costa Prado Local 1 IPS	Calle 72 # 56 - 86	Comercial	x		
Las Delicias - Calle 72	88	Autocamiones	Calle 72 # 57 - 14	Comercial	x		
Las Delicias - Calle 72	89	Irma Fernandez de Chapman	Calle 72 # 57 - 36	Comercial	x		
Las Delicias - Calle 72	90	Edificio Chicago lc 1	Cra 58 # 70 - 129	Comercial	x		
Las Delicias - Calle 72	91	Edificio Chicago Local 2	Cra 58 # 70 - 129	Comercial	x		
Las Delicias - Calle 72	92	Edificio Chicago Relojeria TimeWatch	Cra 58 # 70 - 129	Comercial	x		
Las Delicias - Calle 72	93	Edificio Chicago Farmacenter	Cra 58 # 70 - 129	Comercial	x		
Las Delicias - Calle 72	94	Edificio Chicago Cerrajeria	Cra 58 # 70 - 129	Comercial	x		
Las Delicias - Calle 72	95	Edificio Chicago Local Desocupado	Cra 58 # 70 - 129	Comercial	x		
Las Delicias - Calle 72	96	Edificio Chicago Odontologia Natalia Mindiola	Cra 58 # 70 - 129	Comercial	x		
Las Delicias - Calle 72	97	Edificio Chicago Cooperativa	Cra 58 # 70 - 129	Comercial	x		
Las Delicias - Calle 72	98	Seguros del Estado	Cra 58 # 70 - 129	Comercial	x		
Las Delicias - Calle 72	99	Peluquería Hernan Perrez Barrera	Calle 72 # 58 - 52	Comercial	x		
Las Delicias - Calle 72	100	Supermercado Isimo	Calle 72 # 58 - 55	Comercial	x		
Las Delicias - Calle 72	101	Edificio Torres del Prado	Cra 59 # 70 - 137	Comercial	x		
Las Delicias - Calle 72	102	Restaurante El corralito	Calle 72 # 59 - 12	Comercial	x		
Las Delicias - Calle 72	103	David Araque Guzman Fritos	Calle 72 # 59 - 12	Comercial	x		
Las Delicias - Calle 72	104	Nueva Vision Yuranis Medina Gonzalez	Calle 72 # 59 - 38	Comercial	x		
Las Delicias - Calle 72	105	Olimpica Tanganazo Cra. 60	Cra 60 # 70 - 137	Comercial	x		
Acera ImPar							
Las Delicias - Calle 72	106	Movistar Luis Fernando Navarro	Cra 54 # 72 - 35	Comercial	x		
Las Delicias - Calle 72	107	Edificio Serfinanza	Calle 72 # 54 - 35	Comercial	x		
Las Delicias - Calle 72	108	Hotel Vallclaire	Calle 72 # 55 - 25	Comercial	x		
Las Delicias - Calle 72	109	Lavadero La Pista	Cra. 56 # 72 - 12	Comercial	x		
Las Delicias - Calle 72	110	Edificio Fincar	Cra. 57 # 72 - 25	Comercial	x		
Las Delicias - Calle 72	111	Restaurante Arley Suarez Suarez	Calle 72 # 57 - 13	Comercial	x		
Las Delicias - Calle 72	112	Super Giros	Calle 72 # 57 - 13	Comercial	P		
Las Delicias - Calle 72	113	E. Jimenez & Asociados	Calle 72 # 57 - 15	Comercial	x		
Las Delicias - Calle 72	114	Super Efectivo	Calle 72 # 57 - 15	Comercial	x		
Las Delicias - Calle 72	115	Tienda La Maravilla Hernando Hormiga	Calle 72 # 57 - 21	Comercial	x		
Las Delicias - Calle 72	116	Edificio Recio Turismo	Calle 72 # 57 - 37	Comercial	x		
Las Delicias - Calle 72	117	Edificio Avianca	Calle 72 # 58 - esq	Comercial	x		
Las Delicias - Calle 72	118	Vivienda Desocupada	Calle 72 # 58 - 29	Comercial	x		
Las Delicias - Calle 72	119	Restaurante Las Palmitas Angie Rodriguez Valencia	Calle 72 # 58 - 39	Comercial	x		
Las Delicias - Calle 72	120	Edificio Centro 72	Cra. 59 # 72 - 13	Mixto	x		
Las Delicias - Calle 72	121	Edificio Blanca Elvira	Cra. 59 # 72 - 08	Mixto	x		
Las Delicias - Calle 72	122	Ofelia Mazzillo de Pombo	Calle 72 # 59 - 31	residencial	x		
Las Delicias - Calle 72	123	Unifrar	Calle 72 # 59 - 39	Comercial	x		
Las Delicias - Calle 72	124	Edificio Barranquilla	Cra. 60 # 72 - 19	Comercial	x		
Acera Par Calle 72 Cra. 41 a la 41B Junio 2025							
Las Delicias - Calle 72	125	Constructora Charaneck	Calle 72 # 41 - 24	Baldio	X		
Las Delicias - Calle 72	126	Edificio Boulevar 72	Calle 72 # 41 - 62	residencial	X		
Las Delicias - Calle 72	127	Edificio Julian / Valerio Molinares	Calle 72 # 41 - 64	Mixto	X		
Las Delicias - Calle 72	128	Tienda Julian / Rosa Vasquez Arboleda	Calle 72 # 41 - 68	Comercial	X		
Las Delicias - Calle 72	129	Multidesechables/ Maria Vasquez Arboles	Calle 72 # 41 - 78	comercial	X		
Las Delicias - Calle 72	130	Tres PCL Logistics	Calle 72 # 41 - 88	Comercial	X		
Las Delicias - Calle 72	131	Odontologia Biodentis	Calle 72 # 41 - 88 Lc 2	Comercial	X		
Las Delicias - Calle 72	132	Arepas Asadas la 72	Calle 72 # 41 - 88 Lc 1	Comercial	X		
Acera Impar Calle 72 Cra. 41 a la 41B - Junio 2025							
Las Delicias - Calle 72	133	Mercadito La 72 / Sr. Arturo Sierra	Calle 72 # 41 - 03	Mixto	X		
Las Delicias - Calle 72	134	Panaderia Artesanal	Calle 72 # 41 - 13	Mixto	X		
Las Delicias - Calle 72	135	PeluqueriaEloisa Solano	Calle 72 # 41 - 21	Comercial	X		
Las Delicias - Calle 72	136	Naturalife/Gagriela Pacheco	Calle 72 # 41 - 21 Lc 1	Comercial	X		
Las Delicias - Calle 72	137	Jhon Patiño Camargo/Tv Led 4K	Calle 72 # 41 - 27	Mixto	X		
Las Delicias - Calle 72	138	Jhon Martinez Campo/inmobiliaria	Calle 72 # 41 - 35	Mixto	X		
Las Delicias - Calle 72	139	Angel Gutierrez De la Ossa/ Carlux	Calle 72 # 41 - 41	comercial	x		
Las Delicias - Calle 72	140	Juan Bernado Gaitan	Calle 72 # 41 - 49	Mixto	x		**Desocupado**
Las Delicias - Calle 72	141	Fabio Florez Lozano /Bar Nocturno	Calle 72 # 41 - 59	Mixto	x		
Las Delicias - Calle 72	142	Edificio	Calle 72 # 41 -	Mixto			**Desocupado**
Las Delicias - Calle 72	143	Casa Residencial	Calle 72 # 41 - 83	residencial			**Desocupado**
Las Delicias - Calle 72	144	Edificio / Wilson Martinez Consuegra	Cra. 41B # 42-05	Mixto	x		
Acera par Calle 72 Cra. 41B a la 41C - Julio 2025							
Las Delicias - Calle 72	145	Edificio Centro Empresarial Da Santos	Calle 72 # 41B - 09	Comercial	x		
Las Delicias - Calle 72	146	Edificio El Neco	Calle 72 # 41B - 33	Mixto	x		
Las Delicias - Calle 72	147	Edifio El Neco Peluqueria Elegancia y Estilo	Calle 72 # 41B - 23	comercial	x		
Las Delicias - Calle 72	148	Edifio El Neco Barberia Niche	Calle 72 # 41B - 27	comercial	x		
Las Delicias - Calle 72	149	Edifio El Neco Comercializar	Calle 72 # 41B - 29	comercial	x		
Las Delicias - Calle 72	150	Edificio Dayana Suarezz Meza	Calle 72 # 41B - 47	Mixto	x		
Las Delicias - Calle 72	151	Mildred Aldana/ Peluqueria Estefany Jimenez	Calle 72 # 41B - 61 Lc 1	comercial	x		
Las Delicias - Calle 72	152	Mildred Aldana/Gloss	Calle 72 # 41B - 61 lc 2	comercial	x		
Las Delicias - Calle 72	153	Mildred Aldana/Perfectas	Calle 72 # 41B - 61 lc 3	comercial	x		
Las Delicias - Calle 72	154	Edificio Orpis	Calle 72 # 41B - 73	Mixto	x		
Las Delicias - Calle 72	155	Sancochos la 72	Calle 72 # 41B - 81	Comercial	x		

CONSORCIO URBANO LP	**INFORME MENSUAL SOCIAL**	14 3 6/05/2022

Informe No	**6**	**Periodo**	**1**	**al**	**30**	**Octubre**
Contrato de obra		**LP - 024 - 2024**				
Contratista		**CONSORCIO URBANO LP 2024**				

Proyecto

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Las Delicias - Calle 72	156	Edificio Telemina	Calle 72 # 41B - 95	Mixto	x		
Las Delicias - Calle 72	157	Edificio Telemina LocalesComerciales	Calle 72 # 41B - 89	Comercial	x		
Acera Impar Calle 72 Cra. 41B a la 41C - Julio 2025							
La Delicias - Calle 72	158	Comidas Rapidas Mac Clain	Calle 72 # 41B - 08	Comercial	p		
La Delicias - Calle 72	159	Comidas Rapidas La 72 /Marlena Zamudio	Calle 72 # 41B - 18	Mixto	x		
La Delicias - Calle 72	160	Edificio Tajamares/camilo AndresGomez	Calle 72 # 41B - 28	Mixto	x		
La Delicias - Calle 72	161	Interrapidisimo	Calle 72 # 41B - 28 lc 1	comercial	x		
La Delicias - Calle 72	162	Odontologia Royal Dent	Calle 72 # 41B - 28 lc 2	Comercial	x		
La Delicias - Calle 72	163	Boutique Silvera	Calle 72 # 41B - 28 lc 3	comercial	x		
La Delicias - Calle 72	164	Alejandrro Pinelli Will	Calle 72 # 41B - 44	Mixta	x		
La Delicias - Calle 72	165	Optica Nueva Vision/Alvaro Contreras Capella	Calle 72 # 41B - 54	Mixta	x		
La Delicias - Calle 72	166	Sergio Antonio Quijano	Calle 72 # 41B - 66	Comercial	x		
Acera par Calle 72 Cra. 41C a la 43 - Agosto 2025							
La Delicias - Calle 72	167	Jerys Vega Algarin / Panaderia La Ricota	Calle 72 # 41C- 08	Comercial			
Las Delicias - Calle 72	168	Kevin Valencia Hernandez / Alpha Barberia	Calle 72 # 41C- 14	Comercial			
Las Delicias - Calle 72	169	Hilda Florez Tapia / Salon Stilo	Calle 72 # 41C- 14	Comercial			
Las Delicias - Calle 72	170	Carlos Caballero Arteta	Calle 72 # 41C- 32	Comercial			
Las Delicias - Calle 72	171	Kirenia Rojas Quintero / Experiencia Multimarcas	Calle 72 # 41C- 32	Comercial			
Las Delicias - Calle 72	172	Genesis Villalobos Lucena / konectado2	Calle 72 # 41C- 22	Comercial			
Las Delicias - Calle 72	173	Milena Cabarcas Chamorro / Fajas MD	Calle 72 # 41C- 30	Comercial			
Las Delicias - Calle 72	174	Acceso	Calle 72 # 41C- 31	Residencial			
Las Delicias - Calle 72	175	Super Giros	Calle 72 # 41C- 36	Comercial			
Las Delicias - Calle 72	176	Liliana Jimenez Cuello / Beauty Caprice	Calle 72 # 41C- 36	Comercial			
Las Delicias - Calle 72	177	Katherine Banquez Mancilla /Mixturii	Calle 72 # 41C- 36	Comercial			
Las Delicias - Calle 72	178	Corporacion Universitaria Americana	Calle 72 No. 41C-64	Comercial			
Acera par Calle 72 Cra. 41B a la 43 - agosto 2025							
Las Delicias - Calle 72	179	Boris Bolivarr Atencia / CC Importaciones	Calle 72 # 41B - 103	Comercial			
Las Delicias - Calle 72	180	Cristina Castañeda de la Rosa	Calle 72 # 41B - 111	Comercial			
Las Delicias - Calle 72	181	Desocupado	Calle 72 # 41B -	Comercial			
Las Delicias - Calle 72	182	Arelys Argel Guerra	Calle 72 # 41B - 131	Comercial			
Las Delicias - Calle 72	183	Ernesto Vergara Pacheco / Importadora el Hueco	Calle 72 # 41B - 137	Comercial			
Las Delicias - Calle 72	184	Liceth Ruz Quintero / Local Super Giros	Calle 72 # 41B - 147	Comercial			
Las Delicias - Calle 72	185	Danna Linares Fonseca / Perfuquimicos Premiun	Calle 72 # 41B - 155	Comercial			
Las Delicias - Calle 72	186	Analdis Puertas Orozco / Celuaccesorios	Calle 72 # 41B - 159	comercial			
Las Delicias - Calle 72	187	Zulima Moron Vera / Drogas La Botica	Cra. 43 # 72 - 09	Comercial			
Acera Impar Calle 72 Cra 44 a la 46 agosto 2025							
Las Delicias - Calle 72	188	Estadio	Calle 72 # 44-05				
Las Delicias - Calle 72 Cra. 44B a 45 agosto 2025							
Las Delicias - Calle 72	189	Tiendas Cañamo/Jackeline Miranda Cantillo	calle 72 # 44B - 06	Comercial			
Las Delicias - Calle 72	190	Tiendas del Blumer/Nolvis Maldonado	calle 72 # 44B - 12	Comercial			
Las Delicias - Calle 72	191	Daus /Enis De la Hoz	calle 72 # 44B - 16	Comercial			
Las Delicias - Calle 72	192	Tienda de Remate/Maria Mendoza Pacheco	calle 72 # 44B - 20	Comercial			
Las Delicias - Calle 72	193	Bonny Look /Debora Ortiz Cardenas	calle 72 # 44B - 32	Comercial			
Las Delicias - Calle 72	194	La Galeeria del Bebe /Sandra De la Hoz Pizarro	calle 72 # 44B - 36	Comercial			
Acera Par Las Delicias - Calle 72 Cra. 45 a 46 agosto 2025							
Las Delicias - Calle 72	195	Desocupado	calle 72 # 44B -	Comercial			
Las Delicias - Calle 72	196	Lidis Rivera Cochero / Champions	calle 72 # 45 - 66 Lc 2	Comercial			
Las Delicias - Calle 72	197	Lorena Suarez Utria / MegaOptica	calle 72 # 45 - 72	Comercial			
Las Delicias - Calle 72	198	Desocupado	calle 72 # 45 -	Comercial			Desocupado
Las Delicias - Calle 72	199	Desocupado	calle 72 # 45 -	Comercial			Desocupado
Las Delicias - Calle 72	200	Maria Camila Ucran / Opticas Pracso	calle 72 # 45 - 50	Comercial			
Las Delicias - Calle 72	201	Juleidys Peña Llerena / Tienda Won	calle 72 # 45 - 50	Comercial			
Las Delicias - Calle 72	202	Andres Amaya Diaz / Xtrike me	calle 72 # 45 - 50	Comercial			
Las Delicias - Calle 72	203	KENNIERYS Ramirez Arenas / Power Cel	calle 72 # 45 - 50	Comercial			
Las Delicias - Calle 72	204	David Comas Carvajal / Ofero 72	calle 72 # 45 - 60	Comercial			
Las Delicias - Calle 72	205	Dory Medina Solano / Tiendas Okey	calle 72 # 45 - 50	Comercial			
Las Delicias - Calle 72	206	Heidis Alvarez Aguilar / Tierra Santa	calle 72 # 45 - 166	Comercial			
Las Delicias - Calle 72	207	Kelly Gomez Garcia / Tienda Julieth Gomez	calle 72 # 45 - 166	Comercial			
Las Delicias - Calle 72	208	Bancolombia	calle 72 # 45 -	Comercial			Pendiente
Acera Impar Las Delicias - Calle 72 Cra. 46 a 47 Septiembre 2025							
Las Delicias - Calle 72	209	Super Giros	Calle 72 #46 - 19	Comercial			
Las Delicias - Calle 72	210	Local Desocupado	Calle 72 #46 - 19	comercial			
Las Delicias - Calle 72	211	Calzado Bucaramanga / Sugey Martinez	Calle 72 #46 - 19 lc 3	comercial			
Las Delicias - Calle 72	212	Calzado Alford /Johana Arteaga	Calle 72 #46 - 39	comercial			
Las Delicias - Calle 72	213	Supergiros / Arturo Borelli Salas	Calle 72 #46 - 59	comercial			
Las Delicias - Calle 72	214	Olimpica cra 47	Calle 72 #47 - 31	comercial			
Acera Par Las Delicias - Calle 72 Cra. 46 a 47 Septiembre 2025							
Las Delicias - Calle 72	215	Moises Iglesias / Estadio Elias Chegwin	Calle 72 # 70 - 294	comercial			
Acera Impar Las Delicias - Calle 72 Cra. 47 a 48 Septiembre 2025							
Las Delicias - Calle 72	216	Corn Accesorio para Celular / Alexa Oyola Barcelo	Calle 72 # 47 - 13 Lc 1				
Las Delicias - Calle 72	217	Dulcerna / Carlos Ortega Estrada	Calle 72 # 47 - 13 Lc 2				
Las Delicias - Calle 72	218	Calzado Cozzi / Adriana Gutierrez Suarez	Calle 72 # 47 - 39				
Las Delicias - Calle 72	219	Fraganti perfumeria	Calle 72 # 47 - 39 Lc 105				
Las Delicias - Calle 72	220	Hotel Prado 72 INN / Orlando Pulido	Calle 72 # 47 - 59				
Las Delicias - Calle 72	221	Vale's	Calle 72 # 47 - 65				
Las Delicias - Calle 72	222	Super Giros	Calle 72 # 47 - 69				
Las Delicias - Calle 72	223	Celuaccesorios / Liseth Cataño Vasquez	Calle 72 # 47 - 73				
Acera Par Las Delicias - Calle 72 Cra. 47 a 48 Septiembre 2025							
Las Delicias - Calle 72	224	Centro Comercial Alambra / Orlando Pulido	Calle 72 # 47 - 30				
Las Delicias - Calle 72	225	Edinson Valencia/ E. Jimenez y Asociados	Calle 72 # 47 - 38				
Las Delicias - Calle 72	226	Liliana Pino / Compra Venta Edicio Hazbum	Calle 72 # 47 - 48				
Las Delicias - Calle 72	227	Gloria Hurtado Rsmirez / Optica Vision	Calle 72 # 47 - 50 Lc 6				
Las Delicias - Calle 72	228	Peluquen Beauty Caprice	Calle 72 # 47 - 54				
Las Delicias - Calle 72	229	Adriana Severiche / Super efectivo / Edificio Hazbun	Calle 72 # 47 - 62				
Las Delicias - Calle 72	230	Laura Florez / Bizantine / Edificio Hazbum	Calle 72 # 47 - 64				
Acera Par Las Delicias - Calle 72 Cra. 44 a 44B Septiembre 2025							
Las Delicias - Calle 72	231	Almacen el Barato Diana Vertel Morelli	Calle 72 # 44 - 06				
Las Delicias - Calle 72	232	Jorge Arabia / Maria Graff Bolaño	Calle 72 # 44 - 20				
Las Delicias - Calle 72							

	Lugar de instalación	**Barrio**	**Fecha de instalación**	**Observaciones**
	social.consorciourbanolp@gmail.com	Las Delicias	30/03/2024	social.consorciourbanolp@gmail.com
	3008875720	Las Delicias	30/03/2024	Activo
	Permanente	Las Delicias	6/02/2025	instalado
	Calle 72 # 41B - 89	Las Delicias	30/05/2025	Instalado y Socializado con la comunidad a traves del Volante Informativo

		Actividad /tema	**Cantidad**	**Población objetivo**	**Barrio / Dirección**	**No Asistentes**	**Cant piezas entregadas**	**Evidencias**
11	2025	respeto y ayuda aal transeunte	12	Diregido al Personal de Obra	Calle 72	12	0	Registro Fotografico, Formato de Asitencia

		TOTAL		**2025**								**2026**												
	Fórmula x 100%	**Acumulado**	**Promedio**	**ab**	**may**	**jun**	**jul**	**ago**	**sept**	**oct**	**nov**	**dic**	**Ene**	**Feb**	**mzo**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**sep**	**Oct**	**nov**		
	Soc.realizadas	**59**		3	8	10	10	10	14	4														
	Soc, programadas	**62**		4	9	10	10	10	15	4														
	Socializaciones	95%		75%	89%	100%	100%	100%	93%	100%														
	Reuniones informativas realizadas	**0**		0	0	0	0	0	0	0														
	Reuniones informativas programadas	**0**		0	0	0	0	0	0	0														

CONSORCIO URBANO LP	INFORME MENSUAL SOCIAL	14
		3
		6/05/2022

Informe No	6	Periodo	1	al	30	Octubre	Proyecto
Contrato de obra	LP - 024 - 2024						OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
Contratista	CONSORCIO URBANO LP 2024						

Reuniones con la comunidad			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%																	
Inauguraciones realizadas	**0**		N/A	N/A	N/A	0	0	0	0																	
Inauguraciones autorizadas	**0**		N/A	N/A	N/A	0	0	0	0																	
Inauguraciones			N/A	N/A	N/A	0%	0%	0%	0%																	
No asistentes a las inaguraciones			N/A	N/A	N/A	0	0	0	0																	
No herramientas de divulgacion utilizadas			N/A	N/A	N/A	0	0	50	0																	
Asistencia a las Inaguraciones	0%		0%	0%	0%		0%	0%	0%																	
No de actas levantadas	**232**		67	57	20	22	42	24	232																	
No de vivienda del proyecto	**280**		210	210	210	210	210	232	232																	
Actas de inicio	82%		32%	27%	10%	10%	11%	10%	82%																	
No de actas de cierre realizadas			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A																	
No de actas de incio realizadas			67	57	20	22	42	22	p																	
Cierre de actas de vecindad	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%																		
Total pqr cerradas	**10**		0	2	2	2	0	2	3																	
Total pqr	**17**		0	3	1	3	4	2	4																	
Eficiencia en la gestión PQRS	70%		0%	67%	200%	67%	0%	0%	0%																	
Actividades realizadas	**28**		0	8	10	10	10	14	8																	
Actividades programadas	**29**		0	9	10	10	10	14	8																	
Actividades con la comunidad	98%			89%	100%	100%	100%	100%	100%																	
Actividades realizadas	**8**		0	3	2	3	0	1	1																	
Actividades programadas	**8**		0	3	2	3	0	3	1																	
Actividades con los trabajadores	83%		0%	100%	100%	100%	100%	33%	100%																	
Reuniones realizadas			0	0	1	1	3	0	0																	
Reuniones programadas			0	0	1	1	3	0	0																	
Reuniones comité Participación comunitaria	100%		0%	0%	100%	100%	100%																			
Empleo generados Mujeres C.O			2	4	5	5	6	6	6																	
Empleos requeridos contractual			5	5	5	5	5	6	6																	
Empleos Mujeres centro de oportunidades			40%	80%	100%	100%	120%	100%	100%																	
Empleos generados victimas del conflicto			0	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	NA																	
Total de empleos generados			0	0	0	0	0	0	0																	
Empleos Victimas del conflicto			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%																	
Empleos generados PPC			0	0	0	0	0	36																		
Total de empleos generados			0	0	0	0	0	121																		
Empleos poblacion proteccion constitucional Dec 1860/21			0%	0%	0%	0%	0%	30%																		
Empleos generados MONC Región			1	24	32	54	43	36																		
Total de empleos generados			11	58	74	103	112	121																		
Empleos MONC Región			9%	41%	43%	52%	38%	30%																		
Empleos generados mujeres MONC Región			2	1	4	4	6	6																		
Total de empleos generados			11	24	32	54	43	36																		
Empleos mujeres MONC de la región			18%	4%	13%	7%	14%	17%																		

	Descripción	No folios
	Registro consolidado de atenciones ciudadanas(pqrs)	1
	Registro formato de atenciones ciudadanas	2
	Soportes mecanismos de divulgación implementados	2
	Registro actas de reunión	14
	Registro listados de asistencia	10
	Registro control entrega de volantes	15

No	Descripción			No folios
PGS7	Certificación población víctimas del conflicto			0
PGS8	Certificación mujeres centro de oportunidades			0
PGS9	Actas de vecindad			42
PGS10	Acta restitución bienes afectados			0
PGS11	Registro fotográfico			42
PGS12	Otros anexos	(Especificar cual)		adres 65

Lilibeth Gutierrez G.

Firma

Nombre Sandra Rodriguez Sepulveda

Responsable del área social

Interve Interventoría

CONSORCIO URBANO LP	**REGISTRO FOTOGRAFICO**	Formato	10
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

PROYECTO	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.				
CONTRATO DE OBRA	**LP-024-2024**	**CONTRATISTA:**	**Consorcio Urbano LP**	**PERIODO**	oct-25



Foto No 1	Comité de Participacion Ciudadana



Foto No 2	Comité de Participacion Ciudadana





Foto No 3	Recorrido con Funcionario de Movilidad



Foto No 4	Recorrido con Funcionario de Movilidad



Foto No 5	Apertura Buzon de Sugerencias



Foto No 6	Apertura Buzon de Sugerencias

CONSORCIO URBANO LP	**REGISTRO FOTOGRAFICO**	Formato	10
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

PROYECTO	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.				
CONTRATO DE OBRA	**LP-024-2024**	**CONTRATISTA:**	**Consorcio Urbano LP**	**PERIODO**	oct-25



Foto No 7	Socialiacion Edificio la Giralda



Foto No 8	Socialiacion Edificio la Giralda



Foto No 9	Volanteo Socializacion del Proyecto



Foto No 10	Volanteo Socializacion del Proyecto



Foto No 11	Volanteo Punto SAC



Foto No 12	Volanteo Punto SAC

CONSORCIO URBANO LP	**REGISTRO FOTOGRAFICO**	Formato	10
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

PROYECTO	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.				
CONTRATO DE OBRA	**LP-024-2024**	**CONTRATISTA:**	**Consorcio Urbano LP**	**PERIODO**	oct-25



Foto No 13	Levantamiento Actas de Vecindad



Foto No 14	Levantamiento Actas de Vecindad



Foto No 15	respeto y ayuda al transeunte



Foto No 16	respeto y ayuda al transeunte



Foto No 17	Cierre PQR Sra. Sandra Gomez



Foto No 18	Cierre PQR Sra. Sandra Gomez

CONSORCIO URBANO LP	**REGISTRO FOTOGRAFICO**	Formato	10
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

PROYECTO	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.				
CONTRATO DE OBRA	**LP-024-2024**	**CONTRATISTA:**	**Consorcio Urbano LP**	**PERIODO**	oct-25



Foto No 19	Cierre PQR Sr. Valentina Bonivento



Foto No 20	Cierre PQR Sr. Valentina Bonivento





Foto No 21	Cierre Pqr Tienda Isimo Sr. Hernan Perez



Foto No 22	Cierre Pqr Tienda Isimo Sr. Hernan Perez
