RYF S.A.S
Consultoría, Auditoría e Interventoría


RYF SAS
CONSULTORIA, AUDITORIA E INTERVENTORIA
BOGOTÁ/COLOMBIA

HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA

HALLAZGOS DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza el estudio: HOSPITAL CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE CUNDINAMARCA	**Servicio: MEDICINA NUCLEAR**	**N° de Ficha: 001**
LOCALIZACIÓN / **IMAGEN**		**Fecha: 28-10-2025**

LOCALIZACIÓN

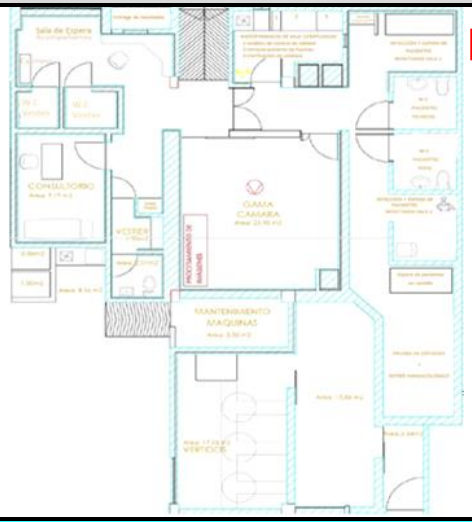

IMAGEN





TIPO DE HALLAZGO:

LOCALIZACIÓN	
SALA DE INYECCION 1	X

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

Se evidencia desprendimiento del chazo de sujeción muro.

PRE - DIAGNOSTICO

1) X Mantenimiento preventivo.
2) X Mantenimiento correctivo.

CLASIFICACIÓN CAUSA		**CAUSA**	**DIAGNÓSTICO**	**PREVENCIÓN / INTERVENCIÓN**		
DIRECTA	**Inf.**			**ELIMINACIÓN CAUSA**	**REPARACIÓN EFECTO**	**PREVENCIÓN**
Mantenimiento correctivo	Resolución 3100 de 2019	Mala manipulación por parte del personal del servicio.	Se debe realizar mantenimiento correctivo	Rellenar el orificio con silicona e insertar un chazo plastico expansivo para lograr su correcta sujeción al muro.	Al realizar estos cambios se subsanara esta anotación.	Se deben utilizar los materiales adecuados en las áreas de servicios todo como lo estipula la RESOLUCION 3100 DE 2019.

GRADO	
BAJO	
MEDIO	X
ALTO	

RYF S.A.S
Consultoría, Auditoría e Interventoría


RYF SAS
CONSULTORIA, AUDITORIA E INTERVENTORIA
BOGOTÁ/COLOMBIA

HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA


HALLAZGOS DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza el estudio: HOSPITAL CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE CUNDINAMARCA	**Servicio: MEDICINA NUCLEAR**	**N° de Ficha: 002**
		Fecha: 28-10-2025

LOCALIZACIÓN

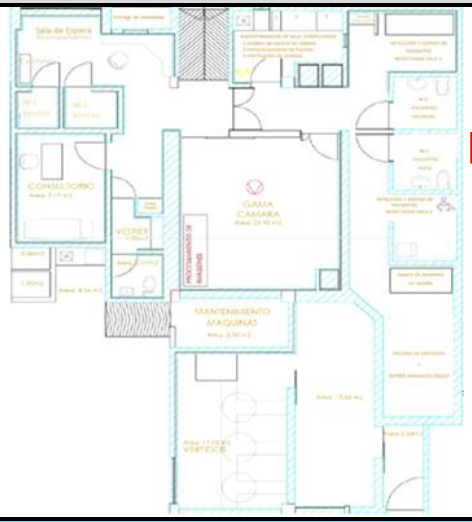

IMAGEN

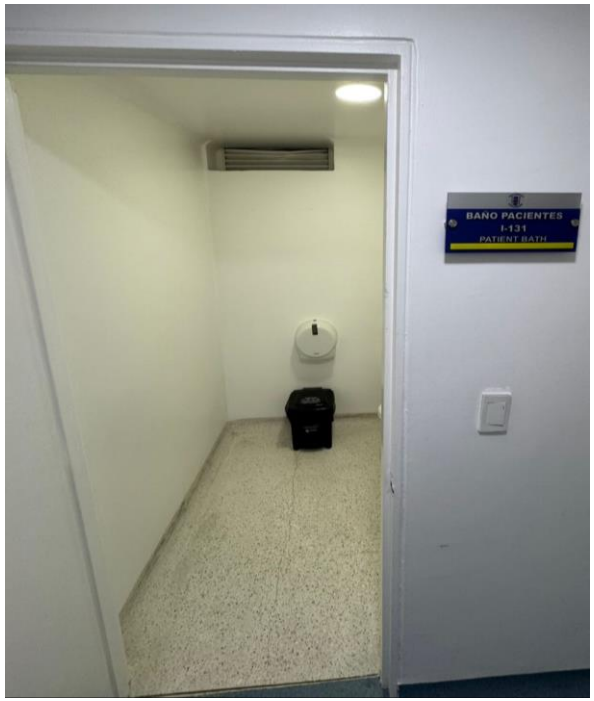



TIPO DE HALLAZGO:

LOCALIZACIÓN	
BAÑO PACIENTES	X

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

Se observa rejilla metalica fija de ventilación forzada.

PRE - DIAGNOSTICO

1) X Mantenimiento preventivo.
2) X Mantenimiento correctivo.

CLASIFICACIÓN CAUSA		**CAUSA**	**DIAGNÓSTICO**	**PREVENCIÓN / INTERVENCIÓN**		
DIRECTA	**Inf.**			**ELIMINACIÓN CAUSA**	**REPARACIÓN EFECTO**	**PREVENCIÓN**
Mantenimiento correctivo	Resolución 3100 de 2019	Mala manipulación por parte del personal del servicio.	Se debe realizar mantenimiento correctivo	Cambio de persianas en malas condiciones	Al realizar estos cambios se subsanara esta anotación.	Se deben utilizar los materiales adecuados en las áreas de servicios todo como lo estipula la RESOLUCION 3100 DE 2019.

GRADO	
BAJO	X
MEDIO	
ALTO	

RYF S.A.S
Consultoría, Auditoría e Interventoría


RYF SAS
CONSULTORIA, AUDITORIA E INTERVENTORIA
BOGOTÁ/COLOMBIA

HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA

HALLAZGOS DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza el estudio: HOSPITAL CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE CUNDINAMARCA	**Servicio: MEDICINA NUCLEAR**	**N° de Ficha: 003**
		Fecha: 28-10-2025

LOCALIZACIÓN

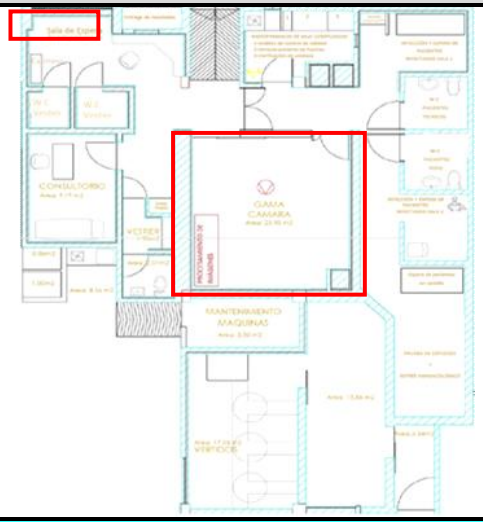

IMAGEN





TIPO DE HALLAZGO:	
LOCALIZACIÓN	
SALA DE ESPERA - CAMARA GAMMA	X

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

Se evidencian lamparas con el fosforo agotado. En sala de espera se observan 2 lamparas que deben ser anuladas por inactividad.

PRE - DIAGNOSTICO

1) X Mantenimiento preventivo.
2) X Mantenimiento correctivo.

CLASIFICACIÓN CAUSA		**CAUSA**	**DIAGNÓSTICO**	**PREVENCIÓN / INTERVENCIÓN**		
DIRECTA	**Inf.**			**ELIMINACIÓN CAUSA**	**REPARACIÓN EFECTO**	**PREVENCIÓN**
Mantenimiento correctivo	Resolución 3100 de 2019	Carencia de mantenimiento Preventivo.	Se encuentra la iluminación de las salas ya desgastadas (Agotado el fosforo).	Cambio de las luminarias.	Al realizar estos cambios se subsanara esta anotación.	Se deben utilizar los materiales adecuados en las áreas de servicios todo como lo estipula la RESOLUCION 3100 DE 2019.

GRADO	
BAJO	
MEDIO	X
ALTO	

RYF S.A.S
Consultoría, Auditoría e Interventoría


RYF SAS
CONSULTORIA, AUDITORIA E INTERVENTORIA
BOGOTÁ/COLOMBIA

HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA

HALLAZGOS DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza el estudio: HOSPITAL CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE CUNDINAMARCA	**Servicio: MEDICINA NUCLEAR**	**N° de Ficha: 004**
		Fecha: 28-10-2025

LOCALIZACIÓN

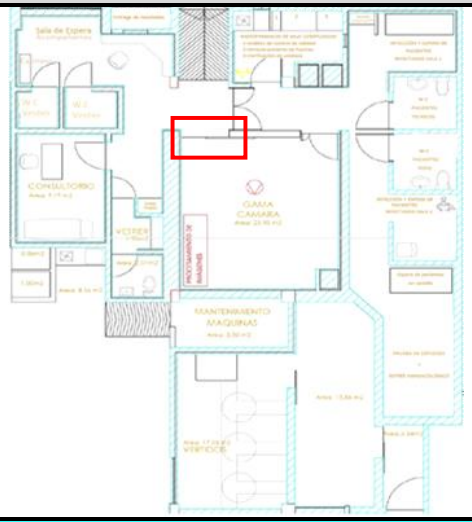

IMAGEN



TIPO DE HALLAZGO:	
LOCALIZACIÓN	
CAMARA GAMMA	X

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

Se evidencian superficie de puerta corrediza con lamina de plomo al ingreo de camara gamma, perforada por la manipulación de la manija tipo roma en acero inoxidable. Se observa el muro con desgaste debido a golpes continuos por la puerta.

PRE - DIAGNOSTICO

1) X Mantenimiento preventivo.
2) X Mantenimiento correctivo.

CLASIFICACIÓN CAUSA		**CAUSA**	**DIAGNÓSTICO**	**PREVENCIÓN / INTERVENCIÓN**		
DIRECTA	**Inf.**			**ELIMINACIÓN CAUSA**	**REPARACIÓN EFECTO**	**PREVENCIÓN**
Mantenimiento correctivo	Resolución 3100 de 2019	Carencia de mantenimiento Preventivo.	Puerta con superficie deteriorada por manija de acero y muro desgastado por golpes continuos.	Desmonte de manija de acero, arreglo de superficie de puerta y muro, re instalacion de manija con monedas planas a cada lado e instalación de tope metalico interno en riel superior e inferior.	Al realizar estos cambios se subsanara esta anotación.	Se deben utilizar los materiales adecuados en las áreas de servicios todo como lo estipula la RESOLUCION 3100 DE 2019.

GRADO	
BAJO	
MEDIO	
ALTO	X

RYF S.A.S
Consultoría, Auditoría e Interventoría


RYF SAS
CONSULTORIA, AUDITORIA E INTERVENTORIA
BOGOTÁ/COLOMBIA

HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA

HALLAZGOS DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza el estudio: HOSPITAL CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE CUNDINAMARCA	**Servicio: MEDICINA NUCLEAR**	**N° de Ficha: 005**
		Fecha: 28-10-2025

LOCALIZACIÓN

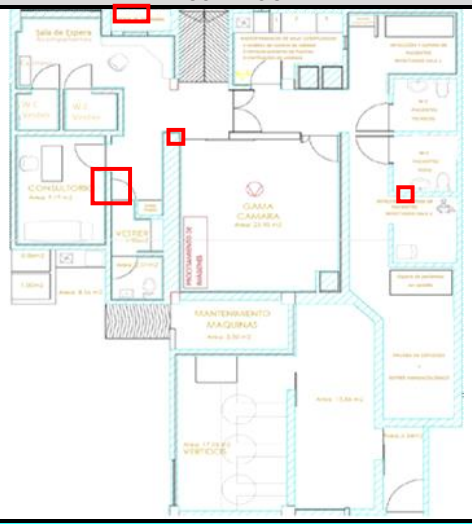


IMAGEN














TIPO DE HALLAZGO:	
LOCALIZACIÓN	
VESTIER CONSULTORIO - PASILLO - CAMARA GAMMA	X

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

Se observa chapa tipo pera descuadrada por manipulación, se evidencia falta de señalizacion en consultorio. Se observa desgaste en las esquinas de los muros en areas de circulación, camara gamma, inyección y espera de pacientes.

PRE - DIAGNOSTICO

1) X Mantenimiento preventivo.
2) X Mantenimiento correctivo.

CLASIFICACIÓN CAUSA		**CAUSA**	**DIAGNÓSTICO**	**PREVENCIÓN / INTERVENCIÓN**		
DIRECTA	**Inf.**			**ELIMINACIÓN CAUSA**	**REPARACIÓN EFECTO**	**PREVENCIÓN**
Mantenimiento correctivo y preventivo.	Resolución 3100 de 2019	Carencia de mantenimiento Preventivo.	Instalación de esquineros dependiendo del nivel de trafico: Alto, de preferencia metalicos y anclados a muro, medio en caucho de impacto y bajo en pvc.	Instalación de esquineros para trafico: Alto, de preferencia metalicos y anclados a muro. Instalación de señalización y ajuste de chapa puerta.	Al realizar estos cambios se subsanara esta anotación.	Se deben utilizar los materiales adecuados en las áreas de servicios todo como lo estipula la RESOLUCION 3100 DE 2019.

GRADO	
BAJO	
MEDIO	X
ALTO	

RYF S.A.S
Consultoría, Auditoría e Interventoría


RYF SAS
CONSULTORIA, AUDITORIA E INTERVENTORIA
BOGOTÁ/COLOMBIA

HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA

HALLAZGOS DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza el estudio: HOSPITAL CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE CUNDINAMARCA	**Servicio: CONSULTA EXTERNA**	**N° de Ficha: 006**
		Fecha: 28-10-2025

LOCALIZACIÓN

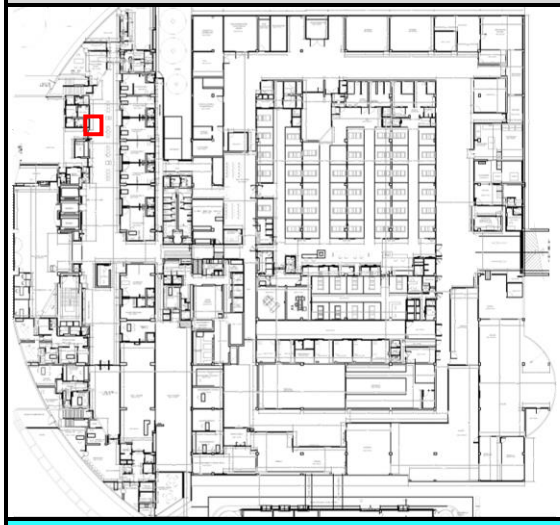

IMAGEN



TIPO DE HALLAZGO:	
LOCALIZACIÓN	
PASILLO CONSULTA EXTERNA	**X**

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

Se observa apertura en techo modular en pasillo de consulta externa, diagonal al espacio de central de mezclas.

PRE - DIAGNOSTICO

1) X Mantenimiento preventivo.
2) X Mantenimiento correctivo.

CLASIFICACIÓN CAUSA		**CAUSA**	**DIAGNÓSTICO**	**PREVENCIÓN / INTERVENCIÓN**		
DIRECTA	**Inf.**			**ELIMINACIÓN CAUSA**	**REPARACIÓN EFECTO**	**PREVENCIÓN**
Mantenimiento correctivo y preventivo.	Resolución 3100 de 2019	Mantenimiento Preventivo en red electrica.	Se sugiere realizar el mantenimiento preventivo en los tiempos estipulados en el cronograma de mantenimiento anual.	Realizar el mantenimiento preventivo y proceder con su sellamiento para evitar algún accidente con los pacientes y/o personal hospitalario.	Al realizar estos cambios se subsanara esta anotación.	Se deben utilizar los materiales adecuados en las áreas de servicios todo como lo estipula la RESOLUCION 3100 DE 2019.

GRADO	
BAJO	
MEDIO	
ALTO	**X**

RYF S.A.S
Consultoría, Auditoría e Interventoría


RYF SAS
CONSULTORIA, AUDITORIA E INTERVENTORIA
BOGOTÁ/COLOMBIA

HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA


HALLAZGOS DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza el estudio: HOSPITAL CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE CUNDINAMARCA	**Servicio: CONSULTA EXTERNA**	**N° de Ficha: 007**
		Fecha: 28-10-2025

LOCALIZACIÓN

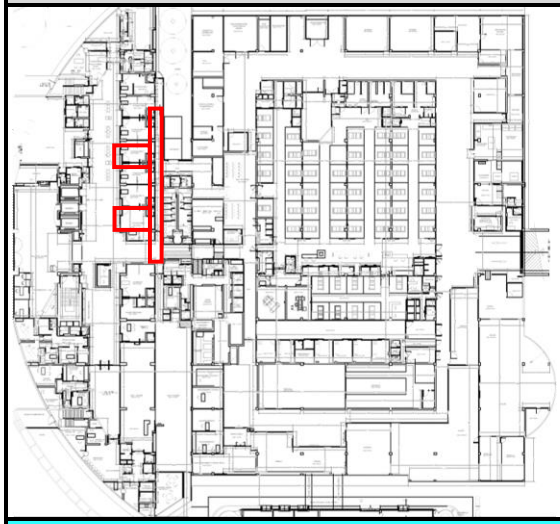

IMAGEN

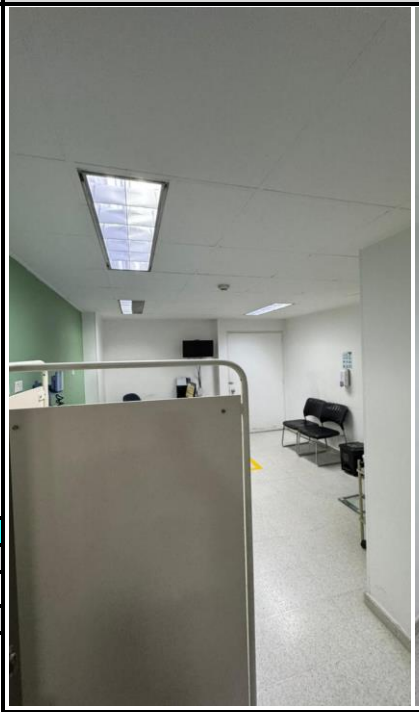





TIPO DE HALLAZGO:	
LOCALIZACIÓN	
PASILLO CONSULTA EXTERNA - CONSULTORIOS	**X**

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

En los techos se encuentran varias Lamparas rectangulares de fluorescente fundidas, sin limpieza. Lamparas de fluorescente y led con el fosforo agotado.

PRE - DIAGNOSTICO

1) X Mantenimiento preventivo.
2) X Mantenimiento correctivo.

CLASIFICACIÓN CAUSA	
DIRECTA	**Inf.**
Mantenimiento correctivo y preventivo.	Resolución 3100 de 2019

CAUSA

Carencia de mantenimiento Preventivo.

GRADO	
BAJO	
MEDIO	**X**
ALTO	

DIAGNÓSTICO

Se sugiere el cambio de lamparas rectangulares fluorescentes con su base y bombillo a lamparas en panel led hermetico para limitar el almacenamiento de particulas ultrafinas, finas y gruesas.

PREVENCIÓN / INTERVENCIÓN		
ELIMINACIÓN CAUSA	**REPARACIÓN EFECTO**	**PREVENCIÓN**
Cambio de lamparas rectangulares fluorescentes a luminarias en panel led y cambio de lamparas led fundidas.	Al realizar estos cambios se subsanara esta anotación.	Se deben utilizar los materiales adecuados en las áreas de servicios todo como lo estipula la RESOLUCION 3100 DE 2019.

RYF S.A.S
Consultoría, Auditoría e Interventoría


RYF SAS
CONSULTORIA, AUDITORIA E INTERVENTORIA
BOGOTÁ/COLOMBIA

HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA

HALLAZGOS DE INFRAESTRUCTURA


Autoriza el estudio: HOSPITAL CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE CUNDINAMARCA	**Servicio: CONSULTA EXTERNA**	**N° de Ficha: 008**
		Fecha: 28-10-2025


LOCALIZACIÓN

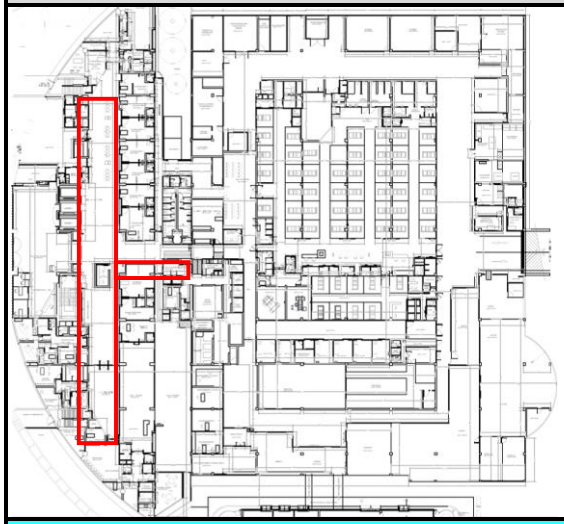

IMAGEN



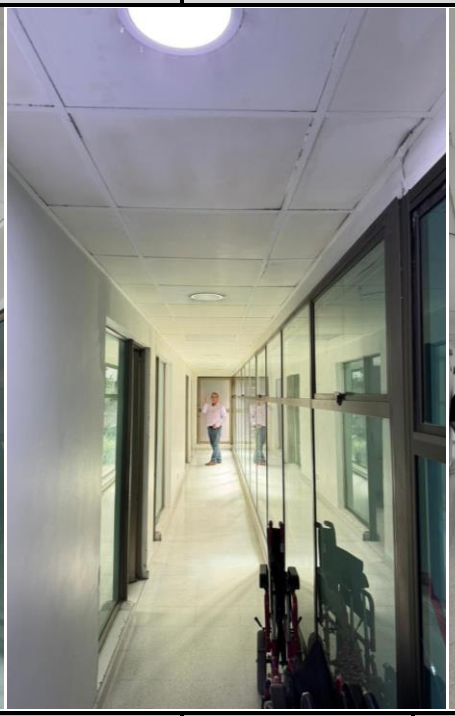

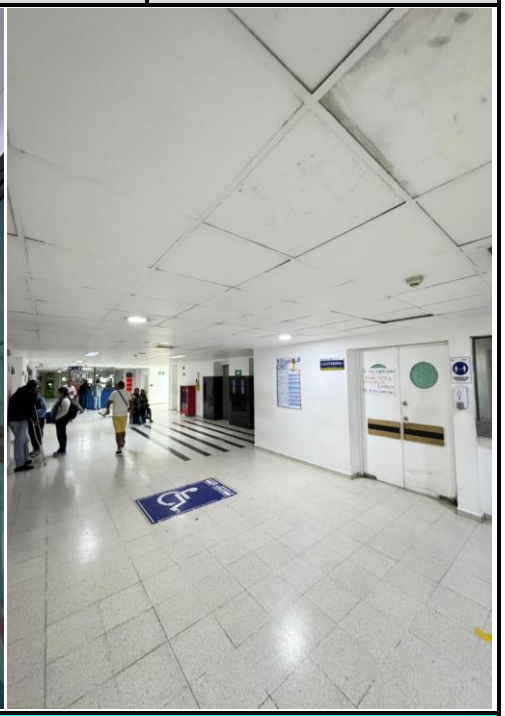

TIPO DE HALLAZGO:

LOCALIZACIÓN	
PASILLO CONSULTA EXTERNA	**X**

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

Los techos presentan dilataciones o aperturas que causan entrada de contaminación. Todas las áreas carecen de aspersores, detector de humo.

PRE - DIAGNOSTICO

1) X Mantenimiento preventivo.
2) X Mantenimiento correctivo.

CLASIFICACIÓN CAUSA		**CAUSA**	**DIAGNÓSTICO**	**PREVENCIÓN / INTERVENCIÓN**		
DIRECTA	**Inf.**			**ELIMINACIÓN CAUSA**	**REPARACIÓN EFECTO**	**PREVENCIÓN**
Mantenimiento correctivo y preventivo.	Resolución 3100 de 2019	Sistema implementado de techos modulares.	La instalación de materiales sin su correcta montura hace que queden partes sin sellar, dando cabida a almacenamiento de bacterias y generando a futuro, problemas en los pacientes.	Retiro y cambio de material o sellar bien las juntas, dilataciones y recubrimiento con pintura hospitalaria baja de olores.	Al realizar estos cambios se subsanara esta anotación.	Se deben utilizar los materiales adecuados en las áreas de servicios todo como lo estipula la RESOLUCION 3100 DE 2019.

GRADO	
BAJO	
MEDIO	
ALTO	**X**
