**MUNICIPIO DE PASTO**

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN**

# INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO

OBRA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION MALLA VIAL URBANA COMUNAS 1 A 6 DEL MUNICIPIO DE PASTO

NEUTICAL DEL SUR S.A.S
NIT:901651309-1

Informe N° 4

1 de octubre a 31 de noviembre de 2025

25 de noviembre de 2025

## 1. GENERALIDADES DEL PROYECTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETO DEL PROYECTO:** | OBRA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION MALLA VIAL URBANA COMUNAS 1 A 6 DEL MUNICIPIO DE PASTO | | |
| **VALOR TOTAL APORTES PARA EL PROYECTO** | **TOTAL DEL PROYECTO** | | $1.659.979.588,00 |
| | **FUENTE 1** | | $.000 |
| | **FUENTE…n.** | | $0 .000 |
| **SUPERVISOR DEL PROYECTO** | Wilber Efrén Murillo | | |
| **SUPERVISORES ANTERIORES (SI APLICA)** | NOMBRE | DESDE | HASTA |
| | N/A | N/A | N/A |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL PROYECTO** | 2025002865 | | |
| **FECHA INICIO EJECUCIÓN DEL PROYECTO** | 24 de junio del 2025 | | |
| **FECHA TERMINACION DEL PROYECTO** | 24 de diciembre de 2025 | | |
| **FECHA TERMINACIÓN EJECUCION PROYECTO SEGÚN PRÓRROGA N°XX** | | | |
| **VALOR CONTRATO DERIVADO OBRA No. 20252481 DE 2025** | $1.659.979.588,00 | | |
| **VALOR CONTRATO DERIVADO INTERVENTORIA No. No. 20252542 DE 2025** | $140.000.000,00 | | |

## 2. ASPECTOS FINANCIEROS PROYECTO (Describir individual según fuentes de financiación)

### 2.1 fuente de financiación N° 1 interventoría

| CONCEPTO | FECHA DE CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS | PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| **PRIMER DESEMBOLSO (Anticipo si** | | | **15/10/2025** | **$ 56.000.000** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **aplica)** | | | | |
| **SEGUNDO DESEMBOLSO** | | | | |
| **TERCER DESEMBOLSO** | | | | |
| ÚLTIMO DESEMBOLSO | | | | |
| **TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME** | | | | **$ 56.000.000** |

## 2.2 fuente de financiación N°2 obra

| CONCEPTO | FECHA DE CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS | PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| **PRIMER DESEMBOLSO (Anticipo si aplica)** | | | **15/10/2025** | **$ 663.991.835.20** |
| **SEGUNDO DESEMBOLSO** | | | | |
| **TERCER DESEMBOLSO** | | | | |
| ÚLTIMO DESEMBOLSO | | | | |
| **TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME** | | | | **$ 663.991.835.20** |

## 3. RENDIEMIENTOS FINANCIEROS (Cuando aplique en caso de anticipo)

| FECHA DE GENERACIÓN | VALOR GENERADO | VALOR CONSIGNADO | VALOR PENDIENTE DE GIRO | FECHA DEL GIRO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **TOTAL** | | | | |

## 4. CONTRATO DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA DE OBRA

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | VALOR TOTAL CONTRATO |
|---|---|---|
| | "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUYO OBJETO REALIZAR LA OBRA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION MALLA VIAL URBANA COMUNAS 1 A 6 DEL MUNICIPIO DE PASTO (SIVM-SU0045-006)" | $140.000.000,00 |
| **Nombre contratista** | NEUTICAL DEL SUR SAS | |
| **NIT O C.C:** | 901651309-1 | |
| **Valor Contrato Inicial** | $140.000.000,00 | |

| | |
|---|---|
| **Valor Contrato Adicional 1** | |
| **Valor Contrato Adicional XXX** | |
| **Valor Contrato Total** | $140.000.000,00 |
| **Fecha Firma del contrato** | 19 de junio de 2025 |
| **Plazo contractual** | 6 meses |
| **Plazo adicional 1** | |
| **Plazo adicional XXX.** | |
| **Fecha del acta de inicio del contrato** | 24 de junio de 2025 |
| **Fecha de Terminación del contrato** | 31 de diciembre de 2025 |
| **Fecha de Suspensión 1.** | |
| **Fecha de Reinicio No 1.** | |
| **Fecha de Terminación reprogramada 1** | |
| **Fecha de Suspensión XXX** | |
| **Fecha de Reinicio No XXX** | |
| **Fecha de Terminación reprogramada XXX.** | |

| CONCEPTO | %REQUERIDO | % a pagar | VALOR | No. ORDEN DE PAGO | FECHA PAGO D/M/A |
|---|---|---|---|---|---|
| **ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)** | **40%** | **60%** | **$56.000.0000** | **2025012401** | **15/10/ 2025** |
| **PRIMER DESEMBOLSO** | | | | | |
| **SEGUNDO DESEMBOLSO** | | | | | |
| **TERCER DESEMBOLSO** | | | | | |
| **ULTIMO DESEMBOLSO** | | | | | |
| **TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME** | | | **$56.000.0000** | | |

| PÓLIZA No. | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS REQUERIDAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | *FECHA INICIO* | *FECHA FIN* |
| 41-44-101294556 | **Cumplimiento** | $ 14.000.000 | 24/06/2025 | 24/06/2026 |
| | **Salarios y prestaciones sociales** | $ 14.000.000 | 24/06/2025 | 24/06/2028 |
| | **Calidad del servicio** | $ 14.000.000 | 24/12/2025 | 24/12/2030 |
| | **Otros.** | $ 56.000.000 | 24/06/2025 | 24/06/2026 |
| **VALOR ACUMULADO RECURSOS PAGADOS** | | | **$ 56.000.000** | |
| **% AVANCE FÍSICO EJECUTADO ACUMULADO – RECURSOS SEGÚN FUENTE DE FINANCIACION** | | | **100 %** | |
| **% AVANCE FÍSICO EJECUTADO ACUMULADO – DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO/CONVENIO** | | | **100 %** | |
| **% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS – RECURSOS SEGÚN FUENTE DE FINANCIACION** | | | **0 %** | |
| **ESTADO DEL CONTRATO/CONVENIO:**<br>**FINALIZADO** | | | | |

## 5. CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | VALOR TOTAL CONTRATO |
|---|---|---|
| | OBRA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION MALLA VIAL URBANA COMUNAS 1 A 6 DEL MUNICIPIO DE PASTO | $1.659.979.588,00 |
| **Nombre contratista** | ASFACON INGENIERIA SAS | |
| **NIT O C.C:** | 901168800-6 | |
| **Valor Contrato Inicial** | $1.659.979.588,00 | |
| **Valor Contrato Adicional 1** | | |
| **Valor Contrato Adicional XXX** | | |
| **Valor Contrato Total** | $1.659.979.588,00 | |
| **Fecha Firma del contrato** | 19 de junio de 2025 | |
| **Plazo contractual** | 6 meses | |
| **Plazo adicional 1** | | |
| **Plazo adicional XXX.** | | |
| **Fecha del acta de inicio del contrato** | 24 de junio de 2025 | |
| **Fecha de Terminación del contrato** | 24 de diciembre de 2025 | |
| **Fecha de Suspensión 1.** | | |
| **Fecha de Reinicio No 1.** | | |
| **Fecha de Terminación reprogramada 1** | | |
| **Fecha de Suspensión XXX** | | |
| **Fecha de Reinicio No XXX** | | |
| **Fecha de Terminación reprogramada XXX.** | | |

**RECURSOS**

| CONCEPTO | %REQUERIDO | % a pagar | VALOR | No. ORDEN DE PAGO | FECHA PAGO D/M/A |
|---|---|---|---|---|---|
| **ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)** | **40%** | **60%** | **$663.991.835,20** | | **25/09/25** |
| **PRIMER DESEMBOLSO** | | | | | |
| **SEGUNDO DESEMBOLSO** | | | | | |
| **TERCER DESEMBOLSO** | | | | | |
| **ULTIMO DESEMBOLSO** | | | | | |
| **TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME** | | | **$663.991.835,20** | | |

| PÓLIZA No. | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | *FECHA INICIO* | *FECHA FINAL* |
| | **Cumplimiento** | $ 331.995.918 | 24/JUN/2025 | 24/JUN/2026 |
| | **Salarios y prestaciones** | $ 165.997.959 | 24/JUN/2025 | 24/DIC/2028 |
| | **Estabilidad de la Obra** | $ 497.993.877 | 24/DIC/2025 | 24/DIC-2030 |
| | **Manejo del anticipo** | $ 663.991.836 | 24/JUN/2025 | 24/JUN/2026 |
| | **Responsabilidad Civil** | $ 284.700.000 | 24/JUN/2025 | 24/DIC/2025 |

| | |
|---|---|
| **VALOR ACUMULADO RECURSOS PAGADOS** | **$ 663.991.835,20** |
| **% AVANCE FÍSICO EJECUTADO ACUMULADO – RECURSOS FONADE** | **100 %** |
| **% AVANCE FÍSICO EJECUTADO ACUMULADO – RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS** | **100 %** |
| **% AVANCE FÍSICO EJECUTADO ACUMULADO – DEL PROYECTO** | **100 %** |
| **% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS - RECURSOS FONADE** | **0 %** |
| **% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS - RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS** | **0 %** |
| **ESTADO DEL CONTRATO/CONVENIO:<br>FINALIZADO** | |

## 6. INFORME DEL SUPERVISOR MES ACTUAL

**DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO:**

- **Aspectos Jurídicos:** (Resumen ejecutivo: breve descripción de las actividades jurídicas adelantadas en el mes objeto del informe)

- **Aspectos financieros:** (Resumen ejecutivo: breve descripción de las actividades financieras adelantadas en el mes objeto del informe)

Durante el mes de julio se realizaron las siguientes actividades financieras:

- 568.64 metros cúbicos de demolición pavimento asfaltico compresor generando un valor de $ 39.349.319,36

- 0.53 metros cúbicos de excavaciones a mano varias sin clasificar, profundidad < 2m, en seco generando un valor de $ 14.525,71

- 464.65 metros cúbicos de excavación mecánica en materiales varios sin clasificar generando un valor de $ 6.738.818,95

- 1330.87 metros cúbicos de retiro y disposición de material sobrante cargue a mano con pago de escombrera generando un valor de $ 51.066.812,77

- 3720.90 metros cuadrados de compactación subrasante generando un valor de $ 7.639.007,70

- 293.72 metros cúbicos de base granular generando un valor de $ 52.045.127,96

- 50.00 metros cúbicos de mezcla densa en caliente tipo MDC-19, incluye imprimación y sello de juntas en pavimento flexible generando un valor de $ 68.814.400,00

- 143.04 metros cúbicos de mezcla densa en caliente tipo MDC-19 para parcheo, incluye imprimación y sello de juntas en pavimento flexible generando un valor de $ 200.314.360,32

Durante el mes de agosto se realizaron las siguientes actividades financieras:

- 56,8 ml de corte de pavimento asfáltico con cortadora generando un valor de $ 701.082,40

- 157,62 m3 de demolición pavimento asfáltico compresor generando un valor de $ 10.907.146,38

- 9,34 m3 de demolición concreto hidráulico generando un valor de $ 1.998.068,84

- 3,20 m3 de excavaciones a mano varias sin clasificar, profundidad < 2 m, en seco generando un valor de $ 87.702,40

- 51,11 m3 de excavación mecánica en materiales varios sin clasificar generando un valor de $ 741.248,33

- 372,95 m3 de retiro y disposición de material sobrante cargue a mano con pago de escombrera generando un valor de $ 14.310.464,45

- 1190,96 m2 de compactación subrasante generando un valor de $ 2.445.040,88

- 59,76 m3 de base granular generando un valor de $ 10.589.053,68

- 530,79 m3 de mezcla densa en caliente tipo MDC-19 para parcheo, incluye imprimación y sello de juntas en pavimento flexible generando un valor de $ 743.322.562,32

Durante el mes de noviembre se realizaron las siguientes actividades financieras:

- 87.64 ml de corte de pavimento asfáltico con cortadora generando un valor de $ 1.081.740,52

- 179,74 m3 de demolición pavimento asfáltico compresor generando un valor de $ 12.437.533,75

- 93,56 m3 de excavaciones a mano varias sin clasificar, profundidad < 2 m, en seco generando un valor de $ 2.564.198,92

- 191,16 m3 de excavación mecánica en materiales varios sin clasificar generando un valor de $ 2.772.461,82

- 603,80 m3 de retiro y disposición de material sobrante cargue a mano con pago de escombrera generando un valor de $ 23.168.355,74

- 1402.64 m2 de compactación subrasante generando un valor de $ 2.879.623,62

- 36,79 m3 de subbase granular generando un valor de $ 6.029.810,72

- 267,76 m3 de base granular generando un valor de $ 49.585.038,21

- 255.36 m3 de mezcla densa en caliente tipo MDC-19 para parcheo, incluye imprimación y sello de juntas en pavimento flexible generando un valor de $ 357.614.800.84

- **Avance del proyecto:** Resumen ejecutivo: (breve descripción de las actividades adelantadas en el mes objeto del informe)

Actividades Ejecutadas en los Sectores Intervenidos

Durante los meses de julio hasta el mes de noviembre se adelantaron las actividades correspondientes al mejoramiento de la estructura de pavimento flexible en los diferentes frentes de trabajo establecidos contractualmente. A continuación, se detalla el desarrollo de las actividades verificadas por la interventoría:

Actividades Ejecutadas en el Mes de Julio

El 03 de julio se dio inicio a las labores constructivas, iniciando con la demolición del pavimento asfáltico existente mediante retroexcavadora, lo que permitió habilitar la zona para la ejecución de excavaciones en material no clasificado. Estas excavaciones se realizaron de forma mixta (manual y mecánica), conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

Posteriormente, se desarrollaron actividades de retiro, cargue, transporte y disposición final del material sobrante en sitio autorizado. Una vez liberada la superficie, se procedió con la conformación, nivelación y compactación de la subrasante,

verificando su capacidad portante para recibir la estructura del pavimento. Sobre esta base se ejecutó la instalación, extendido y compactación de la capa granular, alcanzando las cotas y espesores establecidos.

Como fase final, se aplicó mezcla asfáltica en caliente tipo MDC-19, incluyendo imprimación, riego de adherencia, sellado de juntas y parcheos localizados, garantizando la continuidad superficial y la correcta adherencia entre capas. Durante este período se completaron a satisfacción de la interventoría los trabajos en el sector Alcaldía Centro, y se dio inicio a las labores en el tramo Oriente La Estrella – Popular. Cabe resaltar que las actividades fueron ejecutadas en un tiempo menor al programado inicialmente.

Actividades Ejecutadas en el Mes de Agosto

En agosto continuaron las labores de mejoramiento del pavimento flexible, iniciando con la demolición del pavimento existente mediante el uso de compresor. Esto permitió ejecutar excavaciones manuales y mecánicas en material sin clasificar, seguidas del retiro y disposición final del material sobrante.

Se adelantaron las actividades de conformación y compactación de la subrasante, asegurando las condiciones necesarias para la instalación de la estructura granular. Sobre esta superficie se realizó la colocación y compactación de la capa granular, alcanzando las condiciones requeridas para la aplicación de la mezcla asfáltica. Finalmente, se aplicó mezcla MDC-19 con imprimación, sello de juntas y parcheo de superficie.

Durante este periodo se completaron los tramos correspondientes a los sectores Oriente La Estrella – Popular, Barrio Chapal y Barrio Miraflores, todos recibidos a satisfacción de la interventoría. Los tiempos de ejecución nuevamente fueron inferiores a los proyectados en el cronograma contractual.

Actividades Ejecutadas en el mes de septiembre y octubre

Durante el periodo objeto del presente informe no fue posible adelantar actividades constructivas en campo, en razón a diversos factores de carácter administrativo, técnico y de coordinación interinstitucional, todos ellos debidamente documentados y soportados. Durante el mes de octubre, las gestiones se orientaron a la realización de actividades preliminares indispensables para garantizar condiciones seguras, eficientes y acordes con el estado real del proyecto antes de iniciar cualquier intervención física.

En este contexto, se llevó a cabo la revisión detallada de las cantidades de obra, especificaciones y alcances contractuales, así como los ajustes requeridos para la estructuración y trámite del Acta Modificatoria N.° 1. Paralelamente, se ejecutaron las

Actas de Vecindad en el sector de San Martín, con el fin de establecer el estado previo de los predios colindantes y mitigar riesgos asociados a posibles reclamaciones.

Posteriormente, la verificación técnica de las redes de acueducto realizada por Empopasto evidenció que la tubería existente en el tramo inicialmente contemplado había sobrepasado su vida útil y no cumplía con las condiciones mínimas para ser intervenida de forma segura, lo cual imposibilitó su inclusión dentro del alcance del proyecto.

Finalmente, en reunión llevada a cabo el 29 de octubre entre la Supervisión del Contrato, el Contratista de Obra y la Interventoría, se definió que el tramo técnicamente viable para la continuidad del proyecto corresponde al ubicado en el barrio Santiago, específicamente en la Carrera 23 con Calle 13. Esta determinación permitió establecer los lineamientos técnicos y administrativos necesarios para programar la ejecución física con plena certeza, seguridad y alineación con las condiciones reales del sitio de intervención.

Actividades Ejecutadas en el mes de noviembre

En el sector Barrio Santiago, específicamente en la intersección de la Carrera 23 con Calle 13, se ejecutaron las actividades asociadas al proceso de pavimentación, incluyendo limpieza, preparación de la superficie, conformación y compactación de la estructura de la vía, instalación de base y subbase granular, y aplicación de la capa de rodadura en mezcla asfáltica.

Durante estas labores se presentaron interferencias asociadas a la red de acueducto existente, debido a su poca profundidad, lo que afectó el desarrollo de las excavaciones. Una vez identificadas estas afectaciones, se realizaron los ajustes necesarios para proteger las redes y permitir la continuidad del proceso constructivo sin afectaciones mayores al cronograma.

Posteriormente, se intervinieron las vías del Barrio San Martín, donde se ejecutaron excavaciones, conformación y compactación de estructura, y la pavimentación correspondiente. Con estas actividades se dio cumplimiento a las cantidades de obra establecidas en el Acta Modificatoria No. 2, cerrando la fase programada para esta etapa del proyecto

A continuación, se detalla el avance físico del contrato de obra hasta la fecha del presente informe

| Ítem | detalle | % de avance |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | Obras preliminares | 10 % |

| | | |
|---|---|---|
| Capítulo 2 | Estructura de pavimento | 90 % |
| **Porcentaje total acumulado** | | **100 %** |

- Registro fotográfico interventoría
- Avance de cada una de las actividades programadas
- Cantidades de Obra ejecutadas
- Resultado de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas
- Resumen de las actividades realizadas en el mes
- Relación del personal empleado en la ejecución de la obra

- Ingeniero director de obra
- Ingeniero director de interventoría
- Ingeniero residente de obra
- Ingeniero residente de interventoría
- Profesional en SST

- PGIO
- Actualización del programa de ejecución de obra
- Acreditación de que se encuentra al día en el pago de soportes parafiscales
- Actas parciales de obra con todos los soportes
- Extracto financiero para la cuenta única de rendimientos financieros (si aplica)
- Otros

- **Resumen:**

| | |
|---|---|
| **PERIODO DEL INFORME:** | 1 DE NOVIEMBRE A 31 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| **% AVANCE FÍSICO EJECUTADO ACUMULADO – RECURSOS SEGÚN FUENTE DE FINANCIACION:** | 100 % |
| **% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO ACUMULADO:** | 100 % |
| **VIGENCIA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO/CONVENIO** | DESDE EL DD DE MM DE AA AL DD DE MM DE AA. |

## 7. Anexos

### 7.1. Anexos aspectos jurídicos.

### 7.2. Anexos aspectos financieros

- Extractos bancarios

### 7.3. Anexos aspectos técnicos.

- Informe de interventoría de obra mensual.

**NEUTICAL DEL SUR S.A.S**
**NIT:901651309-1**










CAT 246D
MA281893


RUMIFARMA






9/07/2025 10:04:28 a. m.
# 15-42 Calle 21 E
Pasto
Nariño


9/07/2025 10:04:16 a. m.
# 15-42 Calle 21 E
Pasto
Nariño


10/07/2025 11:11:12 a. m.
# 11E-242 Calle 22
Pasto
Nariño
#casa Kelly Velásquez


10/07/2025 12:11:56 p. m.
# 11E-242 Calle 22
Pasto
Nariño
#casa Kelly Velásquez


11/07/2025 8:22:13 a. m.
# 3-22 Calle 9A
Pasto
Nariño
#casa Kelly Velásquez


FIN
DE OBRA
11/07/2025 8:26:00 a. m.
# 19E-14 Calle 21
Pasto
Nariño
#casa Kelly Velásquez


11/07/2025 10:57:54 a. m.
# 2-292 Calle 8
Pasto
Nariño
#casa Kelly Velásquez


HITACHI
11/07/2025 3:28:07 p. m.
#casa Kelly Velásquez


11/07/2025 9:19:56 a. m.
# 3-22 Calle 9A
Pasto
Nariño
#casa Kelly Velásquez


11/07/2025 9:19:36 a. m.
# 3-22 Calle 9A
Pasto
Nariño
#casa Kelly Velásquez


ASFACON INGENIERIA SAS


Pasto
Nariño











AP 1000 B



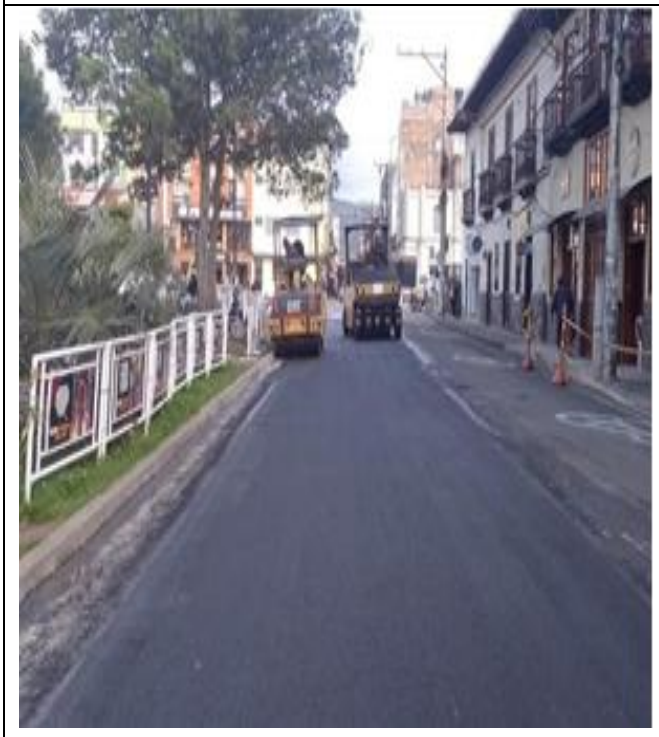












HITACHI
CAT
































AP 1000 B





CAT 1000 B
CATERPILLAR









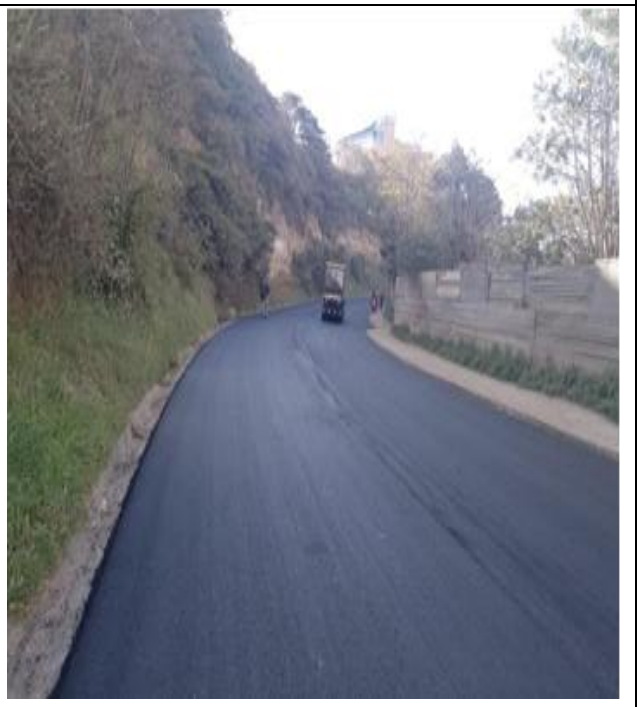
















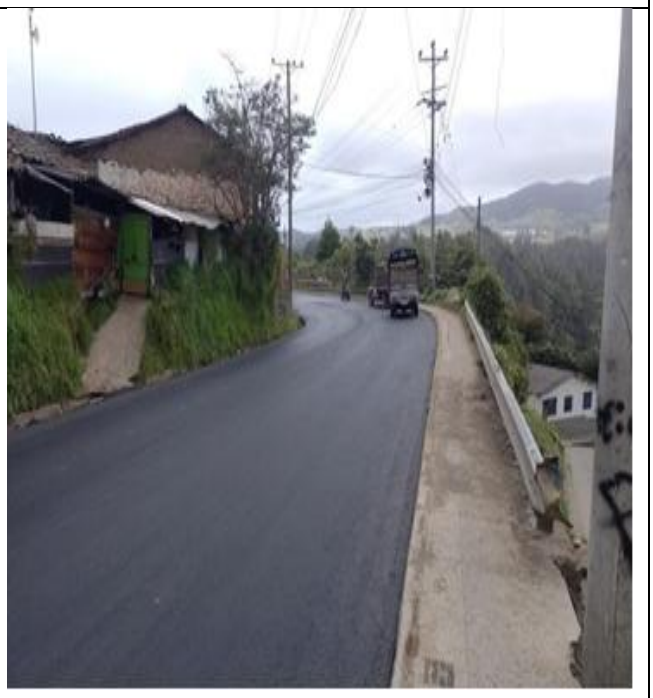




CAT
















CAT
PATERPILLAR


CAT 1000 B
PATERPILLAR



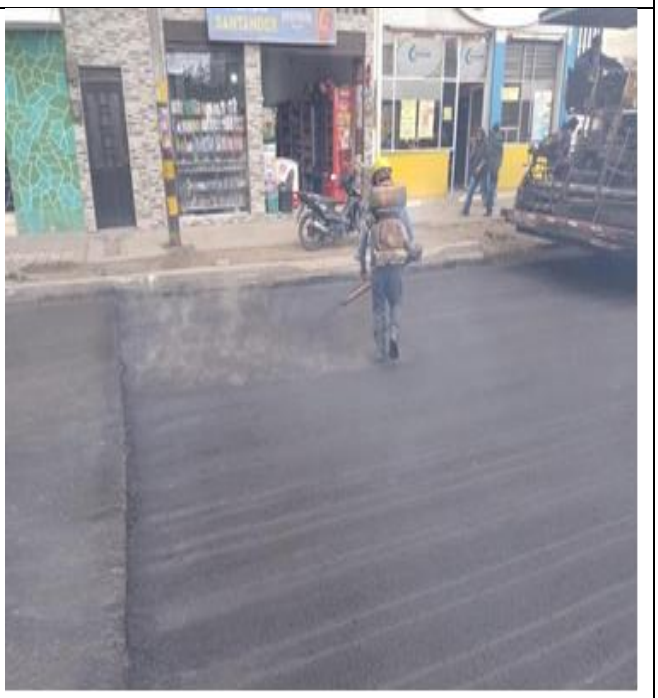

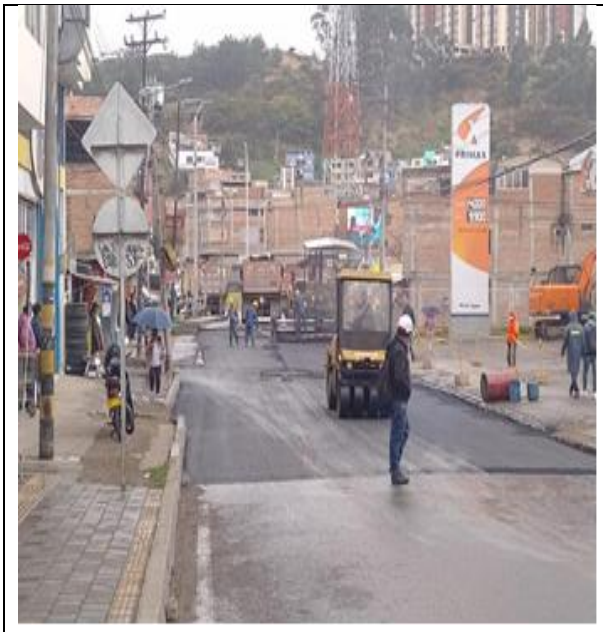






PRIMAX


PRIMAX





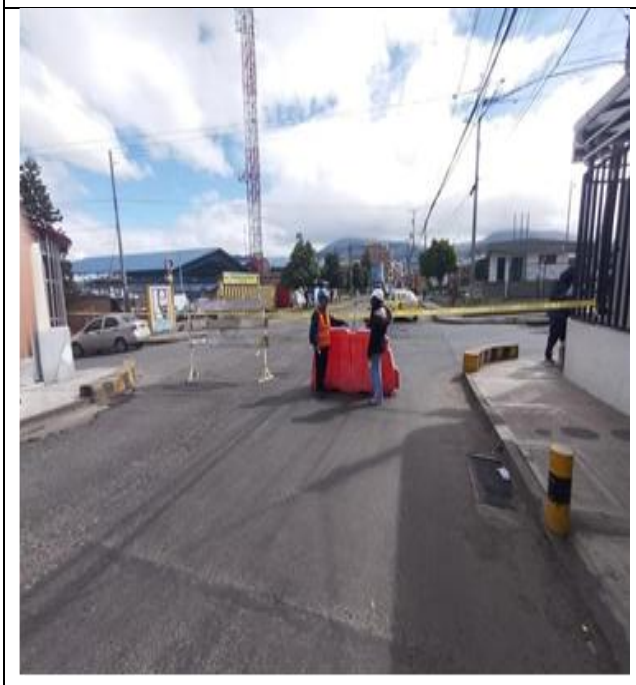

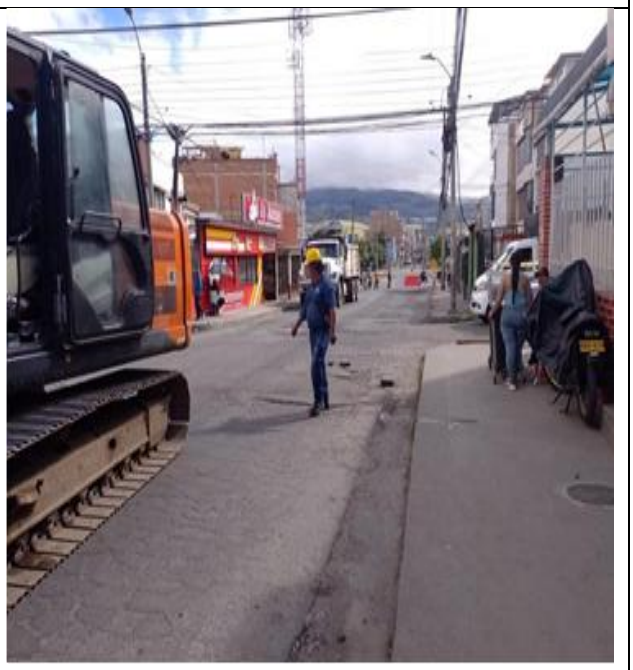


HITACHI












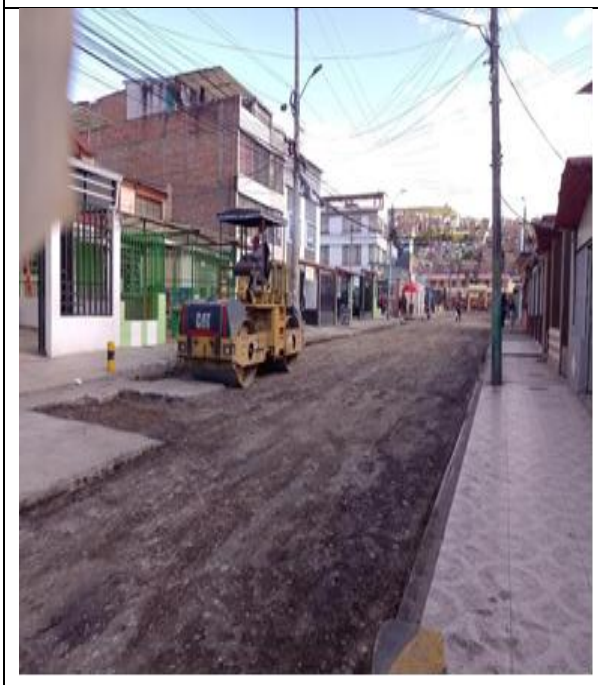
















14 nov 2025 2:41:58 p.m.
Pasto

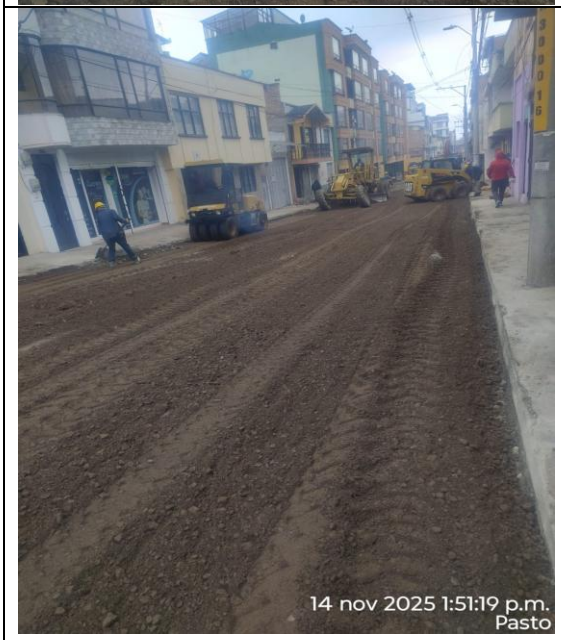
14 nov 2025 1:51:19 p.m.
Pasto

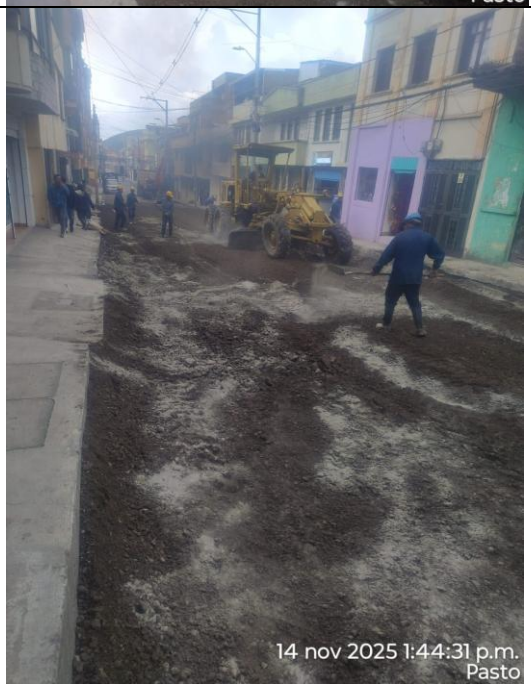
14 nov 2025 1:44:31 p.m.
Pasto




12 nov 2025 1:52:26 p.m.
Pasto


TEL-TRU















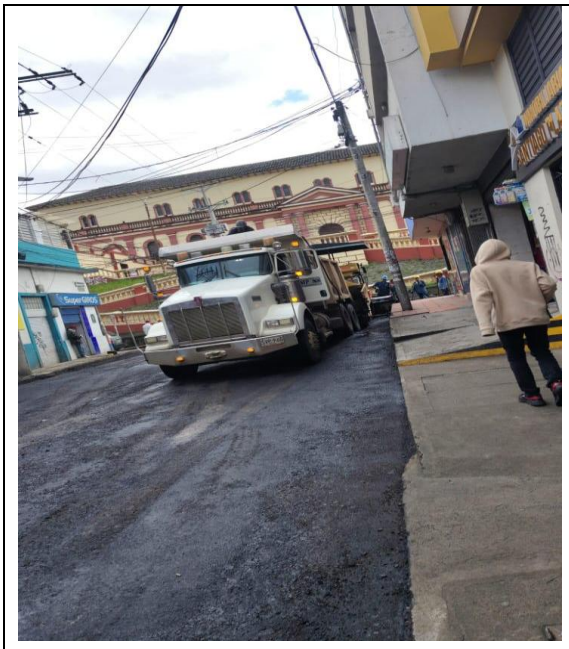


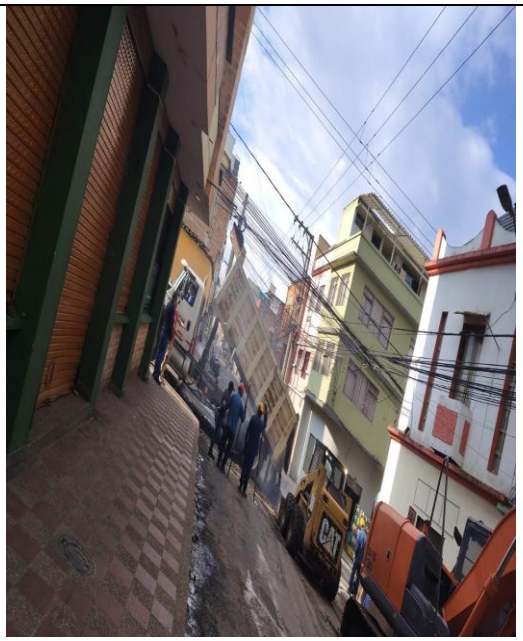

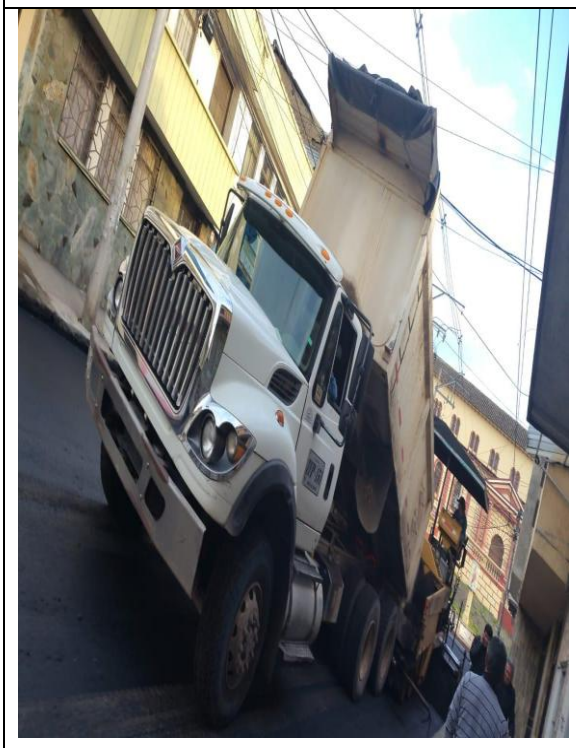


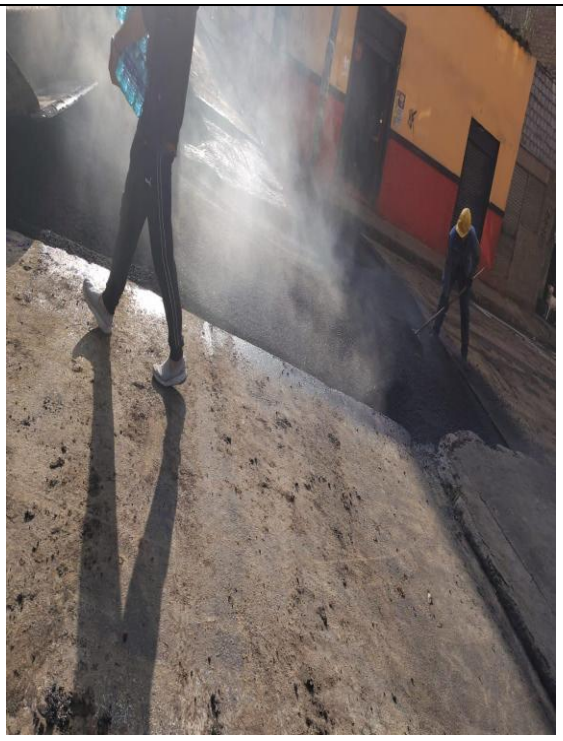




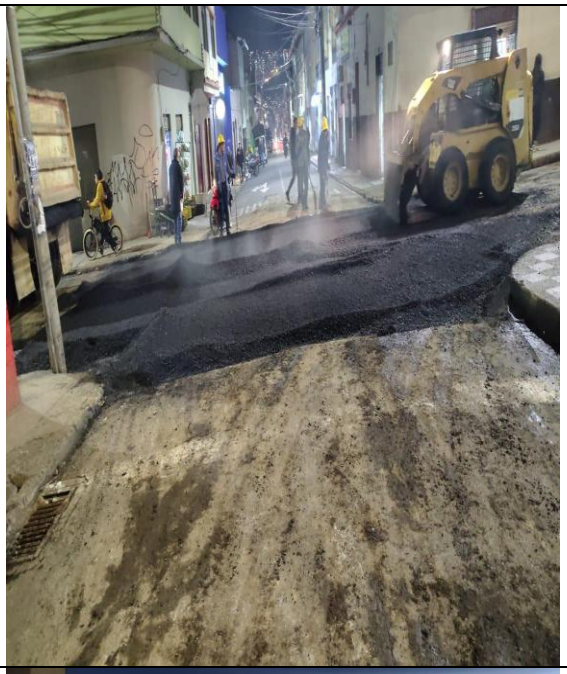



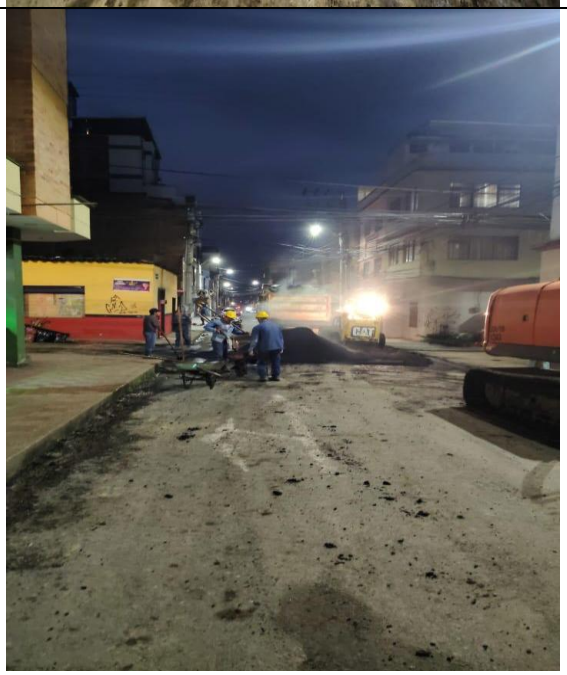


Super GIROS
12 nov 2025 10:09:45 a.m.
Pasto

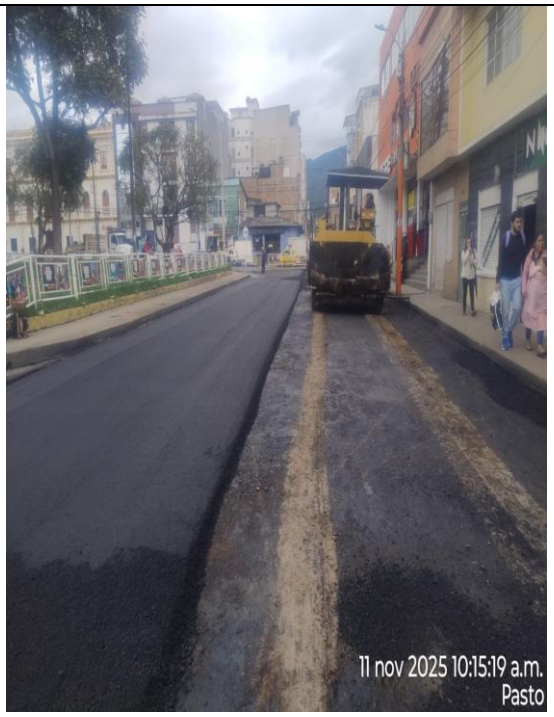
11 nov 2025 10:15:19 a.m.
Pasto


TIGRE
11 nov 2025 9:33:27 a.m.
Pasto


TEL-TRU
