INFORME MENSUAL No. 8

CONTRATO SDM 2024 – 3651

OBJETO DE CONTRATO

REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA OCCIDENTE-SUR – ZONA 5

CONTRATISTA

CONSORCIO SEGURVIAL BOGOTÁ

INTERVENTORÍA

CONSORCIO SEGURIDAD CAPITAL 24 – 27

PERIODO DE EJECUCIÓN

AGOSTO 22 DE 2025 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2025

CONTROL DE LA REVISIÓN

REVISIÓN	DESCRIPCIÓN	NUMERALES QUE CAMBIAN DE LA ANTERIOR REVISIÓN	FECHA
1	Documento Original	N/A	-

CONSORCIO SEGURVIAL BOGOTÁ

Firma			
Nombre	Omar Enrique Duarte Mora	Jordana Francisca Camargo	John Jairo Martínez
Cargo	Director de Proyecto	Ingeniera Residente	Ingeniero Residente
	Elaboró	Elaboró	Elaboró



Firma				
Nombre	Adriana M. Gordillo	Andrea Viviana Niño	Giovanni A. Caicedo	Angie Y. Barbosa
Cargo	Profesional SST	Profesional Trabajo Social	Georreferenciador	Secretaria
	Elaboró	Elaboró	Elaboró	Elaboró

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 6
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 7
   2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 7
   2.2. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA 8
3. PERIODO DE REPORTE 10
4. ESTADO DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO (VIGENTE / EN ACTUALIZACIÓN) 10
5. ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO 11
   5.1. ACTA DE RECIBO PARCIAL Y PLANILLAS DE OBRA 11
   5.2. AVANCE DE ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN 11
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO 15
7. GESTIÓN, AVANCES Y PARTICULARIDADES SOBRE LOS PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO DEL CONTRATO DE OBRA. 22
8. ASPECTOS TÉCNICOS, MODIFICACIONES SURGIDAS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, PROBLEMAS Y SOLUCIONES ADOPTADAS. 23
9. REPORTE DE ACCIONES REALIZADAS A PARTIR DE LAS GESTIONES ADELANTADAS CON OBJETO DE LA VERIFICACIÓN DE CRUCE DE INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN. 24
10. REPORTE DE EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD IMPLEMENTADO. 25
11. REPORTE DE EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE MANEJO DE RESIDUOS. 25
12. REPORTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR O CORREDORES ASIGNADOS 28
13. REPORTE ESTADÍSTICO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LOCALIDAD E INSTITUCIONES BENEFICIADAS. 30
14. REPORTE DE LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN Y FORMATOS DE SEGUIMIENTO AL ESTADO DE LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS DE CONTROL DE OBRA MÍNIMO. 31

15. REPORTES DE LA ENTREGA DE SEÑALIZACIÓN IMPLEMENTADA AL ALMACÉN DE LA ENTIDAD. 32

16. REPORTE DE LA SEÑALIZACIÓN RETIRADA DE VÍA Y ENTREGADA AL ALMACÉN DE LA ENTIDAD. 32

17. ASPECTOS VARIOS 33

18. RECURSOS UTILIZADOS POR EL CONTRATO DE OBRA. 34

18.1. PERSONAL 34

18.2. EQUIPOS DE APLICACIÓN, CONTROL, MATERIALES E INSUMOS 36

19. VINCULACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE 39

20. VINCULACIÓN POR PORCENTAJE DE MUJERES 39

21. INFORME DE GESTIÓN SOCIAL 40

22. SOPORTE DE CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 40

23. SOPORTE DE CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES 41

24. SOPORTE DE IMPLEMENTACIÓN, EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD APROBADO. 41

25. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS (Entre las cuales se destaca el estado de las pólizas del contrato de obra (vigente / en Actualización)). 42

26. REPORTE DE PLANILLAS DE PAGO DE SALARIOS Y HONORARIOS AL PERSONAL VINCULADO AL CONTRATO. 42

27. REPORTE DE PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL VINCULADO AL CONTRATO (SALUD, PENSIÓN, ARL) Y DEMÁS APORTES LEGALES 43

28. CERTIFICACIÓN HECHA POR REPRESENTANTE LEGAL, CONTADOR O REVISOR FISCAL, EN EL QUE DECLARE ENCONTRARSE AL DÍA EN PAGOS POR CONCEPTOS DE SALARIOS Y HONORARIOS Y APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, DE CONFORMIDAD CON LA OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA. 43

29. LISTADO DE PROVEEDORES 44

30. CERTIFICACIÓN HECHA POR REPRESENTANTE LEGAL, CONTADOR O REVISOR FISCAL, EN EL QUE DECLARE ENCONTRARSE AL DÍA EN PAGOS A PROVEEDORES DE ACUERDO CON EL PLAN DE PAGOS ACORDADO CON CADA UNO. 45

31. ESTADO PRESUPUESTAL. 45

31.1. INFORME ECONÓMICO TRIMESTRAL 48

32. SOPORTE DE CUMPLIMIENTO A FACTORES DE SELECCIÓN EN LOS QUE SE OBTUVO PUNTAJE ADICIONAL EN LA OFERTA. 49

33. COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 49

33.1. COMENTARIOS 49

33.2. CONCLUSIONES 50

33.3. RECOMENDACIONES 50

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Datos generales del Contrato 8
Tabla 2 Pólizas del Contrato CSVB 10
Tabla 3 ID ejecutado en el Mes 1 en Señalización Horizontal 11
Tabla 4 CIVs Ejecutados en el mes 1 en señalización horizontal 11
Tabla 5 CIVs ejecutados en el mes 1 en señalización vertical 11
Tabla 6 Adelanto en inspección e implementación 12
Tabla 7 Planes de Manejo de Tránsito (PMT) 16
Tabla 8 Registro de Lluvias 17
Tabla 9 CIVs con Reservas en el ID MV_AV_CALI_941_09_T3 18
Tabla 10 Actividades Realizadas en el Corredor o Corredores 19
Tabla 11 Instituciones Beneficiadas 20
Tabla 12 Personal del contrato de Obra 22
Tabla 13 Equipos empleados para la ejecución de las Actividades 23
Tabla 14 Instrumentos usados para el control de calidad 24
Tabla 15 Relación de materiales utilizados 25
Tabla 16 Pólizas 27
Tabla 17 Proveedores 28
Tabla 18 Balance Presupuestal 29

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Localización Asignada a la Zona Sur Occidente Lote No. 5 9
Ilustración 2 Ejecución vs Programado 30

1. INTRODUCCIÓN

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), requirió contratar las actividades de suministro e instalación de señalización (Vertical y Horizontal) y dispositivos de seguridad vial, para la ciudad de Bogotá D.C. en los espacios que se encuentren a su cargo y estén definidos en las áreas de influencia de los diseños integrales de señalización aprobados y que requieren de señalización para la regulación, prevención e información a los usuarios del Sistema de Movilidad.

Las actividades inherentes al proceso de señalización y seguridad vial para el presente proyecto corresponden a la señalización vertical de pedestal, señalización horizontal y dispositivos de señalización.

En marco de este programa la SDM celebró el contrato SDM 2024-3651 con la firma **CONSORCIO SEGURVIAL BOGOTÁ**, el cual tiene por objeto "REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA OCCIDENTE-SUR", por valor de $18.771.473.428.350¨ y adjudicado por la SDM mediante Resolución No. 757351 del 10 de diciembre de 2024, para la atención integral de las actividades de implementación de señalización, donde se incluye el suministro e instalación de la señalización vertical, aplicación de señalización horizontal y el suministro e instalación de otros dispositivos de señalización horizontal en la malla vial de las localidades de Bosa y Kennedy; dentro de estas zonas de alcance contractual se encuentran diferentes corredores principales de la ciudad, los cuales serán asignados por la SDM e intervenidos por el contrato en mención.

El presente informe el cual tiene como objetivo presentar la información recolectada durante el octavo mes de ejecución, el cual corresponde al periodo comprendido entre el 22 de agosto y el 21 de septiembre de 2025, razón por la que este informe es de avance parcial de obra del periodo anteriormente mencionado y tiene como base la información solicitada en el Anexo Técnico y la Minuta del proceso licitaría SDM-LP-95_2024 y el Contrato 3651-2024.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

A fin de cumplir la atención integral en temas de señalización en la ciudad de Bogotá D.C., la Secretaría Distrital de Movilidad, entidad a cargo de la señalización de la ciudad capital, realizó el proceso licitatorio SDM-LP-95-2024, el cual el CONSORCIO SEGURVIAL BOGOTÁ fue adjudicatario de la zona 5, que corresponden a las localidades de Kennedy y Bosa.

Para cada una de las zonas adjudicadas, las actividades de implementación de señalización: Suministro, instalación de la señalización vertical de pedestal, aplicación de señalización horizontal e implementación de otros dispositivos de señalización horizontal contemplados en el Capítulo 5 de la Resolución 20243040045005 de 2024 Manual de señalización vial de Colombia, dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y Ciclorrutas de Colombia. La implementación de señalización y dispositivos de seguridad vial se realizará sobre el espacio público o privado de uso público (corredores viales, intersecciones a nivel o desnivel, Ciclorrutas, andenes, estacionamientos aprobados por la SDM, entre otros) las demás actividades contempladas para las actividades inherentes al proceso de señalización y seguridad vial.

Es de importancia destacar que la SDM realizó un proceso licitatorio para la contratación de la interventoría para cumplir con la legislación colombiana, el proceso SDM-CMA-116-2024; en el cual el CONSORCIO SEGURIDAD CAPITAL 24-27 fue adjudicatario del proceso para la zona 5, con el que luego se suscribió el contrato SDM-3666-2024.

Los datos generales del contrato se muestran en la siguiente tabla, se indica que a la fecha del presente informe no se han realizado modificaciones de adición, suspensión o reinicio al contrato.

Tabla 1 Datos generales del Contrato

NÚMERO DE CONTRATO DE OBRA	2024 - 3651
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA OCCIDENTE-SUR – ZONA 5
CONTRATANTE	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
CONTRATISTA	CONSORCIO SEGURVIAL BOGOTÁ
REPRESENTANTE LEGAL	MIYER MORALES MEDINA
PLAZO DE EJECUCIÓN	34 MESES
FECHA DE ACTA DE INICIO	22 DE ENERO 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	21 DE NOVIEMBRE 2027
VALOR TOTAL	$18.771.473.428.350 SUMA QUE SE DISCRIMINA DE LA SIGUIENTE MANERA: VIGENCIA 2024: $2.815.721.000 VIGENCIA 2025: $6.209.487.857 VIGENCIA 2026: $6.423.895.143 VIGENCIA 2027: $3.322.369.248
LUGAR DE EJECUCIÓN:	BOGOTÁ D.C., LOCALIDAD DE BOSA Y KENNEDY
INTERVENTOR	CONSORCIO SEGURIDAD CAPITAL 24 -27
NÚMERO DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA	2024 - 3666

Fuente: Elaboración Consorcio Segurvial Bogotá


2.2. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

Los trabajos de implementación de señalización horizontal y vertical serán ejecutados en la red vial de la Zona Occidente sur de la ciudad de Bogotá.

La zona occidente sur comprende las localidades de:

- 07. Bosa
- 08. Kennedy

Ilustración 1 Localización Asignada a la Zona Sur Occidente Lote No. 5

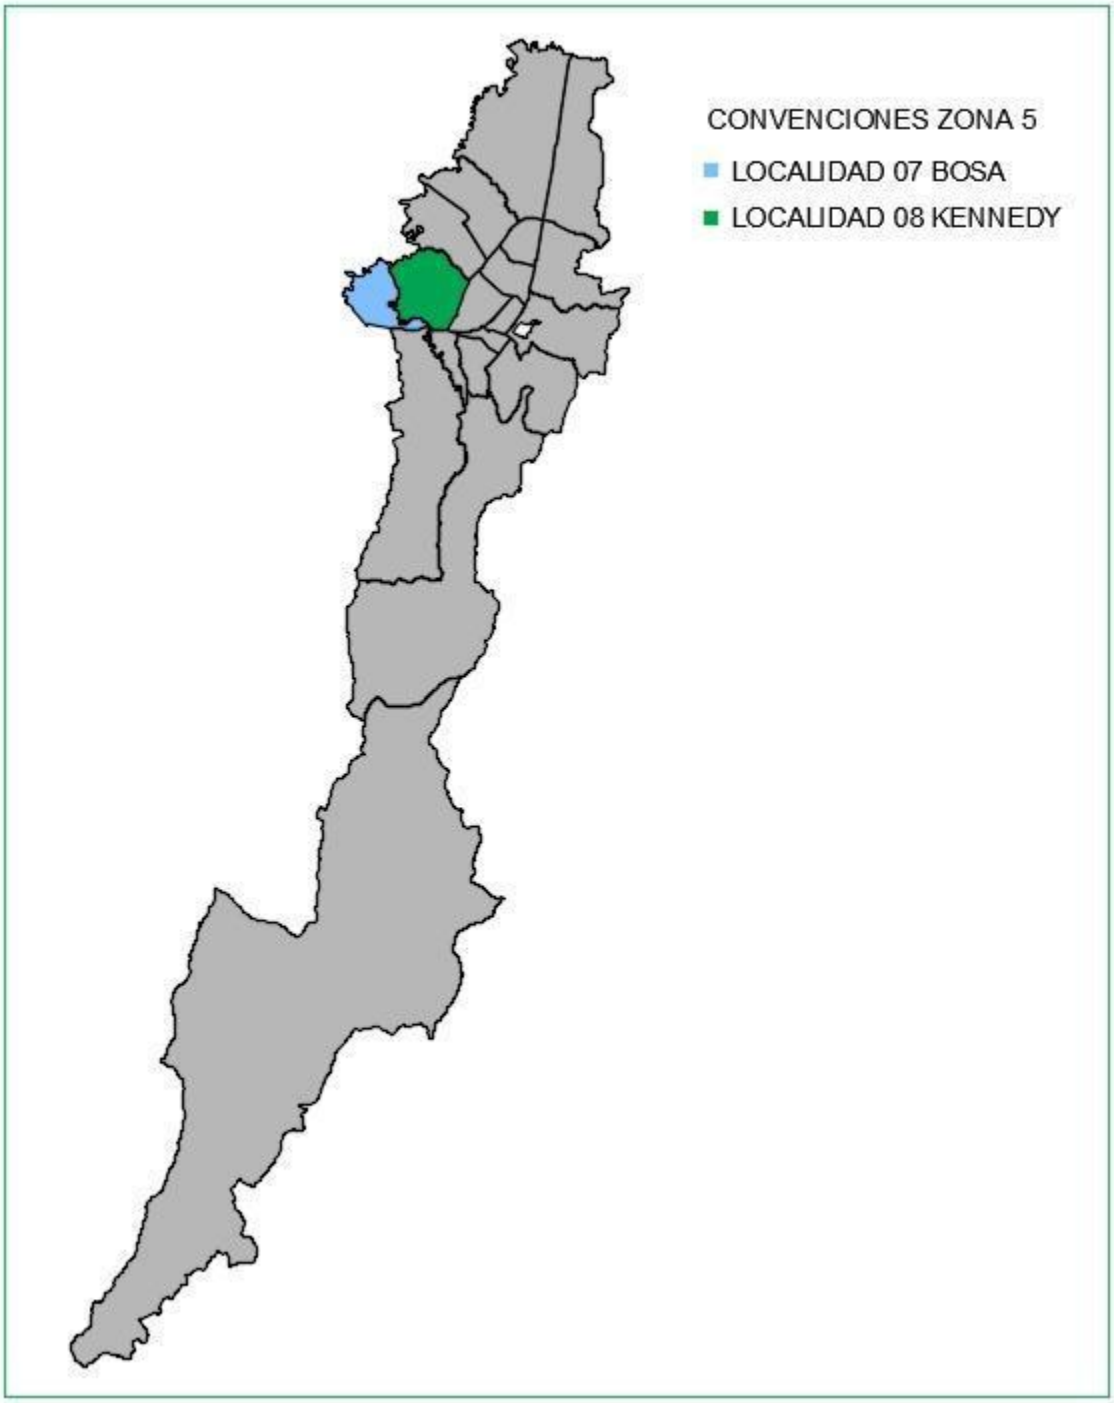

Fuente: Elaboración Consorcio Segurvial Bogotá

3. PERIODO DE REPORTE

Este informe presenta el detalle de las actividades de señalización horizontal, señalización vertical e instalación de dispositivos de tránsito y/o elementos canalizadores del tráfico, realizadas por el Consorcio Segurvial Bogotá y supervisadas por el Consorcio Seguridad Capital 24-27.

Además, presenta información en el cual se muestra el cumplimiento de las responsabilidades adquiridas por el Consorcio Segurvial Bogotá, a través del Anexo Técnico y la Minuta del Contrato 3651-2024.

El presente informe corresponde al periodo No. 8. Comprendido entre el 22 de agosto al 21 de septiembre de 2025.

4. ESTADO DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO (VIGENTE / EN ACTUALIZACIÓN)

Las pólizas solicitadas en el contrato fueron expedidas por la compañía Seguros Mundial S.A. A continuación, se presenta una relación que incluye amparos, vigencia y valor asegurado.

Tabla 2 Pólizas del Contrato 2024-3651 Consorcio Segurvial Bogotá

TIPO DE GARANTÍA	AMPARO	VIGENCIA		VR.	PÓLIZA No.
		DESDE	HASTA		
Cumplimiento	Cumplimiento del contrato	22/01/25	23/05/28	$ 5.631.442.028,40	100363759-3
	Pago de salarios	22/01/25	22/11/30	$ 3.754.294.685,60	100363759-3
	Estabilidad y calidad de la obra	22/11/27	22/11/32	$ 5.631.442.028,40	100363759-3
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	22/11/27	23/05/28	$ 5.631.442.028,40	100363759-3
Responsabilidad civil extracontractual	Amparo básico - predios - labores y operaciones	22/01/25	22/11/27	$ 938.573.671,00	100093818-2
	Patronal	22/01/25	22/11/27	$ 938.573.671,00	100093818-2
	Contratistas y subcontratistas	22/01/25	22/11/27	$ 938.573.671,00	100093818-2
	Vehículos propios y no propios	22/01/25	22/11/27	$ 938.573.671,00	100093818-2

Fuente: Elaboración Consorcio Segurvial Bogotá

Las pólizas anteriormente mencionadas están aprobadas por parte de la entidad contratante.

Ver **Anexo 20.**

5. ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO

5.1. ACTA DE RECIBO PARCIAL Y PLANILLAS DE OBRA

Para el periodo comprendido entre el 22 de agosto y el 21 de septiembre de 2025, se adjunta el cuadro del acta de obra correspondiente al mes 8. Asimismo, se anexa el archivo en formato PDF con las planillas de obra, las cuales han sido debidamente revisadas, aprobadas y firmadas por los ingenieros residentes del contratista y de la interventoría del contrato.

Ver **Anexo 1.**

5.2. AVANCE DE ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN

Se presenta un archivo que contiene la hoja de vida de contrato, donde se especifica la cantidad de ID 's asignados, localización, su correspondiente estado, recursos invertidos en cada, cuenta en que se cobró y datos particulares que permiten tener la trazabilidad completa de cada ID.

Ver **Anexo 2**.

Para el periodo comprendido del 22 de agosto al 21 de septiembre de 2025, se ejecutaron los siguientes tipos de trabajos de Señalización vial en los siguientes puntos:

Tabla 3 CIVs Ejecutados en el mes 8

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL - EX_08_308_1867_12 BICIKENNEDY		
CIV	**DIRECCIÓN**	**LOCALIDAD**
8005552	CL 38CBISS ENTRE KR 79GY KR 79F	KENNEDY
8005617	KR 79G ENTRE CL 39ASY CL 38CBISS	KENNEDY
8005652	KR 79F ENTRE CL 38CBISSY CL 39BISS	KENNEDY
8005697	CL 39AS ENTRE KR 79FY KR 79G	KENNEDY
8005704	KR 79C ENTRE CL 38CBIS SY CL 38C S	KENNEDY
8005705	CL 38CBISS ENTRE KR 79DY KR 79C	KENNEDY
8005719	KR 79D ENTRE CL 39BISSY CL 38CBISS	KENNEDY
8005720	CL 39BISS ENTRE KR 79FY KR 79D	KENNEDY
8005753	KR 79C ENTRE CL 39SY CL 38CBIS S	KENNEDY
8005763	CL 39AS ENTRE KR 79FY KR 79D	KENNEDY
8005767	KR 79F ENTRE CL 40SY CL 39AS	KENNEDY

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL - EX_08_308_1867_12 BICIKENNEDY		
CIV	**DIRECCIÓN**	**LOCALIDAD**
8005768	CL 40S ENTRE KR 79FY KR 79G	KENNEDY
8005820	CL 39 SUR ENTRE KR 79CY KR 79B	KENNEDY
8005838	KR 79C ENTRE CL 39ASY CL 39S	KENNEDY
8005839	CL 39AS ENTRE KR 79DY KR 79C	KENNEDY
8005854	KR 79F ENTRE CL 40ASY CL 40S	KENNEDY
8005861	KR 79G ENTRE CL 40SY CL 40BS	KENNEDY
8005892	CL 39S ENTRE KR 79BY KR 79A	KENNEDY
8005929	CL 40AS ENTRE KR 79DY KR 79F	KENNEDY
8005936	KR 79F ENTRE CL 40BSY CL 40AS	KENNEDY
8005937	CL 40B SUR ENTRE KR 79FY KR 79G	KENNEDY
8005951	CL 40CS ENTRE KR 79GY AK 80	KENNEDY
8005980	KR 79B ENTRE CL 39SY CL 40S	KENNEDY
8005987	KR 79C ENTRE CL 39ASY CL 40AS	KENNEDY
8005988	CL 40AS ENTRE KR 79CY KR 79D	KENNEDY
8006015	KR 79F ENTRE CL 40BSY CL 40CS	KENNEDY
8006016	CL 40CS ENTRE KR 79FY KR 79G	KENNEDY
8006022	CL 40ABISS ENTRE KR 79DY KR 79C	KENNEDY
8006050	KR 79A ENTRE CL 39SY CL 40S	KENNEDY
8006051	CL 40S ENTRE KR 79AY KR 79B	KENNEDY
8006057	CL 40AS ENTRE KR 79BY KR 79C	KENNEDY
8006080	CL 39S ENTRE KR 78NBISY KR 78P	KENNEDY
8006084	KR 79D ENTRE CL 40CSY CL 40ABISS	KENNEDY
8006085	CL 40CS ENTRE KR 79DY KR 79F	KENNEDY
8006111	KR 78P ENTRE CL 39SY CL 39AS	KENNEDY
8006112	CL 39AS ENTRE KR 78PY KR 79	KENNEDY
8006113	KR 79C ENTRE CL 40ABISSY CL 40BBISS	KENNEDY
8006151	CL 40CS ENTRE KR 79CY KR 79D	KENNEDY
8006173	KR 78NBIS ENTRE CL 39BISSY CL 39S	KENNEDY
8006183	KR 79B ENTRE CL 40BBISSY CL 40AS	KENNEDY
8006184	CL 40BBISS ENTRE KR 79CY KR 79B	KENNEDY
8006204	CL 39AS ENTRE KR 78PY KR 78NBIS	KENNEDY
8006209	CL 40AS ENTRE KR 79Y KR 79B	KENNEDY
8006213	KR 79C ENTRE CL 41SY CL 40CS	KENNEDY
8006221	KR 78M ENTRE CL 39SY CL 38CS	KENNEDY
8006226	CL 40CS ENTRE KR 79BY KR 79C	KENNEDY
8006256	KR 78N ENTRE CL 39BISSY CL 39S	KENNEDY
8006257	CL 39BISS ENTRE KR 78NY KR 78N BIS	KENNEDY
8006287	KR 78N ENTRE CL 39BIS SURY CL 39A SUR	KENNEDY
8006288	CL 39AS ENTRE KR 78NBISY KR 78N	KENNEDY

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL - EX_08_308_1867_12 BICIKENNEDY		
CIV	**DIRECCIÓN**	**LOCALIDAD**
8006297	CL 40S ENTRE KR 78NBISY KR 78P	KENNEDY
8006303	CL 40CS ENTRE KR 79AY KR 79B	KENNEDY
8006354	KR 78P ENTRE CL 40SY CL 40BS	KENNEDY
8006363	KR 78N ENTRE CL 40SY CL 39AS	KENNEDY
8006364	CL 40S ENTRE KR 78NBISY KR 78N	KENNEDY
8006389	KR 79A ENTRE CL 40CSY CL 41AS	KENNEDY
8006446	KR 78M ENTRE CL 40SY CL 39S	KENNEDY
8006457	KR 78NBIS ENTRE CL 40BSY CL 40S	KENNEDY
8006458	CL 40BS ENTRE KR 78PY KR 78NBIS	KENNEDY
8006528	KR 78N ENTRE CL 40BSY CL 40S	KENNEDY
8006529	KR 78P ENTRE CL 41S Y CL 40CS	KENNEDY
8006535	KR 78NBIS ENTRE CL 40CSY CL 40BS	KENNEDY
8006536	CL 40CS ENTRE KR 78PY KR 78NBIS	KENNEDY
8006598	KR 78M ENTRE CL 40BSY CL 40S	KENNEDY
8006599	CL 40BS ENTRE KR 78NY KR 78M	KENNEDY
8006600	KR 78N ENTRE CL 40CSY CL 40BS	KENNEDY
8006601	CL 40C S ENTRE KR 78NBISY KR 78N	KENNEDY
8006677	KR 78N ENTRE CL 41S Y CL 40CS	KENNEDY
8006786	KR 78N ENTRE CL 41 SURY CL 41BIS SUR	KENNEDY

Fuente: Elaboración Consorcio Segurvial Bogotá

Tabla 4 CIVs Ejecutados en el mes 8

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL - CP AVENIDA DE LAS AMERICAS – KR 69		
CIV	**DIRECCIÓN**	**LOCALIDAD**
8004679	LAS AMERICAS KR 68F KR 69	KENNEDY
8004705	LAS AMERICAS KR 68F KR 68B	KENNEDY

Fuente: Elaboración Consorcio Segurvial Bogotá

Tabla 5 CIVs Ejecutados en el mes 8

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL - MV_08_001_1703_10		
CIV	**DIRECCIÓN**	**LOCALIDAD**
8006037	KR 79 CL 38CS CL 39AS	KENNEDY
8006112	CL 39AS KR 78P KR 79	KENNEDY
8006122	KR 79 CL 39AS CL 40S	KENNEDY

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL - MV_08_001_1703_10		
CIV	**DIRECCIÓN**	**LOCALIDAD**
8006208	KR 79 CL 40S CL 40AS	KENNEDY
8006292	KR 79 CL 40AS CL 40BS	KENNEDY
8006357	KR 79 CL 40BS CL 40CS	KENNEDY
8014094	KR 79 CL 40CS CL 40CS	KENNEDY
8006630	KR 79 CL 40CS CL 41BS	KENNEDY
8006358	CL 40CS KR 79 KR 79A	KENNEDY

Fuente: Elaboración Consorcio Segurvial Bogotá

Tabla 6 CIVs Ejecutados en el mes 8

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL - MV_08_259_1244_11		
CIV	**DIRECCIÓN**	**LOCALIDAD**
8005951	CL 40CS KR 79G AK 80	KENNEDY
8006096	AK 80 CL 40CS CL 41BS	KENNEDY
8014029	AK 80 CL 40CS CL 40BS	KENNEDY
8005618	CL 39AS KR 79G AK 80	KENNEDY
8012676	AK 80 CL 39AS TV 71B	KENNEDY

Fuente: Elaboración Consorcio Segurvial Bogotá

Tabla 7 CIVs Ejecutados en el mes 8

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL – MV_AV_BOYACA_941_09 (ACCESO PRIMERA DE MAYO CON BOYACÁ y ACCESOS AV. DE LAS AMERICAS)		
CIV	**DIRECCIÓN**	**LOCALIDAD**
8012658	CL 5 SUR AC 26 SUR AK 72	KENNEDY
8012651	DG 5C AK 72 TV 71D	KENNEDY
8012652	CL 5C AK 72 KR 72B	KENNEDY
8004480	CL 6B AK 72 KR 71G	KENNEDY
8012644	CL 6B AK 72 KR 72B	KENNEDY

Fuente: Elaboración Consorcio Segurvial Bogotá

Tabla 8 CIVs Ejecutados en el mes 8

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL – MV_AV_BOYACA_941_09 (RESALTOS)		
CIV	**DIRECCIÓN**	**LOCALIDAD**
8002710	AK 72 ENTRE CL 8B BISY Via Peatonal	KENNEDY
8003031	AK 72 ENTRE CL 7C BISY CL 8	KENNEDY
8003096	AK 72 ENTRE CL 8Y Via Peatonal	KENNEDY

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL – MV_AV_BOYACA_941_09 (RESALTOS)		
CIV	**DIRECCIÓN**	**LOCALIDAD**
8003644	AK 72 ENTRE CL 7AY CL 7C BIS	KENNEDY
8004092	AK 72 ENTRE CL 6CY CL 7A	KENNEDY
8004500	AK 72 ENTRE CL 5BY CL 6C	KENNEDY
8005344	AK 72 ENTRE CL 3Y CL 4	KENNEDY
8005898	AK 72 ENTRE CL 2Y CL 3	KENNEDY
8006237	AK 72 ENTRE CL 1Y CL 2	KENNEDY
8006342	AK 72 ENTRE CL 2A SURY CL 1	KENNEDY
8007409	AK 72 ENTRE CL 32 SURY AC 26 SUR	KENNEDY
8008510	AK 72 ENTRE KR 68CY CL 37SUR	KENNEDY
8009167	AK 72 ENTRE KR 68CY KR 69B	KENNEDY
8009365	AK 72 ENTRE KR 69AY KR 69B	KENNEDY
8009746	AK 72 ENTRE KR 69Y KR 69BIS	KENNEDY
8009933	AK 72 ENTRE KR 68MY KR 69	KENNEDY
8010311	AK 72 ENTRE DG 39 SURY KR 68 I	KENNEDY
8010453	AK 72 ENTRE KR 68K BIS AY KR 68 I	KENNEDY
8011000	AK 72 ENTRE TV 68J BISY CL 39F SUR	KENNEDY
8011175	AK 72 ENTRE TV 72D BISY TV 72D	KENNEDY
8011358	AK 72 ENTRE CL 43A SURY CL 40 SUR	KENNEDY
8011511	AK 72 ENTRE TV 68 IY CL 44 A SUR	KENNEDY
8011524	AK 72 ENTRE TV 68 IY CL 44 C SUR	KENNEDY
8013012	AK 72 ENTRE Via PeatonalY CL 9	KENNEDY
8013256	AK 72 ENTRE CL 39F SURY TV 72F	KENNEDY
8013257	AK 72 ENTRE CL 40SURY CL 39I SUR	KENNEDY
8014051	AK 72 ENTRE CL 11AY CL 11B BIS	KENNEDY
8014052	AK 72 ENTRE CL 10Y CL 11A	KENNEDY
8014088	AK 72 ENTRE CL 9Y Via Peatonal	KENNEDY
8014329	AK 72 ENTRE CL 43C SURY CL 44SUR	KENNEDY
8014330	AK 72 ENTRE CL 43C SURY CL 43A SUR	KENNEDY
8016748	AK 72 ENTRE AC 26 SURY CL 2A SUR	KENNEDY

Fuente: Elaboración Consorcio Segurvial Bogotá


6. REGISTRO FOTOGRÁFICO


Ver registro fotográfico en el **Anexo 3**.

6.1. CP AVENIDA DE LAS AMERICAS – KR 69

ANTES	DESPUÉS
	
Imagen 1: Implementación de calzada.	**Imagen 2:** Implementación de calzada.


ANTES	DESPUÉS
	
Imagen 3: Implementación de calzada.	**Imagen 4:** Implementación de calzada.

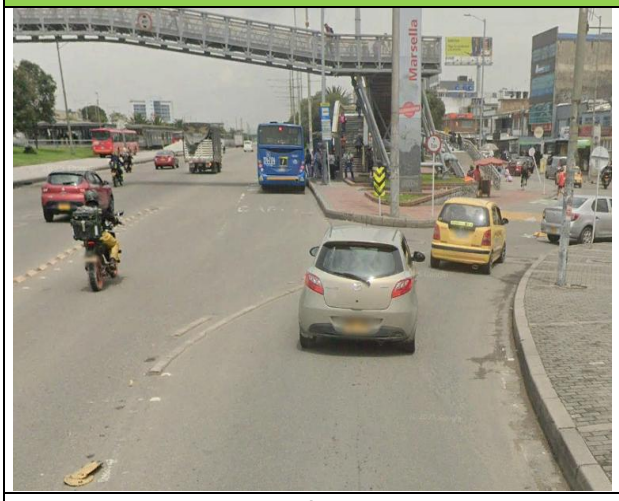
ANTES	DESPUÉS
	
Imagen 5: Implementación de calzada.	**Imagen 6:** Implementación de calzada.

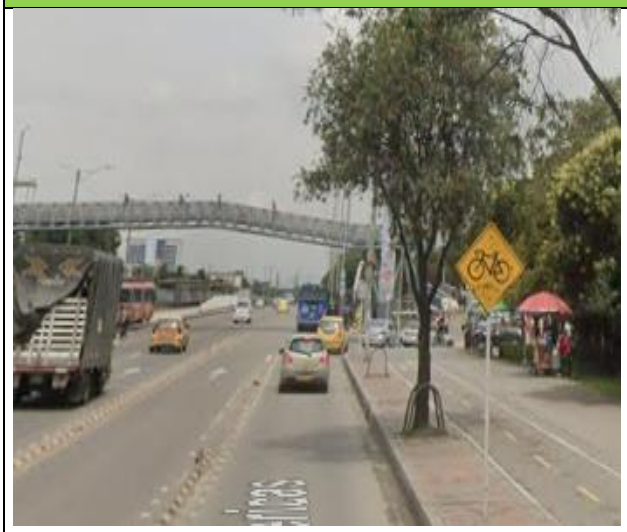ANTES	DESPUÉS
	
Imagen 7: Implementación de calzada.	**Imagen 8:** Implementación de calzada.

6.2. MV_AV_BOYACA_941_09 (RESALTOS)

ANTES	DESPUÉS
	
Imagen 9: Implementación de calzada.	**Imagen 10:** Implementación de calzada.

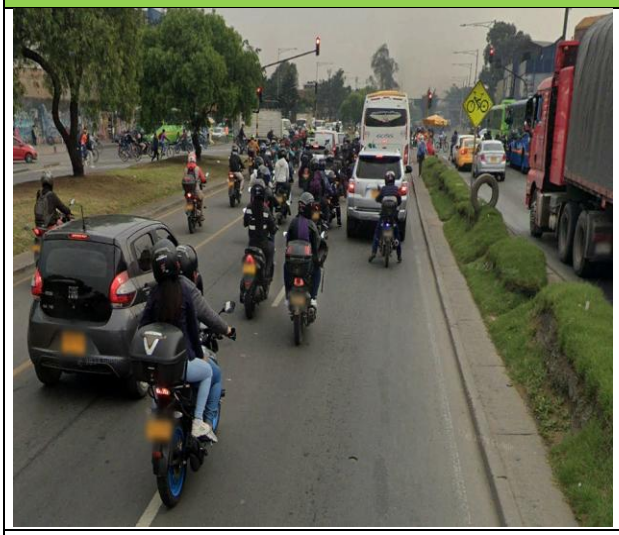ANTES	DESPUÉS
	
Imagen 11: Implementación de calzada.	**Imagen 12:** Implementación de calzada.


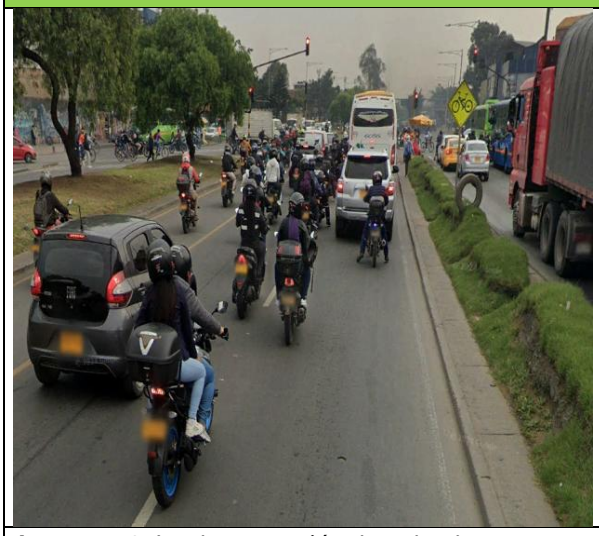
ANTES	DESPUÉS
	
Imagen 13: Implementación de calzada.	**Imagen 14:** Implementación de calzada.

ANTES	DESPUÉS
	
Imagen 15: Implementación de calzada.	**Imagen 16:** Implementación de calzada.

6.3. BICI KENNEDY

ANTES	DESPUÉS
	
Imagen 17: Implementación de calzada.	**Imagen 18:** Implementación de calzada.

ANTES	DESPUÉS
	
Imagen 19: Implementación de calzada.	**Imagen 20:** Implementación de calzada.

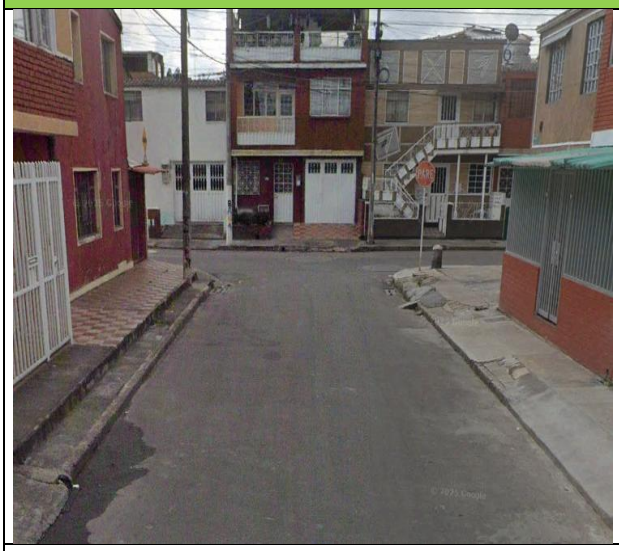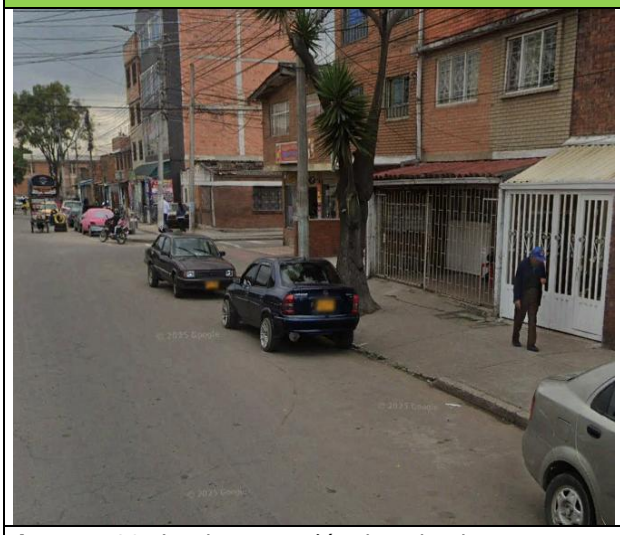ANTES	DESPUÉS
	
Imagen 21: Implementación de calzada.	**Imagen 22:** Implementación de calzada.
ANTES	**DESPUÉS**
	
Imagen 23: Implementación de calzada.	**Imagen 24:** Implementación de calzada.

7. GESTIÓN, AVANCES Y PARTICULARIDADES SOBRE LOS PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO DEL CONTRATO DE OBRA.

Para el periodo del presente informe, a continuación, se presenta un cuadro resumen de los planes de manejo de tránsito del contrato de obra aprobados por la SDM.

Tabla 9 Planes de Manejo de Tránsito (PMT)

PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)							
COI	IDENTIFICADOR ASIGNADO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	COI APROBACIÓN	VIGENCIA		FINAL
					INICIO	FINAL	
EM	CP AV. AMERICAS CON CARRERA 69	KENNEDY	AVENIDA DE LAS AMERICAS AV. AC 6 KR 69	22/09/2025	4/09/2025	19/09/2025	23:00-05:00
EM	CP AV. AMERICAS CON CARRERA 69	KENNEDY	AVENIDA DE LAS AMERICAS (AC 6) - KR 69	22/09/2025	8/09/2025	23/09/2025	23:00-05:00
EM	CP. AV. AMERICAS CON CARRER 78 (BANDERAS)	KENNEDY	AVENIDA DE LAS AMERICAS (AC 6) - AVENIDA POPORO QUIMBAYA (KR 69)	22/09/2025	22/09/2025	7/10/2025	23:00-05:00
EM	CP. AV. AMERICAS CON CARRER 78 (BANDERAS)	KENNEDY	AV. LAS AMERICAS (AC 6) TV 71B - CL 3	22/09/2025	22/09/2025	7/10/2025	23:00-05:00
EM	CP. AV. AMERICAS CON CARRER 78 (BANDERAS)	KENNEDY	AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS (CL 5C) - KR 79C	24/09/2025	22/09/2025	7/10/2025	23:00-05:00
EM	CP. AV. AMERICAS CON CARRER 78 (BANDERAS)	KENNEDY	AVENIDA DE LAS AMERICAS (AC 6) - AVENIDA POPORO QUIMBAYA (KR 78)	24/09/2025	24/09/2025	9/10/2025	23:00-05:00
EM	CP. AV. AMERICAS CON CARRER 78 (BANDERAS)	KENNEDY	TV 71B - AVENIDA DE LAS AMERICAS (AC 6)	24/09/2025	24/09/2025	9/10/2025	23:00-05:00

Fuente: Elaboración Consorcio Segurvial Bogotá

Ver **Anexo 4**

8. ASPECTOS TÉCNICOS, MODIFICACIONES SURGIDAS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, PROBLEMAS Y SOLUCIONES ADOPTADAS.

A lo largo del octavo mes de ejecución del contrato, no se presentaron lluvias que interrumpieran las jornadas de trabajo en los puntos de intervención. Esta condición climática favorable permitió mantener la continuidad operativa en campo y avanzar conforme a lo programado. Gracias a la adecuada programación técnica y a la optimización de los recursos disponibles, se logró cumplir con las metas de aplicación establecidas para este periodo, consolidando el avance proyectado en el plan de trabajo y el cumplimiento de los objetivos contractuales bajo la supervisión de la Interventoría.

Ver la siguiente tabla de registro de lluvias.

Tabla 10 Registro de Lluvias

MES 8		
FECHA	**REGISTRO DE LLUVIAS**	**REGISTRO DE NOVEDAD**
22/08/2025	No se presentan lluvias	Se realizan actividades
23/08/2025	No se presentan lluvias	Se realizan actividades ID RESALTOS - MV_AV. BOYACA_941_09
24/08/2025	Se presentan lluvias en la noche	No se realizan actividades
25/08/2025	No se presentan lluvias	Se realizan actividades
26/08/2025	No se presentan lluvias	Se realizan actividades
27/08/2025	No se presentan lluvias	Se realizan actividades
28/08/2025	No se presentan lluvias	Se realizan actividades
29/08/2025	No se presentan lluvias	Se realizan actividades
30/08/2025	No se presentan lluvias	No se realizan actividades
31/08/2025	No se presentan lluvias	Se realizan actividades
1/09/2025	No se presentan lluvias	Se realizan actividades
2/09/2025	No se presentan lluvias	Se realizan actividades
3/09/2025	No se presentan lluvias	Se realizan actividades ID RESALTOS - MV_AV. BOYACA_941_09
	Se presentan lluvias en la noche	Se cancelan actividades ID EX_08_308_1867_12 BICI KENNEDY
4/09/2025	No se presentan lluvias	Se realizan actividades
5/09/2025	No se presentan lluvias	Se realizan actividades
6/09/2025	No se presentan lluvias	No se realizan actividades

MES 8		
FECHA	**REGISTRO DE LLUVIAS**	**REGISTRO DE NOVEDAD**
7/09/2025	Se presentan lluvias	Se suspenden actividades
8/09/2025	No se presentan lluvias	Se realizan actividades
9/09/2025	No se presentan lluvias	Se realizan actividades
10/09/2025	No se presentan lluvias	Se realizan actividades
11/09/2025	No se presentan lluvias	Se realizan actividades
12/09/2025	No se presentan lluvias	Se realizan actividades
13/09/2025	No se presentan lluvias	No se realizan actividades
14/09/2025	Se presentan lluvias	Se suspenden actividades
15/09/2025	No se presentan lluvias	Se realizan actividades
16/09/2025	No se presentan lluvias	Se realizan actividades
17/09/2025	No presentan lluvias en la noche	Se realizan actividades EX_08_308_1867_12 BICI KENNEDY MV_AV_BOYACA_941_09
18/09/2025	No se presentan lluvias	Se realizan actividades
19/09/2025	Se presentan lluvias	Se suspenden actividades MV_AV_BOYACA_941_09 BICIKENNEDY
20/09/2025	No se presentan lluvias	No se realizan actividades
21/09/2025	No se presentan lluvias	Se realizan actividades

Fuente: Elaboración Consorcio Segurvial Bogotá

Ver **Anexo 5**

9. REPORTE DE ACCIONES REALIZADAS A PARTIR DE LAS GESTIONES ADELANTADAS CON OBJETO DE LA VERIFICACIÓN DE CRUCE DE INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN.

Para el periodo comprendido entre el 22 de agosto y el 21 de septiembre, no se emitieron comunicaciones a otras entidades en relación con consultas sobre reservas de CIV, ni para adelantar gestiones de cruce de información respecto a proyectos de terceros en la zona de influencia del diseño de señalización. Durante este lapso, se llevaron a cabo inspecciones a los diseños asignados por la Secretaría Distrital de Movilidad, sin que se identificaran situaciones que requirieran coordinación o intercambio de información con entidades como la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV, Enel Colombia S.A. E.S.P. – ENEL, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

E.S.P. – EAAB o el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU o Alcaldías Locales de la ciudad de Bogotá.

Ver **Anexo 6**

10. REPORTE DE EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD IMPLEMENTADO.

En cumplimiento con el Plan de Calidad aprobado por la interventoría y el Plan de Inspección de Ensayos, se ha llevado a cabo la supervisión y verificación correspondiente durante el desarrollo de la obra. Este informe tiene como objetivo documentar el cumplimiento de los procedimientos establecidos, garantizando que las actividades realizadas se ajusten a los estándares de calidad y seguridad requeridos, y que los ensayos realizados cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en los planes de inspección y control de calidad.

Ver **Anexo 7**

11. REPORTE DE EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE MANEJO DE RESIDUOS.

En concordancia con el informe anterior y conforme al Protocolo de Manejo de Residuos, se deja constancia de que la recolección de los residuos generados en el frente de obra se realizó según lo programado, el 29 de agosto de 2025. Este procedimiento es evidenciable con el registro fotográfico relacionado como soporte documental de dicho procedimiento.

Así mismo, se adjunta la factura electrónica **MAEE 608**, correspondiente al servicio de gestión ambiental y disposición final de residuos contaminados, emitida por la empresa **MAEE** identificada con el NIT 1.110.498.950-1, en cumplimiento de lo establecido en el Protocolo de Manejo de Residuos y la normatividad ambiental vigente.

De manera paralela, se continúa con el almacenamiento adecuado de los residuos que continúan generando el desarrollo de las actividades, garantizando que

permanezcan identificados, aislados y debidamente clasificados en la bodega de acopio, conforme a los lineamientos del Programa de Manejo de Residuos. Asegurando la trazabilidad de estos elementos hasta su entrega y disposición final.

Finalmente, se informa que en el informe No. 9 se anexará el certificado oficial de disposición final, una vez sea emitido por la empresa especializada, como constancia del cierre integral de este proceso.


RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE OBRA PARA DISPOSICIÓN FINAL







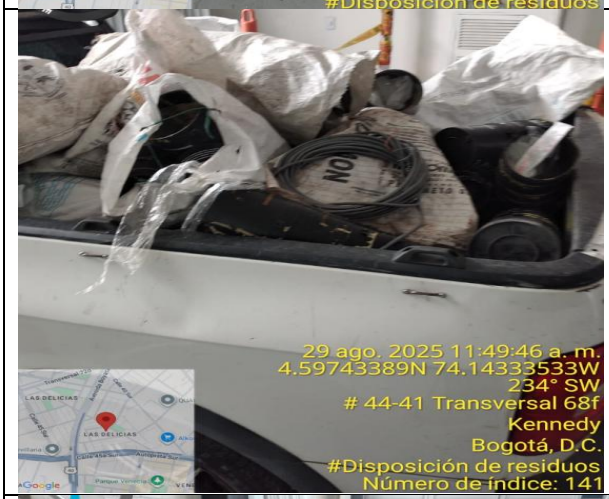

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE OBRA PARA DISPOSICIÓN FINAL	
	
	
	

Ver **Anexo 8**

12. REPORTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR O CORREDORES ASIGNADOS

Tabla 11 Actividades Realizadas en el Corredor o Corredores

ACTIVIDADES REALIZADAS		
ID DISEÑO	**LOCALIDAD**	**ACTIVIDAD**
MV_AV_BOYACA_941_09 RESALTOS	KENNEDY	Durante el periodo se realizó la implementación de Fase 2 y Fase Final con Pintura de larga duración a 40 Resaltos. Estos resaltos pasan a Fase Final por decisión de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), tras la visita realizada en conjunto con la Interventoría y la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV). Durante el recorrido programado el 17 de septiembre de 2025 con la UMV, se llevó a cabo la validación de los resaltos que presentan ahuellamientos. Se precisó que en campo no se tomarían decisiones, dado que posteriormente se llevará a cabo una mesa de trabajo entre la SDM y la UMV, en la cual se definirá cuáles resaltos deberán recibir pintura definitiva y cuáles requerirán reparación. En consecuencia, se indicó que debe esperarse la notificación oficial de la Entidad para proceder con la ejecución de las actividades correspondientes.
BICI-KENNEDY (MV_08_259_1244_11)	KENNEDY	Durante el periodo en curso se realizó las actividades implementación de la Intersección Semafórica entre la Carrera 80 y la Calle 40c sur. Donde se implementó las marcas de metro cuadrado con pintura plástico en frío llana y bicomponente spray. Adicionalmente, también se realizó la instalación de señales verticales según el diseño y bajo la supervisión de la Interventoría.

ACTIVIDADES REALIZADAS		
ID DISEÑO	**LOCALIDAD**	**ACTIVIDAD**
BICI-KENNEDY (EX_08_308_1867_12)	KENNEDY	Para el periodo en curso se realizó toda la implementación del urbanismo táctico adjudicados por la SDM. Durante este periodo la SDM dio la orden de realizar la implementación de unos CIVs que pertenecían a la Fase 3 del proyecto de Bici-Kennedy. Se realizo la implementación del urbanismo táctico con pintura base solvente Acrílico. El resto de las marcas viales se implementaron con pintura de larga duración plástico en frío llana y bicomponente Spray. Por último, se instalaron las Señales Verticales según el diseño y bajo la supervisión de la Interventoría.
BICI-KENNEDY (MV_08_001_1703_10)	KENNEDY	Durante el periodo se realizó la instalación e implementación sobre la Carrera 79, comprendida entre la Calle 40C Sur y la Calle 38C Sur. En el tramo se instalaron bordillos, tachones e hitos, con el fin de salvaguardar las zonas de tránsito de ciclistas. Cabe destacar que el diseño inicial fue modificado y compartido por la Entidad el 22 de agosto. Posteriormente, se efectuó una nueva modificación al diseño, incorporando bordillos no traspasables, la cual fue remitida el 12 de septiembre. Además, se implementó marcas con pintura de larga duración plástico en frío llana y Bicomponente Spray. Se instalaron las Señales verticales en todo el corredor vial.

ACTIVIDADES REALIZADAS		
ID DISEÑO	**LOCALIDAD**	**ACTIVIDAD**
CP_AV_AMERICAS X CARRERA 69	KENNEDY	Se realizó la implementación del compromiso prioritario, realizando el retiro de dispositivos en un carril de la Avenida Américas. Se realizo el reemplazo de algunos dispositivos como los tachones traspasables e hitos flexibles. Para terminar, se realizó la implementación de marcas con pintura de larga duración Plástico en Frío Llana y el metro lineal con Bicomponente Spray. Se reemplazaron las bandas de Agregado existentes.

Fuente: Elaboración Consorcio Segurvial Bogotá

13. REPORTE ESTADÍSTICO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LOCALIDAD E INSTITUCIONES BENEFICIADAS.

Para el presente Informe, se llevaron a cabo diversas implementaciones orientadas a mejorar las condiciones de seguridad vial. Estas acciones hacen parte del cumplimiento de los objetivos establecidos en el proyecto y fueron desarrolladas siguiendo los lineamientos técnicos y de calidad bajo la supervisión de la Interventoría.

A continuación, se detallan las instituciones educativas y de formación, su ubicación y cantidad de población beneficiada.

Tabla 12 Instituciones Beneficiadas

INSTITUCIONES BENEFICIADAS ID EX_08_309_1867_12		
INSTITUCIONES	**DIRECCIÓN**	**POBLACIÓN BENEFICIADA**
Colegio Infantil de Aprendizaje y Desarrollo	CARRERA 79A # 35-01 SUR	CERRADO
Colegio Los Pequeños Infantes	CARRERA 79D # 35B-04 SUR	320
Liceo Eucarístico Mixto	CARRERA 79A # 35C-20 SUR	560
Colegio Distrital INEM Francisco de Paula Santander Sede B	CARRERA 81J # 46-44 SUR	1200

Jardín Infantil HCB Bulliciosos	CALLE 35 SUR # 78L-73	CERRADO
Politécnico Internacional	CARRERA 78K # 35-67 SUR	CERADO
Liceo Cristiano Psicopedagógico Leche y Miel	CARRERA 78L # 35B-29 SUR	480
Colegio Distrital INEM Francisco de Paula Santander Sede A	CALLE 38C SUR # 79-06	1100
Instituto Emaús	CARRERA 78P # 39-52 SUR	920
Centro Educativo Distrital Paulo VI Sede A	CARRERA 78P # 41-20 SUR	800
Colegio San Pedro Claver	CARRERA 79C # 41B-51 SUR	680
Jardín Infantil Gran Colombiano	CARRERA 79D # 41A BIS – 60 SUR	300

Fuente: Elaboración Consorcio Segurvial Bogotá

Tabla 23 Instituciones Beneficiadas

INSTITUCIONES BENEFICIADAS ID EX_08_348_1867_12		
INSTITUCIONES	**DIRECCIÓN**	**POBLACIÓN BENEFICIADA**
Mega Explorer	CL 9 #69A 54	80
Be Lideres del Futuro	CALLE 9A #69B-16	25 por ciclos
Taller Infantil Muñekitos	CALLE 9A -69B 72	50
Liceo María Virgen del Amparo	CARRERA 69D-9B-47 BIS	180
Jardín Infantil Bilingüe Amigos de Jesús	CALLE 9C -69B-02	60
LCA Kids	CALLE 6B 71A 17	Entre 30 y 40 niños
Gimnasio Infantil Santa Cecilia	CALLE 9 # 69B-90	80
Kínder Garden Pompin Tararin	CALLE 8 # 69F-02	60
Instituto Marsella	CALLE 7A #70-04	180
Colegio Marsella	CARRERA 69 # 8-65	1200- 2 jornadas

Fuente: Elaboración Consorcio Segurvial Bogotá

Ver **Anexo 16.**

14. REPORTE DE LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN Y FORMATOS DE SEGUIMIENTO AL ESTADO DE LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS DE CONTROL DE OBRA MÍNIMO.

Se adjuntan los certificados de calibración de los equipos exigidos en el Anexo Técnico, correspondientes a cada cuadrilla operativa y al Retrorreflectómetro, los cuales acreditan el cumplimiento del Consorcio Segurvial Bogotá frente a las condiciones técnicas establecidas en el contrato.

Ver **Anexo 9.**

15. REPORTES DE LA ENTREGA DE SEÑALIZACIÓN IMPLEMENTADA AL ALMACÉN DE LA ENTIDAD.

Se adjunta el **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL No. 08**, correspondiente al periodo de ejecución del presente informe.


Ver **Anexo 10**

16. REPORTE DE LA SEÑALIZACIÓN RETIRADA DE VÍA Y ENTREGADA AL ALMACÉN DE LA ENTIDAD.

Tal como se reportó en el registro anterior y en el marco del Informe No. 8, el pasado 28 de agosto de 2025 se reintegraron 128 señales verticales retiradas, correspondientes a las cuentas No. 6. La entrega se efectuó en el Patio 4 de la Secretaría Distrital de Movilidad, con la supervisión de la Interventoría y el aval de la administración del Almacén, consolidando el proceso de retiro y reintegro conforme a los procedimientos establecidos.

Respecto a las señales y dispositivos asociados a las cuentas No. 7 y 8, la documentación soporte se encuentra actualmente en trámite por conducto de la Interventoría, con el fin de adelantar la gestión de reintegro al Patio No. 4 de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM).

Toda vez que dicha documentación no corresponde al periodo de análisis del presente informe, esta será anexada y reportada en el informe subsiguiente, una vez se concluya el proceso administrativo correspondiente.

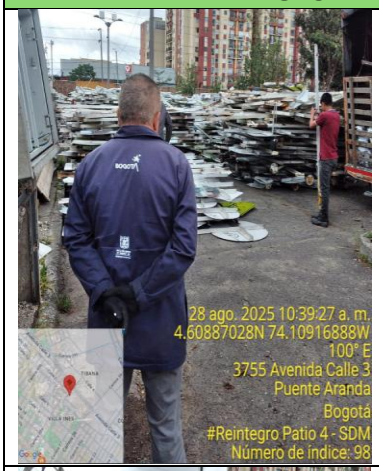REINTEGRO DE RETIROS DE SEÑALES VERTICALES – PATIO 4 SDM		
		
		

Se adjunta la documentación como soporte correspondiente de dicha entrega.

Ver **Anexo 11**

17. ASPECTOS VARIOS

Se adjuntan las Actas de Reunión Semanal, realizadas en el periodo de ejecución del presente informe No. 8, para el Contrato de Obra SDM-2024-3651 y el Contrato de Interventoría SDM-2024-3666.

Ver **Anexo 12**

18. RECURSOS UTILIZADOS POR EL CONTRATO DE OBRA.

Con el objeto de garantizar el cumplimiento del programa de trabajo y como resultado de las actividades ejecutadas se dispuso de los siguientes recursos durante el periodo del presente informe.

18.1. PERSONAL

A continuación, se relaciona el equipo de trabajo profesional, tecnólogo, administrativo y operativo para el desarrollo del proyecto durante el periodo del presente informe:

Tabla 14 Personal del contrato de Obra

LISTA DE PERSONAL VINCULADO AL CONTRATO SDM 2024-3651				
FUNCIONARIO		DOC. IDENTIDAD	NACIONALIDAD	EMPRESA
1	ADRIANA MARGARITA GORDILLO CAMARGO	52.146.766	COLOMBIA	CON. SEGURVIAL BTÁ
2	ANDREA VIVIANA NIÑO CARRIÓN	52.146.766	COLOMBIA	CON. SEGURVIAL BTÁ
3	ANGIE YAMILE BARBOSA JIMÉNEZ	52.146.766	COLOMBIA	CON. SEGURVIAL BTÁ
4	JHON ALEXANDER HERRERA BENAVIDES	52.146.766	COLOMBIA	CON. SEGURVIAL BTÁ
5	JORDANA FRANCISCA CAMARGO FRANCO	52.146.766	COLOMBIA	CON. SEGURVIAL BTÁ
6	JOHN JAIRO MARTÍNEZ BARREIRO	52.146.766	COLOMBIA	CON. SEGURVIAL BTÁ
7	GIOVANNI ARMANDO CAICEDO RINCÓN	52.146.766	COLOMBIA	CON. SEGURVIAL BTÁ
8	OMAR ENRIQUE DUARTE MORA	52.146.766	COLOMBIA	CON. SEGURVIAL BTÁ
9	MOISÉS RODRÍGUEZ SALAZAR	52.146.766	COLOMBIA	CON. SEGURVIAL BTÁ
10	MANUEL FERNANDO IBAGUÉ COCA	52.146.766	COLOMBIA	CON. SEGURVIAL BTÁ
11	BODDY ANDRÉS GRAJALES VERA	52.146.766	COLOMBIA	CON. SEGURVIAL BTÁ
12	VÍCTOR JULIO VELANDIA SANTOS	52.146.766	COLOMBIA	CON. SEGURVIAL BTÁ
13	DYLAN SMITH MARTÍNEZ GALVIS	52.146.766	COLOMBIA	CON. SEGURVIAL BTÁ
14	VALENTINA CAVIEDES GAMBA	52.146.766	COLOMBIA	CON. SEGURVIAL BTÁ
15	ALVARINO ROMERO MORALES	52.146.766	COLOMBIA	SEÑ. NUEVO MILENIO
16	LUIS ALBERTO GALINDO ACOSTA	52.146.766	COLOMBIA	SEÑ. NUEVO MILENIO
17	WILMER ESMIT LOPEZ CAJAMARCA	52.146.766	COLOMBIA	SEÑ. NUEVO MILENIO
18	JORGE LEONARDO RAMÍREZ RINCÓN	52.146.766	COLOMBIA	SEÑ. NUEVO MILENIO
19	JUAN DAVID MORALES GUARACA	52.146.766	COLOMBIA	SEÑ. NUEVO MILENIO
20	CARLOS ANDRES VALBUENA GAITÁN	52.146.766	COLOMBIA	SEÑ. NUEVO MILENIO
21	KEVIN ARTURO SEDAS CAVIEDES	52.146.766	COLOMBIA	SEÑ. NUEVO MILENIO
22	CAMILO ANDRES BARACALDO MARTINEZ	52.146.766	COLOMBIA	SEÑ. NUEVO MILENIO
23	JOHN ALEJANDRO BERRIO MOYA	52.146.766	COLOMBIA	SEÑ. NUEVO MILENIO

LISTA DE PERSONAL VINCULADO AL CONTRATO SDM 2024-3651				
	FUNCIONARIO	DOC. IDENTIDAD	NACIONALIDAD	EMPRESA
24	BRANDON ALIRIO CASTELLANOS HERNANDEZ	52.146.766	COLOMBIA	SEÑ. NUEVO MILENIO
25	JUNIOR JOSÉ CAMACARO SALÓN	52.146.766	VENEZUELA	SEÑ. NUEVO MILENIO
26	RICARDO CAVIEDES RIAÑO	52.146.766	COLOMBIA	SEÑ. NUEVO MILENIO
27	NIXON ALBERTO CAVIEDES RIAÑO	52.146.766	COLOMBIA	SEÑ. NUEVO MILENIO
28	JHON ANDRES GOMEZ BELTRÁN	52.146.766	COLOMBIA	SEÑ. NUEVO MILENIO
29	ANDRES FELIPE IBÁÑEZ ACEVEDO	52.146.766	COLOMBIA	SEÑ. NUEVO MILENIO
30	JORGE ANDRES CÁRDENAS RAMÍREZ	52.146.766	COLOMBIA	SEÑ. NUEVO MILENIO
31	ORLANDO FABIAN CÁRDENAS OLIVERO	52.146.766	COLOMBIA	SEÑ. NUEVO MILENIO
32	BEATRIZ YORLADIS GAMBA BUITRAGO	52.146.766	COLOMBIA	SEÑ. NUEVO MILENIO
33	SONIA ROMERO MORALES	52.146.766	COLOMBIA	SEÑ. NUEVO MILENIO
34	JULIÁN ANDRÉS CÁCERES PINTO	52.146.766	COLOMBIA	SEÑ. NUEVO MILENIO
35	NELSON ENRIQUE MAZO CAMPO	52.146.766	COLOMBIA	SEÑ. NUEVO MILENIO
36	JAROL MEDARDO ÁNGEL CALDERON	52.146.766	COLOMBIA	SEÑ. NUEVO MILENIO
37	SEBASTIÁN MACHADO IBARGUEN	52.146.766	COLOMBIA	SEÑ. NUEVO MILENIO
38	RAFAEL ANTONIO MEDINA BUSTOS	52.146.766	COLOMBIA	SEÑ. NUEVO MILENIO
39	BRAYAN STEVEN MIRANDA CÁRDENAS	52.146.766	COLOMBIA	SEÑ. NUEVO MILENIO
40	FABIAN ESTEBAN RINCÓN BALCEROS	52.146.766	COLOMBIA	SEÑ. NUEVO MILENIO
41	LUIS MIGUEL IGUARÁN RUBIO	52.146.766	COLOMBIA	SEÑ. NUEVO MILENIO
42	JOSÉ ARISTÓBULO CETINA JIMÉNEZ	52.146.766	COLOMBIA	SEÑ. NUEVO MILENIO
43	DAVID HERRERA JUYA	52.146.766	COLOMBIA	SEÑ. NUEVO MILENIO
44	NICOLÁS ENRIQUE RUIZ CASTAÑEDA	52.146.766	COLOMBIA	SEÑ. NUEVO MILENIO
45	PABLO CESAR RODRIGUEZ AMÉZQUITA	52.146.766	COLOMBIA	SEÑ. NUEVO MILENIO
46	CLEMENTE ROA BULLA	52.146.766	COLOMBIA	SEÑ. NUEVO MILENIO
47	EMERSON FLOREZ DAVILA	52.146.766	COLOMBIA	SEÑ. NUEVO MILENIO
48	EDWAR STICK VARGAS VARGAS	52.146.766	COLOMBIA	SEÑ. NUEVO MILENIO
49	CARLOS ANDRÉS CASTILLO MORENO	52.146.766	COLOMBIA	SEÑ. NUEVO MILENIO
50	JAIME BUITRAGO BARRETO	52.146.766	COLOMBIA	SEÑ. NUEVO MILENIO
51	DIEGO MIGUEL BERNIER MONTIER	52.146.766	COLOMBIA	SEÑ. NUEVO MILENIO
52	NAYIBE LUCERO JULIO VALERO	52.146.766	COLOMBIA	SEÑ. NUEVO MILENIO
53	LEIDY TATIANA LOPEZ GOMEZ	52.146.766	COLOMBIA	SEÑ. NUEVO MILENIO
54	SANTIAGO PADILLA CASAS	52.146.766	COLOMBIA	SEÑ. NUEVO MILENIO
55	JHON ALEXANDER MORALES GÓMEZ	52.146.766	COLOMBIA	SEÑ. NUEVO MILENIO
56	CRISTHIAN ANDRÉS MORALES GÓMEZ	52.146.766	COLOMBIA	SEÑ. NUEVO MILENIO

Fuente: Elaboración Consorcio Segurvial Bogotá

Igualmente, en el **Anexo 17** Informe Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, se detalla el personal Operativo que conforma las cuadrillas que trabajaron en la implementación de la Señalización durante el periodo del presente informe.

18.2. EQUIPOS DE APLICACIÓN, CONTROL, MATERIALES E INSUMOS

A continuación, se relaciona los siguientes equipos que se emplearon para la ejecución de los trabajos del periodo desarrollados en el periodo del presente informe y que fueron presentados y probados por parte de la Interventoría:

Tabla 15 Equipos empleados para la ejecución de las Actividades

EQUIPOS DE APLICACIÓN EMPLEADOS		
ÍTEM	**MAQUINARIA EQUIPO**	**DESCRIPCIÓN**
1	Equipo Montado Placa: **WHO 475** **PORTWIN 8900** Serial: **1939400128** Factura: **00015239**	Vehículo autopropulsado y/o montado para aplicación de pintura líquida que tenga incorporado el equipo delineador, el cual deberá poseer, como mínimo, dos (2) boquillas para la aplicación de pintura y otras dos (2) para la aplicación de microesfera tipo drop - on o sembrado
2	Equipo **PINTA RAYAS TERMO PLÁSTICO PROMELT SIN SMART DIE** Factura: **0364**	Vehículo autopropulsado para aplicación de resina termoplástica que tenga incorporado el equipo delineador, el cual deberá poseer dos (2) boquillas para la aplicación de resina por extrusión o pulverización o spray y dos (2) dispensadores o boquillas para la aplicación de microesfera tipo drop on o sembrado a presión. Incluye caldera.
3	Equipo Montado Placa: **WHO 475** **PORTWIN 8900** Serial: **1939400096** Factura: **00015239**	Vehículo autopropulsado y/o montado para aplicación de plástico en frío por el método de spray, el cual deberá poseer, como mínimo, cuatro (4) boquillas para la aplicación de pintura y otras dos (2) para la aplicación de microesfera tipo drop - on. Vehículo autopropulsado y/o montado para aplicación de plástico en frío por el método de extrusión, el cual deberá poseer, como mínimo, dos (2) boquillas para la aplicación de pintura y otras dos (2) para la aplicación de microesfera tipo drop - on
4	**POWERLINER 8900XLT 2 GUN** Serial: **1223400024** Factura: **00005596**	Máquina manual para pintura líquida.
	POWERLINER 8900XLT 2 GUN Serial: **1223400015** Factura: **00005568**	
	PORTWIN 4900 Serial: **19392001** Factura: **00015167**	
5	**TERMO PERFILADO MARCA TATU** Serial: **026P18O16**	Máquina manual para aplicación de termoplástico, incluye caldera.

EQUIPOS DE APLICACIÓN EMPLEADOS		
ÍTEM	**MAQUINARIA EQUIPO**	**DESCRIPCIÓN**
	Factura: PT-05-337	
6	Equipo **LINE LAZER 200 HS 2 PISTOLAS** Factura: **0326**	Máquina manual para aplicación de plástico en frío por el método Spray. Máquina manual para aplicación de plástico en frío por el método extrusión.

Fuente: Elaboración Consorcio Segurvial Bogotá

A continuación, se listan los instrumentos usados por cada cuadrilla en los frentes de obra, para el control de calidad de la señalización implementada:

Tabla 16 Instrumentos usados para el control de calidad

EQUIPOS DE CONTROL	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**
Velocímetro	1
Galgas para la verificación de espesores húmedos	1
Medidor de espesores secos para tomar lecturas de la demarcación sobre testigos	1
Retrorreflectómetro horizontal	1
Lupa con Aumento	1
Cinta métrica / Odómetro	1
Equipo para medir Temperatura ambiente y de la Superficie por demarcar	1
Equipo para medir Velocidad del viento	1
Equipo para medir humedad relativa (Termohigrómetro)	1
Equipo para medir punto de rocío	1

Fuente: Elaboración Consorcio Segurvial Bogotá

Así mismo, en el **Anexo 9.** Equipos mínimos, se adjuntan los certificados de calibración y formatos de seguimiento al estado de los equipos y elementos de control de obra mínimos.

Tabla 17 Relación de materiales utilizados

RELACIÓN DE MATERIALES UTILIZADOS			
DESCRIPCIÓN	**COLOR**	**MARCA**	**LOTE**
Pintura bicomponente spray	Blanco	Señalización Nuevo Milenio	64
			65
Pintura bicomponente spray	Amarillo	Señalización Nuevo Milenio	31
			31
Microesfera de vidrio	N/A	Echostar 5 - Sovitec	K104297
Microesfera de vidrio	N/A	Potters	2022317285
Acrílico Base Solvente	Blanco	Pintuflex	P9212
Acrílico Base Solvente	Amarillo	Señalización Nuevo Milenio	63
Acrílico Base Solvente	Azul 5005	Señalización Nuevo Milenio	6
Acrílico Base Solvente	Azul 5015	Señalización Nuevo Milenio	7
Acrílico Base Solvente	Magenta	Señalización Nuevo Milenio	3
Acrílico Base Solvente	Roja	Señalización Nuevo Milenio	15
Acrílico Base Solvente	Violeta	Señalización Nuevo Milenio	5
Acrílico Base Solvente	Verde	Señalización Nuevo Milenio	3
Acrílico Base Solvente	Naranja	Señalización Nuevo Milenio	6
Acrílico Base Solvente	Mandarina	Señalización Nuevo Milenio	4
Imprimante	Negro	Señalización Nuevo Milenio	54
Pintura llana blanca	Blanco	Señalización Nuevo Milenio	48
Pintura llana Amarilla	Amarillo	Señalización Nuevo Milenio	72
Antigraffiti	Transparente	Avery Dennison	LR480437
			LR480925 LR480926
			LR480927 LR480928
Reflectivo	Blanco	Avery Dennison	LR480361 LR480367
			LR480369 LR480353
			LR480370 LR480371
			LR475407
	Amarillo		LR467116 LR480946
	Amarillo Limón		LR479770 LR480312
			LR480311
			LR473132 LR473456
Estoperol metálico	N.A.	Industrias Astro	N.A.
Tachón plástico	N.A.	Ef Xport ZF	N.A.

RELACIÓN DE MATERIALES UTILIZADOS			
DESCRIPCIÓN	**COLOR**	**MARCA**	**LOTE**
Hito flexible	N.A.	Ef Xport ZF	N.A.
Boya plástica	N.A.	Ef Xport ZF	N.A.
Tachas	Amarilla	Smart Traffic Devices	N.A.
Tachas	Blanco / Rojo	Smart Traffic Devices	N.A.

Fuente: Elaboración Consorcio Segurvial Bogotá

Los certificados de calidad de los materiales y productos empleados en las actividades de señalización y dispositivos de seguridad vial, como parte del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Anexo Técnico y el Plan de Calidad del contrato. Estos documentos garantizan que los insumos utilizados cumplen con las especificaciones técnicas exigidas, asegurando la conformidad con los estándares normativos y el desempeño esperado en condiciones operativas reales.

Ver **Anexo 7**

19. VINCULACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE

Para el periodo de ejecución del presente informe y en cumplimiento de garantizar la provisión del 5% servicios de sujetos de especial protección constitucional, se podrá evidenciar la relación del personal vinculado al contrato 2024-3651 y el cumplimiento con dicha condición de protección constitucional.

Ver **Anexo 14**

20. VINCULACIÓN POR PORCENTAJE DE MUJERES

En búsqueda del compromiso de la vinculación del 13.8% de mujeres y para ello se relacionan los nombres de las mujeres que han estado vinculadas al contrato para el corte No. 8; además del 5% de total de mano de obra no calificada de mejores para este mismo periodo.

Ver **Anexo 15**

21. INFORME DE GESTIÓN SOCIAL

Con base en el componente social descrito en el anexo técnico y en búsqueda de su adecuado cumplimiento, se coordinaron y se ejecutaron las actividades en articulación con el área técnica y bajo el seguimiento de la interventoría, garantizando la socialización, atención a la comunidad y cumplimiento del cronograma establecido en las localidades de Bosa y Kennedy, así como de las zonas de intervención directa del proyecto.

Por lo anterior, se presenta en el documento **Informe de Gestión Social.**

Ver **Anexo 16.**

22. SOPORTE DE CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

El soporte de cumplimiento de la gestión de seguridad y salud en el trabajo es fundamental para garantizar que todas las actividades del contrato se desarrollen de manera segura, responsable y conforme a la normatividad vigente. Este conjunto de evidencias demuestra el cumplimiento con los estándares, procedimientos y disposiciones legales orientadas a proteger la integridad física y la salud de los trabajadores, así como del entorno en el que se ejecuta la obra.

En el **Anexo 17** se incluyen, entre otros, los siguientes elementos:

- Soportes de pago y cumplimiento de aportes parafiscales.
- Registros y certificados de capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo.
- Registros fotográficos del desarrollo de actividades en campo.
- Informes y evidencias de inspecciones de seguridad realizadas en los frentes de trabajo.
- Formatos de preoperacionales de maquinaria y equipos.
- Reportes de inducciones y reinducciones al personal.
- Planillas de seguimiento a la dotación de elementos de protección personal (EPP).

- Evidencias de implementación de elementos de emergencia por cada vehículo y dependencia administrativa.

Además de prevenir accidentes, reducir riesgos y optimizar la continuidad operativa, este soporte contribuye a que la obra se ejecute de manera eficiente y sin interrupciones derivadas de incidentes de seguridad. En conjunto con el seguimiento y acompañamiento de la Interventoría, constituye una herramienta clave para cumplir con las obligaciones contractuales, minimizar riesgos y garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable para todos los involucrados.

23. SOPORTE DE CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES

El registro de la correspondencia oficial, tanto física como digital, que ingresa o se emite desde el Consorcio Segurvial Bogotá, incluyendo comunicaciones con SDM, Interventoría y otras fuentes externas como proveedores e incluso entidades distritales o gubernamentales, se incluye en el **Anexo 18.**

24. SOPORTE DE IMPLEMENTACIÓN, EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD APROBADO.

La importancia del soporte de implementación, ejecución de las actividades y cumplimiento del plan de calidad aprobado radica en asegurar que el proyecto se realice de acuerdo con los estándares y requisitos establecidos. Este soporte demuestra que las actividades se llevan a cabo de manera planificada, controlada y eficiente, garantizando la calidad en cada etapa del proceso. Además, ayuda a identificar y corregir posibles desviaciones a tiempo, minimizando riesgos y asegurando que los resultados finales cumplan con las expectativas y especificaciones acordadas.

En definitiva, es clave para mantener la coherencia, la eficiencia y la satisfacción del cliente, asegurando que el trabajo realizado sea de alta calidad y cumpla con los objetivos del contrato.

Ver **Anexo 7**, **Anexo 9** y **Anexo 19.**

25. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS (Entre las cuales se destaca el estado de las pólizas del contrato de obra (vigente / en Actualización)).

Las pólizas solicitadas en el contrato fueron expedidas por la compañía Seguros Mundial S.A. A continuación, se presenta una relación que incluye amparos, vigencia y valor asegurado.

Tabla 18 Pólizas del Contrato 2024-3651 Consorcio Segurvial Bogotá

TIPO DE GARANTÍA	AMPARO	VIGENCIA		VR.	PÓLIZA No.
		DESDE	HASTA		
Cumplimiento	Cumplimiento del contrato	22/01/25	23/05/28	$ 5.631.442.028,40	100363759-3
	Pago de salarios	22/01/25	22/11/30	$ 3.754.294.685,60	100363759-3
	Estabilidad y calidad de la obra	22/11/27	22/11/32	$ 5.631.442.028,40	100363759-3
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	22/11/27	23/05/28	$ 5.631.442.028,40	100363759-3
Responsabilidad civil extracontractual	Amparo básico - predios - labores y operaciones	22/01/25	22/11/27	$ 938.573.671,00	100093818-2
	Patronal	22/01/25	22/11/27	$ 938.573.671,00	100093818-2
	Contratistas y subcontratistas	22/01/25	22/11/27	$ 938.573.671,00	100093818-2
	Vehículos propios y no propios	22/01/25	22/11/27	$ 938.573.671,00	100093818-2

Fuente: Elaboración Consorcio Segurvial Bogotá

Las pólizas anteriormente mencionadas están aprobadas por parte de la entidad contratante.

Ver **Anexo 20.**

26. REPORTE DE PLANILLAS DE PAGO DE SALARIOS Y HONORARIOS AL PERSONAL VINCULADO AL CONTRATO.

Este documento asegura que el pago a los trabajadores y honorarios se realiza de manera puntual, precisa y en cumplimiento con las obligaciones laborales y legales. Además, ayuda a mantener un control claro sobre los costos del proyecto.

Ver **Anexo 21.**

27. REPORTE DE PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL VINCULADO AL CONTRATO (SALUD, PENSIÓN, ARL) Y DEMÁS APORTES LEGALES

Este reporte es fundamental para garantizar que se cumplan todas las obligaciones sociales y legales correspondientes. Este control asegura que las contribuciones a la seguridad social, riesgos laborales y otros aportes legales se realicen de manera oportuna y correcta, protegiendo a los trabajadores y, en definitiva, no solo refleja una gestión transparente y responsable, sino que también protege los derechos del personal y contribuye a la sostenibilidad y legalidad del proyecto.

Ver **Anexo 22.**

28. CERTIFICACIÓN HECHA POR REPRESENTANTE LEGAL, CONTADOR O REVISOR FISCAL, EN EL QUE DECLARE ENCONTRARSE AL DÍA EN PAGOS POR CONCEPTOS DE SALARIOS Y HONORARIOS Y APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, DE CONFORMIDAD CON LA OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA.

En cumplimiento de las obligaciones contractuales y conforme a lo establecido en la oferta económica presentada, se anexa la certificación expedida por el representante legal, contador o revisor fiscal del Consorcio Segurvial Bogotá, en la que se declara que la organización se encuentra al día en el pago de salarios, honorarios, aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales.

Ver **Anexo 22.**

29. LISTADO DE PROVEEDORES

Se adjunta una tabla con los Proveedores que han estado a lo largo del contrato

sin embargo, los proveedores activos durante el periodo fueron:

- Trans Aguilas del Sur
- Industrias Astro
- Octágono MFG

Tabla 19 Proveedores

PROVEEDORES		
PROVEEDOR	**ACTIVIDAD COMERCIAL**	**CORREO**
Avery Dennison	Papel Reflectivo	alexandra.castillo@averydennison.com
Pintuflex	Fabricante de Pintura	zona08@pintuflexltda.com
Grupo Efexport ZF	Fabricante de dispositivos	almacen.efexport@gmail.com
Smart Traffic Devices	Fabricante de dispositivos	comercial@std.com.co
Etra Interandina	Grupo Empresarial	echavez.interandina@grupoetra.com
G&J Ferreterías	Fabricante de Perfilería Metálica	viviana.romero@gyj.com.co
Octágono	Fabricante de Perfilería Metálica	octagono1@gmail.com
Mundial de Tornillos	Herramientas de ferretería	ventas@mundialdetornillos.com
CYS Señales	Instalación de señales verticales	alvg71@gmail.com
Q y R	Aplicación e instalación de señalización vial	qyrsenalizaciones@gmail.com
Pinto Vías	Aplicación e instalación de señalización vial	pintoviassas@gmail.com
Industrias Astro	Fabricante de dispositivos y pegantes epóxicos	gerenciaindustriasastro@gmail.com
Trans Aguilas del Sur	Transporte	--
Industrias Astro	Dispositivos	--

PROVEEDORES		
PROVEEDOR	**ACTIVIDAD COMERCIAL**	**CORREO**
Octágono MFG	Mano obra señales	--
Señalización Nuevo milenio	Aplicación e instalación de señalización vial. Fabricante de Pintura	asistenteadminitrativa@snuevomilenio.com

Fuente: Elaboración Consorcio Segurvial Bogotá

30. CERTIFICACIÓN HECHA POR REPRESENTANTE LEGAL, CONTADOR O REVISOR FISCAL, EN EL QUE DECLARE ENCONTRARSE AL DÍA EN PAGOS A PROVEEDORES DE ACUERDO CON EL PLAN DE PAGOS ACORDADO CON CADA UNO.

Conforme a las obligaciones contractuales y las disposiciones establecidas en la minuta y el Anexo Técnico del contrato **SDM 2024–3651**, el contratista presenta a continuación la certificación expedida por el representante legal, contador o revisor fiscal, en la que declara encontrarse al día en los pagos a proveedores, según los acuerdos pactados y los términos de ejecución de cada suministro o servicio contratado.

Ver **Anexo 23.**

31. ESTADO PRESUPUESTAL.

El contrato tiene un presupuesto total de $18.771.473.428. A la fecha del presente informe, el valor pendiente por ejecutar es de $ $ 10.052.016.240, lo que muestra que una parte considerable de los recursos asignados han sido utilizados.

Tabla 20 Balance Presupuestal

VALOR TOTAL DE CONTRATO	**$ 18.771.473.428¨**
VALOR POR EJECUTAR	$ 10.052.016.240¨
VALOR PROGRAMADO A EJECUTAR (MES 8) ACUMULADO	$ 5.924.277.014¨
VALOR TOTAL EJECUTADO (MES 8) ACUMULADO	$ 8.719.457.188¨

VALOR EJECUTADO MES 8	**$ 1.680.890.769¨**
PORCENTAJE PROGRAMADO A EJECUTAR (MES 8) ACUMULADO	31.56%
PORCENTAJE EJECUTADO (MES 8) ACUMULADO	46.45%


Fuente: Elaboración Consorcio Segurvial Bogotá

La Ilustración 2 presenta una comparación entre los valores mensuales programados y los efectivamente ejecutados a lo largo de los ocho meses del proyecto.

Para el mes 8, el valor programado fue de $518.092.667 y la ejecución alcanzó $1.680.890.769, manteniendo una tendencia positiva de ejecución por encima de lo previsto.

En términos generales, la gráfica evidencia una mejora progresiva en el ritmo de ejecución de la obra, alcanzando niveles de desempeño superiores a los programados a partir del tercer mes, lo cual refleja una optimización en la gestión técnica y financiera del proyecto.

Ilustración 2 Valor Ejecución Mensual vs Valor Programado Mensual

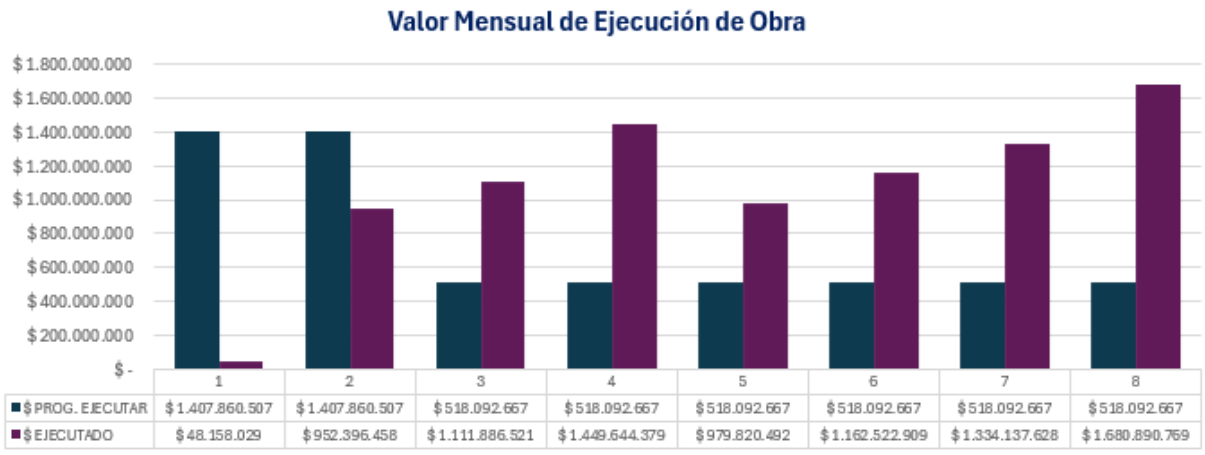


Fuente: Elaboración Consorcio Segurvial Bogotá

La Ilustración 3 presenta una comparación entre el porcentaje acumulado de ejecución programado y el efectivamente ejecutado a lo largo de los ocho meses del proyecto.

Como se puede observar para el mes 8, el porcentaje acumulado programado fue del 31,56%, mientras que la ejecución real alcanzó el 46,45%, confirmando un cumplimiento superior a lo planificado.

Ilustración 3 Porcentaje Ejecución Mensual vs Porcentaje Programado Mensual

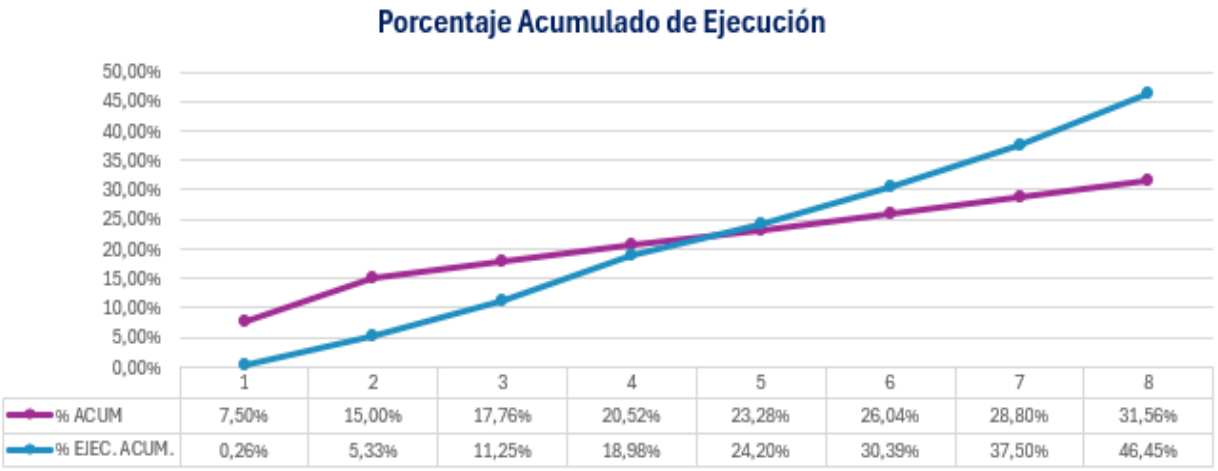


	1	2	3	4	5	6	7	8
% ACUM	7,50%	15,00%	17,76%	20,52%	23,28%	26,04%	28,80%	31,56%
% EJEC. ACUM.	0,26%	5,33%	11,25%	18,98%	24,20%	30,39%	37,50%	46,45%

Fuente: Elaboración Consorcio Segurvial Bogotá

La Ilustración 4 presenta la comparación entre el valor programado acumulado y el valor ejecutado acumulado durante ocho periodos. Se evidencia que, en los primeros cuatro periodos, el valor ejecutado se mantiene por debajo del programado, lo que indica un retraso en la ejecución de la obra respecto a lo planificado. No obstante, a partir del quinto periodo, se observa una mejora significativa en la gestión técnica y financiera del proyecto, ya que el valor ejecutado acumulado no solo alcanza, sino que supera al valor programado, reflejando una optimización en el desempeño del proyecto.

Ilustración 4 Valor Acumulado de Ejecución vs Valor Programado Acumulado

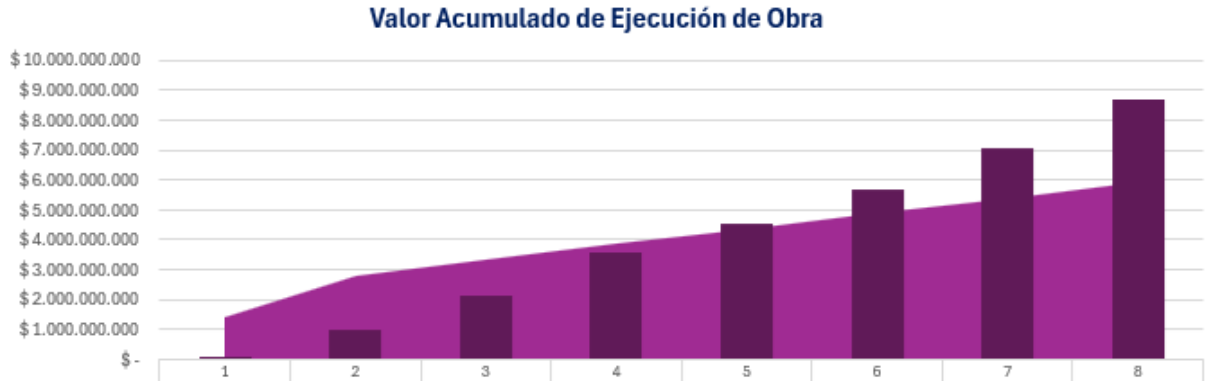

	1	2	3	4	5	6	7	8
$PROG. EJC. ACUM.	$1.407.860.507	$2.815.721.014	$3.333.813.681	$3.851.906.347	$4.369.999.014	$4.888.091.681	$5.406.184.347	$5.924.277.014
$EJEC. ACUM.	$48.158.032	$1.000.554.490	$2.112.441.010	$3.562.085.391	$4.541.905.882	$5.704.428.791	$7.038.566.419	$8.719.457.188

Fuente: Elaboración Consorcio Segurvial Bogotá

Al cierre del octavo mes de ejecución del contrato SDM 2024–3651, se observa un comportamiento financiero favorable frente a lo programado. El valor facturado ejecutado acumulado asciende a $8.719.457.188, correspondiente al 46.45% del valor total del contrato, mientras que el valor programado acumulado para el mismo periodo es de $5.924.277.014, equivalente al 31.56%.

Este resultado evidencia un superávit de ejecución de 14.89 puntos porcentuales respecto a lo programado, consolidando la recuperación presupuestal lograda en los periodos anteriores. La tendencia positiva refleja la efectividad de las estrategias operativas implementadas para mitigar el impacto de factores climáticos y logísticos, garantizando un ritmo de avance constante en los frentes de trabajo.

En conclusión, el contrato se encuentra en un escenario de ejecución anticipada respecto al cronograma financiero, lo cual constituye un indicador favorable para el cumplimiento de las metas proyectadas en los siguientes meses. La prioridad será mantener la disciplina operativa y la optimización de recursos que han permitido alcanzar este resultado.

31.1. INFORME ECONÓMICO TRIMESTRAL

El Informe Económico Trimestral es una herramienta esencial para evaluar la ejecución financiera del contrato, al contrastar los recursos programados con los efectivamente ejecutados. Este análisis permite detectar de manera oportuna

brechas, definir ajustes y aplicar acciones correctivas que aseguren el cumplimiento de las metas, garantizando transparencia en el manejo de los recursos públicos.

En este sentido se presentaron los dos informes trimestrales el primero en el tercer mes del contrato y el segundo en el sexto mes del contrato ver **Anexo 13**, la información del tercer informe se presentará posteriormente en el informe correspondiente al mes 9.

32. SOPORTE DE CUMPLIMIENTO A FACTORES DE SELECCIÓN EN LOS QUE SE OBTUVO PUNTAJE ADICIONAL EN LA OFERTA.

En esta sección se presenta el soporte documental que acredita el cumplimiento de los factores diferenciales ofrecidos por el contratista durante el proceso de selección, los cuales otorgaron puntaje adicional en la etapa de evaluación. La evidencia adjunta respalda el cumplimiento real y verificable de dichos compromisos, conforme a lo exigido en el pliego de condiciones y a lo estipulado contractualmente.

Ver **Anexo 25.**

Para acreditar este cumplimiento, se anexan documentos como las Cartas de cumplimiento de población vulnerable, mujeres y mano de obra no calificada, así como los referentes a Población Nacional, Equipos ofrecidos, Mi PYME y la Manifestación de vinculación de jóvenes entre 18 y 28 años y PMP.

Ver **Anexo 24.**

33. COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

33.1. COMENTARIOS

Durante el octavo mes de ejecución se evidenció una mejora significativa en el ritmo de avance, tanto en lo financiero como en lo físico, alcanzando un cumplimiento acumulado del 46.45%, por encima del 31.56% programado. Este comportamiento refleja la efectividad de las estrategias implementadas en periodos anteriores y la capacidad del Consorcio Segurvial Bogotá para ajustar su operación frente a las contingencias climáticas que, aunque persistieron, no impidieron el cumplimiento de las metas de aplicación. La coordinación con la Interventoría y el seguimiento riguroso de los procesos técnicos han permitido mantener la calidad y la continuidad operativa.

33.2. CONCLUSIONES

- A pesar de las jornadas no ejecutadas por condiciones de lluvia, se logró cumplir y superar las metas de aplicación correspondientes al mes 8, consolidando un superávit de 14.89 puntos porcentuales frente al cronograma financiero.

- La implementación de controles técnicos y administrativos, como inspecciones de seguridad, mediciones ambientales, ensayos de calidad y seguimiento presupuestal, ha sido clave para garantizar la conformidad con los requisitos contractuales y normativos.

- La articulación entre contratista, Interventoría y supervisión ha permitido tomar decisiones oportunas que fortalecen la planeación y aseguran la continuidad de la ejecución.

- El contrato entra en una fase de consolidación, con una proyección favorable hacia el cumplimiento de las metas globales, siempre que se mantenga la disciplina operativa y la gestión efectiva de riesgos.

33.3. RECOMENDACIONES

- Mantener la capacidad operativa actual, asegurando disponibilidad de personal especializado y maquinaria suficiente para sostener el ritmo alcanzado.

- Continuar aplicando estrategias de gestión de riesgo climático, programando actividades en ventanas de clima favorable y utilizando técnicas que mitiguen retrasos en escenarios húmedos.

- Reforzar los mecanismos de seguimiento, mediante reuniones semanales de control, análisis de indicadores y ajustes oportunos al cronograma.

- Consolidar la comunicación efectiva con la Interventoría y entidades relacionadas, anticipando necesidades administrativas o técnicas que puedan impactar el desarrollo del contrato.

- Explorar e implementar alternativas técnicas innovadoras que incrementen la productividad y reduzcan la vulnerabilidad frente a factores externos.
